INFORME PARCIAL DE EJECUCION # 01

CONVENIO 1130 DE 2025 CUYO OBJETO ES SIT - 176 CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PUBLICA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

JUNIO DE 2025



OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, INCLUYE ADQUISICIÓN DE PARQUES COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA Y A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

CONSORCIO IRDET-TUNJA 2024
R/L. EDWIN HERNANDO GARCIA RAMIREZ
Contratista

INTRODUCCION

El presente INFORME DE EJECUCION es presentado para evidenciar la ejecución de actividades en el marco del convenio 1130 de 2025, con el Municipio de Tunja, en el cual dentro del contrato LP 01 2024 cuyo objeto es REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, INCLUYE ADQUISICIÓN DE PARQUES COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA Y A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, se realizo adición de recursos No 2 para la ejecución de los escenarios deportivos de los siguientes barrios:

1. Las quintas
2. La florida
3. Portal de Canapro
4. San Carlos
5. La perla
6. Antonia Santos
7. Libertador
8. Paraíso
9. Urazandy
10. Bachué
11. Sol de oriente
12. Ciudad jardín
13. El dorado
14. La Perla
15. Rincón de la Pradera
16. Suamox.

Con el siguiente presupuesto para las intervenciones:

IRDET Instituto de la Recreación y el Deporte ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET						FECHA: 18/07/25	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD						VERSION:01	
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA						CÓDIGO: JC-F76	
PRESUPUESTO								
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**					
LA FLORIDA								
2	2,1	NP 31	APU	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INCLUYE ANGULO, TEMPLETES TRANSVERSALES DE REFUERZO EN ANGULO Y LAMINA CENTRAL	M2	56,62	$ 336.996,49	$ 19.080.741,00
						Subtotal		**$ 19.080.741,00**
PORTAL DE CANAPRO								
3	3,1	NP 32		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ACRILICO 10 MM, INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL ANTERIOR	UND	2,00	$ 983.336,12	$ 1.966.672,00
						Subtotal		**$ 1.966.672,00**
SAN CARLOS - LA PERLA								
4	4,1	NP 21	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA UN AREA DE 30 M2	UND	1,00	$ 19.638.357,70	$ 19.638.358,00
4	4,2	NP 27	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO BICICLETA	UND	1,00	$ 4.321.117,93	$ 4.321.118,00
4	4,3	NP 28	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO TWISTER	UND	1,00	$ 4.429.150,09	$ 4.429.150,00
						Subtotal		**$ 28.388.626,00**
ANTONIA SANTOS								
5	5,1	APU 5	APU	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO M-5 3/8" (SUMINISTRO + INSTALACION)	ML	19,20	$ 67.408,50	$ 1.294.243,00
5	5,2	APU 6	APU	COLUMPIO EN LONA, FIBRA O SIMILAR	UND	6,00	$ 178.075,95	$ 1.068.456,00
5	5,3	NP 32	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ACRILICO 10 MM, INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL ANTERIOR	UND	2,00	$ 983.336,12	$ 1.966.672,00
5	5,4	NP 35	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PARA SUBE Y BAJA (INCLUYE SOPORTE Y TORNILLERIA DE SUJECION PARA POSTE DE MADERA), INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	UND	4,00	$ 122.711,33	$ 490.845,00

LIBERTADOR								
6	6,1	APU 5	APU	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO M-5 3/8" (SUMINISTRO + INSTALACION)	ML	6,40	$ 67.408,50	$ 431.414,00
6	6,1	APU 6	APU	COLUMPIO EN LONA, FIBRA O SIMILAR	UND	2,00	$ 178.075,95	$ 356.152,00
6	6,1	NP 30	APU	DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO , LONGITUD HASTA 3 MTS ,INCLUYE PEDESTALES DE ANCLAJE EN CONCRETO, DESMONETE Y RETIRO DEL ANTERIOR.	UND	1,00	$ 1.248.832,45	$ 1.248.832,00
						Subtotal		**$ 2.036.398,00**
PARAISO								
7	7,1	1.19.02	ANEXO 2 GBY	CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO	JGO	1,00	$ 7.280.000,00	$ 7.280.000,00
7	7,2	APU 5	APU	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO M-5 3/8" (SUMINISTRO + INSTALACION)	ML	3,20	$ 67.408,50	$ 215.707,00
7	7,3	APU 6	APU	COLUMPIO EN LONA, FIBRA O SIMILAR	UND	1,00	$ 178.075,95	$ 178.076,00
7	7,4	NP 30	APU	DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO , LONGITUD HASTA 3 MTS ,INCLUYE PEDESTALES DE ANCLAJE EN CONCRETO, DESMONETE Y RETIRO DEL ANTERIOR.	UND	2,00	$ 1.248.832,45	$ 2.497.665,00
7	7,5	NP 31	APU	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INCLUYE ANGULO, TEMPLETES TRANSVERSALES DE REFUERZO EN ANGULO Y LAMINA CENTRAL	M2	63,74	$ 336.996,49	$ 21.480.156,00
7	7,6	NP 34	APU	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M. (INCLUYE RETIRO)	ML	27,60	$ 10.129,34	$ 279.570,00
7	7,7	1.01.63	ANEXO 2 GBY	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	20,96	$ 17.717,70	$ 371.363,00
						Subtotal		**$ 32.302.537,00**
URAZANDY								
8	8,1	1.19.04	ANEXO 2 GBY	CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO A.N. 3" Y 2"	JGO	1,00	$ 2.097.446,00	$ 2.097.446,00
						Subtotal		**$ 2.097.446,00**
BACHUE								
9	9,1	1.01.68	ANEXO 2 GBY	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	44,28	$ 8.282,55	$ 366.751,00
9	9,2	1.01.33	ANEXO 2 GBY	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	3,60	$ 17.717,70	$ 63.784,00
9	9,3	1.02.17	ANEXO 2 GBY	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	1,87	$ 67.526,65	$ 126.275,00
9	9,4	1.02.42	ANEXO 2 GBY	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	6,00	$ 9.102,76	$ 54.617,00
9	9,5	1.03.01	ANEXO 2 GBY	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,06	$ 1.557.500,52	$ 93.450,00
9	9,6	1.20.08	ANEXO 2 GBY	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM Actividad (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16")	M2	185,23	$ 182.289,03	$ 33.765.397,00
9	9,7	NP 31	APU	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INCLUYE ANGULO, TEMPLETES TRANSVERSALES DE REFUERZO EN ANGULO Y LAMINA CENTRAL	M2	3,40	$ 336.996,49	$ 1.145.788,00
9	9,8	1.02.26	APU	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	M3	1,87	$ 988.710,91	$ 1.848.889,00
						Subtotal		**$ 37.464.951,00**
SOL DE ORIENTE								
10	10,1	2.07.08	ANEXO 2 GBY	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	0,62	$ 373.055,10	$ 230.324,00
10	10,2	APU 5	APU	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO M-5 3/8" (SUMINISTRO + INSTALACION)	ML	9,60	$ 67.408,50	$ 647.122,00
10	10,3	APU 6	APU	COLUMPIO EN LONA, FIBRA O SIMILAR	UND	3,00	$ 178.075,95	$ 534.228,00
10	10,4	1.20.08	ANEXO 2 GBY	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM Actividad (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16")	M2	49,03	$ 182.289,03	$ 8.936.720,00
10	10,5	NP 30	APU	DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO , LONGITUD HASTA 3 MTS ,INCLUYE PEDESTALES DE ANCLAJE EN CONCRETO, DESMONETE Y RETIRO DEL ANTERIOR.	UND	1,00	$ 1.248.832,45	$ 1.248.832,00
10	10,6	NP 31	APU	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INCLUYE ANGULO, TEMPLETES TRANSVERSALES DE REFUERZO EN ANGULO Y LAMINA CENTRAL	M2	35,00	$ 336.996,49	$ 11.794.877,00
10	10,7	NP 33	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA UN AREA DE 40 M2, INCLUYE SUBE Y BAJA OCHO PUESTOS	UND	1,00	$ 20.968.342,42	$ 20.968.342,00
10	10,8	NP 37	APU	TOBOGAN TIPO TUBO, PASO LADO A LADO (1 TUNEL -2 PANEL), INCLUYE ACCESORIO DE SUJECCION CUADRANTE, DESMONTE Y RETIRO DEL ANTERIOR	UND	1,00	$ 2.913.305,20	$ 2.913.305,00
10	10,9	6.02.03	ANEXO 2 GBY	CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)	M3	0,62	$ 690.223,09	$ 426.144,00
						Subtotal		**$ 47.699.894,00**
EL DORADO								
12	12,1	1.01.68	ANEXO 2 GBY	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	27,00	$ 8.282,55	$ 223.629,00
12	12,2	NP 22	APU	DESMONTE Y RETIRO DE PARQUE INFANTIL EXISTENTE	UND	1,00	$ 455.000,00	$ 455.000,00
12	12,3	NP 23	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO VOLANTE	UND	1,00	$ 4.407.234,26	$ 4.407.234,00
12	12,4	NP 24	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO ESCALADORA	UND	1,00	$ 4.710.446,26	$ 4.710.446,00
12	12,5	NP 25	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO CAMINADOR AEREO	UND	1,00	$ 4.420.641,59	$ 4.420.642,00
12	12,6	NP 26	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO ASCENSOR	UND	1,00	$ 4.710.446,26	$ 4.710.446,00
12	12,7	NP 27	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO BICICLETA	UND	1,00	$ 4.321.117,93	$ 4.321.118,00
12	12,8	NP 28	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO TWISTER	UND	1,00	$ 4.429.150,09	$ 4.429.150,00
12	12,9	NP 33	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA UN AREA DE 40 M2, INCLUYE SUBE Y BAJA OCHO PUESTOS	UND	1,00	$ 20.968.342,42	$ 20.968.342,00
12	13	NP 41	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO TIMON	UND	1,00	$ 4.473.274,26	$ 4.473.274,00
12	13,1	NP 42	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO SILLA PEDALES	UND	1,00	$ 4.429.680,49	$ 4.429.680,00
12	13,2	NP 43	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE TIPO PRENSA Y/O PIERNA	UND	1,00	$ 4.473.274,26	$ 4.473.274,00
						Subtotal		**$ 62.022.235,00**
LA PEÑITA								
13	13,1	1.09,04	ANEXO 2 GBY	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	69,00	$ 9.567,91	$ 660.186,00
13	13,2	NP 30	APU	DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO , LONGITUD HASTA 3 MTS ,INCLUYE PEDESTALES DE ANCLAJE EN CONCRETO, DESMONETE Y RETIRO DEL ANTERIOR.	UND	1,00	$ 1.248.832,45	$ 1.248.832,00
						Subtotal		**$ 1.909.018,00**
RINCON DE LA PRADERA								
14	14,1	1.01.68	ANEXO 2 GBY	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	94,00	$ 8.282,55	$ 778.560,00
14	14,2	1.01.21	ANEXO 2 GBY	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	19,14	$ 42.765,87	$ 818.539,00
14	14,3	1.02.17	ANEXO 2 GBY	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	0,90	$ 67.526,65	$ 60.774,00
14	14,4	3.13.29	ANEXO 2 GBY	MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20 M D04 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)	KG	638,59	$ 9.915,95	$ 6.332.227,00
14	14,5	1.19.07	ANEXO 2 GBY	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M	ML	260,00	$ 9.698,49	$ 2.521.607,00
14	14,6	3.03.23	ANEXO 2 GBY	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES	M3	36,23	$ 829.781,08	$ 30.062.969,00
14	14,7	3.03.05	ANEXO 2 GBY	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	0,90	$ 905.565,97	$ 815.009,00
						Subtotal		**$ 41.389.685,00**
SUAMOX								
15	15,1	2.07.08	ANEXO 2 GBY	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	0,77	$ 373.055,10	$ 285.387,00
15	15,2	NP 31	APU	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INCLUYE ANGULO, TEMPLETES TRANSVERSALES DE REFUERZO EN ANGULO Y LAMINA CENTRAL	M2	139,03	$ 336.996,49	$ 46.852.622,00
15	15,3	6.02.03	ANEXO 2 GBY	CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)	M3	0,77	$ 690.223,09	$ 528.021,00
						Subtotal		**$ 47.666.030,00**
						SUBTOTAL OBRAS		**$ 328.844.449,00**
						SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 328.844.449,00
						VALOR TOTAL		**$ 328.844.449,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	22,00%
IMPREVISTO	I=	3,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30,00%

Es importante aclarar que la división de los recursos provenientes del convenio, se realizó con el ánimo de realizar intervención de manera inmediata dando mejor cobertura y mayor alcance al adicionar un contrato existente el cual tiene muy buenos indicadores y resultados, por tanto se realizó adición al contrato LP 01 de 2024, por valor de TRECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($328.845.829,00) M./CTE.

El valor restante por el orden de los TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 304.070.936,00) sera adjudicado mediante selección abreviada de menor cuantia.

Se presenta a continuación las diferentes actividades ejecutadas con sus respectivos soportes de ejecución. En el presente proyecto no se han presentado quejas ni reclamos por parte de la administración ni los pobladores del área de influencia directa.

El presente INFORME PARCIAL DE EJECUCION DE OBRA es presentado por el contratista CONSORCIO IRDET TUNJA – 2024 dentro del contrato LP 01 2024 cuyo objeto es REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, INCLUYE ADQUISICIÓN DE PARQUES COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA Y A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.

Se presenta a continuación las diferentes actividades ejecutadas con sus respectivos soportes de ejecución. En el presente proyecto no se han presentado quejas ni reclamos por parte de la administración ni los pobladores del área de influencia directa.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	LP 01 2024
OBJETO.	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, INCLUYE ADQUISICIÓN DE PARQUES COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA Y A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE LA

	RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.
FECHA	820.000.807-1
CONTRATANTE	INSTITUTOPARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE TUNJA
NIT.	899.999.445-3
CONTRATISTA	CONSORCIO IRDET TUNJA 2024 R/L. EDWIN HERNANDO GARCIA RAMIREZ
NIT.	901.898.170-6
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
SUPERVISOR	GILBERTO CELY VARGAS GUSTAVO MORENO CASTELBLANCO
INTERVENTOR	BYD MULTIPROYECTOS SAS GILBERTO CELY VARGAS
NIT.	900.268.419-8
VALOR INICIAL	SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($ 751.129.959,13)
VALOR ANTICIPO	$ 0.00
VALOR ADICIONAL N°4	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($43.968.922,00) M./CTE
VALOR ADICIONAL	TRECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

N°5	PESOS ($328.845.829,00) M./CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	MIL CIENTO VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.123.944.688,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL	UN (1) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN
PLAZO ADICIONAL N°1	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL N°2	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL N°3	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL N°4	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL N°5	UN (1) MES
PLAZO TOTAL	OCHO (8) MESES CALENDARIO
ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION N°01	26 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO N° 01	09 DE ENERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION N°02	02 DE MAYO DE 2025
ACTA DE REINICIO N° 02	25 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2025


1. **LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCION**

Escenario # 12: PARQUE INFANTIL BARRIO LAS QUINTAS

Entre Transversal 3a y Carrera 3.



Escenario # 13: CANCHA BARRIO LA FLORIDA
Entre Carrera 6a y Calle 1.

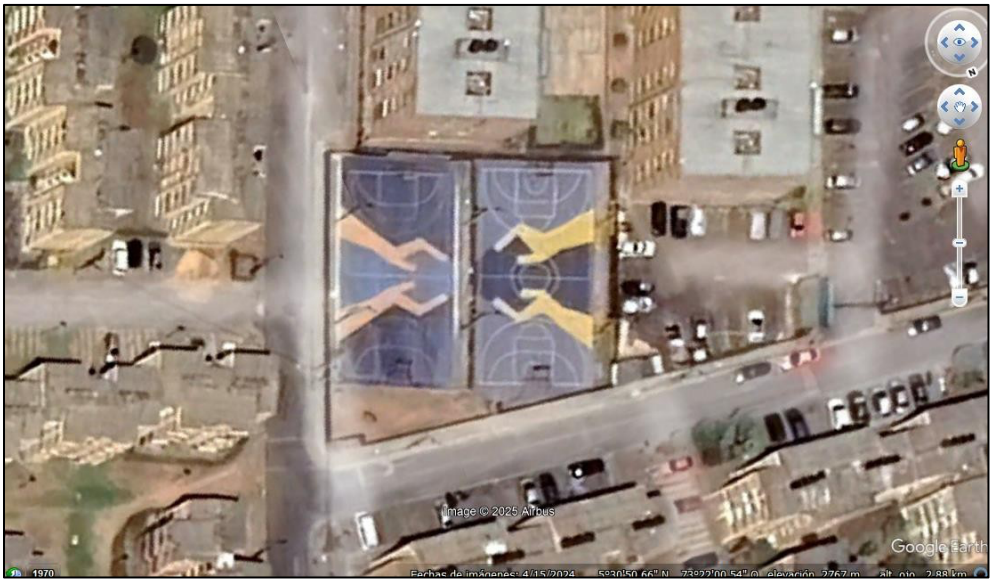

Escenario # 14: CANCHA PORTAL DE CANAPRO
Entre Calle 76a y Calle 78.



Escenario # 15: PARQUE INFANTIL BARRIO SAN CARLOS LA PERLA
Entre Carrera 10 y Calle 5a sur.




Escenario # 16: ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO ANTONIA SANTOS Interior.



Escenario # 17: PARQUE INFANTIL BARRIO LIBERTADOR Calle 4.



Escenario # 18: CANCHA Y PARQUE INFANTIL BARRIO PARAISO
Cancha entre Carrera 16 y Calle 12 – Parque infantil entre Calle 10 y Calle 11.

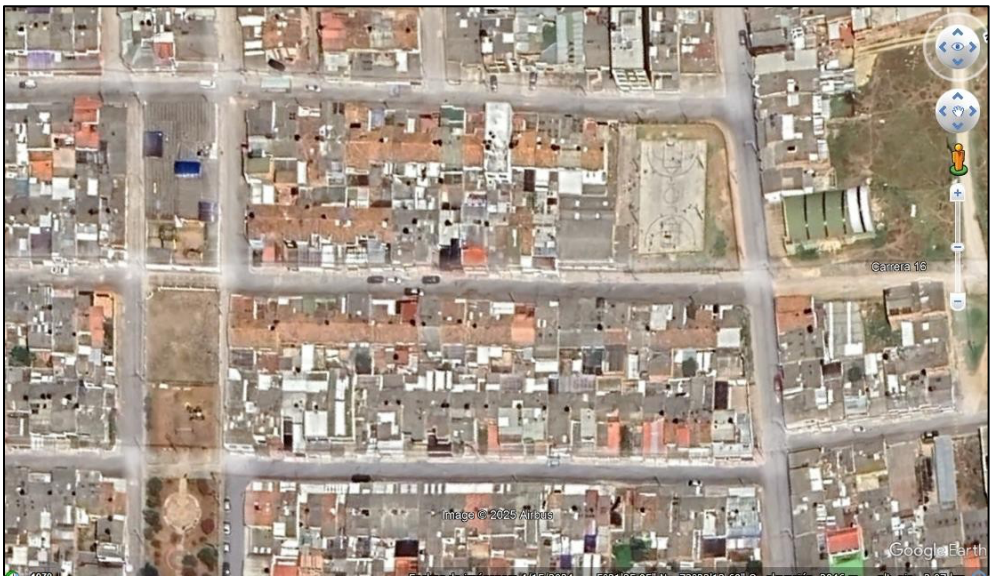

Escenario # 19: ESCENARIO BARRIO URAZANDY
Entre Carrera 14 y Calle 13.



Escenario # 20: CANCHA BARRIO BACHUE
Entre Carrera 4b Bis y Carrera 4a.



Escenario # 21: CANCHA Y PARQUE INFANTIL BARRIO SOL DE ORIENTE
Cancha y parque infantil Carrera 4d – Parque infantil entre Calle 4a y Calle 3b.




Escenario # 22: PARQUE INFANTIL BARRIO CIUDAD JARDIN
Entre Carrera 3 este y Calle 10a sur.



Escenario # 23: PARQUE INFANTIL BARRIO EL DORADO
Entre Carrera 3 este y Calle 28.



Escenario # 24: PARQUE INFANTIL BARRIO LA PEÑITA
Carrera 1.

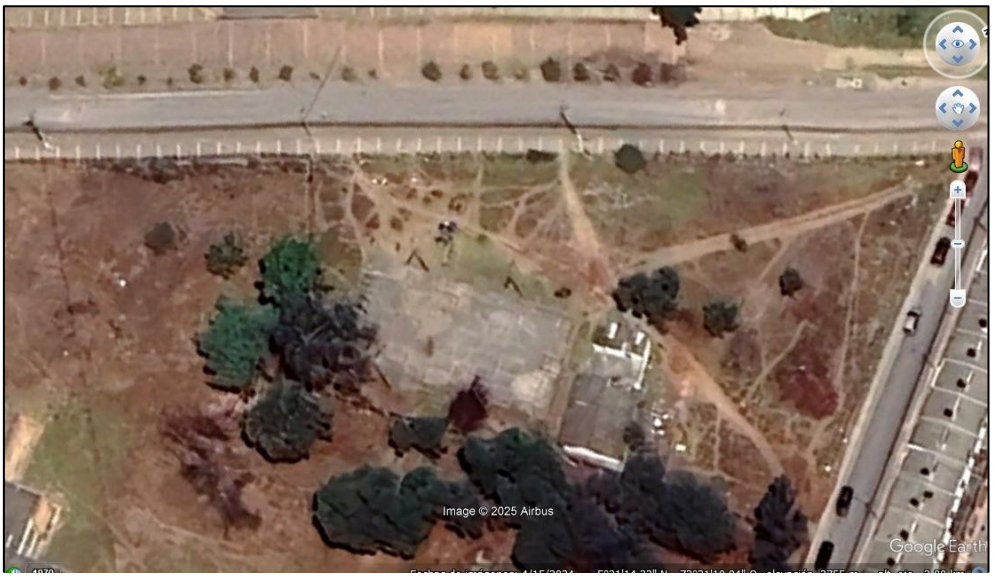

Escenario # 25: CANCHA BARRIO RINCON DE LA PRADERA
Entre Carrera 4 y Calle 34.



Escenario # 26: CANCHA BARRIO SUAMOX
Entre Transversal 1e y Transversal 0 este.



1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Se requiere el mantenimiento y mejoramiento de nuevos escenarios deportivos localizados en la ciudad de Tunja, que presentan deterioro considerable por el paso de los años y mal uso de los mismos. Con estas intervenciones se pretende garantizar la seguridad, funcionalidad de los espacios deportivos, para estimular la práctica deportiva.

Los espacios contratados y actividades generales a realizar por cada escenario deportivo son:

Escenario # 12: PARQUE INFANTIL BARRIO LAS QUINTAS - Entre Transversal 3a y Carrera 3: Se requiere el mejoramiento de tubería metálica del parque infantil mediante la aplicación de pintura y el cambio de algunos elementos en fibra de vidrio y plástico del mismo.

Escenario # 13: CANCHA BARRIO LA FLORIDA - Entre Carrera 6a y Calle 1: Se

requiere la instalación de un cerramiento en malla eslabonada divisorio entre las canchas existentes.

Escenario # 14: CANCHA PORTAL DE CANAPRO - Entre Calle 76a y Calle 78: Se requiere el desmonte e instalación de tableros acrílicos nuevos en canchas de baloncesto.

Escenario # 15: PARQUE INFANTIL BARRIO SAN CARLOS LA PERLA - Entre Carrera 10 y Calle 5a sur: Se requiere la instalación de un parque infantil nuevo y dos máquinas biosaludables.

Escenario # 16: ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO ANTONIA SANTOS – Interior: Se requiere el desmonte e instalación de tableros acrílicos nuevos en canchas de baloncesto y el cambio de elementos de parque infantil existentes.

Escenario # 17: PARQUE INFANTIL BARRIO LIBERTADOR - Calle 4: Se requiere el mejoramiento del parque infantil mediante el cambio de algunos elementos en fibra de vidrio y metálicos del mismo.

Escenario # 18: CANCHA Y PARQUE INFANTIL BARRIO PARAISO - Cancha entre Carrera 16 y Calle 12 – Parque infantil entre Calle 10 y Calle 11: Se requiere el mejoramiento del parque infantil mediante el cambio de algunos elementos en fibra de vidrio y metálicos del mismo. En la cancha se requiere el desmonte e instalación del juego de canchas multifuncionales, así como el desmonte y reemplazo de cerramientos en malla eslabonada deteriorados.

Escenario # 19: ESCENARIO BARRIO URAZANDY - Entre Carrera 14 y Calle 13: Se requiere la instalación de un juego de canchas para microfutbol.

Escenario # 20: CANCHA BARRIO BACHUE - Entre Carrera 4b Bis y Carrera 4a: Se requiere la instalación de cerramiento en malla eslabonada perimetral faltante.

Escenario # 21: CANCHA Y PARQUE INFANTIL BARRIO SOL DE ORIENTE - Cancha y parque infantil Carrera 4d – Parque infantil entre Calle 4a y Calle 3b: Se requiere el mejoramiento del parque infantil mediante el cambio de algunos

elementos en fibra de vidrio y metálicos del mismo, así como la instalación de un parque infantil nuevo. En la cancha se requiere la instalación de cerramientos en malla eslabonada perimetrales faltantes.

Escenario # 22: PARQUE INFANTIL BARRIO CIUDAD JARDIN - Entre Carrera 3 este y Calle 10a sur: Se requiere el mejoramiento del parque infantil mediante el cambio de algunos elementos en fibra de vidrio, plástico y metálicos del mismo.

Escenario # 23: PARQUE INFANTIL BARRIO EL DORADO - Entre Carrera 3 este y Calle 28: Se requiere el desmonte de parque infantil existente e instalación de un parque infantil nuevo y nueve máquinas biosaludables.

Escenario # 24: PARQUE INFANTIL BARRIO LA PEÑITA - Carrera 1: Se requiere el mejoramiento de tubería metálica del parque infantil mediante la aplicación de pintura y el cambio de algunos elementos en fibra de vidrio del mismo.

Escenario # 25: CANCHA BARRIO RINCON DE LA PRADERA - Entre Carrera 4 y Calle 34: Se requiere la demolición de placas en concreto deterioradas, construcción de nuevas y replanteo general de la cancha existente mediante la construcción de placa de concreto de nivelación, así como la demarcación de la misma.

Escenario # 26: CANCHA BARRIO SUAMOX - Entre Transversal 1e y Transversal 0 este: Se requiere la instalación de cerramiento en malla eslabonada perimetral faltante.

1.3 ACTIVIDADES PARCIALES EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO DE 2025 AL 12 DE JULIO DE 2025:

Teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a ejecutar corresponden a la elaboración de insumos en fabrica, a la fecha se encuentran en proceso de producción dichos elementos.

1.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES PRELIMINARES	
	
Foto 1: Localizacion y replanteo suamox	**Foto 1:** Localizacion y replanteo suamox
	
Foto 3: Materia prima cerramientos	**Foto 4:** Materia prima cerramientos



Foto 5: Elaboracion cerramientos



Foto 6: Elaboracion cerramientos



Foto 7: Materia prima parques infantiles



Foto 8: Materia prima parques infantiles

	
Foto 9: Elaboracion de maquinas biosaludables	**Foto 10:** Elaboracion de maquinas biosaludables
	
Foto 11: Elaboracion de parques infantiles	**Foto 12:** Elaboracion de parques infantiles

	
Foto 13: Anclajes maquinas biosaludables	**Foto 14:** Canchas de micro barrio Urazandy

1.5 PERSONAL Y EQUIPO DE OBRA

1.5.1 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA

En el presente proyecto se encuentra disponible el siguiente personal profesional:

- Nombre: LINA MERCEDES SANCHEZ CASTILLO
- Profesional: INGENIERO DIRECTOR DE OBRA

- Nombre: EDWIN HERNANDO GARCIA RAMIREZ
- Profesional: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

- Nombre: DARLEY MAURICIO FORERO
- Profesional: INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

- Nombre: JORGE EDUARDO GARCIA RUIZ
- Profesional: MAESTRO GENERAL

1.5.2 PERSONAL DE OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD
Mano de obra calificada	N/A
Mano de obra no calificada	N/A

1.5.3 EQUIPO DE OBRA

EQUIPO	CANTIDAD	DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR	1	N/A
CAMIONETA DOBLE CABINA	1	N/A
FOMALETA METALICA PARA USO GENERAL	GLB	N/A
COMPRESOR NEUMATICO 5 M³/MIN, AÑO DE FABRICACIÓN 2008 / DOS MARTILLOS.	2	N/A
SALTARIN	1	N/A
VIBROCOMPACTADOR RANA	1	N/A
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	N/A
VIBRADOR DE CONCRETO 5 HP	1	N/A
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	N/A
PULIDORA INDUSTRIAL 2400W	1	N/A
PULIDORA 900W	1	N/A

2. CONCLUSIONES

- Debido a la presencia de lluvias extemporáneas fuertes en la ciudad, no se han podido ejecutar actividades que involucren la instalación de concretos a la vista (CANCHA BARRIO RINCON DE LA PRADERA) y aplicación de pintura en superficies.

Cordialmente,



Fanor David Sarmiento Martínez
Profesional de Apoyo
Oficina de Infraestructura Deportiva.
