INFORME PARCIAL DE EJECUCION # 06

CONVENIO 1130 DE 2025 CUYO OBJETO ES SIT - 176 CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PUBLICA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

FEBRERO 2026





OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA LA VIGENCIA 2025.

CONSORCIO LINSA TUNJA 2025

R/L. LINA MERCEDES SANCHEZ CASTILLO

Contratista

INTRODUCCION

El presente informe parcial de ejecución es presentado para evidenciar la ejecución dentro del convenio 1130 de 2025, en el marco de los presupuestos participativos, el cual esta dado para que el **CONSORCIO LINSA TUNJA 2025**, en el marco del contrato **SAMC 02-2025**, cuyo objeto corresponde a la "*Obras de construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos bajo la responsabilidad del Instituto de la Juventud, el Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extraescolar, en el área urbana del municipio de Tunja, dentro de la ejecución de los presupuestos participativos de la vigencia 2025, con una adjudicación de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 304.070.936,00)*

Realice intervenciones en los siguientes barrios:

1. *las quintas*
2. *santa ines*
3. *soaquira*
4. *los muiscas*
5. *prados del norte*
6. *parque bicentenario*
7. *bochica*
8. *prados de alcala*
9. *barrio xativilla*
10. *20 de julio*
11. *barrio el triunfo*
12. *ciudad jardin*
13. *barrio san francisco*
14. *antonia santos 2*
15. *santa lucia*
16. *nazareth*
17. *fuente higueras*
18. *paraíso*
19. *Montecarlo*
20. *JJ camacho*

Este proceso está dado bajo el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR UNITARIO RESOLUCION 044 DE 2024	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
				LAS QUINTAS					
1	1,2	1.09,04	ANEXO 2 GBY	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	141,40	$ 7.359,93	$ 9.567,91	$ 1.352.902,00
1	1,3		APU	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO M-5 3/8" (SUMINISTRO + INSTALACION)	ML	9,60	$ -	$ 67.408,50	$ 647.122,00
1	1,4		APU	COLUMPIO EN LONA, FIBRA O SIMILAR	UND	3,00	$ -	$ 178.075,95	$ 534.228,00
1	1,5		APU	LIMPIEZA DE SUPERFICIES PREVIA APLICACIÓN DE ESMALTE LAMINA LINEAL, INCLUYE LIJADO DE PARTES CRITICAS	ML	141,40	$ -	$ 3.352,94	$ 474.106,00
1	1,6		APU	JUEGO DE TOBOGAN INCLUYE (2 SEMICODOS-1 TUNEL -1 PANEL), INCLUYE ACCESORIO DE SUJECCION CUADRANTE, Y RETIRO DEL ANTERIOR	UND	1,00	$ -	$ 3.328.039,00	$ 3.328.039,00
1	1,7		APU	DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO , LONGITUD HASTA 3 MTS ,INCLUYE PEDESTALES DE ANCLAJE EN CONCRETO, DESMONTE Y RETIRO DEL ANTERIOR.	UND	4,00	$ -	$ 1.248.832,45	$ 4.995.330,00
							Subtotal		**$ 11.331.727,00**
				SANTA INES					
2	2,1		APU	LIMPIEZA DE SUPERFICIES PREVIA APLICACIÓN DE ESMALTE LAMINA LINEAL, INCLUYE LIJADO DE PARTES CRITICAS	ML	175,40	$ -	$ 3.352,94	$ 588.106,00
2	2,2	1.09,04	ANEXO 2 GBY	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	175,40	$ 7.359,93	$ 9.567,91	$ 1.678.211,00
2	2,3	1.19.04	ANEXO 2 GBY	CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO A.N. 3" Y 2"	JGO	1,00	$ 1.613.420,00	$ 2.097.446,00	$ 2.097.446,00
2	2,4		APU	ADECUACION CANCHA MULTIFUNCIONAL, INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, REINSTALACION Y PINTURA GENERAL EN ESMALTE	UND	2,00	$ -	$ 446.899,02	$ 893.798,00
2	2,5		APU	LIMPIEZA DE SUPERFICIES PREVIA APLICACIÓN DE ESMALTE LAMINA LLENA, INCLUYE LIJADO DE PARTES CRITICAS	M2	6,12	$ -	$ 11.128,00	$ 68.103,00
2	2,6	1.09.05	ANEXO 2 GBY	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	6,12	$ 16.684,41	$ 21.689,73	$ 132.741,00
							Subtotal		**$ 5.458.405,00**
				SOAQUIRA					
3	3,1		APU	CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO A.N. 3" Y 2"	JGO	1,00	$ 1.613.420,00	$ 2.097.446,00	$ 2.097.446,00
3	3,2		APU	ADECUACION CANCHA MULTIFUNCIONAL, INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, REINSTALACION, PINTURA EN ESMALTE Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU MANTENIMIENTO	UND	2,00	$ -	$ 446.899,02	$ 893.798,00
							Subtotal		**$ 2.991.244,00**
				FUENTE HIGUERAS					
4	4,1	1.02.17	ANEXO 2 GBY	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	0,29	$ 51.943,58	$ 67.526,65	$ 19.448,00
4	4,2	1.20.08	ANEXO 2 GBY	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM Actividad (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16")	M2	128,97	$ 140.222,33	$ 182.289,03	$ 23.509.816,00
4	4,3		APU	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M. (INCLUYE RETIRO)	ML	4,90	$ -	$ 10.129,34	$ 49.634,00
4	4,4	1.02.26	APU	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	M3	0,29	$ 760.546,85	$ 988.710,91	$ 284.749,00
4	4,5		APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE ANCLAJE 1/4", INCLUYE CHAZOS EXPANSIVOS 5/8"x4"	UND	24,00	$ -	$ 95.222,60	$ 2.285.342,00
							Subtotal		**$ 26.148.989,00**
				20 DE JULIO					
5	5,1		APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ACRILICO 10 MM, INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL ANTERIOR	UND	2,00	$ -	$ 983.336,12	$ 1.966.672,00
							Subtotal		**$ 1.966.672,00**
				PRADOS DEL NORTE					
6	6,1	1.01.68	ANEXO 2 GBY	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	7,00	$ 6.371,19	$ 8.282,55	$ 57.978,00
6	6,2	1.02.17	ANEXO 2 GBY	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	6,37	$ 51.943,58	$ 67.526,65	$ 430.145,00
6	6,3	3.03.12	ANEXO 2 GBY	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	3,18	$ 100.304,20	$ 130.395,46	$ 414.658,00
6	6,4	1.09,04	ANEXO 2 GBY	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	103,77	$ 7.359,93	$ 9.567,91	$ 992.862,00
6	6,5	1.19.02	ANEXO 2 GBY	CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO	JGO	1,00	$ 5.600.000,00	$ 7.280.000,00	$ 7.280.000,00
6	6,6		APU	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO M-5 3/8" (SUMINISTRO + INSTALACION)	ML	4,80	$ -	$ 67.408,50	$ 323.561,00
6	6,7		APU	COLUMPIO EN LONA, FIBRA O SIMILAR	UND	3,00	$ -	$ 178.075,95	$ 534.228,00
6	6,8		APU	DESMONTE CANCHAS MULTIFUNCIONALES Y/O DE MICRO EXISTENTES, INCLUYE RETIRO	JGO	1,00	$ -	$ 349.297,00	$ 349.297,00
6	6,9		APU	CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO ESTAMPADO-COLOR E = 0.10M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE FRAGUADO) ROJO PARDO	M2	21,22	$ -	$ 215.499,32	$ 4.572.896,00
6	6,10		APU	LIMPIEZA DE SUPERFICIES PREVIA APLICACIÓN DE ESMALTE LAMINA LINEAL, INCLUYE LIJADO DE PARTES CRITICAS	ML	103,77	$ -	$ 3.352,94	$ 347.935,00
6	6,11		APU	JUEGO DE TOBOGAN INCLUYE (2 SEMICODOS-1 TUNEL -1 PANEL), INCLUYE ACCESORIO DE SUJECCION CUADRANTE, Y RETIRO DEL ANTERIOR	UND	1,00	$ -	$ 3.328.039,00	$ 3.328.039,00
6	6,12		APU	DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO , LONGITUD HASTA 3 MTS ,INCLUYE PEDESTALES DE ANCLAJE EN CONCRETO, DESMONTE Y RETIRO DEL ANTERIOR.	UND	3,00	$ -	$ 1.248.832,45	$ 3.746.497,00
							Subtotal		**$ 22.378.096,00**
				EL TRIUNFO					
7	7,1	1.01.32	ANEXO 2 GBY	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	M2	13,00	$ 15.673,35	$ 20.375,36	$ 264.880,00
7	7,2	1.02.17	ANEXO 2 GBY	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	4,69	$ 51.943,58	$ 67.526,65	$ 316.700,00
7	7,3	1.02.42	ANEXO 2 GBY	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	208,30	$ 7.002,12	$ 9.102,76	$ 1.896.105,00
7	7,4	3.13.29	ANEXO 2 GBY	MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20 M D04 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)	KG	18,50	$ 7.627,65	$ 9.915,95	$ 183.445,00
7	7,5	1.02.13	ANEXO 2 GBY	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	3,51	$ 829.581,32	$ 1.078.455,72	$ 3.785.380,00
7	7,6	1.18.04	ANEXO 2 GBY	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI), ACCESO	M2	13,91	$ 130.054,93	$ 169.071,41	$ 2.351.783,00
7	7,7	1.20.08	ANEXO 2 GBY	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM Actividad (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16")	M2	47,85	$ 140.222,33	$ 182.289,03	$ 8.722.530,00
7	7,8		ANEXO 2 GBY	SUMINISTRO DE MALLA TECHO, NYLON 2, CUADRO 15X15 PARA ZONAS SUPERIOR O TECHO DE CANCHA	M2	503,75	$ -	$ 44.715,49	$ 22.525.428,00
7	7,9		APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE PROTECCIÒN: REJA ALTO IMPACTO CONTEMPORANEA 656 DE ACERO O EQUIVALENTE : ALTURA 4,80 EN VARILLAS DE ACERO GALVANIADO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EN POLIESTER TERMOENDURECIDO. ABERTURA DE VARILLAS 50X200 MM, CON VARILLAS VERTICALES CALIBRE 5MM, DOBLE VARILLA HORIZONTAL CALIBRE 6MM UNO A CADA LADO DEL PANEL; POSTE CLASICO + TAPA CALIBRE 16 LONGIZTUD 5 MTS, CADA 5 MTS DE ACERO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLIESTER TERMOENDURECIDO + TAPA NEGRA DE POLIPROPILENO PARA PORTE DE 3" X 3" INCLUYE EXCAVACIÒN , TRASIEGO, CONCRETO DE CIMENTACION 3000 PSI , ARMADURA DE ACERO, FORMALETA, FUNDICION DE BASE DE POSTES, INSTALACION DE MALLA CON SISTEMA DE FIJACION, PLATINAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÒN.	ML	28,03	$ -	$ 1.097.685,95	$ 30.768.137,00
7	7,10		APU	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M. (INCLUYE RETIRO)	ML	47,50	$ -	$ 10.129,34	$ 481.144,00
							Subtotal		**$ 71.295.532,00**

				SAN FRANCISCO						
8	8,1	1.02.17	ANEXO 2 GBY	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	20,94	$ 51.943,58	$ 67.526,65	$	1.414.683,00
8	8,2	3.03.12	ANEXO 2 GBY	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	10,47	$ 100.304,20	$ 130.395,46	$	1.365.240,00
8	8,3			CADENA GALVANIZADA COLUMPIO M-5 3/8" (SUMINISTRO + INSTALACION)	ML	9,60	$ -	$ 67.408,50	$	647.122,00
8	8,4			CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO ESTAMPADO-COLOR E = 0.10M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE FRAGUADO) ROJO PARDO	M2	69,82	$ -	$ 215.499,32	$	15.046.163,00
8	8,5			TOBOGAN TIPO TUBO, PASO LADO A LADO (1 TUNEL -2 PANEL), INCLUYE ACCESORIO DE SUJECCION CUADRANTE, DESMONTE Y RETIRO DEL ANTERIOR	UND	1,00	$ -	$ 2.913.305,20	$	2.913.305,00
8	8,6			DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO , LONGITUD HASTA 4 MTS ,INCLUYE PEDESTALES DE ANCLAJE EN CONCRETO, DESMONETE Y RETIRO DEL ANTERIOR.	UND	2,00	$ -	$ 1.807.832,45	$	3.615.665,00
								Subtotal	**$**	**25.002.178,00**
				NAZARETH						
9	9,1	APU 5	APU	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO M-5 3/8" (SUMINISTRO + INSTALACION)	ML	6,40	$ -	$ 67.408,50	$	431.414,00
9	9,2	APU 6	APU	COLUMPIO EN LONA, FIBRA O SIMILAR	UND	2,00	$ -	$ 178.075,95	$	356.152,00
9	9,3		APU	DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO , LONGITUD HASTA 3 MTS ,INCLUYE PEDESTALES DE ANCLAJE EN CONCRETO, DESMONTE Y RETIRO DEL ANTERIOR.	UND	1,00	$ -	$ 1.248.832,45	$	1.248.832,00
								Subtotal	**$**	**2.036.398,00**
				LOS MUISCAS						
10	10,1	2.07.08	ANEXO 2 GBY	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	1,22	$ 286.965,46	$ 373.055,10	$	455.127,00
10	10,2		APU	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INCLUYE ANGULO, TEMPLETES TRANSVERSALES DE REFUERZO EN ANGULO Y LAMINA CENTRAL	M2	84,00	$ -	$ 336.996,49	$	28.307.705,00
10	10,3	1.02.26	APU	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	M3	1,22	$ 760.546,85	$ 988.710,91	$	1.206.227,00
								Subtotal	**$**	**29.969.059,00**
				SANTA LUCIA						
11	11,1	1.19.10	ANEXO 2 GBY	TUBO SOPORTE MALLA	UND	2,00	$ 133.436,29	$ 173.467,18	$	346.934,00
11	11,2	1.09,04	ANEXO 2 GBY	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	6,00	$ 7.359,93	$ 9.567,91	$	57.407,00
11	11,3	1.19.07	ANEXO 2 GBY	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M	ML	72,00	$ 7.460,38	$ 9.698,49	$	698.291,00
11	11,4		APU	ADECUACION CANCHA MULTIFUNCIONAL, INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, REINSTALACION, PINTURA EN ESMALTE Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU MANTENIMIENTO	JGO	1,00	$ -	$ 446.899,02	$	446.899,00
								Subtotal	**$**	**1.549.531,00**
				BOCHICA						
12	12,1	1.19.07	ANEXO 2 GBY	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M	ML	230,00	$ 7.460,38	$ 9.698,49	$	2.230.653,00
								Subtotal	**$**	**2.230.653,00**
				PARQUE CENTENARIO						
13	13,1	1.02.17	ANEXO 2 GBY	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	6,53	$ 51.943,58	$ 67.526,65	$	440.949,00
13	13,1	3.03.12	ANEXO 2 GBY	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	3,27	$ 100.304,20	$ 130.395,46	$	426.393,00
13	13,1	1.09.17	ANEXO 2 GBY	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	28,00	$ 17.576,11	$ 22.848,94	$	639.770,00
13	13,1		APU	CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO ESTAMPADO-COLOR E = 0.10M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE FRAGUADO) ROJO PARDO	M2	21,78	$ -	$ 215.499,32	$	4.693.575,00
13	13,1	1.04.26	ANEXO 2 GBY	MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts.	M2	4,56	$ 96.488,74	$ 125.435,36	$	571.985,00
13	13,1	1.04.08	ANEXO 2 GBY	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	M2	2,52	$ 180.411,94	$ 234.535,52	$	591.030,00
13	13,1	1.02.26	APU	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	M3	0,64	$ 760.546,85	$ 988.710,91	$	632.775,00
13	13,1	1.12.25	ANEXO 2 GBY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	28,00	$ 58.231,27	$ 75.700,65	$	2.119.618,00
13	13,1	3.13.22	ANEXO 2 GBY	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	477,38	$ 23.898,76	$ 31.068,39	$	14.831.428,00
13	13,1	3.13.34	ANEXO 2 GBY	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	477,38	$ 3.338,02	$ 4.339,43	$	2.071.557,00
13	13,1		ANEXO 2 GBY	REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3	UND	2,00	$ 114.792,00	$ 149.229,60	$	298.459,00
								Subtotal	**$**	**27.317.539,00**
				CIUDAD JARDIN						
14	14,1		APU	DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO , LONGITUD HASTA 3 MTS ,INCLUYE PEDESTALES DE ANCLAJE EN CONCRETO, DESMONTE Y RETIRO DEL ANTERIOR.	UND	1,00	$ -	$ 1.248.832,45	$	1.248.832,00
14	14,2		APU	TECHO EN FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE SOPORTES DE ARMADO, DESMONTE Y RETIRO DEL ANTERIOR	UND	2,00	$ -	$ 569.416,38	$	1.138.833,00
14	14,3		APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ALFAJOR O SIMILAR	M2	1,43	$ -	$ 334.777,30	$	478.732,00
								Subtotal	**$**	**2.866.397,00**
				XATIVILLA						
16	16,1			LIMPIEZA DE SUPERFICIES PREVIA APLICACIÓN DE ESMALTE LAMINA LINEAL, INCLUYE LIJADO DE PARTES CRITICAS	ML	10,00	$ -	$ 3.352,94	$	33.529,00
16	16,2	1.09,04	ANEXO 2 GBY	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	10,00	$ 7.359,93	$ 9.567,91	$	95.679,00
16	16,3		APU	ADECUACION PARQUE BIOSALUDABLE, INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, REINSTALACION, PINTURA EN ESMALTE Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU MANTENIMIENTO	UND	4,00	$ -	$ 412.254,47	$	1.649.018,00
16	16,4		APU	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO M-5 3/8" (SUMINISTRO + INSTALACION)	ML	3,20	$ -	$ 67.408,50	$	215.707,00
16	16,5		APU	COLUMPIO EN LONA, FIBRA O SIMILAR	UND	1,00	$ -	$ 178.075,95	$	178.076,00
								Subtotal	**$**	**2.172.009,00**
				PRADOS DE ALCALA						
17	17,1	1.02.17	ANEXO 2 GBY	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	1,30	$ 51.943,58	$ 67.526,65	$	87.785,00
17	17,2	1.02.42	ANEXO 2 GBY	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	267,97	$ 7.002,12	$ 9.102,76	$	2.439.267,00
17	17,3	1.02.13	ANEXO 2 GBY	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	1,30	$ 829.581,32	$ 1.078.455,72	$	1.401.992,00
17	17,4	1.03.01	ANEXO 2 GBY	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,30	$ 1.198.077,32	$ 1.557.500,52	$	467.250,00
17	17,5	1.04.26	ANEXO 2 GBY	MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts.	M2	14,20	$ 96.488,74	$ 125.435,36	$	1.781.182,00
17	17,6	1.20.08	ANEXO 2 GBY	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM Actividad (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16")	M2	65,94	$ 140.222,33	$ 182.289,03	$	12.020.139,00
17	17,7		APU	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INCLUYE ANGULO, TEMPLETES TRANSVERSALES DE REFUERZO EN ANGULO Y LAMINA CENTRAL	M2	2,10	$ -	$ 336.996,49	$	707.693,00
								Subtotal	**$**	**18.905.308,00**
				ANTONIA SANTOS II						
18	18,1	2.07.08	ANEXO 2 GBY	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	1,87	$ 286.965,46	$ 373.055,10	$	697.613,00
18	18,2		APU	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INCLUYE ANGULO, TEMPLETES TRANSVERSALES DE REFUERZO EN ANGULO Y LAMINA CENTRAL	M2	142,60	$ -	$ 336.996,49	$	48.055.699,00
18	18,3	1.02.26	APU	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	M3	1,87	$ 760.546,85	$ 988.710,91	$	1.848.889,00
								Subtotal	**$**	**50.602.201,00**
								SUBTOTAL OBRAS	**$**	**304.221.938,00**
								SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$	304.221.938,00
								VALOR TOTAL	**$**	**304.221.938,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	22,00%
IMPREVISTO	I=	3,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30,00%

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	SAMC 02 2025
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA LA VIGENCIA 2025.
CONTRANTE:	INSTITUTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE TUNJA
NIT:	820.000.807-1
CONTRATISTA:	CONSORCIO LINSA TUNJA 2025
NIT:	901.992.972-8
SUPERVISOR	GUSTAVO MORENO CASTELBLANCO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 304.070.936,00)
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
ACTA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION	01 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

1.2 LOCALIZACIÓN Y OBJETIVO DE LAS OBRAS EN EJECUCION.

Se busca construir, mejorar y adecuar las condiciones de los espacios deportivos, así como aumentar la disponibilidad de estos para las prácticas físicas, el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y aprovechamiento del tiempo libre en procura de diversificar y descentralizar los espacios deportivos en el IRDET de Tunja

Ubicación: Municipio de Tunja - Zona Urbana.

BARRIO LAS QUINTAS	
Actividades	**Geolocalizacion Carrera 3 Con Calle 46**
Se desarrollarán actividades de mantenimiento a través de lijado y pintura a las estructuras existentes metálicas y el reemplazo de columpios en lona que presentan deterioro, así como los deslizaderos que ya presentan fisuras y también reemplazo de tobogán que se encuentra en malas condiciones.	
SANTA INES	
Actividades	**Geolocalizacion Carrera 5 con calle 42 a**
Se realizará la adecuación de canchas multifuncionales que se encuentran deterioradas con el suministro de nuevas canchas de microfutbol, limpieza y aplicación de esmalte en varias partes de la misma.	

BARRIO SOAQUIRA	
Actividades	**Geolocalizacion Carrera 8ª con calle 56**
Se realizará la adecuación cancha multifuncional, incluye desmonte, traslado, reinstalación, pintura en esmalte y demás actividades necesarias para su mantenimiento	
CANCHA BARRIO FUENTE HIGUERAS	
Actividades	**Geolocalizacion**

	Calle 22 con Carreraa 3 B
Se realizará el Cerramiento en malla eslabonada cal 10 mm actividad (incluye tubo agua negra de 2" y ángulo 1"x1"x3/16").	

CANCHA BARRIO 20 DE JULIO	
Actividades	**Geolocalizacion** **Carrera 14 con Calle 28**
Se realizará el reemplazo de tableros de las canchas multifuncionales los cuales ya presentan un deterioro	

PARQUE Y CANCHA BARRIO PRADOS DEL NORTE	
Actividades	**Geolocalizacion** **CARRERA 8ª CON CALLE 54-02**
Se realizará la construcción de losa en concreto estampado-color e = 0.10m, fundida en sitio, instalación de juego de tobogán incluye (2 semicodos-1 túnel -1 panel, deslizadero en fibra de vidrio, longitud hasta 3 m, incluye pedestales de anclaje en concreto. Instalación y suministro de CANCHA múltiple tubo agua negra 3" y 2" incl. Tablero acrílico 10 mm para anclar al piso.	

CANCHA BARRIO EL TRIUNFO

Actividades	Geolocalizacion Carrera 17ª.con calle 1
Se realizará la instalación de cerramiento en malla eslabonada cal 10 mm actividad (incluye tubo agua negra de 2" y ángulo 1"x1"x3/16") en zonas deterioradas, se pantalla de protección: reja alto impacto contemporánea. Se instalará malla techo, nylon.	

PARQUE BARRIO SAN FRANCISCO	
Actividades	**Geolocalizacion Carrera 6 con Transversal 5ª**
Se realizará la construcción de senderos peatonales de juegos del parque infantil y maquinas biosaludables, la dotación de deslizaderos faltantes y mejoramiento a los columpios que se encuentran dado que carecen de altura para poder hacer buen uso de los mismos.	

PARQUE INFANTIL BARRIO NAZARETH	
Actividades	**Geolocalizacion Sector Callejon Barrio**
Se realizará la adecuación del parque infantil con el suministro e instalación de deslizadero, y dos columpios en lona o fibra.	

CANCHA BARRIO LOS MUISCAS	
Actividades	**Geolocalizacion Diagonal 67b Con Carrera 4**

Se realizará intervención de cerramiento costado norte de la cancha.	

CANCHA BARRIO SANTA LUCIA	
Actividades	**Geolocalizacion Calle 26 con carrera 14**
Adecuacion cancha multifuncional, incluye desmonte, traslado, reinstalacion, pintura en esmalte y demas actividades necesarias para su mantenimiento. Demarcacion con pintura tipo trafico e=0.08 m.	

CANCHA BARRIO BOCHICA	
Actividades	**Geolocalizacion Carrera 4ª con calle 6**
Se realizará la demarcación completa del escenario deportivo para su uso de manera múltiple.	

MULTIPARQUE CENTENARIO	
Actividades	**Geolocalizacion Carrera 4 con calle 8**

Se realizará la construcción de dos espacios dedicados al esparcimiento familiar dentro del parque para realización de asados y reuniones familiares en el marco del uso del parque.	
PARQUE BARRIO CIUDAD JARDIN	
Actividades	**Geolocalizacion Carrera 3ª Este Con calle 10 a sur**
Se realizará mantenimiento y mejoramiento de los parques infantiles existentes con el cambio de deslizadero deteriorado e instalación de piezas de fibra en malas condiciones.	
PARQUE BARRIO XATIVILLA	
ACTIVIDADES	**Geolocalizacion Calle 14 A con Carrera 2ª Este**
Se realizará el mejoramiento del parque bio saludable, así como el reemplazo y dotación de columpios que no se encuentran o están en malas condiciones.	

CANCHA BARRIO PRADOS DE ALCALA	
Actividades	**Geolocalizacion Carrera 1 A con calle 18**

Se dará cerramiento al escenario por el costado oriental del mismo, conservando las condiciones de estética como lo son la instalación de cerramiento en malla eslabonada, con base de antepecho en muro de ladrillo semiprensado, confinado con columnetas en concreto.	
CANCHA BARRIO ANTONIA SANTOS II	
actividades	**Geolocalizacion** **Carrera 4 A con calle 1ª Sur**
Se realizará el cerramiento de dos escenarios deportivos por el costado oriental, evitando así que los balones salgan a la vía poniendo en riesgo los usuarios.	

2. ACTIVIDADES PARCIALES EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025:

Se avanzan las labores en el taller de ornamentación con el proceso de ensamblaje y armado de estructuras metálicas, empleando técnicas de corte, soldadura y fijación de perfiles.

- **CANCHA BARRIO PRADOS DE ALCALA**

Suministro e instalacion de puerta en malla electrosoldada, incluye angulo, templetes transversales de refuerzo en angulo y lamina central.

- **PARQUE BARRIO LAS QUINTAS**

Se realizan actividades de retiro de deslizaderos en fibra de vidrio y tobogán. Se instalan columpios y cadenas en parque infantil barrio Las Quintas. Se realiza la instalación de nuevos deslizaderos en fibra de vidrio y tobogán, cumpliendo con las especificaciones técnicas y criterios de seguridad aplicables a espacios recreativos infantiles.

- **MULTIPARQUE CENTENARIO**

Se realizaron actividades de excavación y fundida de pedestales destinados al soporte de la estructura de las casetas BBQ, garantizando la estabilidad y resistencia necesarias para su instalación. Se efectuaron labores de transporte y anclaje de las casetas en sitio, asegurando su correcta disposición y funcionalidad dentro del área de intervención.

Se construyeron losas en concreto estampado en colores rojo y café, destinadas a las áreas de casetas BBQ en el Multiparque Centenario, garantizando resistencia estructural, acabado estético uniforme y condiciones óptimas de uso comunitario.

Se instaló y aplicó pintura en la cubierta de teja de fibrocemento, soportada en estructura metálica, con el propósito de brindar protección frente a agentes climáticos y asegurar la durabilidad de las casetas.

Se adelantó la construcción de parrillas en ladrillo tipo Maguncia, diseñadas para ofrecer resistencia térmica, funcionalidad y adecuada integración con la infraestructura existente, construcción de mesones en concreto reforzado, proporcionando superficies sólidas y duraderas para el uso comunitario, con acabados uniformes que aseguran condiciones óptimas de higiene y mantenimiento. Se instalan parrillas metálicas para casetas BBQ.

Se ejecutaron actividades de lavado y aplicación de sellante en las losas de concreto estampado en color, correspondientes a los senderos peatonales del parque infantil, con el fin de preservar el acabado estético, proteger la superficie contra el desgaste y garantizar mayor durabilidad frente a agentes externos.

Se retiran de sobrantes producto de las actividades de obra, manteniendo el entorno limpio, seguro y en condiciones adecuadas para el uso comunitario.

- **CANCHA BARRIO LOS MUISCAS**

Se adelantan actividades de instalación de cerramiento en los costados norte y sur del escenario deportivo del barrio Los Muiscas, empleando malla eslabonada calibre 10, la cual incluye la colocación de ángulos metálicos, templetes transversales de refuerzo en ángulo y lámina central. Suministro e instalacion de puerta en malla electrosoldada, incluye angulo, templetes transversales de refuerzo en angulo y lamina central.

- **PARQUE INFANTIL BARRIO PRADOS DEL NORTE**

Se ejecutan actividades de instalación y compactación de material de afirmado en los trazados definidos para senderos peatonales, asegurando la adecuada nivelación y resistencia de la base. De manera complementaria, se desarrolla el proceso de formaleteo para la correcta delimitación de las áreas de trabajo y la instalación de malla electrosoldada. Se funde losa en concreto estampado color rojo para los senderos peatonales del parque infantil, garantizando uniformidad estética y funcionalidad en el espacio público.

Se realizan actividades de retiro de las canchas multifuncionales existentes en estado de deterioro posteriormente, se ejecutó la instalación de nuevas canchas multifuncionales, en escenario deportivo.

Se realizan actividades de lijado y pintura de parque infantil. Se realiza el retiro e instalación de deslizaderos en fibra de vidrio, columpios, cadenas y tobogán de plástico en parques infantiles.

Finalmente, se lleva a cabo el retiro de sobrantes de excavación, con el propósito de mantener el área de intervención limpia, segura y en condiciones óptimas para su uso comunitario.

- **CANCHA BARRIO SANTA LUCIA**

Se realizan actividades de perforación para instalación de bocines de anclaje de tubos de voleibol y fundida de pedestales de los mismos.

- **PARQUE INFANTIL BARRIO SANTA INÉS.**

Se realizaron actividades de lijado y aplicación de pintura en los elementos del parque infantil, con el fin de mejorar su acabado, proteger las superficies y garantizar condiciones óptimas de seguridad y uso para la comunidad.

Se ejecutó la perforación de piso, retiro de elementos existentes y adecuación de las canchas multifuncionales.

- **CANCHA BARRIO SOAQUIRA**

Se realizaron actividades de retiro de elementos existentes en las canchas multifuncionales del escenario deportivo del barrio Soaquira, con el propósito de adelantar su adecuación y mejoramiento**.**

- **PARQUE BARRIO XATIVILLA**

Se ejecutan actividades de lijado y pintura de máquinas biosaludables en parque infantil.

2.1 REGISTRO FOTOGRAFICO

Cancha Barrio Prados de Alcalá	
	
Foto 1: Suministro e instalacion de puerta en malla electrosoldada, incluye angulo, templetes transversales de refuerzo en angulo y lamina central.	**Foto 2:** Suministro e instalacion de puerta en malla electrosoldada, incluye angulo, templetes transversales de refuerzo en angulo y lamina central.

Parque Barrio Las Quintas	
	
Foto 1: Antes de la intervención.	**Foto 2:** Antes de la intervención.

	
Foto 3: Retiro de deslizaderos en fibra de vidrio y tobogán.	**Foto 4:** Suministro e instalación de nuevos deslizaderos en fibra de vidrio y tobogán.
	
Foto 5: Suministro e instalación de nuevos deslizaderos en fibra de vidrio y tobogán, cadenas nuevas para columpios.	**Foto 6:** Suministro e instalación de nuevos deslizaderos en fibra de vidrio y tobogán.
	
Foto 7: Suministro e instalación de cadena galvanizada para columpios.	**Foto 8:** Despues de la intervención.

Multiparque Centenario

	
Foto 1: Excavación manual para pedestales de estructura.	**Foto 2:** Anclaje de las casetas en sitio, asegurando su correcta disposición.
	
Foto 3: Anclaje de las casetas en sitio, asegurando su correcta disposición, fundida de pedestales en concreto de 3000psi destinados al soporte de la estructura.	**Foto 4:** Suministro e instalación de malla electrosoldada para losa en concreto estampado.
	
Foto 5: Fundida de losa en concreto.	**Foto 6:** Aplicación de concret color para estampado.

	
Foto 7: Aplicación de desmoldante y colocacion de moldes de acuerdo a especificaciones tecnicas.	**Foto 8:** Previo a secado, se barre y lava la superficie para aplicar el sellante.
	
Foto 9: Suministro, instalación muro semiprensado tipo maguncia.	**Foto 10:** Suministro, instalación muro semiprensado tipo maguncia y meson en concreto.
	
Foto 11: Suministro e instalación de rejilla y marco.	**Foto 12:** Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento.



Foto 3: Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento.

Cancha Barrio Los Muiscas



Foto 1: Fundida de pedestales en concreto de 3000psi.



Foto 2: Cerramiento malla eslabonada c. 10 incluye angulo, templetes transversales de refuerzo en angulo y lamina central.





Foto 3: Cerramiento malla eslabonada c. 10 incluye angulo, templetes transversales de refuerzo en angulo y lamina central.	**Foto 4:** Cerramiento malla eslabonada c. 10 incluye angulo, templetes transversales de refuerzo en angulo y lamina central.
	
Foto 5: Suministro e instalacion de puerta en malla eslabonada c. 10 incluye angulo, templetes transversales de refuerzo en angulo y lamina central.	**Foto 6:** Suministro e instalacion de puerta en malla eslabonada c. 10 incluye angulo, templetes transversales de refuerzo en angulo y lamina central.

Parque Infantil Barrio Prados Del Norte	
	
Foto 1: Excavacion manual y retiro de material para losa de piso.	**Foto 2:** Mejoramiento de piso con material de afirmado.

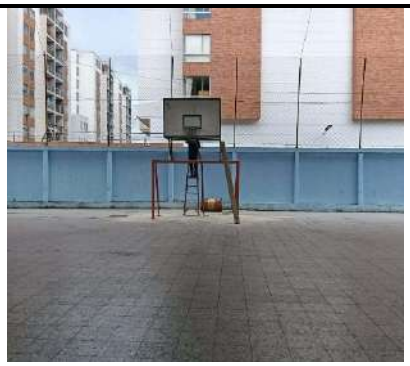
	
Foto 3: Suministro e instalacion de malla electrosoldada, formaleteo y fundida de losa.	**Foto 4:** Fundida de placa de piso.
	
Foto 5: Suministro e instalacion de malla electrosoldada, formaleteo y fundida de losa.	**Foto 6:** Suministro e instalacion de malla electrosoldada, formaleteo.
	
Foto 7: Aplicación de desmoldante y colocacion de moldes de acuerdo a especificaciones tecnicas.	**Foto 8:** Aplicación de desmoldante y colocacion de moldes de acuerdo a especificaciones tecnicas.

	
Foto 7: Previo a secado, se barre y lava la superficie para aplicar el sellante.	**Foto 8:** Previo a secado, se barre y lava la superficie para aplicar el sellante.
	
Foto 7: Lavado final para entrega de zonas intervenidas.	**Foto 8:** Lavado final para entrega de zonas intervenidas.
	
Foto 7: Lavado final para entrega de zonas intervenidas.	**Foto 8:** Instalación de nuevas canchas multifuncionales incllluye tableros.

	
Foto 9: Lijado, limpieza y pintura de parque infantil.	**Foto 10:** Aplicación de esmalte parque infantil.
	
Foto 11: Antes de la intervención.	**Foto 12:** Lijado, limpieza y pintura de parque infantil. Retiro deslizadero e instalación de uno nuevo.
	
Foto 13: Lijado, limpieza y pintura de parque infantil.	**Foto 14:** Suministro e instalacion de cadenas galvanizadas para columpios.

Cancha Barrio Santa Lucia	
	
Foto 1: Perforacion para instalacion de bocines de anclaje para tubos de voleibol.	**Foto 2:** Perforacion para instalacion de bocines de anclaje para tubos de voleibol.
	
Foto 3: Perforacion para instalacion de bocines de anclaje para tubos de voleibol.	**Foto 4:** Perforacion para instalacion de bocines de anclaje para tubos de voleibol.

Parque Infantil Barrio Santa Inés	
	
Foto 1: Desmonte de canchas para adecuaciones.	**Foto 2:** Perforacion para anclaje de canchas.

	
Foto 3: Instalación de canchas multifuncionales.	**Foto 4:** Instalación de canchas multifuncionales.
	
Foto 5: Instalación de canchas multifuncionales.	**Foto 6:** Lijado y aplicación de pintura en los elementos del parque infantil.
	
Foto 7: Lijado y aplicación de pintura en los elementos del parque infantil.	**Foto 8:** Lijado y aplicación de pintura en los elementos del parque infantil.

Cancha Barrio Soaquira	
Foto 1: Demarcación de cancha de voleibol con pintura tipo trafico.	**Foto 2:** Demarcación de cancha de voleibol con pintura tipo trafico.

Cancha Barrio Xativilla	
	
Foto 1: Lijado, limpieza de maquinas biosaludables.	**Foto 2:** Lijado, limpieza de maquinas biosaludables.
	
Foto 3: Aplicación de esmalte a mquinas biosaludables.	**Foto 4:** Aplicación de esmalte a mquinas biosaludables.

2.2 PERSONAL Y EQUIPO DE OBRA

2.2.1 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA

En el presente proyecto se encuentra disponible el siguiente personal profesional:

- Nombre: Lina Mercedes Sánchez Castillo
- Profesional: Ingeniero director De Obra

- Nombre: Edwin Hernando García Ramírez
- Profesional: Ingeniero Residente De Obra

- Nombre: Darley Mauricio Forero
- Profesional: Ingeniero Estructural / Ingeniero De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SST)

- Nombre: Jorge Eduardo García Ruiz
- Profesional: Maestro general

2.2.2 PERSONAL DE OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD
Mano de obra calificada	1
Mano de obra no calificada	3

1.5.3 EQUIPO DE OBRA

Equipo	Cantidad	Observación
Herramienta menor	1	N/A
Camioneta platón 4x4	1	≥ 2010
Mezcladora de concreto	2	≥ 2010
Planta eléctrica	2	≥ 8000W
Cortadora de pavimento	1	≥ 2010
Vibro compactador tipo saltarín y/o rana	2	≥ 2010
Martillo demoledor	1	≥ 62 Joules
Vibro compactador rana	1	N/A
Cortadora de pavimento	1	N/A
Vibrador de concreto 5 hp	1	N/A
Pulidora industrial 2400w	1	N/A
Pulidora 900w	1	N/A

2.1 SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA

Se ejecutó la señalización de los frentes de obra, implementando dispositivos y elementos de control conforme a la normativa vigente en seguridad industrial y salud en el trabajo. Esta actividad tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento de las medidas mínimas de prevención, delimitando las áreas de intervención y reduciendo al máximo la

probabilidad de incidentes o accidentes que pudieran afectar a terceros o al personal vinculado a la obra.

Señalización frentes de obra	
	
Foto 1: Señalizacion cancha barrio las Quintas.	**Foto 2:** Señalizacion cancha barrio las Quintas.

Se realiza la señalización correspondiente en los frentes de obra; sin embargo, algunos usuarios del sector hacen caso omiso a las indicaciones establecidas.

3 CONCLUSIONES

Los trabajos ejecutados en los diferentes escenarios deportivos y recreativos presentan un avance conforme a la programación establecida, evidenciando cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los estándares de calidad definidos en el proyecto.

Durante el desarrollo de las actividades no se registraron reclamos ni observaciones por parte de la comunidad, lo cual refleja una adecuada gestión del proyecto y una aceptación favorable de las intervenciones realizadas.

Las obras ejecutadas contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa, garantizando espacios seguros, funcionales y apropiados para el uso colectivo.

Cordialmente,

Fanor David Sarmiento Martínez
Profesional de Apoyo
Oficina de Infraestructura Deportiva.
