Málaga, 28 de marzo de 2026

Señores
UT-INTER HOSPITAL
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
Málaga-Santander

Referencia: Contrato de obra
Contrato de obra 087 de 2023 cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER".

Asunto: Radicación de Acta de cobro parcial No. 9 de obra

Cordial saludo,

Mediante la presente se adjunta el acta de cobro No. 9 de obra, se anexan los siguientes documentos.

- Acta parcial No. 9.
- Certificación bancaria.
- Sabana de acta parcial de cobro No. 9.
- Informe de mensual y de cobro parcial No. 9
- Certificado de parafiscales con documentación de la contadora del consorcio.
- Planillas de seguridad social de los meses relacionados en el acta parcial de cobro No.9.

Agradezco la atención prestada, y quedo atento a cualquier solicitud derivada del presente comunicado.

Cordialmente,

CARLOS GUTIERREZ
RL Consorcio de García Rovira

RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
23 ABR 2026
VENTANILLA ÚNICA
11:40am

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL No 9

CONTRATO DE OBRA	087-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($64.028.082.699,20)
ANTICIPO 40%	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA ($25.611.233.079,68)
VALOR ADICIONAL	SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($ 665.389.158,15)
CONTRATANTE:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA** N.I.T 900.067.169-9 **R.L. CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA** C.C. 7.169.545
CONTRATISTA	**CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** Nit: 901740580-3 R.L. CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO C.C. 91.273.201
INTERVENTORÍA	**UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL** Nit: 901746842-5 R.L. CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES C.C 91.159.501
SUPERVISOR	ZAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	*JOSÉ ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA*
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ROGER RODRÍGUEZ MORENO
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** como contratista y avalada por **UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL** como interventoría, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
3,0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**		
3,02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	84,40
3,03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	836,03
3-NP75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES	M3	1,58
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	25,64
4,0	**ESTRUCTURA METALICA**		
4-NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	1664,17
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	11951,45
4-NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE RIOSTRAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	4241,13
4-NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	31209,83
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	604,45
5,0	**CUBIERTA**		
5,01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS	M2	877,50
7,0	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
7-NP81	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DRENAJE DE 60X60 CM DE TUBERIA PERFORADA DE 6 PULG. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA FILTRANTE DE 1" A 3"	ML	30,77
9,0	**RED CONTRA INCENDIO**		
9,46	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETRO HASTA 2"	ML	69,40
9,47	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETROS DE 2-1/2" A 6"	ML	26,25
10,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**		
10,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO ESTANDAR 10kVA PARA QUIROFANO.	UND	2,00
12	**CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - DIVISIONES Y MUEBLES)**		
NP147	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA HOJA (APERTURA UNIDIRECCION) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	28,64
NP148	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON DOBLE HOJA (APERTURA VAIVEN) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	9,60
28,0	**ASCENSORES**		
NPS 8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450KG, 2 PARADAS Y CAPACIDAD DE 6 PASAJEROS	UND	2,00

PERIODO DE EJECUCIÓN:
Las actividades reportadas por parte del contratista de obra y avaladas por interventoría correspondientes con el acta *parcial No 9 se desarrollaron durante el periodo de* ***26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2026***

AVANCE DE OBRA:

Durante el periodo de ejecución se realizaron los reportes de información de avance y cargue de la información a la plataforma PISIS - SISPRO según lo siguiente:

- **Del 26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2025**


  Avance programado: 69,00%
  Avance ejecutado: 59,42%

  En el módulo A se continuaron actividades de instalación de estructura metálica por medio de la fabricación e instalación de elementos como columnas compuestas y vigas, así mismo se adelantaron actividades de construcción de mamposterías, elementos de confinamiento, disposición de pases y regatas para la instalación *de redes hidrosanitarias.*

  En el módulo D
  - Se realiza adecuación de espacio de piso 1 del módulo, con la finalidad de habilitar el espacio para el traslado temporal de servicios por contingencia, una vez que se requieren zonas existentes para la construcción del punto fijo del modulo A
  - Se continúan realizado actividades correspondientes con la construcción de elementos de estructura metálica para punto fijo del módulo, paralelamente se desarrollaron actividades de acabados arquitectónicos en el interior del módulo.


REGISTRO FOTOGRAFICO


ELEMENTOS EN CONCRETO

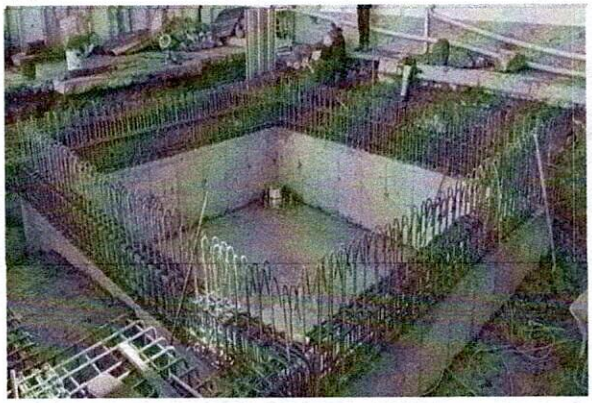



ESTRUCTURA METÁLICA

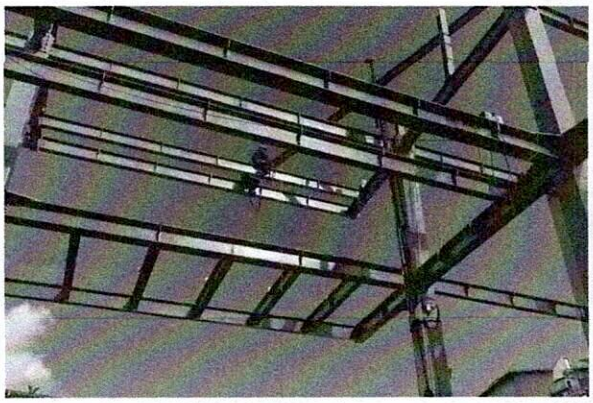

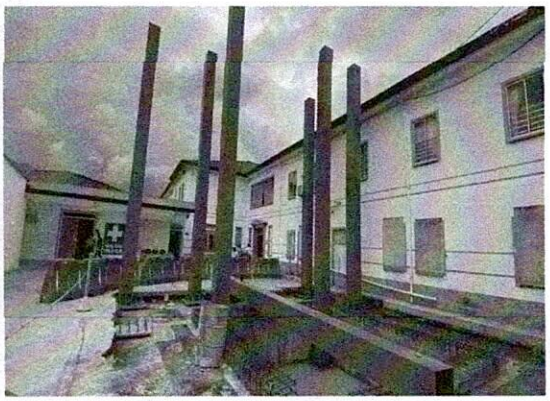



CUBIERTA







INSTALACIONES SANITARIAS


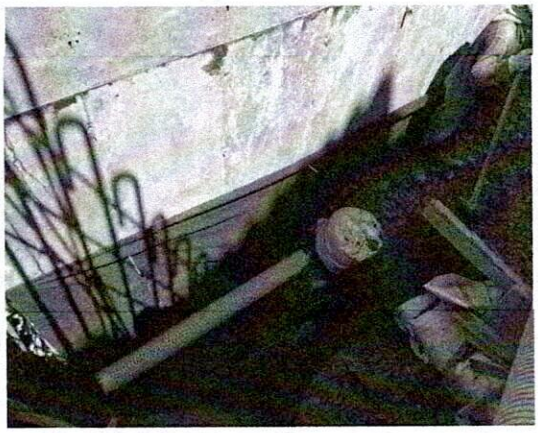


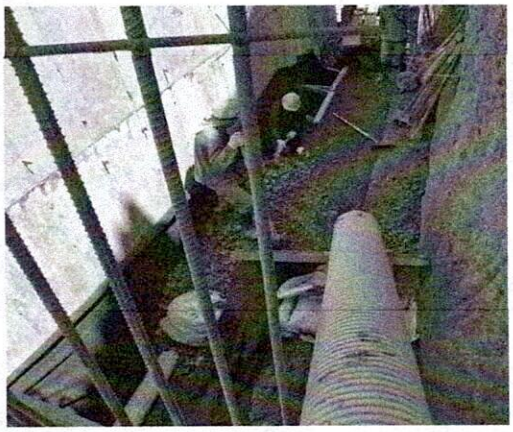


RED CONTRA INCENDIO

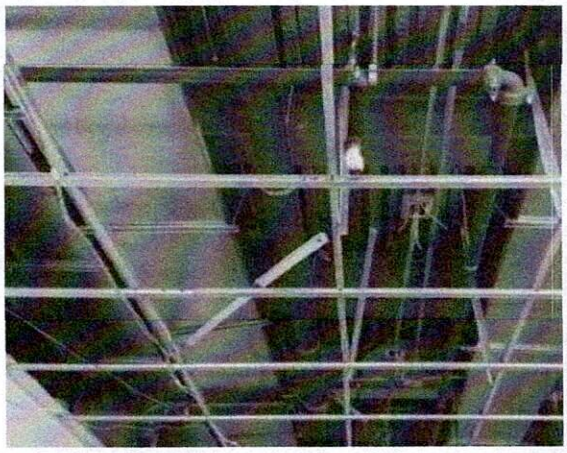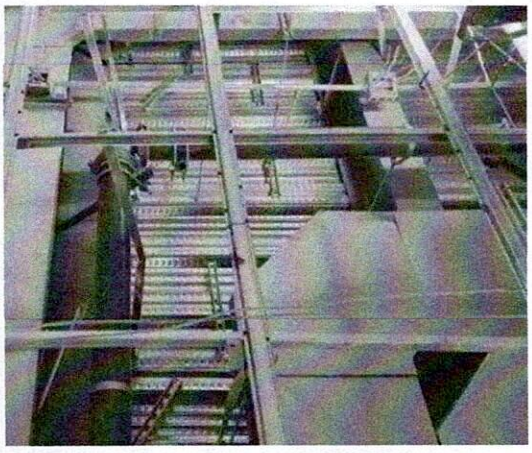
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

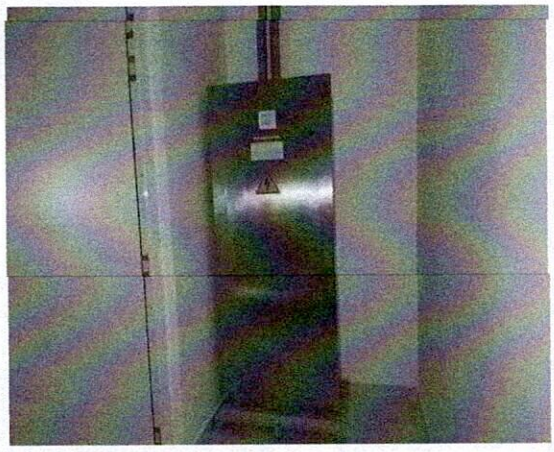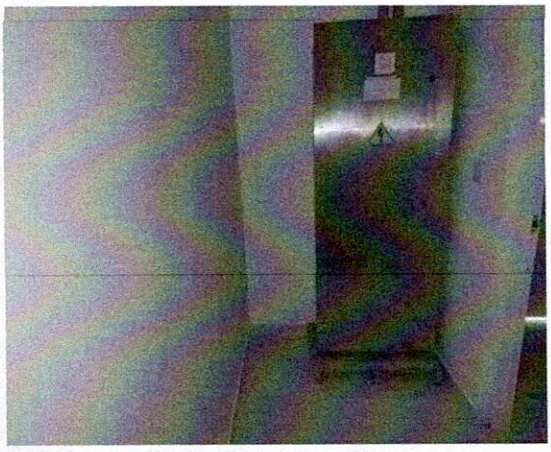



CARPINTERÍA

SUMINISTROS

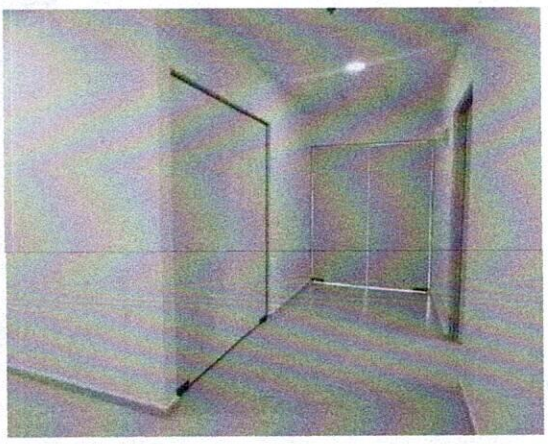

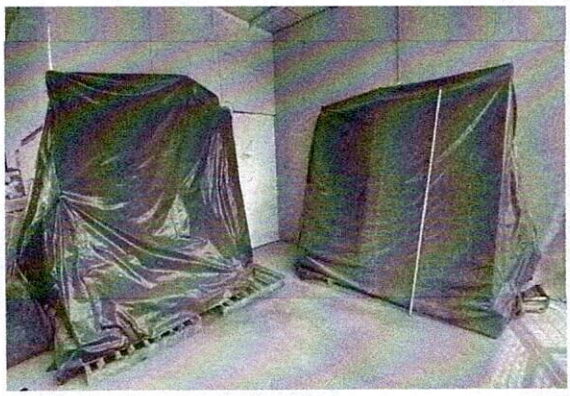

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO	
Anticipo 40%:	$ 25.611.233.080,00
Acta parcial 1:	$ 10.681.193.566,88
Acta parcial 2:	$ 3.054.273.511,53
Acta parcial 3:	$ 4.448.460.052,02
Acta parcial 4:	$ 1.403.466.358,77
Acta parcial 5:	$ 3.180.168.623,59
Acta parcial 6:	$ 4.305.543.655,45
Acta parcial 7:	$ 3.754.076.678,63
Acta parcial 8:	$ 1.741.557.083,91
Acta parcial 9:	$ 3.483.607.422,08
Total amortizado	$ 14.420.938.781,14
Total pagado:	$ 36.052.346.952,86
Saldo restante:	$ 28.641.124.904,49

Avance financiero	55,73%
Avance Físico	59,42%

Una vez revisadas las cantidades de obra ejecutadas en el marco del desarrollo del contrato No 087-23 cuyo objeto es "ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER". en conjunto con el contratista **CONSORCIO DE GARCÍA ROVIRA** y la *interventoría al contrato* ***UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL*** *se considera conveniente realizar el pago* correspondiente al acta parcial No 9 de la siguiente forma:

Periodo de ejecución: del 26/02/2025 al 25/03/2026
Valor acta parcial No 9: $ 3.483.607.422,08
Amortización anticipo 40%: $ 1.393.442.968,83
Valor a pagar en la presenta acta: $ 2.090.164.453,25

Se expide en Málaga, al día dieciocho (18) del mes de abril del 2026.

Ing. JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
Apoyo a la Supervisión E.S.E HRGR

ROGER RODRIGUEZ M

Ing. ROGER RODRÍGUEZ MORENO
Apoyo a la Supervisión E.S.E HRGR

ACTA PARCIAL No. 9

ACTA PARCIAL DE OBRA N°9

CONTRATO No.:	087 DE 2023
OBJETO:	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER
VALOR INICIAL:	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($64.028.082.699,20)
VALOR ADICIONAL:	SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($ 665.389.158,15)
PLAZO INICIAL:	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** Nit: 901740580-3 R.L. CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO C.C. 91.273.201
SUPERVISOR:	ZAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ
APOYO A LA SUPERVISION:	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
APOYO A LA SUPERVISION:	ROGER RODRÍGUEZ MORENO
INTERVENTOR CONTRATO:	**UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL** Nit: 901746842-5 R.L. CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES C.C 91.159.501
ANTICIPO (40%)	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA ($25.611.233.079,68)
FECHA DE INICIACION:	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ACTA DE SUSPENSION	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACION:	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO:	MALAGA, SANTANDER

En Málaga Santander, a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2026, se reunieron, **ZAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ,** en calidad de Supervisor y el señor **CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO** Representante Legal de **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA**, como Contratista, el señor **CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES**,

Representante Legal de **UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL**, como Interventor, el Ingeniero **JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA** como Apoyo a la supervisión, el ingeniero **ROGER RODRÍGUEZ MORENO** como a poyo a la supervisión, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial No. 9 correspondiente al periodo **(26 de febrero del 2025) al (25 de marzo del 2026)** del presente Contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo Nº 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 09	$ 3.483.607.422,08
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO 40%	$ 1.393.442.968,83
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 2.090.164.453,25**
SON: DOS MIL NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($2.090.164.453,25)	

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO
CONTRATISTA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
INTERVENTOR

ZAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ
SUPERVISOR

JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ROGER RODRIGUEZ M
ROGER RODRÍGUEZ MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectó:	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA Apoyo a la Supervisión	
Proyectó:	ROGER RODRÍGUEZ MORENO Apoyo a la Supervisión	ROGER RODRIGUEZ M
Revisó:	KAREN ANDREA MÉNDEZ ESPINOSA Asesora jurídica E.S.E HRGR	

FACTURA

Consorcio De Garcia Rovira
NIT: 901740580 - 3

Factura Electrónica de Venta

CGR 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102537269 que habilita desde CGR 10 hasta CGR 500. Vence 03/12/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bucaramanga Calle 17 # 30-22 san Alonso
Teléfono 3148794700
Correo Electrónico consorciodegarciarovira@gmail.com

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA | **NIT:** 900067169 - 9

Dirección: CARRERA 7 15 80B

Ciudad: Málaga | **Teléfono:** 6076607475

Fecha: 23/04/2026 | **Vencimiento:** 23/04/2026 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: Consorcio De Garcia Rovira

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	41309501	Servicio de obra	und	1,00	2.045.338.831,17	0,00	0	0,00	2.045.338.831,17
2	41309502	Administración	und	1,00	593.148.261,04	0,00	0	0,00	593.148.261,04
3	41309503	Imprevistos	und	1,00	20.453.388,31	0,00	0	0,00	20.453.388,31
4	41309504	Utilidad	und	1,00	102.266.941,56	0,00	0	0,00	102.266.941,56
5	413025	Venta de servicios para el alquiler de equipos con operarios	und	1,00	560.000.000,00	0,00	0	0,00	560.000.000,00
6	41309502	Administración	und	1,00	162.400.000,00	0,00	0	0,00	162.400.000,00

Valor en Letras

TRÉS MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRÉS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	6
SUBTOTAL	**$ 3.483.607.422,08**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 3.483.607.422,08
RETEFUENTE	$ 80.872.148,44
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 3.402.735.273,64**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-17 15:54:49

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 2be20fd8bb6eeffd632b7318f5be36c368be90cd29e71677bcc124e783fbaaf0d71e50e0d54a7ecc63dc05aac0b82165

CERTIFICACIÓN BANCARIA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 30/07/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** con NIT **901.740.580-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 046669997234

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SABANA DE COBRO
No. 9

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

	PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4	ACTA DE COBRO 9		CANT TOTALES EJECUTADAS		CANT A FAVOR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 7,720,722,476.73**		**$ 59,905,682.24**		**$ 5,865,475,910.34**		**$ 1,855,246,566.39**
3.02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	$ 13,486.01	199229.86	$ 2,686,815,884.26	84.40	$ 1,138,219.24	199229.28	$ 2,686,808,127.05	0.58	$ 7,757.20
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	$ 19,505.00	5444.61	$ 106,197,118.05	836.03	$ 16,306,765.15	4309.96	$ 84,065,769.80	1134.65	$ 22,131,348.25
	ITEMS NO PREVISTOS										
3-NP75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES	M3	$ 1,304,797.65	111.63	$ 145,654,561.67	1.58	$ 2,061,580.29	95.44	$ 124,529,887.72	16.19	$ 21,124,673.95
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	$ 1,575,628.61	142.18	$ 224,022,875.77	25.64	$ 40,399,117.56	96.61	$ 152,221,480.01	45.57	$ 71,801,395.76
4.0	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 11,410,924,220.28**		**$ 1,197,903,230.45**		**$ 11,350,029,504.16**		**$ 60,894,716.13**
	ITEMS NO PREVISTOS										
4-NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	133654.73	$ 2,873,576,674.62	1664.17	$ 35,779,655.00	133488.51	$ 2,870,002,990.68	166.22	$ 3,573,683.94
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	259201.99	$ 5,572,842,721.36	11951.45	$ 256,956,077.11	259177.19	$ 5,572,309,487.11	24.80	$ 533,234.25
4-NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE RIOSTRAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	12767.86	$ 274,508,990.00	4241.13	$ 91,184,220.94	12757.07	$ 274,277,005.00	10.79	$ 231,985.00
4-NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	74846.63	$ 1,609,202,608.52	31209.83	$ 671,011,298.43	74838.02	$ 1,609,017,383.43	8.62	$ 185,225.08
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	$ 236,532.35	3169.96	$ 749,798,088.21	604.45	$ 142,971,978.96	3093.74	$ 731,769,592.49	76.22	$ 18,028,495.72
5.0	**CUBIERTA**				**$ 2,135,479,488.47**		**$ 658,125,000.00**		**$ 1,549,671,225.40**		**$ 585,808,263.07**
5.01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS	M2	$ 750,000.00	2415.10	$ 1,811,325,000.00	877.50	$ 658,125,000.00	1848.95	$ 1,386,712,500.00	566.15	$ 424,612,500.00
7.0	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 496,831,249.09**		**$ 5,994,072.31**		**$ 101,555,970.12**		**$ 395,275,278.97**
	ITEMS NO PREVISTOS										
7-NP81	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DRENAJE DE 60X60 CM DE TUBERIA PERFORADA DE 6 PULG. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA FILTRANTE DE 1" A 3"	ML	$ 194,802.48	160.00	$ 31,168,396.80	30.77	$ 5,994,072.31	115.24	$ 22,449,037.80	44.76	$ 8,719,359.00
9.0	**RED CONTRA INCENDIO**				**$ 639,687,122.40**		**$ 1,630,376.51**		**$ 104,603,309.15**		**$ 535,083,813.25**
	PINTURA PARA TUBERIAS										
9.46	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETRO HASTA 2"	ML	$ 15,110.31	188.87	$ 2,853,884.25	69.40	$ 1,048,655.51	188.67	$ 2,850,862.19	0.20	$ 3,022.06
9.47	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETROS DE 2-1/2" A 6"	ML	$ 22,160.80	439.21	$ 9,733,244.97	26.25	$ 581,721.00	46.25	$ 1,024,937.00	392.96	$ 8,708,307.97
10.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**				**$ 5,493,210,590.57**		**$ 87,087,172.20**		**$ 933,868,132.55**		**$ 4,559,342,458.03**
10.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO ESTANDAR 10kVA PARA QUIROFANO.	UND	$ 43,543,586.10	6.00	$ 261,261,516.60	2.00	$ 87,087,172.20	2.00	$ 87,087,172.20	4.00	$ 174,174,344.40
12	**CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - DIVISIONES Y MUEBLES)**				**$ 1,788,665,703.27**		**$ 34,693,297.46**		**$ 204,418,925.64**		**$ 1,584,246,777.63**
NP147	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA HOJA (APERTURA UNIDIRECCION) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	$ 988,877.70	153.68	$ 169,559,089.06	28.64	$ 14,106,127.70	152.84	$ 151,140,067.67	0.84	$ 18,419,021.39
NP148	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON DOBLE HOJA (APERTURA VAIVEN) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	$ 2,144,496.85	27.00	$ 57,901,414.95	9.60	$ 20,587,169.76	9.60	$ 20,587,169.76	17.40	$ 37,314,245.19
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 40,717,077,922.11**		**$ 2,045,338,831.17**		**$ 24,348,702,432.00**		**$ 16,368,375,490.15**
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 11,807,952,597.41		$ 593,148,261.04		$ 7,061,123,705.28		$ 4,746,828,892.14
	IMPREVISTOS		1%		$ 407,170,779.22		$ 20,453,388.31		$ 243,487,024.32		$ 163,683,754.90
	UTILIDAD		5%		$ 2,035,853,896.11		$ 102,266,941.56		$ 1,217,435,121.60		$ 818,418,774.51
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 14,250,977,272.74		$ 715,868,590.91		$ 8,522,045,851.20		$ 5,728,931,421.55
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 54,968,055,194.86**		**$ 2,761,207,422.08**		**$ 32,870,748,283.20**		**$ 22,097,306,911.70**
28.0	**ASCENSORES**				**$ 2,140,000,000.00**		**$ 560,000,000.00**		**$ 560,000,000.00**		**$ 1,580,000,000.00**

	ITEMS NO PREVISTOS			0.00								
NPS 8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450KG, 2 PARADAS Y CAPACIDAD DE 6 PASAJEROS	UND	$ 280,000,000.00	2.00	$ 560,000,000.00	2.00	$ 560,000,000.00	2.00	$ 560,000,000.00	0.00	$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				**$ 6,608,850,125.95**		**$ 560,000,000.00**		**$ 1,539,670,705.64**		**$ 5,069,179,420.31**
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29		$ 1,916,566,536.53		$ 162,400,000.00		$ 446,504,504.64		$ 1,470,062,031.89
	VALOR TOTAL EQUIPOS				**$ 8,525,416,662.48**		**$ 722,400,000.00**		**$ 1,986,175,210.28**		**$ 6,539,241,452.20**
	DIFERENCIA POR AJUSTE				**$ 0.01**						
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				**$ 63,493,471,857.35**		**$ 3,483,607,422.08**		**$ 34,856,923,493.48**		**$ 28,636,548,363.90**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				**$ 1,200,000,000.00**				**$ 1,200,000,000.00**		
	ADICIONAL No 01										
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				**$ 64,693,471,857.35**		**$ 3,483,607,422.08**		**$ 36,056,923,493.48**		**$ 28,636,548,363.90**
	% EJECUTADO CORTE No 8						5.38%				
	% EJECUTADO ACUMULADO						55.74%		55.74%		

ALFONSO CARREÑO SANABRIA
~~DIRECTOR DE OBRA~~
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


JOSE ALEJANDRO SANDOVAL
APOYO A LA SUPERVISION
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA

SAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ
SUPERVISOR
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA

ROGER RODRIGUEZ M
ROGER RODRIGUEZ MORENO
APOYO A LA SUPERVISION
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA

INFORME MENSUAL Y DE COBRO PARCIAL No. 9

"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"

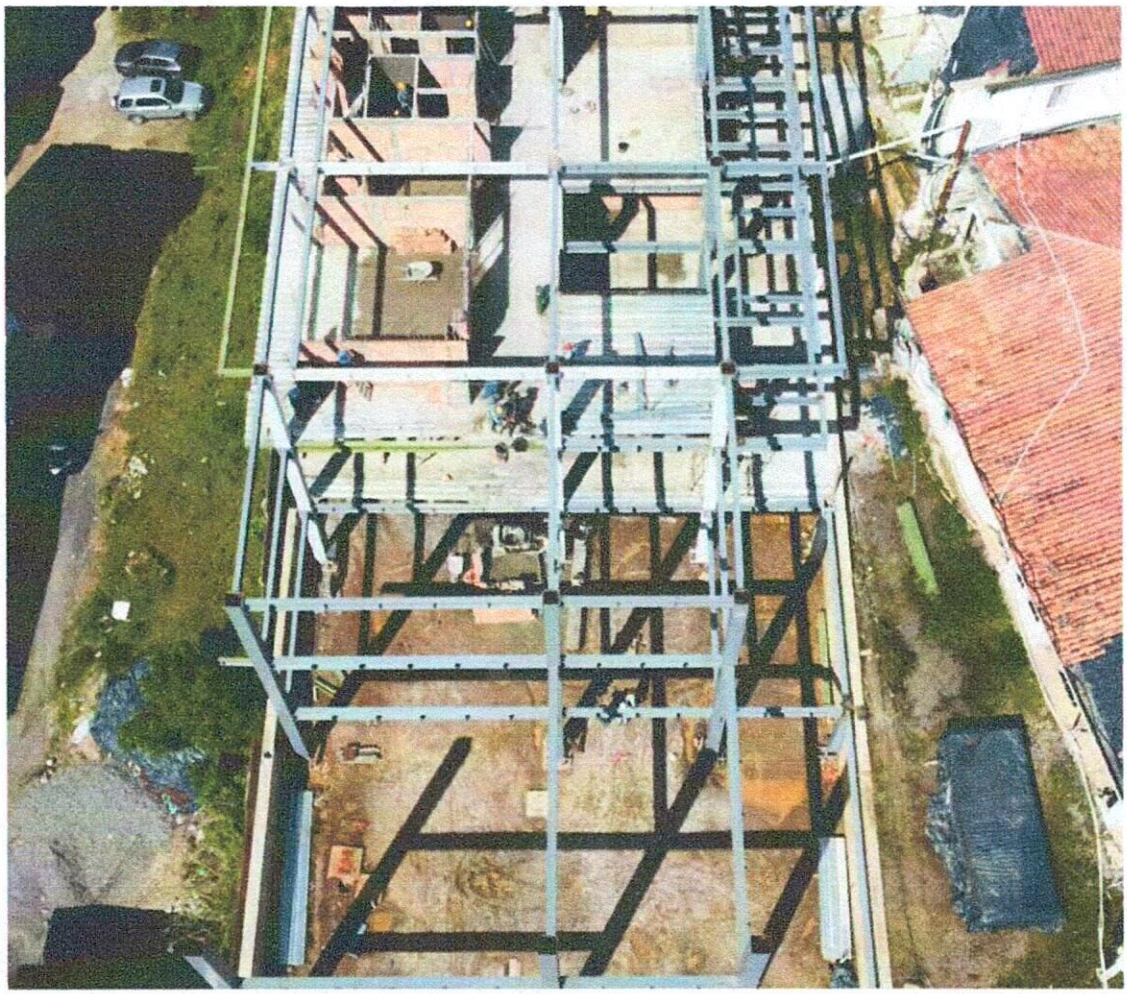

INFORME DE COBRO PARCIAL No 9

CONTRATO DE OBRA No. 087

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

26 de febrero de 2025 – 25 de marzo de 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

TIPO DE CONTRATO: 3

INTRODUCCION 4

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 4

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 5

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 5

Construcción módulo A: 5

Construcción módulo D: 6

Adecuación área de UCI 6

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DEL PRESENTE PERIODO 7

Estructura metálica 7

Módulo D 12

Actividades en ejecución del proyecto 14

INSPECCIÓN DE CALIDAD DE TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALES 17

Acero estructural 19

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 22

TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS PERIODOS DEL PRESENTE INFORME 22

PRESUPUESTO DE OBRA 31

PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO DESDE EL 26/02/2026 HASTA 25/03/2026 31

ACTA PARCIAL No 9 34

Presupuesto de obra ejecutado corte no 9 34

GRAFICA PRESUPUESTO PROGRAMADO DE OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO DE OBRA 40

GRAFICA PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA VS PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRA 41

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 42

TIPO DE CONTRATO:

Contrato de obra incluida dotación de equipos No. 87

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			
NUMERO	**87**	**FECHA**	**09-08-2023**
TIPO	CONTRATO DE OBRA INCLUIDA DOTACIÓN DE EQUIPOS		
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTRAVOS ($64.028.082.699,20)		
ADICIONAL No 1	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($665.389.158,15)		
ENTIDAD CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA		
NIT	901.740.580-3		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO		
IDENTIFICACION	C.C. 91.273.201		
SUPERVISOR	SAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ		
APOYO A LA SUPERVISION	ROGER RODRIGUEZ MORENO		
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL		
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL		
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES		
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

INTRODUCCION

El presente informe tiene como propósito presentar el desarrollo y estado actual del proyecto de adecuación y ampliación de la infraestructura física de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira. El documento abarca los avances ejecutados, las actividades desarrolladas, los recursos utilizados, y las condiciones técnicas y administrativas que han influido en el progreso del proyecto durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2026 y el 25 de marzo de 2026.

Así mismo, el presente documento constituye el soporte técnico y administrativo del acta de cobro parcial No. 9, en la cual se consolidan las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo, conforme a las especificaciones técnicas del contrato, los diseños aprobados y los lineamientos de calidad establecidos. La información aquí contenida se encuentra respaldada mediante memorias de cálculo, registros fotográficos y controles de obra, permitiendo verificar el cumplimiento de las actividades ejecutadas para efectos de su reconocimiento y pago.

El proyecto de adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira representa un hito significativo en el ámbito de la construcción civil, no solo por su magnitud y complejidad técnica, sino también por su impacto directo en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de la provincia de García Rovira.

Concebido para responder a las crecientes necesidades de atención medica especializado, el proyecto busca optimizar la capacidad instalada del hospital, garantizando espacios adecuados para la prestación de servicios de salud en condiciones óptimas de calidad, seguridad y eficiencia.

La ejecución del proyecto ha implicado la superación de diversos desafíos técnicos, logísticos y ambientales, los cuales han sido abordados con profesionalismo y experiencia por parte del equipo de trabajo del Consorcio de García Rovira, asegurando el cumplimiento de los estándares constructivos y normativos vigentes.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

Se deberá identificar la ubicación exacta del proyecto y los límites geográficos que definirán los predios colindantes. Por el costado sur nos encontramos con la calle 16, por el costado norte colinda con la pista de aterrizaje y viviendas vecinas, por el costado oriente se colinda con la vía de la carrea 6 y por el costado occidental colinda con las viviendas vecinas de la carrera 8, esto con el fin de verificar los impactos directos o indirectos al realizar la ejecución y realizar los correctivos pertinentes para todos esos casos eventuales que se presenten.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Málaga, Santander, en la Calle 16 con Carrera 6. Donde se realizará la adecuación y ampliación de la estructura física del hospital regional.



Ilustración 1 Localización E.S.E. Hospital Regional de García Rovira

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto abarca la adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira" del municipio de Málaga, Santander, dividido en modulo A, módulo D, central de gases medicinales, central de residuos y subestación eléctrica con funciones específicas para optimizar la infraestructura hospitalaria.

Construcción módulo A:

Este módulo se encuentra ubicado en el sector occidental del predio y no cuenta con estructura existente inicial del hospital, este módulo contara con los siguientes servicios.

- Parqueaderos
- Cuarto de máquinas hidráulica y red contra incendios
- Morgue
- Cuarto de monitoreo y vigilancia

- Salas de cirugía
- Salas de partos

Construcción módulo D:

El módulo D se encuentra ubicado al este del ingreso actual del hospital existente, el módulo contará con 2 plantas que tendrá los respectivos servicios.

- área administrativa
- Servicio de terapia física, respiratoria y ocupacional

Adecuación área de UCI

El área UCI se encuentra en la zona occidental del hospital, en el cual se busca abordar de manera integrada las acciones de asistencia, cuidado y recuperación y para su implementación se deben considerar las necesidades actuales del hospital en términos de espacios y ambientes que cumplan con la normatividad vigente. Este módulo con su adecuación prestara los siguientes servicios:

- 12 habitaciones de cuidados intensivos
- 2 estaciones de enfermería
- 1 cuarto de descanso medico

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DEL PRESENTE PERIODO

Estructura metálica

Al cierre del mes de marzo se ejecutaron actividades correspondientes a la fabricación e instalación de elementos estructurales, incluyendo vigas, columnas y riostras, en los puntos fijos de los módulos D y A.

Durante este mismo periodo, en el nivel -0.10 del módulo A, se llevó a cabo la instalación de los elementos que se encuentran resaltados en color amarillo, conforme a los planos establecidos.

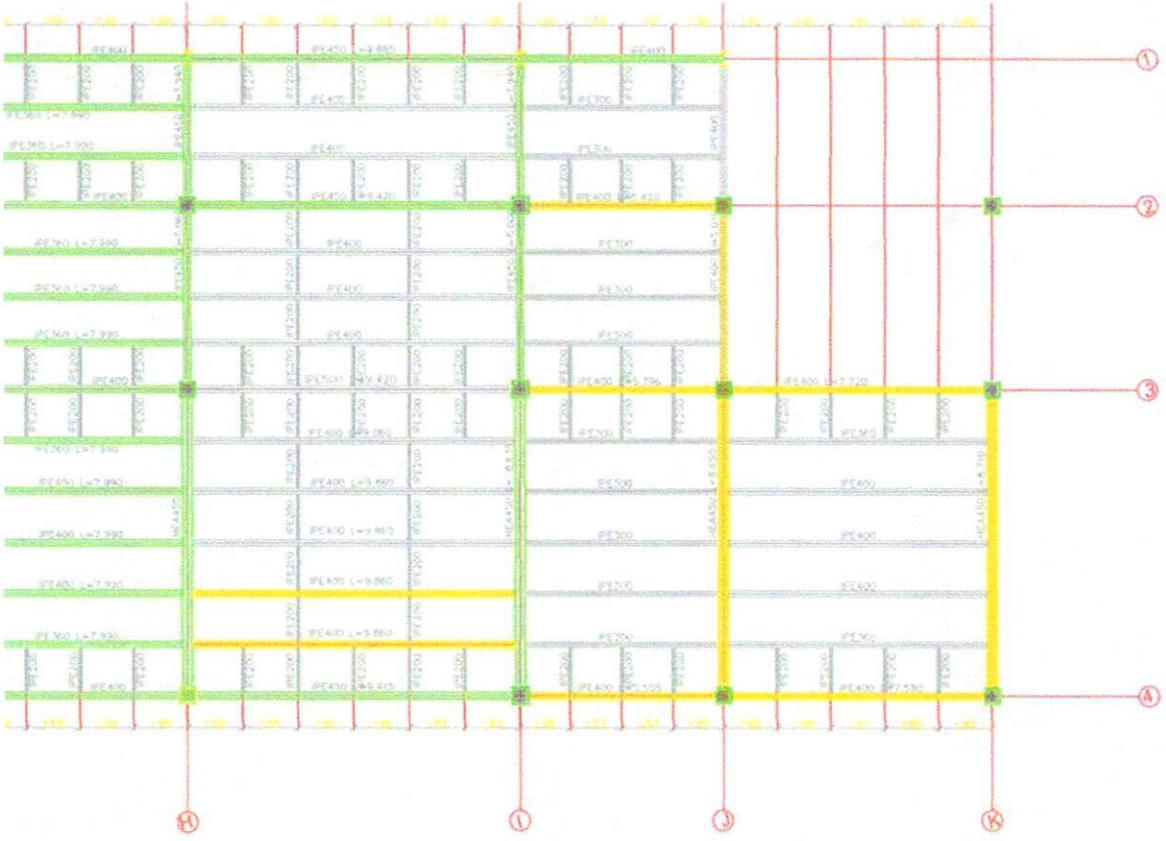


Ilustración 2 Elementos instalados en el módulo A nivel -0.10 m

En el nivel +4.30 del módulo A, se presentan los elementos instalados durante el periodo, los cuales se encuentran resaltados en color amarillo, de acuerdo con el avance registrado en obra.

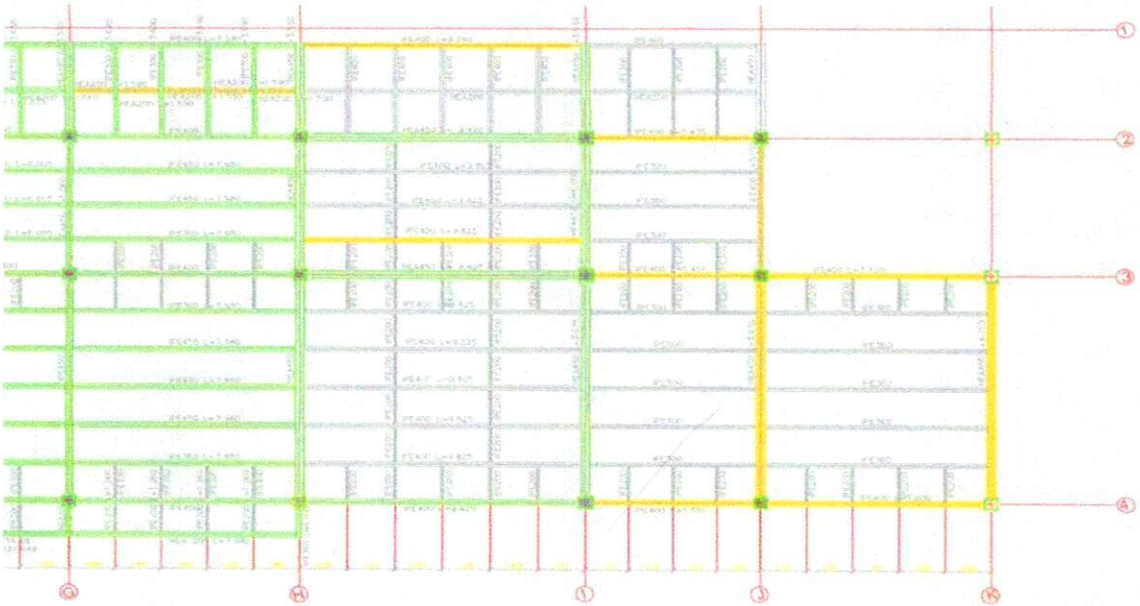


Ilustración 3 Instalación de elementos en el módulo A nivel +4.30

En el nivel +8.50 del módulo A, se presentan los elementos instalados durante el periodo, los cuales se encuentran resaltados en color amarillo, conforme al avance de obra registrado.

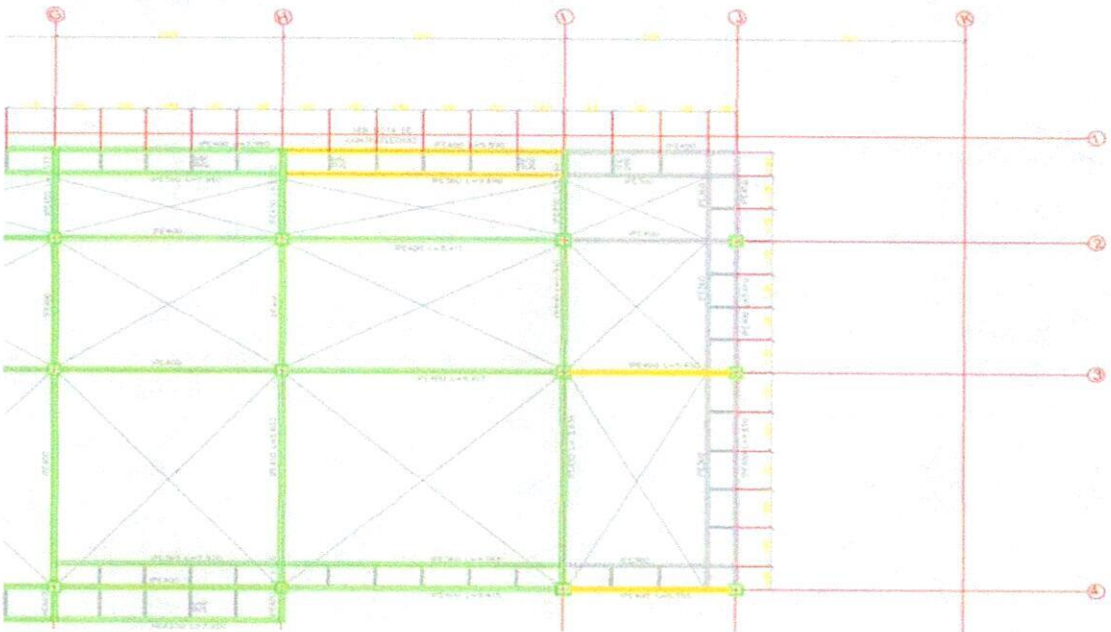


Ilustración 4 Instalación de elementos en el módulo A en el nivel +8.50

En el punto fijo del módulo D se realizó la instalación de trece (13) columnas, las cuales se indican en la siguiente imagen y se encuentran señaladas en color rojo, de acuerdo con el avance ejecutado en obra.

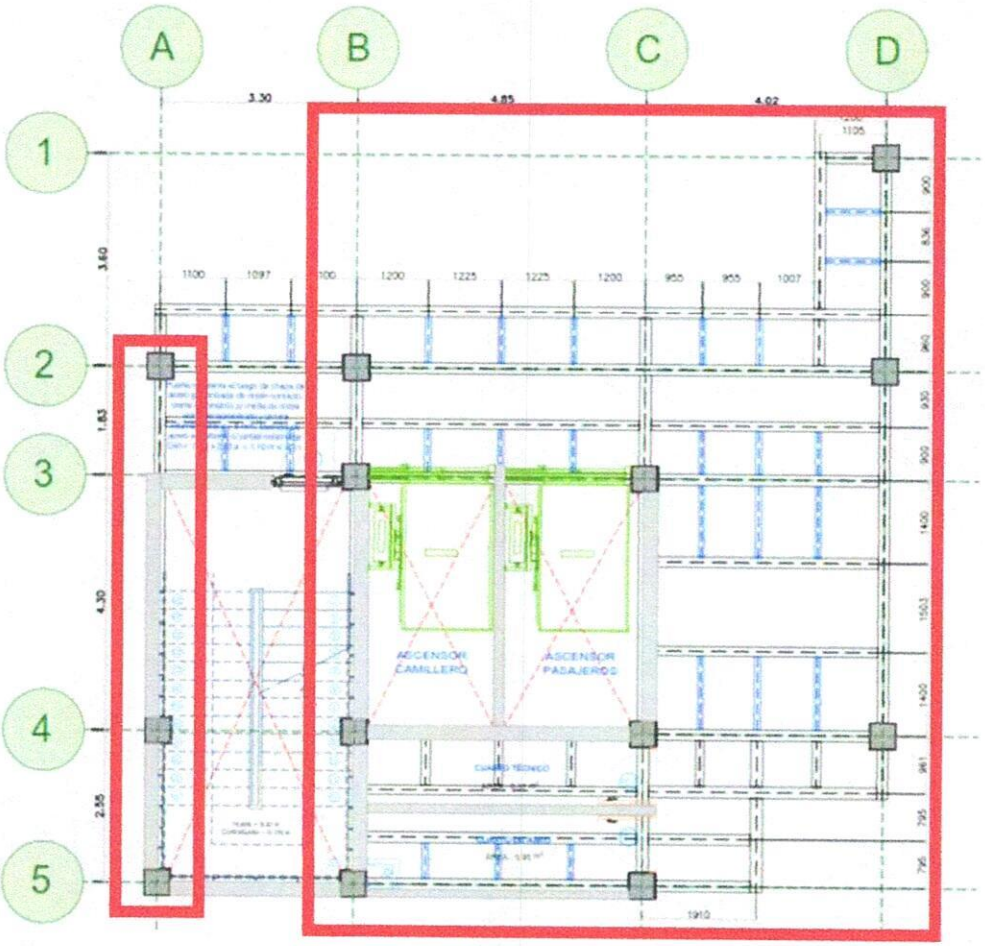


Ilustración 5 Columnas instaladas punto fijo módulo D

Una vez verificados los plomos de las columnas en conjunto con la interventoría, y realizada la instalación de los pasantes internos para las conexiones de vigas, se procedió con la fundida de concreto de 4.000 psi para las columnas correspondientes a los ejes H2, H3, H4, I2, I3, I4, J2, J3, J4, K3 y K4.

La fundida se ejecutó en dos etapas: una primera hasta una altura de 5,00 ml y una segunda correspondiente al tramo restante, alcanzando la altura total de 13,08 ml de cada columna.

Durante el presente periodo, y en cumplimiento del plan de acción establecido, se vinculó un nuevo grupo subcontratista, lo que permitió incrementar el personal

destinado a las actividades de fabricación en 11 personas. Como resultado, se inició la preparación de los elementos estructurales correspondientes al punto fijo del módulo A.



Ilustración 6 Corte de lámina de 1/2" para columnas del punto fijo modulo A

Adicionalmente, se implementó la instalación de una planta eléctrica adicional de 100 kVA, con el fin de garantizar la disponibilidad del suministro eléctrico para el nuevo personal y evitar inconvenientes en la operación de los equipos durante el proceso de fabricación.

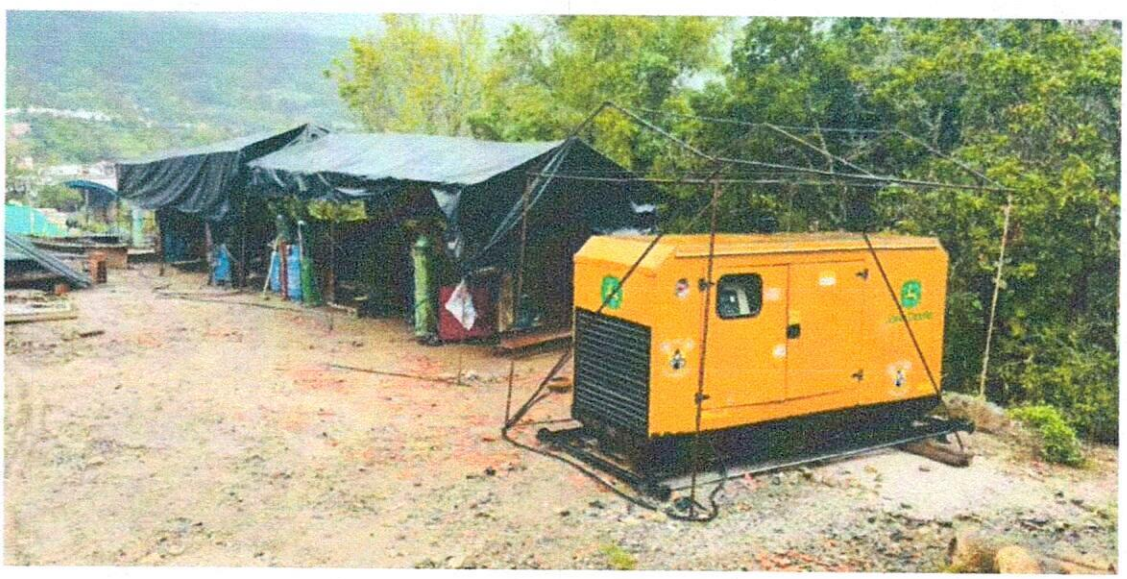


Ilustración 7 Nueva planta eléctrica de 100 Kva para trabajo de estructura metálica

Durante el periodo se incrementaron dos (2) cuadrillas de fabricación con el objetivo de mantener un proceso continuo y mejorar el rendimiento en la producción de los elementos estructurales. No obstante, debido a las lluvias presentadas en el municipio las cuales se encuentran relacionadas en el cuadro de condiciones climáticas, fue necesario adquirir e instalar carpas para dar continuidad a las labores de fabricación. Sin embargo, durante las actividades de montaje, las condiciones climáticas generaron retrasos, obligando en algunos casos a suspender temporalmente los trabajos hasta que cesen las precipitaciones, con el fin de garantizar la seguridad y la calidad en la ejecución.

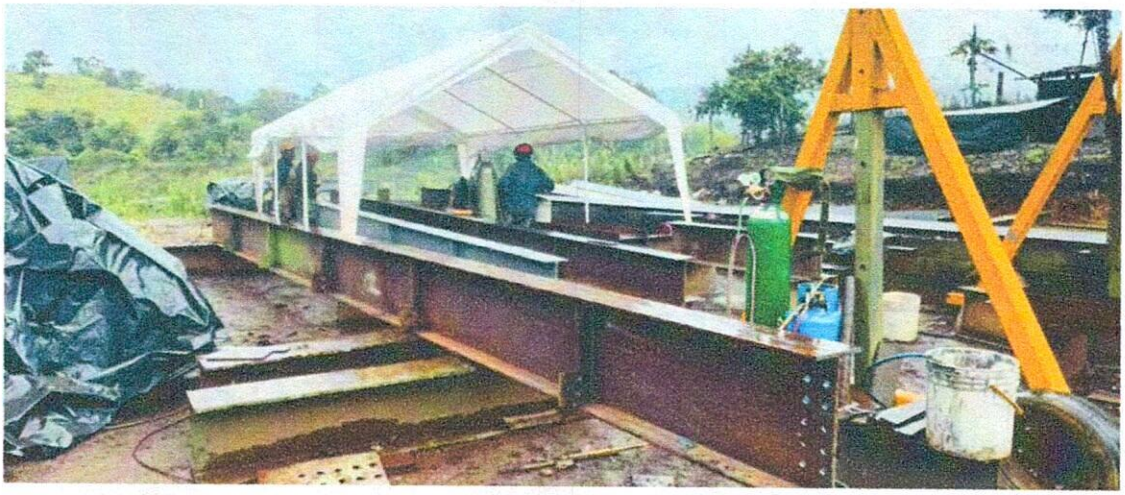


Ilustración 8 Fabricación de elementos estructurales

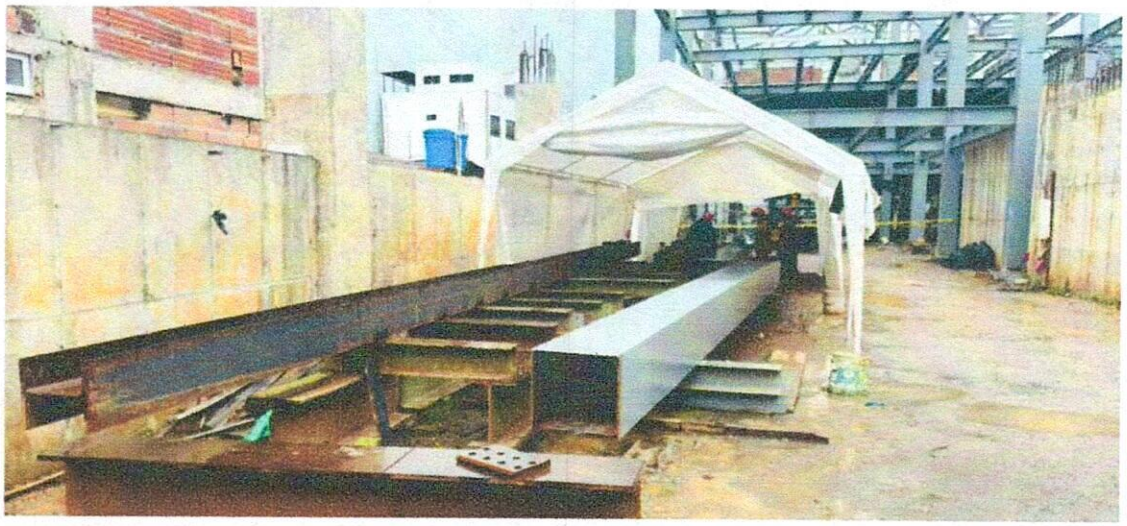


Ilustración 9 Fabricación de columnas para el punto fijo del módulo D



Ilustración 10 Instalación de cercha tipo para cubierta del módulo A

Módulo D

Durante el mes de marzo, y en cumplimiento del compromiso adquirido por el consorcio en el comité realizado el 26 de febrero de 2026, en el cual se estableció la entrega del primer piso del módulo D, se ejecutaron actividades correspondientes a la instalación de puertas, así como a los remates de pintura del módulo, con el fin de llevar a cabo la entrega del primer piso del módulo D. Adicionalmente, en atención a la solicitud de la E.S.E., se construyó una rampa de acceso en la entrada del cuarto de residuos transitorios para el ingreso del personal administrativo y se instalaron dos (2) puntos de datos en el área de terapia pediátrica.

Así mismo, se realizó la verificación de las redes hidráulicas y sanitarias, de los aparatos sanitarios, así como de los sistemas eléctricos y de comunicaciones, con el fin de comprobar su correcto funcionamiento.

En compañía de la interventoría y la E.S.E., se realizó un recorrido de verificación en el primer piso del módulo D, inspeccionando redes, acabados, puertas, llaves, luminarias, tomacorrientes y demás elementos, con el fin de proceder con su entrega. Como soporte de esta actividad, se entregará como documento anexo el inventario correspondiente.

Lo anterior se realiza en concordancia con lo dialogado en el comité del 24 de febrero de 2026, donde se estableció que la entrega de este espacio tiene como

propósito dar continuidad a las adecuaciones y al traslado de las áreas de consulta externa y urgencias, permitiendo la liberación parcial de las áreas de cirugía y urgencias para su intervención y, de esta manera, habilitar el inicio de las actividades preliminares del punto fijo del módulo A.

En este sentido, es de vital importancia la entrega y ocupación oportuna de los espacios por parte del hospital, ya que esto permite dar cumplimiento a la programación establecida en el plan de acción. Actualmente, se está a la espera de que el hospital realice el traslado y la ocupación del módulo D, con el fin de que se defina una fecha oficial que permita iniciar dichas actividades.



Ilustración 11 Verificación de puertas y ventanas primer piso del módulo

Durante el presente mes, en compañía de la E.S.E., se ejecutó la contingencia eléctrica correspondiente a la reubicación del tablero de distribución general del hospital hacia un sector proyectado como zona verde, con el fin de evitar interferencias en el área a intervenir para la construcción del punto fijo del módulo D. Esta actividad se llevó a cabo el sábado 14 de marzo, en sincronización con los jefes de las diferentes áreas del hospital, de acuerdo con el plan previamente enviado y aprobado por la E.S.E. para la suspensión programada del servicio de energía en cada una de las áreas establecidas.



Ilustración 12 Nueva ubicación de tablero eléctrico de distribución general de la E.S.E. Hospital

Actividades en ejecución del proyecto

Durante el presente mes se dio continuidad a las actividades de ajuste de las puertas en el segundo piso del módulo D, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, alineación y acabado final. Así mismo, se ejecutaron actividades de retoque de pintura en filos y muros, orientadas a corregir detalles de acabado



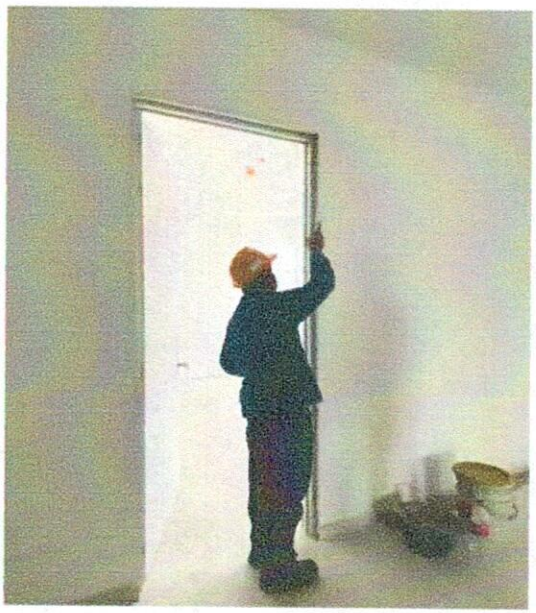


Ilustración 13 Instalación de puertas y remate de vanos

Construcción de rampa de acceso para personal administrativo por el cuarto de residuos transitorios.



Ilustración 14 Rampa de acceso módulo D

Instalación de redes de comunicaciones y prueba de internet en el segundo piso del módulo D.



Ilustración 15 Verificación de redes de comunicaciones segundo piso módulo D

Instalación de cerámica color negro en pared tipo exterior alrededor del módulo D



Ilustración 16 Instalación de cerámica para pared tipo exterior

Instalación de mesones en las áreas requeridas del primer piso del módulo D

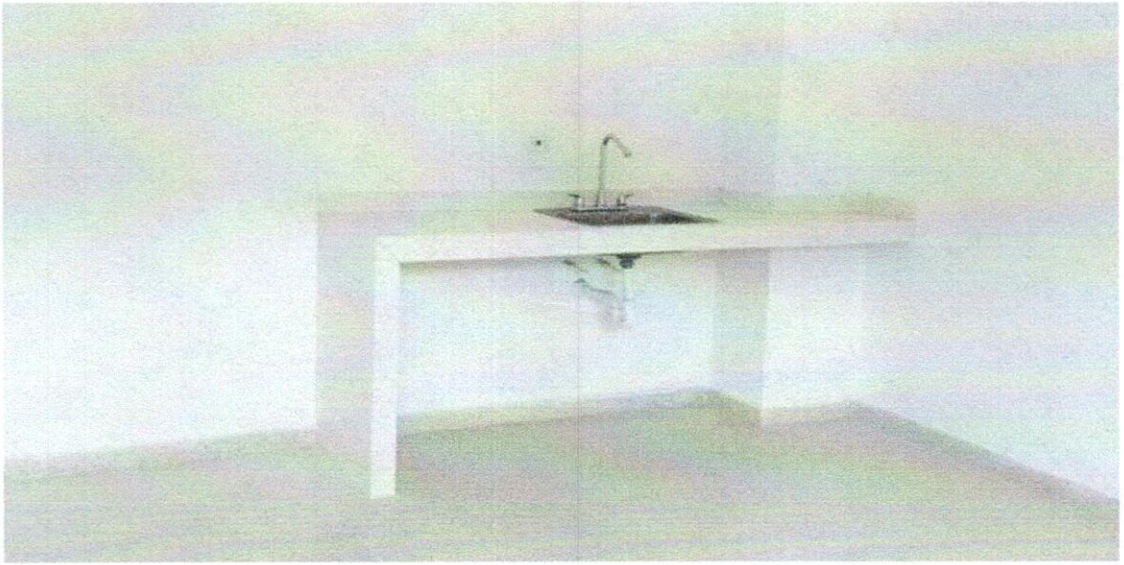


Ilustración 17 Mesón de sala de reanimación

Aplicación de impermeabilizante EucoPlus 7000 Fibras (impermeabilizante cementicio bicomponente, con fibras sintéticas para muros internos de tanque de almacenamiento.



Ilustración 18 Aplicación de impermeabilizante para muros internos de tanque de almacenamiento

INSPECCIÓN DE CALIDAD DE TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALES

El presente informe tiene como objetivo verificar la correcta ejecución de los procesos constructivos y el control de calidad de los materiales requeridos para el desarrollo del proyecto, conforme a los requisitos técnicos y contractuales aplicables, garantizando la conformidad del producto final y el aseguramiento de la calidad en cada una de las etapas del proyecto.

Relación de materiales granulado

Se efectuó el control de recepción de material granular (arena y triturado), verificando su conformidad con los requisitos establecidos para las buenas prácticas de construcción. Dichos materiales fueron incorporados en las actividades de fundida de concreto de 4000 psi para el relleno de columnas metálicas y la ejecución del ante piso de la rampa de ingreso al módulo D.

La actividad se desarrolló bajo supervisión técnica y quedo debidamente registrada en los reportes de control de obra.

Anexo 1 – Registro y control de materiales cantera

Vaciado de concreto

Se ejecutaron las actividades de vaciado de concreto conforme a los diseños estructurales y diseños de concreto para 4000 y 3000 psi.

A la fecha de corte, las estructuras construidas comprenden.

- Concreto para columnas combinadas de la estructura metálica.



Ilustración 19 Prueba de asentamiento – slump test concreto de 4000 psi



Ilustración 20 Cilindros para ensayo de compresión

Previamente a cada vaciado se verifico el proceso de mezclado y la conformidad del concreto con los parámetros de diseños para los elementos. Todas las actividades se ejecutaron bajo supervisión técnica y quedaron debidamente registradas en los reportes de control de obra.

Anexo 2 - Registro de inspección de vaciado de concreto (formato preoperacional y control durante el vaciado de concreto, cuyo objetivo es verificar que todas las condiciones técnicas este conforme antes, durante y después del vaciado)



Fabricación de columnas en lamina de ½"



Ilustración 21 Componentes para el ensayo no destructivos de líquidos penetrantes

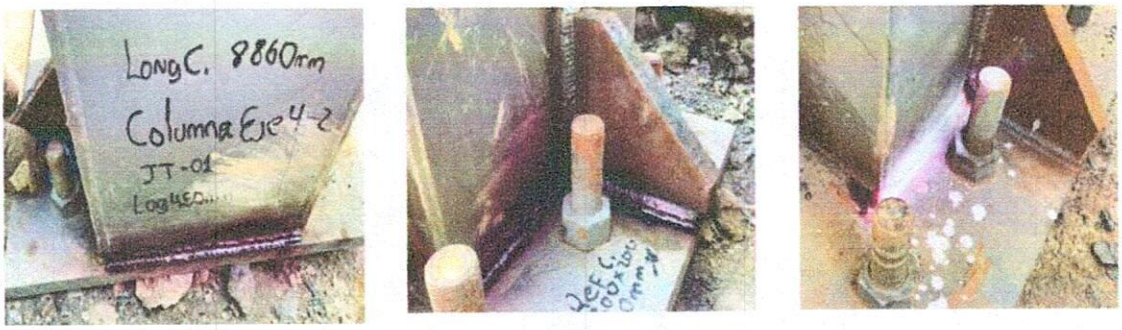
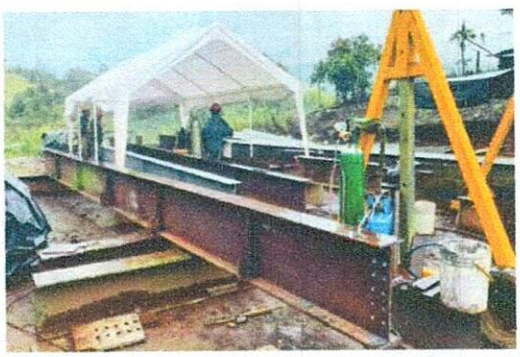





Ilustración 22 Ensayo no destructivo de líquidos penetrantes

Anexo 3 - Ensayos no destructivos de líquidos penetrantes (Es un **reporte técnico de inspección de calidad en soldaduras** de la estructura metálica, cuyo objetivo es detectar **discontinuidades superficiales** como fisuras, porosidades, grietas defectos en cordones de soldadura.


ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO


TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS PERIODOS DEL PRESENTE INFORME




AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Punto fijo módulo D		Fabricación de columnas de foso de ascensor de 10.41 ml.
Punto fijo módulo A		En esta imagen se muestra la instalación de acero PDR60 en la estructura interna de las columnas metálicas.
Modulo A		Fabricación de elementos del módulo A.

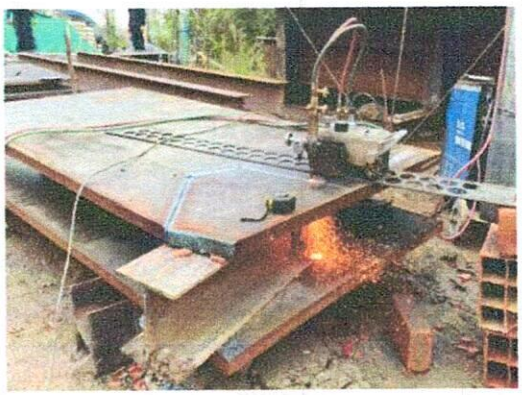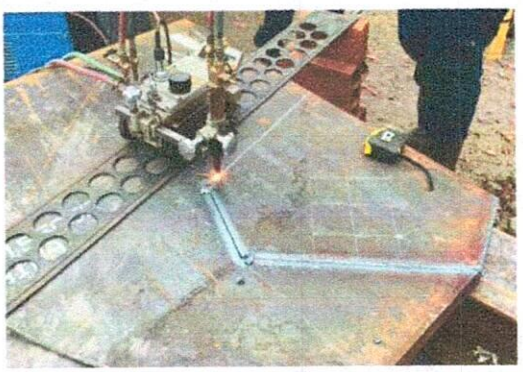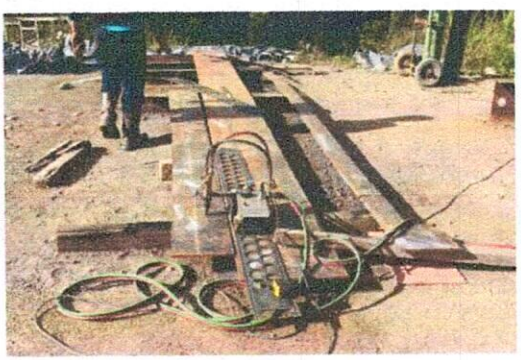AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Modulo A		Corte de lamina de 38 mm para fabricación de conexiones de riostras verticales
Modulo A		
Modulo A		Corte de lámina para fabricación de columnas en el punto fijo del módulo A.

AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Punto fijo modulo D		Instalación de columnas del área de punto fijo y foso de ascensor del modulo D
Modulo A		Se logra mostrar la instalación de vigas, columnas y cerchas de cubierta del modulo A.
Modulo A		Instalación de cerchas de cubierta desde el eje b hasta el eje H

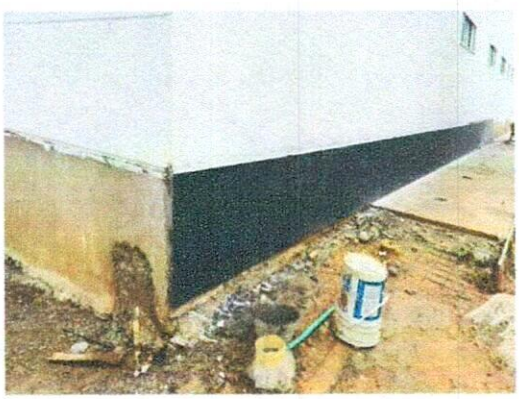AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Modulo A		Instalación de metaldeck en el nivel -0.10m
Modulo A		Instalación de malla electrosoldada entre los ejes G -I en el nivel +4.30
Modulo D		Instalación de cerámica de fachada alrededor del módulo.

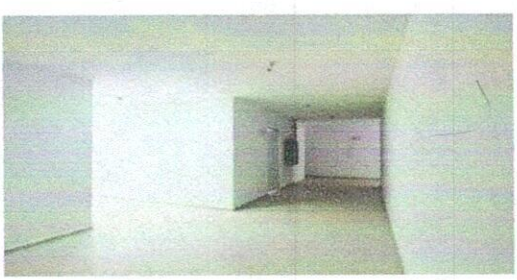AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Modulo D		Construcción de rampa de acceso en concreto de 3000 psi con malla electrosoldada e instalación de baranda sobre el ingreso de cuarto de residuos transitorios.
Módulo D – primer piso		Limpieza y entrega del primer piso a la interventoría y E.S.E para el uso del espacio. Se realizo la instalación de las puertas simples y dobles, el remate de pintura en vanos, la instalación de ventaneria exterior e interior del módulo. Brillo del piso en baldosín de granito.
		
		

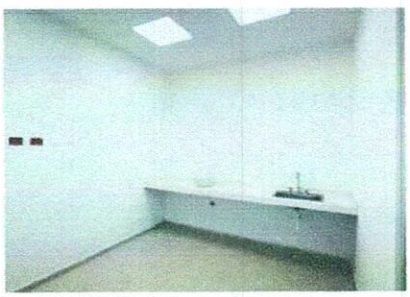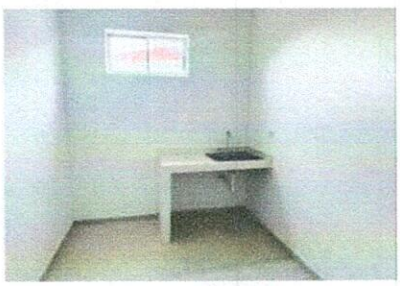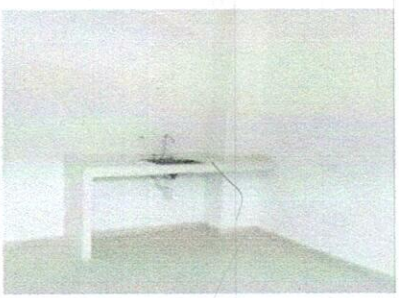AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Módulo D – primer piso		Limpieza y entrega del primer piso a la interventoría y E.S.E para el uso del espacio. Se instalación mesones en los cuartos requeridos, instalación de aparatos sanitarios como (lavamanos, lavaplatos, sanitarios y duchas). Con el equipo de mantenimiento del hospital se hizo verificación de los sistemas y su respectiva aprobación.
		
		
		

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

AREA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
Módulo D – primer piso		En visita de obra con el acampamiento de la interventoría y E.S.E hospital se verificaron cada uno de los espacios entregados, los sistemas hidrosanitarios, eléctricos y de voz y datos, aparatos sanitarios, puertas, ventaneria y chapas el cual se encontraron el buen estado por lo cual se realizó la entrega del primer piso de este módulo D.
		
		

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Control y registro del personal en obra (asistencia, rendimientos y novedades)
- Pagos de seguridad social y nómina de la persona administrativa y de obra.
- Revisión de hojas de vida y de personal de obra.
- Gestión y control de materiales (solicitudes, ingresos, consumos y acopios)
- Elaboración y diligenciamiento de bitácoras de obra.
- Archivo y actualización de registro fotográficos y reportes diarios.
- Verificación de cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) y realización de informes mensuales de obra.
- Realización de informes mensuales, presentación de actividades semanales ejecutadas.
- Comités de obra semanales y mensuales.

CONDICIONES CLIMATICAS

Durante el periodo evaluado, las condiciones climáticas en el municipio, caracterizadas por precipitaciones recurrentes y de intensidad variable, las cuales se encuentra relacionadas en el cuadro de lluvias, han incidido directamente en el desarrollo normal de las actividades constructivas, especialmente en los procesos de fabricación y montaje de la estructura metálica.

Estas condiciones han limitado la continuidad de algunas actividades, obligando a realizar suspensiones temporales por motivos de seguridad y control de calidad, particularmente durante labores de izaje de estructura, fabricación de elementos y fundidas en concreto en altura. Así mismo, la presencia de humedad ha generado restricciones en la manipulación y aplicación de soldadura y oxicorte en la fabricación de la estructura metálica.

Con el fin de mitigar estos efectos y dar continuidad a la ejecución del proyecto, se implementaron medidas como la instalación de carpas en frentes de trabajo y en el área de fabricación, así como la reorganización de actividades, priorizando aquellas que pueden ejecutarse bajo condiciones controladas. No obstante, estas situaciones han generado variaciones en los tiempos de ejecución inicialmente programados.

A continuación, se muestran las horas del estado del clima diario del mes de febrero - marzo de 2026.

ESTADO GENRAL DEL TIEMPO (FEBRERO - MARZO)																																
CLASE DE TIEMPO	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Seco	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	19	6	24	24	19	24	24	20	21	16	20	20	22	17	20	22	16	19	24	24
Lluvia moderada								4					5				5			4	3	8	2	4	2	7	3	2	8	5		
Lluvia intensa								2															2				1					
Total de horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO DESDE EL 26/02/2026 HASTA 25/03/2026

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		25 DE MARZO DE 2026	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 7,720,722,476.73**		**$ 204,700,277.57**
3.02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	$ 13,486.01	199229.86	$ 2,686,815,884.26	10973.92	$ 147,994,394.86
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	$ 19,505.00	5444.61	$ 106,197,118.05	836.03	$ 16,306,765.15
	ITEMS NO PREVISTOS						
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	$ 1,575,628.61	142.18	$ 224,022,875.77	25.64	$ 40,399,117.56
4.0	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 11,410,924,220.28**		**$ 1,507,028,426.56**
	ITEMS NO PREVISTOS						
4-NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	133654.73	$ 2,873,576,674.62	1664.17	$ 35,779,629.32
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	259201.99	$ 5,572,842,721.36	11951.45	$ 256,956,077.11
4-NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE RIOSTRAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	12767.86	$ 274,508,990.00	4583.32	$ 98,541,305.94
4-NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	74846.63	$ 1,609,202,608.52	45245.56	$ 972,779,435.23
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	$ 236,532.35	3169.96	$ 749,798,088.21	604.45	$ 142,971,978.96
5.0	**CUBIERTA**				**$ 2,135,479,488.47**		**$ 658,125,000.00**
5.01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS	M2	$ 750,000.00	2415.10	$ 1,811,325,000.00	877.50	$ 658,125,000.00
10.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**				**$ 5,493,210,590.57**		**$ 87,087,172.20**
10.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO ESTANDAR 10kVA PARA QUIROFANO.	UND	$ 43,543,586.10	6.00	$ 261,261,516.60	2.00	$ 87,087,172.20
12	**CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - DIVISIONES Y MUEBLES)**				**$ 1,788,665,703.27**		**$ -**

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		25 DE MARZO DE 2026	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP147	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA HOJA (APERTURA UNIDIRECCION) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	$ 1,103,332.85	153.68	$ 169,559,089.06		$ -
NP148	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON DOBLE HOJA (APERTURA VAIVEN) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	$ 2,144,496.85	27.00	$ 57,901,414.95		$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 40,717,077,922.11**		**$ 2,456,940,876.33**
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 11,807,952,597.41		$ 712,512,854.14
	IMPREVISTOS		1%		$ 407,170,779.22		$ 24,569,408.76
	UTILIDAD		5%		$ 2,035,853,896.11		$ 122,847,043.82
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 14,250,977,272.74		$ 859,929,306.72
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 54,968,055,194.85**		**$ 3,316,870,183.05**
28	**ASCENSORES**				**$ 2,140,000,000.00**		**$ 560,000,000.00**
	ITEMS NO PREVISTOS			0.00			
NPS 8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450KG, 2 PARADAS Y CAPACIDAD DE 6 PASAJEROS	UND	$ 280,000,000.00	2.00	$ 560,000,000.00	2.00	$ 560,000,000.00
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				**$ 6,608,850,125.95**		**$ 560,000,000.00**
	ADMINISTRACIÓN		29.00%		$ 1,916,566,536.53		$ 162,400,000.00
	VALOR TOTAL EQUIPOS				**$ 8,525,416,662.48**		**$ 722,400,000.00**
	DIFERENCIA POR AJUSTE				**$ 0.01**		
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				**$ 63,493,471,857.35**		**$ 4,039,270,183.05**
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				**$ 1,200,000,000.00**		
	ADICIONAL No 01						
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				**$ 64,693,471,857.35**		**$ 4,039,270,183.05**

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER							
PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA DE MODIFICACION 4		25 DE MARZO DE 2026	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	% EJECUTADO MENSUAL						6.24%
	% EJECUTADO ACUMULADO - CORTE 25 DE MARZO DE 2026						59.43%
	% PROGRAMADO ACUMULADO - CORTE 25 DE MARZO DE 2026						69.00%

ACTA PARCIAL No 9

El presente documento corresponde al acta de cobro parcial No. 9, mediante la cual se relacionan y soportan las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2026 y el 25 de marzo de 2026.

En este lapso se desarrollaron diferentes procesos constructivos conforme a la programación establecida, las especificaciones técnicas y los lineamientos de calidad definidos. Así mismo, en la presente acta se consolidan en las memorias de cantidades y registro fotográfico que comprender la fabricación y montaje de elementos de estructura metálica, ejecución de actividades de contrato y avances en el suministro de la teja castellana, ascensor del punto fijo y la instalación de puertas en el primer piso del módulo D.

Presupuesto de obra ejecutado corte no 9

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER											
PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 9		CANT TOTALES EJECUTADAS		CANT A FAVOR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3.0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				**$ 7,720,722,476.73**		**$ 59,905,682.24**		**$ 5,865,475,910.34**		**$ 1,855,246,566.39**
3.02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	$ 13,486.01	199229.86	$ 2,686,815,884.26	84.40	$ 1,138,219.24	199229.28	$ 2,686,808,127.05	0.58	$ 7,757.20
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	$ 19,505.00	5444.61	$ 106,197,118.05	836.03	$ 16,306,765.15	4309.96	$ 84,065,769.80	1134.65	$ 22,131,348.25
	ITEMS NO PREVISTOS										
3-NP75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES	M3	$ 1,304,797.65	111.63	$ 145,654,561.67	1.58	$ 2,061,580.29	95.44	$ 124,529,887.72	16.19	$ 21,124,673.95
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	$ 1,575,628.61	142.18	$ 224,022,875.77	25.64	$ 40,399,117.56	96.61	$ 152,221,480.01	45.57	$ 71,801,395.76

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 9		CANT TOTALES EJECUTADAS		CANT A FAVOR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
4.0	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 11,410,924,220.28**		**$ 1,197,903,230.45**		**$ 11,350,029,504.16**		**$ 60,894,716.13**
	ITEMS NO PREVISTOS										
4-NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	133654.73	$ 2,873,576,674.62	1664.17	$ 35,779,655.00	133488.51	$ 2,870,002,990.68	166.22	$ 3,573,683.94
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	259201.99	$ 5,572,842,721.36	11951.45	$ 256,956,077.11	259177.19	$ 5,572,309,487.11	24.80	$ 533,234.25
4-NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE RIOSTRAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	12767.86	$ 274,508,990.00	4241.13	$ 91,184,220.94	12757.07	$ 274,277,005.00	10.79	$ 231,985.00
4-NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	$ 21,500.00	74846.63	$ 1,609,202,608.52	31209.83	$ 671,011,298.43	74838.02	$ 1,609,017,383.43	8.62	$ 185,225.08
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20	M2	$ 236,532.35	3169.96	$ 749,798,088.21	604.45	$ 142,971,978.96	3093.74	$ 731,769,592.49	76.22	$ 18,028,495.72

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 9		CANT TOTALES EJECUTADAS		CANT A FAVOR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO										
5.0	**CUBIERTA**				**$ 2,135,479,488.47**		**$ 658,125,000.00**		**$ 1,549,671,225.40**		**$ 585,808,263.07**
5.01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS	M2	$ 750,000.00	2415.10	$ 1,811,325,000.00	877.50	$ 658,125,000.00	1848.95	$ 1,386,712,500.00	566.15	$ 424,612,500.00
7.0	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 496,831,249.09**		**$ 5,994,072.31**		**$ 101,555,970.12**		**$ 395,275,278.97**
	REDES DE PVC SANITARIA AGUAS RESIDUALES										
	ITEMS NO PREVISTOS										
7-NP81	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DRENAJE DE 60X60 CM DE TUBERIA PERFORADA DE 6 PULG. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA FILTRANTE DE 1" A 3"	ML	$ 194,802.48	160.00	$ 31,168,396.80	30.77	$ 5,994,072.31	115.24	$ 22,449,037.80	44.76	$ 8,719,359.00
9.0	**RED CONTRA INCENDIO**				**$ 639,687,122.40**		**$ 1,630,376.51**		**$ 104,603,309.15**		**$ 535,083,813.25**
	PINTURA PARA TUBERIAS										
9.46	PINTURA DE TUBERIA DE	ML	$ 15,110.31	188.87	$ 2,853,884.25	69.40	$ 1,048,655.51	188.67	$ 2,850,862.19	0.20	$ 3,022.06

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 9		CANT TOTALES EJECUTADAS		CANT A FAVOR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	ACERO DIAMETRO HASTA 2"										
9.47	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETROS DE 2-1/2" A 6"	ML	$ 22,160.80	439.21	$ 9,733,244.97	26.25	$ 581,721.00	46.25	$ 1,024,937.00	392.96	$ 8,708,307.97
10.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**				**$ 5,493,210,590.57**		**$ 87,087,172.20**		**$ 933,868,132.55**		**$ 4,559,342,458.03**
10.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO ESTANDAR 10kVA PARA QUIROFANO.	UND	$ 43,543,586.10	6.00	$ 261,261,516.60	2.00	$ 87,087,172.20	2.00	$ 87,087,172.20	4.00	$ 174,174,344.40
12	**CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - DIVISIONES Y MUEBLES)**				**$ 1,788,665,703.27**		**$ 34,693,297.46**		**$ 204,418,925.64**		**$ 1,584,246,777.63**
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP147	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA HOJA (APERTURA UNIDIRECCION) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	$ 988,877.70	153.68	$ 169,559,089.06	28.64	$ 14,106,127.70	152.84	$ 151,140,067.67	0.84	$ 18,419,021.39

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER


PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 9		CANT TOTALES EJECUTADAS		CANT A FAVOR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP148	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON DOBLE HOJA (APERTURA VAIVEN) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	$ 2,144,496.85	27.00	$ 57,901,414.95	9.60	$ 20,587,169.76	9.60	$ 20,587,169.76	17.40	$ 37,314,245.19
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 40,717,077,922.11**		**$ 2,045,338,831.17**		**$ 24,348,702,432.00**		**$ 16,368,375,490.15**
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 11,807,952,597.41		$ 593,148,261.04		$ 7,061,123,705.28		$ 4,746,828,892.14
	IMPREVISTOS		1%		$ 407,170,779.22		$ 20,453,388.31		$ 243,487,024.32		$ 163,683,754.90
	UTILIDAD		5%		$ 2,035,853,896.11		$ 102,266,941.56		$ 1,217,435,121.60		$ 818,418,774.51
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 14,250,977,272.74		$ 715,868,590.91		$ 8,522,045,851.20		$ 5,728,931,421.55
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN				**$ 54,968,055,194.86**		**$ 2,761,207,422.08**		**$ 32,870,748,283.20**		**$ 22,097,306,911.70**
28.0	**ASCENSORES**				**$ 2,140,000,000.00**		**$ 560,000,000.00**		**$ 560,000,000.00**		**$ 1,580,000,000.00**
	ITEMS NO PREVISTOS			0.00							
NPS 8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450KG, 2	UND	$ 280,000,000.00	2.00	$ 560,000,000.00	2.00	$ 560,000,000.00	2.00	$ 560,000,000.00	0.00	$ -

PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER											
PRESUPUESTO DE OBRA INCIAL				ACTA DE MODIFICACION 4		ACTA DE COBRO 9		CANT TOTALES EJECUTADAS		CANT A FAVOR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	V.R. UNITARIO	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	PARADAS Y CAPACIDAD DE 6 PASAJEROS										
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				$ 6,608,850,125.95		$ 560,000,000.00		$ 1,539,670,705.64		$ 5,069,179,420.31
	ADMINISTRACIÓN		$ 0.29		$ 1,916,566,536.53		$ 162,400,000.00		$ 446,504,504.64		$ 1,470,062,031.89
	VALOR TOTAL EQUIPOS				$ 8,525,416,662.48		$ 722,400,000.00		$ 1,986,175,210.28		$ 6,539,241,452.20
	DIFERENCIA POR AJUSTE				$ 0.01						
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				$ 63,493,471,857.35		$ 3,483,607,422.08		$ 34,856,923,493.48		$ 28,636,548,363.90
	VALOR TOTAL CONTINGENCIA VIGENCIA 2023				$ 1,200,000,000.00				$ 1,200,000,000.00		
	ADICIONAL No 01										
	VALOR TOTAL CONTRATO 087				$ 64,693,471,857.35		$ 3,483,607,422.08		$ 36,056,923,493.48		$ 28,636,548,363.90
	% EJECUTADO CORTE No 9						5.38%				
	% EJECUTADO ACUMULADO						55.74%		55.74%		

Durante el corte correspondiente al acta de cobro No. 9, se ejecutó el 5,38% del valor total del proyecto, alcanzando un avance financiero acumulado del 55,74%. Así mismo, el avance ejecutado acumulado total al cierre del mes de marzo asciende al 59,43%, mientras que el porcentaje de avance programado acumulado con corte al 25 de marzo de 2026 se sitúa en el 69,00%.


CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	**Código: CGR-ITM-087-001**

GRAFICA PRESUPUESTO PROGRAMADO DE OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO DE OBRA

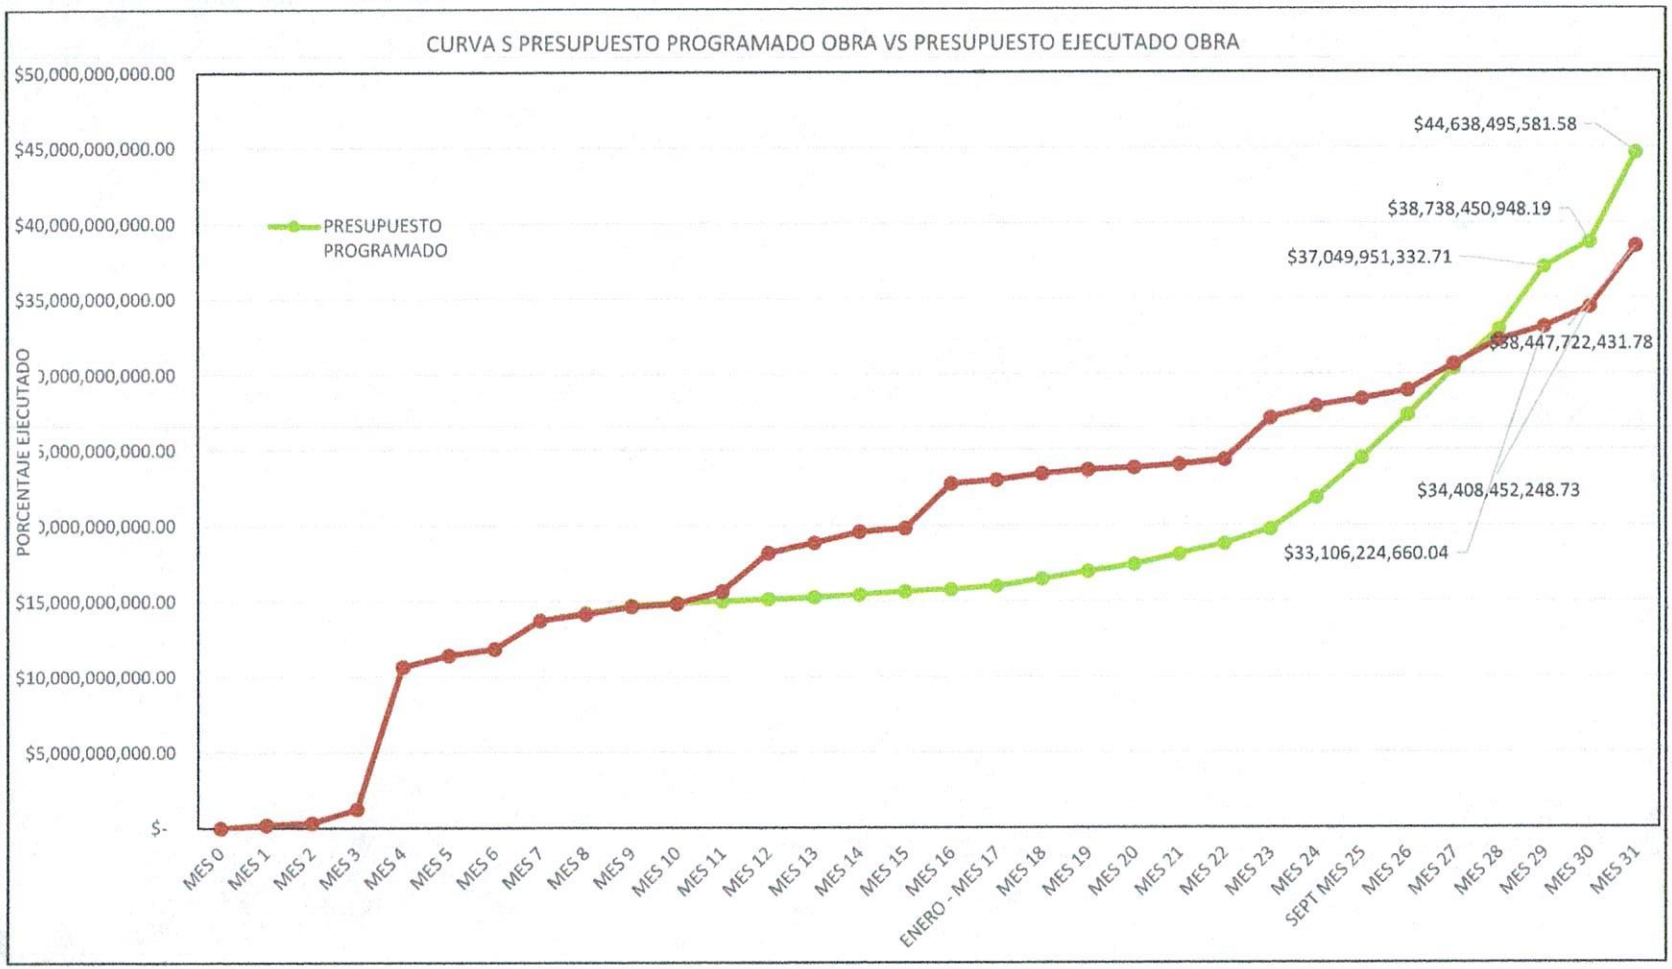

CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA / MÁLAGA – SANTANDER"	
	Revisión: 0	Código: CGR-ITM-087-001

GRAFICA PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA VS PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRA

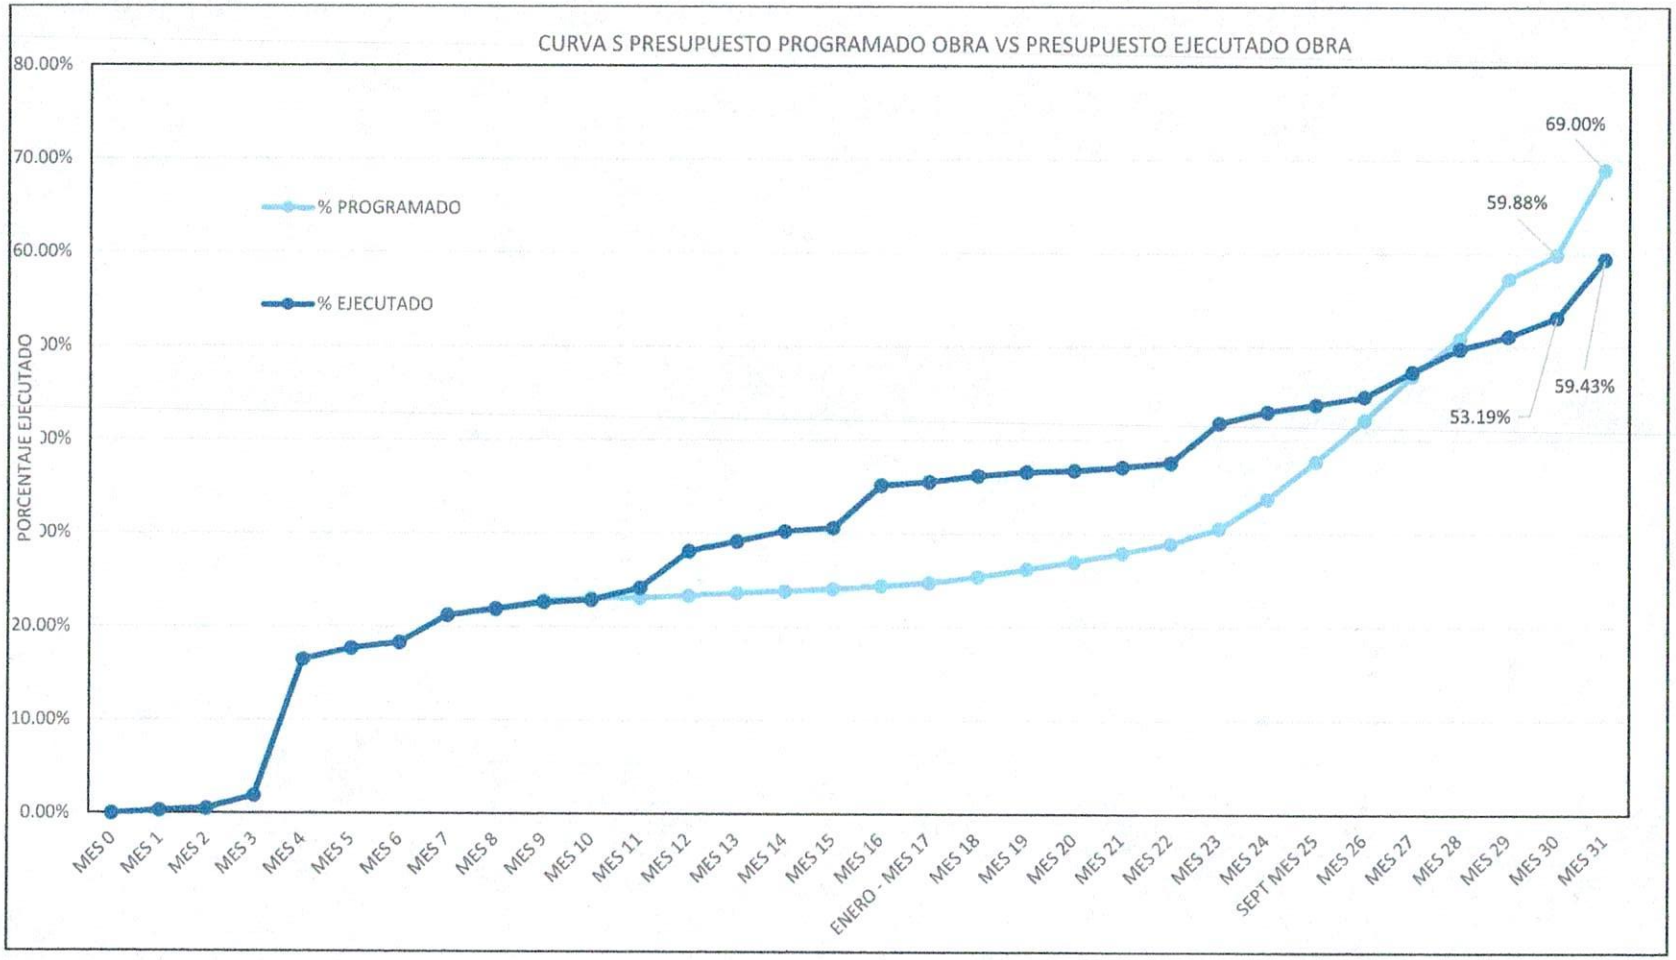

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL No 9

CONTRATO DE OBRA	087-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($64.028.082.699,20)
ANTICIPO 40%	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA ($25.611.233.079,68)
VALOR ADICIONAL	SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE ($ 665.389.158,15)
CONTRATANTE:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA** N.I.T 900.067.169-9 **R.L. CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA** C.C. 7.169.545
CONTRATISTA	**CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** Nit: 901740580-3 R.L. CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO C.C. 91.273.201
INTERVENTORÍA	**UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL** Nit: 901746842-5 R.L. CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES C.C 91.159.501
SUPERVISOR	ZAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	*JOSÉ ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA*
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ROGER RODRÍGUEZ MORENO
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** como contratista y avalada por **UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL** como interventoría, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
3,0	**ELEMENTOS EN CONCRETO**		
3,02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	84,40
3,03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	836,03
3-NP75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES	M3	1,58
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	25,64
4,0	**ESTRUCTURA METALICA**		
4-NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	1664,17
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	11951,45
4-NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE RIOSTRAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	4241,13
4-NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	31209,83
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	604,45
5,0	**CUBIERTA**		
5,01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS	M2	877,50
7,0	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
7-NP81	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DRENAJE DE 60X60 CM DE TUBERIA PERFORADA DE 6 PULG. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA FILTRANTE DE 1" A 3"	ML	30,77
9,0	**RED CONTRA INCENDIO**		
9,46	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETRO HASTA 2"	ML	69,40
9,47	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETROS DE 2-1/2" A 6"	ML	26,25
10,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**		
10,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO ESTANDAR 10kVA PARA QUIROFANO.	UND	2,00
12	**CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - DIVISIONES Y MUEBLES)**		
NP147	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA HOJA (APERTURA UNIDIRECCION) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	28,64
NP148	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON DOBLE HOJA (APERTURA VAIVEN) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	9,60
28,0	**ASCENSORES**		
NPS 8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450KG, 2 PARADAS Y CAPACIDAD DE 6 PASAJEROS	UND	2,00

PERIODO DE EJECUCIÓN:
Las actividades reportadas por parte del contratista de obra y avaladas por interventoría correspondientes con el acta *parcial No 9 se desarrollaron durante el periodo de* **26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2026**

AVANCE DE OBRA:

Durante el periodo de ejecución se realizaron los reportes de información de avance y cargue de la información a la plataforma PISIS - SISPRO según lo siguiente:

- **Del 26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2025**


  Avance programado: 69,00%
  Avance ejecutado: 59,42%

  En el módulo A se continuaron actividades de instalación de estructura metálica por medio de la fabricación e instalación de elementos como columnas compuestas y vigas, así mismo se adelantaron actividades de construcción de mamposterías, elementos de confinamiento, disposición de pases y regatas para la instalación *de redes hidrosanitarias*.

  En el módulo D
- Se realiza adecuación de espacio de piso 1 del módulo, con la finalidad de habilitar el espacio para el traslado temporal de servicios por contingencia, una vez que se requieren zonas existentes para la construcción del punto fijo del modulo A
- Se continúan realizado actividades correspondientes con la construcción de elementos de estructura metálica para punto fijo del módulo, paralelamente se desarrollaron actividades de acabados arquitectónicos en el interior del módulo.


REGISTRO FOTOGRAFICO


ELEMENTOS EN CONCRETO

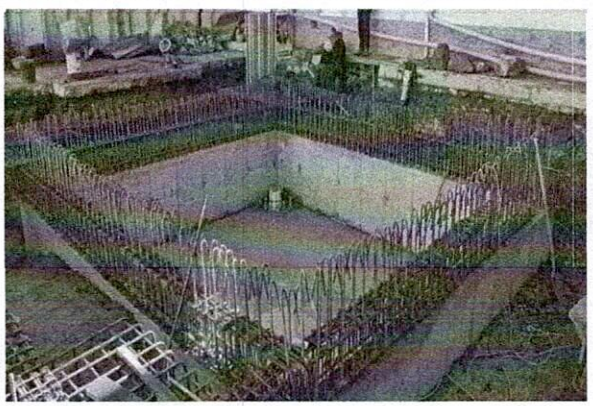




ESTRUCTURA METÁLICA

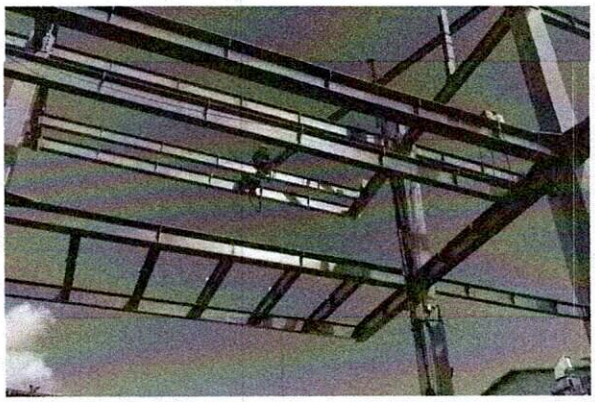

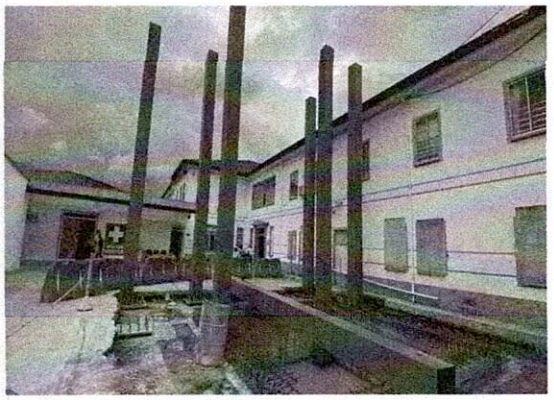



CUBIERTA

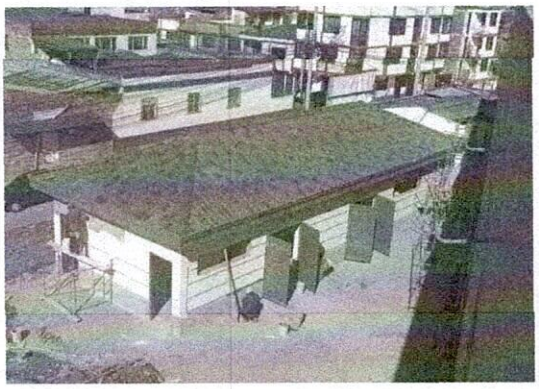





INSTALACIONES SANITARIAS


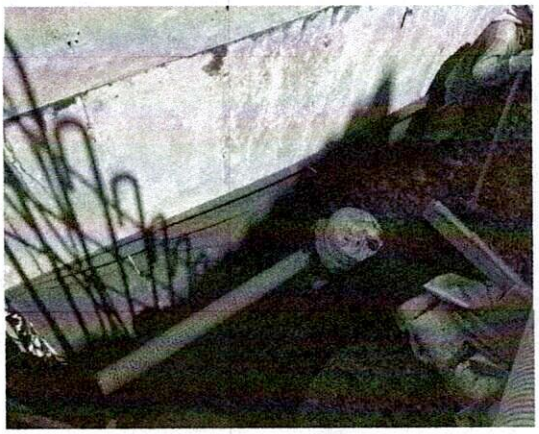


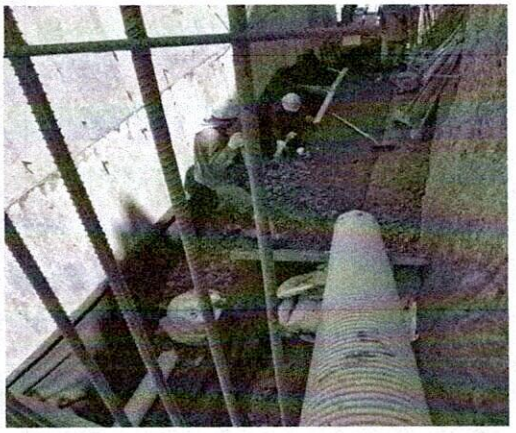


RED CONTRA INCENDIO

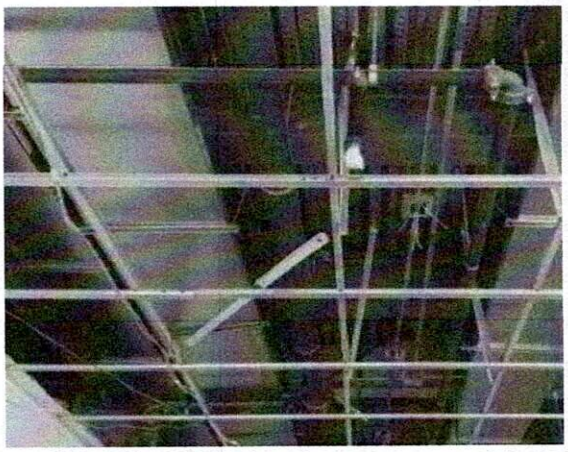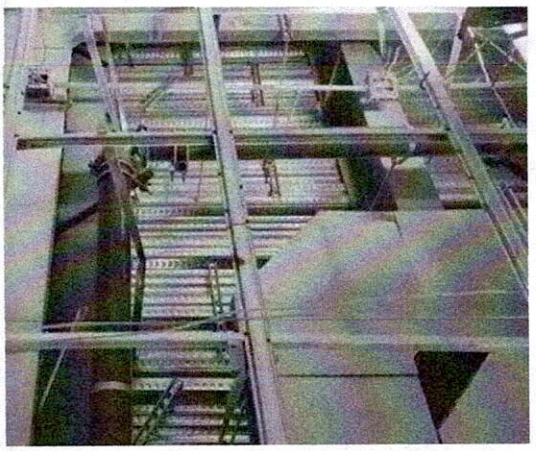
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

CARPINTERÍA

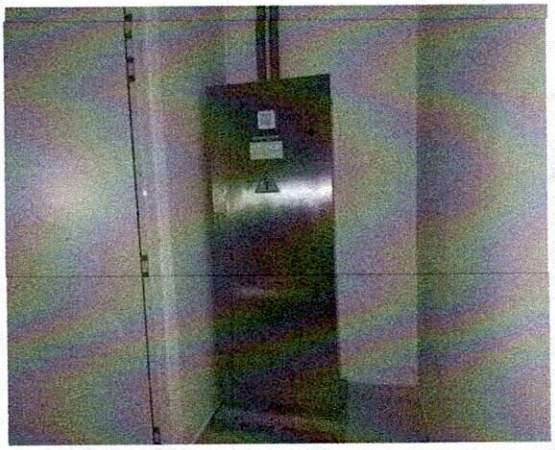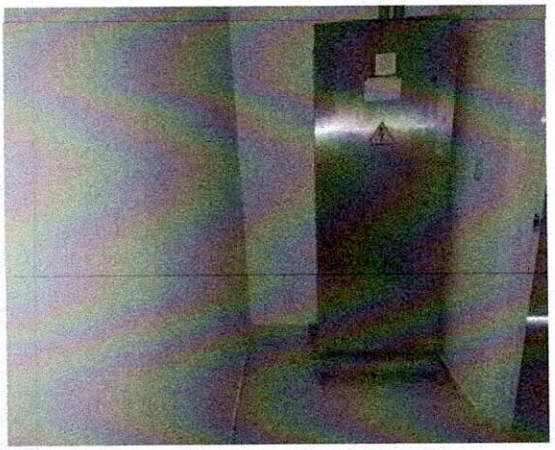SUMINISTROS



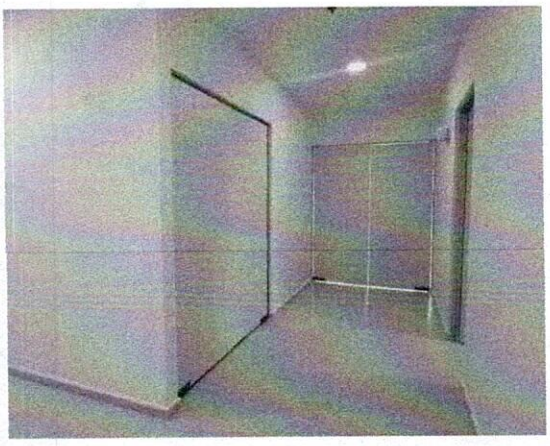

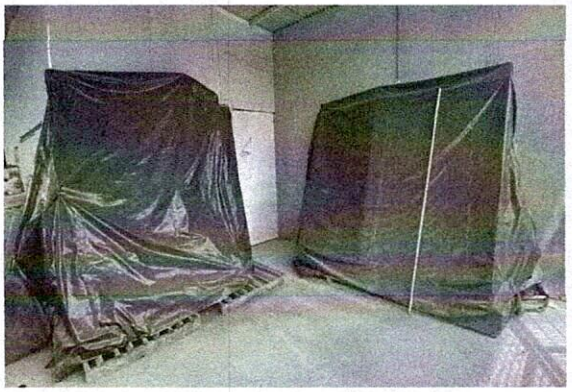BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO	
Anticipo 40%:	$ 25.611.233.080,00
Acta parcial 1:	$ 10.681.193.566,88
Acta parcial 2:	$ 3.054.273.511,53
Acta parcial 3:	$ 4.448.460.052,02
Acta parcial 4:	$ 1.403.466.358,77
Acta parcial 5:	$ 3.180.168.623,59
Acta parcial 6:	$ 4.305.543.655,45
Acta parcial 7:	$ 3.754.076.678,63
Acta parcial 8:	$ 1.741.557.083,91
Acta parcial 9:	$ 3.483.607.422,08
Total amortizado	$ 14.420.938.781,14
Total pagado:	$ 36.052.346.952,86
Saldo restante:	$ 28.641.124.904,49

Avance financiero	55,73%
Avance Físico	59,42%

Una vez revisadas las cantidades de obra ejecutadas en el marco del desarrollo del contrato No 087-23 cuyo objeto es "ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER". en conjunto con el contratista **CONSORCIO DE GARCÍA ROVIRA** y la *interventoría al contrato* **UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL** *se considera conveniente realizar el pago* correspondiente al acta parcial No 9 de la siguiente forma:

Periodo de ejecución: del 26/02/2025 al 25/03/2026
Valor acta parcial No 9: $ 3.483.607.422,08
Amortización anticipo 40%: $ 1.393.442.968,83
Valor a pagar en la presenta acta: $ 2.090.164.453,25

Se expide en Málaga, al día dieciocho (18) del mes de abril del 2026.

Ing. JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
Apoyo a la Supervisión E.S.E HRGR

ROGER RODRIGUEZ M

Ing. ROGER RODRÍGUEZ MORENO
Apoyo a la Supervisión E.S.E HRGR


CONSORCIO HOSPITAL GARCIA ROVIRA	REGISTRO CONTROL DE MATERIA CANTERA	CGR-CIV-CMC-001
		VERSION: 01
		FECHA: 15/08/2023

PROYECTO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E. HSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
FECHA	FEBRERO DE 2026
ASPECTO GENERAL	
MEDIO DE TRANSPORTE	VOLQUETA
DISPOSICION DE MATERIAL	AREA DE BODEGA DE MATERIALES

CONTROL DE MATERIALES

No. RECIBO	FECHA	MATERIAL	METROS	PROVEEDOR
998	4/02/2026	ARENA M	14	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
999	5/02/2026	TRITURADO	14	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
1000	6/02/2026	ARENA	7	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
1001	10/02/2026	ARENA M	14	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
1002	12/02/2026	ARENA	7	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
1004	23/02/2026	ARENA	7	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
1004	24/02/2026	TRITURADO	7	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
1005	24/02/2026	TRITURADO	7	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
1006	25/02/2026	TRITURADO	7	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
1007	26/02/2026	ARENA	7	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S

OBSERVACIONES: Se verifica que el material recibido cumla co los estandares de calidad requeridos para la preparacion del concreto según diseño de mezclas.

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	CRISTIAN GONZALEZ RUEDA	ALFONSO CARREÑO
CARGO	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE OBRA
FIRMA		


CONSORCIO HOSPITAL GARCÍA ROVIRA	REGISTRO CONTROL DE MATERIA CANTERA	CGR-CIV-CMC-001
		VERSION: 01
		FECHA: 15/08/2023

PROYECTO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E. HSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
FECHA	MARZO DE 2026
ASPECTO GENERAL	
MEDIO DE TRANSPORTE	VOLQUETA
DISPOSICION DE MATERIAL	AREA DE BODEGA DE MATERIALES

CONTROL DE MATERIALES

No. RECIBO	FECHA	MATERIAL	METROS	PROVEEDOR
1008	3/03/2026	ARENA	7	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
1009	10/03/2026	ARENA	7	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
1010	11/03/2026	TRITURADO	7	RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
				RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
				RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
				RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
				RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
				RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
				RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S
				RYR LOGISTICA Y CONTRUCCIONES S.A.S

OBSERVACIONES: Se verifica que el material recibido cumla co los estandares de calidad requeridos para la preparacion del concreto según diseño de mezclas.

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	CRISTIAN GONZALEZ RUEDA	ALFONSO CARREÑO
CARGO	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE OBRA
FIRMA		

	REGIOSTRO DE VACIADO DEL CONCRETO	CGR-CIV-RVC-001
		VERSIO 0
		FECHA 15/05/2026

PROYECTO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER				
ESTRUCTURA	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCION	FECHA	16/02/2026		
FRENTE DE OBRA	Columnas metalicas modulo A				
PLANO DE REFERENCIA	01-02-EST-PLT-MOD A-HOSP-MALAGA_RV.1				
CONDICION CLIMATICA	Soleado	HORA DE INCIO	7:00	HOA FIN	2:30

INSPECCION Y ENSAYO

DESCRIPCION	APLICA		CONFORME	DESCRIPCION	APLICA		CONFORME
	SI	NO			SI	NO	
A. PREPARACION DEL VACIADO				**D. EMBEBIDOS**			
1. Superficie del suelo	X		SI	1. Ubicación		X	
2. Condiciones junta de construccion		X		2. Dimensiones, longitud y diametro		X	
B. FORMALETA				3. Tuberia conduits y/o hidraulica		X	
1. Tipo y condiciones de material	X		SI	4. Anclajes y accesorios		X	
2. Ubicación y dimensiones	X		SI	5. Separacion		X	
3. Ajuste	X		SI	7. Cantidad		X	
4. Verticalidad y nivelacion	X		SI	**E. APROBACION PARA VACIADO**			
5. Anteadherente	X		SI	1. Diseño de mezcla	X		SI
C. REFUERZOS				2. Tamaño de arena/agregado	X		SI
1. Figuracion	X		SI	3. Aditivos		X	
2. Ubicación y cantidad	X		SI	4. Juntas de expansion		X	
3. Dimensiones, diametro, longitud	X		SI	5. Acabado	X		SI
4. Anclajes	X		SI	6. Dosificacion por volumenes	X		SI
5. Amarres, juntas o traslapos	X		SI	7. Otros		X	
6. Separación	X		SI				

ESPECIFICACIONES DE CONCRETO

PREPARACION	MEZCLADO EN OBRA	RESISTENCIA (PSI)	4000	ADITIVO	
VOLUMEN DE VACIADO	24	NUMERO DE CILINDROS TOMADOS	8		

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACION:

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	CRISTIAN GONZALEZ RUEDA	ALFONSO CARREÑO
CARGO	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE OBRA
FIRMA		

JCB INGENIERIA SAS	**REPORTE DE INSPECCION ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LIQUIDOS PENETRANTES**	**IN-ND-P-002-F1-PA** **Versión: 1**

PROYECTO: Construcción Estructura Metálica E.S.E Hospital Regional de García Rovira	*INFORME No:* **PT-ESTRUC-MET-HOSPMAL-002**
CLIENTE: JOB INGENIERIA SAS — *Ubicación: Málaga - Sder*	*FECHA: 2/03/2026*
NORMA/ESPECIFICACION EVALUACION: AWS D1.1 - AWS D1.1M/2015	*PAGINA:* 1 DE 2
EQUIPO/ELEMENTO INSPECCIONADO: LAMINA	*PLANO/DETALLE: N.A*

ESPECIFICACION DE MATERIAL: HR		ESPESOR: VARIOS	*JUNTA:* FILETE/ A TOPE
PROCESO DE SOLDADURA: GMAW	ESTADO SUPERFICIE: LISA	*SUP. INSPECCION:* EXTERNA	

METODO DE INSPECCION: Visible Removible con Solvente (II-C)		ESPECIFICACION DE REFERENCIA: ASTM E 165	
MARCA Y REF. PENETRANTE:	MAGNAFLUX PENETRANT SKD	*TIEMPO DE PENETRADO:*	7 Min
MARCA Y REF. REMOVEDOR:	MAGNAFLUX CLEANER SKC	*TIEMPO DE REVELADO:*	10 Min
MARCA Y REF. REVELADOR	MAGNAFLUX DEVELOPER SKL	*METODO DE LIMPIEZA:*	Manual

EQUIPO Y/Ó ELEMENTO	ESTAMPE	LONGITUD INSPECCION (MM)	INDICACION		EVALUACION	OBSERVACIONES
			TIPO	LONG (MM)		
ESTRUCTURA METÁLICA –HOSPITAL MÁLAGA (VIGA ENTREPISO N1 EJE H-I (2-3)	J1	985 cm	N.A	N.A	*CONFORME*	*CORDONES DE SOLDADURA PULIDO*
ESTRUCTURA METÁLICA –HOSPITAL MÁLAGA (VIGA ENTREPISO N2 EJE H-I (2-3)	J1	986 cm	N.A	N.A	*CONFORME*	*CORDONES DE SOLDADURA PULIDO*
ESTRUCTURA METÁLICA –HOSPITAL MÁLAGA (VIGA ENTREPISO N2 EJE H-I (1-2)	J1	989 cm	N.A	N.A	*CONFORME*	*CORDONES DE SOLDADURA PULIDO*
ESTRUCTURA METÁLICA –HOSPITAL MÁLAGA (VIGA ENTREPISO N2 EJE H-I (3-4)	J1	985 cm	N.A	N.A	*CONFORME*	*CORDONES DE SOLDADURA PULIDO*


OBSERVACIONES: Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para almacenamiento de metal de aporte.


INSPECTOR: **ALFONSO TARAZONA** **INSPECTOR END Nivel II - LP - VT** **ASNT**			
	FIRMA INSPECTOR	**CLIENTE**	**INTERVENTORIA**


JCB INGENIERIA SAS	**REPORTE DE INSPECCION ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS** **LIQUIDOS PENETRANTES**	*PT-ESTRUC-METAL-HOSPMAL-002R (ANEXO A)* Página 2 de 2


REGISTRO FOTOGRAFICO

VIGAS ENTREPISOS N1 Y N2 EJE H-I (1-2) (2-3) (3-4)

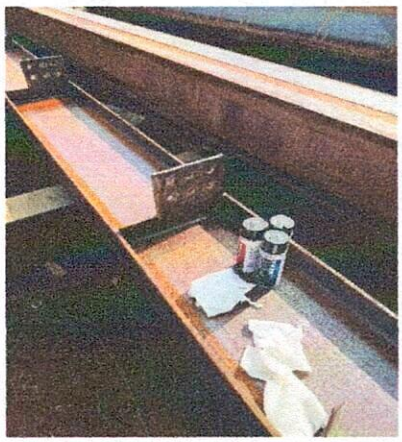

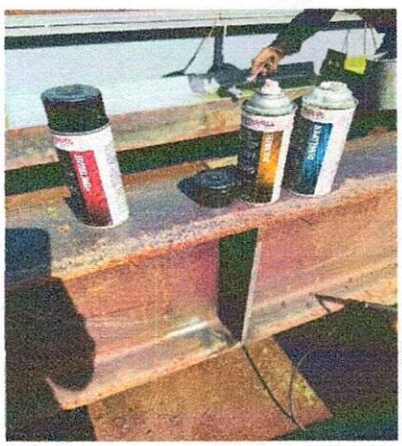

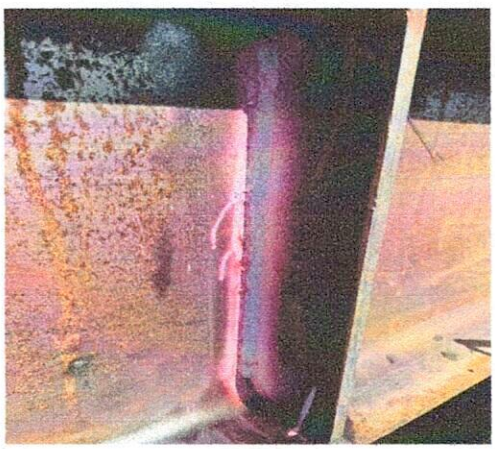

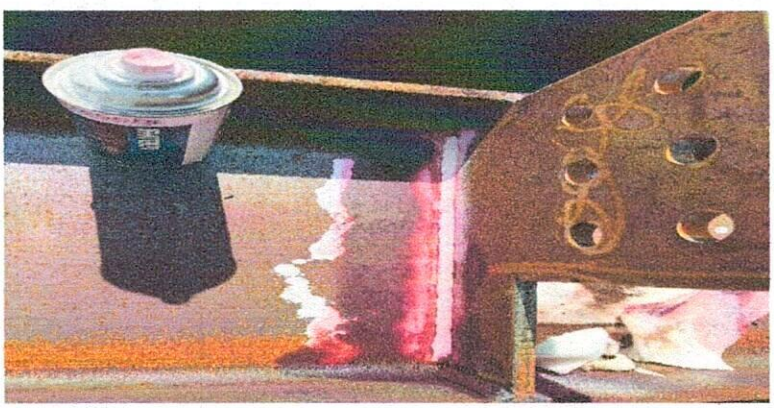INSPECTOR: ALFONSO TARAZONA INSPECTOR END Nivel II - LP- VT ASNT			
	FIRMA INSPECTOR	CLIENTE	INTERVENTORIA

JCB INGENIERIA SAS	**REPORTE DE INSPECCION ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LIQUIDOS PENETRANTES**	**IN-ND-P-002-F1-PA** Versión: 1

PROYECTO: Construcción Estructura Metálica E.S.E Hospital Regional de García Rovira	*INFORME No:* **PT-ESTRUC-MET-HOSPMAL-018**
CLIENTE: JOB INGENIERIA SAS — *Ubicación: Málaga - Sder*	*FECHA: 31/03/2026*
NORMA/ESPECIFICACION EVALUACION: AWS D1.1 - AWS D1.1M/2015	*PAGINA:* 1 DE 8
EQUIPO/ELEMENTO INSPECCIONADO: LAMINA	*PLANO/DETALLE: N.A*

ESPECIFICACION DE MATERIAL: HR		ESPESOR: VARIOS	*JUNTA:* FILETE/ A TOPE
PROCESO DE SOLDADURA: GMAW	ESTADO SUPERFICIE: LISA	*SUP. INSPECCION:* EXTERNA	

METODO DE INSPECCION: Visible Removible con Solvente (II-C)		ESPECIFICACION DE REFERENCIA: ASTM E 165	
MARCA V REF. PENETRANTE:	MAGNAFLUX PENETRANT SKD	*TIEMPO DE PENETRADO:*	7 Min
MARCA Y REF. REMOVEDOR:	MAGNAFLUX CLEANER SKC	*TIEMPO DE REVELADO:*	10 Min
MARCA Y REF. REVELADOR	MAGNAFLUX DEVELOPER SKL	*METODO DE LIMPIEZA:*	Manual

EQUIPO Y/Ó ELEMENTO	ESTAMPE	LONGITUD INSPECCION (MM)	INDICACION		EVALUACION	OBSERVACIONES
			TIPO	LONG (MM)		
ESTRUCTURA METÁLICA –HOSPITAL MÁLAGA (VIGA ENTREPISO N1 EJE J-K (3-4)	J1	8145	N.A	N.A	*CONFORME*	*CORDONES DE SOLDADURA PULIDO*
ESTRUCTURA METÁLICA –HOSPITAL MÁLAGA (VIGA ENTREPISO N2 EJE J-K (3-4)	J1	8145	N.A	N.A	*CONFORME*	*CORDONES DE SOLDADURA PULIDO*
ESTRUCTURA METÁLICA –HOSPITAL MÁLAGA (COLUMNA PUNTO FIJO MD EJE 1-D)	J1	8860	N.A	N.A	*CONFORME*	*CORDONES DE SOLDADURA PULIDO*
ESTRUCTURA METÁLICA –HOSPITAL MÁLAGA (COLUMNA PUNTO FIJO MD EJE 2-D)	J1	8860	N.A	N.A	*CONFORME*	*CORDONES DE SOLDADURA PULIDO*
ESTRUCTURA METÁLICA –HOSPITAL MÁLAGA (COLUMNA PUNTO FIJO MD EJE 4-D)	J1	8860	N.A	N.A	*CONFORME*	*CORDONES DE SOLDADURA PULIDO*
ESTRUCTURA METÁLICA –HOSPITAL MÁLAGA (RIGIDIZADOR COLUMNA PUNTO FIJO MD 4-A)	J1	200	N.A	N.A	*CONFORME*	*CORDONES DE SOLDADURA PULIDO*

OBSERVACIONES: Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para almacenamiento de metal de aporte.

INSPECTOR: ALFONSO TARAZONA			

PROCESO DE LA INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES

Limpieza y Preparación de la Superficie

- **Procedimiento:** Se realizó la limpieza mecánica inicial del cordón de soldadura utilizando una brocha y trapo seco para eliminar restos de polvo y escoria superficial. Posteriormente, se aplicó el agente Cleaner sobre la zona de interés para asegurar la eliminación de grasas o aceites.
- **Tiempo de Secado:** Se otorgó un tiempo de espera de 5 minutos para garantizar la evaporación total del solvente antes de proceder.

Aplicación del Líquido Penetrante

- **Procedimiento:** Se aplicó el líquido penetrante (tinta roja) de manera uniforme sobre la soldadura y la zona afectada por el calor (ZAC). Se verificó que la superficie permaneciera húmeda durante todo el proceso para asegurar la capilaridad.
- **Tiempo de Penetración:** Se mantuvo el producto en reposo sobre la pieza durante 7 minutos.
- **Eliminación del Exceso de Penetrante**: Se retiró el exceso de tinta roja de la superficie utilizando primero un trapo seco y limpio. Finalizada la limpieza gruesa, se empleó un trapo ligeramente humedecido con **Cleaner** para retirar los residuos de fondo evitando la aplicación directa del solvente sobre la soldadura para no lavar el material alojado en posibles discontinuidades.

Aplicación del Revelador e Interpretación


- **Procedimiento:** Se agitó el envase y se aplicó una capa fina y uniforme de **Revelador** (polvo blanco) sobre el área inspeccionada. Se mantuvo la distancia recomendada para evitar acumulaciones excesivas de material que pudieran enmascarar los resultados.
- **Tiempo de Revelado:** Se esperaron **10 minutos** para la extracción de la tinta y la formación de indicaciones visibles.
- **Resultado:** Se procedió con la inspección visual final para identificar manchas o líneas de color rojo sobre el fondo blanco del revelador

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIGA ENTREPISO N1 IPE 400 EJE JK 3-4


- **Limpieza y Preparación de la Superficie**



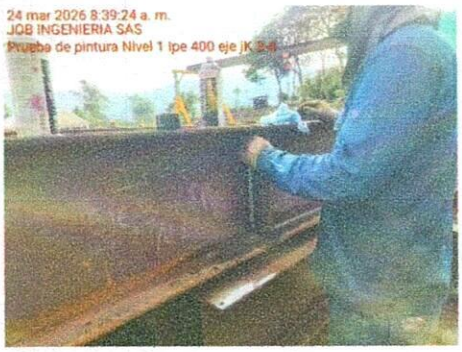



- **Aplicación del Líquido Penetrante**



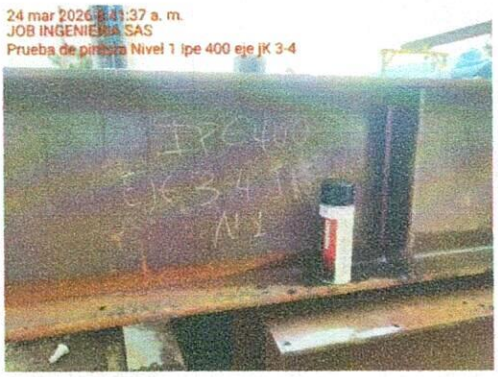

- **Aplicación del Revelador e Interpretación**


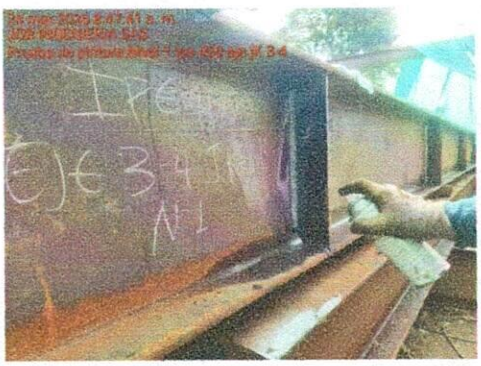


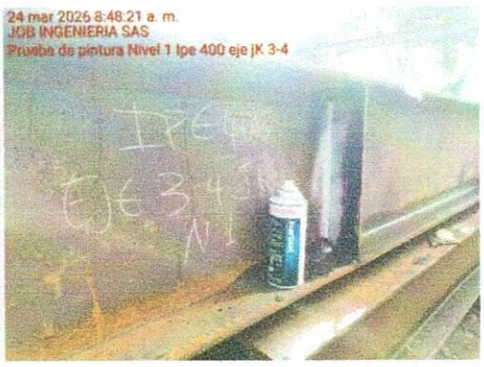


REGISTRO FOTOGRAFICO

VIGA ENTREPISO N2 IPE 360 EJE JK 3-4



- **Limpieza y Preparación de la Superficie**

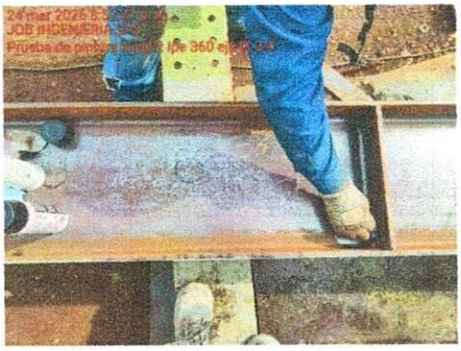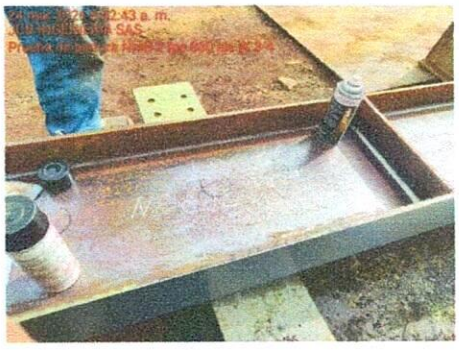- **Aplicación del Líquido Penetrante**


- **Aplicación del Revelador e Interpretación**

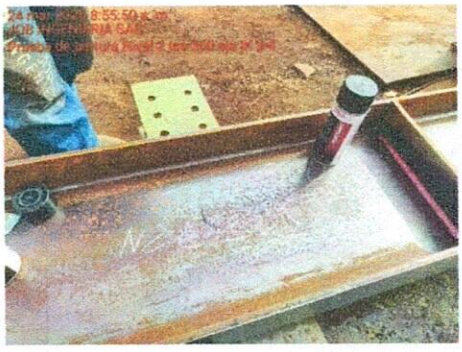REGISTRO FOTOGRAFICO


COLUMNA PUNTO FIJO MD EJE 1-D

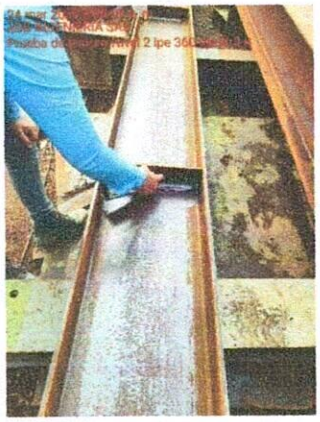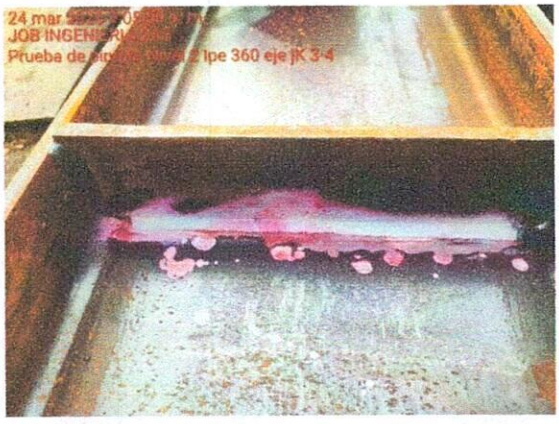
- **Limpieza y Preparación de la Superficie**



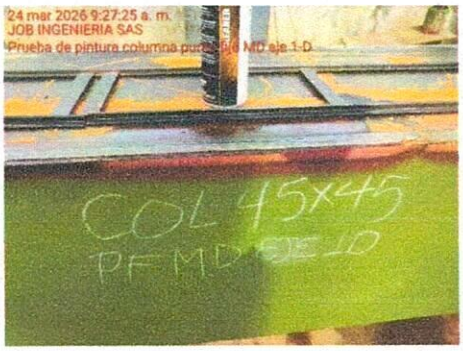


- **Aplicación del Líquido Penetrante**

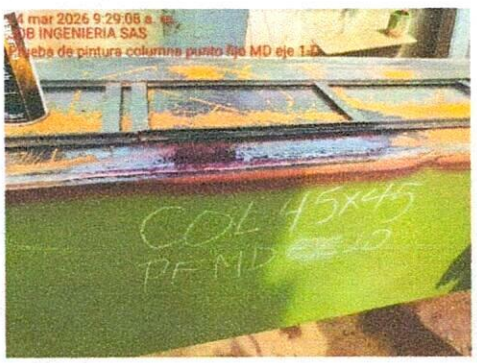

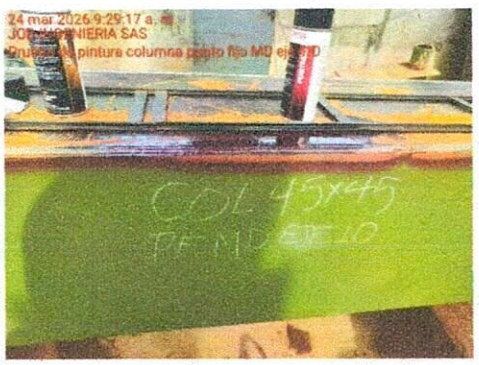

- **Aplicación del Revelador e Interpretación**




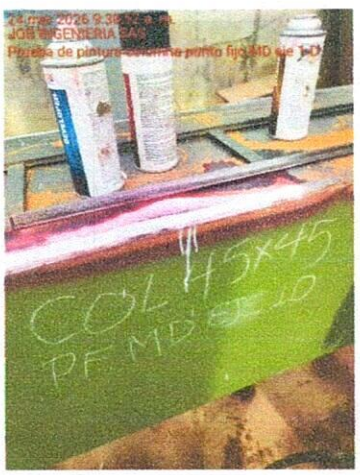


REGISTRO FOTOGRAFICO


COLUMNA PUNTO FIJO MD EJE 2-D

- **Limpieza y Preparación de la Superficie**

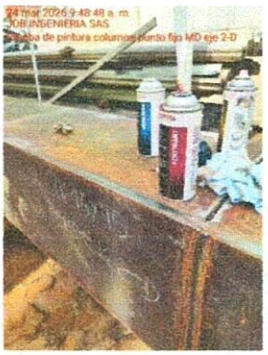

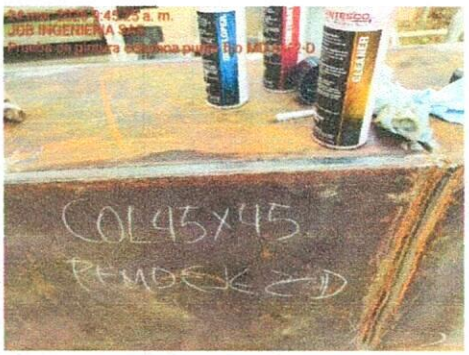



- **Aplicación del Líquido Penetrante**

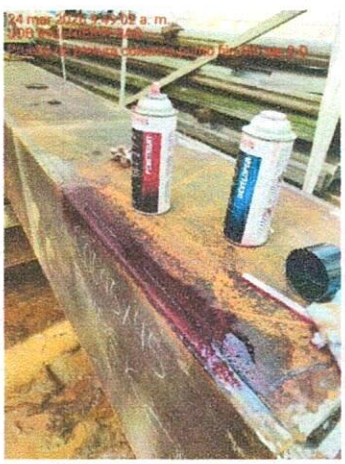



- **Aplicación del Revelador e Interpretación**

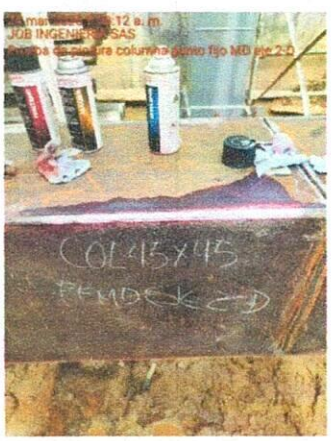


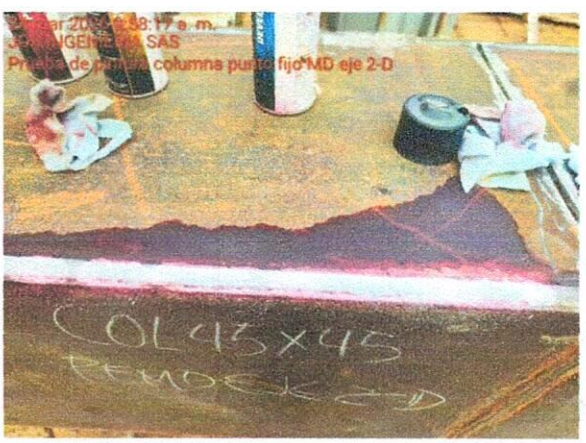


REGISTRO FOTOGRAFICO


COLUMNA PUNTO FIJO MD EJE 4-D

- **Limpieza y Preparación de la Superficie**

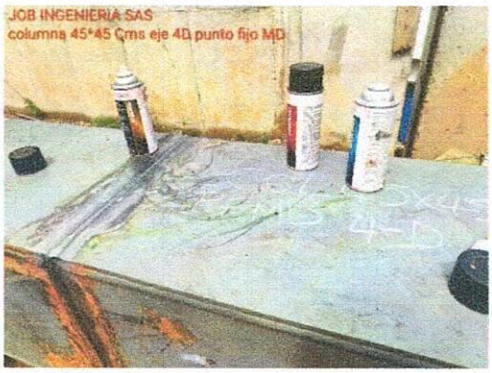

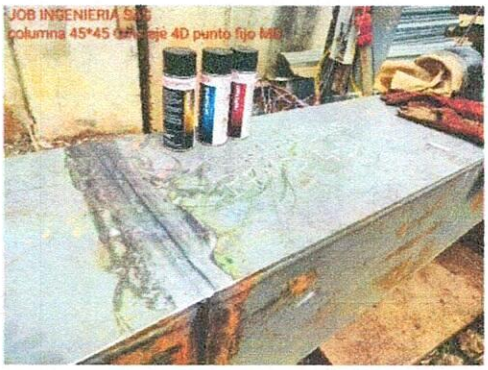


- **Aplicación del Líquido Penetrante**

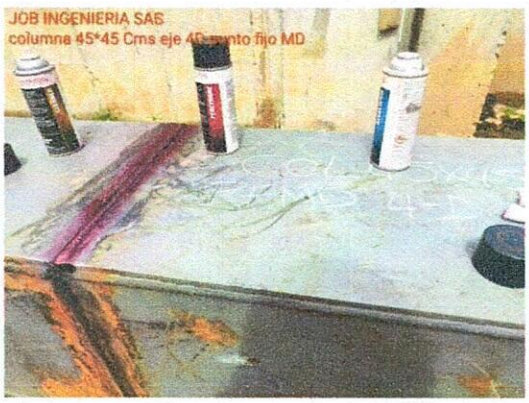



- **Aplicación del Revelador e Interpretación**

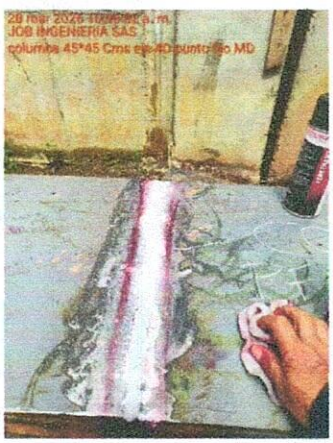



REGISTRO FOTOGRAFICO

RIGIDIZADOR COLUMNA PUNTO FIJO MD EJE 4-A

- **Limpieza y Preparación de la Superficie**




- **Aplicación del Líquido Penetrante**




- **Aplicación del Revelador e Interpretación**




Construsuelos de Colombia S.A.S *NIT.804,015,242-8*	FECHA:	18/03/2021
	CODIGO:	PP06-13-R04
	REVISION:	4

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
DE HORMIGON INV. E-410-13 (NORMA ICONTEC 673)
Capping de Neopreno de acuerdo a las Normas ASTM C-1231-93 y AASHTO T22-851

OBRA : **ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER**

CONTRATISTA : CONSORCIO DE GARCÍA ROVIRA


Ensayado : DIEGO OCHOA C. CÓDI 068

Altura : 30 Diámetro: 15 Area : 176,72 cm^2

NOMBRE MUESTRA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (Días)	UBICACIÓN	CARGA ESPERADA	Area Total Cm2	Carga KN	Carga Kilos	Efzo Kg/cm2 Sección Total	PSI	MPS	TIPO FALLA
1	21/02/2026	07/03/26	14	ZAPATAS INTERNAS PINTO FIJO	4000	176,72	452,84	46177,00	261,31	3708	25,62	3
2	28/02/2026	07/03/26	7	LOZA PUNTO FIJO	4000	176,72	520,77	53103,96	300,51	4264	29,46	5
3	21/02/2026	07/03/26	14	VIGAS INTERIORES PUNTO FIJO	4000	176,72	450,16	45903,72	259,75	3686	25,47	5

OBSERVACIONES:

CONO (A) TIPO 1



Conos razonablemente bien formados en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de de 1 pulg (25 mm)

CONO Y HENDEDURA (B) TIPO 2



Conos bien formados en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo

CONO Y CORTE (C) TIPO 3



Fisuras verticales encolumnadas a través de ambos extremos, conos no bien formados

CORTE (D) TIPO 4



Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; golpee suavemente con un martillo para distinguirla del tipo 1

COLUMNAR (E) TIPO 5



Fracturas en los lados en las partes superior o inferior (ocurre comunmente con tapas no adheridas)

COLUMNAR (E) TIPO 6




Similar al Tipo 5, pero el extremo del cilindro es puntiagudo


Construsuelos de Colombia S.A.S
NIT. 804.015.242-8

Mary Calderón J.
ELABORÓ:

Fanny L. Ramírez S.
REVISÓ:

Ing. Miguel Angel Camargo J.
APROBÓ

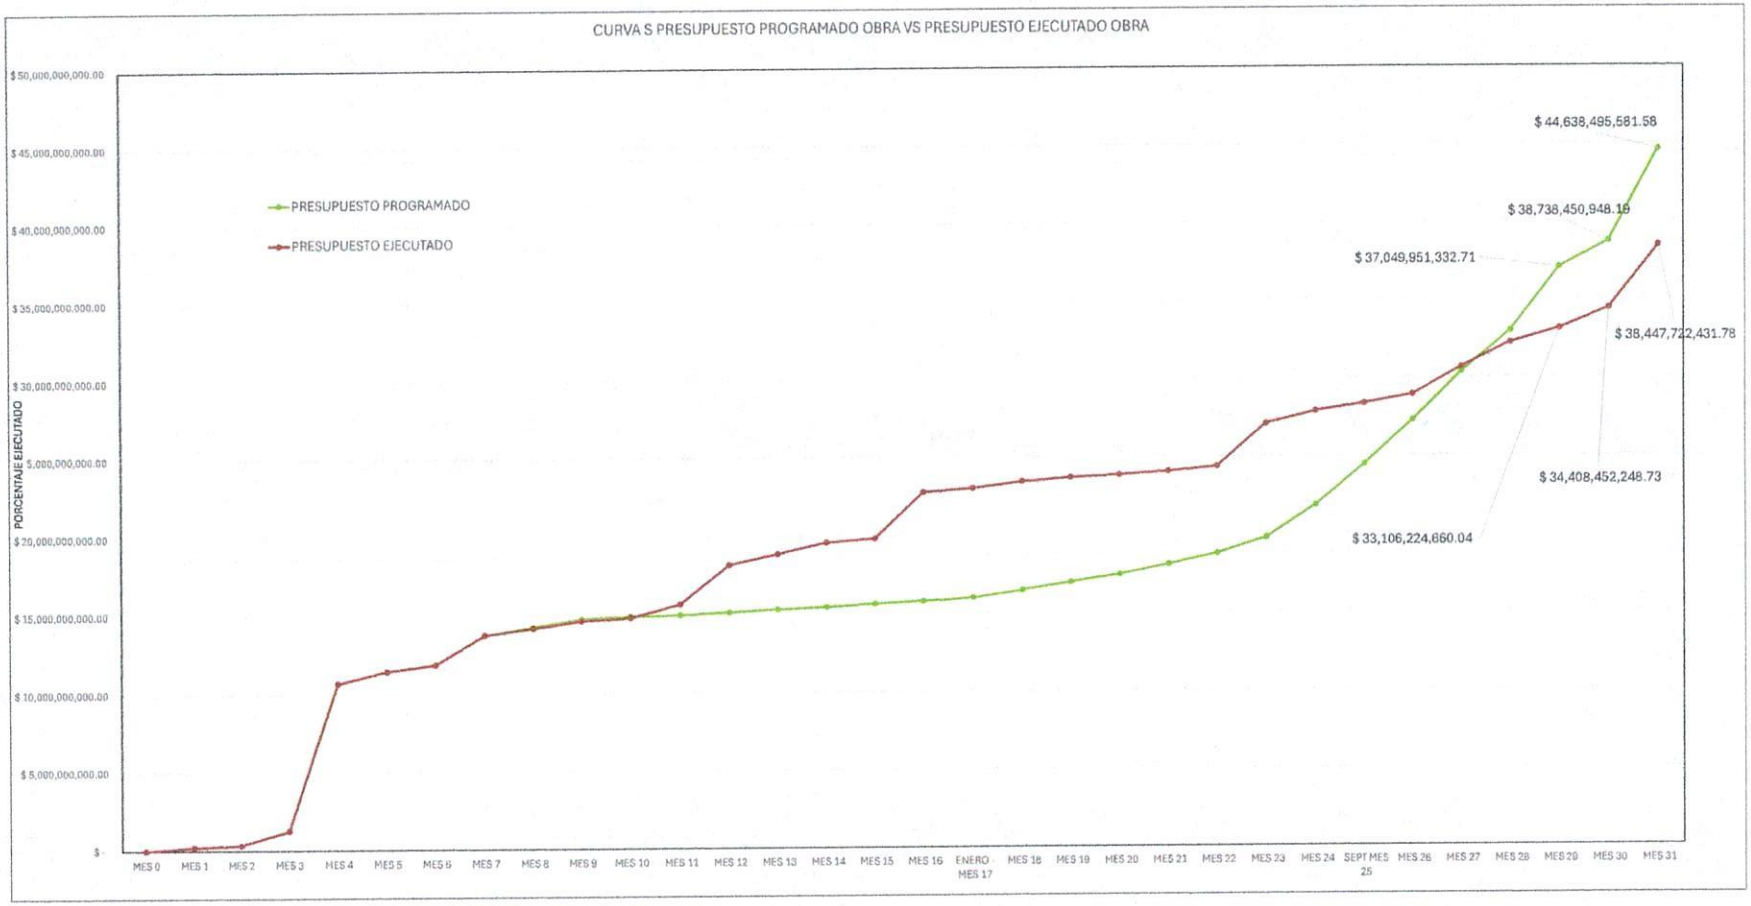
CURVA S PRESUPUESTO PROGRAMADO OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO OBRA
PORCENTAJE EJECUTADO
$ 50,000,000,000.00
$ 45,000,000,000.00
$ 40,000,000,000.00
$ 35,000,000,000.00
$ 30,000,000,000.00
$ 25,000,000,000.00
$ 20,000,000,000.00
$ 15,000,000,000.00
$ 10,000,000,000.00
$ 5,000,000,000.00
$ -
PRESUPUESTO PROGRAMADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
$ 44,638,495,581.58
$ 38,738,450,948.19
$ 37,049,951,332.71
$ 38,447,722,431.78
$ 34,408,452,248.73
$ 33,106,224,660.04
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
ENERO MES 17
MES 18
MES 19
MES 20
MES 21
MES 22
MES 23
MES 24
SEPT MES 25
MES 26
MES 27
MES 28
MES 29
MES 30
MES 31

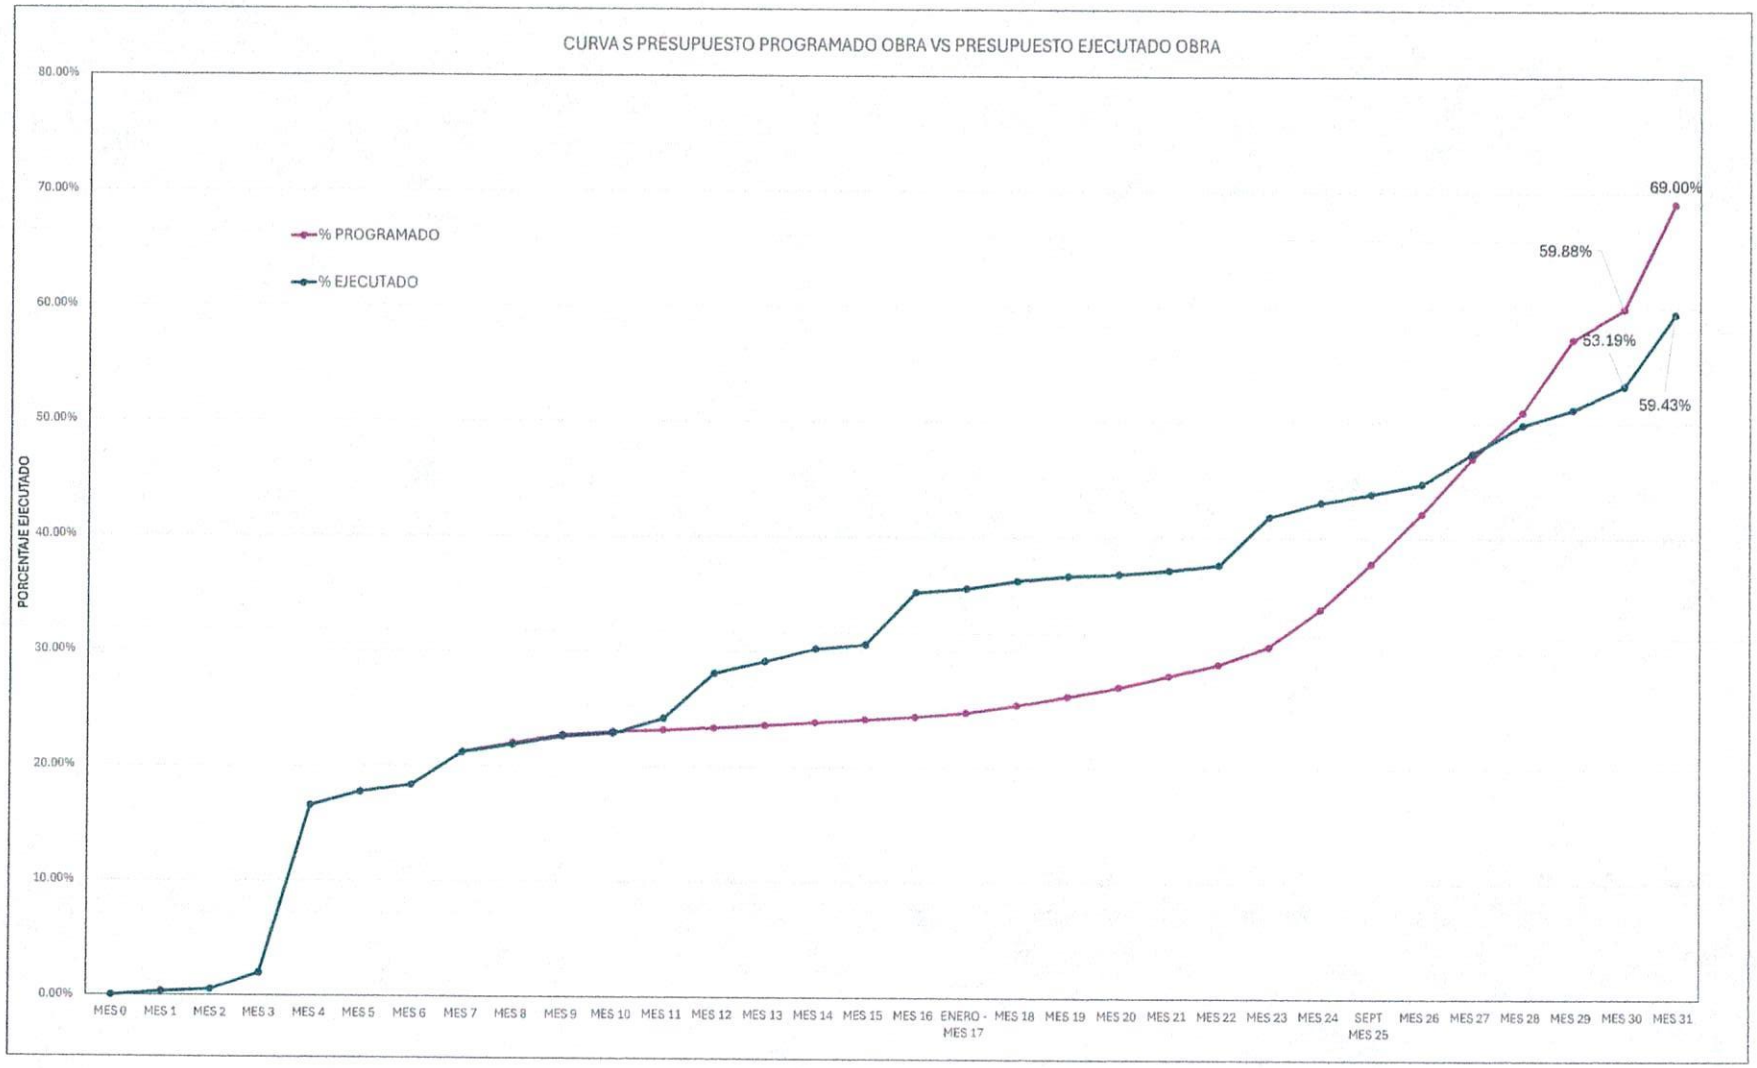
CURVA S PRESUPUESTO PROGRAMADO OBRA VS PRESUPUESTO EJECUTADO OBRA
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
PORCENTAJE EJECUTADO
% PROGRAMADO
% EJECUTADO
69.00%
59.88%
53.19%
59.43%
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
ENERO - MES 17
MES 18
MES 19
MES 20
MES 21
MES 22
MES 23
MES 24
SEPT MES 25
MES 26
MES 27
MES 28
MES 29
MES 30
MES 31

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3,02	ACERO DE REFUERZO FG					UNIDAD	KG
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	210118,80
		No Varilla	Largo (M)	Peso ml/kg	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D - PUNTO FIJO							
PLANTA NIVEL -2.95							
	Ganchos	3	0,86	0,557	135	1	64,7
VG- CIM - 4							
	Superior	7	7,33	3,042	6	1	133,8
		5	7,13	1,56	2	1	22,2
	Inferior	7	7,33	3,042	6	1	133,8
		5	7,13	1,56	2	1	22,2
	Flejes	3	2,8	0,557	45	1	70,2
	Ganchos	3	0,86	0,557	135	1	64,7
ZAPATA TIPO 2							
	RLx	6	2,2	2,25	48	1	237,6
	RLy	6	2,2	2,25	48	1	237,6
ZAPATA TIPO 5							
	RLx	6	2,45	2,25	52	1	286,7
	RLy	6	2,45	2,25	52	1	286,7
MURO 1 Y 3 DE CONTENCION							
	Vertiical Exterior	5,00	3,10	1,56	72	1,00	348,2
	Vertical Interior	5,00	3,25	1,56	72	1,00	365,0
	Longitudinal Exterior	4,00	6,20	0,996	36	1,00	222,3
	Longitudinal Interior	4,00	6,20	0,996	36	1,00	222,3
MURO 2 Y 4 DE CONTENCION							
	Vertiical Exterior	5,00	3,10	1,56	72	1,00	348,2
	Vertical Interior	5,00	3,25	1,56	72	1,00	365,0
	Longitudinal Exterior	4,00	6,75	0,996	36	1,00	242,0
	Longitudinal Interior	4,00	6,75	0,996	36	1,00	242,0
LOZA INTERIOR							
	RLx	5	4,45	1,56	36	1	249,9
	RLx	5	2,3	1,56	28	1	100,5
	RLy	5	5,13	1,56	30	1	240,1
	RLy	5	2,97	1,56	24	1	111,2
PLANTA NIVEL -1,9							
VG- CIM - D							
	Superior	6	9	2,25	4	1	81,0
		6	8,5	2,25	2	1	38,3
		6	8	2,25	6	1	108,0
	Inferior	6	6,25	2,25	6	1	84,4
		6	5,05	2,25	4	1	45,5
		6	6,95	2,25	2	1	31,3
	Flejes	4	1,46	0,996	95	1	138,1
	Ganchos	3	0,57	0,557	285	1	90,5
VG- CIM - 4'							
	Superior	6	4,3	2,25	6	1	58,1
	Inferior	6	4,3	2,25	6	1	58,1
	Flejes	4	1,46	0,996	33	1	48,0
	Ganchos	3	0,57	0,557	99	1	31,4
VG- CIM - C							
	Superior	6	5,5	2,25	6	1	74,3
	Superior	6	7,26	2,25	6	1	98,0
	Inferior	6	3,3	2,25	6	1	44,6
	Inferior	6	5,25	2,25	6	1	70,9
	Flejes	4	1,46	0,996	61	1	88,7
	Ganchos	3	0,57	0,557	183	1	58,1
VG- CIM - 3							
	Superior	6	5,5	2,25	6	1	74,3
	Superior	6	7	2,25	4	1	63,0
	Superior	6	3	2,25	2	1	13,5
	Inferior	6	3,75	2,25	4	1	33,8
	Inferior	6	5,25	2,25	6	1	70,9
	Inferior	6	7,75	2,25	2	1	34,9
	Flejes	4	1,46	0,996	67	1	97,4
	Ganchos	3	0,57	0,557	201	1	63,8
VG- CIM - 2							
	Superior	6	7,1	2,25	6	1	95,9

	Superior	6	7,1	2,25	6	1	95,9
	Inferior	6	5,3	2,25	6	1	71,6
	Inferior	6	5,3	2,25	6	1	71,6
	Flejes	4	1,46	0,996	121	1	176,0
	Ganchos	3	0,57	0,557	363	1	115,2
VG- CIM - B							
	Superior	6	9	2,25	6	1	121,5
	Superior	6	8,3	2,25	6	1	112,1
	Inferior	6	2,35	2,25	6	1	31,7
	Inferior	6	3,25	2,25	6	1	43,9
	Flejes	4	1,46	0,996	73	1	106,2
	Ganchos	3	0,57	0,557	219	1	69,5
VG- CIM - A							
	Superior	6	5,75	2,25	6	1	77,6
	Superior	6	5,75	2,25	6	1	77,6
	Inferior	6	5,05	2,25	6	1	68,2
	Inferior	6	5,05	2,25	6	1	68,2
	Flejes	4	1,46	0,996	81	1	117,8
	Ganchos	3	0,57	0,557	243	1	77,2
VG- CIM - 4							
	Superior	6	3	2,25	6	1	40,5
	Superior	6	3	2,25	6	1	40,5
	Inferior	6	7,75	2,25	6	1	104,6
	Inferior	6	7,75	2,25	6	1	104,6
	Flejes	4	1,46	0,996	67	1	97,4
	Ganchos	3	0,57	0,557	201	1	63,8
VG- CIM - 5							
	Superior	6	5,5	2,25	6	1	74,3
	Superior	6	5,5	2,25	6	1	74,3
	Inferior	6	5,5	2,25	6	1	74,3
	Inferior	6	5,5	2,25	6	1	74,3
	Flejes	4	1,46	0,996	88	1	128,0
	Ganchos	3	0,57	0,557	264	1	83,8
ZAPATA DE CIMENTACION							
Zapata tipo 1							
	RLx	6	2,15	2,25	66	1	319,3
	RLy	6	2,15	2,25	66	1	319,3
ZAPATA tipo 2							
	RLx	6	2,1	2,25	48	1	226,8
	RLy	6	2,1	2,25	48	1	226,8
Zapata tipo 3							
	RLx	6	2,3	2,25	72	1	372,6
	RLy	6	2,3	2,25	72	1	372,6
Zapata tipo 4							
	RLx	6	1,95	2,25	20	1	87,8
	RLy	6	1,95	2,25	20	1	87,8
VG- CIM - 5							
	Superior	6	2,3	2,25	6	1	31,1
	Inferior	6	2,3	2,25	6	1	31,1
	Flejes	4	1,86	0,996	16	1	29,6
	Ganchos	3	0,57	0,557	48	1	15,2

	ACUMULADO	210118,80
	ACTA MODIFICATORIA 4	199229,86
	COBRADAS PARCIAL No 1	32716,10
	COBRADAS PARCIAL No 3	115909,58
	COBRADAS PARCIAL No 4	27209,05
	COBRADAS PARCIAL No 5	11114,32
	COBRADAS PARCIAL No 6	10972,26
	COBRADAS PARCIAL No 8	1223,57
	EJECUTADOS MES DE MARZO	10973,92
OBSERVACIONES:		



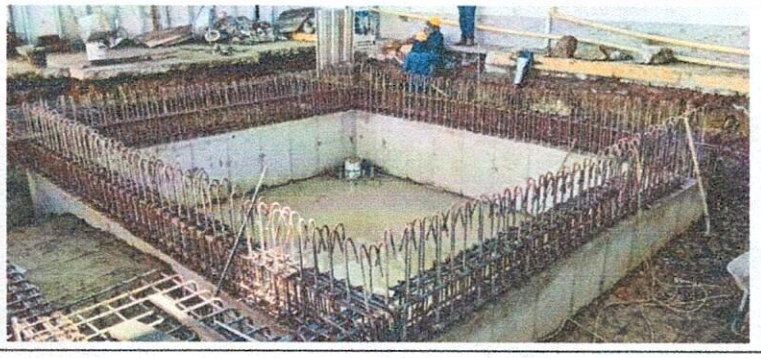

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
3,03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					UNIDAD	M2
	Largo	Ancho	ÁreaColum	ÁreaCo	Cant	TOTAL Area	4309,96 SUBTOTAL
MODULO A							
LACA N-0.10							
AREA 7						37,93	37,93
AREA 8						168,59	168,59
AREA 9						194,82	194,82
PLACA N+4.30							
AREA 6						81,01	81,01
AREA 7						33,06	33,06
AREA 8						149,95	149,95
AREA 9						170,67	170,67
AREA DE MANTENIMIENTO - ALMACEN							
PLACA DE CONTRAPISO					81,34		81,34

ACUMULADO	4309,96
ACTA MODIFICATORIA 4	5444,61
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1134,65
COBRADAS PARCIAL No 5	259,65
COBRADAS PARCIAL No 6	2300,75
COBRADAS PARCIAL No 7	500,54
COBRADAS PARCIAL No 8	412,99
EJECUTADO MES DE MARZO	836,03

OBSERVACIONES:





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS					UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	96,61
		Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
H4	LAM 1/2"	0,43	0,43	13,08			2,37
I2	LAM 5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
I3	LAM 5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
I4	LAM 5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
J2	LAM 5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
J3	LAM 5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
J4	LAM 5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
K3	LAM 1/2"	0,43	0,43	8,77			1,59
K4	LAM 1/2"	0,43	0,43	8,77			1,59
						ACUMULADO	96,61
						ACTA MODIFICATORIA 4	142,18
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	45,57
						COBRADAS PARCIAL No 6	25,46
						COBRADAS PARCIAL No 7	26,55
						COBRADAS PARCIAL No 8	18,96
						EJECUTADAS MES DE MARZO	25,64



UBICACIÓN PLANO







IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO		PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER											
ITEM No.												UNIDAD	KG
4-NP6		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36										TOTAL	188509,34
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES										
			LONG	KG/ML	CANT	AREA RIGIDIZADORES EN L	AREA RIGIDIZADORES EN RECTANGULARES	CANT. RIGIDIZADORES RECTANGULARES	AREA TOTAL RIGIDIZADORES	LAMINA A36 DE 1/2" X KG/M2	KG TOTAL VIGA	KG TOTAL RIGIDIZADORES	KG TOTAL
MODULO A													
VOLADIZO EJES A - B ENTRE EJE 3 - 4	NIVEL 3	HEA 200	6,25	42,30	1,00					99,7	264,375	0,00	264,38
VOLADIZO EJES A ENTRE EJE 2 - 3	NIVEL 3	HEA 200	5,52	42,30	1,00					99,7	233,496	0,00	233,50
VOLADIZO EJES A ENTRE EJE 3 - 4	NIVEL 3	HEA 200	9,16	42,30	2,00					99,7	775,1052	0,00	775,11
VOLADIZO EJE 4 - 4´ EJE A	NIVEL 3	HEA 200	1,38	42,30	1,00					99,7	58,374	0,00	58,37
VOLADIZO EJE 4 - 4´ EJE A	NIVEL 3	HEA 200	4,35	42,30	1,00					99,7	184,005	0,00	184,01
EJES B - C ENTRE 3 - 4	NIVEL 3	HEA 200	6,74	42,30	1,00					99,7	285,102	0,00	285,10
VOLADIZO B - C EJE 4	NIVEL 3	HEA 200	6,76	42,30	1,00					99,7	285,7365	0,00	285,74
VOLADIZO B - C ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3	HEA 200	6,76	42,30	2,00					99,7	571,896	0,00	571,90
VOLADIZO C - D ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 400	6,67	66,30	1,00		0,06		0,060	99,7	442,221	5,98	448,20
VOLADIZO C - D ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 360	6,70	57,10	1,00		0,06		0,060	99,7	382,57	5,98	388,55
EJES C - D ENTRE 3 - 4	NIVEL 3	HEA 200	4,18	42,30	1,00					99,7	176,814	0,00	176,81
VOLADIZO C - D EJE 4	NIVEL 3	HEA 200	4,18	42,30	1,00					99,7	176,814	0,00	176,81
VOLADIZO D - E ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 400	6,67	66,30	1,00	0,10			0,100		442,221	0,00	442,22
VOLADIZO D - E ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 360	6,70	57,10	1,00	0,10			0,100		382,57	0,00	382,57
EJES D - E ENTRE 3 - 4	NIVEL 3	HEA 200	6,82	42,30	1,00						288,486	0,00	288,49
VOLADIZO D - E EJE 4	NIVEL 3	HEA 200	6,81	42,30	1,00					99,7	288,063	0,00	288,06
EJES E - F ENTRE 3 - 4	NIVEL 3	HEA 200	7,99	42,30	1,00					99,7	337,977	0,00	337,98
VOLADIZO E - F ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 400	8,04	66,30	1,00	0,13			0,130		533,052	0,00	533,05
VOLADIZO E - F ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 360	8,02	57,10	1,00	0,13			0,130		457,942	0,00	457,94
VOLADIZO E - F EJE 4	NIVEL 3	HEA 200	8,00	42,30	1,00					99,7	338,4	0,00	338,40
VOLADIZO F - G ENTRE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 400	8,30	66,30	1,00	0,13			0,130	99,7	550,29	12,96	563,25
VOLADIZO F - G ENTRE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 360	8,34	57,10	1,00	0,13			0,130	99,7	476,214	12,96	489,18
EJES F - G ENTRE 3 - 4	NIVEL 3	HEA 200	8,46	42,30	1,00					99,7	357,858	0,00	357,86
EJES G - H ENTRE 3 - 4	NIVEL 3	IPE 360	7,99	57,10	1,00				0,000	99,7	456,229	0,00	456,23
VOLADIZO G - H ENTRE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 400	7,99	66,30	1,00				0,000	99,7	529,737	0,00	529,74
VOLADIZO G - H ENTRE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 360	7,99	57,10	1,00				0,000	99,7	456,229	0,00	456,23
VOLADIZO EJES G - H EJE 4	NIVEL 3	HEA 200	7,92	42,30	1,00					99,7	335,016	0,00	335,02
EJES H - I ENTRE 3 - 4	NIVEL 3	IPE 360	9,87	57,10	1,00		0,16		0,160	99,7	563,577	15,95	579,53
VOLADIZO H - I ENTRE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 400	9,88	66,30	1,00		0,16		0,160	99,7	655,707	15,95	671,66
VOLADIZO H - I ENTRE 1 - 2	NIVEL 3	IPE 360	9,89	57,10	1,00		0,16		0,160	99,7	564,719	15,95	580,67

ACUMULADO MOD A	188509,34
ACUMULADO MODULO D CUBIERTA	15035,15
ACUMULADO MODULO D	55632,70
ACTA MODIFICATORIA 4	269201,99
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	24,80
COBRADAS PARCIAL No 1	167821,87
COBRADAS PARCIAL No 6	27705,32
COBRADAS PARCIAL No 7	15035,15
COBRADAS PARCIAL No 8	36863,40
EJECUTADAS MES DE MARZO	11951,45

OBSERVACIONES:









UBICACION PLANO



IMAGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO		PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER										UNIDAD	KG
ITEM No.		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE RIOSTRAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36										TOTAL	13099,26
4-NP8		DIMENSIONES											
LOCALIZACIÓN		LONG	KG/ML	CANT	AREA RIGIDIZADORES EN L	AREA RIGIDIZADORES EN RECTANGULARES	AREA CONEXIÓN ENTRE VIGA Y PLATINA (M2)	AREA TOTAL RIGIDIZADORES	LAMINA A36 DE 1/2" X KG/M2	KG TOTAL VIGA	KG TOTAL RIGIDIZADORES	KG TOTAL	
MODULO A													
VOLADIZO EJE E - F ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 2	HEA 200	1,21	42,30	1,00					99,7	50,9715	0,00	50,97
VOLADIZO EJE E - F ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 2	HEA 200	1,58	42,30	1,00					99,7	66,6225	0,00	66,62
VOLADIZO EJE E - F ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 2	IPE 300	2,59	42,30	1,00					99,7	109,557	0,00	109,56
EJE 2 ENTRE I-J	NIVEL 3	IPE 400	5,43	66,30	1,00		0,13		0,130	99,7	360,009	12,96	372,97
EJE J ENTRE 2-3	NIVEL 3	IPE 400	5,07	66,30	1,00					99,7	336,141	0,00	336,14
EJE J ENTRE 1-2	NIVEL 1	IPE 400	3,95	66,30	1,00	0,16			0,160	99,7	261,885	15,95	277,84
VOLADIZO EJE H - I ENTRE 1 - 2	NIVEL 2	IPE 400	3,70	66,30	5,00				0,000	99,7	1226,55	0,00	1226,55
EJE 3 ENTRE H-I	NIVEL 1	IPE 500	9,42	90,70	1,00		0,10		0,100	99,7	854,394	9,97	864,36
EJES H - I ENTRE 3 - 4	NIVEL 2	IPE 400	9,09	66,30	2,00				0,000	99,7	1205,334	0,00	1205,33
PORCENTAJE DE SOLDADURA 1.8%													231,62
												ACUMULADO	13099,26
												ACTA MODIFICATORIA 4	12767,86
												SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	-331,40
												COBRADAS PARCIAL No 1	8515,94
												EJECUTADAS MES DE MARZO	4583,32
OBSERVACIONES:													



UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
4-NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36					UNIDAD	KG
		DIMENSIONES				TOTAL	74934,26
LOCALIZACIÓN		Area columna	Kg/m2	Kg platinas	Kg rigidizadores internos	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D - PUNTO FIJO							
A4	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
A5	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
B2	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
A4	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
A5	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
B3	COLUMNA 450X450MMX 10.41ML	18,23832	99,70	12,64	93,12	1,00	1924,12
B4	COLUMNA 450X450MMX 10.41ML	18,23832	99,70	12,64	93,12	1,00	1924,12
C3	COLUMNA 450X450MMX 10.41ML	18,23832	99,70	12,64	93,12	1,00	1924,12
C4	COLUMNA 450X450MMX 10.41ML	18,23832	99,70	12,64	93,12	1,00	1924,12
D1	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
D2	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
D3	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
MODULO A - PUNTO FIJO							
A1	COLUMNA 450X450	22,89	99,70	205,20	7,18	1,00	2494,51
A2	COLUMNA 450X450	22,89	99,70	205,20	7,18	1,00	2494,51
A3	COLUMNA 450X450	22,89	99,70	205,20	7,18	1,00	2494,51
B1	COLUMNA 450X450	22,89	99,70	205,20	7,18	1,00	2494,51
PORCENTAJE DE SOLDADURA 1.8%							553,55

ACUMULADO	74934,26
ACUMULADO No 2	13939,48
ACTA MODIFICATORIA 4	74646,63
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	-14027,11
COBRADAS PARCIAL No 1	32417,77
COBRADAS PARCIAL No 2	11210,42
EJECUTADAS MES DE MARZO	45245,56

OBSERVACIONES:	



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE
GARCIA ROVIRA

PROYECTO		PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER										UNIDAD	KG
ITEM No.													
4-NP9		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36										TOTAL	13839,48
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES											
		LONG	KG/ML	CANT	AREA RIGIDIZADORES EN L	AREA RIGIDIZADORES EN RECTANGULARES	CANT. RIGIDIZADORES RECTANGULARES	AREA TOTAL RIGIDIZADORES	LAMINA A36 DE 1/2" X KG/M2	KG TOTAL VIGA	KG TOTAL RIGIDIZADORES	KG TOTAL	
MODULO A													
VIGAS PRINCIPALES													
EJES H - I ENTRE 1 - 2	NIVEL 1	IPE 400	9,86	66,30	2,00	0,16			0,320	99,7	1307,436	31,80	1338,34
EJES H - I ENTRE 2 - 3	NIVEL 1	IPE 400	9,86	66,30	3,00	0,16			0,480	99,7	1961,154	47,86	2009,01
EJES J - K ENTRE 3 - 4	NIVEL 1	IPE 360	8,15	57,10	2,00	0,11			0,220	99,7	930,73	21,93	952,66
EJES J - K ENTRE 3 - 4	NIVEL 1	IPE 400	8,15	66,30	3,00	0,26			0,760	99,7	1621,035	77,77	1698,80
EJES H - I ENTRE 2 - 3	NIVEL 2	IPE 400	9,83	66,30	2,00		0,19		0,380	99,7	1303,458	37,89	1341,34
EJES H - I ENTRE 3 - 4	NIVEL 2	IPE 400	9,83	66,30	5,00		0,19		0,950	99,7	3258,645	94,72	3353,36
EJES J - K ENTRE 3 - 4	NIVEL 2	IPE 360	8,15	57,10	5,00		0,21		1,050	99,7	2326,825	104,69	2431,51
VOLADIZO EJE J COSTADO EJE 1	NIVEL 2	HEA 450	3,53	140,00	1,00		0,73		0,730	99,7	494,2	72,78	566,98
PORCENTAJE DE SOLDADURA 1.8%													248,47
												ACUMULADO No 2 MOD A	13839,48
OBSERVACIONES:													









UBICACION PLANO



IMAGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
ITEM No.						
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO				UNIDAD	M2
					TOTAL	3093,74
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Elementos	SUBTOTAL
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ares		
MODULO A						
PLACA N-0.10						
AREA 8						168,59
AREA 9						194,82
PLACA N+4.30						
AREA 8						149,95
AREA 9						170,67

ACUMULADO	3093,74
ACTA MODIFICATORIA 4	3169,96
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1454,54
COBRADAS PARCIAL No 5	121,58
COBRADAS PARCIAL No 6	1593,84
COBRADAS PARCIAL No 7	542,29
COBRADAS PARCIAL No 8	231,58
EJECUTADAS MES DE MARZO	604,45

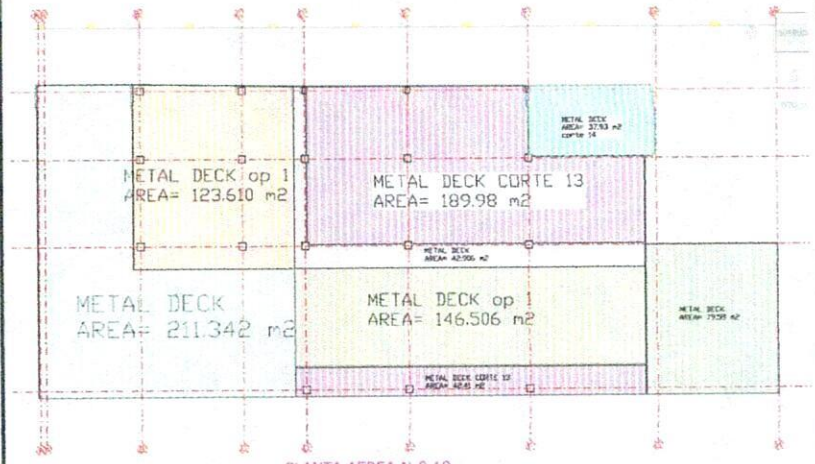

PLANTA AEREA N-0.10

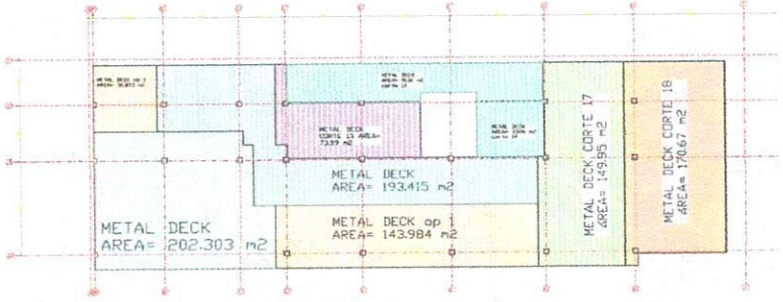

PLANTA AEREA N+4.30

UBICACIÓN PLANO







IMÁGENES


ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
5,01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS					UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	1848,95
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area	Cant	SUBTOTAL
MODULO A							
Teja Castellana		0,9	1,5		1,35	650,00	877,50
							0,00
						ACUMULADO	1848,95
						ACTA MODIFICATORIA 4	2415,10
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	566,15
						COBRADAS PARCIAL No 2	150,00
						COBRADAS PARCIAL No 3	82,52
						COBRADAS PARCIAL No 6	119,80
						COBRADAS PARCIAL No 7	619,13
						EJECUTADAS MES DE MARZO	877,50
OBSERVACIONES:							

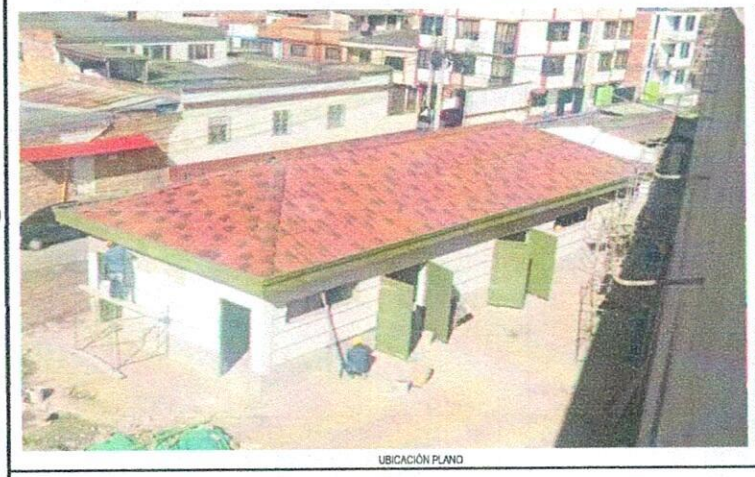

UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES


ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
10.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO ESTANDAR 10kVA PARA QUIROFANO.				TOTAL	2,00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
UCI				2,00		
CUARTO ELECTRICO				2,00		2,00
				ACUMULADO		2,00
				ACTA MODIFICATORIA 4		6,00
				SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		4,00
				EJECUTADAS MES DE MARZO		2,00
OBSERVACIONES:						



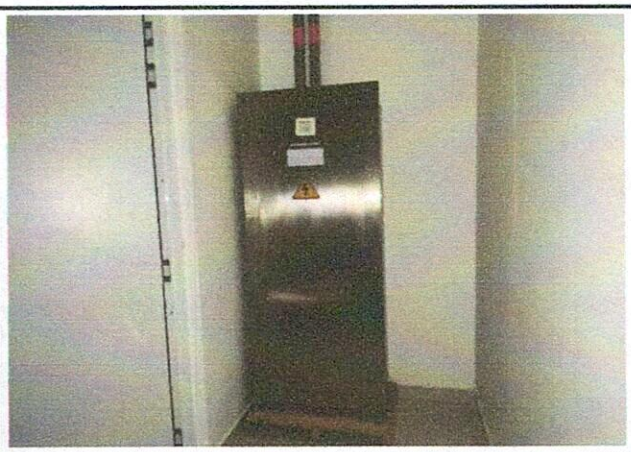

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP147	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA HOJA (APERTURA UNIDIRECCION) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	152,84
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
MODULO D						
PRIMER PISO						
TERAPIA OCUPACIONAL CUBICULO 1	1,00		2,40		1,00	2,40
BAÑO VESTIER PERSONAL	1,00		2,40		1,00	2,40
BAÑO VESTIER PERSONAL	1,00		2,40		1,00	2,40
TERAPIA PEDIATRICOS	1,00		2,40		1,00	2,40
BAÑO TERAPIA PEDIATRICOS	1,00		2,40		1,00	2,40
LOKER TERAPIA PEDIATRICOS	1,00		2,40		1,00	2,40
BAÑO VESTIER PACIENTES	1,00		2,40		1,00	2,40
BAÑO VESTIER PACIENTES	1,00		2,40		1,00	2,40

ACUMULADO	152,84
ACTA MODIFICATORIA 4	153,68
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,84
COBRADAS PARCIAL No 5	81,56
COBRADAS PARCIAL No 6	42,64
EJECUTADO MES DE MARZO	28,64

OBSERVACIONES:



UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER		
12-NP148	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON DOBLE HOJA (APERTURA VAIVEN) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	9,60
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
MODULO D						
SALA DE REANIMACION	2,00		2,40		1,00	4,80
GIMNASIO	2,00		2,40		1,00	4,80

	ACUMULADO	9,60
	ACTA MODIFICATORIA 4	27,00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	17,40
	EJECUTADO MES DE MARZO	9,60

OBSERVACIONES:



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
28-NPS8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450KG, 2 PARADAS Y CAPACIDAD DE 6 PASAJEROS				UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	2,00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
PUNTO FIJO MODULO D						
ASCENSOR PASAJEROS					2,00	2,00
						0,00

	ACUMULADO	2,00
	ACTA MODIFICATORIA 4	2,00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00
	EJECUTADO MES DE MARZO	2,00
OBSERVACIONES:		



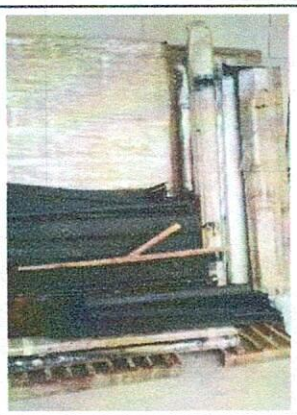



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3,02	ACERO DE REFUERZO FG					UNIDAD	KG
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	199225,09
		No Varilla	Largo (M)	Peso ml/kg	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
MODULO D - PUNTO FIJO							
VG- CIM - D							
	Inferior	6	6,25	2,25	6	1	84,4
						ACUMULADO	199225,09
						ACTA MODIFICATORIA 4	199229,86
						SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	4,77
						COBRADAS PARCIAL No 1	32716,10
						COBRADAS PARCIAL No 3	115909,58
						COBRADAS PARCIAL No 4	27209,05
						COBRADAS PARCIAL No 5	11114,32
						COBRADAS PARCIAL No 6	10972,26
						COBRADAS PARCIAL No 8	1223,57
						COBRADAS PARCIAL No 9	84,40
OBSERVACIONES:							



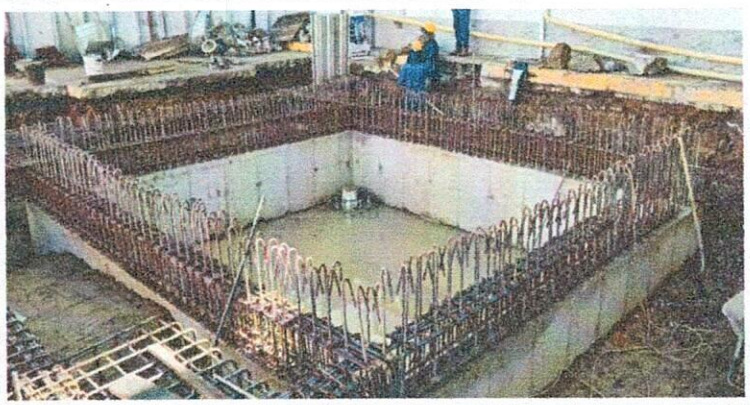

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
3,03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6					UNIDAD	M2
						TOTAL	4309,96
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
	Largo	Ancho	ÁreaColum	ÁreaCo	Cant	Area	SUBTOTAL
CENTRAL DE RESIDUOS							
CENTRAL DE RESIDUOS	12,30	5,75	0,99	0,128	70	69,61	69,61
AREA DE FARMACIA							
FARMACIA						190,04	190,04
MODULO D							
PRIMER PISO					2	567,90	1135,80
SEGUNGO PISO					1	567,90	567,90
SEGUNGO PISO VOLADO	10,87	2,35			1	25,54	25,54
DESCUENTO AREA COLUMNAS 0.5X0.50	0,50	0,50			-11	-2,75	-2,75
DESCUENTO AREA COLUMNA CIRCULAR					-1	-0,20	-0,20
DESCUENTO AREA COLUMNA HEB	0,24	0,23			-4	-0,22	-0,22
MODULO A							
PLACA N-0.10							
AREA 1						211,34	211,34
AREA 2						123,61	123,61
AREA 3						189,98	189,98
AREA 4						42,91	42,91
AREA 5						146,51	146,51
AREA 6						42,41	42,41
AREA 7						37,93	37,93
AREA 8						168,59	168,59
AREA 9						194,82	194,82
PLACA N+4.30							
AREA 1						36,83	36,83
AREA 2						202,30	202,30
AREA 3						73,59	73,59
AREA 4						193,42	193,42
AREA 5						143,98	143,98
AREA 6						81,01	81,01
AREA 7						33,06	33,06
AREA 8						149,95	149,95
AREA 9						170,67	170,67
AREA DE MANTENIMIENTO - ALMACEN							
PLACA DE CONTRAPISO					81,34		81,34

	ACUMULADO	4309,96
	ACTA MODIFICATORIA 4	5444,61
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1134,65
	COBRADAS PARCIAL No 5	259,65
	COBRADAS PARCIAL No 6	2300,75
	COBRADAS PARCIAL No 7	500,54
	COBRADAS PARCIAL No 8	412,99
	COBRADAS PARCIAL No 9	836,03
OBSERVACIONES:		



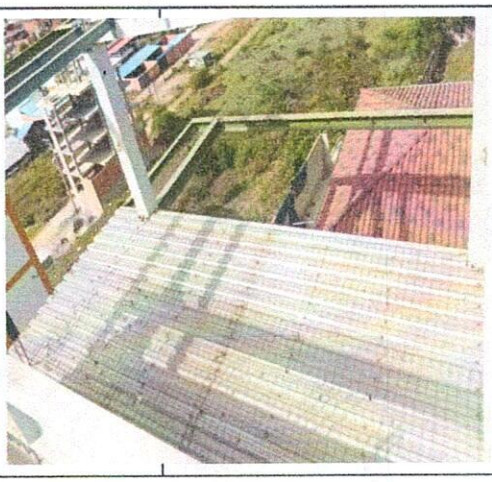



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP 75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES					UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	95,44
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad		Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
EJE J-2	1,50	1,50	0,70	1		1	1,58
					ACUMULADO		95,44
					ACTA MODIFICATORIA 4		111,63
					SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		16,19
					COBRADAS PARCIAL No 3		82,79
					COBRADAS PARCIAL No 4		1,73
					COBRADAS PARCIAL No 6		9,34
					COBRADAS PARCIAL No 9		1,58



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER						
ITEM No.							
NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS					UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL	96,61
		Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A							
H2	1/2"	0,43	0,43	13,08			2,37
H3	1/2"	0,43	0,43	13,08			2,37
H4	1/2"	0,43	0,43	13,08			2,37
I2	5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
I3	5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
I4	5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
J2	5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
J3	5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
J4	5/8"	0,47	0,47	13,08			2,89
K3	1/2"	0,43	0,43	8,77			1,59
K4	1/2"	0,43	0,43	8,77			1,59

ACUMULADO	96,61
ACTA MODIFICATORIA 4	142,18
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	45,57
COBRADAS PARCIAL No 6	25,46
COBRADAS PARCIAL No 7	26,55
COBRADAS PARCIAL No 8	18,96
COBRADAS PARCIAL No 9	25,64

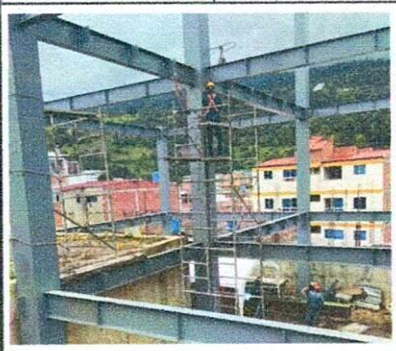

UBICACIÓN PLANO



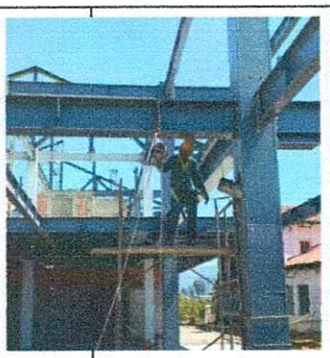



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36

			DIMENSIONES			UNIDAD	M3
						TOTAL	133488,51
LOCALIZACIÓN		Area acero exterior	Kg/m2	Kg interno	Kg rigidizadores internos	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D - PUNTO FIJO							
A2	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
PORCENTAJE DE SOLDADURA 1.8%							2360,31

	ACUMULADO	133488,51
	ACTA MODIFICATORIA 4	133654,73
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	166,22
	COBRADAS PARCIAL No 1	73033,33
	COBRADAS PARCIAL No 6	22059,84
	COBRADAS PARCIAL No 7	29210,71
	COBRADAS PARCIAL No 8	7520,46
	COBRADAS PARCIAL No 9	1664,17



UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO		PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER											
ITEM No.												UNIDAD	KG
4-NP6		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36										TOTAL	188509,34
		DIMENSIONES											
LOCALIZACIÓN		LONG	KG/ML	CANT	AREA RIGIDIZADORES EN L	AREA RIGIDIZADORES EN RECTANGULARES	CANT. RIGIDIZADORES RECTANGULARES	AREA TOTAL RIGIDIZADORES	LAMINA A36 DE 1/2" X KG/M2	KG TOTAL VIGA	KG TOTAL RIGIDIZADORES	KG TOTAL	
MODULO A													
VOLADIZO EJES A - B ENTRE EJE 3 - 4	NIVEL 3 HEA 200	6,25	42,30	1,00					99,7	264,375	0,00	264,38	
VOLADIZO EJES A ENTRE EJE 2 - 3	NIVEL 3 HEA 200	5,52	42,30	1,00					99,7	233,496	0,00	233,50	
VOLADIZO EJES A ENTRE EJE 3 - 4	NIVEL 3 HEA 200	9,16	42,30	2,00					99,7	775,1052	0,00	775,11	
VOLADIZO EJE 4 - 4´ EJE A	NIVEL 3 HEA 200	1,38	42,30	1,00					99,7	58,374	0,00	58,37	
VOLADIZO EJE 4 - 4´ EJE A	NIVEL 3 HEA 200	4,35	42,30	1,00					99,7	184,005	0,00	184,01	
EJES B - C ENTRE 3 - 4	NIVEL 3 HEA 200	6,74	42,30	1,00					99,7	285,102	0,00	285,10	
VOLADIZO B - C EJE 4	NIVEL 3 HEA 200	6,76	42,30	1,00					99,7	285,7365	0,00	285,74	
VOLADIZO B - C ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3 HEA 200	6,76	42,30	2,00					99,7	571,896	0,00	571,90	
VOLADIZO C - D ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 400	6,67	66,30	1,00		0,06		0,060	99,7	442,221	5,98	448,20	
VOLADIZO C - D ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 360	6,70	57,10	1,00		0,06		0,060	99,7	382,57	5,98	388,55	
EJES C - D ENTRE 3 - 4	NIVEL 3 HEA 200	4,18	42,30	1,00					99,7	176,814	0,00	176,81	
VOLADIZO C - D EJE 4	NIVEL 3 HEA 200	4,18	42,30	1,00					99,7	176,814	0,00	176,81	
VOLADIZO D - E ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 400	6,67	66,30	1,00	0,10			0,100		442,221	0,00	442,22	
VOLADIZO D - E ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 360	6,70	57,10	1,00	0,10			0,100		382,57	0,00	382,57	
EJES D - E ENTRE 3 - 4	NIVEL 3 HEA 200	6,82	42,30	1,00						288,486	0,00	288,49	
VOLADIZO D - E EJE 4	NIVEL 3 HEA 200	6,81	42,30	1,00					99,7	288,063	0,00	288,06	
EJES E - F ENTRE 3 - 4	NIVEL 3 HEA 200	7,99	42,30	1,00					99,7	337,977	0,00	337,98	
VOLADIZO E - F ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 400	8,04	66,30	1,00	0,13			0,130		533,052	0,00	533,05	
VOLADIZO E - F ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 360	8,02	57,10	1,00	0,13			0,130		457,942	0,00	457,94	
VOLADIZO E - F EJE 4	NIVEL 3 HEA 200	8,00	42,30	1,00					99,7	338,4	0,00	338,40	
VOLADIZO F - G ENTRE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 400	8,30	66,30	1,00	0,13			0,130	99,7	550,29	12,96	563,25	
VOLADIZO F - G ENTRE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 360	8,34	57,10	1,00	0,13			0,130	99,7	476,214	12,96	489,18	
EJES F - G ENTRE 3 - 4	NIVEL 3 HEA 200	8,46	42,30	1,00					99,7	357,858	0,00	357,86	
EJES G - H ENTRE 3 - 4	NIVEL 3 IPE 360	7,99	57,10	1,00				0,000	99,7	456,229	0,00	456,23	
VOLADIZO G - H ENTRE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 400	7,99	66,30	1,00				0,000	99,7	529,737	0,00	529,74	
VOLADIZO G - H ENTRE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 360	7,99	57,10	1,00				0,000	99,7	456,229	0,00	456,23	
VOLADIZO EJES G - H EJE 4	NIVEL 3 HEA 200	7,92	42,30	1,00					99,7	335,016	0,00	335,02	
EJES H - I ENTRE 3 - 4	NIVEL 3 IPE 360	9,87	57,10	1,00		0,16		0,160	99,7	563,577	15,95	579,53	
VOLADIZO H - I ENTRE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 400	9,89	66,30	1,00		0,16		0,160	99,7	655,707	15,95	671,66	
VOLADIZO H - I ENTRE 1 - 2	NIVEL 3 IPE 360	9,89	57,10	1,00		0,16		0,160	99,7	564,719	15,95	580,67	

ACUMULADO MOD A	188509,34
ACUMULADO MODULO D CUBIERTA	15035,15
ACUMULADO MODULO D	55632,70
ACTA MODIFICATORIA 4	259201,99
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	24,80
COBRADAS PARCIAL No 1	167621,87
COBRADAS PARCIAL No 6	27705,32
COBRADAS PARCIAL No 7	15035,15
COBRADAS PARCIAL No 8	36863,40
COBRADAS PARCIAL No 9	11951,45

OBSERVACIONES:









UBICACION PLANO



IMAGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

PROYECTO		PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.		
4-NP8		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE RIOSTRAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES LONG	KG/ML	CANT	AREA RIGIDIZADORES EN L	AREA RIGIDIZADORES EN RECTANGULARES	AREA CONEXIÓN ENTRE VIGA Y PLATINA (M2)	AREA TOTAL RIGIDIZADORES	LAMINA A36 DE 1/2" X KG/M2	KG TOTAL VIGA	UNIDAD / TOTAL KG TOTAL RIGIDIZADORES	KG TOTAL
												UNIDAD	KG
												TOTAL	12757,07
MODULO A													
VOLADIZO EJE E - F ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 2	HEA 200	1,21	42,30	1,00					99,7	50,9715	0,00	50,97
VOLADIZO EJE E - F ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 2	HEA 200	1,58	42,30	1,00					99,7	66,6225	0,00	66,62
VOLADIZO EJE E - F ENTRE EJE 1 - 2	NIVEL 2	IPE 300	2,59	42,30	1,00					99,7	109,557	0,00	109,56
EJE 2 ENTRE I-J	NIVEL 3	IPE 400	5,43	66,30	1,00		0,13		0,130	99,7	360,009	12,96	372,97
EJE J ENTRE 1-2	NIVEL 1	IPE 400	3,95	66,30	1,00	0,16			0,160	99,7	261,885	15,95	277,84
VOLADIZO EJE H - I ENTRE 1 - 2	NIVEL 2	IPE 400	3,70	66,30	5,00				0,000	99,7	1226,55	0,00	1226,55
EJE 3 ENTRE H-I	NIVEL 1	IPE 500	9,42	90,70	1,00		0,10		0,100	99,7	854,394	9,97	864,36
EJES H - I ENTRE 3 - 4	NIVEL 2	IPE 400	9,09	66,30	2,00				0,000	99,7	1205,334	0,00	1205,33
PORCENTAJE DE SOLDADURA 1.8%													225,57

ACUMULADO	12757,07
ACTA MODIFICATORIA 4	12767,86
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	10,79
COBRADAS PARCIAL No 1	8515,94
COBRADAS PARCIAL No 9	4241,13

OBSERVACIONES:



UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
4-NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36

						UNIDAD	KG
		DIMENSIONES				TOTAL	60898,53
LOCALIZACIÓN		Area columna	Kg/m2	Kg platinas	Kg rigidizadores internos	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D - PUNTO FIJO							
A4	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
A5	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
B2	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
A4	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
A5	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1634,75
B3	COLUMNA 450X450MMX 10.41ML	18,23832	99,70	12,64	93,12	1,00	1924,12
B4	COLUMNA 450X450MMX 10.41ML	18,23832	99,70	12,64	93,12	1,00	1924,12
C3	COLUMNA 450X450MMX 10.41ML	18,23832	99,70	12,64	93,12	1,00	1924,12
C4	COLUMNA 450X450MMX 10.41ML	18,23832	99,70	12,64	93,12	1,00	1924,12
D1	COLUMNA 450X450MMX 8.86ML	15,52272	99,70	12,64	74,496	1,00	1094,75
PORCENTAJE DE SOLDADURA 1.8%							305,37

	ACUMULADO	60898,53
	ACUMULADO No 2	13939,48
	ACTA MODIFICATORIA 4	74846,53
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	8,62
	COBRADAS PARCIAL No 1	32417,77
	COBRADAS PARCIAL No 2	11210,42
	COBRADAS PARCIAL No 9	31209,83

OBSERVACIONES:



ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO


UNIDAD	M2
TOTAL	3093,74

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ares	Elementos	SUBTOTAL
MODULO A						
PLACA N-0.10						
AREA 8						168,59
AREA 9						194,82
PLACA N+4.30						
AREA 8						149,95
AREA 9						170,67

ACUMULADO	3093,74
ACTA MODIFICATORIA 4	3169,96
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	1454,54
COBRADAS PARCIAL No 5	121,58
COBRADAS PARCIAL No 6	1593,84
COBRADAS PARCIAL No 7	542,29
COBRADAS PARCIAL No 8	231,58
COBRADAS PARCIAL No 9	604,45

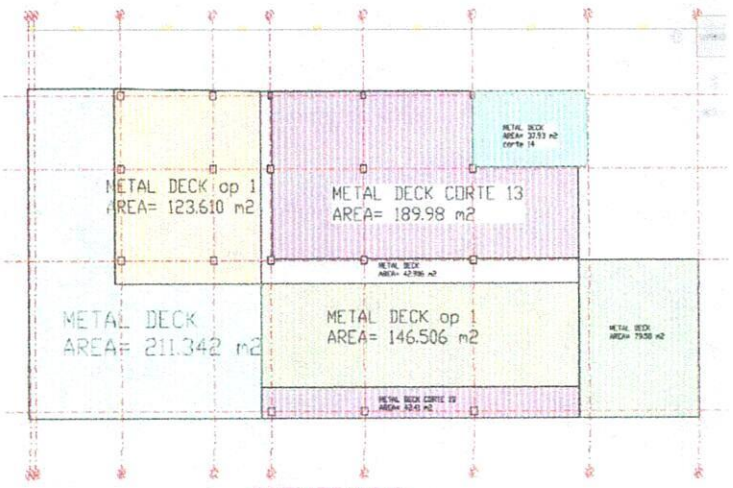

PLANTA AEREA N-0.10

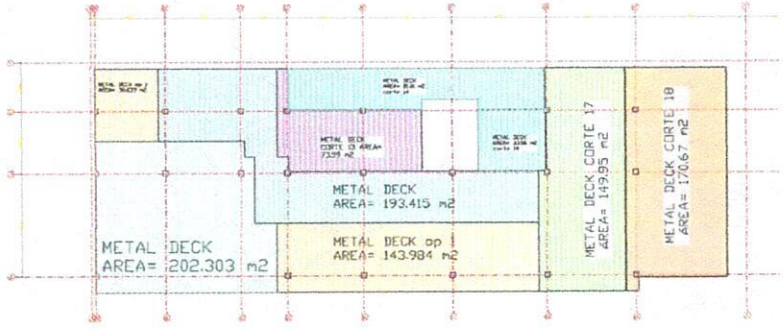

PLANTA AEREA N+4.30

UBICACIÓN PLANO







IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES

RESIDENTE DE OBRA

UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

5,01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS				UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	1848,95
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area	Cant	SUBTOTAL
MODULO A						
Teja Castellana	0,9	1,5		1,35	650,00	877,50
						0,00

ACUMULADO	1848,95
ACTA MODIFICATORIA 4	2415,10
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	566,15
COBRADAS PARCIAL No 2	150,00
COBRADAS PARCIAL No 3	82,52
COBRADAS PARCIAL No 6	119,80
COBRADAS PARCIAL No 7	619,13
COBRADAS PARCIAL No 9	877,50

OBSERVACIONES:

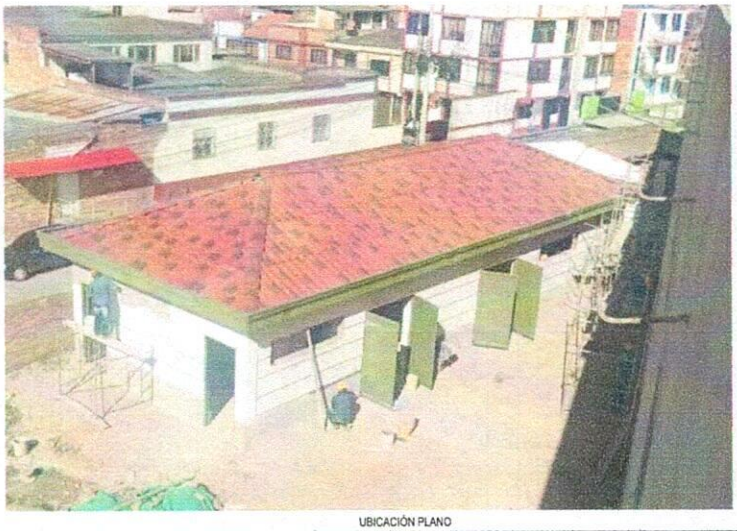

UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	


7-NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DRENAJE DE 60X60 CM DE TUBERIA PERFORADA DE 6 PULG. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA FILTRANTE DE 1" A 3"	UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	115,24
	Longitud (L)	Ancho (A)	Alto (h)	Cantidad	Elementos	SUBTOTAL
MODULO ZONA DE AMBULANCIAS						
MURO DE CONTENCION H=5.90 MTS LONG ITEM 3.07	41,24					41,24

	ACUMULADO	115,24
	ACTA MODIFICATORIA 3	160,00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	44,76
	COBRADAS PARCIAL No 3	59,90
	COBRADAS PARCIAL No 4	24,57
	COBRADAS PARCIAL No 9	30,77

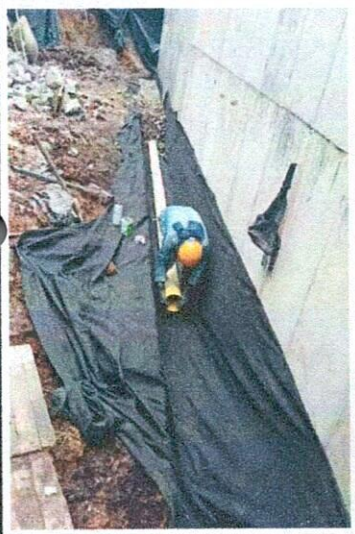



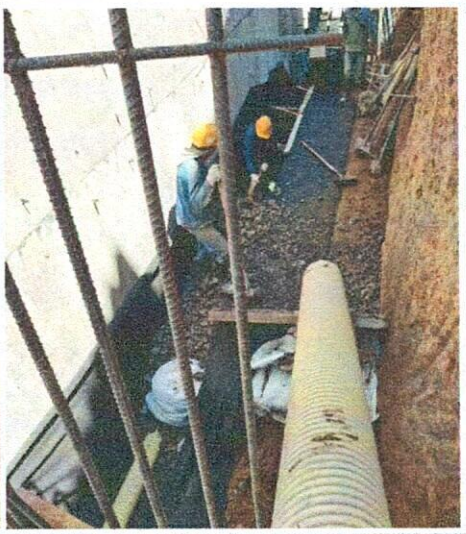

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL


PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

9,46	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETRO HASTA 2"	UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	188,67
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area	Elementos	SUBTOTAL
MODULO D						
TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2"		59,30				59,30
TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1-1/2"		41,10				10,10
TUBERIA HG DE 1"		243,92				

	ACUMULADO	188,67
	ACTA MODIFICATORIA 4	188,87
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,20
	COBRADAS PARCIAL No 4	119,27
	COBRADAS PARCIAL No 9	69,40
OBSERVACIONES:		

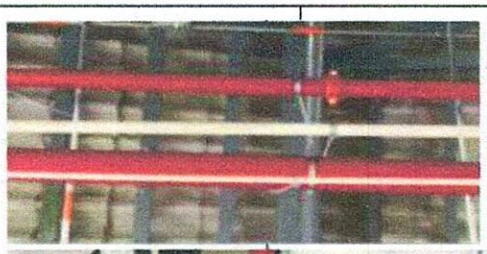

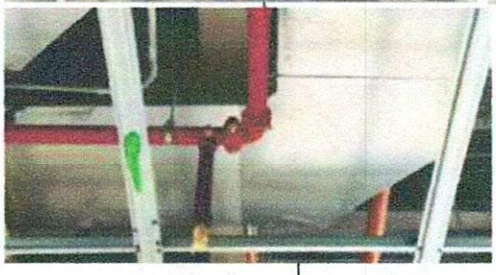ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL

PROYECTO ITEM No.	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER					
10.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO ESTANDAR 10kVA PARA QUIROFANO.				TOTAL	2,00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UND	
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Cantidad		
UCI				2,00		
CUARTO ELECTRICO				2,00		2,00
				ACUMULADO		2,00
				ACTA MODIFICATORIA 4		6,00
				SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		4,00
				COBRADAS PARCIAL No 9		2,00
OBSERVACIONES:						





ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
NP147	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA HOJA (APERTURA UNIDIRECCION) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	152,84
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
MODULO D						
PRIMER PISO						
TERAPIA OCUPACIONAL CUBICULO 1	1,00		2,40		1,00	2,40
BAÑO VESTIER PERSONAL	1,00		2,40		1,00	2,40
BAÑO VESTIER PERSONAL	1,00		2,40		1,00	2,40
TERAPIA PEDIATRICOS	1,00		2,40		1,00	2,40
BAÑO TERAPIA PEDIATRICOS	1,00		2,40		1,00	2,40
LOKER TERAPIA PEDIATRICOS	1,00		2,40		1,00	2,40
BAÑO VESTIER PACIENTES	1,00		2,40		1,00	2,40
BAÑO VESTIER PACIENTES	1,00		2,40		1,00	2,40

ACUMULADO	152,84
ACTA MODIFICATORIA 4	153,68
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,84
COBRADAS PARCIAL No 5	81,56
COBRADAS PARCIAL No 6	42,64
COBRADAS PARCIAL No 9	28,64

OBSERVACIONES:



UBICACIÓN PLANO



IMÁGENES

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	
12-NP148	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON DOBLE HOJA (APERTURA VAIVEN) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	9,60
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
MODULO D						
SALA DE REANIMACION	2,00		2,40		1,00	4,80
GIMNASIO	2,00		2,40		1,00	4,80

	ACUMULADO	9,60
	ACTA MODIFICATORIA 4	27,00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	17,40
	COBRADAS PARCIAL No 9	9,60
OBSERVACIONES:		

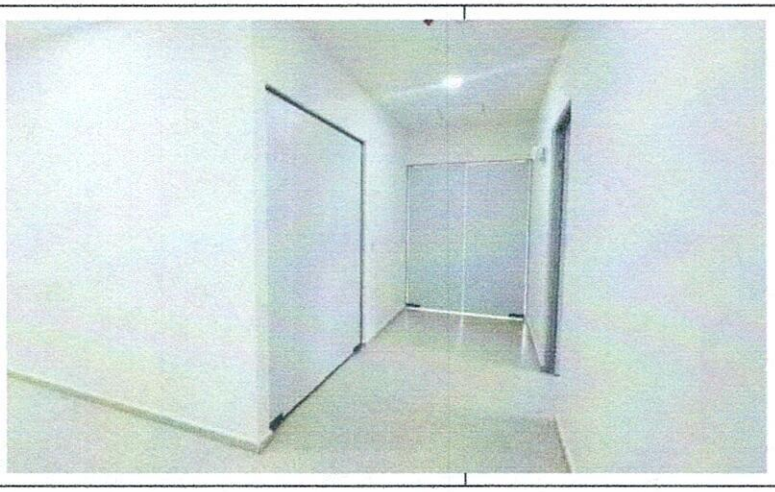

ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INTER HOSPITAL

PROYECTO	PROYECTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER
ITEM No.	

28-NPS8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450KG, 2 PARADAS Y CAPACIDAD DE 6 PASAJEROS				UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	2,00
	Ancho	Largo (M)	Alto	Area (m)	Cant	
PUNTO FIJO MODULO D						
ASCENSOR PASAJEROS					2,00	2,00
						0,00

	ACUMULADO	2,00
	ACTA MODIFICATORIA 4	2,00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00
	COBRADAS PARCIAL No 9	2,00
OBSERVACIONES:		







ALEXIS RONDON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
RESIDENTE DE OBRA
UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES

Bucaramanga, 25 de marzo de 2026

Yo JESSICA MARCELA CAMELO VACA, en mi condición de Contador del CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA identificado con Nit No. 901.740.580-3, me permito CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDADA DE JURAMENTO que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (06) meses anteriores a la presente certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dada en Bucaramanga, a los veintiocho (25) días del mes de marzo del año 2026.

Cordialmente,

CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO
C.C. 91.273.201
Representante legal

JESSICA CAMELO VACA
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 211938-T
CC 1.102.355.623

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

211938-T



JESSICA MARCELA
CAMELO VACA
C.C. 1102355623
RESOLUCION INSCRIPCION 852 **FECHA 22/12/2015**
UNIVERSIDAD UNIDADES TECN. DE SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 224961

214670

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.355.623**

CAMELO VACA

APELLIDOS

JESSICA MARCELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1988**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-ABR-2006 PIEDECUESTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00218366-F-1102355623-20100226 0021312676A 1 32979595

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 4 0 A 9 E B D 6 C D 8 A 0 F 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESSICA MARCELA CAMELO VACA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102355623 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 211938-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Fecha de verificación: 24/03/2026			FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL FEB- MAR		UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL	
Número Total de Trabajadores: 68						
Líder de SST que realiza la verificación	FAYRUT DENNIS CORZO MENDEZ					

#	Nombre completo trabajador	CEDULA	CARGO	Empresa	# PLANILLA VERIFICADA SEGUIDAD SOCIAL PEN DIC SAL ENE	Afiliación ARL (SI/No)
1	IVAN GUTIERREZ PINTO	91232897	INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
2	CRISTIAN ORLANDO GONZALEZ RUEDA	1098761067	AUXILIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
3	EDRAS NIÑO CARVAJAL	5612669	TOPOGRAFO	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
5	LAURA CAMILA VELOZA REYES	1.095.827.911	AUX ADMO	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
6	CAMILO EDUARDO DIAZ	1102774962	AUX DE INGENIERIA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
7	CRISTIAN YESID PINZON NOVA	1099662522	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
8	JORGE DIAZ RINCON	13749125	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si

9	JAIRO GARAVITO VASQUEZ	91352609	OPERARIO	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
10	LEONARDO ROJAS SANGUINO	1096950590	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
11	SADY ROBERTO BASTO MURILLO	5613984	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
12	RAUL SANCHEZ CACERES	2087414	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
13	WEIMAR YECID ROA QUINTERO	1099662017	OPERARIO	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
14	IVAN SANDOVAL DIMAS	1.096.957.220	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
15	LIBARDO TUTIRA DIAZ	13.922.207	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
16	JOSE SILVESTRE HUERTAS	1.098.150.540	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
17	EDISON ALBERTO CHAVARRIA CHAPARRO	1.098.101.480	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
18	ANDRES LOPEZ CACERES	13924491	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
19	MARCO ANTONIO BARAJAS	13929922	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si

20	REIBI ALEXANDER MEDINA GOMEZ	PPT 6197969	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
21	NIXON YESID RODRIGUEZ JAIMES	13929337	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
22	VICTOR MANUEL FUENTES MILLAN	79183413	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
23	JUAN ANTONIO HUERTAS TARAZONA	1.098.150.989	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
24	LUIS CARLOS VALDERRAMA	1.096.948.176	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
25	YORMAN HALI PINZON	1.096.954.022	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
26	JAIME ESPINEL IBAÑEZ	13.928.984	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
27	CARLOS JULIO ESPINEL IBAÑEZ	13.927.880	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
28	SILFREDO ORTIZ ORTIZ	72.240.872	MAESTRO DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
29	JAIDER ANDRES TORRES RICO	1.007.551.709	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
31	ROBERTO PARRA PARRA	5.748.006	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si

32	WILMER ISAQUITA DUARTE	1099302117	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
33	LUIS ARLEY FERNANDEZ BAUTISTA	13930401	AUX ELECTRICO	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
34	PATROCINIO ROMERO MANTILLA	1095510650	AUX ELECTRICO	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
35	EDWIN JAVIER CASTRO AMAYA	1096946960	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
36	JAIRO CELIS RINCO	1093748517	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
37	YEFERSON ANDRES CAICEDO DÍAZ	1005337622	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO GARCIA ROVIRA	9501285224	Si
38	JUAN PABLO ROJAS ESPINEL	1005230995	AYUDANTE DE OBRA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
39	GERZON ARTURO CORREA MOGOLLON	1096960660	OFICIAL DE OBRA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	si
40	OSCAR SIERRA RAVELO	13927372	AYUDANTE DE OBRA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	si
41	ELIANA ALEXANDRA SUAREZ GONZALEZ	1100502462	AUX SST	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	si
42	ALFONSO TARAZONA SANTANDER	91499154	JEFE DE TALLER	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si

43	GEHINNER ALIRIO CHIQUILLO DIAZ	1098725902	AUX ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
44	FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	77156325	SOLDADOR	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
45	ALVARO RAFAEL BELTRAN DIAZ	73507388	AUX ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
46	JAIRO LEONARDO GARCIA NIÑO	1095799972	AUX ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	si
47	JOHN FREDY DUARTE PICO	91355809	AUX ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	si
48	LIBARDO JAIMES JAIMES	5609131	AUX ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	si
49	JONATHAN ALEXIS SAAVEDRA QUICENO	1095940597	AUX ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	si
50	LUIS EDUARDO QUINTERO CARVAJAL	1098649572	AUX DE ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	si
51	DARLY MARTINEZ GUERRERO	37546748	TOPOGRAFA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	si
52	ELVIS CARRILLO VILLEGAS	912402589	ARMADOR	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
53	CARLOS FERNEY GARCIA TORRES	1005300247	AUX DE ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si

54	OMAR AGUSTO INFANTE MOJICA	13927639	AUX DE ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
55	DAYRO ESTIVEN MENDOZA PABON	1065162188	ING CIVIL	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
56	JAIDER GOMEZ OLIVERO	9694535	AUX SOLDADURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
57	DOMINGO RALEVO	1127914204	AUXILIAR	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
58	PARMENIO GOYENECHE	79561726	SOLDADOR	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
59	ROBERTO CASTRO PARRA	13925004	AUXILIAR	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
60	JEISON DANIEL ACUÑA GODOY	1098100144	AUXILIAR DE ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
61	HAROL IVAN ARAQUE	1057547442	AUXILIAR DE ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
62	WILSON JAVIER DUARTE PICO	91355833	AUXILIAR DE ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
63	JOSE MIGUEL SANABRIA HERNANDEZ	1096958843	CONDUCTOR	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
64	WILMER COBOS LOZANO	1096953602	SOLDADOR	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si

65	YONATAN ZORRO	1080182712	SOLDADOR	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
66	FERNANDO AGUILAR TOCANCHON	727632	AUXILIAR DE ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
67	JHON JAIRO TORRES GARCIA	1005136488	SOLDADOR	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si
68	OMAR FERNEY CASTELLANOS	1096960273	AUXILIAR DE ESTRUCTURA	JOB INGENIERIA SAS	1080345469	Si

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740580	3	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 32 28 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	152399646	9501285224	E	2026/03/18	2026/03/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$30,235,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13929922	BARAJAS ANAYA MARCO ANTONIO									X									230301	30	$1,858,347	$297,400	EPS002	30	$1,858,347	$74,400	CCF39	30	$1,858,347	$74,400	14-25	30	$1,858,347	$129,400	30	$0	$0	SI	$575,600
2	CC	5613984	BASTO MURILLO SADY ROBERTO																		25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF39	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
3	CC	1005337622	CAICEDO DIAZ YEFERSON ANDRES	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS041	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
4	CC	91487260	CARREÑO SANABRIA ALFONSO																		230201	30	$12,151,115	$2,065,800	EPS002	30	$12,151,115	$486,100	CCF39	30	$12,151,115	$486,100	14-25	30	$12,151,115	$845,800	30	$0	$0	SI	$3,883,800
5	CC	1096946960	CASTRO AMAYA EDWIN JAVIER																		230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-25	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0	SI	$506,100
6	CC	1096946960	CASTRO AMAYA EDWIN JAVIER									X									230201	2	$116,727	$14,100	EPS002	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0	SI	$14,100
7	CC	1093748517	CELIS RICO JAIRO	X								X									230301	26	$1,561,224	$249,800	EPS002	26	$1,561,224	$62,500	CCF39	26	$1,561,224	$62,500	14-25	26	$1,561,224	$108,700	26	$0	$0	SI	$483,500
8	CC	1098101480	CHAVARRIA CHAPARRO EDINSON ALBERTO											X							230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$0	14-25	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0	SI	$350,300
9	CC	1096960660	CORREA MOGOLLON GERZON ARTURO	X																	230301	22	$1,540,000	$246,400	EPS005	22	$1,540,000	$61,600	CCF39	22	$1,540,000	$61,600	14-25	22	$1,540,000	$107,200	22	$0	$0	SI	$476,800
10	CC	1102774962	DIAZ RAMOS CAMILO EDUARDO																		230301	30	$2,535,748	$405,800	ESSC24	30	$2,535,748	$101,500	CCF39	30	$2,535,748	$101,500	14-25	30	$2,535,748	$176,500	30	$0	$0	SI	$785,300
11	CC	13749125	DIAZ RINCON JORGE									X									230301	30	$1,794,678	$287,200	EPS005	30	$1,794,678	$71,800	CCF39	30	$1,794,678	$71,800	14-25	30	$1,794,678	$125,000	30	$0	$0	SI	$555,800
12	CC	77097078	DIAZ ORTIZ JOSE GUILLERMO		X																230901	29	$3,377,560	$540,500	EPS010	29	$3,377,560	$135,200	CCF39	29	$3,377,560	$135,200	14-25	29	$3,377,560	$235,100	29	$0	$0	SI	$1,046,000
13	CC	77097078	DIAZ ORTIZ JOSE GUILLERMO										X								230901	1	$116,468	$14,000	EPS010	1	$116,468	$0	CCF39	1	$116,468	$0	14-25	1	$116,468	$0	1	$0	$0	SI	$14,000
14	CC	13927880	ESPINEL IBAÑEZ CARLOS JULIO																		230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-25	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0	SI	$506,100
15	CC	13927880	ESPINEL IBAÑEZ CARLOS JULIO										X								230301	2	$116,727	$14,100	EPS005	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0	SI	$14,100
16	CC	13928984	ESPINEL IBAÑEZ JAIME																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
17	CC	1095946093	FAJARDO UNIVIO JHULY DAYANNA																		230201	30	$4,169,728	$667,200	EPS005	30	$4,169,728	$166,800	CCF39	30	$4,169,728	$166,800	14-25	30	$4,169,728	$290,300	30	$0	$0	SI	$1,291,100
18	CC	13930401	FERNANDEZ BAUTISTA LUIS ARLEY																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
19	CC	79183413	FUENTES MILLAN VICTOR MANUEL									X									25-14	30	$1,794,678	$287,200	EPS002	30	$1,794,678	$71,800	CCF39	30	$1,794,678	$71,800	14-25	30	$1,794,678	$125,000	30	$0	$0	SI	$555,800
20	CC	91352609	GARAVITO VASQUEZ JAIRO									X									25-14	30	$2,676,029	$428,200	EPS037	30	$2,676,029	$107,100	CCF39	30	$2,676,029	$107,100	14-25	30	$2,676,029	$186,300	30	$0	$0	SI	$828,700
21	CC	1098761067	GONZALEZ RUEDA CRISTIAN ORLANDO																		25-14	30	$5,790,103	$926,500	EPS037	30	$5,790,103	$231,700	CCF39	30	$5,790,103	$231,700	14-25	30	$5,790,103	$403,000	30	$0	$0	SI	$1,792,900
22	CC	1096948176	GUERRERO VALDERRAMA LUIS CARLOS										X								230301	2	$116,727	$14,100	EPS041	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0	SI	$14,100
23	CC	1096948176	GUERRERO VALDERRAMA LUIS CARLOS																		230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS041	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-25	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0	SI	$506,100
24	CC	91232897	GUTIERREZ PINTO IVAN ALONSO																		25-14	30	$3,089,677	$494,400	EPS010	30	$3,089,677	$123,600	CCF39	30	$3,089,677	$123,600	14-25	30	$3,089,677	$215,100	30	$0	$0	SI	$956,700
25	CC	1098150540	HUERTAS TARAZONA JOSE SILVESTRE																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF39	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
26	CC	1098150989	HUERTAS TARAZONA JUAN ANTONIO									X									230201	30	$1,794,678	$287,200	EPS005	30	$1,794,678	$71,800	CCF39	30	$1,794,678	$71,800	14-25	30	$1,794,678	$125,000	30	$0	$0	SI	$555,800
27	CC	1099302117	ISAQUITA DUARTE WILMER																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
28	CC	13924491	LOPEZ CACERES ANDRES																		231001	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF39	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
29	PT	6197969	MEDINA GOMEZ REIBI ALEXANDER									X									25-14	30	$2,152,500	$344,400	EPS041	30	$2,152,500	$86,100	CCF39	30	$2,152,500	$86,100	14-25	30	$2,152,500	$149,900	30	$0	$0	SI	$666,500

30	CC	1096957709	MENDOZA CARRILLO FARID JHOAN CAMILO		X																230201	16	$933,816	$149,500	EPS005	16	$933,816	$37,400	CCF39	16	$933,816	$37,400	14-25	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	SI	$289,300
31	CC	5612669	NIÑO CARVAJAL EDRAS																		230301	30	$3,479,771	$556,800	EPS037	30	$3,479,771	$139,200	CCF39	30	$3,479,771	$139,200	14-25	30	$3,479,771	$242,200	30	$0	$0	SI	$1,077,400
32	CC	72240872	ORTIZ ORTIZ SILFREDO											X							230301	30	$2,066,667	$330,700	EPS002	30	$2,066,667	$82,700	CCF39	30	$2,066,667	$0	14-25	30	$2,066,667	$0	30	$0	$0	SI	$413,400
33	CC	5748006	PARRA PARRA ROBERTO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
34	CC	1099662522	PINZON NOVA CRISTIAN YESID									X									230301	30	$2,152,500	$344,400	EPS005	30	$2,152,500	$86,100	CCF39	30	$2,152,500	$86,100	14-25	30	$2,152,500	$149,900	30	$0	$0	SI	$666,500
35	CC	1096954022	PINZON CRISTANCHO YORMAN HALI									X									230301	30	$1,760,853	$281,800	EPS005	30	$1,760,853	$70,500	CCF39	30	$1,760,853	$70,500	14-25	30	$1,760,853	$122,600	30	$0	$0	SI	$545,400
36	CC	1099662017	ROA QUINTERO WEYMAR YECID									X									25-14	30	$2,152,500	$344,400	EPS041	30	$2,152,500	$86,100	CCF39	30	$2,152,500	$86,100	14-25	30	$2,152,500	$149,900	30	$0	$0	SI	$666,500
37	CC	13929337	RODRIGUEZ JAIMES NIXON YESID																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
38	CC	1005230995	ROJAS ESPINEL JUAN PABLO	X								X									230301	26	$1,561,224	$249,800	EPS041	26	$1,561,224	$62,500	CCF39	26	$1,561,224	$62,500	14-25	26	$1,561,224	$108,700	26	$0	$0	SI	$483,500
39	CC	1096950590	ROJAS SANGUINO LEONARDO									X									25-14	30	$2,152,500	$344,400	EPS037	30	$2,152,500	$86,100	CCF39	30	$2,152,500	$86,100	14-25	30	$2,152,500	$149,900	30	$0	$0	SI	$666,500
40	CC	1095510650	ROMERO MANTILLA PATROCINIO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
41	CC	2087411	SANCHEZ CASERES RAUL																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
42	CC	1096957220	SANDOVAL DIMAS IVAN FERNEY																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF39	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
43	CC	13927372	SIERRA RAVELO OSCAR	X								X									230301	21	$1,269,407	$203,200	EPS002	21	$1,269,407	$50,800	CCF39	21	$1,269,407	$50,800	14-25	21	$1,269,407	$88,400	21	$0	$0	SI	$393,200
44	CC	1007551709	TORRES RICO JAIDER ANDRES									X									230301	30	$1,858,347	$297,400	EPS037	30	$1,858,347	$74,400	CCF39	30	$1,858,347	$74,400	14-25	30	$1,858,347	$129,400	30	$0	$0	SI	$575,600
45	CC	13922207	TUTIRA DIAZ LIBARDO																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS041	30	$2,100,000	$84,000	CCF39	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
46	CC	1095827911	VELOZA REYES LAURA CAMILA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	Afiliados(42)																						$98,818,429	$15,915,800			$98,818,429	$3,935,600			$98,818,429	$3,782,800			$98,818,429	$6,581,600		$0	$0		$30,215,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740580	3	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 32 28 70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	152399646	9501285224	E	2026/03/18	2026/03/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$30,235,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				42	$15,915,800	$10,600	$0	$15,926,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$336,000	$300	$0	$336,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,505,500	$2,300	$0	$3,507,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$6,953,700	$4,500	$0	$6,958,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$4,566,100	$3,100	$0	$4,569,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$554,500	$400	$0	$554,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$6,581,600	$4,300	$0	$6,585,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	42	$6,581,600	$4,300	$0	$6,585,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,782,800	$2,500	$0	$3,785,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	42	$3,782,800	$2,500	$0	$3,785,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				42	$3,935,600	$2,700	$0	$3,938,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$101,500	$100	$0	$101,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$258,800	$200	$0	$259,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$848,800	$600	$0	$849,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$444,800	$300	$0	$445,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$893,700	$600	$0	$894,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,388,000	$900	$0	$1,388,900
TOTAL				42	$30,215,800	$20,100	$0	$30,235,900

2026/03/19 07:10 AM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-24, 01:52:30 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080345469

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 21/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

S DEL APORTANTE

ocial	JOB INGENIERIA SAS	Nombre Sucursal	BUCARAMANGA	Código Sucursal	01
nto	NI901478369	Dirección	TV 112 #20 - 53		
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3232196491		
sona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER		
ntante Legal	ORTIZ BLANCO JHONATAN	Identificación	CC 1098728354		
liados	40	ARP	ARL SURA		

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	YST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
YONIS JOSE CORTEZ NIETO	01	00	X																0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.283.997	$ 205.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.283.997	$ 51.400	6,960	$ 1.283.997	$ 89.400	(CCF39) CAJASAN	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.700
JHON JAIRO TORRES GARCIA	01	00	X																0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 1.833.334	$ 293.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.833.334	$ 73.400	6,960	$ 1.833.334	$ 127.700	(CCF39) CAJASAN	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900
DAYRON STEVEN MENDOZA PABON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
JAIRO ANDRES OJEDA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF39) CAJASAN	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CARLOS FERNEY GARCIA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
HAROLD IVAN ARAQUE SALAMANCA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
GELBER ALBERTO PALENCIA SIERRA	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 817.089	$ 130.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(CCF39) CAJASAN	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.100
YONATAN ZORRO	01	00	X	X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.266.667	$ 202.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.266.667	$ 50.700	6,960	$ 1.266.667	$ 88.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.266.667	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.300
JAIRO LEONARDO GARCIA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
JONATHAN ALEXIS SAAVEDRA QUICENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
WILMER ERLEY COBOS LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF39) CAJASAN	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
JOSE MIGUEL SANABRIA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF39) CAJASAN	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
OMAR FERNEY CASTELLANOS SUAREZ	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.283.997	$ 205.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.283.997	$ 51.400	6,960	$ 1.283.997	$ 89.400	(CCF39) CAJASAN	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.700
IVAN MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ	01	00		X															0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 641.999	$ 102.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 641.999	$ 25.700	6,960	$ 641.999	$ 44.700	(CCF39) CAJASAN	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900
JEISON DANIEL ACUÑA GODOY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
EDWIN DUARTE DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF39) CAJASAN	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
LUIS EDUARDO QUINTERO CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
JUAN CARLOS QUINTERO ORTEGA	01	00		X															0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.133.334	$ 181.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.133.334	$ 45.400	6,960	$ 1.133.334	$ 78.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.133.334	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.100
GEHINNER ALIRIO CHIQUILLO DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

s de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 21/03/2026 **Empresa NI901478369 JOB INGENIERIA SAS** **Planilla Nro: 1080345469** **Periodo Cotización: febrero de 2026** **Periodo Servicio: marzo de 2026**

..LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
JHONATAN ORTIZ BLANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.150.000	$ 86.000	6,960	$ 2.150.000	$ 149.700	(CCF39) CAJASAN	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.700
CARLOS ANDRES MARTINEZ ROJAS	01	00		X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.283.997	$ 205.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.283.997	$ 51.400	6,960	$ 1.283.997	$ 89.400	(CCF39) CAJASAN	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.700
ELIANA ALEXANDRA SUAREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
JOSE SANTOS RINCON GUALDRON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF39) CAJASAN	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
DOMINGO RAVELO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CARLOS ANDRES ROJAS HERNANDEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
ROBERTO CASTRO PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
OMAR AUGUSTO INFANTE MOJICA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
DARLY MARTINEZ GUERRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
LIBARDO JAIMES JAIMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
FERNANDO TOCANCHON AGUILAR	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.283.997	$ 205.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.283.997	$ 51.400	6,960	$ 1.283.997	$ 89.400	(CCF39) CAJASAN	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.700
REINALDO JUNIOR MARTINEZ MENDOZA	01	00	X																0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 641.999	$ 102.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 641.999	$ 25.700	6,960	$ 641.999	$ 44.700	(CCF39) CAJASAN	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900
ALVARO RAFAEL BELTRAN DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
FERNANDO JOSE MAZA SANTANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PARMENIO GOYENECHE CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF39) CAJASAN	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
JOHN FREDY DUARTE PICO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
WILSON JAVIER DUARTE PICO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
JUAN SEBASTIAN MONROY VILLAMIZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
ELVIS CARRILLO VILLEGAS	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.100
ALFONSO TARAZONA SANTANDER	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
JAIDER GOMEZ OLIVERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

TALES

nsión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
.796.874	$ 64.547.779	$ 64.547.779	$ 64.547.779	$ 10.049.300	$ 2.583.700	$ 4.494.000	$ 2.583.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.710.700	$ 102.100	$ 19.812.800

s de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-16, 09:10:51 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 84083000

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202603

PAGADA 2026-03-13 00:00:00.0

DATOS DEL APORTANTE

zón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
cumento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
o Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	15
idad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
presentante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

DATOS DEL AFILIADO

ocumento	CC 13928766		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
o Cotizante	01	00					DURAN VILLAMIL RODRIGO	68432000 - 68		SANTANDER

APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
													0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	25-14		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF40	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-16, 09:11:26 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 84083000

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202603

PAGADA 2026-03-13 00:00:00.0

DATOS DEL APORTANTE

zón Social	RYR LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES SAS				
cumento	NI 901647862	**Dirección**	CR 10 #10 - 108 LOCAL 1		
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112082083		
o Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	15
idad	MALAGA	**Departamento**	SANTANDER		
presentante Legal	ROJAS RODRIGUEZ TEOFILO ALBERTO	**Identificación**	CC 13926005		

DATOS DEL AFILIADO

ocumento	CC 1098130385		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
o Cotizante	01	00					PEÑA CARVAJAL EDINSON MANUEL	68432000 - 68		SANTANDER

APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																		Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
													0	22	22	22	22		F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 1.283.997	$ 89.400	CCF40	4 %	$ 1.283.997	$ 51.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 51.400	$ 89.400	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952
