

Id		Nombre de tarea	% mpleta
1		**CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**	56%
2	✓	FIRMA ACTA DE INICIO DE OBRA	100%
3	✓	REVISION TECNICA DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES Y PLANIMETRIA	100%
4	✓	INICIO DE OBRA	100%
5		**4 ESTRUCTURA**	86%
6		**4.2 ESTRUCTURA METÁLICA - ACERO DE REFUERZO - ANCLAJES**	95%
7		**4.2.1 PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C.**	95%
8	✓	TRABAJO DE CAMPO/LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	100%
9		TRABAJO EN TALLER Y SUMINISTRO DE MATERIALES	98%
10		MONTAJE DE ESTRUCTURA	90%
11		FIN ESTRUCTURA METALICA	0%
12		FIN ESTRUCTURA	0%
13		**6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	0%
14		**6.1 DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS**	0%
15		6.1.1 TUBERÍA PVC-P RECUBRIMIENTO RUBATEX 3/4"	0%
16		6.1.2 TUBERÍA PVC-P RECUBRIMIENTO RUBATEX 1"	0%
17		**7 INSTALACIONES ELECTRICAS**	90%
18	✓	**7.3 BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA**	100%
19	✓	7.3.2 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø2"	100%
20	✓	7.3.3 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1"-1/2"	100%
21	✓	7.3.4 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1-1/4	100%
22	✓	7.3.5 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1"	100%
23	✓	7.3.6 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4"	100%
24	✓	7.3.9 BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 54X200	100%
25	✓	7.3.10 BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 54X300	100%
26	✓	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	100%
27	✓	NP 08 DUCTERIA TIPO PVC 3/4"	100%
28	✓	FIN BANCO DE DUCTERIAS	100%
29	✓	**7.4 TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL**	100%
30	✓	**7.4.1 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDN-6-1)**	100%
31	✓	SUMINISTRO A OBRA	100%
32	✓	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%
33	✓	**7.4.2 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDN-2)**	100%
34	✓	SUMINISTRO A OBRA	100%
35	✓	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%
36	✓	**7.4.3 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDN-3-4)**	100%
37	✓	SUMINISTRO A OBRA	100%
38	✓	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%
39	✓	**7.4.4 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDN-5-6)**	100%
40	✓	SUMINISTRO A OBRA	100%
41	✓	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%

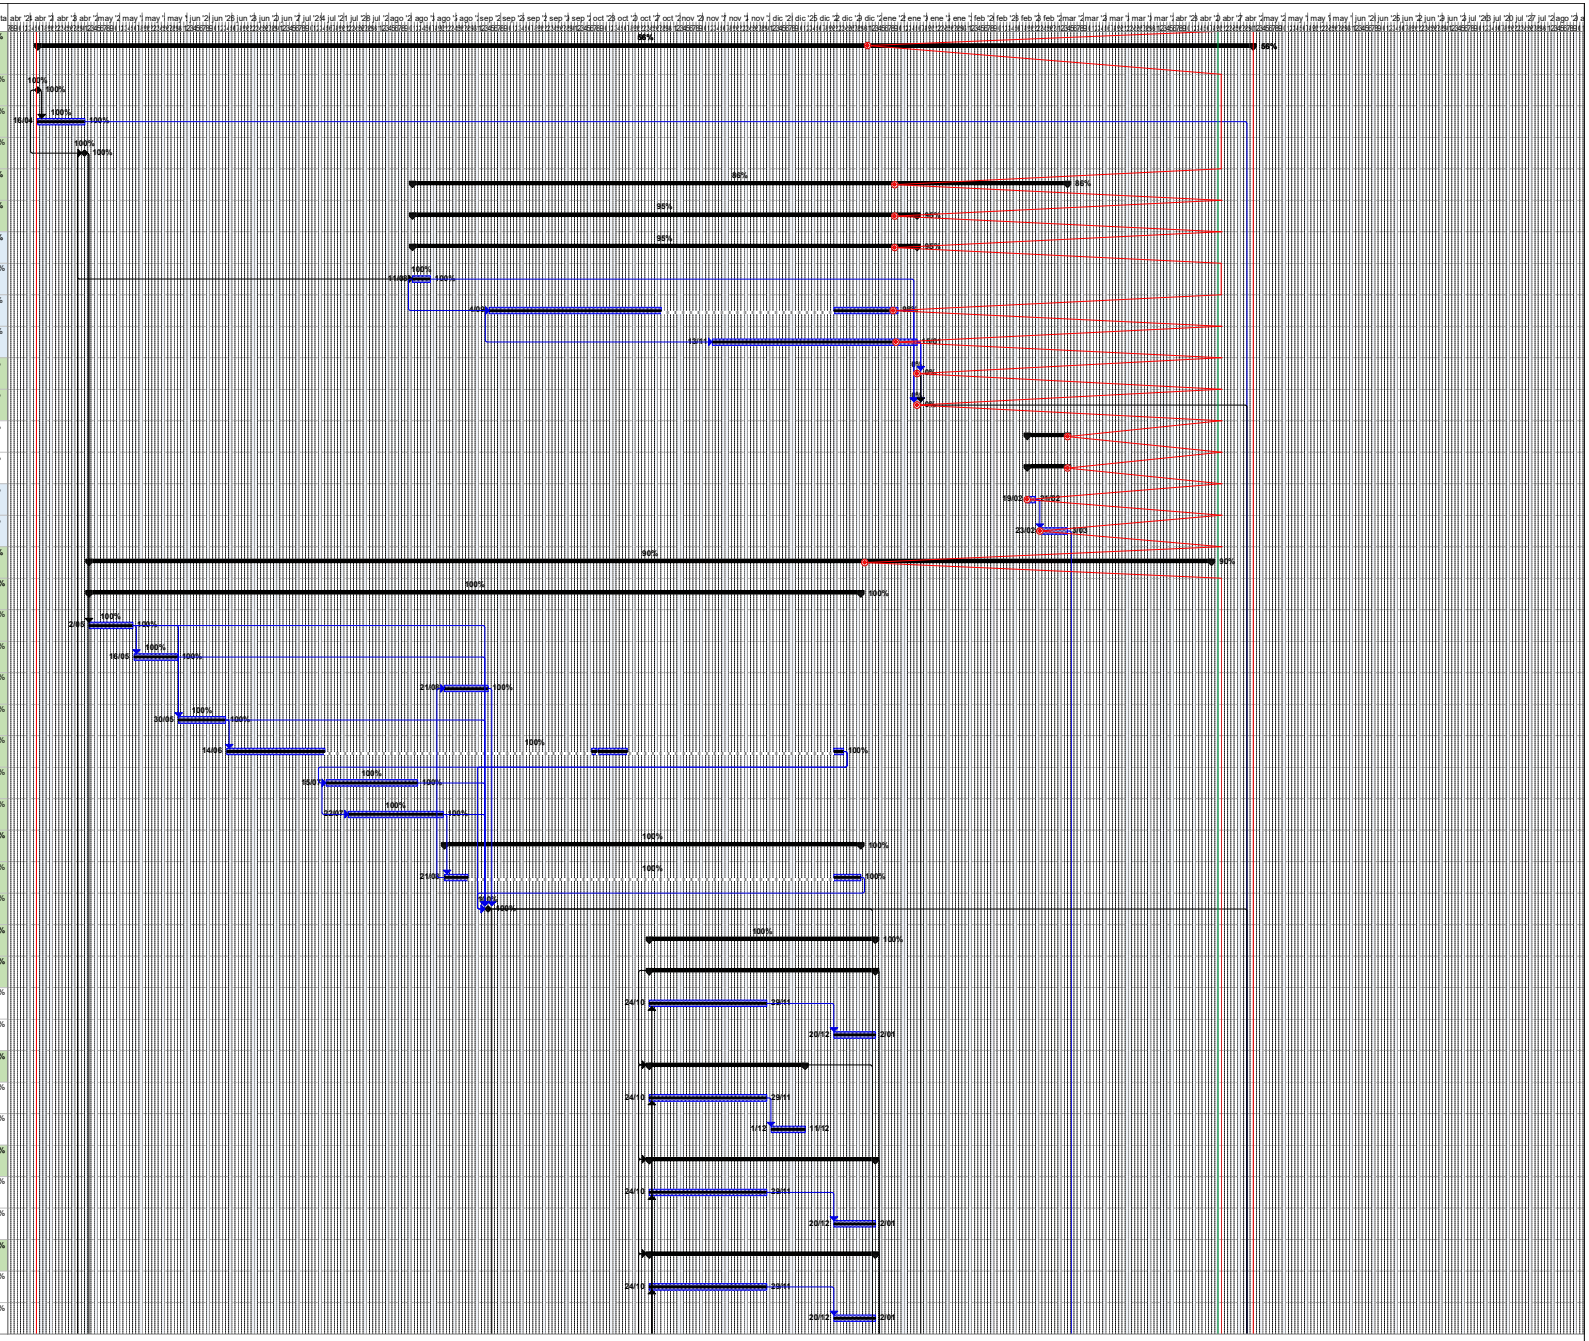

Proyecto: REPROGRAMACION - Fecha: lun 20/04/26

Tarea	Tarea resumida	División	Tarea inactiva	Tarea manual		solo el comienzo	Tareas críticas	
Tarea crítica	Tarea crítica resumida	Tareas externas	Hito inactivo	solo duración		solo fin	División crítica	
Hito	Hito resumido	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual		Tareas externas	Progreso	
Resumen	Progreso resumido	Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Resumen manual		Hito externo	Fecha límite	

Id	Nombre de tarea	% mpleta
42	**7.4.5 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDA)**	100%
43	SUMINISTRO A OBRA	100%
44	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%
45	**7.4.6 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDI-3-4)**	100%
46	SUMINISTRO A OBRA	100%
47	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%
48	**7.4.7 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDR-1)**	100%
49	SUMINISTRO A OBRA	100%
50	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%
51	**7.4.8 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDR-3-4)**	100%
52	SUMINISTRO A OBRA	100%
53	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%
54	**7.4.9 COFRE METÁLICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED**	100%
55	SUMINISTRO A OBRA	100%
56	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%
57	FIN TABLEROS ELECTRICOS	100%
58	**7.5 ACOMETIDAS ELECTRICAS**	98%
59	7.5.1 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT 3 No. 4/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 4/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 6 AWGXCUXDESN TIERRA	100%
60	7.5.2 CABLEADO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 3XNo. 2/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 NO. 2/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 NO. 2/0 CUXDESNXAWG TIERRA	100%
61	7.5.3 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 3 No. 1/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 1/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 6 AWGXCUXDESN TIERRA	100%
62	7.5.4 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 3 No. 2 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 2 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 8 AWGXCUXDESN TIERRA	100%
63	7.5.5 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 3 No. 4 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 4 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 8 AWGXCUXDESN TIERRA	100%
64	7.5.6 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,600V 90°C: 2 No. 4 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 4 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 8 AWGXCUXDESN TIERRA	100%
65	7.5.7 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 3 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 8 AWGXCUXDESN TIERRA	100%
66	7.5.8 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,600V 90°C: 3 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 10 AWGXCUXDESN TIERRA	100%
67	7.5.9 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,600V 90°C: 1 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 10 AWGXCUXDESN TIERRA	100%
68	7.5.11 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 1 No. 12 AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 12 AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 12 AWGXCUXDESN TIERRA	94%
69	FIN ACOMETIDAS ELECTRICAS	100%
70	**7.6 SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC**	71%
71	**APARATOS ELECTRICOS**	71%

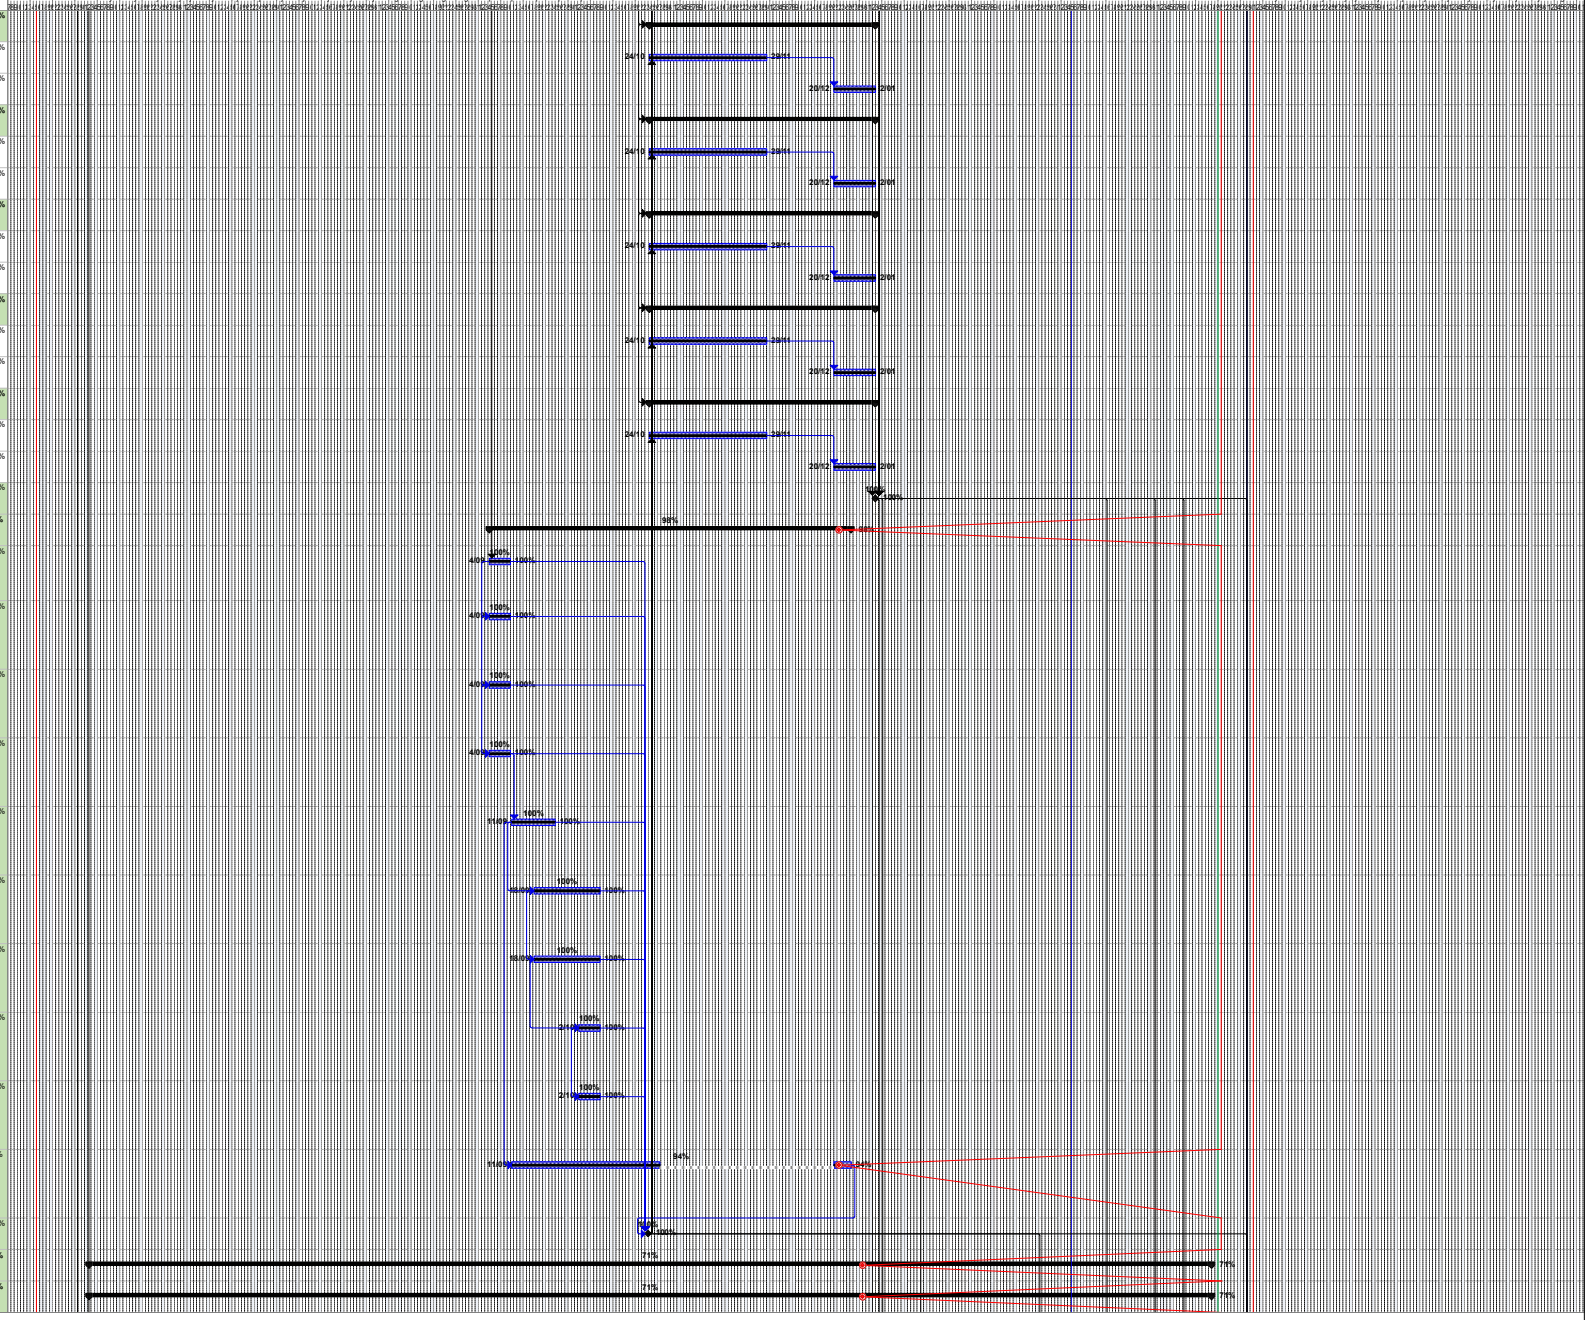

Proyecto: REPROGRAMACION -
Fecha: lun 20/04/26


Tarea	Tarea resumida	División	Tarea inactiva	Tarea manual	solo el comienzo	Tareas críticas		
Tarea crítica	Tarea crítica resumida	Tareas externas	Hito inactivo	solo duración	solo fin	División crítica		
Hito	Hito resumido	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso		
Resumen	Progreso resumido	Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Fecha límite		

Id	Nombre de tarea	% completa
72	**7.6.1 INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERÍA PVC**	100%
73	DUCTERIA	100%
74	ALAMBRADO	100%
75	COLOCACION APARATO	100%
76	PRUEBAS	100%
77	**7.6.2 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL)**	100%
78	DUCTERIA	100%
79	ALAMBRADO	100%
80	COLOCACION APARATO	100%
81	PRUEBAS	100%
82	**7.6.3 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL)**	100%
83	DUCTERIA	100%
84	ALAMBRADO	100%
85	COLOCACION APARATO	100%
86	PRUEBAS	100%
87	**7.6.4 TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL)**	100%
88	DUCTERIA	100%
89	ALAMBRADO	100%
90	COLOCACION APARATO	100%
91	PRUEBAS	100%
92	**7.6.6 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./125V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL)**	100%
93	DUCTERIA	100%
94	ALAMBRADO	100%
95	COLOCACION APARATO	100%
96	PRUEBAS	100%
97	**7.6.7 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA)**	100%
98	DUCTERIA	100%
99	ALAMBRADO	100%
100	COLOCACION APARATO	100%
101	PRUEBAS	100%
102	**7.6.8 TOMACORRIENTE BIFÁSICA AÉREA 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2Ø+PT)**	90%
103	DUCTERIA	100%
104	ALAMBRADO	100%
105	COLOCACION APARATO	100%
106	PRUEBAS	0%
107	**7.6.9 TOMACORRIENTE BIFÁSICA DE INCRUSTAR 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20P, EN SALIDA DE TUBERÍA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TORNILLERÍA, TE**	90%
108	DUCTERIA	100%
109	ALAMBRADO	100%
110	COLOCACION APARATO	100%

Proyecto: REPROGRAMACION -
Fecha: lun 20/04/26

Tarea	Tarea resumida	División	Tarea inactiva	Tarea manual	solo el comienzo	Tareas críticas	
Tarea crítica	Tarea crítica resumida	Tareas externas	Hito inactivo	solo duración	solo fin	División crítica	
Hito	Hito resumido	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso	
Resumen	Progreso resumido	Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Fecha límite	


Id	Nombre de tarea	% mpleta
111	PRUEBAS	0%
112	**7.6.10 SECADOR DE MANOS ECOJET OPERADO POR SENSOR, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V, MONTAJE DE SOBREPONER, EN SALIDA DE TUBERÍA PVC; INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TORNILLERÍA, TERMINALES, Y**	0%
113	DUCTERIA	0%
114	ALAMBRADO	0%
115	COLOCACION APARATO	0%
116	PRUEBAS	0%
117	**7.6.20 LUCES INTERMITENTES TÚNEL LED INCLUYE: 4 BANDAS LED RGBW CON PERFIL DE ALUMINIO CONFIGURACIÓN DINÁMICA Y 2 ANILLOS DE ALUMINIO CONTROLADOR DE COLOR Y DE INTERMITENCIA TÚNEL CABLEADO**	0%
118	DUCTERIA	0%
119	ALAMBRADO	0%
120	COLOCACION APARATO	0%
121	PRUEBAS	0%
122	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	51%
123	NP 02 INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 15A / TUBERIA PVC	100%
124	DUCTERIA	100%
125	ALAMBRADO	100%
126	COLOCACION APARATO	100%
127	PRUEBAS	100%
128	NP 03 INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 15A / TUBERIA EMT	56%
129	DUCTERIA	50%
130	ALAMBRADO	50%
131	COLOCACION APARATO	50%
132	PRUEBAS	100%
133	NP 05 INTERRUPTOR 4 VIAS 15 A / TUBERIA EMT	45%
134	DUCTERIA	50%
135	ALAMBRADO	50%
136	COLOCACION APARATO	50%
137	PRUEBAS	0%
138	NP 06 LUMINARIA BOMBILLO LED DE EMERGENCIA 7 W ZONA FOSO ASCENSOR	0%
139	DUCTERIA	0%
140	ALAMBRADO	0%
141	COLOCACION APARATO	0%
142	PRUEBAS	0%
143	FIN APARATOS ELECTRICOS	0%
144	FIN SALIDAS ELECTRICAS	0%
145	**7.7 PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA**	0%
146	7.7.1 BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRA AISLADA DE COBRE ESTAÑADO CON 10 CONECTORES CON AISLADORES EN RESINA EPOXICA DE DIMENSIONES (440X50X6)MM. SECCIÓN TRANSVERSAL 300 MM^2.	0%
147	FIN PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA	0%
148	FIN INSTALACIONES ELECTRICAS	0%

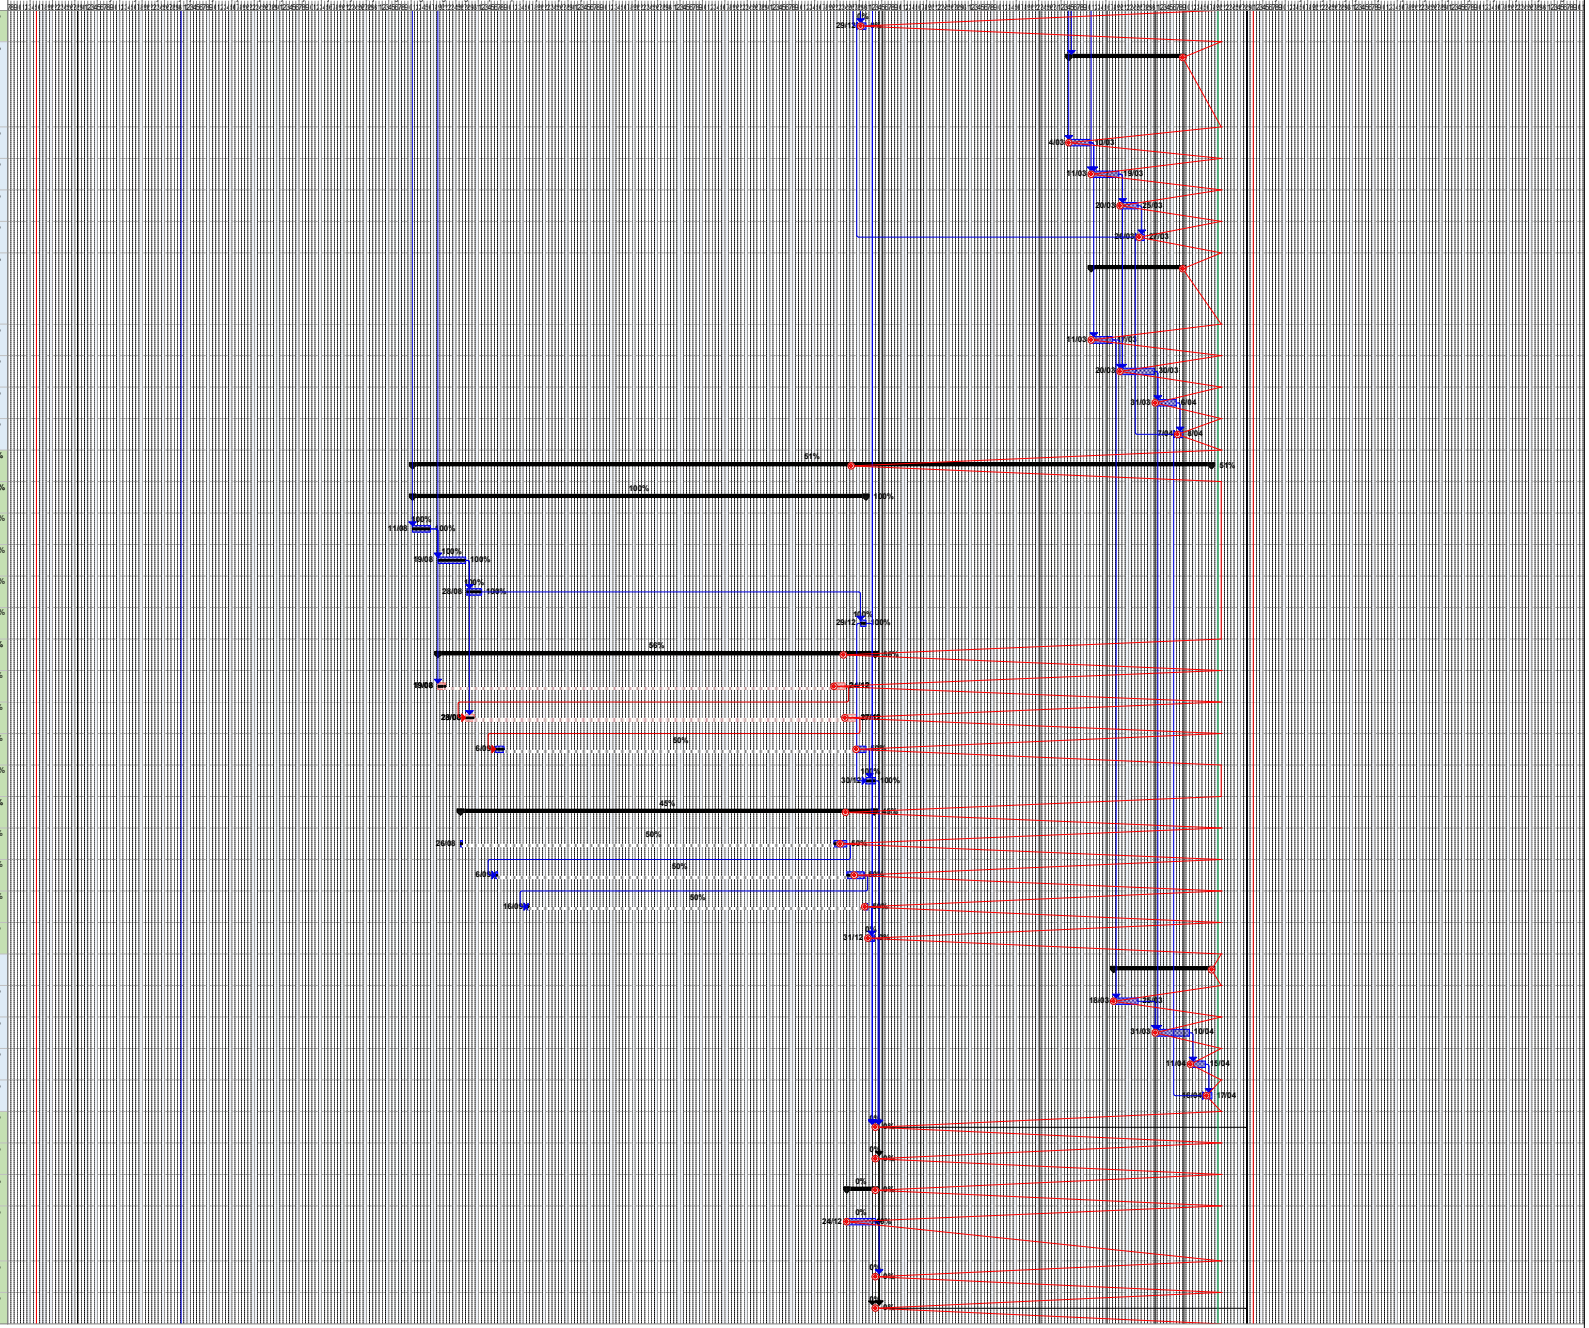

Proyecto: REPROGRAMACION -
Fecha: lun 20/04/26

Tarea | Tarea resumida | División | Tarea inactiva | Tarea manual | solo el comienzo | Tareas críticas
Tarea crítica | Tarea crítica resumida | Tareas externas | Hito inactivo | solo duración | solo fin | División crítica
Hito | Hito resumido | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso
Resumen | Progreso resumido | Agrupar por síntesis | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Fecha límite


Id	Nombre de tarea	% completa
149	**8 COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**	34%
150	**8.2 PUNTO DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT. 6A F/UTP Y ACCESORIOS.**	77%
151	CABLEADO	100%
152	INSTALACION DE APARATOS	0%
153	CERTIFICACION	0%
154	8.3 PATCH PANEL DE 48 PTS 1UR	0%
155	8.4 ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTAL 1 UR	0%
156	8.6 INSTALACIÓN DE SWITCH ARUBA NETWORKING 6300/48P SMART, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.	0%
157	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	28%
158	NP 26 ACOMETIDA FIBRA ÓPTICA, MULTIMODO, 12 HILOS, CONECTORIZACIÓN LC-LC, OM4, DESDE MUSEO A EDIFICIO TÚNEL DEL VIENTO FAC.	100%
159	NP 25 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE (58X61) DE 40U TIPO INDUSTRIAL	100%
160	**NP 28 PUNTO DE RED DOBLE DE VOZ Y DATOS PARA PISO CON 1 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A /120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL) + 1 UND TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE CAJA, EN SALIDA DE TUB**	67%
161	CABLEADO	100%
162	INSTALACION DE APARATOS	100%
163	CERTIFICACION	0%
164	**NP 29 PUNTO DE RED DOBLE DE VOZ Y DATOS PARA PISO CON 1 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A /120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL) + 2 UND DE TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE CAJA, EN SALIDA DE**	67%
165	CABLEADO	100%
166	INSTALACION DE APARATOS	100%
167	CERTIFICACION	0%
168	**NP 27 SENSOR DE OCUPACIÓN MANUAL REMOTO IPV0R 3-VÍAS DE PARED, EN SALIDA DE TUBERIA PVC**	0%
169	CABLEADO	0%
170	INSTALACION DE APARATOS	0%
171	CERTIFICACION	0%
172	FIN COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	0%
173	**9 INSTALACIONES MECÁNICAS**	0%
174	**9.1 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN**	0%
175	9.1.1 CABLEADO DE COMUNICACIÓN 2X16 BLINDADO APANTALLADO	0%
176	9.1.2 TUBERÍA DE COBRE 5/8"	0%
177	9.1.3 TUBERÍA DE COBRE 3/8"	0%
178	FIN INSTALACIONES MECÁNICAS	0%
179	**10 PAÑETES**	72%
180	10.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	93%
181	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	0%
182	AD31 MURO EN SUPERBOARD FACHADA SUPERFICIE PULIDA DE 10MM INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, MALLA FIBRA DE VIDRIO, MASILLADO Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A UNA CARA INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR	0%
183	AD32 RECUBRIMIENTO BORDE DE PLACA EN SUPERBOARD ENTRE 0.55 Y 0.40 H (INCLUYE PINTURA BLANCA A 3 CAPAS, ESTUCO TIPO EXTERIOR, CINTA MALLA DE DILATACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ESTRUCTURA)	0%
184	AD33 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL N°5 PV E=0,12 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES	0%
185	AD34 CASETÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR (PERMANENTE)	0%

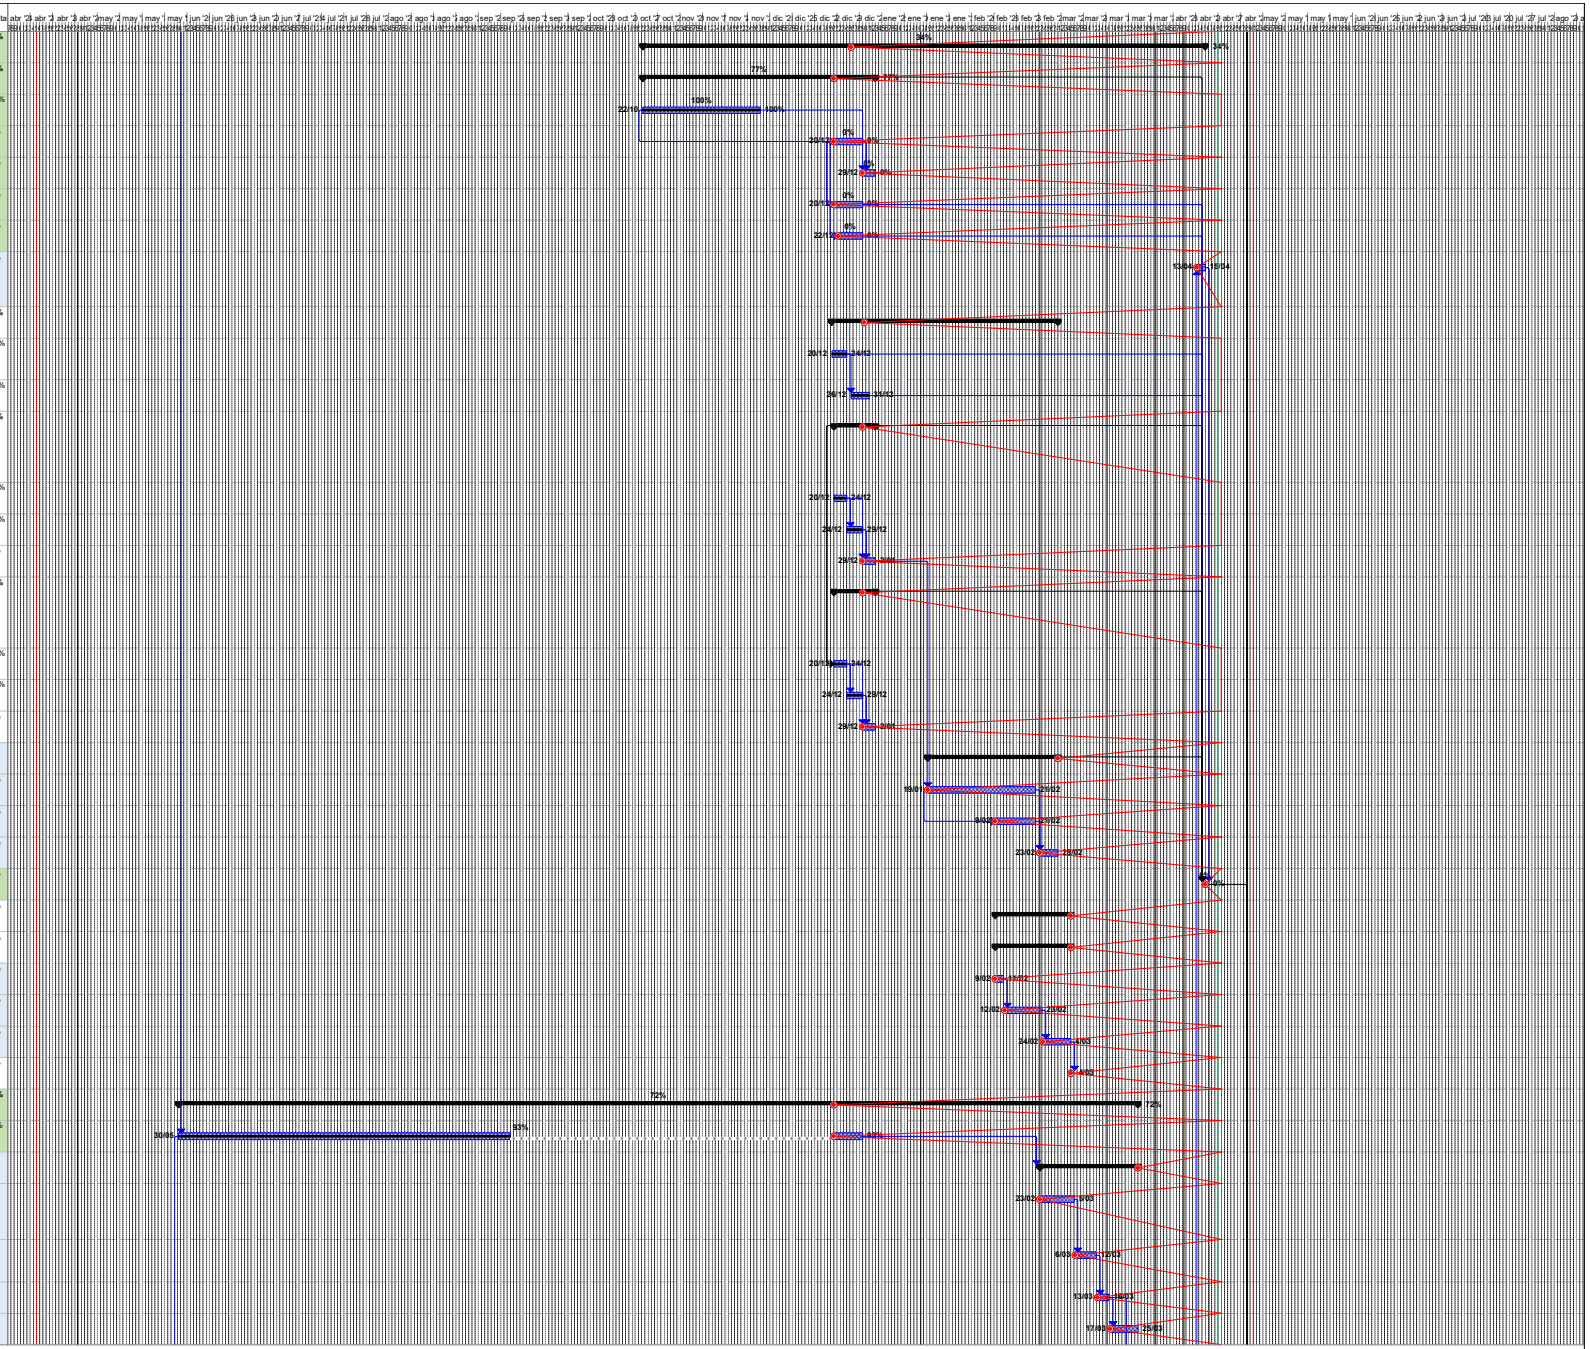

Proyecto: REPROGRAMACION - Fecha: lun 20/04/26

Tarea	Tarea resumida	División	Tarea inactiva	Tarea manual	solo el comienzo	Tareas críticas		
Tarea crítica	Tarea crítica resumida	Tareas externas	Hito inactivo	solo duración	solo fin	División crítica		
Hito	Hito resumido	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso		
Resumen	Progreso resumido	Agrupar por síntesis	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Fecha límite		


Id	Nombre de tarea	% mpleta
186	FIN PAÑETES	100%
187	**12 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**34%**
188	**12.1 BASES PISOS Y ACABADOS**	**61%**
189	12.1.2 BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS E: 10 cm)	0%
190	12.1.3 IMPERMEABILIZANTE BI COMPONENTE DE ALTA ADHERENCIA, RESISTENCIA A CAMBIOS DE TEMPERATURA EXTREMOS Y DE ALTA ELASTICIDAD REF CUBRISEAL DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS (DOS MANOS)	0%
191	12.1.4 PLACA ENTREPISO DE ALTA RESISTENCIA SUPERFICIE PULIDA 20 MM PARA CAMBIOS DE NIVEL (INCLUYE TORNILLERÍA, SELLADO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	0%
192	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**87%**
193	NP 01 BORDILLO EN CONCRETO H: 20 A: .15	99%
194	**ANDÉN Y GRADERÍAS**	**79%**
195	NP 10 EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR, INCLUYE CARGUE Y TRASPORTE	100%
196	NP 15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	100%
197	NP 12 RELLENO COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B200, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	100%
198	NP 11 RELLENO COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO BASE B600, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	100%
199	NP 13 BORDILLO PREFABRICADO DE CONCRETO (0.35 X 0.2 X 0.80)	100%
200	NP 21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	86%
201	NP 09 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ELEMENTOS COMO PLACAS, ESCALERAS, PEDESTALES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA OBRA	87%
202	NP 16 CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN	0%
203	NP 14 LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO PESADO	0%
204	**RECALCES**	**98%**
205	NP 19 ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO - ESPESOR 4 CM	87%
206	NP 18 PERFORACIÓN Y ANCLAJE EN CONCRETO REFORZADO PARA INSTALACIÓN DE REFUERZOS ESTRUCTURALES	93%
207	NP 17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY:420 MPA GR60 - NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO.	100%
208	NP 20 CONCRETO 3000 PSI ACELERADO A 7 DÍAS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	100%
209	NP 23 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=VARIABLE (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, INCLUYE DILATACIONES)	81%
210	FIN BASES PISOS Y ACABADOS	0%
211	**12.2 ENCHAPES**	**11%**
212	12.2.3 PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 PLATA DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS (TERRAZAS)	0%
213	12.2.4 GUARDAESCOBA PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS (TERRAZAS)	0%
214	12.2.5 PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 NEGRO DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS. (CIRCULACIONES)	0%
215	12.2.6 GUARDAESCOBA PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 NEGRO DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS. (CIRCULACIONES)	0%
216	12.2.7 PISO VINÍLICO	0%
217	12.2.8 GUARDAESCOBA PISO VINÍLICO	0%
218	**12.2.9 PISO EN VIDRIO INCOLORO MULTILAMINADO**	**0%**
219	SUMINISTRO	0%
220	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
221	12.2.10 ENCHAPE PISO MIKONOS ARD GRIS CARAS DIFERENCIADAS 33.8X33.8 O SIMILAR (PISO)	0%
222	**12.2.13 FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO REF. STAC BOND DE IGUAL O MEJORES CARACTERÍSTICAS (COLOR REF: SILVER METALIC)**	**42%**

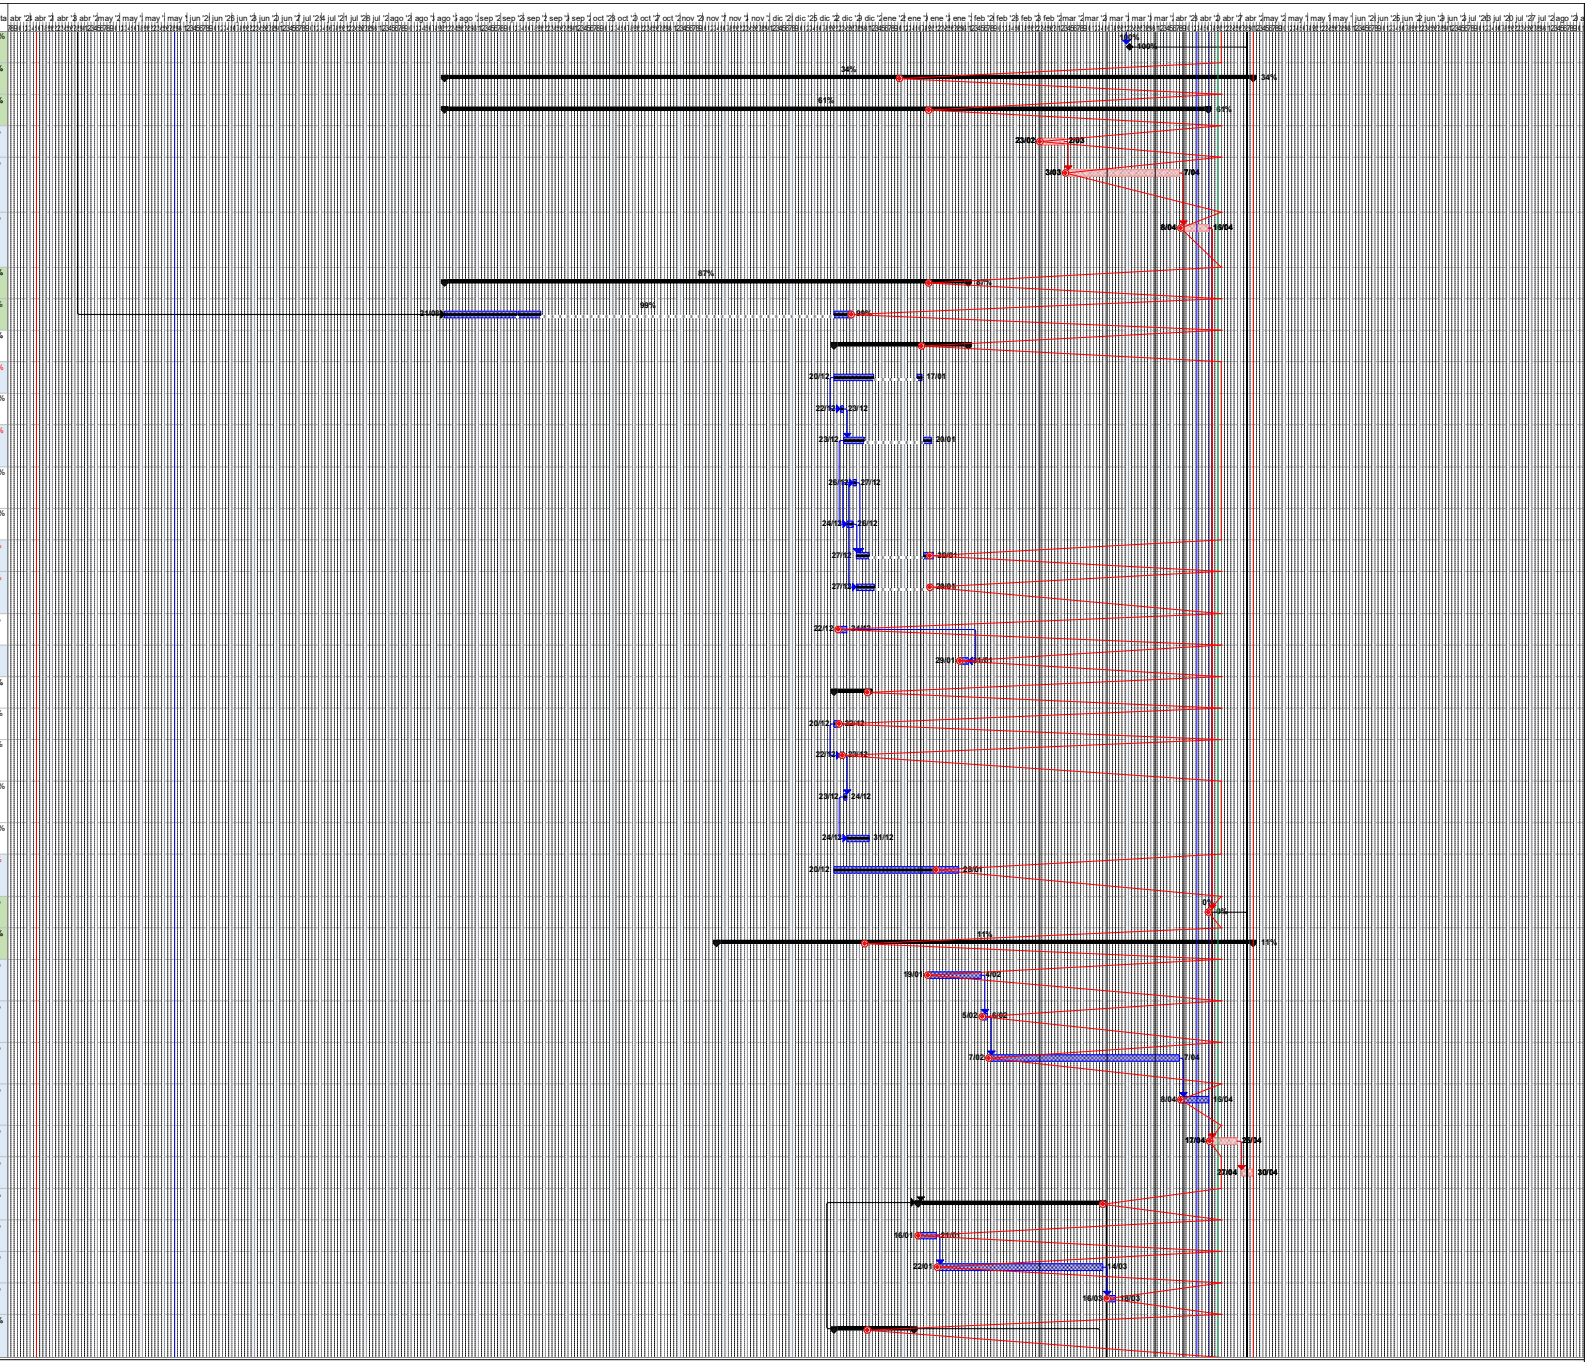

Proyecto: REPROGRAMACION - Fecha: lun 20/04/26

Tarea | Tarea resumida | División | Tarea inactiva | Tarea manual | solo el comienzo | Tareas críticas
Tarea crítica | Tarea crítica resumida | Tareas externas | Hito inactivo | solo duración | solo fin | División crítica
Hito | Hito resumido | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso
Resumen | Progreso resumido | Agrupar por síntesis | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Fecha límite


Id	Nombre de tarea	% completa
223	SUMINISTRO DE PANELES	97%
224	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE	34%
225	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	30%
226	**12.2.14 FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO REF. STAC BOND DE IGUAL O MEJORES CARACTERÍSTICAS (COLOR REF: BLUE)**	**88%**
227	SUMINISTRO DE PANELES	89%
228	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE	88%
229	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	88%
230	FIN ENCHAPES	0%
231	FIN ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	0%
232	**13 ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES**	**0%**
233	13.1 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	0%
234	13.2 PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS BAJO PLACA EN METALDECK	0%
235	13.3 PINTURA ANTIDESLIZANTE (HUELLAS ESCALERA)	0%
236	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**0%**
237	NP 24 ENCHAPE DE MURO 30X60 COLOR GRIS O EL QUE DETERMINE LA ENTIDAD. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	0%
238	NP 22 ESTUCO Y PINTURA ACRILICA A 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	0%
239	FIN ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES	0%
240	**14 CARPINTERÍA EN MADERA**	**0%**
241	**14.1 PUERTA CON ACABADO EN MELAMINA VERTICAL A DOS CARAS CON CANTOS ENCHAPADOS EN PVC DE 0.5mm INCLUYE MARCO, TAPALUZ Y BISAGRAS**	**0%**
242	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
243	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
244	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
245	**14.2 CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**0%**
246	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
247	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
248	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
249	**14.3 MESÓN EN MÁRMOL PARA SOBREPONER (60 CMS)INCLUYE SALPICADERO 4 CMS SILICONA, CHAZOS Y ACCESORIOS)**	**0%**
250	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
251	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
252	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
253	FIN CARPINTERÍA EN MADERA	0%
254	**15 CARPINTERÍA METÁLICA**	**0%**
255	**15.1 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS**	**0%**
256	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
257	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
258	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
259	FIN CARPINTERÍA METÁLICA	0%
260	**17 CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE**	**0%**
261	17.1 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	0%

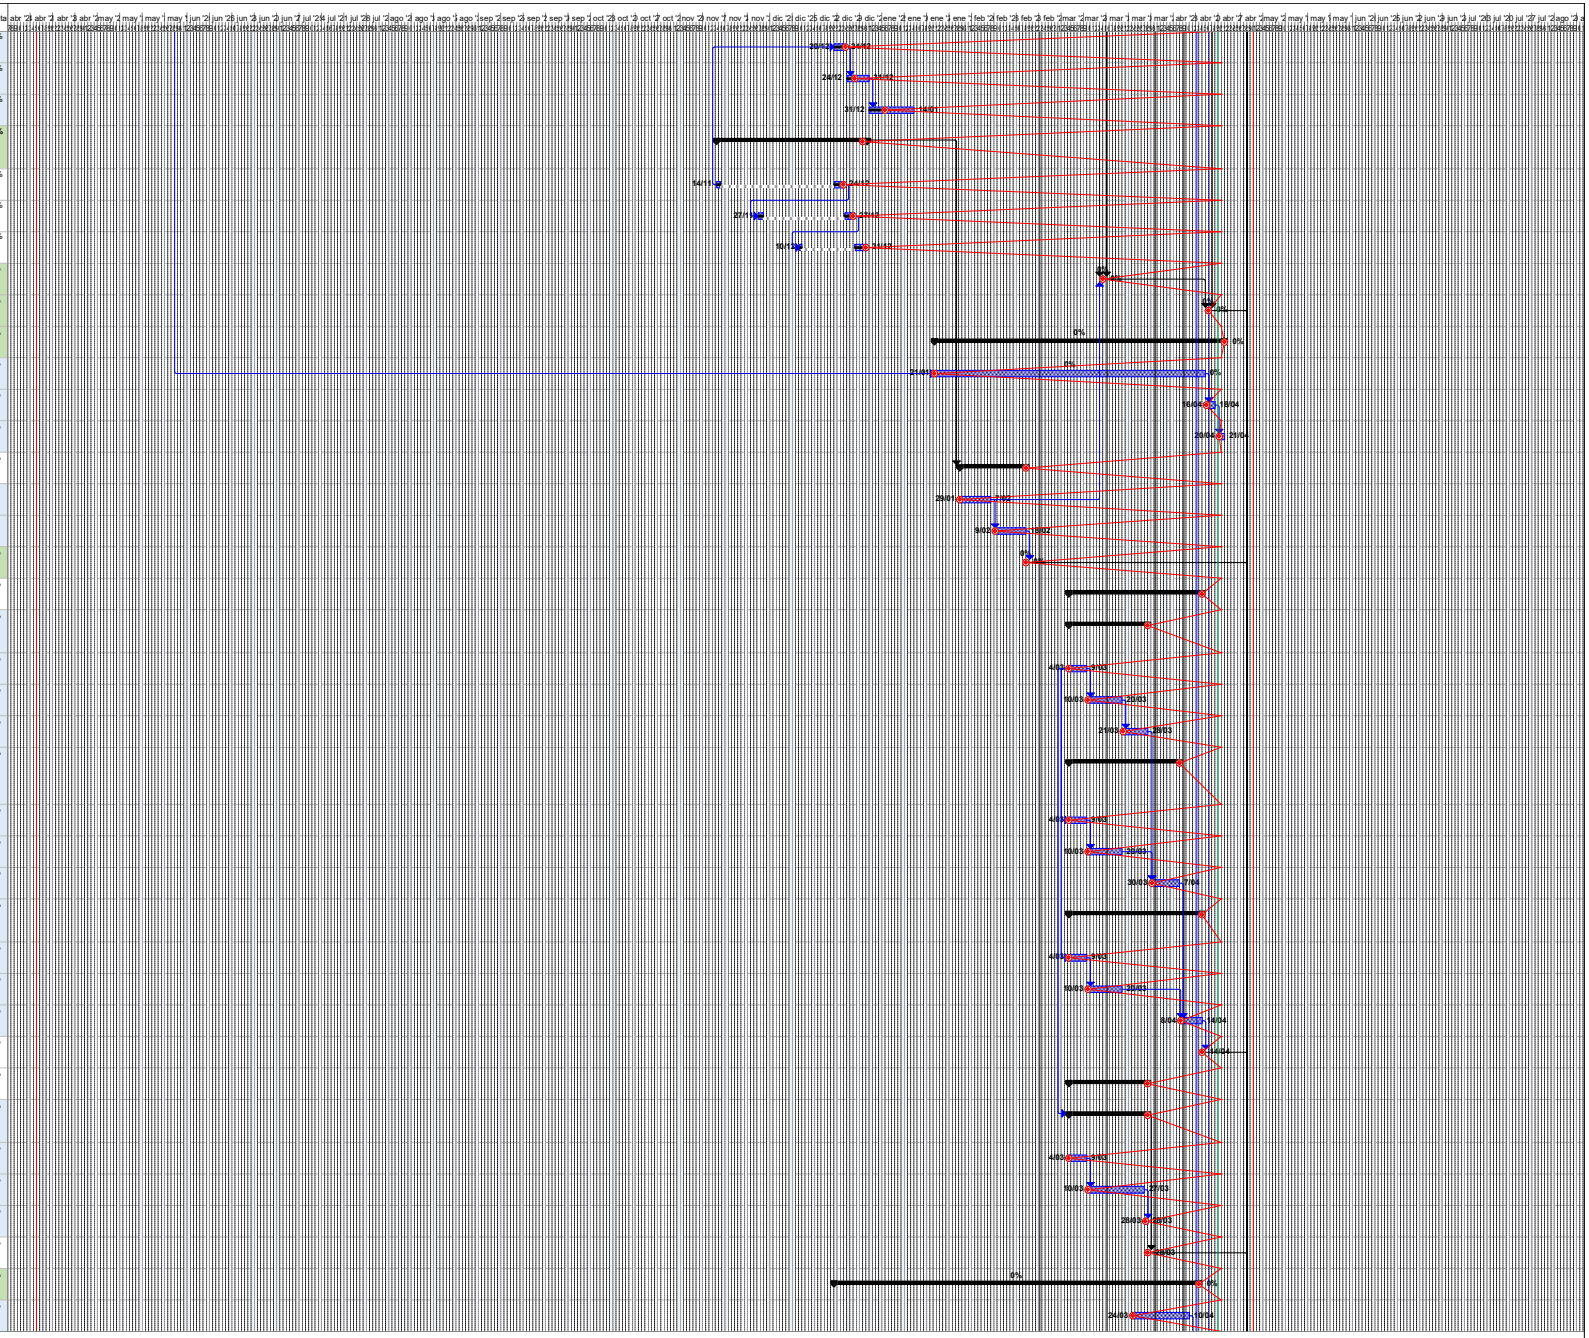

Proyecto: REPROGRAMACION - Fecha: lun 20/04/26

Tarea | Tarea resumida | División | Tarea inactiva | Tarea manual | solo el comienzo | Tareas críticas
Tarea crítica | Tarea crítica resumida | Tareas externas | Hito inactivo | solo duración | solo fin | División crítica
Hito | Hito resumido | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso
Resumen | Progreso resumido | Agrupar por síntesis | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Fecha límite


Id	Nombre de tarea	% mpleta
262	17.2 ACCESORIOS (ASIDERO) NIQUELADA PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS	0%
263	**17.3 VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL, TUBULAR RF 1101 PROYECTANTE DE ALÚMINA CON VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4MM COLOR COOL LITE + PVB .76 + VIDRIO 4MM BRONCE) VENTANAS BASCULANTES CON BRAZOS DE 8".**	0%
264	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
265	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
266	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
267	**17.4 FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4MM COLOR COOL LITE + PVB .76 + VIDRIO 4MM BRONCE)**	0%
268	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
269	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
270	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
271	**17.5 PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD DE 2.4 X 2.5 CM (VIDRIO 4MM COLOR COOL LITE + PVB .76 + VIDRIO 4MM BRONCE)**	0%
272	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
273	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
274	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
275	**17.6 FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4+4 LAMINADO PVB .76 INCOLORO) INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE TIPO ESTRELLA O SIMILAR QUE APOYE EN PLACA O COLUMNA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN APLIQUE EN CADA CA**	0%
276	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
277	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
278	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
279	**17.7 DIVISIONES PARA BAÑO EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 DE SEGURIDAD, PVB .76 COLOR NEGRO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PUERTAS).**	0%
280	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
281	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
282	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
283	**17.8 BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4+4 LAMINADO PVB .76 INCOLORO)**	0%
284	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
285	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
286	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
287	**17.9 MESÓN DE TRABAJO EMPOTRADO CON ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 3,5 MTS DE LARGO EN FORMA CURVA CON UN RADIO DE 7.7 APROXIMADAMENTE, INCLUYE SALPICADERO.**	0%
288	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
289	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
290	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
291	**17.10 MESÓN DE TRABAJO EMPOTRADO CON ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 7 MTS DE LARGO APROXIMADAMENTE CON SALPICADERO, INCLUYE (COCINA DE 6 PUESTOS 1 PLANCHA Y HORNO A GAS, COCINA CALDERO DE 3 FOGONES CON DOS QUEMADORES CADA UNO, POCETAS LAVAPLATOS DOB**	0%
292	INICIO DE FABRICACIÓN	0%
293	LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%
294	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%
295	FIN CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	0%
296	**19 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	0%

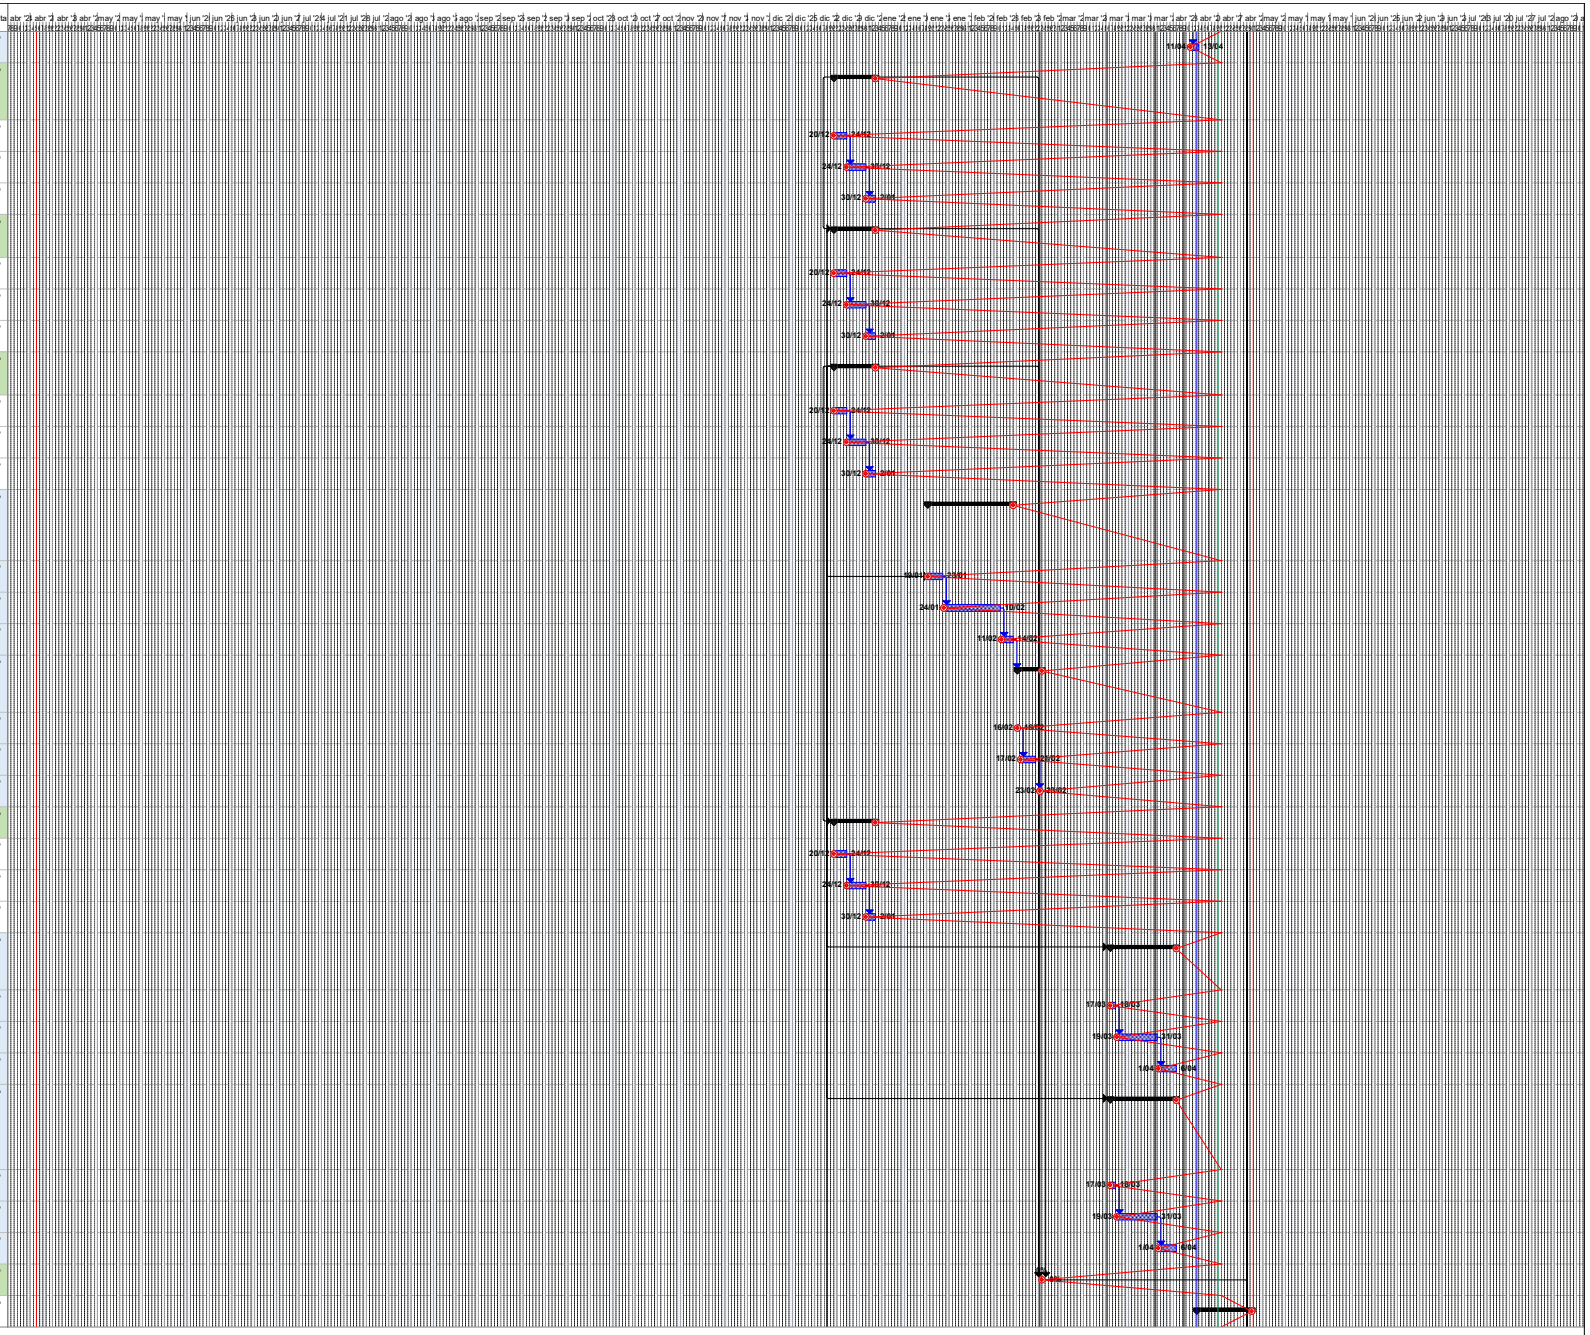

Proyecto: REPROGRAMACION - Fecha: lun 20/04/26

Tarea | Tarea resumida | División | Tarea inactiva | Tarea manual | solo el comienzo | Tareas críticas
Tarea crítica | Tarea crítica resumida | Tareas externas | Hito inactivo | solo duración | solo fin | División crítica
Hito | Hito resumido | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso
Resumen | Progreso resumido | Agrupar por síntesis | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Fecha límite


Id	Nombre de tarea	% completa
297	19.1 SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA POSTERIOR. INCLUYE VÁLVULA ANTIVANDÁLICA PUSH. REF ADRIÁTICA DE CORONA O SIMILAR	0%
298	19.2 LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	0%
299	19.3 GRIFERÍA ANTI VANDÁLICA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH, DE EMPOTRAR EN MUROS, CROMADA METÁLICA. INCLUYE INSTALACIÓN, ACCESORIOS DESDE LA ENTRADA A LA VÁLVULA HASTA LA CONEXIÓN AL GRIFO, Y TODO LO RELACIONADO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	0%
300	FIN APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%
301	**19.4 JUEGOS DE INCRUSTACIONES**	0%
302	19.4.1 PAPELERA TIPO INSTITUCIONAL CILÍNDRICA ACABADO SATINADO CAPACIDAD 18L	0%
303	19.4.3 REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	0%
304	19.4.4 TAPA DE REGISTRO EN PVC	0%
305	19.4.5 REJILLAS PLÁSTICA DE PARED PARA VENTILACIÓN.	0%
306	19.4.6 ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	0%
307	FIN JUEGOS DE INCRUSTACIONES	0%
308	**20 VIDRIOS Y ESPEJOS**	0%
309	20.1 ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	0%
310	20.2 INSTALACIÓN DE PELÍCULA ADHESIVA SANDBLASS FROSTED SEGÚN DISEÑO	0%
311	FIN VIDRIOS Y ESPEJOS	0%
312	**21 CERRADURAS**	0%
313	21.1 CERRADURA CILÍNDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	0%
314	21.2 CERRADURA CILÍNDRICA POMO ALUMINIO BAÑO	0%
315	21.3 CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD	0%
316	**24 ASEO GENERAL**	10%
317	24.1 LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	0%
318	24.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	19%
319	FIN ASEO GENERAL	0%
320	**26 EQUIPOS**	23%
321	**26.1 EQUIPOS HIDROSANITARIOS**	23%
322	**26.1.1 EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓN**	0%
323	SUMINISTRO	0%
324	INSTALACION	0%
325	PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%
326	**26.1.2 SISTEMA EYECTOR DRENAJE AGUAS LLUVIAS 3 HP**	67%
327	SUMINISTRO	100%
328	INSTALACION	100%
329	PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%
330	**26.1.3 EQUIPO INCENDIOS NORMALIZADO 40 HP**	0%
331	SUMINISTRO	0%
332	INSTALACION	0%
333	PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%
334	**26.1.4 UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE. O, INESTANCABLE CON PASO DE SOLIDOS DE 37 MM, POTENCIA 1 HP.**	33%
335	SUMINISTRO	100%

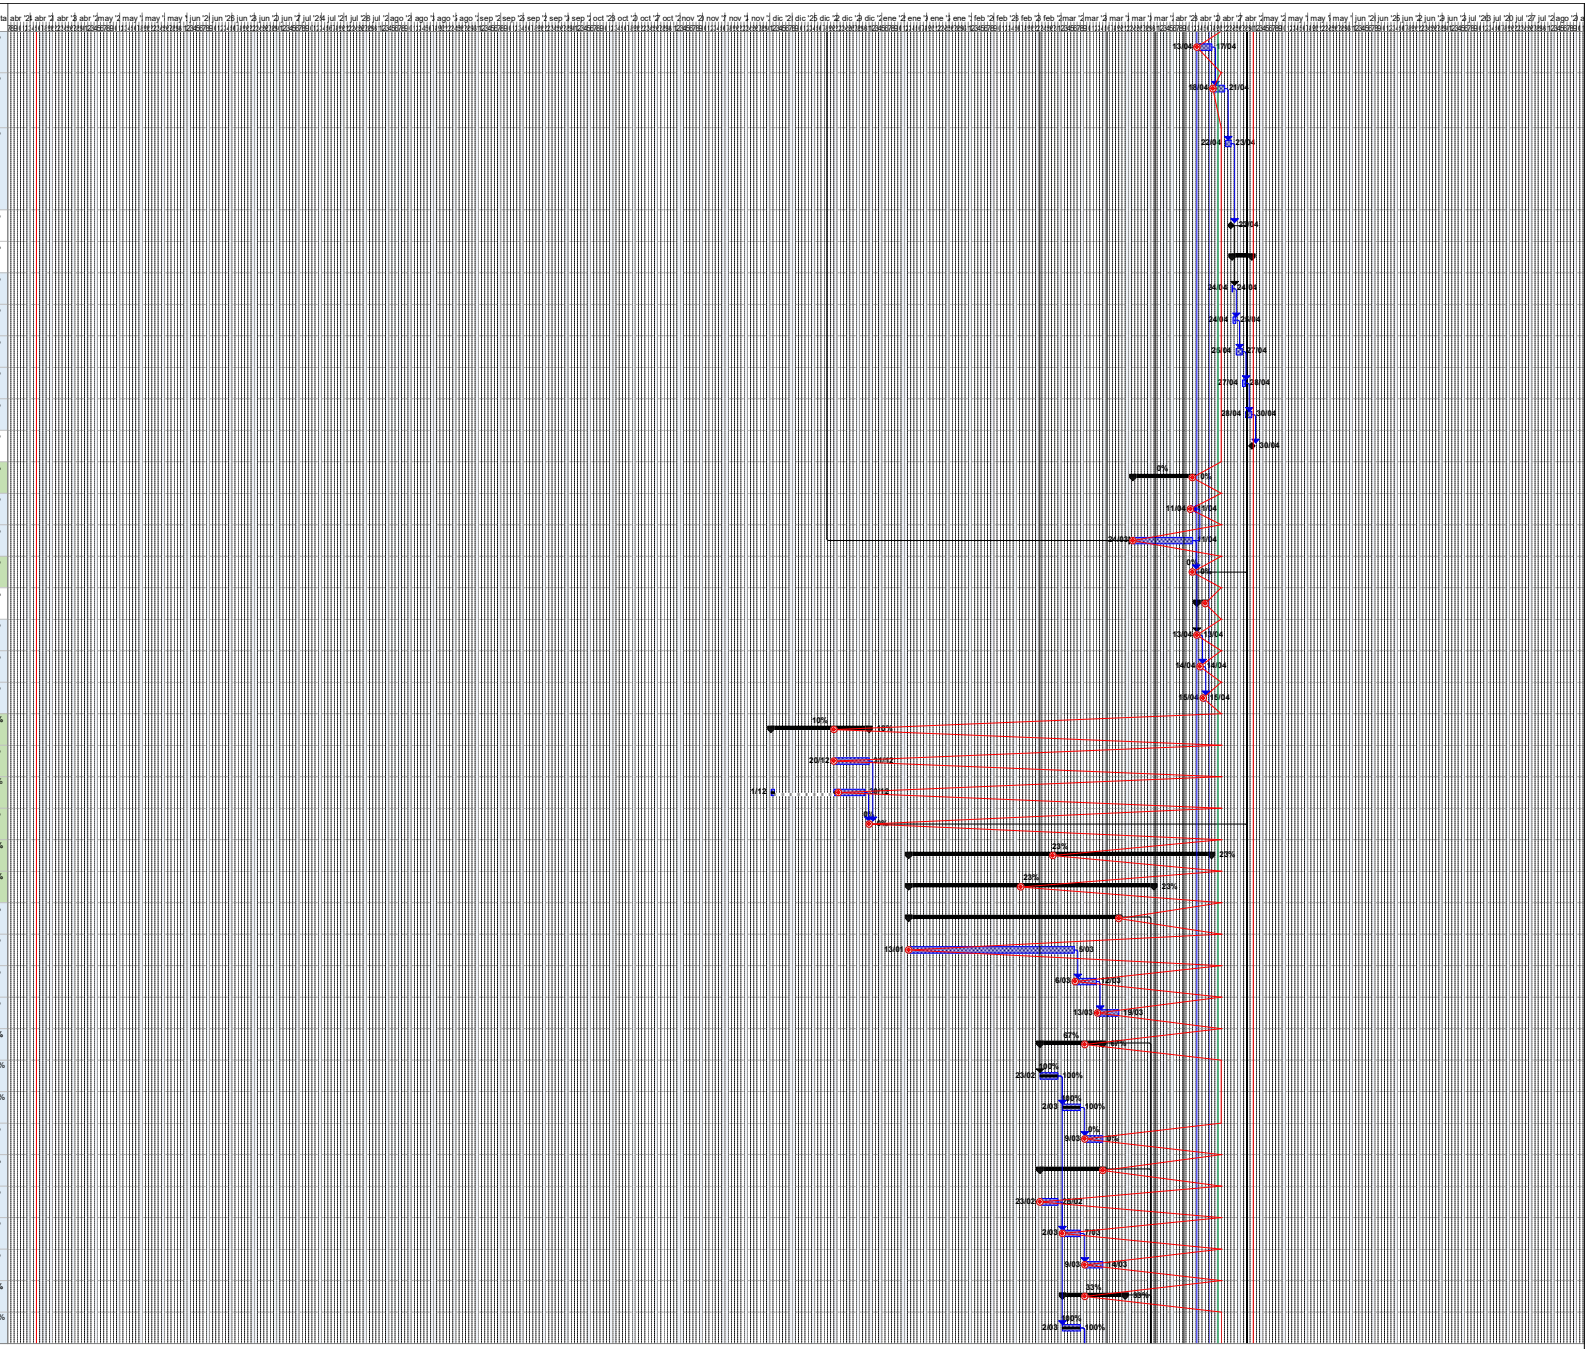

Proyecto: REPROGRAMACION - Fecha: lun 20/04/26

Tarea | Tarea resumida | División | Tarea inactiva | Tarea manual | solo el comienzo | Tareas críticas
Tarea crítica | Tarea crítica resumida | Tareas externas | Hito inactivo | solo duración | solo fin | División crítica
Hito | Hito resumido | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso
Resumen | Progreso resumido | Agrupar por síntesis | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Fecha límite

Id		Nombre de tarea	% completa
336		INSTALACION	0%
337		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%
338		**26.1.5 MOTOBOMBA PARA AGUA CON SOLIDOS DRENAJE AGUAS FOSO EYECTOR 3 HP**	**67%**
339	✓	SUMINISTRO	100%
340	✓	INSTALACION	100%
341		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%
342		FIN EQUIPOS HIDROSANITARIOS	0%
343		**26.2 EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA**	**0%**
344		**26.2.1 UNIDAD INTERIOR TIPO PARED CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 15.400 Btu/h**	**0%**
345		SUMINISTRO	0%
346		INSTALACION	0%
347		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%
348		**26.2.2 UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL DE ALTA ESTÁTICA CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 96.000 Btu/h**	**0%**
349		SUMINISTRO	0%
350		INSTALACION	0%
351		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%
352		**26.2.3 UNIDAD EXTERIOR DE VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 36.000 Btu/h**	**0%**
353		SUMINISTRO	0%
354		INSTALACION	0%
355		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%
356		**26.2.4 UNIDAD EXTERIOR DE VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 209.800 Btu/h**	**0%**
357		SUMINISTRO	0%
358		INSTALACION	0%
359		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%
360		FIN EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA	0%
361		ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**57%**
362		**NP 30 SWITCH ARUBA CX6300L-S3L76A Dos fuentes de poder YL670A 48G PoE +, LICENCIAS, GARANTÍA Y (04) MÓDULOS SFP MM, POR CADA SWITCH.**	**57%**
363		SUMINISTRO	60%
364		INSTALACION	0%
365		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%
366		FIN EQUIPOS	0%
367		**TERMINACION DE OBRA**	0%

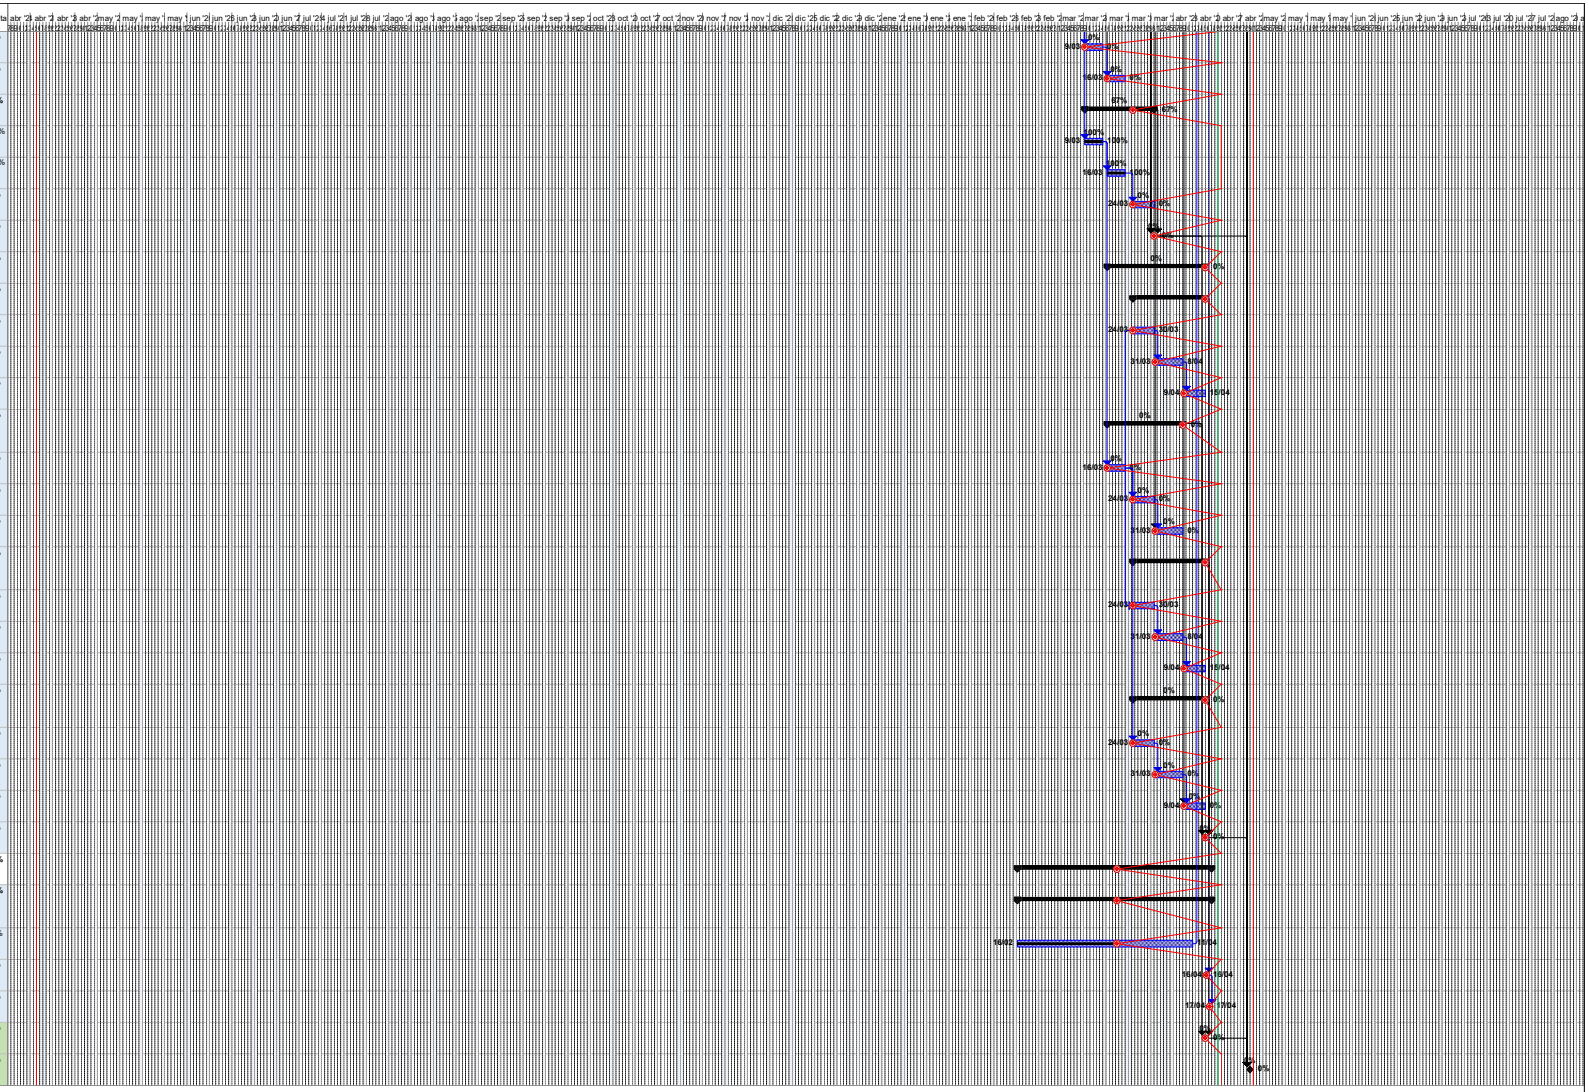

Proyecto: REPROGRAMACION - Fecha: lun 20/04/26

Tarea | Tarea resumida | División | Tarea inactiva | Tarea manual | solo el comienzo | Tareas críticas
Tarea crítica | Tarea crítica resumida | Tareas externas | Hito inactivo | solo duración | solo fin | División crítica
Hito | Hito resumido | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso
Resumen | Progreso resumido | Agrupar por síntesis | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Fecha límite
