

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**	**70%**	**406 días**	**mié 16/04/25**	**lun 15/06/26**
2		FIRMA ACTA DE INICIO DE OBRA	100%	0 días	mié 16/04/25	mié 16/04/25
3		REVISION TECNICA DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES Y PLANIMETRIA	100%	17 días	mié 16/04/25	lun 5/05/25
4		INICIO DE OBRA	100%	0 días	lun 5/05/25	lun 5/05/25
5		MODIFICATORIO 1	100%	0 días	jue 24/07/25	jue 24/07/25
6		MODIFICATORIO 2	100%	0 días	mié 24/12/25	mié 24/12/25
7		MODIFICATORIO 3	0%	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26
8		**3 CIMENTACION**	**98%**	**125,42**	**vie 26/12/25**	**mié 6/05/26**
9		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**98%**	**125,42**	**vie 26/12/25**	**mié 6/05/26**
10		NP 19 ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO - ESPESOR 4 CM	100%	23 días	vie 26/12/25	lun 19/01/26
11		NP 18 PERFORACIÓN Y ANCLAJE EN CONCRETO REFORZADO PARA INSTALACIÓN DE REFUERZOS ESTRUCTURALES	100%	21 días	mar 6/01/26	sáb 2/05/26
12		NP 17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY:420 MPA GR60 - NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO.	91%	25 días	jue 15/01/26	mié 6/05/26
13		NP 20 CONCRETO 3000 PSI ACELERADO A 7 DÍAS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	100%	23 días	lun 26/01/26	mié 6/05/26
14		FIN CIMENTACIONES	0%	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26
15		**4 ESTRUCTURA**	**99%**	**283,84**	**vie 25/07/25**	**sáb 16/05/26**
16		**4.2 ESTRUCTURA METÁLICA - ACERO DE REFUERZO - ANCLAJES**	**99%**	**283,84 días**	**vie 25/07/25**	**sáb 16/05/26**
17		**4.2.1 PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C.**	**99%**	**283,84 días**	**vie 25/07/25**	**sáb 16/05/26**
18		TRABAJO DE CAMPO/LOCALIZACIÓN, DISEÑO Y APROBACIÓN DE DISEÑOS	100%	30 días	vie 25/07/25	lun 25/08/25
19		TRABAJO EN TALLER Y SUMINISTRO DE MATERIALES	100%	142 días	mar 9/09/25	mié 4/02/26
20		MONTAJE DE ESTRUCTURA	97%	140 días	mié 22/10/25	sáb 16/05/26
21		FIN PERFILERÍA ESTRUCTURAL	0%	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26
22		**6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**0%**	**42 días**	**sáb 2/05/26**	**sáb 13/06/26**
23		**6.1 DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS**	**0%**	**42 días**	**sáb 2/05/26**	**sáb 13/06/26**
24		6.1.1 TUBERÍA PVC-P RECUBRIMIENTO RUBATEX 3/4"	0%	21 días	sáb 2/05/26	sáb 23/05/26
25		6.1.2 TUBERÍA PVC-P RECUBRIMIENTO RUBATEX 1"	0%	21 días	sáb 23/05/26	sáb 13/06/26
26		FIN DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS	0%	0 días	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26
27		**7 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**96%**	**402 días**	**mié 16/04/25**	**jue 11/06/26**
28		**7.3 BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA**	**99%**	**351,16 días**	**mar 6/05/25**	**vie 8/05/26**
29		7.3.2 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø2"	100%	16 días	mar 6/05/25	mié 21/05/25
30		7.3.3 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1"-1/2"	100%	16 días	mar 6/05/25	mié 21/05/25
31		7.3.4 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1-1/4	100%	16 días	mar 6/05/25	mié 21/05/25
32		7.3.5 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1"	100%	16 días	mar 6/05/25	mié 21/05/25
33		7.3.6 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4"	100%	34 días	mar 6/05/25	lun 9/06/25
34		7.3.9 BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 54	100%	34 días	mar 6/05/25	lun 9/06/25
35		7.3.10 BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 54X300	100%	34 días	mar 6/05/25	lun 9/06/25
36		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**100%**	**274,16**	**vie 25/07/25**	**vie 8/05/26**
37		NP 08 DUCTERIA TIPO PVC 3/4"	100%	14 días	vie 25/07/25	vie 8/05/26
38		FIN BANCO DE DUCTERIAS	0%	0 días	vie 8/05/26	vie 8/05/26
39		**7.4 TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL**	**100%**	**120 días**	**mar 16/09/25**	**mar 20/01/26**
40		**7.4.1 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDN-0-1)**	**100%**	**50 días**	**mar 16/09/25**	**jue 6/11/25**
41		SUMINISTRO A OBRA	100%	42 días	mar 16/09/25	mar 28/10/25
42		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%	8 días	mié 29/10/25	jue 6/11/25

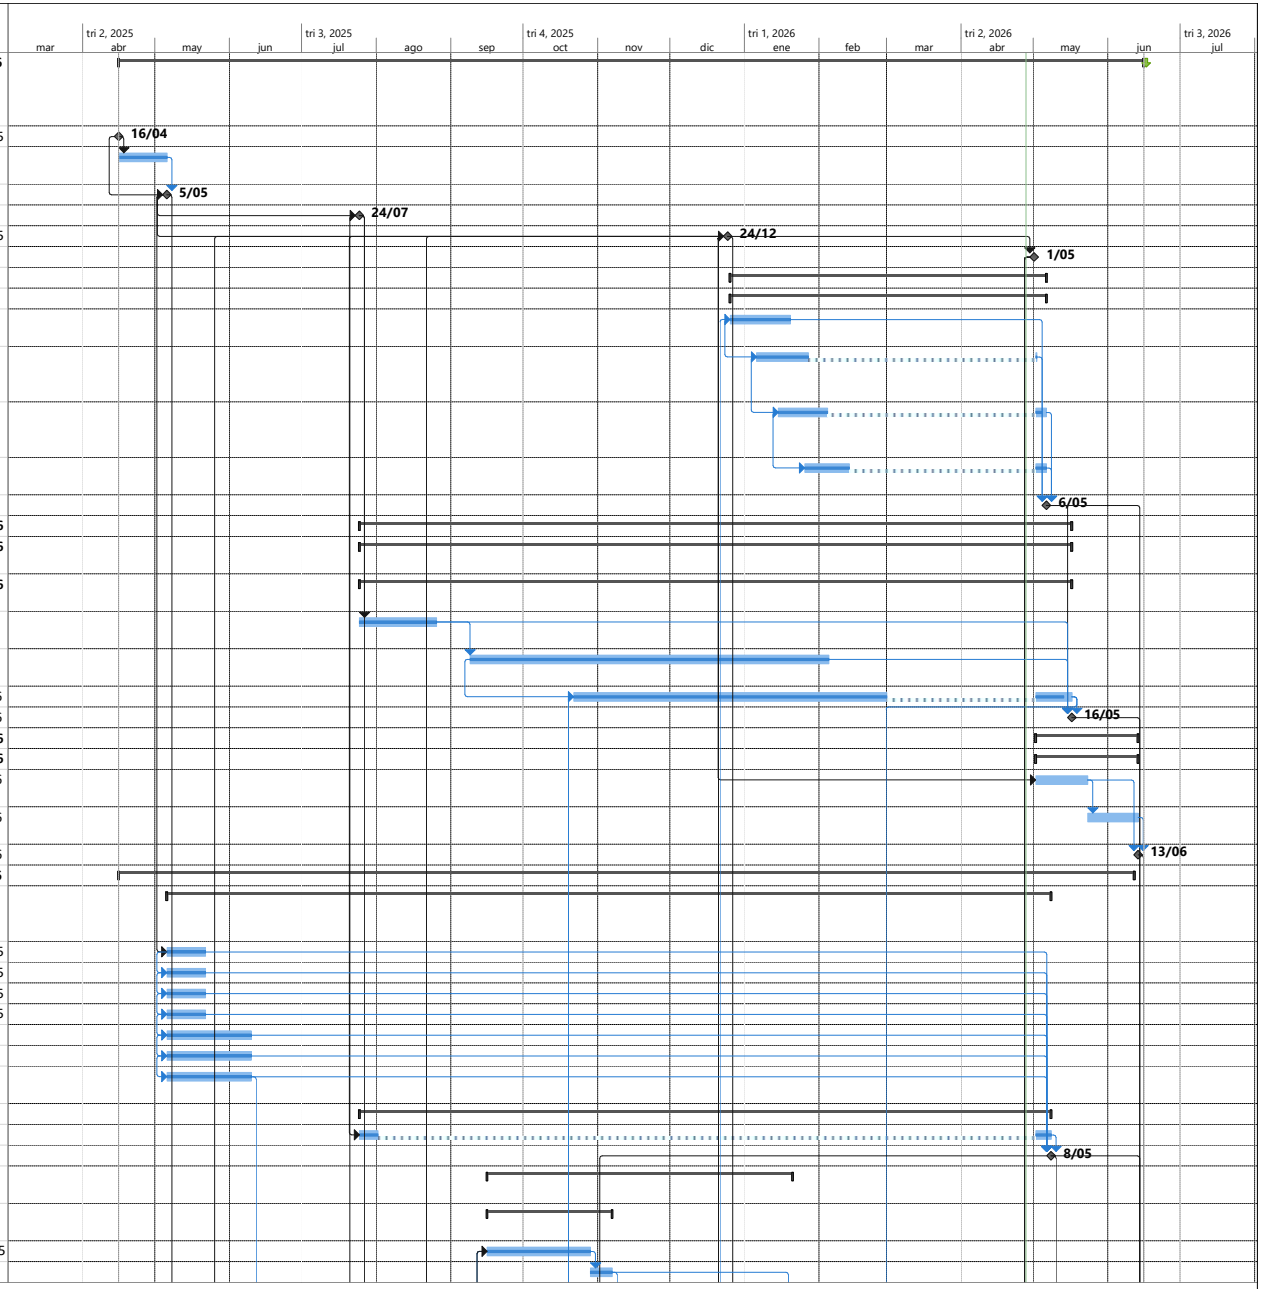

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 28/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin
43		**7.4.2 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDN-2)**	**100%**	**58 días**	**mar 16/09/25**	**vie 14/11/25**
44		SUMINISTRO A OBRA	100%	42 días	mar 16/09/25	mar 28/10/25
45		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%	8 días	vie 7/11/25	vie 14/11/25
46		**7.4.3 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDN-3-4)**	**100%**	**68 días**	**mar 16/09/25**	**mar 25/11/25**
47		SUMINISTRO A OBRA	100%	42 días	mar 16/09/25	mar 28/10/25
48		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%	8 días	mar 18/11/25	mar 25/11/25
49		**7.4.4 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDN-5-6)**	**100%**	**76 días**	**mar 16/09/25**	**mié 3/12/25**
50		SUMINISTRO A OBRA	100%	42 días	mar 16/09/25	mar 28/10/25
51		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%	8 días	mié 26/11/25	mié 3/12/25
52		**7.4.5 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDA)**	**100%**	**84 días**	**mar 16/09/25**	**vie 12/12/25**
53		SUMINISTRO A OBRA	100%	42 días	mar 16/09/25	mar 28/10/25
54		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%	8 días	jue 4/12/25	vie 12/12/25
55		**7.4.6 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDI-3-4)**	**100%**	**94 días**	**mar 16/09/25**	**lun 22/12/25**
56		SUMINISTRO A OBRA	100%	42 días	mar 16/09/25	mar 28/10/25
57		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%	8 días	lun 15/12/25	lun 22/12/25
58		**7.4.7 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDR-1)**	**100%**	**102 días**	**mar 16/09/25**	**mié 31/12/25**
59		SUMINISTRO A OBRA	100%	42 días	mar 16/09/25	mar 28/10/25
60		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%	8 días	mar 23/12/25	mié 31/12/25
61		**7.4.8 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL (TDR-3-4)**	**100%**	**110 días**	**mar 16/09/25**	**vie 9/01/26**
62		SUMINISTRO A OBRA	100%	42 días	mar 16/09/25	mar 28/10/25
63		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%	8 días	vie 2/01/26	vie 9/01/26
64		**7.4.9 COFRE METÁLICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED**	**100%**	**120 días**	**mar 16/09/25**	**mar 20/01/26**
65		SUMINISTRO A OBRA	100%	42 días	mar 16/09/25	mar 28/10/25
66		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	100%	8 días	mar 13/01/26	mar 20/01/26
67		FIN TABLEROS ELECTRICOS	100%	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26
68		**7.5 ACOMETIDAS ELECTRICAS**	**99%**	**368,16**	**mié 16/04/25**	**vie 8/05/26**
69		7.5.1 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT 3 No. 4/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 4/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 6 AWGXCUXDESN TIERRA	100%	8 días	mar 10/06/25	mar 17/06/25
70		7.5.2 CABLEADO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 3XNo. 2/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 NO. 2/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 NO. 2/0 CUXDESNXAWG TIERRA	100%	4 días	mar 10/06/25	vie 13/06/25
71		7.5.3 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 3 No. 1/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 1/0 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 6 AWGXCUXDESN TIERRA	100%	8 días	mar 10/06/25	mar 17/06/25
72		7.5.4 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 3 No. 2 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 2 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 8 AWGXCUXDESN TIERRA	100%	4 días	mar 10/06/25	vie 13/06/25
73		7.5.5 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 3 No. 4 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 4 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 8 AWGXCUXDESN TIERRA	100%	8 días	mar 10/06/25	mar 17/06/25

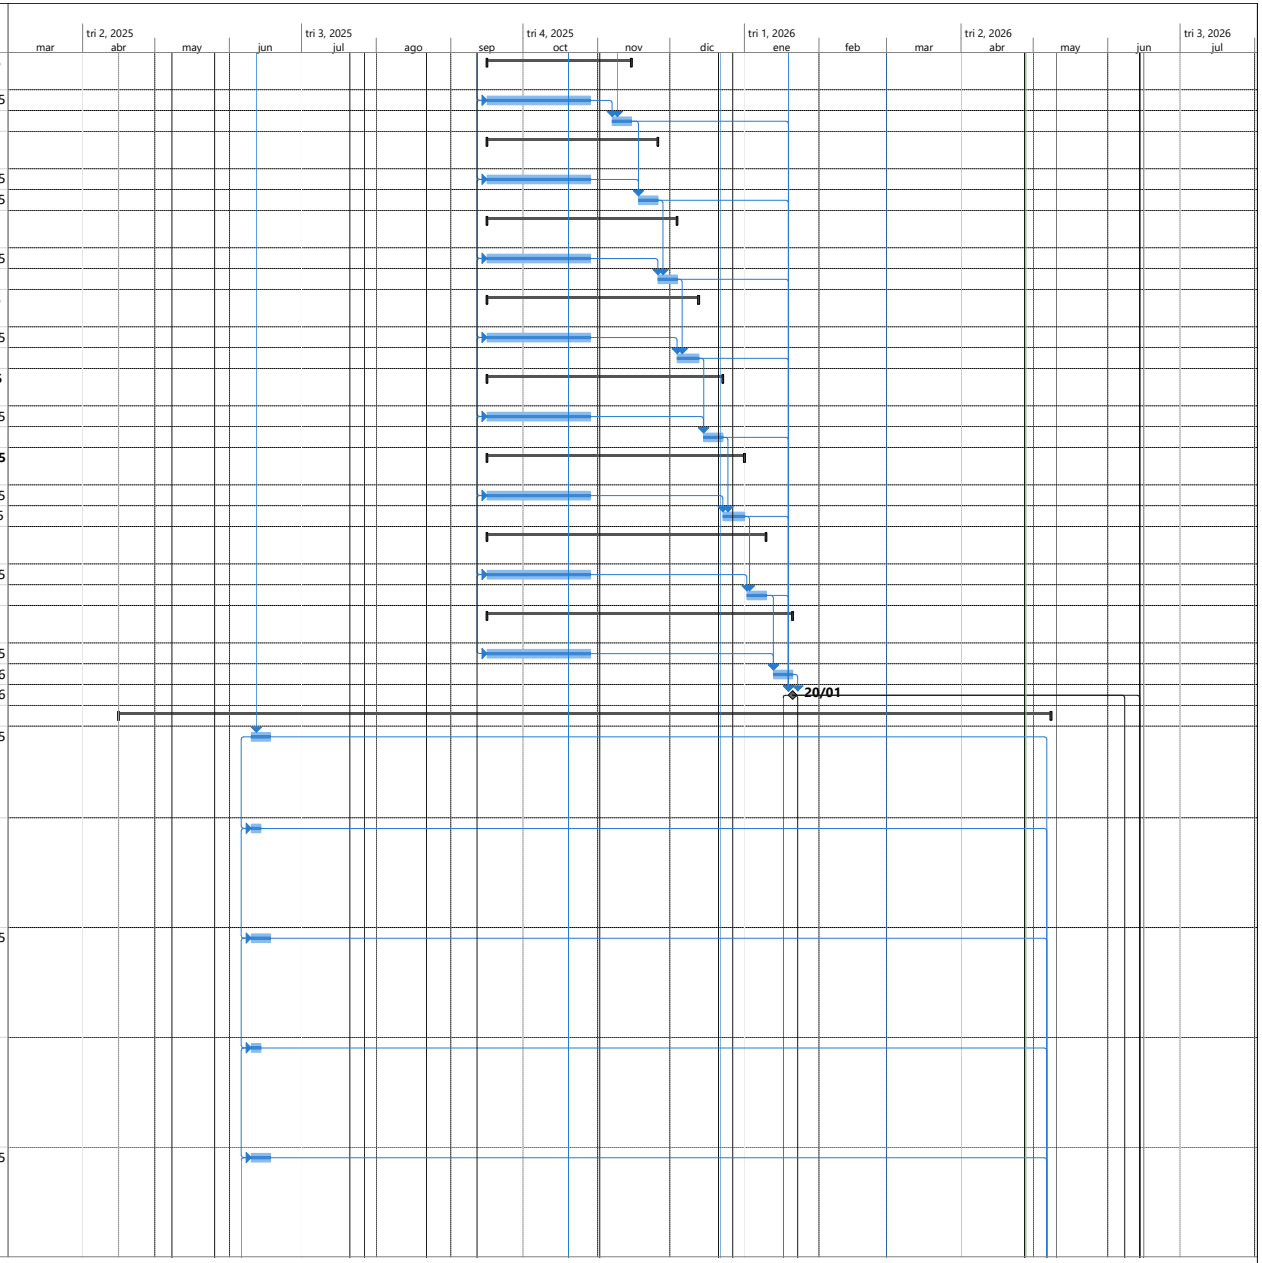

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 28/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin
74		7.5.6 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,600V 90°C: 2 No. 4 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 4 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 8 AWGXCUXDESN TIERRA	100%	4 días	mar 10/06/25	vie 13/06/25
75		7.5.7 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 3 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 8 AWGXCUXDESN TIERRA	100%	16 días	mar 10/06/25	jue 26/06/25
76		7.5.8 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,600V 90°C: 3 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 10 AWGXCUXDESN TIERRA	100%	26 días	mar 10/06/25	lun 7/07/25
77		7.5.9 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,600V 90°C: 1 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 8 KCMIL/AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 10 AWGXCUXDESN TIERRA	100%	4 días	mar 10/06/25	vie 13/06/25
78		7.5.10 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) 600V 90°C: 2 No. 12 AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 12 AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 12 AWGXCUXDESN TIERRA, INCLUYE	100%	5 días	mié 16/04/25	mar 22/04/25
79		7.5.11 CABLEADO EN COBRE TIPO PE, HF, FR, LS, CT, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, 600V 90°C: 1 No. 12 AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT FASES + 1 No. 12 AWGXCUX PE, HF, FR, LS, CT NEUTRO + 1 X No. 12 AWGXCUXDESN TIERRA	100%	56 días	mar 10/06/25	mié 6/08/25
80		FIN ACOMETIDAS ELECTRICAS	0%	0 días	vie 8/05/26	vie 8/05/26
81		**7.6 SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC**	**88%**	**385 días**	**mar 6/05/25**	**jue 11/06/26**
82		**7.6.1 INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERÍA PVC**	**100%**	**250 días**	**mar 6/05/25**	**jue 22/01/26**
83		DUCTERIA	100%	8 días	mar 6/05/25	mar 13/05/25
84		ALAMBRADO	100%	10 días	mié 14/05/25	vie 23/05/25
85		COLOCACION APARATO	100%	4 días	lun 26/05/25	jue 29/05/25
86		PRUEBAS	100%	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26
87		**7.6.2 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL)**	**100%**	**242 días**	**mié 14/05/25**	**jue 22/01/26**
88		DUCTERIA	100%	8 días	mié 14/05/25	mié 21/05/25
89		ALAMBRADO	100%	12 días	jue 22/05/25	mar 3/06/25
90		COLOCACION APARATO	100%	6 días	mié 4/06/25	lun 9/06/25
91		PRUEBAS	100%	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26
92		**7.6.3 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL)**	**100%**	**234 días**	**jue 22/05/25**	**jue 22/01/26**
93		DUCTERIA	100%	8 días	jue 22/05/25	jue 29/05/25
94		ALAMBRADO	100%	12 días	vie 30/05/25	mié 11/06/25
95		COLOCACION APARATO	100%	6 días	jue 12/06/25	mar 17/06/25
96		PRUEBAS	100%	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26
97		**7.6.4 TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL)**	**100%**	**226 días**	**vie 30/05/25**	**jue 22/01/26**
98		DUCTERIA	100%	10 días	vie 30/05/25	lun 9/06/25
99		ALAMBRADO	100%	10 días	mar 10/06/25	jue 19/06/25
100		COLOCACION APARATO	100%	6 días	vie 20/06/25	jue 26/06/25
101		PRUEBAS	100%	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26

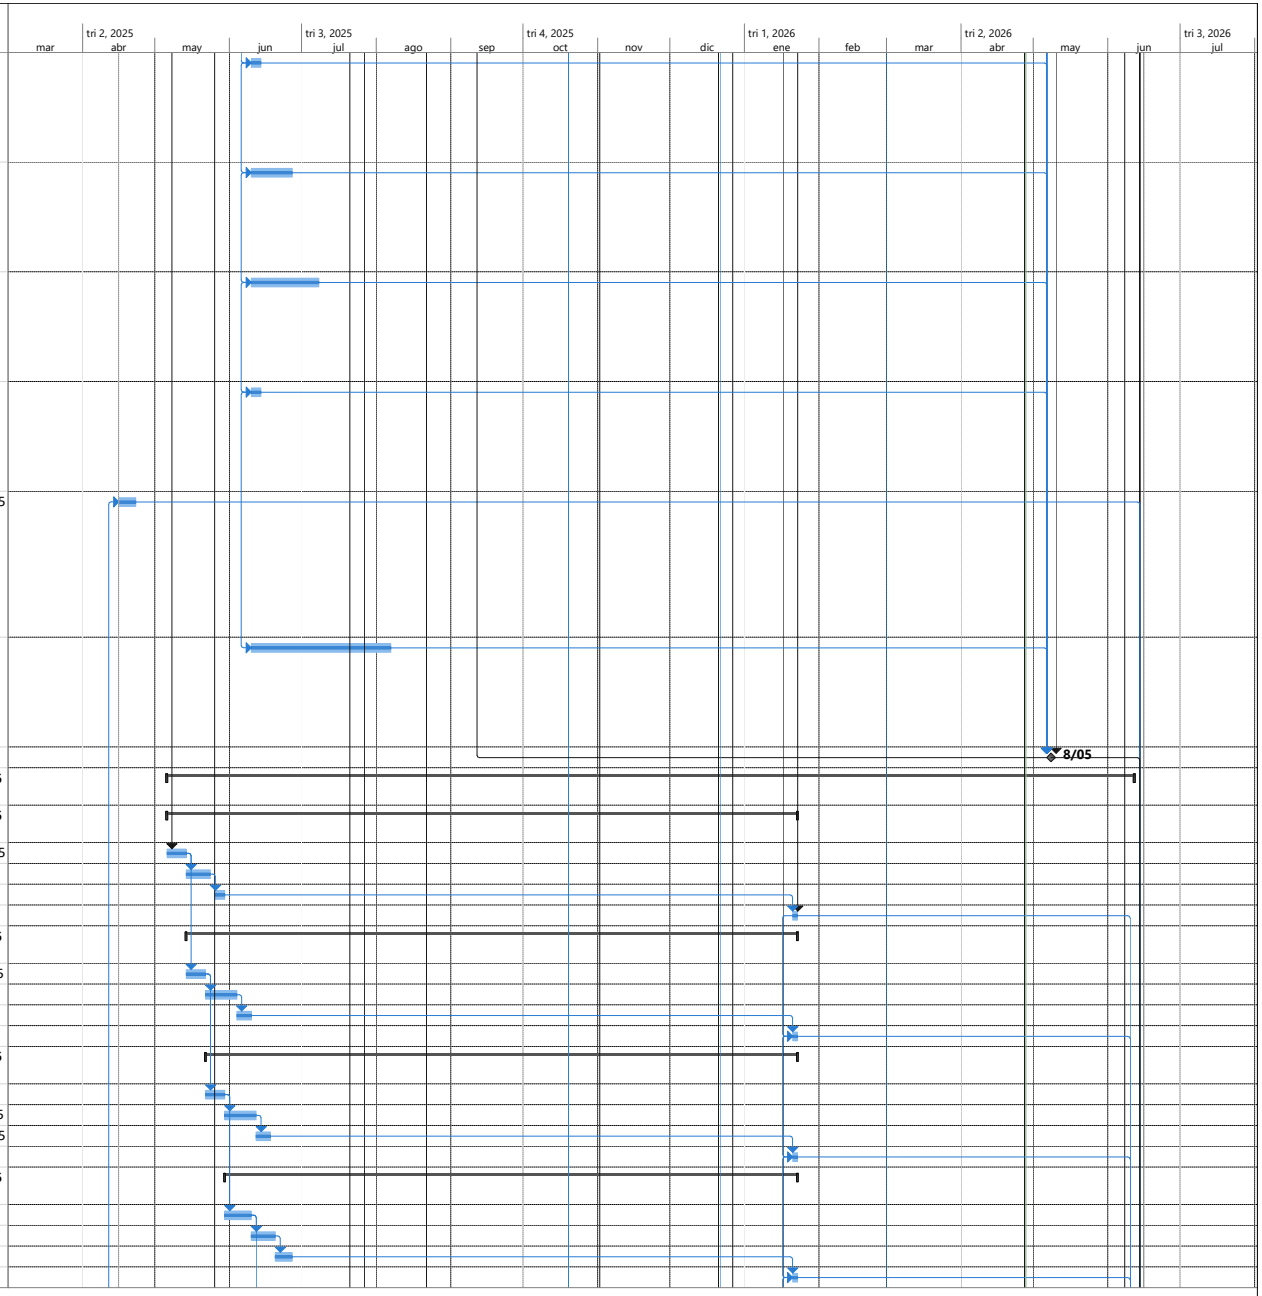

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 28/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin
102		**7.6.6 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./125V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL)**	**100%**	**216 días**	**mar 10/06/25**	**jue 22/01/26**
103		DUCTERIA	100%	8 días	mar 10/06/25	mar 17/06/25
104		ALAMBRADO	100%	12 días	mié 18/06/25	mar 1/07/25
105		COLOCACION APARATO	100%	6 días	mié 2/07/25	lun 7/07/25
106		PRUEBAS	100%	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26
107		**7.6.7 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA)**	**100%**	**208 días**	**mié 18/06/25**	**jue 22/01/26**
108		DUCTERIA	100%	8 días	mié 18/06/25	jue 26/06/25
109		ALAMBRADO	100%	12 días	vie 27/06/25	mié 9/07/25
110		COLOCACION APARATO	100%	6 días	jue 10/07/25	mar 15/07/25
111		PRUEBAS	100%	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26
112		**7.6.8 TOMACORRIENTE BIFÁSICA AÉREA 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2Ø+PT)**	**100%**	**200 días**	**vie 27/06/25**	**jue 22/01/26**
113		DUCTERIA	100%	10 días	vie 27/06/25	lun 7/07/25
114		ALAMBRADO	100%	10 días	mar 8/07/25	jue 17/07/25
115		COLOCACION APARATO	100%	6 días	vie 18/07/25	mié 23/07/25
116		PRUEBAS	100%	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26
117		**7.6.9 TOMACORRIENTE BIFÁSICA DE INCRUSTAR 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20P, EN SALIDA DE TUBERÍA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TORNILLERÍA, TE**	**100%**	**190 días**	**mar 8/07/25**	**jue 22/01/26**
118		DUCTERIA	100%	8 días	mar 8/07/25	mar 15/07/25
119		ALAMBRADO	100%	10 días	mié 16/07/25	vie 25/07/25
120		COLOCACION APARATO	100%	4 días	lun 28/07/25	jue 31/07/25
121		PRUEBAS	100%	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26
122		**7.6.10 SECADOR DE MANOS ECOJET OPERADO POR SENSOR, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V, MONTAJE DE SOBREPONER, EN SALIDA DE TUBERÍA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TORNILLERÍA, TERMINALES, Y**	**75%**	**291 días**	**mar 8/07/25**	**jue 7/05/26**
123		DUCTERIA	100%	8 días	mar 8/07/25	mar 15/07/25
124		ALAMBRADO	100%	10 días	mié 16/07/25	vie 25/07/25
125		COLOCACION APARATO	0%	4 días	sáb 2/05/26	mar 5/05/26
126		PRUEBAS	0%	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26
127		**7.6.20 LUCES INTERMITENTES TÚNEL LED INCLUYE: 4 BANDAS LED RGBW CON PERFIL DE ALUMINIO CONFIGURACIÓN DINÁMICA Y 2 ANILLOS DE ALUMINIO CONTROLADOR DE COLOR Y DE INTERMITENCIA TÚNEL CABLEADO**	**0%**	**40 días**	**sáb 2/05/26**	**jue 11/06/26**
128		DUCTERIA	0%	14 días	sáb 2/05/26	vie 15/05/26
129		ALAMBRADO	0%	12 días	sáb 16/05/26	jue 28/05/26
130		COLOCACION APARATO	0%	10 días	vie 29/05/26	sáb 6/06/26
131		PRUEBAS	0%	2 días	mié 10/06/26	jue 11/06/26
132		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**100%**	**222,88**	**vie 25/07/25**	**vie 13/03/26**
133		**NP 02 INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 15A / TUBERIA PVC**	**100%**	**222,88 días**	**vie 25/07/25**	**vie 13/03/26**
134		DUCTERIA	100%	8 días	vie 25/07/25	vie 1/08/25
135		ALAMBRADO	100%	10 días	lun 4/08/25	jue 14/08/25
136		COLOCACION APARATO	100%	6 días	vie 15/08/25	jue 21/08/25
137		PRUEBAS	100%	2 días	mié 21/01/26	vie 13/03/26
138		**NP 03 INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 15A / TUBERIA EMT**	**100%**	**30 días**	**vie 26/12/25**	**lun 26/01/26**
139		DUCTERIA	100%	10 días	vie 26/12/25	lun 5/01/26
140		ALAMBRADO	100%	10 días	mar 6/01/26	vie 16/01/26
141		COLOCACION APARATO	100%	4 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26
142		PRUEBAS	100%	4 días	vie 23/01/26	lun 26/01/26

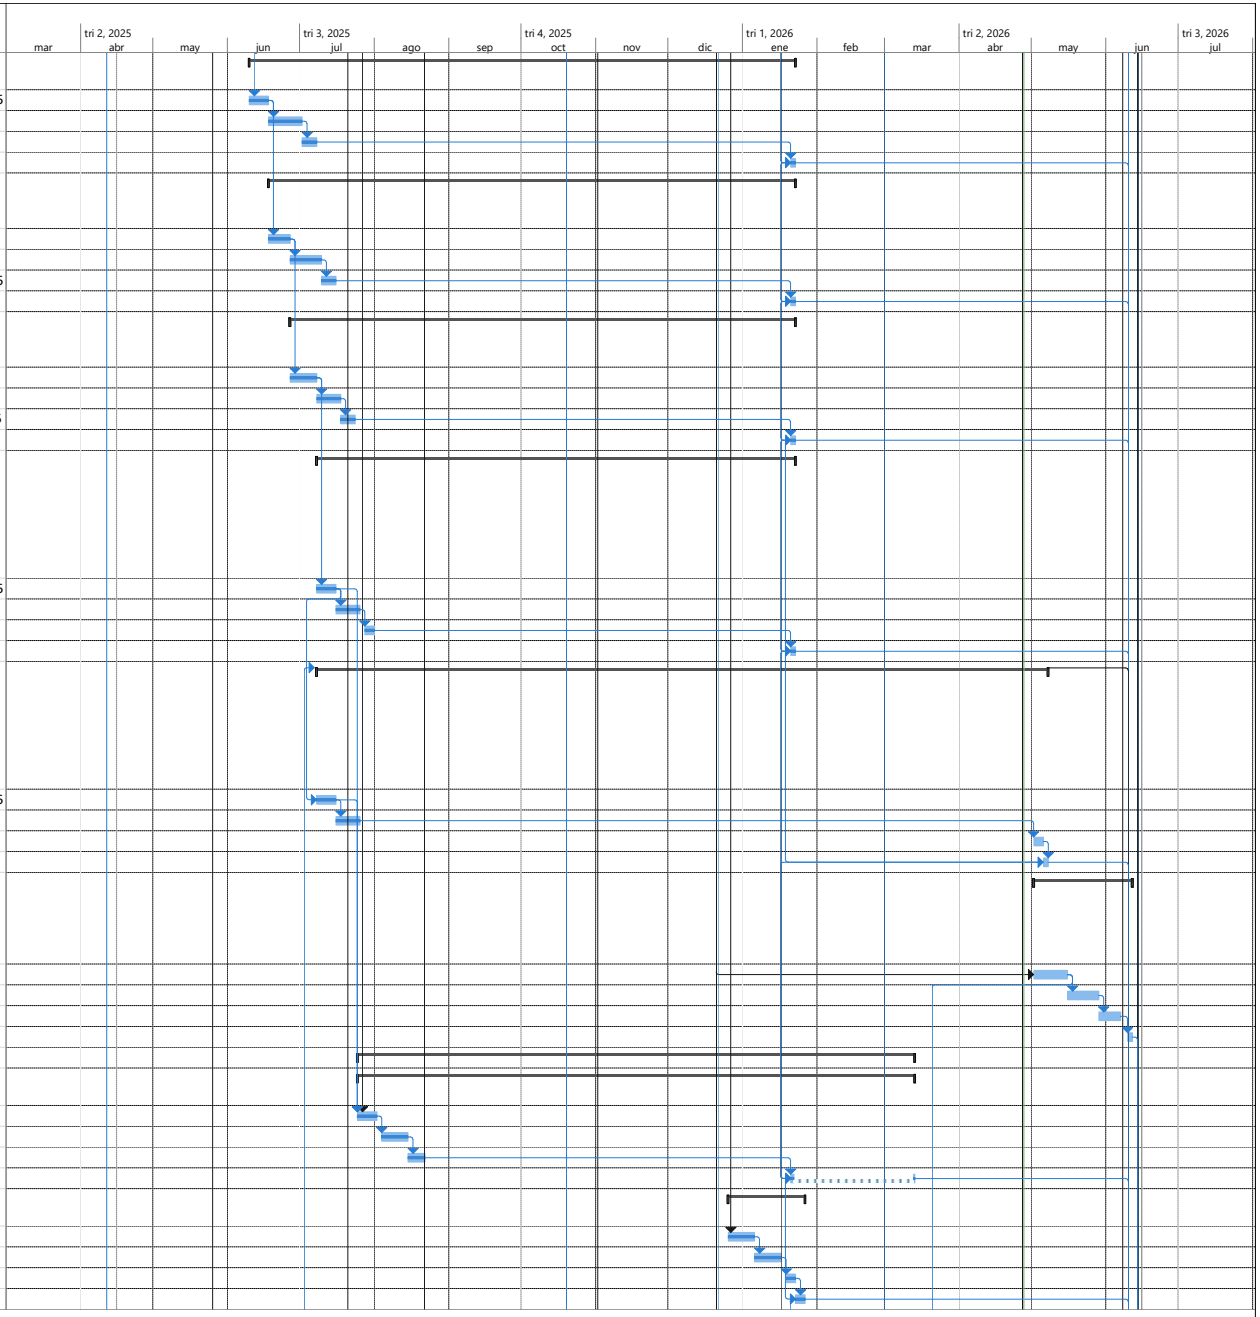

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 28/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin
143		NP 05 INTERRUPTOR 4 VIAS 15 A / TUBERIA EMT	100%	28 días	jue 15/01/26	mié 11/02/26
144		DUCTERIA	100%	8 días	jue 15/01/26	jue 22/01/26
145		ALAMBRADO	100%	12 días	vie 23/01/26	mar 3/02/26
146		COLOCACION APARATO	100%	6 días	mié 4/02/26	lun 9/02/26
147		PRUEBAS	100%	2 días	mar 10/02/26	mié 11/02/26
148		FIN SALIDAS ELECTRICAS	0%	0 días	jue 11/06/26	jue 11/06/26
149		**7.7 PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA**	**99%**	**71 días**	**lun 16/02/26**	**vie 1/05/26**
150		7.7.1 BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRA AISLADA DE COBRE ESTAÑADO CON 10 CONECTORES CON AISLADORES EN RESINA EPOXICA DE DIMENSIONES (440X50X6)MM. SECCIÓN TRANSVERSAL 300 MM^2.	100%	8 días	lun 16/02/26	lun 23/02/26
151		FIN PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA	0%	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26
152		**8 COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**	**85%**	**202,4 d**	**jue 6/11/25**	**sáb 6/06/26**
153		**8.2 PUNTO DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT. 6A F/UTP Y ACCESORIOS.**	**58%**	**200,4 días**	**jue 6/11/25**	**jue 4/06/26**
154		CABLEADO	100%	42 días	jue 6/11/25	vie 19/12/25
155		INSTALACION DE APARATOS	10%	28 días	jue 15/01/26	jue 28/05/26
156		CERTIFICACION	10%	8 días	mar 14/04/26	jue 4/06/26
157		8.3 PATCH PANEL DE 48 PTS 1UR	100%	12 días	vie 6/03/26	mar 17/03/26
158		8.4 ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTAL 1	100%	10 días	mar 24/02/26	jue 5/03/26
159		**8.6 INSTALACIÓN DE SWITCH ARUBA NETWORKING 6300/48P SMART, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**	**50%**	**33 días**	**lun 6/04/26**	**sáb 9/05/26**
160		INSTALACIÓN DISPOSITIVO	100%	8 días	lun 6/04/26	lun 13/04/26
161		PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	0%	8 días	sáb 2/05/26	sáb 9/05/26
162		ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**98%**	**155,4 d**	**vie 26/12/25**	**sáb 6/06/26**
163		NP 26 ACOMETIDA FIBRA ÓPTICA, MULTIMODO, 12 HILOS, CONECTORIZACIÓN LC-LC, OM4, DESDE MUSEO A EDIFICIO TÚNEL DEL VIENTO FAC.	100%	30 días	vie 26/12/25	lun 26/01/26
164		NP 25 SUMISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE (58X61) DE 40U TIPO INDUSTRIAL	100%	28 días	mar 27/01/26	lun 23/02/26
165		**NP 30 SWITCH ARUBA CX6300L-S3L76A Dos fuentes de poder YL670A 48G PoE +, LICENCIAS, GARANTÍA Y (04) MÓDULOS SFP MM,**	**100%**	**64 días**	**mar 27/01/26**	**mié 1/04/26**
166		ADQUISICIÓN Y COMPRA	100%	56 días	mar 27/01/26	mar 24/03/26
167		SUMINISTRO A OBRA	100%	8 días	mié 25/03/26	mié 1/04/26
168		NP 28 PUNTO DE RED DOBLE DE VOZ Y DATOS PARA PISO CON 1 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL) + 1 UND TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE CAJA, EN SALIDA DE TUB	**83%**	**125,4 días**	**mar 27/01/26**	**sáb 6/06/26**
169		DUCTERÍA	100%	3 días	mar 27/01/26	jue 29/01/26
170		CABLEADO	100%	5 días	vie 30/01/26	mar 3/02/26
171		INSTALACION DE APARATOS	100%	2 días	jue 12/02/26	vie 13/02/26
172		CERTIFICACION	0%	2 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26
173		NP 29 PUNTO DE RED DOBLE DE VOZ Y DATOS PARA PISO CON 1 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL) + 2 UND DE TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE CAJA, EN SALIDA DE	**85%**	**122,4 días**	**vie 30/01/26**	**sáb 6/06/26**
174		DUCTERÍA	100%	5 días	vie 30/01/26	mar 3/02/26
175		CABLEADO	100%	3 días	mié 4/02/26	vie 6/02/26
176		INSTALACION DE APARATOS	100%	3 días	lun 9/02/26	mié 11/02/26
177		CERTIFICACION	0%	2 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26
178		NP 27 SENSOR DE OCUPACIÓN MANUAL REMOTO IPV0R 3-VÍAS DE PARED, EN SALIDA DE TUBERIA PVC	**100%**	**28 días**	**mié 25/03/26**	**jue 23/04/26**
179		DUCTERÍA	100%	12 días	mié 25/03/26	mar 7/04/26

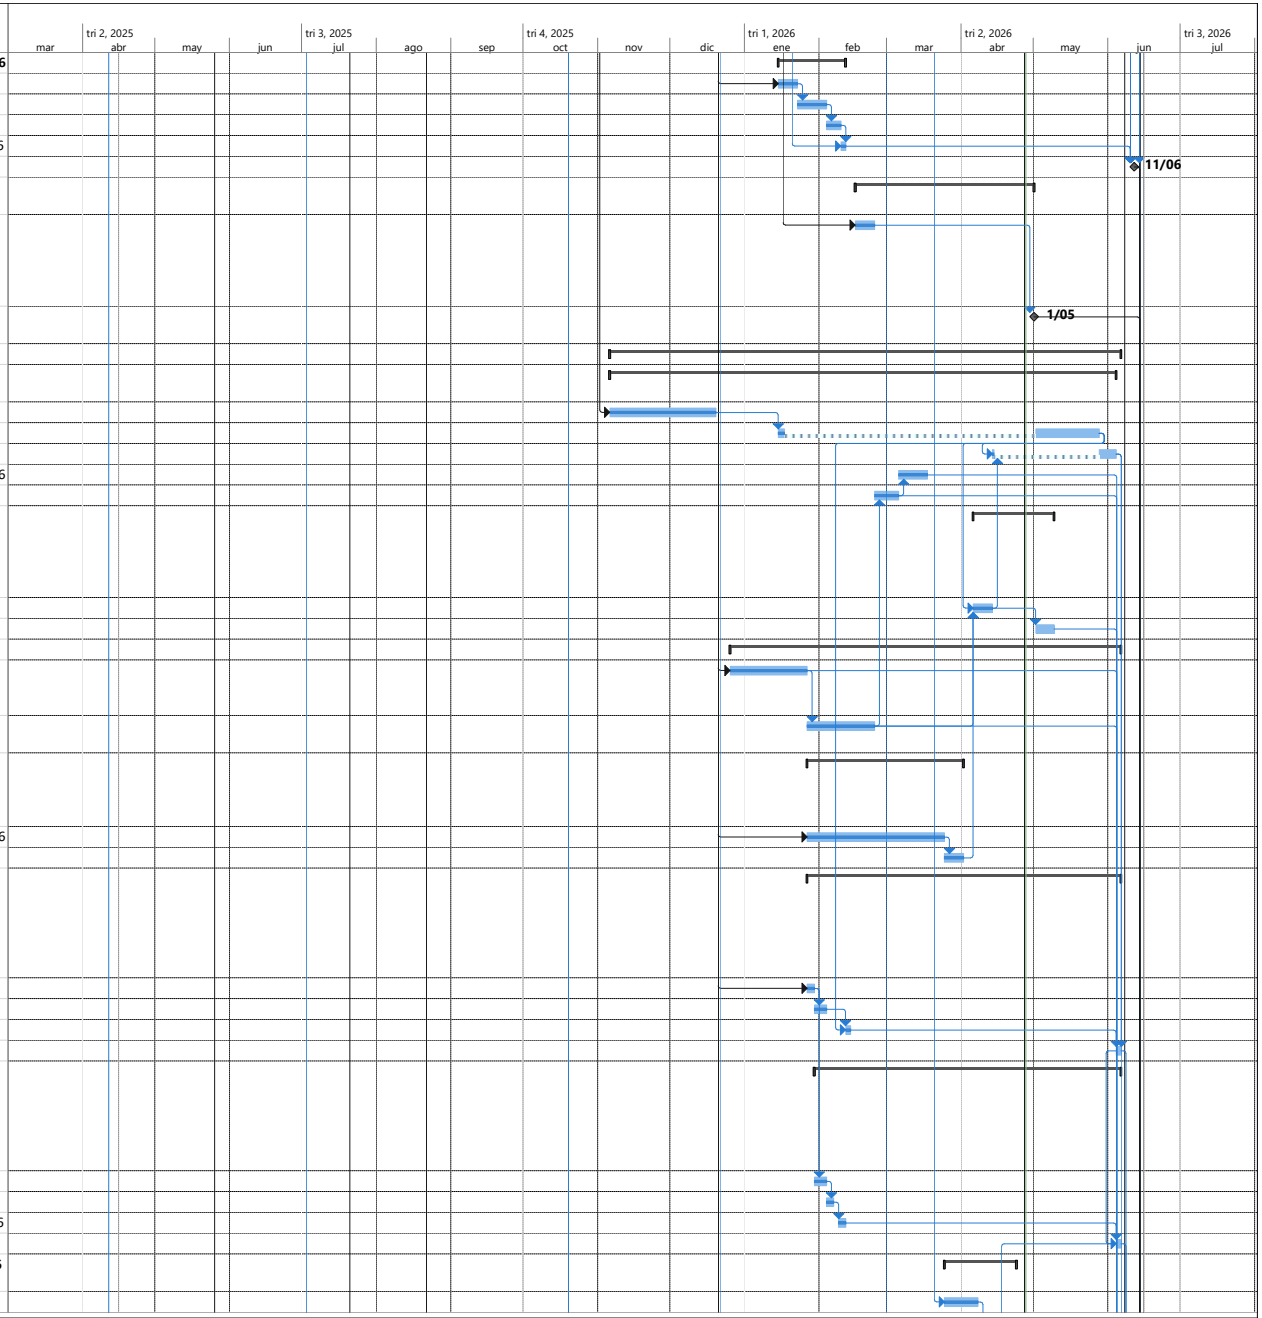

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 28/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Progreso
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso manual
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin
180		CABLEADO	100%	8 días	mié 8/04/26	mié 15/04/26
181		INSTALACION DE APARATOS	100%	6 días	jue 16/04/26	mar 21/04/26
182		CERTIFICACION	100%	2 días	mié 22/04/26	jue 23/04/26
183		FIN COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	0%	0 días	sáb 6/06/26	sáb 6/06/26
184		**9 INSTALACIONES MECÁNICAS**	**0%**	**35 días**	**sáb 2/05/26**	**sáb 6/06/26**
185		**9.1 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN**	**0%**	**35 días**	**sáb 2/05/26**	**sáb 6/06/26**
186		9.1.1 CABLEADO DE COMUNICACIÓN 2X16 BLINDADO APANTALLADO	0%	35 días	sáb 2/05/26	sáb 6/06/26
187		9.1.2 TUBERÍA DE COBRE 5/8"	0%	20 días	sáb 16/05/26	sáb 6/06/26
188		9.1.3 TUBERÍA DE COBRE 3/8"	0%	20 días	sáb 16/05/26	sáb 6/06/26
189		FIN INSTALACIONES MECÁNICAS	0%	0 días	sáb 6/06/26	sáb 6/06/26
190		**10 PAÑETES**	**89%**	**335,08**	**vie 30/05/25**	**sáb 16/05/26**
191		10.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	89%	128 días	vie 30/05/25	sáb 16/05/26
192		FIN PAÑETES	0%	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26
193		**12 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**75%**	**279,74**	**mar 26/08/25**	**sáb 13/06/26**
194		**12.1 BASES PISOS Y ACABADOS**	**67%**	**73,74**	**jue 5/03/26**	**vie 22/05/26**
195		12.1.2 BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS E: 10 cm)	100%	14 días	mié 1/04/26	jue 16/04/26
196		12.1.3 IMPERMEABILIZANTE BI COMPONENTE DE ALTA ADHERENCIA, RESISTENCIA A CAMBIOS DE TEMPERATURA EXTREMOS Y DE ALTA ELASTICIDAD REF CUBRISEAL DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS (DOS MANOS)	0%	14 días	sáb 2/05/26	vie 15/05/26
197		12.1.4 PLACA ENTREPISO DE ALTA RESISTENCIA SUPERFICIE PULIDA 20 MM PARA CAMBIOS DE NIVEL (INCLUYE TORNILLERÍA, SELLADO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	85%	26 días	jue 5/03/26	vie 22/05/26
198		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**76%**	**275,8**	**mar 26/08/25**	**mar 9/06/26**
199		NP 01 BORDILLO EN CONCRETO H: .20 A: .15	100%	98 días	mar 26/08/25	lun 2/02/26
200		NP 23 ALISTADO DE PISO EN MORTERO	100%	70 días	mar 20/01/26	mar 31/03/26
201		AD31 MURO EN SUPERBOARD FACHADA SUPERFICIE PULIDA DE 10MM INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, MALLA FIBRA DE VIDRIO, MASILLADO Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A UNA CARA INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR	10%	42 días	mar 24/02/26	mar 9/06/26
202		AD32 RECUBRIMIENTO BORDE DE PLACA EN SUPERBOARD ENTRE 0.55 Y 0.40 H (INCLUYE PINTURA BLANCA A 3 CAPAS, ESTUCO TIPO EXTERIOR, CINTA MALLA DE DILATACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ESTRUCTURA).	20%	28 días	mar 10/03/26	vie 15/05/26
203		AD34 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL N°5 PV E=0,12 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES	80%	16 días	mar 3/03/26	mar 5/05/26
204		AD36 CASETÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR (PERMANENTE)	100%	8 días	jue 19/03/26	vie 27/03/26
205		FIN BASES PISOS Y ACABADOS	0%	0 días	mar 9/06/26	mar 9/06/26
206		**12.2 ENCHAPES**	**75%**	**195,74**	**vie 21/11/25**	**sáb 13/06/26**
207		12.2.3 PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 PLATA DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS (TERRAZAS)	50%	21 días	mié 1/04/26	mar 2/06/26
208		12.2.4 GUARDAESCOBA PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS (TERRAZAS)	57%	10 días	mié 15/04/26	mié 6/05/26
209		12.2.5 PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 NEGRO DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS. (CIRCULACIONES)	88%	49 días	mar 3/03/26	jue 7/05/26
210		12.2.6 GUARDAESCOBA PORCELANATO TODO MASA REF MARS-R 30*60 NEGRO DE SIMILARES O MEJORES CARACTERÍSTICAS. (CIRCULACIONES)	88%	21 días	vie 10/04/26	lun 4/05/26
211		12.2.7 PISO VINÍLICO	0%	21 días	vie 22/05/26	vie 12/06/26
212		12.2.8 GUARDAESCOBA PISO VINÍLICO	0%	10 días	mié 3/06/26	sáb 13/06/26

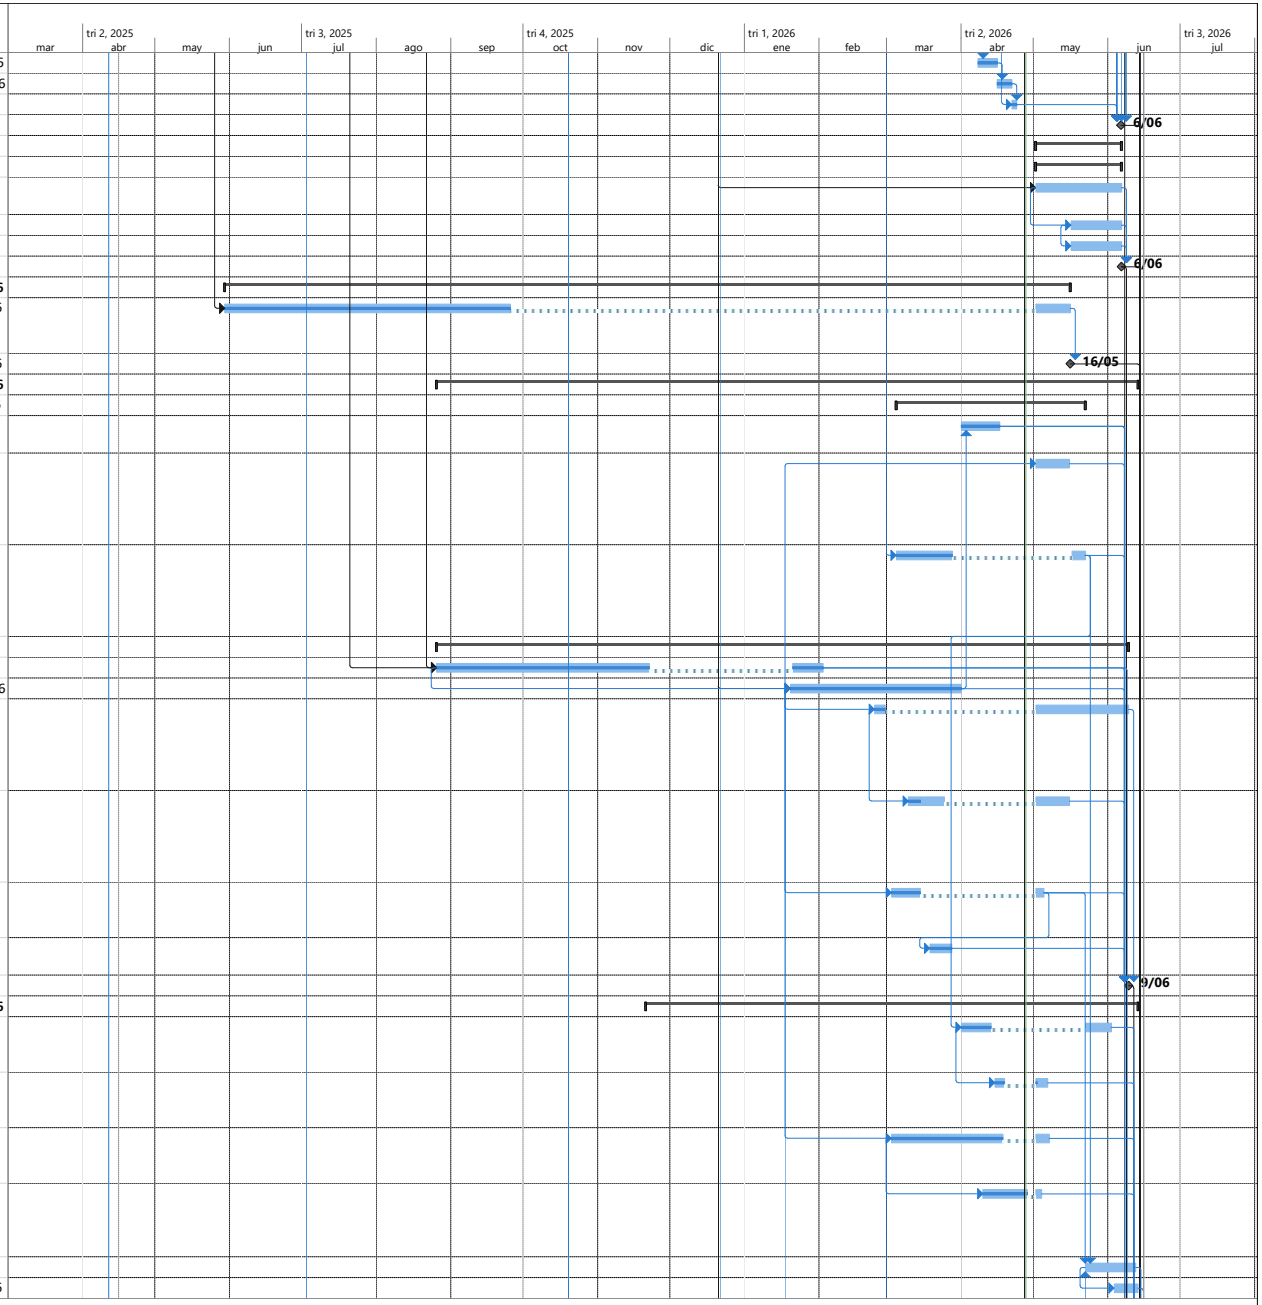

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 28/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin
213		**12.2.9 PISO EN VIDRIO INCOLORO MULTILAMINADO**	**0%**	**123 días**	**jue 5/02/26**	**vie 12/06/26**
214		SUMINISTRO (MATERIA PRIMA Y PROCESO DE LAMINADO)	0%	42 días	jue 5/02/26	sáb 23/05/26
215		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%	20 días	sáb 23/05/26	vie 12/06/26
216		12.2.10 ENCHAPE PISO MIKONOS ARD GRIS CARAS DIFERENCIADAS 33.8X33.8 O SIMILAR (PISO)	50%	28 días	mar 17/03/26	vie 15/05/26
217		**12.2.13 FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO REF. STAC BOND DE IGUAL O MEJORES CARACTERÍSTICAS (COLOR REF: SILVER METALIC)**	**94%**	**114,2 días**	**mié 7/01/26**	**mié 6/05/26**
218		SUMINISTRO DE PANELES	94%	70 días	jue 15/01/26	mié 6/05/26
219		INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE	94%	56 días	mié 7/01/26	mar 5/05/26
220		MONTAJE DE PANELES	94%	58 días	jue 5/02/26	mar 5/05/26
221		**12.2.14 FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO REF. STAC BOND DE IGUAL O MEJORES CARACTERÍSTICAS (COLOR REF: BLUE)**	**96%**	**157,44 días**	**vie 21/11/25**	**mar 5/05/26**
222		SUMINISTRO DE PANELES	96%	86 días	vie 21/11/25	mar 5/05/26
223		INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE	96%	58 días	vie 5/12/25	lun 4/05/26
224		MONTAJE DE PANELES	96%	56 días	mié 7/01/26	lun 4/05/26
225		FIN ENCHAPES	0%	0 días	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26
226		FIN ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0 días	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26
227		**13 ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES**	**39%**	**103 días**	**mar 24/02/26**	**jue 11/06/26**
228		13.1 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	30%	40 días	mar 3/03/26	mié 3/06/26
229		13.2 PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS BAJO PLACA EN METALDECK	80%	28 días	mar 24/02/26	jue 7/05/26
230		13.3 PINTURA ANTIDESLIZANTE (HUELLAS ESCALERA)	0%	40 días	sáb 2/05/26	jue 11/06/26
231		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**50%**	**85,4 días**	**mar 3/03/26**	**lun 1/06/26**
232		NP 24 ENCHAPE DE MURO 30X60 COLOR GRIS O EL QUE DETERMINE LA ENTIDAD. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	50%	28 días	mar 3/03/26	vie 15/05/26
233		NP 22 ESTUCO Y PINTURA ACRILICA A 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	50%	42 días	mar 10/03/26	lun 1/06/26
234		FIN ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAP	0%	0 días	jue 11/06/26	jue 11/06/26
235		**14 CARPINTERÍA EN MADERA**	**0%**	**43 días**	**sáb 2/05/26**	**sáb 13/06/26**
236		**14.1 PUERTA CON ACABADO EN MELAMINA VERTICAL A DOS CARAS CON CANTOS ENCHAPADOS EN PVC DE 0.5mm INCLUYE MARCO, TAPALUZ Y BISAGRAS**	**0%**	**41,6 días**	**sáb 2/05/26**	**sáb 13/06/26**
237		INICIO DE FABRICACIÓN	0%	21 días	sáb 2/05/26	sáb 23/05/26
238		LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%	4 días	sáb 23/05/26	mié 27/05/26
239		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%	10 días	mié 3/06/26	sáb 13/06/26
240		**14.2 CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**0%**	**42 días**	**sáb 2/05/26**	**sáb 13/06/26**
241		INICIO DE FABRICACIÓN	0%	30 días	sáb 2/05/26	lun 1/06/26
242		LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%	6 días	mar 2/06/26	sáb 6/06/26
243		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%	6 días	lun 8/06/26	sáb 13/06/26
244		**14.3 MESÓN EN MÁRMOL PARA SOBREPONER (60 CMS)INCLUYE SALPICADERO 4 CMS SILICONA, CHAZOS Y ACCESORIOS)**	**0%**	**41 días**	**lun 4/05/26**	**sáb 13/06/26**
245		INICIO DE FABRICACIÓN	0%	30 días	lun 4/05/26	mié 3/06/26
246		LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%	6 días	jue 4/06/26	mar 9/06/26
247		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%	5 días	mié 10/06/26	sáb 13/06/26
248		FIN CARPINTERÍA EN MADERA	0%	0 días	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26
249		**15 CARPINTERÍA METÁLICA**	**0%**	**40 días**	**sáb 2/05/26**	**jue 11/06/26**
250		**15.1 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS**	**0%**	**40 días**	**sáb 2/05/26**	**jue 11/06/26**
251		INICIO DE FABRICACIÓN	0%	28 días	sáb 2/05/26	sáb 30/05/26

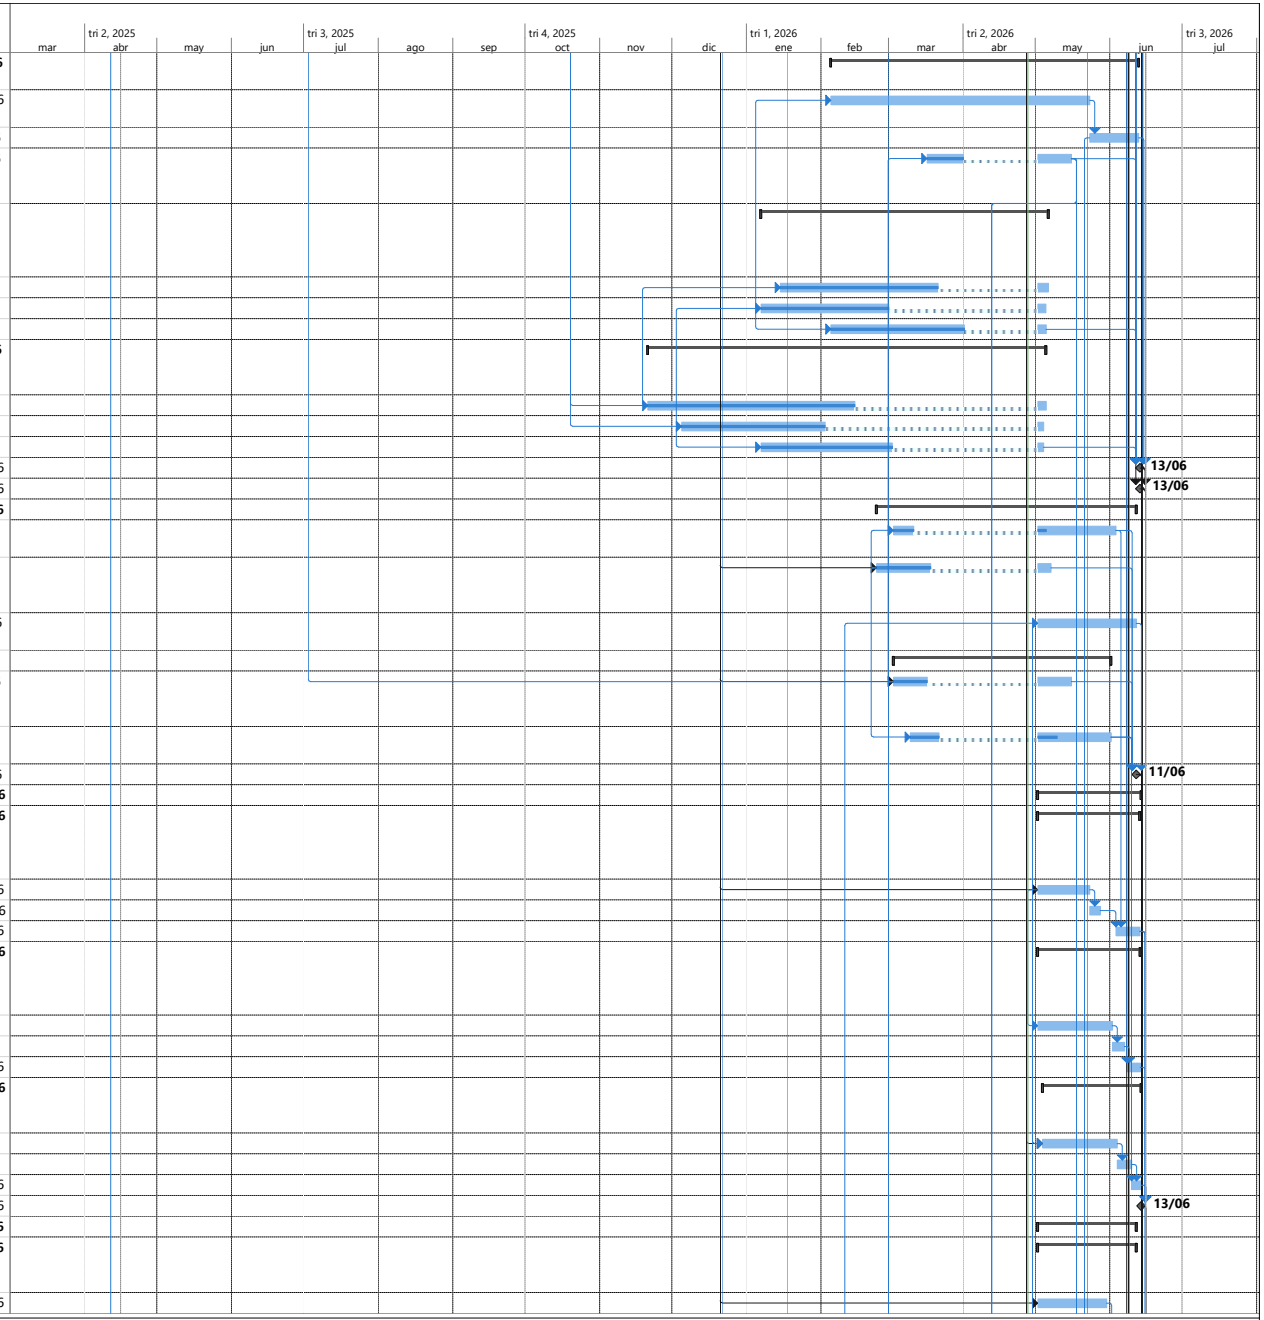

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 28/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin
252		LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%	2 días	sáb 30/05/26	lun 1/06/26
253		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%	10 días	mar 2/06/26	jue 11/06/26
254		FIN CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0 días	jue 11/06/26	jue 11/06/26
255		**17 CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE**	**24%**	**107 días**	**mar 24/02/26**	**lun 15/06/26**
256		17.1 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	0%	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26
257		17.2 ACCESORIOS (ASIDERO) NIQUELADA PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS	0%	4 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26
258		**17.3 VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL, TUBULAR RF 1101 PROYECTANTE DE ALÚMINA CON VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4MM COLOR COOL LITE + PVB .76 + VIDRIO 4MM BRONCE) VENTANAS BASCULANTES CON BRAZOS DE 8".**	**0%**	**81 días**	**mar 24/02/26**	**mié 20/05/26**
259		INICIO DE FABRICACIÓN	0%	28 días	mar 24/02/26	mar 24/03/26
260		LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%	6 días	sáb 2/05/26	jue 7/05/26
261		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%	12 días	vie 8/05/26	mié 20/05/26
262		**17.4 FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4MM COLOR COOL LITE + PVB .76 + VIDRIO 4MM BRONCE)**	**51%**	**73,4 días**	**mar 24/02/26**	**mar 12/05/26**
263		INICIO DE FABRICACIÓN	60%	42 días	mar 24/02/26	sáb 9/05/26
264		LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	50%	30 días	mar 17/03/26	sáb 2/05/26
265		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	38%	26 días	mié 1/04/26	mar 12/05/26
266		**17.5 PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD DE 2.4 X 2.5 CM (VIDRIO 4MM COLOR COOL LITE + PVB .76 + VIDRIO 4MM BRONCE)**	**0%**	**55 días**	**mar 17/03/26**	**jue 14/05/26**
267		INICIO DE FABRICACIÓN	0%	32 días	mar 17/03/26	lun 20/04/26
268		LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%	5 días	sáb 2/05/26	mié 6/05/26
269		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%	8 días	jue 7/05/26	jue 14/05/26
270		**17.6 FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4+4 LAMINADO PVB .76 INCOLORO) INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE TIPO ESTRELLA O SIMILAR QUE APOYE EN PLACA O COLUMNA CON ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN APLIQUE EN CADA CA**	**59%**	**64,4 días**	**mar 10/03/26**	**sáb 16/05/26**
271		INICIO DE FABRICACIÓN	80%	35 días	mar 10/03/26	vie 8/05/26
272		LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	70%	7 días	vie 10/04/26	sáb 2/05/26
273		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%	14 días	sáb 2/05/26	sáb 16/05/26
274		**17.7 DIVISIONES PARA BAÑO EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 DE SEGURIDAD, PVB .76 COLOR NEGRO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PUERTAS).**	**0%**	**52 días**	**mié 25/03/26**	**mar 19/05/26**
275		INICIO DE FABRICACIÓN	0%	25 días	mié 25/03/26	lun 20/04/26
276		LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%	3 días	sáb 2/05/26	lun 4/05/26
277		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%	14 días	mar 5/05/26	mar 19/05/26
278		**17.8 BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4+4 LAMINADO PVB .76 INCOLORO)**	**0%**	**19 días**	**jue 28/05/26**	**lun 15/06/26**
279		INICIO DE FABRICACIÓN	0%	12 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26
280		LLEGADA MATERIAL A LA OBRA	0%	5 días	jue 4/06/26	lun 8/06/26
281		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	0%	7 días	mar 9/06/26	lun 15/06/26
282		FIN CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	0%	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26
283		**19 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**18%**	**68 días**	**mar 17/03/26**	**jue 28/05/26**
284		19.1 SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA POSTERIOR. INCLUYE VÁLVULA ANTIVANDÁLICA PUSH. REF ADRIÁTICA DE CORONA O SIMILAR	30%	12 días	vie 17/04/26	lun 25/05/26
285		19.2 LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	30%	12 días	vie 17/04/26	lun 25/05/26

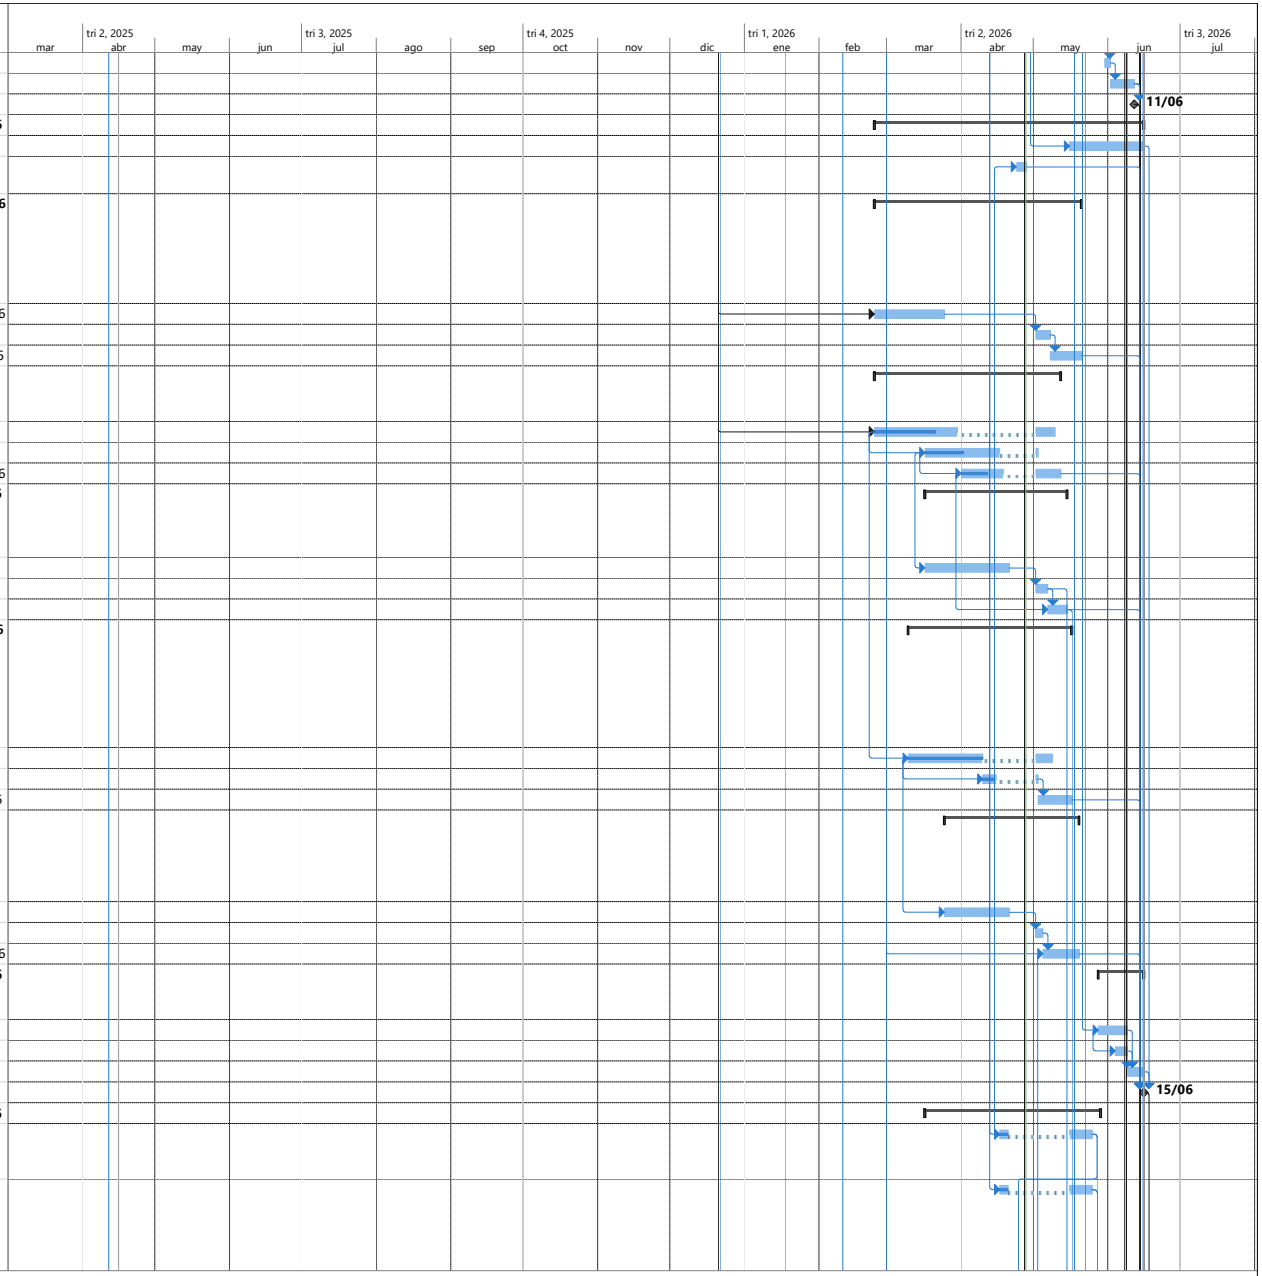

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 28/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin
286		19.3 GRIFERÍA ANTI VANDÁLICA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH, DE EMPOTRAR EN MUROS, CROMADA METÁLICA. INCLUYE INSTALACIÓN, ACCESORIOS DESDE LA ENTRADA A LA VÁLVULA HASTA LA CONEXIÓN AL GRIFO, Y TODO LO RELACIONADO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	30%	2 días	mié 29/04/26	mar 26/05/26
287		FIN APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26
288		**19.4 JUEGOS DE INCRUSTACIONES**	**7%**	**68 días**	**mar 17/03/26**	**jue 28/05/26**
289		19.4.1 PAPELERA TIPO INSTITUCIONAL CILÍNDRICA ACABADO SATINADO CAPACIDAD 18L	50%	4 días	mar 12/05/26	vie 15/05/26
290		19.4.3 REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	0%	7 días	mar 17/03/26	mar 24/03/26
291		19.4.4 TAPA DE REGISTRO EN PVC	0%	7 días	mié 25/03/26	mar 31/03/26
292		19.4.6 ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIO	0%	12 días	sáb 16/05/26	jue 28/05/26
293		FIN JUEGOS DE INCRUSTACIONES	0%	0 días	jue 28/05/26	jue 28/05/26
294		**20 VIDRIOS Y ESPEJOS**	**0%**	**14,4 días**	**vie 15/05/26**	**sáb 30/05/26**
295		20.1 ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	0%	5 días	lun 25/05/26	sáb 30/05/26
296		20.2 INSTALACIÓN DE PELÍCULA ADHESIVA SANDBLASS FROSTED SEGÚN DISEÑO	0%	2 días	vie 15/05/26	sáb 16/05/26
297		FIN VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0 días	sáb 30/05/26	sáb 30/05/26
298		**21 CERRADURAS**	**0%**	**3,6 días**	**vie 12/06/26**	**lun 15/06/26**
299		21.1 CERRADURA CILÍNDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	0%	2 días	sáb 13/06/26	lun 15/06/26
300		21.3 CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD	0%	2 días	vie 12/06/26	sáb 13/06/26
301		FIN CERRADURAS	0%	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26
302		**24 ASEO GENERAL**	**10%**	**61 días**	**mié 1/04/26**	**jue 4/06/26**
303		24.1 LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	0%	40 días	mié 1/04/26	mié 13/05/26
304		24.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNID	19%	40 días	vie 17/04/26	jue 4/06/26
305		FIN ASEO GENERAL	0%	0 días	jue 4/06/26	jue 4/06/26
306		**25 VÍAS**	**79%**	**133 días**	**mar 6/01/26**	**sáb 23/05/26**
307		**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**79%**	**133 días**	**mar 6/01/26**	**sáb 23/05/26**
308		NP 10 EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR, INCLUYE CARGUE Y TRASPORTE	97%	30 días	mar 6/01/26	mar 12/05/26
309	✓	NP 15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	100%	2 días	mar 13/01/26	mié 14/01/26
310	✓	NP 12 RELLENO COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B200. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	100%	7 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26
311	✓	NP 13 BORDILLO PREFABRICADO DE CONCRETO (0.35 X 0,2 X 0,80)	100%	7 días	jue 22/01/26	mié 28/01/26
312	✓	NP 11 RELLENO COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO BASE B600. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	100%	7 días	jue 29/01/26	mié 4/02/26
313		NP 21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	99%	40 días	jue 5/02/26	jue 7/05/26
314		NP 09 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ELEMENTOS COMO PLACAS, ESCALERAS, PEDESTALES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA OBRA	74%	40 días	vie 13/02/26	sáb 9/05/26
315		NP 16 CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN	0%	12 días	sáb 2/05/26	mié 13/05/26
316		NP 14 LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO PESADO	0%	8 días	sáb 16/05/26	sáb 23/05/26
317		FIN ACTIVIDADES NO PREVISTAS	0%	0 días	sáb 23/05/26	sáb 23/05/26
318		**26 EQUIPOS**	**55%**	**406 días**	**mié 16/04/25**	**lun 15/06/26**
319		**26.1 EQUIPOS HIDROSANITARIOS**	**85%**	**406 días**	**mié 16/04/25**	**lun 15/06/26**
320		**26.1.1 EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓ**	**71%**	**101 días**	**mar 24/02/26**	**mar 9/06/26**
321	✓	SUMINISTRO	100%	42 días	mar 24/02/26	jue 9/04/26
322		INSTALACION	0%	15 días	vie 22/05/26	vie 5/06/26
323		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	0%	2 días	lun 8/06/26	mar 9/06/26
324		**26.1.2 SISTEMA EYECTOR DRENAJE AGUAS LLUVIAS 3 HP**	**92%**	**103 días**	**mar 24/02/26**	**jue 11/06/26**
325	✓	SUMINISTRO	100%	14 días	mar 24/02/26	lun 9/03/26
326	✓	INSTALACION	100%	10 días	mar 10/03/26	jue 19/03/26

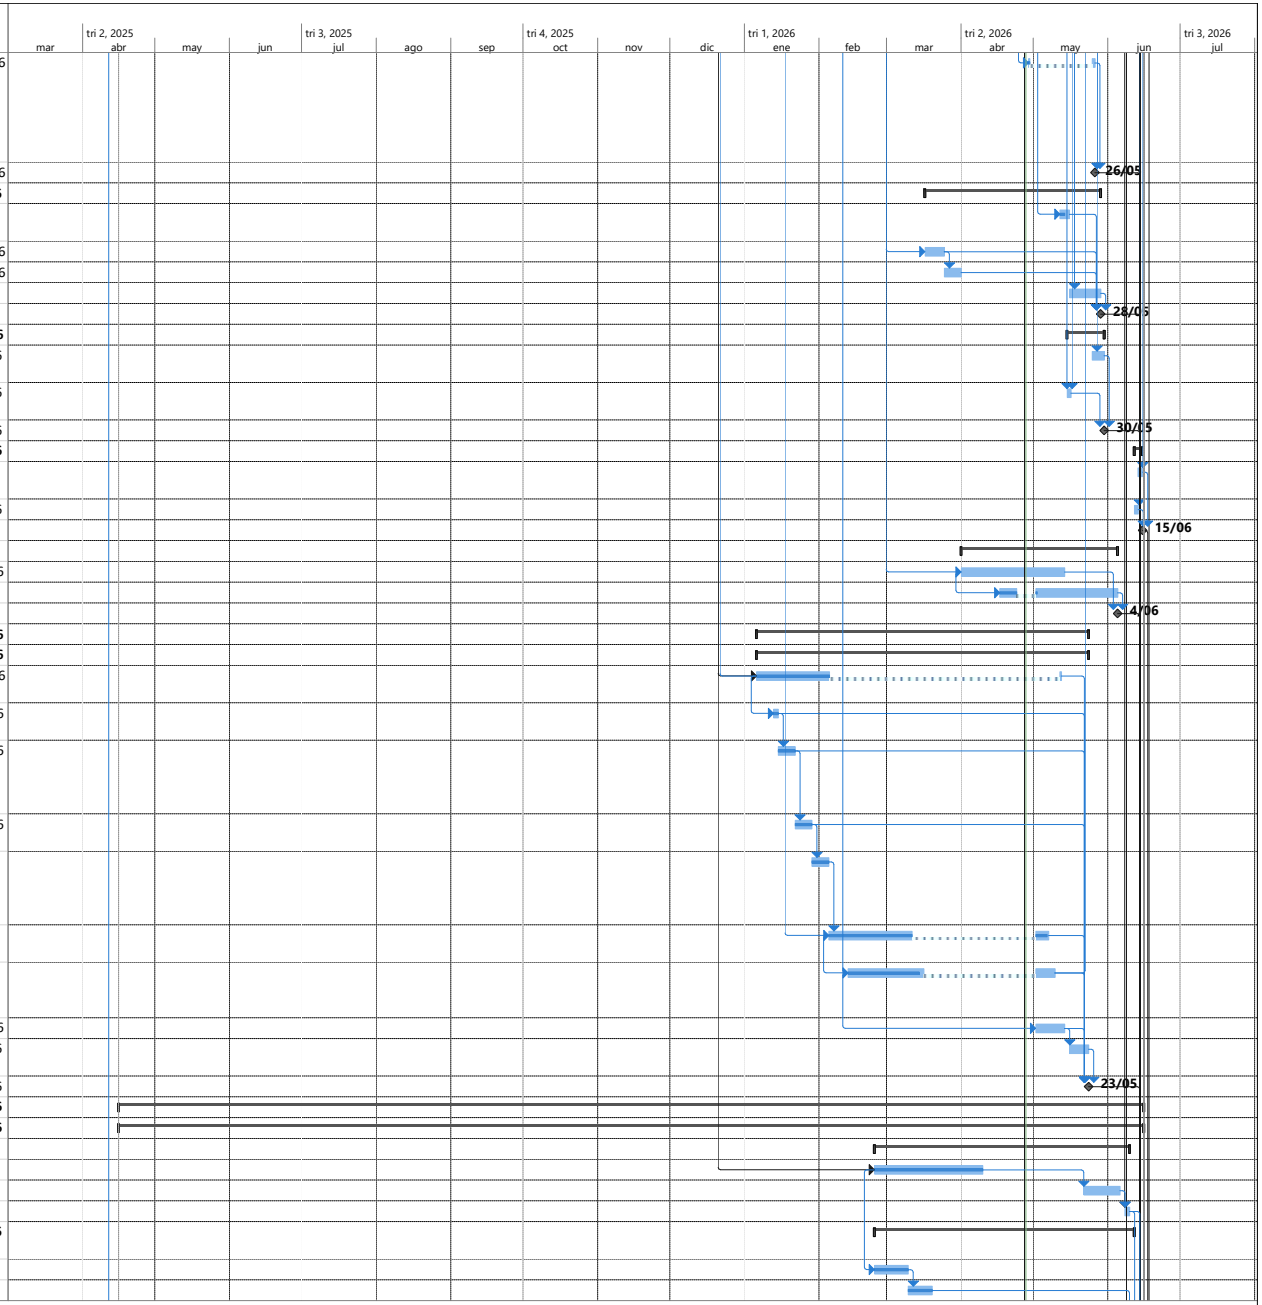

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 28/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo	Fin
327		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENT	0%	2 días	mié 10/06/26	jue 11/06/26
328		**26.1.4 UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE. O, INESTANCABLE CON PASO DE SOLIDOS DE 37 MM, POTENCIA 1 HP.**	**94%**	**53 días**	**mié 16/04/25**	**mié 11/06/25**
329		SUMINISTRO	100%	42 días	mié 16/04/25	vie 30/05/25
330		INSTALACION	100%	8 días	sáb 31/05/25	sáb 7/06/25
331		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENT	0%	3 días	lun 9/06/25	mié 11/06/25
332		**26.1.5 MOTOBOMBA PARA AGUA CON SOLIDOS DRENAJE AGUAS FOSO EYECTOR 3 HP**	**90%**	**128 días**	**mar 3/02/26**	**lun 15/06/26**
333		SUMINISTRO	100%	28 días	mar 3/02/26	lun 2/03/26
334		INSTALACION	100%	8 días	mar 3/03/26	mar 10/03/26
335		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENT	0%	4 días	vie 12/06/26	lun 15/06/26
336		FIN EQUIPOS HIDROSANITARIOS	0%	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26
337		**26.2 EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA**	**0%**	**34 días**	**mar 12/05/26**	**lun 15/06/26**
338		**26.2.1 UNIDAD INTERIOR TIPO PARED CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 15.400 Btu/h**	**0%**	**31 días**	**mar 12/05/26**	**vie 12/06/26**
339		SUMINISTRO	0%	20 días	mar 12/05/26	lun 1/06/26
340		INSTALACION	0%	4 días	sáb 6/06/26	mié 10/06/26
341		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENT	0%	2 días	jue 11/06/26	vie 12/06/26
342		**26.2.2 UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL DE ALTA ESTÁTICA CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 96.000 Btu/h**	**0%**	**33 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 13/06/26**
343		SUMINISTRO	0%	20 días	mar 12/05/26	lun 1/06/26
344		INSTALACION	0%	2 días	jue 11/06/26	vie 12/06/26
345		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENT	0%	2 días	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26
346		**26.2.3 UNIDAD EXTERIOR DE VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 36.000 Btu/h**	**0%**	**34 días**	**mar 12/05/26**	**lun 15/06/26**
347		SUMINISTRO	0%	20 días	mar 12/05/26	lun 1/06/26
348		INSTALACION	0%	2 días	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26
349		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENT	0%	1 día	lun 15/06/26	lun 15/06/26
350		**26.2.4 UNIDAD EXTERIOR DE VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 209.800 Btu/h**	**0%**	**34 días**	**mar 12/05/26**	**lun 15/06/26**
351		SUMINISTRO	0%	20 días	mar 12/05/26	lun 1/06/26
352		INSTALACION	0%	2 días	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26
353		PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENT	0%	1 día	lun 15/06/26	lun 15/06/26
354		FIN EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA	0%	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26
355		**TERMINACION DE OBRA**	0%	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26

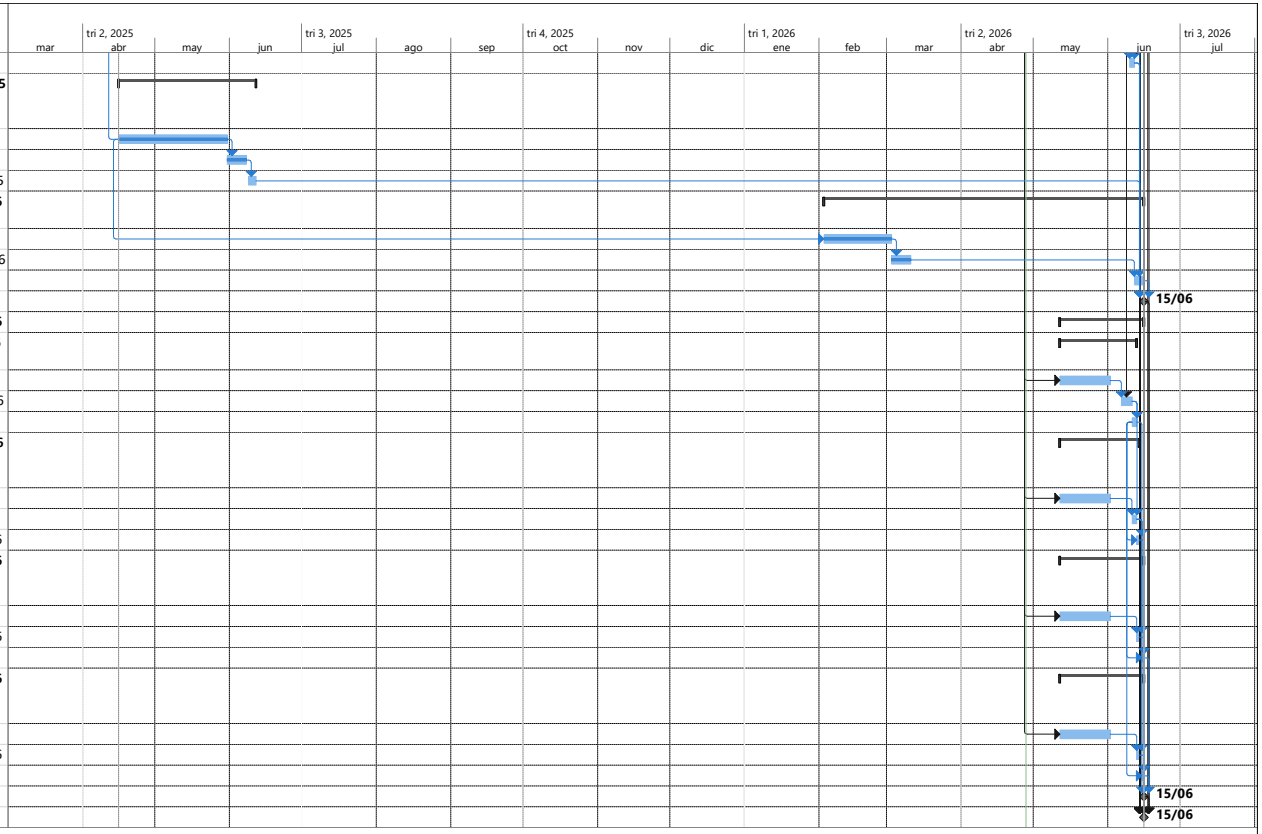

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 28/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
