FASECOL

Cableado Eléctrico | Soluciones en Accesibilidad | Proyectos Eléctricos | Servicio y Mantenimiento | Proyectos TIC

Dosquebradas, Noviembre 25 de 2020

Consejo Superior de la Judicatura
Ing. Julián Zuleta
Pereira, Risaralda

Asunto: Informe de suministro e instalación de plataforma Ascensor para pasajeros para el palacio de justicia de Apia, Risaralda.

Cordial saludo,

Por medio de la presente damos relación a las actividades realizadas conforme a los términos del contrato SER 20-31 de 2019 y sus adiciones y prorrogas relacionadas con el suministro, instalación y puesta en marcha de un Ascensor de pasajeros para el Palacio de Justicia de Apia, Risaralda.

Inicialmente, se trabaja en la instalación de vigas de soporte en techo; seguida por la instalación de la acometida eléctrica. Una vez instalada la acometida, se probó la iluminación del foso y el punto de datos (conexión citófono) ubicado en portería. Por último, se probó la acometida trifásica desde el tablero de distribución principal hasta la acometida cero metros dentro del foso del elevador.










Posteriormente, se inician las labores de instalación de ascensor el 24 de septiembre del 2020, comenzando con el inventario general del equipo








Se procede con el inicio de la instalación de guías y alineación.

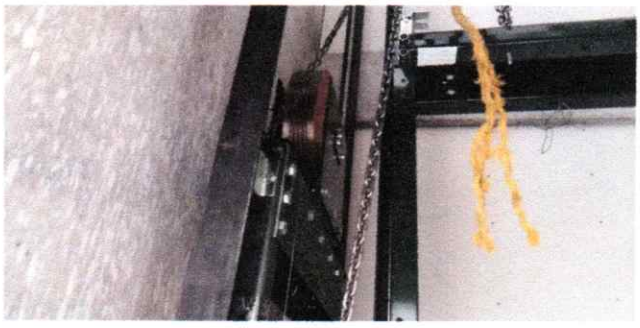

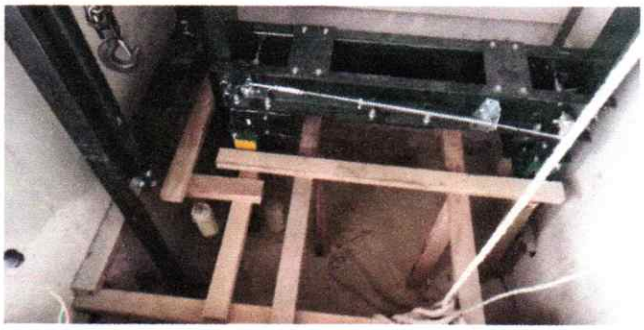


FASECOL


Cableado Eléctrico | Soluciones en Accesibilidad | Proyectos Eléctricos | Servicio y Mantenimiento | Proyectos TIC

Una vez alineado, se instalaron los sistemas mecánicos y puertas, cabina, sistema de suspensión y cableado eléctrico del elevador. Asi como el control principal.





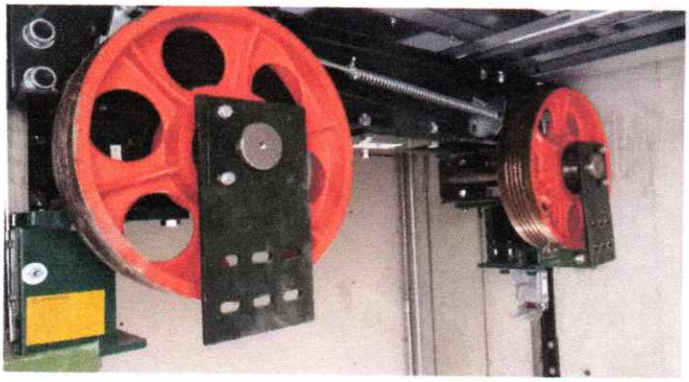

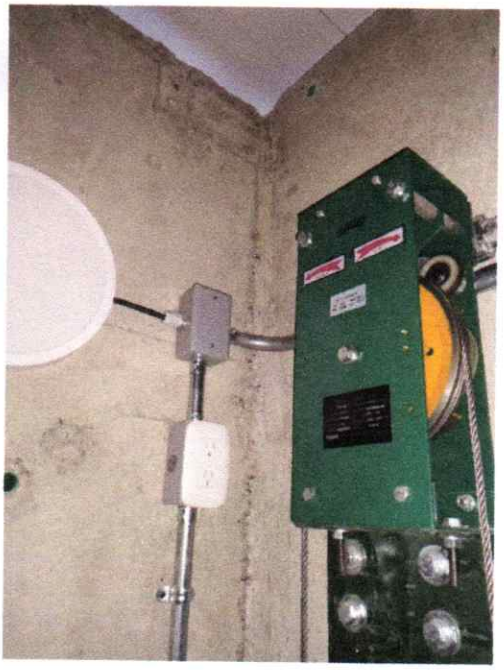

CR 1 N 9 - 295Vallarta la Badea BOD 1
Dosquebradas - Risaralda
Tel. (6) 340 1076

FASECOL

Cableado Eléctrico | Soluciones en Accesibilidad | Proyectos Eléctricos | Servicio y Mantenimiento | Proyectos TIC














CR 1 N 9 - 295Vallarta la Badea BOD 1
Dosquebradas - Risaralda
Tel. (6) 340 1076


FASECOL

Cableado Eléctrico | Soluciones en Accesibilidad | Proyectos Eléctricos | Servicio y Mantenimiento | Proyectos TIC

Se procede también a realizar la obra civil que corresponde al terminado de la zona de puertas con estructura liviana, y quicios de puerta (parte inferior del piso de la puerta)

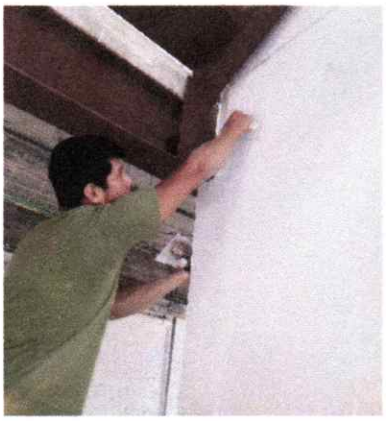



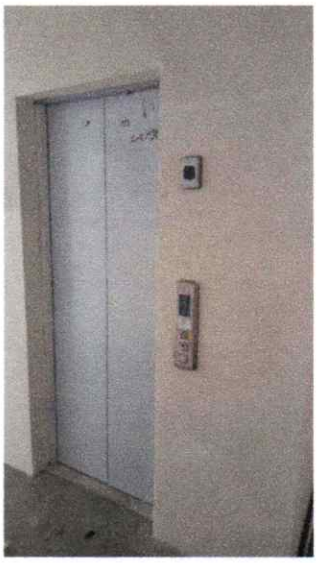

Posteriormente se procede a instalar las botoneras de cada piso.

Es importante aclarar que la instalación del elevador no está al 100% dado que el edificio no contaba al momento de culminar los trabajos de montaje con la fuerza eléctrica trifásica definitiva suministrada por la Chec; por lo que el movimiento del equipo se realizó con una conexión temporal bifásica, que permitió energizar el motor; pero está pendiente realizar el ajuste del mismo que consiste en calibración de pesos, tiempo de apertura de puertas, velocidades del motor y chequeo de seguridades del elevador.

Luego de ello se podrá hacer entrega oficial del ascensor de pasajeros para el Palacio de Justicia de Apia

Agradeciendo la atención prestada

Atentamente,

Ing. Leonardo Guerrero
3203222750
