Contrato N° SAMC-005

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO NARIÑO

MUNICIPIO LLANADA - NARIÑO

Valor contrato. $99.149.841

fecha inicio - 22 Diciembre 2025

DICIEMBRE 2025

Powered by CamScanner

fecha: 22 Diciembre de 2025

Se realiza Socializacion del alcance del contrato con la poblacion beneficiaria de los Barrios San Francisco y villa Dubai. Se realiza reunion en la biblioteca del centro cultural del Municipio de la Llanada.

Se Contro con la participacion de Secretaria planeacion Contratista, Supervision, propietarios de lotes del barrio villa Dubai.

Se realiza compromiso con Comunidad para que cada uno aporte materiales para las acometidas domiciliarias y la instalacion de cada acometida la realizara el Contratista de obra ya que esta incluido dentro del presupuesto del contrato de obra.

Ingeniero

fecha: 23 diciembre de 2025
Personal: 2 ayudante

Equipo: Herramienta Menor
clima: lluvioso

Actividades

Rocería y desmonte de via de acceso donde se ubicara el tanque principal

Ingeniero

fecha: 24 diciembre

No se realizan actividades por festividades

fecha: 25 diciembre

No se realizan actividades por festividades
Navideñas

Desde el dia 26-30 diciembre se realiza logistica para acopio de materiales y alojamiento del personal en obra

Se realiza Suspension de obra

fecha suspension 30 diciembre 2025

fecha Reinicio de obra 14 enero 2026

fecha finalizacion Actualizada: 9 marzo 2026

Powered by CamScanner

Semana: 14 al 18 enero 2026

En esta semana se realiza roceria y descapote de materia vegetal, de la via acceso a los lotes beneficiarios para el posterior localizacion y replanteo

Personal: 2 ayudantes, 1 ing residente
Equipo: Herramienta Menor

Se presentan intensas lluvias en la zona del proye por lo cual se hace drenajes para que el terreno no presente saturación.

El Contratista realiza Compra de tubería para colector principal y acometidas domiciliarias

Ing residente

Semana: 19 al 25 de Enero 2026

Personal: 1 ing residente
2 ayudantes.

Equipo: Herramienta Menor
Clima: lluvias intensas

Actividades
Se realiza Poseria y descapote zona donde se ubicara Colector principal de 10" y Camaras de inspeccion

El contratista en esta Semana realiza acopio de materiales petreos. (triturado y arena)

Debido a los intensos lluvias en la zona del proyecto no es posible el inicio de excavaciones para Colector principal, camaras de inspeccion y acometidas domiciliarios

Ingeniero residente

Semana 26 de enero al 1 febrero 2026

Personal: 2 ayudantes
1 ingeniero residente

Equipo: Herramienta Menor
Clima: lluvia intensa

Actividades:

Se presenta cierre de la via acceso al municipio debido a perdida de la banca en el sector Bolivar.

En la zona se presenta periodo de intensas lluvias por lo cual no ha sido posible programar inicio de trabajos de excavación de colector, camaras y acometidos

El Contratista realizo Suministro de ladrillo para Construccion de Camaras de inspeccion se acopia en la casa del señor Jorge con frente al proyecto.

Ingeniero

Semana del 2 - 8 febrero 2026

Personal: 1 Ing residente
2 ayudantes
1 Topografo 1 Cadenero
Equipo: Herramienta Menor, Equipo topografia
Clima: lluvia intensas

Actividades

Se realiza localizacion y replanteo de colector principal, Camaras inspeccion y acometidas domiciliarias, Se materializan niveles de camaras y referencia en puntos fijos para su posterior construcción

Se realiza levantamento de cada lote de los beneficiarios de este proyecto.

Se transporta desde la ciudad de pasto la tubería y accesorios para la ejecucion del contrato de obras tubería de 10", 4" codos y sillas y y sillas T

Ing residente.

Semana: del 9 - 15 febrero 2026

Personal: 1 ing. residente
2 ayudante
Equipo: Herramienta Menor
Clima: lluvias intensas
Actividades:
Debido a las intensas lluvias en la zona del proyecto

no se inicio trabajos de excavacion → maquina para cuelor y camaras, se debe considerar que debido a las profundidades de diseño de camara y instalacion de tuberia no es viable iniciar estos trabajos ya que se debe garantizar la seguridad del personal.

las lluvias intensas continuan en el Municipio de la Llanada, esta situacion no es imputable al contratista al retraso de la obra No se puede desarrollar con normalidad la obra

Ing residente

Fecha: 16 al 22 febrero 2026
Personal: 1 ayudante
1 ing residente
Equipo: Herramienta Menor
Clima: lluvioso

Se realiza transporte material peteos desde el acopio hasta punto construccion de Camaras de inspeccion.

Las lluvias intensas no permiten inicio de trabajo de excavacion a maquina y excavacion a Mano. por la seguridad de personal de obra.

Ing residente.

Fecha: 23 de febrero al 1 de marzo 2026

Personal: 1 ing residente
2 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Lluvioso

Actividades

Se realiza transporte de tubería y accesorios de centro acopio hasta el sitio de la obra. para inicio de instalación de este material

Descapote para acometidas domiciliarias de cada usuario, se tienen 23 acometidas de usuarios

Transiego de materiales petreos para construcción de cámaras de inspección.

Ing residente.

Fecha: 2 marzo 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador

Clima: lluvia moderado

Actividades
Se empieza excavación a maquina con retrocarga

en una profundidad inicial aproximada de 3 metros y 1 metro de ancho para tubería del colector principal.

Se realiza excavación a mano para perfilar excavación de colector.
Entibado excavación
Excavación para cámara de inspección #1 a máquina y perfilado a mano.

Ing residente

Fecha: 3 marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Retro cargador
Clima: Lluvioso

Excavación a mano para perfilar excavación de colector y paredes de cámara de inpección #1
Entibado excavación
No es posible continuar con los trabajos de excavación a mano y a máquina debido a la lluvia intensa

Ing residente

fecha: 4 marzo de 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador
Clima: Soleado
Actividad

Excavacion a maquina para colector principal en una profundidad aproximada de 3m y ancho 1m

Transiego material petreo y ladrillo para construccion de camara inspeccion #1

Ing residente

fecha: 5 marzo de 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador
Clima: lluvioso

Se suspenden trabajos de excavacion a mano y a maquina debido a lluvias intensas en la zona del proyecto

Ing residente

Fecha: 6 marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador

Clima: Lluvioso

Actividad

Excavacion a maquina para canaleta de inspeccion #2

Entibado excavacion

Excavacion a Mano para excavacion y perfilamiento de Canaleta #2

Ing residente.

Fecha: 7 marzo 2026

No se realizan actividades por lluvias intensas en la zona del proyecto

Ing residente

Fecha: 9 marzo 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador

Clima: Soleado

Se suscribe prorroga de 2 meses al contrato de obra
Nueva fecha terminacion 9 mayo/2026

Powered by CamScanner

Se realiza excavacion a maquina para colocar Principal.
Entibado excavacion
Excavacion a mano para perfilar excavacion y piso de excavacion para tubo de 10"

Ing residente

Fecha: 10 marzo 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Retrocargador
Herramienta menor
Clima: lluvioso
Actividad
Se realiza excavacion a maquina para camara inspeccion #3.
Entibado excavacion
Excavacion a mano para perfilado piso y paredes de Camara inspeccion #3

Ing residente

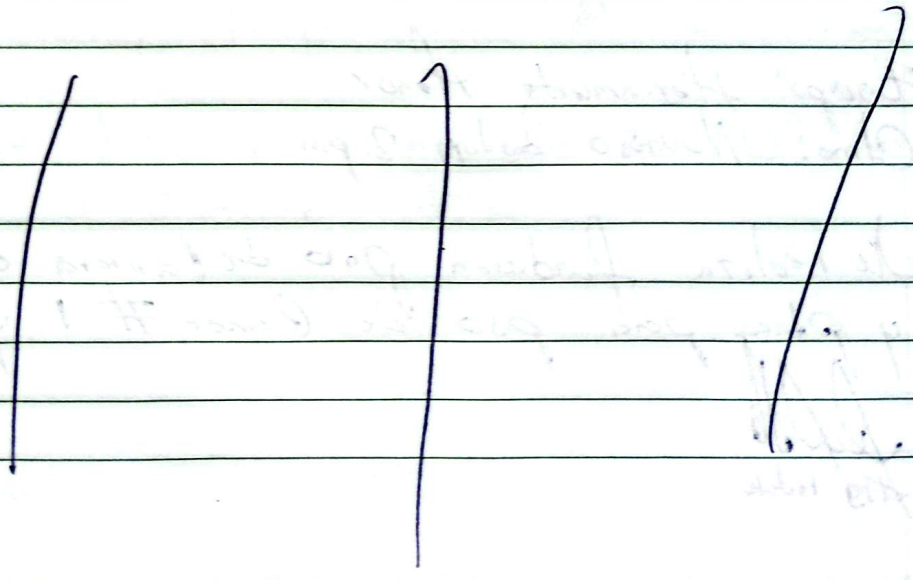

Powered by CamScanner

Febrero 11 de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Retrocargador

Clima: lluvioso

Actividad

Se realiza excavacion a maquina para colector principal

Excavacion a mano para perfilado de excavacion para tubera 10" y 4"
Entibado Excavacion
Excavacion a mano para acometidas domiciliarias

Ing residente

Febrero 12 de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: lluvioso despues 2 pm

Se realiza fundicion pozo de camara de inspeccion y placa para pozo de Concreto #1 y #2

Ing residente

febrero 13 de 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Personal:
Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado
Actividad
fundicion de piso de Camara inspeccion #3 y #4
Se instala colchon de triturado para tuberia colector Principal espesor 20cm tramo comprendido Camara #1 y camara #2

Ing residente

febrero 14 de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado

Entibado de excavacion para guantizar estabilidad de excavaciones tramo camara #1 a camara #3

Instalacion de tuberia Corrugada de 10" desde Camara #1 a camara #2

Ing residente

Fecha: 16 marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herram menor
Clima: Soleado
Actividad
Instalacion tubería Corrugada 10" para colector principal desde Camara #1 a camara #2

Instalacion de tubería y accesorios para domiciliarias

Ing residente

Fecha 17 marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herram Menor
Clima: Lluvioso

Instalacion tuberia Sanitaria 10" corrugado para Colector principal y sellero con material de excavacion.

Ing residente

Fecha 18 de marzo 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado.

Actividad

Entibado excavacion para garantizar estabilidad de excavaciones de colector y camara inspeccion

Ing residente

fecha: 19 febrero 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herram Menor
Clima: Soleado

Actividad

Instalacion de tubria y accesorios de acometidos domiciliarias.

Ing residente

Fecha: 20 ~~(febrero)~~ Marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado

Actividad
Instalacion de tuberia corrugado de 10" en el colector principal

Pega ladrillo para Camara #1

Ing residente

Fecha 21 marzo 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Clima: lluvioso

Actividad

Pega mamposteria para Camaras #1 y #2

Instalacion tubera y accesorios acometida domiciliarias

Ing residente

fecha 23 marzo 2026

Dia festivo no hay actividades

fecha: 24 marzo 2026.

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado

Mamposteria camara #1 y #2 y repello piso y camara #1

Ing residente.

fecha: 25 marzo de 2026

Personal: 1 Maestro de obra
1 ing residente
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Lluvioso

Actividad

Se realizo repello piso y mamposteria camara #1 y camara #2

Ing residente

Powered by CamScanner

Fecha: 26 marzo 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado
Actividad
. Mamposteria para Camaras #3 - #4
Instalacion tubería 10" colector principal

Ing residente

Fecha: 27 marzo 2026
Personal . 1 ing residente
1 maestro

Equipo: Herram Menor
Clima: Soleada

Mamposteria para Camara inspeccion #3 - #4

Fecha: 28 marzo 2026
Personal 1 ing residente
1 maestro
2 ayudantes
Equipo: Herram Menor
Clima: Soleado

Repello para camara inspeccion #3 y #4

Powered by CamScanner

Instalacion de acometida domiciliaria.

Ing residente

fecha: 30 marzo 2026

No se realiza actividades lluvias intensas

Ing residente

fecha: 31 marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herram Menor
Clima: Soleado

Excavacion para camara inspeccion #3 y #4
Se realizo relleno camara #3 y #4

Ing residente

fecha: 01 ABRIL 2026

Personal: 1 maestro obra
1 ingr civil
3 ayudantes
Equipo = Herramienta Menor
Clima: lluvioso

Actividad

Repello de cara interno concreto inspector #4

Ing residente

Fecha: 2 abril 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado
Actividad

Se realiza mampostería para camara #4
Se realiza la actividad de conectar el tubo de desagüe del colegio a camara #1

Ing residente

Fecha: 3 abril 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado
Actividad

- Se realiza instalacion de tubería tramo camara #3 a camara #4.
- Relleno con material excavacion para

Colector principal y Camaras inspecion costados exteriores.

Ing residente

fecha: 24 abril 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor

clima: Soleado

Actividad

Relleno con material proveniente de excavacion para Colector principal y acometidas

Ing residente

fecha: 6 abril 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor

clima: Soleado

Actividad

fundicion de tapas de Camara de inspecion #1 y Camera inspeccion #2

Relleno con material de excavacion, acometidas domiciliarias

Ing residente

Powered by CamScanner

Fecha: 7 abril 2026
Equipo: Herramienta Menor
Personal: 1 maestro
1 ing residente
3 ayudantes

Clima: lluvias
Actividades
fundicion de tapas de camaras #3 y camara #4 en concreto de 3000 psi

Relleno para colector principal con material de excavación.

Ing residente.

Fecha: 8 abril 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herram menor
Clima: Soleado.

Actividades
Relleno con material de excavacion para excavacion externa a camaras de inspeccion

Ing residente

Fecha 9 abril 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herram menor
Clima: Soleado
Actividad
Relleno con material proveniente de excavacion
para acometidas domiciliarias.

Ing residente
