UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2024	INFORME MENSUAL SOCIAL N°15	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	6/5/2022

Informe No	15	Periodo	1 de agosto 2025	31 de agosto 2025
Contrato de obra	018-2024			
Contratista	UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2024			

PROYECTO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. ETEPA III MODULO VI

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

AGOSTO

Periodo	Fecha			Nombre- Lugar	Tipo de reunión	N° Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
ago-25	1	8	25	Ana Isabel Toscano Navarro - K 4B 80 35 - Santo Domingo de Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Ana Maria Gomez Peña - K 3B 79 80 - Santo Domingo de Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Astrid Duran Barbosa - K 2A 73D 51 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Gonzales Rita Antonia - K 1F 64 34 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	4	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Edgar Vallejo - T 2 74 56 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Edwin Junior Ariza Sierra - C 74 1 27 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Gutierrez Mosquera Franco Elias - K 5A 88 66 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Herrera De Sandoval Doris Maria - K 4A 79 59 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Humberto Franceschi Caceres - K 2C 66 25 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Juana Cecilia Montenegro Mercado - K 1D 74 30 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Kelys Johana Quiroz Romero - T 1 3A 37 - Santo Domingo de Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Lilia Mercedes Estrada Amador - C 3 80 58 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Marlene Isabel Ramirez Lora -C 74 3C 80 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Octaviana Torregroza De Leon - K 5B 89 70- Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	25	Pacheco Jefe Yaneth - K 1H 64 41 - Santo Domingo De Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	1	8	28	Rafael Emiro Arroyobuto - k 1H 80 120 - Santo Domingo de Guzman	SOCIALIZACION INDIVIDUAL	3	Se presenta la propuesta de intervención y el alcance del presupuesto con el acompañamiento de la interventoría.	Acta de reunion -propuesta de intervencion
	22	8	25	COLEGIO JOSE CONSUEGRA EB SANTO DOMINGO DE GUZMAN	SOCIALIZACION GENERAL	26	Se realizo reunion general de socializacion de proyecto a fin de dar a conocer a los beneficiarios toda informacion relacionada al mejoramiento en cuanto componentes obligatorios, logistica del contratista, presupuestos; reunión organizada por el contratista con acompañamiento de interventoria y dirigida por alcaldia.	registro de asistencia - registro fotografico.
	TOTAL					**75**		
	OTRAS REUNIONES							
	27	8	25	Gladys Peralta K 6A Sur 89 57 - Santa Maria apto 1	Reunion de Seguimiento	7	Se realizó visita en la vivienda del beneficiario Gladys Peralta para establecer acuerdos y compromisos para culminación de actividades y toma de detalles pendientes.	Acta de reunion
	20	8	25	Estela Gonzales K 6Q 102 A 189 - Villa San Pedro III	Reunion de Seguimiento	3	Se realizó visita en la vivienda del beneficiario Estela Gonzalez para establecer acuerdos y compromisos para culminación de actividades y toma de detalles pendientes.	Acta de reunion
	5	8	25	Aura Sanchez - K 6A 102 88 - Villa San Pedro III	Reunion de Seguimiento	4	Se realizo visita para establecer acuerdos y compromisos de terminacion junto a interventoria y edubar, comprometiendose el subcontratista a reactivar la obra el dia 25 de agosto	Acta de reunion
	20	8	25	Yasiris Cali - K 4 92 29 - San Luis	Reunion de Seguimiento	5	Se realizó visita en la vivienda del beneficiario Yasiris Cali para establecer acuerdos y compromisos para culminación de actividades y toma de detalles pendientes, debido a retrasos en la ejecucion por falta de material y a que la beneficiaria no aceptaba en enchape de piso social	Acta de reunion
	14	8	25	Kelly Quiroz T1 3A 37 - Santo Domingo	Atencion a Caso	6	Se realizo visita para validacion de areas intervenidas junto a interventoria y edubar y establecer acuerdos de terminacion, sin embargo no se logro debido a que el beneficiario manifiesta estar en desacuerdo y retira a todo personal de su vivienda	Acta de reunion
	18	8	25	Kelly Quiroz T1 3A 37 - Santo Domingo	Cierre de vivienda	6	Se realizo visita para validacion de areas intervenidas junto a interventoria y edubar y establecer acuerdos de terminacion, sin embargo no se logro debido a que el beneficiario manifiesta estar en desacuerdo y retira a todo personal de su vivienda	Acta de reunion
	22	8	25	Kelly Quiroz T1 3A 37 - Santo Domingo	Cierre de vivienda	6	Se realizo visita para validacion de areas intervenidas junto a interventoria , edubar y alcaldia para establecer acuerdos de terminacion, sin embargo no se logro debido a que el beneficiario manifiesta nuevamente estar en desacuerdo y retira a todo personal de su vivienda expresa no querer saber nada cpn respecto al mejoramiento . por tal razon las entidades pertinentes proceden al cierre de vivienda	Acta de reunion
	20	8	25	Miladys Garizabalo K 2D 90 71 Santo Domingo	Atencion a solicitud	4	Se visita la vivienda con edubar e interventoria para aclarar con inconformidad de la postulante debido a que ella desea conservar en enchape existente en sala, a lo cual se confirma que si se conservara.	Acta de reunion
	5	8	26	Fany Hernandez - Calle 78 1D-64 Santo Domingo	Atencion a solicitud	6	Se realizo visita en la vivienda con edubar e interventoria debio a detalles pendientes, se establecio acuerdos y compromisos de terminacion de obra.	Acta de reunion
	TOTAL					**47**		

1.1.2 DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha	Mecanismo de divulgacion	Cantidad	Tema	Registros dejados
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO	19-ago-25	Entrega de Volante	47	Se realizó entrega de invitación a socializacion general del proyecto a traves de un volante y folleto.	Formato entrega de volante

1.2 POLITICA DE EMPLEO

2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo	Tipo de población
Diana Contreras	1081825494	OPERATIVO	Pobreza extrema
Jesus Rafael Pua Narvaez	1042423355	OPERATIVO	Pobreza extrema
Orlando Alvarez	91289459	OPERATIVO	Pobreza extrema
Roberto Carlos Cordoba De La Hoz	8777043	OPERATIVO	Pobreza extrema
Rafael Antonio Calvo Carreño	72176017	OPERATIVO	Pobreza extrema
Camilo Andres Salinas Visbal	1049264100	OPERATIVO	Pobreza extrema
Neider David Caro Correa	1005625189	OPERATIVO	Pobreza extrema
Jose Aristides Gomez Prasca	72.047.111	OPERATIVO	Pobreza extrema
Karina Cortes Palacin	1.043.001.955	INSPECTORA	Centro de Oportunidades
Alexandra Ruiz Fonseca	1143424687	OFICIOS VARIOS	Pobreza extrema
		OFICIOS VARIOS	Centro de Oportunidades

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto	35
Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto	8
Total mano de obra	43

1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

1.3.1 ACTAS DE VECINDAD

Agosto

Barrio	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Estado		Observaciones
				Inicio	Cierre	
Santo Domingo De Guzman	Ana Isabel Toscano Navarro	K 4B 80 35	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Ana Maria Gomez Peña	K 3B 79 80	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Astrid Duran Barbosa	K 2A 73D 51	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Gonzales Rita Antonia	K 1F 64 34	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Edgar Vallejo	T 2 74 56	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Edwin Junior Ariza Sierra	C 74 1 27	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Gutierrez Mosquera Franco Elias	K 5A 88 66	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Herrera De Sandoval Doris Maria	K 4A 79 59	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Humberto Franceschi Caceres	K 2C 66 25	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Juana Cecilia Montenegro Mercado	K 1D 74 30	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Kelys Johana Quiroz Romero	T 1 3A 37	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Lilia Mercedes Estrada Amador	C 3 80 58	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Marlene Isabel Ramirez Lora	C 74 3C 80	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Octaviana Torregroza De Leon	K 5B 89 70	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Pacheco Jefe Yaneth	K 1H 64 41	RESIDENCIAL	X	X	
Santo Domingo De Guzman	Rafael Emiro Arroyobuto	K 1H 80 120	RESIDENCIAL	x	x	
			TOTAL	16	16	

1.3.2 REPARACION / INDEMNIZACIÓN DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Periodo	N° Acta	Nombre del afectado	Cédula	Dirección	Descripción	
					Afectación	Bien restituido
NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Observaciones: En este periodo no se realizaron reparaciones.

1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD

1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Mecanismo de atención	Lugar de instalación	Barrio	Fecha de instalación	Observaciones
Pac (punto de atención a la comunidad)	Calle 99 con cordialidad LOCAL 4	Villa san pedro I - II Y III- Santo Domingo-Santa maria-20 de julio- san carlos-san luis	28 de Agosto	El punto de atención se colocó en una oficina de la bodega de los contartistas la cual esta al límite con los barriosvilla san pedro 1 y 2; HORARIO: jueves 7:30 AM - 12:00 PM

1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS

Se debe anexar el registro de la matriz de PQRS establecido por la entidad contratante

1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Fecha			Actividad /tema	Población objetivo	Barrio / Dirección	No Asistentes	Cant piezas entregadas	Registros dejados
14	8	2025	Charla corta de **"COMUNICACIÓN ASERTIVA" -**	**EMPLEADOS UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024**	OFICINA BOMBA PUMA	**6**	**N/A**	Listado de asistencia y registros fotográficos.
29	8	2025	Charla de **"SOSTENIBILIDAD SOCIAL"** se explica a los beneficiarios la importancia del componente electrico en tuberia galvanizada en metal D, asi mismo que es un componente obligatorio para ejecutar el mejoramiento.	**BENEFICIARIOS**	SANTO DOMINGO DE GUZMAN - SANTA MARIA	**11**	**N/A**	Listado de asistencia y registros fotográficos.
Total						**17**		

2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL

INDICADORES		TOTAL		2024							2025								2026								
Programa	Fórmula x 100%	Acumulado	Promedio	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago									
Programa de informacion y participacion	Reuniones realizadas	4	0,3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1									
	Reuniones programadas	4	0,3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1									
	Reuniones con la comunidad	100%	100%	100%	100%	100%												100%									
	Reuniones individuales realizadas	563	37,5	11	27	58	41	33	44	24	67	14	44	35	93	41	15	16									
	Reuniones individuales programadas	563	37,5	11	27	58	41	33	44	24	67	14	44	35	93	41	15	16									
	Reuniones por beneficiario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
	N° asistentes a las reuniones	2512	167,5	188	196	386	126	232	144	126	222	54	138	115	291	126	46	122									
	Mecanismos de divulgación implementados	13	0,9	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	1									
	Asistencia a las reuniones	19323%	19323%	9400%	9800%	38600%	12600%					5400%	13800%	3833%		12600%		12200%									

Infraestructura de predios	No de actas levantadas	**509**	**33,9**	11	27	71	41	76	44	24	67	21	37	1	17	41	15	16															
	No de vivienda del proyecto	**1000**	**1000,0**	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000															
	Actas de inicio	3%	3%	1%	3%	7%	4%	8%	4%	2%	7%	2%	4%	0%	2%	4%	2%	2%															
	No de actas de cierre realizdas	**554**	**36,9**	0	0	0	60	76	44	24	38	42	49	46	102	41	16	16															
	No de actas de incio realizadas	**651**	**43,4**	11	27	71	41	76	44	24	67	21	49	46	102	41	15	16															
	Cierre de actas de vecindad	85%	85%	0%	0%	0%	146%	100%	100%	100%	57%	200%	100%	100%	100%	100%	107%	100%															
Atención a la comunidad	Total de pqr cerradas	**3**	**0,2**	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Total pqr abiertas	**3**	**0,2**	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Eficiencia en la gestión PQRS	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															
Sostenibilidad social	Actividades realizadas	**15**	**1,0**	0	4	1	1	0	1	1	1	0	2	1	1	0	1	1															
	Actividades programadas	**15**	**1,0**	0	4	1	1	0	1	1	1	0	2	1	1	0	1	1															
	Actividades con los trabajadores	100%	100%	0%	100%	100%	100%		100%	100%	100%		100%	100%	100%		100%	100%															
	Actividades realizadas	**14**	**0,9**	0	0	3	3	1	0	0	0	2	1	1	0	1	1	1															
	Actividades programadas	**14**	**0,9**	0	0	3	3	1	0	0	0	2	1	1	0	1	1	1															
	Actividades con la comunidad	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%				100%	100%	100%		100%	100%	100%															
Política del empleo	Empleo generados Mujeres C.O	**23**	**1,5**	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															
	Empleos requeridos contractual	**30**	**2,0**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															
	Empleos Mujeres centro de oportunidades	77%	77%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%															
	Empleos generados PPC	**130**	**8,7**	7	15	17	7	4	11	4	4	3	6	10	14	10	9	9															
	Total de empleos generados	**974**	**64,9**	84	108	95	95	63	84	63	59	40	41	28	61	55	55	43															
	Empleos poblacion proteccion constitucional Dec 1860/21	13%	13%	0%	14%	18%	7%	6%	13%	6%	7%	8%	15%	36%	23%	18%	16%	9															
	Empleos generados MONC	**745**	**49,7**	0	73	90	75	75	53	74	53	30	31	10	52	47	47	35															
	Total de empleos generados	**911**	**60,7**	0	84	108	95	95	63	84	59	40	41	28	61	55	55	43															
	Empleos MONC	82%	82%	0	87%	83%	79%	79%	84%	88%	90%	75%	76%	36%	85%	85%	85%	81%															
	Empleos generados MOC	**162**	**10,8**	0	11	18	20	20	10	10	10	10	10	10	9	8	8	8															
	Total de empleos generados	**915**	**61,0**	0	84	108	95	95	63	84	63	40	41	28	61	55	55	43															
	Empleos MOC	18%	18%	0%	13%	17%	21%	21%	16%	12%	16%	25%	24%	36%	15%	15%	15%	15%															

3. OBSERVACIONES: El indicador es acumulativo

4. ANEXOS

No	Descripción	No folios
PGS1	Registro consolidado de atenciones ciudadanas (pqrs)	0
PGS2	Registro formato de atenciones ciudadanas	0
PGS3	Soportes mecanismos de divulgación implementados	0
PGS4	Registro actas de reunión	22
PGS5	Registro listados de asistencia	3
PGS6	Registro controls entrega de voloantes	47

No	Descripción			No folios
PGS7	Certificación población victimas del conflicto			0
PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades			2
PGS9	Actas de vecindad			16
PGS10	Acta restitución bienes afectados			0
PGS11	Registro fotográfico			18
PGS12	Otros anexos	(Especificar cual)	Levantamiento técnico	

Firma
Nombre DANIELA YEE MENDEZ
Responsable del área social
Contratista

Firma
Nombre PSI. MAIRA ALEJANDRA ESCORCIA
Responsable del área Social
Interventoria

UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2024	CONSOLIDADO ATENCIONES A LA COMUNIDAD	Formato	8
		Versión	2
		Fecha	12/7/2021

PROYECTO	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. ETAPA III - MÓDULO VI.	CONTRATO DE OBRA	018-2024
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2024	PERIODO	ago-25

No. Consecutivo	Fecha	Manifestante	Dirección	Asunto	Tipología				Gestión	Solución				Estado
					R	P	Q	S		RP	I	D	E/V	Fecha de cierre
1	13/12/22024	Nalcy Cecilia Narvaez Garcia	Carrera 4SUR #90- 26 - barrio Santa Maria	Se recepciona la solicitud de la beneficiaria Nalcy Narváez: 1. mejorar acabados arriba de Zócalo 2. Aplicar una mano de pintura carece de la misma 3. Terminar parte eléctrica y hacer recogida 4. Mejorar estuco en ficha de vano de entrada de entrada a cocina 5. Culminar los detalles eléctricos Se estipula queja en compañía del profesional Social de Interventoría. Fecha límite 17 de diciembre de 2024.			X		Posterior al levantamiento de la queja se deja estipulado la toma de los detalles por parte del contratista encargado en el área. Detalles terminados el día 17/12/2024 a satisfacción de la beneficiaria.	X				Cerrada 17/12/2024
2	13/12/22024	Mary Cruz Camargo Sarmiento	Carrera 3SUR #90-39 barrio Santa Maria	Se realiza visita al predio por solicitud de la beneficiaria ya que hasta la fecha no se han tomado los detalles para culminar el mejoramiento: 1. El beneficiario optó por instalar la Luz de forma directa en la caja de Break ya que no contaba con energía en la vivienda. 2. El mesón cuenta con el enchape mal instalado y se llena de agua cuando usan el lavaplatos (corregir Nivel). 3. La beneficiaria comenta que las puertas de las alcobas se las desinstalaron, las dejaron en el patio y se le dañaron con el agua de lluvia. 4. El tomacorriente de la nevera fue suministrado por el beneficiario e instalado por el mismo y está en mal estado (colocar GFCI). 5. No han cambiado el sifón del lavaplatos. 6. Mejorar estuco y pintura. 7. Enchape de baño con tono de diferente color. 8. No se ha instalado la varilla Polo a tierra 9. No tiene buje el lavamanos Se estipula			X		Posterior al levantamiento de la queja se deja estipulado la toma de los detalles por parte del contratista encargado en el área. Detalles terminados el día 20/12/2024 a satisfacción de la beneficiaria.	X				Cerrada 20/12/2024
3	13/12/22024	Carmen Garcia Villalba	Carrera 4SUR #89-80 barrio Santa Maria	Beneficiario manifieste en inconformidad debido a detalles faltantes hasta la fecha 1. Intervención eléctrica faltante. 2. Piedras en cocina partidas. 3. Baños sin luz. 4. Sin sello de lavamanos de baño 5. No se cambió la grifería del lavaplatos Se estipula solicitud en compañía de la Trabajadora Social de interventoría fecha límite para toma de Detalles 20 de diciembre.			X		Posterior al levantamiento de la queja se deja estipulado la toma de los detalles por parte del contratista encargado en el área. Detalles terminados el día 20/12/2024 a satisfacción de la beneficiaria.	X				Cerrada 20/12/2024
				Total			3			3				

Tipología **R** Reclamo; **P** Petición; **Q** Queja; **S** Sugerencia

Solución **RP** Reparación; **I** Indemnización; **D** Donación o servicio; **E/V** Escrita/verbal

OBSERVACIONES

Firma profesional social contratista

Nombre: **DANIELA YEE**

Vo.Bo Interventoría

Nombre: **PSI. MAIRA ALEJANDRA ESCORCIA**

UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2024	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/7/2021

PROYECTO	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. ETEPA III MODULO VI

CONTRATO DE OBRA	SA-EDU-018-2024	CONTRATISTA	Unión Temporal Viviendas 2024	PERIODO	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

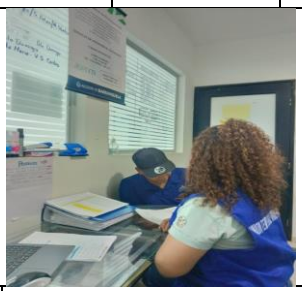


Foto No 1	PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD



Foto No 2	CHARLA SOBRE COMPONENTE ELECTRICO



Foto No 3	CHARLA CORTA SOBRE EL COMPONENTE ELECTRICO COMUNIDAD



Foto No 4	APERTURA DE VIVIENDA



Foto No 5	APERTURA DE VIVIENDA BARRIO 20 DE JULIO



Foto No 6	RESOCIALIZACION VIVIENDA



Foto No 7	SOCIALIZACION GENERAL DE PROYECTO



Foto No 8	CIERRE DE VIVIENDAS



Foto No 9	CIERRE DE VIVIENDAS



Foto No 10	REUNION DE SEGUIMIENTO

			
Foto No 11	REUNION DE SEGUIMIENTO	**Foto No 12**	APERTURA DE VIVIENDAS
			
Foto No 13	**APERTURA DE VIVIENDA**	**Foto No 14**	CHARLA CORTA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA EMPLEADOS
			
Foto No 15	CIERRE DE VIVIENDAS	**Foto No 16**	CIERRE DE VIVIENDAS
			
Foto No 17	CIERRE DE VIVIENDAS	**Foto No 18**	ATENCION A SOLICITUDES
