Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
	FORMATO: INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: ATC-FR-003
		Página 1 de 5

INFORME DE AVANCE PERIODO DE FEBRERO 2026

Alcaldía de San Cristóbal Bolivar

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº COID-836-2025 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

Objeto del Convenio:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.						
Valor del Convenio:	$ 6.606.511.499,00	Aporte de Mindeportes:		$ 6.606.511.499,00		Aporte del Municipio:	$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00						
Valor Total:	$ 6.606.511.499,00						
Plazo de Ejecución:	7/08/2026	Suspensión 1		Reinicio:		Prórroga Nº 1	
Fecha de Inicio:	24/11/2025	Suspensión 2		Reinicio:		Prórroga Nº 2	
Vencimiento:	7/08/2026					Plazo Actualizado	7/08/2026
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
SEGUROS DEL ESTADO	Desde	7/11/2025	Hasta 7/02/2027	$ 1.321.302.299,80		Hasta N/A	N/A

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	4	Período comprendido entre el	1/02/2026	al	28/02/2026
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL				
Localización	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, BOLIVAR				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:		Objeto:	
Contrato Nº:		Contrato Nº:	
Contratista:		Contratista:	
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:		Fecha de Inicio:	
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:		Fecha de Terminación:	
Prórrogas:		Prórrogas:	
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:		Valor Inicial:	
Valor Adiciones:		Valor Adiciones:	
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	
Valor pagado:		Valor pagado:	
Valor por pagar:		Valor por pagar:	
Nombre Supervisor:		Nombre Interventor:	

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº				CONTRATO DE OBRA Nº			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Nombre de la Aseguradora	Póliza N°			Nombre de la Aseguradora	Póliza N°		

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR


SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

En el de febrero de 2026, en el proceso licitatorio LP-003-2025, de acuerdo al cronograma del proceso en secop I, la apertura del proceso, pliegos definitivos, cierre del proceso, el acta de apertura de sobre N° 1 y el acta informe de evalaucion preeliminar.

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

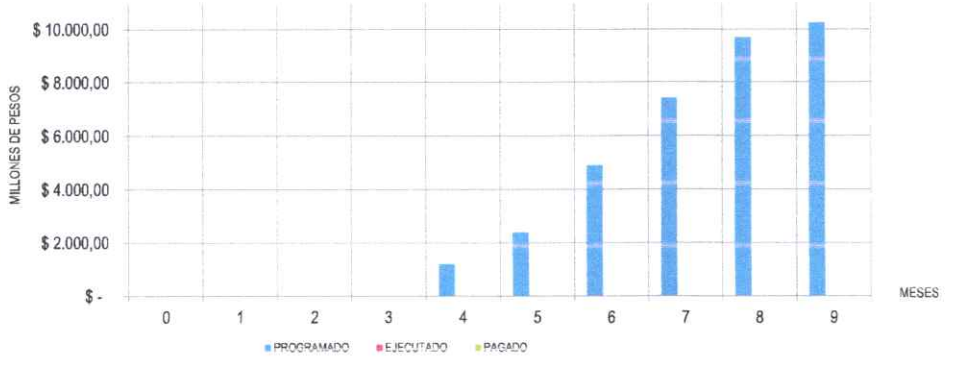

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N.A.	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A.	0
2.	Registro Fotográfico	N.A.	0	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A.	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	N.A.	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N.A.	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A.	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A.	0
5.	Copia último informe de interventoría	N.A.	0	12.	Control maquinaria y equipo	N.A.	0
6.	Copia actas de comité de obra	N.A.	0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A.	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N.A.	0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio	N.A.	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
ISMAEL MARTINEZ CASTILLA	LUIS MANUEL UTRIA SUAREZ	LUIS MANUEL UTRIA SUAREZ	Elaborado: 17/04/2026
Secretario de Hacienda	Secretario de Planeacion municipal	Secretario de Planeacion municipal	Total de Páginas: 2

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
	FORMATO: INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: ATC-FR-003
		Página __ de __

ANEXO Nº 1: BALANCE PRESUPUESTAL

Alcaldía de San Cristobal Bolivar

CONVENIO Nº COID-836-2025 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	Localización	SAN CRISTOBAL - BOLIVAR
Contrato Nº:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	Contratista:	
Período:	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026	Interventor:	
Director de obra:		Director Interventoría:	

1. CONTRATO DE OBRA Nº XXX - CONTROL AL PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad contrato	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**0,00**						**0,00**		**0,00**
	Administración	0%			0,00						0,00		0,00
	Imprevistos	0%			0,00						0,00		0,00
	Utilidad	0%			0,00						0,00		0,00
	IVA 16% Sobre Utilidad	16%			0,00						0,00		0,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**

2. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA Nº XXX

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 0,00	V/R ANTICIPO:	$ 0,00
V/R ADICIONES:	$ 0,00	% ANTICIPO:	0,00%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 0,00	% RETEGARANTÍA:	0,00%

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	

3. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº XXX

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 0,00	V/R ANTICIPO:	$ 0,00
V/R ADICIONES:	$ 0,00	% ANTICIPO:	0,00%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 0,00	% RETEGARANTIA:	0,00%

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
ISMAEL MARTINEZ CASTILLA Secretario de Hacienda	LUIS MANUEL UTRIA SUAREZ Secretario de Planeacion Municipal	LUIS MANUEL UTRIA SUARES Secretario de Planeacion Municipal	Elaborado: 17/04/2026 Total de Páginas: 1

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
	FORMATO: INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: ATC-FR-003
		Página 1 de 1


ANEXO Nº 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

Alcaldía de San Cristóbal Bolívar

CONVENIO Nº COID-836-2025 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO -CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO RECREATIVO DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO RECREATIVO DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	Localización	San Cristobal, Bolivar
Contratista:		Director de obra:	
Interventor:		Director Interventoría:	
Fecha del registro fotográfico:			

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Evidencia de apertura del proceso y demás actuaciones en el período informado		

FOTOGRAFÍA Nº 4	FOTOGRAFÍA Nº 5	FOTOGRAFÍA Nº 6

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
	FORMATO: INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: ATC-FR-003
		Página _ de _

ANEXO Nº 3: RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

Alcaldía de San Cristóbal Bolívar

CONVENIO Nº COID-836-2025 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	Localización	San cristobal, Bolivar
Contrato Nº:		Contratista:	
Periodo:	Del 01/02/2026 al 28/02/2026	Interventor:	
Director de obra:		Director interventoría:	

ACTA Nº ___ MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			Cantidad contrato	Valor Unitario	Valor Total	Mayores (+)	Menores (-)	Mayores (+)	Menores (-)		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Administración	0%			0,00			0,00	0,00		0,00
	Imprevistos	0%			0,00			0,00	0,00		0,00
	Utilidad	0%			0,00			0,00	0,00		0,00
	IVA 16% Sobre Utilidad	16%			0,00			0,00	0,00		0,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICACIÓN	CONCEPTO DIRECTOR INTERVENTORIA	CONCEPTO SUPERVISOR MUNICIPIO
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**0,00**	**OBSERVACIONES:**		
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**0,00**			
	Administración	0%			0,00			
	Imprevistos	0%			0,00			
	Utilidad	0%			0,00			
	IVA 16% Sobre Utilidad	16%			0,00			
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				0,00			

* ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
ISMAEL MARTINEZ CASTILLA Secretario de Hacienda	LUIS MANUEL UTRIA SUAREZ Secretario de planeacion municipal	LUIS MANUEL UTRIA SUAREZ Secretario de Planeacion municipal	Elaborado: 17/04/2026 Total de Páginas: 1
