CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
			Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	miércoles, 25 de marzo de 2026	**PERIODO No.**	35	DEL	**18/03/2026**	AL	**24/03/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y CORREGIMIENTO DE LOMA DE ARENA JURISDICCIÓN ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0280 DE 2025	CONTRATO No.:	0281 DE 2025
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de julio de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de julio de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	23 de enero de 2026	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	23 de enero de 2026
**FECHA DE REINICIACIÓN:	18 de febrero de 2026	**FECHA DE REINICIACIÓN:	18 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	25 de marzo de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	25 de marzo de 2026
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES	PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES
PLAZO ACTUALIZADO:	240,00	PLAZO ACTUALIZADO:	240,00
PLAZO TRANSCURRIDO:	234 EQUIVALE AL 97,5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	234 EQUIVALE AL 97,5%
VALOR INICIAL :	$ 396.766.230,00	VALOR INICIAL :	$ 6.163.657.461,00
VALOR ADICION(ES):	$ 132.337.520,00	VALOR ADICION(ES):	$ 2.101.266.178,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 529.103.750,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 8.264.923.639,00
VALOR PAGADO:	$ 132.255.410,00	VALOR PAGADO:	$ 1.751.760.629,90
VALOR POR PAGAR:	$ 396.848.340,00	VALOR POR PAGAR:	$ 8.264.923.639,00
SUPERVISOR CRA:	PEDRO SARMIENTO ARIZA	INTERVENTOR:	CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA FINALIZACION DE ACTIVIDADES	DÍAS
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	**03/07/2025**	03/07/2025	-
2	**CAPITULO I - RECUPERACION ARROYO LEON**	31/12/2025		
3	Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	31/12/2025	31/12/2025	-
4	Limpieza para Recuperación Ambiental	23/01/1900	12/03/2026	-46.070,00
5	Retiro y Disposición Final de Residuos	30/12/2025		
6	Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	30/12/2025		
7	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO**	31/12/2025	31/12/2025	-
8	Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga	31/12/2025	31/12/2025	-
9	Movilización Terrestre de Equipos	29/08/2025	29/08/2025	-
10	Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	30/12/2025	31/12/2025	-1,00
11	Desmovilización Terrestre de Equipos	24/12/2025	31/12/2025	-7,00
12	**CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**	31/12/2025	31/12/2025	-
13	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno	31/12/2025	31/12/2025	-
14	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4.	31/12/2025	31/12/2025	-
15	**CAPITULO IV - NO PREVISTOS**	25/03/2026		
16	Suministro e instalación de geotextil tejido biaxial en poliester de alta densidad	25/03/2026		
17	Suministro e instalación de bolsas tipo bibbags en colipolimero de alto desempeño de 1x1x1 para izaje, incluye excavación y conformación de	25/03/2026		
18	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	31/12/2025		
Plazo del proyecto en días		**181**		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 8.031.336.662,86	97,17%	2,17%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 8.210.317.115,35	99,34%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
			Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	miércoles, 25 de marzo de 2026	PERIODO No.	35	DEL	18/03/2026	AL	24/03/2026

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Miércoles, 18 de marzo de 2026:

- Se realiza seguimiento a la actividad de instalación de las bolsas JumboBags para protección de taludes, en total se llenan 85 bolsas ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 16 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero LOS POCITOS ubicado a una distancia aproximada de 15 kilómetros, logrando la disposición final de 256 m³ de material.

Jueves, 19 de marzo de 2026:

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 19 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero LOS POCITOS ubicado a una distancia aproximada de 15 kilómetros, logrando la disposición final de 304 m³ de material.

Viernes, 20 de marzo de 2026:

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 20 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero LOS POCITOS ubicado a una distancia aproximada de 15 kilómetros, logrando la disposición final de 320 m³ de material.

Sábado, 21 de marzo de 2026:

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 26 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero LOS POCITOS ubicado a una distancia aproximada de 15 kilómetros, logrando la disposición final de 416 m³ de material.

Domingo, 22 de marzo de 2026:

Día no laboral

Lunes, 23 de marzo de 2026:

Día no laboral - Dia Festivo

Martes, 24 de marzo de 2026:

- Seguimiento y control a la evacuación de 28 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero LOS POCITOS ubicado a una distancia aproximada de 15 kilómetros, logrando la disposición final de 448 m³ de material.
- Se realizó la revisión detallada de la documentación correspondiente a las actas de permiso ingreso a predios, así como de la matriz de PQRs, con el fin de verificar el adecuado cierre de cada uno de los registros, constatando que las observaciones, requerimientos y compromisos asociados se encuentra debidamente atendidos, documentados y formalmente finalizados.
- Se realizó una inspección conjunta con el contratista de obra y el supervisor de la CRA en todos los frentes de intervención (Tramo principal y brazo), durante la cual se verificó en campo el desarrollo de las actividades ejecutadas, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Martes, 25 de marzo de 2026:

- Se llevó a cabo la socialización final puerta a puerta con los actores presentes en el área de influencia del proyecto, en la cual se informó sobre la culminación de las actividades de limpieza ejecutadas en el arroyo León y su brazo auxiliar, dejando constancia del cierre de las intervenciones y del cumplimiento del alcance previsto.
- Se realizó la inspección a las actividades de desmovilización de equipos en el frente de obra, verificando el retiro ordenado de la maquinaria y herramientas, así como el cumplimiento de las condiciones operativas y ambientales establecidas para el cierre de las actividades en sitio.
-Inspección a las actividades de desmonte del campamento de obra, incluyendo el retiro de los puntos ecológicos instalados y de la dotación de emergencia correspondiente al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).


CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA / C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	miércoles, 25 de marzo de 2026	PERIODO No.	35	DEL	18/03/2026	AL	24/03/2026

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Seguimiento a la instalación de bolsas JumboBags para obras de protección de taludes ante erosión



Seguimiento a la instalación de bolsas JumboBags para obras de protección de taludes ante erosión



Seguimiento a la instalación de bolsas JumboBags para obras de protección de taludes ante erosión

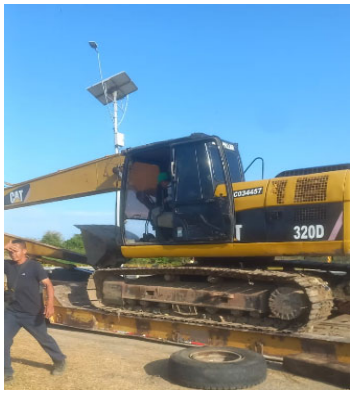

Desmovilización de maquinaria en Arreoyo León



Desmovilización de maquinaria en Arreoyo León



Desmovilización de maquinaria en Arreoyo León

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE
