ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 9 de marzo de 2026	**SEMANA No.**	**47**	DEL	**2-mar-26**	AL	**8-mar-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Cabrera Cundinamarca

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	353 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	353 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 02 de marzo al 08 de marzo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

* **ITEM 1.6 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES**: Se realizo el transporte de material de afirmado desde la cantera autorizada LA COLINA hasta el tramo 1 de cabrera entre las abscisas K4+600 al K3+908.

* **ITEM NP5 MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE):** Se realiza extendida, conformación y compactación de material de afirmado entre las abscisas K4+600 al K3+908 , este tramos se realizaron con espesor promedio de 13 cm respectivamente y con anchos promedio de 4m

*Se realizaron actividades de **topografia**.

*Se realizaron actividades de l**evantamiento de actas de vecindad.**

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	32,20%	24,86%	-7,34%
Durante el periodo	9,91%	2,34%	-7,58%
Acumulado Actual	42,11%	27,19%	-14,92%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	353,00	116,00	-69,96

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.393.714.755	$ 1.075.941.517	77,20%
Durante el periodo	$ 429.161.648	$ 101.215.223	23,58%
Acumulado Actual	$ 1.822.876.403	$ 1.177.156.740	64,58%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 645.719.663,61

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
$ 8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 02 al 08 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-En la semana evaluada se remite el comunicado 25C02_DTO_342 del 16 de marzo de 2026, donde se relaciona el primer requerimiento de aclaración técnica y cumplimiento ambiental por el suministro de materiales granulares en los meses enero y febrero de 2026 en los frentes de obra.
-Dentro de la semana evaluada, el Contratista continúa con la implementación del Paga en el frente de obra (campamento móvil, punto ecológico, gestión de residuos, en las actividades realizadas en obra) Interventoría realiza el seguimiento pertinente para garantizar el cumplimiento del mismo.
-Se solicita al Contratista por medio de correo electrónico la entrega de información actualizada, clave para el seguimiento de la implementación del Paga en obra y la gestión de los RCD.
-Se continúa con el desarrollo del informe ambiental del mes de febrero de 2026 de Interventoría.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo señalado se adelantaron diversas acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos sociales del contratista de obra y a fortalecer los mecanismos de seguimiento de la interventoría. Entre ellas se destacan:
• Reiteración de observaciones: La interventoría emitió nuevamente observaciones al informe social presentado por el contratista correspondiente al mes de noviembre, con el fin de insistir en la necesidad de ajustes y correcciones que permitan una adecuada trazabilidad de las actividades sociales.
• Participación en reunión interna: El componente social participó activamente en la sesión de revisión sobre los incumplimientos del contratista, aportando insumos para la identificación de riesgos y la definición de medidas correctivas.
• Apremio por incumplimiento: Se emitió un requerimiento formal mediante comunicado 25C02_DTO_343 al contratista por el retraso en la puesta en funcionamiento del subprograma 6.1 Atención a la comunidad, específicamente en lo relacionado con la apertura de la oficina de atención y la instalación de buzones satélites. Este incumplimiento afecta directamente la comunicación con la comunidad y la transparencia del proceso.
• Revisión y aprobación metodológica: La interventoría revisó y aprobó la metodología y los talleres propuestos por el contratista, solicitando además la programación detallada para garantizar su ejecución oportuna y efectiva.
• Solicitud formal sobre porcentajes de contratación de mano de obra: La interventoría solicitó de manera formal que se tengan en cuenta los porcentajes de contratación de mano de obra no calificada, así como los demás porcentajes requeridos, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y asegurar la participación equitativa de la comunidad en el proceso de ejecución de la obra. Esto en el caso de que se llegué a subcontratar personal.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas en los frentes de obra, destacándose labores de replanteo, ingreso de material y conformación de afirmado en las zonas intervenidas. Asimismo, se realizaron actividades relacionadas con la instalación y verificación de la señalización correspondiente al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y la delimitación de las áreas de trabajo, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad.
Para el desarrollo de estas labores, el contratista contó con un (1) profesional ambiental, un (1) ingeniero residente, un (1) profesional social, una (1) inspectora SST, un (1) topógrafo, tres (3) operarios de maquinaria, un (1) maestro de obra, dos (2) auxiliares de tráfico y cuatro (4) auxiliares de obra, quienes participaron en las actividades ejecutadas en campo.
En el marco del seguimiento realizado por la interventoría, se efectuaron inspecciones a maquinaria y equipos, verificación del uso y estado de los elementos de protección personal (EPP), así como revisión de las condiciones de seguridad en las zonas de trabajo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

* Se informa que el tramo No 2 el cual se deberia ejecutar entre las abscisas K7+200 al K8+100 presenta un problema de estabilidad en la abscisa K7+200 en su costado izquierdo, por lo que es necesario iniciar este tramo 20 m mas adelante en la abscisa K7+220. Los 20 m faltantes se trasladan para ejecutar en el tramo 1.
*Se informa que en el tramo 1 el cual estaba contemplado realizar entre las abscisas K4+000 al K4+980, se encuentra una placa huella que inicia sobre la abscisa K4+908 por lo que se ajusto este tramo.
* Teniendo en cuenta que para la determinacion de los tramos a intervenir y sus abscisas de inicio y final se determinaron mediante recorrido en vehiculo en el cual se tomo como referencia la distancia que marcaba el odometro y de esta manera determinar aproximadamente las abscisas de inicio y final de cada tramo,se informa que estas abscisas se ajustaron con topografia por lo que varian en su nomenclatura pero se mantienen los mismos tramos a intervenir segun recorrido realizado con el ICCU-ALCALDIA-CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

*Teniendo en cuenta lo anterior se hizo ajuste a el abscisasdo en donde el tramo 1 se encuentra entre las abscisa K3+908 al K4+908, el tramo No 2 entre las abscisas K7+220 al K8+100 y el tramo No 3 entre las abscisas K8+300 al K12+700 dando cumplimiento a los 6.2 km de alcance.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el dia 1 de enero al dia 31 de marzo del 2026. Se esta dando cumplimiento a esta actividad de obra.
2) Demolicion Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero a el dia 2 de marzo del 2026. No se ha iniciado a realizar esta actividad de obra y segun programacion para la presente semana se debio finalizar esta actividad.
3) Remocion de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero a el dia 2 de marzo del 2026. No se ha iniciado a realizar esta actividad de obra y segun programacion para la presente semana se debio finalizar esta actividad. .
4) Excavaciones varias en material comun seco a mano, contemplada a ejecutar el dia 9 de febrero a el dia 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo excavaciones.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el dia 9 de febrero a el dia 9 marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el dia 12 de febrero al dia dia 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 13 de enero al dia 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de roceria.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos quimicos no tradicionales. Contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero al dia 21 de abril del 2026. El contratista no ha iniciado con esta actividad de obra por lo que se evidencia un atraso significativo en la ejecucion del contrato.
9) Tuberia de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el dia 9 de febrero al dia 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalacion de tuberia de polietileno
10) Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 13 de enero al dia 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los dias 13 de enero y el dia 23 de febrero del 2026. Para la presente semana el contratista finalizo con la instalacion de material de afirmado para los 6.2 km a intervenir.
* Se presenta un atraso fisico del 14.92% catorce punto noventa y dos por ciento con respecto al porcentaje de programacion para la presente semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topógrafo, Operador vibro compactador, Operador retroexcavadora, oficial, 4 ayudantes,2 auxiliares de trafico.
*Se evidencia maquinaria y equipos (Motoniveladora, retroexcavadora, vibro compactador, camionetas, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $1.177.156.740 Mil ciento setenta y siete millones ciento cincuenta y seis mil setecientos cuarenta pesos. que corresponden a un avance físico del 27,19% venti siete punto diecinueve por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

* Deterioro de la dotación y elementos de protección personal (EPP) utilizados por parte del personal operativo. *
*Ausencia de un punto de atención de emergencias en el frente de obra (falta de extintor, botiquín y señalización). * *Falta de señalización preventiva donde se presentan abismos o desniveles cercanos al área de trabajo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido
Deterioro de la dotación y elementos de protección personal (EPP) utilizados por parte del personal operativo.	Contratista	No ha cumplido
Ausencia de un punto de atención de emergencias en el frente de obra (falta de extintor, botiquín y señalización).	Contratista	No ha cumplido
Falta de señalización preventiva donde se presentan abismos o desniveles cercanos al área de trabajo.	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES


11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.
Se generara por parte de esta interventoria un oficio de incumplimiento en la programacion de obra, teniendo en cuenta que a fecha del presente informe ya se evidencia un atraso en las actividades en el Municipio de Cabrera mayor al 5%.


12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

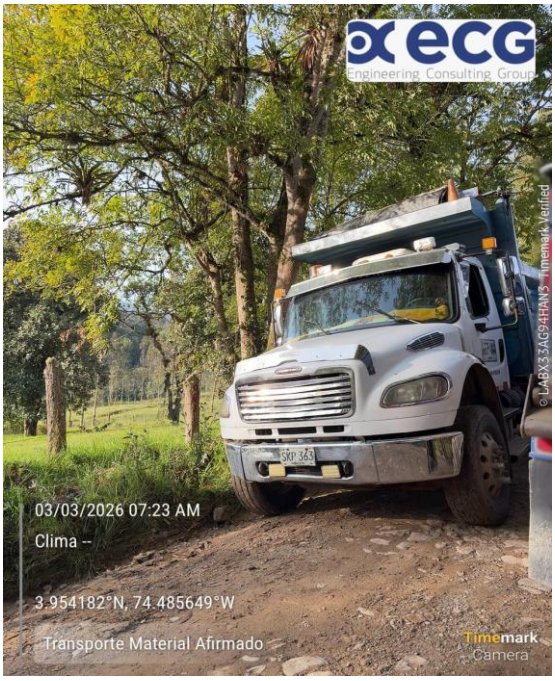


Transporte de material

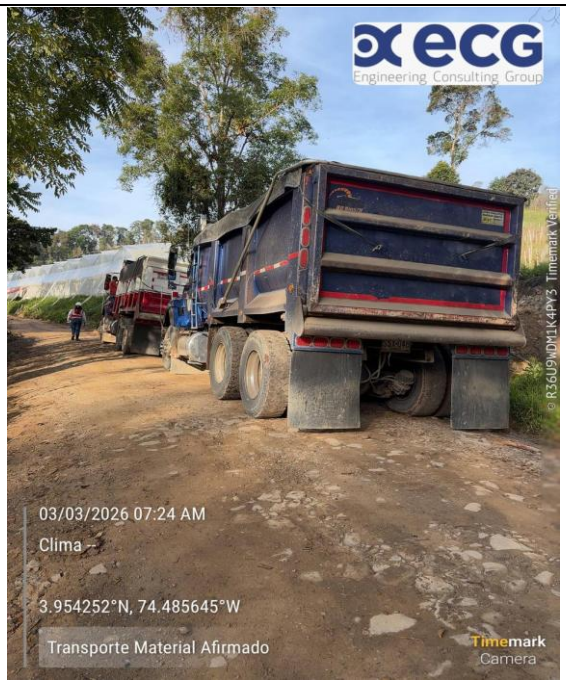


Transporte de material.

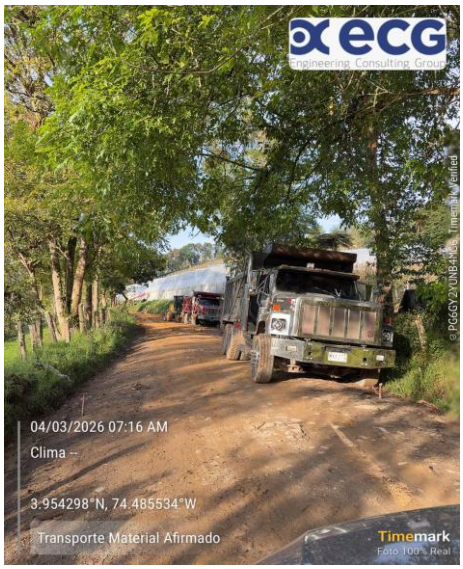

Transporte de material

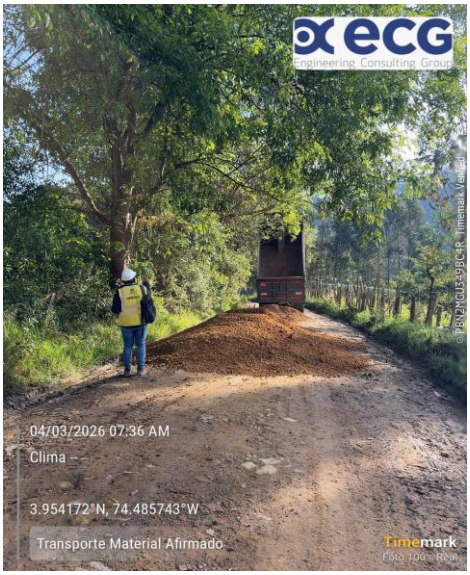


Transporte de material

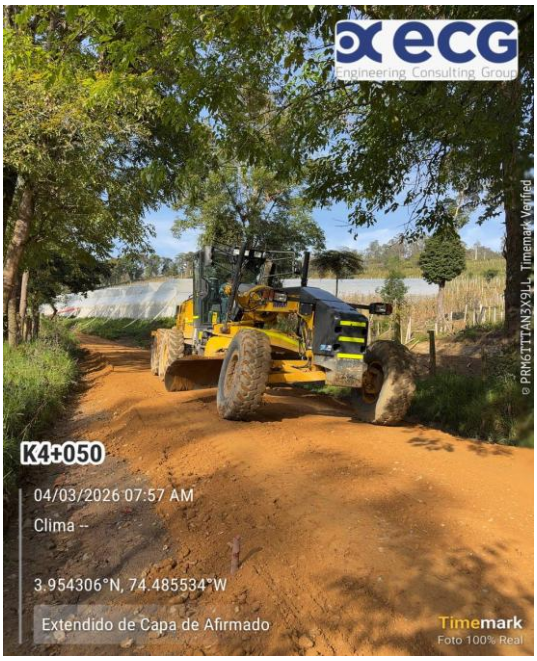


Extendido Material Afirmado.



Extendido Material Afirmado.

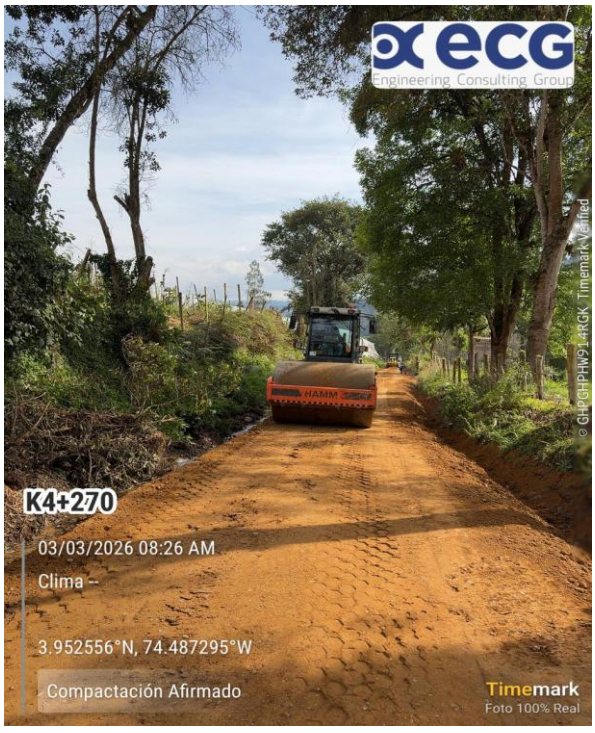

Compactación Material Afirmado.

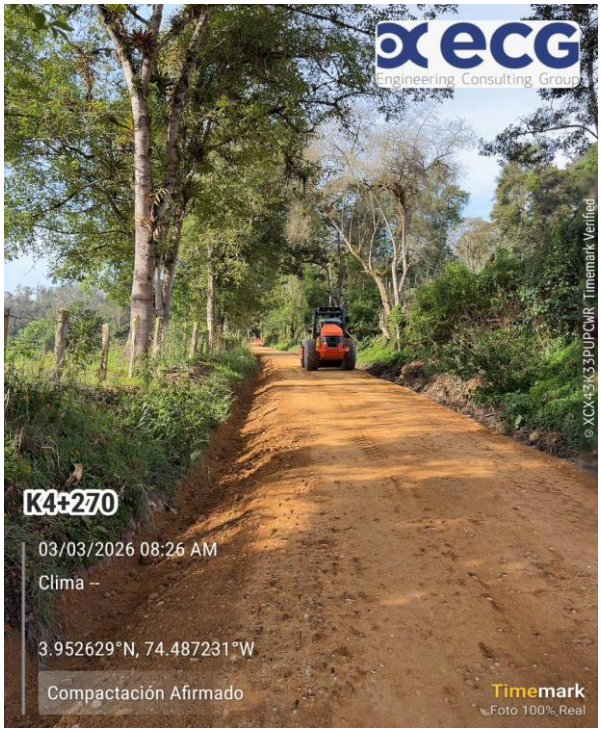

Compactación Material Afirmado.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro
