Consorcio **Inter-Digital**
Fonseca

INFORME DE INTERVENTORÍA ABRIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002- 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

ABRIL 2026

FONSECA, LA GUAJIRA.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente Informe de Interventoría tiene como propósito presentar el seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas en el marco del contrato correspondiente al componente de mejoramiento de infraestructura, desarrollados en las instituciones educativas beneficiadas.

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las condiciones físicas de los ambientes escolares, promoviendo espacios adecuados, seguros y funcionales que faciliten el desarrollo de procesos innovadores y contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. Lo anterior se ejecuta mediante el contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA."

La interventoría, en cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas, financieras y sociales, ha realizado el acompañamiento permanente a las etapas de ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales suministrados, el avance físico y financiero de las obras. Así mismo, se ha velado por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y la preservación del entorno escolar durante la ejecución del proyecto.

El contrato objeto de interventoría será ejecutado mediante el contrato 002 del 2025 con objeto FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, derivado del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-005-2025, cuyo contratista es el CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.

Las sedes educativas beneficiarias del proyecto son:

- Institución Educativa Ernesto Parodi Medina – Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal
- Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal
- Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal
- Institución Educativa Rural Agroambiental José Pérez – Sede Principal

El presente informe brinda información sobre las actividades de interventoría realizadas, así como del personal del contratista CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. en el marco del contrato de interventoría 002-2025, en el periodo de tiempo comprendido entre 1 de ABRIL 2026 al 21 ABRIL de 2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA OBJETO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
NIT	9 0 1 9 7 3 5 3 5- 1
REP. LEGAL	GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
C.C.	1.065.663.256
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 86 CENTAVO M/CTE. ($7.179.697.691,86) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO FOSECA, LA GUAJIRA.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.
NIT	9 0 1 9 7 7 5 3 1 -0
REP. LEGAL	ROIMAN JOSE COBO NIEVES
C.C.	17.956.759
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
VALOR:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS ($446.576.060,00) MDA/CTE.
PLAZO:	OCHO (8) MESES.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

Departamento: La Guajira

Municipio: Fonseca.

SEDE EDUCATIVA.	LOCALIZACIÓN.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	10°52'56.3"N - 72°50'47.4"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL	10°53'4.56"N- 72°50'58.02"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL	10°53'5.43"N - 72°51'16.87"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	10°53'20.22"N - 72°51'41.31"O
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	10°54'30"N 72°51'25"W

5. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 47-44-101032168	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	22-08-2025 AL 22-04-2026	$ 223.288.030,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIOENS SOCIALES LEGALES E INDEMNZACIONES LABORALES	22-08-2025 AL 22-04-2029	$ 22.328.803,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22-08-2025 AL 22-10-2026	$ 44.657.606,00

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se detallan las actividades administrativas realizadas por CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. como cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría 002 del 2025 en el periodo de tiempo que comprende el presente informe.

6.1 PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

MES DEL PAGO	NUMERO DE PLANILLA
MARZO	9502557103

6.2 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

- **Papelería, Informes, Fotocopia:**

Incluye todos los gastos de papelería empleados para el desarrollo de las actividades de oficina, notificación de comunicados al personal, documento de informes, impresiones a color para evidencias y registro fotográfico.

- **Gastos de transportes:**

Estos se generaron por el desplazamiento del personal del equipo de trabajo a los puntos de ejecución del proyecto a supervisar.

7. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA REALIZADAS.

Verificación del cumplimiento de las obligaciones contraculturales del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 durante el periodo de tiempo que compete al presente informe de interventoría del mes de marzo, por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

7.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

Se realizó la solitud al contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de la siguiente documentación con la finalidad de ser validada por la interventoría.

- Documentos de RUT: La cual fue validada por la interventoría.
- Pólizas contractuales actualizadas.

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTOS No. 47-44-101031991.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	22/08/2025 a 22/08/2026	$ 717.969.769,19
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 3.589.848.845,93

Pago de salaries, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones.	22/08/2025 a 22/04/2029	$ 358.984.884,59
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	22/08/2025 a 22/04/2027	$ 717.969.769,19
Calidad de servicio.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 717.969.769,19

7.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA.

7.2.1 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

La Interventoría verificó las actividades de mejoramiento de infraestructura en las aulas de las sedes educativas beneficiarias del proyecto, evidenciando que durante el periodo objeto del presente informe, se realizó seguimiento, verificación y control a las actividades ejecutadas dentro del componente de mejoramiento de infraestructura, evidenciando el desarrollo de las siguientes labores preliminares:

1. **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

Se verificó la ejecución de la acometida eléctrica destinada a la alimentación de equipos de aire acondicionado, consistente en la instalación de tubería metálica tipo EMT de 3/4”, incluyendo accesorios de fijación, acoples y elementos de sujeción conforme a especificaciones técnicas.

Así mismo, se constató el tendido de conductores en cobre, correspondientes a dos (2) líneas calibre No. 10 AWG para alimentación y un (1) conductor calibre No. 12 AWG para puesta a tierra. La interventoría evidenció que las actividades de trazado, instalación, fijación y conexionado fueron realizadas conforme a los lineamientos técnicos establecidos.

Se realizó verificación del sistema instalado, validando continuidad eléctrica, correcta canalización y cumplimiento de condiciones de seguridad, dejando constancia de que la actividad se ejecutó de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y normativa aplicable, se realizó la instalación de lámparas de sobre poner de 18W para la bodega y baños de un ambientes de biblioteca.

2. ASEO Y LIMPIEZA

Se verificó la ejecución de actividades de limpieza general en las áreas intervenidas, las cuales incluyeron la recolección y disposición de residuos de obra, limpieza de superficies y adecuación básica de los espacios.

La interventoría constató que dichas actividades se realizaron con el fin de dejar las áreas en condiciones adecuadas para la continuidad de las fases constructivas y de instalación, cumpliendo con criterios de orden, seguridad y preparación del área de trabajo.

7.2.1 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA.

La interventoría validó la dotacion de los siguiente elementos por parte del contratista a las sede beneficiarias del proyecto.

SEDE EDUCATIVA.	ELEMENTOS.	CANTIDAD.
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	31 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	0
	AUDIFONOS DIADEMA	31 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades
	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	3 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	1 unidad
	Automatización Aulas	1 aula
	Automatización Bibliotecas.	0
	Fotocopiadora multifuncional.	0
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	0
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad
	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	Señalización Ruta de Evacuación (Según NTC 1461)	1 unidad

SEDE EDUCATIVA.	ELEMENTOS.	CANTIDAD.
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	0 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	13 unidades
	AUDIFONOS DIADEMA	13 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades

	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	4 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	2 unidad
	Automatización Aulas	0 aula
	Automatización Bibliotecas.	1 Biblioteca
	Fotocopiadora multifuncional.	1 unidad
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	1 unidad
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad
	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	División Infantil	3 Unidades
	Extintor CO2 del 10 Lb, intalados incluye soporte.	1 unidad
	KIT Primeros auxilio (botiquín A, camilla, collarín).	1 unidad
MATERIAL PEDAGOGICO	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	150 unidades

	Cuentos Infantiles y obras literarias	50 unidades
	Kit De Juegos Pedagógico	1 unidad

SEDE EDUCATIVA.	ELEMENTOS.	CANTIDAD.
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	0 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	17 unidades
	AUDIFONOS DIADEMA	17 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades
	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	3 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	2 unidad
	Automatización Aulas	0 aula
	Automatización Bibliotecas.	1 Biblioteca
	Fotocopiadora multifuncional.	1 unidad
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	1 unidad
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad
	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	División Infantil	3 Unidades
	Extintor CO2 del 10 Lb, intalados incluye soporte.	1 unidad
	KIT Primeros auxilio (botiquín A, camilla, collarín).	1 unidad

MATERIAL PEDAGOGICO	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	150 unidades
	Cuentos Infantiles y obras literarias	150 unidades
	Kit De Juegos Pedagógico	1 unidad

SEDE EDUCATIVA.	**ELEMENTOS.**	**CANTIDAD.**
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON-SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL)	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	0 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	17 unidades
	AUDIFONOS DIADEMA	17 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades
	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	4 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	2 unidad
	Automatización Aulas	0 aula
	Automatización Bibliotecas.	1 Biblioteca
	Fotocopiadora multifuncional.	1 unidad
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	1 unidad
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad

	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	División Infantil	3 Unidades
	Extintor CO2 del 10 Lb, intalados incluye soporte.	1 unidad
	KIT Primeros auxilio (botiquín A, camilla, collarín).	1 unidad
MATERIAL PEDAGOGICO	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	150 unidades
	Cuentos Infantiles y obras literarias	150 unidades
	Kit De Juegos Pedagógico	1 unidad

SEDE EDUCATIVA.	**ELEMENTOS.**	**CANTIDAD.**
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL (BIBLIOTECA DIGITAL))	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	0 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	15 unidades
	AUDIFONOS DIADEMA	15 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades

	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	4 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	2 unidad
	Automatización Aulas	0 aula
	Automatización Bibliotecas.	1 Biblioteca
	Fotocopiadora multifuncional.	1 unidad
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	1 unidad
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad
	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	Señalización Ruta de Evacuación (Según NTC 1461)	1 unidad
	División Infantil	3 Unidades
	Extintor CO2 del 10 Lb, intalados incluye soporte.	1 unidad
	KIT Primeros auxilio (botiquín A, camilla, collarín).	1 unidad
MATERIAL PEDAGOGICO	Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	150 unidades
	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	150 unidades

	Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	150 unidades
	Cuentos Infantiles y obras literarias	150 unidades
	Kit De Juegos Pedagógico	1 Unidad

SEDE EDUCATIVA.	ELEMENTOS.	CANTIDAD.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL (AULA DIGITAL)	COMPUTADOR PORTATIL HP 14 Pulgadas	31 unidades
	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	0
	AUDIFONOS DIADEMA	31 unidades
	TABLERO DIGITAL TV DE 65 PULGADAS	1 Unidades
	AIRE MINI SPLIT DE 24000BTU	2 unidades
	Router Access Point RompeMuros	1 unidad
	UPS Online de 2KVA	1 unidad
	Automatización Aulas	1 aula
	Automatización Bibliotecas.	0
	Fotocopiadora multifuncional.	0
	Suministro e instalación de Circuito Cerrado de televisión	0
	Gabinete Metálico 20U	1 unidad
	Extintor Tipo ABC 20 Libras Instalados e incluye soporte.	1 unidad
	Punto ecológico incluido Canecas Reciclables 20 Litros	1 unidad
	Señalización Ruta de Evacuación (Según NTC 1461)	1 unidad

De igual forma la interventoría verificó el suministro de puntos ecológicos para cada ambiente intervenido, extintores, botiquines según lo establecido contractualmente.

Para el componente pedagógico se verifico la correcta entrega de cartillas educativas en las bibliotecas, de la siguiente manera, por biblioteca;

Contenido educativo Impreso Cartillas educación Ambiental TOMO II	UND	150
Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO I	UND	150
Contenido educativo Impreso Educación SEXUAL TOMO II	UND	150
Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz I	UND	150
Contenido educativo Impreso Educación Catedra de paz TOMO II	UND	150
Cuentos Infantiles y obras literarias	UND	150

Para el kit de juegos didácticos, de igual manera el contratista llevó a cabo metodología de apropiación y transferencia de conocimiento con los docentes de las sedes beneficiarias del proyecto.

7.2.2 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PEDAGOGICO.

Durante el periodo objeto del presente informe, la interventoría realizó seguimiento, verificación y control al desarrollo de las jornadas de capacitación y apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), orientadas a la transferencia de conocimiento hacia los docentes de las sedes educativas beneficiarias del proyecto.

En este sentido, se evidenció la ejecución de talleres estructurados en múltiples sesiones, cuyo objetivo fue fortalecer las competencias digitales del cuerpo docente, así como promover el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas suministradas en el marco del contrato.

La interventoría constató que las jornadas abordaron de manera integral los siguientes contenidos:

En primer lugar, se desarrollaron procesos de apropiación básica y operativa de las TIC, en los cuales se capacitó a los docentes en el uso adecuado de equipos de cómputo, tableros digitales interactivos, sistemas de respaldo energético (UPS), redes inalámbricas (WiFi), así como en la comprensión funcional de servidores web y herramientas de seguridad perimetral como firewall. Estas actividades incluyeron sesiones prácticas orientadas a garantizar el correcto manejo de los equipos instalados y su integración en el entorno educativo.

De igual forma, se verificó el desarrollo de espacios orientados al fortalecimiento de las competencias TIC docentes, mediante la implementación de metodologías activas e

innovadoras que integran tecnología en los procesos de enseñanza–aprendizaje. En este componente, se abordaron tendencias actuales como la incorporación de la inteligencia artificial en la educación, promoviendo su uso responsable y estratégico como herramienta de apoyo pedagógico.


Así mismo, la interventoría evidenció la capacitación en el uso de plataformas educativas implementadas en el proyecto, específicamente en lo relacionado con el manejo funcional y pedagógico de las plataformas PEDigital y BiblioPED, orientadas a la gestión de contenidos educativos digitales y al fortalecimiento de los procesos de lectura, consulta e investigación. Estas sesiones incluyeron el acceso, navegación, administración de contenidos y aplicación práctica en el aula.

Adicionalmente, se verificó que los contenidos impartidos fueron acompañados de material pedagógico de apoyo, guías prácticas y ejercicios aplicados, facilitando la apropiación efectiva por parte de los docentes. La interventoría constató la participación activa de los asistentes y la adecuada articulación de los contenidos con las necesidades del contexto educativo.

En términos generales, se concluye que las actividades del componente de apropiación TIC se ejecutaron conforme a lo establecido contractualmente, evidenciando pertinencia, coherencia pedagógica y adecuada transferencia de conocimiento hacia la comunidad educativa beneficiaria.


7.2.3 AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 7.179.697.691,86	$ 7.179.697.691,86	0%

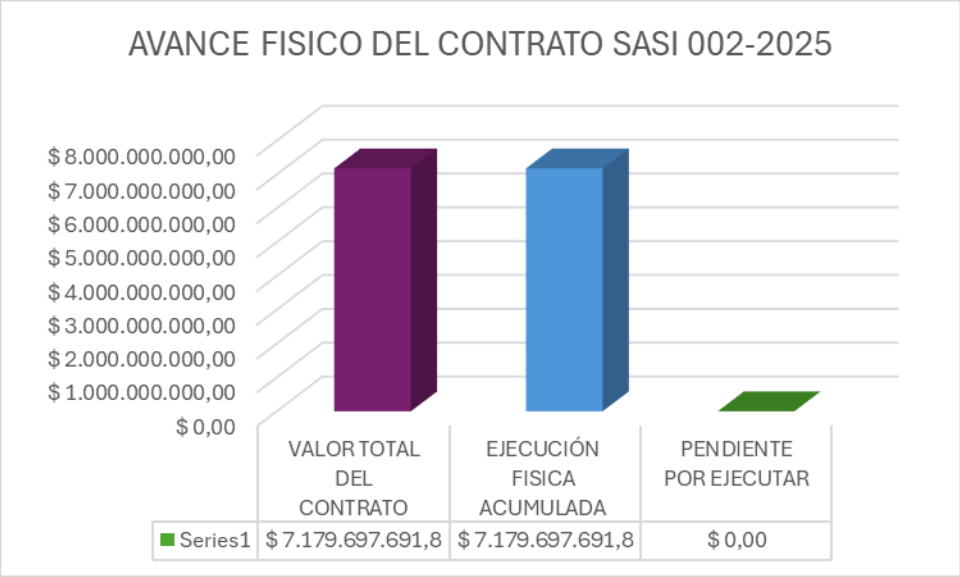

Se evidencia un avance físico en el presente acumulado del 100% ($ 7.179.697.691,86)

7.2.4 AVANCE FÍNANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

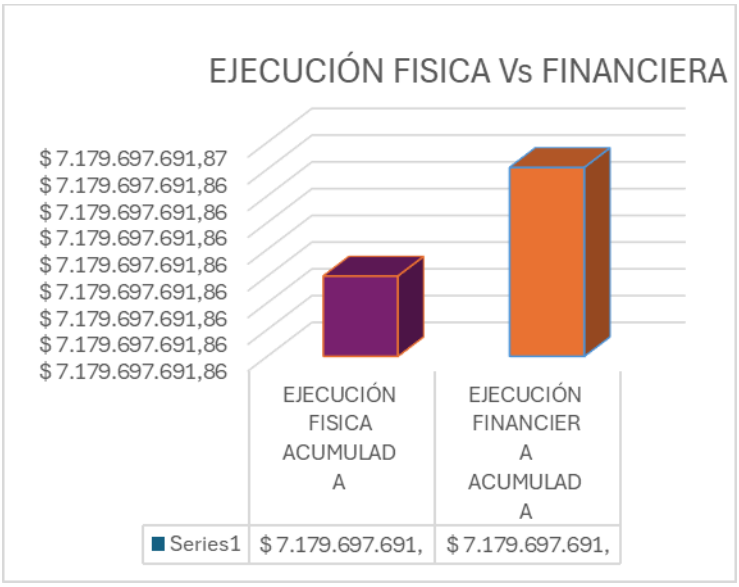

EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA	EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA 1	EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA 2	EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA 3	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
$ 7.179.697.691,86	$ 2.902.594.287,50	$ 2.080.787.050,38	$ 2.196.316.353,99	$ 7.179.697.691,86

7.3 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA.

Se realizó la revisión del informe No 7 de actividades del contratista, el cual conforme a la verificación se evidencian las actividades del componente implementación tecnológica y del componente de mejoramiento de infraestructura.

7.3.1 VALIDACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES DEL CONTRATISTA.

TITULAR.	N.o PLANILLA MARZO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO FONSECA DIGITAL	9502471596	Cumple.

8. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Director De Interventoría:

Se mencionan las actividades realizadas por el director de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizo la planificación y socialización con el equipo de trabajo de las estrategias para la puesta en marcha de las actividades de interventoría.
- Realizó visitas a campo (sedes educativas) para verificación de condiciones iniciales.
- Realizó actividades de supervisión para llevar control económico de la ejecución del contratista y de la interventoría.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las actividades del contratista y de la interventoría.
- Revisó el análisis del informe y demás documentación suministrada por el contratista.
- Gestionado la asignación de los recursos para la ejecución de las actividades de la interventoría.
- Revisó cantidades presentadas por el contratista para acta parcial No 2 contrato SASI 002 - 2025

Residente De Interventoría 1:

Dentro de las actividades realizadas por el residente de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Residente De Interventoría 2:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.

– Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Interventor Educativo.

Dentro de las actividades realizadas por el interventor educativo en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Verificación de cumplimiento del lineamiento de ministerio de educación nacional en las actividades del proyecto.
- Respondió dudas e inquietudes de parte de la comunidad educativa con relación a la ejecución del proyecto en relación con el contrato de suministro 002 del 2025.
- Elaboración de temario y metodología para la transferencia de conocimiento.

9. AVANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 21 de abril del 2026 se ´presenta un acta parcial No 3 con un avance financiero del 30,59% para un avance total acumulado de 100%

1. COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA											
1.1	**COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO.**										
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 11.940.000,00	$ 95.520.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 29.220.191,04
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 14.610.095,52
1.1.3		PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 14.610.095,52
1.1.4	APOYO EDUCATIVO	PERSONA	8,00	$ 6.069.500,00	$ 48.556.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 14.853.597,11
1.1.5	APOYO CONTABLE	PERSONA	8,00	$ 3.034.750,00	$ 24.278.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 7.426.798,55
1.2.2	SECRETARIA	PERSONA	8,00	$ 2.985.000,00	$ 23.880.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 7.305.047,76
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
2.1	PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	UND	8,00	$ 940.000,00	$ 7.520.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 2.179.411,90
2.2	ARRENDAMIENTOS (Incluye servicios públicos)	MES	8,00	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 8.114.831,56
2.4	GASTOS DE TRANSPORTE	MES	8,00	$ 6.500.000,00	$ 52.000.000,00		40,43%	28,98%	30,59%	100,00%	$ 15.070.401,47
	TOTAL COSTOS DIRECTOS.				**375.274.000,0**						**$ 113.390.470,42**
	I.V.A 19%				**$ 71.302.060,00**						**$ 21.544.189,38**
	VALOR TOTAL INTERVENTORIA				**$ 446.576.060,00**						**$ 134.934.659,80**

10. CONCLUSIONES.

- La Interventoría pudo validar el correcto desarrollo de las actividades contractuales por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 en el corte del presente informe
- El contratista presenta un avance físico del 100% correspondiente a ($ 7.179.697.691,86)
- Se presenta el acta parcial No3 para contrato de SASI 002-2025 por un valor de $ $ 2.196.316.353,99 para un avance financiero acumulado en tres actas parciales de $ 7.179.697.691,86 correspondiente 100%
- El contratista cumplió con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social para el periodo del presente informe.
- Se revisó y validó el ajuste de mayores y menores cantidades No. 2, con fecha 13 de abril de 2026, constatando que dicho ajuste se encuentra debidamente soportado técnica y administrativamente, sin que implique modificación del objeto ni del valor total del contrato, manteniendo su equilibrio económico.
- Se constató que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas, calidades y condiciones contractuales definidas, no evidenciándose incumplimientos técnicos en los componentes verificados.

Roiman cobo N

ROIMAN COBO NIEVES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA
