FECHA:	15/3/2026
DIAS RESTANTES	53 Dias
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	
CORTE DEL INFORME	
15 de marzo de 2026	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL No 18 DE INTERVENTORIA

LOTE: 0 4

CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154791	CONSORCIO ESCOSA
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169112	ELSA TORRES ARENALES

FECHAS			PLAZOS EN DIAS				VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:		INTERVENTORIA		OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169112	CO1.PCCNTR.8154791	INICIAL		211		211	INICIAL	$ 796.278.928,00	$ 2.295.618.762,00
INICIO	8 de octubre de 2025	8 de octubre de 2025	SUSPENSIONES					ADICIÓNES	$ 37.571.611,00	$ 300.000.000,00
TERMINACIÓN INICIAL	7 de mayo de 2026	7 de mayo de 2026	PRÓRROGAS		0		0	TOTAL	$ 833.850.539,00	$ 2.595.618.762,00
TERMINACION FINAL	7 de mayo de 2026	7 de mayo de 2026	TOTAL		211		211			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	DICIEMBRE 5 DE 2025	$ 37.571.611,00	NA	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	DICIEMBRE DE 2025	$ 300.000.000,00	NA	
2				
3				
4				

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (8/3/2026)	EJECUTADO SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR FRENTE SEMANAL	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO PROGRAMACION	FECHA FIN PROGRAMACION
AGUSTIN FERNANDEZ	A	AGUSTIN FERNANDEZ	60,41%	7,10%	67,51%	2,00%	100,00%	$ 24.603.629,00	$ 209.224.594,00	$ 346.328.166,02	20/11/2025	13/03/2026
FRIEDRICH NAUMAN	A	FRIEDRICH NAUMAN	84,35%	1,11%	85,46%	0,00%	100,00%	$ 2.223.132,00	$ 171.030.415,24	$ 200.127.188,19	18/11/2025	17/02/2026
TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSE ANTONIO RICAURTE	85,27%	12,41%	97,67%	2,00%	100,00%	$ 38.012.289,00	$ 261.234.210,55	$ 306.385.683,54	1/12/2025	16/03/2026
NUEVO HORIZONTE	C	RURAL HORIZONTE	17,67%	0,00%	17,67%	7,60%	93,37%	$ -	$ 98.613.717,62	$ 558.073.737,62	1/12/2025	18/03/2026
VISTA BELLA	B	SAN CIPRIANO	1,31%	3,60%	4,91%	11,00%	39,00%	$ 5.797.915,00	$ 2.106.883,00	$ 160.897.405,96	9/02/2026	6/05/2026
CRISTOBAL COLON	C	SORATAMA	100,62%	0,00%	100,62%	0,00%	100,00%	$ -	$ 86.277.191,00	$ 85.748.504,43	16/12/2025	17/02/2026
SIMON RODRIGUEZ	C	BOSQUE CALDERON TEJADA	33,64%	0,00%	33,64%	22,82%	69,00%	$ -	$ 79.576.052,00	$ 236.531.332,00	20/01/2026	24/04/2026
CAMPESTRE MONTE VERDE	A	PLAN PADRINOS SAN LUIS	0,00%	1,91%	1,91%	11,25%	83,25%	$ 2.807.796,00	$ 2.807.796,00	$ 147.010.146,20	20/01/2026	7/05/2026
COLEGIO UNION COLOMBIA	A	UNION COLOMBIA	111,58%	0,00%	111,58%	0,00%	100,00%	$ -	$ 124.663.200,63	$ 111.725.784,05	5/01/2026	26/02/2026

EMERGENCIAS

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR 8/03/2026)	EJECUCION SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR FRENTE ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A	A	FILARMONICO							$ 49.861.775,00	7/11/2025	14/01/2026	
NUEVO HORIZONTE SEDE D	A	NUEVO HORIZONTE							$ 8.593.622,00	19/12/2025	15/01/2026	
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	D	AGUSTIN FERNANDEZ							$ -			NO APLICA
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C	A	AGUSTIN FERNANDEZ							$ -			PENDIENTE
COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN SEDE B	A	FRIEDRICH NAUMAN							$ 7.381.053,54	20/02/2026	20/02/2026	
COLEGIO USAQUEN SEDE A	A	USAQUEN							$ 35.072.909,32	17/01/2026	7/02/2026	
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	A	ALVARO GOMEZ							$ 21.585.300,36	2/02/2026	3/3/20206	
COLEGIO NUEVA COLOMBIA SEDE A	A	NUEVA COLOMBIA							$ 8.899.132,00	18/02/2026	18/02/2026	
COLEGIO COMPARTIR SUBA	B	COMPARTIT							$ 1.460.036,39	20/02/2026	14/03/2026	
COLEGIO EL SALITRE SEDE A	A	EL SALITRE							$ 15.228.361,19	8/2/20206	14/03/2026	
COLEGIO 21 ANGELES SEDE A	A	21 ANGELES							$ -			NP POR APROBAR
COLEGIO 21 ANGELES SEDE C	C	21 ANGELES							$ -			NP POR APROBAR
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A	A	SIMON RODRIGUEZ							$ 1.938.500,00	5/01/2026	15/01/2026	
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A	REPUBLICA DOMINICANA							$ 3.998.096,59	18/02/2026	18/02/2026	

PERSONAL DEL PROYECTO	
PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL DE APOYO	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST OBRA	2
INSPECTOR DE OBRA	2
PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST OBRA	2
INSPECTOR OBRA	2
PERSONAL OPERATIVO	39

EMERGENCIAS

OBRAS DE EMERGENCIAS	TERMINADAS	EN EJECUCION	EJECUTADO
FILARMONICO SIMON BOLIVAR SEDE A	SI	NO	100,00%
NUEVO HORIZONTE SEDE D	SI	NO	100,00%
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	NO	NO	0,00%
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C	NO	NO	0,00%
COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN SEDE B	SI	NO	100,00%
COLEGIO USAQUEN SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO NUEVA COLOMBIA SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO COMPARTIR SUBA	SI	NO	100,00%
COLEGIO EL SALITRE SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO 21 ANGELES SEDE A	NO	NO	0,00%
COLEGIO 21 ANGELES SEDE C	NO	NO	0,00%
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A	SI	NO	100,00%
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	SI	NO	100,00%

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		23		34			
2		13		24		35			
3		14		25		36			
4		15		26		37			
5		16		27		38			
6		17		28		39			
7		18		29		40			
8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA			
9		20		31					
10	TOTAL OBRA			32					
11	$ -			33		$ -			

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	0%	0%	75%
META	100%	100%	25%


AVANCE FISICO		
TERMINADAS	2	22%
EN EJECUCION	7	78%
POR INICIAR	0	0%
TOTAL	9	100%


CONTRACTUAL


PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO:	73,96%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	42,53%
VALOR TOTAL FRENTES PROGRAMADO:	$ 1.919.731.329,16
VALOR TOTAL FRENTES EJECUTADO:	$ 1.103.965.904,87


AVANCE - ATRASO
-31,43%

EMERGENCIAS	
VALOR ASIGNADO	$ 442.790.828,00
VALOR EJECUTADO	$ 154.018.786,38
VALOR POR EJECUTAR	$ 288.772.041,62







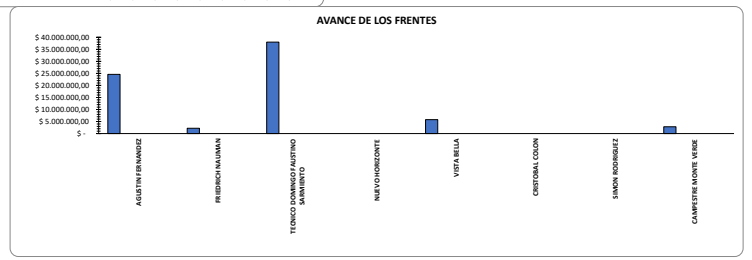

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

1. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION: EL CONTRATISTA REALIZO HASTA LA SEMANA 17 SEGUIMIENTO DE PROGRAMACION CON BASE EN LA PROGRAMACION V3 REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2026. PRESEBTABA UN ATRASO DE -28.72% EL CUAL SE HA INCREMENTADO CONTINUANDO EL SEGUIMIENTO CON LA PROGRAMACION V3 LLEGANDO A UN -31.43% . ES NECESARIO TENER EN CUENTA QUE LA INTERVENTORIA SOLICITO UNA MESA DE TRABAJO PARA ACTUALIZACION PRESUPUESTAL PERO SOLO HASTA EL PASADO 14 DE MARZO DE 2026 SE DIO POR FINALIZADA LA ENTREGA DE INFORMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA CON LA PRESENTACION DE NUEVAS PROPUESTAS TECNICAS PARA LOS FRENTES DE VISTA BELLA Y MONTEVERDE, LAS CUALES MODIFICAN LA INICIAL ENTREGADA Y COMPLEMENTAN ALGUNAS DE LAS MISMAS. **POR LO TANTO HASTA EL DIA LUNES 17 DE MARZO DE 2026 SE PODRA ESTABLECER ULTIMA ACTUALIZACION PARA PRESENTACION A LA SED Y CONSIGUIENTE ACTUALIZACION DE PROGRAMACION EN VERSION 4**

2. OBSERVACIONES POR ATRASO: A.CONFORME LO PROGRAMADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ESCOSA DEBIO HACER ENTREGA DEL FRENTE CRISTOBAL COLON SEDE C Y A LA FECHA NO SE HASUCEDIDO- **B**.IGUALMENTE LOS FRENTES DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO CON FECHA DE ENTREGA EL 16 DE MARZO DE 2026 NO FUE ENTREGADO Y **C-**EL COLEGIO NUEVO HORIZONTE CON FECHA DE ENTREGA DEL 18 DE MARZO DE 2026 PRESENTA UNA EJECUCION SOLO DE MENOS DEL 18% Y POR CONSIGUIENTE UN ATRASO % REPRESENTATIVO TENIENDO EN CUENTA EL VALOR DEL FRENTE **D.** , EL FRENTE FRIEDRICH NAUMAN CON FECHA DE ENTREGA EL PASADO 17 DE FEBRERO DE 2026 SOLO FUE ENTREGADO EL PASADO 13 DE MARZO DE 2026**. E.** EL PERSONAL DEL CONTRATISTA HA SIDO ROTATIVO EN LOS FRENTES DISMINUYENDO LA CANTIDAD CON RELACION A SEMANAS ANTERIORES LO QUE SE EVIDENCIA EN LA N O CULMINACION DE ACTIVIDADES Y LA NO ENTREGA POR FALTA DE REMATES Y OBRAS MENORES.

4. COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C- EL CONTRATISTA REMITIO ESQUEMAS PARA PUERTA DE ACCESO PARA ZONA AULAS MEDIANTE OFICIOS CE-E-258-2025 Y EN BALANCE REALIZADO SE INCLUYO ALCANCE DE PISO CHIP EN ZONA DE JUEGOS**.** LA INTERVENTORIA HABIA REMITIDO MEDIANTE OFICIO INT-COLEGIOSNORTE-L10-315 ACTA DE SEGUIMIENTO REALIZADO EN ESTA SEDE CON REPRESENTANTES DEL COLEGIO PARA INICIO DE OBRAS EN AULAS DE 2DO Y ZONA DE PARQUE HACIA AULA PREESCOLAR, TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE NO INTERUMPIR CLASES DE FORMA DEFINITIVA. ESTA INTERVENCION INICIO EL DIA MARTES 10 DE MARZO CON EL INICIO DE CERRAMIENTO DE LA ZONA CONFORME LO COORDINADO PREVIAMENTE.

5. COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE SEDE A- MEDIANTE OFICIO CE-E-255-2025 DEL 13 DE MARZO DE 2026 EL CONSORCIO ESCOSA REMITIO ESQUEMA DE CUBIERTA PARA ZONA DE EQUIPO DE BOMBAS Y ASEO PARA REVISION DE INTERVENTORIA Y EL DIA SABADO 14 DE MARZO MEDIANTE OFICIO CE-E-256-2025 PARA ACTUALIZACION Y MODIFICACION DE PROPUESTA SOBRE CANALIZACION DE ALL PARA ZONAS DE MONTEVERDE. **BITACORAS DE OBRA**-ASIMISMO MEDIANTE COMUNICADO DE INTERVENTORIA INT-COLEGIOSNORTE-L10-322 SE REITERO AL CONTRATISTA LA IMPORTANCIA DE PROVEER LAS BITACORAS DE LOS FRENTES DE MONTEVERDE SEDE A- CONSIDERANDO EL INICIO DE INTERVENCION EN ZONA DE CUNETAS Y DE VISTA BELLA EL DIA 9 DE MARZO DE 2026

6. COLEGIO VISTA BELLA SEDE B- MEDIANTE OFICIO EL CONSORCIO ESCOSA CE-E-259-2025 EL PASADO 13 DE MARZO REMITIO PROPUESTA PARA COMPLEMENTAR Y MODIFICAR EL ALCANCE INICIAL PARA CUARTO DE INSTRUMENTOS Y SISTEMA DE BOMBEO PARA BAÑOS. EN RESPUESTA AL COMUNICADO DE INTERVENTORIA **INT-COLEGIOSNORTE-L10-324** DONDE SE REMITE ACTA DE SOCIALIZACION REALIZADA EN ESTA SEDE Y SE REITERA LA URGENCIA DE ENVIO DE CUALQUIER MODIFICACION AL PLANTEAMIENTO INICIAL PROPUESTO DADO EL PLAZO CONTRACTUAL EN CURSO**. EL CONTRATISTA DIO INICIO A FRENTE DE OBRA CON EL MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EL DIA 9 DE MARZO DE 2026.**

7. COLEGIO UNION COLOMBIA- SEDE ENTREGADA. y. COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN SEDE A- EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2026, CON ACOMPAÑAMIENTO DEL APOYO A LA SUPERVISION SE REALIZO LA ENTREGA DE ESTE FRENTE DE OBRA CON LA ENTREGA DE MANUAL DE MANTENIMIENTO Y MEDIANTE ACTA DE RECIBIDO,.

8- COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D- MEDIANTE OFICIO INT-COLEGIOSNORTE-L10-323 LA INTERVENTORIA REITERA LAS OBRAS PENDIENTES DE FINALIZACION POR EJECUTAR PARA ESTE FRENTE CONSIDERANDO LA FECHA DE TERMINACION DEL 16 DE MARZO DE 2026.

9. COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE C Y NUEVO HORIZONTE SEDE C- LA INTERVENTORIA REMITIO AL CONSORCIO ESCOSA OFICIO INT-COLEGIOSNORTE-L10-321 MEDIANTE EL CUAL RECUERDA LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE LOS ALCANCES INICIALES Y EL INCUMPLIMIENTO A LA FECHA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA DEL COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE C ESTABA PROGRAMADA PARA EL 17 DE FEBRERO DE 2026 Y LA ENTREGA DEL NUEVO HORIZONTE SEDE C ENTREGA PROGRAMADA PARA EL 18 DE MARZO DE 2026.

10. EMERGENCIAS SILVICULTURALES - EL CONTRATISTA REALIZO TALA EL DIA 14 Y 15 DE MARZO DE 2026 SEGÚN REPORTADO EN LA SEDE SALITRE SEDE A- CONEJERA, CON LA OBSERVACION DE QUE LOS ARBOLES SE DEJARON A CIERTA ALTURA POR ESTAR ACTUALMENTE INTEGRADOS CON EL CERRAMIENTO EXISTENTE Y SU RETIRO REPRESENTA UNA LABOR DE INTERVENCION DEL MISMO.

NOTA 1. EL CONTRATISTA PRESENTO REPROGRAMACION DE FRENTES DE TRABAJO CON LOS AJUSTES REALIZADOS A LOS ALCANCES PRESUPUESTALES POR FRENTES CONFORME COMITÉ ENTRE CONTRATISTA, SED E INTERVENTORIA EL PASADO 19 DE DICIEMBRE DE 2025. Y POR TANTO PRESENTO MEDIANTE OFICIO CE-E-117-2025 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2026. ASIMISMO SE REALIZO ADICION AL CONTRATO DE CONTRATISTA CON LA INCLUSION DEL FRENTE DE TRABAJO COLEGIO UNION COLOMBIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USQUEN REALIZANDOSE MODIFICACION CONTRACTUAL DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CO1 PCCNTR 8154791-2025 DE $ 2.595.618.762 PESOS M/CTE CON VALOR ADICIONAL DE $300.000.000 PESOS M/CTE. POR CONSIGUIENTE SE REALIZO ACTUALIZACION DE POLIZAS CORRESPONDIENTES No 11-44-101124244 Y 11-44-101264244 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO. CBE MENCIONAR QUE NO SE REALIZO ADICION EN PLAZO CONTRACTUAL PARA EL CONTRATO

NOTA 2- TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICACION CONTRATUAL CON LA ADICION AL CONTRATO DE OBRA , EL CONTRATO DE INTERVENTORIA TAMBIEN REGISTRA UNA MODIFICACION CONTRACTUAL DEL VALOR TOTAL DE CONTRATO EN $37.571.611 PESOS M/CTE PARA UN VALOR TOTAL DE L CONTRATO ACTUALIZADO DE $833.850.539 PESOS M/CTE. NO SE REALIZO ADICION EN TIEMPO PARA EL CONTRATO. LA ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS DE INTERVENTORIA CON No 14-44-101243578 Y 14-44-101243578


3-COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A- LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO INT-COLEGIOSNORTE-L10-307 SOLICITO AL CONTRATISTA DIAGNOSTICO EN RELACION CON EL ESTADO DE ACOMETIDAS PARA HABILITAR LA ILUMINACION DE LA ZONA DE RECTORIA Y ADMINISTRACION, FRENTE A LO CUAL EL CONSORCIO ESCOSA ENVIO OFICIO CE-E-246-2025, EL CUAL FUE REVISADO POR INTERVENTORIA Y REMITIDAS OBSERVACIONES MEDIANTE OFICIO DE INTERVENTORIA INT-COLEGIOSNORTE-L10-326

DIRECTOR INTERVENTORIA
ELKIN SALAZAR PÉREZ


RESIDENTE INTERVENTORIA
CLAUDIA CAROLINA ROJAS GARCIA

FECHA:	16/3/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME
DIAS RESTANTES	53	Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	SEMANAL No 18 DE INTERVENTORIA
REGISTRO FOTOGRAFICO			SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	LOTE 0 4

FRENTE	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN SEDE A	INSTLACION DE REJILLAS PARA CARCAMO POSTERIOR				
COLEGIO FRIEDRICH NAUMAN SEDE A	INSTALACION DE TAPAS DESARENADOR Y CAJA DE INSPECCION				
COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D	TERMINACION DE PISO CHIP ZONA POSTERIOR				
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C	CERRAMIENTO INTERVENCION AULA 2DO DE PRIMARIA Y PREESCOLAR				

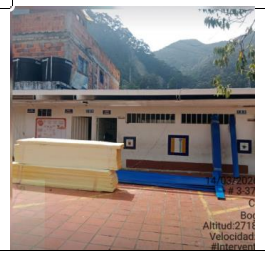COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C	**EMBALAJE Y RETIRO DE TEJA DE ADBESTO**				
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C	**DEMOLICION DE MURO EXISTENTE EN SUPERBOARD Y MURO EN MAMPOSTERIA AULA 2DO DE PRIMARIA**				
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C	**RETIRO DE PISO CHIP EXISTENTE Y TERMINACION DE INSTALACION DE TEJA CUBIERTA AULAS**				
COLEGIO VISTA BELLA SEDE A	**MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EXTERIOR PERIMETRAL**				

COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE SEDE A	**CERRAMIENTO EN LONA PARA INTERVENCION AREA POSTERIOR A CANCHA**				
COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE SEDE A	**EXCAVACIONES PARA CUNETAS ZONA POSTERIOR**				
COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE SEDE A	**CERRAMIENTO PARA AMPLIACION DE CARCAMO EXISTENTE Y DEMOLICIONES PARA CAJA NUEVA**				
COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE C	**INSTALACION DE CANAL DE ALL**				

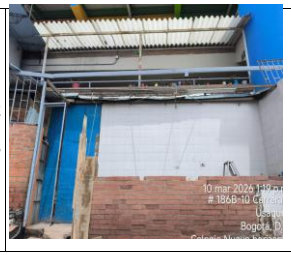COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	**DEMOLICIONES Y RETIRO DE PISO HACIA ZONA DE CULATA E IMPERMEABILIZACION**				
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	**ENCOROCE-PAÑETE - ESTUCO Y PINTURA ZONA ADMINISTRACION Y RECTORIA**				
COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C	**PAÑETES ZONA DE SERVICIOS Y DADOS PARA ESTRUCTURA CUBIERTA Y BAÑO AULA DE DEPORTES**				
COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C	**DESMONTE CUBIERTA Y VENTANA DE ZONA DE SERVICIOS Y DEMOLICION MURO PARA PUERTA DE ACCESO ESCALERA DE DEPORTES**				

EMERGENCIAS SILVICULTURALES	**COLEGIO SALITRE SEDE A**			
