ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03

ABRIL DE 2026

<table>
<tr><th colspan="3">INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo de contrato: CTO DE OBRA 752-2025</td><td rowspan="2">Adición:</td><td>Dinero: $ 254.437.025,00</td></tr>
<tr><td>Tiempo: 7 meses</td></tr>
<tr><td>Contratista: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN</td><td colspan="2">C.C./NIT: 10.284.343</td></tr>
<tr><td>OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.</td><td colspan="2">VIGENCIA:
Desde: 17 de septiembre de 2025
Hasta: 12 de agosto de 2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">VALOR: El valor del presente contrato es la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($982.508.292)
M/CTE incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, los cuales serán a cargo del contratista.

FORMA DE PAGO: El Municipio de Villamaría Caldas, pagará al contratista de la siguiente manera:
Un Anticipo equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato. EI Contratista presentara una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre él.

Cuotas parciales hasta completar el 100% del valor del contrato, los cuales se cancelarán a la previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, debe de acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. Este último en caso de que aplique.

El contratista deberá acreditar encontrarse al día en los pagos a la seguridad social integral, conforme lo exige la Ley, por la naturaleza jurídica el contratista presenta el certificado de cumplimiento en consideración al artículo 50 ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003.
MODIFICACIONES AL CONTRATO

OTRO SI N ° 1

PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de URGENCIA MANIFIESTA N° 752-2025 de la siguiente manera:
Que la Cláusula SEXTA quedara así:</td></tr>
</table>

CLÁUSULA SEXTA – EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución será desde la firma del acta de inicio hasta el quince (15) de marzo de 2026

OTRO SI N° 2

PRIMERA: SUSPENDER de común acuerdo el término de ejecución del contrato URGENCIA MANIFIESTA N° 752-2025, por un periodo de DOS (02) MESES, contados a partir de la firma del documento.

OTRO SI N° 3

PRIMERA: LEVANTAR de común acuerdo y con efectos inmediatos la suspensión temporal de la ejecución del contrato
URGENCIA MANIFIESTA N° 752-2025 pactada en el OTRO SI N° 2.
Que la cláusula sexta quedará así:

CLÁUSULA SEXTA – EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución será desde la firma del acta de reinicio, es decir, desde el veinticuatro (24) de febrero de 2026 hasta el doce (12) de abril de 2026.

OTRO SI N° 4

PRIMERA: ADICIONAR el valor anteriormente mencionado al OTROSÍ No 4 CONTRATO No 752-2025 URGENCIA MANIFIESTA:
La Cláusula CUARTA quedará así:
CLAUSULA CUARTA: VALOR: El valor estimado del contrato asciende a la suma de: **UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE (1.236.945.317) M/CTE**. Los cuales se cancelarán de la siguiente manera: Actas parciales, conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informes de actividades avaladas por el supervisor. Para el pago cada contratista deberá aportar: a) Copia de los comprobantes de pago y panilla de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y riegos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. b) Informe de actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro.

La Cláusula SEXTA quedará así:
CLAUSULA SEXTA - EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del contrato será desde el cumplimiento d e los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir, desde la firma del acta de inicio, es
decir, desde el trece (13) de abril de 2026 y hasta por cuatro (04) meses calendario.

RUBRO: 2.3.2.02.02.005-2.3.2.02.02.009	**CDP:** 971-1151 / 2025	**RP: 1962/2025**
	CDP: 502-529 /2026	**RP:782-1179/2026**

Valor a pagar según acta: $216.312.252,00	**Valor desembolsos efectuados:** $ 823.870.750,00

INFORMACIÓN PARA REPORTAR

JORGE ELIÉCER BUITRAGO URIBE, Secretario de infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el precitado contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo comprendido durante los meses de Enero a Abril de 2026, actividades que han sido verificadas y supervisadas, las cuales fueron:

ACTA N°	TRES (3) PARCIAL
CONTRATO №	752-2025
OBJETO	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS."

CONTROL FÍSICO


CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA 3	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
2.1.3	OTRAS EXCAVACIONES						
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 41.517	9,84	$ 408.527	146,87	$ 6.097.602,00
2.2	RELLENOS						
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	$31.201	223,36	$ 6.969.055	17,92	$ 559.122,00
3.0	CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO						
3.1	CONCRETO SIMPLE						
3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML	$ 49.863,00	280,50	$ 13.986.572	18,00	$ 897.534,00
3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	$ 648.832,00	0,20	$ 129.766	0,20	$ 129.766,00
3.1.15.9	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f'c=4000 PSI	M3	$ 1.035.410,00	49,09	$ 50.828.277	37,56	$ 38.890.000,00
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6.679	6861,10	$ 45.825.287	1592,22	$ 10.634.437,00
4.0	CAPITULO 4 - COLECCION Y ENTREGA DE AGUAS						
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS						

4.3.1	SUMINISTRO Y COLACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS						
4.3.1.2	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 23.403,000	60,00	$ 1.404.180	24,00	$ 561.672,00
4.5	CAJA DE INSPECCIÓN						
4.5.1	TIPO I						
4.5.1.1	EN CONCRETO SIMPLE	ML	$ 253.879,000	0,00	$ -	0,70	$ 177.715,00
6.0	**CAPITULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO**						
6.1	DREN EN ZANJA						
6.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA						
6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	$ 21.481,00	90,00	$ 1.933.290	20,00	$ 429.620,00
6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO						
6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML	$ 110.232,00	148,00	$ 16.314.336	135,20	$ 14.903.366,00
6.2.2.3	ROCA	ML	$ 194.669,00	100,00	$ 19.466.900	38,00	$ 7.397.422,00
7.0	**CAPITULO 7 - ACARREOS**						
7.2	ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR						
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 28.938,00	13,00	$ 376.194	222,08	$ 6.426.551,00
8.0	**CAPITULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA**						
8.1	TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA						
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	$ 72.336,00	19,20	$ 1.388.851	8,80	$ 636.557,00
9.0	**CAPITULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
9.7	JORNALES POR ADMINISTRACIÓN						
9.7.3	OBRERO	DÍA	$ 81.668	16,00	$ 1.306.688	33,00	$ 2.695.044,00
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP-3	CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML	$ 5.239	22,00	$ 115.258	27,70	$ 145.120,00
NP-4	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	$ 148.448	12,00	$ 1.781.376	10,36	$ 1.537.921,00
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E	ML	$ 5.841	18,00	$ 105.138	31,00	$ 181.071,00

	INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO						
NP-8	Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado	ML	$ 712.401	700,00	$ 498.680.700	175,00	$ 124.670.175,00
NP-9	TUBERÍA PVC NOVAFORT DIÁMETRO DE 315 mm - 12.4"	ML	$ 168.943	54,00	$ 9.122.922	30,00	$ 5.068.290,00
NP-10	CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	$ 561.106	2,80	$ 1.571.097	2,10	$ 1.178.323,00
NP-11	CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	$ 501.222	1,20	$ 601.466	1,30	$ 651.589,00
NP-12	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	$ 522.087	4,00	$ 2.088.348	3,00	$ 1.566.261,00
NP-13	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	$ 155.387	4,00	$ 621.548	3,00	$ 466.161,00
NP-14	ESTRIBOS L=0.95M	UN	$ 83.731	8,00	$ 669.848	4,00	$ 334.924,00
NP-15	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	M2	$ 85.669	212,00	$ 18.161.769	143,98	$ 12.334.582,00
					TOTAL COSTO DIRECTO		$ 238.570.825,00
					ADMINISTRACIÓN 30%		$ 71.571.248,00
					UTILIDAD 5%		$ 11.928.541,00
					TOTAL INCLUIDO AU		$ 322.070.614,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TABLA OBTENIDA SEGÚN BITÁCORA DE OBRA, INFORME EJECUTIVO Y VISITA DE OBRA.

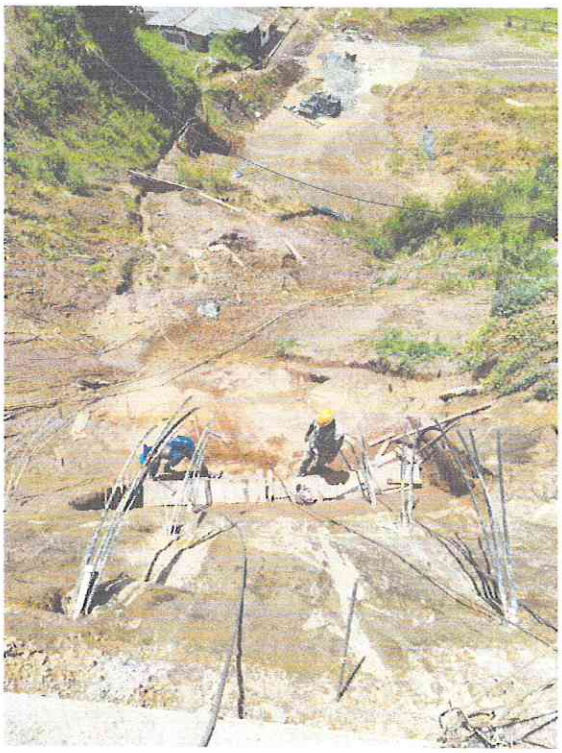Registro Fotográfico	Descripción Actividades.
	1. Excavación en conglomerado



2. Relleno alrededor de estructuras



3. Lechada de inyección relación a/c=0,45 con bomba 70 psi (incluye aditivo expansor y plastificante)



4. Concreto para solado de limpieza



5. Dados en concreto para anclaje f'c=4000 psi

	6. Acero de refuerzo
	7. Suministro y colación tuberías pvc aguas lluvias diámetro de 3”



8. Dren en zanja conglomerado




9. Caja de inspección tipo 1 en concreto simple



10. Suministro y colación tuberías pvc aguas lluvias ø 3" all perforada para drenes



11. Perforación en roca para anclajes pasivos

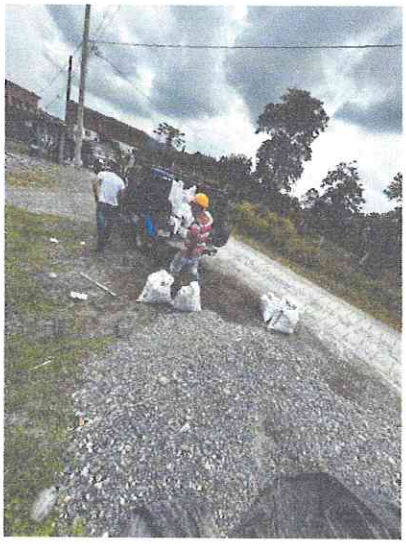	12. Buggi fuerte pendiente
	13. Trinchos en guadua o madera rolliza con alambre y horcón sencillo



14. Jornales por administración obrero



15. Corte pavimento de concreto con disco (2.5cm de profundidad)

	16. Demolición mecánica de pavimento en concreto hidráulico. incluye retiro y disposición en sitio autorizado
	17. Suministro, transporte e instalación cordón para control de aguas lluvias con suelo cemento



18. Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección a/c, fraguado y postensado.



19. Tubería pvc novafort diámetro de 315 mm - 12.4"



20. Cilindro cámara de inspección y de caída d=1.20 metros




21. Cono cámara de inspección y de caída d=1.20 metros



22. Bases y cañuelas cámara de inspección y de caída d=1.20 metros



23. Tapa para cámaras de inspección y de caída d=1.20 metros

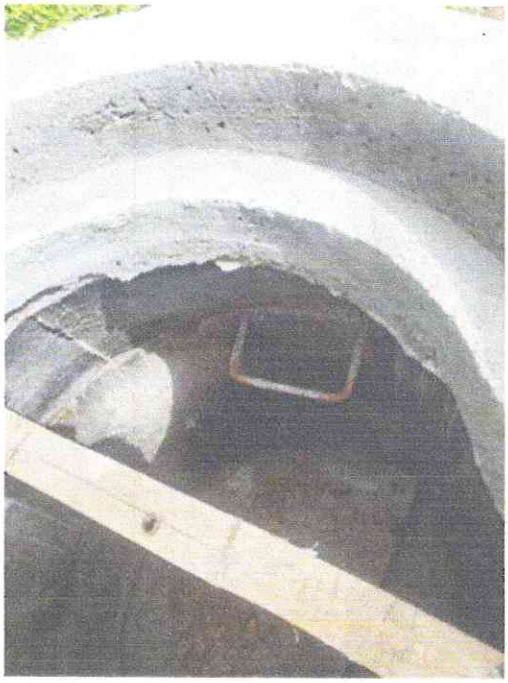

24. Estribos l=0.95m



25. Acequia en geomembrana

Como se puede evidenciar en las actividades anteriormente descritas se ha realizado un control del personal y documental. Dicha información se ha revisado con los registros físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención.

De igual manera el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales de octubre y noviembre en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS

CONTROL FINANCIERO				
RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	S 982.508.292,00	VALOR ANTICIPO		S 393.003.317,00
VALOR ACTAS ANTERIORES	S 718.112.388,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		S 287.244.955,00
VALOR PRESENTE ACTA	S 322.070.614,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	100%	S 105.758.362,00
SALDO POR EJECUTAR	S 196.762.315,00	SALDO POR AMORTIZAR	0%	S 0,00
VALOR ADICIONES	S 254.437.025,00			
SUMAS IGUALES	S 1.236.945.317,00	SUMAS IGUALES	100%	S 393.003.317,00

VALOR PRESENTE ACTA	S 322.070.614,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	S 105.758.362,00
VALOR A PAGAR	S 216.312.252,00

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago Parcial No. **TRES** (03) del **CONTRATO N.º 752-2025**

FIRMA:

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: Informe ejecución con sus respectivos anexos, planilla de aportes a la seguridad social integral del mes de Enero a Abril de 2026, registro fotográfico, actas y pre actas de obra, informe de avance de obra.

JORGE CASTILLO
INGENIERO CIVIL

Villamaría, 30 de abril de 2026

Señor
Ing. Jorge Buitrago
secretaria de infraestructura y vías

Cordial saludo

Por medio de la presente, realizo entrega del Acta Parcial No. 3 del contrato de obra No. 752-2025 URGENCIA MANIFIESTA, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.". Para lo cual adjunto los siguientes documentos:

- Factura de venta
- Certificado bancario
- Registro único tributario (RUT)
- Acta de obra
- Pre-actas de obra
- Informe técnico de avance de obra
- Informe SST
- Certificado de Paz y Salvo de Pago de Parafiscales
- Cedula, tarjeta profesional y certificado de antecedentes del contador que realiza el certificado anterior.
- Planillas de pago del personal administrativo y operativo

Gracias por su atención y diligencia.

Atentamente

Jorge Eduardo Castillo Marín
CONTRATISTA

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN Identificado con CC 10284343

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA SANTANDER, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24149383505
Fecha de apertura:	23 de Septiembre de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a CUALQUIER, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 23 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14704025042

(415)7707212489984(8020) 000001470402504 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 8 4 3 4 3	6	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 8 4 3 4 3	1 9 8 7 0 7 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTILLO	MARIN	JORGE	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
AV BERNARDO ARANGO 7 B 140 CA A 3 CONJ ACUARELA DE CAMPOHERMOSO

42. Correo electrónico joedcama8@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 8 7 8 0 4 6	3 2 3 5 8 7 1 9 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 2 0 1 0 2	4 2 2 0	2 0 0 2 0 1 0 2	4 2 1 0		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 2 2 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 24 / 15 : 04: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6def0c7ec9f7e8a032e657fe99f6b562d7783fb724444bb99210c85f9c45a017c5d0e1bd43cc78e3b8b06b6ba4a5c2d4

Número de Factura: FVEL-21
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 15/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido: 28
Fecha de orden de pedido: 30/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO
Nombre Comercial: CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO
Nit del Emisor: 10284343
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: AV BERNARDO ARANGO 7 B 140 CA A 3 CONJ ACUARELA DE CAMPOHERMOSO
Teléfono / Móvil: 6068878046
Correo: joedcama8@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE VILLAMARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801152
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: CL 9 CR 4 ESQ
Teléfono / Móvil: 3117628544
Correo: tesoreria@villamaria-caldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	COSTO DIRECTO	M4	1,00	$ 238.570.825,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 238.570.825,00
2	02	ADMINISTRACION	M4	1,00	$ 71.571.248,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.571.248,00
3	03	UTILIDAD	M4	1,00	$ 11.928.541,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.928.541,00

Notas Finales

Acta de obra No 3
Linea de negocio: OBRA LOS CUERVOS

Datos Totales



Documento generado el:
07/05/2026 09:45:31
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 09:45:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	322070614
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	322070614
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	322070614
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 322070614

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	322.070.614,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	322.070.614,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	322.070.614,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$322.070.614,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082957301 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-06

ACTA N°	3
FECHA	30/04/2026
CONTRATO №	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DIAS)	3 MESES
VALOR	$ 882.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	CAPITULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES														
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA														
1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4.439,00	1200,00	$ 5.326.800		1200,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
1.3	CERRAMIENTO														
1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML	$ 3.887,00	40,00	$ 155.480		5,00	0,00	35,00	$ 136.045		$ -	35,00	$ 136.045,00	100,00%
1.5	CAMPAMENTO DE 9M2 ESTERILLA, TEJA DE ZINC Y PISO	UN	$ 1.326.722,00	1,00	$ 1.326.722		0,00	0,00	1,00	$ 1.326.722		$ -	0,00	$ -	0,00%
2	CAPITULO 2 - EXCAVACIONES														
2.1	EXCAVACIONES														
2.1.1	EN ZANJA														
2.1.1.1	HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD														
2.1.1.1.2	TIERRA HUMEDA	M3	$ 35.496,00	16,40	$ 582.134		14,72	0,00	1,68	$ 59.633		$ -	1,68	$ 59.633,00	100,00%
2.1.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA														
2.1.2.2.1	TIERRA	M3	$ 8.948	164,10	$ 1.468.367		164,10	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	100,00%
2.1.2.3	PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL														
2.1.2.3.1	TIERRA	M3	$ 33.131	112,00	$ 3.710.672		0,00	221,17	333,17	$ 11.038.255		$ -	97,50	$ 3.230.273,00	29,26%
2.1.3.	OTRAS EXCAVACIONES														
2.1.3.1	TIERRA	M3	$ 37.691	8,10	$ 305.297		0,00	18,06	26,16	$ 985.997		$ -	5,00	$ 188.455,00	19,11%
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 41.517	34,70	$ 1.440.640		24,86	0,00	9,84	$ 408.527	146,87	$ 6.097.602,00	175,09	$ 7.269.212,00	1779,37%
2.2	RELLENOS														
2.2.1.	EN ZANJA	M3	$ 23.665	9,60	$ 227.184		9,60	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	$ 31.201	38,40	$ 1.198.118		0,00	184,96	223,36	$ 6.969.055	17,92	$ 559.122,00	276,97	$ 8.704.143,00	124,90%
2.4	EXCAVACION DE PILOTES Y CAISSONS														
2.4.8	PERFORACIÓN MECÁNICA PARA PILOTES EN TIERRA O CONGLOMERADO D=0.35M A UNA PROFUNDIDAD DE 0-15M	ML	$ 85.055	35,00	$ 2.976.925		0,00	0,00	35,00	$ 2.976.925		$ -	35,00	$ 2.976.925,00	100,00%
3	CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO														
3.1	CONCRETO SIMPLE														
3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML	$ 49.863,00	238,00	$ 11.867.394		0,00	42,50	280,50	$ 13.986.572	18,00	$ 897.534,00	18,00	$ 897.534,00	6,42%
3.1.4.	PAVIMENTOS														
3.1.5.	SARDINELES														
3.1.6.	PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3	$ 911.356,00	1,30	$ 1.184.763		0,00	0,70	2,00	$ 1.822.712		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.7.	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3	$ 903.021,00	11,00	$ 9.933.231		0,00	6,08	17,08	$ 15.423.599		$ -	17,08	$ 15.423.599,00	100,00%
3.1.8.	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	$ 648.832,00	18,40	$ 11.938.509		18,20	0,00	0,20	$ 129.766	0,20	$ 129.766,00	0,37	$ 240.068,00	185,00%
3.1.12	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA	M3	$ 1.116.814,00	17,30	$ 19.320.692		17,30	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.15	PANTALLAS														
3.1.15.2	PASIVAS e=15CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 144.526,00	50,00	$ 7.226.300		0,00	20,00	70,00	$ 10.116.820		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.15.5	ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" DE 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA	ML	$ 433.314,00	1000,00	$ 433.314.000		875,00	0,00	125,00	$ 54.164.250		$ -	125,00	$ 54.164.250,00	100,00%

ACTA N°	3
FECHA	30/04/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1359 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DIAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.608.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
3.1.15.9	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f'c=4000 PSI	M3	$ 1.035.410,00	33,50	$ 34.688.235		0,00	15,59	49,09	$ 50.828.277	37,56	$ 38.890.000,00	60,53	$ 62.673.367,00	123,30%
3.1.16	CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS														
3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3	$ 1.069.556,00	5,00	$ 5.347.780		5,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.16.5	CAÑUELA EN CONCRETO PARA DRENES	ML	$ 12.962,00	9,00	$ 116.658		0,00	0,00	9,00	$ 116.658		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.17	CIMENTACIONES														
3.1.17.1	CONCRETO CLASE II PARA PILOTES D=0,35M	ML	$ 89.585,00	35,00	$ 3.135.475		0,00	0,00	35,00	$ 3.135.475		$ -	35,00	$ 3.135.475,00	100,00%
3.1.17.5	CONCRETO CLASE II PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	$ 837.305,00	1,10	$ 921.036		0,00	0,06	1,16	$ 971.274		$ -	1,16	$ 971.274,00	100,00%
3.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN														
3.2.1	SELLO PVC DE 0,10M	ML	$ 32.025,00	13,20	$ 422.730		13,20	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.3	INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS														
3.3.2	D131 (15x15 da 5.0 mm)	M2	$ 14.749,00	167,50	$ 2.470.458		27,50	0,00	140,00	$ 2.064.650		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO														
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6.679,00	5813,90	$ 38.831.038		0,00	1047,20	6681,10	$ 45.825.287	1592,22	$ 10.634.437,00	6499,32	$ 43.408.958,00	94,73%
3.7	JUNTAS PARA PAVIMENTO														
3.7.1	CORTE ANDÉN DE CONCRETO CON DISCO (2.5 cm de profundidad)	ML	$ 3.732,00	18,00	$ 67.176		18,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
4.0	CAPITULO 4 - COLECCION Y ENTREGA DE AGUAS														
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS														
4.3.1	SUMINISTRO Y COLACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS														
4.3.1.1	DIÁMETRO DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 18.279,000	2,0	$ 36.558		2,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
4.3.1.2	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 23.403,000	62,50	$ 1.462.688		2,50	0,00	60,00	$ 1.404.180	24,00	$ 561.672,00	24,00	$ 561.672,00	40,00%
4.5	CAJA DE INSPECCIÓN														
4.5.1	TIPO I														
4.5.1.1	EN CONCRETO SIMPLE	ML	$ 253.879,000	0,30	$ 76.164		0,30	0,00	0,00	$ -	0,70	$ 177.715,00	0,70	$ 177.715,00	0,00%
5.0	CAPITULO 5 - GAVIONES														
5.1	GAVIONES CON MALLA TIPO INVIAS DE TRIPLE TORSIÓN														
5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	M3	$ 302.661,00	240,00	$ 72.638.640		49,00	0,00	191,00	$ 57.808.251		$ -	190,20	$ 57.566.122,00	99,58%
5.1.6	CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IN SITU	M3	$ 461.031,00	40,00	$ 18.441.240		13,80	0,00	53,80	$ 24.803.468		$ -	53,80	$ 24.803.468,00	100,00%
6.0	CAPITULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO					391873,00									
6.1	DREN EN ZANJA														
6.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA														
6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	$ 21.481,00	180,0	$ 3.866.580		90,00	0,00	90,00	$ 1.933.200	20,00	$ 429.620,00	20,00	$ 429.620,00	22,22%
6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO														
6.2.2.1	TIERRA	ML	$ 51.333,00	210,40	$ 10.800.463		62,40	0,00	148,00	$ 7.597.284		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML	$ 110.232,00	168,30	$ 18.552.046		20,30	0,00	148,00	$ 16.314.336	135,20	$ 14.903.366,00	135,20	$ 14.903.366,00	91,35%
6.2.2.3	ROCA	ML	$ 194.669,00	42,10	$ 8.195.565		0,00	57,90	100,00	$ 19.466.900	38,00	$ 7.397.422,00	38,00	$ 7.397.422,00	38,00%
6.3	SUMINISTRO Y COLACIÓN DE GEOTEXTILES														
6.3.1	NT-1600	M2	$ 5.093,00	140,00	$ 712.460		42,40	0,00	97,60	$ 496.696		$ -	142,20	$ 723.656,00	145,70%
7.0	CAPITULO 7 - ACARREOS														
7.1	SOBREACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR														

ACTA N°	3
FECHA	30/04/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.608.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 284.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3	$ 53.023,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1.2	VOLQUETA CARGUE MECÁNICO	M3	$ 39.037,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1.3	JEEP O CAMIONETA HASTA 3KM	VJ	$ 53.229,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.2	ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR														
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 28.938,00	0,00	$ -		0,00	13,00	13,00	$ 376.194	222,08	$ 6.426.551,00	222,08	$ 6.426.551,00	1708,31%
7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 120.576,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.2.3	EN BESTIA FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 24.135,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL-14	ML	$ 446.363,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00%
8.0	CAPITULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA														
8.1	TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA														
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	$ 72.336,00	112,00	$ 8.101.632		92,80	0,00	19,20	$ 1.388.851	8,60	$ 636.557,00	28,00	$ 2.025.408,00	145,83%
8.3	PODA Y ERRADICACIÓN DE ARBOLES														
8.3.1	ESTABLECIMIENTO DE RASTROJOS	M2	$ 7.670,00	192,00	$ 1.472.640		0,00	8,00	200,00	$ 1.534.000		$ -	0,00	$ -	0,00%
9.0	CAPITULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS														
9.1	BARANDA TUBULAR EN POSTE GALVANIZADO D=2", TRES BARRAS HORIZONTALES CADA 0,33 M														
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	$ 5.166	300,00	$ 1.549.800		120,00	0,00	180,00	$ 929.880		$ -	216,00	$ 1.115.856,00	120,00%
9.7	JORNALES POR ADMINISTRACIÓN														
9.7.3	OBRERO	DÍA	$ 61.668	10,00	$ 616.680		0,00	6,00	16,00	$ 1.306.688	33,00	$ 2.695.044,00	33,00	$ 2.695.044,00	206,25%
	ITEMS NO PREVISTOS													$ -	
NP-1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4.439	374,39	$ 1.661.907		0,00	0,00	374,39	$ 1.661.907		$ -	551,00	$ 2.445.889,00	147,17%
NP-2	EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA	M3	$ 8.948	1335,00	$ 11.945.580		0,00	0,00	1335,00	$ 11.945.580		$ -	2110,84	$ 18.887.796,00	158,12%
NP-3	CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML	$ 5.239	22,00	$ 115.258		0,00	0,00	22,00	$ 115.258	27,70	$ 145.120,00	27,70	$ 145.120,00	125,91%
NP-4	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	$ 148.448	12,00	$ 1.781.376		0,00	0,00	12,00	$ 1.781.376	10,36	$ 1.537.921,00	10,36	$ 1.537.921,00	86,33%
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	$ 5.841	18,00	$ 105.138		0,00	0,00	18,00	$ 105.138	31,00	$ 181.071,00	49,00	$ 286.209,00	272,22%
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2	$ 12.260	30,00	$ 367.800		0,00	0,00	30,00	$ 367.800		$ -	30,00	$ 367.800,00	100,00%
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL:14	ML	$ 446.363	12,00	$ 5.356.356		0,00	0,00	12,00	$ 5.356.356		$ -	14,00	$ 6.249.082,00	116,67%
NP-8	Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado	ML	$ 712.401	700,00	$ 498.680.700		0,00	0,00	700,00	$ 498.680.700	175,00	$ 124.670.175,00	550,00	$ 391.820.550,00	78,57%

ACTA Nº	3
FECHA	30/04/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-9	TUBERÍA PVC NOVAFORT DIÁMETRO DE 315 mm - 12.4"	ML	$ 168.943	54,00	$ 9.122.922		0,00	0,00	54,00	$ 9.122.922	30,00	$ 5.068.290,00	30,00	$ 5.068.290,00	55,56%
NP-10	CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	$ 561.106	2,80	$ 1.571.097		0,00	0,00	2,80	$ 1.571.097	2,10	$ 1.178.323,00	2,10	$ 1.178.323,00	75,00%
NP-11	CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	$ 501.222	1,20	$ 601.466		0,00	0,00	1,20	$ 601.466	1,30	$ 651.589,00	1,30	$ 651.589,00	108,33%
NP-12	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	$ 522.087	4,00	$ 2.088.348		0,00	0,00	4,00	$ 2.088.348	3,00	$ 1.566.261,00	3,00	$ 1.566.261,00	75,00%
NP-13	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCION Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	$ 155.387	4,00	$ 621.548		0,00	0,00	4,00	$ 621.548	3,00	$ 466.161,00	3,00	$ 466.161,00	75,00%
NP-14	ESTRIBOS L=0.95M	UN	$ 83.731	8,00	$ 669.848		0,00	0,00	8,00	$ 669.848	4,00	$ 334.924,00	4,00	$ 334.924,00	50,00%
NP-15	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	M2	$ 85.669	212,00	$ 18.161.769		0,00	0,00	212,00	$ 18.161.769	143,98	$ 12.334.582,00	143,98	$ 12.334.582,00	67,92%
NP-16	ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO 1/2 x 8"	UN	$ 26.970	13,00	$ 350.610		0,00	0,00	13,00	$ 350.610		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-17	SARDINELES TIPO A	ML	$ 77.767	30,00	$ 2.333.021		0,00	0,00	30,00	$ 2.333.021		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-18	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACIÓN: CONCRETO 50%, PIEDRA 50%	M3	617.602,15	0,80	$ 494.242		0,00	0,00	0,80	$ 494.242		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	M2-MES	27.344,00				0,00	108,00	108,00	$ 2.953.152		$ -	72,00	$ 1.968.768,00	66,67%
NP	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	236.009,00				0,00	2,00	2,00	$ 472.018		$ -	2,00	$ 472.018,00	100,00%
NP	COMISIÓN TOPOGRÁFICA	DÍA	692.001,00				0,00	3,00	3,00	$ 2.076.003		$ -	3,00	$ 2.076.003,00	100,00%
NP	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	34.353,00				0,00	10,00	10,00	$ 343.530		$ -	10,00	$ 343.530,00	100,00%
												$ -			
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.302.254.146,00					$ 919.720.408,00		$ 238.570.825,00		$ 770.505.927,00	
				Administración 30%	$ 390.676.244,00					$ 275.916.122,00		$ 71.571.248,00		$ 231.151.778,00	
				Imprevistos 0%	-					-		-		-	84,09%
				Utilidad 5%	$ 65.112.707,00					$ 45.986.020,00		$ 11.928.541,00		$ 38.525.296,00	
				TOTAL	$ 1.758.043.097,00					$ 1.241.622.548,00		$ 322.070.614,00		$ 1.040.183.001,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 982.508.292,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 718.112.388,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 322.070.614,00
SALDO POR EJECUTAR		-$ 57.674.710,00
VALOR ADICIONES	$ 254.437.025,00	$ 254.437.025,00
SUMAS IGUALES	$ 1.236.945.317,00	$ 1.236.945.317,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 287.244.955,00
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 105.758.362,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 393.003.317,00	$ 393.003.317,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 322.070.614,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 105.758.362,00		
VALOR A PAGAR	$ 216.312.252,00		

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
NIT/CC : 10.284.343
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO
NIT/CC 75.071.884
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: JONIER ALEJANDRO RAMÍREZ ZULUAGA
NIT/CC : 75.106.622 DE MANIZALES
ALCALDE MUNICIPAL
VoBo. ORDENADOR DEL GASTO

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**2.1.3.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CONGLOMERADO	**M3**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
DADOS	17,00	2,10	2,10	0,40	29,99	29,99
PERFILADO PANTALLA PASIVA		10,15	6,00	1,00	30,45	60,44
EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE ACEQUIA TRAMO 4		21,60	1,00	0,55	11,88	72,32
EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE ACEQUIA TRAMO 3		41,00	1,40	0,55	31,57	103,89
EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE ACEQUIA TRAMO 2		21,00	1,00	0,55	11,55	115,44
HOMBROS ACEQUIA		167,20	0,20	0,10	3,34	118,78
REEXCAVACION PANTALLA PASIVA		10,15	4,00	0,50	10,15	128,93
REEXCAVACION TALUD CONTIGUO A PANTALLA PASIVA		5,20	3,00	2,30	17,94	146,87
					0,00	146,87
					TOTAL	**146,87**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	2.2.2
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3
FECHA	30/04/2026	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
TRAMO 1 TUBERIA		12,00	0,50	0,83	4,97	4,97
TRAMO 2 TUBERIA		18,00	0,50	0,70	6,26	11,23
HOMBROS ACEQUIA		167,20	0,20	0,20	6,69	17,92
					0,00	17,92
					0,00	17,92
					0,00	17,92
					0,00	17,92
				TOTAL	17,92	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	3.1.3.4
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML
FECHA	30/04/2026	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
PANTALLA PASIVA ANCLAJES 3,00 M	2,00	3,00			6,00	6,00
PANTALLA PASIVA ANCAJES 6,00 M	2,00	6,00			12,00	18,00
					0,00	18,00
					0,00	18,00
					0,00	18,00
					0,00	18,00
					0,00	18,00
					0,00	18,00
				TOTAL		18,00



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	3.1.8
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3
FECHA	30/04/2026	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LADO	DIÁMETRO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CAMARA 1			1,50	0,05	0,09	0,09
CAMARA 2			1,50	0,05	0,09	0,18
CAJA 3		0,60		0,05	0,02	0,20
					0,00	0,20
					0,00	0,20
					0,00	0,20
					TOTAL	**0,20**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRA	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	NÚMERO DEL ITEM
OBJETO DEL CONTRAT	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	3.1.15.9
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f'c=4000 PSI	M3
FECHA	30/04/2026	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
DADOS SUPERIORES	17,00	2,00	2,00	0,35	23,80	23,80
DADOS INFERIORES	17,00	0,45	0,45	0,18	0,60	24,40
COBERTOR PLATINAS	33,00	0,30	0,30	0,20	0,59	24,99
LLENO CARCAVAS	4,00	2,00	2,00	0,50	12,57	37,56
					0,00	37,56
					0,00	37,56
					0,00	37,56
					0,00	37,56
				TOTAL		37,56



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	3.4.1
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ACERO DE REFUERZO	**KG**

FECHA 30/04/2026

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	PESO	TOTAL	ACUM.
DADOS INFERIORES		134,40	8,00	1,00	1.075,20	1.075,20
DADOS SUPERIORES		23,35	8,00	1,00	186,80	1.262,00
BASTONES ATRAQUE		16,00	8,00	1,00	128,00	1.390,00
BURROS		5,04	8,00	0,56	22,58	1.412,58
ESPIRAL DADOS		5,83	8,00	1,00	46,64	1.459,22
BASTONES PARRILLA INTERMEDIA		2,80	8,00	1,00	22,40	1.481,62
VARILLA ANCLAJES PASIVOS 3,00 M		3,00	2,00	2,24	13,41	1.495,03
VARILLA ANCLAJES PASIVOS 6,00 M		6,00	2,00	2,24	26,88	1.521,91
ARAÑA ANCLAJES PASIVOS		4,50	4,00	1,00	18,00	1.539,91
REFUERZO LONGITUDINAL SARDINEL		19,90	1,00	0,56	11,14	1.551,05
REFUERZO TRANSVERSAL SARDINEL		0,70	67,67	0,56	26,53	1.577,58
HAZAS DE TAPAS		0,69	5,00	1,55	5,35	1.582,93
TAPAS CAJAS		2,58	1,00	0,56	1,44	1.584,37
TAPAS CAMARAS		7,01	2,00	0,56	7,85	1.592,22
					TOTAL	**1592,22**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de Infraestructura y Vías

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**4.3.1.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	**ML**

FECHA 30/04/2026

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	DIÁMETRO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL TALUD	4,00	6,00			24,00	24,00
					0,00	24,00
					0,00	24,00
					0,00	24,00
					0,00	24,00
					0,00	24,00
					0,00	24,00
					TOTAL	**24,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	4.5.1.1
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	EN CONCRETO SIMPLE	**ML**

FECHA 30/04/2026

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CAJA 3		0,70			0,70	0,70
					0,00	0,70
					0,00	0,70
					0,00	0,70
					0,00	0,70
					0,00	0,70
					TOTAL	0,70



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**6.1.2.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	**ML**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
DREN 1		20,00			20,00	20,00
DREN 2		20,00				20,00
DREN 3		20,00				20,00
DREN 4		20,00				20,00
					0,00	20,00
					0,00	20,00
					0,00	20,00
					TOTAL	**20,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**6.2.2.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CONGLOMERADO	**ML**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
TRAMO 4: ENROCADO SECCIÓN PRELIMINAR		21,60			21,60	21,60
TRAMO 4: ENROCADO SECCIÓN MODIFICADA		21,60			21,60	43,20
TRAMO 3: ACEQUIA COLECTORA LATERAL		41,00			41,00	84,20
TRAMO TUBERIA		30,00			30,00	114,20
TRAMO 2: ACEQUIA GAVIONES		21,00			21,00	135,20
					0,00	135,20
					0,00	135,20
					TOTAL	**135,20**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**6.2.2.3**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ROCA	**ML**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
PERFORACION ANCLAJES PASIVOS 3,00 M	2,00	3,00			6,00	6,00
DRENES	1,00	20,00			20,00	26,00
PERFORACION ANCLAJES PASIVOS 6,00 M	2,00	6,00			12,00	38,00
					0,00	38,00
					0,00	38,00
					0,00	38,00
					0,00	38,00
					0,00	38,00
					TOTAL	**38,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**7.2.1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	BUGGI FUERTE PENDIENTE	**M3-HM**

FECHA 30/04/2026

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CUBICAJE	HECTOMETROS	PESO	TOTAL	ACUM.
ACARREO HASTA EL TALUD DADOS		111,04	2,00		222,08	222,08
					0,00	222,08
					0,00	222,08
					0,00	222,08
					0,00	222,08
					0,00	222,08
				TOTAL	**222,08**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**8.1.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	**M2**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
TRINCHO TALUD		8,80	1,00		8,80	8,80
					0,00	8,80
					0,00	8,80
					0,00	8,80
					0,00	8,80
					0,00	8,80
					0,00	8,80
					0,00	8,80
					TOTAL	**8,80**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**9.7.3**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	OBRERO	**DÍA**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	PESO	TOTAL	ACUM.
COBERTOR PLATINA		16,50			16,50	16,50
ACARRERO ACERO		16,50			16,50	33,00
					0,00	33,00
					0,00	33,00
					0,00	33,00
					0,00	33,00
				TOTAL	**33,00**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-3**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	**ML**
FECHA		

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
DEMOLICIÓN VIGA CONTIGUA A CANCHA		7,80			7,80	7,80
DEMOLICIÓN VÍA		19,90			19,90	27,70
					0,00	27,70
					0,00	27,70
					0,00	27,70
					0,00	27,70
					TOTAL	**27,70**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VIAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-4**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	**M3**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
VIA		17,00	1,45	0,40	9,86	9,86
VIGA CONTIGUA A CANCHA		14,60	0,20	0,17	0,50	10,36
					0,00	10,36
					0,00	10,36
					0,00	10,36
					0,00	10,36
					0,00	10,36
					0,00	10,36
					TOTAL	**10,36**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-5**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	**ML**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
VIA		31,00			31,00	31,00
					0,00	31,00
					0,00	31,00
					0,00	31,00
					0,00	31,00
					0,00	31,00
					0,00	31,00
					0,00	31,00
					TOTAL	**31,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-8**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado	**ML**

FECHA 30/04/2026

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
TALUD FRENTE IZQUIERDO	ml	175,00	1,00	1,00	175,00	175,00
					0,00	175,00
					0,00	175,00
					0,00	175,00
					0,00	175,00
					0,00	175,00
					0,00	175,00
					0,00	175,00
					TOTAL	175,00



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-9**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	TUBERÍA PVC NOVAFORT DIÁMETRO DE 315 mm - 12.4"	**ML**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
TRAMO 1: CAJA 3 - CAMARA 1		12,00			12,00	12,00
TRAMO 2: CAMARA 1 - CAMARA 2		18,00			18,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					TOTAL	**30,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-10**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	**ML**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CÁMARA 1		1,30			1,30	1,30
CÁMARA 2		0,80			0,80	2,10
					0,00	2,10
					0,00	2,10
					0,00	2,10
					0,00	2,10
					0,00	2,10
					0,00	2,10
					TOTAL	**2,10**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-11**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	**ML**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CÁMARA 1		0,65			0,65	0,65
CÁMARA 2		0,65			0,65	1,30
					0,00	1,30
					0,00	1,30
					0,00	1,30
					0,00	1,30
					0,00	1,30
					0,00	1,30
					TOTAL	**1,30**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-12**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	**UN**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CAJA 3		1,00			1,00	1,00
CÁMARA 1		1,00			1,00	2,00
CÁMARA 2		1,00			1,00	3,00
					0,00	3,00
					0,00	3,00
					0,00	3,00
					TOTAL	**3,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-13**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	**UN**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CAJA 3		1,00			1,00	1,00
CÁMARA 1		1,00			1,00	2,00
CÁMARA 2		1,00			1,00	3,00
					0,00	3,00
					0,00	3,00
					0,00	3,00
					TOTAL	**3,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-14**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ESTRIBOS L=0.95M	**UN**

FECHA 30/04/2026

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CÁMARA 1		2,00			2,00	2,00
CÁMARA 2		2,00			2,00	4,00
					0,00	4,00
					0,00	4,00
					0,00	4,00
					TOTAL	**4,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**ACEQUIA EN GEOMEMBRANA**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	**M2**
FECHA	**30/04/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
TRAMO 4: ENROCADO		21,60	2,30		49,68	49,68
TRAMO 3: COLECTORA LATERAL		41,00	2,30		94,30	143,98
TRAMO 2: TALUD GAVIONES		21,00	2,30			143,98
TRAMO 1: PANTALLA PASIVA		11,00	2,30			143,98
					0,00	143,98
					0,00	143,98
					0,00	143,98
					0,00	143,98
					TOTAL	**143,98**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

JORGE CASTILLO
INGENIERO CIVIL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA

INFORME DE OBRA
CONTRATO 752-225 URGENCIA MANIFIESTA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.

CONTRATISTA
JORGE EDUARDO MARIN CASTILLO
NIT No 10.248.343

VILLAMARIA, CALDAS
ABRIL DE 2026

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Mediante el decreto No 035 del 20 de febrero de 2025, decreto 049 del 05 de marzo y el decreto 136 del 05 de junio, se decretó y prorrogó el estado de calamidad pública y urgencia manifiesta, por lo cual las entidades territoriales se encuentran habilitadas a hacer uso de ese mecanismo de selección para mitigar, prevenir y matizar los motivos que dieron origen a dicha declaratoria. Que ante estos hechos el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en acta recomendó declarar LA URGENCIA MANIFIESTA Y EL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA en el municipio de Villamaría, Caldas, para atender debidamente la emergencia, se hace necesario la construcción de obras de reducción del riesgo.

2. DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO

Contratista: JORGE EDUARDO CASATILLO MARIN Contrato No: 752-2025	
Valor del contrato	$ 982.508.292
Valor adición	$ 254.437.025
Plazo Inicial	3 MESES
Fecha de Iniciación	17 de septiembre de 2025
Prorroga	3 MESES
Suspensión	28 DÍAS
Fecha de Corte	30 de abril de 2026

3. UBICACIÓN Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

El contrato de Obra se desarrolla en el Municipio de Villamaría – Caldas, a continuación, se relaciona el punto a intervenir considerando el estado inicial previo a las intervenciones, su ubicación y los conceptos técnicos y decisiones tomadas con base en la importancia de la necesidad de recuperación, para garantizar la seguridad de la comunidad.

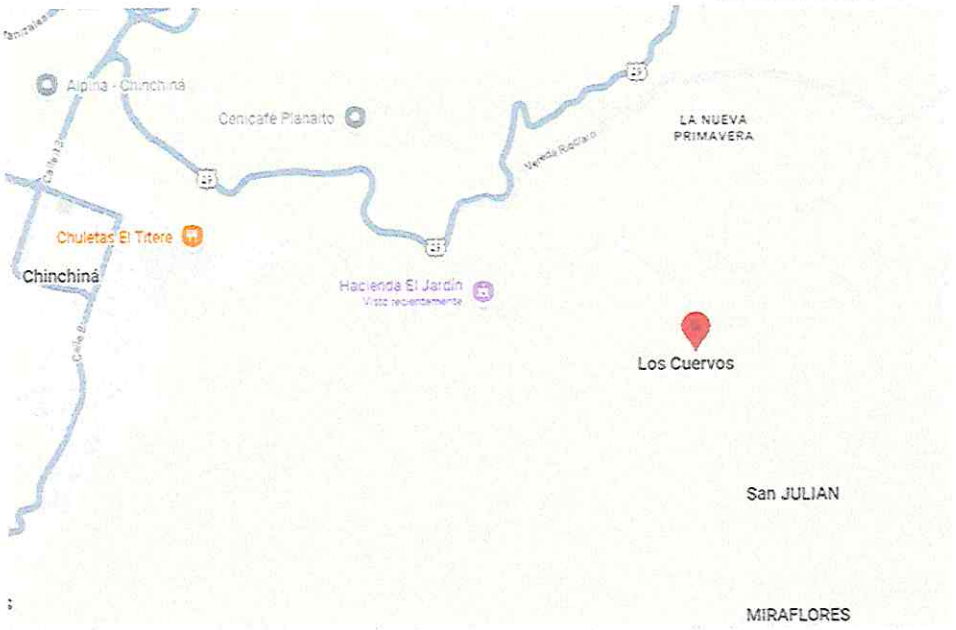


Figura 1. Ubicación Cancha los cuervos en el municipio de Villamaría, Caldas. (https://www.google.com/maps/search/cancha+los+cuervos/@4.9792585,-75.5733438,17.61z?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

La obra se ejecuta conforme a las especificaciones técnicas entregadas por la Corpocaldas, y la secretaria de infraestructura y vía del municipio de Villamaría, Caldas, las demás aplicables y exigidas según la actividad desarrollada. Las cantidades contractuales de la obra iniciales son las siguientes:

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
CAPITULO 1 – TRABAJOS PRELIMINARES			
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA		
1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INLCUYE RETIRO)	M2	374,39
1.3	CERRAMIENTO		
1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEEGURIDAD ANCHO 7 CM	ML	35,00
1.5	CAMPAMENTO DE 9M2 ESTERILLA, TEJA DE ZINC Y PISO	UN	1,00
CAPITULO 2 – EXCAVACIONES			
2.1	EXCAVACIONES		
2.1.1	EN ZANJA		
2.1.1.1	HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD		
2.1.1.1.2	TIERRA HUMEDA	M3	1,68
2.1.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA		
2.1.2.2.1	TIERRA	M3	1335,00
2.1.2.3	PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL		
2.1.2.3.1	TIERRA	M3	333,17

2.1.3	OTRAS EXCAVACIONES		
2.1.3.1	TIERRA	M3	26,16
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	9,84
2.2	RELLENOS		
2.2.1	EN ZANJA	M3	0,00
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	223,36
2.4	EXCAVACIÓN DE PILOTES Y CAISSONS		
2.4.8	PERFORACIÓN MECÁNICA PARA PILOTES EN TIERRA O CONGLOMERADO D=0.35M A UNA PROFUNDIDAD DE 0-15M	ML	35,00
CAPITULO 3 – OBRAS EN CONCRETO			
3.1	CONCRETO SIMPLE		
3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0.45 CON BOMBA 70 PSI (INCLUYE ADITIVO EXPANSOR Y PLASTIFICANTE)	ML	280,50
3.1.4	PAVIMENTOS		
3.1.5	SARDINELES		
3.1.6	PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3	2,00
3.1.7	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3	17,08
3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	0,20
3.1.12	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA	M3	0,00
3.1.15	PANTALLAS		
3.1.15.2	PASIVAS E=15CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2	70,00
3.1.15.5	ANCLAJE ACTIVO CABLE 12" DE 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA	ML	125,00
3.1.15.9	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE F'C =4000 PSI	M3	49,09
3.1.16	CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS		
3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3	0,00
3.1.16.5	CAÑUELA EN CONCRETO PARA DRENES	ML	9,00
3.1.17	CIMENTACIONES		
3.1.17.1	CONCRETO CLASE II PARA PILOTES D=0.35M	ML	35,00
3.1.17.5	CONCRETO CLASE II PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	1,16
3.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN		
3.2.1	SELLO PVC DE 0.10M	ML	0,00
3.3	INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS		
3.3.2	D131(15X15 DE 5.0 MM)	M2	140,00
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO		
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	6861,10
3.7	JUNTAS DE PAVIMIENTO		
3.7.1	CORTE ANDEN DE CONCRETO CON DISCO (2.5 CM DE PROFUNDIDAD)	ML	0,00
CAPITULO 4 – COLECCIÓN Y ENTRGA DE AGUAS			
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS		

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

4.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS		
4.3.1.1	DIÁMETRO DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	0,00
4.3.1.2	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	60,00
4.5	CAJA DE INSPECCIÓN		
4.5.1	TIPO I		
4.5:1.1	EN CONCRETO SIMPLE	ML	0,00
.CAPITULO 5 – GAVIONES.			
5.1	GAVIONES CON MALLA TIPO INVIAS DE TRIPLE TORSIÓN		
5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	M3	191,00
5.1.8	CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IN SITU	M3	53,80
CAPITULO 6 – DRENAJE SUBTERRANEO			
6.1	DREN EN ZANJA		
6.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA		
6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	90,00
6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO		
6.2.2.1	TIERRA	ML	148,00
6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML	148,00
6.2.2.3	ROCA	ML	100,00
6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES		
6.3.1	NT-1600	M2	97,60
CAPITULO 7 – ACARREOS			
7.1	SOBREACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR		
7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3	0.00
7.1.2	VOLQUETA CAGUE MECÁNICO	M3	0.00
7.1.3	JEEP O CAMIONETA HASTA 3KM	VJ	0.00
7.2	ACARREOS EN VEHÍCULOS NO AUTOMOTOR		
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	13,00
7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	0.00
7.2.3	EN BESTIA FUERTE PENDIENTE	M3-HM	0.00
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LÁMINA GALVANIZADA CAL - 14	ML	0.00
CAPITULO 8 – OBRAS DE BIOINGENIERIA			
8.1	TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA		
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	19,20
8.3	PODA Y ERRADICACIÓN DE ARBOLES		
8.3.1	ESTABLECIMIENTO DE RASTROJOS	M2	200,00
CAPITULO 9 – OBRAS COMPLEMENTARIAS			
9.1	BARANDA TUBULAR EN POSTE GALVANIZADO D=2" TRES BARRAS HORIZONTALES CADA 0.30 M		
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	180,00
9.7	JORNALES POR ADMINISTRACIÓN		
9.7.3	OBRERO	DÍA	16,00

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

ITEMS NO PREVISTOS			
NP1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	374,39
NP-2	EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA	M3	1335,00
NP-3	CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML	22,00
NP-4	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	12,00
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	18,00
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2	30,00
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUMBÓN.EN LAMINA GALVANIZADA CAL:14	ML	12,00
NP-8	Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado.	ML	700,00
NP-9	TUBERÍA PVC NOVAFORT DIÁMETRO DE 315 mm - 12.4"	ML	54,00
NP-10	CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	2,80
NP-11	CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	1,20
NP-12	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	4,00
NP-13	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	4,00
NP-14	ESTRIBOS L=0.95M.	UN	8,00
NP-15	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	M2	212,00
NP-16	ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO 1/2 x 8"	UN	13,00
NP-17	SARDINELES TIPO A	ML	30,00
NP-18	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACIÓN: CONCRETO 50%, PIEDRA 50%	M3	0,80

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
CAPITULO 1 – TRABAJOS PRELIMINARES			
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA		
1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INLCUYE RETIRO)	M2	0.00
1.3	CERRAMIENTO		
1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEEGURIDAD ANCHO 7 CM	ML	0.00
1.5	CAMPAMENTO DE 9M2 ESTERILLA, TEJA DE ZINC Y PISO	UN	0.00
CAPITULO 2 – EXCAVACIONES			
2.1	EXCAVACIONES		
2.1.1	EN ZANJA		
2.1.1.1	HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD		
2.1.1.1.2	TIERRA HUMEDA	M3	0.00
2.1.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA		
2.1.2.2.1	TIERRA	M3	0.00
2.1.2.3	PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL		
2.1.2.3.1	TIERRA	M3	0.00
2.1.3	OTRAS EXCAVACIONES		
2.1.3.1	TIERRA	M3	0.00
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	146.87
2.2	RELLENOS		
2.2.1	EN ZANJA	M3	0.00
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	17.92
2.4	EXCAVACIÓN DE PILOTES Y CAISSONS		
2.4.8	PERFORACIÓN MECÁNICA PARA PILOTES EN TIERRA O CONGLOMERADO D=0.35M A UNA PROFUNDIDAD DE 0-15M	ML	0.00
CAPITULO 3 – OBRAS EN CONCRETO			
3.1	CONCRETO SIMPLE		
3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0.45 CON BOMBA 70 PSI (INCLUYE ADITIVO EXPANSOR Y PLASTIFICANTE)	ML	18.00
3.1.4	PAVIMENTOS		
3.1.5	SARDINELES		
3.1.6	PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3	0.00
3.1.7	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3	0.00
3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	0,20
3.1.12	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA	M3	0.00
3.1.15	PANTALLAS		
3.1.15.2	PASIVAS E=15CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0.00
3.1.15.5	ANCLAJE ACTIVO CABLE 12" DE 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA	ML	0.00

3.1.15.9	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE F'C =4000 PSI	M3	37.56
3.1.16	CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS		
3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3	0.00
3.1.16.5	CAÑUELA EN CONCRETO PARA DRENES	ML	0.00
3.1.17	CIMENTACIONES		
3.1.17.1	CONCRETO CLASE II PARA PILOTES D=0.35M	ML	0.00
3.1.17.5	CONCRETO CLASE II PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	0.00
3.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN		
3.2.1	SELLO PVC DE 0.10M	ML	0.00
3.3	INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS		
3.3.2	D131(15X15 DE 5.0 MM)	M2	0.00
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO		
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	1592.22
3.7	JUNTAS DE PAVIMIENTO		
3.7.1	CORTE ANDEN DE CONCRETO CON DISCO (2.5 CM DE PROFUNDIDAD)	ML	0.00
CAPITULO 4 – COLECCIÓN Y ENTRGA DE AGUAS			
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS		
4.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS		
4.3.1.1	DIÁMETRO DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	0.00
4.3.1.2	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24.00
4.5	CAJA DE INSPECCIÓN		
4.5.1	TIPO I		
4.5.1.1	EN CONCRETO SIMPLE	ML	0.70
CAPITULO 5 – GAVIONES			
5.1	GAVIONES CON MALLA TIPO INVIAS DE TRIPLE TORSIÓN		
5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	M3	0.00
5.1.8	CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IN SITU	M3	0.00
CAPITULO 6 – DRENAJE SUBTERRANEO			
6.1	DREN EN ZANJA		
6.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA		
6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	20.00
6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO		
6.2.2.1	TIERRA	ML	0.00
6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML	135.20
6.2.2.3	ROCA	ML	38.00
6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES		
6.3.1	NT-1600	M2	0.00
CAPITULO 7 – ACARREOS			
7.1	SOBREACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR		
7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3	0.00

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

7.1.2	VOLQUETA CAGUE MECÁNICO	M3	0.00
7.1.3	JEEP O CAMIONETA HASTA 3KM	VJ	0.00
7.2	ACARREOS EN VEHÍCULOS NO AUTOMOTOR		
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	222.08
7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	0.00
7.2.3	EN BESTIA FUERTE PENDIENTE	M3-HM	0.00
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LÁMINA GALVANIZADA CAL - 14	ML	0.00
CAPITULO 8 – OBRAS DE BIOINGENIERIA			
8.1	TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA		
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	8.80
8.3	PODA Y ERRADICACIÓN DE ARBOLES		
8.3.1	ESTABLECIMIENTO DE RASTROJOS	M2	0.00
CAPITULO 9 – OBRAS COMPLEMENTARIAS			
9.1	BARANDA TUBULAR EN POSTE GALVANIZADO D=2" TRES BARRAS HORIZONTALES CADA 0.30 M		
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	0.00
9.7	JORNALES POR ADMINISTRACIÓN		
9.7.3	OBRERO	DÍA	33.00
ITEMS NO PREVISTOS			
NP-1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	0.00
NP-2	EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA	M3	0.00
NP-3	CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML	27.70
NP-4	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	10.36
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	31.00
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2	0.00
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL:14	ML	0.00
NP-8	ANCLAJE ACTIVO DE 25 MTS CON BULBO DE PRESIÓN DEL 50% DE LA LONGITUD, CON CABLEADO DE 1/2 PULGADA PARA 4 TORONES, INCLUYE PERFORACIÓN 6 PULG DE DIÁMETRO EN CONGLOMERADO, ENCAMISADO CON TUBERÍA METÁLICA, LECHADA DE INYECCIÓN A/C, FRAGUADO Y POSTENSADO.	ML	175.00
NP-9	TUBERÍA PVC NOVAFORT DIÁMETRO DE 315 mm - 12.4"	ML	30.00
NP-10	CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	2.10

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

NP-11	CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	1.30
NP-12	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	3.00
NP-13	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	3.00
NP-14	ESTRIBOS L=0.95M	UN	4.00
NP-15	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	M2	143.98
NP-16	ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO 1/2 x 8"	UN	0.00
NP-17	SARDINELES TIPO A	ML	0.00
NP-18	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACIÓN: CONCRETO 50%, PIEDRA 50%	M3	0.00

6. AVANCE DE OBRA

Con corte hasta la fecha se puede aproximar el avance de las obras con los siguientes porcentajes:

VERADA LOS CUERVOS	VALOR EJECUTADO	% PORCENTAJE EJECUTADO
	$ 1.040.183.001,00	84,09%

7. CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE OBRA

COLABORADOR	CANTIDAD	DEDICACIÓN
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1	100%
MAESTRO DE OBRA	1	100%
PROFESIONAL SST	1	100%
PROFESIONAL SOCIAL	1	50%
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	1	100%
AYUDANTE DE OBRA	6	100%

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





- **RELLENO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS**



Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

- **LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)**



- **CONCRETO PARA SOLADO DE LIMPIEZA**

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com



- **DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f'c=4000 PSI**



- **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO**

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com



- **SUMINISTRO Y COLACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS DIÁMETRO DE 3”**



Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

- **CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 1 EN CONCRETO SIMPLE**



- **SUMINISTRO Y COLACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES**



Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

- **DREN EN ZANJA CONGLOMERADO**




- **PERFORACIÓN ROCA**



- **BUGGI FUERTE-PENDIENTE**

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com



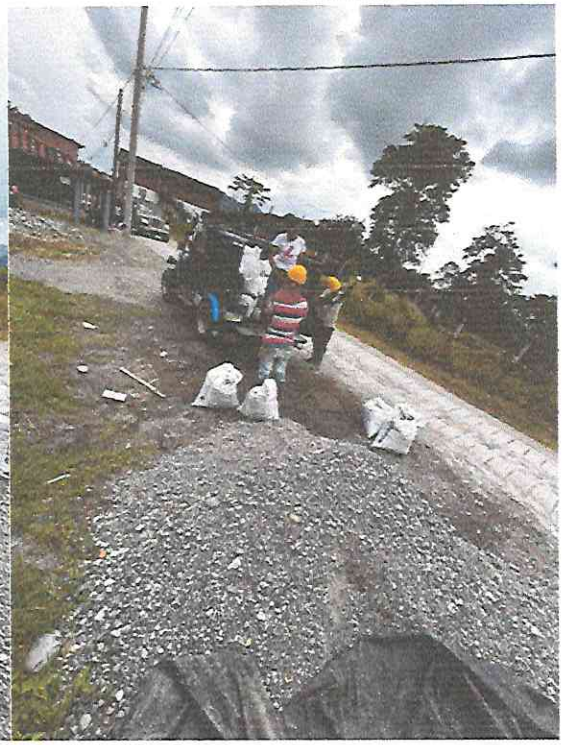

- **TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO**




- **JORNALES OBRERO**

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com




- **CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO**

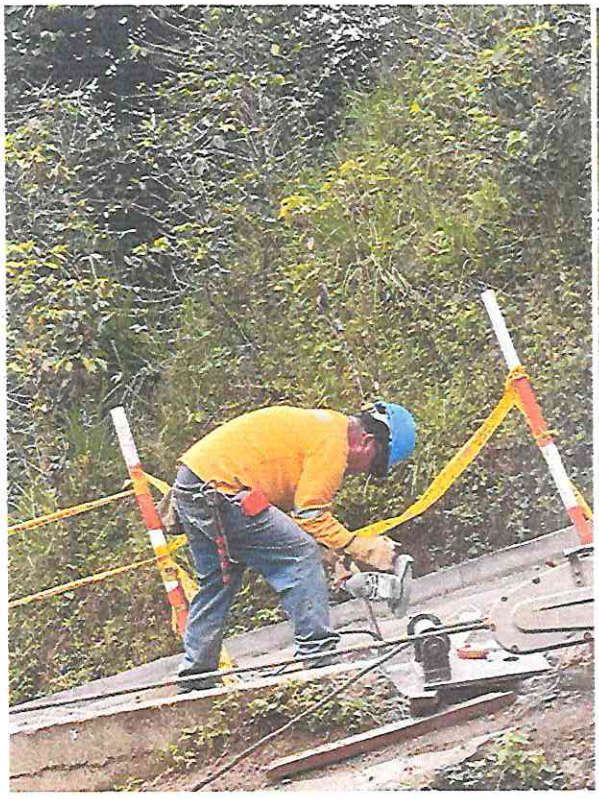


- **DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com





- **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO**




- **ANCLAJE ACTIVO DE 25 MTS CON BULBO DE PRESIÓN DEL 50% DE LA LONGITUD, CON CABLEADO DE 1/2 PULGADA PARA 4 TORONES, INCLUYE PERFORACIÓN 6**

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

PULG DE DIÁMETRO EN CONGLOMERADO, ENCAMISADO CON TUBERÍA METÁLICA, LECHADA DE INYECCIÓN A/C, FRAGUADO Y POSTENSADO.



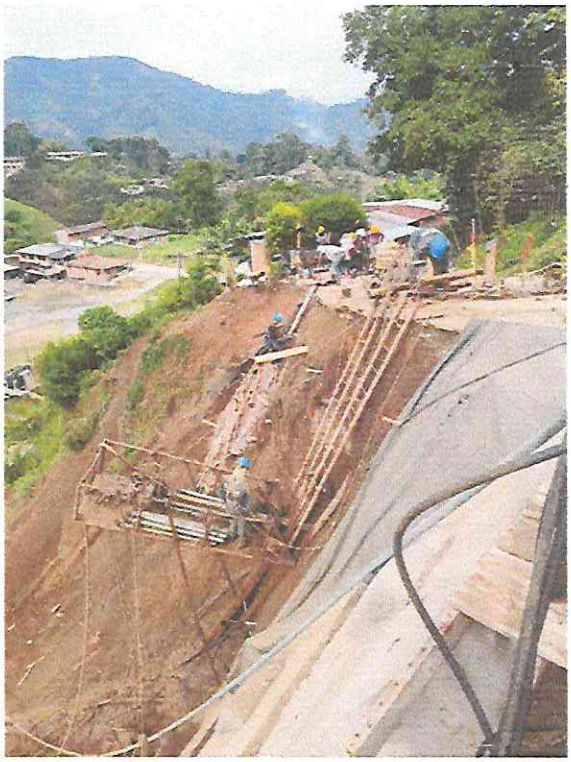

- **TUBERÍA PVC NOVAFORT 12"**





- **CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS**

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com



- **CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS**



- **BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS**

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com




- **TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS**



- **ESTRIBOS L=0.95M**

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

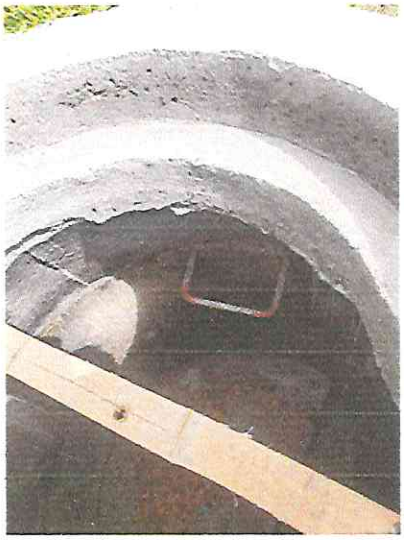

- **ACEQUIA EN GEOMEMBRANA**





Elaboro:

JUAN SEBASTIAN AGUDELO RAMIREZ
Ingeniero civil
Ing. Residente C. 752-2025

Reviso y aprobó:

JORGE EDUARDO CASTILLO
Ingeniero Civil
Contratista C. 752-2025

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

JORGE CASTILLO	**INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA – CALDAS"

NIT :10284343-6

CONTRATO 715-2025

ELABORADO POR
LEYDI JOHANA LÓPEZ CARDONA
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA 5321

ABRIL 30 / 2026
VILLAMARIA CALDAS

JORGE CASTILLO	INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA LOS CUERVOS (JECM)

CONTENIDO

1. PERSONAL EN OBRA
2. RESPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
3 INDICADORES MES DE FEBRERO/MARZO/ABRIL
Ausentismo laboral por cauda medica
Accidentalidad
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN FEBRERO/MARZO/ABRIL
5. RECOMENDACIONES DESDE EL AREA SST

	INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**

1. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL OBRA JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN - CONTRATO 715-2025

CARGO	NUMERO DE TRABAJADORES	NOMBRE DEL TRABAJADOR
RESPRESENTANTE LEGAL	1	• JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
INGENIERO RESIDENTE	1	• JUAN SEBASTIAN AGUDELO RAMIREZ
PROFESIONAL SST	1	• LEYDI JOHANA LÓPEZ CARDONA
MAESTRO DE OBRA	1	• CARLOS ALBERTO GALVEZ SOTO
OCICIALES	1	• GILBERTO GALVIS SOTO
AYUDANTES	5	• SEBASTIAN GALVIS • NICOLAS JARAMILLO • ROBERTH LOAIZA • ADRIAN MARIN • GUILERMO MARQUEZ • ALAIN CASTAÑO
TOTAL TABAJADORES	10	

	INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**

GONZA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S

CARGO	NUMERO DE TRABAJADORES	NOMBRE DEL TRABAJDOR
REPRESENTANTE LEGAL	1	• LUIS GONZALO CASTAÑO
OPERARIO DE MAQUINA	1	• EDWIN ANDRES MUÑOZ
AYUDANTES	4	• GERARDO ANDRES DIAZ • REINALDO CASTAÑEDA • JORGE ARIEL CASTAÑEDA • NELSON ANDRES VALENCIA
TOTAL DE TRABAJADORES	6	

2. REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Durante el periodo comprendido desde el 24 de Febrero al 30 de Abril del año 2026 no se presentaron Accidentes de Trabajo en la empresa JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN

ARL | sura

Medellín, 4 de mayo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN, CC C10284343, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de enero de 2026 hasta el 04 de mayo de 2026, para los centros de trabajo seleccionados:

Nombre Centro de Trabajo	Código Centro de Trabajo
OBRA	0000000000

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.86.9.44, 192.230.104.17, 172.16.42.57.


VIGILADO SUPERSALUD

JORGE CASTILLO	**INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**

3. INDICADORES MES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL

Ausentismo laboral por causa medica


En el periodo comprendido desde el 24 de Febrero al 30 de Abril del año 2026, se perdieron 0%,de dias programados de trabajo por incapacidad medica.

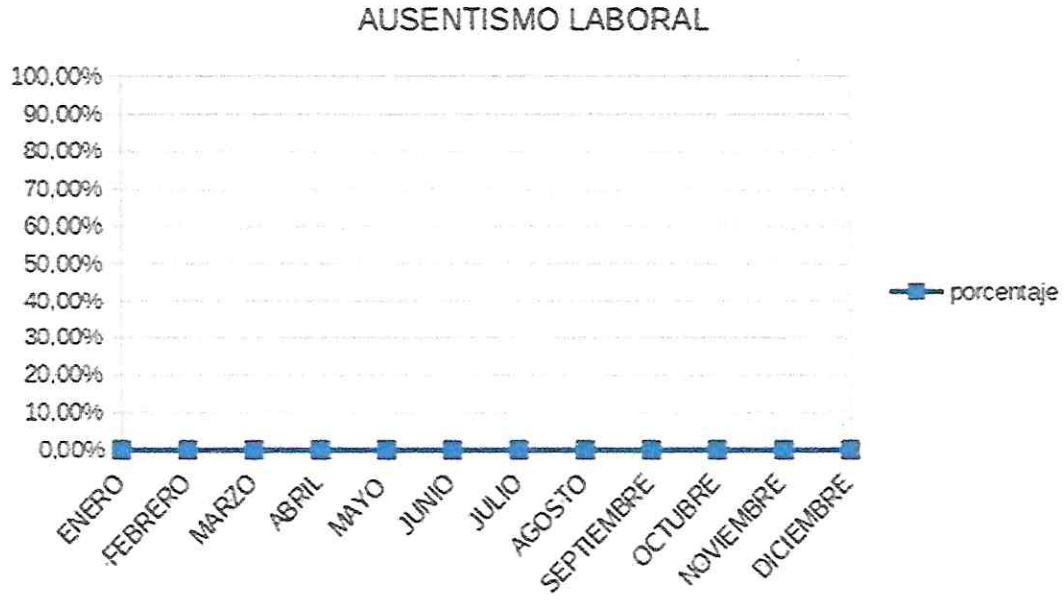

JORGE CASTILLO	**INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**


Accidentalidad

Durante el periodo comprendido desde el 24 de Febrero al 30 de Abril del año 2026 no se presentaron ACCIDENTES DE TRABAJO en la empresa JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN

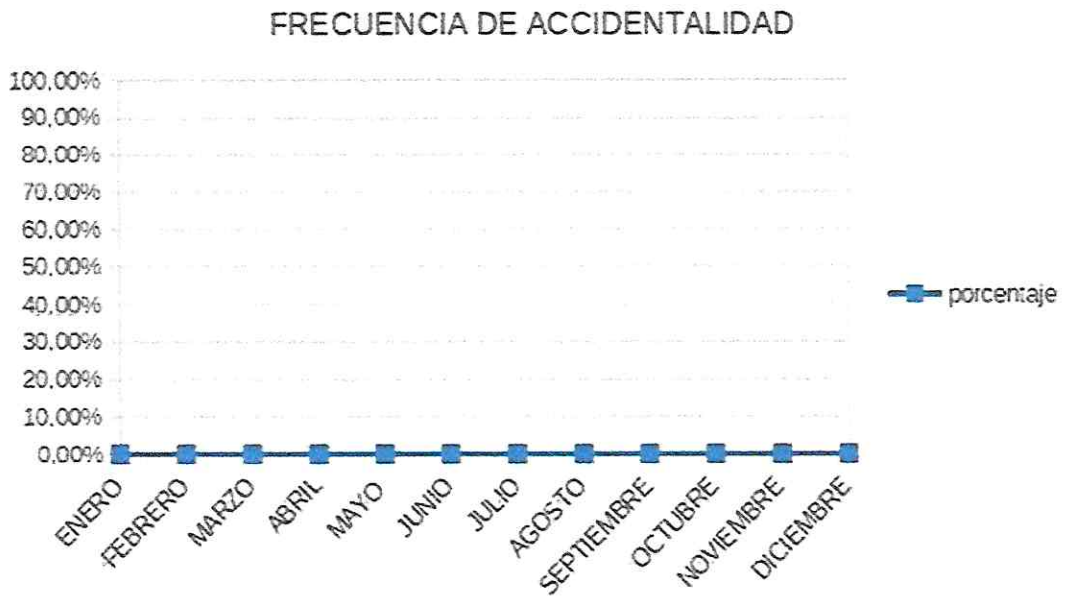


JORGE CASTILLO	**INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

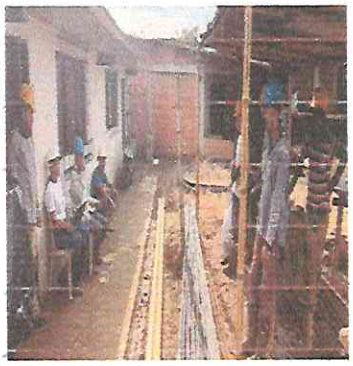FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• REINDUCCION	
• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• CAPACITACIONES	   



JORGE CASTILLO	**INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**

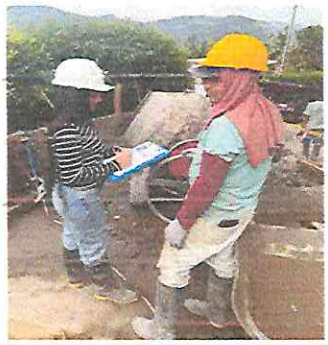• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• INSPECCIONES	  
• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• ENTREGA DE EPP	   

	INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**

• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• SEÑALIZACION	  
• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• Acompañamiento en actividades de perforacion y tensionamiento	 


JORGE CASTILLO	**INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**

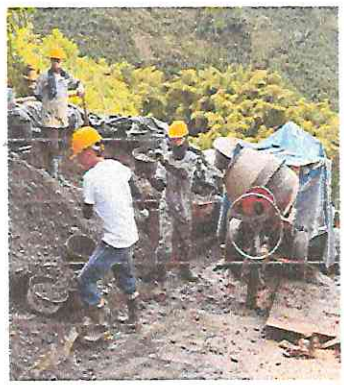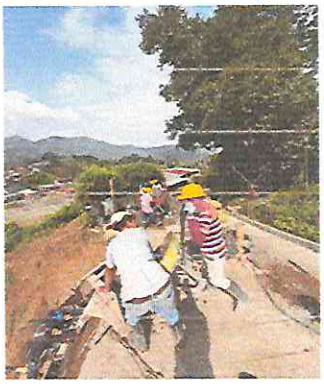• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• Acompañamiento en actividad de trabajo en alturas asociado a perfilamiento de talud,instalcion de acero y formaleta	  
• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• Acompañamineto en actividad de vasiado de concreto	  

	INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**

• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• Acompañamineto en actividad de excavación manual , verificando condiciones seguras de trabajo.	 
• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• Orden y aseo	   

	INFORME #3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**OBRA LOS CUERVOS (JECM)**

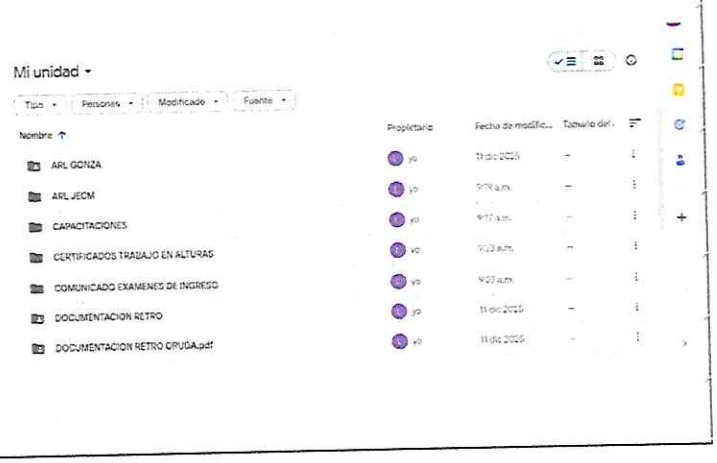• FEBRERO 24 A ABRIL 30	• Actualizacion de drive empresarial	

5. RECOMENDACIONES DESDE EL AREA DE SST

• Fortalecer la supervisión en actividades de excavación manual, verificando la estabilidad del terreno, control de taludes y uso adecuado de herramientas, con el fin de prevenir derrumbes o atrapamientos.

• Mantener y reforzar las condiciones de orden y aseo en todos los frentes de trabajo, evitando la acumulación de materiales y residuos que generen riesgos locativos.

• Garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad durante el vaciado de concreto, especialmente en el manejo de herramientas, contacto con el material y condiciones del área.

• Reforzar el control en actividades de trabajo en alturas, asegurando la correcta instalación de sistemas de protección contra caídas, inspección de equipos y verificación de puntos de anclaje.

• Supervisar las labores de perforación y tensionamiento, verificando el estado de los equipos, control de proyección de partículas y uso de elementos de protección personal.

• Implementar y mantener señalización visible y adecuada en las áreas de trabajo, delimitando zonas de riesgo y tránsito de personal.

• Dar continuidad a las inspecciones de seguridad, asegurando el seguimiento y cierre de hallazgos identificados en campo.

• Fortalecer las capacitaciones y reinducciones, enfocándolas en los riesgos críticos evidenciados durante las actividades desarrolladas en obra.

JORGE CASTILLO
INGENIERO CIVIL

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.284.343 de Manizales, CERTIFICO QUE A LA FECHA ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO con mis obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, compuesto por salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales (Cajas de compensación Familiar, SENA, ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, MARIA SONIA GALLEGO MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.298.378 de Manizales, y con Tarjeta Profesional No. 9575-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador doy fe de que el suscrito se encuentra a PAZ y SALVO de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, compuesto por salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Manizales, a los 30 días del mes de abril de 2026.

JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343 DE MANIZALES

MARIA SONIA GALLEGO MEJIA
C.C. 24.298.378 DE MANIZALES
CONTADORA PUBLICA
TP. 9575-T

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.298.378
GALLEGO MEJIA

APELLIDOS
MARIA SONIA

NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

9575-T



MARIA SONIA
GALLEGO MEJIA
C.C. 24.298.378
RESOLUCION INSCRIPCION 1539-T FECHA 9-XII-83
UNIVERSIDAD FUNDEMA

Presidente

00016968



FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1948
NAVARRO
CALI (VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.47 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

02-DIC-1969 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0913000-00062383-F-0024298378-20080901 0002846916A 1 4810005861

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z 6 0 0 0 A C F 3 F Z Z C 1 D B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA SONIA GALLEGO MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24298378 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 9575-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37097768

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-04-16

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10284343	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV BERNARDO ARANGO 7B140 CASA A3	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	JOEDCAMA8@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8905828
FAX	8924521	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		37097768

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10284343	57	No	No	No	17	1	0	Salario	CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO	$2.025.896

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10284343																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES												
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10284343	PROTECCION	30	$2.025.896	0.1600000	$324.200	$0	$0	$324.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10284343	SALUD TOTAL	30	$2.025.896	0.1250000	$253.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.025.896	2	0.0696000	$141.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10284343	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$324.200	$0	$0	$0	$0	2	$500	$0	$0	$324.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$253.300	$0	0	$0	0	$0	$253.300	2	$400	$0	$253.700	$0	0	$0	$0	$253.700	$0	$0	$253.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$141.100	0	$0	$0	$141.100	2	$200	$141.300	0	$0	$0	$141.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	2	$0	$0
SENA	0	$0	2	$0	$0
ICBF	0	$0	2	$0	$0
ESAP	0	$0	2	$0	$0
MinEdu	0	$0	2	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$253.700
PENSIONES	1	$324.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$141.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$719.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32841446
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-03-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10284343	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV BERNARDO ARANGO 7B140 CASA A3	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	JOEDCAMA8@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8905828
FAX	8924521	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 02	Año: 2025	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		32841446

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10284343	57	No	No	No	17	1	0	Salario	CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO	$2.025.896

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10284343																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10284343	PROTECCION	30	$2.025.896	0.1600000	$324.200	$0	$0	$324.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10284343	SALUD TOTAL	30	$2.025.896	0.1250000	$253.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.025.896	2	0.0696000	$141.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10284343	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$324.200	$0	$0	$0	$0	1	$300	$0	$0	$324.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$253.300	$0	0	$0	0	$0	$253.300	1	$200	$0	$253.500	$0	0	$0	$0	$253.500	$0	$0	$253.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$141.100	0	$0	$0	$141.100	1	$100	$141.200	0	$0	$0	$141.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	1	$0	$0
SENA	0	$0	1	$0	$0
ICBF	0	$0	1	$0	$0
ESAP	0	$0	1	$0	$0
MinEdu	0	$0	1	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$253.500
PENSIONES	1	$324.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$141.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$719.200

Número de Transacción: APII6068323306374937

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 09 de 2026 07:54 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 21209OZL

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3505
Comercio Virtual:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	36545807
Valor Pagado:	$6.794.000,00

Imprimir Cerrar

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-10284343
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	04
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OBRA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36545807
TOTAL COTIZANTES:	14
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36545807
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.600	$ 280.600
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.000	$ 196.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.500	$ 86.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.000	$ 257.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.100	$ 56.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		6	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 946.300	$ 946.300
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.026.400	$ 1.026.400
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.235.400	$ 1.235.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 993.600	$ 993.600
Subtotal Pensión		3	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.255.400	$ 3.255.400
14-11	890903790	ARL SURA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.646.000	$ 1.646.000
Subtotal ARL		1	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.646.000	$ 1.646.000
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 946.300	$ 946.300
Subtotal CCF		1	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 946.300	$ 946.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.794.000	$ 6.794.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36545807
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10284343	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV BERNARDO ARANGO 7B140 CASA A3	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	JOEDCAMA8@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8905828
FAX	8924521	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	OBRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		$23.642.233		36545807

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1053865353	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	AGUDELO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN	$2.900.000
CC-18593818	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	CASTAÑO SANTA JOSE ALAIN	$1.750.905
CC-10260634	01	5	No	No	17	1	5431201	Fijo	GALVEZ SOTO CARLOS ALBERTO	$3.300.000
CC-1002655458	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GALVIS CASTAÑO DAVID SEBASTIAN	$1.750.905
CC-10276367	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GALVIS SOTO GILBERTO	$2.553.600
CC-1054986685	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GARCIA LOPEZ LEANDRO ANDRES	$1.750.905
CC-1060647044	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	JARAMILLO RODRIGUEZ NICOLAS ANDRES	$1.750.905
CC-1193232190	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOAIZA CASTAÑO JUAN CAMILO	$1.750.905
CC-1058138457	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOAIZA PATIÑO ROBERTH YAMIL	$1.750.905
CC-1060655198	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOPEZ CARDONA LEYDI JOHANA	$2.000.000
CC-86009399	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	MARIN POSADA HECTOR JAVIER	$2.553.600
CC-18396241	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	MARQUEZ PEREZ GUILLERMO	$1.750.905
CC-9924092	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	SERNA MARIN ADRIAN	$1.750.905
CC-1054479656	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	VELEZ GALVIS ALEJANDRO	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1053865353																													0		
CC - 18593818			X	2026-02-24																									0		
CC - 10260634																													0		
CC - 1002655458																													0		
CC - 10276367	X	2026-02-04																											0		
CC - 1054986685			X	2026-02-20																									0		
CC - 1060647044																													0		
CC - 1193232190			X	2026-02-07																									0		
CC - 1058138457																													0		
CC - 1060655198																													0		
CC - 86009399			X	2026-02-07																									0		
CC - 18396241																													0		
CC - 9924092			X	2026-02-28																									0		
CC - 1054479656			X	2026-02-14																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1053865353	PROTECCION	30	$2.900.000	0.1600000	$464.000	$0	$0	$464.000	$0	$0	$0
CC - 18593818	PORVENIR	24	$1.400.724	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 10260634	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1002655458	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 10276367	COLPENSIONES	27	$2.298.240	0.1600000	$367.800	$0	$0	$367.800	$0	$0	$0
CC - 1054986685	PROTECCION	20	$1.167.270	0.1600000	$186.800	$0	$0	$186.800	$0	$0	$0
CC - 1060647044	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1193232190	COLPENSIONES	7	$408.545	0.1600000	$65.400	$0	$0	$65.400	$0	$0	$0
CC - 1058138457	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1060655198	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 86009399	PROTECCION	7	$595.840	0.1600000	$95.400	$0	$0	$95.400	$0	$0	$0
CC - 18396241	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 9924092	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1054479656	PORVENIR	14	$817.089	0.1600000	$130.800	$0	$0	$130.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053865353	SANITAS	30	$2.900.000	0.0400000	$116.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.900.000	1	0.0696000	$201.900
CC - 18593818	EPS-S COOSALUD	24	$1.400.724	0.0400000	$56.100	$0	0	$0	0	$0	24	$1.400.724	1	0.0696000	$97.500
CC - 10260634	SALUD TOTAL	30	$3.300.000	0.0400000	$132.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.300.000	1	0.0696000	$229.700
CC - 1002655458	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 10276367	SALUD TOTAL	27	$2.298.240	0.0400000	$92.000	$0	0	$0	0	$0	27	$2.298.240	1	0.0696000	$160.000
CC - 1054986685	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	20	$1.167.270	0.0400000	$46.700	$0	0	$0	0	$0	20	$1.167.270	1	0.0696000	$81.300
CC - 1060647044	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1193232190	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$408.545	0.0400000	$16.400	$0	0	$0	0	$0	7	$408.545	1	0.0696000	$28.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1058138457	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1060655198	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0696000	$139.200
CC - 86009399	SALUD TOTAL	7	$595.840	0.0400000	$23.900	$0	0	$0	0	$0	7	$595.840	1	0.0696000	$41.500
CC - 18396241	ESSC ASMET SALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 9924092	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1054479656	SALUD TOTAL	14	$817.089	0.0400000	$32.700	$0	0	$0	0	$0	14	$817.089	1	0.0696000	$56.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053865353	CCF DE CALDAS	30	$2.900.000	0.0400000	$116.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18593818	CCF DE CALDAS	24	$1.400.724	0.0400000	$56.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10260634	CCF DE CALDAS	30	$3.300.000	0.0400000	$132.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002655458	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10276367	CCF DE CALDAS	27	$2.298.240	0.0400000	$92.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054986685	CCF DE CALDAS	20	$1.167.270	0.0400000	$46.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060647044	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193232190	CCF DE CALDAS	7	$408.545	0.0400000	$16.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1058138457	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060655198	CCF DE CALDAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-86009399	CCF DE CALDAS	7	$595.840	0.0400000	$23.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18396241	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9924092	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1054479656	CCF DE CALDAS	14	$817.089	0.0400000	$32.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	4	$1.026.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.026.400
COLPENSIONES	4	$993.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$993.600
PORVENIR	5	$1.235.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.235.400
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	4	$280.600	$0	0	$0	0	$0	$280.600	0	$0	$0	$280.600	$0	0	$0	$0	$280.600	$0	$0	$280.600
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.500	$0	0	$0	0	$0	$86.500	0	$0	$0	$86.500	$0	0	$0	$0	$86.500	$0	$0	$86.500
ESSC ASMET SALUD	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100
EPS-S COOSALUD	1	$56.100	$0	0	$0	0	$0	$56.100	0	$0	$0	$56.100	$0	0	$0	$0	$56.100	$0	$0	$56.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$257.000	$0	0	$0	0	$0	$257.000	0	$0	$0	$257.000	$0	0	$0	$0	$257.000	$0	$0	$257.000
SANITAS	2	$196.000	$0	0	$0	0	$0	$196.000	0	$0	$0	$196.000	$0	0	$0	$0	$196.000	$0	$0	$196.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	14	$1.646.000	0	$0	$0	$1.646.000	0	$0	$1.646.000	0	$0	$0	$1.646.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	14	$946.300	0	$0	$946.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$946.300
PENSIONES	3	$3.255.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.646.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$946.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$6.794.000

PANTALLAZO SECOP II ACTA No 3

REGISTRO DE FACTURA

Valor total de la factura no puede ser mayor que el valor del contrato

Id de pago Pago 003

Obligado a facturar electrónicamente (•) Si ( ) No *

CUFE 6def8c7ec0f7e0a032e667fe99f0b662d7783fb724444bb99210e85f9c45a0f7e5d0e1bd43cc76c3b0b0b0b6ba4a5e2d4 Borrar Factura válidada

Consultar los detalles de la factura

Número de factura FVEL 21 *

Fecha de emisión 7/05/2026 5:10 PM *

Fecha de vencimiento 15/05/2026 12:00

Valor neto 322 070 614 * Valor antes de IVA

Valor total 322 070 614 *

Notas ACTA DE OBRA No 3

Fecha de recepción original 17 horas de tiempo transcurrido

Número de radicación 1 *

	Descripción	Nombre del documento		
☑	0. REMISORIA.pdf	0. REMISORIA.pdf	Descargar	Detalle
☑	1. FACTURA FVEL 21 (ACTA 3).pdf	1. FACTURA FVEL 21 (ACTA 3).pdf	Descargar	Detalle
☑	2. CERT BANCARIO JORGE CASTILLO.pdf	2. CERT BANCARIO JORGE CASTILLO.pdf	Descargar	Detalle
☑	3. RUT JECM.pdf	3. RUT JECM.pdf	Descargar	Detalle
☑	4. ACTA DE OBRA No 3.pdf	4. ACTA DE OBRA No 3.pdf	Descargar	Detalle
☑	5. PREACTA DE OBRA No 3.pdf	5. PREACTA DE OBRA No 3.pdf	Descargar	Detalle
☑	6. INFORME TECNICO ACTA No 3.pdf	6. INFORME TECNICO ACTA No 3.pdf	Descargar	Detalle
☑	7. INFORME SST #3.pdf	7. INFORME SST #3.pdf	Descargar	Detalle
☑	8. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO PAGO PARAFISCALES.pdf	8. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO PAGO PARAFISCALES.pdf	Descargar	Detalle
☑	9. DOCUMENTOS CONTADOR.pdf	9. DOCUMENTOS CONTADOR.pdf	Descargar	Detalle
☑	10. PLANILLA 2026-03 CASTILLO CUERVOS.pdf	10. PLANILLA 2026-03 CASTILLO CUERVOS.pdf	Descargar	Detalle
☑	11. SS JECM MARZO 2026.pdf	11. SS JECM MARZO 2026.pdf	Descargar	Detalle

Borrar Anexar

	Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
☑	37097765	67-Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	No aplica	2026-04-16	2026-03	2.025.896	253.300	324.200	141.100	0	0	Tipo cotizante >7	Validar

Agregar Borrar
