1. INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO

Número de Contrato:	CIP-ERUDM-2025-19
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO PARA LA ADECUACIÓN, EL MANTENIMIENTO, REMODELACION, QUE REQUIERAN LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y/O RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe ejecutivo tiene como finalidad dar a conocer el estado actual del contrato **CIP-ERUDM-2025-19**, cuyo objeto corresponde al suministro de mobiliario urbano necesarios para el mantenimiento de los escenarios deportivos**,** en el municipio de **La Dorada, Caldas**.

Este documento presenta la información general del contrato, la localización del proyecto, el avance de los suministros entregados y el respectivo registro fotográfico.

3. AVANCE DE SUMINISTROS ENTREGADOS

BALANCE DE MAYORES Y MENORES			**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO #2**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR/ TOTAL**	**AVANCE (%)**
6,00	**MOBILIARIO URBANO**				
6,01	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO	M2	47,74	$ 3.485.020,00	14,61%
6,02	SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL EXTERIOR CASTILLO REAL, COMPOSICIÓN DE 1 TOBOGAN DOBLE, 1 TOBOGAN SENCILLO, 1 TOBOGAN TUBULAR EN ESPRIAL, COLUMPIOS, PUENTE DE CUERDA, CAMINO DE EQUILIBRIO, ESCALERA DE ACCESO CON BARANDA, PLATAFORMAS, PANELES LATERALES CON FIGURAS Y TECHOS DECORATIVOS	UND	0,00	$ 0,00	0,00%
6,03	SUMINISTRO DE BANCA CON ESPALDAR	UND	0,00	$ 0,00	0,00%
6,04	SUMINISTRO DE CANASTAS DE BASURA, INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 0,3X0,3X0,4	UND	0,00	$ 0,00	0,00%
7,00	**CARPINTERIA METALICA**				

7,01	SUMINISTRO DE REJILLA METÁLICA PARA CARCAMOS	ML	0,00	$ 0,00	0,00%
10,00	**RED ELECTRICA**				
10,04	SUMINISTRO MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR	UN	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
10,05	SUMINISTRO DE LED ALUMBRADO PUBLICO SPRING 80W	UN	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
10,08	SUMINISTRO DE TABLERO GENERAL SEGÚN DISEÑO INCLUYE: UN BREAKER TOTALIZADOR DE 3X80A SEIS BREAKER BIPOLARES DE 2X32 A SEIS TEMPORIZADORES DIGITALES. SEIS CONTACTORES DE 2 X 30A 2 BREAKER TRIFASICOS DE 3X40A GABINETE TIPO INTEMPERIE. MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE. FRENTE MUERTO. CERTIFICADO RETIE DEL TABLERO	UND	1,00	$ 6.775.100,00	100,00%
10,1	SUMINISTRO DE POSTE TRASLUCIDO DE 6 A 8M	UND	6,00	$ 14.196.600,00	100,00%
10,11	SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN PARA POSTES OPALESCENTES CON CINTA RGB	ML	36,00	$ 13.147.200,00	100,00%
10,12	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUZ RGB SUMERGIBLE	UND	16,00	$ 11.790.400,00	100,00%
10,13	SUMINISTRO DE GUAYA TENSADA (INCLUYE CLAVE 20X20 POLARIZADO, TERMO ENCOJIBLE NO.3 Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML	36,00	$ 3.826.800,00	100,00%
15,00	**MOBILIARIO URBANO**				
15,01	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO	M2	0,00	$ 0,00	0,00%
15,02	SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL EXTERIOR CASTILLO REAL, COMPOSICIÓN DE 1 TOBOGAN DOBLE, 1 TOBOGAN SENCILLO, 1 TOBOGAN TUBULAR EN ESPRIAL, COLUMPIOS, PUENTE DE CUERDA, CAMINO DE EQUILIBRIO, ESCALERA DE ACCESO CON BARANDA, PLATAFORMAS, PANELES LATERALES CON FIGURAS Y TECHOS DECORATIVOS	UND	0,00	$ 0,00	0,00%
15,03	SUMINISTRO DE CANASTAS DE BASURA, INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 0,3X0,3X0,4	UND	0,00	$ 0,00	0,00%

OBRA CIVIL
NIT. 901963647-5

16,00	**RED ELECTRICA**				
16,03	SUMINISTRO MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR	UND	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
16,04	SUMINISTRO DE LED ALUMBRADO PUBLICO SPRING 80W	UND	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!
16,07	SUMINISTRO DE POSTE TRASLUCIDO DE 6 A 8M	UND	3,00	$ 7.098.300,00	100,00%
16,08	SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN PARA POSTES OPALESCENTES CON CINTA RGB	ML	24,00	$ 8.740.800,00	100,00%
16,10	SUMINISTRO DE GUAYA TENSADA (INCLUYE CLAVE 20X20 POLARIZADO, TERMO ENCOJIBLE NO.3 Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO)	ML	24,00	$ 2.551.200,00	100,00%
22,00	**SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA**				
22,01	SUMINISTRO DE BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA CON ESPALDAR TIPO OLAND DIMENSIONES 1,80X0,45X0,57M (ANCHOXALTOXPROFUNDIDAD) INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION EN SITIO	UND	0,00	$ 0,00	0,00%
22,02	SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL EXTERIOR CASTILLO REAL, COMPOSICIÓN DE 1 TOBOGAN DOBLE, 1 TOBOGAN SENCILLO, 1 TOBOGAN TUBULAR EN ESPRIAL, COLUMPIOS, PUENTE DE CUERDA,CAMINO DE EQUILIBRIO, ESCALERA DE ACCESO CON BARANDA, PLATAFORMAS, PANELES LATERALES CON FIGURAS Y TECHOS DECORATIVOS	UND	0,00	$ 0,00	0,00%
22,03	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO	M2	46,00	$ 3.358.000,00	53,49%
22,04	SUMINISTRO DE CANASTAS DE BASURA, INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 0,3X0,3X0,4	UND	0,00	$ 0,00	0,00%
23,00	**RED ELECTRICA**				
23,01	SUMINISTRO DE POSTE OPALESCENTE DE 8 METROS. INCLUYE BRAZO	UND	5,00	$ 11.830.500,00	100,00%
23,02	SUMINISTRO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO 30W, TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, CHASIS EN ALUMINIO, PROTECCIÓN DPS 10KVA, IP 66. ANGULO DE APERTURAM 90- 150 °, GARANTÍA 5 AÑOS, INCLUENDO INSTALACION DE CABLEADO PARA SU ELABORACION.	UND	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!

OBRA CIVIL & SUMINISTRO SAS NIT 901963647-5


23,03	SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN PARA POSTES OPALESCENTES CON CINTA RGB	ML	30,00	$ 10.956.000,00	100,00%
23,04	SUMINISTRO DE GUAYA TENSADA (INCLUYE CLAVE 20X20 POLARIZADO, TERMO ENCOJIBLE NO.3 Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML	30,00	$ 3.189.000,00	100,00%
27,00	**CONSTRUIR OBRAS DE MAMPOSTERÍA Y ENCHAPE**				
27,05	SUMINISTRO DE ENCHAPE PISO INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA Y/O PEGACOR	M2	8,53	$ 496.446,00	100,00%
30,00	**RED HIDROSANITARIA**				
30,06	SUMINISTRO DE COMBO SANITARIO INCLUYE LAVAMANOS CON PEDESTAL, GRIFERIA, SANITARIO Y ACCESORIOS.	UND	2,00	$ 1.398.600,00	100,00%
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				
N.P. 9,13	SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE 3HP 220V	UND	4,00	$ 6.353.012,00	100,00%
N.P. 9,15	SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 V	UND	2,00	$ 3.600.000,00	100,00%
TOTAL SUMINISTRO				**$ 112.792.978,00**	**36,15%**

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

6.01 SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO



10.08 SUMINISTRO DE TABLERO GENERAL SEGÚN DISEÑO INCLUYE: UN BREAKER TOTALIZADOR DE 3X80A SEIS BREAKER BIPOLARES DE 2X32 A SEIS TEMPORIZADORES DIGITALES. SEIS CONTACTORES DE 2 X 30A 2 BREAKER TRIFASICOS DE 3X40A GABINETE TIPO INTEMPERIE. MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE. FRENTE MUERTO. CERTIFICADO RETIE DEL TABLERO

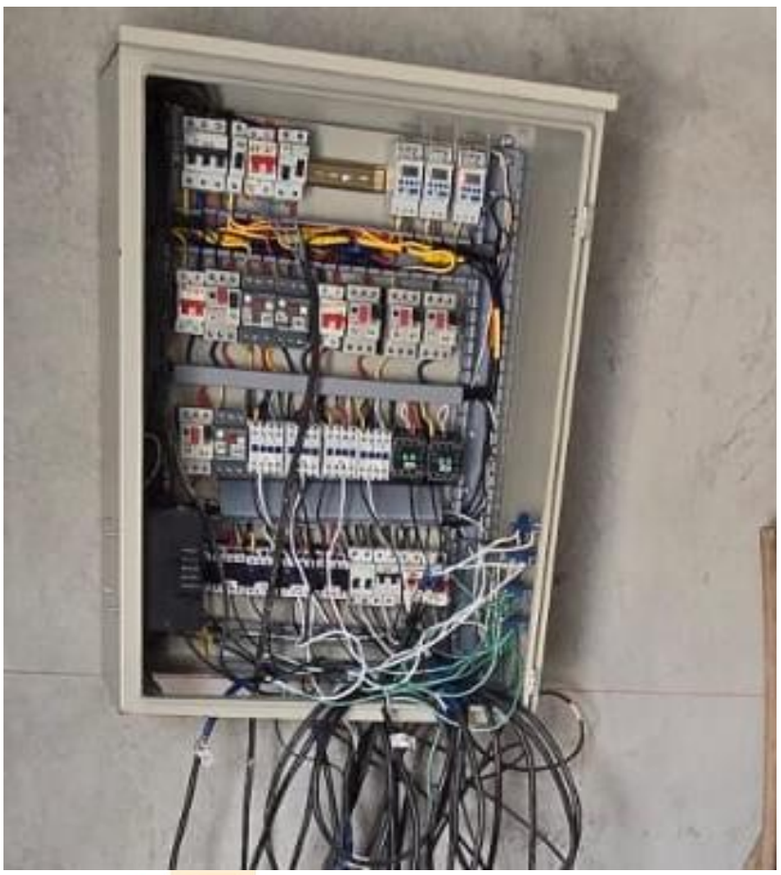

10.10 SUMINISTRO DE POSTE TRASLUCIDO DE 6 A 8M



10.11 SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN PARA POSTES OPALESCENTES CON CINTA RGB




10.12 SUMINISTRO DE LUMINARIA LUZ RGB SUMERGIBLE






10.13 SUMINISTRO DE GUAYA TENSADA (INCLUYE CLAVE 20X20 POLARIZADO, TERMO ENCOJIBLE NO.3 Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

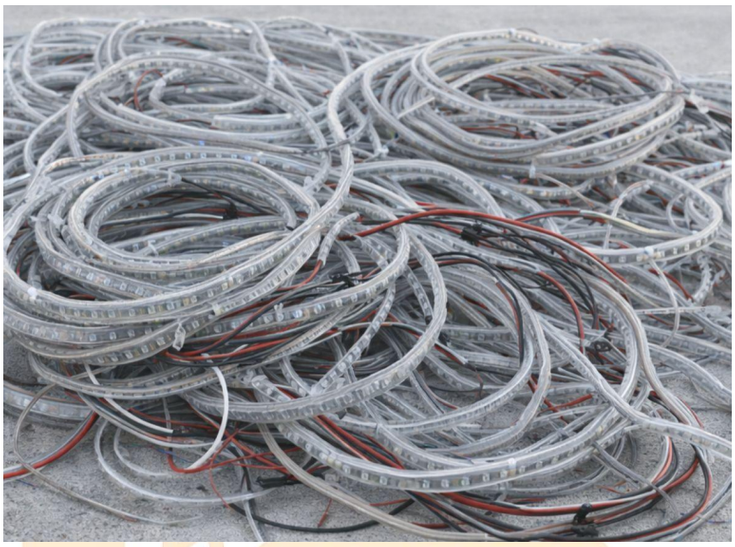


16.07 SUMINISTRO DE POSTE TRASLUCIDO DE 6 A 8M



16.08 SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN PARA POSTES OPALESCENTES CON CINTA RGB

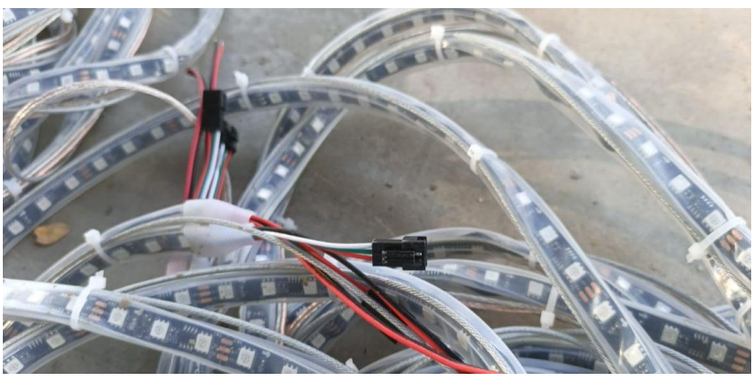

16.10 SUMINISTRO DE GUAYA TENSADA (INCLUYE CLAVE 20X20 POLARIZADO, TERMO ENCOJIBLE NO.3 Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO)

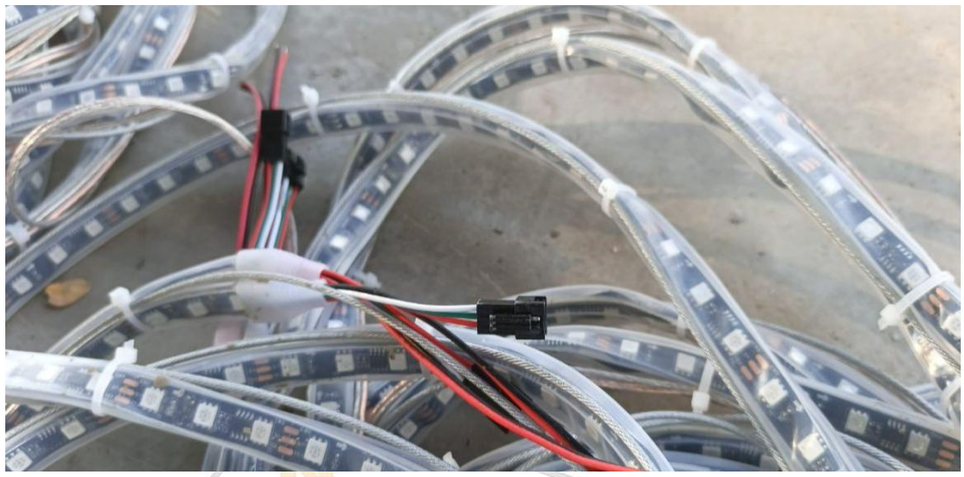

22.03 SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO






23.01 SUMINISTRO DE POSTE OPALESCENTE DE 8 METROS. INCLUYE BRAZO






23.03 SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN PARA POSTES OPALESCENTES CON CINTA RGB

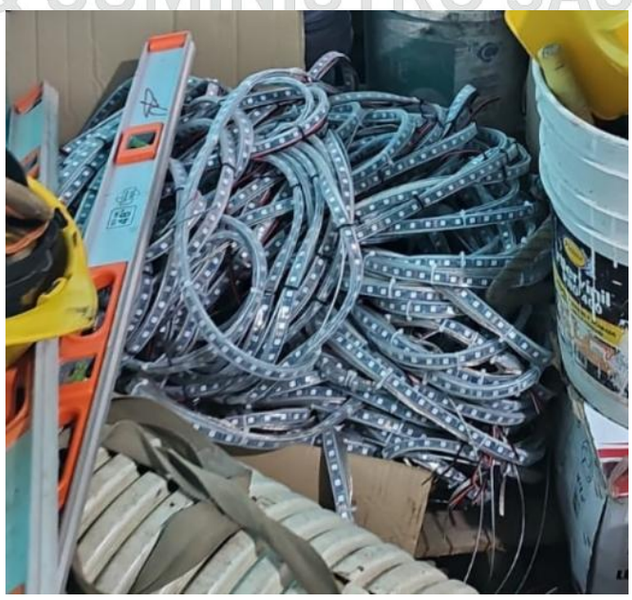

OBRA CIVIL & SUMINISTRO SAS

23.04 SUMINISTRO DE GUAYA TENSADA (INCLUYE CLAVE 20X20 POLARIZADO, TERMO ENCOJIBLE NO.3 Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

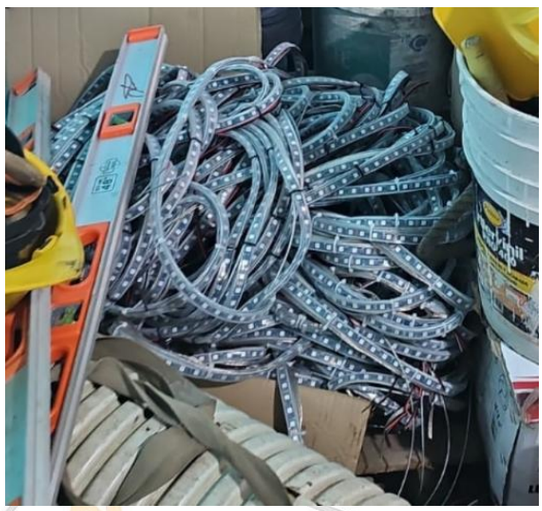


27.05 SUMINISTRO DE ENCHAPE PISO INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA Y/O PEGACOR



30.06 SUMINISTRO DE COMBO SANITARIO INCLUYE LAVAMANOS CON PEDESTAL, GRIFERIA, SANITARIO Y ACCESORIOS.



N.P 9.13 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE 3HP 220V

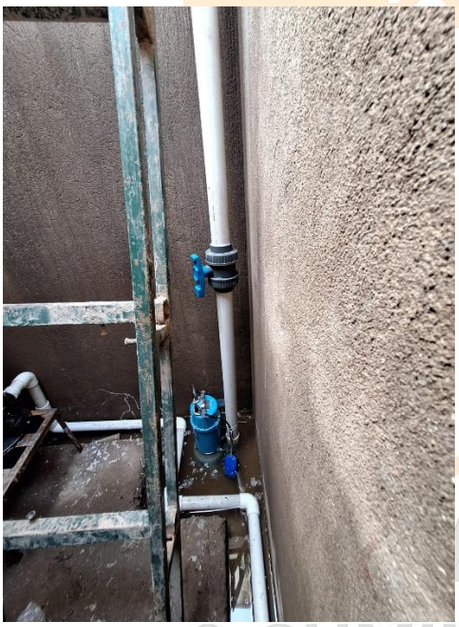N.P 9.15 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 V
 

& SUMINISTRO SAS
NIT. 901963647-5

Atentamente,

Pedro Rusinque

OBRA CIVIL & SUMINISTRO S.A.S
NIT N° 901963647-5
Representante legal: Pedro Alejandro Rusinque Arias.
C.C 1.053.844.066
