ICCU-I-2026-0003645

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

13 de marzo de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0003645**

Folios: 1 Anexos: No

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME MENSUAL 1 5 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Bogotá D, C. 13 de marzo de 2026

Ingeniero
JORGE HERNANDO FORERO FORERO
REPRESENTANTE LEGAL TERRA PROYECTOS CIVILES SAS
AK 15 NO. 100 69 OF 306
terraingenierosltda@gmail.com
Bogotá

Asunto: APROBACIÓN INFORME MENSUAL 1 5 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Ref.: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO EL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

Reciba un cordial saludo,

En atención a la solicitud radicada por correo electrónico el de 18 DICIEMBRE del 2025 mediante el cual TERRA PROYECTOS CIVILES SAS. presenta el informe mensual de interventoría No 1, del periodo comprendido del 5 de NOVIEMBRE al 31 de NOVIEMBRE de 2025 revisión y aprobación de esta entidad.

Una vez verificada la información aportada en estos informes, esta supervisión envío observaciones mediante correo electrónico el 23 de FEBRERO de las 2026 dichas observaciones fueron subsanadas mediante correo electrónico el 4 de MARZO de 2026.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Así las cosas, esta entidad manifiesta que el informe de interventoría No.1 CUMPLE y por lo tanto se da la aprobación.

tud radicada por correo electrónico el de 18 DICIEMBRE del 2025 mediante el cual TERRA PROYECTOS CIVILES SAS. presenta el informe mensual de interventoría No 1, del periodo comprendido del 5 de NOVIEMBRE al 31 de NOVIEMBRE de 2025 revisión y aprobación de esta entidad.

Una vez verificada la información aportada en estos informes, esta supervisión envío observaciones mediante correo electrónico el 23 de FEBRERO de las 2026 dichas observaciones fueron subsanadas mediante correo electrónico el 4 de MARZO de 2026.

Así las cosas, esta entidad manifiesta que el informe de interventoría No.1 CUMPLE y por lo tanto se da la aprobación.

Cordialmente,

QR Validación Documento:

Contraseña:SzKQ3sjpiz

SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial.

Aprobó: JUAN DIEGO JIMENEZ MORENO / DCM
Revisó: JUAN DIEGO JIMENEZ MORENO / DCM
Proyectó: JUAN DIEGO JIMENEZ MORENO / DCM

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	04/03/2025


Acta No.1

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	786-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	5 DE NOVIEMBRE DE 2025		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:


REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: "1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	29/09/2025		
FECHA DE INICIO	05/11/2025		
PLAZO	8	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	04/07/2026		
VALOR TOTAL	5.344.002.688		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	CDP No. 1625 del 25 de junio de 2025 del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, concadenado al CDP-2025000016 del 25 de junio de 2025 emitido por el ICCU		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RER-2025000018 del 15 de octubre de 2025		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	27 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA ☑	PROBINTEC S.A.S.		
MUNICIPIO ☐			
INTERVENTOR ☐	SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ		
SUPERVISOR ☑			
GESTOR DE PROYECTO ☐			
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐			

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	PROBINTEC S.A.S.	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO	
INTERVENTOR ☑	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.	

NOTA:	

OBSERVACIONES:



VO. BO. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL -
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	04/03/2025


Acta No.1

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	884-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	5 DE NOVIEMBRE DE 2025		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	15/10/2025		
FECHA DE INICIO	05/11/2025		
PLAZO	9	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	04/08/2026		
VALOR TOTAL	1.054.622.506		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	CDP No. 1725 del 25 de junio de 2025 del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, concadenado al CDP-2025000017 del 25 de junio		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RER-2025000025 del 4 de noviembre de 2025		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.		
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.	
SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO	
INTERVENTOR ☐	NA	

NOTA:	

OBSERVACIONES:



VO. BO. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL -
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU-CTO-884 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. ICCU-786 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO EL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INFORME MENSUAL No. 01

05/11/2025 – 30/11/2025

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

BOGOTÁ, 02 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

El informe mensual inicia con el siguiente Indice o Contenido que hace las veces de Lista de Chequeo y corresponde a la página uno (1) del informe:

Contrato de Obra No.	**786-2025**	**Contratista:** **PROBINTEC S.A.S.**
Contrato de Interventoría No.	**884-2025**	**Interventoría:** **TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.**

Objeto Contrato de Obra: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: "1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INFORME MENSUAL No.	**01**	**MES O PERIODO:** 05 - 30 NOVIEMBRE 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Interventoría		2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Introducción		6
2	Descripción del proyecto		6
2.1	Localización	MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	6
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		14
2.3	Estado inicial de la vía		14
2.4	Características técnicas del proyecto		18
3	Información Contrato de Obra		18
3.1	Información general contrato de obra		18
3.2	Actividades ejecutadas en el mes		19
3.3	Seguimiento ítems no previstos		26
4	Reportes ejecución mensual contrato de obra		26

4.1	Informe semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	26
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra		27
4.3	Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	27
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		29
4.5	Estado General del Tiempo		29
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		30
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	30
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		30
4.8.1	Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)		30
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		31
4.9.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		31
4.9.2	Seguimiento Programa de Inversión		31
4.9.3	Seguimiento Programa de Obra		31
4.10	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		31
5	Información contrato de interventoría		31
5.1	Información general del contrato de interventoría		31
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		32
5.3	Informes especialistas y profesionales		34
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		35

5.5	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		35
6	Reportes ejecución mensual contrato de interventoría		35
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		35
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	36
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría		37
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	37
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		38
6.5.1	Al momento de la realización de este informe el proyecto se encuentra en la fase de revisión documental para dar inicio a las actividades de campo, una vez efectuado lo anterior se procederá a la entrega del insumo en mención. Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría		38
6.6	Otros Documentos seguimiento mensual		38
6.6.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		38
6.6.2	Seguimiento Programa de Inversión		38
6.6.3	Actas de Comité de Obra	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia	38

		ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	38
6.6.4	Actas de Reunión	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	38
7	Conclusiones y recomendaciones		38
8	Anexos		39
8.1	Correspondencia		39
8.2	Registro fotográfico del avance de las obras.		39
8.3	Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.		39
8.4	Bitácora del mes correspondiente		39
8.5	Certificación componente ambiental y social		39
8.6	Acta de costos de interventoría	MS-GP-FR-033 FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	39

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre:
HÉCTOR ANDRÉS USECHE GUZMAN
Tarjeta Profesional:
25202-82951 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

1 Introducción

El presente informe contiene la información de avance del contrato de interventoría No. ICCU-CTO-884-2025 a cargo de TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S. el cual tiene por objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO EL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.**

Para el alcance del contrato de interventoría, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca contrató la consultoría de siete (7) tramos de vía para la realización de los estudios y diseños de carreteras, a través de la ejecución del siguiente contrato de obra a cargo de esta interventoría.

Contrato No. ICCU-786-2025 Lote 4 PROBINTEC S.A.S.

2 Descripción del proyecto

2.1 Localización

El presente proyecto se encuentra distribuido en siete sectores del departamento de Cundinamarca

LOTE 4						
ITEM	**No**	**MUNICIPIO**	**VÍA**	**LONGITUD (km)**	**MEJORAMIENTO**	**REHABILITACIÓN**
1	25	Carmen de Carupa / Susa	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	15.0	15.0	X
2	2	Albán / Guayabal de Síquima	VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS	8.7	1.2	7.5

3	7	Cucunubá / Ubaté	VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATÉ A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANODE CUCUNUBÁ	5.0	0.5	4.5
4	21	Sesquilé	VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ	4.5	3.5	1.0
5	26	Cajicá / Tabio	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ	3.4	3.4	X
6	4	Chaguaní	VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ	4.1	4.1	X
7	11	Fusagasugá	ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE	2.0	2.0	X
TOTAL				42.7	29.7	13.0


Tabla 1 Zonas a intervenir



UBICADO EN LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA.

El corredor vial correspondiente al tramo T-25 (Susa –Carmen de Carupa), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Susa –Carmen de Carupa. Consta de una longitud total de 15 Km en donde se presenta un estado de conservación variable donde se cuenta con un desgaste vial por falta de drenaje optimo en el corredor vial. Cuenta con un ancho promedio de 7 m de calzada orientada de manera bidireccional donde se hace notoria la ausencia de obras de drenaje funcionales para el óptimo funcionamiento de esta vía.

Ilustración 1 Carmen de Carupa / Susa

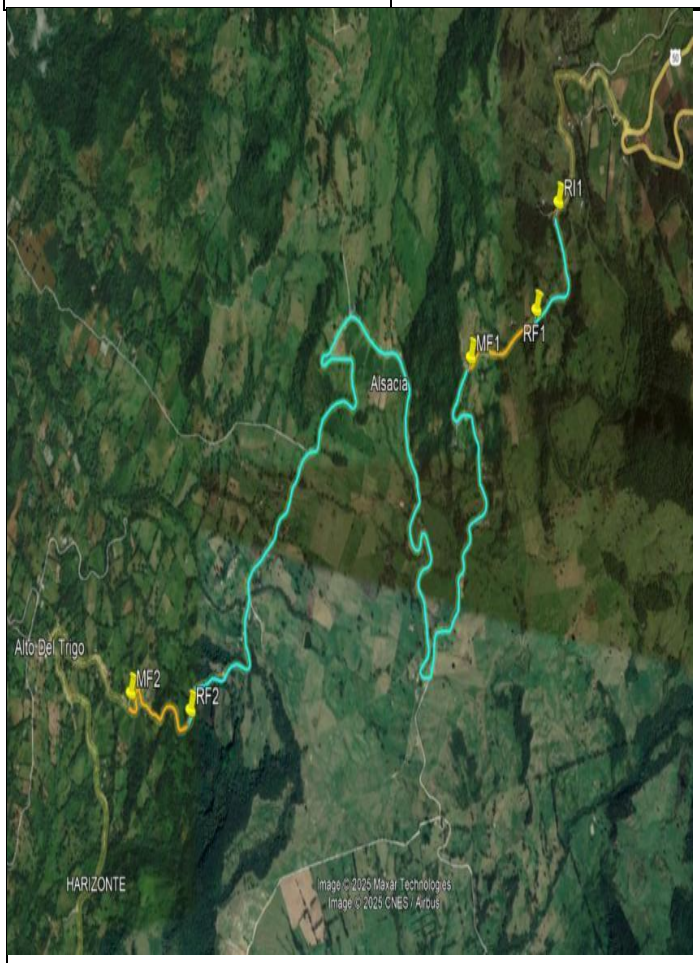


UBICADO EN LA VÍA DEL SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS.

Longitud: 8.7 Kilómetros

El corredor vial correspondiente al tramo T-2 (Los Alpes – Corralejas), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Albán y Guayabal de Síquima, y constituyéndose en un eje de integración regional hacia el sector conocido como Alto del Trigo. Con una longitud total de 8,7 Km a intervenirse con una superficie asfáltica en estado de deterioro con afectaciones debido a la falta de elementos de drenaje superficial óptimos además de algunos sectores no pavimentaos con zonas con anchos de calzada de aproximadamente entre 6 m y 8 m en distintas zonas del sector contando esta zona con una alta presencia de curvas en la carretera aumentando la peligrosidad del tránsito por la falta de drenaje en la misma.


Ilustración 2 Albán / Guayabal de Síquima

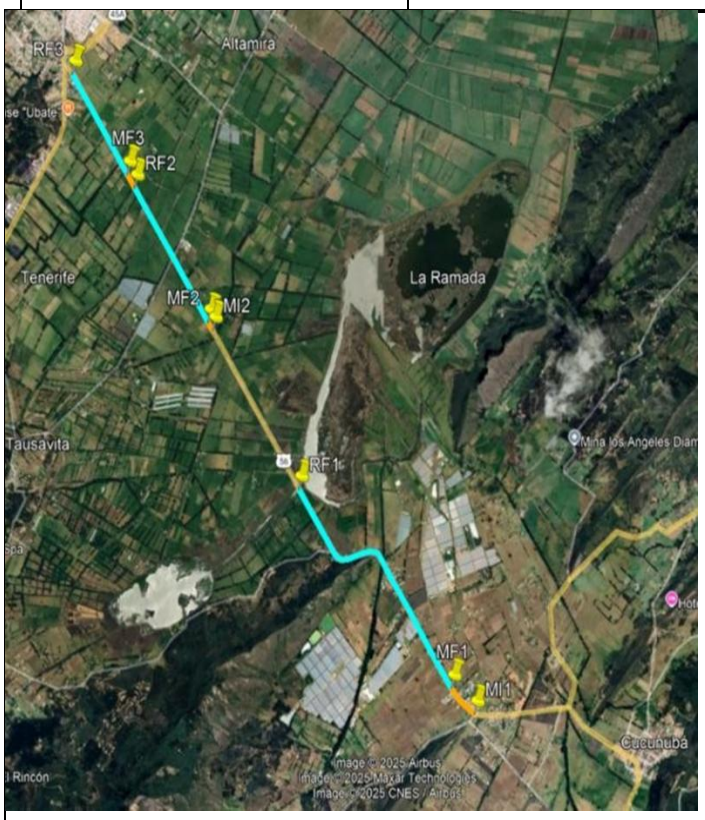

UBICADO EN LA VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATÉ A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ.

El corredor vial correspondiente al tramo T-7 (Ubaté - Cucunuba), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Ubaté – Cucunuba. evidenciando múltiples patologías propias del deterioro avanzado de pavimentos flexibles y ausencia de un adecuado sistema de drenaje superficial y estructural. Consta de un ancho promedio de calzada de 7 m, con una longitud total para la intervención de 5 Km en pavimento flexible en donde se hace notoria la falta de cunetas y elementos de drenaje que permitan el buen funcionamiento del corredor vial en cuestión.


Ilustración 3 Cucunubá / Ubaté

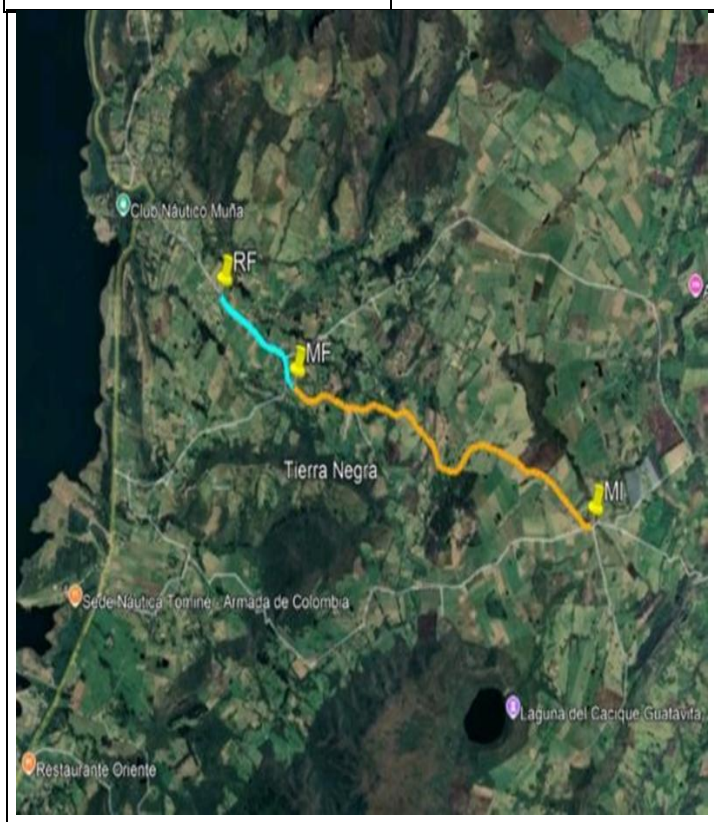

UBICADO EN LA VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ.

El corredor vial correspondiente al tramo T-21 (Sesquilé), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Sesquilé con un total de 4,5 Km destinados a ser intervenidos presentan una superficie variable con zonas destapadas y algunas otras con presencia de pavimento flexible donde se observa un deterioro del corredor vial lo que resulta en una pérdida funcional de la superficie de tránsito. Donde se identificaron anchos variables entre las zonas pavimentadas y menores anchos de calzada en las zonas destapadas, sin presencia de elementos de drenaje.


Ilustración 4 Sesquilé

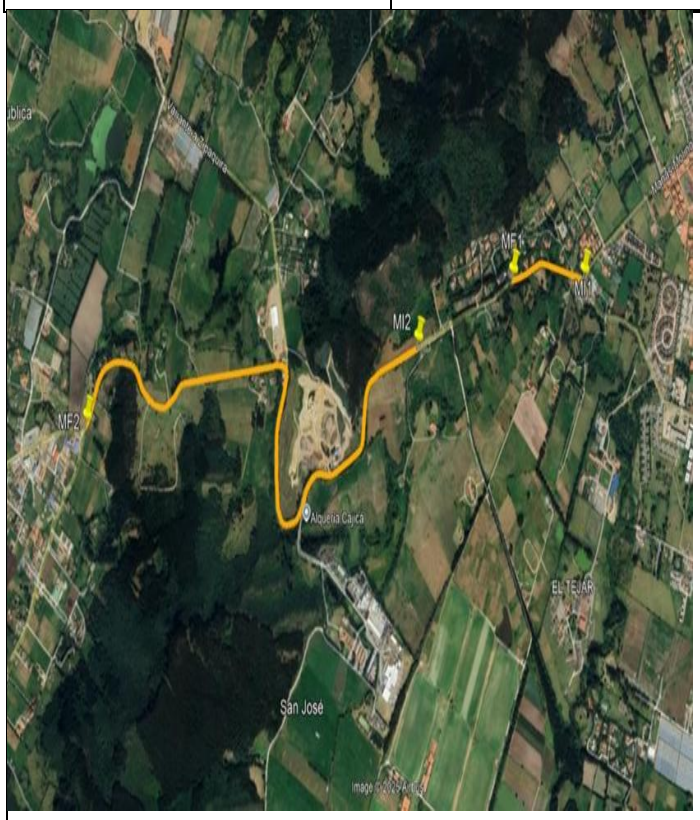

UBICADO EN LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

El corredor vial correspondiente al tramo T-26 (Cajicá - Tabio), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Cajicá – Tabio con una longitud total de 3.4 Km de distancia entre estas 2 localizaciones con una orientación bidireccional promediando en la vía un ancho de 7 metros de calzada. Presentando un estado de conservación deficiente, evidenciando múltiples patologías propias del deterioro avanzado de pavimentos flexibles y ausencia de un adecuado sistema de drenaje superficial y estructural.


Ilustración 5 Cajicá / Tabio

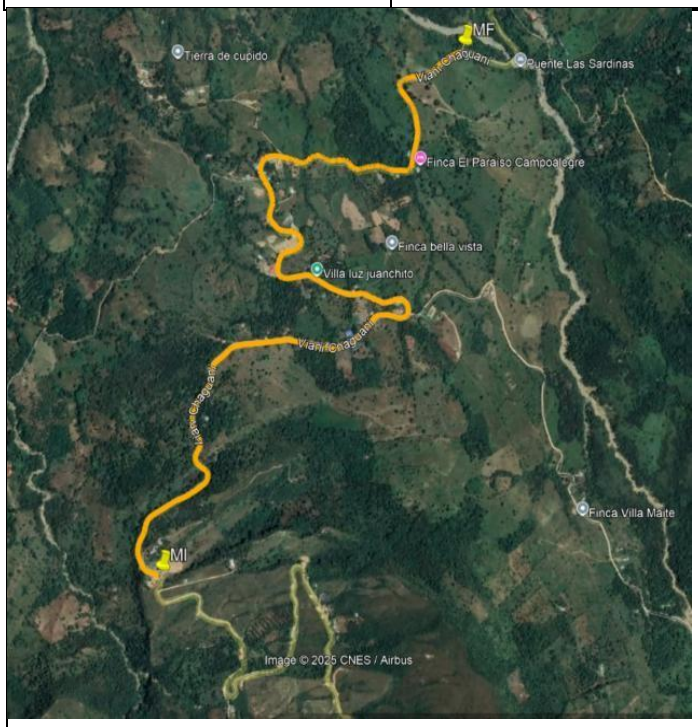

UBICADO EN LA VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ.

El corredor vial correspondiente al tramo T-4 (San Vicente - Chaguaní), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de San Vicente – Chaguaní. En donde se presenta un corredor vial básico no pavimentado al inicio del tramo continuando con zonas pavimentadas con alto grado de deterioro para un total de 4,1 Km de vía a ser intervenidos además de falta de elementos de drenaje que disminuyan el desgaste en la carretera por la presencia de acumulaciones de agua.

Ilustración 6 Chaguaní

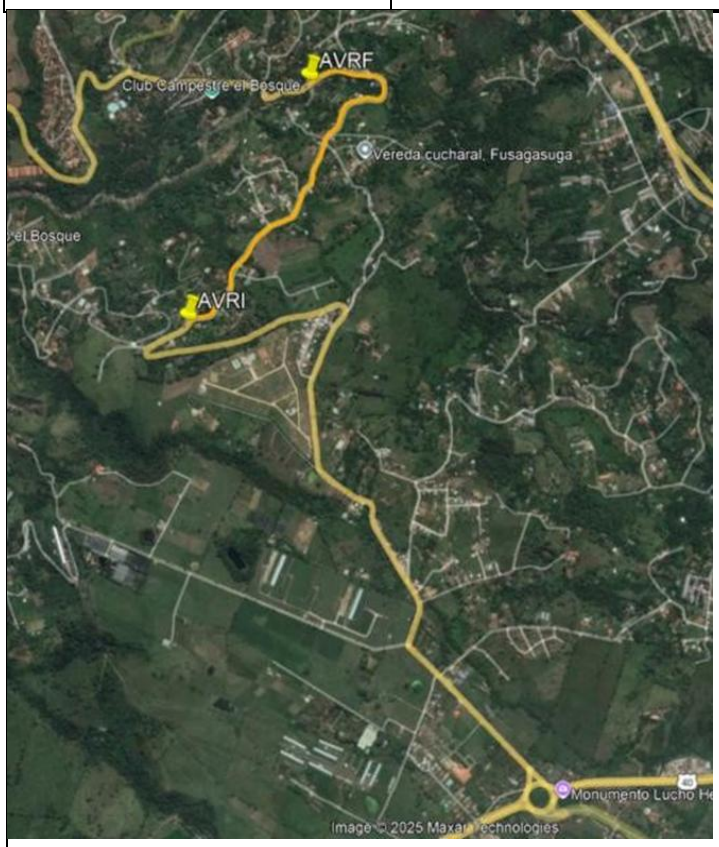

ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

El corredor vial correspondiente al tramo T-11 (Fusagasugá), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Fusagasugá. Con una longitud total para la intervención de 2 km en pavimento asfaltico con presencia de desgaste en múltiples zonas con un desgaste total de la capa asfáltica, con ausencia de elementos de drenaje provocando la presencia de charcos y acumulaciones de agua, promoviendo la inseguridad vial en el tramo especialmente en las zonas curvas del corredor vial.

Ilustración 7 Fusagasugá

2.2 Conectividad, área de influencia y beneficios

Las presentes vías del Lote en cuestión corresponden a corredores encargados de la unión de cascos urbanos, veredas, inspecciones y sectores rurales entre sí, apoyando la conectividad intermunicipal y la salida hacia rutas nacionales, afectando de manera directa 11 municipios con una combinación entre zonas completamente rurales hasta áreas urbanas del departamento de Cundinamarca; impactando de gran manera la zona en cuestión disminuyendo el costo logístico mediante la mejora de las vías, facilitando el transporte de productos agrícolas, evitando la pérdida de productos, aumentando la seguridad vial y la integración de municipios a corredores regionales mediante la mejora del trazado y las condiciones geométricas de las vías presentes, haciendo análisis de posibles amenazas y zonas vulnerables en las carreteras del sector aumentando la seguridad de las comunidades que diariamente hacen uso de estos corredores viales.

2.3 Estado inicial de la vía

Los presentes corredores viales en los cuales se les realizará los estudios y diseños presentan múltiples variaciones en el estado general de los mismos, donde se logran evidenciar secciones de vía pavimentadas en condiciones de desgaste en las vías que comprenden zonas de cascos urbanos y en su gran mayoría corredores viales de zonas completamente rurales en suelo afirmado como se logra evidenciar en los registros fotográficos siguientes:



Visita en campo estado inicial Susa – Carmen de Carupa



Visita en campo estado inicial Sesquile



Visita en campo estado inicial Cajicá - Tabio



Visita en campo estado inicial Fusagasuga



Visita en campo estado inicial Chaguani



Visita en campo estado inicial Alban - Siquima



Visita en campo estado inicial Cucunubá - Ubaté

Tabla 2 Registro fotográfico estado inicial tramos

Durante el mes es cuestión se han venido realizando visitas en campo para la identificación del estado general de los corredores viales a fin de preparar los procesos necesarios al momento de proceder a realizar los estudios y diseños requeridos para estas vías por parte del equipo de consultoría.

2.4 Características técnicas del proyecto

Los estudios y diseños deberán ser entregados por parte del grupo de Consultoría después de haber sido realizadas las pruebas y ensayos necesarios a fin de garantizar uso óptimo de los recursos dispuestos para la ejecución de esta tarea teniendo en cuenta las particularidades de cada tramo a intervenir promoviendo buenas prácticas durante el desarrollo de las actividades y realización de los estudios en cada zona de interés.

3 Información Contrato de Obra

3.1 Información general contrato de obra

	CONSULTOR
PROCESO:	ICCU-CM-017-2025
CONTRATO No.	ICCU-786-2025
CONTRATISTA:	**PROBINTEC S.A.S.** **NIT No. 829.001.061-1**

Tabla 3 Información PROBINTEC S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL:	**DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**
OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: "1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE"
PLAZO INICIAL	8 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	11/5/2025
VALOR INICIAL:	$ 5,344,002,688.00
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	7/4/2026
MODIFICACIÓN	Modificatorio No. 1 – Contrato No. ICCU 786-2025
ANTICIPO:	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO: Se realizará un anticipo por un valor del 20% del valor total del contrato
ASEGURADORA:	Zurich Colombia Seguros S.A

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

Durante el avance del mes en cuestión se realizó las siguientes actividades para cada especialidad involucrada en el proyecto:

- Tránsito y transporte: Elaboración de la metodología de trabajoencampo en donde se expresó la propuesta de ejecución de los trabajos de recolección de

datos para cada uno de los tramos en cuestión para el Lote 4 del proyecto, definiéndose en estos aspectos como la ubicación de la zona donde se ejecutarán los estudios de cada corredor vial de manera general en la zona departamental que este se desarrolla y más específicamente en el área que comprende para cada municipio donde se realizará cada trabajo utilizando herramientas de georreferenciación, se identificaron los insumos con los que se cuenta en esta rama necesarios para la recolección de datos e información en campo sobre volumen vehicular en cada tramo de vía a intervenir, horarios pico de tránsito, variabilidad en el volumen vehicular, definición de los formatos a utilizar para la recopilación de la información en campo, definición del concepto para la clasificación vehicular en automóviles, buses y camiones; identificación de información en campo del desplazamiento vehicular por medio de encuestas en con el objetivo de obtener datos tales como:

- Observar origen y destino de los vehículos que transitan la vía en cuestión.
- Identificación de patrones de recorrido y rutas utilizadas.
- Caracterización de horarios con mayor y menor demanda de la carretera.
- Conocer el propósito del desplazamiento por parte de los usuarios de la vía.
- Aportar insumos al diseño y operación vial.

En donde se define el método a desarrollar para la recolección de datos por medio de encuestas aleatorias diferenciándolas por zona de la vía, hora de la toma, sentido de la ruta, a su vez que se determinar fuentes de información secundarías de elementos que han sido recolectados con el paso del tiempo por distintas entidades como vienen a ser la recolección de datos de peajes administrados por el ANI, censos municipales y planeación local, catastros viales de parte del INVIAS, Gobernación y municipios.

Se continua con la determinación de la metodología de trabajo a implementar en el campo para la recolección de los datos necesarios en donde se buscará tener al final de cada jornada la identificación de cada punto de control establecido para la realización del estudio, determinación del sentido de la vía, registro por intervalos de tiempo para cada categoría vehicular, observaciones del campo tales como el estado del clima, cierres viales, congestión e incidentes en carretera. Se apoyará estos elementos con los respectivos registros fotográficos de la zona en cuestión.

Se definió los recursos entregables finales posterior a la recolección de datos en campo, cronograma de actividades y manera de gestión documental y de la

información, informes que fueron remitidos a la interventoría a fin de recibir las observaciones necesarias para su mejora y validación a fin de dar inicio a las actividades de campo.

- Topografía: Se elaboró la metodología de trabajo para el desarrollo de las actividades topográficas del proyecto, en la cual se definieron de manera integral las fases de planificación, ejecución en campo y procesamiento en gabinete, necesarias para la obtención de información geométrica y altimétrica confiable en los tramos objeto de estudio. En la fase inicial se realizó la identificación y delimitación del área de influencia del proyecto a nivel departamental, municipal y local, determinando los corredores viales y sectores específicos a intervenir, apoyándose en cartografía base, herramientas de georreferenciación y sistemas de información geográfica (SIG), con el fin de garantizar una correcta localización espacial en cada uno de los tramos a intervenir.

  Como parte de la planificación, se identificaron y evaluaron los insumos técnicos con los que se contaba, tales como cartografía oficial, modelos digitales del terreno y estudios previos, los cuales sirvieron como base para la programación de las actividades en campo. Asimismo, se definieron los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de los levantamientos topográficos, incluyendo equipos GNSS, estaciones totales, niveles, prismas y dispositivos de registro digital, estableciendo previamente los procedimientos de verificación, calibración y control de calidad de los mismos. Se determinaron igualmente los sistemas de referencia geodésicos y altimétricos a emplear, asegurando la compatibilidad con la normativa técnica vigente y la cartografía oficial.

  En la fase de ejecución en campo se estableció el procedimiento para la materialización de la red de control topográfico horizontal y vertical, mediante la selección de puntos estratégicos y la realización de observaciones GNSS y nivelaciones geométricas, garantizando la precisión y confiabilidad de los datos. Posteriormente, se definió la metodología para la toma de información planimétrica y altimétrica, incluyendo el levantamiento detallado del eje vial, bordes de calzada, cunetas, estructuras existentes, obras de drenaje, accesos, edificaciones, secciones transversales y perfiles longitudinales, así como demás elementos físicos relevantes presentes en el área de estudio.

  La metodología contempla la definición de criterios técnicos como densidad de puntos, intervalos de medición y tolerancias admisibles, los cuales se ajustan de acuerdo con el tipo de terreno, la complejidad geométrica del corredor y las

condiciones del entorno. Durante la recolección de información se establecieron protocolos para el registro sistemático de los datos en formatos de campo estandarizados, la codificación adecuada de los puntos levantados y el respaldo digital diario de la información obtenida. Adicionalmente, se consideró el registro de observaciones de campo relacionadas con condiciones climáticas, accesibilidad, interferencias, restricciones físicas y particularidades del terreno, las cuales fueron complementadas con registros fotográficos georreferenciados.

Finalmente, la metodología establece los productos entregables, el cronograma de actividades y la estrategia de gestión documental y de la información, definiendo la estructura de los informes técnicos a presentar. Dichos informes serán remitidos a la interventoría para su revisión y validación, permitiendo la implementación de los ajustes necesarios y garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos antes y durante el desarrollo de las actividades de campo. De manera similar se remitió la propuesta de descripción de las placas de identificación para la topografía del proyecto.

- Geología: Se elaboró la metodología de trabajo para el desarrollo de los estudios geológicos del proyecto vial, definiendo las fases de planificación, trabajo de campo y análisis, orientadas a la caracterización geológica del área de influencia. En la etapa inicial se realizó la recopilación y revisión de información secundaria existente, incluyendo cartografía geológica oficial, estudios previos, fotografías aéreas y modelos digitales del terreno, con el fin de establecer el contexto geológico regional y local de los siete corredores viales a intervenir.

  En la fase de campo se estableció el procedimiento para el reconocimiento geológico de los tramos del proyecto, contemplando la identificación y descripción de unidades litológicas, estructuras geológicas, fallas, fracturas, zonas de debilidad y procesos de inestabilidad presentes en el área. Se definieron los criterios para la ubicación de estaciones de observación, el registro de afloramientos, taludes naturales y cortes existentes, así como la documentación de evidencias de movimientos en masa, erosión y meteorización.

  La metodología incluyó el levantamiento de información mediante registros descriptivos, fotografías georreferenciadas y esquemas de campo, garantizando la correcta localización de los elementos observados. Se realizará el análisis e interpretación de la información recolectada, integrándola con los insumos secundarios para la elaboración de mapas geológicos, perfiles interpretativos y

la identificación de condicionantes geológicos que puedan influir en el diseño vial. Finalmente, se definieron los productos entregables, cronograma y estructura de los informes técnicos, los cuales fueron remitidos a la interventoría para su revisión y validación.

- Geotecnia: Se definió la metodología de trabajo para los estudios geotécnicos del proyecto vial, estableciendo las actividades necesarias para la caracterización del suelo y la roca a lo largo de los corredores viales objeto de estudio. En la fase de planificación se plantea la recopilación y análisis información secundaria disponible, incluyendo estudios geotécnicos previos, cartografía geológica, topográfica y registros de intervenciones existentes, con el fin de orientar la ubicación y alcance de las exploraciones en campo.

  La fase de ejecución contempla la realización de exploraciones directas e indirectas, tales como perforaciones, calicatas, sondeos y ensayos in situ, definiendo los procedimientos para la toma de muestras alteradas e inalteradas. Se establecieron los criterios para la ejecución de ensayos de laboratorio, orientados a la determinación de propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de los materiales. Adicionalmente, se incluye la evaluación de condiciones de estabilidad de taludes, capacidad portante, asentamientos y comportamiento del terreno ante cargas viales.

  Se ejecutará un análisis e interpretación de los resultados obtenidos, integrando la información de campo y laboratorio para la elaboración de perfiles geotécnicos, modelos de suelo y recomendaciones de diseño. Serán definieron los productos técnicos, cronograma y esquema de presentación de informes, los cuales fueron remitidos a la interventoría para su revisión, observaciones y validación.

- Hidrología e hidráulica: Elaboración de la propuesta de metodología de trabajo para los estudios hidrológicos e hidráulicos del proyecto vial, orientada a la evaluación del comportamiento de las corrientes superficiales y el drenaje asociado a los corredores viales. En la fase inicial se planifica la recopilación de información secundaria como registros hidrometeorológicos, cartografía hidrográfica, estudios previos y datos de entidades competentes, con el fin de caracterizar las cuencas y subcuencas que interactúan con el proyecto.

  En la fase de campo se estableció el procedimiento para la identificación y caracterización de cauces, drenajes, obras hidráulicas existentes y zonas

susceptibles a inundación o socavación. Se definieron los criterios para la toma de datos geométricos de secciones hidráulicas, niveles de agua, pendientes y condiciones del cauce, complementados con registros fotográficos y georreferenciados. En la fase de análisis se desarrollaron los estudios hidrológicos para la estimación de caudales de diseño y los análisis hidráulicos para la verificación y diseño de obras de drenaje transversal y longitudinal. Los resultados fueron consolidados en informes técnicos, definiendo los productos entregables, cronograma y gestión documental, los cuales fueron sometidos a revisión y validación por parte de la interventoría.

- Estructuras: Definición de la propuesta de metodología de trabajo para el desarrollo de los estudios y diseños estructurales del proyecto vial, orientada a la evaluación y diseño de las estructuras requeridas para la infraestructura en los siete tramos viales establecidos en el proyecto. En la fase de planificación se realizará la recopilación y análisis de información secundaria, incluyendo diseños existentes, normatividad vigente, estudios geotécnicos e hidráulicos, con el fin de establecer los criterios de diseño aplicables.

  Se establece el procedimiento para la inspección y levantamiento de información de estructuras existentes, tales como puentes, box culverts, alcantarillas y muros, identificando su estado estructural, dimensiones, materiales y posibles patologías. La metodología incluirá el registro fotográfico y la verificación de condiciones de operación y seguridad.

  Se efectuará el análisis estructural necesario, definiendo tipologías, materiales, cargas de diseño y verificaciones normativas. Finalmente, se establecieron los productos entregables, planos, memorias de cálculo, cronograma y presentación de informes. Esta propuesta se remitió a la interventoría para su revisión y validación.

- Ambiental: Se plantea la metodología de trabajo para los estudios ambientales del proyecto, orientada a la identificación, evaluación y manejo de los impactos ambientales asociados al desarrollo del proyecto en cada una de las zonas comprendida por los corredores viales en cuestión. Se proyecta la recolección información secundaria sobre el área de influencia, verificando normatividad ambiental vigente, instrumentos de ordenamiento territorial y estudios previos.

Se definieron los procedimientos para la identificación y caracterización de componentes ambientales, tales como medio físico, biótico y socioeconómico, mediante recorridos, registros de campo y documentación fotográfica. Se contempló la identificación de áreas sensibles, restricciones ambientales y posibles conflictos asociados al proyecto vial.

En la fase de análisis se evaluaron los impactos ambientales potenciales y se formularon medidas de manejo, prevención, mitigación y compensación. Finalmente, se definieron los productos entregables, cronograma y estructura de los informes ambientales, consolidando la propuesta metodológica de esta especialidad para ser remitida a la interventoría para su revisión y validación.

- Gestión predial: Se definió la metodología de trabajo para la gestión predial en las zonas de interés concernientes a los corredores viales, orientada a la identificación y caracterización de los predios requeridos para la ejecución del proyecto, recopilación de información catastral, registral y cartográfica disponible, con el fin de delimitar las áreas de afectación predial.

  En la fase de campo se estableció el procedimiento para la verificación predial, incluyendo visitas técnicas, identificación de linderos, usos del suelo, mejoras y ocupaciones existentes. La metodología contempló el levantamiento de información socioeconómica básica y el registro fotográfico de cada predio afectado, finalizando el análisis de la información recolectada, consolidando fichas prediales, planos de afectación y bases de datos. En esta fueron definidos los productos entregables, cronograma y presentación de informes.

- Costos y presupuesto: Se preparó la metodología de trabajo para la estimación de costos y la elaboración del presupuesto del proyecto definidos para los tramos del Lote 4 del proyecto, orientada a la definición de cantidades de obra y costos asociados. Definiendo la recolección de información técnica proveniente de los estudios de topografía, geotecnia, estructuras, hidráulica y diseño geométrico, así como precios de referencia y bases de datos oficiales.

  Fueron establecieron los procedimientos para el cálculo de cantidades de obra, la estructuración de análisis de precios unitarios (APU) y la elaboración del presupuesto general del proyecto. Se definieron criterios para la inclusión de costos directos, indirectos, imprevistos y ajustes normativos.

Finalmente, la metodología contempló la consolidación de los productos entregables y estructura de los informes de costos y presupuesto, información consolidada en la propuesta metodológica de la presente especialidad remitidos a la interventoría para su revisión, definición de observaciones, comentarios y validación.

- Preparación de la programación de las primeras visitas de campo en conjunto con los especialistas de la interventoría y la consultoría.

- Se realizaron mesas de trabajo conjuntas entre el equipo de consultoría e interventoría a fin de aclarar dudas y plantear las metodologías de trabajo por parte del equipo consultor y las verificaciones del plan de campo presentado ante la interventoría para su revisión y aprobación.

- Revisión, consolidación y entrega formal a la interventoría y a la entidad contratante de las hojas de vida, certificados, soportes académicos y experiencia del equipo profesional, conforme a lo exigido en el Anexo Técnico.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

Al momento de la realización de este informe no han sido incluidos ítems no previstos para la ejecución de este contrato:

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

4 Reportes ejecución mensual contrato de obra

4.1 Informe semanal

Se anexan informes semanales:

- No. 01: 05/11/2025 – 09/11/2025
- No. 02: 10/11/2025 – 16/11/2025
- No. 03: 17/11/2025 – 23/11/2025
- No. 04: 24/11/2025 – 30/11/2025

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Durante el presente período del informe en cuestión no se dispuso de maquinaria y equipos en obra debido al proceso inicial de preparación documental para los estudios y diseños del proyecto.

4.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Durante el mes en cuestión se realizó por parte del equipo de consultoría dedico sus labores a la elaboración y preparación de las metodologías de trabajo de las distintas especialidades establecidas en el contrato de obra, cronogramas y programación de campo y demás documentación necesaria para dar inicio a las actividades de estudios y diseños en campo. Así mismo se realizaron distintas mesas de trabajo conjunto entre el equipo de interventoría y consultoría en sus distintas áreas para la aclaración de dudas y coordinación de trabajo a para el optimo desarrollo de las actividades contractuales.

El siguiente listado pertenece al personal del equipo de Consultoría:

Director de Proyecto	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Especialista en Pavimentos	EDUARDO CASTAÑEDA
	BENJAMIN DANIEL SIERRA LEÓN
Especialista en Tránsito y Transporte	GIOVANNI ENRIQUE MELO ZAPATA
	JEAN PAUL MEJIA ORTIZ
Especialista en Seguridad Vial	MONICA YANETH SUAREZ CASTELLANOS
	MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ
Especialista en Geotecnia	WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ
	DANNY FERNANDO ARCINIEGAS LÓPEZ
Especialista en Diseño Geométrico	EDUARDO ALBERTO CASTAÑEDA PINZÓN
	JUAN CARLOS FORERO SARMIENTO

	CLAUDIA PATRICIA RINCON MONSALVE
Especialista BIM	JOSE ARMANDO VILLAMIZAR RODRÍGUEZ
	JAIRO ALBERTO VASQUEZ LIZARAZO
Especialista en Estructuras	SAMUEL MONTERO VARGAS
	DARIO GUERRERO MANTILLA
Especialista Forestal	MARÍA ALEXANDRA BAUTISTA BAYONA
	ANGEL MARIA CORZO PRIETO
Especialista Ambiental	SANDRA PAOLA CASTELLANOS SOLANO
	WALTER MANRIQUE MEJIA
Especialista en Hidráulica e Hidrología	JUAN CARLOS FORERO SARMIENTO
	ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ
Geólogo	HECTOR HERNÁNDEZ OSSES
	LEONARDO OCTAVIO OLARTE SANCHEZ
Profesional Gestor Social	LESSLY ANDREA CASTELLANOS AVENDAÑO
	JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON
Profesional de Costos y Presupuestos	EDGAR DUARTE ARGUELLO
	JULIÁN ANDRÉS ROJAS ARIZA
Ingeniero Residente - Apoyo Consultoría	CASTRO VASQUEZ MARYORY ALEJANDRA
	GERMAN PEREZ PINTO
	VALERIA ANGELICA SALINAS PEREZ

Ingeniero catastral y Geodesta	MARTHA MERCEDES GARCIA GARCIA
Abogado (Con Conocimiento en Estudio de Título Predial)	MANUEL HERNANDO BECERRA ARAQUE
Avaluador	JUAN SEBASTIAN LOPEZ CUADROS
Hidrogeólogo	JEYSON ANDRES VERA VIANA
Biólogo	MARIA IDALÍ TACHACK GARCIA
	ANDRES CAMILO QUIÑONES GUERRERO
Profesional en Riesgos	CESAR AUGUSTO OBREGON RODRIGUEZ

Tabla 4 Personal Consultoría

Se anexa oficio de aprobación de personal del equipo de consultoría remitido por parte de la Interventoría.

Entidad	PROBINTEC S.A.S.
NIT	829001061-1
Correo electrónico	probintecsas@gmail.com
Número de contacto	3161147965
Representante Legal	Diana Esperanza Moreno Florez

Tabla 5 Datos CONSULTORÍA

Se anexa formato HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

El consultor PROBINTEC S.A.S., contratista del Contrato de Consultoría No. ICCU-786-2025, mediante la comunicación 003-OF141125 hace entrega de los documentos de inicio: plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría, que se encuentran en revisión de interventoría. Durante el período de tiempo es cuestión no se ha efectuado

4.5 Estado General del Tiempo

En revisión por parte de interventoría a los documentos de: Hojas de Vida, plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos

requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría. No se realizan tareas en campo durante el presente período del informe en cuestión.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

El consultor PROBINTEC S.A.S., contratista del Contrato de Consultoría No. ICCU-786-2025, mediante la comunicación 003-OF141125 hace entrega de los documentos de inicio: plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría, que se encuentran en revisión de interventoría. Al momento de la realización del presente informe no se han realizado ensayos de laboratorio por parte del equipo de consultoría.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	SGPL-223339735-1	$ 1.068.800.536,00	05/11/2025 - 05/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SGPL-223339735-1	$ 1.068.800.536,00	05/11/2025 - 05/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SGPL-223339735-1	$ 1.068.800.536,00	05/11/2025 - 05/07/2029
Calidad del servicio	SGPL-223339735-1	$ 1.603.200.804,00	05/07/2026 - 05/07/2031

Tabla 6 Pólizas contrato PROBINTEC S.A.S.

Se anexa ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS del contrato de consultoría.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

En revisión por parte de interventoría a los documentos de: Hojas de Vida, plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría.

4.8.1 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

En revisión por parte de interventoría a los documentos de: Hojas de Vida, plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

En revisión por parte de interventoría a los documentos de: Hojas de Vida, plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría.

4.9.2 Seguimiento Programa de Inversión

El consultor PROBINTEC S.A.S., contratista del Contrato de Consultoría No. ICCU-786-2025, mediante la comunicación 003-OF141125 hace entrega de los documentos de inicio: plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría, que se encuentran en revisión de interventoría.

4.9.3 Seguimiento Programa de Obra

El consultor PROBINTEC S.A.S., contratista del Contrato de Consultoría No. ICCU-786-2025, mediante la comunicación 003-OF141125 hace entrega de los documentos de inicio: plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría, que se encuentran en revisión de interventoría.

4.10 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

El consultor PROBINTEC S.A.S., contratista del Contrato de Consultoría No. ICCU-786-2025, mediante la comunicación 003-OF141125 hace entrega de los documentos de inicio: plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría, que se encuentran en revisión de interventoría.

5 Información contrato de interventoría

5.1 Información general del contrato de interventoría

	INTERVENTORIA
PROCESO:	ICCU-CM-042-2025
CONTRATO No.	ICCU-CTO-884-2025

CONTRATISTA:	**TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S** **Nit. 901788878 -1**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JORGE HERNANDO FORERO FORERO**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.
PLAZO INICIAL	Nueve (9) meses, contados a partir del ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	11/5/2025
VALOR INICIAL:	$ 1,054,622,500.00
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	8/4/2026
ANTICIPO:	No Aplica
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

Tabla 7 Información TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el mes en cuestión se han venido realizando por parte del equipo de interventoría tareas de revisión documental inicial necesarias para la definición de las objetivos y parámetros a seguir durante la recopilación de la información para la

ejecución de los estudios y diseños por parte del equipo de consultoría, las actividades en ejecutadas son las siguientes:

- Revisión de las distintas metodologías de trabajo para cada una de las especialidades necesarias para la ejecución del proyecto: Pavimentos, Tránsito y transporte, Seguridad vial, Geotecnia, Diseño geométrico, Estructural, Ambiental, Hidráulica e hidrológica, Geología, Gestión social, Costos y presupuestos; en donde se realizaron los comentarios pertinentes a cada una de las áreas de especialidad en cuestión para la mejora en la claridad de la información, dándose recomendaciones para la discriminación y detalle de la información, solicitando la separación de la información con un mayor grado de especificidad en los componentes necesarios para cada metodología, desde la planificación de los elementos necesarios para la recolección de datos.

  Determinando parámetros de verificación, señalando mejores y aspectos a tener en cuenta basados en los requerimientos establecidos en el anexo técnico de obra y el anexo técnico de interventoría a fin de presentar una información, clara, detallada y veraz para dar inicio de manera eficiente a las labores de recolección y análisis de los datos compilados en el campo para cada uno de los tramos del Lote 4 del proyecto.

- Revisión de la programación de obra para aprobación de la documentación inicial requeridas para el inicio de las actividades de consultoría.

- Se realizaron mesas de trabajo conjuntas entre el equipo de consultoría e interventoría a fin de aclarar dudas y plantear las metodologías de trabajo por parte del equipo consultor y las verificaciones del plan de campo presentado ante la interventoría para su revisión y aprobación.

- Acompañamiento durante los comités semanales de seguimiento de avance de obra en conjunto con la consultoría y la entidad contratante.

- Revisión de hojas de vida del personal especialista del equipo de consultoría para validación del personal necesario para la ejecución del proyecto.

- Revisión del plan de campo detallado para cada uno de los componentes y especialidades requeridas para la ejecución del proyecto.

5.3 Informes especialistas y profesionales

Durante el mes del informe se realizaron múltiples tareas de revisión y verificación de información por parte de los especialistas del equipo de interventoría en las áreas de:

- Pavimentos.
- Tránsito y transporte.
- Seguridad vial.
- Geotecnia.
- Diseño geométrico.
- Estructural y estructural (Puentes).
- Hidráulica e hidrológica.
- Geología.
- Gestión social.
- Costos y presupuestos.
- Catastral y geodesta.
- Abogado.
- Avaluador.

Los antes mencionados encargados de la revisión de la metodología de trabajo presentada por el equipo de consultoría, adición de comentarios y sugerencia de modificaciones basándose a los lineamientos establecidos en el anexo técnico de obra y el anexo técnico de interventoría en conjunto con lo establecido en los pliegos de condiciones y demás documentos provistos por parte de la entidad contratante para el pleno desarrollo de las actividades de elaboración de los estudios y diseños en la zona demarcada.

Así mismo se hace uso de los ingenieros residentes y secretaria para el apoyo, agilización de los procesos documentales, recepción y control de información remitida y requerida por parte de las entidades involucradas en el proyecto y dinamismo de las comunicaciones entre la entidad contratante y el equipo de consultoría tanto en medios digitales como de manera presencial.

Entre las principales observaciones presentadas por los especialistas sobre los entregables remitidos por parte de la consultoría se encuentra el ceñirse en cada una de las metodologías a lo requerido por parte de la entidad contratante para un mayor

control de los resultados esperados y un aumento en el grado de detalle y especificidad sobre cada proceso a ejecutar en el desarrollo de los estudios y diseños.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Al momento de la realización del presente informe mensual de actividades, el informe del Programa Anual de Caja (PAC) se encuentra en elaboración por parte del equipo de consultoría, la cual será anexada una vez sea remitida por este último.

5.5 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Para ambas partes involucradas en la ejecución del presente contrato, tanto el personal calificable de la consultoría como el personal calificable de la interventoría cumplen con los criterios necesarios para la asignación de puntaje que fueron requeridos por parte de la entidad contratante.

El personal calificable en cuestión para cada una de las partes es el siguiente:

Consultoría:

Director de Proyecto	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Especialista en Geotecnia	WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ
	DANNY FERNANDO ARCINIEGAS LÓPEZ

Tabla 8 Personal calificable PROBINTEC S.A.S

Interventoría:

Director de Interventoría	ANDRÉS USECHE
Especialista en Geotecnia	CARLOS GARCÍA

Tabla 9 Personal calificable TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Vehículo	Marca	Modelo	Año	Placa
Camioneta	CREVROLET	Captiva	2014	HTL722
Camioneta	JEEP	Grand Cherokee	2014	IEM303

Tabla 10 Vehículos Interventoría

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Durante el mes en cuestión se realizaron por parte del equipo de interventoría el control de las comunicaciones e información entre la entidad contratante y el equipo de consultoría, la revisión de las metodologías de cada una de las distintas áreas necesarias para el desarrollo del proyecto, así mismo como la validación y supervisión de cronogramas, planes de campo y participación de mesas de trabajo conjunto y comités de seguimiento de avance de la mano la entidad contratante y del equipo de consultoría para la resolución de inquietudes y coordinación de trabajo para la elaboración de los documentos necesarios para el inicio de las labores de estudios y diseños contratados.

INGENIERO TRANSITO Y TRANSPORTE	FABIAN TAFUR	CUMPLE
INGENIERO SST	FABIAN TAFUR	CUMPLE
INGENIERO ESTRUCTURAS	KEVIN DIAZ	CUMPLE
INGENIERO ESTRUCTURAS PUENTES	KEVIN DIAZ	CUMPLE
INGENIERO HIDRAULICO	RICARDO TAFUR	CUMPLE
GEOLOGO	ALBERTO FANDIÑO	CUMPLE
PROFESIONAL SOCIAL	ROCIO LEAL	CUMPLE
COSTOS Y PRESUPUESTOS	CARLOS BARRERA	CUMPLE
RESIDENTE 1	ALEJANDRA ROSERO	CUMPLE
RESIDENTE 2	DANIEL CHARRIS	CUMPLE
CATASTRAL Y GEODESTA	JUAN VANEGAS	CUMPLE
ABOGADO	JENNY BOHORQUEZ	CUMPLE
AVALADOR	PAOLA SANCHEZ	CUMPLE
TOPOGRAFO	EDGAR IBAÑEZ	CUMPLE
DIRECTOR	ANDRÉS USECHE	CUMPLE

GEOTECNISTA	CARLOS GARCÍA	CUMPLE

Tabla 11 Personal Interventoría

Entidad	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.
NIT	901.788.878-1
Correo electrónico	interventorialote4iccu@gmail.com
Número de contacto	3122958359
Representante legal	Jorge Hernando Forero Forero

Tabla 12 Datos INTERVENTORÍA

Se anexa BASE REVISION CALCULO DE SEGURIDAD SOCIAL

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Para el mes en cuestión del presente informe se realiza la revisión del plan de inversión del anticipo, en donde se realiza repartición de gastos en pagos al personal especialista, estudios y ensayos incluyéndose el transporte del personal y equipos al campo para recolección de datos e información además del gasto de alquiler de equipos, oficina, mobiliaria y otros elementos necesarios para el desarrollo óptimo de las tareas establecidas en el anexo técnico de obra.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	11-44-101267297	$ 105.462.250,60	07/10/2025 10/01/2027
Prestaciones sociales	11-44-101267297	$ 210.924.501,20	07/10/2025 10/07/2027
Calidad del servicio	11-44-101267297	$ 210.924.501,20	07/07/2026 07/07/2031

Tabla 13 Pólizas contrato TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

Se anexa ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS del contrato de interventoría.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Al momento de la realización de este informe el proyecto se encuentra en la fase de revisión documental para dar inicio a las actividades de campo, una vez efectuado lo anterior se procederá a la entrega del insumo en mención.

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

Al momento de la realización de este informe el proyecto se encuentra en la fase de revisión documental para dar inicio a las actividades de campo, una vez efectuado lo anterior se procederá a la entrega del insumo en mención.

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

En revisión por parte de interventoría a los documentos de: Hojas de Vida, plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría.

6.6.2 Seguimiento Programa de Inversión

En revisión por parte de interventoría a los documentos de: Hojas de Vida, plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría.

6.6.3 Actas de Comité de Obra

Se anexa:

- ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

6.6.4 Actas de Reunión

Se anexa:

- ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

7 Conclusiones y recomendaciones

Se ejecutan por parte del equipo de consultoría la realización y desarrollo de las metodologías de trabajo, plan de campo, cronogramas y demás documentos necesarios para el inicio de las actividades en campo de la consultoría donde se recomienda por parte del equipo de interventoría la celeridad en los procesos y la precisión a la hora de

desarrollar dichos pliegos a fin de dar validación de los mismos, generando de esta manera un mayor avance en las actividades de estudios en campo para cada uno de los siete (7) tramos comprendidos para el Lote #4, así mismo buscar una mejora de la comunicación y cumplimiento de los compromisos dentro de los tiempos establecidos por la entidad contratante en busca de ejecutar todas las tareas señaladas con la menor cantidad de contratiempos posibles. Se hace necesario un mayor cuidado a la hora de generar las subsanaciones a las observaciones y comentarios presentados por parte del equipo de interventoría sobre la documentación remitida por parte de la consultoría.

8 Anexos

8.1 Correspondencia

Se anexa registro de correspondencia.

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

Se anexa registros fotográficos.

8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

Se anexa registros fotográficos.

8.4 Bitácora del mes correspondiente

Al momento de la realización de este informe el proyecto se encuentra en la fase de revisión documental para dar inicio a las actividades de campo, una vez efectuado lo anterior se procederá a la entrega del insumo en mención.

8.5 Certificación componente ambiental y social

Al momento de la realización de este informe el proyecto se encuentra en la fase de revisión documental para dar inicio a las actividades de campo, una vez efectuado lo anterior se procederá a la entrega del insumo en mención.

8.6 Acta de costos de interventoría

Se anexa ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA.

Link de los ANEXOS

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/15i206vca4N8K1TGssLsCYnxEr2okkuEY

	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA N° 1 **FECHA:** 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

ACTA FINAL SI | NO x (INDICAR CON UNA "X")

VALOR ACTA: $ 83,592,133.00 **PERIODO:** 5/11/2025 al 30/11/2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-884-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INTERVENTORÍA: TERRA PROYECTOS I CIVILES S.A.S **CONTRATISTA:** PROBINTEC S.A.S

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES **PLAZO ACTUAL:** NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: 5-nov-25 **FECHA DE FIN:** 4-ago-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A** N.A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506.00 **VALOR CON ADICIONES:** $ 1,054,622,506.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				
Director de Interventoría	$ 8,630,000.00	III-3	1	40%	9	2.3	$ 71,456,400.00	**1**	**40%**	**9**	**$ 71,456,400.00**	**1**	**40%**	**0.40**	**$ 3,175,840.00**	**1**	**40%**	**0.40**	**$ 3,175,840.00**	**$ 68,280,560.00**
Especialista Pavimentos	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Tránsito y Transporte	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Seguridad Vial	$ 7,050,000.00	II-4	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Geotecnia	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Diseño Geométrico	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en BIM	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	4	2.3	$ 32,430,000.00	**1**	**50%**	**4**	**$ 32,430,000.00**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**$ 32,430,000.00**
Especialista en Estructuras	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Estructuras (Puentes)	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista Ambiental	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	5	2.3	$ 35,592,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 35,592,500.00**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**$ 35,592,500.00**
Especialista Forestal	$ 6,190,000.00	II-3	1	50%	5	2.3	$ 35,592,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 35,592,500.00**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**$ 35,592,500.00**
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Geólogo	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Profesional Gestor Social	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	5	2.3	$ 35,592,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 35,592,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**$ 32,033,250.00**
Profesional de Costos y Presupuestos	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	**1**	**50%**	**4**	**$ 28,474,000.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**$ 24,914,750.00**
Ingeniero Residente - Apoyo Consultoría	$ 1,900,000.00	II-2	2	100%	9	2.3	$ 78,660,000.00	**2**	**100%**	**9**	**$ 78,660,000.00**	**2**	**100%**	**0.40**	**$ 3,496,000.00**	**2**	**100%**	**0.40**	**$ 3,496,000.00**	**$ 75,164,000.00**
Ingeniero Catastral y Geodesta	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	**1**	**50%**	**4**	**$ 28,474,000.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**$ 24,914,750.00**

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA N° 1 **FECHA:** 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

ACTA FINAL SI | NO x (INDICAR CON UNA "X")

VALOR ACTA: $ 83,592,133.00 **PERIODO:** 5/11/2025 al 30/11/2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-884-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INTERVENTORÍA: TERRA PROYECTOS I CIVILES S.A.S **CONTRATISTA:** PROBINTEC S.A.S

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES **PLAZO ACTUAL:** NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: 5-nov-25 **FECHA DE FIN:** 4-ago-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A** N.A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506.00 **VALOR CON ADICIONES:** $ 1,054,622,506.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
Abogado (Con Conocimiento en Estudio de Título Predial)	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	1	50%	4	$ 28,474,000.00	1	50%	0.50	$ 3,559,250.00	1	50%	0.50	$ 3,559,250.00	$ 24,914,750.00
Avualuador	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	1	50%	4	$ 28,474,000.00	1	50%	0.40	$ 2,847,400.00	1	50%	0.40	$ 2,847,400.00	$ 25,626,600.00
PERSONAL TECNICO								PERSONAL TECNICO						0.00	$ -			0.00	$ -	$ -
Topógrafo	$ 2,800,000.00	-	1	50%	4	2.3	$ 12,880,000.00	1	50%	4	$ 12,880,000.00	1	50%	0.30	$ 966,000.00	1	50%	0.30	$ 966,000.00	$ 11,914,000.00
Secretaria	$ 1,500,000.00	-	1	100%	9	2.3	$ 31,050,000.00	1	100%	9	$ 31,050,000.00	1	100%	0.07	$ 241,500.00	1	100%	0.07	$ 241,500.00	$ 30,808,500.00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811,987,400.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811,987,400.00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 61,447,490.00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 61,447,490.00	$ 750,539,910.00

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
OTROS COSTOS						OTROS COSTOS				OTROS COSTOS				OTROS COSTOS				
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	2	6	$ 4,200,000.00	$ 50,400,000.00	2	6	$ 4,200,000.00	$ 50,400,000.00	2	0.83	$ 4,200,000.00	$ 6,972,000.00	2	0.83	$ 4,200,000.00	$ 6,972,000.00	$ 43,428,000.00
Alquiler de mobiliario para oficina, con equipos de cómputo, impresora, tinta para impresión y demás elementos que integren la oficina	Mes	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	$ 8,987,000.00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	$ 8,987,000.00
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	Mes	1	9	$ 450,000.00	$ 4,050,000.00	1	9	$ 450,000.00	$ 4,050,000.00	1	0.00	$ 450,000.00	$ -	1	0.00	$ 450,000.00	$ -	$ 4,050,000.00
NOMBRE SUBCAPITULO					$ 74,250,000.00	NOMBRE SUBCAPITU		$	74,250,000.00	NOMBRE SUBCAPITULO		$	8,798,000.00	NOMBRE SUBCAPITULO		$	8,798,000.00	$ 65,452,000.00
AJUSTE AL PESO													-$ 0.08				-$ 0.08	$ 0.08
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74,250,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74,250,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 8,798,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 8,798,000.00	$ 65,452,000.00
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 886,237,400.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 886,237,400.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 70,245,489.92			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 70,245,489.92	$ 815,991,910.08
				IVA 19%	$ 168,385,106.00			IVA 19%	$ 168,385,106.00			IVA 19%	$ 13,346,643.08			IVA 19%	$ 13,346,643.08	$ 155,038,462.92

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA N° 1 **FECHA:** 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

ACTA FINAL SI | NO x (INDICAR CON UNA "X")

VALOR ACTA: $ 83,592,133.00 **PERIODO:** 5/11/2025 al 30/11/2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-884-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INTERVENTORÍA: TERRA PROYECTOS I CIVILES S.A.S **CONTRATISTA:** PROBINTEC S.A.S

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES **PLAZO ACTUAL:** NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: 5-nov-25 **FECHA DE FIN:** 4-ago-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A** N.A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506.00 **VALOR CON ADICIONES:** $ 1,054,622,506.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
TOTAL VALOR INTERVENTORÍA							$ 1,054,622,506.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 1,054,622,506.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 83,592,133.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 83,592,133.00	$ 971,030,373.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO															$ -					
TOTAL A PAGAR															$ 83,592,133.00				$ 83,592,133.00	$ 971,030,373.00

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ -	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
SALDO A FAVOR	$ -	0%	
SUMAS IGUALES	$ -	100.0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1,054,622,506.00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ 0.00		
ACTA No. 1	$ 83,592,133.00	8%	8%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 971,030,373.00	92%	
SUMAS IGUALES	$ 1,054,622,506.00	100%	

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
TERRA PROYECTOS CIVILES S.AS.

LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SUPERVISORA DEL CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

HÉCTOR ANDRÉS USECHE GUZMAN
DIRECTOR INTERVENTORÍA
TERRA PROYECTOS CIVILES S.AS.

JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CONTRATISTA-SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S

NIT 901.788.878-1

Bogotá D.C, 5 de diciembre de 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU
NIT. 900.258.711-1

DEBE A

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S

NIT. 901.788.878-1

LA SUMA DE:

NOVECIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($913.000)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO OTROS COSTOS DIRECTOS ALQUILER DE OFICINA EN LA AV CARRERA 15 100-69 OFICINA 306 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, durante el periodo del 05 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, PARA EL CONTRATO No. CCU-CTO-884-2025 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE".



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S

NIT 901.788.878-1

Bogotá D.C, 4 de diciembre de 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU
NIT. 900.258.711-1

DEBE A

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S

NIT. 901.788.878-1

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($3.486.000)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO OTROS COSTOS DIRECTOS ALQUILER VEHÍCULOS (VEHÍCULO TIPO PICKUP 4X4 O CAMIONETA CUYO MODELO NO PUEDE SER INFERIOR A EL AÑO 2010, CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA CINCO (5) PASAJEROS (INCLUYE PEAJES Y CONDUCTOR) PARA LA CAMIONETA 4X4 PLACA IEM303 AÑO 2014, MODELO GRAND CHEROKEE , MARCA JEEP, durante el periodo del 5 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, PARA EL CONTRATO No. CCU-CTO-884-2025 CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE”.

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S

NIT 901.788.878-1

Bogotá D.C, 4 de diciembre de 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU
NIT. 900.258.711-1

DEBE A

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S

NIT. 901.788.878-1

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($3.486.000)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO OTROS COSTOS DIRECTOS ALQUILER VEHÍCULOS (VEHÍCULO TIPO PICKUP 4X4 O CAMIONETA CUYO MODELO NO PUEDE SER INFERIOR A EL AÑO 2010, CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA CINCO (5) PASAJEROS (INCLUYE PEAJES Y CONDUCTOR) PARA LA CAMIONETA 4X4 PLACA HTL722 AÑO 2014, MODELO CAPTIVA, MARCA CHEVROLET, durante el periodo del 5 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, PARA EL CONTRATO No. CCU-CTO-884-2025 CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE”.



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S

NIT 901.788.878-1

Bogotá D.C, 05 de diciembre de 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU
NIT. 900.258.711-1

DEBE A

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S

NIT. 901.788.878-1

LA SUMA DE:

NOVECIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($913.000)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO OTROS COSTOS DIRECTOS ALQUILER DE MOBILIARIO PARA OFICINA, CON EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORA, TINTA PARA IMPRESIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS QUE INTEGREN LA OFICINA, durante el periodo del 05 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, PARA EL CONTRATO No. CCU-CTO-884-2025 CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE”.

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036731988

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HTL722	CHEVROLET	CAPTIVA SPORT	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.997	GRIS CENIZA METALICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CES554894	N	3GNFL7E5XES554894

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3GNFL7E5XES554894	N	3GNFL7E5XES554894	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

IDENTIFICACIÓN

NIT 901788878

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
264

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482013000478826

I-E
I

FECHA IMPORT.
22/11/2013

PUERTAS
4

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
08/02/2014

FECHA EXP. LIC TTO.
24/10/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



LT03009447775

Servicios Integrales 95908.1.0-9 05/25

4:01

ublico.runt.gov.co

RUNTPRO

Transporte

Fecha expedición: 17/03/2025

Fecha inicio de vigencia: 18/03/2025

Fecha fin de vigencia: 17/03/2026

Entidad expide SOAT: LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS

Código tarifa: 232

Estado: VIGENTE

Póliza SOAT

Número de póliza: 4308005160980000

Fecha expedición: 12/03/2024

Fecha inicio de

Transporte @Copyright 2026 RUNT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2025-03-17	2025-03-18	2026-03-17

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308006602936000	HTL722	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	2997	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	WAGON

LÍNEA VEHICULO
CAPTIVA SPORT

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
CES554894	3GNFL7E5XES554894	3GNFL7E5XES554894	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ASESORIAS COMERCIALES Y FINANCIERAS SAS,	3123715932	NI	8300647232	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
232	$ 833500	$ 433400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1269000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68 [2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180378748

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: DIAGNOSTIYA 170

NIT: 900117669

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-019-002

Fecha de expedición: 2025/03/22

Fecha de vencimiento: 2026/03/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: HTL722

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2014

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2997

NRO. MOTOR: CES554894

NRO. CHASIS: 3GNFL7E5XES554894

VIN: 3GNFL7E5XES554894

LÍNEA: CAPTIVA SPORT

COLOR: GRIS CENIZA METALICO

NOMBRE PROPIETARIO: ASESORIAS COMERCIALES Y FINANCIERAS SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ROBAYO QUINTERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035363741

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
IEM303	JEEP	GRAND CHEROKEE	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.600	GRIS METAL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR
******

REG: N

VIN: 1C4RJFBG6EC497708

NÚMERO DE SERIE
******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 1C4RJFBG6EC497708

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901788878

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
290

DECLARACION DE IMPORTACIÓN
192014000088669

DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	14/08/2014	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/10/2014	09/05/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

LT03008754636

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 10 20	2025 10 23	2026 10 22

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91363247 - 613673043	IEM303	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	3600	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	JEEP	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO: GRANDCHEROKEELIMITED

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
1C4RJFBG6EC497708	1C4RJFBG6EC497708	1C4RJFBG6EC497708	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	3122958359	NIT	901788878	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80002648	91363247	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
23	$ 833.500	$ 433.400	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.269.300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT. Las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/politicadatospersonales.

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.

[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

[5] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185527844

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA

NIT: 900110552

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-027-002

Fecha de expedición: 2025/11/25

Fecha de vencimiento: 2026/11/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IEM303

CLASE: CAMPERO

MARCA: JEEP

MODELO: 2014

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 3600

NRO. MOTOR:

NRO. CHASIS: 1C4RJFBG6EC497708

VIN: 1C4RJFBG6EC497708

LÍNEA: GRAND CHEROKEE LIMITED

COLOR: GRIS METAL

NOMBRE PROPIETARIO: TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

ANTONIO ALEJANDRO BARRETO MORENO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185527844

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA

NIT: 900110552

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-027-002

Fecha de expedición: 2025/11/25

Fecha de vencimiento: 2026/11/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IEM303

CLASE: CAMPERO

MARCA: JEEP

MODELO: 2014

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 3600

NRO. MOTOR:

NRO. CHASIS: 1C4RJFBG6EC497708

VIN: 1C4RJFBG6EC497708

LÍNEA: GRAND CHEROKEE LIMITED

COLOR: GRIS METAL

NOMBRE PROPIETARIO: TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

ANTONIO ALEJANDRO BARRETO MORENO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180378748

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: DIAGNOSTIYA 170

NIT: 900117669

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-019-002

Fecha de expedición: 2025/03/22

Fecha de vencimiento: 2026/03/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: HTL722

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2014

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2997

NRO. MOTOR: CES554894

NRO. CHASIS: 3GNFL7E5XES554894

VIN: 3GNFL7E5XES554894

LÍNEA: CAPTIVA SPORT

COLOR: GRIS CENIZA METALICO

NOMBRE PROPIETARIO: ASESORIAS COMERCIALES Y FINANCIERAS SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ROBAYO QUINTERO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 10 20	2025 10 23	2026 10 22

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91363247 - 613673043	IEM303	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	3600	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	JEEP	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO: GRANDCHEROKEELIMITED

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
1C4RJFBG6EC497708	1C4RJFBG6EC497708	1C4RJFBG6EC497708	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	3122958359	NIT	901788878	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80002648	91363247	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
23	$ 833.500	$ 433.400	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.269.300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT. Las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/politicadatospersonales.

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.

[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

[5] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2025-03-17	2025-03-18	2026-03-17

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308006602936000	HTL722	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	2997	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	WAGON

LÍNEA VEHICULO
CAPTIVA SPORT

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
CES554894	3GNFL7E5XES554894	3GNFL7E5XES554894	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ASESORIAS COMERCIALES Y FINANCIERAS SAS,	3123715932	NI	8300647232	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
232	$ 833500	$ 433400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1269000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68 [2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036731988

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HTL722	CHEVROLET	CAPTIVA SPORT	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.997	GRIS CENIZA METALICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CES554894	N	3GNFL7E5XES554894

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3GNFL7E5XES554894	N	3GNFL7E5XES554894	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

IDENTIFICACIÓN

NIT 901788878

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
264

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482013000478826

I-E
I

FECHA IMPORT.
22/11/2013

PUERTAS
4

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
08/02/2014

FECHA EXP. LIC TTO.
24/10/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



LT03009447775

Servicios Integrales 95908.1.0-9 05/25

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035363741

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
IEM303	JEEP	GRAND CHEROKEE	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.600	GRIS METAL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR
******

REG: N

VIN: 1C4RJFBG6EC497708

NÚMERO DE SERIE
******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 1C4RJFBG6EC497708

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901788878

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
290

DECLARACION DE IMPORTACIÓN
192014000088669

DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	14/08/2014	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/10/2014	09/05/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

LT03008754636

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141168879611

(415)7707212489984(8020) 000014116887961 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 8 8 7 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AK 15 NO. 100 69 OF 306

42. Correo electrónico TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	6 0 1 3 9 7 6 3 8 5	3 1 2 2 9 5 8 3 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 1 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FORERO FORERO JORGE HERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141168879611

(415)7707212489984(8020) **000014116887961 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 8 8 7 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 1 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 7 6 7 4 0 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141168879611

(415)7707212489984(8020) **000014116887961 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 8 8 7 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 4 3 9 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FORERO	FORERO	JORGE	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Miércoles, 12 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TERRA PROYECTOS CIVILES SAS identificado(a) con NIT 901788878, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	69900008075	2024/01/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

TERRA PROYECTOS CIVILES SAS
Nit. 901.788.878-1

Yo, **JORGE HERNANDO FORERO FORERO** identificado con el documento de identidad No. **79.343.910 expedida** en Bogota, o brando en nombre propio y/o representación legal de TERRA PROYECTOS CIVILES SAS con NIT 901.788.878-1, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, **Ley 1474 De 2011** "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes.

1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes Fuentes: (Detalle de la ocupación, oficio, Profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos, por ejemplo: comerciante).

2. Actividades de Ingeniería y otras actividades conexas

3. Si posee ingresos adicionales, especifique su Origen:

Otros ingresos provenientes de actividades como consorciado en distintos proyectos en ejecución.

4. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

5. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

TERRA PROYECTOS CIVILES SAS
Nit. 901.788.878-1

En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los 15 días del mes de marzo de 2026, en la ciudad de Bogota D.C.__.

Nombre del proponente:	**TERRA PROYECTOS CIVILES SAS**
Dirección:	**AV CR 15 100-69 OF 306**
Ciudad:	**BOGOTA D.C.**
Teléfono:	**601-3976385 fax:**
Correo electrónico:	**TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM**
Nit:	**901.788.878-1**

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
CC 79.343.910 de Bogotá
Representante Legal
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS
NIT 901.788.878-1

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.343.910**

FORERO FORERO

APELLIDOS

JORGE HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-AGO-1965**

TENJO

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-SEP-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500113-45122161-M-0079343910-20040727 **01328** 04208C 02 153344660

TERRA PROYECTOS CIVILES SAS
Nit. 901.788.878-1

CERTIFICACIÓN

PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito Representante Legal de **TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S**. NIT. 901.788.878-1 certifica que el pago de las obligaciones laborales y de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de compensación Familiar) han sido contabilizados y cancelados por **TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S** desde la fecha de inicio del contrato y se encuentra a PAZ Y SALVO. Adicionalmente se encuentran al día con el pago de obligaciones laborales (nominas, liquidaciones, honorarios, etc.) en los últimos (06) seis meses.

Lo anterior, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la resolución 2379 de 2008.

Nota 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social y en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en Decreto 780 de 2016 modificado parcialmente por el decreto 1990 de 2016.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D. C. a los 30 días del mes de noviembre de 2025, así mismo confirmo que la entidad no está obligada a tener revisor fiscal debido que no supera los topes requeridos.

Atentamente,



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
CC 79.343.910 de Bogotá
Representante Legal
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS
NIT 901.788.878-1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.561.283**
CAMACHO VERGARA

APELLIDOS
XIOMARA ALEJANDRA

NOMBRES

Xiomara A Camacho V

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1974**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-MAR-1992 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00308888-F-0052561283-20110616 **0027**246405A 1 1281377883

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



202059-T

XIOMARA ALEJANDRA
CAMACHO VERGARA
C.C. 52561283
RESOLUCION INSCRIPCION 282 **FECHA 29/05/2015**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 213377

Xiomara A Camacho

204134

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 3 7 5 6 E 0 F E 0 E 0 9 A C 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **XIOMARA ALEJANDRA CAMACHO VERGARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52561283 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 202059-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901788878-1	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	AK 15 100-69 OF 206	6013976385	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
92481178	18/12/2025				14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	N	11/02/2026	50123753	$1.732.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	8.200	0		0		0	55	300	0	8.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	69.700	0		0		0	55	2.400	0	72.100	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	32.600	0		0		0	55	1.200	0	33.800	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	8.200	0		0		0	55	300	0	8.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	97.500	0		0		0	55	3.400	0	100.900	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	128.500	0	0	0	0	55	4.400	0	132.900	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	95.900	0	0	0	0	55	3.300	0	99.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	33.000	0	0	0	0	55	1.200	0	34.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	608.300	0	0	0	0	55	20.800	0	629.100	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	376.700				376.700	55	12.900	389.600			3.767	389.600	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	216.200	55	7.400	223.600	14

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901788878-1	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS		AK 15 100-69 OF 206	6013976385	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
92481178	18/12/2025				14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	N	11/02/2026	50123753	$1.732.400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	55	0	0	0
ICBF				
0	55	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	216.200	223.800
Pensión	4	865.700	895.400
Riesgos Laborales	1	376.700	389.600
CCF	1	216.200	223.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	1.674.800	1.732.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901788878-1	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS		AK 15 100-69 OF 206	6013976385	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
92481178	18/12/2025				14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	N	11/02/2026	50123753	$1.732.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	46369957	LEAL HERRERA ROCIO	1	0			S	X																25-14	1.547.500	247.600	0	0	0	0	EPS037	1.547.500	61.900	14-25	1.547.500	5	107.800	CCF22	1.547.500	61.900	0	0	0	0	0
2	CC	52016871	ZAMBRANO DIAZ LAURA ROSA	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	19378001	FANDIÑO BARON JOSE ALBERTO	1	0			S	X																25-14	1.762.500	282.000	0	0	0	0	EPS037	1.762.500	70.500	14-25	1.762.500	5	122.700	CCF22	1.762.500	70.500	0	0	0	0	0
4	CC	79839007	IBAÑEZ PEÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	25283649	ROSERO SALAZAR ENID ALEJANDRA	1	0			S	X																25-14	1.583.334	253.400	0	0	0	0	EPS008	1.583.334	63.400	14-25	1.583.334	5	110.300	CCF22	1.583.334	63.400	0	0	0	0	0
6	CC	1007730325	CHARRIS MENDOZA DANIEL DAVID	1	0			S	X																230301	1.583.334	253.400	0	0	0	0	EPS005	1.583.334	63.400	14-25	1.583.334	5	110.300	CCF22	1.583.334	63.400	0	0	0	0	0
7	CC	1019030326	SANCHEZ RODRIGUEZ PAOLA	1	0			S	X																230301	1.547.500	247.600	0	0	0	0	EPS010	1.547.500	61.900	14-25	1.547.500	5	107.800	CCF22	1.547.500	61.900	0	0	0	0	0
8	CC	74379711	BARRERA PESCA CARLOS ANDRES	1	0			S	X																231001	1.547.500	247.600	0	0	0	0	EPS005	1.547.500	61.900	14-25	1.547.500	5	107.800	CCF22	1.547.500	61.900	0	0	0	0	0
9	CC	79683578	TAFUR SANCHEZ FABIAN	1	0			S	X																25-14	3.525.000	564.000	0	0	0	0	EPS005	3.525.000	141.000	14-25	3.525.000	5	245.400	CCF22	3.525.000	141.000	0	0	0	0	0
10	CC	7175012	VANEGAS MOJICA JUAN HARVEY	1	0			S	X																230901	1.547.500	247.600	0	0	0	0	EPS002	1.547.500	61.900	14-25	1.547.500	5	107.800	CCF22	1.547.500	61.900	0	0	0	0	0
11	CC	92527941	DIAZ MANGONES KEVIN ARTURO	1	0			S	X																25-14	3.525.000	564.000	0	0	0	0	EPS037	3.525.000	141.000	14-25	3.525.000	5	245.400	CCF22	3.525.000	141.000	0	0	0	0	0
12	CC	7165605	GARCIA CASTILLO CARLOS EDUARDO	1	0			S	X																25-14	3.525.000	564.000	0	0	0	0	EPS005	3.525.000	141.000	14-25	3.525.000	5	245.400	CCF22	3.525.000	141.000	0	0	0	0	0
13	CC	79862203	USECHE GUZMAN HECTOR ANDRES	1	0			S	X																230901	2.876.667	460.300	0	0	0	0	EPS008	2.876.667	115.100	14-25	2.876.667	5	200.300	CCF22	2.876.667	115.100	0	0	0	0	0
14	CC	1015995560	BOHORQUEZ ALONSO JENNY ROCIO	1	0			S	X																25-14	1.547.500	247.600	0	0	0	0	EPS008	1.547.500	61.900	14-25	1.547.500	5	107.800	CCF22	1.547.500	61.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901788878-1	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	AK 15 100-69 OF 206	6013976385	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92481178	$10.039.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.700	0		0		0	0	0	0	53.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	522.100	0		0		0	0	0	0	522.100	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	335.300	0		0		0	0	0	0	335.300	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	53.700	0		0		0	0	0	0	53.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	175.900	0		0		0	0	0	0	175.900	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	828.100	0	0	0	0	0	0		828.100	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	612.000	0	0	0	0	0	0		612.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	496.600	0	0	0	0	0	0		496.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.356.300	0	0	30.000	30.000	0	0		3.416.300	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.924.600				1.924.600	0	0	1.924.600			19.246	1.924.600	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.380.700	0	0	1.380.700	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901788878-1	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS		AK 15 100-69 OF 206	6013976385	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92481178	$10.039.000	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.380.700	1.380.700
Pensión	4	5.353.000	5.353.000
Riesgos Laborales	1	1.924.600	1.924.600
CCF	1	1.380.700	1.380.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	10.039.000	10.039.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901788878-1	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS		AK 15 100-69 OF 206	6013976385	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92481178	$10.039.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007730325	CHARRIS MENDOZA DANIEL DAVID	1	0			S	X																230301	1.366.734	218.700	0	0	0	0	EPS005	1.366.734	54.700	14-25	1.366.734	5	95.200	CCF22	1.366.734	54.700	0	0	0	0	0
2	CC	1015995560	BOHORQUEZ ALONSO JENNY ROCIO	1	0			S	X																25-14	1.341.167	214.600	0	0	0	0	EPS008	1.341.167	53.700	14-25	1.341.167	5	93.400	CCF22	1.341.167	53.700	0	0	0	0	0
3	CC	1019030326	SANCHEZ RODRIGUEZ PAOLA	1	0			S	X																230301	1.341.167	214.600	0	0	0	0	EPS010	1.341.167	53.700	14-25	1.341.167	5	93.400	CCF22	1.341.167	53.700	0	0	0	0	0
4	CC	19378001	FANDIÑO BARON JOSE ALBERTO	1	0			S	X																25-14	1.527.500	244.400	0	0	0	0	EPS037	1.527.500	61.100	14-25	1.527.500	5	106.400	CCF22	1.527.500	61.100	0	0	0	0	0
5	CC	19450031	DUEÑAS FORERO CARLOS ALBERTO	1	5			S																		0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	25283649	ROSERO SALAZAR ENID ALEJANDRA	1	0			S	X																25-14	1.366.734	218.700	0	0	0	0	EPS008	1.366.734	54.700	14-25	1.366.734	5	95.200	CCF22	1.366.734	54.700	0	0	0	0	0
7	CC	46369957	LEAL HERRERA ROCIO	1	0			S	X																25-14	1.341.167	214.600	0	0	0	0	EPS037	1.341.167	53.700	14-25	1.341.167	5	93.400	CCF22	1.341.167	53.700	0	0	0	0	0
8	CC	51849259	PALOMINO DE FORERO SONIA PATRICIA	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS001	6.000.000	240.000	14-25	6.000.000	1	31.400	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
9	CC	52016871	ZAMBRANO DIAZ LAURA ROSA	1	0			S	X																230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS005	1.233.700	49.400	14-25	1.233.700	5	85.900	CCF22	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
10	CC	7165605	GARCIA CASTILLO CARLOS EDUARDO	1	0			S	X																25-14	3.055.000	488.800	0	0	0	0	EPS005	3.055.000	122.200	14-25	3.055.000	5	212.700	CCF22	3.055.000	122.200	0	0	0	0	0
11	CC	7175012	VANEGAS MOJICA JUAN HARVEY	1	0			S	X																230901	1.341.167	214.600	0	0	0	0	EPS002	1.341.167	53.700	14-25	1.341.167	5	93.400	CCF22	1.341.167	53.700	0	0	0	0	0
12	CC	74379711	BARRERA PESCA CARLOS ANDRES	1	0			S	X																231001	1.341.167	214.600	0	0	0	0	EPS005	1.341.167	53.700	14-25	1.341.167	5	93.400	CCF22	1.341.167	53.700	0	0	0	0	0
13	CC	79504123	PRIETO MUÑOZ SANDRO JOSE	1	0			S	X																25-14	1.762.500	282.000	0	0	0	0	EPS008	1.762.500	70.500	14-25	1.762.500	5	122.700	CCF22	1.762.500	70.500	0	0	0	0	0
14	CC	79683578	TAFUR SANCHEZ FABIAN	1	0			S	X																25-14	3.055.000	488.800	0	0	0	0	EPS005	3.055.000	122.200	14-25	3.055.000	5	212.700	CCF22	3.055.000	122.200	0	0	0	0	0
15	CC	79839007	IBAÑEZ PEÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S	X																230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS005	1.233.700	49.400	14-25	1.233.700	5	85.900	CCF22	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
16	CC	79862203	USECHE GUZMAN HECTOR ANDRES	1	0			S	X																230901	2.483.139	397.400	0	0	0	0	EPS008	2.483.139	99.400	14-25	2.483.139	5	172.900	CCF22	2.483.139	99.400	0	0	0	0	0
17	CC	79865912	TAFUR SANCHEZ RICARDO	1	0			S	X																231001	1.762.500	282.000	0	0	0	0	EPS005	1.762.500	70.500	14-25	1.762.500	5	122.700	CCF22	1.762.500	70.500	0	0	0	0	0
18	CC	92527941	DIAZ MANGONES KEVIN ARTURO	1	0			S	X																25-14	1.527.500	244.400	0	0	0	0	EPS037	1.527.500	61.100	14-25	1.527.500	5	106.400	CCF22	1.527.500	61.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

		ACTA DE COSTOS	Del 5 al 30 de noviembre de 2025											
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE		2,025	$ 1,423,500											
CANTIDAD	PERSONAL MINIMO REQUERIDO	Nombre_Completo	DÍAS TRABAJADOS	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA	VALOR TOTAL DEVENGADO (Por Acta Costos No. 1)	VALOR TOTAL DEVENGADO (Por Planilla 50123753 y 92481178)	40% DEL VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	IBC SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL PENSION 16%	TOTAL SALUD 12;5%	IBC RIESGOS	TARIFA SISTEMA	ARL	TOTAL APORTES
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	HÉCTOR ANDRÉS USECHE GUZMAN	4.80	$ 8,630,000.00	$ 1,380,800.00	$ 2,876,667.00	552,320	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO	7.50	$ 7,050,000.00	$ 1,762,500.00	$ 3,525,000.00	705,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO	7.50	$ 7,050,000.00	$ 1,762,500.00		705,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE	FABIAN TAFUR SÁNCHEZ	7.50	$ 7,050,000.00	$ 1,762,500.00	$ 3,525,000.00	705,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL	FABIAN TAFUR SÁNCHEZ	7.50	$ 7,050,000.00	$ 1,762,500.00		705,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	SANDRO JOSÉ PRIETO MUÑOZ	7.50	$ 7,050,000.00	$ 1,762,500.00	$ 1,762,500.00	705,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	ESPECIALISTA BIM	JONATHAN DUVAN FONSECA PÉREZ	0.00	$ 7,050,000.00	NO APLICA PARA ESTE PERIODO							0.0696	-	-
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	KEVIN ARTURO DIAZ MANGONES	7.50	$ 7,050,000.00	1,762,500	$ 3,525,000.00	705,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (PUENTES)	KEVIN ARTURO DIAZ MANGONES	7.50	$ 7,050,000.00	1,762,500		705,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MARLEN GUTIERREZ ORTEGON	0.00	$ 6,190,000.00	NO APLICA PARA ESTE PERIODO							0.0696	-	-
1	ESPECIALISTA FORESTAL	CARLOS ALFONSO CONTRERAS JIMÉNEZ	0.00	$ 6,190,000.00	NO APLICA PARA ESTE PERIODO							0.0696	-	-
1	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	RICARDO TAFUR SÁNCHEZ	7.50	$ 7,050,000.00	$ 1,762,500.00	$ 3,055,000.00	705,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	ESPECIALISTA EN GEÓLOGO	JOSÉ ALBERTO FANDIÑO BARÓN	7.50	$ 7,050,000.00	$ 1,762,500.00	$ 1,762,500.00	705,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	ROCIO LEAL HERRERA	7.50	$ 6,190,000.00	$ 1,547,500.00	$ 1,547,500.00	619,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	CARLOS ANDRES BARRERA PESCA	7.50	$ 6,190,000.00	$ 1,547,500.00	$ 1,547,500.00	619,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	INGENIERO RESIDENTE 1 APOYO CONSULTORÍA	ENID ALEJANDRA ROSERO SALAZAR	25.00	$ 1,900,000.00	$ 1,583,333.33	$ 1,583,334.00	633,333	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	INGENIERO RESIDENTE 2 APOYO CONSULTORÍA	DANIEL DAVID CHARRIS MENDOZA	25.00	$ 1,900,000.00	$ 1,583,333.33	$ 1,583,334.00	633,333	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA	JUAN HARVEY VANEGAS MOJICA	7.50	$ 6,190,000.00	$ 1,547,500.00	$ 1,547,500.00	619,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	ABOGADO (Con Conocimiento en Estudio de Título Predial)	JENNY ROCIO BOHÓRQUEZ ALONSO	7.50	$ 6,190,000.00	$ 1,547,500.00	$ 1,547,500.00	619,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	AVALUADOR	PAOLA SÁNCHEZ RODRIGUEZ	6.00	$ 6,190,000.00	$ 1,238,000.00	$ 1,547,500.00	495,200	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	TOPOGRAFO	EDGAR ANTONIO IBÁÑEZ PEÑA	4.50	$ 2,800,000.00	$ 420,000.00	$ 1,423,500.00	168,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
1	SECRETARIA	LAURA ROSA ZAMBRANO DIAZ	2.10	$ 1,500,000.00	$ 105,000.00	$ 1,423,500.00	42,000	1,423,500	227,800	177,900	1,423,500	0.0696	99,100	504,800
22	TOTAL			$ 130,560,000.00	$ 28,362,966.67	$ 33,782,835.00	$ 11,345,186.67	$ 27,046,500.00	$ 4,328,200.00	$ 3,380,100.00	$ 27,046,500.00		$ 1,882,900.00	$ 9,591,200.00

Contrato N° : ICCU-CTO-884-2025

Nombre del Supervisor: JUAN DIEGO JIMENEZ MORENO

Firma de Revisión:

Fecha: 5/03/2026

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) — **No. 1**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-786-2025 (CONSULTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	29/09/2025	**FECHA INCIO**	05/11/2025
	ICCU-884-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	15/10/2025	**FECHA INCIO**	05/11/2025
NOMBRE CONTRATISTA	PROBINTEC S.A.S.		N/A	**NIT**	829001061-1
	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S		N/A	**NIT**	901788878-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: "1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 05 de noviembre del 2025 hasta el 04 de julio de 2026
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de NUEVE (09) meses según el acta de inicio, va desde el 05 de noviembre del 2025 hasta el 04 de agosto de 2026
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 4 de julio de 2026 según acta de inicio para consultoría y el plazo de ejecución es hasta el 4 de agosto de 2026 según acta de inicio para interventoría.

FORMA DE PAGO - CONSULTORÍA	El pago de la ejecución del contrato se realizará de la siguiente forma: 1. Se realizará un anticipo por un valor del 10% del valor total del contrato. 2. El pago restante del contrato se pagará por volumen entregado y aprobado por la interventoría hasta completar el 95% del valor total del contrato. 3. Se realizará un último pago correspondiente al 5% del valor total del contrato una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. NOTA 1: EL ICCU no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. NOTA 2: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU, luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar el trámite de los giros así. NOTA 3: El contratista deberá realizar los aportes de retención del impuesto de Industria y Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada municipio en donde se desarrollen las obras y/o labores, además, para el trámite de liquidación y posterior pago de la misma (10 % final), el contratista deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas tramitadas. De igual forma deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las retenciones correspondientes al 10% final. NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 6: El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. NOTA 7: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al consultor, serán asumidas por el mismo.	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$5.344.002.688,00
	Los desembolsos del valor del contrato se realizaran de la siguiente forma: La entidad pagará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo 1. La entidad realizará al interventor el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la liquidación de la interventoría recibidos a entera satisfacción de la entidad. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la interventoría realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato; el supervisor del contrato de Interventoría, expedirá certificación de cumplimiento		

FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	Verificando que el interventor adelante el porcentaje de avance real de ejecución de las actividades de la consultoría sobre las que ejerce interventoría Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las establecidas en la minuta contractual. Así mismo para cada pago, el interventor deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. NOTA 1: El pago se realizará de acuerdo con los componentes del formulario No 1, gestión que debe quedar debidamente sustentadas y soportada en el informe de interventoría del correspondiente mes. NOTA 2: El reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal se realizará sobre el que efectivamente fue empleado en la ejecución de los trabajos, aprobados por la entidad, afectados por un factor multiplicador. De igual modo, otros costos directos ocasionados deberán ser aprobados por la entidad. Para tal efecto, el interventor deberá solicitar aprobación del inicio de cada uno de los profesionales y otros costos que componen su oferta, conforme con el plan de la consultoria y actividades en ejecución. NOTA 3: EL ICCU no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la formulación y presentación de las propuestas. NOTA 4: El contratista deberá realizar los pagos que corresponden al impuesto de Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad económica que ejerzan y las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en donde se desarrolle la consultoría, o ejerzan las actividades gravadas con dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito para el trámite de la liquidación y posterior pago del contrato (5% final). Así las cosas, El Contratista deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación del Impuesto de Industria y Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de acuerdo con el valor total del contrato. NOTA 5: Teniendo en cuenta que el contrato de consultoría a realizar la interventoría contiene variables en cuanto a su ejecución y forma de pago, en caso de que, el contrato de consultoría termine antes de finalizar el plazo de ejecución de la presente interventoría, el ICCU solo reconocerá los valores ejecutados por el interventor hasta el término del contrato de consultoría. Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$1.054.622.506,00

	PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	05/11/2025 al 30/11/2025	

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de consultoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**SGPL-223339735-1**	**05/11/2025**	**05/01/2027**	**$ 1.068.800.536,00**
Buen manejo del anticipo	**SGPL-223339735-1**	**05/11/2025**	**05/01/2027**	**$ 1.068.800.536,00**
Prestaciones sociales	**SGPL-223339735-1**	**05/11/2025**	**05/07/2029**	**$ 1.068.800.536,00**
Calidad del servicio	**SGPL-223339735-1**	**05/07/2026**	**05/07/2031**	**$ 1.603.200.804,00**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	**11-44-101267297**	**05/11/2025**	**08/02/2027**	**$ 105.462.250,60**
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**11-44-101267297**	**05/11/2025**	**08/08/2029**	**$ 210.924.501,20**
Calidad del servicio	**11-44-101267297**	**05/08/2026**	**05/08/2031**	**$ 210.924.501,20**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**EN REVISIÓN**
	Fecha diligenciamiento	**EN REVISIÓN**

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

El 05 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la suscripción del Acta de Inicio de los contratos de consultoría, dando inicio a las actividades técnicas, administrativas. Posteriormente, se realizó la remisión oficial de las actas debidamente suscritas por todas las partes (ICCU, Consultor e Interventoría).

Durante el mes en cuestión se han venido realizando por parte del equipo de interventoría tareas de revisión documental inicial necesarias para la definición de las objetivos y parámetros a seguir durante la recopilación de la información para la ejecución de los estudios y diseños por parte del equipo de consultoría, las actividades en ejecutadas son las siguientes:

-Revisión de las distintas metodologías de trabajo para cada una de las especialidades necesarias para la ejecución del proyecto: Pavimentos, Tránsito y transporte, Seguridad vial, Geotecnia, Diseño geométrico, Estructural, Ambiental, Hidráulica e hidrológica, Geología, Gestión social, Costos y presupuestos; en donde se realizaron los comentarios pertinentes a cada una de las áreas de especialidad en cuestión para la mejora en la claridad de la información, dándose recomendaciones para la discriminación y detalle de la información, solicitando la separación de la información con un mayor grado de especificidad en los componentes necesarios para cada metodología, desde la planificación de los elementos necesarios para la recolección de datos.
Determinando parámetros de verificación, señalando mejores y aspectos a tener en cuenta basados en los requerimientos establecidos en el anexo técnico de obra y el anexo técnico de interventoría a fin de presentar una información, clara, detallada y veraz para dar inicio de manera eficiente a las labores de recolección y análisis de los datos compilados en el campo para cada uno de los tramos del Lote 4 del proyecto.

-Revisión de la programación de obra para aprobación de la documentación inicial requeridas para el inicio de las actividades de consultoría.

-Se realizaron mesas de trabajo conjuntas entre el equipo de consultoría e interventoría a fin de aclarar dudas y plantear las metodologías de trabajo por parte del equipo consultor y las verificaciones del plan de campo presentado ante la interventoría para su revisión y aprobación.

-Acompañamiento durante los comités semanales de seguimiento de avance de obra en conjunto con la consultoría y la entidad contratante.

-Revisión de hojas de vida del personal especialista del equipo de consultoría para validación del personal necesario para la ejecución del proyecto.

-Revisión del plan de campo detallado para cada uno de los componentes y especialidades requeridas para la ejecución del proyecto.


RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
Al no contar con cronograma aprobado no se ha creado la curva S de avance del contrato fisico.

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
	26,00	-26	0,00



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -		0%


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
-100%

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
-100%

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	PROBINTEC S.A.S.	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S
Anticipo	$0,00	$0,00
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$0,00	$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$5.344.002.688,00	$1.054.622.506
Porcentaje de ejecución	0,00%	0,00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES. (Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoria (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	Responsable diligenciamiento	JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO
	Fecha diligenciamiento	EN REVISIÓN

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	EN REVISIÓN	Chalecos	N/A
	Cascos	N/A	Otros	N/A
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	N/A	NO	N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



	FORMATO	CODIGO	MS-GP-FR-32
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/12/2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU-CTO-884 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. ICCU-786 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO EL MUNICIPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INFORME MENSUAL No. 01

05/11/2025 – 30/11/2025

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

BOGOTÁ, 02 DE DICIEMBRE DE 2025

1



	FORMATO	CODIGO	MS-GP-FR-32
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/12/2025

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

El informe mensual inicia con el siguiente Indice o Contenido que hace las veces de Lista de Chequeo y corresponde a la página uno (1) del informe:

Contrato de Obra No.	786-2025	Contratista:	PROBINTEC S.A.S.
Contrato de Interventoría No.	884-2025	Interventoría:	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

Objeto Contrato de Obra: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS: "1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INFORME MENSUAL No.	01	MES O PERIODO:	05 - 30 NOVIE MBRE 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Indice Informe Mensual de Interventoría		2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Introduccion		6
2	Descripción del proyecto		6
2.1	Localización	MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	6
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		14
2.3	Estado inicial de la vía		14
2.4	Caracteristicas técnicas del proyecto		18
3	Información Contrato de Obra		18
3.1	Información general contrato de obra		18
3.2	Actividades ejecutadas en el mes		19
3.3	Seguimiento ítems no previstos		26
4	Reportes ejecución mensual contrato de obra		26

2


Visita en campo estado inicial Chaguaní


Visita en campo estado inicial Cajicá - Tabio

Visita en campo estado inicial Albán - Sigüima

Visita en campo estado inicial Fusagasugá



Visita en campo estado inicial Susa – Carmen de Carupa



Visita en campo estado inicial Sesquile



Visita en campo estado inicial Cucunubá - Ubaté

Tabla 2 Registro fotográfico estado inicial tramos

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
N/A		
10- ANEXOS		
N/A		
FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO	CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
SANDRA ROCIO CASTILLO	SUBDIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	30 de noviembre de 2025	

TERRA PROYECTOS CIVILES SAS
901.788.878-1
CR 15 100 69 OF 306
(601) 3976385
Bogotá - Colombia
terraingenierosltda@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. TPC 13

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 12:56
Expedición	24/03/2026, 12:57
Vencimiento	23/04/2026
Vendedor	TERRA PROYECTOS CIVILES
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Nit: 900.258.711-1
Teléfono: (601) 7491624 - (601) 7491625
Dirección: CL 26 51-53 TO CENTRAL P 6
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: YESENIA.HERRERO@CUNDINAMARCA.GOV.CO

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO No ICCU-CTO-884-2025 ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 01 DEL PERIODO 05/11/2025 A 30/11/2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.	1.00	70,245,489.92	70,245,489.92

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y tres millones quinientos noventa y dos mil ciento treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 83,592,133.00

Total Bruto	70,245,489.92
IVA 19%	13,346,643.08
Total a Pagar	83,592,133.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CUENTA DE AHORROS No. 69900008075
ANOMBRE DE TERRA PROYECTOS CIVILES SAS NIT 901.788.878-1
-ESTA NC ANULA Y REEMPLAZA LA FACTURA TPC-10 DE 06/03/2026

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093362801 aprobado en 20250521 prefijo TPC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8.66
CUFE: ae63feaede6ce477064af013714f18fdebedbce72f2513c53a4eaead89073cb5c7966baad95b23d9d75c8fa679ed05b8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	4/036/2025

Tipo de garantía (Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	884-2025
Convenio No:	
Resolución No:	
Contratista o responsable:	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS Nit. 901.788.878-1
Garantía No:	11-44-101267297 ANEXO 2 CUMPLIMIENTO
Garantía emitida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición de la garantía:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de aprobación de la garantía:	05 DE DICIEMBRE DE 2025
Razón de la aprobación:	ACTA DE INICIO

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 105.462.250,60	2025	11	05	2027	02	08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$ 210.924.501,20	2025	11	05	2029	08	08
**CALIDAD DEL SERVICIO	$ 210.924.501,20	2026	08	05	2031	08	05

Notas u observaciones:

- **La garantía de calidad del servicio será de 5 años contados a partir de la suscripción de acta de recibo final de la obra**.
- Se aprueba la póliza citada en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN
Subdirector Técnico - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU

Reviso y elaboró: **Jonathan Fernando López Pachón** – Profesional Especializado - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	4/036/2025

Tipo de garantía (Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	884-2025
Convenio No:	
Resolución No:	
Contratista o responsable:	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS Nit. 901.788.878-1
Garantía No:	11-44-101267297 ANEXO 0 CUMPLIMIENTO
Garantía emitida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición de la garantía:	16 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de aprobación de la garantía:	31 DE OCTUBRE DE 2025
Razón de la aprobación:	GARANTIAS INICIALES

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 105.462.250,60	2025	10	07	2027	01	10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$ 210.924.501,20	2025	10	07	2029	10	07
**CALIDAD DEL SERVICIO	$ 210.924.501,20	2026	07	07	2031	07	07

Notas u observaciones:

- **La garantía de calidad del servicio será de 5 años contados a partir de la suscripción de acta de recibo final de la obra**.
- Se aprueba la póliza citada en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN
Subdirector Técnico - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU

Reviso y elaboró: **Jonathan Fernando López Pachón** – Profesional Especializado - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU

	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA N° 1 **FECHA:** 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

ACTA FINAL SI | NO x (INDICAR CON UNA "X")

VALOR ACTA: $ 83,592,133.00 **PERIODO:** 5/11/2025 al 30/11/2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-884-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INTERVENTORÍA: TERRA PROYECTOS I CIVILES S.A.S **CONTRATISTA:** PROBINTEC S.A.S

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES **PLAZO ACTUAL:** NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: 5-nov-25 **FECHA DE FIN:** 4-ago-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A** N.A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506.00 **VALOR CON ADICIONES:** $ 1,054,622,506.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				
Director de Interventoría	$ 8,630,000.00	III-3	1	40%	9	2.3	$ 71,456,400.00	**1**	**40%**	**9**	**$ 71,456,400.00**	**1**	**40%**	**0.40**	**$ 3,175,840.00**	**1**	**40%**	**0.40**	**$ 3,175,840.00**	**$ 68,280,560.00**
Especialista Pavimentos	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Tránsito y Transporte	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Seguridad Vial	$ 7,050,000.00	II-4	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Geotecnia	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Diseño Geométrico	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en BIM	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	4	2.3	$ 32,430,000.00	**1**	**50%**	**4**	**$ 32,430,000.00**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**$ 32,430,000.00**
Especialista en Estructuras	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Estructuras (Puentes)	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista Ambiental	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	5	2.3	$ 35,592,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 35,592,500.00**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**$ 35,592,500.00**
Especialista Forestal	$ 6,190,000.00	II-3	1	50%	5	2.3	$ 35,592,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 35,592,500.00**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**$ 35,592,500.00**
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Geólogo	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Profesional Gestor Social	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	5	2.3	$ 35,592,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 35,592,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**$ 32,033,250.00**
Profesional de Costos y Presupuestos	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	**1**	**50%**	**4**	**$ 28,474,000.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**$ 24,914,750.00**
Ingeniero Residente - Apoyo Consultoría	$ 1,900,000.00	II-2	2	100%	9	2.3	$ 78,660,000.00	**2**	**100%**	**9**	**$ 78,660,000.00**	**2**	**100%**	**0.40**	**$ 3,496,000.00**	**2**	**100%**	**0.40**	**$ 3,496,000.00**	**$ 75,164,000.00**
Ingeniero Catastral y Geodesta	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	**1**	**50%**	**4**	**$ 28,474,000.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**$ 24,914,750.00**

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA N° 1 **FECHA:** 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

ACTA FINAL SI | NO x (INDICAR CON UNA "X")

VALOR ACTA: $ 83,592,133.00 **PERIODO:** 5/11/2025 al 30/11/2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-884-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INTERVENTORÍA: TERRA PROYECTOS I CIVILES S.A.S **CONTRATISTA:** PROBINTEC S.A.S

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES **PLAZO ACTUAL:** NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: 5-nov-25 **FECHA DE FIN:** 4-ago-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A** N.A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506.00 **VALOR CON ADICIONES:** $ 1,054,622,506.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
Abogado (Con Conocimiento en Estudio de Título Predial)	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	1	50%	4	$ 28,474,000.00	1	50%	0.50	$ 3,559,250.00	1	50%	0.50	$ 3,559,250.00	$ 24,914,750.00
Avualuador	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	1	50%	4	$ 28,474,000.00	1	50%	0.40	$ 2,847,400.00	1	50%	0.40	$ 2,847,400.00	$ 25,626,600.00
PERSONAL TECNICO								PERSONAL TECNICO						0.00	$ -			0.00	$ -	$ -
Topógrafo	$ 2,800,000.00	-	1	50%	4	2.3	$ 12,880,000.00	1	50%	4	$ 12,880,000.00	1	50%	0.30	$ 966,000.00	1	50%	0.30	$ 966,000.00	$ 11,914,000.00
Secretaria	$ 1,500,000.00	-	1	100%	9	2.3	$ 31,050,000.00	1	100%	9	$ 31,050,000.00	1	100%	0.07	$ 241,500.00	1	100%	0.07	$ 241,500.00	$ 30,808,500.00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811,987,400.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811,987,400.00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 61,447,490.00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 61,447,490.00	$ 750,539,910.00

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
OTROS COSTOS						OTROS COSTOS				OTROS COSTOS				OTROS COSTOS				
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	2	6	$ 4,200,000.00	$ 50,400,000.00	2	6	$ 4,200,000.00	$ 50,400,000.00	2	0.83	$ 4,200,000.00	$ 6,972,000.00	2	0.83	$ 4,200,000.00	$ 6,972,000.00	$ 43,428,000.00
Alquiler de mobiliario para oficina, con equipos de cómputo, impresora, tinta para impresión y demás elementos que integren la oficina	Mes	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	$ 8,987,000.00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	$ 8,987,000.00
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	Mes	1	9	$ 450,000.00	$ 4,050,000.00	1	9	$ 450,000.00	$ 4,050,000.00	1	0.00	$ 450,000.00	$ -	1	0.00	$ 450,000.00	$ -	$ 4,050,000.00
NOMBRE SUBCAPITULO					$ 74,250,000.00	NOMBRE SUBCAPITU		$	74,250,000.00	NOMBRE SUBCAPITULO		$	8,798,000.00	NOMBRE SUBCAPITULO		$	8,798,000.00	$ 65,452,000.00
AJUSTE AL PESO													-$ 0.08				-$ 0.08	$ 0.08
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74,250,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74,250,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 8,798,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 8,798,000.00	$ 65,452,000.00
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 886,237,400.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 886,237,400.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 70,245,489.92			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 70,245,489.92	$ 815,991,910.08
				IVA 19%	$ 168,385,106.00			IVA 19%	$ 168,385,106.00			IVA 19%	$ 13,346,643.08			IVA 19%	$ 13,346,643.08	$ 155,038,462.92

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA N° 1 **FECHA:** 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

ACTA FINAL SI | NO x (INDICAR CON UNA "X")

VALOR ACTA: $ 83,592,133.00 **PERIODO:** 5/11/2025 al 30/11/2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-884-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INTERVENTORÍA: TERRA PROYECTOS I CIVILES S.A.S **CONTRATISTA:** PROBINTEC S.A.S

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES **PLAZO ACTUAL:** NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: 5-nov-25 **FECHA DE FIN:** 4-ago-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A** N.A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506.00 **VALOR CON ADICIONES:** $ 1,054,622,506.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
TOTAL VALOR INTERVENTORÍA							$ 1,054,622,506.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 1,054,622,506.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 83,592,133.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 83,592,133.00	$ 971,030,373.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO															$ -					
TOTAL A PAGAR															$ 83,592,133.00				$ 83,592,133.00	$ 971,030,373.00

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ -	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
SALDO A FAVOR	$ -	0%	
SUMAS IGUALES	$ -	100.0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1,054,622,506.00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ 0.00		
ACTA No. 1	$ 83,592,133.00	8%	8%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 971,030,373.00	92%	
SUMAS IGUALES	$ 1,054,622,506.00	100%	

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
TERRA PROYECTOS CIVILES S.AS.

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SUPERVISORA DEL CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

HÉCTOR ANDRÉS USECHE GUZMAN
DIRECTOR INTERVENTORÍA
TERRA PROYECTOS CIVILES S.AS.

JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CONTRATISTA-SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHobabativ	OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-23-11:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	126	**Fecha Registro:**	2026-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-250001 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	2525	**Nro. Cdp:**	1725
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	70.245.490,00	**Valor Iva:**	13.346.643,00	**Valor Total:**	83.592.133,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901788878	**Razon Social:**	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	FACTURA DE VENTA TPC 13 ACTA PARCIAL N 1

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHobabativ	OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-23-11:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	126	**Fecha Registro:**	2026-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-250001 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	2525	**Nro. Cdp:**	1725
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	70.245.490,00	**Valor Iva:**	13.346.643,00	**Valor Total:**	83.592.133,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901788878	**Razon Social:**	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	FACTURA DE VENTA TPC 13 ACTA PARCIAL N 1

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

27 de marzo de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0004216**

Folios: 1 Anexos: Si

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: ACTA DE COSTOS 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 884 DE 2025 EYD REGALÍAS LOTE 4 - 5 A 30 NOV

Bogotá D, C. 27 de marzo de 2026

Doctora
KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa Dirección Administrativa y Financiera
Calle 26 # 51-53 Torre Central Sexto Piso

Asunto: ACTA DE COSTOS 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 884 DE 2025 EYD REGALÍAS LOTE 4 - 5 A 30 NOV

Ref.: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE

Cordial saludo;

De manera atenta remito los documentos para el trámite de pago del acta parcial No. 1 del contrato de interventoría ICCU-884-2025, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2025, así:

Registro presupuestal **RER-2025000025 del 4 de noviembre de 2025 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS y RER-2026000016 ICCU.**

Documentos que se adjuntan:

1. Oficio de entrega.
2. Acta de inicio
3. Informe del Contratista de interventoría del periodo noviembre 2025.
4. Acta parcial No. 1 del periodo noviembre 2025.
5. Soportes de las memorias de cálculo del acta parcial del periodo de noviembre 2025.
6. Rut contratista de interventoría – TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

ICCU-I-2026-0004216

7. Certificación Bancaria contratista de interventoría.
8. Declaración de Origen de Fondos – Sarlaf, del periodo de noviembre 2025.
    - Cedula del represente legal.
9. Certificación de parafiscales del consorcio y cada uno de los consorciados del periodo de noviembre 2025.
    - Copia Cedula, copia de la tarjeta profesional, certificado de vigencias de antecedentes (junta de central de contadores) del profesional a cargo de generar el certificado.
    - Soporte pago planillas del periodo a cobrar.
10. Formato para el Cálculo de la seguridad social del mes de noviembre 2025 (firmados por su debida supervisión).
11. INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA No 1, debidamente suscritos correspondientes al Contrato ICCU-884 de 2025.
12. Factura electrónica correspondiente al acta de interventoría No 01 del periodo de noviembre 2025
13. Pólizas actualizadas de acuerdo a su última modificación contractual.
14. Verificación de publicación de pagos en Secop II
15. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA FACTURACIÓN PAGO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

Cordialmente,

SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial.

QR Validación Documento:

Contraseña:W39TBUJc4m

Aprobó: LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ / DCM
Revisó: . ASTRITH YAMILE PARDO AVILA / SDIV
Proyectó: JUAN DIEGO JIMENEZ MORENO / DCM

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHobabativ OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-250001 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-23-11:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	126	**Fecha Registro:**	2026-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		03-250001 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	83.592.133,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	83.592.133,00	**Saldo x Ordenar:**	83.592.133,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	22.946.594,00	**Valor Neto:**	60.645.539,00			**Nro. Compromiso:**	2525	**Nro. Cdp:**	1725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	8

TERCERO

Identificacion:	901788878	**Razon Social:**	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	69900008075	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	126	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	00RG-2402-0600-2024-00005-0021 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED VIAL REGIONAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Nación	RG25000	CSF	2026-04-23				
					Total:	83.592.133,00	0,00	83.592.133,00	83.592.133,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2026-04-23	Generada	83.592.133,00


SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHobabativ	OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-23-11:52 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	886.237.400,00	1,000 %	8.862.374,00	8.862.374,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	2,500 %	1.756.137,00	1.756.137,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	2,000 %	1.404.910,00	1.404.910,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	2,000 %	1.404.910,00	1.404.910,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	2,000 %	1.404.910,00	1.404.910,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	1,500 %	1.053.682,00	1.053.682,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	1,000 %	702.455,00	702.455,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	0,200 %	140.491,00	140.491,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70.245.490,00	6,000 %	4.214.729,00	4.214.729,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.346.643,00	15,000 %	2.001.996,00	2.001.996,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHobabativ OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-250001 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-23-11:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	126	**Fecha Registro:**	2026-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		03-250001 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	83.592.133,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	83.592.133,00	**Saldo x Ordenar:**	83.592.133,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	22.946.594,00	**Valor Neto:**	60.645.539,00			**Nro. Compromiso:**	2525	**Nro. Cdp:**	1725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	8

TERCERO

Identificacion:	901788878	**Razon Social:**	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	69900008075	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	126	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	00RG-2402-0600-2024-00005-0021 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED VIAL REGIONAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Nación	RG25000	CSF	2026-04-23				
					Total:	83.592.133,00	0,00	83.592.133,00	83.592.133,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2026-04-23	Generada	83.592.133,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHobabativ	OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-23-11:52 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	886.237.400,00	1,000 %	8.862.374,00	8.862.374,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	2,500 %	1.756.137,00	1.756.137,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	2,000 %	1.404.910,00	1.404.910,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	2,000 %	1.404.910,00	1.404.910,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	2,000 %	1.404.910,00	1.404.910,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	1,500 %	1.053.682,00	1.053.682,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	1,000 %	702.455,00	702.455,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	70.245.490,00	0,200 %	140.491,00	140.491,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70.245.490,00	6,000 %	4.214.729,00	4.214.729,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.346.643,00	15,000 %	2.001.996,00	2.001.996,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

REGALIAS ORDEN DE PAGO - 202670000010

900258711-1

Miércoles 22 de Abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : TERRA PROYECTOS CIVILES SAS **CC O NIT :** 901788878 **DV : 1**

DIRECCIÓN : AK 15 100 69 OF 306 **TEL** : 6013976385

DESCRIPCIÓN : PRO ADULTO MAYOR 2% - FACTURA DE VENTA TPC 13 ACTA PARCIAL 1 PERIODO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 884-2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A

DOC SOPORTE ASIENTO: 5858 **Numero: ICCU 884-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
83551010	PROYECTOS DE INVERSION SGR ACTIVOS			**70.245.490,00**	**0,00**
10010101	EjecuciOn proyectos de inversiOn SGR			**60.645.538,00**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**13.346.643,10**	**0,00**
1384900707	CXC SGR TIMBRE			**8.862.374,00**	**0,00**
1384900702	CXC SGR ESTAMPILLAS			**6.111.357,63**	**0,00**
1384900703	CXC SGR RETENCION EN LA FUENTE			**4.214.729,40**	**0,00**
1384900704	CXC SGR RETENCION IVA			**2.001.996,47**	**0,00**
1384900701	CXC SGR CONTRIBUCION ESP Y TASA PRO DEPORTE			**1.756.137,25**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**0,00**	**0,00**
58909002	AJUSTES AL PESO			**0,00**	**0,10**
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	70.245.490,00	0,20	**0,00**	**140.490,98**
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	70.245.490,00	1,00	**0,00**	**702.454,90**
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	70.245.490,00	1,50	**0,00**	**1.053.682,35**
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	70.245.490,00	2,00	**0,00**	**1.404.909,80**
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	70.245.490,00	2,00	**0,00**	**1.404.909,80**
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	70.245.490,00	2,00	**0,00**	**1.404.909,80**
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	70.245.490,00	2,50	**0,00**	**1.756.137,25**
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	13.346.643,10	15,00	**0,00**	**2.001.996,47**
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	70.245.490,00	6,00	**0,00**	**4.214.729,40**
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE DEC 175 2025	886.237.400,00	1,00	**0,00**	**8.862.374,00**
10010102	EjecuciOn proyectos de inversiOn SGR CXP			**0,00**	**60.645.538,00**
89151615	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION SGR ACTIVOS			**0,00**	**83.592.133,00**
	SUMAS IGUALES			**167.184.265,85**	**167.184.265,85**

Total Deducciones	**22.946.594,75**	**Total a Girar**	**60.645.538,00**

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	2026000017	REGISTRO	2026000016

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	83.592.133,10
TOTAL PRESUPUESTO		**83.592.133,10**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: JESSICA ALEXANDRA BERNAL VARGAS

	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA N° 1 **FECHA:** 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

ACTA FINAL SI | NO x (INDICAR CON UNA "X")

VALOR ACTA: $ 83,592,133.00 **PERIODO:** 5/11/2025 al 30/11/2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-884-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INTERVENTORÍA: TERRA PROYECTOS I CIVILES S.A.S **CONTRATISTA:** PROBINTEC S.A.S

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES **PLAZO ACTUAL:** NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: 5-nov-25 **FECHA DE FIN:** 4-ago-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A** N.A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506.00 **VALOR CON ADICIONES:** $ 1,054,622,506.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				
Director de Interventoría	$ 8,630,000.00	III-3	1	40%	9	2.3	$ 71,456,400.00	**1**	**40%**	**9**	**$ 71,456,400.00**	**1**	**40%**	**0.40**	**$ 3,175,840.00**	**1**	**40%**	**0.40**	**$ 3,175,840.00**	**$ 68,280,560.00**
Especialista Pavimentos	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Tránsito y Transporte	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Seguridad Vial	$ 7,050,000.00	II-4	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Geotecnia	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Diseño Geométrico	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en BIM	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	4	2.3	$ 32,430,000.00	**1**	**50%**	**4**	**$ 32,430,000.00**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**$ 32,430,000.00**
Especialista en Estructuras	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista en Estructuras (Puentes)	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Especialista Ambiental	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	5	2.3	$ 35,592,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 35,592,500.00**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**$ 35,592,500.00**
Especialista Forestal	$ 6,190,000.00	II-3	1	50%	5	2.3	$ 35,592,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 35,592,500.00**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**1**	**50%**	**0.00**	**$ -**	**$ 35,592,500.00**
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Geólogo	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.3	$ 40,537,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 40,537,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 4,053,750.00**	**$ 36,483,750.00**
Profesional Gestor Social	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	5	2.3	$ 35,592,500.00	**1**	**50%**	**5**	**$ 35,592,500.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**$ 32,033,250.00**
Profesional de Costos y Presupuestos	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	**1**	**50%**	**4**	**$ 28,474,000.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**$ 24,914,750.00**
Ingeniero Residente - Apoyo Consultoría	$ 1,900,000.00	II-2	2	100%	9	2.3	$ 78,660,000.00	**2**	**100%**	**9**	**$ 78,660,000.00**	**2**	**100%**	**0.40**	**$ 3,496,000.00**	**2**	**100%**	**0.40**	**$ 3,496,000.00**	**$ 75,164,000.00**
Ingeniero Catastral y Geodesta	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	**1**	**50%**	**4**	**$ 28,474,000.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**1**	**50%**	**0.50**	**$ 3,559,250.00**	**$ 24,914,750.00**

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA N° 1 **FECHA:** 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

ACTA FINAL SI | NO x (INDICAR CON UNA "X")

VALOR ACTA: $ 83,592,133.00 **PERIODO:** 5/11/2025 al 30/11/2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-884-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INTERVENTORÍA: TERRA PROYECTOS I CIVILES S.A.S **CONTRATISTA:** PROBINTEC S.A.S

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES **PLAZO ACTUAL:** NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: 5-nov-25 **FECHA DE FIN:** 4-ago-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A** N.A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506.00 **VALOR CON ADICIONES:** $ 1,054,622,506.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
Abogado (Con Conocimiento en Estudio de Título Predial)	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	1	50%	4	$ 28,474,000.00	1	50%	0.50	$ 3,559,250.00	1	50%	0.50	$ 3,559,250.00	$ 24,914,750.00
Avualuador	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.3	$ 28,474,000.00	1	50%	4	$ 28,474,000.00	1	50%	0.40	$ 2,847,400.00	1	50%	0.40	$ 2,847,400.00	$ 25,626,600.00
PERSONAL TECNICO								PERSONAL TECNICO						0.00	$ -			0.00	$ -	$ -
Topógrafo	$ 2,800,000.00	-	1	50%	4	2.3	$ 12,880,000.00	1	50%	4	$ 12,880,000.00	1	50%	0.30	$ 966,000.00	1	50%	0.30	$ 966,000.00	$ 11,914,000.00
Secretaria	$ 1,500,000.00	-	1	100%	9	2.3	$ 31,050,000.00	1	100%	9	$ 31,050,000.00	1	100%	0.07	$ 241,500.00	1	100%	0.07	$ 241,500.00	$ 30,808,500.00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811,987,400.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811,987,400.00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 61,447,490.00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 61,447,490.00	$ 750,539,910.00

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
OTROS COSTOS						OTROS COSTOS				OTROS COSTOS				OTROS COSTOS				
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	2	6	$ 4,200,000.00	$ 50,400,000.00	2	6	$ 4,200,000.00	$ 50,400,000.00	2	0.83	$ 4,200,000.00	$ 6,972,000.00	2	0.83	$ 4,200,000.00	$ 6,972,000.00	$ 43,428,000.00
Alquiler de mobiliario para oficina, con equipos de cómputo, impresora, tinta para impresión y demás elementos que integren la oficina	Mes	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	$ 8,987,000.00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	9	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	1	0.83	$ 1,100,000.00	$ 913,000.00	$ 8,987,000.00
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	Mes	1	9	$ 450,000.00	$ 4,050,000.00	1	9	$ 450,000.00	$ 4,050,000.00	1	0.00	$ 450,000.00	$ -	1	0.00	$ 450,000.00	$ -	$ 4,050,000.00
NOMBRE SUBCAPITULO					$ 74,250,000.00	NOMBRE SUBCAPITU		$	74,250,000.00	NOMBRE SUBCAPITULO		$	8,798,000.00	NOMBRE SUBCAPITULO		$	8,798,000.00	$ 65,452,000.00
AJUSTE AL PESO													-$ 0.08				-$ 0.08	$ 0.08
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74,250,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74,250,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 8,798,000.00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 8,798,000.00	$ 65,452,000.00
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 886,237,400.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 886,237,400.00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 70,245,489.92			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 70,245,489.92	$ 815,991,910.08
				IVA 19%	$ 168,385,106.00			IVA 19%	$ 168,385,106.00			IVA 19%	$ 13,346,643.08			IVA 19%	$ 13,346,643.08	$ 155,038,462.92

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA N° 1 **FECHA:** 5 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

ACTA FINAL SI | NO x — INDICAR CON UNA "X"

VALOR ACTA: $ 83,592,133.00 **PERIODO:** 5/11/2025 al 30/11/2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-884-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INTERVENTORÍA: TERRA PROYECTOS I CIVILES S.A.S **CONTRATISTA:** PROBINTEC S.A.S

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES **PLAZO ACTUAL:** NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: 5-nov-25 **FECHA DE FIN:** 4-ago-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A** N.A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506.00 **VALOR CON ADICIONES:** $ 1,054,622,506.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
TOTAL VALOR INTERVENTORÍA							$ 1,054,622,506.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 1,054,622,506.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 83,592,133.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 83,592,133.00	$ 971,030,373.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO															$ -					
TOTAL A PAGAR															$ 83,592,133.00				$ 83,592,133.00	$ 971,030,373.00

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ -	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
SALDO A FAVOR	$ -	0%	
SUMAS IGUALES	$ -	100.0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1,054,622,506.00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ 0.00		
ACTA No. 1	$ 83,592,133.00	8%	8%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 971,030,373.00	92%	
SUMAS IGUALES	$ 1,054,622,506.00	100%	

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
TERRA PROYECTOS CIVILES S.AS.

LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SUPERVISORA DEL CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

HÉCTOR ANDRÉS USECHE GUZMAN
DIRECTOR INTERVENTORÍA
TERRA PROYECTOS CIVILES S.AS.

JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CONTRATISTA-SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHcarodric	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-9:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	224652326	**Fecha Registro:**	2026-05-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-250001 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2026-05-06		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	83.592.133,00	**Valor Deducciones:**	22.946.594,00	**Valor Neto:**	60.645.539,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**83.592.133,00**	Valor Deducciones	22.946.594,00	Valor Neto	**60.645.539,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901788878	**Razón Social:**	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900008075	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	ORDEN DE PAGO 20260000010 126	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2026-05-04
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU / 00RG-2402-0600-2024-00005-0021 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED VIAL REGIONAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA									
	Nación	RG25000	CSF	83.592.133,00	0,00	83.592.133,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	4.214.729,00	4.214.729,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.001.996,00	2.001.996,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,000 %	1.404.910,00	1.404.910,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,000 %	702.455,00	702.455,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,500 %	1.053.682,00	1.053.682,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,000 %	1.404.910,00	1.404.910,00	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,000 %	1.404.910,00	1.404.910,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,200 %	140.491,00	140.491,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,500 %	1.756.137,00	1.756.137,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,000 %	8.862.374,00	8.862.374,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
03-250001 - INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2026-05-01	83.592.133,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
