Aguazul, 06 de mayo de 2026

Ingeniero:
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor contrato de prestación de servicios No. 0073-2026
Aguazul

Ref.: Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión No 0073-2026

Asunto: Informe de ejecución de actividades No 4- ACTA No. 5 PARCIAL 4

Por medio de la presente me permito presentar informe No. 4-Acta 05 PARCIAL 4 de ejecución de actividades, las cuales se desarrollaron durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/04/2026 al 30/04/2026, de acuerdo al contrato de la referencia, cuyo objeto contractual es "PRESTAR APOYO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO EN LA PLATAFORMA GESPROY, ASÍ COMO PARA EL REPORTE OPORTUNO DE ALERTAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, REGISTRADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

Sin otro particular,

GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
C.C. No. 47.442.426 de Yopal
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 4

Aguazul, 06 de mayo del 2026.

Señor(a)
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0073 - MA-CD-SI-069-2026 de 16-01-2026.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

CONTRATO	:	0073
TIPO CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO	:	PRESTAR APOYO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO EN LA PLATAFORMA GESPROY, ASÍ COMO PARA EL REPORTE OPORTUNO DE ALERTAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, REGISTRADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.
VALOR	:	$20.400.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 MCTE.
VALOR FINAL	:	$20.400.000,00 MCTE.
PLAZO	:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA	:	
FECHA INICIO	:	19-01-2026
FECHA TERMINACIÓN	:	18-05-2026

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/04/2026 hasta el 30/04/2026.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Actualizar la información física de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en la plataforma GESPROY, desde su aprobación hasta la fase de cierre. Así como la revisión de programación, metas físicas y financieras y demás aspectos de los proyectos desarrollados en el marco del Proceso de Gestión de la Infraestructura.	En atención al cumplimiento de la actividad relacionada con la actualización de la información técnica y financiera de los proyectos de inversión del SGR en la plataforma GESPROY, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2026, se realizó la actualización de la información física de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), desde su aprobación hasta la fase de cierre, así como la revisión de la programación, las metas físicas y financieras y demás aspectos relevantes de los proyectos

	desarrollados en el marco del Proceso de Gestión de la Infraestructura. En el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2026, sobre el proyecto **"Construcción del parador y ejecución de obras de urbanismo en el Parque del Arroz del municipio de Aguazul, departamento de Casanare"**, se realizaron las correspondientes actividades de seguimiento y registro. Asimismo, el proyecto presenta reinicio con fecha del 27 de abril de 2026. En el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril, respecto al proyecto **Construcción de obras de estabilización, mitigación y control para la protección de la margen derecha, aguas arriba del río Cachiza, en el estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal, ubicado en la vereda Únete del municipio de Aguazul, Casanare**. Se realizó la actualización de pólizas con reinicio y se registró el acta de reinicio del contrato de obra e interventoría. Se registró el Acta No. 713 correspondiente a la Ampliación No. 6 de la Suspensión No. 10, de fecha 06 de marzo de 2026, por un periodo de treinta (30) días, del contrato de obra No. 684-2019. La fecha prevista de reinicio es el 06 de MAYO de 2026. Al contrato de obra se le realizo registro de acta n. 72 de fijación de precios Se registró el Acta No. 58, correspondiente a la Ampliación No. 6 de la Suspensión No. 11, de fecha 06 de marzo de 2026, por un periodo de treinta (30) días, del contrato No. 685-2019. La fecha prevista de reinicio es el 06 de MAYO de 2026. Lo anterior, en el marco del proyecto **"Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul"**. Evidencia: Actividad 1 Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 1
Realizar la emisión y entrega oportuna de alertas tempranas en caso de retrasos en la entrega de la información, con el fin de prevenir incumplimientos y evitar sanciones, en el marco del proceso de Gestión de la Infraestructura.	En cumplimiento de la actividad asignada y conforme a la designación realizada por el supervisor para el período comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, se efectuó la emisión y entrega oportuna de alertas tempranas frente a posibles retrasos en la entrega de información, con el propósito de prevenir incumplimientos y evitar eventuales sanciones. En el marco del proceso de Gestión de la Infraestructura, se encuentra el proyecto **"Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López, en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare"**, el cual presenta una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 98,81%. Actualmente, el proyecto se encuentra en estado TERMINADO, con una alerta EJ-1-24. Evidencia: Actividad 2 Informe de alertas Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 2
Elaborar respuestas a los requerimientos formulados por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), los organismos de control y el representante legal, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales del municipio en su calidad de entidad ejecutora.	En cumplimiento de la actividad asignada y conforme a la designación efectuada por el supervisor para el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril 2026, no se presentaron requerimientos por parte del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), los organismos de control ni del representante legal, garantizando así el

	cumplimiento de las obligaciones legales del municipio en su calidad de entidad ejecutora. Evidencia: Actividad 3 Medio: Medio físico: 1 folio Medio digital: Anexo 3
Elaborar un (1) informe mensual que detalle el estado de avance de cada uno de los proyectos financiados con recursos del SGR, en el marco del Proceso de Gestión de la Infraestructura.	En cumplimiento se presenta una actualización del estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaria de lEn el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2026, se presenta la actualización del estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), los cuales son ejecutados por el Municipio de Aguazul a través de la Secretaría de Infraestructura. El presente informe se elabora en cumplimiento de la Actividad No. 4 del Contrato CPS No. 0076-2026, cuyo objeto corresponde a: "Elaborar un (1) informe mensual que detalle el estado de avance de cada uno de los proyectos financiados con recursos del SGR, en el marco del Proceso de Gestión de la Infraestructura". En este sentido, se realiza el seguimiento y verificación de la información registrada en el aplicativo GESPROY SGR, con el fin de evidenciar el avance físico, administrativo y contractual de cada uno de los proyectos, así como la actualización de documentos relevantes como actas, suspensiones, reinicios, prórrogas y demás soportes asociados a su ejecución. Evidencia: Informe estado de proyectos Medio: Medio físico: 3 folios Medio digital: Anexo 4
Brindar acompañamiento y asistencia profesional a los responsables de los proyectos de inversión en temas relacionados con el uso de la plataforma GESPROY, los procesos de reprogramación y la carga de información.	En cumplimiento de las funciones asignadas, se brindó acompañamiento y asistencia profesional a los responsables de los proyectos de inversión en temas relacionados con el manejo y uso de la plataforma GESPROY. En este sentido, se realizó apoyo al **Proyecto BPIN 2022850100009 "Construcción de obras de estabilización, mitigación y control para la protección de la margen derecha aguas arriba del río Cachiza, en el estribo del paso elevado".** En dicho proyecto se efectuó la reprogramación, teniendo en cuenta la fecha final de terminación, estableciendo como horizonte el 16 de abril de 2026. Evidencia: Asistencia profesional Medio: Medio físico: 1 Medio digital: Anexo 5
Las demás designadas por el supervisor que sean inherentes al objeto contractual	En atención al cumplimiento de la actividad asignada y de conformidad con la designación otorgada por el supervisor para el período comprendido entre el 01 al 30 de marzo, asistí de manera presencial a la ciudad de Villavicencio a una capacitación sobre el aplicativo GESPROY SGR y la nueva metodología establecida mediante la Resolución No. 4574 de 2025, la cual inició su implementación el 01 de enero de 2026. Se proyecto oficio al FONDO MIXTO con el propósito de fortalecer l los procesos de seguimiento y control, así como garantizar la adecuada ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, se solicito remitir a la Dirección de Infraestructura, al correo electrónico obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co, la información actualizada relacionada con el estado, avance físico,

	avance financiero y cumplimiento normativo de los siguientes proyectos: • **BPIN 2024850100031:** Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía Guaduales - sector Matapalo del municipio de Aguazul, Casanare. • **BPIN 2025850100002**: Construcción, dotación y mejoramiento de áreas recreo deportivas para el equipamiento denominado Villa Olímpica del municipio de Aguazul, departamento de Casanare. • **BPIN 2025850100003:** Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de la vereda Rincón de la Esmeralda del municipio de Aguazul, Casanare. • **BPIN 2025850100004:** Mejoramiento a nivel de pavimento de las vías de la vereda Guadualito y La Victoria del municipio de Aguazul, Casanare. • **BPIN 2025850100005**: Ampliación de las redes de distribución de gas natural para el área rural y urbana del municipio de Aguazul, Casanare. • **BPIN 2025850100006:** Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía terciaria denominada Vía 1, vereda Rincón del Bubuy del municipio de Aguazul, departamento de Casanare. • **BPIN 2025850100010:** Mejoramiento a nivel de pavimento en el sector del PR 2+663 al PR 3+68445 del anillo vial Unión Charte - Cupiagua en la vereda El Triunfo del municipio de Aguazul, Casanare. • **BPIN 2025850100016:** Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda San Lorenzo en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare. • **BPIN 2025850100021:** Mejoramiento a nivel de pavimento de las vías internas de la urbanización Quintas de la Sabana del área urbana de San José del Bubuy, municipio de Aguazul, departamento de Casanare. Evidencia: Otras actividades Medio: Medio físico: 1 folio Medio digital: Anexo 6

Para una ejecución acumulada del contrato 0073 del 85.0%

OBSERVACIONES:
FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BBVA 981580301

Atentamente,


GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
Contraista

ACTIVIDAD 1.


En atención al cumplimiento de la actividad relacionada con la actualización de la información técnica y financiera de los proyectos de inversión del SGR en la plataforma GESPROY, correspondiente al periodo comprendido entre el **01 de abril al 30 de abril de 2026,** se realizó la actualización de la información física de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), desde su aprobación hasta la fase de cierre, así como la revisión de la programación, las metas físicas y financieras y demás aspectos relevantes de los proyectos desarrollados en el marco del Proceso de Gestión de la Infraestructura.

ITEM	BPIN	PROYECTO	OBSERVACIÒN
1	2022005850010	Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare	En el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2026, sobre el proyecto "Construcción del parador y ejecución de obras de urbanismo en el Parque del Arroz del municipio de Aguazul, departamento de Casanare", se realizaron las correspondientes actividades de seguimiento y registro. Asimismo, el proyecto presenta reinicio con fecha del 27 de abril de 2026.

ITEM	BPIN	PROYECTO	OBSERVACIÒN
2	2022850100009	Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de aguazul Casanare	En el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril, respecto al proyecto Construcción de obras de estabilización, mitigación y control para la protección de la margen derecha, aguas arriba del río Cachiza, en el estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal, ubicado en la vereda Únete del municipio de Aguazul, Casanare. Se realizó la actualización de pólizas con reinicio y se registró el acta de reinicio del contrato de obra e interventoría.

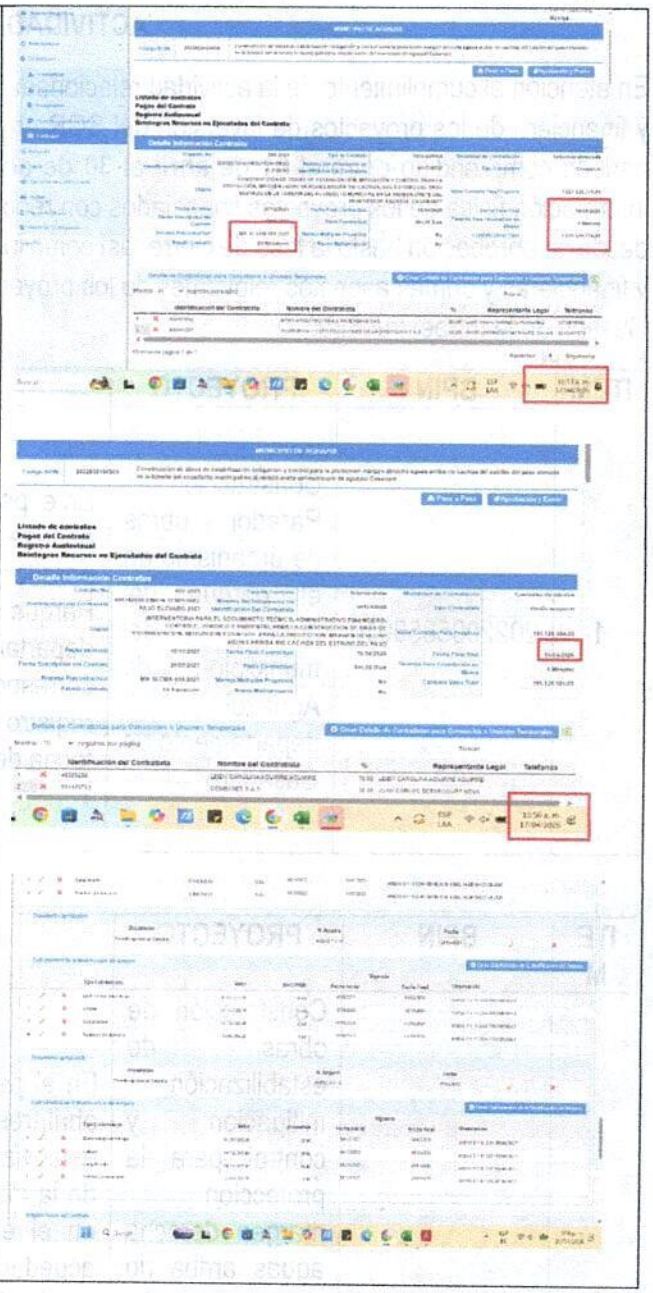ITEM	BPIN	PROYECTO	OBSERVACIÒN
2	2019850100004	Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul	Se registró el **Acta No. 713** correspondiente a la **Ampliación No. 6 de la Suspensión No. 10**, de fecha 06 de marzo de 2026, por un periodo de treinta (30) días, del contrato de obra No. 684-2019. La fecha prevista de reinicio es el **06 de MAYO de 2026**.  Al contrato de obra se le realizo registro de acta n. 72 de fijación de precios

			Modificaciones al Contrato — Crear Modificaciones al Contrato Mostrar 10 registros por página — Buscar Tipo De Modificación | Documento | Documento Número | Fecha Documento | Objeto | Valor | Adición En Tiempo | Soporte | Fecha d Registr 11 | Tiempo | Prorroga | 0 | 26/09/2025 | PRORROGA DE UN MES | 1 Mes(es) | - | - 12 | Aclaracion | Acuerdo | 72 | 16/03/2026 | ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS | | Ver | 27/04/2026 Mostrando página 2 de 2 — Anterior 1 2 Siguien Se registró el **Acta No. 58**, correspondiente a la **Ampliación No. 6 de la Suspensión No. 11**, de fecha 06 de marzo de 2026, por un periodo de treinta (30) días, del contrato No. 685-2019. La fecha prevista de reinicio es el **06 de MAYOde 2026**. Lo anterior, en el marco del proyecto *"Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul"*. Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato Mostrar 10 registros por página — Buscar Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Soporte 56 | Acta de suspensión | 05/03/2026 | ACTA 56 AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION 11, POR 30 DIAS FECHA PREVISTA DE REINICIO 07 DE MARZO DE 2026 | 0.00 | 19/03/2026 | Ajustes de diseños estudios o condiciones técnicas | Ver 57 | Acta de suspensión | 06/03/2026 | ACTA NO. 57 AMPLIACIÓN NO. 5 A LA SUSPENSIÓN NO 11 DEL 06 DE MARZO DE 2026 (30 DIAS) FECHA REINICIO 06 DE ABRIL 2026 | 0.00 | 01/04/2026 | Ajustes de diseños estudios o condiciones técnicas | Ver 58 | Acta de suspensión | 06/04/2026 | ACTA NO 58 AMPLIACIÓN NO 6 A LA SUSPENSIÓN NO.11 DEL 06 DE ABRIL DE 2026, POR 30 DIAS FECHA PREVISTA DE REINICIO 06/05/2026 | 0.00 | 21/04/2026 | Ajustes de diseños estudios o condiciones técnicas | Ver Mostrando página 3 de 3 — Anterior 1 2 3 4 Siguiente

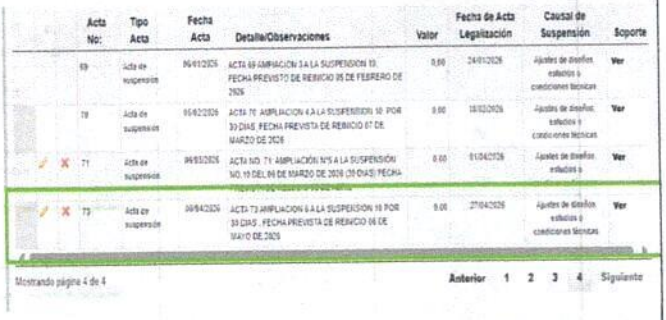ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0073 del 16 de enero de 2026

Yopal, 30 de abril de 2026

Ingeniero
Juan Miguel Sandoval Gutierrez
Secretario de Infraestructura
Municipio de Aguazul

ASUNTO: Elaborar un (1) informe mensual que detalle el estado de avance de cada uno de los proyectos financiados con recursos del SGR, en el marco del Proceso de Gestión de la Infraestructura. ACTIVIDAD 4

PERIODO:01 de abril al 30 de abril de 2026

Este informe presenta una actualización del estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 4 del Contrato CPS No.0076-2026 de " Elaborar un (1) informe mensual que detalle el estado de avance de cada uno de los proyectos financiados con recursos del SGR, en el marco del Proceso de Gestión de la Infraestructura

Actualmente el sistema GESPROY registra un total de OCHO (proyectos que se relacionan a continuación, en sus diferentes estados: en ejecución y terminado.

Proyectos en Estado en Ejecución:


ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2019850100004	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL
2	2020850100007	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
3	2022005850010	CONSTRUCCIÓN PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
4	2022850100009	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Proyectos en Estado Terminado y Para cierre

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2019850100002	CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
2	2022850100011	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL URBANO DENOMINADO CONCHA ACÚSTICA ALBERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
3	2021005850074	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROYECTOS EN EJECUCION
PROYECTO 1.

BPIN	2019850100004
Proyecto	Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado Plaza de Toros en el municipio de Aguazul
Estado	En ejecución
Avance Físico	93,44% (corte agosto 2025)
Avance Financiero	93,96% (corte agosto 2025)
Alerta	Proyecto suspendido desde el 24 de septiembre de 2025. Se registró ampliación de la suspensión con fecha prevista de reinicio el 06 de mayo de 2026
IGPR – IGPR CUARTO TRIMESTRE 2025	75 puntos

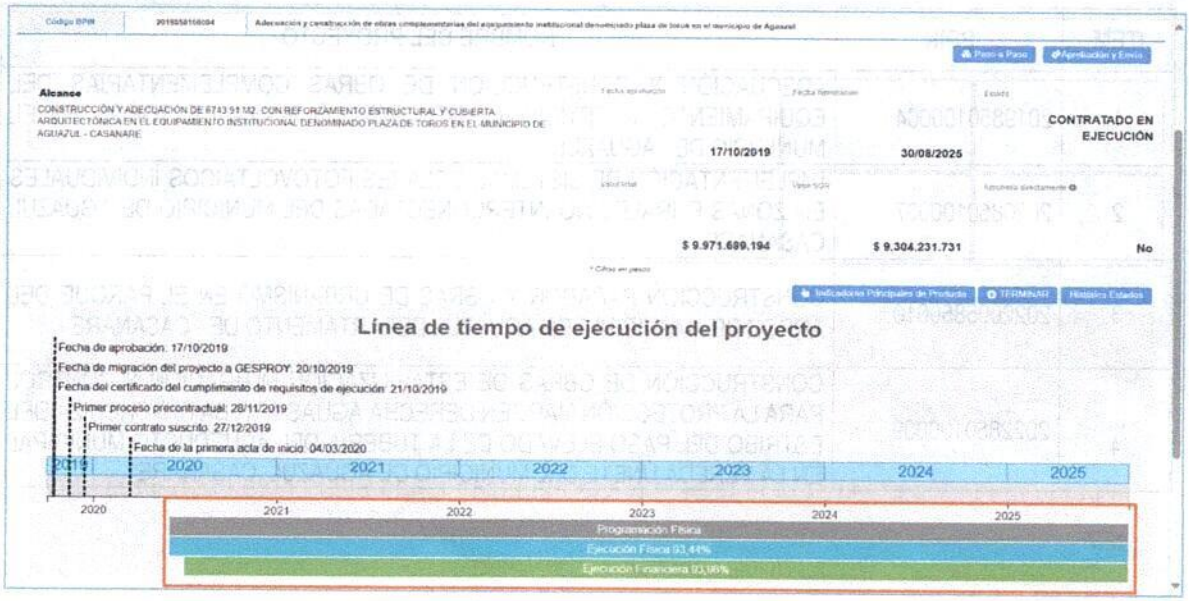

PROYECTO 2.

BPIN: 2020850100007
PROYECTO: Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanare
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 77,24% a marzo 2024
AVANCE FINANCIERO: 72,51% a agosto de 2024
OBSERVACIÓN: La programación registrada esta de julio de 2021 a marzo de 2024, Presenta dos Planes administrativos de control por parte del Departamento nacional de planeación:
PAC 2581-24: "c) No ejecutar el proyecto de inversión en los términos de su aprobación sin justificación técnica o jurídica."

- ✓ "En la visita se observó que, aunque el contrato de obra tiene acta de terminación en octubre de 2023, están pendientes por desarrollar actividades para la funcionalidad del proyecto, tales como la sincronización del software para el cobro del servicio, instalación del sistema de cobro prepago y la creación de la entidad encargada de atender el servicio eléctrico prestado por los paneles instalados en cada beneficiario, careciendo así de la debida sostenibilidad del proyecto.
- ✓ Las actividades pendientes por desarrollar impiden que los beneficiarios tengan el debido soporte técnico del sistema, que garantice el correcto funcionamiento en el momento en que se presenten fallas en el servicio eléctrico.


- ✓ El proyecto no cuenta con acciones que permiten la continuidad y operación, situación que puede llegar a comprometer el uso eficiente de los sistemas fotovoltaicos instalado en los 137 beneficiarios los cuales pueden presentar posibles fallas irreparables que comprometen la estabilidad del proyecto.

PAC 1142-24: se registra programación vencida, siendo necesario que la entidad ejecutora rinda explicaciones al respecto, toda vez, que lo anterior configura una presunta situación irregular, que se enmarca en la causal c) del Artículo 174 de la Ley 2056 de 2020
Teniendo en cuenta que la actividad de interventoría no se ejecutó al 100 %, se va a realizar la solicitud ante el DNP para ajustar el porcentaje de ejecución de la interventora, la cuál va de acuerdo al avance de la obra.
ALERTA: No presenta alertas
IGPR CUARTO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO



PROYECTO 3.

BPIN	2022005850010
Proyecto	Construcción Parador y obras de urbanismo en el Parque del Arroz del municipio de Aguazul, departamento de Casanare
Estado	En ejecución
Avance Físico	97,57% (corte septiembre 2025)
Avance Financiero	77,48% (corte julio 2024)
Observación	Se proyecta reinicio el 27 de abril de 2026

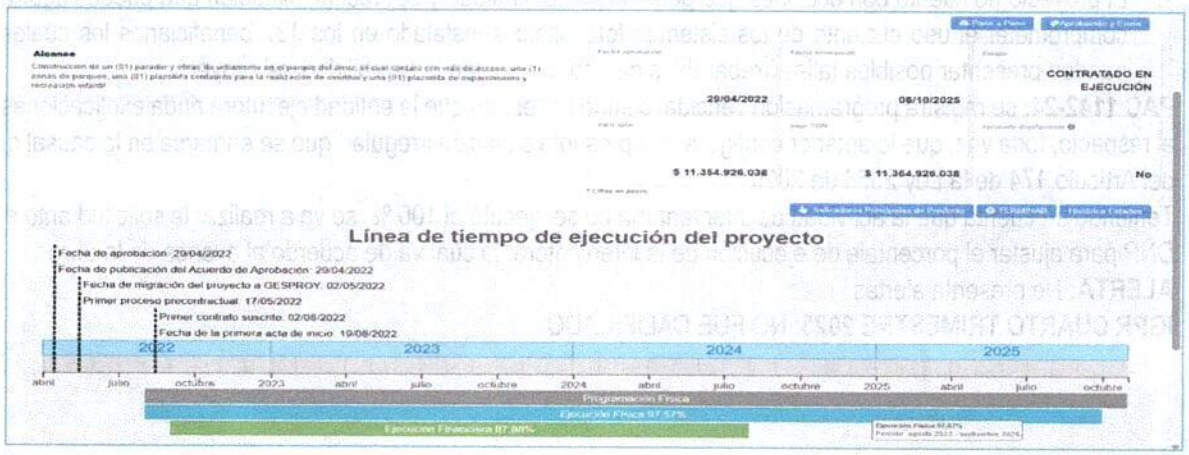

PROYECTO 4.


BPIN: 2022850100009
PROYECTO: Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de Aguazul-Casanare.
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 59,60 a febrero de 2025
AVANCE FINANCIERO: 45,35 a abril de 2024

OBSERVACIÓN: Se reprogramo el proyecto, con fecha de horizonte final el 16 de abril de 2026
Presenta un PAC-1144-24 (Programación vencida) – tiene suspensión de giros
ALERTA: No presenta alertas
IGPR CUARTO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO



PROYECTO PARA CIERRE
PROYECTO 1

BPIN: 2019850100002
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
ESTADO: PARA CIERRE
AVANCE FISICO: 99,94 registrada a diciembre de 2022
AVANCE FINANCIERO: 99,94registrada a diciembre de 2022
IGPR CUARTO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO

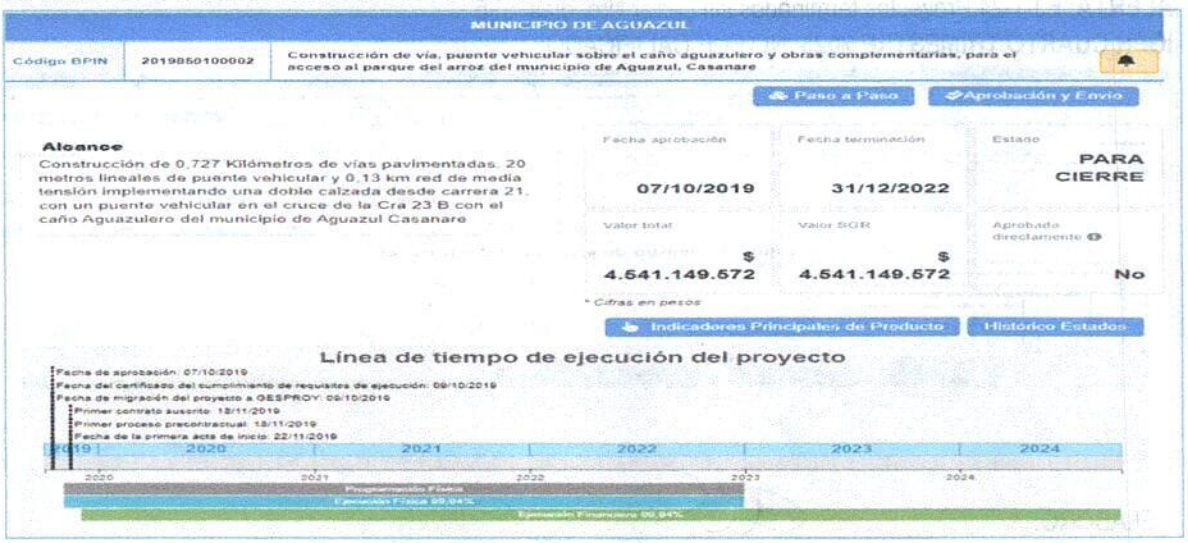

PROYECTO 2

BPIN: 2021005850074
PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,09% Registrada a diciembre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 99,99 a DICIEMBRE 2025
IGPR CUARTO TRIMESTRE 2025:: NO FUE CALIFICADO



PROYECTOS TERMINADOS
PROYECTO 1

BPIN: 2022850100011
PROYECTO: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 100% Registrada a octubre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 98,81 a diciembre de 2024
OBSERVACIÓN: El contrato de Interventoría N. 321-2022, no está liquidado. (le faltan pagos)
ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 595
IGPR CUARTO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO



ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0073 del 16 de enero de 2026

ACTIVIDAD 3. Elaborar respuestas a los requerimientos formulados por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), los organismos de control y el representante legal, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales del municipio en su calidad de entidad ejecutora.

En cumplimiento de la actividad asignada y conforme a la designación efectuada por el supervisor para el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril, no se presentaron requerimientos por parte del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), los organismos de control ni del representante legal, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones legales del municipio en su calidad de entidad ejecutora.

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0073 del 16 de enero de 2026


ACTIVIDAD 2. -INFORME DE ALERTAS

Realizar la emisión y entrega oportuna de alertas tempranas en caso de retrasos en la entrega de la información, con el fin de prevenir incumplimientos y evitar sanciones, en el marco del proceso de Gestión de la Infraestructura.

D/A: En atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor para el periodo comprendido entre el **01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026** se realizó la emisión y entrega oportuna de alertas tempranas ante posibles retrasos en la entrega de la información, con el fin de prevenir incumplimientos y evitar sanciones, en el marco del proceso de Gestión de la Infraestructura.


ASUNTO: INFORME MENSUAL DE ESTADO DE ALERTAS.

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CÓDIGO ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
EJ-1-24	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 746 	2022850100011	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL URBANO DENOMINADO CONCHA ACÚSTICA ALBERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Ejecución Física 100%Ejecución Financiera 98,81%

ALERTAS SIN SUBSANAR

NOTA: Las alertas se visualizan en el aplicativo GESPROY, en el menú izquierdo, en la sección de *"Reportes" -Alertas SMSCE*

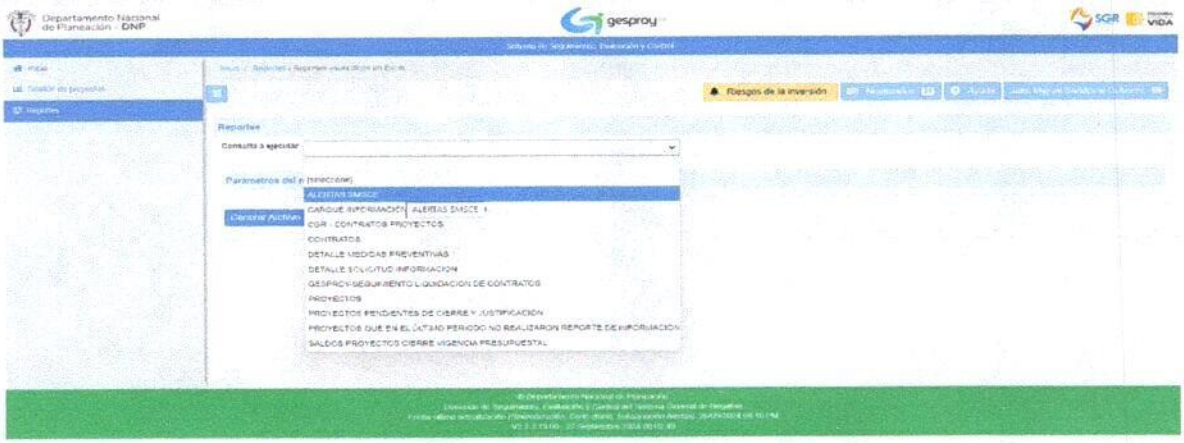

6. Alertas 7

6. Alertas 7

Asociada A	No.	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo
Proyecto	7	4	2	0	1

Detalle alertas entidad

Código	Descripción	Cuenta No.	Cuenta	Último Periodo Reportado	Plazo Reporte

No hay datos de alertas

Detalle de alertas en proyectos

BPIN	No.	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo
2013850100023	1	1	0	0	0
2025850100011	2	0	1	0	1
2021850100020	1	1	0	0	0
2013850100017	1	1	0	0	0
2022850100011	1	1	0	0	0
2021005650074	1	0	1	0	0


ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0073 del 16 de enero de 2026

ACTIVIDAD 5. Brindar acompañamiento y asistencia profesional a los responsables de los proyectos de inversión en temas relacionados con el uso de la plataforma GESPROY, los procesos de reprogramación y la carga de información.

D/A: En cumplimiento de las funciones asignadas, se brindó acompañamiento y asistencia profesional a los responsables de los proyectos de inversión en temas relacionados con el manejo y uso de la plataforma GESPROY.

En este sentido, se realizó apoyo al Proyecto BPIN 2022850100009 "Construcción de obras de estabilización, mitigación y control para la protección de la margen derecha aguas arriba del río Cachiza, en el estribo del paso elevado". En dicho proyecto se efectuó la reprogramación, teniendo en cuenta la fecha final de terminación, estableciendo como horizonte el 16 de abril de 2026.

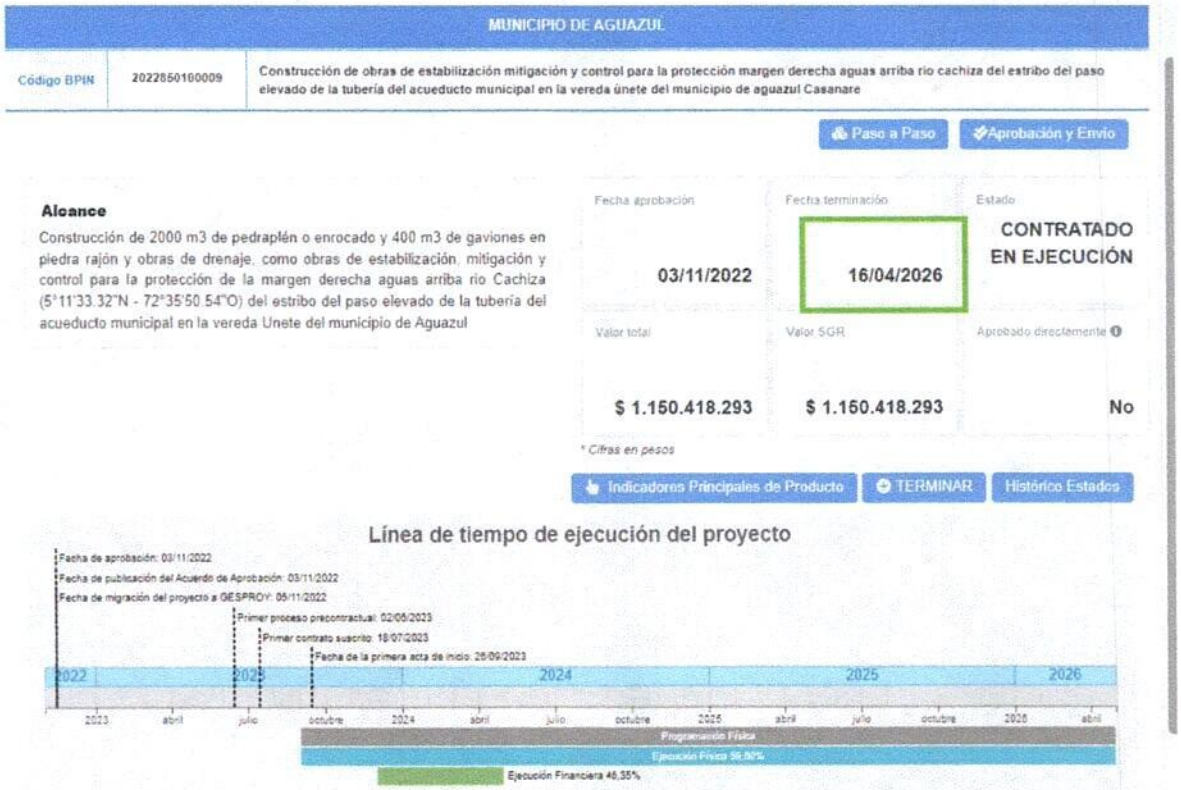

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0073 del 16 de enero de 2026

ACTIVIDAD 6.LAS DEMÁS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR QUE SEAN INHERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL

En atención al cumplimiento de la actividad asignada y de conformidad con la designación otorgada por el supervisor para el período comprendido entre el 01 al 30 de marzo, asistí de manera presencial a la ciudad de Villavicencio a una capacitación sobre el aplicativo GESPROY SGR y la nueva metodología establecida mediante la Resolución No. 4574 de 2025, la cual inició su implementación el 01 de enero de 2026.

Se proyecto oficio al FONDO MIXTO con el propósito de fortalecer l los procesos de seguimiento y control, así como garantizar la adecuada ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, se solicito remitir a la Dirección de Infraestructura, al correo electrónico **obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co**, la información actualizada relacionada con el estado, avance físico, avance financiero y cumplimiento normativo de los siguientes proyectos:

- BPIN 2024850100031: Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía Guaduales - sector Matapalo del municipio de Aguazul, Casanare.
- BPIN 2025850100002: Construcción, dotación y mejoramiento de áreas recreo deportivas para el equipamiento denominado Villa Olímpica del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.
- BPIN 2025850100003: Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de la vereda Rincón de la Esmeralda del municipio de Aguazul, Casanare.
- BPIN 2025850100004: Mejoramiento a nivel de pavimento de las vías de la vereda Guadualito y La Victoria del municipio de Aguazul, Casanare.
- BPIN 2025850100005: Ampliación de las redes de distribución de gas natural para el área rural y urbana del municipio de Aguazul, Casanare.
- BPIN 2025850100006: Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía terciaria denominada Vía 1, vereda Rincón del Bubuy del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.
- BPIN 2025850100010: Mejoramiento a nivel de pavimento en el sector del PR 2+663 al PR 3+68445 del anillo vial Unión Charte - Cupiagua en la vereda El Triunfo del municipio de Aguazul, Casanare.
- BPIN 2025850100016: Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda San Lorenzo en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare.
- BPIN 2025850100021: Mejoramiento a nivel de pavimento de las vías internas de la urbanización Quintas de la Sabana del área urbana de San José del Bubuy, municipio de Aguazul, departamento de Casanare.

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0073 del 16 de enero de 2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 47442426		SERRANO DELGADO GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 21A 13-19	YOPAL-CASANARE	6329277	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	211652612	9501849789	I	2026/05/08	2026/04/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$632,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,040,000	$326,400			$2,040,000	$255,000			$2,040,000	$40,800			$2,040,000	$10,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$2,040,000**	**$326,400**			**$2,040,000**	**$255,000**			**$2,040,000**	**$40,800**			**$2,040,000**	**$10,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					**$2,040,000**	**$326,400**			**$2,040,000**	**$255,000**			**$2,040,000**	**$40,800**			**$2,040,000**	**$10,700**		**$0**	**$0**
1	CC 47442426	SERRANO GENNY	25-14	30	$2,040,000	$326,400	EPS005	30	$2,040,000	$255,000	CCF69	30	$2,040,000	$40,800	14-23	30	$2,040,000	$10,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$2,040,000**	**$326,400**			**$2,040,000**	**$255,000**			**$2,040,000**	**$40,800**			**$2,040,000**	**$10,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$326,400	$0	$0	$326,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$326,400	$0	$0	$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,700	$0	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,800	$0	$0	$40,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$40,800	$0	$0	$40,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,000	$0	$0	$255,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$255,000	$0	$0	$255,000
TOTAL				1	$632,900	$0	$0	$632,900
