INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA	
A. INFORMACIÓN GENERAL	
Acta Parcial N°:	17
Periodo del Acta:	DEL 24 DE FEBRERO A 23 DE ABRIL DE 2026
Contrato N°:	LP-006-2023
Objeto Del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
Contratista:	CONSORCIO COLECTORES FGP
Representante Legal:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
Interventoría:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
Representante Legal:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
Supervisor Contrato:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado De Disponibilidad Presupuestal - CDP	949 DE 4 ABRIL DE 2025
Registro Presupuestal – RP:	2446 DE 21 JULIO DE 2025; 2431 DE 17 DE JULIO 2025
Valor del Contrato:	VENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 33/100 ($24.490.616.158,33)
Acuerdo Modificatorio N° 001	15 DE ABRIL DEL 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
Plazo Del Contrato Inicial:	NUEVE (9) MESES
Fecha Acta De Inicio:	20-SEPTIEMBRE-2023
Fecha De Suspensión N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha De Ampliación Suspensión N° 1:	12 DE ENERO DE 2024
Fecha De Reinicio N° 1:	9 DE FEBRERO DE 2024
Fecha De Suspensión N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
Fecha De Ampliación Suspensión N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
Fecha De Reinicio N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha De Prorroga N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha De Suspensión N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha De Ampliación Suspensión N° 3:	16 DE ENERO DE 2025
Fecha De Ampliación N° 2 De Suspensión N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025

Fecha De Reinicio N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
Fecha Prorroga N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
Fecha Prorroga N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
Fecha De Suspensión N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
Fecha De Reinicio N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
Fecha Prorroga N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
Plazo Del Contrato Final:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
Fecha de Terminación:	31 DE JULIO DE 2026
Valor Presente Acta:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 2.149.340.876,50).

B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (*Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato*)

Detalle de Actividades Ejecutadas Acta Parcial N° 17

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA
	1.1 COLECTOR CENTRO HISTÓRICO		
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización, Trazado y Replanteo.	ML	268,31
2	**SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**		
2.1	Soporte para Cinta Demarcadora.	UN	358,00
2.2	Cinta Demarcadora, Sin Soporte.	ML	536,62
2.3	Valla móvil - Tipo 4.	UN	8,00
INP-054	Maletines o barreras plásticas con medidas de 2 metros de largo, 1 metro de alto, base de 50 cm	UN	5,00
3	**CORTES Y DEMOLICIONES**		
3.2	Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso.	ML	536,62
3.4	Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m.	M2	1.854,01
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**		
4.1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	466,37
4.2	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	4.558,50
4.4	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.	M3	5.395,67
4.5	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	268,31
4.6	Manejo de Aguas Residuales.	ML	268,31
4.7	Entibado Metálico Continuo.	M2	831,76
5	**LLENOS**		
5.1	Cimentación de Tubería con Material Granular.	M3	872,18
5.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	3.589,08
5.4	Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS).	M3	12,58

6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**		
6.8	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm).	ML	60,00
6.11	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 16" (400mm).	ML	9,00
6.16	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 33".	ML	268,31
8	**OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO**		
8.2	Reconstrucción de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa.	M2	69,76
8.3	Reconstrucción de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa.	ML	53,88
8.8	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,80 m, Profundidad 1,80m < H ≤ 3,00m.	UN	5,00
8.9	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,80 m, Profundidad 3,00m < H ≤ 4,50m.	UN	1,00
INP-002	Acero de Refuerzo de 60.000PSI	KG	5.636,07
INP-033	Pavimento de Concreto rígido con resistencia a la flexión MR-45 kg/cm2 E=0.25 mts Acelerado a 7 días (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2	50,30
INP-034	Suministro y colocación de Geotextil Tejido T2400	M2	3.917,33
INP-037	Construcción de Sumidero para Rejilla de Captación de 0.75 m x 6.25 m con 1.58 < H < 2.20 m	UN	1,00
	SUMINISTROS		
1	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	M	40,00
	1.2 IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO		
1.1	Localización, Trazado y Replanteo.	ML	268,31
2	**SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**		
2.1	Soporte para Cinta Demarcadora.	UN	179,00
2.2	Cinta Demarcadora, Sin Soporte.	ML	536,62
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**		
4.1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	379,66
4.2	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	1.138,98
4.4	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.	M3	1.518,63
4.5	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	268,31
4.6	Manejo de Aguas Residuales.	ML	268,31
4.7	Entibado Metálico Continuo.	M2	1.073,24
5	**LLENOS**		
5.1	Cimentación de Tubería con Material Granular.	M3	608,56
5.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	1.138,98
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**		
IMP_6.2	Instalación de Tubería de PVC-U 24" PSI 200 RDE 21.	ML	268,31
IMP_6.4	Instalación de Accesorios HD 24", Extremos Bridados.	UN	6,00
	SUMINISTROS IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO		
INP-023	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo 11,25° E.B Ø=24"	UN	2,00

CONSORCIO COLECTORES IGP
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico


INP-027	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Unión Brida por Acople Universal Ø=24" E.B. PN16	UN	4,00


A. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1. Que a la fecha, he cumplido con las actividades establecidas en el contrato.
2. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debida y legalmente pagados por el valor que exige la Ley.


B. ANEXOS

Anexar evidencias fotográficas, esquemas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el periodo correspondiente

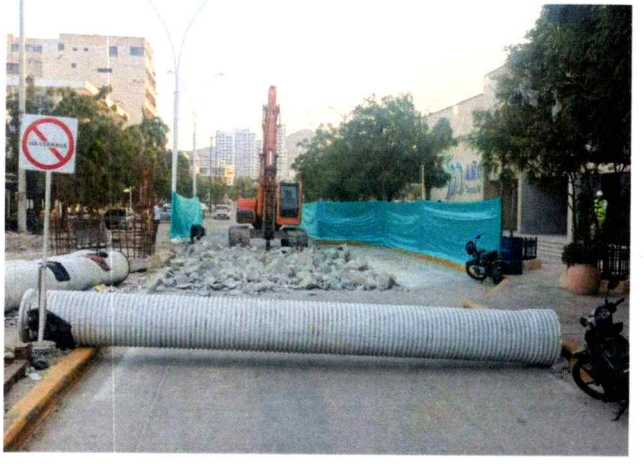

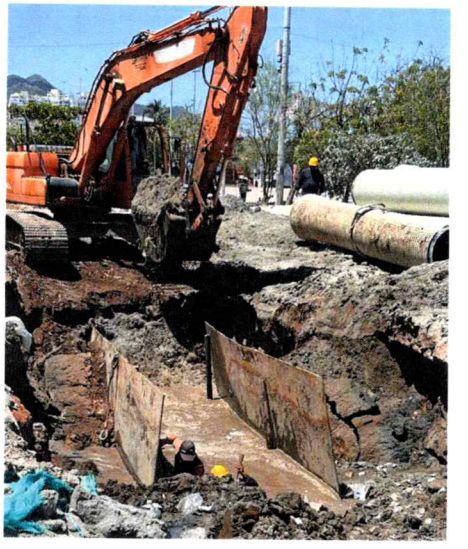



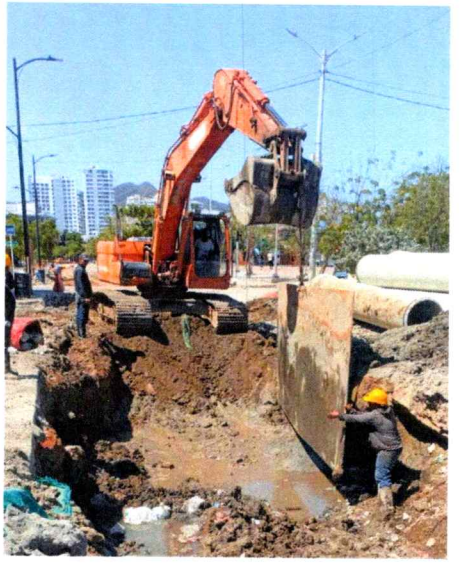














CONSORCIO COLECTORES FGP
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS


INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico





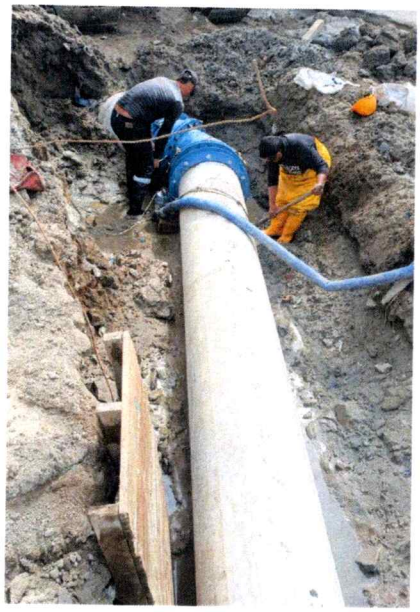

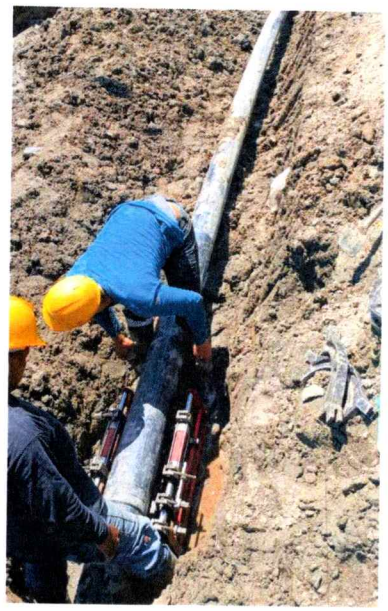

FIRMA CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLECTORES FGP
