CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
Nit: 901.996.498-6

CERTIFICIÓN:

Que en conformidad a la forma de pago estipulada en el contrato de obra CONTRATO 2656 DE 2025 cuyo objeto es: "**CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.**". Me permito **AVALAR** el pago del acta parcial No.01 por un valor de: **$755.468.137** al **CONSORCIO EDUCATIVO 2025** con nit: **901.978.294-4** representado legalmente por **JOSUE YAMIL SANCHEZ CLAROS**, identificado con cedula de ciudadanía No.7.698.841 de Neiva.

En constancia, se firma en IBAGUE, a los (15) días del mes de ABRIL de 2026.

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
C.C 1.110.510.653 De Ibagué
Representante Legal: CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
INTERVENTOR
NIT: 901.996.498-6

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113189-7

Código: CCE-EICP-FM-116	
Versión: 01	
Fecha: 02/03/2026	

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION	**ACTA No:**	2	**VALOR ACTA :**	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	**FECHA DE ELABORACIÓN**	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

		MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ												
	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ												
1	**CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1.01	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	ml	138.30	$ 10,000.00	$ 1,383,000.00	73.45	$ 734,500.00	0.00	$ -	73.45	$ 734,500.00	64.85	$ 648,500.00
1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS, INCLUYE CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	28.00	$ 140,000.00	$ 3,920,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	28.00	$ 3,920,000.00
1.03	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3500 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M	ml	138.30	$ 150,000.00	$ 20,745,000.00	0.00	$ -	71.05	$ 10,657,500.00	71.05	$ 10,657,500.00	67.25	$ 10,087,500.00
1.04	Viga aerea de 0.3*0.3 3500 PSI	ml	138.30	$ 155,000.00	$ 21,436,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	138.30	$ 21,436,500.00
1.05	Columnas de 0.3*0.3 3500 PSI	ml	139.30	$ 155,000.00	$ 21,591,500.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	139.30	$ 21,591,500.00
1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	5,666.27	$ 16,000.00	$ 93,860,369.49	0.00	$ -	1,537.41	$ 24,598,560.00	1537.41	$ 24,598,560.00	4328.86	$ 69,261,809.49
1.07	Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ml	117.75	$ 310,000.00	$ 36,502,500.00	0.00	$ -	41.40	$ 12,834,000.00	41.40	$ 12,834,000.00	76.35	$ 23,668,500.00
1.08	Muro ladrillo rejilla 0.12 mts, dos caras a la vista (lineal)	m2	414.90	$ 265,500.00	$ 118,453,950.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	414.90	$ 118,453,950.00
1.09	Mortero 1.3 Impermeabilizado (Torta superior de proteccion (0.05*0.35)	m3	3.76	$ 1,500,000.00	$ 5,640,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	3.76	$ 5,640,000.00
1.10	Puerta en lamina Cal. 18 (incluye anticorrosivo). Acceso corredor	m2	15.75	$ 1,050,500.00	$ 16,545,375.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	15.75	$ 16,545,375.00
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2	220.00	$ 30,500.00	$ 6,710,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	220.00	$ 6,710,000.00
10.01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	und	52.00	$ 29,500.00	$ 1,534,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	52.00	$ 1,534,000.00
9.01 ;1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	627.32	$ 31,200.00	$ 19,572,449.45	624.36	$ 19,479,884.74	2.93	$ 91,303.69	627.28	$ 19,571,188.43	0.04	$ 1,261.02
9.02, 5.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	813.53	$ 84,500.00	$ 68,743,611.51	811.66	$ 68,585,427.51	-187.31	-$ 15,827,406.35	624.36	$ 52,758,021.16	189.18	$ 15,985,590.35
10.10	DADO CONCRETO	m3	3.69	$ 1,400,000.00	$ 5,163,200.00	0.00	$ -	1.84	$ 2,576,000.00	1.84	$ 2,576,000.00	1.85	$ 2,587,200.00
10.09	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI E=0.05M	m2	41.49	$ 34,500.00	$ 1,431,405.00	0.00	$ -	21.32	$ 735,367.50	21.32	$ 735,367.50	20.18	$ 696,037.50
N.P.2	TERRACEO CON MATERIAL DE SITIO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	m2	318.00	$ 16,641.00	$ 5,291,838.00	0.00	$ -	318.00	$ 5,291,838.00	318.00	$ 5,291,838.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 448,624,698.40		$ 88,799,812.20		$ 40,957,162.80		$ 129,756,975.00		$ 318,767,723.40
2	**CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA SEGÚN DISEÑO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	0.00	$ 6,500.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.02	Desmonte marcos y puertas	und	2.00	$ 28,550.00	$ 57,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 57,100.00
2.03, 1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS, INCLUYE CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	75.57	$ 140,000.00	$ 10,579,383.36	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	75.57	$ 10,579,383.36
2.04,1.07	Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ml	42.66	$ 310,000.00	$ 13,286,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	42.66	$ 13,286,600.00
2.05,1.05	Columnas de 0.3*0.3 3500 PSI	ml	10.72	$ 155,000.00	$ 1,660,825.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.72	$ 1,660,825.00
2.06 ;1.03	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3500 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M	ml	60.09	$ 150,000.00	$ 9,013,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.09	$ 9,013,500.00
2.07,1.08	Muro ladrillo rejilla 0.12 mts, dos caras a la vista (lineal)	m2	60.09	$ 285,500.00	$ 17,155,695.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.09	$ 17,155,695.00
2.08,1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	1,907.34	$ 16,000.00	$ 30,517,493.76	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1907.34	$ 30,517,493.76
2.09	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	m2	120.18	$ 300,000.00	$ 36,054,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	120.18	$ 36,054,000.00
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2	60.09	$ 30,500.00	$ 1,832,745.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.09	$ 1,832,745.00
10.01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	und	60.09	$ 29,500.00	$ 1,772,655.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.09	$ 1,772,655.00
1.01	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	ml	60.09	$ 10,000.00	$ 600,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.09	$ 600,900.00
										0.00			
Subtotal					$ 122,530,897.10		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 122,530,897.10
3	**MURO DE CONTECCION SECTOR SUBESTACION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
3.01,1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS, INCLUYE CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	8.14	$ 140,000.00	$ 1,139,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	8.14	$ 1,139,600.00
3.02	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI , H=2.0 M (SIN REFUERZO)	m3	10.74	$ 2,625,000.00	$ 28,198,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.74	$ 28,198,800.00
3.03,1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	551.49	$ 16,000.00	$ 8,823,807.36	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	551.49	$ 8,823,807.36
3.04	Relleno en recebo común compactado mecanicamente	m3	23.87	$ 145,000.00	$ 3,461,440.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	23.87	$ 3,461,440.00
3.05	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m2	194.00	$ 56,000.00	$ 10,864,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	194.00	$ 10,864,000.00
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	20.29	$ 6,500.00	$ 131,904.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	20.29	$ 131,904.50
Subtotal					$ 62,619,551.90		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 62,619,551.90
4	**ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
4.01	ANDEN EN CONCRETO E 12 CM 3000 PSI	m2	364.00	$ 182,000.00	$ 66,248,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	364.00	$ 66,248,000.00
4.02	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI ANCHO 60 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	44.54	$ 635,000.00	$ 28,282,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	44.54	$ 28,282,900.00
4.03	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO ESPESOR 12 CM, INCLUYE SELLO ACRÍLICO	m2	81.20	$ 262,500.00	$ 21,315,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	81.20	$ 21,315,000.00

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800111189-7

Código: CCE-EICP-FM-116	
Versión: 01	
Fecha: 02/03/2026	

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION	**ACTA No:**	2	**VALOR ACTA :**	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	**FECHA DE ELABORACIÓN**	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

		MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ													
4.04	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	1,202.49	$ 18,000.00	$ 21,644,733.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1202.49	$ 21,644,733.60
5.03,	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	28.99	$ 31,200.00	$ 904,488.00	0.00	$ -	8.28	$ 258,336.00	8.28	$ 258,336.00	20.71	$ 646,152.00
5.02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	m3/comp	37.69	$ 84,500.00	$ 3,184,551.50	0.00	$ -	8.28	$ 699,660.00	8.28	$ 699,660.00	29.41	$ 2,484,891.50
1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	256.64	$ 16,000.00	$ 4,106,272.43	0.00	$ -	251.20	$ 4,019,276.80	251.20	$ 4,019,276.80	5.44	$ 86,995.63
N.P.1	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	44.54	$ 625,810.00	$ 27,873,577.40	0.00	$ -	27.60	$ 17,272,356.00	27.60	$ 17,272,356.00	16.94	$ 10,601,221.40
Subtotal					$ 173,559,622.90		$ 0.00		$ 22,249,628.80		$ 22,249,628.80		$ 151,309,894.10
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 797,234,670.30		$ 88,799,812.20		$ 63,206,781.60		$ 152,006,593.80		$ 645,228,066.50
PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS I.E ALFONSO PALACIO RUDAS													
5	**RED PLUVIAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
5.01,2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	0.00	$ 6,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	m3/comp	118.01	$ 84,500.00	$ 9,971,542.49	41.11	$ 3,473,830.49	75.61	$ 6,389,351.74	116.72	$ 9,863,182.23	1.28	$ 108,360.27
5.03,	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	118.01	$ 31,200.00	$ 3,681,787.20	31.62	$ 986,650.08	53.48	$ 1,668,490.20	85.10	$ 2,655,140.28	32.91	$ 1,026,646.92
5.04,3.05	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	58.81	$ 145,000.00	$ 8,526,817.80	0.00	$ -	58.81	$ 8,526,817.80	58.81	$ 8,526,817.80	0.00	$ -
5.05	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ml	129.00	$ 73,500.00	$ 9,481,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	129.00	$ 9,481,500.00
5.06	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ml	72.00	$ 154,500.00	$ 11,124,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	72.00	$ 11,124,000.00
5.07	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	und	8.00	$ 1,475,500.00	$ 11,804,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 11,804,000.00
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2	17.00	$ 30,500.00	$ 518,500.00	5.00	$ 152,500.00	0.00	$ -	5.00	$ 152,500.00	12.00	$ 366,000.00
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO/CORRUGADA DE 8"	ml	160.28	$ 172,500.00	$ 27,648,300.00	0.00		130.35	$ 22,485,375.00	130.35	$ 22,485,375.00	29.93	$ 5,162,925.00
1.01	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	ml	160.28	$ 10,000.00	$ 1,602,800.00	160.00	$ 1,600,000.00	0.00	$ -	160.00	$ 1,600,000.00	0.28	$ 2,800.00
Subtotal					$ 84,359,247.50		$ 6,212,980.60		$ 39,070,034.70		$ 45,283,015.30		$ 39,076,232.10
6	**CUBIERTAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
6.01,2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	459.31	$ 6,800.00	$ 3,327,308.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	489.31	$ 3,327,308.00
6.02	CORREA LAMINA CAL. 18 (10"4)CMS SENCILLA	ml	0.00	$ 53,200.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.03	CUBIERTA CANALETA 90 LAMINA GALVANIZADA CAL=24 .6 MTS	ml	91.89	$ 67,500.00	$ 6,202,575.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	91.89	$ 6,202,575.00
6.04	ACERO ESTRUCTURAL A-572 GR 50 CON ACABADO EN ANTICORROSIVO 3MILS Y ESMALTE SINTETICO GRIS	Kg	3,031.81	$ 29,000.00	$ 87,922,436.64	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	3031.81	$ 87,922,436.64
6.05	CUBIERTA TEJA STANDING SEAM CAL 26 E 0,46	m2	538.15	$ 116,500.00	$ 62,694,475.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	538.15	$ 62,694,475.00
1.05	Columnas de 0.3*0.3 3500 PSI	ml	6.40	$ 155,000.00	$ 992,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	6.40	$ 992,000.00
Subtotal					$ 161,138,794.60		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 161,138,794.60
7	**ANDENES URBANISMO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
7.01,2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	412.66	$ 6,500.00	$ 2,683,564.00	341.53	$ 2,219,945.00	0.00	$ -	341.53	$ 2,219,945.00	71.33	$ 463,619.00
7.02,5.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	75.35	$ 31,200.00	$ 2,350,852.61	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	75.35	$ 2,350,852.61
7.03,1.02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	m3/comp	97.95	$ 84,500.00	$ 8,276,960.22	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	97.95	$ 8,276,960.22
7.04,4.02	ANDEN EN CONCRETO E 12 CM 3000 PSI	m2	222.95	$ 182,000.00	$ 40,576,463.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	222.95	$ 40,576,463.20
7.05,1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	601.96	$ 16,000.00	$ 9,631,336.32	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	601.96	$ 9,631,336.32
7.06, 3.06	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m2	110.84	$ 56,000.00	$ 6,207,040.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	110.84	$ 6,207,040.00
8.11	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	210.00	$ 156,700.00	$ 32,907,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	210.00	$ 32,907,000.00
8.08 ; 4.05	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	780.32	$ 18,000.00	$ 14,045,698.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	780.32	$ 14,045,698.80
Subtotal					$ 116,678,915.20		$ 2,219,945.00		$ 0.00		$ 2,219,945.00		$ 114,458,970.20
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 362,176,957.30		$ 8,432,925.60		$ 39,070,034.70		$ 47,502,960.30		$ 314,673,996.90
PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER													
8	**ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	878.65	$ 6,500.00	$ 5,698,225.00	0.00	$ -	834.83	$ 5,426,392.40	834.83	$ 5,426,392.40	41.82	$ 271,832.60
8.01 ;1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	455.86	$ 31,200.00	$ 14,222,769.60	331.09	$ 10,329,937.55	124.73	$ 3,891,443.87	455.81	$ 14,221,381.42	0.04	$ 1,388.18
8.02; 5.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	592.62	$ 84,500.00	$ 50,076,001.30	430.41	$ 36,369,988.48	162.19	$ 13,704,854.31	592.60	$ 50,074,842.77	0.01	$ 1,158.53
8.03,3.05	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	21.70	$ 145,000.00	$ 3,145,905.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	21.70	$ 3,145,905.50
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	m2	876.65	$ 13,200.00	$ 11,571,780.00	418.26	$ 5,520,979.20	147.03	$ 1,940,796.00	565.29	$ 7,461,775.20	311.36	$ 4,110,004.80
8.05 ;3.06	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m2	1,321.94	$ 56,000.00	$ 74,028,640.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1321.94	$ 74,028,640.00
8.06 ; 4.04	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO ESPESOR 12 CM, INCLUYE SELLO ACRÍLICO	m2	233.90	$ 262,500.00	$ 61,398,750.00	169.30	$ 44,439,963.75	0.00	$ -	169.30	$ 44,439,963.75	64.60	$ 16,958,786.25

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113169-7

Código: CCE-EICP-FM-116	
Versión: 01	
Fecha: 02/03/2026	

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION	**ACTA No:**	2	**VALOR ACTA :**	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	**FECHA DE ELABORACIÓN**	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

Nº	DESCRIPCIÓN	MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ												
8.07; 4.02	ANDEN EN CONCRETO E 12 CM 3000 PSI	m2	642.75	$ 182,000.00	$ 116,980,500.00	317.62	$ 57,806,203.00	133.05	$ 24,214,481.20	450.66	$ 82,020,684.20	192.09	$ 34,959,815.80
8.08 ; 4.05	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	2,366.96	$ 18,000.00	$ 42,605,190.00	1523.20	$ 27,417,600.29	365.15	$ 6,572,634.12	1888.35	$ 33,990,234.41	478.61	$ 8,614,955.59
8.09 ; 4.02	CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 40 X40, GRAVA COMUN INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ml	0.00	$ 642,000.00	$ -	0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.10	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI ANCHO 60 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	9.54	$ 635,000.00	$ 6,057,900.00	9.54	$ 6,057,900.00	0.00	$ -	9.54	$ 6,057,900.00	0.00	$ -
8.11	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	319.00	$ 156,700.00	$ 49,987,300.00	235.34	$ 36,877,778.00	75.68	$ 11,859,056.00	311.02	$ 48,736,834.00	7.98	$ 1,250,466.00
11.12	Suministro e instalación de baranda construida en tubo redondo de cerramiento de 2" modulo de 1x1 enmarcada en ángulo de 1"x1/8 malla grabada cal 10, flanche en lamina cta. 1/16 de 0.20x0.25 (incluye pintura)	ml	30.00	$ 755,400.00	$ 22,662,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	30.00	$ 22,662,000.00
9.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	263.00	$ 152,500.00	$ 40,106,737.50	155.33	$ 23,687,329.68	93.91	$ 14,321,817.90	249.24	$ 38,009,147.58	13.75	$ 2,097,589.92
16.03	Suministro e instalación de lecho en arena para tubería	m3	60.29	$ 185,000.00	$ 11,153,650.00	2.85	$ 527,009.50	0.00	$ -	2.85	$ 527,009.50	57.44	$ 10,626,640.50
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO/CORRUGADA DE 8"	ml	60.29	$ 172,500.00	$ 10,400,025.00	60.29	$ 10,400,025.00	0.00	$ -	60.29	$ 10,400,025.00	0.00	$ -
5.07	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	und	7.00	$ 1,475,500.00	$ 10,328,500.00	6.00	$ 8,853,000.00	1.00	$ 1,475,500.00	7.00	$ 10,328,500.00	0.00	$ -
16.08	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	26.00	$ 124,500.00	$ 3,237,000.00	26.00	$ 3,237,000.00	0.00	$ -	26.00	$ 3,237,000.00	0.00	$ -
9.05, 1.06	ACERO FIGURADO 37000 PSI	Kg	925.87	$ 18,000.00	$ 14,613,878.61	83.15	$ 1,330,380.60	783.36	$ 12,533,773.65	866.51	$ 13,864,154.45	59.36	$ 949,724.16
10.03	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3	18.43	$ 645,000.00	$ 11,886,060.00	1.69	$ 1,088,760.00	13.86	$ 8,940,345.00	15.55	$ 10,029,105.00	2.88	$ 1,856,955.00
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2	206.96	$ 30,500.00	$ 6,312,127.50	4.77	$ 145,485.00	2.19	$ 66,642.50	6.96	$ 212,127.50	200.00	$ 6,100,000.00
11.10	ESCALERA MACIZA UN TRAMO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	m3	1.55	$ 1,780,500.00	$ 2,768,392.62	1.55	$ 2,768,392.62	0.00	$ -	1.55	$ 2,768,392.62	0.00	$ -
N.P.1	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	121.30	$ 625,810.00	$ 75,910,753.00	74.09	$ 46,366,262.90	11.43	$ 7,153,008.30	85.52	$ 53,519,271.20	35.78	$ 22,391,481.80
Subtotal													
9	**MUROS DE CONTENCIÓN**				$ 645,352,085.60		$ 323,223,995.70		$ 112,100,745.30		$ 435,324,741.00		$ 210,027,344.60
9.01 ;1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	291.71	$ 31,200.00	$ 9,101,289.60	174.67	$ 5,449,828.18	117.03	$ 3,651,336.00	291.70	$ 9,101,164.18	0.00	$ 125.42
9.02; 5.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	492.99	$ 84,500.00	$ 41,657,360.94	227.08	$ 19,187,936.70	64.63	$ 5,461,389.30	291.71	$ 24,649,326.00	201.28	$ 17,008,034.94
9.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	1,008.40	$ 152,500.00	$ 153,781,030.66	0.00	$ -	365.26	$ 55,701,862.54	365.26	$ 55,701,862.54	643.14	$ 98,079,168.12
9.04; 1.09	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	m2	146.53	$ 34,500.00	$ 5,055,112.50	77.12	$ 2,660,467.50	49.45	$ 1,705,852.50	126.56	$ 4,366,320.00	19.97	$ 688,792.50
9.05, 1.06	ACERO FIGURADO 37000 PSI	Kg	4,715.59	$ 16,000.00	$ 75,449,368.13	1651.69	$ 26,427,040.64	3007.84	$ 48,125,400.26	4659.53	$ 74,552,440.90	56.06	$ 896,927.24
9.06,3.02	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI , H=2.0 M (SIN REFUERZO)	m3	55.58	$ 2,625,000.00	$ 145,884,375.00	8.07	$ 21,183,828.75	47.50	$ 124,700,546.25	55.58	$ 145,884,375.00	0.00	$ -
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	108.28	$ 6,500.00	$ 703,850.55	0.00	$ -	88.26	$ 573,696.50	88.26	$ 573,696.50	20.02	$ 130,154.05
Subtotal													
10	**CERRAMIENTO**				$ 431,632,387.40		$ 74,909,101.80		$ 239,920,083.30		$ 314,829,185.10		$ 116,803,202.30
10.01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	und	49.00	$ 29,500.00	$ 1,445,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	49.00	$ 1,445,500.00
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2	564.80	$ 30,500.00	$ 17,226,400.00	0.00	$ -	88.83	$ 2,709,315.00	88.83	$ 2,709,315.00	475.97	$ 14,517,085.00
10.03	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3	0.00	$ 645,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.04,1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	360.54	$ 29,500.00	$ 10,635,830.88	27.74	$ 818,466.00	0.45	$ 13,281.93	28.19	$ 831,747.92	332.34	$ 9,804,082.96
10.05, 5.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3/comp	358.05	$ 84,500.00	$ 30,254,810.84	23.66	$ 1,999,489.70	6.18	$ 522,062.13	29.84	$ 2,521,551.83	328.20	$ 27,733,259.01
10.06,1.07	PILOTE PRE EXCAVADO D=30CM INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ml	263.81	$ 310,000.00	$ 81,782,133.33	135.00	$ 41,850,000.00	1.80	$ 558,000.00	136.80	$ 42,408,000.00	127.01	$ 39,374,133.33
10.07,3.05	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0.00	$ 145,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.08	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	m2	117.82	$ 34,500.00	$ 4,064,652.00	40.44	$ 1,395,180.00	0.81	$ 27,945.00	41.25	$ 1,423,125.00	76.57	$ 2,641,527.00
10.09	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	m3	35.34	$ 1,950,500.00	$ 68,940,032.40	12.13	$ 23,663,466.00	0.24	$ 473,971.50	12.38	$ 24,137,437.50	22.97	$ 44,802,594.90
10.10	DADO CONCRETO	m3	21.11	$ 1,400,000.00	$ 29,547,093.33	3.68	$ 5,152,000.00	0.08	$ 112,000.00	3.76	$ 5,264,000.00	17.35	$ 24,283,093.33
10.11,1.08	Muro ladrillo rejilla 0.12 mts, dos caras a la vista (lineal)	m2	564.80	$ 265,500.00	$ 161,250,400.00	52.05	$ 14,860,275.00	90.69	$ 25,891,995.00	142.74	$ 40,752,270.00	422.06	$ 120,498,130.00
10.12	PINTURA TIPO EXTERIOR PARA MUROS CERRAMIENTO EXISTENTE	m2	0.00	$ 30,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE SEGURIDAD	ml	392.72	$ 105,000.00	$ 41,235,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	392.72	$ 41,235,600.00
10.14	PAÑETE LISO MUROS 1.4, E=1.5 - 2 CM	m2	0.00	$ 47,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.15,1.06	ACERO FIGURADO 37000 PSI	Kg	16,097.31	$ 16,000.00	$ 257,557,012.58	3579.08	$ 57,265,250.99	934.79	$ 14,956,635.44	4513.87	$ 72,221,886.42	11583.45	$ 185,335,126.15
10.16 ;2.11	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	m2	414.50	$ 300,000.00	$ 124,350,000.00	0.00	$ -	241.72	$ 72,516,000.00	241.72	$ 72,516,000.00	172.78	$ 51,834,000.00
10.17	FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VEHICULAR (ENTRE 4 Y 4,8 M DE ANCHO)X 2.5 M DE ALTURA	und	1.00	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 12,500,000.00
10.18	FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2.00MX2.50M	und	2.00	$ 5,050,800.00	$ 10,101,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 10,101,600.00
1.05	Columnas de 0.3*0.3 3500 PSI	ml	183.27	$ 155,000.00	$ 29,181,333.33	19.50	$ 3,022,500.00	30.85	$ 4,780,975.00	50.35	$ 7,803,475.00	137.92	$ 21,377,858.33
N.P.3	ALFAJIA DE CONCRETO 2500 PSI SECCION 0.30 X 0.075 M (SIN REFUERZO)	ML	392.72	$ 62,631.00	$ 24,596,446.32	0.00	$ -	120.66	$ 7,569,582.66	120.66	$ 7,569,582.66	271.86	$ 17,026,863.66
N.P.4	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO)	M3	35.34	$ 412,081.00	$ 14,564,920.53	0.00	$ -	7.38	$ 3,040,416.03	7.38	$ 3,040,416.03	27.97	$ 11,524,504.49
Subtotal													
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 919,233,765.60		$ 150,026,627.70		$ 133,172,179.70		$ 283,198,807.40		$ 636,034,958.10
					$ 1,996,219,238.60		$ 548,159,726.20		$ 485,193,008.30		$ 1,033,352,733.50		$ 962,865,505.00
	INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO												
11	Accesos y circulaciones												

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 890111389-7

Código: CCE-EICP-FM-116	
Versión: 01	
Fecha: 02/03/2026	

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION	**ACTA No:**	2	VALOR ACTA :	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	FECHA DE ELABORACIÓN	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

		MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ												
11.01 ; 1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	350.65	$ 31,200.00	$ 10,946,563.68	123.50	$ 3,853,067.18	57.52	$ 1,794,689.83	181.02	$ 5,647,757.01	169.63	$ 5,298,806.67
11.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp	456.11	$ 90,500.00	$ 41,277,667.21	170.20	$ 15,402,707.76	23.13	$ 2,092,840.56	193.32	$ 17,495,548.32	262.79	$ 23,782,118.89
11.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	0.00	$ 135,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.04 ;4.04	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO ESPESOR 12 CM, INCLUYE SELLO ACRÍLICO	m2	179.59	$ 262,500.00	$ 47,141,062.50	111.11	$ 29,166,060.00	0.00	$ -	111.11	$ 29,166,060.00	68.48	$ 17,975,002.50
11.05.4.02	ANDEN EN CONCRETO E 12 CM 3000 PSI	m2	179.59	$ 182,000.00	$ 32,684,470.00	152.46	$ 27,748,275.10	0.00	$ -	152.46	$ 27,748,275.10	27.12	$ 4,936,194.90
11.09 ;4.05	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	1,257.10	$ 18,000.00	$ 22,627,710.00	717.14	$ 12,908,431.04	0.00	$ -	717.14	$ 12,908,431.04	539.96	$ 9,719,278.96
11.07	CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 40 X40, GRAVA COMUN INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ml	0.00	$ 642,000.00	$ -			0.00	$ -	0.00		0.00	$ -
11.08,811	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	250.47	$ 156,700.00	$ 39,248,649.00	55.76	$ 8,737,592.00	0.00	$ -	55.76	$ 8,737,592.00	194.71	$ 30,511,057.00
11.09	SARDINEL (0.15*0.20*040) EN CONCRETO SIMPLE 2500 PSI	ml	0.00	$ 94,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.10	ESCALERA MACIZA UN TRAMO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	m3	0.00	$ 1,780,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.11,1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	754.37	$ 16,000.00	$ 12,069,920.00	0.00	$ -	754.36	$ 12,069,789.01	754.36	$ 12,069,789.01	0.01	$ 130.99
11.12	Suministro e instalación de baranda construida en tubo redondo de cerramiento de 2" modulo de 1x1 enmarcada en ángulo de 1"x1/8 malla grabada cal.10, flanche en lamina cta 1/16 de 0.20x0.25 (incluye pintura)	ml	15.00	$ 755,400.00	$ 11,331,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 11,331,000.00
11.13,3.06	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m2	0.00	$ 56,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	359.17	$ 6,500.00	$ 2,334,605.00	0.00	$ -	359.17	$ 2,334,605.00	359.17	$ 2,334,605.00	0.00	$ -
9.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	107.75	$ 152,500.00	$ 16,432,027.50	87.30	$ 13,313,988.86	0.00	$ -	87.30	$ 13,313,988.86	20.45	$ 3,118,038.64
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0 15 M	m2	33.19	$ 30,500.00	$ 1,012,356.00	33.19	$ 1,012,356.00	0.00	$ -	33.19	$ 1,012,356.00	0.00	$ -
10.03	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3	12.31	$ 645,000.00	$ 7,939,950.00	7.42	$ 4,788,480.00	4.88	$ 3,144,375.00	12.30	$ 7,932,855.00	0.01	$ 7,095.00
12.04,8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	m2	303.39	$ 14,500.00	$ 4,399,206.48	303.39	$ 4,399,206.48	0.00	$ -	303.39	$ 4,399,206.48	0.00	$ -
N.P.1	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	124.03	$ 625,810.00	$ 77,619,214.30	58.17	$ 36,403,367.70	25.19	$ 15,764,153.90	83.36	$ 52,167,521.60	40.67	$ 25,451,692.70
Subtotal					$ 327,064,401.70		$ 157,733,532.10		$ 37,200,453.30		$ 194,933,985.40		$ 132,130,416.30
12	**Cancha**												
12.01,1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	204.60	$ 29,500.00	$ 6,041,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	204.80	$ 6,041,600.00
12.02,11.0	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp	266.24	$ 90,500.00	$ 24,094,720.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	266.24	$ 24,094,720.00
12.03,9.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	153.60	$ 152,500.00	$ 23,424,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	153.60	$ 23,424,000.00
12.04,8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	m2	875.55	$ 14,500.00	$ 12,695,533.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	875.55	$ 12,695,533.00
12.05,4.04	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO ESPESOR 12 CM, INCLUYE SELLO ACRÍLICO	m2	0.00	$ 262,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 12 CM,	m2	512.00	$ 182,000.00	$ 93,184,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	512.00	$ 93,184,000.00
12.06,4.05	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	1,971.20	$ 18,000.00	$ 35,481,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1971.20	$ 35,481,600.00
12.07	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI ANCHO 60 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	0.00	$ 635,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.08,8.11	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	50.47	$ 156,700.00	$ 7,908,649.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	50.47	$ 7,908,649.00
12.09	SUMINISTRO JUEGO DE (2) ESTRUCTURAS MULTIPLE MOVIBLE, (MICROFUTBOL - BALONCESTO),CON MEDIDAS REGLAVENTARIAS EN TUBERIA AGUA NEGRA CON DIAMETRO INTERIOR DE 2½ PULGADAS LAS 2 PORTERIAS DE MICROFUTBOL, EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE 1½ PULGADAS, TABLEROS EN ACRILICO DE 10 MM COLOR CRISTAL DE MEDIDAS 1.20 X 1.80 MTS, DEMARCADOS CON AROS, INCLUYE MALLAS EN NYLON PARA AROS ESTRUCTURA MOVIBLE CON RUEDAS Y CONTRAPESO NO INCLUYE MALLAS PARA PORTERIAS DE MICROFUTBOL	und	2.00	$ 17,200,000.00	$ 34,400,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 34,400,000.00
12.10	Demarcacion cancha multiple pintura tipo trafico microfutbol - baloncesto y voleibol (2manos)	ml	120.00	$ 18,500.00	$ 2,220,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	120.00	$ 2,220,000.00
Subtotal					$ 239,450,102.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 239,450,102.00
13	**Malla contra impacto**												
13.01	CERRAMIENTO PERIVETRAL DE CANCHA MULTIPLE EN MALLA DE NYLON TRENZADO, INCLUYE TUBOS METÁLICOS Y ANCLAJES EN CONCRETO DE TUBOS, CABLES, Y GUAYA PARA APERTURA SOBRE LATERIAL DE ACCESO EN DOS SENTIDOS	m2	399.00	$ 66,200.00	$ 26,413,800.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	399.00	$ 26,413,800.00
Subtotal					$ 26,413,800.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 26,413,800.00
14	**Cerramiento malla**												
14.01,1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	236.58	$ 29,500.00	$ 6,978,962.50	10.88	$ 320,840.99	84.50	$ 2,492,602.50	95.37	$ 2,813,443.49	141.20	$ 4,165,519.01
14.02,11.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp	267.55	$ 90,500.00	$ 24,213,048.75	10.50	$ 950,235.52	116.64	$ 10,556,187.88	127.14	$ 11,506,423.40	140.40	$ 12,706,625.35
14.03,1.07	Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ml	40.00	$ 310,000.00	$ 12,400,000.00	39.60	$ 12,276,000.00	0.00	$ -	39.60	$ 12,276,000.00	0.40	$ 124,000.00
14.04,1.09	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI E=0.05M	m2	18.05	$ 34,500.00	$ 622,656.00	18.05	$ 622,656.00	0.00	$ -	18.05	$ 622,656.00	0.00	$ -
14.05,1.03	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	m3	5.41	$ 1,950,500.00	$ 10,560,787.20	5.41	$ 10,560,787.20	0.00	$ -	5.41	$ 10,560,787.20	0.00	$ -
14.06,10.10	Dado concreto	m3	4.00	$ 1,400,000.00	$ 5,600,000.00	1.60	$ 2,240,000.00	0.00	$ -	1.60	$ 2,240,000.00	2.40	$ 3,360,000.00
14.08 ; 1.05	ACERO FIGURADO 60000 PSI	m3	0.00	$ 2,650,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.09,2.11	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	Kg	4,628.71	$ 16,000.00	$ 74,059,360.00	1466.90	$ 23,470,328.49	0.00	$ -	1466.90	$ 23,470,328.49	3161.81	$ 50,589,031.51
		m2	180.00	$ 300,000.00	$ 54,000,000.00	0.00	$ -	120.32	$ 36,096,000.00	120.32	$ 36,096,000.00	59.68	$ 17,904,000.00

Alcaldía Municipal Ibagué
NIT 800113169 7

Código: CCE-EICP-FM-116
Versión: 01
Fecha: 02/03/2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION		**ACTA No:** 2	**VALOR ACTA :**	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	**FECHA DE ELABORACIÓN**	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

		MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ												
14.10	Fabricación suministro e instalación de Puerta batiente de doble hoja marco en cold rolled perfileria 10x4 cal. 16 + reja compuesta de perales verticales entubo cuadrado de 1-1/2" + cerradura tipo stadge o similar con pasador interior + perfil metalico de soporte 12x12 + pasador metalico a piso con porta candado + anticorrosivo + pintura color a definir. dimensiones 6,36x2,50	und	1.00	$ 16,500,000.00	$ 16,500,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 16,500,000.00
14.11,10.18	Fabricación suministro e instalación de Puerta batiente de doble hoja marco en cold rolled perfileria 10x4 cal. 16 + reja compuesta de perales verticales entubo cuadrado de 1-1/2" + cerradura tipo stadge o similar con pasador interior + perfil metalico de soporte 12x12 + pasador metalico a piso con porta candado + anticorrosivo + pintura color a definir. dimensiones 200x250	und	1.00	$ 5,050,800.00	$ 5,050,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,050,800.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE SEGURIDAD	ml	60.00	$ 105,000.00	$ 6,300,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.00	$ 6,300,000.00
1.08	Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal)	m2	120.00	$ 285,500.00	$ 34,260,000.00	0.00	$ -	26.78	$ 7,645,690.00	26.78	$ 7,645,690.00	93.22	$ 26,614,310.00
2.05,1.05	Columnas de 0,3*0,3 3500 PSI	ml	11.00	$ 155,000.00	$ 1,705,000.00	11.00	$ 1,705,000.00	0.00	$ -	11.00	$ 1,705,000.00	0.00	$ -
10.01,	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	und	20.05	$ 29,500.00	$ 591,573.33	20.05	$ 591,573.33	0.00	$ -	20.05	$ 591,573.33	0.00	$ -
N P 3	ALFAJIA DE CONCRETO 2500 PSI SECCIÓN 0 30 X 0 075 M (SIN REFUERZO)	ml	60.16	$ 62,631.00	$ 3,767,880.96	0.00	$ -	60.16	$ 3,767,880.96	60.16	$ 3,767,880.96	0.00	$ -
Subtotal					$ 256,610,068.70		$ 52,737,421.60		$ 60,658,361.40		$ 113,395,782.90		$ 143,314,285.90
15	Muro perimetral												
15.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m3	13.88	$ 29,500.00	$ 409,460.00	0.00	$ -	13.87	$ 409,216.83	13.87	$ 409,216.83	0.01	$ 243.17
15.02,5.02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	m3/comp	46.39	$ 84,500.00	$ 3,919,955.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	46.39	$ 3,919,955.00
15.03,3.05	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	m3	4.43	$ 145,000.00	$ 642,350.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	4.43	$ 642,350.00
15.04	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0 30 X 0 25 (SIN REFUERZO)	ml	0.00	$ 120,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.05	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI SECCION 1 00 X 0 70 X 0 30 (SIN REFUERZO)	und	14.00	$ 292,500.00	$ 4,095,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 4,095,000.00
15.06	DADOS EN CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI 60% / 40% ROCA SECCION DADO 0 60 X 0 60 X 0 50	und	11.33	$ 165,500.00	$ 1,875,667.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	11.33	$ 1,875,667.00
15.07	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0 25 X 0 25 M (SIN REFUERZO)	ml	34.00	$ 144,500.00	$ 4,913,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	34.00	$ 4,913,000.00
15.08	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0 20 X 0 25 M (SIN REFUERZO)	ml	34.00	$ 145,500.00	$ 4,947,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	34.00	$ 4,947,000.00
15.09	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 12 CM	m2	102.00	$ 232,500.00	$ 23,715,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	102.00	$ 23,715,000.00
15.10,1.05	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	2,294.00	$ 16,000.00	$ 36,704,000.00	0.00	$ -	1303.36	$ 20,853,813.55	1303.36	$ 20,853,813.55	990.64	$ 15,850,186.45
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0 15 M	m2	180.00	$ 30,500.00	$ 5,490,000.00	118.76	$ 3,622,027.50	0.00	$ -	118.76	$ 3,622,027.50	61.25	$ 1,867,972.50
14.05,1.03	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	m3	3.39	$ 1,950,500.00	$ 6,618,046.50	0.00	$ -	3.39	$ 6,618,046.50	3.39	$ 6,618,046.50	0.00	$ -
10.03	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3	9.05	$ 645,000.00	$ 5,835,960.00	0.00	$ -	9.05	$ 5,835,960.00	9.05	$ 5,835,960.00	0.00	$ -
1.08	Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal)	m2	88.80	$ 285,500.00	$ 25,360,965.00	0.00	$ -	88.80	$ 25,353,256.50	88.80	$ 25,353,256.50	0.03	$ 7,708.50
14.06,10.10	Dado concreto	m3	1.28	$ 1,400,000.00	$ 1,792,000.00	0.00	$ -	1.28	$ 1,792,000.00	1.28	$ 1,792,000.00	0.00	$ -
14.03,1.07	Pilote pre excavado D=30cm incluye retro de sobrantes	ml	28.80	$ 310,000.00	$ 8,928,000.00	0.00	$ -	28.80	$ 8,928,000.00	28.80	$ 8,928,000.00	0.00	$ -
14.04,1.09	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI E=0 05M	m2	11.31	$ 34,500.00	$ 390,195.00	0.00	$ -	11.31	$ 390,195.00	11.31	$ 390,195.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 135,636,698.50		$ 3,622,027.50		$ 70,180,489.40		$ 73,802,516.90		$ 61,834,082.60
16	Instalaciones Hidrosanitarias												
16.01,1.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	0.00	$ 29,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.02,11.2	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp	0.00	$ 90,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.03	Suministro e instalación de lecho en arena para tuberia	m3	0.00	$ 185,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.04	Suministro, extendida y compactada en recebo	m3	0.00	$ 145,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.05	RELLENO EN GRAVILLA FINA 1/2"	m3	0.00	$ 235,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	m2	0.00	$ 14,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.07	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	0.00	$ 85,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.08	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	0.00	$ 124,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.09	RED SANITARIA PVC-S 6"	ml	0.00	$ 320,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO/CORRUGADA DE 8"	ml	0.00	$ 172,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DRENAJE 6"	ml	0.00	$ 124,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.12	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 60X60X60 CM (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	und	0.00	$ 1,060,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
17	Muro confencion												
17.01,1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	179.05	$ 29,500.00	$ 5,282,065.00	0.00	$ -	2.00	$ 59,000.00	2.00	$ 59,000.00	177.05	$ 5,223,065.00
17.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3/Comp	223.82	$ 84,500.00	$ 18,912,479.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	223.82	$ 18,912,479.04
17.03 ,9.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	7.69	$ 160,500.00	$ 1,233,603.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	7.69	$ 1,233,603.00
17.04 ,3.03	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI , H=2 0 M (SIN REFUERZO)	m3	28.18	$ 2,672,500.00	$ 75,316,395.00	1.50	$ 4,008,750.00	0.00	$ -	1.50	$ 4,008,750.00	26.68	$ 71,307,645.00

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113189-7

Código: CCE-EICP-FM-116
Versión: 01
Fecha: 02/03/2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION		ACTA No: 2	VALOR ACTA :	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	FECHA DE ELABORACIÓN	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

		MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ												
17.05	CONCRETO 13 8 MPA - (2000 PSI) PARA SOLADO	m3	2.56	$ 870,000.00	$ 2,228,940.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.56	$ 2,228,940.00
17.06.1.05	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	1850.00	$ 16,000.00	$ 29,600,000.00	46.39	$ 742,186.67	0.00	$ -	46.39	$ 742,186.67	1803.61	$ 28,857,813.33
Subtotal					$ 132,673,482.00		$ 4,750,936.70		$ 59,000.00		$ 4,809,936.70		$ 127,763,545.30
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1,117,748,462.50		$ 219,843,917.90		$ 167,998,303.10		$ 386,842,220.90		$ 730,906,232.10
	SUBTOTAL OBRAS				$ 4,273,378,319.00	TOTAL	$ 864,236,380.80	TOTAL	$ 765,468,137.70	TOTAL	$ 1,619,704,518.50	TOTAL	$ 2,653,673,800.50
					PROCENTAJE		20.22%		17.68%		37.90%		62.10%
	NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**DESCRIPCIÓN**										
	NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se		**ADMINISTRACIÓN (24%)**		24%								
	NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**IMPREVISTOS (1%)**		1%								
			UTILIDAD (5%)		5%								
	VALOR TOTAL				$ 4,273,378,319.00								

	BALANCE DEL CONTRATO		
	VALOR CONTRATO	100.00%	$ 4,273,378,319.00
	VALOR ACTA PARCIAL No. 1	20.22%	$ 864,236,380.80
	VALOR ACTA PARCIAL No. 2	17.68%	$ 755,468,137.70
	SALDO POR EJECUTAR	62.10%	$ 2,653,673,600.50
	TOTAL	100.00%	$ 4,273,378,319.00
	PORCENTAJE EJECUTADO	37.90%	

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
LEONEL ALFREDO NIETO
Supervisor

CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN (R.L)
Interventor

CONSORCIO EDUCATIVO 2025
JOSUE YAMIL SANCHEZ CLARO (R.L)
Contratista

	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CODIGO:	
		VERSIÓN: 01	
	FORMATO: HOJA DE PRESENTACIÓN		
		IBAGUE - TOLIMA	

MEMORIAS DE

ACTA PARCIAL N°02

"CONSORCIO EDUCATIVO 2025"

NIT

901978294-4

CONTRATO DE OBRA N°2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)	DESCRIPCION	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3500 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M	ITEM	1,03	UNIDAD	ml







Localización	Dimensiones				TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
SEDE N°1						
VIGA TERRAZA 1 _TERRAZA		7,10				7,10
VIGA TERRAZA 2 _TERRAZA		6,40				6,40
VIGA TERRAZA 3 _TERRAZA		3,05				3,05
VIGA TERRAZA 4 _TERRAZA		6,10				6,10
VIGA TERRAZA 5 _TERRAZA		5,30				5,30
VIGA TERRAZA 6 _TERRAZA		7,40				7,40
VIGA TERRAZA 7 _TERRAZA		3,90				3,90
VIGA TERRAZA 8 _TERRAZA		7,20				7,20
VIGA TERRAZA 9 _TERRAZA		6,20				6,20
VIGA TERRAZA 10 _TERRAZA		6,30				6,30
VIGA TERRAZA 11 _TERRAZA		6,30				6,30
VIGA TERRAZA 12 _TERRAZA		5,80				5,80
Subtotal						71,05
TOTAL						71,05

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"											
DIRECCIÓN DE			FORMATO									
PROCESO	2656		CÓDIGO			MEMORIA ACTA PARCIAL						
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1		HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)	DESCRIPCION	ACERO FIGURADO 60000 PSI	ITEM	1.06	UNIDAD	Kg









Localización	TRASLAPO	Peso	Dimensiones Longitud	Elemento	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
ACTA N°2						
ACERO DE REFUERZO DE PILOTES No. 4		0.99	2.3	4	23.00	210.33
ACERO DE REFUERZO DE PILOTES No. 3 FLEJES		0.56	0.62	23	23.00	183.67
ACERO DE REFUERZO DE DADOS No. 5		1.55	0.9	12	23.00	385.52
ACERO DE REFUERZO DE VIGA DE CIMENTACION No. 4	7.1	0.99	71.05	6.00	1.0	466.12
ACERO DE REFUERZO DE VIGA DE CIMENTACION No. 3 FLEJES		0.56	1.10	474	1.0	291.78
Subtotal						1,537.41
TOTAL						1,537.41

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL
PROCESO	2656	CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1

HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE Nº	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	CONTRATO Nº	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	CONTRATO Nº	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)	DESCRIPCION	Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ITEM	1.07	UNIDAD	ml







Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
ACTA N°2						
PILOTES PRE EXCAVADOS		1.80			23.00	41.40
Subtotal						41.40
TOTAL						41.40

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL
PROCESO	2656	CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1

HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE Nº	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	CONTRATO Nº	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	CONTRATO Nº	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)	DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	ITEM	9.01 ;1,02	UNIDAD	m3









Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
ACTA N°1						
TERRAZA 1 _TERRAZA		7.10	3.00	1.05		22.37
TERRAZA 1 _VIGA DE CIMENTACIÓN		7.10	0.55	0.4		1.56
TERRAZA 2_TERRAZA		6.40	2.80	0.8		14.34
TERRAZA 2_VIGA DE CIMENTACIÓN		6.40	0.48	0.75		2.30
TERRAZA 3_TERRAZA		3.05	2.90	0.8		7.08
TERRAZA 3_VIGA DE CIMENTACIÓN		3.05	0.33	0.46		0.46
TERRAZA 4_TERRAZA		6.10	2.60	1		15.86
TERRAZA 4_VIGA DE CIMENTACIÓN		6.10	0.58	0.38		1.34
TERRAZA 5_TERRAZA		5.30	1.65	1.72		15.04
TERRAZA 5_VIGA DE CIMENTACIÓN		5.30	0.70	0.4		1.48
TERRAZA 6_TERRAZA		7.40	2.10	0.9		13.99
TERRAZA 6_VIGA DE CIMENTACIÓN		7.40	0.50	0.3		1.11
TERRAZA 7_TERRAZA		3.40	2.00	1		6.80
TERRAZA 7_VIGA DE CIMENTACIÓN		3.40	0.50	0.3		0.51
TERRAZA 8_TERRAZA		7.20	2.40	0.8		13.82
TERRAZA 8_VIGA DE CIMENTACIÓN		7.20	0.60	0.3		1.30
TERRAZA 9_TERRAZA		6.20	2.70	0.8		13.39
TERRAZA 9_VIGA DE CIMENTACIÓN		6.20	0.53	0.3		0.99
TERRAZA 10_TERRAZA		6.30	2.20	0.5		6.93
TERRAZA 10_VIGA DE CIMENTACIÓN		6.30	0.70	0.38		1.68
TERRAZA 11_TERRAZA		6.30	2.10	0.45		5.95
TERRAZA 11_VIGA DE CIMENTACIÓN		6.30	0.70	0.4		1.76
TERRAZA 12_TERRAZA		5.80	2.10	0.7		8.53
TERRAZA 12_VIGA DE CIMENTACIÓN		5.80	0.70	0.36		1.46
EXCAVACIÓN MURO		2.40	1.20	2		5.76
EXCAVACIÓN PARQUE		9.70	1.15	0.75		8.37
TERRAZAS LATERALES 1		11.00	0.40	0.85		3.74
TERRAZAS LATERALES 2		8.20	0.40	0.85		2.79
						180.70
ACTA N°2						
EXCAVACION DE PILOTES - CERRAMIENTO POSTERIOR		1.80	0.071		23.00	2.93
EXCAVACION DE DADOS - CERRAMIENTO POSTERIOR		0.40	0.40	0.50	23.00	
Subtotal						2.93
TOTAL						2.93

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL
PROCESO	2656	CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1

HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)	DESCRIPCION	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	ITEM	5.02	UNIDAD	m3











Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
ACTA 1						
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
TERRAZA 1 _TERRAZA		7.10	3.00	3.05		64.97
TERRAZA 1 _VIGA DE CIMENTACIÓN		7.10	0.55	0.4		1.56
TERRAZA 2_TERRAZA		6.40	3.30	2.8		59.14
TERRAZA 2_VIGA DE CIMENTACIÓN		6.40	0.48	0.75		2.30
TERRAZA 3_TERRAZA		3.05	3.40	2.8		29.04
TERRAZA 3_VIGA DE CIMENTACIÓN		3.05	0.33	0.46		0.46
TERRAZA 4_TERRAZA		6.10	3.10	3		56.73
TERRAZA 4_VIGA DE CIMENTACIÓN		6.10	0.58	0.38		1.34
TERRAZA 5_TERRAZA		5.30	2.15	3.72		42.39
TERRAZA 5_VIGA DE CIMENTACIÓN		5.30	0.70	0.4		1.48
TERRAZA 6_TERRAZA		7.40	2.60	2.9		55.80
TERRAZA 6_VIGA DE CIMENTACIÓN		7.40	0.50	0.3		1.11
TERRAZA 7_TERRAZA		3.40	2.50	3		25.50
TERRAZA 7_VIGA DE CIMENTACIÓN		3.40	0.50	0.3		0.51
TERRAZA 8_TERRAZA		7.20	2.90	2.8		58.46
TERRAZA 8_VIGA DE CIMENTACIÓN		7.20	0.60	0.3		1.30
TERRAZA 9_TERRAZA		6.20	3.20	2.8		55.55
TERRAZA 9_VIGA DE CIMENTACIÓN		6.20	0.53	0.3		0.99
TERRAZA 10_TERRAZA		6.30	2.70	2.5		42.53
TERRAZA 10_VIGA DE CIMENTACIÓN		6.30	0.70	0.38		1.68
TERRAZA 11_TERRAZA		6.30	2.60	2.45		40.13
TERRAZA 11_VIGA DE CIMENTACIÓN		6.30	0.70	0.4		1.76
TERRAZA 12_TERRAZA		5.60	2.60	2.7		40.72
TERRAZA 12_VIGA DE CIMENTACIÓN		5.60	0.70	0.38		1.46
EXCAVACIÓN MURO		2.40	1.20	2		5.76
EXCAVACIÓN PARQUE		9.70	1.15	0.75		8.37
TERRAZAS LATERALES 1		11.00	0.90	1.35		13.37
TERRAZAS LATERALES 2		8.20	0.90	1.35		9.96
Subtotal						624.36
ACTA 2						
DESCUENTO FACTOR DE EXPANSIÓN ACTA No. 1						-187.31
% expansión (30%)						
TOTAL						-187.31

Contratista

Interventoria

Alcaldía Municipal Ibagué Nit.890111189-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"											
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656		CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		


FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)	DESCRIPCION	DADO CONCRETO	ITEM	10.10	UNIDAD	m3





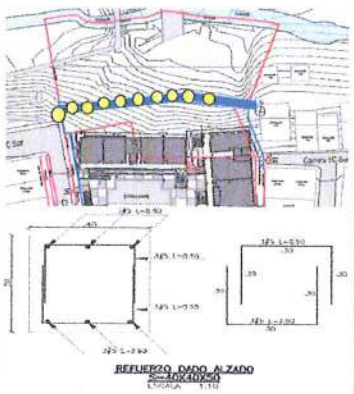

Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
JCIAH 1						
DADOS EN CONCRETO CERRAMIENTO POSTERIOR A LA INSTITUCION		0,40	0,40	0,5	23,00	1,84
Subtotal						1,84
TOTAL						1,84

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"										
DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		


FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)	DESCRIPCION	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	ITEM	10.08	UNIDAD	m2





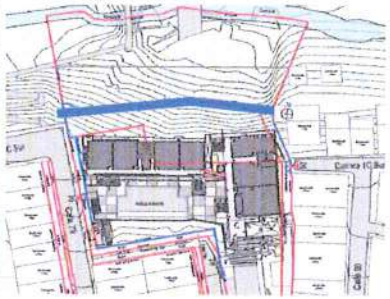

Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
ACTA N°2						
BASE EN CONCRETO POBRE PARA VIGA DE CIMENTACIÓN		71,05	0,30		1,00	21,32
Subtotal						21,32
TOTAL						21,32

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7

"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL						
PROCESO	2656	CÓDIGO							
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE Nº	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO Nº	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO Nº	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)	DESCRIPCION	TERRACEO CON MATERIAL DE SITIO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	ITEM	N.P.2	UNIDAD	m2







Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
ACTA N°2						
TERRAZA 1_TERRAZA		7.10	4.64			32.96
TERRAZA 2_TERRAZA		6.40	4.94			31.63
TERRAZA 3_TERRAZA		3.05	5.04			15.38
TERRAZA 4_TERRAZA		6.10	4.74			28.93
TERRAZA 5_TERRAZA		5.30	3.79			20.10
TERRAZA 6_TERRAZA		7.40	4.24			31.40
TERRAZA 7_TERRAZA		3.90	4.14			16.16
TERRAZA 8_TERRAZA		7.20	4.54			32.71
TERRAZA 9_TERRAZA		6.20	4.84			30.03
TERRAZA 10_TERRAZA		6.30	4.34			27.36
TERRAZA 11_TERRAZA		6.30	4.24			26.73
TERRAZA 12_TERRAZA		5.80	4.24			24.61
Subtotal						318.00
TOTAL						318.00

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
DIRECCIÓN DE PROCESO	2656	FORMATO CÓDIGO	MEMORIA ACTA PARCIAL
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN 1	HOJA 1 DE 1

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	ITEM	5.03;	UNIDAD	m3

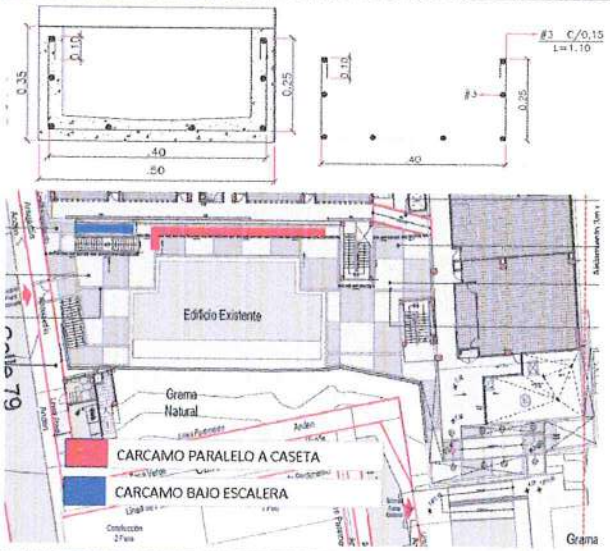





Localización	Dimensiones Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
ACTA N°2						
CUNETA BAJO ESCALERA		7,00	0,50	0,60	1,00	2,10
CUNETA ESCUADRA "L"		7,70	0,50	0,60	1,00	2,31
CUNETA PARALELO CASETA		12,90	0,5	0,6	1,00	3,87
Subtotal						8,28
TOTAL						8,28

Josue Yamil Sanchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué Nit.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"												
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL									
PROCESO	2656		CÓDIGO										
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1			
FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE Nº	2	ELABORÓ				
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"												
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS								CONTRATO Nº			2655	
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025								CONTRATO Nº			2656 - 2025	

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	ITEM	5.02	UNIDAD	m3/comp



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
ACTA N°2						
CUNETA BAJO ESCALERA		7.00	0.50	0.60	1.00	2.10
CUNETA ESCUADRA "L"		7.70	0.50	0.60	1.00	2.31
CUNETA PARALELO CASETA		12.90	0.50	0.60	1.00	3.87
Subtotal						8.28
TOTAL						8.28

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113359-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"											
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656		CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE Nº	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS		CONTRATO Nº		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025		CONTRATO Nº		2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	ACERO FIGURADO 60000 PSI	ITEM	1,06	UNIDAD	Kg

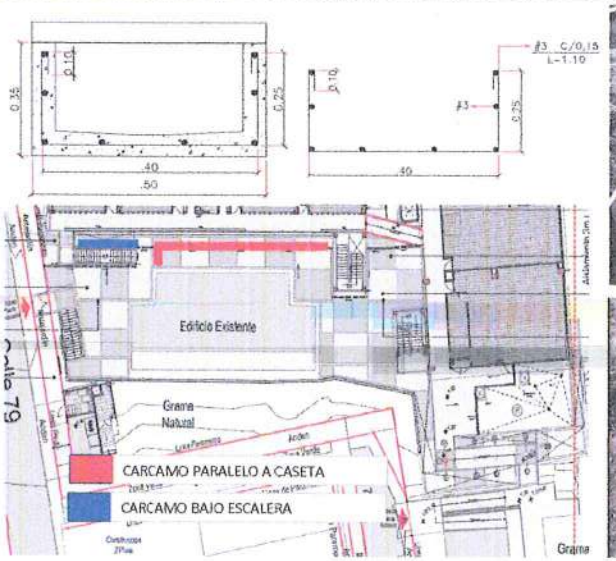

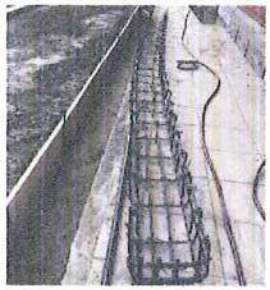



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	TRASLAPO	KG	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
ACTA Nº 2						
ACERO CUNETA BAJO ESCALERA	#3	7,00	0,70	0,56	8,00	34,50
ACERO CUNETA BAJO ESCALERA - FLEJES	#3	1,1		0,56	47,67	29,36
ACERO CUNETA PARALELO A CASETA DE COMIDAD	#3	12,90	1,29	0,56	8,00	63,57
ACERO CUNETA PARALELO A CASETA DE COMIDAD - FLEJES	#3	1,10		0,56	87	53,59
ACERO CUNETA ESCUADRA "L"	#3	7,70	0,77	0,56	8,00	37,95
ACERO CUNETA ESCUADRA "L" - FLEJES	#3	1,10		0,56	52	32,24
					Subtotal	251,20
					TOTAL	**251,20**

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890111389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"											
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656		CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS		CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025		CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ITEM	N.P.1	UNIDAD	ml

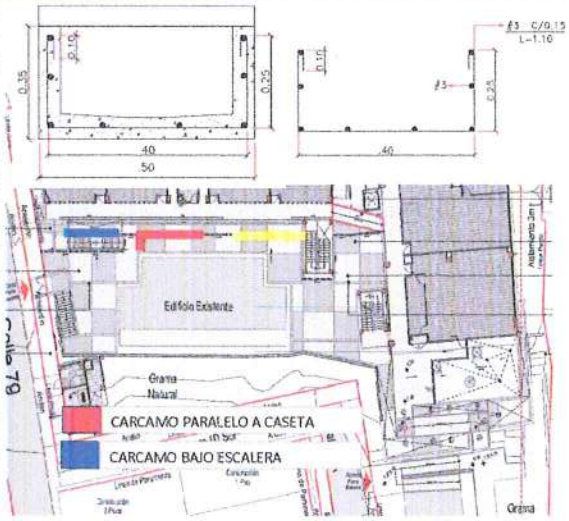





Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ						
CUNETA BAJO ESCALERA		7,00	0,50	0,60	1,00	7,00
CUNETA ESCUADRA "L"		7,70	0,50	0,60	1,00	7,70
CUNETA PARALELO CASETA		12,90	0,5	0,6	1,00	12,90
Subtotal						27,60
TOTAL						27,60

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	DESCRIPCION	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	ITEM	5.02	UNIDAD	m3/comp









Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
ACTA 1						
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIOS RUDAS						
ZONA DURA		18.30	0.50	1.23		11.29
ZONA DURA PLACA 1		5.70	0.50	-0.13		-0.37
ZONA DURA PLACA 2		4.30	0.50	-0.13		-0.28
EXCAVACIÓN 1		17.30	0.50	0.65		5.62
EXCAVACIÓN 2		39.10	0.50	0.55		10.75
EXCAVACIÓN 3 L		18.64	0.45	0.55		4.61
Subtotal						31.62
ACTA 2						
DESCUENTO POR ESPANSIÓN ACTA No. 1						-9.49
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 1		17.20	0.50	1.30		11.18
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 2		19.43	0.50	0.91		8.84
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 3		19.00	0.5	1.12		10.64
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 4		20.90	0.5	0.9		9.41
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 5		17.98	0.50	0.98		8.77
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 6		17.94	0.50	1.05		9.42
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 7		17.90	0.50	0.95		8.50
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 1		1.50	1.50	1.30		2.93
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 2		1.50	1.50	0.91		2.05
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 3		1.50	1.50	1.12		2.52
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 4		1.50	1.50	0.9		2.03
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 5		1.50	1.50	0.98		2.19
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 6		1.50	1.50	1.05		2.36
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 7		1.50	1.50	0.95		2.14
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 8		1.50	1.50	0.95		2.14
						75.61
TOTAL						**75.61**

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7

"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS		CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025		CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	ITEM	5.03;	UNIDAD	m3







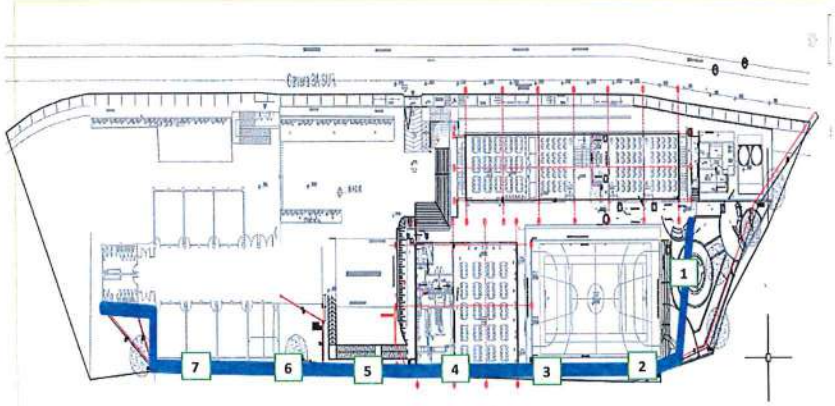

Localización	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS						
ACTA N°1						
ZONA DURA		18.30	0.50	1.23		11.29
ZONA DURA PLACA 1		5.70	0.50	-0.13		-0.37
ZONA DURA PLACA 2		4.30	0.50	-0.13		-0.28
EXCAVACIÓN 1		17.30	0.50	0.65		5.62
EXCAVACIÓN 2		39.10	0.50	0.55		10.75
EXCAVACIÓN 3 L		18.64	0.45	0.55		4.61
						31.62
ACTA N°2						
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 1		17.20	0.50	1.30		11.18
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 2		19.43	0.50	0.91		8.84
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 3		19.00	0.5	1.12		10.64
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 4		20.90	0.5	0.9		9.41
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 5		17.98	0.50	0.98		8.77
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 6		17.94	0.50	1.05		9.42
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 7		17.90	0.50	0.95		8.50
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 1		1.50	1.50	1.30		2.93
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 2		1.50	1.50	0.91		2.05
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 3		1.50	1.50	1.12		2.52
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 4		1.50	1.50	0.9		2.03
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 5		1.50	1.50	0.98		2.19
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 6		1.50	1.50	1.05		2.36
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 7		1.50	1.50	0.95		2.14
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 8		1.50	1.50	0.95		2.14
DESCUENTO DE EXPANSIÓN ACTA N°1					-31.62	- 31.62
Subtotal						53.48
TOTAL						53.48

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE Nº	2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO Nº	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO Nº	2656 - 2025

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	DESCRIPCION	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	ITEM	5.04;3,05	UNIDAD	m3









Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	AREA	
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS						
ACTA N°2						
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 1		17.20	0.50	1.10		9.46
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 2		19.43	0.50	0.71		6.90
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 3		19.00	0.5	0.92		8.74
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 4		20.90	0.5	0.70		7.32
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 5		17.98	0.50	0.78		6.97
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 6		17.94	0.50	0.85		7.62
EXCAVACION TUBERIA 8" TAMO 7		17.90	0.50	0.75		6.71
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 1		1.50	1.50	0.28		0.64
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 2		1.50	1.50	0.28		0.64
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 3		1.50	1.50	0.28		0.64
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 4		1.50	1.50	0.28		0.64
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 5		1.50	1.50	0.28		0.64
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 6		1.50	1.50	0.28		0.64
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 7		1.50	1.50	0.28		0.64
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION 8		1.50	1.50	0.28		0.64
Subtotal						58.81
TOTAL						58.81

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7

"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	RED PLUVIAL	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO/CORRUGADA DE 8"	ITEM	16.10	UNIDAD	ml









Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS						
ACTA N°2						
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO/CORRUGADA DE 8"		130,35				130,35
Subtotal						130,35
TOTAL						130,35

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-2	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO		MEMORIA ACTA PARCIAL					
PROCESO	2656	CODIGO							
FECHA EMISION	10/04/2026	VERSION	1	HOJA	1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°		2656 - 2025


CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ITEM	2.01	UNIDAD	m2

















Localizacion	Numero	Dimensiones ANCHO	Longitud	AREA	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°2						
ANDEN INTERIOR A		15.20	2.50			38.25
ANDEN INTERIOR B		30.60	2.80			85.68
ANDEN INTERIOR PORTERIA		12.10	2.00			24.20
ANDEN INTERIOR PORTERIA (RAMPA)		3.35	4.50			15.08
PLAZOLETA 1		6.82	3.80			25.92
PLAZOLETA 2		14.70	4.00			58.80
PLAZOLETA 3		12.20	4.35			53.07
PLAZOLETA 4		10.33	5.90			60.95
PLAZOLETA 5		8.30	3.85			32.04
RAMPA 1		5.10	1.80			9.18
RAMPA 2		1.25	1.20			1.50
RAMPA 3		6.80	2.00			13.60
ESCALERA 1 COMEDOR		2.1	3.17			6.66
ESCALERA 2 COMEDOR		1.75	3.6			6.30
RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA 1		6.80	2.80			
RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA 2		2.95	2.30			
RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1		7.30	2.90			
RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		3.25	2.40			
RAMPA DE ACCESO PLAZOLETA 1 - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNA		9.30	2.40			
PARQUEADERO				147.03		147.03
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°1		7.40	2.64			19.54
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°2		12.16	1.58			19.12
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°3		1.80	1.00			1.80
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE DE ASEO		31.58	1.00			31.58
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1		47.60	1.00			47.60
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS		47.88	0.86			41.18
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS SOBRE ANCHO		4.60	0.64			2.94
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1 NUEVOS		17.57	1.06			18.63
ANDEN DE PROTECCION COMEDOR		11.97	0.75			8.98
ANDEN DE PROTECCION COMEDOR		2.15	5.19			11.16
RAMPA 4 COMEDOR		5.03	1.82			9.15
CUNETA "L" EN CIRCULACION RAMPA 2 LONGITUDINAL		0.6	5.7			3.42
CUNETA "L" RAMPA DOBLE LONGITUDINAL		0.6	3.84			2.30
CUNETA EN CONCRETO ANDEN INTERIOR		0.5	45.90			22.95
CUNETA EN CONCRETO ANDEN INTERIOR		0.5	4.26			2.15
CUNETA PLAZOLETA INFERIOR		0.5	14.07			7.04
ASCENSOR		0.5	6.42			3.21
ASCENSOR		0.5	3.48			1.75
CARCAMO EN LA VIA		0.5	4.37			2.19
Subtotal						834.83
TOTAL						834.83

Josué Yamid Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"										
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	ITEM	8.01 ;1,02	UNIDAD	m3

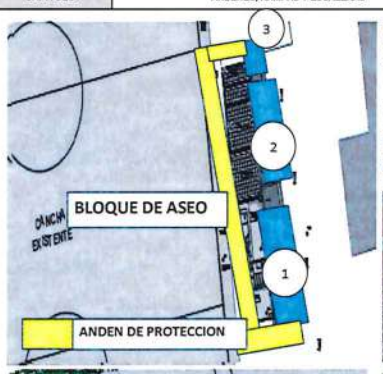













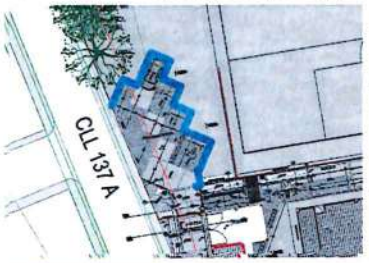









Localización	Ejes	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	AREA	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
EXCAVACION MANUAL ANDEN INTERIOR A		15.91	2.56	0.42		16.07
EXCAVACION MANUAL ANDEN INTERIOR B		30.60	2.88	0.42		35.99
EXCAVACION MANUAL ANDEN INTERIOR PORTERIA		12.10	2.08	0.42		10.16
EXCAVACION MANUAL ANDEN INTERIOR PORTERIA (RAMPA)		3.35	4.56	0.42		6.33
PARQUEADERO		4.90	10.60	0.35		18.18
PARQUEADERO - TERRAPLEN		7.70	10.20	0.35		27.49
EXCAVACION MANUAL PLAZOLETA 1		6.82	3.80	0.42		10.88
EXCAVACION MANUAL PLAZOLETA 2		14.70	4.00	0.42		24.70
EXCAVACION MANUAL PLAZOLETA 3		12.20	4.35	0.42		22.29
EXCAVACION MANUAL PLAZOLETA 4		10.33	5.90	0.42		25.60
EXCAVACION MANUAL PLAZOLETA 5		8.30	3.86	0.42		13.46
RAMPA 1		5.10	1.80	0.42		3.86
RAMPA 2		1.25	1.20	0.42		0.63
RAMPA 3		6.80	2.00	0.42		5.71
EXCAVACIÓN ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS		47.88	0.86	0.42	1.00	17.29
EXCAVACIÓN ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS SOBRE ANCHO		4.60	0.64	0.42	1.00	1.24
EXCAVACIÓN ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1 NUEVOS		17.57	1.06	0.42	1.00	7.82
EXCAVACIÓN ANDEN DE PROTECCION COMEDOR		11.97	0.75	0.42		3.77
EXCAVACIÓN ANDEN DE PROTECCION COMEDOR		2.15	5.19	0.42		4.69
RAMPA 4 COMEDOR		5.03	1.82	0.42		3.84
ESCALERA 1 COMEDOR		2.1	3.17	0.42		2.80
ESCALERA 2 COMEDOR		1.75	3.6	0.42		2.65
EXCAVACION BORDILLOS LATERAL DERECHO VIA		48.38	0.25	0.45	59.00	5.44
EXCAVACIÓN BORDILLOS PLAZOLETAS		75.44	0.25	0.45	92.00	8.49
EXCAVACION BORDILLOS ANDEN PRINCIPAL		111.52	0.25	0.45	136.00	12.55
TUBERIA PLUVIAL 8"		60.29	0.60	0.60		21.70
CAJAS DE INSPECCIÓN		1.00	1.00	1.00	6.00	6.00
EXCAVACION MANUAL DE TUBERIA 4" CARCAMO DE ANDEN A CAJAS		26.00	0.40	0.20	1.00	2.08
EXCAVACION CUNETA "L" EN CIRCULACION RAMPA 2 LONGITUDINAL		5.70	0.50	0.23		0.66
EXCAVACION CUNETA "L" RAMPA DOBLE LONGITUDINAL		3.84	0.50	0.23		0.44
EXCAVACION CUNETA EN CONCRETO ANDEN INTERIOR		45.90	0.40	0.28		5.14
EXCAVACION CUNETA EN CONCRETO ANDEN INTERIOR		4.30	0.40	0.28		0.48
EXCAVACION CUNETA PLAZOLETA INFERIOR		14.97	0.40	0.28		1.68
EXCAVACION CUNETA ASCENSOR		6.42	0.40	0.28		0.72
EXCAVACION CUNETA ASCENSOR		3.40	0.40	0.28		0.38
						331.09
ACTA N°2						
EXCAVACION ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°1		7.15	2.64	0.42		7.91
EXCAVACION ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°2		11.70	1.58	0.42		7.76
EXCAVACION ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°3		1.90	1.00	0.42		0.76
EXCAVACION ANDEN PROTECCION ZONA BLOQUE DE ASEO		31.55	1.00	0.42		13.25
EXCAVACION DE BORDILLO LATERAL DERECHO DE LA VIA AREA DE ASEO		41.00	0.30	0.42		5.17
EXCAVACION CUNETA LONGITUDINAL A VIA PRINCIPAL AREA DE ASEO		35.20	0.30	0.3		2.17
EXCAVACION DE CAJA INSPECCION ACCESO VIA		1.20	1.20	1.20		1.73
EXCAVACION ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1 PARALELO CERRAMIENTO		40.00	0.90	0.32		13.85
EXCAVACION PARQUEADERO				0.45	147.03	66.16
EXCAVACION DE BORDILLO EN EL PARQUEADERO		34.60	0.30	0.3		3.12
EXCAVACION CARCAMO EN LA VIA		4.37	0.60	0.3		0.79
EXCAVACION CARCAMO PARQUEADERO		11.43	0.60	0.3		2.06
				Subtotal		124.73
				TOTAL		124.73

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113189-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"											
DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL									
PROCESO	2656	CÓDIGO										
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1			
FECHA	DD 10	MM 4	AA 2026	CORTE N°	2	ELABORÓ						

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025
CONTRATO N°	2655
CONTRATO N°	2656 - 2025


CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	ITEM	8,02; 5,02	UNIDAD	m3










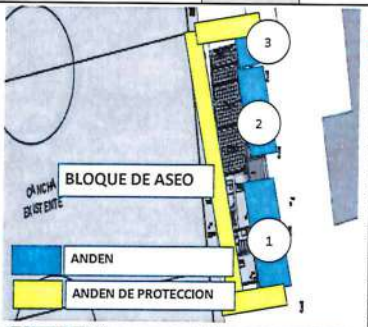






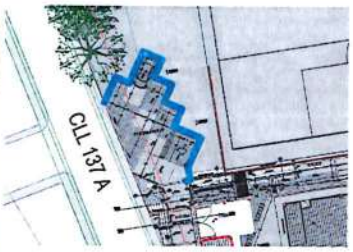











Localización	Ejes	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
RETIRO ANDEN INTERIOR A		15.30	2.56	0.42		16.07
RETIRO ANDEN INTERIOR B		20.68	2.80	0.42		35.99
RETIRO ANDEN INTERIOR PORTERIA		12.18	2.00	0.42		10.16
RETIRO ANDEN INTERIOR PORTERIA (RAMPA)		3.25	4.50	0.42		6.33
RETIRO PARQUEADERO		4.00	10.60	0.35		18.18
RETIRO PARQUEADERO - TERRAPLEN		7.70	10.20	0.35		27.49
RETIRO PLAZOLETA 1		6.82	3.80	0.42		10.88
RETIRO PLAZOLETA 2		14.70	4.00	0.42		24.70
RETIRO PLAZOLETA 3		12.20	4.35	0.42		22.29
RETIRO PLAZOLETA 4		10.33	5.90	0.42		25.60
RETIRO PLAZOLETA 5		8.30	3.86	0.42		13.46
RETIRO RAMPA 1		5.10	1.80	0.42		3.86
RETIRO RAMPA 2		1.25	1.20	0.42		0.63
RETIRO RAMPA 3		6.80	2.00	0.42		5.71
RETIRO ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS		47.88	0.86	0.42	1.00	17.29
RETIRO ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS SOBRE ANCHO		4.60	0.64	0.42	1.00	1.24
RETIRO ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1 NUEVOS		17.57	1.06	0.42	1.00	7.82
RETIRO ANDEN DE PROTECCION COMEDOR		11.97	0.75	0.42		3.77
RETIRO ANDEN DE PROTECCION COMEDOR		2.15	5.19	0.42		4.69
RAMPA 4 COMEDOR		5.03	1.82	0.42		3.84
ESCALERA 1 COMEDOR		2.1	3.17	0.42		2.80
ESCALERA 2 COMEDOR		1.75	3.6	0.42		2.65
RETIRO BORDILLOS LATERAL DERECHO VIA		48.38	0.25	0.45	59.00	5.44
RETIRO BORDILLOS PLAZOLETAS		75.44	0.25	0.45	92.00	8.49
RETIRO DE EXCAVACION BORDILLOS ANDEN PRINCIPAL		111.52	0.25	0.45	136.00	12.55
TUBERIA PLUVIAL		60.29	0.60	0.60		21.70
CAJAS DE INSPECCION		1.00	1.00	1.00	6.00	6.00
RETIRO TUBERIA 4" CARCAMO DE ANDEN A CAJAS		5.70	0.40	0.20	1.00	0.46
EXCAVACION CUNETA "L" EN CIRCULACION RAMPA 2 LONGITUDINAL		5.70	0.50	0.23		0.66
EXCAVACION CUNETA "L" RAMPA DOBLE LONGITUDINAL		3.84	0.50	0.23		0.44
EXCAVACION CUNETA EN CONCRETO ANDEN INTERIOR		45.95	0.40	0.28		5.14
EXCAVACION CUNETA EN CONCRETO ANDEN INTERIOR		4.35	0.40	0.28		0.48
EXCAVACION CUNETA PLAZOLETA INFERIOR		14.07	0.40	0.28		1.58
EXCAVACION CUNETA ASCENSOR		6.42	0.40	0.28		0.72
EXCAVACCION CUNETA ASCENSOR		3.40	0.40	0.28		0.38
ACTA N°2						
RETIRO DE EXCAVACION ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°1		7.15	2.64	0.5	1.00	9.42
RETIRO DE EXCAVACION ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°2		11.70	1.58	0.5	1.00	9.24
RETIRO DE EXCAVACION ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°3		1.80	1.00	0.5	1.00	0.90
RETIRO DE EXCAVACION ANDEN PROTECCION ZONA BLOQUE DE ASEO		31.55	1.00	0.5	1.00	15.78
RETIRO DE EXCAVACION DE BORDILLO LATERAL DERECHO DE LA VIA AREA DE ASEO		41.00	0.30	0.5	1.00	6.15
RETIRO DE EXCAVACION CUNETA LONGITUDINAL A VIA PRINCIPAL AREA DE ASEO		36.20	0.30	0.2	1.00	2.17
RETIRO DE EXCAVACION DE CAJA INSPECCION ACCESO VIA		1.20	1.20	1.20	1.00	1.73
RETIRO EXCAVACION AE ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1 PARALELO PORTERIA		48.00	0.80	0.32	1.00	13.85
RETIRO EXCAVACION DE PARQUEADERO		147.03		0.45	1.00	66.16
					1.00	
RETIRO DE MATERIAL INTERNO EN GRADAS 1		18.14	0.80	1.48	1.00	21.48
RETIRO DE MATERIAL INTERNO EN GRADAS 2		18.14	0.80	1.22	1.00	17.85
RETIRO DE MATERIAL INTERNO EN GRADAS 3		18.14	0.80	0.73	1.00	10.59
RETIRO MURO DE GRADERIA 1		18.14	0.80	1.36	1.00	19.74
RETIRO MURO DE GRADERIA 2		18.14	0.80	1.18	1.00	17.12
RETIRO MURO DE GRADERIA 3		18.14	0.80	0.93	1.00	13.50
RETIRO MURO DE GRADERIA 4		18.14	0.80	0.4	1.00	5.24
RETIRO ZARPA DE GRADERIA 1		18.14	1.00	0.3	1.00	5.44
RETIRO ZARPA DE GRADERIA 2		18.14	1.00	0.3	1.00	5.44
RETIRO ZARPA DE GRADERIA 3		18.14	1.00	0.3	1.00	5.44
RETIRO ZARPA DE GRADERIA 4		18.14	1.00	0.3	1.00	5.44
RETIRO DE DEMOLICION DE PLACA EN GRADERIA 1		18.14	0.80	0.06	1.00	0.87
RETIRO DE DEMOLICION DE PLACA EN GRADERIA 2		18.14	0.80	0.06	1.00	0.87
RETIRO DE DEMOLICION DE PLACA EN GRADERIA 3		18.14	0.80	0.06	1.00	0.87
RETIRO DE EXCAVACION DE BORDILLO EN EL PARQUEADERO		34.68	0.30	0.35	1.00	3.64
RETIRO EXCAVACION CARCAMO EN LA VIA		4.27	0.30	0.3	1.00	0.39
RETIRO DE DEMOLICION CARCAMO EN LA VIA		4.27	0.30	0.12	1.00	0.16
RETIRO DE EXCAVACION CARCAMO PARQUEADERO		11.43	0.26	0.3	1.00	1.03
DESCUENTO POR EXPANSIÓN ACTA 1						-99.33
Subtotal						162.19
TOTAL						162.19

NOTA: La diferencia del retiro con respecto a la excavacion, es devido a la demolicion de cimientos enterrados de graderia la cual no se cuantifica como excavación

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7


"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	ITEM	8.04	UNIDAD	m2

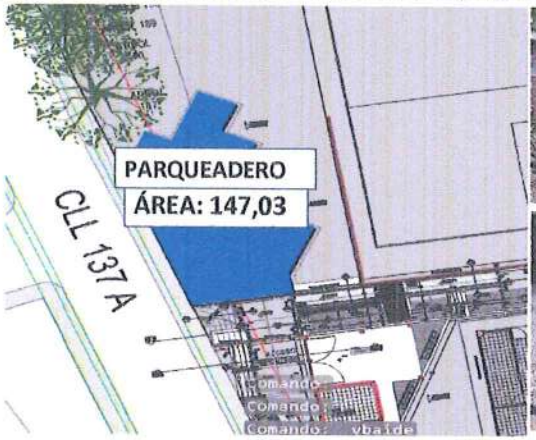





Localización	Dimensiones AREA	Longitud	Ancho	Alto	CANT.	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
ANDEN INTERIOR A		15,30	2,50			38,25
ANDEN INTERIOR B		30,60	2,80			85,68
ANDEN INTERIOR PORTERIA		12,10	2,00			24,20
ANDEN INTERIOR PORTERIA (RAMPA)		3,35	4,50			15,08
PLAZOLETA 1		6,82	3,80			25,92
PLAZOLETA 2		14,70	4,00			58,80
PLAZOLETA 3		12,20	4,35			53,07
PLAZOLETA 4		10,33	5,90			60,95
PLAZOLETA 5		8,30	3,86			32,04
RAMPA 1		5,10	1,80			9,18
RAMPA 2		1,25	1,20			1,50
RAMPA 3		6,80	2,00			13,60
						418,26
ACTA N°2						
GEOTEXTIL PARQUEADERO	147,03				1,00	147,03
Subtotal						147,03
TOTAL						**147,03**

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	ANDEN EN CONCRETO E:12 CM 3000 PSI	ITEM	8.07; 4,02	UNIDAD	m2

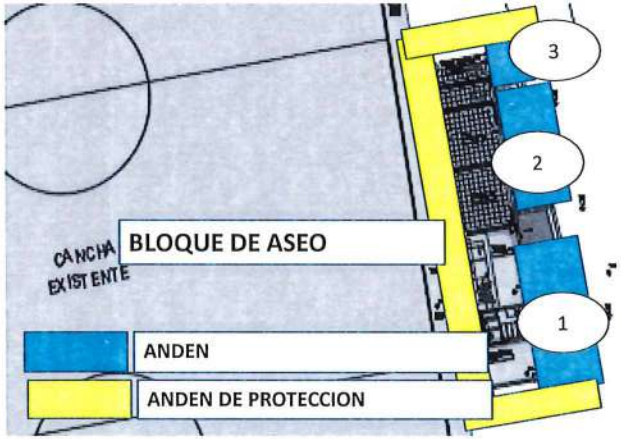













Localización	Dimensiones					TOTAL
	AREA	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
ANDEN INTERIOR A		15.30	2.30			35.19
ANDEN INTERIOR B		30.60	2.60			79.56
RECALCE ANDEN		30.60	0.82			25.09
ANDEN INTERIOR PORTERIA		12.10	1.80			21.78
ANDEN INTERIOR PORTERIA (RAMPA)		3.35	4.30			14.41
ANDEN PLAZOLETA 4		10.33	1.83			18.90
RAMPA 1		5.10	1.80			9.18
RAMPA 2		1.25	1.20			1.50
RAMPA 3		6.80	2.00			13.60
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS		47.88	0.86		1.00	41.18
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS SOBRE ANCHO		4.60	0.64		1.00	2.94
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1 NUEVOS		17.57	1.06		1.00	18.62
ANDEN DE PROTECCIÓN COMEDOR		11.97	0.75			8.98
ANDEN DE PROTECCIÓN COMEDOR		2.15	5.19			11.16
RAMPA 4 COMEDOR		5.03	1.82			9.15
CONCRETO PARA CANAL EN DESCOLE DE TUBERIA 8"		9.1	0.7			6.37
						317.62
ACTA N°2						
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°1		7.15	2.90	0.12	1.00	20.74
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°2		11.70	2.04	0.12	1.00	23.87
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°3		1.80	1.00	0.12	1.00	1.80
CUNETA LONGITUDINAL A VIA PRINCIPAL AREA DE ASEO		36.20	0.30	0.12	1.00	10.86
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE DE ASEO		31.55	1.00	0.12	1.00	31.55
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1		48.08	0.92	0.12	1.00	44.23
Subtotal						133.05
TOTAL						**133.05**

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800113369-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	ITEM	8.08 ; 4,05	UNIDAD	Kg



Localización	Dimensiones AREA	Longitud	Ancho	Alto	KG	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
ANDEN INTERIOR A		15,30	2,30		2,96	104,16
ANDEN INTERIOR B		30,60	2,60		2,96	235,50
RECALCE ANDEN		30,60	0,82		2,96	74,27
ANDEN INTERIOR PORTERIA		12,10	1,80		2,96	64,47
ANDEN INTERIOR PORTERIA (RAMPA)		3,35	4,30		2,96	42,64
PLAZOLETA 1		6,42	3,40		2,96	64,61
PLAZOLETA 2		14,50	3,60		2,96	154,51
PLAZOLETA 3		12,00	3,95		2,96	140,30
PLAZOLETA 4		9,93	5,70		2,96	167,54
PLAZOLETA 5		8,10	3,86		2,96	92,55
RAMPA 1		5,10	1,60		2,96	27,17
RAMPA 2		1,25	1,20		2,96	4,44
RAMPA 3		6,80	2,00		2,96	40,26
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS		47,88	0,86		2,96	121,88
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS SOBRE ANCHO		4,60	0,64		2,96	8,71
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1 NUEVOS		17,57	1,06		2,96	55,13
ANDEN DE PROTECCIÓN COMEDOR		11,97	0,75		2,96	26,57
ANDEN DE PROTECCIÓN COMEDOR		2,15	5,19		2,96	33,03
RAMPA 4 COMEDOR		5,03	1,82		2,96	27,10
ESCALERA 1 COMEDOR		2,1	3,17		2,96	19,70
ESCALERA 2 COMEDOR		1,75	3,6		2,96	18,65
						1523,20
ACTA N°2						
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°1		7,15	2,64		2,96	55,77
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°2		11,70	1,58		2,96	54,72
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°3		1,80	1,80		2,96	5,33
CUNETA LONGITUDINAL A VIA PRINCIPAL AREA DE ASEO		36,20	0,26		2,96	27,86
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE DE ASEO		31,55	1,00		2,96	93,39
ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1		48,09	0,90		2,96	128,09
Subtotal						365,15
TOTAL						365,15

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"												
DIRECCIÓN DE				FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656			CODIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026			VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ITEM	8.11	UNIDAD	ml

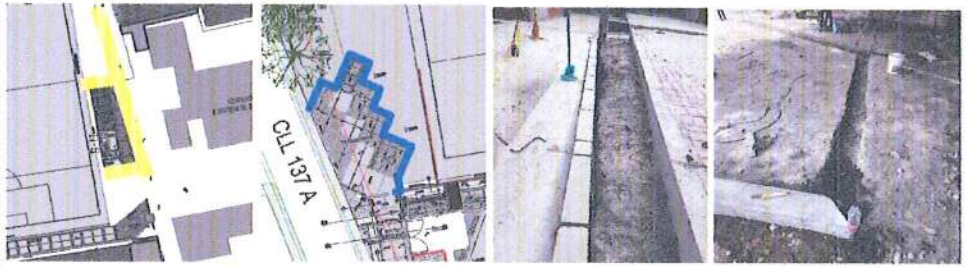

Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
BORDILLOS LATERAL DERECHO VIA		48,38			59,00	48,38
BORDILLOS PLAZOLETA		75,44			92,00	75,44
BORDILLOS ANDEN PRINCIPAL		111,52			136,00	111,52
						235,34
ACTA N°2						
BORDILLO LATERAL DERECHO DE LA VIA AREA DE ASEO		41,00	0,20	0,35		41,00
BORDILLO PARA PARQUEADERO		34,68	0,20	0,35		34,68
Subtotal						75,68
TOTAL						75,68

Jósué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		


DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	ITEM	9.03	UNIDAD	m3/comp



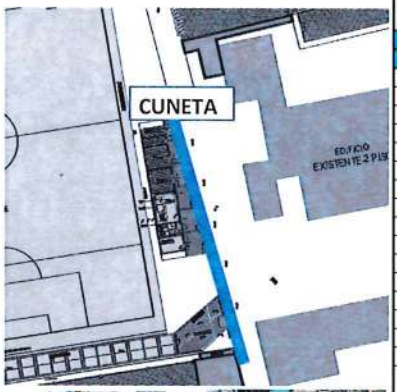






Localización	Dimensiones AREA	Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
ANDEN INTERIOR A		15.30	2.50	0.3		11.48
ANDEN INTERIOR B		30.60	2.80	0.3		25.70
ANDEN INTERIOR PORTERIA		12.10	2.00	0.3		7.26
ANDEN INTERIOR PORTERIA (RAMPA)		3.35	4.50	0.3		4.52
PLAZOLETA 1		6.82	3.80	0.3		7.77
PLAZOLETA 2		14.70	4.00	0.3		17.64
PLAZOLETA 3		12.20	4.35	0.3		15.92
PLAZOLETA 4		10.33	5.90	0.3		18.28
PLAZOLETA 5		8.30	3.86	0.3		9.61
RAMPA 1		5.10	1.80	0.3		2.75
RAMPA 2		1.25	1.20	0.3		0.45
RAMPA 3		6.80	2.00	0.3		4.08
ESCALERA 1 COMEDOR		2.1	3.17	0.3		2.00
ESCALERA 2 COMEDOR		1.75	3.6	0.3		1.89
RAMPA 4 COMEDOR		5.03	1.82	0.12		1.10
ZONAS DE PROTECCIÓN						
EXCAVACION ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS		47.88	0.86	0.30	1.00	12.35
EXCAVACION ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 2 NUEVOS SOBRE ANCHO		4.60	0.64	0.30	1.00	0.88
EXCAVACION ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1 NUEVOS		17.57	1.06	0.30	1.00	5.59
EXCAVACIÓN ANDEN DE PROTECCIÓN COMEDOR		11.97	0.75	0.3		2.69
EXCAVACIÓN ANDEN DE PROTECCIÓN COMEDOR		2.15	5.19	0.3		3.35
						155.33
ACTA N°2						
CUNETA LONGITUDINAL A VIA PRINCIPAL AREA DE ASEO		36.20	0.26	0.13	1.00	1.22
SUB BASE PARQUEADERO	147.03			0.5	1.00	73.52
SUB BASE LOBBY ACCESO PRINCIPAL		9.55	2.20	0.5	1.00	10.51
TALUD - SOBRE ANCHO CONFINAMIENTO BORDILLO		34.68	0.50	0.5	1.00	8.67
Subtotal						93.91
TOTAL						93.91

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"										
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	
FECHA	DD 10	MM 4	AA 2026	CORTE N°	2	ELABORÓ					
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"										
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS					CONTRATO N°		2655			
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025					CONTRATO N°		2656 - 2025			
CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE	ITEM	5.07	UNIDAD	und				

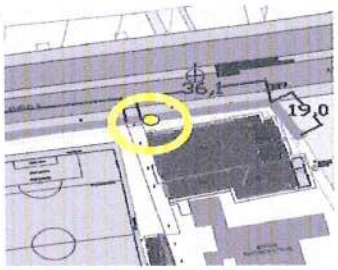



Localización	Dimensiones				CANT	TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
CAJAS DE INSPECCIÓN RED 6"					4,00	4,00
CAJAS DE INSPECCIÓN RED 4"					2,00	2,00
						6,00
ACTA N°2						
CAJA DE INSPECCION ACCESO VIA PRINCIPAL					1,00	1,00
Subtotal						1,00
TOTAL						1,00

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7

"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025

CONTRATO N° 2655

CONTRATO N° 2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	ACERO FIGURADO 37000 PSI	ITEM	9.05; 1.06	UNIDAD	Kg













Localización	Dimensiones NUMERO	Longitud	TRASLAPO	KG/M	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
ACERO CUNETA "L" EN CIRCULACION RAMPA 2 LONGITUDINAL	#3	5,70		0,56	8,00	25,54
ACERO CUNETA "L" EN CIRCULACION RAMPA 2 TRANSVERSAL	#3	1,1		0,56	39	24,02
ACERO CUNETA RAMPA DOBLE LONGITUDINAL	#3	3,84		0,56	8,00	17,20
ACERO CUNETA RAMPA DOBLE TRANSVERSAL	#3	1,10		0,56	27	16,39
						83,15
ACTA N°2						
CUNETA EN CONCRETO ANDEN INTERIOR LONGITUDINAL	#3	45,90	4,59	0,56	8,00	226,20
CUNETA EN CONCRETO ANDEN INTERIOR FLEJES	#3	1,00		0,56	307,00	171,92
CUNETA EN CONCRETO ANDEN INTERIOR LONGITUDINAL	#3	4,30		0,56	8,00	19,26
CUNETA EN CONCRETO ANDEN INTERIOR FLEJES	#3	1,00		0,56	30	16,61
CUNETA PLAZOLETA INFERIOR LONGITUDINAL	#3	14,07	1,41	0,56	8,00	69,34
CUNETA PLAZOLETA INFERIOR FLEJES	#3	1,00		0,56	94,80	53,09
CUNETA ASCENSOR LONGITUDINAL	#3	6,42	0,64	0,56	8,00	31,64
CUNETA ASCENSOR FLEJE	#3	1,00		0,56	43,80	24,53
CUNETA ASCENSOR FLEJE	#3	3,40		0,56	8,00	15,23
CUNETA ASCENSOR LONGITUDINAL	#3	1,00		0,56	23,67	13,25
CARCAMO EN LA VIA	#3	4,37	0,44	0,56	8,00	21,54
CARCAMO EN LA VIA - FLEJES	#3	1,00		0,56	30,13	16,87
CARCAMO PARQUEADERO	#3	11,43	1,14	0,56	8,00	56,33
CARCAMO PARQUEADERO - FLEJES	#3	1,10		0,56	77,20	47,56
	Subtotal					783,36
	TOTAL					783,36

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT 890111189-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL						
PROCESO	2656	CÓDIGO							
FECHA EMISIÓN	2/03/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1

FECHA	DD	2	MM	3	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	ITEM	10.03	UNIDAD	m3











Localización	Dimensiones				TOTAL
	Alto	Longitud	Ancho	KG/M CANT	
ACTA 1					
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER					
DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS PERIMETRO	0.12	8.00	1.00	1.00	0.96
DEMOLICION DADOS ENTERRADOS EN DESCOLE DE TUBERIA 8"	0.2	9.1	0.4	1.00	0.73
ACTA 2					
DEMOLICIÓN CIMIENTOS TUBERIA 8"	0.2	60.29	0.5	1.00	6.03
DEMOLICIÓN CIMIENTOS CARCAMO ANDEN PRINCIPAL	0.1	7	0.5	1.00	0.35
DEMOLICIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL	0.1	134	0.5	1.00	6.70
DEMOLICIÓN CIMIENTOS CARCAMO ANDEN PRINCIPAL	7	0.1	0.5	1.00	0.35
DEMOLICIÓCIMIENTO CAJAS DE INSPECCIÓN	0.2	0.60	0.60	6.00	0.43
Subtotal					13.86
TOTAL					13.86

Josue Yamil Sanchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 890113389-7

"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	ITEM	10,02	UNIDAD	m2



Localización	Ejes	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	CANT.	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
PLACA PARA CUNETA "L" EN CIRCULACION RAMPA 2		6,70	0,50		1,00	2,85
PLACA PARA CUNETA RAMPA DOBLE		3,84	0,50		1,00	1,92
						4,77
ACTA N°2						
DEMOLICION PLACA PARA CARCAMO EN LA VIA		4,37	0,50			2,19
Subtotal						2,19
TOTAL						2,19

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCION DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISION	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS	DESCRIPCION	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ITEM	N.P.1	UNIDAD	ML





Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT.	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°2						
CARCAMO EN PARQUEADERO		11,43				11,43
Subtotal						11,43
TOTAL						11,43

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	MUROS DE CONTENCIÓN	DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	ITEM	9.01 ;1,02	UNIDAD	m3

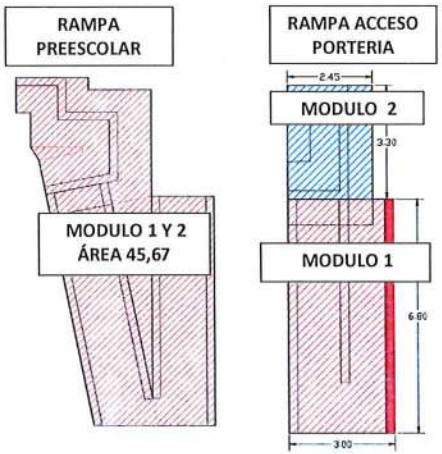











Localización	Dimensiones AREA	Longitud	Ancho	Alto	CANT.	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
EXCAVACION MANUAL MURO CONTENCION PLAZOLETA 3		3.00	1.00	1.9	1	5.70
EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1		6.80	2.60	2.60	1.00	49.50
EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		2.95	2.30	2.65	1.00	17.98
EXCAVACION LOBBY DE PORTERIA PRINCIPAL		9.55	2.20	0.49	1.00	5.15
EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1		7.30	2.90	2.05	1.00	43.40
EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PREECOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		3.25	2.40	2.45	1.00	19.11
EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PLAZOLETA 1 - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNNA		9.30	2.40	1.50	1.00	33.48
MURO PLAZOLETA 5		1.33	0.2	1.33	1.00	0.35
						174.67
ACTA N°2						
EXCAVACION FALTANTE RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		3.30	2.45	2.65	1.00	21.43
EXCAVACION FALTANTE RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1 Y 2	45.67			2.09	1.00	95.61
Subtotal						117.03
TOTAL						117.03

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"											
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656		CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	MUROS DE CONTENCIÓN	DESCRIPCION	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	ITEM	9,02; 5,02	UNIDAD	m3







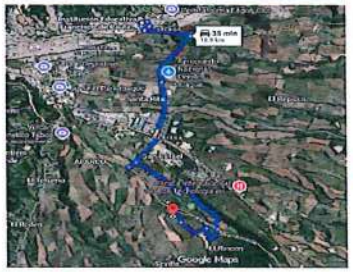







Localización	Dimensiones AREA	Longitud	Ancho	Alto	CANT.	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
RETIRO MURO CONTENCION PLAZOLETA 3		3.00	1.00	1.9	1	5.70
RETIRO RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA 1		6.80	2.80	2.60	1.00	49.50
RETIRO RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA 2		2.95	2.30	2.65	1.00	17.98
RETIRO LOBBY DE PORTERIA PRINCIPAL		9.55	2.20	0.49	1.00	5.15
RETIRO RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1		7.30	2.90	2.05	1.00	43.40
RETIRO RAMPA DE ACCESO PREECOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		3.25	2.40	2.45	1.00	19.11
RETIRO RAMPA DE ACCESO PLAZOLETA 1 - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNZIA		9.30	2.40	1.50	1.00	33.48
RETIRO MURO PLAZOLETA 5		1.33	0.20	1.33	1.00	0.35
SUB TOTAL						174.67
ACTA N°2						
RETIRO DE FALTANTE EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		3.30	2.45	2.65	1.00	21.43
EXCAVACION FALTNATE RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1 Y 2	45.67			2.09	1.00	95.61
Subtotal						117.03
DESCUENTO POR EXPANSIÓN ACTA 1						-52.40
TOTAL						64.63

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL				
PROCESO	2656	CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	MUROS DE CONTENCIÓN	DESCRIPCION	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	ITEM	9.03	UNIDAD	m3/comp

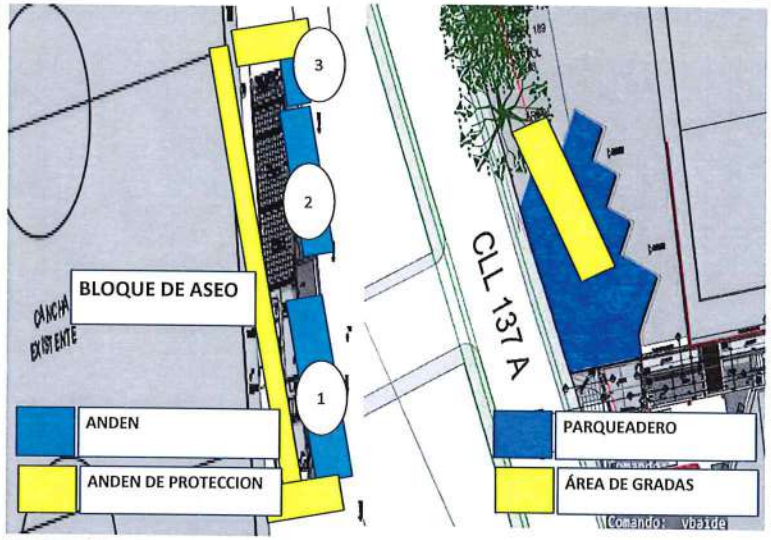



Localización	AREA	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°2						
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°1		7.15	2.64	0.3	1.00	5.65
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°2		11.70	1.58	0.3	1.00	5.55
ANDEN ZONA BLOQUE DE ASEO N°3		1.80	1.00	0.3	1.00	0.54
EXCAVACION ANDEN PROTECCION ZONA BLOQUE DE ASEO		31.55	1.00	0.3	1.00	9.47
EXCAVACION DE BORDILLO LATERAL DERECHO DE LA VIA AREA DE ASEO		41.00	0.30	0.3	1.00	3.69
EXCAVACION CUNETA LONGITUDINAL A VIA PRINCIPAL AREA DE ASEO		36.20	0.30	0.3	1.00	3.26
EXCAVACION ANDEN DE PROTECCION BLOQUE 1 PARALELO CERRAMIENTO		43.08	0.90	0.42		18.17
RELLENO EN AREA DE CIMIENTOS ENTERRADOS EN DEMOLICION DE GRADAS		16.50	3.30	0.5	1.00	27.23
MUROS DE CONTENCIÓN LLENOS EN RAMPAS						
EXCAVACION MANUAL MURO CONTENCION PLAZOLETA 3		3.00	1.00	1.9	1	5.70
EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1		6.80	2.80	2.60	1.00	49.50
EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		2.95	2.30	2.65	1.00	17.98
EXCAVACION LOBBY DE PORTERIA PRINCIPAL		9.55	2.20	0.49	1.00	5.15
EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1		7.30	2.90	2.05	1.00	43.40
EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PREECOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		3.25	2.40	2.45	1.00	19.11
EXCAVACION RAMPA DE ACCESO PLAZOLETA 1 - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNNA		9.30	2.40	1.50	1.00	33.48
MURO PLAZOLETA 5		1.33	0.2	1.33	1.00	0.35
EXCAVACION FALTANTE RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		3.30	2.45	2.65	1.00	21.43
EXCAVACION FALTANTE RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1 Y 2	45.67			2.09	1.00	95.61
Subtotal						365.26
TOTAL						365.26

Josue Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7


"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025


CAPÍTULO	MUROS DE CONTENCIÓN	DESCRIPCION	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	ITEM	9.04; 1,09	UNIDAD	m2









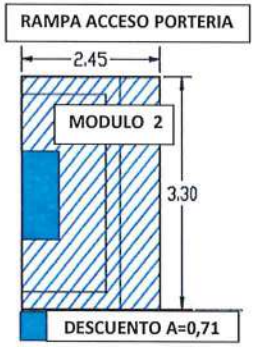





Localización	Dimensiones AREA	Longitud	Ancho	Alto	CANT.	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA 1		6.80	2.80			19.04
RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA 2		2.95	2.30			6.79
RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1		7.30	2.90			21.17
RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		3.25	2.40			7.80
RAMPA DE ACCESO PLAZOLETA 1 - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNNA		9.30	2.40			22.32
						77.12
ACTA N°2						
RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA 2		3.30	2.45			8.09
RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1	27.51					27.51
RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2	13.85					13.85
Subtotal						49.45
TOTAL						49.45

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890111389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"												
DIRECCIÓN DE					FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO		2656			CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN		10/04/2026			VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	
FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ				
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"												
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS								CONTRATO N°			2655	
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025								CONTRATO N°			2656 - 2025	
CAPÍTULO	MUROS DE CONTENCIÓN			DESCRIPCION	ACERO FIGURADO 37000 PSI			ITEM	9.05; 1,06		UNIDAD	Kg	

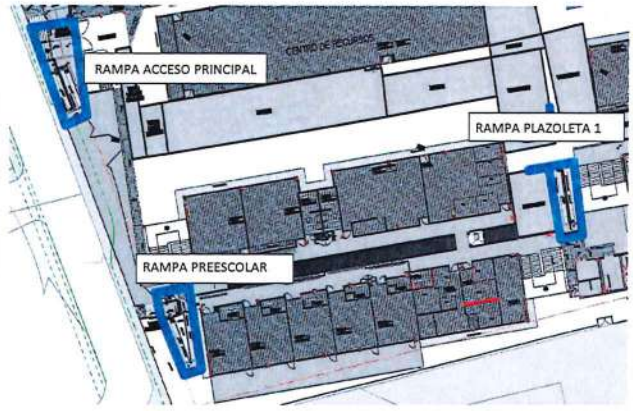

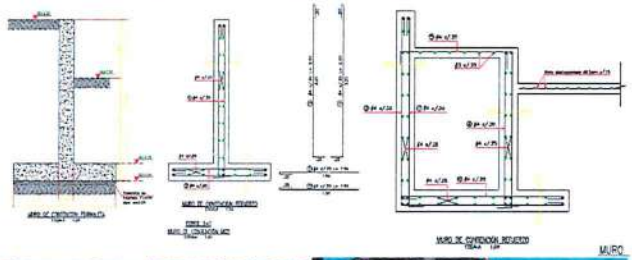







Localización	NUMEERO	Dimensiones Longitud	TRASLAPO	KG/M	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
ACERO MURO PLAZOLETA 3 - PARRILLA 1 VERTIVAL	INTERNO	1.80		0.99	15.00	26.64
ACERO MURO PLAZOLETA 3 - PARRILLA 2 VERTICAL	EXTERNO	1.80		0.99	15.00	26.64
ACERO MURO PLAZOLETA 3 - HORIZONTAL	FLEJE	3.00		0.99	18.00	53.68
ACERO PLAZOLETA 3 - ZAPATA PARRILLA 1 - TRANSVERSAL	FLEJE	0.60		0.99	15.00	8.95
ACERO PLAZOLETA 3 - ZAPATA PARRILLA 2 - TRANSVERSAL	FLEJE	1.00		0.99	15.00	14.91
ACERO PLAZOLETA 3 - ZAPATA PARRILLA 1 - LONGITUDINAL	SUPERIOR	3.00		0.99	3.00	8.95
ACERO PLAZOLETA 3 - ZAPATA PARRILLA 2 - LONGITUDINAL	INFERIOR	3.00		0.99	3.00	8.95
ACERO MURO PLAZOLETA 5 - PARRILLA 1 VERTIVAL	INTERNO	1.43		0.99	8.00	11.37
ACERO MURO PLAZOLETA 5 - PARRILLA 2 VERTICAL	EXTERNO	1.43		0.99	8.00	11.37
ACERO MURO PLAZOLETA 5 - HORIZONTAL	INTERNO	1.43		0.99	8.00	11.37
ACERO MURO PLAZOLETA 5 - HORIZONTAL	EXTERNO	1.43		0.99	8.00	11.37
ACERO ZARPA MC2 PARRILLA 1 - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	SUPERIOR	1.90		0.99	22.00	41.55
ACERO ZARPA MC2 PARRILLA 2 - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	INFERIOR	1.90		0.99	22.00	41.55
ACERO ZARPA MC2 PARRILLA 1 - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	LONGITUDINAL	4.40		0.99	8.00	34.99
ACERO ZARPA MC2 PARRILLA 2 - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	LONGITUDINAL	4.40		0.99	8.00	34.99
ACERO MURO MC2 PARRILLA 1 - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	VERTICAL	2.60		0.99	22.00	56.86
ACERO MURO MC2 PARRILLA 2 - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	VERTICAL	2.60		0.99	22.00	56.86
ACERO MURO MC2 PARRILLA 1 - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	HORIZONTAL	4.40		0.99	9.00	39.36
ACERO MURO MC2 PARRILLA 2 - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	HORIZONTAL	4.40		0.99	9.00	39.36
ACERO MURO MC2A (3) - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA		5.40		0.99	34.00	182.50
ACERO MURO MC2A (1) - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA		2.60		0.99	34.00	87.87
ACERO MURO MC2A (6) - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA		3.20		0.99	34.00	108.15
ACERO MURO MC2A (4) - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA		2.38		0.99	29.00	68.46
ACERO MURO MC2A (5) - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA		2.38		0.99	29.00	68.46
ACERO MURO MC2A (5) GANCHO RAMPA - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA		1.80		0.99	29.00	
ACERO MURO MC2A (7) - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA		2.38		0.99	29.00	68.46
ACERO MURO MC2A (8) - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA		2.38		0.99	29.00	68.46
ACERO ZARPA MC2A - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	HORIZONTAL	7.40		0.99	24.00	176.53
ACERO MURO 1 MC2A - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	LONGITUDINAL	7.40		0.99	18.00	132.40
ACERO MURO 2 MC2A - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	LONGITUDINAL	5.40		0.99	14.00	75.15
ACERO MURO 3 MC2A - RAMPA PORTERIA MOVILIDAD REDUCIDA	LONGITUDINAL	5.40		0.99	14.00	75.15
ACTA N°2						
ACERO RAMPA PREESCOLAR MURO 1 - VERTICAL PARRILA 1	#4	2.40		0.99	43.00	102.58
ACERO RAMPA PREESCOLAR MURO 1 - VERTICAL PARRILA 2	#4	4.00		0.99	43.00	170.97
ACERO RAMPA PREESCOLAR MURO 1 - HORIZONTAL PARRILLA 1 Y 2	#5	8.40	0.84	1.55	16.00	229.45
ACERO RAMPA PREESCOLAR MURO 2 - VERTICAL PARRILA 1 Y 2	#4	1.63		0.99	70.00	113.42
ACERO RAMPA PREESCOLAR MURO 2 - HORIZONTAL PARRILA 1 Y 2	#5	7.00	0.70	1.55	10.00	119.50
ACERO RAMPA PREESCOLAR MURO 2 - HORIZONTAL PARRILA 1 Y 2	#5	3.85		1.55	2.00	11.95
ACERO ZARPA RAMPA PREESCOLAR PARRILLA 1 SUPERIOR TRANSVERSAL	#4	2.00		0.99	43.00	85.48
ACERO ZARPA RAMPA PREESCOLAR PARRILLA 1 Y 2 LONGITUDINAL	#5	7.90	0.79	1.55	8.00	107.00
ACERO ZARPA RAMPA PREESCOLAR MURO MC2A - 1 TRANSVERSAL PARRILLA 1 Y 2	#4	2.00		0.99	32.00	65.52
ACERO ZARPA RAMPA PREESCOLAR MURO MC2A - 2 TRANSVERSAL PARRILLA 1 Y 2	#4	2.00		0.99	20.00	40.95
ACERO ZARPA RAMPA PREESCOLAR MURO MC2A - 3 TRANSVERSAL PARRILLA 1 Y 2	#4	2.00		0.99	22.00	45.05
ACERO ZARPA RAMPA PREESCOLAR MURO MC2A - 1 LONGITUDINAL PARRILLA 1 Y 2	#5	3.20		1.55	12.00	59.52
ACERO ZARPA RAMPA PREESCOLAR MURO MC2A - 2 LONGITUDINAL PARRILLA 1 Y 2	#5	3.10		1.55	12.00	57.66
ACERO ZARPA RAMPA PREESCOLAR MURO MC2A - 3 LONGITUDINAL PARRILLA 1 Y 2	#4	2.36		0.99	16.00	37.53
ACERO MURO RAMPA PREESCOLAR PARA ESCALERA - VERTICAL	#4	1.50		0.99	15.00	20.33
ACERO MURO RAMPA PREESCOLAR LATERAL PARA ESCALERA - VERTICAL	#4	1.90		0.99	14.00	26.44
ACERO MURO MC2A "C" RAMPA PREESCOLAR - HORIZONTAL	#5	9.23	0.92	1.55	10.00	140.32
ACERO MURO MC2A RAMPA PREESCOLAR ANTEPECHO - HORIZONTAL	#5	2.95		1.55	4.00	18.29
ACERO MURO MC2A RAMPA PREESCOLAR ANTEPECHO - VERTICAL	#4	2.70		0.99	40.00	107.35
ACERO MURO MC2A INICIO RAMPA PREESCOLAR - VERTICAL	#4	1.90		0.99	14.00	26.44
ACERO RAMPA PREESCOLAR LLEGADA MURO 3 - PARRILLA 1 Y 2 - VERTICAL	#4	0.80		0.99	60.00	47.71
ACERO RAMPA PREESCOLAR LLEGADA MURO 3 - PARRILLA 1 Y 2 - HORIZONTAL	#5	6.00		1.55	6.00	55.80
ACERO RAMPA PREESCOLAR LLEGADA MURO 4 - PARRILLA 1 Y 2 - VERTICAL	#4	0.80		0.99	60.00	47.71
ACERO RAMPA PREESCOLAR LLEGADA MURO 4 - PARRILLA 1 Y 2 - HORIZONTAL	#5	6.00		1.55	6.00	55.80
ACERO RAMPA PREESCOLAR ZARPA LLEGADA - PARRILLA 1 Y 2 TRANSVERSAL	#4	2.00		0.99	60.00	119.28
ACERO RAMPA PREESCOLAR ZARPA LLEGADA - PARRILLA 1 Y 2 LONGITUDINAL	#5	6.00		1.55	8.00	74.40
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 1 - PARRILLA 1 Y 2 - VERTICAL	#4	1.82		0.99	82.00	148.34
DESCUENTO DE ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 1 - PARRILLA 1 Y 2 - VERTICAL	#4	-0.70		0.99	10.00	- 6.99









ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 1 - PARRILLA 1 Y 2 - HORIZONTAL	#4	8.26	0.83	0.99	14.00	126.44
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 2 - PARRILLA 1 - VERTICAL	#4	1.62		0.99	43.00	69.24
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 2 - PARRILLA 2 - VERTICAL	#4	1.62		0.99	19.00	30.69
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 2 - PARRILLA 2 - VERTICAL	#5	1.62		1.55	14.00	35.15
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 2 - PARRILLA 1 - HORIZONTAL	#4	8.26	0.83	0.99	6.00	54.19
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 2 - PARRILLA 1 - HORIZONTAL	#4	4.55		0.99	1.00	4.52
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 2 - PARRILLA 2 - HORIZONTAL	#4	8.26	0.83	0.99	4.00	36.13
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 2 - PARRILLA 2 - HORIZONTAL	#5	8.26	0.83	1.55	3.00	42.25
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO DESCANSO - PARRILLA 1 Y 2 - VERTICAL	#4	1.45		0.99	13.00	18.74
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO DESCANSO - PARRILLA 1 Y 2 - HORIZONTAL	#4	2.04		0.99	10.00	20.28
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO DESCANSO - PARRILLA 1 Y 2 - HORIZONTAL	#4	2.30		0.99	2.00	4.57
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO CON TACHES "U"	#4	0.70		0.99	41.00	20.53
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 EN MURO TACHE - LONGITUDINAL	#4	6.95	0.70	0.99	2.00	15.26
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO RECIBIMIENTO - PARRILLA 1 Y 2 - VERTICAL	#5	1.55		1.55	8.00	19.22
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO RECIBIMIENTO - PARRILLA 1 Y 2 - HORIZONTAL	#4	2.10		0.99	12.00	25.05
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - ZARPA PARRILLA 1 Y 2 - TRANSVERSAL	#4	2.10		0.99	82.00	171.17
ACERO RAMPA PLAZOLETA 1 - ZARPA PARRILLA 1 Y 2 - LONGITUDINAL	#5	8.26	0.83	1.55	9.00	112.67
ACERO PARA DISTANCIADORES - SEPARADORES	#4	0.25		0.99	230.00	57.18
				Subtotal		3,007.84
				TOTAL		3,007.84

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

AA

Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800113389-7


"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCION DE PROCESO		2656		FORMATO CODIGO	MEMORIA ACTA PARCIAL						
FECHA EMISION		10/04/2026		VERSION	1	HOJA		1		DE	1
FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS — CONTRATO N° 2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025 — CONTRATO N° 2656 - 2025


CAPÍTULO	MUROS DE CONTENCIÓN	DESCRIPCION	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI , H=2,0 M (SIN REFUERZO)	ITEM	9.06.3.02	UNIDAD	m3




































Localización	Área	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
MURO DE CONTENCION PLAZOLETA 3		3.00	0.20	0.85	1.00	0.51
ZARPA MURO DE CONTENCION PLAZOLETA 3		3.00	1.00	0.25	1.00	0.75
MURO DE CONTENCION PLAZOLETA 5		1.33	0.20	1.33	1.00	0.35
RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1		6.80	2.80	0.25	1.00	4.76
RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2		2.95	2.30	0.25	1.00	1.70
						8.07
ACTA N°2						
RAMPA PLAZOLETA 1 - ZARPA - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNA		8.24	2.40	0.25		4.94
ZARPA RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MODULO 2		3.30	3.45	0.25		2.84
RAMPA ACCESO PORTERIA MURO 1 MC2A		6.75	0.25	2.10		3.54
RAMPA ACCESO PORTERIA MURO 2 MC2A		5.30	0.25	1.95		2.58
RAMPA ACCESO PORTERIA MURO 3 MC2A		6.75	0.25	1.50		2.53
RAMPA ACCESO PORTERIA CONCRETO MURO 1 - MC2		1.06	0.25	2.10		0.56
RAMPA ACCESO PORTERIA CONCRETO MURO 2 - MC2		2.80	0.25	2.10		1.47
RAMPA ACCESO PORTERIA CONCRETO MURO 3 - MC2		1.75	0.25	2.10		0.92
RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 1 - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNA		8.24	0.25	1.31		2.70
RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 2 - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNA		8.24	0.25	1.11		2.28
RAMPA PLAZOLETA 1 - DESCANSO - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNA		1.74	0.25	0.90		0.39
RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO 3 - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNA		8.60	0.25	0.24		0.52
RAMPA PLAZOLETA 1 - MURO DE INICIO - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNA		1.60	0.25	1.31		0.52
RAMPA DE PREESCOLAR MURO 1		8.40	0.25	2.00		4.20
RAMPA DE PREESCOLAR MURO 2		7.00	0.25	1.08		1.83
RAMPA DE PREESCOLAR MURO 3		6.14	0.25	0.61		0.94
RAMPA DE PREESCOLAR MURO 4		7.90	0.25	0.50		0.99
RAMPA DE PREESCOLAR ZARPA - MODULO 2	13.85		0.25			3.46
RAMPA DE PREESCOLAR ZARPA - MODULO 1	27.51		0.25			6.88
RAMPA DE PREESCOLAR MURO A		1.50	0.25	1.31		0.49
RAMPA DE PREESCOLAR MURO B		0.73	0.25	2.11		0.39
RAMPA DE PREESCOLAR MURO C		1.66	0.25	2.11		0.88
RAMPA DE PREESCOLAR MURO D		1.34	0.25	2.11		0.71
RAMPA DE PREESCOLAR MURO E		1.26	0.25	1.31		0.41
RAMPA DE PREESCOLAR MURO F		1.47	0.25	1.31		0.48
Subtotal						47.50
TOTAL						47.50

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7


"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	MUROS DE CONTENCIÓN	DESCRIPCION	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ITEM	2.01	UNIDAD	m2

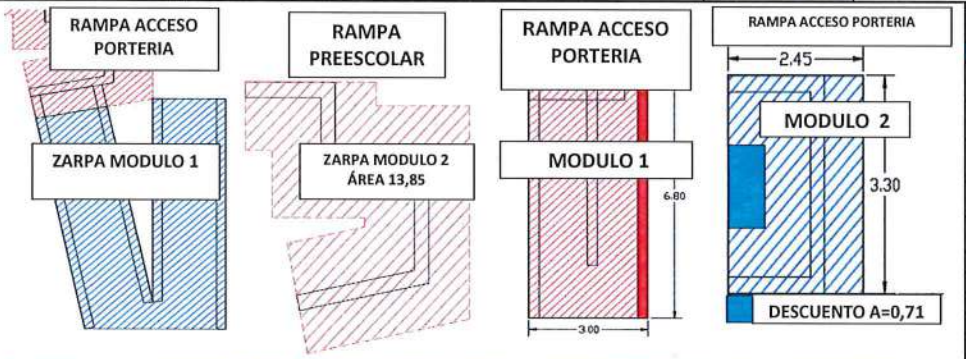



Localización	Dimensiones AREA	Longitud	Ancho	Alto	CANT.	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
RAMPA DE ACCESO PLAZOLETA 1 - MOVILIDAD REDUCIDA INTERNNA		8.24	2.40			19.78
RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 1	27.51					27.51
RAMPA DE ACCESO PREESCOLAR - MOVILIDAD REDUCIDA MODULO 2	13.85					13.85
RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA 1		6.80	2.80			19.04
RAMPA DE ACCESO PORTERIA PRINCIPAL - MOVILIDAD REDUCIDA 2		3.30	2.45			8.09
					Subtotal	88.26
					TOTAL	88.26

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL
PROCESO	2656	CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1 HOJA 1 DE 1


FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	ITEM	10.02	UNIDAD	m2

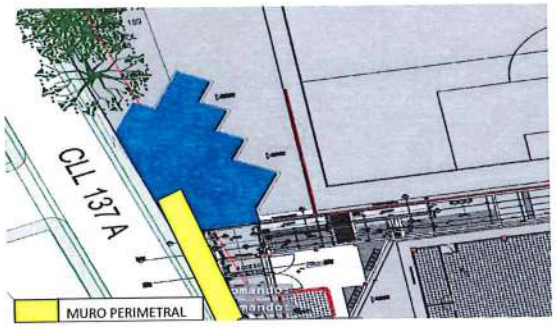



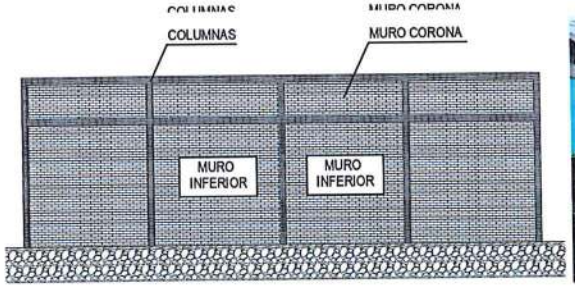




Localización	Dimensiones				CANT.	TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto		
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°2						
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 1 - INFERIOR			2.78	3.5		9.73
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 1 - CORONA			2.78	1		2.78
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 2 - INFERIOR			2.83	3.5		9.91
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 2 - CORONA			2.83	1		2.83
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 3 - INFERIOR			2.88	3.5		10.08
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 3 - CORONA			2.88	1		2.88
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 4 - INFERIOR			2.76	3.5		9.66
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 4 - CORONA			2.76	1		2.76
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 5 - INFERIOR			2.78	3.5		9.73
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 5 - CORONA			2.78	1		2.78
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 6 - INFERIOR			2.83	3.5		9.91
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 6 - CORONA			2.83	1		2.83
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 7 - INFERIOR			2.88	3.5		10.08
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 7 - CORONA			2.88	1		2.88
Subtotal						88.83
TOTAL						88.83

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"												
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL									
PROCESO	2656		CÓDIGO										
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1			
FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ				
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"												
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS						CONTRATO N°		2655				
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025						CONTRATO N°		2656 - 2025				
CAPÍTULO	CERRAMIENTO		DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS			ITEM	10.04;1,02	UNIDAD	m3			

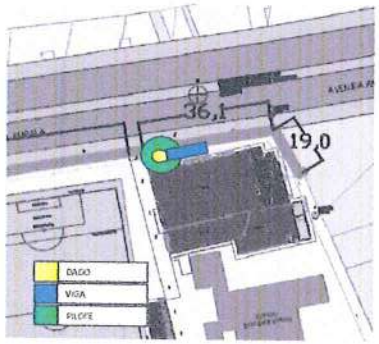





Localización	Ejes	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
EXCAVACION MANUAL PILOTES		3,00	0,071		45,00	9,54
EXCAVACION MANUAL DADO		0,40	0,40	0,55	46,00	4,05
EXCAVACION MANUAL VIGA DE CIMENTACION		79,70	0,30	0,35	1,00	8,37
EXCAVACION MANUAL VIGA DE CIMENTACION		36,10	0,30	0,35	1,00	3,79
EXCAVACION MANUAL VIGA DE CIMENTACION		19,00	0,30	0,35	1,00	2,00
						27,74
ACTA N°2						
EXCAVACION VIGA DE CIMENTACION PORTON VIA PRINCIPAL		2,70	0,30	0,30	1,00	0,24
EXCAVACION DE PILOTE PORTON VIA PRINCIPAL		1,80	0,071		1,00	0,13
EXCAVACION DE DADO PORTON VIA PRINCIPAL		0,40	0,40	0,50	1,00	0,08
Subtotal						0,45
TOTAL						0,45

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCION DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CODIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSION	1	HOJA		1		DE	1	
FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ		


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	ITEM	10,05; 5,02	UNIDAD	m3/comp

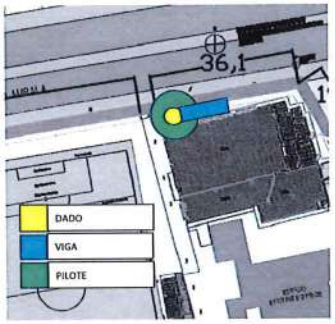





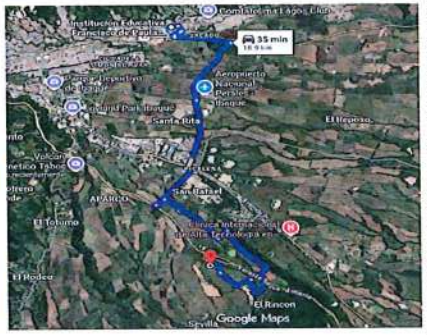

Localización	Dimensiones CANT.	Longitud	Ancho	Alto	% EXP.	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
RETIRO EXCAVACION MANUAL DADO		0.40	0.40	0.55	46.00	4.05
RETIRO EXCAVACION MANUAL VIGA DE CIMENTACION		79.70	0.30	0.35	1.00	8.37
RETIRO EXCAVACION MANUAL VIGA DE CIMENTACION		36.10	0.30	0.35	1.00	3.79
RETIRO EXCAVACION MANUAL VIGA DE CIMENTACION		19.00	0.30	0.35	1.00	2.00
SUB TOTAL						18.20
ACTA N°2						
RETIRO DE EXCAVACION VIGA DE CIMENTACION PORTON VIA PRINCIPAL		2.70	0.30	0.30	1.00	0.24
RETIRO DE EXCAVACION DE DADO PORTON VIA PRINCIPAL		0.40	0.40	0.50	1.00	0.08
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 1 - INFERIOR		2.78	0.15	2.5	1.00	1.04
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 1 - CORONA		2.78	0.15	0.6	1.00	0.25
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 2 - INFERIOR		2.83	0.15	2.5	1.00	1.06
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 2 - CORONA		2.83	0.15	0.6	1.00	0.25
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 3 - INFERIOR		2.88	0.15	2.5	1.00	1.08
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 3 - CORONA		2.88	0.15	0.6	1.00	0.26
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 4 - INFERIOR		2.76	0.15	2.5	1.00	1.04
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 4 - CORONA		2.76	0.15	0.6	1.00	0.25
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 5 - INFERIOR		2.78	0.15	2.5	1.00	1.04
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 5 - CORONA		2.78	0.15	0.6	1.00	0.25
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 6 - INFERIOR		2.83	0.15	2.5	1.00	1.06
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 6 - CORONA		2.83	0.15	0.6	1.00	0.25
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 7 - INFERIOR		2.88	0.15	2.5	1.00	1.08
RETIRO DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL 7 - CORONA		2.88	0.15	0.6	1.00	0.26
RETIRO DE COLUMNAS FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL	7.00	2.50	0.15	0.25	1.00	0.66
RETIRO DEMOLICION DE VIGA CORONA FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL		19.74	0.15	0.25	1.00	0.74
RETIRO DEMOLICION DE VIGA INFERIOR FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL		19.74	0.15	0.25	1.00	0.74
Subtotal						11.64
DESCUENTO POR EXPANSIÓN ACTA 1						-5.46
TOTAL						6.18

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7


"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE PROCESO			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISION	10/04/2026		VERSION	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	PILOTE PRE EXCAVADO D=30CM INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ITEM	10.06;1,07	UNIDAD	ml

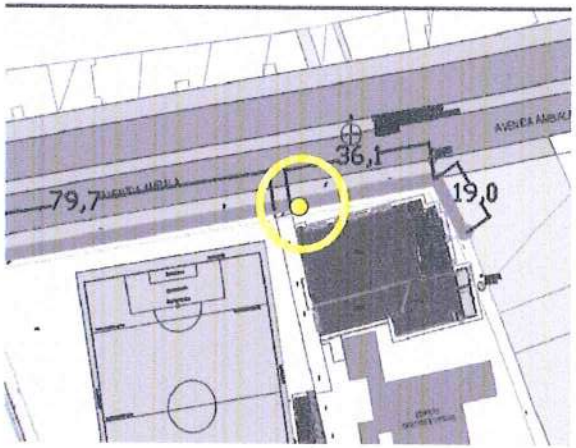





Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
PILOTES PRE EXCAVADOS		3,00	0,071		45,00	135,00
						135,00
ACTA N°2						
PILOTE PORTON VIA PRINCIPAL		1,80			1,00	1,80
Subtotal						1,80
TOTAL						1,80

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	ITEM	10.08	UNIDAD	m2

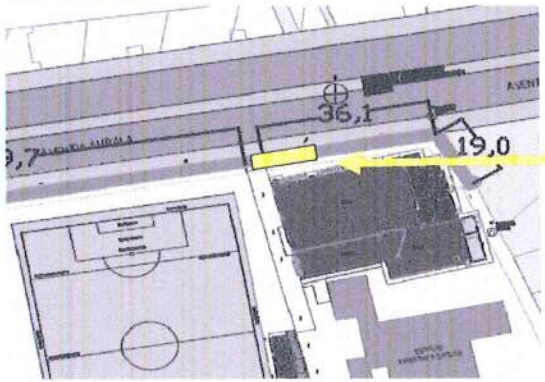



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M PARA VIGA DE CIMENTACION		36,10	0,30			10,83
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M PARA VIGA DE CIMENTACION		36,10	0,30	0,35	1,00	10,83
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M PARA VIGA DE CIMENTACION		19,00	0,30	0,35	1,00	5,70
						27,36
ACTA N°2						
BASE EN CONCRETO POBRE PARA VIGA PORTON VIA PRINCIPAL		2,70	0,30		1,00	0,81
Subtotal						0,81
TOTAL						0,81

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISION	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	ITEM	10.09	UNIDAD	m3

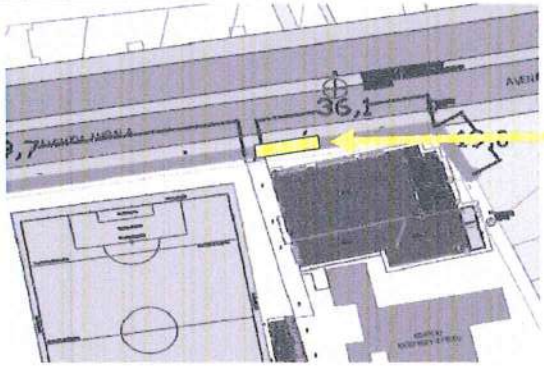




Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI E=0.05M PARA VIGA DE CIMENTACION		36,10	0,30	0,3	1,00	3,25
EXCAVACION MANUAL VIGA DE CIMENTACION		36,10	0,30	0,3	1,00	3,25
EXCAVACION MANUAL VIGA DE CIMENTACION		19,00	0,30	0,3	1,00	1,71
						8,21
ACTA N°2						
VIGA PORTON VIA PRINCIPAL		2,70	0,30	0,30	1,00	0,24
Subtotal						0,24
TOTAL						0,24

Jesgue Tamir Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"												
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL									
PROCESO	2656		CÓDIGO										
FECHA EMISION	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1			
FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ				
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"												
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS								CONTRATO N°		2655		
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025								CONTRATO N°		2656 - 2025		
CAPÍTULO	CERRAMIENTO		DESCRIPCION	DADO CONCRETO					ITEM	10.10	UNIDAD	m3	

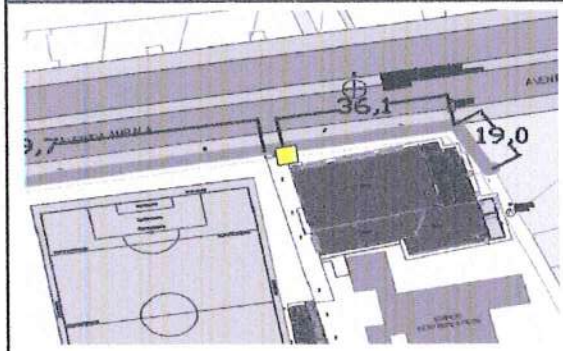



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
DADO CONCRETO		0,40	0,40	0,5	48	3,68
						3,68
ACTA N°2						
DADO EN VIGA PORTON VIA PRINCIPAL		0,40	0,40	0,50	1,00	0,08
Subtotal						0,08
TOTAL						0,08

Jesué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		


DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal).	ITEM	10.11;1,08	UNIDAD	m2



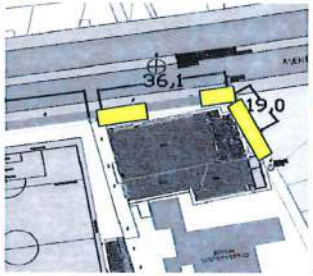



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
LADRILLO REJILLA 0,12m.		104.00		0.5		52.00
						52.00
ACTA N°2						
LADRILLO REJILLA ESQUIN PORTON PAE		36.10		0.9		32.49
LADRILLO REJILLA VECINDAD		19.00		3.00		57.00
LADRILLO REJILLA EN VIGA PORTON VIA PRINCIPAL		2.40		0.5		1.20
Subtotal						90.69
TOTAL						90.69

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800113359-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025


CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	ACERO FIGURADO 37000 PSI	ITEM	10.15;1,06	UNIDAD	Kg












Localización	Dimensiones					TOTAL
	Numero	Peso	Longitud	Elemento	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
ACERO DE REFUERZO DE PILOTES No 4	#4	0.99	3.5	4	45.00	626.22
ACERO DE REFUERZO DE PILOTES No 3	#3	0.56	0.62	30	45.00	468.72
ACERO DE REFUERZO DE DADOS No 5	#5	1.55	0.9	12	46.00	771.03
ACERO DE REFUERZO DE VIGA DE CIMENTACION No 4	#4	0.99	134.80	6.00	13.5	884.34
ACERO DE REFUERZO DE VIGA DE CIMENTACION No 3	#3	0.56	1.10	899	1	553.58
ACERO DE REFUERZO DE COLUMNETA DE CONFINAMIENTO No 4	#4	0.99	1.00	4.00	39.00	155.06
ACERO DE REFUERZO DE COLUMNETA DE CONFINAMIENTO No 3	#3	0.56	1.10	5.00	39.00	120.12
						3,579.08
ACTA N°2						
ACERO DE REFUERZO DE COLUMNETA ESQUINA VECINDAD	#4	0.99	1.00	4.00	2.00	7.95
ACERO DE REFUERZO DE COLUMNETA ESQUINA VECINDAD FLEJES	#3	0.56	1.10	9.00	2.00	11.09
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS PORTON PAE	#4	0.99	4.50	6.00	2.00	53.68
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS PORTON PAE FLEJES	#3	0.56	1.10	40.00	2.00	49.28
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS VECINDAD	#5	1.55	3.50	6.00	9.00	292.95
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS VECINDAD	#5	1.55	1.10	30.00	9.00	460.35
ACERO PARA DADO PORTON VIA PRINCIPAL	#5	1.55	0.90	12.00	1.00	16.76
ACERO VIGA DE CIMENTACION PORTON VIA PRINCIPAL	#4	0.99	2.70	6.00	1.00	16.10
ACERO VIGA DE CIMENTACION PORTON VIA PRINCIPAL FLEJES	#3	0.56	1.10	19.00	1.00	11.70
ACERO PILOTE PORTON VIA PRINCIPAL	#4	0.99	1.80	4.00	1.00	7.16
ACERO PILOTE PORTON VIA PRINCIPAL FLEJES	#3	0.56	0.071	18.00	1.00	0.71
ACERO COLUMNETA PORTON VIA PRINCIPAL	#4	0.99	1.00	4.00	1.00	3.98
ACERO COLUMNETA PORTON VIA PRINCIPAL	#3	0.56	1.10	5.00	1.00	3.08
Subtotal						934.79
TOTAL						934.79

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		


FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	ITEM	10.16 ;2,11	UNIDAD	m2

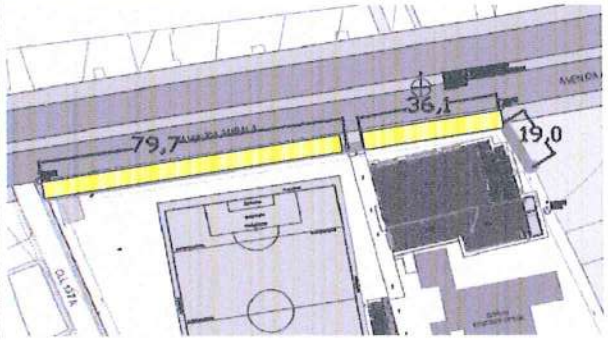









Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
CERRAMIENTO EN MALLA PARALELO VIA AMBALA		79,70		2,00		159,40
CERRAMIENTO EN MALLA PARALELO VIA AMBALA		36,10		2,00		72,20
CERRAMIENTO EN MALLA ESQUINA VECINDAD		2,36		2,00		4,72
CERRAMIENTO EN MALLA PORTON VIA PRINCIPAL		2,70		2,00		5,40
Subtotal						241,72
TOTAL						**241,72**

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CODIGO								
FECHA EMISION	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	Columnas de 0,3*0,3. 3500 PSI.	ITEM	1,05	UNIDAD	ml















Localización	Ejes	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°1						
COLUMNAS 0,30X0,30 CONCRETO PARA CERRAMIENTO VIA AMBALA		0,30	0,30	0,50	39	19,50
						19,50
ACTA N°2						
COLUMNETA ESQUINA VECINDAD		0,30	0,30	0,9	2,00	1,80
COLUMNAS PORTON PAE		0,30	0,30	4,00	2,00	8,00
COLUMNAS PARA MURO CERRAMIENTO VECINDAD		0,30	0,30	3,00	7,00	21,00
COLUMNA PORTON VIA PRINCIPAL		0,30	0,30	0,5	1,00	0,05
Subtotal						30,85
TOTAL						**30,85**

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800111389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ		

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	ALFAJIA DE CONCRETO 2500 PSI SECCION 0.30 X 0.075 M (SIN REFUERZO)	ITEM	N.P 3	UNIDAD	ML

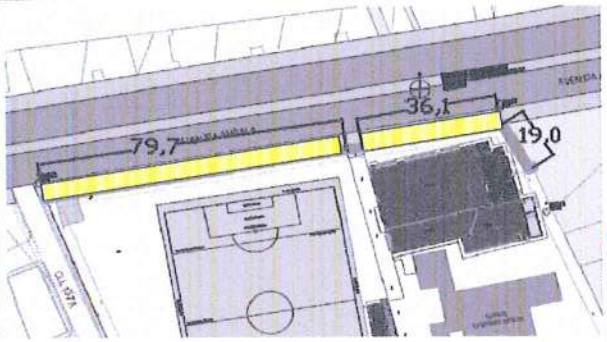









Localización	Dimensiones				CANT	TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto		
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ALFAJIA EN CERRAMIENTO PARALELO VIA AMBALA		79,70				79,70
ALFAJIA EN CERRAMIENTO PARALELO VIA AMBALA		36,10				36,10
ALFAJIA CERRAMIENTO ESQUINA VECINDAD		2,36				2,36
ALFAJIA CERRAMIENTO PORTON VIA PRINCIPAL		2,70				2,70
Subtotal						120,86
TOTAL						120,86

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7

"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025


CONTRATO N°				CONTRATO N°	2655
CONTRATO N°				CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	DESCRIPCION	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO)	ITEM	N.P 4	UNIDAD	M3









Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
COLUMNAS FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL		2.50	0.30	0.30	17	3.83
DEMOLICION DE VIGA CORONA FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL		19.74	0.30	0.30	2.00	1.78
DEMOLICION DE VIGA INFERIOR FRENTE A PORTERIA PRINCIPAL		19.74	0.30	0.30	2.00	1.78
					Subtotal	7.38
					TOTAL	7.38

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800113189-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
DIRECCION DE PROCESO	2656	FORMATO CODIGO	MEMORIA ACTA PARCIAL
FECHA EMISION	10/04/2026	VERSION 1	HOJA 1 DE 1

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	Accesos y circulaciones	DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	ITEM	11.01 ; 1.02	UNIDAD	m3

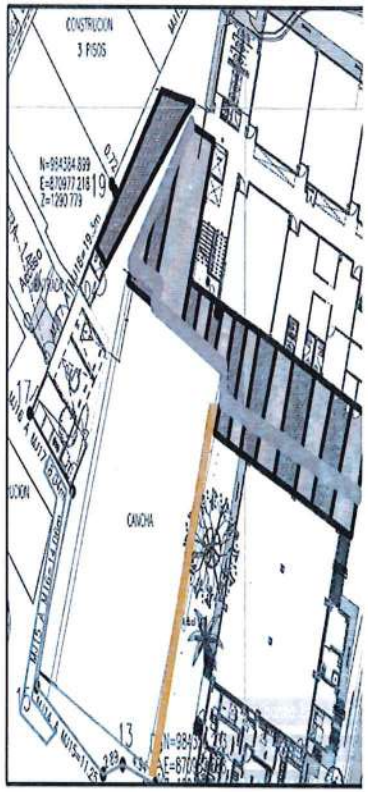



Localización	Dimensiones Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°1						
AREA 1 ESTAMPADO		8.16	2.40	0.42	3.00	24.68
AREA 1 CONCRETO		8.16	2.40	0.42	3.00	24.68
AREA 2 ESTAMPADO		2.05	6.33	0.42	1.00	5.45
AREA 2 CONCRETO		2.05	6.33	0.42	1.00	5.45
AREA 3 ESTAMPADO		3.58	2.48	0.42	1.00	4.15
AREA 3 CONCRETO		2.51	3.78	0.42	1.00	3.96
AREA 4 ESTAMPADO		2.51	3.70	0.42	1.00	3.90
AREA 5 CONCRETO		12.40	2.51	0.42	1.00	13.07
AREA 6 ESTAMPADO A		1.19	1.79	0.42	1.00	0.89
AREA 6 ESTAMPADO B		5.03	2.50	0.42	1.00	5.28
AREA 6 ESTAMPADO C		2.50	4.40	0.42	1.00	2.31
AREA 7 CONCRETO		2.74	5.02	0.42	1.00	2.89
AREA 8 CONCRETO		18.58	3.25	0.42	1.00	12.66
AREA 9 CONCRETO		3.20	1.26	0.42	1.00	0.85
BORDILLOS		54.40	0.20	0.28	68.00	3.05
CARCAMO		58.17	0.40	0.54	1.00	12.56
DESCUENTO POR CAJAS						
CAJAS EN ESTAMPADO 70*70		0.70	0.70	0.42	-4.00	-1.05
CAJAS EN ESTAMPADO 45*45		0.45	0.45	0.42	-2.00	-0.18
CAJAS EN ESTAMPADO 0.32*0.32		0.32	0.32	0.42	-1.00	-0.04
CAJAS EN CONCRETO 0.32*0.32		0.32	0.32	0.42	-1.00	-0.04
CAJAS EN CONCRETO 1.2*0.8		1.20	0.80	0.42	-2.00	-0.87
CAJAS EN CONCRETO 0.4*0.87		0.40	0.87	0.42	-1.00	-0.15
		Subtotal				123.50
ACTA N°2						
EXCAVACION CARCAMO PARALELO A CANCHA		25.19	0.50	0.4	1.00	5.04
AREA 1 ESTAMPADO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		8.16	2.40	0.2	3.00	11.75
AREA 1 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		8.16	2.40	0.2	3.00	11.75
AREA 2 ESTAMPADO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.05	6.33	0.2	1.00	2.60
AREA 2 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.05	6.33	0.2	1.00	2.60
AREA 3 ESTAMPADO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		3.58	2.48	0.2	1.00	1.97
AREA 3 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.51	3.78	0.2	1.00	1.89
AREA 4 ESTAMPADO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.51	3.70	0.2	1.00	1.86
AREA 5 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		12.40	2.51	0.2	1.00	6.22
AREA 6 ESTAMPADO A SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		1.19	1.79	0.2	1.00	0.43
AREA 6 ESTAMPADO B SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		5.03	2.50	0.2	1.00	2.52
AREA 6 ESTAMPADO C SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.50	4.40	0.2	1.00	1.10
AREA 7 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.74	5.02	0.2	1.00	1.38
AREA 8 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		18.58	3.25	0.2	1.00	6.03
AREA 9 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		3.20	1.26	0.2	1.00	0.40
		Subtotal				57.52
		TOTAL				57.52

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656	CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	


FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	Accesos y circulaciones	DESCRIPCION	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	ITEM	11.02	UNIDAD	m3/comp





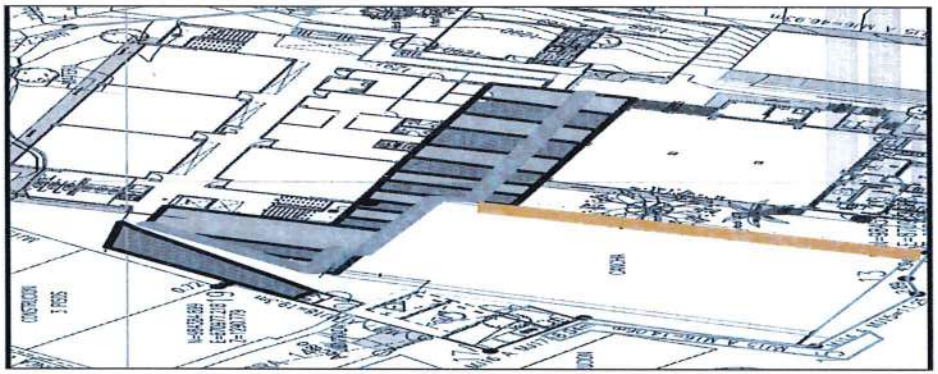



Localización	Ejes	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	CANT.	TOTAL
ACTA N°2						
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
RETIRO EN CARCAMO PARALELO A CANCHA		25.19	0.50	0.4		5.04
RETIRO DE CIMIENTO PARALELO A LA CANCHA		17.44	0.40	0.7		4.88
AREA 1 ESTAMPADO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		8.16	2.40	0.2	3.00	11.75
AREA 1 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		8.16	2.40	0.2	3.00	11.75
AREA 2 ESTAMPADO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.05	6.33	0.2	1.00	2.60
AREA 2 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.05	6.33	0.2	1.00	2.60
AREA 3 ESTAMPADO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		3.98	2.48	0.2	1.00	1.97
AREA 3 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.51	3.76	0.2	1.00	1.89
AREA 4 ESTAMPADO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.51	3.70	0.2	1.00	1.86
AREA 5 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		12.40	2.51	0.2	1.00	6.22
AREA 6 ESTAMPADO A SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		1.19	1.79	0.2	1.00	0.43
AREA 6 ESTAMPADO B SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		5.03	2.50	0.2	1.00	2.52
AREA 6 ESTAMPADO C SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.50	4.40	0.2	1.00	1.10
AREA 7 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		2.74	5.02	0.2	1.00	1.38
AREA 8 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		18.58	3.25	0.2	1.00	6.03
AREA 9 CONCRETO SOBREXCAVACIÓN POR FALLOS EN SUBRASANTE		3.20	1.26	0.2	1.00	0.40
Subtotal						62.41
DESCUENTO EXPANSIÓN ACTA 1						-39.28
TOTAL						23.13

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113189-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"										
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	
FECHA	DD 10	MM 4	AA 2026	CORTE N°	2	ELABORÓ					
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"										
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS						CONTRATO N°		2655		
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025						CONTRATO N°		2656 - 2025		
CAPÍTULO	Accesos y circulaciones	DESCRIPCION	ACERO FIGURADO 60000 PSI				ITEM	11.11;1,06	UNIDAD	Kg	

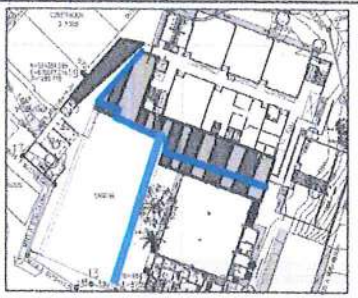

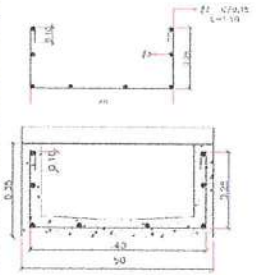



Localización	Dimensiones NUMERO	Longitud	TRASLAPO	KG/M	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER						
ACTA N°2						
ACERO CUNETA PARALELA CANCHA LONGITUDINAL	#3	25,19	2,52	0,56	8,00	124,14
ACERO CUNETA PARALELO CANCHA TRANSVERSAL	#3	1,10		0,56	169	104,00
ACERO CUNETA ANDEN LONGITUDINAL	#3	58,17	5,82	0,56	8,00	288,60
ACERO CUNETA ANDEN TRANSVERSAL	#3	1,1		0,56	389	239,50
Subtotal						754,36
TOTAL						754,36

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Acta

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"										
DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		


FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	Accesos y circulaciones	DESCRIPCION	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ITEM	2,01	UNIDAD	m2





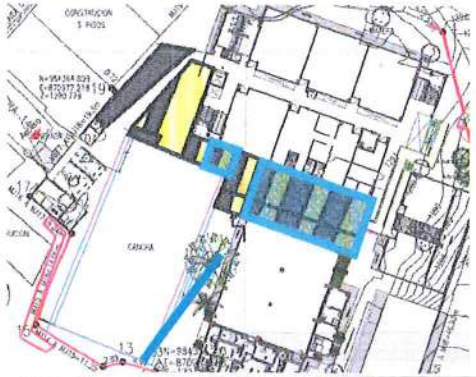

Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	AREA	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
AREA DE ANDENES Y CIRCULACION					359,17	359,17
Subtotal						359,17
TOTAL						359,17

Josue Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		


DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	Accesos y circulaciones	DESCRIPCION	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	ITEM	10.03	UNIDAD	m3



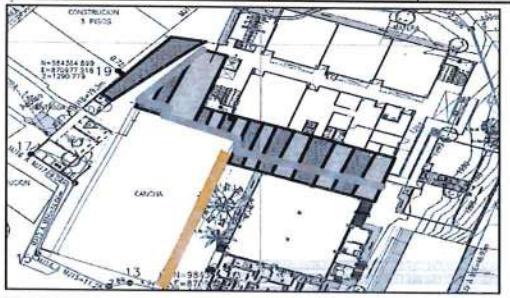

Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT.	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°1						
CARCAMO		18.56	1.30	0.2	1.00	4.83
CUNETA		18.56	0.70	0.2	1.00	2.60
SUB TOTAL						7.42
ACTA N°2						
DEMOLICION CIMIENTO PARALELO A LA CANCHA		19.50	0.50	0.5	1.00	4.88
Subtotal						4.88
TOTAL						4.88

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"											
DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656		CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	Accesos y circulaciones	DESCRIPCION	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ITEM	N.P.1	UNIDAD	ml

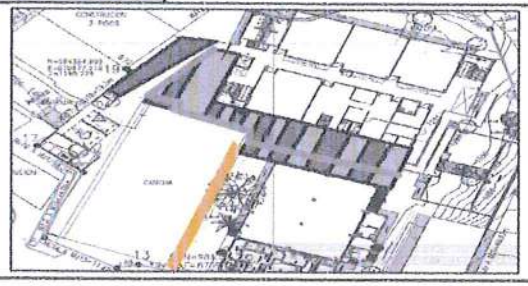



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT.	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°1						
CARCAMO		58,17				58,17
SUB TOTAL						58,17
ACTA N°2						
CARCAMO PARALELO A LA CANCHA		25,19	0,50	0,4	1,00	25,19
Subtotal						25,19
TOTAL						25,19

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL						
PROCESO	2656	CÓDIGO							
FECHA EMISIÓN	2/03/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1


FECHA	DD	2	MM	3	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	Cerramiento malla	DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	ITEM	14.01;1,02	UNIDAD	m3





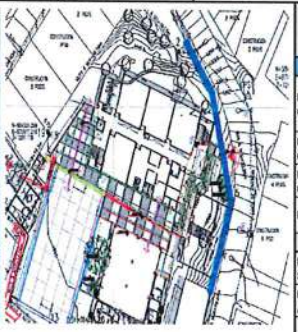

Localización	Ejes	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
ACTA No. 1						
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
EXCAVACION MANUAL CERRAMIENTO POSTERIOR CANCHA - VIGA CIMENTACION		60.16	0.30	0.35	1.00	6.32
EXCAVACION MANUAL CERRAMIENTO POSTERIOR CANCHA - PILOTES		1.80	0.071		17.00	2.16
EXCAVACION MANUAL CERRAMIENTO POSTERIOR CANCHA - PILOTES		3.00	0.071		3.00	0.64
EXCAVACION MANUAL DADO		0.40	0.40	0.55	20.00	1.76
ACTA No. 2						
EXCAVACIÓN ADICIONAL POR DEMOLICIÓN EN SECTOR MURO PERIMETRAL POSTERIOR		37.70	1.35	1	1.00	50.90
EXCAVACIÓN PERFILACIÓN MURO DE CONTENCIÓN ADICIONAL-PODERIOR CANCHA		7.00	1.20	2	2.00	33.60
Subtotal						84.50
TOTAL						84.50

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		


FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	Muro perimetral	DESCRIPCION	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	ITEM	15.01	UNIDAD	m3





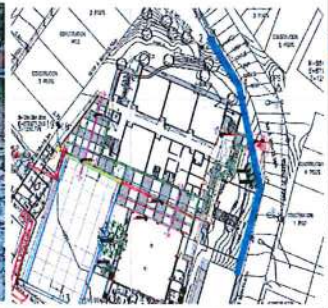

Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
EXCAVACION VIGA DE CIMENTACION PARA MURO PERIMETRAL		37.70	0.40	0.7	1.00	10.56
EXCAVACION DADOS PARA MURO PERIMETRAL		0.40	0.40	0.5	16.00	1.28
EXCAVACION PARA PILOTES		1.60	0.07		16.00	2.04
Subtotal						13.87
TOTAL						13.87

Josue Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	Cerramiento malla	DESCRIPCION	ALFAJIA DE CONCRETO 2500 PSI SECCIÓN 0.30 X 0.075 M (SIN REFUERZO)	ITEM	N.P.3	UNIDAD	ml

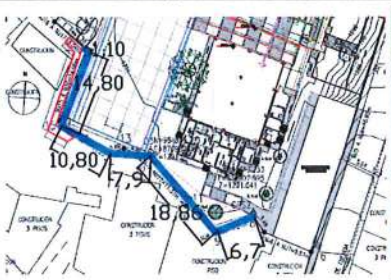







Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT.	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
ALFAJIA EN CONCRETO PARTE POSTERIOR		60.16				60.16
Subtotal						60.16
TOTAL						60.16

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389 7

"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL						
PROCESO	2656	CÓDIGO							
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	Cerramiento malla	DESCRIPCION	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	ITEM	14,02;11,02	UNIDAD	m3/comp













Localización	Cantidad	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	%EXP	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°1						
EXCAVACION MANUAL CERRAMIENTO POSTERIOR CANCHA - VIGA CIMENTACION		60.16	0.30	0.35	1.00	6.32
EXCAVACION MANUAL DADO		0.40	0.40	0.55	20.00	1.76
Subtotal						8.08
ACTA NO 2						
DESCUENTO POR EXPANSIÓN ACTA 1						-2.42
RETIRO MURO PERIMETRAL ACCESO PRINCIPAL		37.70	0.20	3.15	1.00	23.75
RETIRO DE EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION PARA MURO PERIMETRAL		37.70	0.40	0.5	1.00	7.54
RETIRO DE EXCAVACION DADOS PARA MURO PERIMETRAL		0.40	0.40	0.5	16.00	1.28
CARGUE DE EXCAVACION MURO DE CONTENCION		5.00	0.40	1	1.00	2.00
EXCAVACIÓN ADICIONAL POR DEMOLICIÓN EN SECTOR MURO PERIMETRAL POSTERIOR		37.70	1.35	1	1.00	50.90
EXCAVACIÓN PERFILACIÓN MURO DE CONTENCIÓN ADICIONAL-PODERIOR CANCHA		7.00	1.20	2	2.00	33.60
TOTAL						116.64

Jósué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7

"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	Cerramiento malla	DESCRIPCION	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	ITEM	14.09;2,11	UNIDAD	m2







Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA POSTERIOR CANCHA		60,16		2	1,00	120,32
Subtotal						120,32
TOTAL						120,32

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025


MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"												
DIRECCIÓN DE PROCESO		2656		FORMATO CÓDIGO		MEMORIA ACTA PARCIAL							
FECHA EMISIÓN		10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		
FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ				

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025

CONTRATO N°	2655						
CONTRATO N°	2656 - 2025						
CAPÍTULO	Cerramiento malla	DESCRIPCION	Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal).	ITEM	1,08	UNIDAD	m2



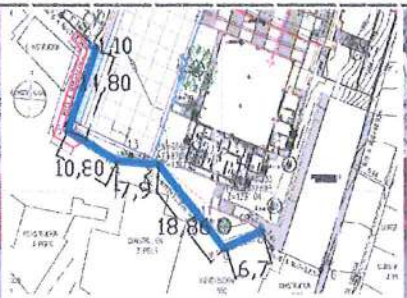



Localización	Dimensiones Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
CERRAMENTO EN MURO A LA VISTA POSTERIOR CANCHA		53,56	0,12	0,5	1,00	26,78
Subtotal						26,78
TOTAL						26,78

Josué Yamil Sánchez Charos
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL
PROCESO	2656	CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1


HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	Muro perimetral	DESCRIPCION	ACERO FIGURADO 60000 PSI	ITEM	15.10;1,06	UNIDAD	Kg







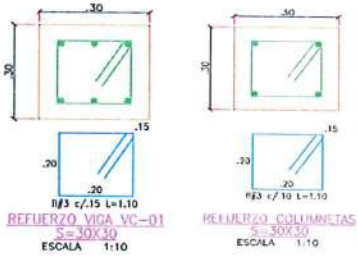





Localización	Dimensiones					TOTAL
	Numero	Peso	Longitud	TRASLAPO	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
ACERO VIGA DE CIMENTACION MURO PERIMETRAL ACCESO	#5	1.55	37.70	3.77	6.00	386.17
ACERO FLEJES VIGA DE CIMENTACION MURO PERIMETRAL ACCESO	#4	0.99	1.10		252	275.90
ACERO DE REFUERZO DE PILOTES	#4	0.99	2.3	4	16.00	146.32
ACERO DE REFUERZO DE PILOTES FLEJES	#4	0.99	0.62	23	16.00	226.79
ACERO DE REFUERZO DE DADOS	#5	1.55	0.9	12	16.00	268.19
Subtotal						1,303.36
TOTAL						1,303.36

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	Muro contencion	DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	ITEM	17.01;1,02	UNIDAD	m3

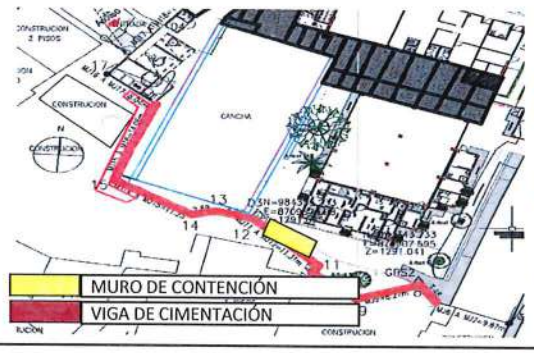



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
EXCAVACION MURO DE CONTENCION		5.00	0.40	1	1.00	2.00
Subtotal						2.00
TOTAL						2.00

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		


DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	Muro perimetral	DESCRIPCION	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	ITEM	14.04;1,09	UNIDAD	.m2



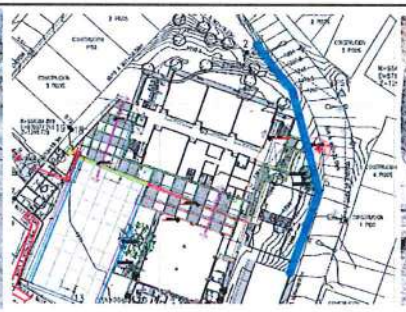



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
CONCRETO POBRE PARA VIGAS DE CIMENTACION MURO PERIMETRAL ACCESO		37.70	0.30		1.00	11.31
Subtotal						11.31
TOTAL						11.31

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVERADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		


DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	Muro perimetral	DESCRIPCION	Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ITEM	14.03;1,07	UNIDAD	ml



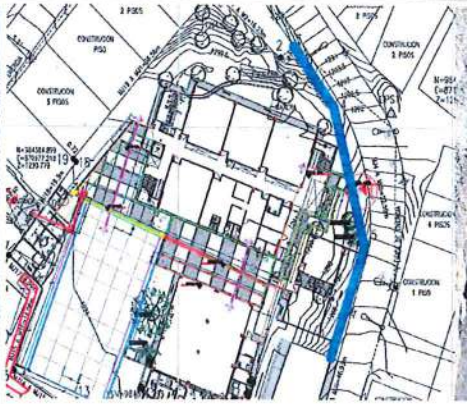



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
PILOTES EN MURO PERIMETRAL ACCESO PRINCIPAL		1.80	0.071		16.00	28.80
Subtotal						28.80
TOTAL						28.80

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS


Alcaldía Municipal Ibagué NIT.890113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE			FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL							
PROCESO	2656		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN	10/04/2026		VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1	


FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	Muro perimetral	DESCRIPCION	Dado concreto	ITEM	14.06;10,10	UNIDAD	m3

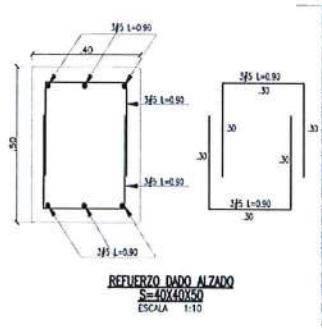



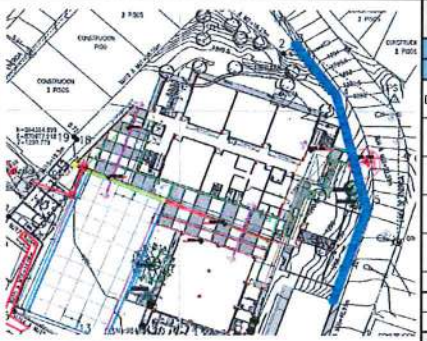

Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
DADOS EN MURO PERIMETRAL ACCESO PRINCIPAL		0.40	0.40	0.5	16.00	1.28
Subtotal						1.28
TOTAL						1.28

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		
DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL
PROCESO	2656	CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1


HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS				CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025				CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	Cerramiento malla	DESCRIPCION	Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal).	ITEM	1.08	UNIDAD	m2



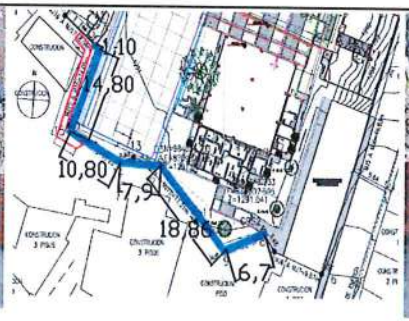



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
CERRAMIENTO EN MURO A LA VISTA POSTERIOR CANCHA		53.56	0.12	0.5	1.00	26.78
Subtotal						26.78
TOTAL						26.78

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		

DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL								
PROCESO	2656	CÓDIGO									
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1		

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°		2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°		2656 - 2025

CAPÍTULO	Muro perimetral	DESCRIPCION	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	ITEM	10.03	UNIDAD	m3







Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
CIMIENTO ENTERRADO VIGA MURO PERIMETRAL		37.70	0.40	0.6	1.00	9.05
Subtotal						9.05
TOTAL						9.05

Josue Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"		


DIRECCIÓN DE		FORMATO	MEMORIA ACTA PARCIAL						
PROCESO	2656	CÓDIGO							
FECHA EMISIÓN	10/04/2026	VERSIÓN	1	HOJA		1		DE	1

FECHA	DD	10	MM	4	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS			CONTRATO N°	2655
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025			CONTRATO N°	2656 - 2025

CAPÍTULO	Muro perimetral	DESCRIPCION	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	ITEM	14.05;1,03	UNIDAD	m3



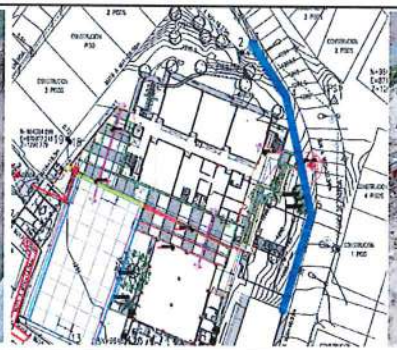



Localización	Dimensiones					TOTAL
	Ejes	Longitud	Ancho	Alto	CANT	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO						
ACTA N°2						
VIGA DE CIMENTACION MURO PERIMETRAL ACCESO PRINCIPAL		37.70	0.30	0.30	1.00	3.39
Subtotal						3.39
TOTAL						3.39

Josué Yamil Sánchez Claros
CONTRATISTA
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTEREDUCATIVAS

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO EDUCATIVO 2025 Identificado con NI 9019782944

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina QUIRINAL, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta de Ahorros

Número;	24148635056
Fecha de apertura:	25 de Agosto de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0517 QUIRINAL de la ciudad de NEIVA, el día Lunes, 06 de abril de 2026

Cordialmente,

Banco Caja Social

Vicepresidencia de Banca Masiva

RUT

"CONSORCIO EDUCATIVO 2025"

NIT

901978294-4

CONTRATO DE OBRA N°2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141198889735

(415)7707212489984(8020) 000014119888973 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 8 2 9 4	4	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO EDUCTIVO 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 8 37 A 26 LC 24 CC ZARAGOZA PLAZA

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
construcivilaliada@hotmail.com		3 1 6 5 3 5 2 2 0 3	6 0 8 8 7 3 7 7 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 5 0 5 2 7						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	5	5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ ARIAS NUBIA

985. Cargo Gestor IV

Fecha generación documento PDF: 19-08-2025 11:12:05AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141198889735

(415)7707212489984(8020) 000014119888973 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 8 2 9 4	4	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 5 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 5 2 7	
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141198889735

(415)7707212489984(8020) 000014119888973 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 8 2 9 4	4	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 5 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 6 9 8 8 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	CLAROS	JOSUE	YAMIL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 5 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 1 6 5 9 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARANGUREN	MENDEZ	MARIA	ZULEMA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141198889735

(415)7707212489984(8020) 000014119888973 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 8 2 9 4	4	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 2 4 9 4 8	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CIVIL ALIADA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
427,337,832	1 0	2 0 2 5 0 5 2 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 4 7 9 3 7	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,846,040,487	9 0	2 0 2 5 0 5 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL

"CONSORCIO EDUCATIVO 2025"

NIT

901978294-4

CONTRATO DE OBRA N°2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

Los suscritos JOSUÉ YAMIL SÁNCHEZ CLAROS identificada con la C.C. 7.698.841 de Neiva y CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ, identificado con la C.C. 12.138.562 de Neiva obrando como Representante legal y Contador Público del CONSORCIO EDUCATIVO 2025, identificada con NIT. 901.978.294-4; certificamos que el CONSORCIO se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los seis (06) días del mes de abril del año 2026, en la ciuda d de Neiva.

Atentamente

JOSUÉ YAMIL SÁNCHEZ CLAROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCATIVO 2025

CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ
C.C. 12.138.562 de Neiva
T.P. 61087 – T
CONTADOR

EMPRESAS
GRUPO ROMERO S.A.S.
Nit. 901.347.937-4

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ, identificado con C.C. 93.123.908, y con Tarjeta Profesional No. 65338-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S, identificada con Nit. 901.347.937-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a los seis (06) días del mes de abril de 2026

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

CARGO: REVISOR FISCAL

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure / Tel: (8) 685 6852
valenromero98@hotmail.com – obrasciviles1998@hotmail.com –
consultoriascolombianas@hotmail.com
Villavicencio - Meta

Constructura Aliada sas
NIT 901.124.948-8

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

Los suscritos MARÍA ZULEMA ARANGUREN MENDEZ identificada con la C.C. 55.165.964 de Neiva y CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ, identificado con la C.C. 12.138.562 de Neiva obrando como Representante legal y Contador Público del CONSTRUCTORA CIVIL ALIADA S.A.S. identificada con NIT. 901.124.948-8; certificamos que la EMPRESA se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma. Durante el periodo 11 de noviembre de 2025 al 02 de marzo de 2026.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los seis (06) días del mes de abril del año 2026, en la ciudad de Neiva.

Atentamente,

MARIA ZULEMA ARANGUREN MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA CIVIL ALIADA S.A.S

CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ
C.C. 12.138.562 de Neiva
T.P. 61081-T
CONTADOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5759B8830B81F009

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12138562 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 61081-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 12.138.562
CUERVO NARVAEZ
APELLIDOS
CARLOS MANUEL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-SEP-1969
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
01-OCT-1987 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1900100-00166187-M-0012138562-20090804
0014432178A 1
6670032381


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
61081-T
CARLOS MANUEL
CUERVO NARVAEZ
C.C. 12138562
RES. INSCRIPCION 107 DEL 27/08/1998
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
280706
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
68848

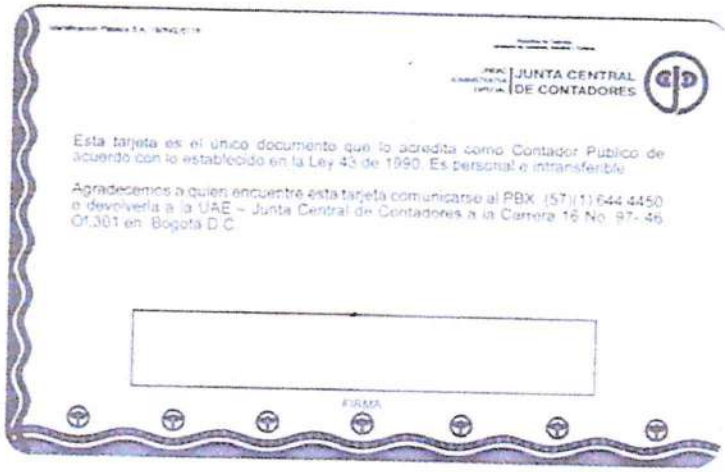
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

Z89E5CDC576A8C34

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93123908 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 65338-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.123.908
RAMIREZ RAMIREZ

APELLIDOS
CARLOS ADOLFO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1967
ESPINAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

26-SEP-1985 ESPINAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2904600-00058663-M-0093123908-20080824 0002582362A 1 6480012717



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

65338-T

CARLOS ADOLFO
RAMIREZ RAMIREZ
C.C. 93123908
RESOLUCION INSCRIPCION 43 FECHA 27/05/98
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

022100

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

93123908

CONSORCIO EDUCATIVO 2025	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CODIGO:	Alcaldía de IBAGUÉ
		VERSIÓN: 01	
	FORMATO: HOJA DE PRESENTACIÓN		
		IBAGUE - TOLIMA	

INFORME DE

ACTA PARCIAL N°02

"CONSORCIO EDUCATIVO 2025"

NIT

901978294-4

CONTRATO DE OBRA N°2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025

OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONTRATO DE OBRA NO. 2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025

"CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"



CONSORCIO EDUCATIVO 2025

INFORME PARCIAL DE OBRA #02

DEL 03 DE MARZO 2026 AL 10 DE ABRIL DE 2026

1. INTRODUCCION

Por medio de este informe se deja el reporte de los procesos, alcance y desarrollo de las actividades ejecutadas en el contrato de obra #2656 del 09 de octubre de 2025 que tiene como objeto **CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.** El anterior contrato está en ejecución por medio del CONSORCIO EDUCATIVO 2025. Los parámetros de ejecución técnica en temas de procesos constructivos desarrollados en la obra son los estipulados en el diseño geométrico entregado por el Municipio de Ibagué.

Con el presente proyecto se quiere ejecutar el Empréstito entre FINDETER y el Municipio de Ibagué, el cual se realizó por un préstamo de 105 mil millones de pesos dentro de los cuales se destinó 5000 para el sector educación, y que por priorización de la Administración Municipal, la Secretaría de Educación Municipal presentó varias necesidades en el sector educativo en 5 instituciones de las cuales fueron intervenidas con recursos del Gobierno Nacional mediante convenio interadministrativo No. 001291 de 2016 FFIE, es así que Las instituciones antes relacionadas y que hacen parte de las 26 instituciones que construye la Administración Municipal, en alianza con el Gobierno Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para la implementación de la Jornada Única.

Cabe resaltar que las mencionadas obras ya se encuentran terminadas en un 100%, quedando pendiente obras que no fueron contempladas dentro del presupuesto y que, por su alcance dentro de los recursos autorizados, no se pueden desarrollar obras denominadas como complementarias, entre ellas como servicios públicos, urbanismos, redes de aguas lluvias, cerramientos, demoliciones, podas.

Las instituciones educativas, en el marco de la jornada única, son importantes ya que estas, satisfacen las necesidades actuales, y por ende a la comunidad educativa en general, ya que esto permite que se brinde una educación de calidad que beneficiará a más de 4.697 estudiantes de las diferentes comunas de la ciudad de Ibagué. Es importante resaltar que, estas obras complementarias, buscan mitigar los impactos, que genera la ausencia de ellas en la comunidad educativa, generándose la necesidad en los componentes y/o infraestructura de URBANISMO; CERRAMIENTO; Y PAISAJISMO.

En conclusión, el presente proyecto busca la intervención de las instituciones **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CIUDAD LUZ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN PARDO SEDE JORGE QUEVEDO**, a fin de ser entregadas al 100% para su funcionamiento a la comunidad estudiantil para prestar un servicio eficiente que satisfaga las necesidades de los mismos, cumpliendo con los estándares y/o reglamentaciones del sector educativo.

INFORMACION DEL CONTRATO

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las obras complementarias, buscan mitigar los impactos, que genera la ausencia de componentes de infraestructura complementaria idóneos, que permita de manera integral coadyuvar en el buen desempeño de la Infraestructura nueva y existente y que garantice bienestar en la comunidad educativa, generándose la necesidad de intervención, especialmente en los componentes y/o infraestructura de URBANISMO; CERRAMIENTO; Y PAISAJISMO

Las instituciones educativas, en el marco de la jornada única, son importantes ya que estas, satisfacen las necesidades actuales, y por ende a la comunidad educativa en general, ya que esto permite que se brinde una educación de calidad que beneficiará a estudiantes de las diferentes comunas de la ciudad de Ibagué.

1.2 RELACIÓN DE POLIZA

La póliza del contrato de obra se encuentra debidamente constituida y vigente, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable para la contratación estatal, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la correcta ejecución de la obra y la protección de los recursos públicos frente a eventuales riesgos derivados del contrato.

TIPO DE POLIZA: Póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales (Decreto 1082 de 2015).

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Para el presente contrato, la póliza se encuentra expedida por ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A, identificada con NIT 860.002.534-0.

Aseguradora	No. Póliza	Tipo de póliza	Vigencia		Monto Asegurado
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S. A	LBCO-225948062-1	Responsabilidad civil extracontractual	9/10/2025	11/05/2026	$ 711.750.000,00
	SGPL-225945128-1	Cumplimiento del contrato	9/10/2025	11/09/2026	$ 427.337.831,90
	SGPL-225945128-1	Pagos de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/11/2025	11/05/2029	$ 213.668.915,95
	SGPL-225945128-1	Estabilidad y calidad de las obras	11/11/2025	11/05/2031	$ 1.282.013.495,70

1.3 PROCESO CONSTRUCTIVO

El proyecto tiene como alcance principal infraestructura de URBANISMO; CERRAMIENTO; Y PAISAJISMO en cuatro (4) instituciones educativas del municipio de Ibagué; **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CIUDAD LUZ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN PARDO SEDE JORGE QUEVEDO**. Las obras complementarias en las instituciones educativas son sinónimo de educación de calidad y beneficio a estudiantes de las diferentes comunas de la ciudad de Ibagué. El proyecto tiene una duración inicial de ciento ochenta (180) días contados a partir del día 11 de noviembre del año 2025, las actividades requeridas para la ejecución de la obra serán desarrolladas por personal capacitado e idóneo para desempeñarlas.

Para la construcción de estas obras complementarias en las instituciones se divide en Hitos o Eventos que se presentan a nivel general en cualquier construcción, aunque pueden variar en su cantidad, de acuerdo con el grado de complejidad del proyecto, o según el tipo de edificio, componente o situación en la que se encuentre;

- Preparación del Terreno derivado del Replanteo Topográfico.
- Señalización de Áreas a Intervenir, conforme el PMT y PMA.
- Movimiento de Tierras, Adecuación, Preliminares y Campamento, Cerramientos.
- Cimentación y Contención de Tierras.
- Estructuras y Componentes Complementarios.
- Conexión Instalaciones Anteriores y Urbanismo.
- Acabados
- Recolección de Escombros y Desechos para Cierre.
- Entrega de Espacios, Puesta en marcha y/o Revisión de Funcionalidad.

2.3 AREA A SER INTERVENIDA.

UBICACIÓN	INSTITUCIÓN
Municipio de Ibagué - Tolima	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CIUDAD LUZ
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN PARDO SEDE JORGE QUEVEDO

2.4 LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto está ubicado en el Departamento del Tolima específicamente en el municipio de Ibagué y se localiza en el área urbana:


- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CIUDAD LUZ,** localizada en la comuna N°9 barrio Ciudad Luz.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS,** localizada en la comuna N°8 barrio Ciudadela Simón Bolívar.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER,** localizada en la comuna N°7 barrio El Salado.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN PARDO SEDE JORGE QUEVEDO,** localizada en la comuna N°2 barrio 20 de Julio.
-

INSTITUCIÓN CIUDAD LUZ




Fuente Google Mapas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS

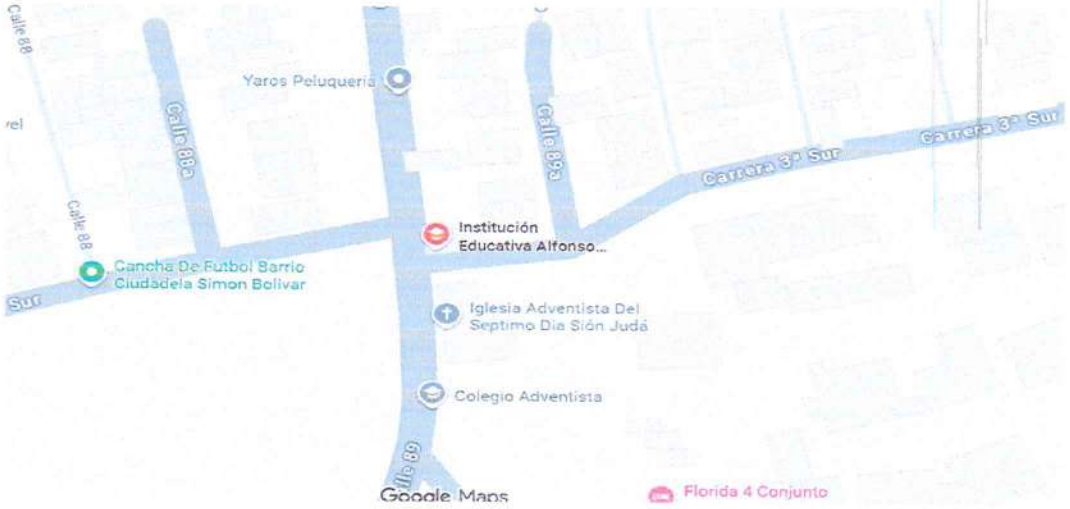


INSTITUCIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTADER

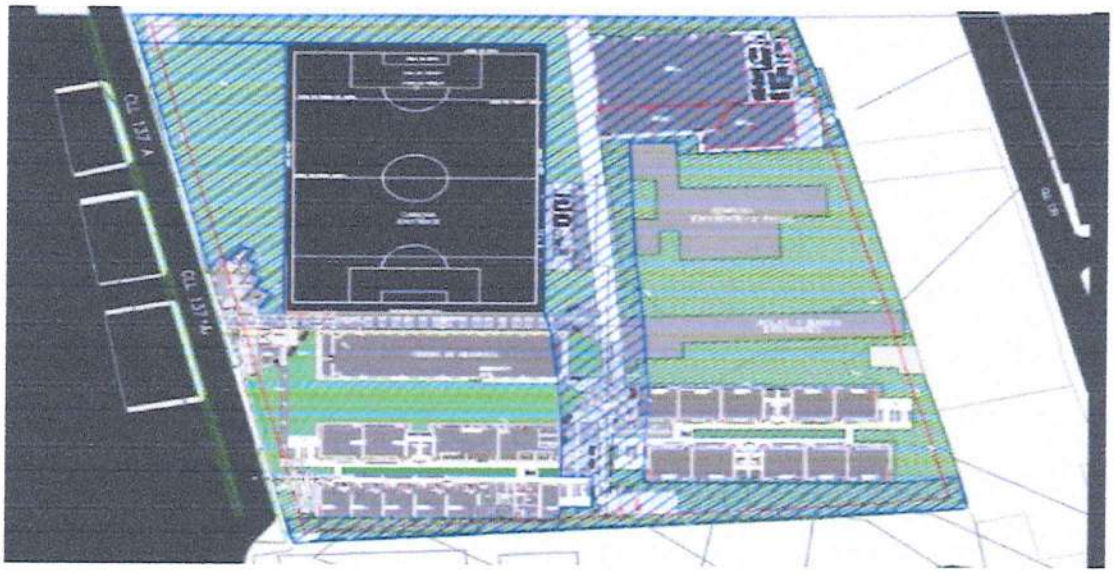

Fuente Google

INSTITUCIÓN GERMAN PARDO

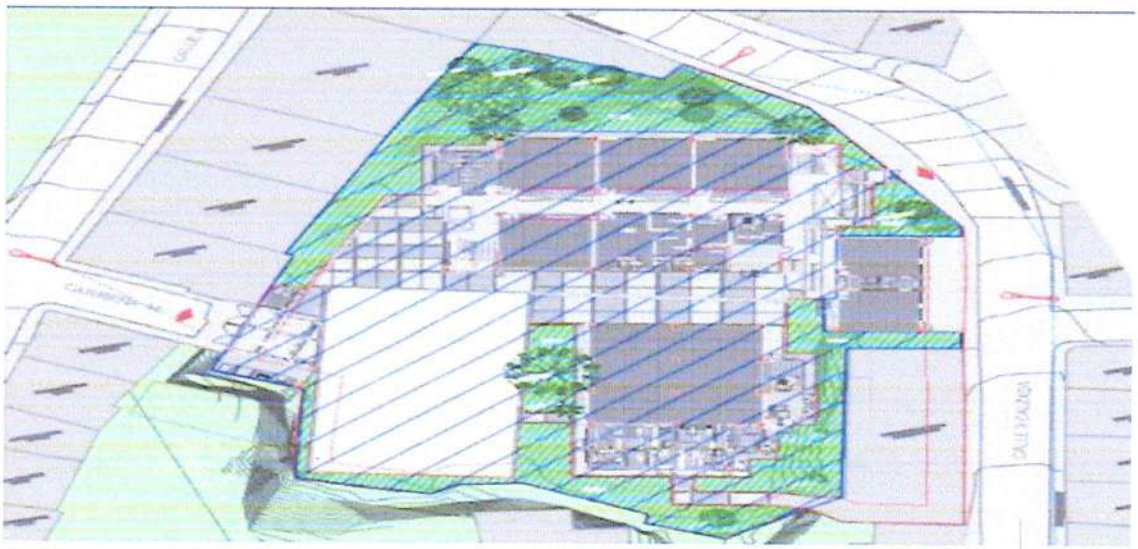

Fuente Google

2.5 SUPERVISORES.

CARGO	NOMBRE
Supervisor de Contrato de Obra	Ing. LEONEL ALFREDO NIETO ASESOR DE DESPACHO

CARGO	NOMBRE
Supervisor de Interventoría	Ing. MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN Director de Interventoría

2. CONTRATO DE OBRA.

2.1 CONTRO DE OBRA No 2656

CONTRATO OBRA No	#2656 del 09 de octubre de 2025
OBJETO	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025 NIT: 901978294-4. Rep. Legal: Ing. Josué Yamil Sánchez Claros.
VALOR INICIAL	Cuatro mil doscientos setenta y tres millones trescientos setenta y ocho mil trescientos diecinueve pesos M/cte ($4.273.378.319,00)
FECHA DE INICIO	Noviembre 11 de 2025
PLAZO INICIAL	180 días a partil del Acta de Legalización.
VALOR TOTAL	Cuatro mil doscientos setenta y tres millones trescientos setenta y ocho mil trescientos diecinueve pesos M/cte ($4.273.378.319,00)
FECHA PRESENTE INFORME	10 de abril de 2026
DIAS TRANSCURRIDOS A LA FECHA	150 días calendario transcurridos de ejecución

3. CONDICIONES FINANCIERAS.

Estas condiciones corresponden al trabajo y actividades desarrollada en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN PARDO SEDE JORGE QUEVEDO, INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ Y INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIOS RUDAS.

3.1 DESCRIPCION RESUMIDA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

De acuerdo a las actividades programadas el contratista desarrollo las siguientes actividades

OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	m2
EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m2
PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO ESPESOR 12 CM, INCLUYE SELLO ACRÍLICO	m2
ANDEN EN CONCRETO E:12 CM 3000 PSI	m2
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg
CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 40 X40, GRAVA COMUN INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml
CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI ANCHO 60 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml
EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp
Suministro e instalación de lecho en arena para tubería	m3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO/CORRUGADA DE 8"	ml
CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	und
RED SANITARIA PVC-S 4"	ml
ACERO FIGURADO 37000 PSI	Kg
DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3
ESCALERA MACIZA UN TRAMO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	m3
CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	MI

MUROS DE CONTENCIÓN

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3
EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	m2

ACERO FIGURADO 37000 PSI	Kg
MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI , H=2,0 M (SIN REFUERZO)	m3
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2

CERRAMIENTO

DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	und
DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2
DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3/comp
PILOTE PRE EXCAVADO D=30CM INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ml
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	m2
VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	m3
DADO CONCRETO	m3
Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal).	m2
PINTURA TIPO EXTERIOR PARA MUROS CERRAMIENTO EXISTENTE	m2
ALFAJIA DE CONCRETO 2500 PSI SECCION 0.30 X 0.075 M (SIN REFUERZO)	ML
DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO)	M3
ACERO FIGURADO 37000 PSI	Kg
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	m2
FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VEHICULAR (ENTRE 4 Y 4,8 M DE ANCHO) X 2,5 M DE ALTURA	und
FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2.00MX2.50M	und
Columnas de 0,3*0,3. 3500 PSI.	ml

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN PARDO SEDE JORGE QUEVEDO

Accesos y circulaciones

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp
PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO ESPESOR 12 CM, INCLUYE SELLO ACRÍLICO	m2
ANDEN EN CONCRETO E:12 CM 3000 PSI	m2
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg
CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 40 X40, GRAVA COMUN INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml
EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp
DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2
DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	m2
BASE EN CONCRETO POBRE	M2
CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ML

CERRAMIENTO EN MALLA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp
Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ml
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	m2
VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	m3
Dado concreto	m3
MURO EN CONCRETO A LA VISTA	m3
ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg
Columnas de 0,3*0,3. 3500 PSI.	ml
DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	und
Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal).	M2
ALFAJIA DE CONCRETO 2500 PSI SECCIÓN 0.30 X 0.075 M (SIN REFUERZO)	ML
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	M2

MURO DE CONTENCION

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI, H=2,0 M (SIN REFUERZO)	m3	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3	
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	M3/COMP	
ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	

MURO PERIMETRAL

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m3
CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	m3/comp
ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg
VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	m3
DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3
Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal).	m2
Dado concreto	m3
Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ml
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	m2

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ

CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)

VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3500 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M	ml
ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg
Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ml
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3
DADO CONCRETO	m3
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	m2

TERRACEO CON MATERIAL DE SITIO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	m2

Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	Ml
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3

ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS

CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI ANCHO 60 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3
CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	m3/comp
ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIOS RUDAS

RED PLUVIAL

CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	M3/COMP
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3
Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	ML
DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	M2
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3
CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO/CORRUGADA DE 8"	ML

ANDENES URBANISMO

LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2

3.2 AVANCE DEL PROYECTO

Al presente informe con fecha hasta el 10 de abril, se contemplan la ejecución de actividades correspondientes a etapas posteriores del cronograma, asociadas a los capítulos de accesos y circulaciones, andenes, rampas, escaleras, muros de contención, cerramiento, cerramientos en ladrillo y red pluvial.

3.3 AVANCE FISICO EJECUTADO ACOMULADO

Conforme a la programación presentada por el contratista, el avance físico ejecutado acumulado alcanza el 34,40%, las cuales se desarrollaron las actividades según previstas en el cronograma establecido, dejando constancia que se encuentran actividad no cuantificadas dada a su no culminación de proceso constructivo a la fecha del corte de la presente acta parcial.

3.4 ANALISIS COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO Y REAL

A la fecha de corte, el avance físico ejecutado del proyecto alcanza un 34,40%, frente a un avance programado del 76,22% conforme al cronograma contractual, lo que representa una desviación del 41,82%.

Dicha variación se explica principalmente por los criterios de medición adoptados para el control del avance de obra. En la actualidad, se cuenta con materiales de carácter representativo debidamente acopiados en sitio, así como con la ejecución de actividades contractuales tales como la fabricación de puertas, portones y cubiertas, las cuales se desarrollan en patio taller debido a la imposibilidad técnica de su ejecución directa en obra. Sin embargo, estas actividades no son objeto de cuantificación hasta tanto no se encuentren completamente instaladas y ejecutadas en sitio, conforme a las especificaciones técnicas y a los ítems contractuales. En caso de considerarse dichas actividades en proceso, el porcentaje de avance físico sería superior.

Adicionalmente, se presentan actividades con niveles de ejecución estimados entre el 50% y el 70% que, de acuerdo con los lineamientos de medición establecidos, no son susceptibles de contabilización parcial. De igual forma, existen actividades ya culminadas que no fueron cuantificadas oportunamente, debido a que, al momento de efectuar las mediciones, no se encontraban completamente finalizadas. En consecuencia, estos avances serán reflejados en el porcentaje de ejecución únicamente una vez las actividades sean terminadas y recibidas a satisfacción.

Así mismo, se han ejecutado actividades no previstas contractualmente, las cuales no son objeto de cuantificación dentro del avance físico, pese a ser necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.

En este sentido, la diferencia entre el avance programado y el ejecutado obedece a un desfase en los procesos de medición y cuantificación contractual, y no a una insuficiencia en la ejecución física de las obras, evidenciándose que los frentes de trabajo se mantienen activos, con desarrollo continuo y con la incorporación progresiva de mano de obra calificada.



3.5 ACTIVIDADES Y/O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

El contratista se compromete a cumplir con el objetivo del contrato y materializar las obras establecidas en el mismo, también se compromete con dar cumplimiento a los requerimientos por parte de la interventoría y a cumplir con todas las normas técnicas y constructivas, para el buen desarrollo de la obra.

4. RESUMEN PARCIAL

Durante el periodo consolidado se efectuó la transición integral desde la etapa administrativa y de aprestamiento hacia una ejecución constructiva activa, incluyendo:

- Formalización contractual mediante Acta de Inicio.
- Revisión, depuración y validación de documentación técnica.
- Vinculación de personal operativo y profesional cumpliendo normativa laboral.
- Implementación de planes SST y señalización preventiva.
- Socialización permanente con comunidades educativas.
- Control topográfico continuo para verificación de niveles y alineamientos.
- Implementación logística para manejo y almacenamiento de materiales.

Las actividades se ejecutaron garantizando la coexistencia segura entre la obra y el funcionamiento normal de las instituciones educativas

En el marco de la ejecución del proyecto en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, se desarrollaron diversas actividades constructivas correspondientes a obras de adecuación, mejoramiento y construcción de infraestructura.

Inicialmente, se ejecutaron labores de excavación para la conformación de las rampas y muros de acceso:

- Rampa de acceso portería
- Rampa de acceso preescolar
- Rampa de acceso interna

Estas actividades se realizaron conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando las condiciones necesarias para la correcta cimentación. De manera complementaria, se llevó a cabo la instalación de concreto de solado como capa de limpieza y regularización de la subrasante.

Posteriormente, se desarrollaron trabajos de figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para las rampas y muros de acceso, cumpliendo con los diseños estructurales establecidos. Una vez verificado el correcto armado, se procedió con la fundición de los elementos estructurales, asegurando la adecuada colocación, vibrado y curado del concreto.

En paralelo, se ejecutaron actividades relacionadas con la conformación de andenes ubicados de manera paralela al bloque de aseo de la institución. Dichos andenes fueron construidos mediante una estructura compuesta por una capa de 20 cm de material tipo recebo debidamente compactado, sobre la cual se dispuso una losa de 12 cm de

concreto reforzado con malla electrosoldada de 6 mm, garantizando su resistencia y durabilidad.

Adicionalmente, se llevaron a cabo excavaciones para la construcción de andenes de protección en los bloques existentes, los cuales no presenta una estructura para su conformación, seguidas de la fundición de placas de concreto de 12 cm de espesor, igualmente reforzadas con malla electrosoldada 6mm, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

De igual forma, se ejecutaron actividades de fundición de alfajías con su debido acero estructural en el tramo paralelo a la vía Ambala correspondiente al cerramiento, contribuyendo a la adecuada delimitación y acabado del área intervenida.

En cuanto a los cerramientos perimetrales, se desarrolló la instalación de acero de refuerzo y fundición de columnas, vigas, pilotes y dados para los muros colindantes con predios vecinos. Posteriormente, se realizó la instalación de mampostería en ladrillo a la vista, garantizando la separación física y estética entre la institución educativa y los predios colindantes.

Se desarrollaron actividades de demolición de muros perimetral existente, así mismo se realizó la demolición de vigas y columnas estructurales existentes en muro perimetral. Finalmente, se avanzó en la conformación del área de parqueadero, donde se ejecutó la instalación de geotextil, subbase y recebo debidamente extendido y compactado. Asimismo, se realizó la instalación de bordillos perimetrales que delimitan el área destinada al estacionamiento. Como actividad previa, se efectuó la demolición de 19,50 metros lineales de gradería existente, con el fin de adecuar el espacio conforme a los diseños establecidos para el parqueadero.

En cuanto a actividades complementarias, se realizaron labores permanentes de cargue, retiro y disposición final de material sobrante y escombros. Se efectuó recepción y almacenamiento de materiales como acero de refuerzo, cemento, grava, arena, rejillas y tapas para cárcamos, verificando especificaciones técnicas.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se implementaron señalización, cerramientos provisionales con lona verde, delimitación con cinta de peligro y vallas informativas, garantizando control de accesos y mitigación de riesgos para la comunidad educativa y personal de obra.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN PARDO**

En el marco de la ejecución del proyecto en la Institución Educativa German Pardo durante el presente período se desarrollaron diversas actividades constructivas, las cuales quedaron debidamente registradas en las correspondientes actas de obra.

Inicialmente, se ejecutaron actividades relacionadas con la construcción del cerramiento perimetral, específicamente mediante la instalación de mampostería en ladrillo a la vista como soporte para la malla eslabonada. De manera complementaria, se llevó a cabo el armado, instalación de acero de refuerzo y fundición de la alfajía, garantizando la rigidez y estabilidad del sistema de cerramiento.

Posteriormente, se realizó la instalación de malla eslabonada calibre 10, la cual fue debidamente templada y fijada, permitiendo la culminación del cerramiento en la parte posterior de la institución, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De forma paralela, se ejecutó la demolición de un muro existente ubicado en el costado lateral de la cancha, actividad necesaria para la adecuación del área intervenida. Seguido a esto, se desarrollaron trabajos de excavación para la construcción de un cárcamo paralelo a la cancha existente, incluyendo el figurado, instalación de acero de refuerzo y posterior fundición en concreto, cumpliendo con los lineamientos estructurales definidos en diseño.

En lo correspondiente al acceso principal, se realizó la demolición del cerramiento existente en mampostería, con el fin de dar paso a la nueva estructura proyectada. Posteriormente, se ejecutaron actividades de excavación para la viga de cimentación, dados y pilotes, garantizando las condiciones adecuadas del terreno para la cimentación.

Previo a la instalación del acero, se llevó a cabo la ejecución de concreto de limpieza (solado), con el propósito de proporcionar una superficie uniforme y evitar la contaminación del acero de refuerzo. Acto seguido, se desarrolló el figurado, armado e instalación del acero estructural correspondiente a dados, vigas de cimentación y pilotes.

Una vez verificados los procesos anteriores, se procedió con la fundición en concreto de los elementos de cimentación, incluyendo vigas, dados y pilotes, asegurando el adecuado vibrado y curado del material.

Adicionalmente, se ejecutó la instalación de acero de refuerzo para columnas, así como la construcción de muros en mampostería a la vista en el cerramiento del acceso principal, conforme a los diseños arquitectónicos y estructurales establecidos.

Como actividades complementarias, se efectuaron labores de cargue, retiro y disposición final de material producto de excavaciones y demoliciones. En SST, se implementaron medidas de señalización, delimitación y cerramiento provisional, garantizando condiciones seguras para la comunidad educativa.

Finalmente, se adelantaron actividades de localización y replanteo para la rampa de acceso principal, seguidas de la correspondiente excavación, garantizando la correcta implantación de este elemento dentro del proyecto.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LUZ**

Durante el período correspondiente a la presente etapa parcial del proyecto ejecutado en la Institución Educativa Ciudad Luz, se desarrollaron actividades preliminares y estructurales orientadas a la construcción del cerramiento en la parte posterior del predio, conforme a los lineamientos técnicos y diseños establecidos.

Inicialmente, se llevaron a cabo labores de localización y replanteo general del cerramiento posterior, garantizando la correcta implantación de los ejes y niveles del proyecto en función de las condiciones topográficas existentes.

Posteriormente, se ejecutaron actividades de excavación para la cimentación, incluyendo la conformación de excavaciones para vigas de cimentación, pilotes y dados, necesarias para la estabilidad estructural del cerramiento. Es importante señalar que el terreno presenta variaciones de altura y diferencias de nivel, por lo cual fue necesario implementar trabajos de terraceo con material de sitio, con el fin de adecuar las plataformas de trabajo y garantizar condiciones óptimas de construcción.

Como parte del proceso constructivo, se realizó la fundición de concreto de limpieza (solado) en las áreas de cimentación, proporcionando una superficie uniforme para la posterior instalación del acero de refuerzo. Seguido a esto, se desarrollaron actividades de figurado, armado e instalación de acero estructural para pilotes, dados y vigas de cimentación, conforme a los planos estructurales del proyecto.

Una vez verificados los elementos de refuerzo, se procedió con la fundición de concreto estructural en pilotes, dados y vigas de cimentación, asegurando el cumplimiento de los procedimientos técnicos de colocación, vibrado y curado del concreto.

De manera complementaria, se ejecutaron actividades de excavación para la construcción de un cárcamo ubicado en la parte central de la institución, el cual fue desarrollado con una sección de 50 cm, incluyendo la instalación de acero de refuerzo y su respectiva fundición en concreto, garantizando su funcionalidad hidráulica y estructural.

Adicionalmente, se realizaron trabajos de excavación para la construcción de muros en la parte posterior, en uno de los costados del predio, teniendo en cuenta las condiciones particulares de profundidad y las curvas de nivel presentes en el área intervenida, lo cual requirió ajustes en la conformación del terreno.

Finalmente, se deja constancia que durante el desarrollo de esta etapa se ha llevado a cabo el suministro y recepción de materiales de construcción, tales como acero de refuerzo, grava, arena y cemento, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de las actividades descritas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS**

En el marco de la ejecución del proyecto en la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, durante el presente período se dio continuidad a las actividades correspondientes a la construcción de la red pluvial y obras complementarias.

Se ejecutaron labores de excavación para la instalación de tubería de 8 pulgadas, destinadas al sistema de drenaje pluvial. Previamente, se llevó a cabo la localización y replanteo mediante control topográfico, con el fin de garantizar las pendientes requeridas y los niveles adecuados de encole y descole de la tubería, asegurando su correcto funcionamiento hidráulico.

Posteriormente, se realizó la conformación de la cama de arena como soporte para la tubería, seguida de la instalación de tubería tipo Novafort de 8 pulgadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto. Una vez instalada la tubería, se procedió con el relleno de la excavación por capas, utilizando material tipo recebo y material de sitio, debidamente compactados para garantizar la estabilidad de la estructura.

De manera complementaria, se ejecutaron actividades de excavación para la construcción de cajas de inspección, contemplándose un total de ocho (8) unidades dentro del tramo intervenido de la red pluvial. Cada caja presenta dimensiones de 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m, realizándose tanto la excavación como la fundición en concreto de las estructuras, de acuerdo con las condiciones del terreno y los diseños establecidos.

Adicionalmente, se adelantaron trabajos de excavación para la conformación de andenes de protección en áreas adyacentes a estructuras existentes, con el propósito de garantizar su estabilidad y accesibilidad. Asimismo, se ejecutaron excavaciones para la instalación de bordillos, los cuales servirán como elemento de confinamiento para dichos andenes.

Por otra parte, se deja constancia que se viene adelantando la fabricación de la estructura metálica de la cubierta correspondiente al bloque existente, actividad que se está desarrollando fuera de las instalaciones de la institución educativa (patio-taller), debido a ajustes en los diseños estructurales que fueron modificados y remitidos por la interventoría. Esta medida permite optimizar los procesos constructivos y garantizar la correcta ejecución conforme a los nuevos lineamientos técnicos.

Finalmente, se informa que durante el período se ha realizado el acopio y recepción total de materiales de construcción, tales como cemento, arena, grava y recebo, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y se encuentran disponibles para el desarrollo continuo de las actividades en obra.

RESUMEN DE IMPREVISTOS DE OBRA.

Durante el período objeto del presente informe, se presentó como situación imprevista la realización de la jornada electoral a nivel nacional. En este contexto, la infraestructura de las instituciones fueron destinadas como punto de apoyo logístico para el desarrollo de dicho proceso.

En consecuencia, y atendiendo a los protocolos de seguridad, logística y alistamiento requeridos por las autoridades competentes, se suspendieron las actividades constructivas durante los días viernes y sábado, con el fin de permitir la adecuada preparación de las instalaciones para la jornada electoral.

Esta situación incidió de manera temporal en el normal desarrollo de las actividades programadas en obra, sin embargo, corresponde a un evento externo debidamente justificado.
El contratista deja constancia en el presente informe mensual que las condiciones climáticas adversas, especialmente la ocurrencia de lluvias frecuentes durante el periodo evaluado, han generado afectaciones en el normal desarrollo de las actividades programadas. Dichas condiciones han obligado a la suspensión temporal de labores de excavación, conformación y compactación de subrasantes, así como del vaciado y curado de elementos en concreto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad de la obra.
En virtud de lo anterior, el contratista se compromete a entregar la depuración detallada de los días afectados por lluvia. Dicho reporte contará con el soporte documental de las entidades competentes y estaciones meteorológicas oficiales que demuestren la ocurrencia de estas eventualidades, con el fin de realizar los ajustes pertinentes a la programación y justificar las variaciones en los tiempos de ejecución previstos.

5. CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA.

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD	ESTADO
Equipo de topografía – Estación y Nivel	1	Disponible
Volquetas 8 m3	2	Disponibles
Minicargador – Punta y pala	1	Disponible
Retroexcavadora	1	Disponible
Rana vibro compactadora	1	Disponible
Cortadora de concreto	1	Disponible

5.1 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

OCUPACIÓN	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA – Ing. Civil	1
RESIDENTE DE OBRA – Ing. Civil	2
ARQUITECTO INSPECTOR	1
PROMOTOR SST Y HSEQ	1
OFICIALES/AYUDANTES	49
TOPOGRAFO	1

RELACION PERSONAL CONSORCIO EDUCATIVO 2025 SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL ACTIVO FEBRERO-MARZO				
N°	No CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA
1	7698841	JOSUE YAMIL SANCHEZ CLAROS	REP. LEGAL	11/11/2025
2	1077867137	ALEJANDRA ROCHA CARDOZO	SST DE OBRA	25/11/2025
3	7699652	JULIO CESAR PAEZ PEREZ	ING. RESIDENTE	26/11/2025
4	17973997	ROBINSON EDUARDO ARANGO URREGO	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025
5	1063956269	EDINSON FABIAN CUETO MORALES	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025
6	1063957461	ANDRES AUGUSTO ROJANO CANTILLO	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025
7	91481383	HECTOR RAUL HURTADO CASTELLANOS	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025
8	70162660	TOBIAS PUCHANA	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2026
9	5983933	YOLIAN LUIS RON ALCALA	AYUDANTE DE OBRA	3/12/2025
10	1006119248	GUSTAVO ADOLFO VARON VARON	AYUDANTE DE OBRA	3/12/2025
11	1126254982	MARHLON STEVEN VILLAFAÑE BORJA	AYUDANTE DE OBRA	5/12/2025
12	1006157023	JUAN PABLO MEJIA LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	13/12/2025

13	1114150223	EDWIN ALEXANDER MOLANO	AYUDANTE DE OBRA	18/12/2025
14	3173990	LUIS ALBERTO BENAVIDES CAÑAS	AYUDANTE DE OBRA	6/01/2026
15	1075320161	JULIAN ANDRES MEDINA SANCHEZ	ARQUITECTO	6/01/2026
16	12139184	WILLIAM MARIN PERDOMO	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026
17	7706902	FAIBER MACIAS RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026
18	12196195	LUIS ALFONSO ARBELAEZ VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026
19	1077293662	SANTIAGO DIAZ PEDREROS	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026
20	92546096	JOSE DE JESUS LONDOÑO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2026
21	1001805346	LUIS MAURICIO MORENO PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	11/01/2026
22	7693479	ALEXANDER MACIAS RAMIRES	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2026
23	1077227113	WILLIAM CAMILO MARIN PALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	12/01/2026
24	14296642	WILLIAN FERNANDO RAMIREZ MARIN	AYUDANTE DE OBRA	12/01/2026
25	93123995	JAIME GOMEZ BARRERO	AYUDANTE DE OBRA	14/01/2026
26	5406603	WILLY ALEXANDER BAUDIN	AYUDANTE DE OBRA	14/01/2026
28	7715701	MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO	INGENIERO	16/01/2026
29	1070919135	ARLEX LOZANO VALDERRAMA	AYUDANTE DE OBRA	17/01/2026
30	1005712602	HASWUER ESTIVEN TORO GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	19/01/2026
31	83220729	YESID GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	20/01/2026
34	1025528245	BRAYAN STIVEN CASTRO ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2026
36	1104545793	JHON SEBASTIAN MONTAÑEZ GUEVARA	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2026
38	1110530303	LEONARDO ANDRES BERMUDEZ ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	23/01/2026
39	1022322674	YERSIN LEON	TOPOGRAFO	29/01/2026
40	1118470164	EDWIN CARVAJAL TIQUE	AYUDANTE DE OBRA	26/01/2026
42	1049629164	WILSON FORERO	AYUDANTE DE OBRA	27/01/2026
45	1070598523	ANDRES FELIPE HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2026
46	14295343	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	5/02/2026
47	83168019	JOSE KENNEDY ROMERO	AYUDANTE DE OBRA	5/02/2026
48	1065604210	HECTOR RAUL HURTADO ESPAÑOL	AYUDANTE DE OBRA	7/02/2026
49	1105670420	JHON STIVEN ALARCON	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2026
50	1006504174	JUAN SEBASTIAN CORRALES	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2026
51	93238563	DIEGO FERNANDO RONDON	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026
52	11079744832	JOSUE DANIEL BROCHERO	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2026
53	1110527003	PEDRO LUIS CASTRO	AYUDANTE DE OBRA	23/02/2026
54	93349331	PEDRO JOSE LOZANO	AYUDANTE DE OBRA	3/03/2026
55	93396346	CARLOS IVAN MORENO	AYUDANTE DE OBRA	4/03/2026

6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2655

CONTRATO DE INTERVENTORIA No	#2655 del 2025
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURIDICA PARA "EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

CONTRATISTA	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS identificado con el NIT: 901.996.498-6. Representante Legal: Ing Mario Alejandro Alvarado Guzmán
DIRECTOR INTERVENTORIA	MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN
RESIDENTE INTERVENTORIA	AMDERSON ORLANDO ACOSTA LOPEZ

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS (FRENTE INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER)

8.01 ;1,02 - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS: Es necesaria para garantizar un trabajo preciso y controlado en zonas donde el acceso de maquinaria es limitado o puede generar afectaciones a estructuras existentes, redes de servicios o áreas en funcionamiento. Este tipo de excavación permite ajustar con mayor exactitud las dimensiones y profundidades requeridas, reducir riesgos de daños colaterales y asegurar condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad durante la ejecución de las obras.

8,02; 5,02 - CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS: Es necesario para garantizar la adecuada evacuación del material producto de las excavaciones, especialmente en áreas donde no es posible el uso de maquinaria. Esta actividad permite mantener las zonas de trabajo limpias y seguras, evitar acumulaciones que interfieran con el desarrollo de la obra y asegurar que los materiales sean transportados y dispuestos en sitios autorizados, cumpliendo con las normas técnicas, ambientales y de seguridad vigentes.

8.04 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100: Es necesario para garantizar la correcta separación y estabilización de las capas del suelo en las áreas intervenidas. Este material permite un adecuado filtrado y drenaje del agua, evitando la migración de finos y la pérdida de capacidad portante del terreno. Adicionalmente, contribuye a la distribución uniforme de cargas, reduce el riesgo de asentamientos diferenciales y aumenta la durabilidad de la estructura, asegurando un mejor desempeño técnico y funcional de la obra a largo plazo.

8.07; 4,02 - ANDEN EN CONCRETO E:12 CM 3000 PSI: Es fundamental para garantizar un adecuado desempeño estructural y funcional de la obra, ya que proporciona la capacidad necesaria para soportar el tránsito peatonal continuo y cargas ocasionales sin presentar deformaciones ni fisuración prematura. Esta especificación asegura una correcta distribución de esfuerzos, mayor durabilidad frente a la abrasión y a las condiciones ambientales, y un comportamiento adecuado ante cambios térmicos y humedad. Asimismo, contribuye a la seguridad de los usuarios al prevenir asentamientos diferenciales y desniveles, reduce los costos de mantenimiento a largo plazo y cumple con los criterios técnicos y normativos exigidos para infraestructura urbana y espacios públicos.

8.08 ; 4,05 - REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA: es un elemento fundamental en la construcción de andenes y placas en concreto, ya que actúa como refuerzo para controlar la fisuración producida por retracción, cambios

térmicos y cargas de servicio. Su uso mejora el comportamiento estructural del concreto al distribuir de manera uniforme los esfuerzos, reducir la aparición de grietas y limitar su apertura, lo que incrementa la durabilidad y vida útil del elemento. Además, contribuye a mantener la integridad del andén frente al tránsito peatonal continuo y a posibles cargas ocasionales, garantizando estabilidad, seguridad y un mejor desempeño a largo plazo de la estructura.

8.10 - CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI ANCHO 60 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA): Es necesaria para garantizar la correcta recolección y conducción de las aguas superficiales, evitando encharcamientos y la erosión del terreno. Esta estructura permite proteger las áreas adyacentes y las capas estructurales de la obra, mejorar el drenaje y prolongar la vida útil de las superficies intervenidas, asegurando condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y durabilidad.

8.11 - BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Es necesario para delimitar y confinar las áreas intervenidas, aportando orden, seguridad y control en los espacios de circulación. Su instalación permite definir bordes, canalizar adecuadamente las aguas superficiales y proteger las superficies adyacentes frente a desplazamientos o deterioro, garantizando durabilidad y un adecuado funcionamiento de la obra, sin incluir la preparación de la superficie de apoyo.

9.01 ;1,02 – EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS: Es necesaria para garantizar un trabajo preciso y controlado en zonas donde el acceso de maquinaria es limitado o puede generar afectaciones a estructuras existentes, redes de servicios o áreas en funcionamiento. Este tipo de excavación permite ajustar con mayor exactitud las dimensiones y profundidades requeridas, reducir riesgos de daños colaterales y asegurar condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad durante la ejecución de las obras.

9,02; 5,02 - CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS: Es necesario para garantizar la adecuada evacuación del material producto de las excavaciones, especialmente en áreas donde no es posible el uso de maquinaria. Esta actividad permite mantener las zonas de trabajo limpias y seguras, evitar acumulaciones que interfieran con el desarrollo de la obra y asegurar que los materiales sean transportados y dispuestos en sitios autorizados, cumpliendo con las normas técnicas, ambientales y de seguridad vigentes.

9.03 - EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO): Es necesaria para garantizar una superficie estable y uniforme que sirva como soporte adecuado para las capas superiores. Este proceso mejora la capacidad portante del terreno, reduce asentamientos y deformaciones, y asegura un correcto comportamiento estructural y una mayor durabilidad de la obra.

10.02 - DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M: Es necesaria para permitir la adecuación del área intervenida, liberar espacios requeridos por el nuevo diseño y eliminar elementos que interfieren con la ejecución de la obra, garantizando condiciones seguras y apropiadas para el desarrollo de las actividades constructivas.

10.03 - DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS: Es necesaria para eliminar elementos estructurales existentes que interfieren con el nuevo diseño y las actividades proyectadas, permitiendo una correcta excavación y adecuación del terreno. Esta actividad garantiza la estabilidad de la obra, evita asentamientos no controlados y asegura condiciones seguras y adecuadas para la ejecución de las nuevas estructuras.

10.04;1,02 - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS: Es necesaria para garantizar un trabajo preciso y controlado en zonas donde el acceso de maquinaria es limitado o puede generar afectaciones a estructuras existentes, redes de servicios o áreas en funcionamiento. Este tipo de excavación permite ajustar con mayor exactitud las dimensiones y profundidades requeridas, reducir riesgos de daños colaterales y asegurar condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad durante la ejecución de las obras.

10,05; 5,02 - CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS: Es necesario para garantizar la adecuada evacuación del material producto de las excavaciones, especialmente en áreas donde no es posible el uso de maquinaria. Esta actividad permite mantener las zonas de trabajo limpias y seguras, evitar acumulaciones que interfieran con el desarrollo de la obra y asegurar que los materiales sean transportados y dispuestos en sitios autorizados, cumpliendo con las normas técnicas, ambientales y de seguridad vigentes.

10.06;1,07 - PILOTE PRE EXCAVADO D=30CM INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES: Es necesario para garantizar una adecuada transmisión de cargas hacia estratos resistentes del terreno, mejorando la estabilidad y seguridad de la estructura. Este sistema permite una ejecución controlada, reduce afectaciones al entorno y asegura la correcta evacuación del material excavado, cumpliendo con los requerimientos técnicos y constructivos del proyecto.

10.08 - BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M: Es necesaria para proporcionar una superficie de apoyo uniforme y limpia, que facilite la correcta ejecución de los elementos constructivos posteriores. Esta capa permite regularizar el terreno, mejorar la distribución de cargas y proteger las estructuras superiores, garantizando un adecuado proceso constructivo y mayor durabilidad de la obra.

10.09 - VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO): Es necesaria para amarrar y distribuir de manera uniforme las cargas de la estructura hacia el terreno o los elementos de fundación, mejorando la estabilidad y el comportamiento estructural del conjunto. Su ejecución permite controlar asentamientos diferenciales y garantizar la adecuada transmisión de esfuerzos, asegurando la seguridad y durabilidad de la obra.

10.10 - DADO CONCRETO: Es necesario para recibir y transmitir de forma segura las cargas puntuales de la estructura hacia la cimentación, proporcionando estabilidad y correcto apoyo a los elementos estructurales. Su construcción garantiza una adecuada distribución de esfuerzos, reduce concentraciones de carga y contribuye al buen comportamiento estructural y a la durabilidad de la obra.

10.11;1,08 - Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal): Es necesario para delimitar y organizar los espacios de manera funcional y estética. Este elemento constructivo brinda cerramiento, seguridad y ventilación, manteniendo un adecuado acabado arquitectónico en ambas caras y garantizando durabilidad y correcto desempeño dentro del conjunto de la obra.

10.15;1,06 - ACERO FIGURADO 37000 PSI: Es necesario para reforzar los elementos estructurales de la obra, aportando resistencia a los esfuerzos de tracción y flexión. Su uso garantiza la correcta capacidad estructural, controla fisuras y deformaciones, y asegura la estabilidad, seguridad y durabilidad de las estructuras de concreto conforme a los requerimientos técnicos del proyecto.

N.P. 3 - ALFAJÍA: La alfajía es un elemento constructivo fundamental que se instala en la parte superior de muros, antepechos o vanos con el fin de proteger la edificación frente a la acción del agua lluvia, ya que facilita el adecuado escurrimiento mediante pendientes o goterones que evitan la infiltración y el deterioro de los materiales; de esta manera, contribuye a prevenir patologías como humedades y fisuras, mejora la durabilidad de los elementos constructivos, garantiza un correcto remate técnico en obra y, adicionalmente, aporta un acabado estético que define y ordena los bordes de la estructura.

10.16 - CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS: La malla eslabonada es un elemento fundamental en obras de cerramiento, ya que permite delimitar y asegurar áreas de manera eficiente, garantizando el control de acceso y la protección de bienes y personas; además, ofrece alta durabilidad frente a condiciones ambientales, requiere bajo mantenimiento y facilita la visibilidad hacia el interior y exterior del predio, lo que contribuye a la vigilancia y seguridad sin generar barreras visuales, convirtiéndose en una solución funcional, económica y ampliamente utilizada en proyectos de infraestructura y espacios públicos.

N.P. 4 - DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO): La demolición de vigas y columnas en estructuras de concreto reforzado es una actividad de alta importancia técnica, ya que permite retirar elementos estructurales que presentan patologías como fisuración, pérdida de capacidad resistente, corrosión del refuerzo o fallas constructivas, las cuales comprometen la estabilidad y seguridad de la edificación; su ejecución controlada es fundamental para evitar colapsos parciales o totales durante la intervención, garantizar la correcta liberación de cargas y posibilitar la construcción de nuevos elementos estructurales que cumplan con las especificaciones de diseño y normativas vigentes, asegurando así la funcionalidad, seguridad y vida útil del proyecto

N.P. 2 - TERRACEO CON MATERIAL DE SITIO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN: El terraceo con material de sitio producto de la excavación es una actividad fundamental en la adecuación del terreno, ya que permite conformar y estabilizar superficies mediante la reutilización del material excavado, optimizando recursos y reduciendo costos de disposición y transporte; además, contribuye al control de pendientes, mejora las condiciones de drenaje, disminuye el riesgo de erosión y facilita la ejecución de obras posteriores al generar plataformas seguras y niveladas, garantizando así la estabilidad y funcionalidad del terreno conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

REGISTRO FOTOGRAFICO




























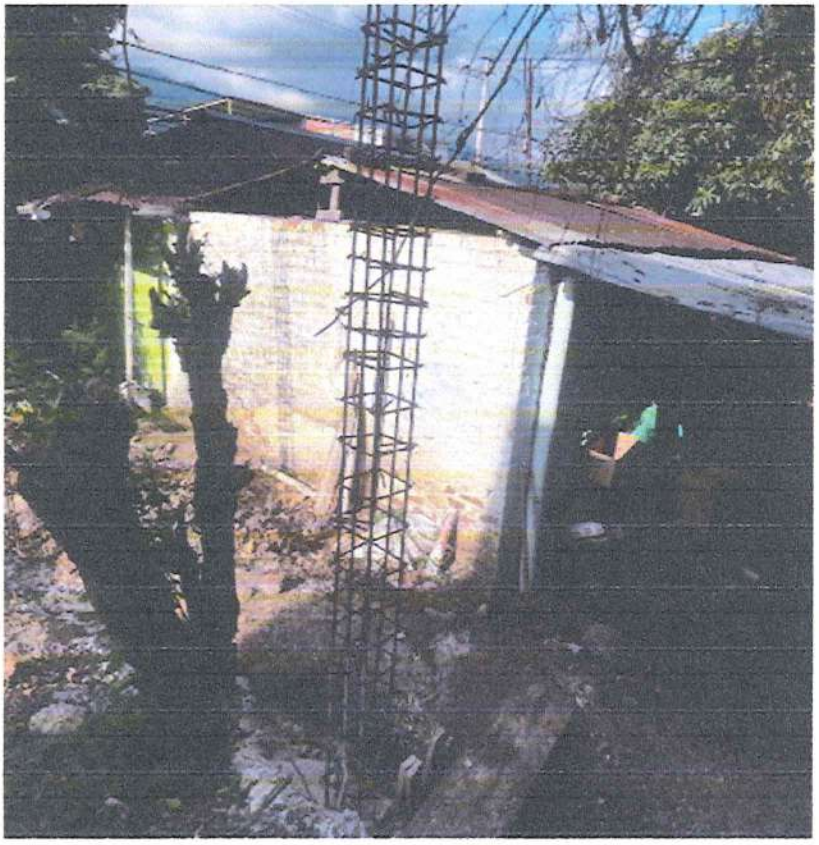


































7/4/2026
Ibagué
#CONSORCIO EDUCATIVO 2025


7/4/2026
Ibagué
#CONSORCIO EDUCATIVO 2025


8/4/2026
Ibagué
#CONSORCIO EDUCATIVO 2025


8/4/2026
Ibagué
#CONSORCIO EDUCATIVO 2025


















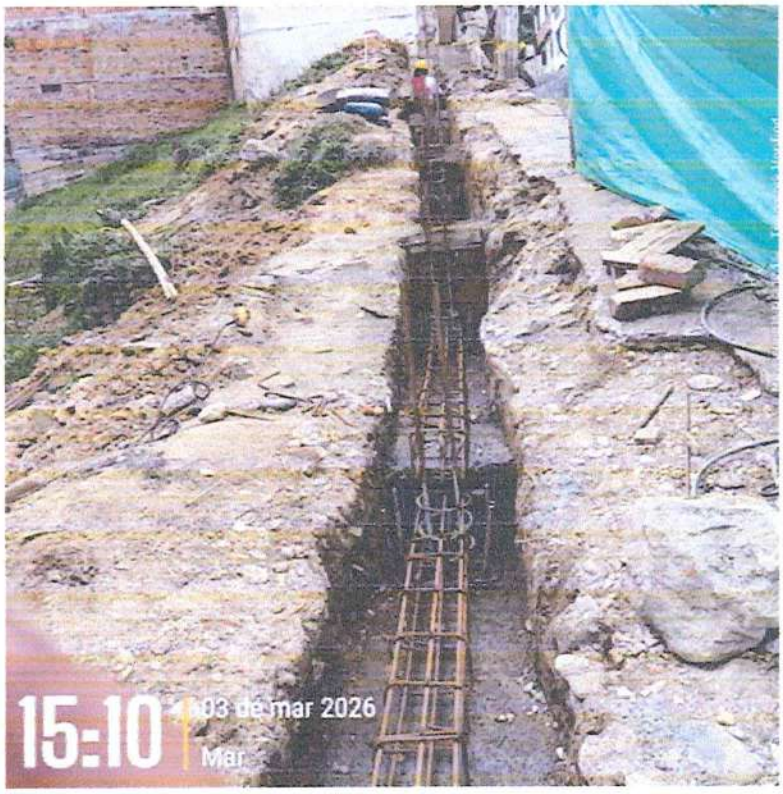


15:10
03 de mar 2026
Mar









Elaborado por:

Representante legal

CONSORCIO EDUCATIVO 2025	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CODIGO:	Alcaldía de IBAGUÉ
		VERSIÓN: 01	
	FORMATO: HOJA DE PRESENTACIÓN		
		IBAGUE - TOLIMA	

INFORME

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

"CONSORCIO EDUCATIVO 2025"

NIT

901978294-4

CONTRATO DE OBRA N°2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025

YERSIN SORIA TOPOGRAFIA MP:01-14078 CPNT

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: Diseño de urbanismos

Lugar: Institución Educativa Francisco De Paula Santander

Ciudad: Ibagué

Fecha: 8 de abril de 2026

2. INTRODUCCIÓN

En la fecha 8 de febrero de 2026, se realizó el levantamiento topográfico en la Institución Educativa Francisco De Paula Santander, ubicada en la ciudad de Ibagué, con el fin de obtener la información planimétrica y altimétrica necesaria para el diseño de los accesos en rampa para discapacitados, realización de urbanismos como el parqueadero de la institución.

3. ALCANCE DEL LEVANTAMIENTO

El levantamiento topográfico permitió determinar cotas, pendientes, alineamientos y características del terreno requeridas para el desarrollo del proyecto. A partir de la información obtenida se generaron los perfiles longitudinales y transversales, así como los planos topográficos correspondientes.

La cartera de campo fue elaborada y se entrega en formato Excel, la cual se anexa al presente informe como soporte técnico de los datos levantados.

4. PRODUCTOS GENERADOS

Planos topográficos


Perfiles longitudinales y transversales

Cartera de campo en formato Excel

Registro fotográfico del levantamiento

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO *PROCESO DE CONSTRUCCIÓN (RAMPA DE ACCESO SECTOR OCCIDENTE)*

FOTOGRAFÍA 1

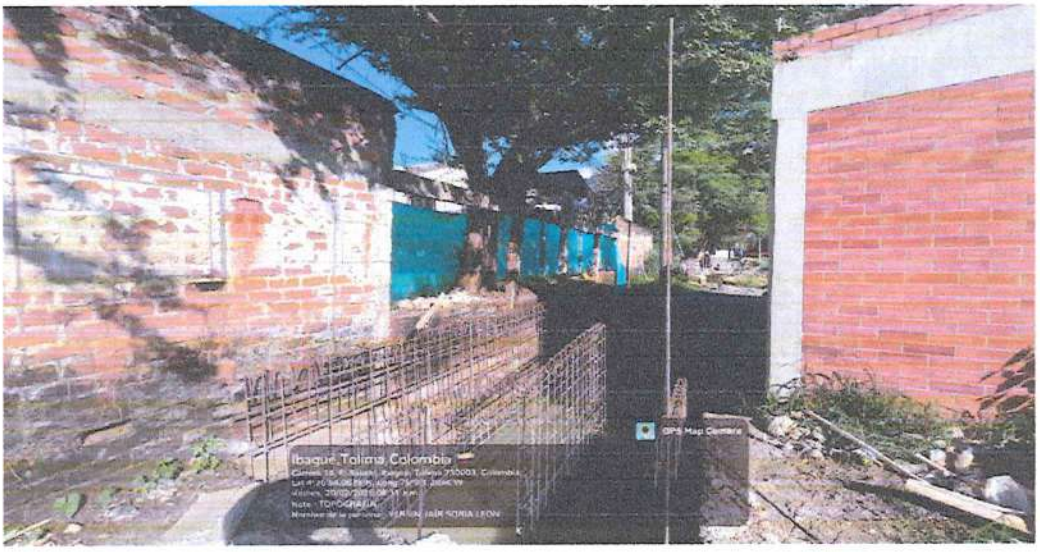

FOTOGRAFÍA 2



REGISTRO FOTOGRAFÍCO PROCESO *DE CONSTRUCCIÓN (RAMPA DE ACCESO SECTOR SUR)*


FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA 3

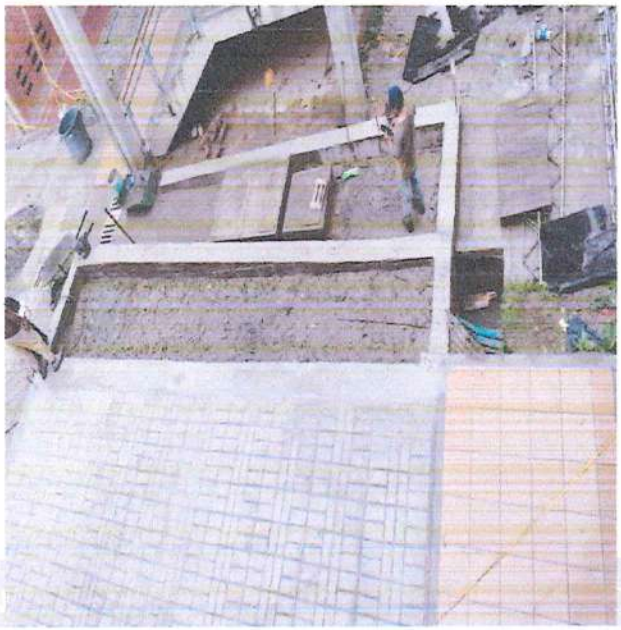

FOTOGRAFÍA 4



REGISTRO FOTOGRAFÍCO *PROCESO DE CONSTRUCCIÓN (RAMPA DE ACCESO SECTOR SUROCCIDENTE)*

FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4



FOTOGRAFÍA 5



REGISTRO FOTOGRAFÍCO *PROCESO DE CONSTRUCCIÓN (PARQUEADERO SECTOR OCCIDENTE)*

FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4



FOTOGRAFÍA 5



Fotografía 8


6. RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO

Los levantamientos topográficos y nivelaciones fueron realizadas por el Topógrafo Yersin Jair Soria León, identificado con Tarjeta Profesional N.°01-14078 CPNT, quien labora para el Consorcio Instituciones Educativas 2025.

7. ANEXOS

Planos topográficos

Plano zonas construidas hasta la fecha.

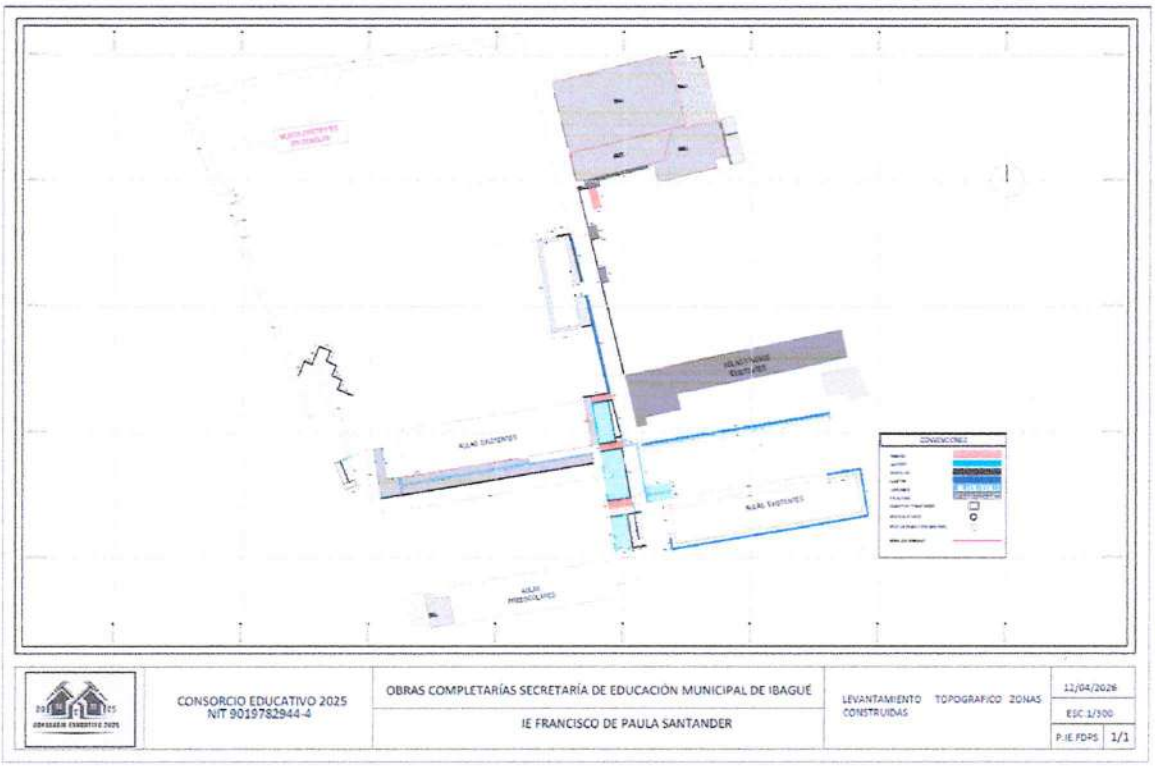

YERSIN SORIA TOPOGRAFIA MP:01-14078 CPNT

CARTERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

# DE PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
1	983812.008	880932.957	959.386	GPS1
2	983806.323	880960.254	958.897	D2
3	983806.325	880960.245	958.897	D2C
4	983805.147	880972.2	958.794	D3
5	983805.147	880972.196	958.803	D3
6	983805.146	880972.201	958.803	D3
7	983805.901	880959.281	958.903	AND
8	983805.067	880960.425	958.927	AND
9	983783.572	880962.913	958.862	AND
10	983784.696	880963.843	958.89	AND
11	983805.698	880964.295	958.949	AND
12	983806.667	880964.043	958.906	AND
13	983806.648	880963.918	958.903	AND
14	983853.327	880955.214	958.97	MURP
15	983852.833	880951.994	959.158	MURP
16	983852.282	880948.691	959.169	MURP
17	983851.665	880945.372	957.967	MURP
18	983851.166	880942.043	959.257	MURP
19	983850.6	880938.721	959.367	MURP
20	983849.951	880935.423	959.552	MURP
21	983849.348	880932.138	959.631	MURP
22	983848.767	880928.808	959.639	MURP
23	983848.165	880925.514	959.708	MURP
24	983847.633	880922.19	959.701	MURP
25	983847.147	880918.804	959.752	MURP
26	983846.604	880915.486	959.884	MURP
27	983846.055	880912.177	960.079	MURP
28	983845.51	880908.93	960.381	MURP
29	983844.869	880905.505	960.25	MURP
30	983844.367	880902.247	960.583	MURP
31	983843.695	880898.897	960.641	MURP
32	983843.136	880895.709	960.763	MURP
33	983842.601	880892.266	961.004	MURP
34	983841.988	880888.911	961.012	MURP
35	983841.263	880885.602	961.322	MURP
36	983840.748	880882.317	961.29	MURP
37	983825.405	880882.704	960.81	MURP
38	983822.406	880883.879	960.865	MURP
39	983819.402	880885.043	960.842	MURP

40	983817.507	880887.03	960.795	MURP
41	983814.84	880888.249	960.853	MURP
42	983814.243	880887.175	960.856	MURP
43	983811.862	880888.162	960.694	MURP
44	983810.057	880889.756	960.663	MURP
45	983807.246	880890.848	960.576	MURP
46	983806.837	880889.778	960.627	MURP
47	983803.484	880891.087	960.63	MURP
48	983800.039	880892.538	960.693	MURP
49	983798.474	880893.154	960.573	MURP
50	983795.512	880894.305	960.426	MURP
51	983793.017	880895.3	960.425	MURP
52	983790.023	880896.516	960.421	MURP
53	983787.255	880897.611	960.523	MURP
54	983784.289	880898.834	960.517	MURP
55	983781.34	880900.05	960.477	MURP
56	983778.413	880901.29	960.414	MURP
57	983775.645	880902.483	960.19	MURP
58	983772.581	880903.755	960.087	MURP
59	983769.631	880904.963	960.067	MURP
60	983767.064	880906.011	960.063	MURP
61	983764.255	880907.17	960.477	MURP
62	983812.008	880932.954	959.385	GPS1C
63	983806.871	880963.867	958.869	SAR
64	983806.026	880965.992	958.874	AND
65	983807.224	880966.92	958.804	AND
66	983807.474	880967.072	958.727	AND
67	983807.542	880967.316	958.729	CUN
68	983795.95	880970.222	958.773	CUN
69	983795.924	880969.97	958.809	CUN
70	983795.891	880969.762	958.8	SAR
71	983795.538	880967.755	958.862	AND
72	983792.191	880968.311	958.859	AND
73	983792.606	880970.846	958.806	AND
74	983792.611	880971.062	958.765	CUN
75	983785.436	880972.38	958.829	SAR
76	983785.517	880972.577	958.847	SAR
77	983785.647	880972.839	958.819	CUN
78	983785.659	880972.351	958.855	AND
79	983785.672	880969.406	958.891	AND
80	983785.294	880967.598	958.927	AND
81	983784.294	880969.048	958.861	AND
82	983784.536	880969.937	958.875	AND

83	983785.453	880969.874	958.901	AND
84	983785.287	880968.887	958.886	AND
85	983769.634	880976.82	958.863	AND
86	983769.644	880976.563	958.893	AND
87	983769.559	880976.315	959.064	AND
88	983769.646	880976.244	959.34	AND
89	983768.878	880970.516	959.36	AND
90	983774.156	880980.081	958.871	AND
91	983774.118	880979.839	958.872	SAR
92	983795.538	880974.867	958.764	SAR
93	983795.476	880974.591	958.81	SAR
94	983795.67	880974.555	958.813	SAR
95	983795.756	880974.812	958.811	SAR
96	983795.709	880975.477	958.626	SAR
97	983795.917	880975.437	958.618	SAR
98	983795.903	880976.275	958.427	SAR
99	983796.091	880976.227	958.43	SAR
100	983799.195	880975.45	958.48	SAR
101	983799.392	880975.407	958.48	SAR
102	983798.926	880974.69	958.653	SAR
103	983799.174	880974.6	958.643	SAR
104	983798.847	880974.016	958.799	SAR
105	983799.026	880973.986	958.801	SAR
106	983806.03	880972.002	958.788	SAR
107	983806.282	880973.061	958.606	SAR
108	983806.1	880973.105	958.605	SAR
109	983806.504	880974.02	958.398	SAR
110	983806.329	880974.083	958.407	SAR
111	983809.395	880973.296	958.414	SAR
112	983809.237	880973.35	958.407	SAR
113	983809.153	880972.36	958.587	SAR
114	983808.974	880972.399	958.597	SAR
115	983808.949	880971.533	958.783	SAR
116	983808.76	880971.578	958.783	SAR
117	983808.732	880971.326	958.786	SAR
118	983813.553	880974.268	958.353	AND
119	983818.608	880973.247	958.701	AND
120	983818.867	880974.076	958.697	AND
121	983818.984	880974.131	958.545	AND
122	983820.837	880973.606	958.753	AND
123	983820.09	880970.484	958.754	AND
124	983818.972	880970.782	958.725	AND
125	983818.2	880970.874	958.72	AND

126	983818.654	880970.04	958.737	AND
127	983818.694	880969.548	958.739	AND
128	983818.414	880969.592	958.722	AND
129	983817.849	880969.315	958.729	AND
130	983817.774	880969.062	958.769	AND
131	983818.481	880968.905	958.727	AND
132	983819.63	880968.604	958.761	AND
133	983820.181	880973.862	958.637	AND
134	983820.876	880973.675	958.66	AND
135	983821.042	880974.341	958.659	AND
136	983849.311	880956.992	958.565	CARC
137	983848.909	880957.146	958.57	CARC
138	983755.937	880978.268	959.435	D4
139	983755.929	880978.269	959.434	D4
140	983755.926	880978.272	959.412	D4
141	983805.136	880972.201	958.79	D3C
142	983767.204	880972.477	959.391	AND
143	983766.94	880970.747	959.392	AND
144	983768.003	880977.193	958.874	RAMP
145	983767.953	880977.019	959.017	SAR
146	983767.947	880976.499	959.354	SAR
147	983767.637	880976.373	959.362	SAR
148	983766.988	880972.519	959.377	SAR
149	983768.648	880970.393	959.388	AND
150	983762.448	880972.278	959.427	CAJA
151	983762.313	880971.628	959.43	CAJA
152	983761.655	880971.749	959.442	CAJA
153	983761.761	880972.403	959.436	CAJA
154	983756.696	880972.405	959.481	AND
155	983756.997	880974.191	959.462	SAR
156	983757.192	880974.174	959.478	SAR
157	983757.9	880977.95	959.43	SAR
158	983757.711	880978.174	959.451	SAR
159	983758.631	880978.077	959.18	SAR
160	983758.828	880978.045	959.177	SAR
161	983758.768	880978.911	959.092	SAR
162	983758.953	880978.838	959.091	SAR
163	983758.896	880979.289	959.041	SAR
164	983758.892	880979.484	959.033	SAR
165	983757.858	880979.433	958.915	RAMP
166	983757.704	880978.215	959.042	RAMP
167	983755.468	880974.422	959.475	SAR
168	983755.274	880974.45	959.481	SAR

169	983752.397	880974.994	959.462	POZO
170	983752.563	880975.951	959.457	POZO
171	983751.616	880976.115	959.455	POZO
172	983751.451	880975.167	959.456	POZO
173	983750.078	880976.332	959.466	CAJA
174	983750.242	880977.314	959.438	CAJA
175	983749.261	880977.48	959.449	CAJA
176	983749.099	880976.499	959.454	CAJA
177	983743.591	880976.198	959.467	AND
178	983743.402	880976.226	959.469	AND
179	983741.584	880976.531	959.454	AND
180	983744.269	880980.203	959.416	AND
181	983744.057	880980.456	959.409	AND
182	983744.33	880980.476	959.06	AND
183	983744.154	880980.461	959.043	AND
184	983744.492	880981.501	958.852	AND
185	983744.265	880981.755	958.857	AND
186	983742.459	880982.068	958.725	AND
187	983756.339	880979.638	958.976	SAR
188	983755.2	880972.608	959.477	CARC
189	983754.8	880972.658	959.471	CARC
190	983752.713	880972.926	959.475	SAR
191	983752.485	880972.905	959.476	SAR
192	983753.715	880957.548	959.484	SAR
193	983752.687	880957.669	959.455	CARC
194	983752.283	880957.733	959.453	CARC
195	983752.597	880957.443	959.461	CAJA
196	983751.703	880957.612	959.452	CAJA
197	983751.581	880956.7	959.459	CAJA
198	983752.452	880956.552	959.451	CAJA
199	983752.502	880956.534	959.456	CARC
200	983752.093	880956.547	959.456	CARC
201	983753.343	880955.277	959.494	AND
202	983751.211	880952.307	959.454	CAJA
203	983750.735	880952.33	959.461	CAJA
204	983750.678	880951.934	959.454	CAJA
205	983751.142	880951.853	959.458	CAJA
206	983749.884	880931.822	959.492	AND
207	983749.661	880930.65	959.487	AND
208	983749.311	880928.257	959.477	AND
209	983747.628	880927.56	959.447	CARC
210	983747.225	880927.602	959.482	CARC
211	983747.261	880927.99	959.494	CARC


212	983746.568	880928.062	959.478	CARC
213	983746.672	880928.716	959.481	CAJA
214	983747.363	880928.621	959.487	CAJA
215	983745.131	880927.909	959.465	AND
216	983744.919	880927.987	959.47	AND
217	983745.092	880927.516	959.499	AND
218	983744.57	880924.736	959.748	AND
219	983748.586	880924.062	959.854	AND
220	983758.818	880979.736	958.9	CARC
221	983756.947	880980.162	958.876	CARC
222	983756.327	880979.784	958.875	CARC
223	983756.954	880982.902	958.891	CARC
224	983757.54	880983.196	958.902	CARC
225	983756.002	880983.443	958.892	CARC
226	983757.217	880983.444	958.923	CAJA
227	983756.411	880983.522	958.912	CAJA
228	983756.545	880984.292	958.903	CAJA
229	983757.193	880984.356	958.704	CUN
230	983756.083	880984.5	958.888	AND
231	983756.917	880984.383	958.703	CUN
232	983760.307	881005.837	958.79	CAJA
233	983759.978	881005.908	958.78	CAJA
234	983760.363	881006.166	958.777	CAJA
235	983760.037	881006.222	958.771	CAJA
236	983760.687	881007.075	958.676	CAJA
237	983760.768	881007.754	958.67	CAJA
238	983760.863	881011.447	958.66	AND
239	983763.623	881027.245	958.615	AND
240	983764.475	881028.024	958.503	CUN
241	983764.853	881028.29	958.302	CUN
242	983774.702	881026.29	957.979	CUN
243	983775.498	881026.191	957.224	CUN
244	983775.814	881027.41	957.23	CUN
245	983746.939	880985.013	958.754	SAR
246	983746.829	880984.654	958.767	CARC
247	983743.126	880985.277	958.726	CARC
248	983743.204	880985.68	958.688	CARC
249	983745.572	880983.486	958.771	CAJA
250	983745.742	880984.254	958.763	CAJA
251	983744.953	880984.409	958.749	CAJA
252	983744.798	880983.652	958.763	CAJA
253	983745.165	880985.344	958.749	CAJA
254	983744.734	880985.439	958.687	CAJA

255	983743.208	880983.736	958.745	CAJA
256	983743.068	880983.07	958.734	CAJA
257	983742.42	880983.17	958.736	CAJA
258	983742.52	880983.872	958.731	CAJA
259	983743.319	880982.42	958.734	CAJA
260	983743.213	880981.954	958.715	CAJA
261	983740.719	880982.343	958.726	CARC
262	983741.284	880982.766	958.715	CARC
263	983740.972	880984.092	958.743	CARC
264	983741.475	880984.027	958.742	CARC
265	983730.309	880978.437	959.457	D5
266	983730.314	880978.437	959.46	D5
267	983740.214	880980.917	959.393	AND
268	983732.602	880982.345	959.452	AND
269	983732.599	880982.267	959.453	AND
270	983732.29	880981.95	959.441	AND
271	983732.394	880979.532	959.441	CAJA
272	983731.592	880979.654	959.455	CAJA
273	983732.258	880978.73	959.448	CAJA
274	983731.448	880978.857	959.452	CAJA
275	983731.905	880979.727	959.439	AND
276	983732.478	880979.621	959.453	AND
277	983732.336	880978.622	959.456	AND
278	983731.754	880978.688	959.448	AND
279	983731.659	880978.124	959.438	AND
280	983734.163	880977.745	959.456	AND
281	983734.247	880978.011	959.444	AND
282	983735.229	880977.847	959.454	AND
283	983735.235	880977.559	959.448	AND
284	983735.084	880977.756	959.444	CAJA
285	983734.963	880976.972	959.457	CAJA
286	983734.181	880977.1	959.455	CAJA
287	983734.326	880977.883	959.458	CAJA
288	983745.807	880991.395	958.638	AND
289	983746.219	880991.352	958.66	AND
290	983748.002	880991.038	958.734	AND
291	983748.039	880991.485	958.726	AND
292	983744.257	880991.703	958.697	AND
293	983744.347	880992.113	958.706	AND
294	983735.595	880990.922	958.754	AND
295	983735.714	880991.823	958.77	AND
296	983734.711	880991.391	960.206	AND
297	983734.623	880991.125	960.205	AND

298	983732.05	880991.477	960.166	CUN
299	983732.239	880991.666	958.613	CUN
300	983735.944	881007.843	958.702	AND
301	983734.93	881006.697	958.685	AND
302	983734.655	881006.775	958.639	CUN
303	983736.806	881012.83	958.687	CUN
304	983736.864	881013.32	958.694	CUN
305	983740.088	881036.438	958.536	CUN
306	983740.88	881036.348	958.569	CUN
307	983740.25	881037.423	958.529	CUN
308	983739.989	881037.754	958.464	CUN
309	983732.286	880982.418	959.052	RAMP
310	983732.571	880982.37	959.046	RAMP
311	983732.552	880983.737	959.048	RAMP
312	983732.75	880983.481	959.048	RAMP
313	983734.871	880983.665	958.997	CAJA
314	983735.731	880983.554	958.995	CAJA
315	983735.824	880984.302	958.993	CAJA
316	983735.03	880984.486	959.012	CAJA
317	983735.912	880983.545	958.975	CAJA
318	983736.037	880984.63	958.982	CAJA
319	983737.536	880983.282	958.937	CAJA
320	983737.742	880984.409	958.922	CAJA
321	983740.427	880982.181	959.413	RAMP
322	983740.705	880982.402	959.422	RAMP
323	983742.199	881046.731	958.317	D6
324	983742.199	881046.732	958.317	D6
325	983746.358	880922.622	959.836	D7
326	983746.358	880922.622	959.837	D7
327	983753.799	880955.214	959.472	AND
328	983750.166	880931.802	959.479	AND
329	983749.317	880928.312	959.475	AND
330	983749.519	880928.26	959.481	AND
331	983749.346	880927.35	959.464	AND
332	983749.292	880926.934	959.491	CUN
333	983748.834	880924.27	961.329	AND
334	983756.265	880922.99	959.958	AND
335	983755.98	880921.013	959.96	AND

YERSIN SORIA TOPOGRAFIA MP:01-14078 CPNT

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COSTADO SUR Y SUROESTE

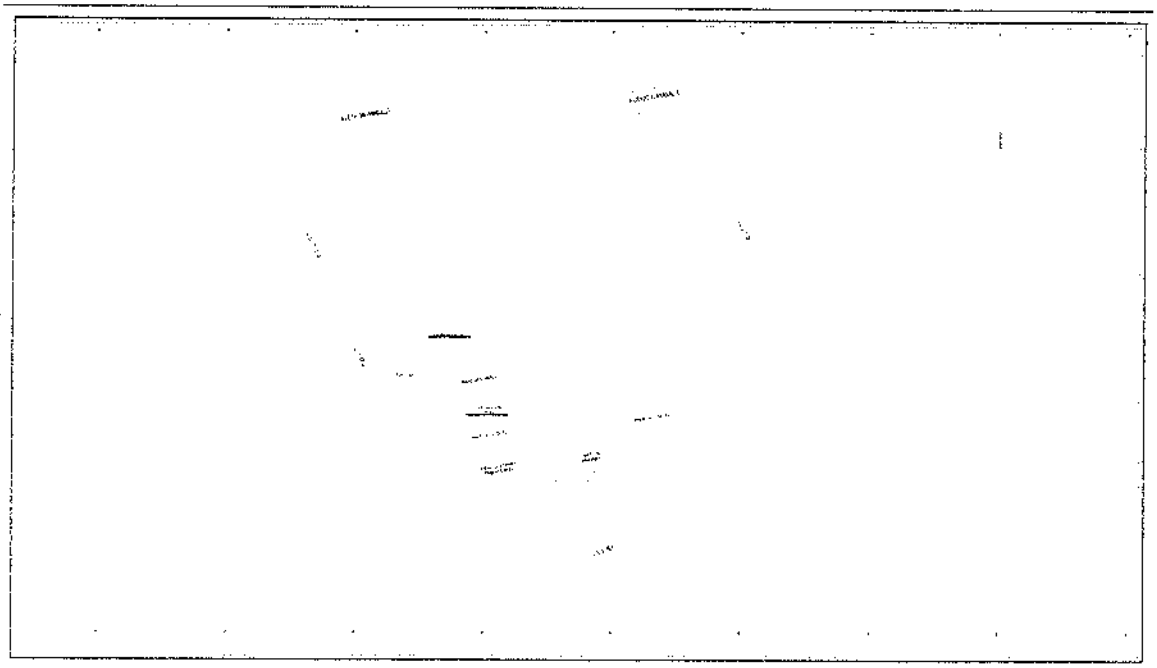

CONSORCIO EDUCATIVO 2025
NIT 901397329-4-4

OBRAS COMPLEMENTARIAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUE

IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR SUR - SUROESTE Y EXCAVACIONES


12/04/2024

ESC 1:200

P.E.F.D.P.S 1/1

VOLUMEN DE EXCAVACIONES REALIZADAS

Costado Noroeste

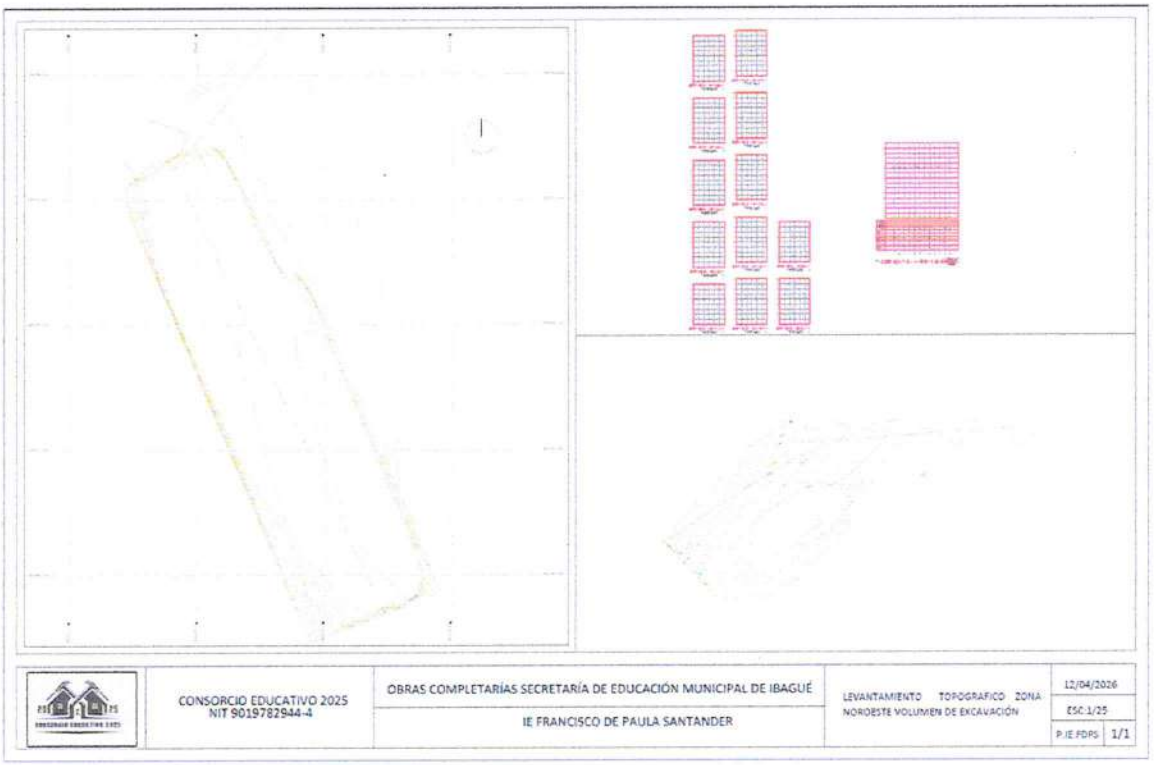

VOLUMEN EXCAVADO COSTADO NOROESTE FDPS PORTERIA RAMPA

VOLUMEN EXCAVADO COSTADO NOROESTE FDPS

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+000.00	0.00	-0.58	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+001.00	0.00	-3.35	1.00	0.00	-1.97	9,998.03
0+002.00	0.00	-3.38	1.00	0.00	-3.37	9,994.67
0+003.00	0.00	-3.63	1.00	0.00	-3.51	9,991.16
0+004.00	0.00	-3.68	1.00	0.00	-3.66	9,987.50
0+005.00	0.00	-3.71	1.00	0.00	-3.70	9,983.80
0+006.00	0.00	-3.74	1.00	0.00	-3.73	9,980.07
0+007.00	0.00	-3.48	1.00	0.00	-3.61	9,976.46
0+008.00	0.00	-3.46	1.00	0.00	-3.47	9,972.99
0+009.00	0.00	-3.48	1.00	0.00	-3.47	9,969.52
0+010.00	0.00	-2.75	1.00	0.00	-3.11	9,966.41
0+011.00	0.00	-1.13	1.00	0.00	-1.94	9,964.47

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -35.53m3
COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

VOLUMEN EXCAVADO COSTADO SUROESTE FDPS PORTERIA RAMPA

VOLUMEN EXCAVADO COSTADO NOROESTE FDPS


ESTACION	ELEVACIONES TERRENO	ELEVACIONES SUBRASANTE	ESPESORES CORTE	ESPESORES TERRAPLEN
0+000.00	960.00	960.13	----	0.13
0+001.00	958.83	960.11	----	1.28
0+002.00	958.83	960.10	----	1.27
0+003.00	958.82	960.11	----	1.29
0+004.00	958.82	960.13	----	1.31
0+005.00	958.82	960.14	----	1.32
0+006.00	958.82	960.16	----	1.34
0+007.00	958.81	960.18	----	1.36
0+008.00	958.81	960.20	----	1.39
0+009.00	958.82	960.23	----	1.41
0+010.00	959.17	960.24	----	1.07
0+011.00	959.61	960.15	----	0.53

YERSIN SORIA TOPOGRAFIA MP:01-14078 CPNT

CARTERAS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EXCAVACION COSTADO NOROESTE

# PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
12	983759.496	880915.115	959.944	CORO
14	983758.845	880913.468	960.047	CORO
16	983757.538	880913.044	960.075	CORO
18	983757.235	880911.961	960.129	CORO
20	983755.93	880912.162	960.242	CORO
24	983755.461	880910.841	960.33	CORO
30	983749.849	880916.263	959.984	CORO
32	983750.032	880916.696	960.026	CORO
35	983747.124	880917.312	960.073	CORO
37	983746.16	880914.726	960.216	CORO

# PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
13	983759.386	880915.031	959.595	PATA
15	983758.567	880913.708	959.769	PATA
17	983757.254	880913.264	959.591	PATA
19	983756.985	880912.35	959.626	PATA
21	983756.041	880912.396	959.673	PATA
23	983755.985	880912.982	958.839	PATA
25	983755.151	880911.003	958.804	PATA
27	983753.297	880914.116	958.817	PATA
29	983753.322	880914.597	958.809	PATA
31	983750.028	880916.054	959.531	PATA
33	983750.217	880916.559	959.573	PATA
34	983749.953	880915.97	958.823	PATA
36	983747.21	880917.112	958.836	PATA
38	983746.432	880914.847	958.83	PATA

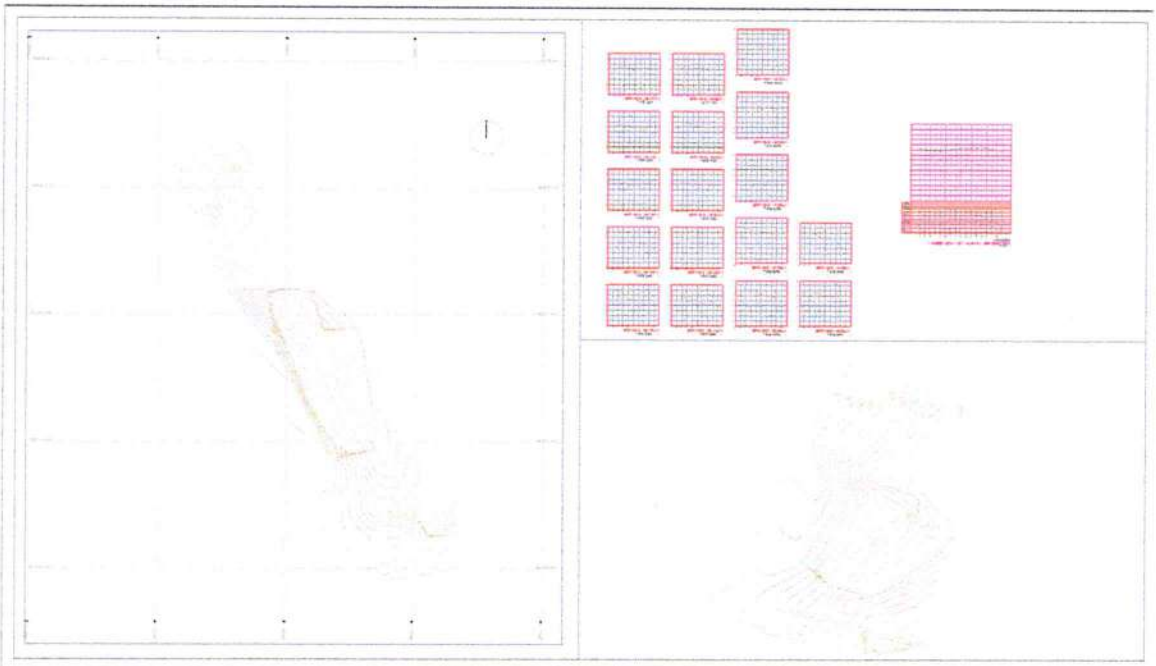

	CONSORCIO EDUCATIVO 2025 NIT 9019782944-4	OBRAS COMPLETARÍAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ZONA SUROESTE VOLUMEN DE EXCAVACIÓN	12/04/2026 ESC:1/75 P.IE.FDPS 1/1

VOLUMEN EXCAVADO COSTADO SURDESTE FDPS RAMPA PREESCOLAR

VOLUMEN EXCAVADO COSTADO SURDESTE FDPS

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+003.00	0.00	-1.59	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+004.00	0.00	-1.59	1.00	0.00	-1.59	9,998.41
0+005.00	0.00	-1.02	1.00	0.00	-1.30	9,997.11
0+006.00	0.00	-0.39	1.00	0.00	-0.70	9,996.40
0+007.00	0.00	-0.08	1.00	0.00	-0.23	9,996.17
0+008.00	0.00	-0.41	1.00	0.00	-0.24	9,995.93
0+009.00	0.00	-2.95	1.00	0.00	-1.68	9,994.25
0+010.00	0.00	-3.25	1.00	0.00	-3.10	9,991.15
0+011.00	0.00	-3.54	1.00	0.00	-3.40	9,987.75
0+012.00	0.00	-3.84	1.00	0.00	-3.69	9,984.06
0+013.00	0.00	-4.13	1.00	0.00	-3.99	9,980.07
0+014.00	0.00	-4.42	1.00	0.00	-4.28	9,975.80
0+015.00	0.00	-4.21	1.00	0.00	-4.32	9,971.48
0+016.00	0.00	-2.95	1.00	0.00	-3.58	9,967.90
0+017.00	0.00	-2.32	1.00	0.00	-2.64	9,965.26
0+018.00	0.00	-2.10	1.00	0.00	-2.21	9,963.04
0+019.00	0.00	-0.08	1.00	0.00	-1.09	9,961.95

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -38.05m3
COEF. ABUNDANIENTO: 1.00

VOLUMEN EXCAVADO COSTADO SURDESTE FDPS RAMPA PREESCOLAR

VOLUMEN EXCAVADO COSTADO SURDESTE FDPS

ESTACION	ELEVACIONES TERRENO	ELEVACIONES SUBRASANTE	ESPESORES CORTE	ESPESORES TERRAPLEN
0+003.00	960.02	960.14	----	0.12
0+004.00	959.76	959.99	----	0.22
0+005.00	959.73	959.86	----	0.13
0+006.00	959.73	959.73	----	0.01
0+007.00	959.81	959.81	0.00	----
0+008.00	959.91	959.91	0.00	----
0+009.00	959.04	960.01	----	0.97
0+010.00	959.04	960.11	----	1.07
0+011.00	959.04	960.21	----	1.17
0+012.00	959.03	960.23	----	1.20
0+013.00	959.02	960.27	----	1.25
0+014.00	959.01	960.30	----	1.29
0+015.00	959.00	960.34	----	1.34
0+016.00	958.98	960.26	----	1.28
0+017.00	958.97	960.07	----	1.09
0+018.00	958.97	959.90	----	0.93
0+019.00	959.44	959.67	----	0.23

YERSIN SORIA TOPOGRAFIA MP:01-14078 CPNT

# PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
50	983723.996	880923.897	960.778	COL
76	983723.912	880926.507	959.659	CORO
79	983723.021	880926.452	959.941	CORO
78	983720.108	880926.982	960.744	CORO
74	983724.091	880928.897	959.592	CORO
71	983721.724	880929.669	959.909	CORO
68	983721.794	880930.566	959.742	CORO
219	983721.89	880931.801	959.45	CORO
66	983713.789	880930.206	960.551	CORO
64	983714.629	880932.986	959.465	CORO
88	983709.997	880930.515	960.442	TN
89	983710.884	880932.646	959.932	TN
87	983709.151	880933.516	960.24	TN
84	983709.522	880937.755	960.271	TN
219	983721.89	880931.801	959.45	PAT
220	983721.54	880931.814	959.05	PAT

Firma: Yersin Jair Soria leon
CC: 1022322674

Topógrafo: Yersin Jair Soria León

T.P.: 01-14078 CPNT

INFORME DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

"CONSORCIO EDUCATIVO 2025"

NIT

901978294-4

CONTRATO DE OBRA N°2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

N° 4

"CONSORCIO EDUCATIVO 2025"
NIT:
901978294-4

1.DATOS DE LA OBRA.

"CONTRATO N°2656 DE 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL "CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".

GENERALIDADES

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Plan.

El Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos con el propósito de reducir al mínimo los accidentes laborales y daños al Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para el Consorcio.

ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el periodo del **11** de febrero del 2026 al **10** de marzo de 2026, se vienen desarrollando en la obra las siguientes actividades.

SEÑALIZACION Y CERRAMIENTO DE LA OBRA

Durante el periodo comprendido de febrero 11 a marzo 10 de 2026 se buscó mantener en buen estado en encerramiento de las obras, haciendo uso de diferentes elementos como polisombra, cintas de peligro.

También se elaboraron colombinas de cemento para ubicar el encerramiento en sitios donde no se puede enterrar guaduas en el piso y ninguna varilla, esto se realizó con el fin de que mantuviera una estabilidad los cerramientos ya que el viento que hace por la lluvia ocasiona que se caigan o los estudiantes en ocasiones cuando juegan causan las caídas de los cerramientos.

Se ubicaron señales informativas en distintos puntos de los frentes de obra de cada institución para informar a la comunidad educativa sobre el proceso que se adelanta allí y por lo tanto que tengan cuidado al pasar por estos sitios, de igual forma también

hay información allí para el personal que labora en la obra.



La señalización de la obra se va ubicando en los sitios que se van interviniendo por lo que se debe estar moviendo de acuerdo a la necesidad, también se van ubicando señales diferentes en distintos sitios que lo requieran, se ubica polisombra para aislar la obra de los sitios donde está el personal escolar.

También en los sitios donde hay riesgos se colocan cintas de peligro alrededor para que se vea fácil y no se causen accidentes por no estar señalizada, en sitios donde el riesgo es más grande se coloca polisombra alrededor de estos.

UBICACIÓN DE VALLAS



I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



I.E GERMAN PARDO



I.E ALFONSO PALACIO RUDAS



I.E CIUDAD LUZ

Desde el inicio de la obra se ubicaron vallas informativas donde relata toda la información del proyecto, las actividades que se van a realizar y demás consideraciones importantes, se cumple con el requisito de colocar la información para que la comunidad conozca el proyecto que se está haciendo, cuánto dura y las entidades que hacen parte de él y están ubicadas al ingreso de las cuatro instituciones en una parte visible, durante el desarrollo de la obra se mantiene verificación de que las vallas están bien ubicadas y no se caigan.

INGRESO DE PERSONAL

Desde el inicio de la obra se garantiza los procesos de ingreso de personal con la afiliación de los obreros a la ARL, EPS y administradoras de pensión, el consorcio realiza la gestión administrativa y nos envía el comprobante de afiliaciones para ser

anexadas en la carpeta que se lleva en la obra, hasta que no esté lista la afiliación no se puede hacer el ingreso del personal a laborar por seguridad y en cumplimiento de las normas que regulan la contratación.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

N°	No CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO
1	7698841	JOSUE YAMIL SANCHEZ CLAROS	REP.LEGAL	11/11/2025	
2	1077867137	ALEJANDRA ROCHA CARDOZO	SST DE OBRA	25/11/2025	
3	7699652	JULIO CESAR PAEZ PEREZ	ING.RESIDENTE	26/11/2025	
4	1075320161	JULIAN ANDRES MEDINA SANCHEZ	ARQUITECTO	6/01/2026	
5	7715701	MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO	INGENIERO	16/01/2026	
6	1022322674	YERSIN LEON	TOPOGRAFO	29/01/2026	


PERSONAL OPERATIVO

N°	No CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO
1	17973997	ROBINSON EDUARDO ARANGO URREGO	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025	
2	1063956269	EDINSON FABIAN CUETO MORALES	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025	
3	1063957461	ANDRES AUGUSTO ROJANO CANTILLO	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025	
4	91481383	HECTOR RAUL HURTADO CASTELLANOS	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025	
5	5983933	YOLIAN LUIS RON ALCALA	AYUDANTE DE OBRA	3/12/2025	14/02/2026
6	1006119248	GUSTAVO ADOLFO VARON VARON	AYUDANTE DE OBRA	3/12/2025	
7	1126254982	MARHLON STEVEN VILLAFAÑE BORJA	AYUDANTE DE OBRA	5/12/2025	28/02/2026
8	1006157023	JUAN PABLO MEJIA LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	13/12/2025	16/02/2026
9	1114150223	EDWIN ALEXANDER MOLANO	AYUDANTE DE OBRA	18/12/2025	
10	3173990	LUIS ALBERTO BENAVIDES CAÑAS	AYUDANTE DE OBRA	6/01/2026	
11	12139184	WILLIAM MARIN PERDOMO	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026	
12	7706902	FAIBER MACIAS RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026	
13	12196195	LUIS ALFONSO ARBELAEZ VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026	
14	1077293662	SANTIAGO DIAZ PEDREROS	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026	
15	92546096	JOSE DE JESUS LONDOÑO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2026	
16	1001805346	LUIS MAURICIO MORENO PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	11/01/2026	
17	7693479	ALEXANDER MACIAS RAMIRES	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2026	

18	1077227113	WILLIAM CAMILO MARIN PALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	12/01/2026	
19	14296642	WILLIAN FERNANDO RAMIREZ MARIN	AYUDANTE DE OBRA	12/01/2026	
20	93123995	JAIME GOMEZ BARRERO	AYUDANTE DE OBRA	14/01/2026	
21	5406603	WILLY ALEXANDER BAUDIN	AYUDANTE DE OBRA	14/01/2026	
22	1070919135	ARLEX LOZANO VALDERRAMA	AYUDANTE DE OBRA	17/01/2026	06/03/2026
23	1005712602	HASWUER ESTIVEN TORO GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	19/01/2026	
24	83220729	YESID GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	20/01/2026	
25	1025528245	BRAYAN STIVEN CASTRO ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2026	
26	1104545793	JHON SEBASTIAN MONTAÑEZ GUEVARA	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2026	
27	1110530303	LEONARDO ANDRES BERMUDEZ	AYUDANTE DE OBRA	23/01/2026	03/03/2026
28	1118470164	EDWIN CARVAJAL TIQUE	AYUDANTE DE OBRA	26/01/2026	
29	1049629164	WILSON FORERO	AYUDANTE DE OBRA	27/01/2026	
30	1070598523	ANDRES FELIPE HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2026	06/03/2026
31	14295343	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	5/02/2026	24/02/2026
32	83168019	JOSE KENNEDY ROMERO	AYUDANTE DE OBRA	5/02/2026	
33	1065604210	HECTOR RAUL HURTADO ESPAÑOL	AYUDANTE DE OBRA	7/02/2026	
34	1105670420	JHON STIVEN ALARCON	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2026	
35	1006504174	JUAN SEBASTIAN CORRALES	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2026	
36	93238563	DIEGO FERNANDO RONDON	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	19/02/2026
37	1107974832	JOSUE DANIEL BROCHERO	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2026	02/03/2026
38	1110527003	PEDRO LUIS CASTRO	AYUDANTE DE OBRA	23/02/2026	28/02/2026
39	93349331	PEDRO JOSE LOZANO	AYUDANTE DE OBRA	03/03/2026	
40	93396346	CARLOS IVAN MORENO	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2026	
41	70162660	TOBIAS PUCHANA	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2026	

El número de trabajadores varía con el ingreso y salida de personal, en la tabla se muestra las cantidades para este periodo en el Consorcio Educativo 2025.

INDUCCION PERSONAL QUE INGRESA A LABORAR EN LA OBRA

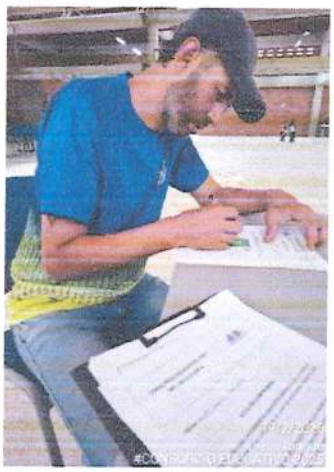



Durante este periodo se realizaron inducciones al personal nuevo que empezó a laborar con el consorcio, se les da información sobre la obra, información administrativa, información de aspectos de seguridad y salud en el trabajo, lo mismo que se les hace la evaluación de inducción para verificar si han aprendido la información que se les ha compartido.

Se realizaron las inducciones en SST al personal que ingresó durante el mes, donde se socializó:

- Normas de seguridad
- Políticas de SST
- Riesgos de la obra
- Uso obligatorio de EPP
- Procedimientos seguros de trabajo
- Reporte de actos inseguros
- Horario
- Entrega de EPP

RELACION INDUCCIONES A PERSONAL NUEVO QUE INGRESA

N°	No CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO
1	93238563	DIEGO FERNANDO RONDON	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	19/02/2026
2	1107974832	JOSUE DANIEL BROCHERO	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2026	02/03/2026
3	1110527003	PEDRO LUIS CASTRO	AYUDANTE DE OBRA	23/02/2026	28/02/2026
4	93349331	PEDRO JOSE LOZANO	AYUDANTE DE OBRA	03/03/2026	
5	93396346	CARLOS IVAN MORENO	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2026	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE EL PRESENTE MES

El consorcio cuenta con las herramientas y equipos necesarios para desarrollar la obra, los equipos que se requieran y que no se encuentren a disposición en la obra se alquilan con proveedores de la ciudad que los tengan.


El traslado de los equipos se realiza en vehículos de los proveedores quienes los traen a la obra y los recogen cuando ya no se utilizan.

Durante el presente mes se ha utilizado solo herramientas manuales.

- Picos
- Palas
- Barras
- Masetas
- Martillos
- Seguetas
- Buguis
- Manguera niveles
- Manguera de riego

CHARLAS DE SEGURIDAD



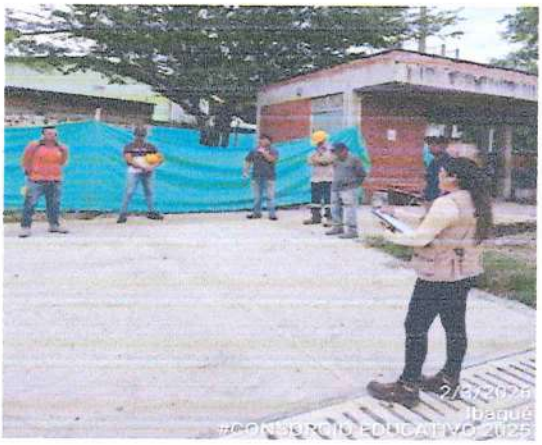





Se manejan charlas de seguridad que se dictan a primera hora de la mañana al ingreso de los obreros, durante estas jornadas se tocan temas de seguridad y salud en el trabajo las cuales aportan herramientas al personal para su cuidado personal durante el desarrollo de la obra.

También se tocan temas de aspectos de cuidado del medio ambiente como es el orden y aseo en obra y la correcta disposición de los desechos que salen día a día, se les brinda recomendaciones en seguridad, concientización de los peligros existentes y el autocuidado de los mismos, también se analiza las actuaciones diarias que suceden para dejar en ellos una enseñanza de lo que pasa a diario, se deja


evidencia en fotos de las charlas realizadas y se firma un formato de asistencia por cada una.

FECHA	TEMA DE LA CHARLA
16/02/2026	USO ADECUADO DE EPP GAFAS GUANTES TAPABOCAS, CONSECUENCIAS DEL RIESGO QUÍMICO
16/02/2026	USO ADECUADO HERRAMIENTAS MANUALES. PREVENCIÓN DE LESIONES EN EXCAVACIONES
16/02/2026	PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. PREVENCIÓN DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
17/02/2026	PELIGROS EN EXCAVACIONES
17/02/2026	REPORTE INCIDENTES, ORDEN Y ASEO.
17/02/2026	USO ADECUADO DE EPP INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS,
18/02/2026	SENSIBILIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN. PREVENCIÓN DE CAÍDAS AL MISMO NIVEL
18/02/2026	PREVENCIÓN DE LESIONES. USO DE PP
18/02/2026	CUIDADOS Y PREVENCIÓN DE LESIONES EN LAS MANOS. USO ADECUADO DE GUANTES
19/02/2026	CUIDADOS CON MANIPULACIÓN DE HIERRO, MANIPULACIÓN DE CEMENTO, USO DE PP Y BOTAS DE SEGURIDAD
19/02/2026	PREVENCIÓN DE GOLPES CON ESCOMBROS, HERRAMIENTAS DE MANO
19/02/2026	PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
20/02/2026	PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN LA PIEL POR EXPOSICIÓN ALZAS TEMPERATURAS
20/02/2026	ORDEN Y LIMPIEZA EN ZONAS DE TRABAJOS. ESPACIOS LIBRES DE OBSTÁCULOS
20/02/2026	PROTECCIÓN AUDITIVA, ORDEN Y ASEO
21/02/2026	DIFERENCIAS DIFERENCIA DE INCIDENTE Y ACCIDENTE
21/02/2026	PREVENCIÓN DE LESIONES EN LA COLUMNA BUENAS POSTURAS
21/02/2026	PREVENCIÓN DE LESIONES EN LA COLUMNA BUENAS POSTURAS, ORDEN Y ASEO
23/02/2026	MANIPULACIÓN DE CARGAS POSTURAS ADECUADAS
23/02/2026	PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS
23/02/2026	AGOTAMIENTO GOLPE DE CALOR. FATIGA POR EXPOSICIÓN ALTAS TEMPERATURAS
24/02/2026	PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN LA PIEL POR EXPOSICIÓN DE CHISPAS POR MANIPULACIÓN DE PULIDORA
24/02/2026	USO ADECUADO DE GAFAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE IRRITACIÓN DE OJOS
24/02/2026	INSPECCIÓN DE EXTENSIONES Y TOMAS
25/02/2026	MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGA MÍNIMA POSICIÓN ADECUADA
25/02/2026	PREVENCIÓN DE LESIONES EN LA COLUMNA POR POSTURAS PROLONGADAS Y MANTENIDAS
25/02/2026	PREVENCIÓN DE LESIONES CON MANIPULACIÓN DE TUBERÍA Y ACERO
26/02/2026	RECOMENDACIONES USO DE EPP CASCO GUANTES GAFAS BOTAS DE SEGURIDAD
26/02/2026	POSTURAS ADECUADAS
26/02/2026	USO ADECUADO EQUIPOS ELÉCTRICOS. PULIDORA SIERRA CIRCULAR

	TROZADORA,
27/02/2026	PREVENCIÓN DE IRRITACIÓN EN LA VISTA POR CONTACTO DE MATERIAL PARTICULADO
27/02/2026	PREVENCIÓN DE IRRITACIÓN EN LA VISTA POR MATERIAL PARTICULADO
27/02/2026	PREVENCIÓN DE LESIONES EN LA COLUMNA.
28/02/2026	CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN INTEGRAL
28/02/2026	PELIGROS DE ACCIDENTE CON OBJETOS O HERRAMIENTAS EN EL SUELO
28/02/2026	BUEN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS
2/03/2026	REPORTE DE ACCIDENTES O INCIDENTES LABORALES, ORDEN Y ASEO.
2/03/2026	CUIDADOS CON CORTE DE HIERRO CON PULIDORA, ORDEN Y ASEO
2/03/2026	PRIMERO AUXILIOS, ORDEN Y ASEO.
3/03/2026	PREVENCIÓN DE LESIONES EN LA COLUMNA POR POSTURAS PROLONGADAS
3/03/2026	USO DE BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO
3/03/2026	RIESGOS Y PELIGROS EN OBRA
4/03/2026	PREVENCIÓN Y CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO, USO DE TAPABOCAS
4/03/2026	PREVENCIÓN DE RESBALONES TROPEZONES Y CAÍDAS, ORDEN Y ASEO.
4/03/2026	CHARLA SST PELIGROS EXISTENTES CON MANIPULACIÓN DE HIERRO, USO DE GUANTES DE NITRILO
5/03/2026	PELIGROS CON MANIPULACIÓN DE EQUIPO DE SOLDADURA, PROTECCIÓN DE CARETA Y DEMÁS
5/03/2026	PELIGROS EN EXCAVACIÓN
5/03/2026	CUIDADOS Y PRECAUCIÓN CON MANEJO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS MEZCLADORA DE CONCRETO
6/03/2026	INSPECCIÓN DE CONEXIONES Y EXTENSIONES
6/03/2026	PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS
9/03/2026	USO ADECUADO DE GAFAS. CUIDADO OCULAR
9/03/2026	PROTECCIÓN DE LA PIEL. EXPOSICIÓN A ALTAS TEMPERATURAS USO DE BLOQUEADOR
9/03/2026	LEVANTAMIENTO DE OBJETOS POSTURAS ADECUADAS
10/03/2026	PELIGROS CON MANEJO DE HERRAMIENTAS, MANUALES EN EXCAVACIONES
10/03/2026	OBRA DESPEJADA DE MATERIAL SOBRANTE
10/03/2026	PREVENCIÓN DE GOLPES CON ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS

PAUSAS ACTIVAS



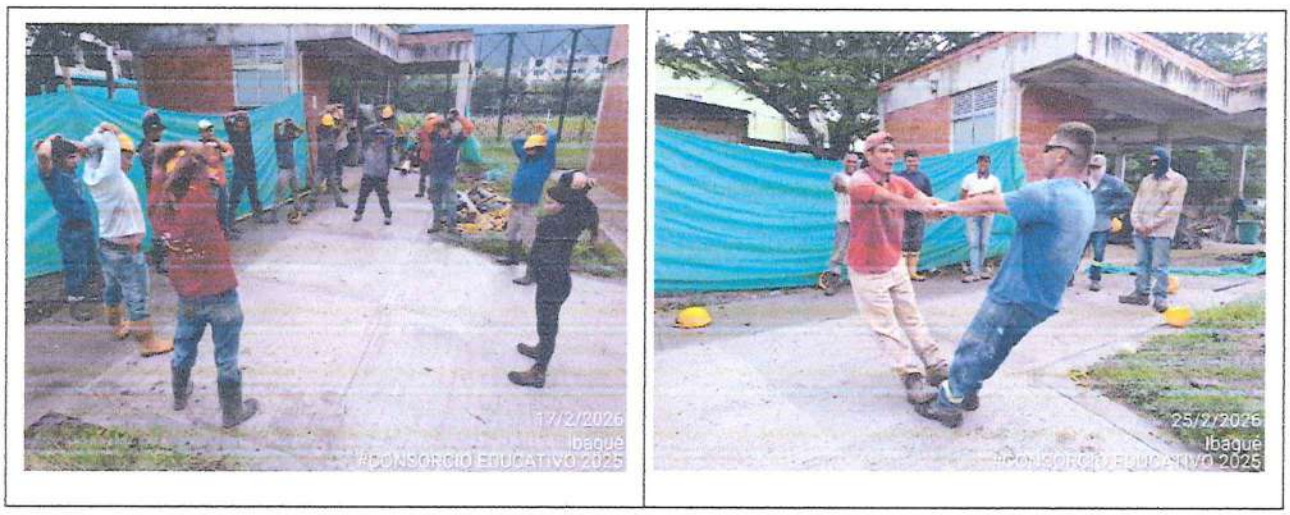

Durante este periodo se realizaron jornadas de pausas activas a todos los obreros, en las jornadas el personal se muestra muy receptivo a la realización de los ejercicios y participan de buena manera, se organizan estas sesiones en sitios abiertos en los cuales se puedan mover y son dirigidos por la sst de obra quien hace parte activa de la realización de estas jornadas y se deja evidencia fotográfica de la realización de las pausas activas, con estas pausas se busca un descanso de la jornada de trabajo del obrero y que con ellas pueda descansar del trabajo forzado del día.

PASOS PEATONALES

CL 8 37 A 26 LC 24 Y 26 CC ZARAGOZA PLAZA


19/2/2026
Ibagué
#CONSORCIO EDUCATIVO 2025


19/2/2026
Ibagué
#CONSORCIO EDUCATIVO 2025




21/2/2026
Ibagué
#CONSORCIO EDUCATIVO 2025

CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**CONTRATO** N°2656 DE 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL "CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".	SISOMA INFORME Del 11/02/2026 al 10/03/2026
	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	









Se mantienen ubicados pasos peatonales en los sitios de la obra que así lo requieran, estos pasos peatonales se organizan con la ayuda de poli sombra y cintas de peligro, las cuales se extienden a lo largo del sendero peatonal con apoyo de Guaduas y canecas , en las mismas paredes de la institución o colombinas.

Los pasos peatonales, se reubican de acuerdo a las necesidades por el desarrollo de la obra, por lo que no son puntos fijos, teniendo en cuenta que se van liberando secciones de la obra, de acuerdo a la finalización de actividades en ciertas partes de la obra.

.

ENTREGA DE DOTACION, EPP Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE
CL 8 37 A 26 LC 24 Y 26 CC ZARAGOZA PLAZA

CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**CONTRATO** N°2656 DE 2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL "CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".	SISOMA INFORME Del 11/02/2026 al 10/03/2026
	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	

PROTECCION PERSONAL





Cuando el personal ingresa a laborar se le entrega la dotación y se le hace entrega de EPP,el personal que tiene sus epp desgastados o dañados se les hace reposición de elementos de protección personal, se les entrega todos los elementos de protección personal que se requieren para que ellos puedan desempeñar su labor durante el tiempo que ellos duren trabajando.

Se mantiene revisión constante, para hacerles reposición de los elementos de protección personal que por su uso se les hayan dañado, esta entrega de la dotación y elementos de protección personal se hace haciendo firmar un formato en el cual el obrero firma como recibido de la misma.

Para este periodo se realizó:

- Reposición de EPP deteriorado
- Entrega de dotación (camisetas, pantalón, botas, chalecos)
- Registro de entrega firmada por los trabajadores.

PUNTOS ECOLOGICOS



En cada institución se ubican puntos ecológicos, donde los obreros pueden desechar todo tipo de basuras que se sacan durante el día, ya sea de las actividades dentro de la obra o del consumo que ellos hagan de comestibles.

Estos puntos ecológicos se identifican y se orienta a todos los obreros en cuál caneca deben disponer cada residuo, de acuerdo al color de la caneca y al tipo de basura que vayan a desechar, en las capacitaciones se les recuerda de forma repetitiva la importancia de arrojar la basura en estos puntos ecológicos y no arrojarlas en zonas verdes o en el suelo , para contribuir a prevenir la contaminación, estos puntos se van moviendo de acuerdo como se desarrolle la obra.

PUNTOS DE SEGURIDAD



En todas las instituciones en las cuales se está desarrollando la obra, se tienen puntos de seguridad por si se llega a presentar alguna emergencia.

En cada punto de seguridad se deja el botiquín, el extintor y la camilla que se ubican de acuerdo a cómo esté la obra en el momento, en algunas de las obras cuando se hace trabajo en sitios al aire libre, se debe mantener el botiquín guardado para evitar que se moje y se puedan deteriorar sus elementos, estos elementos de seguridad se dejan a cargo de la persona encargada de obra, ellos los ubica a diario y los guarda al terminar la jornada laborar.

PUNTOS DE ENCUENTRO Y RUTAS DE EVACUACION

Se ubican las rutas de evacuación en la obra, teniendo en cuenta los sitios por donde se debe salir, en caso de qué se presente cualquier emergencia, estos puntos de encuentro y las rutas se señalizan y se les explica a los obreros por donde deben ir y dónde es el sitio donde se deben ubicar en caso de qué se presente algún imprevisto, estos puntos también son móviles de acuerdo a cómo vaya avanzando la obra y los identificamos a medida que se vayan corriendo, y se socializa al personal de obra.









INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante este periodo y desde el inicio de la obra, en todas las instituciones se han realizado inspecciones de seguridad a los elementos y herramientas que se utilizan para realizar las diferentes actividades dentro de la obra.

Cuando se hace esta revisión, se verifica que la herramienta o elemento se encuentre en condiciones óptimas para que el empleado la pueda usar, en caso dado de que tenga algún desperfecto, se retira del uso y se le hacen las correcciones que requiera, de acuerdo a los hallazgos para poderla volver a utilizar.

Dentro de estas inspecciones, se tiene un cuidado muy especial de verificar su estado para evitar que se llegue a causar algún accidente en los obreros por defectos en los elementos y herramientas, las inspecciones se dejan por escrito en los formatos que el consorcio maneja.

Durante el periodo se realizaron diferentes inspecciones de seguridad a diferentes implementos como son:

Herramientas manuales: a estas se les mira que tengan todas sus partes en perfectas condiciones para que sean usadas por los obreros, de esta forma nos aseguramos que no se vayan a presentar lesiones en el personal obrero por desperfectos en las condiciones en que se encuentran las herramientas

Cerramiento y señalización: se hace verificación diaria de que queden correctamente ubicados y que aíslen el sitio de la construcción, evitando de esta forma que personas ajenas ingresen y puedan sufrir accidentes

Señalización de peligros: se verifica que queden señalizados los peligros de la obra con cintas o polisombra y que se le coloquen las botellas en las varillas que se encuentran descubiertas.

Uso adecuado de epp: se verifica que los empleados usen en la forma debida los implementos de protección que se les entrega y que los cuiden para evitar desgastes innecesarios por mal uso

Se realizaron también inspecciones periódicas de seguridad en:

- Áreas de trabajo
- Almacenamiento de materiales
- Herramientas manuales
- Extensiones eléctricas

Resultado:

- Se realizó reposición de herramientas en mal estado.
- Se recomendó mantenimiento preventivo.
- Se garantizó el uso seguro de las herramientas

- Se detectaron condiciones inseguras menores.
- Se dejaron recomendaciones correctivas.
- Se realizó seguimiento a los hallazgos.

INSPECCIONES DE PUNTOS DE SEGURIDAD (EMERGENCIAS)

Teniendo en cuenta que los puntos de seguridad garantizan ayuda en una emergencia se realiza inspección a los elementos que lo componen, se verifica cada botiquín que tenga los elementos que hacen parte de él, en buen estado y que tenga todos los elementos necesarios, al igual que se verifica que no se encuentren vencidos, se verifican las camillas que se encuentren en buen estado, y se verifican los extintores de que no estén sobrecargados o que se encuentren vencidos.

Toda esta revisión se hace para garantizarle al obrero que pueda haber una reacción adecuada y con los elementos necesarios en caso de presentarse una emergencia, todas estas revisiones se dejan por escrito en los formatos que se manejan dentro del consorcio.



Se realizaron inspecciones periódicas a los puntos de seguridad:

CL 8 37 A 26 LC 24 Y 26 CC ZARAGOZA PLAZA

- **Extintores:** presión, fecha de recarga, señalización y accesibilidad.
- **Botiquín de primeros auxilios:** dotación completa y vigencia de insumos.
- **Camilla:** estado físico, ubicación y disponibilidad.

GESTIÓN AMBIENTAL

Se socializaron y reforzaron las **políticas ambientales**, incluyendo:

- Manejo adecuado de residuos
- Separación en la fuente
- No arrojar residuos en áreas o zonas verdes
- Control de polvo y material particulado
- Uso racional del agua
- Prohibición de vertimientos y quemas
- Manejo adecuado de escombros
- Limpieza en obra

Durante las jornadas de capacitación se orientó casi a diario al personal sobre la importancia de el orden y aseo en la obra. esto incluye el no arrojar basuras en cualquier sitio, sino hacer uso de los sitios en los cuales se tiene previsto que lo hagan, no arrojar bolsas de cemento en cualquier parte para evitar la contaminación sino en los sitios de acopio destinados para esta tarea y manejar entre todos procesos de prevención de la contaminación, esto teniendo en cuenta que las actividades que se desarrollan dentro de la obra de una u otra forma tienden a dañar en cierta medida el medio ambiente y es nuestra responsabilidad, evitar que este daño se agrande, siendo apoyo en la prevención del daño.

PUNTOS DE ACOPIO BOLSAS DE CEMENTO



Se encuentran ubicadas en bodegas de almacenamiento de cada institución educativa

Dentro de la obra se han ubicado sitios específicos para que los empleados vayan ubicando allí todas las bolsas de cemento que van saliendo de las actividades en las cuales se utiliza.

Estas bolsas se van desocupando, se aplanan, se apilan y se amarran o se meten en bolsas de negras para ser entregadas al proveedor del cemento, quien hace la disposición final de estas bolsas, en las capacitaciones se enfatiza al personal y se les recomienda no arrojar estas bolsas en cualquier sitio y apoyar en el buen manejo de estas, teniendo en cuenta que, si se arrojan en cualquier parte y llueve, puede ser un foco de contaminación

Los sitios dentro de la obra que están destinados para guardar estas bolsas, se les dan a conocer a los obreros durante las capacitaciones, si se está trabajando en sitios donde no hay forma de tener un sitio cubierto para guardarlas, se meten en bolsas plásticas de una vez y se tratan de mantener alejadas del agua.

PUNTOS DE ACOPIO MATERIAL RESULTANTE DE LA OBRA





Cómo se manejan actividades en donde se debe hacer excavación para poder abrir zanjas y cunetas para construir lo que se requiere dentro de la obra, se saca material que se va organizando en ciertos sitios, que se destinan para acopiar allí, en los cuales se recolecta el material hasta que se cuente con la cantidad de material necesaria para poder hacer el retiro.

Cuando ya se tiene la cantidad de material se contrata las volquetas en las cuales se puede transportar hasta los sitios de disposición final de dicho material, mientras no se haya completado la cantidad requerida para hacer su traslado, se ubica en un sitio especifico, se señaliza el material y se trata de mantener lo más alejado posible de los estudiantes para evitar accidentes.

ORDEN Y ASEO EN OBRA



Todos los días al finalizar la jornada laboral se recogen las basuras que hayan quedado durante el día, se echan en el punto ecológico y se organizan las herramientas que se han usado en la obra, los obreros ayudan a realizar estas actividades para mantenerla en orden y aseo.

Cuando por las actividades no se puede hacer a diario la recolección de basuras y residuos de materiales, se hacen jornadas en las cuales se recoge todo lo que haya quedado sobrando y se organiza la obra, para poder tener todo en orden y evitar accidentes y contaminación.

Se organizan las bodegas donde se guarda material, se deja todo organizado, se

separar elementos y se organiza de forma que no se vayan a tener accidentes por desorden.

PUNTO DE HIDRATACION PARA EL PERSONAL



En sitios específicos de la obra se ubican los puntos de hidratación para el personal, para esto se utilizan termos en los cuales se mantiene el agua a temperatura adecuada para su consumo y el personal puede tomarla en el momento en que lo requiera, este punto se mantiene señalizado para que los obreros sepan en dónde está ubicado, en las capacitaciones también se les socializa dónde queda el punto para que en caso de qué necesiten tomar el agua lo puedan hacer.

OTRAS ACTIVIDADES EN OBRA

Durante el periodo del 11 de febrero al 10 de marzo se realizaron otras actividades en SST como son:

- Acompañamiento a actividades de alto riesgo
- Seguimiento a recomendaciones SST.
- Señalizaciones informativas en las zonas de actividad de obra.

De igual forma se realizaron análisis de trabajo seguro y se realizaron los permisos de trabajo para tareas a desarrollar en las cuales se requería este proceso, los mismos se dejaron documentados y firmados por el ingeniero y las personas que realizaron las tareas.

RELACION ATS Y PERMISOS DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO

INICIO	FIN	INSTITUCION	ACTIVIDADES
9/02/2026	14/02/2026	I.E. GERMAN PARDO GARCIA I.E CIUDAD LUZ I.E ALFONSO PALACIO RUDAS	TRABAJOS DE EXCAVACION FUNDICION EN CONCRETO CORTE Y FIGURADO DE ACERO
9/02/2026	14/02/2026	I.E. FRANCISCO DE PAULA	ACTIVIDADES DE EXCAVACION FUNDICIONES
16/02/2026	21/02/2026	I.E. FRANCISCO DE PAULA	EXCAVACIONES MANUALES, FIGURADO DE HIERRO FUNDICIONES EN CONCRETO
16/02/2026	21/02/2026	I.E. GERMAN PARDO GARCIA I.E CIUDAD LUZ I.E ALFONSO PALACIO RUDAS	DEMOLICION DE MURO CONCRETO Y LADRILLO FUNDICIONES EN CONCRETO
23/02/2026	28/02/2026	I.E. FRANCISCO DE PAULA	EXCAVACIONES MANUALES FUNDICIONES EN CONCRETO
23/02/2026	28/02/2026	I.E. GERMAN PARDO GARCIA I.E CIUDAD LUZ I.E ALFONSO PALACIO RUDAS	EXCAVACIONES MANUALES FIGURADO DE ACERO INSTALACION DE TUBERIA

Para el presente periodo se realizaron análisis de trabajo, seguro para las actividades que se iban a desarrollar dentro de la obra en cada Institución y se realizaron los permisos de trabajo que se requieren para cada actividad.

Durante la verificación de análisis de trabajo seguro se tuvo en cuenta el observar el tipo de actividad que se iba a desarrollar y las condiciones de cada una, para asimismo verificar que se tuviera la seguridad necesaria en el desarrollo de cada tarea.

Estos permisos de trabajo se organizaron en los formatos que maneja el consorcio, y allí firman los empleados que iban a hacer parte de cada tarea.

ACCIDENTES E INCIDENTES

Durante el periodo del 11 de febrero al 10 de marzo no se reportaron accidentes, se reportó 1 incidentes dentro de la obra por acto inseguro en la institución educativa Alfonso Palacio Rudas

- Accidentes laborales: 0
- Incidentes: 1

INDICES DE ACCIDENTABILIDAD

Registro de incidentes / accidentes de trabajo

Se cuenta con los Indicadores de Desempeño de SISOMA en el que registran los incidentes y accidentes ocurrido.

- INDICADORES DE SISOMA

INDICADOR	
Horas Hombre Trabajadas (Aplicable solo a 44 H. por semana)	**7.216 Horas**
Número de Trabajadores	**41**
Número de atenciones médicas comunes reportadas y días perdidos	***0***
Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas y días perdidos	***0***
Incidentes	**1**
Accidentes	**0**


CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas permitieron fortalecer la cultura de autocuidado, mejorar las condiciones de trabajo y reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales y afectaciones ambientales.

RECOMENDACIONES

- Mantener el uso permanente de EPP
- Continuar con las inspecciones
- Fortalecer la gestión ambiental
- Cumplir procedimientos seguros
- Reportar actos y condiciones insegura

Proyecto:



Alejandra Rocha Cardozo
ADM: Salud Ocupacional

PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

"CONSORCIO EDUCATIVO 2025"

NIT

901978294-4

CONTRATO DE OBRA N°2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025

PERSONAL ACTIVO FEBRERO-MARZO					
N°	No CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	FECHA RETIRO
1	7698841	JOSUE YAMIL SANCHEZ CLAROS	REP.LEGAL	11/11/2025	
2	1077867137	ALEJANDRA ROCHA CARDOZO	SST DE OBRA	25/11/2025	
3	7699652	JULIO CESAR PAEZ PEREZ	ING.RESIDENTE	26/11/2025	
4	17973997	ROBINSON EDUARDO ARANGO URREGO	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025	
5	1063956269	EDINSON FABIAN CUETO MORALES	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025	
6	1063957461	ANDRES AUGUSTO ROJANO CANTILLO	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025	
7	91481383	HECTOR RAUL HURTADO CASTELLANOS	AYUDANTE DE OBRA	27/11/2025	
8	70162660	TOBIAS PUCHANA	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2026	
9	5983933	YOLJAN LUIS RON ALCALA	AYUDANTE DE OBRA	3/12/2025	14/02/2026
10	1006119248	GUSTAVO ADOLFO VARON VARON	AYUDANTE DE OBRA	3/12/2025	
11	1126254982	MARHLON STEVEN VILLAFAÑE BORJA	AYUDANTE DE OBRA	5/12/2025	28/02/2026
12	1006157023	JUAN PABLO MEJIA LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	13/12/2025	16/02/2026
13	1114150223	EDWIN ALEXANDER MOLANO	AYUDANTE DE OBRA	18/12/2025	
14	3173990	LUIS ALBERTO BENAVIDES CAÑAS	AYUDANTE DE OBRA	6/01/2026	
15	1075320161	JULIAN ANDRES MEDINA SANCHEZ	ARQUITECTO	6/01/2026	
16	12139184	WILLIAM MARIN PERDOMO	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026	
17	7706902	FAIBER MACIAS RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026	
18	12196195	LUIS ALFONSO ARBELAEZ VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026	
19	1077293662	SANTIAGO DIAZ PEDREROS	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2026	
20	92546096	JOSE DE JESUS LONDOÑO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2026	
21	1001805346	LUIS MAURICIO MORENO PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	11/01/2026	
22	7693479	ALEXANDER MACIAS RAMIRES	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2026	
23	1077227113	WILLIAM CAMILO MARIN PALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	12/01/2026	
24	14296642	WILLIAN FERNANDO RAMIREZ MARIN	AYUDANTE DE OBRA	12/01/2026	
25	93123995	JAIME GOMEZ BARRERO	AYUDANTE DE OBRA	14/01/2026	
26	5406603	WILLY ALEXANDER BAUDIN	AYUDANTE DE OBRA	14/01/2026	
28	7715701	MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO	INGENIERO	16/01/2026	
29	1070919135	ARLEX LOZANO VALDERRAMA	AYUDANTE DE OBRA	17/01/2026	6/03/2026
30	1005712602	HASWUER ESTIVEN TORO GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	19/01/2026	
31	83220729	YESID GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	20/01/2026	
34	1025528245	BRAYAN STIVEN CASTRO ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2026	
36	1104545793	JHON SEBASTIAN MONTAÑEZ GUEVARA	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2026	10/03/2026
38	1110530303	LEONARDO ANDRES BERMUDEZ ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	23/01/2026	3/03/2026
39	1022322674	YERSIN LEON	TOPOGRAFO	29/01/2026	
40	1118470164	EDWIN CARVAJAL TIQUE	AYUDANTE DE OBRA	26/01/2026	
42	1049629164	WILSON FORERO	AYUDANTE DE OBRA	27/01/2026	
45	1070598523	ANDRES FELIPE HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	2/02/2026	6/03/2026
46	14295343	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	5/02/2026	24/02/2026
47	83168019	JOSE KENNEDY ROMERO	AYUDANTE DE OBRA	5/02/2026	
48	1065604210	HECTOR RAUL HURTADO ESPAÑOL	AYUDANTE DE OBRA	7/02/2026	
49	1105670420	JHON STIVEN ALARCON	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2026	
50	1006504174	JUAN SEBASTIAN CORRALES	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2026	
51	93238563	DIEGO FERNANDO RONDON	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	19/02/2026
52	11079744832	JOSUE DANIEL BROCHERO	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2026	2/03/2026
53	1110527003	PEDRO LUIS CASTRO	AYUDANTE DE OBRA	23/02/2026	28/02/2026
54	93349331	PEDRO JOSE LOZANO	AYUDANTE DE OBRA	3/03/2026	
55	93396346	CARLOS IVAN MORENO	AYUDANTE DE OBRA	4/03/2026	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7705266
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DANIEL RICARDO PAZ CARRILLO	PAZ CARRILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 8D 27-37	TELÉFONO:	8622229
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**60081113 75**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		28			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		215123347

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 285.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 285.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 223.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 223.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 9.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 517.800**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901347937	4	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CL 7 B 46 43		6632563			VALENROMERO98@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36621227	E	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	859.200	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36621227	2026-03-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	HSC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1726895	MORENO HUERTAS JOSE SALOMON	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	9.266	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1202001
2	CC 93123714	ROMERO SANDOVAL LUIS FERNANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	9.266	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1620201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901347937	4	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CL 7 B 46 43		6632563			VALENROMERO98@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36621227	E	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	859.200	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36621227	2026-03-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.501.810	3.501.810	3.501.810	3.501.810	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	560.400	0	0	0	560.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.400	0	0	0	560.400
EPS(Administradoras: 1)				2	140.200	0	0	0	140.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	140.200	0	0	0	140.200
ARP(Administradoras: 1)				2	18.400	0	0	0	18.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	18.400	0	0	0	18.400
CCF(Administradoras: 1)				2	140.200	0	0	0	140.200
COFREM	CCF34	892000146	3	2	140.200	0	0	0	140.200

Gran Total	859.200	0	0	0	859.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36871542
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901978294	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 8 37 A 26	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUCIVILAALIADA@HOTAIL.COM	TELÉFONO	2088737773
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7698841	PRIMER APELLIDO	SANCHEZ	SEGUNDO APELLIDO	CLAROS
PRIMER NOMBRE	JOSUE	SEGUNDO NOMBRE	YAMIL		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
49		$60.178.785		36871542

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1105670420	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	ALARCON ARANGO JHON STIVEN	$1.750.905
CC-17973997	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	ARANGO URREGO ROBINSON EDUARDO	$1.750.905
CC-12196195	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	ARBELAEZ VARGAS LUIS ALFONSO	$1.750.905
PT-5406603	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	BAUDIN WILLY ALEXANDER	$1.750.905
CC-3173990	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	BENAVIDES CAÑAS LUIS ALBERTO	$1.750.905
CC-1110530303	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	BERMUDEZ ALFONSO LEONARDO ANDRES	$1.750.905
CC-1107974832	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	BROCHERO MAHECHA JOSUE DANIEL	$1.750.905
CC-93456853	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	CARDENAS GARZON JOHANATAN	$1.750.905
CC-1110553660	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	CARDENAS LUGO JULIAN HUMBERTO	$1.750.905
CC-1118470164	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	CARVAJAL TIQUE EDWIN	$1.750.905
CC-1110527003	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	CASTRO DOMINGUEZ PEDRO LUIS	$1.750.905
CC-1025528245	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	CASTRO ROJAS BRAYAN ESTIBEN	$1.750.905
CC-1006504174	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	CORRALES JUAN SEBASTIAN	$1.750.905
CC-1063956269	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	CUETO MORALES EDINSON FABIAN	$1.750.905
CC-1077293662	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	DIAZ PEDREROS SANTIAGO	$1.750.905
CC-1049629164	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	FORERO VALDERRAMA WILSON ANDRES	$1.750.905
CC-83220729	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	GARCIA YESID	$1.750.905
CC-93123995	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	GOMEZ BARRERO JAIME	$1.750.905
CC-1000757215	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	HENAO JULIO CESAR AUGUSTO	$1.750.905
CC-1070598523	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	HERNANDEZ PERDOMO ANDRES FELIPE	$1.750.905
CC-91481383	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	HURTADO CASTELLANOS HECTOR RAUL	$1.750.905
CC-1065604210	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	HURTADO ESPAÑOL HECTOR RAUL	$1.750.905
CC-92546096	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	LONDOÑO QUINTERO JOSE DE JESUS	$1.750.905
CC-1110573860	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	LOPEZ BARRETO JEISON ANDRES	$1.750.905
CC-1070919135	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	LOZANO VALDERRAMA ARLEX	$1.750.905
CC-7693479	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	MACIAS RAMIREZ ALEXANDER	$1.750.905
CC-7706902	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	MACIAS RAMIREZ FAIBER	$1.750.905
CC-1077227113	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	MARIN PALENCIA WILLIAM CAMILO	$1.750.905
CC-12139184	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	MARIN PERDOMO WILLIAM	$1.750.905
CC-1075320161	01	No	No	No	41	1	4429001	Fijo	MEDINA SANCHEZ JULIAN ANDRES	$1.750.905
CC-1114150223	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	MOLANO EDWIN ALEXANDER	$1.750.905
CC-1104545793	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	MONTAÑEZ GUEVARA JHON SEBASTIAN	$1.750.905
CC-1001805346	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	MORENO PEREZ LUIS MAURICIO	$1.750.905
CC-7699652	01	No	No	No	41	1	4429001	Fijo	PAEZ PEREZ JULIO CESAR	$4.500.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-70162660	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	PUCHANA URBINA TOBIAS FELIX	$1.750.905
CC-1104697256	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	QUINTERO RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	$1.750.905
CC-14296642	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	RAMIREZ MARIN WILLIAM FERNANDO	$1.750.905
CC-1077867137	01	No	No	No	41	1	4429001	Fijo	ROCHA CARDOZO ALEJANDRA	$1.750.905
CC-14295343	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	$1.750.905
CC-1108232090	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	RODRIGUEZ BARRETO JUAN PABLO	$1.750.905
CC-1063957461	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	ROJANO CANTILLO ANDRES AUGUSTO	$1.750.905
CC-83168019	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	ROMERO AVILES JOSE KENNEDY	$1.750.905
CC-93238563	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	RONDON URREGO DIEGO FERNANDO	$1.750.905
CC-7698841	01	No	No	No	41	1	4429001	Fijo	SANCHEZ CLAROS JOSUE YAMIL	$1.750.905
CC-7715701	01	No	No	No	41	1	4429001	Fijo	SANCHEZ MOYANO MANUEL RICARDO	$1.750.905
CC-1022322674	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	SORIA LEON YERSIN JAIR	$1.750.905
CC-1005712602	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	TORO GOMEZ HASWUER ESTIVEN	$1.750.905
CC-1006121624	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	TORRES GARZON BRAYAN STEVEN	$1.750.905
CC-1006119248	01	No	No	No	73	1	4429001	Fijo	VARON VARON GUSTAVO ADOLFO	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1105670420	X	2026-02-16	X	2026-02-17																									0		
CC - 17973997																													0		
CC - 12196195																													0		
PT - 5406603																													0		
CC - 3173990																													0		
CC - 1110530303			X	2026-02-19																									0		
CC - 1107974832	X	2026-02-20	X	2026-02-24																									0		
CC - 93456853	X	2026-02-16	X	2026-02-16																									0		
CC - 1110553660	X	2026-02-20	X	2026-02-20																									0		
CC - 1118470164																													0		
CC - 1110527003	X	2026-02-21	X	2026-02-24																									0		
CC - 1025528245																													0		
CC - 1006504174	X	2026-02-19																											0		
CC - 1063956269																													0		

NOVEDADES																																	
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1077293662																													0		
CC - 1049629164																													0		
CC - 83220729																													0		
CC - 93123995																													0		
CC - 1000757215	X	2026-02-19	X	2026-02-19																									0		
CC - 1070598523	X	2026-02-02	X	2026-02-11																									0		
CC - 91481383																													0		
CC - 1065604210	X	2026-02-05																											0		
CC - 92546096																													0		
CC - 1110573860	X	2026-02-24	X	2026-02-24																									0		
CC - 1070919135			X	2026-02-10																									0		
CC - 7693479																													0		
CC - 7706902																													0		
CC - 1077227113			X	2026-02-10																									0		
CC - 12139184																													0		
CC - 1075320161																													0		
CC - 1114150223																													0		
CC - 1104545793			X	2026-02-06																									0		
CC - 1001805346																													0		
CC - 7699652																													0		
CC - 70162660	X	2026-02-12																											0		
CC - 1104697256	X	2026-02-20	X	2026-02-20																									0		
CC - 14296642																													0		
CC - 1077867137																													0		
CC - 14295343	X	2026-02-05	X	2026-02-10																									0		
CC - 1108232090	X	2026-02-09	X	2026-02-09																									0		
CC - 1063957461																													0		
CC - 83168019	X	2026-02-05																											0		
CC - 93238563	X	2026-02-18	X	2026-02-18																									0		
CC - 7698841																													0		
CC - 7715701																													0		
CC - 1022322674																													0		
CC - 1005712602			X	2026-02-06																									0		
CC - 1006121624	X	2026-02-05	X	2026-02-05																									0		
CC - 1006119248																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1105670420	PORVENIR	8	$466.908	0.1600000	$74.800	$0	$0	$74.800	$0	$0	$0
CC - 17973997	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 12196195	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
PT - 5406603	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 3173990	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1110530303	PORVENIR	10	$583.635	0.1600000	$93.400	$0	$0	$93.400	$0	$0	$0
CC - 1107974832	PORVENIR	5	$291.818	0.1600000	$46.700	$0	$0	$46.700	$0	$0	$0
CC - 93456853	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1110553660	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1118470164	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1110527003	PORVENIR	4	$233.454	0.1600000	$37.400	$0	$0	$37.400	$0	$0	$0
CC - 1025528245	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1006504174	PORVENIR	21	$1.225.634	0.1600000	$196.200	$0	$0	$196.200	$0	$0	$0
CC - 1063956269	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1077293662	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1049629164	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 83220729	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 93123995	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1000757215	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1070598523	PORVENIR	10	$583.635	0.1600000	$93.400	$0	$0	$93.400	$0	$0	$0
CC - 91481383	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1065604210	PORVENIR	23	$1.342.361	0.1600000	$214.800	$0	$0	$214.800	$0	$0	$0
CC - 92546096	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1110573860	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1070919135	PORVENIR	10	$583.635	0.1600000	$93.400	$0	$0	$93.400	$0	$0	$0
CC - 7693479	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 7706902	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1077227113	COLPENSIONES	10	$583.635	0.1600000	$93.400	$0	$0	$93.400	$0	$0	$0
CC - 12139184	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1075320161	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1114150223	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1104545793	PORVENIR	8	$466.908	0.1600000	$74.800	$0	$0	$74.800	$0	$0	$0
CC - 1001805346	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7699652	COLPENSIONES	30	$4.500.000	0.1600000	$720.000	$0	$0	$720.000	$0	$0	$0
CC - 70162660	COLPENSIONES	19	$1.108.907	0.1600000	$177.500	$0	$0	$177.500	$0	$0	$0
CC - 1104697256	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 14296642	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1077867137	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 14295343	PORVENIR	6	$350.181	0.1600000	$56.100	$0	$0	$56.100	$0	$0	$0
CC - 1108232090	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1063957461	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 83168019	PORVENIR	26	$1.517.451	0.1600000	$242.800	$0	$0	$242.800	$0	$0	$0
CC - 93238563	COLFONDOS	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 7698841	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 7715701	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1022322674	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1005712602	PORVENIR	6	$350.181	0.1600000	$56.100	$0	$0	$56.100	$0	$0	$0
CC - 1006121624	COLPENSIONES	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1006119248	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1105670420	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$466.908	0.0400000	$18.700	$0	0	$0	0	$0	8	$466.908	542100 2	0.0696000	$32.500
CC - 17973997	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900
CC - 12196195	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900
PT - 5406603	SAVIA SALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 3173990	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900
CC - 1110530303	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$583.635	0.0400000	$23.400	$0	0	$0	0	$0	10	$583.635	542100 2	0.0696000	$40.700
CC - 1107974832	FAMISANAR	5	$291.818	0.0400000	$11.700	$0	0	$0	0	$0	5	$291.818	542100 2	0.0696000	$20.400
CC - 93456853	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	542100 2	0.0696000	$4.100
CC - 1110553660	SANITAS	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	542100 2	0.0696000	$4.100
CC - 1118470164	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900
CC - 1110527003	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$233.454	0.0400000	$9.400	$0	0	$0	0	$0	4	$233.454	542100 2	0.0696000	$16.300
CC - 1025528245	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900
CC - 1006504174	NUEVA E.P.S. S.A.	21	$1.225.634	0.0400000	$49.100	$0	0	$0	0	$0	21	$1.225.634	542100 2	0.0696000	$85.400
CC - 1063956269	EPS PROTEGER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1077293662	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5421002	0.0696000	$121.900
CC - 1049629164	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5421002	0.0696000	$121.900
CC - 83220729	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5421002	0.0696000	$121.900
CC - 93123995	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5421002	0.0696000	$121.900
CC - 1000757215	SAVIA SALUD	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	5421002	0.0696000	$4.100
CC - 1070598523	SALUD TOTAL	10	$583.635	0.0400000	$23.400	$0	0	$0	0	$0	10	$583.635	5421002	0.0696000	$40.700
CC - 91481383	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5421002	0.0696000	$121.900
CC - 1065604210	EPS PROTEGER	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	$0	0	$0	0	$0	23	$1.342.361	5421002	0.0696000	$93.500
CC - 92546096	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5421002	0.0696000	$121.900
CC - 1110573860	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	5421002	0.0696000	$4.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1070919135	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$583.635	0.0400000	$23.400	$0	0	$0	0	$0	10	$583.635	54210002	0.0696000	$40.700
CC - 7693479	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	54210002	0.0696000	$121.900
CC - 7706902	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	54210002	0.0696000	$121.900
CC - 1077227113	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$583.635	0.0400000	$23.400	$0	0	$0	0	$0	10	$583.635	54210002	0.0696000	$40.700
CC - 12139184	MIN002 - ADRES	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	54210002	0.0696000	$121.900
CC - 1075320161	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	54210002	0.0696000	$121.900
CC - 1114150223	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	54210002	0.0696000	$121.900
CC - 1104545793	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$466.908	0.0400000	$18.700	$0	0	$0	0	$0	8	$466.908	54210002	0.0696000	$32.500
CC - 1001805346	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	54210002	0.0696000	$121.900
CC - 7699652	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.500.000	0.0400000	$180.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.500.000	54210002	0.0696000	$313.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 70162660	SANITAS	19	$1.108.907	0.0400000	$44.400	$0	0	$0	0	$0	19	$1.108.907	542100 2	0.0696000	$77.200
CC - 1104697256	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	542100 2	0.0696000	$4.100
CC - 14296642	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900
CC - 1077867137	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900
CC - 14295343	SALUD TOTAL	6	$350.181	0.0400000	$14.100	$0	0	$0	0	$0	6	$350.181	542100 2	0.0696000	$24.400
CC - 1108232090	SANITAS	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	542100 2	0.0696000	$4.100
CC - 1063957461	EPS PROTEGER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900
CC - 83168019	NUEVA E.P.S. S.A.	26	$1.517.451	0.0400000	$60.700	$0	0	$0	0	$0	26	$1.517.451	542100 2	0.0696000	$105.700
CC - 93238563	SALUD TOTAL	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	542100 2	0.0696000	$4.100
CC - 7698841	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542100 2	0.0696000	$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7715701	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	54210002	0.0696000	$121.900
CC - 1022322674	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	54210002	0.0696000	$121.900
CC - 1005712602	SANITAS	6	$350.181	0.0400000	$14.100	$0	0	$0	0	$0	6	$350.181	54210002	0.0696000	$24.400
CC - 1006121624	FAMISANAR	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	54210002	0.0696000	$4.100
CC - 1006119248	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	54210002	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1105670420	COMFATOLIMA	8	$466.908	0.0400000	$18.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-17973997	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12196195	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5406603	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-3173990	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110530303	COMFATOLIMA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1107974832	COMFATOLIMA	5	$291.818	0.0400000	$11.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93456853	COMFATOLIMA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110553660	COMFATOLIMA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1118470164	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1110527003	COMFATOLIMA	4	$233.454	0.0400000	$9.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1025528245	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006504174	COMFATOLIMA	21	$1.225.634	0.0400000	$49.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063956269	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077293662	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049629164	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83220729	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93123995	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000757215	COMFATOLIMA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1070598523	COMFATOLIMA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91481383	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065604210	COMFATOLIMA	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92546096	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110573860	COMFATOLIMA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1070919135	COMFATOLIMA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7693479	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7706902	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077227113	COMFATOLIMA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12139184	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075320161	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1114150223	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104545793	COMFATOLIMA	8	$466.908	0.0400000	$18.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001805346	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7699652	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.500.000	0.0400000	$180.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-70162660	COMFATOLIMA	19	$1.108.907	0.0400000	$44.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104697256	COMFATOLIMA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14296642	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077867137	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14295343	COMFATOLIMA	6	$350.181	0.0400000	$14.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1108232090	COMFATOLIMA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063957461	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83168019	COMFATOLIMA	26	$1.517.451	0.0400000	$60.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93238563	COMFATOLIMA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7698841	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7715701	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022322674	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005712602	COMFATOLIMA	6	$350.181	0.0400000	$14.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006121624	COMFATOLIMA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006119248	COMFATOLIMA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	8	$2.121.100	$0	$0	$0	$0	6	$8.200	$0	$0	$2.129.300
PROTECCION	5	$1.401.000	$0	$0	$0	$0	6	$5.500	$0	$0	$1.406.500
PORVENIR	32	$5.259.100	$0	$0	$0	$0	6	$20.300	$0	$0	$5.279.400
COLFONDOS	4	$850.000	$0	$0	$0	$0	6	$3.300	$0	$0	$853.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	2	$14.100	$0	0	$0	0	$0	$14.100	6	$100	$0	$14.200	$0	0	$0	$0	$14.200	$0	$0	$14.200
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	6	$300	$0	$70.400	$0	0	$0	$0	$70.400	$0	$0	$70.400
SAVIA SALUD	2	$72.500	$0	0	$0	0	$0	$72.500	6	$300	$0	$72.800	$0	0	$0	$0	$72.800	$0	$0	$72.800
MIN002 - ADRES	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	6	$300	$0	$70.400	$0	0	$0	$0	$70.400	$0	$0	$70.400
EPS-S COOSALUD	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	6	$300	$0	$70.400	$0	0	$0	$0	$70.400	$0	$0	$70.400
SANITAS	10	$483.900	$0	0	$0	0	$0	$483.900	6	$1.900	$0	$485.800	$0	0	$0	$0	$485.800	$0	$0	$485.800
NUEVA E.P.S. S.A.	18	$1.005.100	$0	0	$0	0	$0	$1.005.100	6	$3.900	$0	$1.009.000	$0	0	$0	$0	$1.009.000	$0	$0	$1.009.000
EPS PROTEGER	3	$193.900	$0	0	$0	0	$0	$193.900	6	$800	$0	$194.700	$0	0	$0	$0	$194.700	$0	$0	$194.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	$250.100	$0	0	$0	0	$0	$250.100	6	$1.000	$0	$251.100	$0	0	$0	$0	$251.100	$0	$0	$251.100
SALUD TOTAL	5	$180.100	$0	0	$0	0	$0	$180.100	6	$700	$0	$180.800	$0	0	$0	$0	$180.800	$0	$0	$180.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	49	$4.190.500	0	$0	$0	$4.190.500	6	$16.200	$4.206.700	0	$0	$0	$4.206.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFATOLIMA	44	$1.949.600	6	$7.600	$1.957.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$460,400	6	$1.800	$462.200
SENA	0	$0	6	$0	$0
ICBF	0	$0	6	$0	$0
ESAP	0	$0	6	$0	$0
MinEdu	0	$0	6	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	10	$2.419.600
PENSIONES	4	$9.668.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$4.206.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$2.419.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$18.714.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36690471
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA CIVIL ALIADAS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901124948	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	NEIVA	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7020	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUCIVILALIADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8747568
FAX	8747568	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55165964	PRIMER APELLIDO	ARANGUEN	SEGUNDO APELLIDO	MENDEZ
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	ZULEMA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$3.501.810		36690471

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-55165964	01	No	No	No	41	1	2821101	Fijo	ARANGUREN MENDEZ MARIA ZULEMA	$1.750.905
CC-1004248970	01	No	No	No	41	1	2821101	Fijo	PLAZA PAJOY ELICIA	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 55165964																													0		
CC - 1004248970																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 55165964	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1004248970	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 55165964	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5	0.0052200	$9.200
CC - 1004248970	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	2	0.0104400	$18.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-55165964	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004248970	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$560.400	$0	$0	$0	$0	19	$6.900	$0	$0	$567.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$140.200	$0	0	$0	0	$0	$140.200	19	$1.800	$0	$142.000	$0	0	$0	$0	$142.000	$0	$0	$142.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$27.500	0	$0	$0	$27.500	19	$400	$27.900	0	$0	$275	$27.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$140.200	19	$1.800	$142.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$142.000
PENSIONES	1	$567.300

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	$27.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$142.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$879.200
