
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
0		**ADECUACIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO SALA DEL PENSAMIENTO EN EL PISO 5 EN LA TORRE A DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO**	**132 días?**		**vie 17/10/25**	**jue 30/04/26**
1		**ETAPA PRECONTRACTUAL**	0 días		vie 17/10/25	vie 17/10/25
2		**INICIO DE ETAPA CONTRACTUAL**	0 días		mié 17/12/25	mié 17/12/25
3		**ACTIVIDADES PARA EL ALCANCE DE $ 241.965.741,00**	**92 días?**		**mié 17/12/25**	**jue 30/04/26**
4		**ACTIVIDADES CIVILES Y DE ACABADOS**	**91,88 días?**		**mié 17/12/25**	**jue 30/04/26**
5		Desmonte y acarreo de puertas en vidrio con marcos de aluminio	2 días	80	jue 18/12/25	vie 19/12/25
6		Desmonte de ventanas en vidrio con marco en acero (si la hoja mide más de 2m2 se contará como una unidad independiente)	2 días	62	mié 31/12/25	vie 2/01/26
7		Demolición manual de muros 0.15m de bloque de cemento	2 días	6	lun 5/01/26	mar 6/01/26
8		Desmonte de lamparas 30x100	2 días	7FC-1 día	mar 6/01/26	mié 7/01/26
9		Demolición alfajias en concreto reforzado	2 días	8	jue 8/01/26	vie 9/01/26
10		Desmonte red eléctrica existente (incluye desmote de tableros existentes, tomacorrientes, cableado, canaletas, etc.).	3 días	9	mar 13/01/26	jue 15/01/26
11		Levante de muro en bloque de concreto 5 Mpa 9 * 19 * 39	5 días	10	vie 16/01/26	jue 22/01/26
12		Suministro en instalación de Piso de vinilo tipo tableta de 2 mm Tablón Nuez	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
13		Pañete allanado en mortero 1:4 1 cara	3 días	11	vie 23/01/26	mar 27/01/26
14		Pañete allanado en mortero 1:4 para filos	3 días	13CC	vie 23/01/26	mar 27/01/26

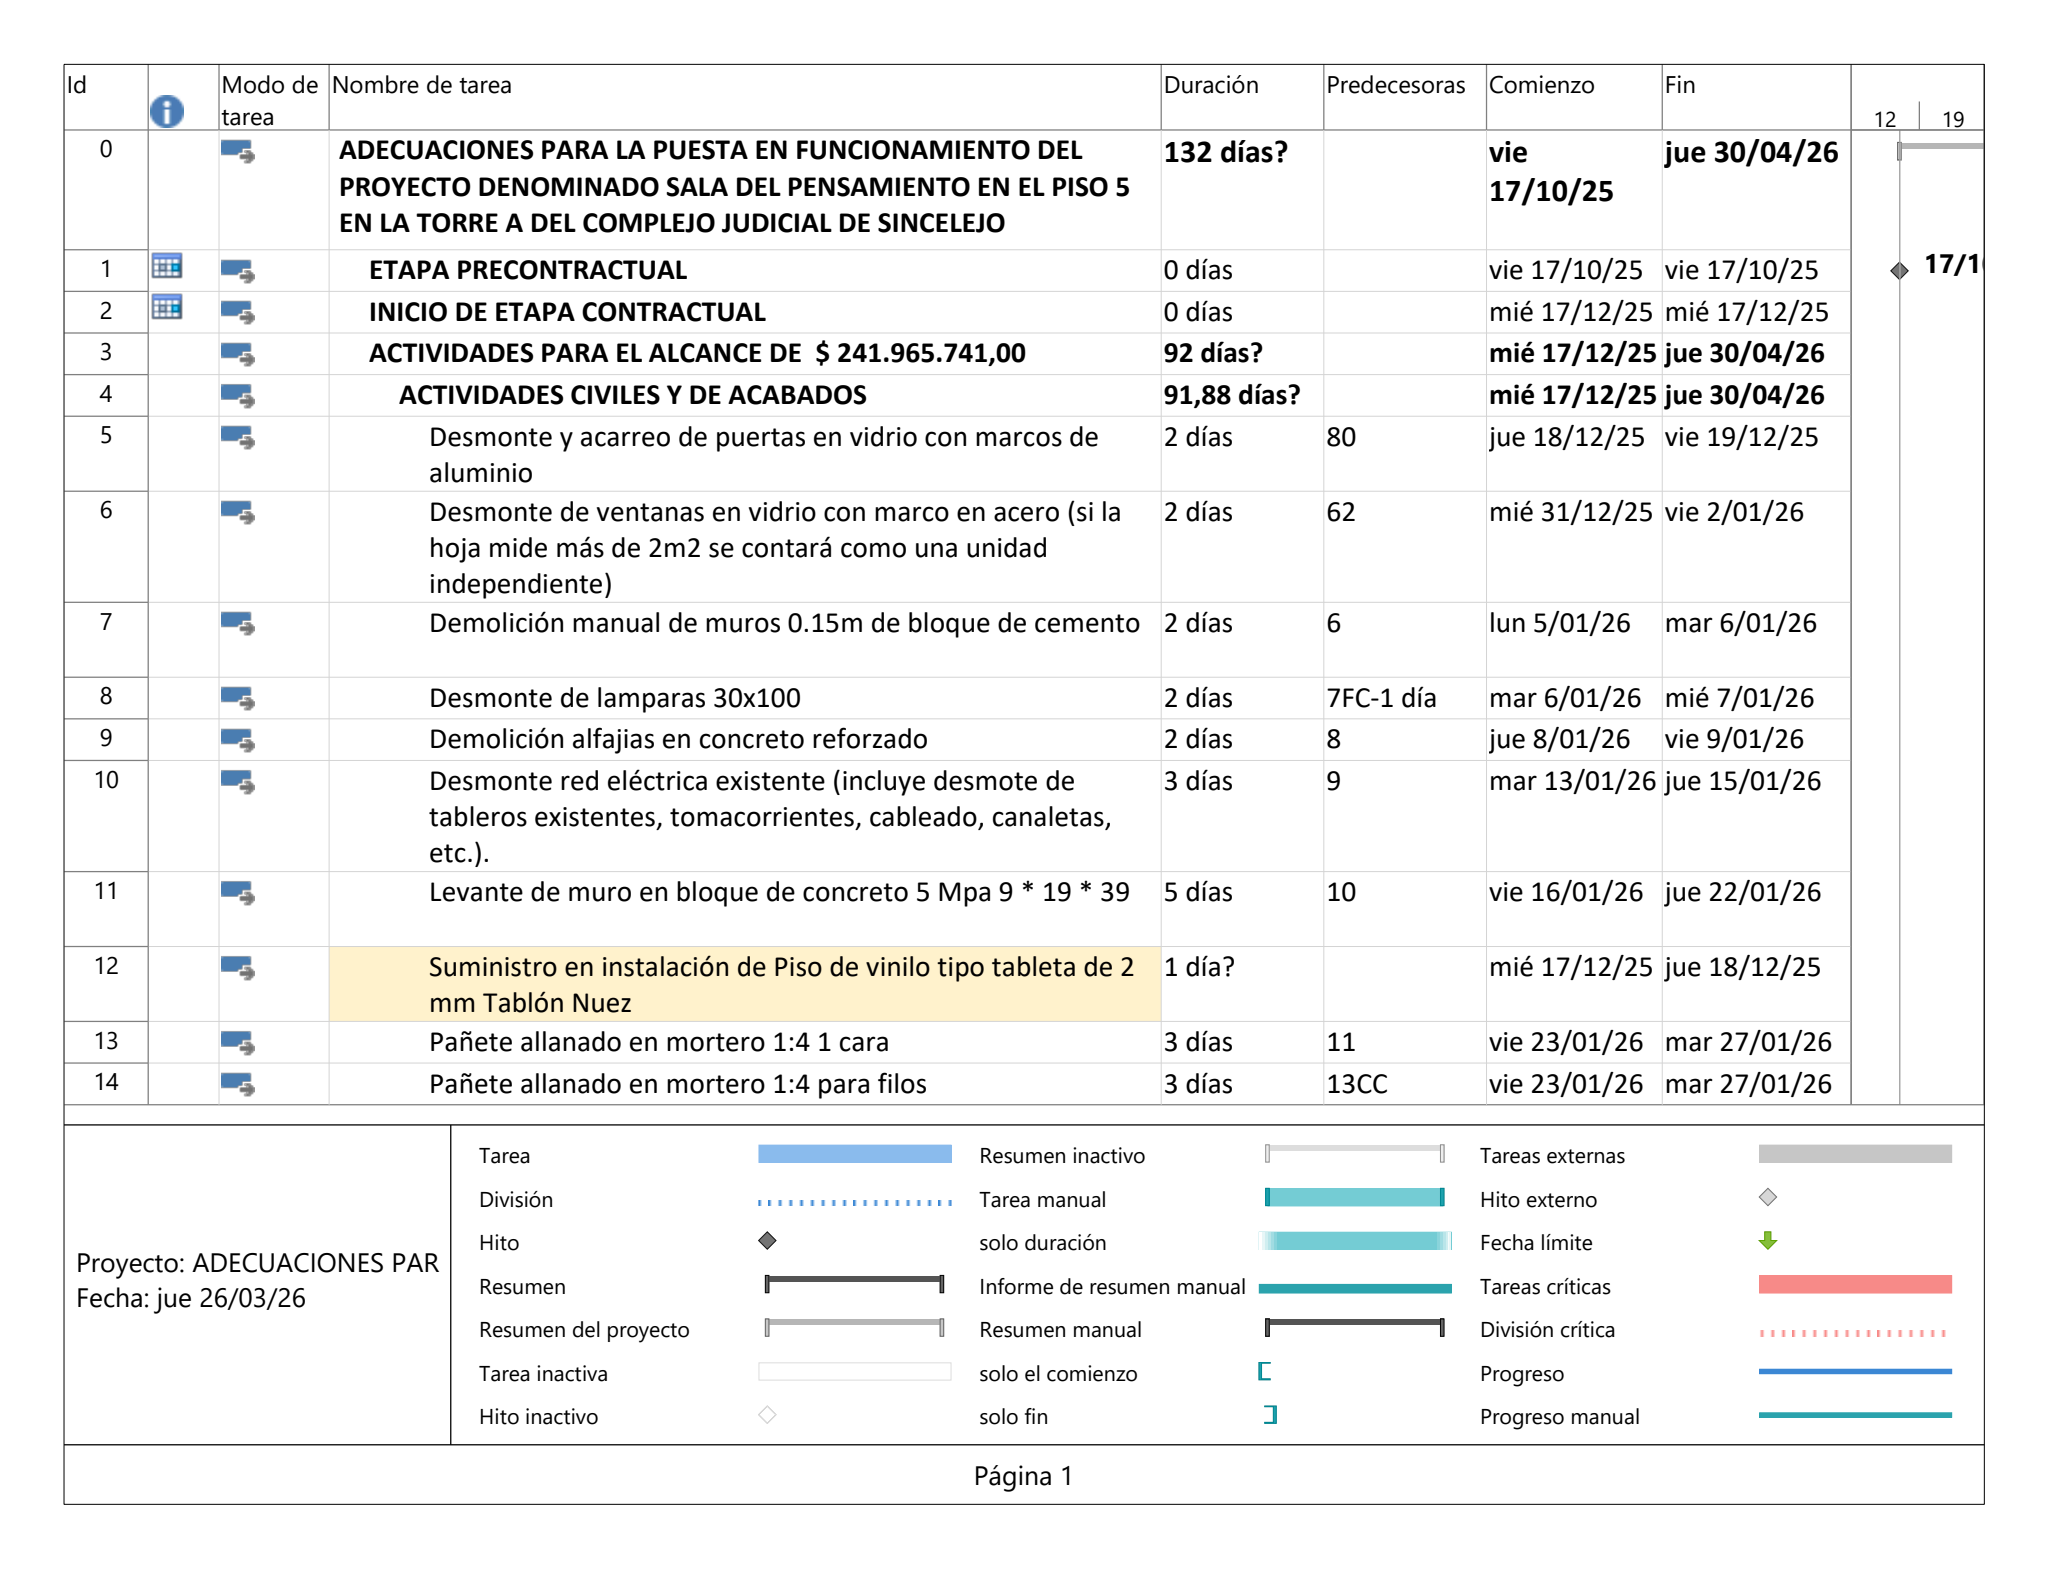

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
15		Suministro y aplicación de estuco plástico en muros interiores color blanco en pared	3 días	14	mié 28/01/26	vie 30/01/26
16		Pintura tipo 1 sobre muros, aplicación de 3 manos color institucional	2 días	15FC-1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26
17		Suministro de plantas ornamentales. Incluye maceta, abono, rodachines y plato recolector	1 día	16	lun 2/02/26	lun 2/02/26
18		Cielo raso en panel PVC especificación 50% PVC (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre-aislante térmico acústico-auto estinguible-resistente a hongos-bacterias-no condultor de electricidad)	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
19		Perfil perimetral corniza PVC	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
20		Suministro e instalación de muro verde artificial en relieve tipo Jardín vertical artificial flores tropicales formato 50x100 cm	2 días	17	mar 3/02/26	mié 4/02/26
21		Suministro e instalación de sillón reclinable confort	1 día	20	jue 5/02/26	jue 5/02/26
22		Suministro e instalación de piso en grama sintética green garden 30 mm alto tráfico (incluye pegante)	5 días	20	jue 5/02/26	mié 11/02/26
23		Suministro e instalación de Mesa auxiliar Everett 63x39x30 Onix Blanco	1 día	21	vie 6/02/26	vie 6/02/26
24		Árbol Central, compuesto por 32 paneles entamborados de 260cm*180cm y grosor de 4cm, con caras externas en lámina fondo DURATEX AMARETTO de 5.5mm, con núcleo interno en MDF de 30mm y contorno en canto Rígido, 8 de los cuales con cinta de luz led cálida de	1 día	23CC	vie 6/02/26	vie 6/02/26

12 19

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin	12 19
25		Suministro de bolsa de boxeo 23 kg, incluye 2 pares de guantes (1 par de hombre y 1 de mujer) y estructura para su correcta instalación	1 día	24CC	vie 6/02/26	vie 6/02/26	
26		Suministro e instalación de cabina de oficina tipo pod acustica insonora movil antiestres con indicador en luces led 1.00x1.20 diseño contemporáneo. Colores a elegir x 2.23 m. Incluye esmerilado en vidrio de puerta y silla ajustable y ventilador con su re	15 días	78FC+5 días	vie 10/04/26	jue 30/04/26	
27		Construcción de gradas del pensamiento, incluye acabados, estructura, arcos y demas de acuerdo a diseño	3 días	22	jue 12/02/26	lun 16/02/26	
28		Suministro e instalación de módulos divisorios en madera y nylon piso-techo , incluye punto de anclaje. Colores a elegir.	2 días	25CC	vie 6/02/26	lun 9/02/26	
29		Suministro e instalación de lampara Pie Bissen 1 luz E 27	1 día	28CC	vie 6/02/26	vie 6/02/26	
30		Suministro e instalación de Puerta corrediza en panel maderable recuebierto en wpc 1.50x2.40 1 hoja	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25	
31		Suministro e instalación de ventanas corredizas en vidrio templado laminado con tratamiento acustico y solar VPH COOL LITE 120, estructura de soporte en perfil negro, incluye todos los elementos necesarios para instalar. Altura 2.3m	2 días	29	lun 9/02/26	mar 10/02/26	

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
32		Aviso motivacional en acrilico volumétrico luminoso 100x66 cm; acrilico dorado espejo, volumetrico con relieve 4 cm, flotante para efecto de retroiluminación con luces led modulares de alta intensidad , fuente de voltaje	1 día	31	mié 11/02/26	mié 11/02/26
33		Suministro e instalación de protectores en acero de ventanas altira 2.30 m	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
34		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de fuente de agua vertical caida en cascada ancho 3 m alto 2 m	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
35		Suministro e instalación de sistema de sonido ambiental e institucional integrado, tipo 2.1, con control central y periféricos de audio	2 días	31CC	lun 9/02/26	mar 10/02/26
36		Suministro e instalación de alfombra autoadhesiva	2 días	35	mié 11/02/26	jue 12/02/26
37		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELÉCTRICOS, AIRE Y DATOS**	**57,88 días?**		**mié 17/12/25**	**mar 10/03/26**
38		Salida normal para tomacorriente doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	2 días	46	jue 5/02/26	vie 6/02/26
39		Salida regulada para tomacorriente naranja doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente naranja, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	2 días	38CC	jue 5/02/26	vie 6/02/26

12 | 19

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
40		Salida de iluminación. Incluye cola en cable encauchetado de 3*14 AWG, tomas aéreas, prensa estopas, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	2 días	38CC	jue 5/02/26	vie 6/02/26
41		Salida para interruptor triple inteligente con luz indicadora circular.	2 días	38CC	jue 5/02/26	vie 6/02/26
42		Salida para interruptor cuádruple inteligente con luz indicadora circular.	2 días	38CC	jue 5/02/26	vie 6/02/26
43		Cable de cobre alimentador libre de halógenos 3*#14 AWG (Tres hilos de cable monopolar #14 AWG) en tubería EMT de 1/2". Incluye marcación de tubería cada m, curvas EMT, conectores, uniones, terminales, cajas con tapas, elemento estructurales para soportes	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
44		Cable de cobre alimentador libre de halógenos (#12 F + # 12 N + #12 T) AWG en tubería EMT de 1/2". Incluye marcación de tubería cada m, curvas EMT, conectores, uniones, terminales, cajas con tapas, elemento estructurales par soportes de la tubería y demás	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
45		Cable de cobre alimentador libre de halógenos (#12 F + # 12 N + #12 T) AWG en tubería PVC de 1/2". Incluye marcación de tubería cada m, curvas EMT, conectores, uniones, terminales, cajas con tapas, elemento estructurales par soportes de la tubería y demás	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
46		Regata, resane y pintura	3 días	16	lun 2/02/26	mié 4/02/26
47		Luz de Emergencia de incrustar	4 días	42	lun 9/02/26	jue 12/02/26

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
48		Salida bifásica a 220 V para aire acondicionado de 24000 BTU	4 días	47FC-1 día	jue 12/02/26	mar 17/02/26
49		Aire acondicionado de 24000 BTU, 220 V	4 días	48FC-1 día	mar 17/02/26	vie 20/02/26
50		Tuberías de cobre para aire de 24000 BTU	4 días	49FC-1 día	vie 20/02/26	mié 25/02/26
51		Cardan doble para bombillo Gu10, luz fría - luz cálida	4 días	50FC-1 día	mié 25/02/26	lun 2/03/26
52		Cinta led sencilla para iluminación en perfil de aluminio de incrustar (strip lines)	4 días	51FC-1 día	lun 2/03/26	jue 5/03/26
53		Salida de datos con Jack Rj45 Keystone Cat 6A 10 Gb	4 días	52FC-1 día	jue 5/03/26	mar 10/03/26
54		Salida HDMI de alta definición 4 k de 10 m en tubería PVC SCH 40 de 3/4"	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
55		Salida HDMI de alta definición 4 k de 15 m en tubería PVC SCH 40 de 3/4"	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
56		Cable HDMI de alta definición 4 k de 2m	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
57		Cable UTP cat 6A en tuberia SCH 40 de 3/4"	1 día?		mié 17/12/25	jue 18/12/25
58		**ITEMS NO PREVISTOS**	**72 días**		**mié 17/12/25**	**mar 31/03/26**
59		Demolicion de zocalo el baldosa de cemento	2 días	80	jue 18/12/25	vie 19/12/25
60		Demolicion de ceramica de piso (loseta de cemento)	2 días	59	lun 22/12/25	mar 23/12/25
61		Demolicion de plantilla en concreto	2 días	60	mié 24/12/25	vie 26/12/25
62		Concreto de 3000 para plantilla de piso e=10cm. Incluye malla electrosoldada	2 días	61	lun 29/12/25	mar 30/12/25
63		Retiro de material proveniente de demoliciones. Incluye trasciego de quito a primer piso y disposicion final en lugar autorizado	5 días	59CC	jue 18/12/25	mié 24/12/25

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
64		Cielo raso en superboard o similar con figuras irregulares y diseño para instalacion de cinta led. Incluye estructura	3 días	62FC+2 días	lun 5/01/26	mié 7/01/26
65		Suministro e instalacion de sofa con tapizado y base igual o similar al existente de 2,4 m de largo	2 días	21CC	jue 5/02/26	vie 6/02/26
66		Suministro e instalacion de piso vinilico de espesor 3mm o mas con textura y acabado según diseño	2 días	62FC+2 días	lun 5/01/26	mar 6/01/26
67		Suministro y aplicación de estuco plástico en muros interiores color blanco en pared	2 días	15CC	mié 28/01/26	jue 29/01/26
68		Suministro e instalación de Puerta corrediza con marco en panel maderable según diseño de 1.8x2.40 1 hoja	1 día	25CC	vie 6/02/26	vie 6/02/26
69		Guardaescoba en pvc	2 días	66	mié 7/01/26	jue 8/01/26
70		Salida para interruptor doble inteligente	2 días	53	mié 11/03/26	jue 12/03/26
71		Suministro e instalacion de cable UTP cat 6A	4 días	70FC-1 día	jue 12/03/26	mar 17/03/26
72		Suministro e instalacion de cajas PVC 2x4	4 días	71FC-1 día	mar 17/03/26	vie 20/03/26
73		Suministro e instalacion de cajas PVC 4x4	4 días	72FC-2 días	jue 19/03/26	mié 25/03/26
74		Suministro e instalacion de cajas SCH 40 4x4	4 días	73FC-2 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26
75		suminstro e instalacion de tuberia SCH 40 de 1/2"	4 días	74FC-2 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26
76		suminstro e instalacion de tuberia PVC de 1/2"	4 días	74FC-2 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26
77		Suministro e instalacion de cable de cobre alimentador libre de halógenos (#12 F + # 12 N + #12 T) AWG	4 días	74FC-2 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26
78		Suministro e instalacion de granito pulido	4 días	74FC-2 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26
79		Machones en concreto de 3000 psi S=10x10. Inlcuye acero de resfuerzo	5 días	11	vie 23/01/26	jue 29/01/26

12 | 19

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
80		Localizacion trazado y replanteo	1 día	2	mié 17/12/25	mié 17/12/25
81		**ADMINISTRACION**	91 días		mié 17/12/25	jue 30/04/26
82		**IMPREVISTOS**	91 días		mié 17/12/25	jue 30/04/26
83		**UTILIDAD**	91 días		mié 17/12/25	jue 30/04/26
84		**IVA SOBRE LA UTILIDAD**	91 días		mié 17/12/25	jue 30/04/26
85		**FIN**	0 días		jue 30/04/26	jue 30/04/26

12 19


Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

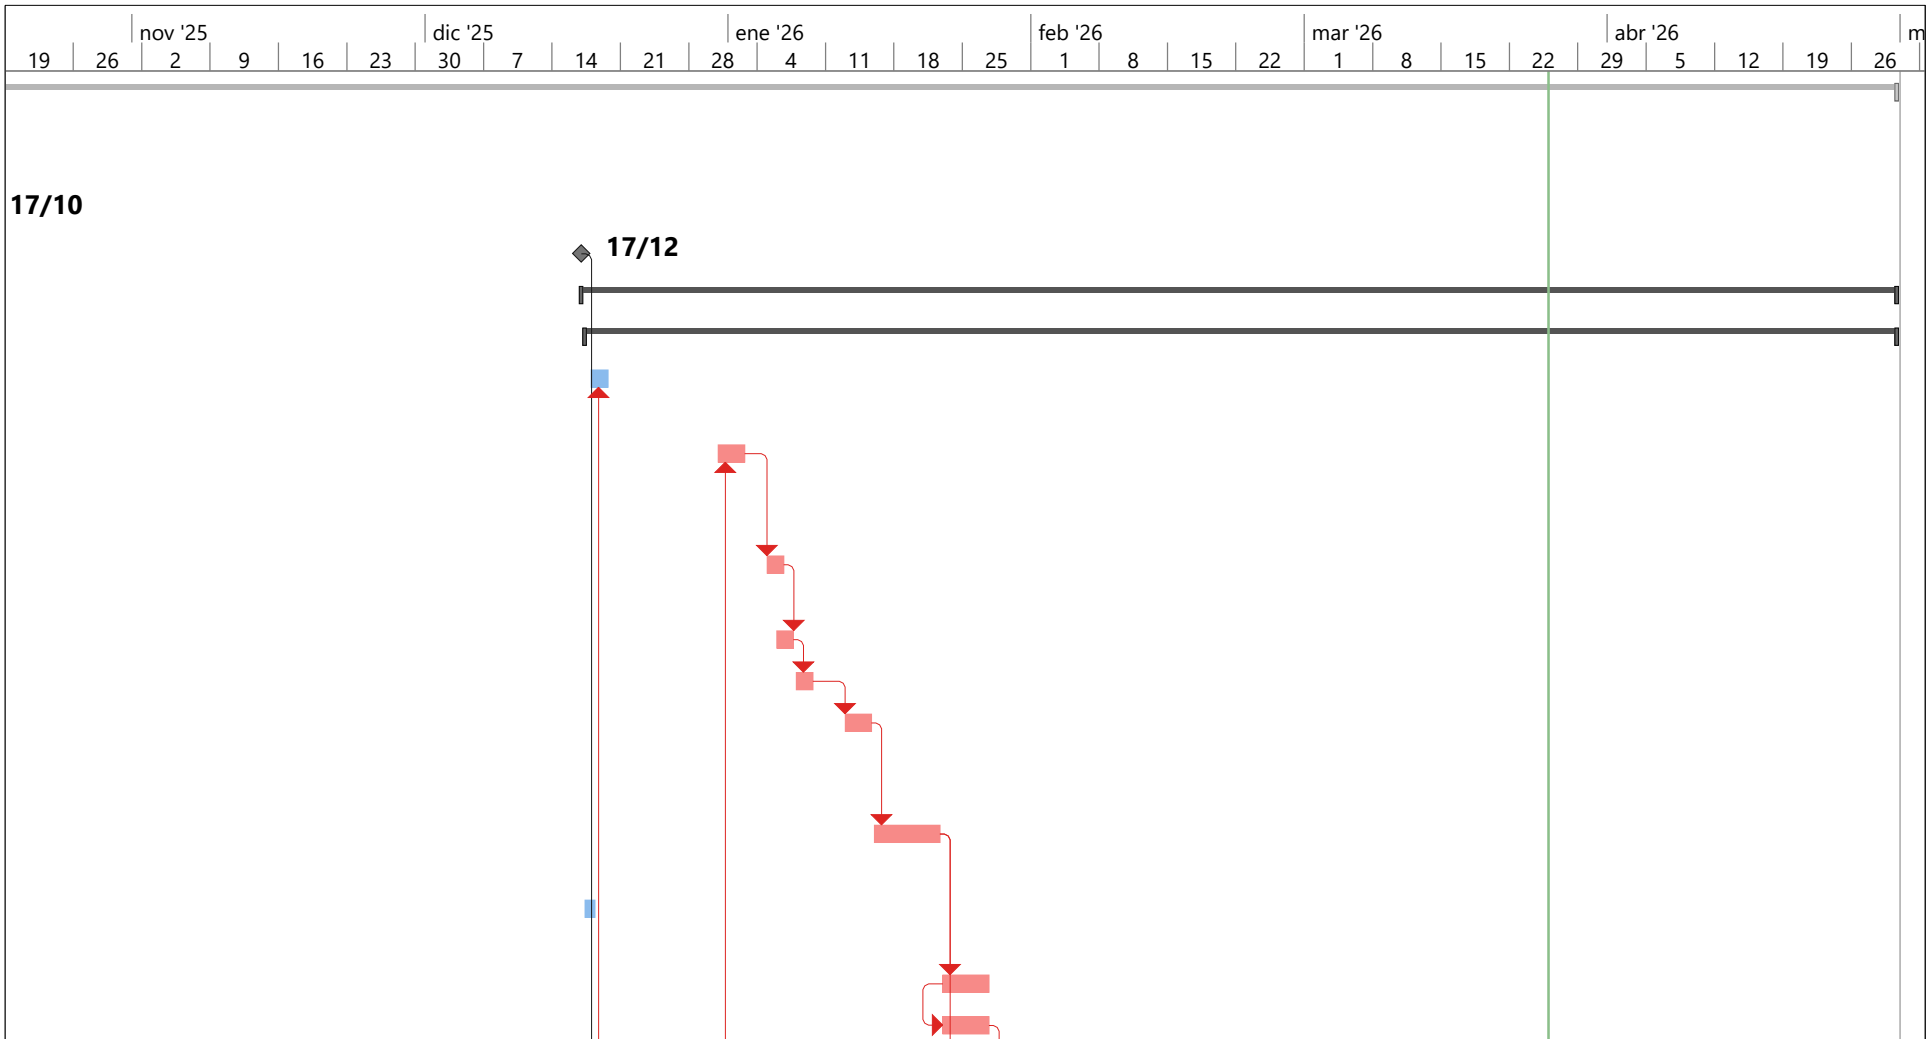


Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

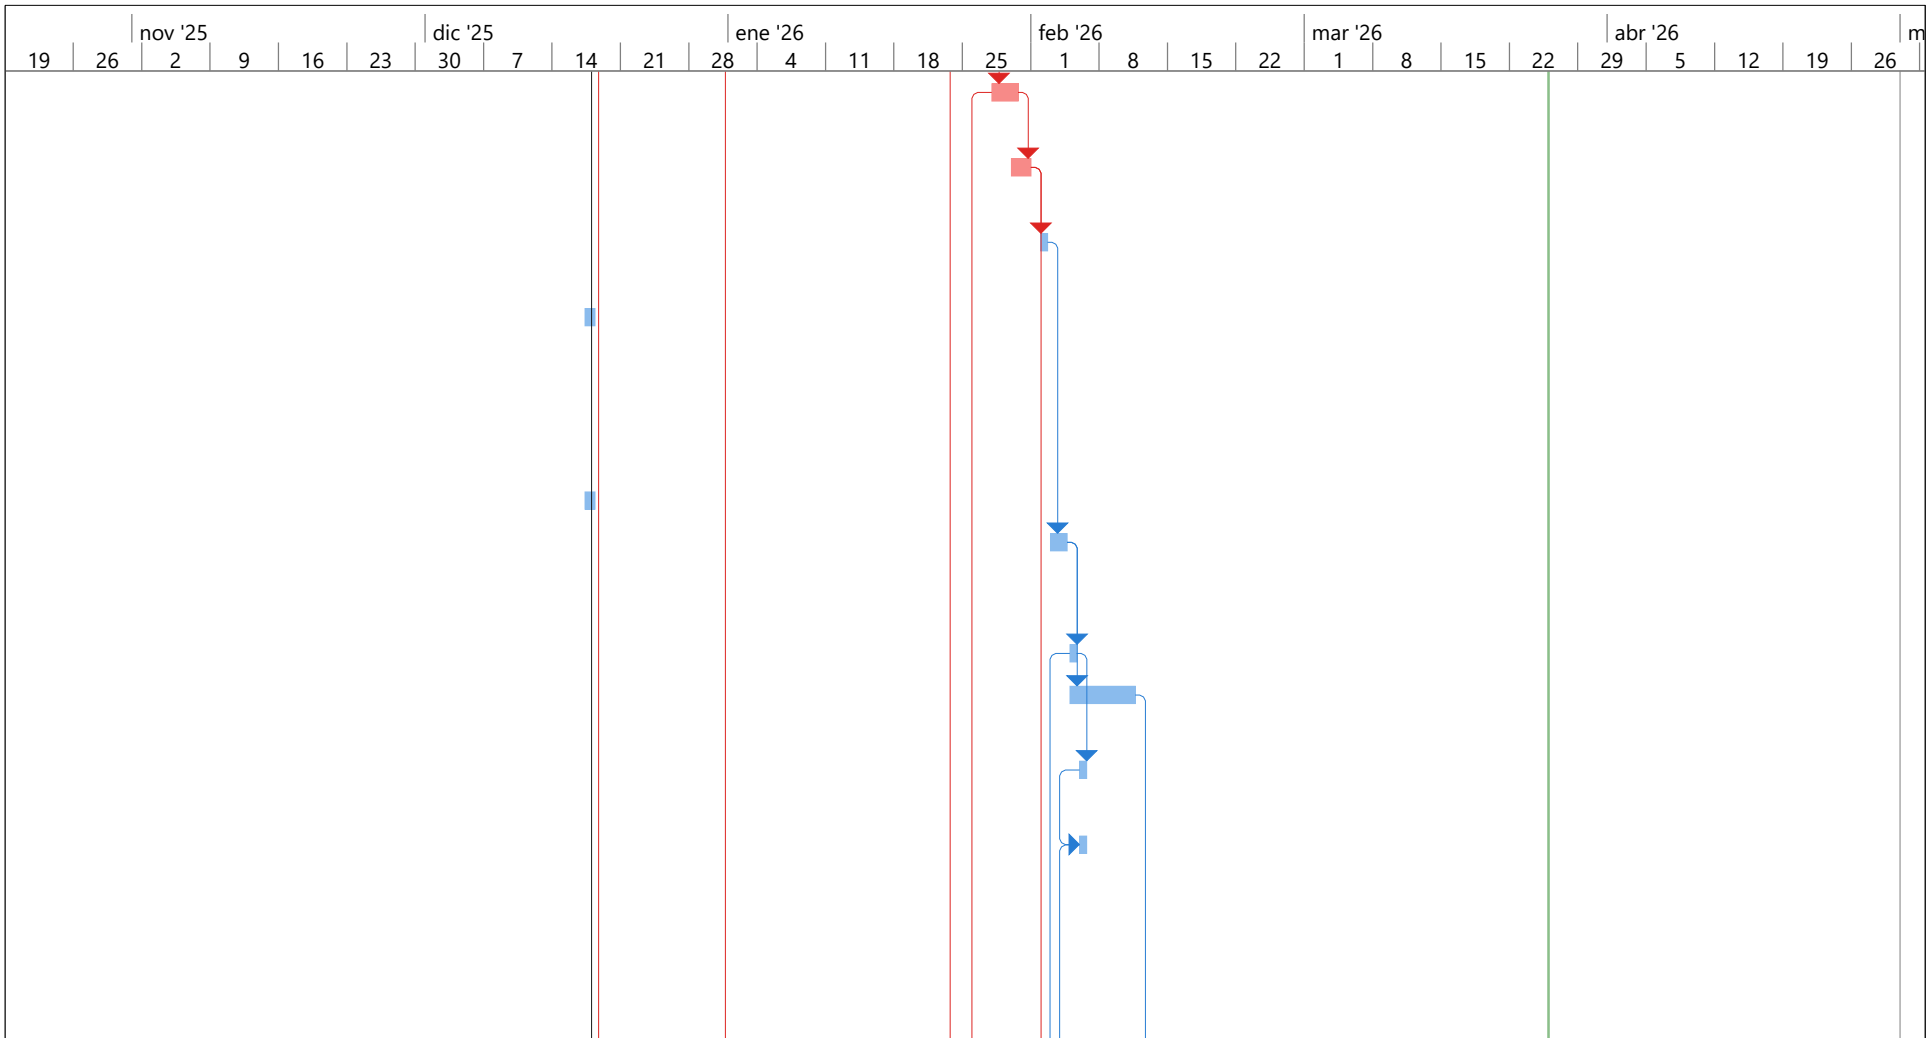


Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

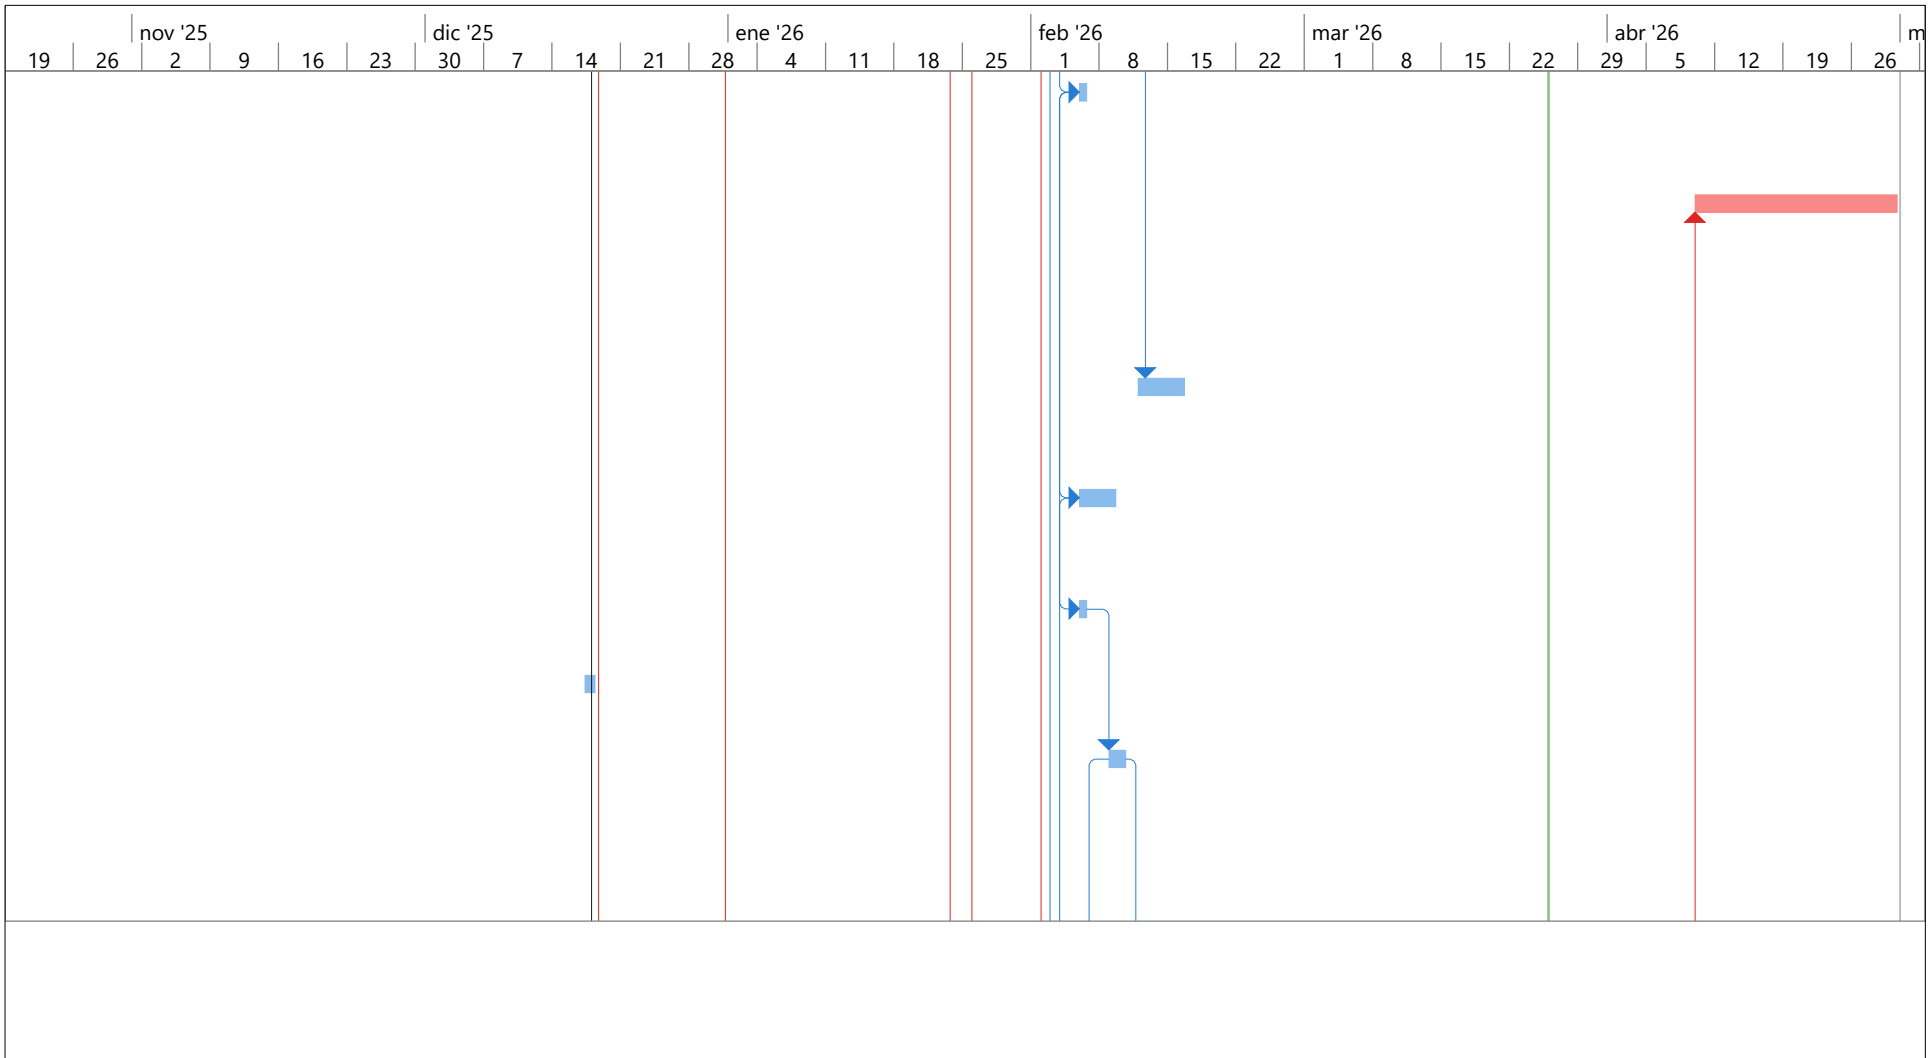


Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

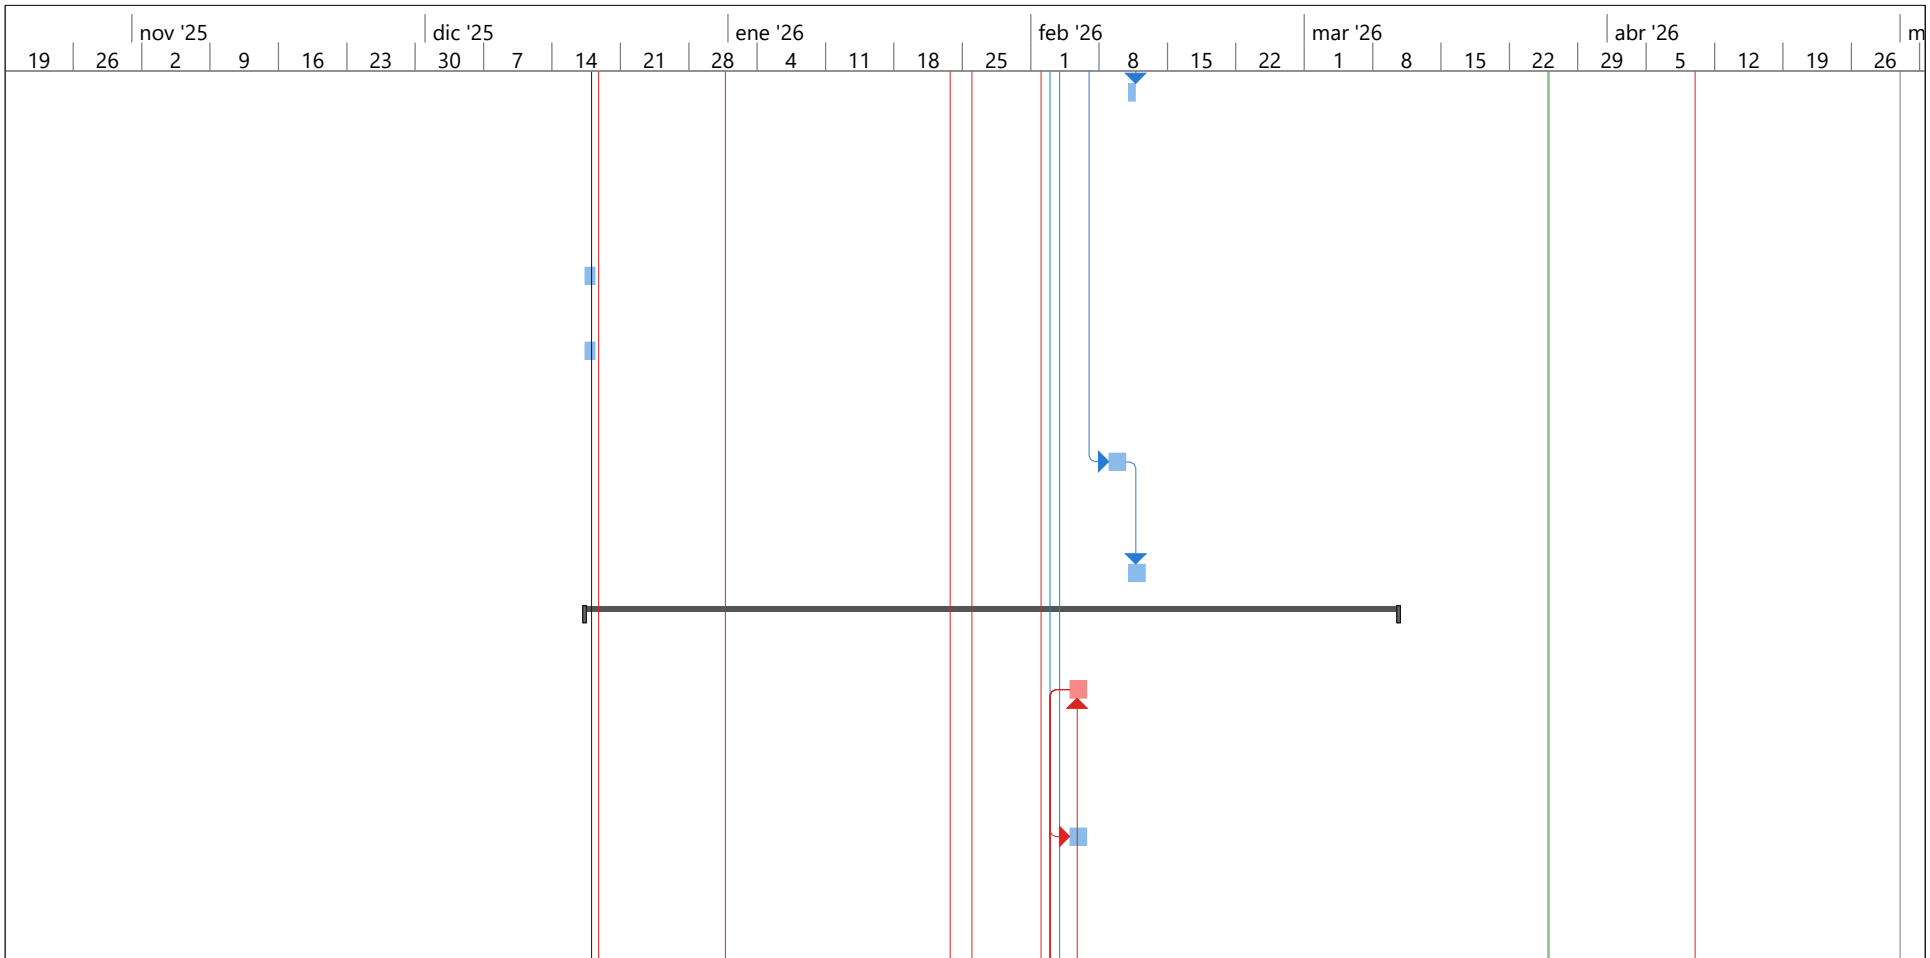


Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

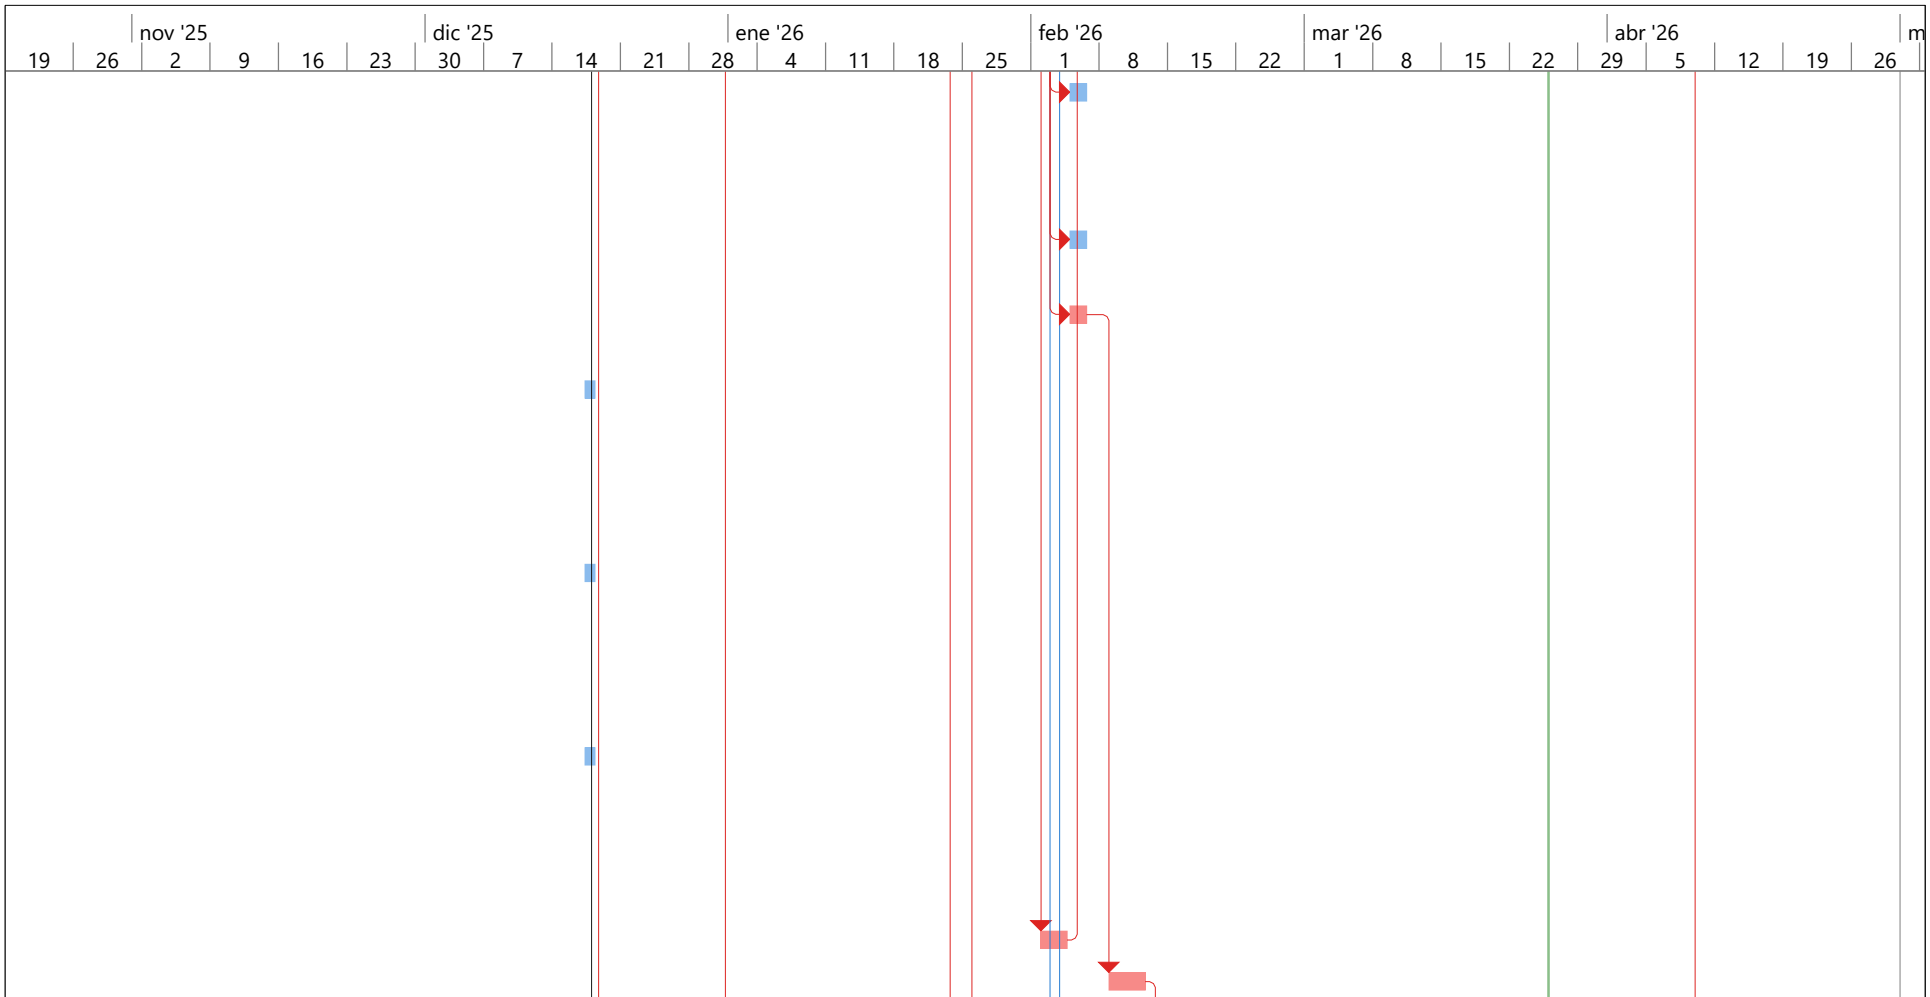


Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

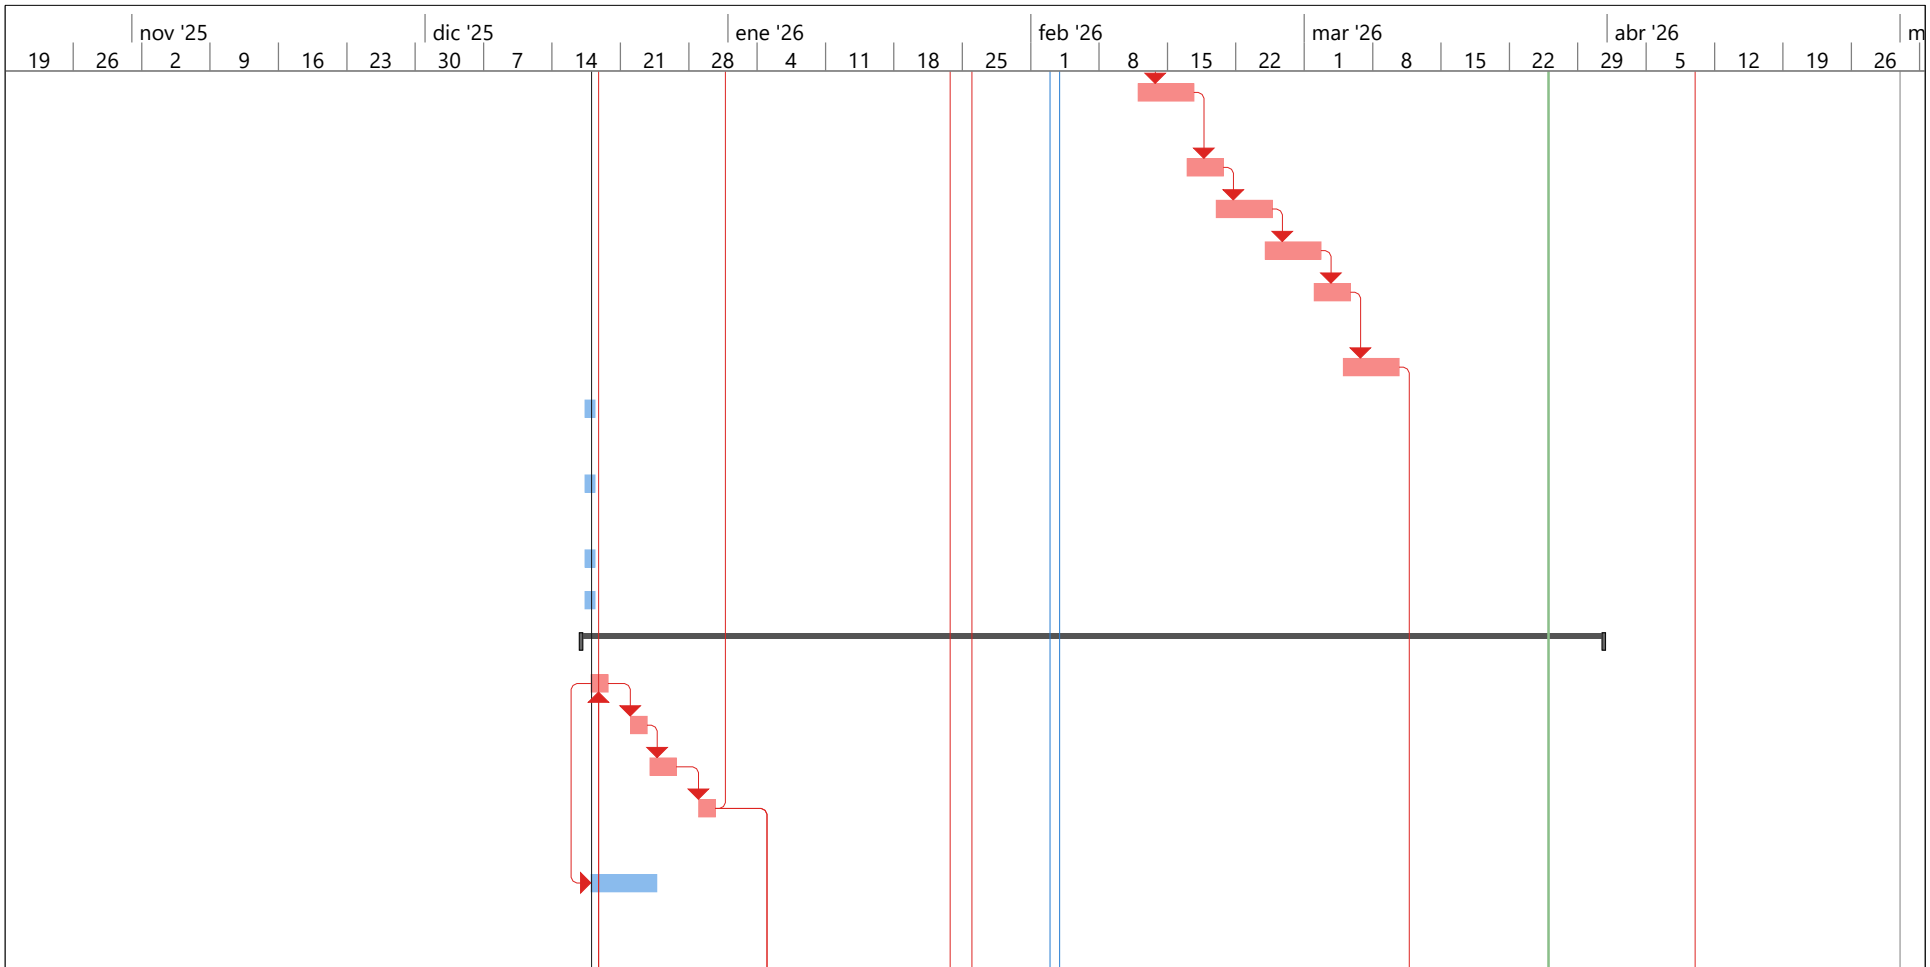


Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

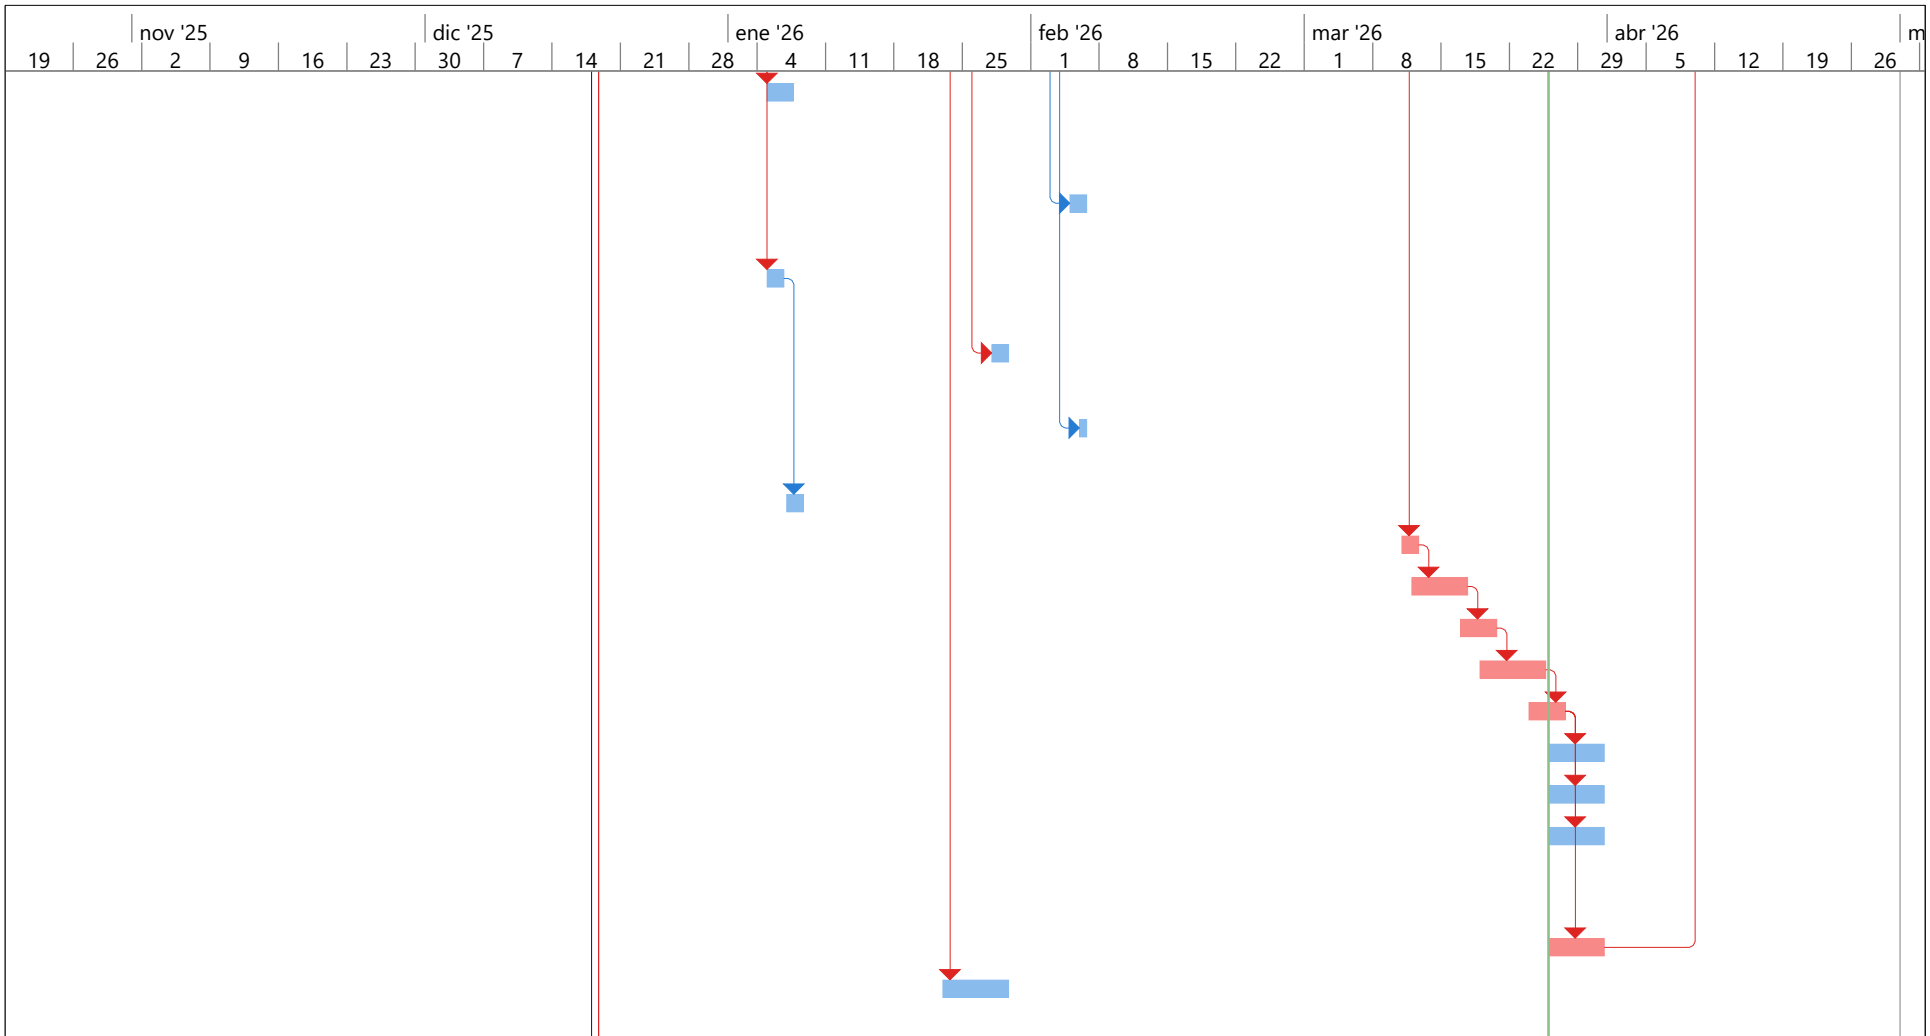

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

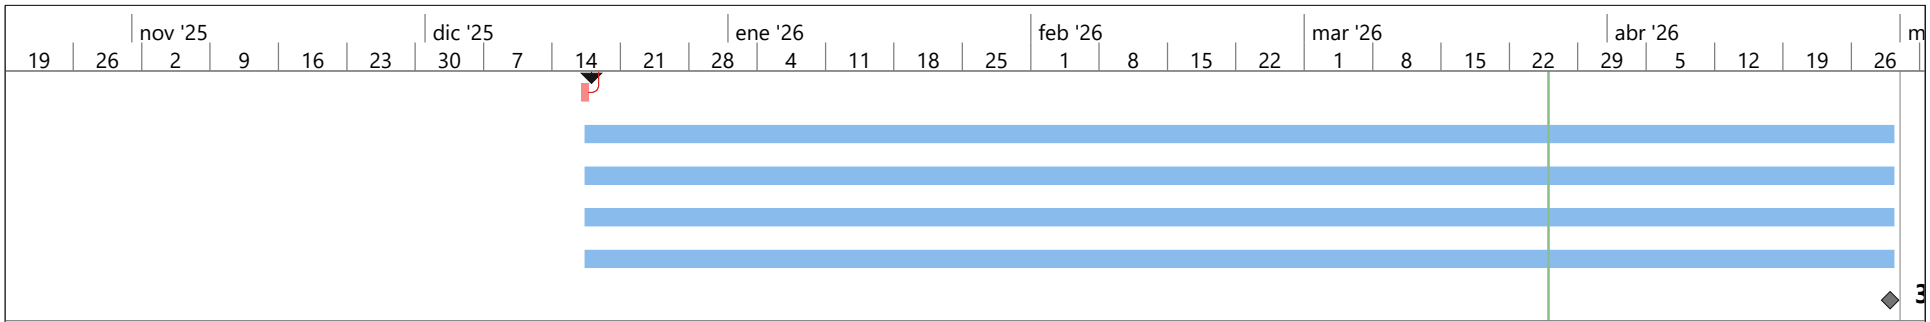

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: jue 26/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
