

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo
0		**ADECUACIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO SALA DEL PENSAMIENTO EN EL PISO 5 EN LA TORRE A DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO**	**72 días**		**jue 16/10/25**
1		**ETAPA PRECONTRACTUAL**	0 días		jue 16/10/25
2		**INICIO DE ETAPA CONTRACTUAL**	0 días		mar 16/12/25
3		**ACTIVIDADES PARA EL ALCANCE DE $ 241.965.741,00**	**32 días**		**mar 16/12/25**
4		**ACTIVIDADES CIVILES Y DE ACABADOS**	**30 días**		**mar 16/12/25**
5		Desmonte y acarreo de puertas en vidrio con marcos de aluminio	2 días	2	mar 16/12/25
6		Desmonte de ventanas en vidrio con marco en acero (si la hoja mide más de 2m2 se contará como una unidad independiente)	2 días	5FC-1 día	mié 17/12/25
7		Demolición manual de muros 0.15m de bloque de cemento	2 días	6	vie 19/12/25
8		Desmonte de lamparas 30x100	2 días	7FC-1 día	lun 22/12/25
9		Demolición alfajias en concreto reforzado	2 días	8	mié 24/12/25
10		Desmonte red eléctrica existente (incluye desmote de tableros existentes, tomacorrientes, cableado, canaletas, etc.).	3 días	9	lun 29/12/25
11		Levante de muro en bloque de concreto 5 Mpa 9 * 19 * 39	5 días	10	vie 2/01/26
12		Suministro en instalación de Piso de vinilo tipo tableta de 2 mm Tablón Nuez	5 días	11FC-3 días	mar 6/01/26
13		Pañete allanado en mortero 1:4 1 cara	3 días	11	vie 9/01/26
14		Pañete allanado en mortero 1:4 para filos	3 días	13CC	vie 9/01/26
15		Suministro y aplicación de estuco plástico en muros interiores color blanco en pared	3 días	14	jue 15/01/26
16		Pintura tipo 1 sobre muros, aplicación de 3 manos color institucional	2 días	15FC-1 día	lun 19/01/26
17		Suministro de plantas ornamentales. Incluye maceta, abono, rodachines y plato recolector	1 día	16	mié 21/01/26
18		Cielo raso en panel PVC especificación 50% PVC (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre-aislante térmico acústico-auto estinguible-resistente a hongos-bacterias-no condultor de electricidad)	4 días	12	mié 14/01/26
19		Perfil perimetral corniza PVC	2 días	18	mar 20/01/26
20		Suministro e instalación de muro verde artificial en relieve tipo Jardín vertical artificial flores tropicales formato 50x100 cm	2 días	17	jue 22/01/26
21		Suministro e instalación de sillón reclinable confort	1 día	18	mar 20/01/26
22		Suministro e instalación de piso en grama sintética green garden 30 mm alto tráfico (incluye pegante)	5 días	18	mar 20/01/26
23		Suministro e instalación de Mesa auxiliar Everett 63x39x30 Onix Blanco	1 día	21	mié 21/01/26
24		Árbol Central, compuesto por 32 paneles entamborados de 260cm*180cm y grosor de 4cm, con caras externas en lámina fondo DURATEX AMARETTO de 5.5mm, con núcleo interno en MDF de 30mm y contorno en canto Rígido, 8 de los cuales con cinta de luz led cálida de	1 día	23CC	mié 21/01/26
25		Suministro de bolsa de boxeo 23 kg, incluye 2 pares de guantes (1 par de hombre y 1 de mujer) y estructura para su correcta instalación	1 día	24CC	mié 21/01/26
26		Suministro e instalación de cabina de oficina tipo pod acustica insonora movil antiestres con indicador en luces led 1.00x1.20 diseño contemporáneo. Colores a elegir x 2.23 m. Incluye esmerilado en vidrio de puerta y silla ajustable y ventilador con su re	1 día	25CC	mié 21/01/26
27		Construcción de gradas del pensamiento, incluye acabados, estructura, arcos y demas de acuerdo a diseño	3 días	22	mar 27/01/26
28		Suministro e instalación de múdulos divisorios en madera y nylon piso-techo , incluye punto de anclaje. Colores a elegir.	2 días	26CC	mié 21/01/26
29		Suministro e instalación de lampara Pie Bissen 1 luz E 27	1 día	28CC	mié 21/01/26
30		Suministro e instalación de Puerta corrediza en panel maderable recuebierto en wpc 1.50x2.40 1 hoja	2 días	28CC	mié 21/01/26
31		Suministro e instalación de ventanas corredizas en vidrio templado laminado con tratamiento acustico y solar VPH COOL LITE 120, estructura de soporte en perfil negro, incluye todos los elementos necesarios para instalar. Altura 2.3m	2 días	30CC	mié 21/01/26
32		Aviso motivacional en acrilico volumétrico luminoso 100x66 cm; acrilico dorado espejo, volumetrico con relieve 4 cm, flotante para efecto de retroiluminación con luces led modulares de alta intensidad , fuente de voltaje	1 día	26	jue 22/01/26
33		Suministro e instalación de protectores en acero de ventanas altira 2.30 m	2 días	26CC	mié 21/01/26
34		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de fuente de agua vertical caida en cascada ancho 3 m alto 2 m	1 día	33CC	mié 21/01/26
35		Suministro e instalación de sistema de sonido ambiental e institucional integrado, tipo 2.1, con control central y periféricos de audio	2 días	34	jue 22/01/26
36		Suministro e instalación de alfombra autoadhesiva	2 días	35	lun 26/01/26
37		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELÉCTRICOS, AIRE Y DATOS**	**9 días**		**mié 21/01/26**
38		Salida normal para tomacorriente doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	2 días	46	lun 26/01/26
39		Salida regulada para tomacorriente naranja doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente naranja, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	2 días	38CC	lun 26/01/26

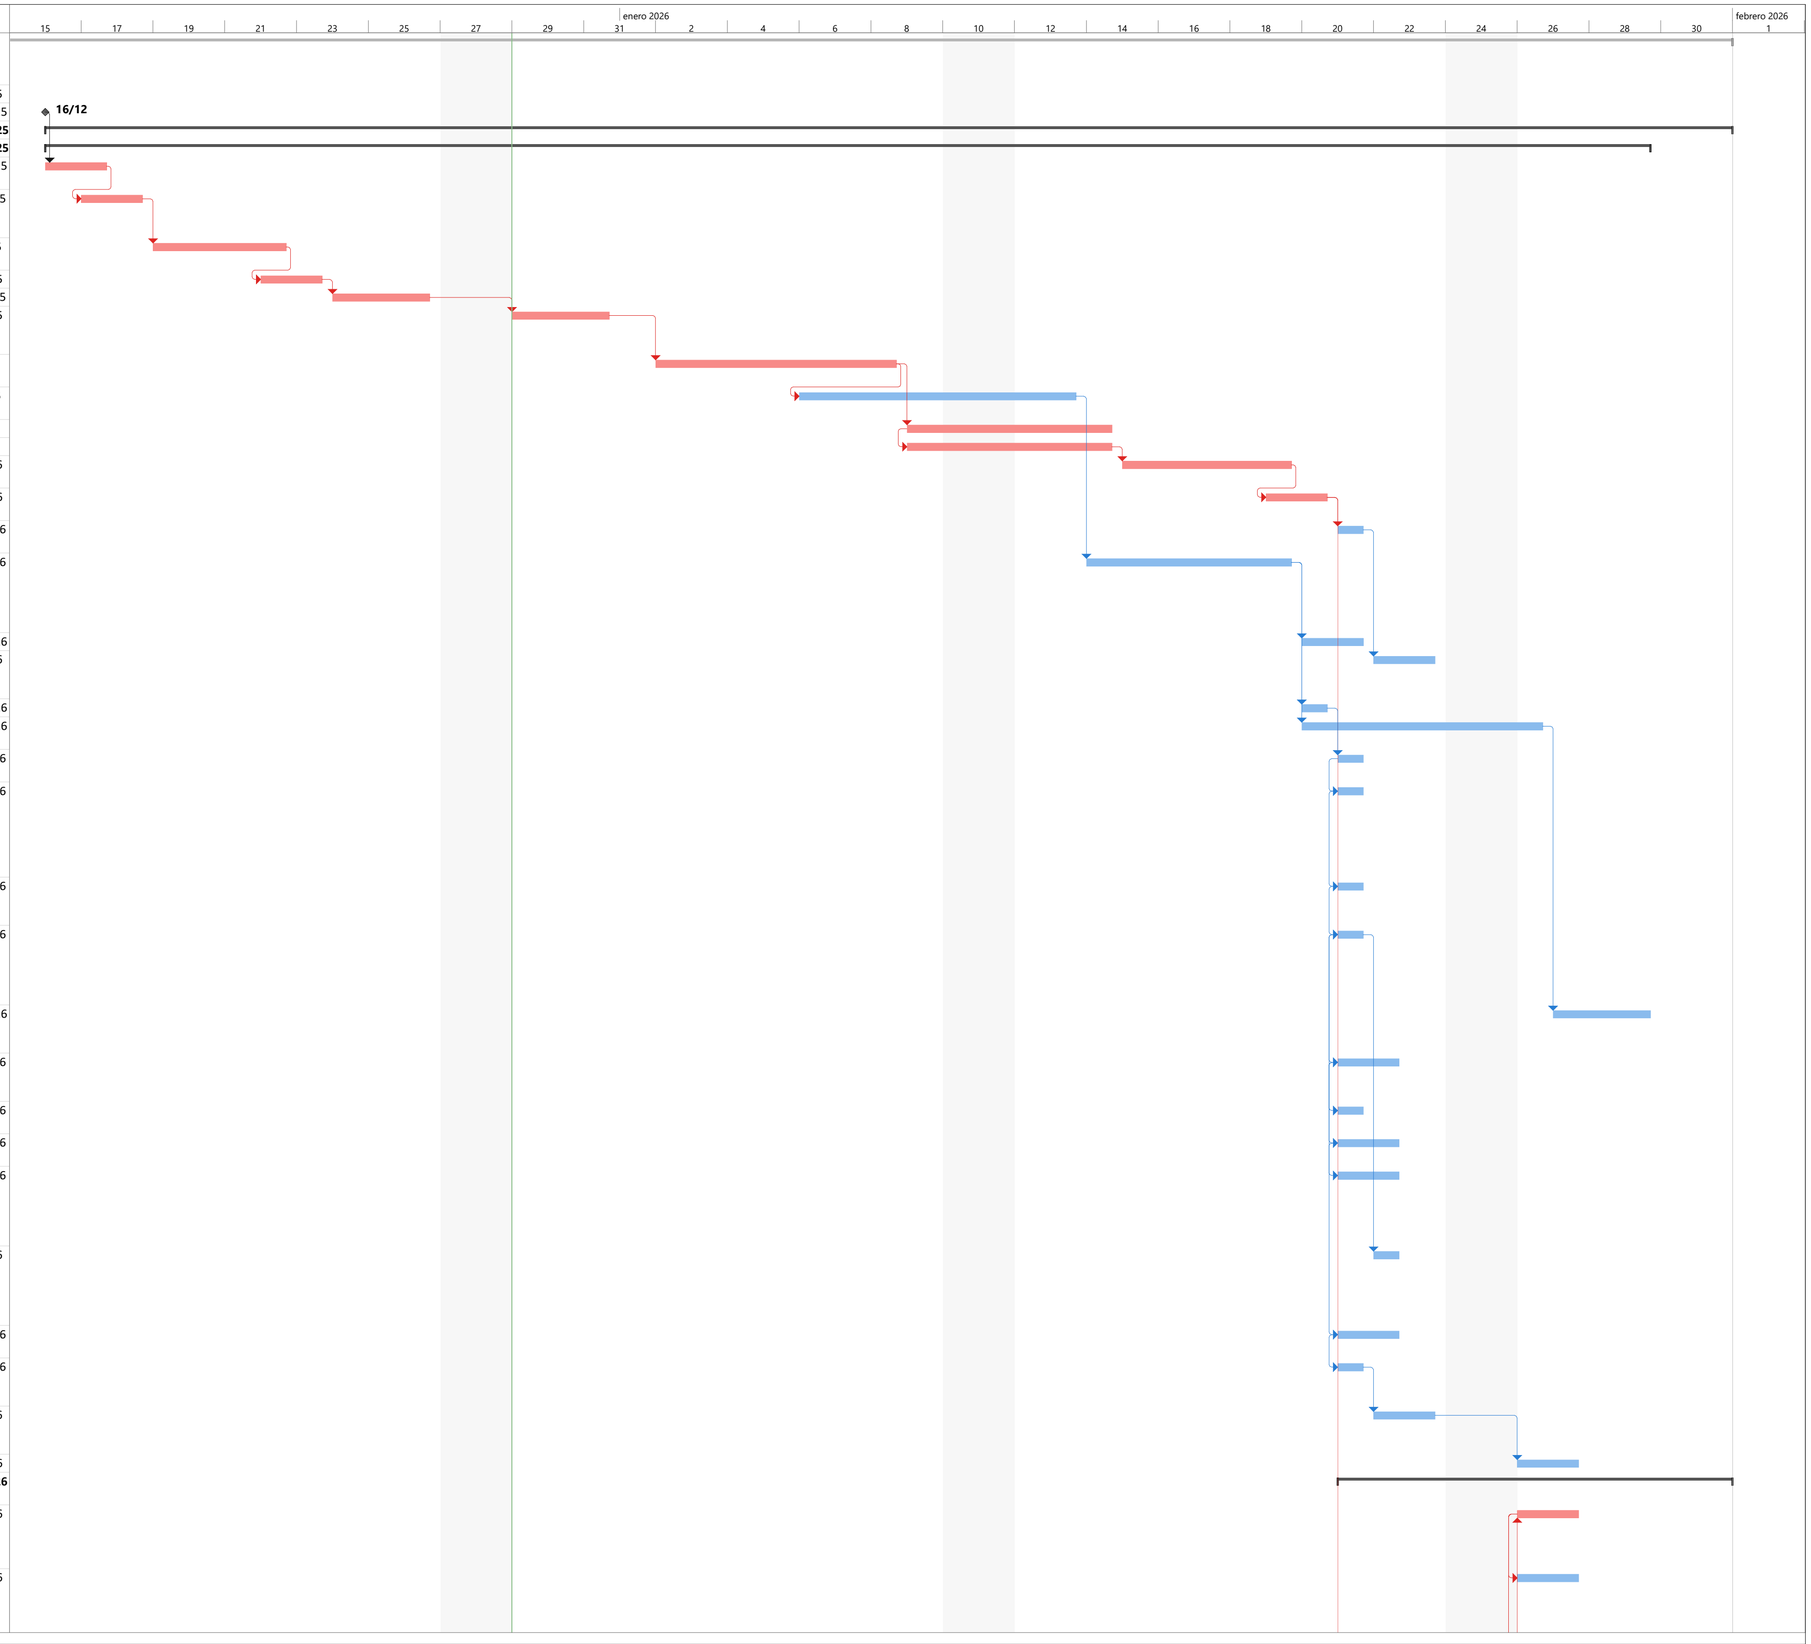

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: lun 29/12/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo
40		Salida de iluminación. Incluye cola en cable encauchetado de 3*14 AWG, tomas aéreas, prensa estopas, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	2 días	38CC	lun 26/01/26
41		Salida para interruptor triple inteligente con luz indicadora circular.	2 días	38CC	lun 26/01/26
42		Salida para interruptor cuádruple inteligente con luz indicadora circular.	2 días	38CC	lun 26/01/26
43		Cable de cobre alimentador libre de halógenos 3*#14 AWG (Tres hilos de cable monopolar #14 AWG) en tubería EMT de 1/2". Incluye marcación de tubería cada m, curvas EMT, conectores, uniones, terminales, cajas con tapas, elemento estructurales para soportes	4 días	42	mié 28/01/26
44		Cable de cobre alimentador libre de halógenos (#12 F + # 12 N + #12 T) AWG en tubería EMT de 1/2". Incluye marcación de tubería cada m, curvas EMT, conectores, uniones, terminales, cajas con tapas, elemento estructurales par soportes de la tubería y demás	4 días	42	mié 28/01/26
45		Cable de cobre alimentador libre de halógenos (#12 F + # 12 N + #12 T) AWG en tubería PVC de 1/2". Incluye marcación de tubería cada m, curvas EMT, conectores, uniones, terminales, cajas con tapas, elemento estructurales par soportes de la tubería y demás	4 días	42	mié 28/01/26
46		Regata, resane y pintura	3 días	16	mié 21/01/26
47		Luz de Emergencia de incrustar	4 días	42	mié 28/01/26
48		Salida bifásica a 220 V para aire acondicionado de 24000 BTU	4 días	42	mié 28/01/26
49		Aire acondicionado de 24000 BTU, 220 V	4 días	42	mié 28/01/26
50		Tuberías de cobre para aire de 24000 BTU	4 días	42	mié 28/01/26
51		Cardan doble para bombillo Gu10, luz fría - luz cálida	4 días	42	mié 28/01/26
52		Cinta led sencilla para iluminación en perfil de aluminio de incrustar (strip lines)	4 días	42	mié 28/01/26
53		Salida de datos con Jack Rj45 Keystone Cat 6A 10 Gb	4 días	42	mié 28/01/26
54		Salida HDMI de alta definición 4 k de 10 m en tubería PVC SCH 40 de 3/4"	4 días	42	mié 28/01/26
55		Salida HDMI de alta definición 4 k de 15 m en tubería PVC SCH 40 de 3/4"	4 días	42	mié 28/01/26
56		Cable HDMI de alta definición 4 k de 2m	4 días	42	mié 28/01/26
57		Cable UTP cat 6A en tuberia SCH 40 de 3/4"	4 días	42	mié 28/01/26
58		**ADMINISTRACION**	31 días		mar 16/12/25
59		**IMPREVISTOS**	31 días		mar 16/12/25
60		**UTILIDAD**	31 días		mar 16/12/25
61		**IVA SOBRE LA UTILIDAD**	31 días		mar 16/12/25
62		**FIN**	0 días	57	sáb 31/01/26

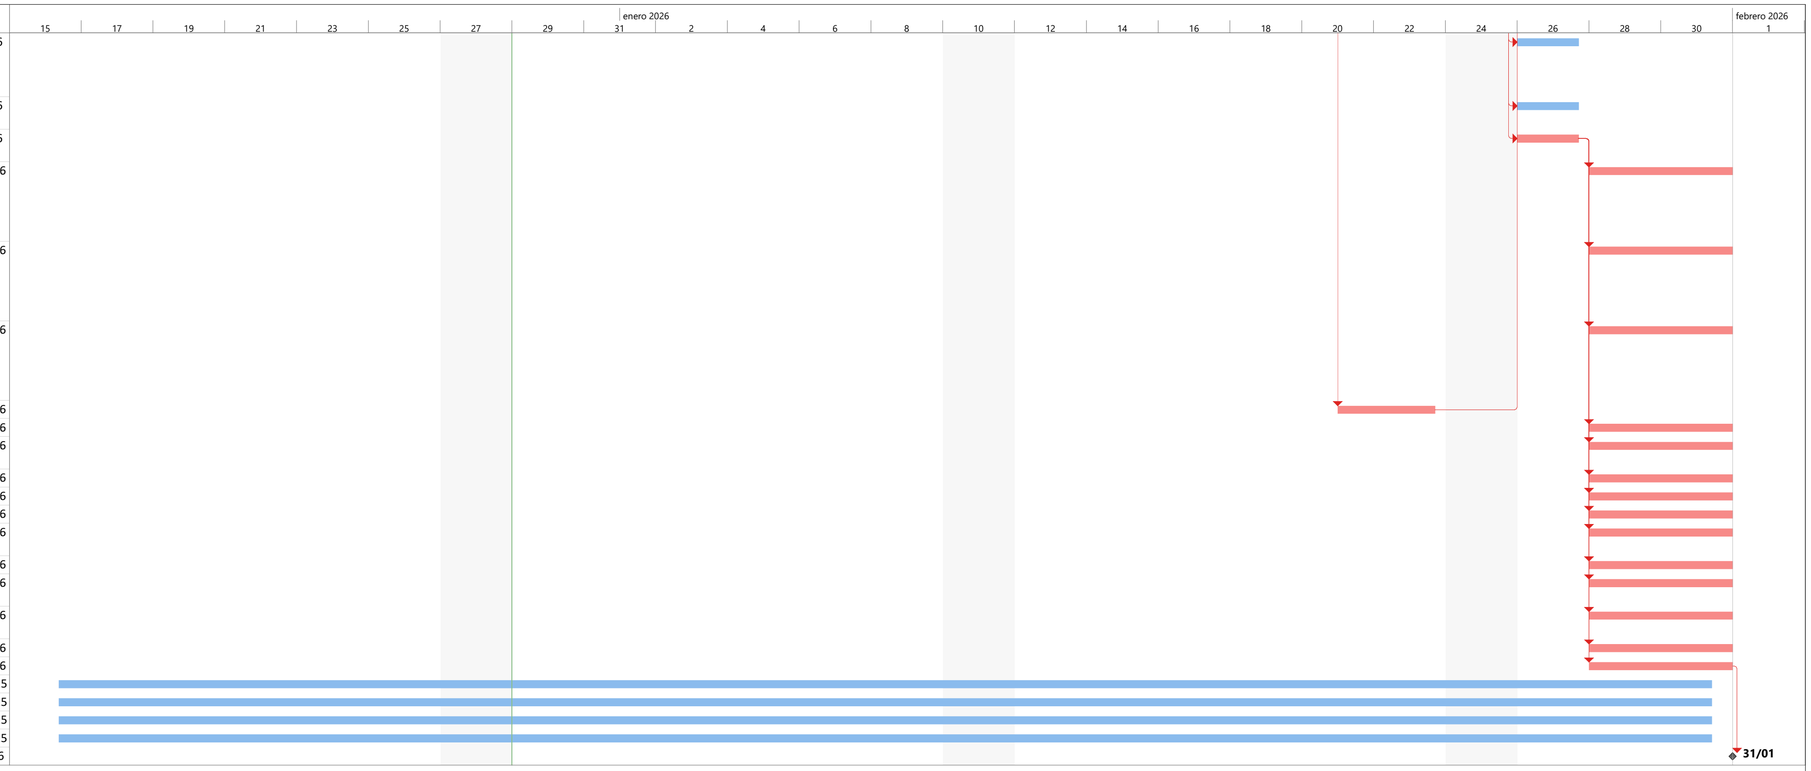

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: lun 29/12/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual
