INFORME DE AVANCE

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 02257 - 2025

SUBGERENCIA TÉCNICA

GERENCIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

FEBRERO 2026

TABLA DE CONTENIDO (INDICANDO PAGINA)

Proyecto Ficha Tecnica.....3
Contratos Derivados.....4
Descripción del Contrato N°1.....4
Supervicion del Contrato.....5
Perfiles Profesionales minimo.....5
Garantias Contractuales.....7
Cronograma.....8
Actividades realizadas durante el periodo reportado.....9
Avance General del Contrato 02257-2025.....12
Actividades No previstas inicialmente que han sido realizadas o ha incorporar durante la ejecución del proyecto.....12
Seguimiento Y Supervision.....13
Novedades Presentadas.....14
Informes.....15
Oficios recibidos.....15
Respuestas y observaciones.....16
Componentes financieros.....16
Observaciones y conclusiones.....16
Anexos.....17

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 02257 DE 2025

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

1. PROYECTO – FICHA TECNICA

N° CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	02257 de 2025
ENTIDAD /CLIENTE	Alcaldía municipal de Soacha
OBJETO	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"
PLAZO DE EJECUCION	CATORCE (14) meses, término contado a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación.
FECHA DE INICIO	26/09/2025
FECHA DE FINALIZACION	25/11/2026
PRORROGA N°1	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.000.000.000 M/CTE
ADICION N° 1	N/A
BOLSA DE MANDATO	$9.433.962.264,15
CUOTA DE GERENCIA	$566.037.736,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$326.547.662,00

"Nota; se podrán adicionar a la tabla las filas que sean necesarias"

2. CONTRATOS DERIVADOS

A continuacion se describen los contratos **02257-206-2025** PROYECTISTAS ASOCIADOS **y 02257-208-2025** AUDITORIENTE QUALITY S.A. derivados que desarrollaran el proyecto.

2.1. Descripcion del contrato: N°1

DENOMINACION	Contratante
N° DEL CONTRATO	02257-206-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.
NIT	900.426.155-7
OBJETO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 02257 -2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION	VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2026
PRORROGA N°1	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 326.547.662,00
ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($326.547.662 m/cte.) incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar con ocasión de su celebración, ejecución, y liquidación.
EJECUCION	
PRESUPUESTAL	%
FISICA	%
FECHA INICIO DE SUSPENCION	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	

2.2. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato 02257-2025 realizado por parte del equipo supervisor del contrato designado por EPUXUA E.I.C.E.

El equipo de supervisión está conformado por un grupo multidisciplinar en áreas técnicas, jurídicas y financieras, que aportan su experiencia y conocimiento al cumplimiento del proyecto, el cual se indica en la siguiente tabla:

CARGO	NOMBRE
Ing. Fabian Andrés Cuesta Cantor	Director de ejecución de proyectos Epuxua E.I.C.E.
Ing. Carlos Arturo Bello Bonilla	Subdirector de ejecución de Proyectos Epuxua E.I.C.E.
Edgar de la Cruz Munevar	Director de interventoría

En el “Acta de Designación de supervisión” del 01 de enero de 2026, se designa como supervisor del contrato 02257-2025, al ingeniero Fabian Cuesta Cantor, debido a el relevo en la dirección de ejecución.

2.3. PERFILES PROFESIONALES MINIMO

DENOMINACION	FORMACION PROFESIONAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBJETIVO GENERAL A DESARROLLAR
GERENTE DEL PROYECTO (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)	Ingeniero Civil o Arquitecto	Experiencia Especifica como director de Consultoría o Coordinador como mínimo de UN (1) en Proyectos de Consultoría cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	
PROFESIONAL ARQUITECTO	Arquitecto	Experiencia Especifica como director o Coordinador o Arquitecto o Diseñador como mínimo UN (1) año en Proyectos cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	
DISEÑADOR ESTRUCTURAL	Ingeniero Civil	Experiencia Especifica como Diseñador Estructural o Especialista Estructural de Consultoría como mínimo de UN (1) en Proyectos de Consultoría cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	

PROFESIONAL EN GEOTECNIA	Ingeniero Civil o Ingeniero en Geotecnia	Experiencia Especifica como Diseñador o Especialista o Profesional o Asesor en Geotecnia de Consultoría como mínimo de UN (1) en Proyectos de Consultoría cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	
DISEÑADOR HIDRÁULICO	Ingeniero Civil o Ingeniero Hidráulico o Ingeniero Sanitario	Experiencia Especifica como Diseñador o Especialista o Profesional o Asesor Hidráulico de Consultoría como mínimo de UN (1) en Proyectos de Consultoría cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	
DISEÑADOR ELÉCTRICO, DE REDES DE VOZ Y DATOS	Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Electromecánico.	Experiencia Especifica como Diseñador o Especialista o Profesional o Asesor Eléctrico o electromecánico de Consultoría como mínimo de UN (1) en Proyectos de Consultoría cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	
TOPOGRAFO	Ingeniería civil o topógrafo o afines.	Experiencia Especifica como Topógrafo de Consultoría como mínimo de UN (1) en Proyectos de Consultoría cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Ingeniero Civil Arquitecto o afines	Experiencia Especifica como Asesor, Coordinador de Presupuestos de Consultoría como mínimo de UN (1) en Proyectos de Consultoría cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	
PROFESIONAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Trabajador social, psicólogo, sociólogo o afines.	Experiencia Especifica como Profesional Social de Consultoría como mínimo de UN (1) en Proyectos de Consultoría cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	
FINANCIERO	Ingeniero o administrador o afines.	Experiencia Especifica como Auxiliar de Consultoría como mínimo de UN (1) en Proyectos de Consultoría cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	

ABOGADO	Profesional en derecho	Experiencia Especifica como Abogado de Consultoría como mínimo de UN (1) en Proyectos de Consultoría cuyo objeto o alcance contemple ESTUDIOS Y/O DISEÑOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.	

2.4. Garantias Contractuales

El contratista otorga como garantía a favor del CONTRATANTE las pólizas requeridas en el documento de caracterización que hace parte integral del proceso. Las siguientes garantías (pólizas de cumplimiento y extracontractuales) pueden ser evidenciadas mediante la plataforma SECOP, por medio de la cual se dio aprobación de estas:

GARANTÍA	PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	BY-100060698 - Anexo 0	$65.309.532,40	23/12/2025-23/11/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	BY-100060698 - Anexo 0	$ 16.327.383,10	23/12/2025-23/05/2029
CALIDAD DE SERVICIO	BY-100060698 - Anexo 0	$32.654.766,20	23/12/2025-23/11/2026

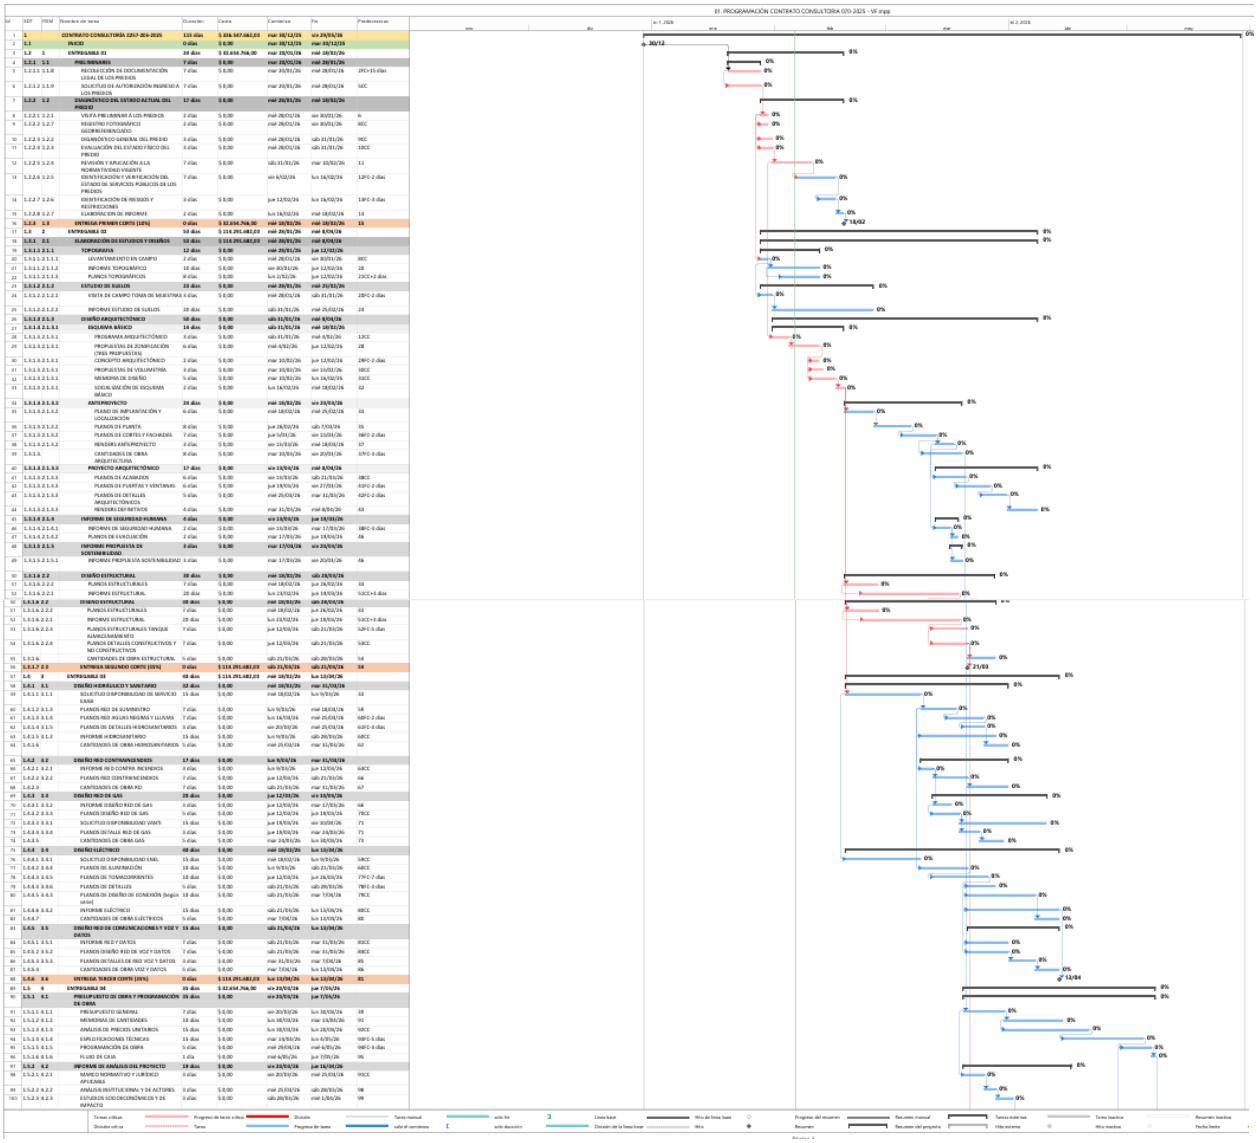




Ver anexo Polizas Contractuales (Seis (06)Folios – Polizas)).

2.5. Cronograma

A continuación, se presenta el cronograma del contrato:

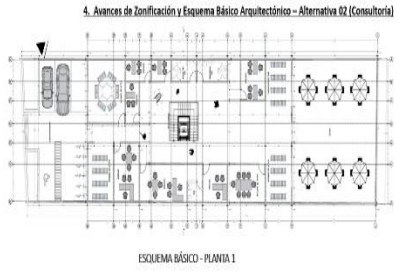
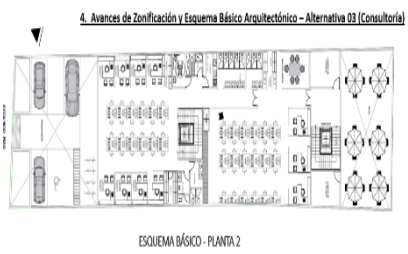


2.6. Actividades Relizadas Durante el Periodo Reportado

Semana 5: (01 de febrero - 06 de febrero de 2026)

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:


- Se compiló parte de la documentación legal del predio, obteniendo CERTIFICADO DE NOMENCLATURA Y CERTIFICADO DE USO DEL SUELO.
- Se realizó adelanto de diagnóstico previo y programa arquitectónico inicial teniendo en cuenta lo requerido por la entidad contratante y cliente final.
- Se realizaron primeras tres (03) propuestas de esquema básico arquitectónico.
- Se realizaron los planos de Topografía de los predios de la Cra. 9 (parqueadero) y Diagonal 9 (Aceites Angelita).
- Se iniciaron las exploraciones de suelo en Campo para el Estudio Geotécnico del predio de la Cra. 9.

		
PROPUESTA #1	PROPUESTA # 2	PROPUESTA # 3

Semana 6 (07 de febrero de 2026 – 13 de febrero de 2026)

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:


- Se adelanta una propuesta No. 4 de esquema básico teniendo en cuenta lo dialogado en las mesas técnicas con Supervisión, donde se realizaron correcciones respecto a las propuestas anteriormente presentadas, dentro de las observaciones, se tuvieron en cuenta las distribuciones de la propuesta No.3, manteniendo en ancho de patio de 5m de la propuesta No.2
- El día 12 de febrero, se radica el informe mensual No.1 correspondiente al mes de enero.
- Se adelantan informes de Topografía para ambos predios.
- Se adelantan trabajos de laboratorio de estudio de suelos de la Cra.9

	
PROPUESTA #4	INFORME DE TOPOGRAFIA

Semana 7 (14 de febrero de 2026 – 20 de febrero de 2026)

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:


- El día 16 de febrero de 2026, se realiza socialización de las cuatro (04) propuestas de esquema básico arquitectónico, en dicho comité estuvieron presentes Alcaldía de Soacha, Secretaría de Infraestructura y Dirección de Equipamiento, así como Supervisión y Consultoría. En dicha socialización, el cliente final sugirió generar un solo acceso al público por la edificación colindante existente que es la Secretaría de Hacienda e integrar en la colindancia o patio posterior ambas edificaciones. Adicionalmente, se corroboró el estado legal y físico del predio, corroborándose que el predio es uno solo con un área aproximada de 1360m2, donde se encuentra construida la actual Secretaría de Hacienda, por lo que facilitaría de algún modo realizar el diseño, sin embargo, hay que tener en cuenta el tipo de licenciamiento que se vaya a realizar en su momento, dado que para cumplir con el requerimiento del cliente final de integrar los dos edificios, el tipo de licenciamiento pasaría a ser de AMPLIACIÓN, pero se debe corroborar si la edificación existente cuenta con una licencia ya aprobada, ya que, esto afecta si se debe hacer reconocimiento de la edificación existente en caso de que no cuente con licencia.
- Se realizó Levantamiento Arquitectónico preliminar y visita de reconocimiento a la edificación de Secretaría de Hacienda, con el fin de entender su funcionamiento espacial y desarrollar una propuesta de integración entre la edificación existente y la nueva edificación a diseñar.
- Se realizó propuesta de Esquema básico No. 5 teniendo en cuenta los requerimientos del cliente final de integrar la Edificación existente de Secretaría de Hacienda con la nueva edificación a proponer.
- Se continúan con los trabajos de laboratorio del Estudio de Suelos del predio de la Cra. 9.
- Se socializa propuesta No.5 de esquema básico con la Supervisión e Interventoría, en esta, la Supervisión plantea dar un desarrollo al área donde se integrarán las dos edificaciones, generando espacios de articulación sobre el patio existente.

	
PROPUESTA #5 – INGRESO POR SEC. DE HACIENDA	LEVANTAMIENTO ARQ. INICIAL- SEC. DE HACIENDA

Semana 8 (21 de febrero de 2026 – 28 de febrero de 2026)

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza planteamiento de desarrollo del área de integración de la edificación existente con la nueva edificación, donde se plantea un área de espera con su respectivo control de acceso y una zona de estar al servicio de una cafetería propuesta.
- Se realizaron las respectivas averiguaciones en Curaduría para el tipo de trámite para licenciamiento, donde se corrobora que, de acuerdo a las características del proyecto, se debe tramitar como licencia de RECONOCIMIENTO Y AMPLIACIÓN, dado que, a la fecha, la edificación existente no cuenta con licencia anterior, lo que implicaría realizar una serie de estudios que no se encuentran dentro del alcance físico contractual.

		
FORMATO DE LICENCIAMIENTO	ESPACIO DE TRANSICIÓN	TIPO DE LICENCIA

2.6.1. Avance General del Contrato 02257-2025

Fecha	Actividad	% de Proyeccion vs ejecucion
03 de febrero de 2026	se realizaron las exploraciones y toma de sondeos para el estudio geotécnico del predio Cra.9 (Parqueadero).	8.72% vs 8,02%
03 de febrero de 2026	Comite de seguimiento – Registro fotografico georreferenciado, reconocimiento de caracteristicas de predios.	8.72% vs 8,02%
06 de febrero de 2026	Comite de seguimiento Epuxua 001 – Presentción de hojas de vida de profesionales de consultoria, eswuema basico inicial.	8.72% vs 8,02%

10 de febrero de 2026	Comite de seguimiento – planos de topografia de predios de intervención	8.72% vs 8,02%
11 de febrero de 2026	Comite de seguimiento Epuxua 002 – Presentción de esquema basico (propuestas de diseño)	15.10% vs 14.52%
20 de febrero de 2026	Comite de seguimiento Epuxua 003 – Revision y socializacion de propuesta de diseño N°5 (solicitada por alcaldia) Se realiza levantamiento arquitectonico de secretaria de hacienda.	20.41% vs 17.92%
27 de febrero de 2026	Comite de seguimiento Epuxua 004 – Socialización de documento de curaduría (concepto de norma urbanística).	20.41% vs 17.92%
27 de febrero de 2026	Comite de seguimiento Epuxua 004 – Socialización de documento de curaduría (concepto de norma urbanística).	20.41% vs 17.92%

2.6.2. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o ha incorporar durante la ejecución del proyecto

- Estudios y levantamiento arquitectonico de Secretaria de hacienda**,** licencia de construccion (ampliación) donde se debe contemplar el reconocimiento de la construcción existente (sec. de Hacienda).

"Nota; cuando sean varios contratos derivados deberan organizar con los items 2.1,-2.2-2.3-2.4-2.5….. "

3. SEGUIMIENTO Y SUPERVISION


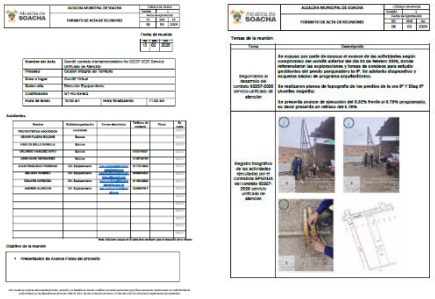

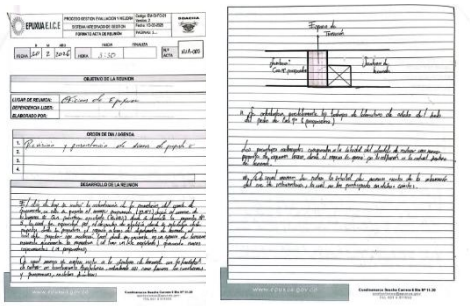
3.1. Comités de Seguimiento, Recorridos, Etc…

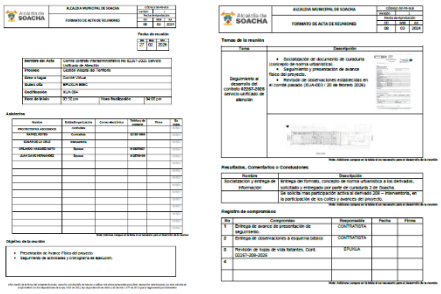
Con el objetivo de realizar el seguimiento al contrato **02257-2025,** el equipo de supervisión del proyecto realizó los siguientes comités de seguimiento y recorridos, durante el periodo del 30 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026, del proyecto:

FECHA	OBJETIVO	EVIDENCIA (ACTA- EVIDENCIA FOTOGRAFICA)
03 de febrero de 2026	Seguimiento de estudios y diseños, Servicio Unificado de Atención S.U.A. Y Seguimiento de cronograma. **EQUIPAMENTOS**	 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 02257 DE 2025

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

06 de febrero de 2026	Seguimiento de estudios y diseños, Servicio Unificado de Atención S.U.A. Y Seguimiento de cronograma. **EPUXUA 001**	
10 de febrero de 2026	Seguimiento de estudios y diseños, Servicio Unificado de Atención S.U.A. Y Seguimiento de cronograma.	
11 de febrero de 2026	Seguimiento de estudios y diseños, Servicio Unificado de Atención S.U.A. Y Seguimiento de cronograma. **EPUXUA 002**	
20 de febrero de 2026	Seguimiento de estudios y diseños, Servicio Unificado de Atención S.U.A. Y Seguimiento de cronograma. **EPUXUA 003**	

27 de febrero de 2026	Seguimiento de estudios y diseños, Servicio Unificado de Atención S.U.A. Y Seguimiento de cronograma. **EPUXUA 004**	

3.2. NOVEDADES PRESENTADAS

Nota: "Se deberan reguistrar, 1)Conflictos entre partes,.2) Solicitudes de adición 3. Solicitudes de prorrogas 4. Incumplimientos contractuales 5. Suspensión de contrato y/o etc…."

4. INFORMES

EPUXUA E.I.C.E., en calidad de Supervisor del Contrato Interadministrativo mantiene un archivo organizado de los contratos, correspondencia, informes, resúmenes gráficos, solicitudes, requerimientos, quejas, planos y demás documentos proyectados atinentes a las labores de control, supervisión de los trabajos y plazos estipulados, Por parte del contratista en este periodo se reportó la entrega de:

FECHA	INFORME	CONTRATISTA
09/02/2026	**SGT-125-2026** / Solicitud viabilidad urbanística, ambiental y norma.	CONTRATO - 2257-206-2025
12/02/2026	**SGT-155-2026 /** Solicitud de documentación complementaria, para el inicio del contrato interadministrativo no. 02257 – 2025. (entrega de hojas de vida de profesionales), de interventoría CTO. 2257-208-2025, según el consecutivo aq-007-02-2026	CONTRATO - 2257-208-2025
26/02/2026	**SGT-234-2026** / Solicitud de información sobre licencia de construcción	CONTRATO - 2257-206-2025
27/02/2026	**SGT-246-2026** / Solicitud de escritura pública.	CONTRATO - 2257-206-2025
28/02/2026	**SGT-245-2026 /** Solicitud de viabilidad de servicios públicos	CONTRATO - 2257-206-2025

28/02/2026	**SGT-247-2026 /** Solicitud de mayor presencia en la ejecución contractual	CONTRATO - 2257-208-2025
10/03/2026	**SGT-338-2026 /** Evaluación de hojas de vida	CONTRATO - 2257-208-2025
13/03/2026	**SGT-337-2026 /** Solicitud de Rendimiento	CONTRATO - 2257-208-2025

4.1. Oficios recibidos

N° OFICIOS	FECHA (DIA/MES/AÑO)	ASUNTO	ESTADO
1	10/02/2026	AQ-007-02-2026 Remisión de hojas de vida personal interventoría	REVISADO/CONTESTADO
1	12/02/2026	AQ-008-02-2026 Remisión – Informes mensuales N°1 Consultoría e Interventoría SUA	REVISADO / RECIBIDO CON OBSERVACIONES
3	25/02/2026	AQ-009-02-2026 Traslado de oficio – Solicitud documento licencia construcción secretaria hacienda	REVISADO/CONTESTADO VÍA EMAIL
3	25/02/2026	PA-2602-23711 Reiteración a solicitud documentación legal predios	REVISADO/CONTESTADO VÍA EMAIL

5. RESPUESTAS A OBSERVACIONES

El contratista debe dar respuesta oportuna al Interventor y Supervisor del contrato de las observaciones que puedan influir en la ejecución del contrato, así como la información, jurídica, técnica, social, ambiental y financiera que se requiera para elaborar reportes o respuestas a entidades de control.

En referencia a la siguiente tabla se evaluó que en el periodo reportado.

N°1	SE EVALUO	NO	SI
1	REPORTE DE CONFLICTO DE INTERES U OTROS	NO SE REPORTO NINGUNO	
2	FALLAS EN LA CALIDAD DE ENTREGABLES	NO HAY NINGUN REPORTE	
3	FALLAS EN EL COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NO HAY NINGUN REPORTE	
4	FALLAS EN LOS PAGOS DE ARL Y EPS DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO.	NO HAY NINGUN REPORTE	
5	FALLAS EN LA COMUNICACION CON LA COMUNIDAD (SI APLICA)	NO HAY NINGUN REPORTE	

El Contratista manifiesta que, ha respondido todas y cada una de las observaciones presentadas por la entidad contratante o, la interventoría del contrato en el plazo correspondiente, para el presente ***periodo no se realiza ningún requerimiento por ninguna de las partes.***

6. COMPONENTE FINANCIERO

6.1. Pagos Realizados a Derivados del Proyecto.

N° CONTRATO	N°FACTURA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
02257-2025			

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES *(indicar de acuerdo a la gerencia integral del proyecto)*

8. ANEXOS

8.1 INFORME DE CONSULTORIA MES 2-CTO 2257-206-2025 DE SOACHA
8.2 INFORME_MENSUAL_02_INTERV_CTO_2257-208-2025
8.3 Formato informe financiero Contrato de gerencia 02257-2025 Febrero 2026
8.4 ACTA SEGUIMIENTO- XUA-001 (06 FEBRERO 2026) 02257-2025
8.5 ACTA SEGUIMIENTO- XUA-002 (11 FEBRERO 2026) 02257-2025
8.6 ACTA SEGUIMIENTO- XUA-003(20 FEBRERO 2026) 02257-2025
8.7 ACTA SEGUIMIENTO- XUA-004(27 FEBRERO 2026) 02257-2025
8.8 SGT234-2026 – Solicitud licencia de construccion.
8.9 SGT245-2026 - Viabilidad de servicios publicos.
8.10 SGT24562026 – Solicitud de escritura publica.
8.11 SGT247-2026 - Solicitud de participación interventoría.
8.12 02. PRESENTACION COMITÉ DE SERVICIO UNFICADO DE ATENCION 03-02-2026
8.13 03. PRESENTACION COMITÉ DE SERVICIO UNFICADO DE ATENCION 06-02-2026
8.14 04. PRESENTACION COMITÉ DE SERVICIO UNFICADO DE ATENCION 16-02-2026
8.15 05. PRESENTACION COMITÉ DE SERVICIO UNFICADO DE ATENCION 16-02-2026
8.16 05. PRESENTACION COMITÉ DE SERVICIO UNFICADO DE ATENCION 23-02-2026

ING. FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR
Director de Ejecución de Proyectos
EPUXUA E.I.C.E
Proyectó: Arquitecto. Orlando Vásquez Soto- Contratista Epuxua 2026.
Elaboró: Arquitecto. Juan Hernández – Contratista Epuxua 2026
Revisó: Eisenhower Barbosa García – Abogado Especializado Contratista
