	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	HOJA_____de _____
	INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORIA_REGIONAL QUINDÍO	

SEMANA No.	1	DEL	1/10/2020	AL	15/10/2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		CONTRATISTA DE OBRA	
Interventoria	**CONSORCIO NOGAALL - B&C**	**Contratista de Obra:**	**CONSORCIO OBRAS PARA EL SENA**
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636404 de 2020	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552215 de 2020
Fecha de Iniciación Contrato de Interventoria	10 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación Contrato de Obra	10 de agosto de 2020
Fecha de Terminación Inicial	15 de diciembre de 2020	Fecha de Terminación Inicial	1 de diciembre de 2020
Plazo Inicial (dias)	128	Plazo Inicial (dias)	114
Valor Inicial contrato de Interventoria	$ 687.163.500,00	Valor inicial Contrato de Obra Lote 4	$ 10.468.638.491
Fecha de Iniciación Contrato de Obra	10 de agosto de 2020	Valor Total Presupuesto Regional	$ 377.070.248
Valor prorroga 01		Valor prorroga 01	
Valor Actualizado		Valor Actualizado	
Plazo prorroga 01		Plazo prorroga 01	
Plazo prorroga 02		Plazo prorroga 02	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Terminación prorroga :		Fecha de Terminación prorroga :	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:


"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA
PERSONAL ADMINISTRATIVO	ING. JHON HENRY NARAVEZ PANCHA
DIRECTOR DE OBRA	ING. ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. LINA YULIETH LÓPEZ GRANADA
SUPERVISION SENA / GRUPO DE CONSTRUCCIONES	
SUPERVISOR GENERAL	ARQ. LUIS ALBERTOGONZÁLEZ Z.
APOYO A SUPERVISION GENERAL	ING. YEIMMY GRACIA
APOYO A SUPERVISION GENERAL	ARQ.JAIME RUIZ
SUPERVISOR REGIONAL	ARQ. ANDRES FELIPE MORENO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE OBRA


SEDE: Ciudad ó Municipio - CENTRO AGROINDUSTRIAL ARMENIA QUINDIO

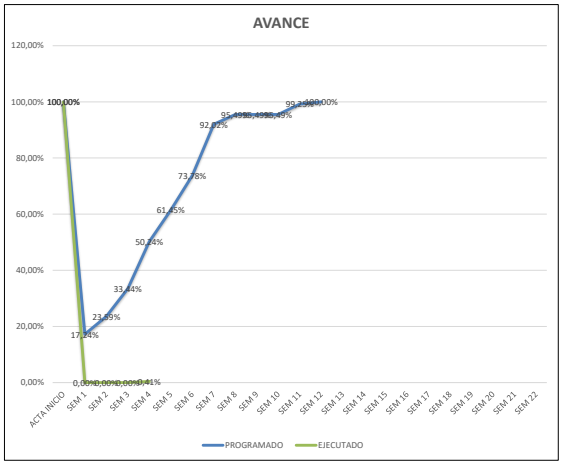

%AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
ACTA INICIO	100,00%	100,00%	0%
SEM 1	17,24%	0,00%	-17%
SEM 2	23,59%	0,00%	-24%
SEM 3	33,44%	0,00%	-33%
SEM 4	50,24%	0,41%	-50%
SEM 5	61,45%		
SEM 6	73,78%		
SEM 7	92,02%		
SEM 8	95,49%		
SEM 9	95,49%		
SEM 10	95,49%		
SEM 11	99,25%		
SEM 12	100,00%		
SEM 13			
SEM 14			
SEM 15			
SEM 16			
SEM 17			
SEM 18			
SEM 19			
SEM 20			
SEM 21			
SEM 22			

Notas: LOS PORCENTAJES SE REALIZAN A CORTE DE LA SEMANA 4 10/10/2020 SEGÚN PROGRAMACIÓN PRESENTADA , LA CUAL NO SE ENCUENTRA APROBADA E INICIABA EL 14/09/2020 Y LAS ACTIVIDADES EN OBRA INICIARON EL 02/10/2020.

SEDE: Ciudad ó Municipio - CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - ARMENIA QUINDÍO

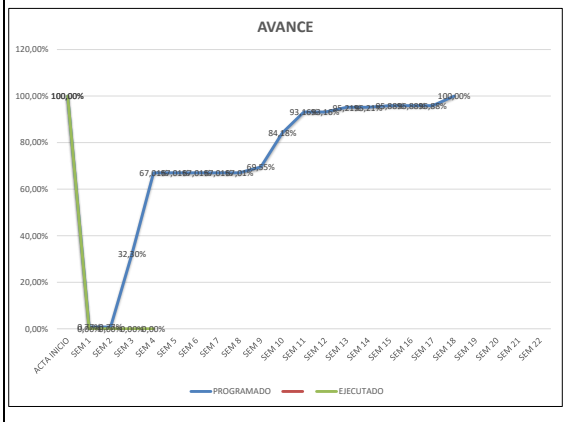

%AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
ACTA INICIO	100,00%	100,00%	0,00%
SEM 1	0,77%	0,00%	-0,77%
SEM 2	0,77%	0,00%	-0,77%
SEM 3	32,30%	0,00%	-32,30%
SEM 4	67,01%	0,00%	-67,01%
SEM 5	67,01%		
SEM 6	67,01%		
SEM 7	67,01%		
SEM 8	67,01%		
SEM 9	69,55%		
SEM 10	84,18%		
SEM 11	93,16%		
SEM 12	93,16%		
SEM 13	95,21%		
SEM 14	95,21%		
SEM 15	95,88%		
SEM 16	95,88%		
SEM 17	95,88%		
SEM 18	100,00%		
SEM 19			
SEM 20			
SEM 21			
SEM 22			


Notas: LOS PORCENTAJES SE REALIZAN A CORTE DE LA SEMANA 4 10/10/2020 SEGÚN PROGRAMACIÓN PRESENTADA , LA CUAL NO SE ENCUENTRA APROBADA. EN ESTE CENTRO NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES.

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	HOJA_____de _____
	INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORIA_REGIONAL QUINDÍO	

SEMANA No.	1	DEL	1/10/2020	AL	15/10/2020

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE: Ciudad ó Municipio - DESPACHO REGIONAL - ARMENIA QUINDÍO

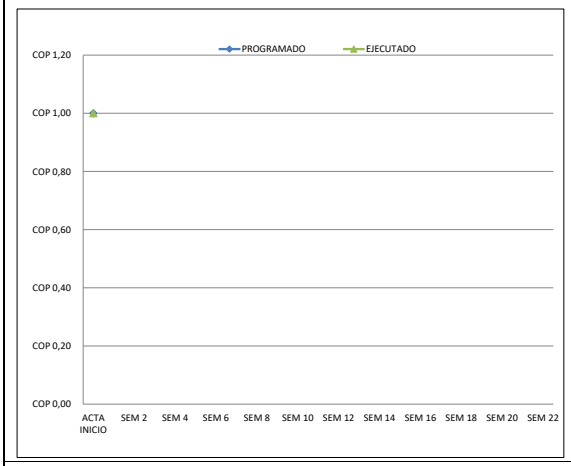

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
ACTA INICIO	100,00%	100,00%	0%
SEM 1			
SEM 2			
SEM 3			
SEM 4			
SEM 5			
SEM 6			
SEM 7			
SEM 8			
SEM 9			
SEM 10			
SEM 11			
SEM 12			
SEM 13			
SEM 14			
SEM 15			
SEM 16			
SEM 17			
SEM 18			
SEM 19			
SEM 20			
SEM 21			
SEM 22			

Notas: NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A ESTE CENTRO DEBIDO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PARTE DEL SENA, REPROGRAMACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO INICIAL, DEBIDO QUE SE INCLUYERON ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EN EL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SE DEBEN REDISTRIBUIR ESTOS RECURSOS.

CONTROL DE HITOS

SEDE: Ciudad ó Municipio - CENTRO AGROINDUSTRIAL - ARMENIA QUINDÍO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**10/08/2020**	**10/08/2020**	**0**
1	Impermeabilizaciones	26/10/2020		**0**
2	Sistemas eléctricos	14/09/2020		**31**
3	Jardinería	NA	NA	**NA**
4	Equipos de bombeo	14/09/2020		**31**
5	Mantenimiento y lavado de tanques	NA	NA	**NA**
6	Sistemas contra incendios	NA	NA	**NA**
7	Refrigeración (aires acondicionados)	16/09/2020		**29**
8	Mantenimientos Generales	30/11/2020		**0**
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales.	26/10/2020		**0**
10	Ítems no previstos	5/11/2020		**0**
	ENTREGA A LA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	**1/12/2020**		**0**

SEDE: Ciudad ó Municipio - CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - ARMENIA QUINDÍO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**10/08/2020**	**10/08/2020**	**0**
1	Impermeabilizaciones	8/10/2020		**7**
2	Sistemas eléctricos	NA	NA	**NA**
3	Jardinería	28/09/2020		**17**
4	Equipos de bombeo	7/10/2020		**8**
5	Mantenimiento y lavado de tanques	25/12/2020		**0**
6	Sistemas contra incendios	NA	NA	**NA**
7	Refrigeración (aires acondicionados)	7/10/2020		**8**
8	Mantenimientos Generales	26/11/2020		**0**
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales.	14/01/2021		**0**
10	Ítems no previstos	NA	NA	**NA**
	ENTREGA A LA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	**1/12/2020**		**0**

SEDE: Ciudad ó Municipio - DESPACHO REGIONAL- ARMENIA QUINDÍO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**10/08/2020**	**10/08/2020**	**0**
1	Impermeabilizaciones	3/11/2020		**0**
2	Sistemas eléctricos	NA	NA	**NA**
3	Jardinería	NA	NA	**NA**
4	Equipos de bombeo	PDTE	PDTE	**PDTE**
5	Mantenimiento y lavado de tanques	PDTE	PDTE	**PDTE**
6	Sistemas contra incendios	NA	NA	**NA**
7	Refrigeración (aires acondicionados)	11/09/2020		**34**
8	Mantenimientos Generales	30/11/2020		**0**
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales.	5/11/2020		**0**
10	Ítems no previstos	NA	NA	**NA**
	ENTREGA A LA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	**1/12/2020**		**0,00**

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	HOJA_____de _____
	INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORIA_REGIONAL QUINDÍO	

SEMANA No.	1	DEL	1/10/2020	AL	15/10/2020

ASPECTOS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA

1. Actividades en Ejecución:

Sede: CENTRO AGROINDUSTRIAL

1.SE INICIO EL ACONDICIONAMIENTO DE MUROS EN LA ZONA DE FRUHOR (FRUTAS Y HORTALIZAS) PARA LAS ACTIVIDADES PREVIAS DE ENCHAPE.
2.ENCHAPE PARED 25 x 25 PRIMERA CALIDAD /M2: SE REALIZA CAMBIO DE ENCHAPE DE 25X25 POR NO SER COMERCIAL A ENCHAPE DE 20X20 (ITEM CONTRACTUAL), SE AUTORIZA CAMBIAR INSUMO DE CEMENTO BLANCO A BOQUILLA PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD SIN INCREMENTAR EL VALOR. SE SOLICITA CONSERVAR LA MEDIACAÑA EXISTENTE Y SE ACUERDA PEGA DE ENCHAPE EN UNIONES ENTRE MURO Y COLUMNA. SE REALIZA OBSERVACION AL SENA DE ALTURA DE 2,80 M DEL ENCHAPE, PERO SE MANIFIESTA QUE ESTA SE REQUIERE PARA SOLUCIONAR LAS HUMEDADES DE TUBERÍA A VAPOR.
2. VINILO TIPO 1 (SUPERLAVABLE) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS: SE INICIO ACTIVIDAD EN LOS PASILLOS PISO 1 Y 2 DE LA ESCUELA DEL CAFE EL 10/10/2020, CON INSUMO NO APROPIADO, SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA ENTREGAR LA FICHA TECNICA PARA AVALAR EL INSUMO Y REALIZAR NUEVAMENTE LA ACTIVIDAD (3 MANOS).

Sede: CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES DE OBRA.

Sede: DESPACHO REGIONAL

NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES DE OBRA.

ASPECTOS SG - SST - AMBIENTALES

SG-SST
-USO DE EPP – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
-TRABAJO EN ALTURAS: SE SOLICITA TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA A EJECUTAR LA ACTIVIDAD.
-DOTACIÓN: SE REALIZÓ DOTACIÓN DE LOS EPP- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AL PERSONAL DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
-SE SOLICITA CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN CARTELERA
-VIGÍA: SE SOLICITA CONFORMAR EL VIGÍA, LA ENCARGADA DEL SST DEL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE YA SE CONFORMÓ Y SE BRINDÓ LA CAPACITACIÓN, NO SE TIENE LOS SOPORTES DE ESTO, POR LO TANTO, SE SOLICITA TENER EN OBRA ESTA INFORMACIÓN.
-BRIGADA DE ASEO: NO SE HA CONFORMADO LA BRIGADA DE ASEO, SE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE ES EL ENCARGADO DE REALIZAR EL ASEO A LAS BATERÍAS SANITARIAS QUE LE PRESTARON EN LAS INSTALACIONES, AL IGUAL QUE MANTENER EN ORDEN Y ASEO EL CAMPAMENTO Y LAS ZONAS DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA.
-SEÑALES: FALTAN SEÑALES REGLAMENTARIAS, PREVENTIVAS E INFORMATIVAS. SE DEBEN SEÑALAR LAS ÁREAS DONDE SE ESTÁN EJECUTANDO ACTIVIDADES.
-DOCUMENTACIÓN: SE SOLICITA TENER EN OBRA LA CARPETA DE SST ACTUALIZADA.

AMBIENTALES
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES AL CONTRATISTA:
-FALTA SEÑALIZACIÓN Y ADECUACIÓN EN EL PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES.
-LOS RCD DE LA ZONA DE TRABAJO FRUHOR (FRUTAS Y HORTALIZAS), SE DEBEN DISPONER EN EL PUNTO DE ACOPIO.
-NO SE HA REALIZADO CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA EN EL COMPONENTE AMBIENTAL
-FALTAN 2 CANECAS Y SEÑALIZACIÓN.
-FALTA KIT DE DERRAMES.
EL SENA EN EL RECORRIDO AL PUNTO DE ACOPIO, DECIDE HABILITAR UN ESPACIO MÁS AMPLIO PARA DAR EN PRÉSTAMO AL CONTRATISTA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RCD.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Comités:

EL 14/10/2020 SE REALIZÓ COMITÉ DE OBRA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL ENTRE SENA-CONTRATISTA- INTERVENTORÍA, EN EL CUAL SE DESTACARON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: SE REALIZARON OBSERVACIONES AL CONTRATISTA DE LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PENDIENTES POR CUMPLIR.
2.ASPECTOS TÉCNICOS: SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, OBSERVACIONES DE MATERIALES, RECORRIDO DE OBRA A LAS ACTIVIDADES INICIADAS (ADECUACIONES DE ZONAS PARA ENCHAPE Y PINTURA MUROS) Y A LAS QUE PRESENTAN ALGUNA OBSERVACIÓN Y OTRAS QUE QUEDARON POR FUERA DE LA VISITA INICIAL, SE SOLICITA ACTA DE VECINDAD.
3.ASPECTOS PRESUPUESTALES: SE INFORMA ESTADO DEL BALANCE.
4.SG-SST: SE ACLARA PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE PERSONAL, SE SOLICITA AL CONTRATISTA CUMPLIMIENTO AL SG-SST Y SE REALIZA OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES.
5.EMERGENCIAS: EN OBRA SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE EMERGENCIAS (BOTIQUÍN, EXTINTOR, CAMILLA) Y SE REALIZA OBSERVACIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES.
6. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: SE SOLICITA AL CONTRATISTA CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO, SE REALIZA SOLICITUD DE ADECUACIÓN DE ZONA DE ALIMENTACIÓN, EN OBRA SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN Y ZONA DE AISLAMIENTO.
COMPROMISOS: SE ESTABLECEN COMPROMISOS Y SE SOLICITA DAR CUMPLIMIENTO.

Correspondencia:

NG.6404.20-047 Proyección flujo de caja contrato de obra No.CO1.PCCNTR.1552215

NG.6404.20-048 Respuestaa su comunicado OBR-SENA-2020-154

NG.6404.20-051 Solicitud cronogramade obra a 1 de diciembrede 202

NG.6404.20-052 Complementohacomunicado de interventoríaNG.6404.20-039–Ítemsno previstos

NG.6404.20-053 Traslado oficio de obra No. 168 –Definicióncambios distribución presupuestal

ASPECTOS JURIDICOS

La interventoria mediante comunicado NG.6404.20-045 ENTREGO oncepto jurídico Interventoría –SOBRE "CONCEPTO DE ASESOR EXTERNO SOBRE LA INCLUSIÓN DEL CONCEPTO "ADMINISTRACIÓN" EN RELACIÓN CON LOS COSTOS DE PROTOCOLOS COVID-19" –PAPSO del contratista CONSORCIO OBRAS PARA EL SENA. Ademas, mediante comunicado NG.6404.20-052 entrego el analisis solicitado por la supervision general del contrato en relaciona los ítems no previstos producto de las visitas.

OBSERVACIONES


1. NO SE DA CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO, POR PERSONAL INSUFICIENTE (PLAN DE TRABAJO 1: 1OF+1AYU - PLAN DE TRABAJO 2: 1OF+3AYU) Y FALTA DE MATERIALES EN OBRA.
2. TIEMPO PERDIDO POR UTILIZAR INSUMO NO APROPIADO PARA LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN MUROS, POR LO TANTO, SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA EJECUTAR NUEVAMENTE LA ACTIVIDAD Y REVISAR LOS INSUMOS ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. TRAS LO ANTEIOR ESTA INTERVENTORIA EMITIO SU COMNICADO NG.6404.20-060 EN CUAL SOLICITA AL CONTRATISTA ENTREGAR DE MANERA INMEDIATA EL PLAN DE CONTINGENCIA CORRESPONDIENTE.

PERSONAL ADMINISTRATIVO	CANTIDAD
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA	1
PERSONAL OPERATIVO	
1- IMPERMEABILIZACIONES	0
2- SISTEMAS ELÉCTRICOS	0
3- JARDINERÍA	0
4- EQUIPOS DE BOMBEO	0
5- MANTENIMIENTO Y LAVADO DE TANQUES	0
6- SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	0
7- REFRIGERACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)	0
8- MANTENIMIENTOS GENERALES	4
9- UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES.	0
10. ÍTEMS NO PREVISTOS	0
TOTAL PERSONAL EN OBRA	0

NOTA:
1. PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
2. NO SE TRABAJA SIMULTANEAMENTE EN AMBOS FRENTES DE LAS ACTIVIDADES INICIADAS: ENCHAPE EN LA ZONA FRUHOR (FRUTAS Y HORTALIZAS) Y PINTURA EN LA ESCUELA DEL CAFE.
3. EL PERSONAL EXISTENTE SE DESPLAZA DE UNA ACTIVIDAD A LA OTRA POR FALTA DE MATERIALES, SIN CULMINAR LAS ACTIVIDADES INICIALES (ACTIVIDADES CONSERNIENTES A ENCHAPE EN ZONA DE FRUHOR).

OBSERVACIONES:


DIRECTOR - COORDINADOR:

NOMBRES Y APELLIDOS	Ing. Arley Montañez Mendez	FIRMA		Director de Interventoría
NOMBRES Y APELLIDOS	Ing. Jhon Henry Narváez Panchá	FIRMA		Coordinador de Interventoría
NOMBRES Y APELLIDOS	Arq. Lina Yulieth López Granada	FIRMA		Residente de Interventoría

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	HOJA_____de _____
	INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORIA_REGIONAL QUINDÍO	

SEMANA No.	1	DEL	1/10/2020	AL	15/10/2020

ANEXO No. 1 - REGISTRO FOTOGRAFICO

			
UBICACION	DESCRIPCION	UBICACION	DESCRIPCION
CENTRO AGROINDUSTRIAL COLISEO	INICIO DE OBRA: CHARLA POR PARTE DE LAS PROFESIONALES DE SST DEL SENA Y RESIDENTE DE INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA	CENTRO AGROINDUSTRIAL COLISEO	ADECUACIÓN DE CAMPAMENTO
			
UBICACION	DESCRIPCION	UBICACION	DESCRIPCION
CENTRO AGROINDUSTRIAL COLISEO	CARTELERA INFORMATIVA Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA	CENTRO AGROINDUSTRIAL COLISEO	ZONA DE SALUD SEGÚN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
			
UBICACION	DESCRIPCION	UBICACION	DESCRIPCION
CENTRO AGROINDUSTRIAL ZONA DE ALIMENTACIÓN	INDUCCIÓN Y CAPACITACION POR PARTE DE LA PROFESIONAL SST DEL CONTRATISTA A LOS EMPLEADOS	CENTRO AGROINDUSTRIAL ZONA DE FRUHOR (FRUTAS Y HORTALIZAS)	ADECUACIÓN DE PARA LAS ACTIVIDADES PREVIAS A ENCHAPE
			
UBICACION	DESCRIPCION	UBICACION	DESCRIPCION
CENTRO AGROINDUSTRIAL ZONA DE FRUHOR (FRUTAS Y HORTALIZAS)	ADECUACIÓN DE ZONA DE FRUHOR (FRUTAS Y HORTALIZAS) PARA LAS ACTIVIDADES PREVIAS A ENCHAPE	CENTRO AGROINDUSTRIAL ESCUELA DEL CAFÉ PISO 1	ADECUACIÓN DE PASILLO PISO 1
			
UBICACION	DESCRIPCION	UBICACION	DESCRIPCION
CENTRO AGROINDUSTRIAL ESCUELA DEL CAFÉ PISO 2	VINILO TIPO 1 (SUPERLAVABLE) MUROS INTERIORES ACTIVIDAD NO APROBADA	CENTRO AGROINDUSTRIAL ESCUELA DEL CAFÉ PISO 2	VINILO TIPO 1 (SUPERLAVABLE) MUROS INTERIORES ACTIVIDAD NO APROBADA
