SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES GUAJIRA

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 02

PERÍODO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

ELABORÓ: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre: Ing. Soraya Navarro Bolaño	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 5
1.2. OBJETO A CONTRATAR 6
1.3. CONTRATO DE OBRA No . CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 7
1.4. LOCALIZACIÓN 7

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 9

2.1. FORMA DE PAGO 10
2.2. ANTICIPO DE OBRA 10
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 10
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 11
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 11
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 12
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 14
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 14
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 14

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
3.2. FORMA DE PAGO 16
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 17
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 17
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 18
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 18
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 18
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 19

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 20

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 20

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

6.1 CONCLUSIONES: 21
6.2 RECOMENDACIONES: 23

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto 7
Grafica 2. Localización geográfica del proyecto CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA 7
Grafica 3. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO 8
Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA 8
Grafica 5. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA 8

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 9
Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 11
Tabla 3. Control financiero contratista Sede Comercio y Servicio - Riohacha 13
Tabla 4. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao ...13
Tabla 5. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha 13
Tabla 6. Control financiero contratista Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca.....13
Tabla 7. Relación del personal Contrato 14
Tabla 8. Información general del contrato de interventoría 15
Tabla 9. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 16
Tabla 10. Relación del personal de Interventoría 17
Tabla 11. Relación de equipos del interventor 17
Tabla 12 Actas de comité 18
Tabla 13 Presupuesto sedes Atlántico 20

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Relación de planos.
Anexo No. 14: Informes semanales.
Anexo No. 15: Registro fotográfico.
Anexo No. 16: Bitácora de Obra.
Anexo No. 17: Programación actualizada. (CD)
Anexo No. 18. Documentos contrato de Obra e Interventoría

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, CONSORCIO INTER INGECO - GNG, presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Informe Mensual de Interventoría No. 2, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo, financiero, social y jurídico, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, y cuyo objeto es*: “MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.”,* Contrato suscrito el 15 de mayo de 2020 y con Acta de inicio suscrita el 21 de agosto de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2020 y el 11 de octubre de 2020 correspondiente al segundo mes de ejecución del Contrato de Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 16 de junio de 2020 tras un proceso de concurso de méritos CM-DG-0001-2020 para el LOTE No. 1 al **CONSORCIO INTER INGECO -GNG por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”

1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento de la Guajira, en los Municipios de Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas).



Grafica 1. Localización de la zona del proyecto



Grafica 2. Localización geográfica del proyecto CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



Grafica 3. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



Grafica 5. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas)
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual
VALOR ADICIÓN No. 01	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta
PRORROGA No. 01:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE DICIEMBRE DE 2020

2.1. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su segundo mes de ejecución.

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
PÓLIZAS	**COMPAÑÍA**	**VALOR ASEGURADO**	**NÚMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$ 1.755.459.751,40	M-100115506	07/05/2020	01/06/2021
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$ 438.864.937,85		07/05/2020	01/12/2023
ESTABILIDAD DE OBRA		$ 1.755.459.751,40		01/12/2020	01/12/2021
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$438.901.500,00	M–100019446	07/05/2020	01/12/2020

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2020 y el 11 de octubre de 2020 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- **Semana 5:** 07 de septiembre al 13 de septiembre de 2020
  Programado: 0.00%
  Ejecutado: 0.00%

- **Semana 6:** 14 de septiembre al 20 de septiembre de 2020
  Programado: Implementación de protocolos de Bioseguridad en las sedes:
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha
  - Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca

  Ejecutado: 0.00%

- **Semana 7:** 21 de septiembre al 27 de septiembre de 2020
  Programado:
  - Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 6,77%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 0,00%
  - Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 3,27%
  - Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

Ejecutado:

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 0,00%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 0,00%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 0,00%
- Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

- **Semana 8:** 28 de septiembre al 04 de octubre de 2020

Programado:

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 10,43%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 1,03%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 31,86%
- Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca: 12,93%

Ejecutado:

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 0,00%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 0,00%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 0,00%
- Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

- **Semana 9:** 05 de octubre al 11 de octubre de 2020

Programado:

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 4,17%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 10,58%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 26,66%
- Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca: 21,59%

Ejecutado:

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 0,00%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 0,00%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 0,00%
- Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

En el periodo del presente informe el Contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA presentó mediante oficio DCS-135-CO1. 2323 del 06 de octubre los PDF correspondientes a los flujos de caja de cada una de las sedes del Departamento de la Guajira acorde a su respectiva programación, sin embargo NO presenta avance de obra por lo tanto no existe un avance financiero del mismo. Se diligencia formato "Control Financiero Contratista" y se encuentra en el Anexo No. 01.

2.5.1. SEDE COMERCIO Y SERVICIO – RIOHACHA:

Tabla 3. Control financiero contratista Sede Comercio y Servicio - Riohacha

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 31.107.415	$ 31.107.415	$ 174.927.498
TOTALES		$ 0	$ 0	$ 31.107.415	$ 31.107.415	$ 174.927.498

2.5.2. CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO:

Tabla 4. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2.5.3. CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA:

Tabla 5. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 40.060.928	$ 40.060.928	$ 64.768.246
TOTALES		$ 0	$ 0	$ 40.060.928	$ 40.060.928	$ 64.768.246

2.5.4. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA:

Tabla 6. Control financiero contratista Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 7.648.641	$ 7.648.641	$ 21.653.257
TOTALES		$ 0	$ 0	$ 7.648.641	$ 7.648.641	$ 21.653.257

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato “Control de Personal Contratista”, en el Anexo No. 02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 7. Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	SINDY CASTRO AGUIRRE
3	Coordinador de Obra	LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO
4	Profesional SST	LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ
5	Inspector de seguridad	DUBYS VALENZUELA SANCHEZ
6	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
7	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
8	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.


En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, NO ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 12 de agosto de 2020 y el 11 de septiembre de 2020, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 06.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
	SEPTIEMBRE																			OCTUBRE												
DIA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																															
Seco o Soleado	0	6	4	6	6	4	6	6	8	4	8	6	4	4	4	6	6	4	4	4	4	0	4	4	4	6	4	4	4	6	140
Nublado	8	2	4	2	2	4	2	2	0	4	0	2	4	4	4	2	2	4	4	4	4	8	4	4	4	2	4	4	4	2	100
Lluvias intensas																															0
Lluvias moderadas																						1									1
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

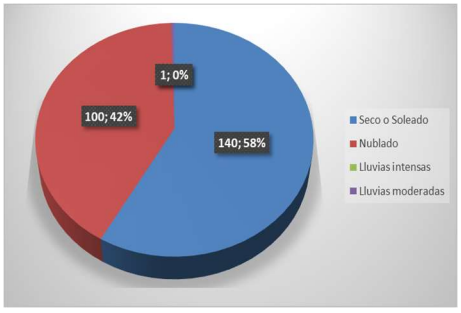

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 8. Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO - GNG
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas)
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900) incluido IVA
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.

3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del segundo mes de ejecución. El estado legal del contrato de Interventoría se encuentra registrado en el Formato “Control Legal Interventoría” y las pólizas actualizadas en el Anexo No. 15:

Tabla 9. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$138.309.580,00	15-44-101228786	12/08/2020	28/07/2021
CALIDAD DEL SERVICIO		$138.309.580,00		12/08/2020	13/01/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$34.577.395,00		12/08/2020	27/01/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$351.121.200,00	15-40-101064985	12/08/2020	27/01/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Debido a que los pagos parciales mensuales de interventoría equivalen al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción y a la fecha de este informe el Contratista no ha ejecutado actividades, se relaciona el estado financiero del contrato de interventoría relacionando valores en cero pagados a la Interventoría, valor ejecutado

y valor programado a la fecha del presente informe. Se diligencia formato “Control Financiero Interventoría” y se encuentra en el Anexo No. 07.

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
						$ 691.547.950,00
1	12/08/20–11/09/20	$0	$0	$0	$0	$0
2	12/09/20–11/10/20	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría contó con el siguiente personal para la ejecución del segundo mes comprendido entre el 12 de septiembre de 2020 y el 11 de octubre de 2020. Se diligencia formato “Control de Personal Interventoría”, se encuentra en el Anexo No. 8:

Tabla 10. Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	SORAYA NAVARRO
4	Residente SST	YALILE RINCÓN RUIZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato “Control de Maquinaria y Equipos Interventoría”. Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 11. Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período se realizaron los siguientes comités de obra. Anexo N° 11

Tabla 12 Actas de comité

Fecha	Comité No.
17-09-20	2

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 12 de septiembre de 2020 al 11 de octubre de 2020, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Gestionar toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redirección al SENA.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Suscripción de actas de comité registradas en el período.
- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y acompañamiento a las visitas diagnósticas realizadas a las diferentes sedes del SENA en el Departamento conforme a la programación presentada por el contratista y avalada por interventoría.
- Seguimiento y control de los procesos constructivos conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.

- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.
- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.
- Seguimiento y control de calidad a la disposición de herramienta y equipo utilizado en el período.
- Seguimiento y control de los procesos ejecutados en los frentes de trabajo.
- Registro de recomendaciones y requerimientos realizados en campo al contratista, suscritos en el libro de obra.
- Cuantificación de obras ejecutadas en el período.
- Control y seguimiento a las no conformidades en cada uno de los frentes de trabajo.
- Revisión y verificación de la aplicación del plan ambiental, presentado por el contratista.
- Revisión y verificación al cumplimiento del programa de seguridad industrial presentado por el contratista.
- Revisión del cumplimiento del programa de calidad presentado por el contratista.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato equivale a OCHO MIL SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCENTA Y SIETE PESOS M(CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

Con un valor contractual designado para la regional de Atlántico de $763.321.793.

Según presupuesto entregado por el Contratista en el periodo del presente informe, se tienen los siguientes valores presupuestales por sede:

Tabla 13 Presupuesto sedes Atlántico

SEDE	DIRECCIÓN	VALOR
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA	KM1 VIA BARRANCAS	$ 27,364,346
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS	CARRERA 42 A Y 45 TRONCAL DEL CARIBE	$ 50,771,054
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS	TRONCAL DEL CARIBE- RIOHACHA - MAICAO KM 5	$ 80,076,766
SEDE COMERCIO Y SERVICIOS / DIRECCION REGIONAL/CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA/ CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS	KR 15 # 19-40	$ 179,765,940
CENTRO DE FORMACIÓN	CALLE 14 No. 11-134	NO HA PRESENTADO

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

El contratista presentó los respectivos diagnósticos para las diferentes sedes del Departamento de la Guajira mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre, sin embargo se realizaron observaciones al contenido de los mismos, teniendo en cuenta que no se ajustaron a lo descrito en su contrato de obra, Capítulo 2.3 ítem 3.2 el cual indica que debe contener un consolidado final del estado actual de las instalaciones a intervenir (con sugerencias de intervención, evaluación programación, detalles de ejecución en los casos que aplique), presentar un cronograma de intervenciones por instalación de la Entidad, presentar el Programa de Calidad específico para el proyecto, el cual debe contener los lineamientos de calidad e indiciadores que deben tenerse en cuenta en cuanto a procesos constructivos, calidad de materiales a emplear acabados y demás aspectos contemplados en el Manual de Mantenimiento de la Entidad, dicha obligación fue solicitada mediante comunicados CINP-BTA-023-0071-4700 del 7 de septiembre, CINP-BTA-023-0122-5009 del 17 de septiembre, CINP-BTA-023-0142-5186 del 23 de septiembre.

Referente a la aprobación de documentos contractuales, mediante oficio CINP-BTA-023-0099-4898 del 14 de septiembre esta Interventoría emitió las últimas observaciones referentes a los Análisis de Precios Contractuales las cuales fueron subsanadas mediante oficio DCS-082-CO1.2328 del 17 de septiembre respecto a la descripción de cada ítem, contener lo indicado en los APU´s entregados por la Entidad y el costo de los mismos el cual debe coincidir exactamente con el presentado en la propuesta económica.

Respecto a la solicitud de aprobación de APU´s No Previstos presentada por el contratista mediante oficios DCS-094-CO1.6309 del 25 de septiembre, DCS-126-CO1. 2323 del 05 de octubre, DCS-133-CO1.2323 del 05 de octubre, esta interventoría mediante oficio CINP-BTA-0187-5430 del 2 de octubre de 2020 remitió observaciones que no han sido subsanadas, en virtud de lo expuesto en el capítulo ***4.1.4 Aprobación de Precios para ítem nuevos*** de los anexos al contrato No. CO1.PCCNTR.1636309: “*El Contratista de obra presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica correspondiente y el análisis de los nuevos precios unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista de obra la modificación o aclaración que estime conveniente …”.*

A fecha de corte del presente informe el contrato de obra CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no presenta adelanto en sus actividades teniendo en cuenta que para el segundo mes sólo se realizaron actividades administrativas concernientes a la presentación de presupuestos, programaciones y flujos de caja.

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha:

De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 21,37% debido a que a fecha de corte del presente informe no se habían ejecutado actividades constructivas. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia en el que se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría.

- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 11,61% debido a que a fecha de corte del presente informe no se habían ejecutado actividades constructivas. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia en el que se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría.

- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 61,78% debido a que a fecha de corte del presente informe no se habían ejecutado actividades constructivas. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia en el que se evidencien los recursos que se van a disponer para recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría.

- Centro Agroempresarial y Acuícola – Fonseca:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 34,52% debido a que a fecha de corte del presente informe no se habían ejecutado actividades constructivas. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia en el que se evidencien los recursos que se van a disponer para

recuperar el retraso que se lleva de tal forma que se cumplan las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, según programa de obra aprobado por esta Interventoría.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda nuevamente al SENA, que las Especificaciones Técnicas sean mejoradas para un mayor entendimiento de cada una. En todas las especificaciones particulares falta ampliar procedimientos de ejecución y alcances del ítem los cuales deben ser evaluadas y complementadas. Se debe desglosar los presupuestos por sedes a intervenir y no de manera global por Centro de formación, que permita identificar las actividades a ejecutar en cada lugar, con el fin de solventar las inconsistencias encontradas en campo con respecto a las cantidades planteadas en los presupuestos.

Se recomienda al contratista disponer de los recursos para el desarrollo de las obras de manera oportuna y de primera calidad según lo dispuesto en el contrato. Dar cumplimiento oportuno a las actividades administrativas que hacen parte del contrato como son la presentación de APU´s, Presupuestos definitivos, Programación de Obra de las actividades a realizar, Programa de Inversiones semana por semana, Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades, Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada.

A la fecha no se ha presentado de manera completa y en debida forma la documentación requerida de ningún trabajador, por lo que se debe realizar la respectiva subsanación.

Si bien es cierto se presentaron reprogramaciones para las sedes a intervenir, a la fecha ya se presentan atrasos en el inicio de actividades de obra como se relaciona en el siguiente cuadro:

REGIONAL	MUNICIPIO	DIRECCION	IDENTIFICACION DEL INMUEBLE O DE LA EDIFICACION ACTUAL	FECHA DE INICIO REPROGRAMACION PROPUESTA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO	INICIO DE OBRA REPROGRAMACION PROPUESTA	FECHA DE TERMINACION REPROGRAMACION PROPUESTA
GUAJIRA	FONSECA	KM1 VIA BARRANCAS	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA	7/10/2020	8/10/2020	1/12/2020
GUAJIRA	MAICAO	CARRERA 42 A Y 45 TRONCAL DEL CARIBE	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS	9/10/2020	14/10/2020	1/12/2020
GUAJIRA	RIOHACHA	TRONCAL DEL CARIBE- RIOHACHA - MAICAO KM 5	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS	2/10/2020	3/10/2020	30/11/2020
GUAJIRA	RIOHACHA	KR 15 # 19-40	SEDE COMERCIO Y SERVICIOS / DIRECCION REGIONAL/CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA/ CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS	30/09/2020	1/10/2020	1/12/2020

Se dio visto bueno de las programaciones ajustadas para las sedes: CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS- RIOHACHA, SEDE COMERCIO Y SERVICIO – RIOHACHA, CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS – MAICAO, CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA – FONSECA, sin embargo,

para la aprobación definitiva de estas programaciones, el contratista debe anexar el archivo digital en Project de la misma y los programas de inversión semanal de cada programación.

Mediante comunicado CINP-BTA-023-0198-5473 del 05 de octubre esta interventoría solicitó las evidencias de implementación de los protocolos de bioseguridad, con respecto a la programación presentada por el contratista para el inicio de actividades en las sedes del Sena a nivel nacional, lo cual a la fecha no ha sido atendido, por lo cual se solicita NUEVAMENTE la entrega de los documentos faltantes para poder dar cumplimiento a sus obligaciones y no seguir generando atrasos en el plazo contractual de la obra.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG Ingeniería S.A.S.

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2020

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	$ 8,777,298,757	$ 0	$ -	$ 0
1	Agos Sep	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	Sep Oct	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		$ -	$ -	$ -	$ 0	-	$ -	$ 0

Firma

Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIOINTERINGECOGNG

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2020

FECHA	SEPTIEMBRE																			OCTUBRE											OBSERVACIONES
CARGO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE**	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
RESIDENTE TÉCNICO - **LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO**	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
PROFESIONAL SST - **LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ**	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
PROFESIONAL AMBIENTAL -																																
OFICIALES Y MAESTROS DE OBRA																																
AYUDANTES																																
OPERADORES DE MAQUINARIA																																
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																																
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	TOTAL PERIODO 78

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
De la región																																0	0.00%	
De fuera de la región																																0	0.00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
De la región																																0	0.00%	
De fuera de la región																																0	0.00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**78**	**100.00%**	
De la región	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	33.33%	
De fuera de la región	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		52	66.67%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
En proceso de reinserción social																																0	0.00%	
En condición de desplazamiento																																0	0.00%	
MUJERES	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
Mano de Obra no Calificada																																0	0.00%	
Mano de Obra Calificada																																0	0.00%	
Profesionales - Técnicos	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	33.33%	
PROVEEDORES	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
Local																																0	0.00%	
Nacional																																0	0.00%	
Internactional																																0	0.00%	

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingenieria S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

OBRA [X]
INTERVENTORIA [ ]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR ENCARGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS				

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR DESIGNADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 de septiembre de 2020 y el 11 de octubre de 2020

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	SEPTIEMBRE																		OCTUBRE											
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																															
Seco o Soleado	0	6	4	6	6	4	6	6	8	4	8	6	4	4	4	6	6	4	4	4	4	0	4	4	4	6	4	4	4	6	140
Nublado	8	2	4	2	2	4	2	2	0	4	0	2	4	4	4	2	2	4	4	4	4	8	4	4	4	2	4	4	4	2	100
Lluvias intensas																															0
Lluvias moderadas																						1									1
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing.Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA

OBRA
INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2020

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A		$ -	$ -	$ -
1	Agos Sep	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
2	Sep Oct	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ -**			

	CALCULO DE CORTE DE INTERVENTORIA No.02	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
VCI=	Valor inicial del contrato de Interventoria	$ 691,547,900.00
VACI 1=	Valor adiciones	$ -
VACT=	Valor total contrato de Interventoria	$ 691,547,900.00
	FORMA DE PAGO CONTRATO INTERVENTORIA	
	Costo variable (90%)	$ 622,393,110.00
	Liquidacion (10%)	$ 69,154,790.00
	TOTAL	$ 691,547,900.00
	CONTRATO DE OBRA	
VICO=	Valor inicial contrato de obra	$ 8,777,298,757.00
VACO 1=	Valor adiciones	$ -
VTCO=	Valor Total contrato de obra	$ 8,777,298,757.00
VAO=	Valor acta de obra No.01	$ -
%AO=	(VAO/VTCO)*100=($0/$8.777.298.757)*100=	0.00%
%AO=	Porcentaje de avance de obra	**0.00%**
	CALCULO VALOR VARIABLE PRESENTE ACTA	
VAI=	(%AO*VTCI)/100 = (0,0%*$691.547.900) =	$ -
VAI=	Valor acta de Interventoria	**$** -
	VALOR A FACTURAR	**$ -**

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIOINTERINGECOGNG

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA | **INTERVENTORIA** [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2020

FECHA	SEPTIEMBRE																			OCTUBRE										OBSERVACIONES
CARGO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
RESIDENTE TÉCNICO - **SORAYA NAVARRO**	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
PROFESIONAL SST - **YALILE RINCON RUIZ**	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA**	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ**	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA**	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**6**		**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**		**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**		**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**		**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**		**TOTAL PERIODO** **156**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
De la región																																0	0.00%	
De fuera de la región																																0	0.00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
De la región																																0	0.00%	
De fuera de la región																																0	0.00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**78**	**50.00%**	
De la región	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	16.67%	
De fuera de la región	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		52	33.33%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
En proceso de reinserción social																																0	0.00%	
En condición de desplazamiento																																0	0.00%	
MUJERES	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
Mano de Obra no Calificada																																0	0.00%	
Mano de Obra Calificada																																0	0.00%	
Profesionales - Técnicos	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		52	33.33%	
PROVEEDORES	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0.00%**	
Local																																0	0.00%	
Nacional																																0	0.00%	
Internactional																																0	0.00%	

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901286694
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO GUATAVITA 2019
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7765943255**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		763953566	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 836.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000	$ 0	$ 836.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.968.100	$ 0	$ 0	$ 47.300	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 3.062.700	$ 0	$ 3.062.700
SUBTOTALES:										**$ 3.898.700**	**$ 0**	**$ 3.898.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 165.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.309.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.309.300	$ 0	$ 0	$ 1.309.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 140.100
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 96.000
EPSC22	EPSC22-CONVIDA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000
SUBTOTALES:													**$ 1.754.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.754.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 735.100	$ 735.100	$ 0	$ 0	$ 735.100
SUBTOTALES:									**$ 735.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 735.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 951.100	$ 0	$ 951.100
SUBTOTALES:			**$ 951.100**	**$ 0**	**$ 951.100**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 283.500	$ 0	$ 283.500
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 189.000	$ 0	$ 189.000
SUBTOTALES:			**$ 472.500**	**$ 0**	**$ 472.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1014182441	PEREZ RESTREPO XIOMARA ANDREA	DEPEND		$ 2.625.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.625.000	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.625.000	$ 105.000	$ 0	$ 105.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.625.000		$ 182.700	30	$ 2.625.000	CCF24-COMPENSAR	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1016051107	VELASQUEZ RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.400.000		$ 167.100	30	$ 2.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1069743525	ROJAS CORREA HEINER GIOVANNI	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.200.000		$ 16.800	30	$ 3.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1069873145	HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	09																230301-PORVENIR	22	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000	EPSC22-CONVIDA	22	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 1.100.000		$ 76.600	22	$ 1.100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1069873402	PEREZ MANJARRES YIDMER	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1082837753	QUANDT PEÑA ANDRES ALFONSO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	17	$ 1.983.334	$ 317.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 317.400	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 1.983.334	$ 79.400	$ 0	$ 79.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	17	$ 1.983.334		$ 138.100	17	$ 1.983.334	CCF24-COMPENSAR	$ 79.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1082837753	QUANDT PEÑA ANDRES ALFONSO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI														18-30			25-14 COLPENSIONES	13	$ 1.516.667	$ 242.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.700	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 1.516.667	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13	$ 1.516.667		$ 0	13	$ 1.516.667	CCF24-COMPENSAR	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 9.450.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 9.450.000	$ 1.512.000	$ 47.300	$ 47.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.606.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 9.450.000	$ 1.181.300	$ 0	$ 1.181.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 9.450.000		$ 49.400	30	$ 9.450.000	CCF24-COMPENSAR	$ 378.000	$ 189.000	$ 283.500	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901286694
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO GUATAVITA 2019
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7765943255**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2020
DÍAS DE MORA:		0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		763953566		

TOTAL	$ 7.811.800

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7765905159**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2020
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	763945517		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.000	$ 0	$ 2.192.000
SUBTOTALES:										**$ 3.312.000**	**$ 0**	**$ 3.312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 548.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
SUBTOTALES:													**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 828.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.440.800	$ 1.440.800	$ 0	$ 0	$ 1.440.800
SUBTOTALES:									**$ 1.440.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
SUBTOTALES:			**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 828.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES													
																									PENSIÓN									SALUD							ARP																							
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1140836813	BARROS MENA ANDRES RAFAEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 39141822	NAVARRO BOLAÑO SORAYA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 72180405	DE AVILA GOMEZ JULIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 77106298	MORALES GALINDO JOSE FIDEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 78760291	SOLANO ALMANZA SERGIO JAVIER	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 92535392	SIERRA HERNANDEZ JAIR ERITH	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.200.000		$ 222.800	30	$ 3.200.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.408.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7765906228**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		762848907	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.209.300	$ 0	$ 0	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 1.254.300	$ 0	$ 1.254.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 3.830.800	$ 0	$ 0	$ 109.400	$ 109.400	$ 0	$ 0	$ 4.049.600	$ 0	$ 4.049.600
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.596.000	$ 0	$ 0	$ 49.900	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 1.695.800	$ 0	$ 1.695.800
SUBTOTALES:										**$ 6.999.700**	**$ 0**	**$ 6.999.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.650.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.650.100	$ 0	$ 0	$ 2.650.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 180.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 273.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.000	$ 0	$ 0	$ 273.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 253.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.900	$ 0	$ 0	$ 253.900
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 56.700
SUBTOTALES:													**$ 3.413.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.413.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 802.000	$ 802.000	$ 0	$ 0	$ 802.000
SUBTOTALES:									**$ 802.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 802.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	9	$ 1.715.800	$ 0	$ 1.715.800
SUBTOTALES:			**$ 1.715.800**	**$ 0**	**$ 1.715.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 599.300	$ 0	$ 599.300
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:			**$ 799.300**	**$ 0**	**$ 799.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.417.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 1.417.000	$ 56.700	$ 0	$ 56.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.417.000		$ 98.700	30	$ 1.417.000	CCF24-COMPENSAR	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 19377460	POSADA MARTINEZ GUILLERMO	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 765.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.500.000		$ 313.200	30	$ 4.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 32773848	ROLON AMAYA YUDY PATRICIA	DEPEND		$ 10.000.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 10.000.000	$ 1.600.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.700.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 10.000.000	$ 1.250.000	$ 0	$ 1.250.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 10.000.000		$ 52.200	30	$ 10.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0
4	CC 38465287	MOSQUERA IBARGUEN DAMARIS	DEPEND		$ 2.080.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.080.000	$ 332.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.080.000	$ 83.200	$ 0	$ 83.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.080.000		$ 10.900	30	$ 2.080.000	CCF24-COMPENSAR	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.037.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.037.500	$ 806.000	$ 25.200	$ 25.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 856.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.037.500	$ 201.500	$ 0	$ 201.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.037.500		$ 26.300	30	$ 5.037.500	CCF24-COMPENSAR	$ 201.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 9.975.000	FIJO			NO																	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 9.975.000	$ 1.596.000	$ 49.900	$ 49.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.695.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 9.975.000	$ 1.246.900	$ 0	$ 1.246.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 9.975.000		$ 52.100	30	$ 9.975.000	CCF24-COMPENSAR	$ 399.000	$ 0	$ 299.300	$ 0	$ 0
7	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.825.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.825.000	$ 1.092.000	$ 34.200	$ 34.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.160.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.825.000	$ 273.000	$ 0	$ 273.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 6.825.000		$ 35.700	30	$ 6.825.000	CCF24-COMPENSAR	$ 273.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 8002292	SANCHEZ OSPINA LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.308.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.308.000	$ 209.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 209.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.308.000	$ 52.400	$ 0	$ 52.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.308.000		$ 91.100	30	$ 1.308.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7765906228**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/10/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	762848907		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 80268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.750.000	$ 121.800	$ 121.800	30	$ 1.750.000	CCF24-COMPENSAR	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 13.730.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7765909790**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		762854390	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 704.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.000	$ 0	$ 704.000
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.353.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.353.900	$ 0	$ 2.353.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.000	$ 0	$ 504.000
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.059.700	$ 0	$ 0	$ 19.000	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 1.097.700	$ 0	$ 1.097.700
SUBTOTALES:										**$ 4.659.600**	**$ 0**	**$ 4.659.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 56.000
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 182.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.200	$ 0	$ 0	$ 356.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 69.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 367.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900	$ 0	$ 0	$ 367.900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 117.600
SUBTOTALES:													**$ 1.155.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.155.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.233.900	$ 1.233.900	$ 0	$ 0	$ 1.233.900
SUBTOTALES:									**$ 1.233.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.233.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	3	$ 299.600	$ 0	$ 299.600
CCF24	CCF24-COMPENSAR	11	$ 856.000	$ 0	$ 856.000
SUBTOTALES:			**$ 1.155.600**	**$ 0**	**$ 1.155.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1013659310	BORJA MEJIA YULLY CATHERINE	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 66.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.650.000		$ 8.700	30	$ 1.650.000	CCF24-COMPENSAR	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020809187	GUTIERREZ ROLON CAMILA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1032476484	CELIS DIAZ ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.900.000		$ 15.200	30	$ 2.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1054916932	GUTIERREZ RODAS MANUEL ENRIQUE	DEPEND		$ 2.940.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.940.000	$ 470.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 470.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.940.000	$ 117.600	$ 0	$ 117.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.940.000		$ 204.700	30	$ 2.940.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1060588261	LOPEZ VILLADA JOHAN ANDRES	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.400.000		$ 97.500	30	$ 1.400.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1090428683	ROLON AMAYA SERGIO ANDRES	DEPEND		$ 1.744.000	FIJO			SI		30														230301-PORVENIR	30	$ 1.744.000	$ 279.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 279.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.744.000	$ 69.800	$ 0	$ 69.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.744.000		$ 121.400	30	$ 1.744.000	CCF24-COMPENSAR	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 40042302	PATARROYO CABRERA AIDEE JAZMIN	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 42081884	ARISTIZABAL MURILLO CARMEN PATRICIA	DEPEND		$ 3.150.000	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 3.150.000	$ 504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.150.000	$ 126.000	$ 0	$ 126.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.150.000		$ 219.300	30	$ 3.150.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7765909790**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/10/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	762854390

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP											
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 45781892	LEONES HERRERA YOLANIS	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.046.025	$ 167.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.046.025	$ 41.900	$ 0	$ 41.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.046.025		$ 5.500	30	$ 1.046.025	CCF24-COMPENSAR	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52021726	VELASQUEZ SANCHEZ LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 3.800.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.800.000	$ 608.000	$ 19.000	$ 19.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 646.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 152.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.800.000		$ 264.500	30	$ 3.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 52076340	VASQUEZ BORDA CLAUDIA DEL PILAR	DEPEND		$ 2.075.850	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.075.850	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.075.850	$ 83.100	$ 0	$ 83.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.075.850		$ 10.900	30	$ 2.075.850	CCF24-COMPENSAR	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52547621	ROBAYO GUERRA EDITH	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.400.000		$ 7.400	30	$ 1.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 52874534	SOTO POLOCHE CARMEN MILENA	DEPEND		$ 3.800.000	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 126.667	$ 20.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20.300	EPS017-FAMISANAR	1	$ 126.667	$ 5.100	$ 0	$ 5.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 126.667		$ 8.900	1	$ 126.667	CCF24-COMPENSAR	$ 5.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 80067157	MONTENEGRO SANTAFE MARCO AURELIO	DEPEND		$ 4.536.000	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 151.200	$ 24.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.200	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 151.200	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 151.200		$ 10.600	1	$ 151.200	CCF24-COMPENSAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 8.204.700**

Planilla Pagada

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

OBRA
INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

	ACTA No. 002		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN			
CIUDAD Y FECHA: 17 septiembre 2020	**HORA DE INICIO: 1:00 PM**	**HORA FIN: 2:10 PM**	
LUGAR: **REUNIÓN VIRTUAL**	**DIRECCIÓN GENERAL / DAF / OFICINA COORDINADOR CONSTRUCCIONES**		
TEMAS: MANTENIMIENTO LOTE 1			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar avances según compromisos de la reunión del 8 de septiembre de 2020, Contratista de Obra, Interventoría			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

LOTE 1

* Interviene Andrés (Sena) se leen los compromisos del acta anterior para que la interventoría indique lo que se ha cumplido y que otras falencias hay en este momento, compromisos el 9 septiembre 2020 se enviaran el de Sabanalarga y Sincelejo qué sería enviar el informe diagnóstico el presupuesto sin los no previstos y la programación del personal que va a ingresar con el compromiso de que una vez ya se vayan iniciar la obra pues lógicamente del personal deben emitir las respectivas afiliaciones y demás documentación que requería para el inicio como tal de la obra, para el 10 sep. jueves sería Barranquilla Valledupar y montería, Para él 11 sep. viernes Santa Marta Riohacha y Cartagena, para el 15 sep. martes el restante de las que ya nos han enviado por correo electrónico como aprobadas para iniciar, y el último compromiso establecía que el 14 septiembre 2020 se iniciará la intervención en la primera sede y arrancando con el protocolo de bioseguridad eso es lo que quedó plasmado en el acta.

* La Interventoría: se creó una matriz de seguimiento que contiene cantidad de sedes, regional, municipio, identificación de la sede y diagnóstico, se resume si se entregó o no presupuesto, si se entregó programación, fecha propuesta de inicio, qué es muy diferente a la fecha inicio de obra porque es el período que el contratista estima prudente para hacer implementación de protocolos de bioseguridad en las sedes y la fecha planteada como fecha de terminación, la identificación se implementó en protocolo en debida forma, la verificación de inicio de obras, como está el presupuesto del contrato estimado el frente al que arroja un diagnóstico si contamos con un recurso gráfico, si ya se autorizó el ingreso del personal y qué observaciones se tienen, sí se va a hablar de entrega de presupuestos y programación, es importante aclarar que nosotros como interventoría debemos exigir de acuerdo a lo que exige el contrato la entrega de diagnósticos diligenciados de la debida forma cumpliendo todos los requisitos, se toma la decisión en aras de ir avanzando en las obras aprobar presupuesto y programación para que el contratista pudiera proceder con la entrega de los permisos o de la documentación para los permisos de la entrega de la entrada del personal y después el contratista fuera cumpliendo con la totalidad de los diagnósticos o el paquete completo. Se debe hacer énfasis en el cumplimiento de una entrega de presupuesto y de programación, si se mira en el grupo Atlántico la única sede que no se ha entregado presupuesto es la sede de malambo, el contratista se había comprometido a entregar para Sabanalarga no se ha entregado ni presupuesto ni programación, la fecha tentativa de inicio estaba para

el día 11 de septiembre donde se ese mismo día se realizaría la implementación y se iniciaría con obras según presupuestado, la totalidad de los presupuestos tienen entregados incluyendo unas actividades no previstas de las cuales todavía no están aprobados los no previstos, el día de ayer en la tarde al final del día se recibió un documento que está siendo evaluado pero esos presupuestos que tenemos no están todavía incluido lo qué es actividades no previstas, si las actividades estaban previstas para el 15 para estas sedes y el 11 para Sabanalarga entonces nos procedemos a mirar y efectivamente encontramos que el contratista en la sede industrial de aviación Barranquilla inició o está iniciando el 16 con actividades pero actividades no previstas entonces estás actividades todavía no tienen claridad si efectivamente se va a proceder con el reconocimiento de la misma porque no se ha aprobado los APU no previstos, lo mismo pasa en las dos sedes de Sabanalarga donde el contratista tenía pensado iniciar el 11; inició el 11 pero con actividades no previstas, plantea el inicio de actividades no previstas para esas fechas, estoy diciendo que el plantea iniciar actividades pero que a la fecha no han implementado, por lo tanto no se ha arrancado; en la sede Barranquilla centro de comercio y servicios y la dirección regional se implementó, pero no se ha iniciado obras, Bolívar y Sucre , solo se han entregado presupuestos de dos sedes la sede de Cartagena y Tolú ,se proyectó cómo inició para hacer la implementación el 18 el 11 y el 14 con fecha de inicio el mismo día, es decir, se planteaba salvo la sede de Tolú que en el mismo día se implementaba y arrancaban ,solo se ha implementado en Sincelejo en la sede de Corozal y en la finca El Rodeo y se iniciaron obras, acá no hay observaciones, en la sede de Cartagena y en la sede de Turbaco se tienen observaciones que el contratista dentro de su programación, arrancar con actividades no previstas y en la sede de Turbaco el contratista no especifica a que corresponde el presupuesto y la programación, César tenemos pendiente de entregar presupuesto y programación de Aguachica de la Jagua de Ibirico y tenemos pendiente el Centro de Desarrollo Vecinal de Valledupar, no se ha iniciado en ninguna de las sedes ni hemos implementado, las fechas de inicio estaban para el 15 de septiembre, en Córdoba solo está pendiente el Centro Agropecuario El Porvenir las otras 6 sedes estaban pensadas para iniciar de implementación el 14 de septiembre a la fecha no se ha implementado, no se ha iniciado obra, en Montería en la dirección regional se presenta una programación que habla de que está contemplado iniciar con una actividades no previstas, tampoco se puede arrancar, La Guajira y Magdalena a excepción de Uribia está presentado un presupuesto y programación con fecha de mañana y arranque de obra el día sábado y en Maicao el día 25 sep., sin embargo, está pendiente porque en tres sedes estaba pensado arrancar con actividades no previstas, en Magdalena no se ha presentado nada, en Providencia se sabe que todavía no está permitidos los vuelos, en San Andrés se tiene la sede regional y el centro de formación tenemos que se entregó el presupuesto y la programación tenemos pensado para mañana iniciar con la implementación y automáticamente iniciar también con las obras suponiendo que la implementación queda debida forma y avalada por las partes, en los presupuestos hay algunos que superan el valor del presupuesto contractual propuesto como por ejemplo Sabanalarga el predio está superando el valor aunque todavía no tenemos aprobado los ítems no previstos, entonces no se puede hablar si se va de verdad a exceder en el valor del presupuesto original frente al que se está planteando es la única sede que sucede esa situación en San Andrés hay un tema de presupuestos por que el presupuesto contracual se tenía por 94 millones para estas dos sedes, la dirección regional y la sede de formación y lo que valoró el contratista es de 363 millones, el contratista debe evaluar y revisar esto ya que es un valor bastante elevado. Igualmente menciona que hay un comunicado respuesta al comunicado numero 59 enviado el día de ayer donde el contratista manifiesta estar cumpliendo con sus obligaciones y haber respondido a todos los comunicados de la interventoría, se manifestó que se han realizado observaciones que a la fecha no han sido atendidas en debida forma, comunicado entregado el día de ayer, el contratista ha venido subsanando algunas de esas observaciones.

*Interviene Jorge Molina (representante legal del consorcio), manifesta la intención de los constructores del proyecto de sacar el proyecto adelante, solicita que la entidad tuviera ya la claridad de la situación real de contrato en este momento, se ha hecho un esfuerzo que no se ha tenido en cuenta en presentar los diagnósticos lo mejor posibles , pero nos hemos encontrado con una situación donde hasta el momento hemos encontrado 456 ítems no previstos que están presentando, ante 196 contractuales, en la intervención de la interventoría manifestaba que la programación empezaba con estos ítems no previstos por que son necesarios para la ejecución de los contractuales, un ejemplo de las impermeabilizaciones planteadas en donde no se ha tenido en cuenta del retiro de las anteriores, el arreglo de fisuras, El alistamiento de la superficie para instalar el nuevo manto y este es un ejemplo de muchos pero la realidad es que la planeación que se hizo para para la

proyección del tema, o sea del contrato le faltaron todos estos ítems y pensamos que simplemente las sedes mandaron unas necesidades de ejecución de actividades a nivel general pero técnicamente no fueron planteadas adecuadamente; quisiéramos que la entidad tuviera en cuenta esta realidad que hemos encontrado, lo otro que se ha manifestado a través del tiempo son las fechas que hemos tenido, pues inicialmente nosotros tuvimos una adjudicación el 12 de mayo pero con un inicio el 21 de agosto tiempo en el cual la entidad demoro en adjudicar la interventoría y hasta el 4 de septiembre empezamos a terminar las visitas, entonces en 13 días se ha realizado un esfuerzo gigantesco, en vez de un profesional como lo exigió el contrato en programación de obra tenemos 6, entonces estamos haciendo todo el esfuerzo, pero vemos que no se ha reconocido en ese tema y lo digo porque habido cartas de incumplimiento a la aseguradora, cartas de incumplimiento a la entidad, pero no se ha manifestado la realidad del contrato, enfatizo tenemos toda la intención de sacarlo adelante, vemos que ya estamos terminando toda esa evaluación pero sí quisiéramos y que los supervisores y la parte jurídica de la entidad tenga en cuenta que hemos estado tratando de enderezar el norte del proyecto junto con la interventoría enviando información pero vuelvo y le digo hay situaciones y muchas situaciones en donde la legalización de los no previstos tendría que darse muy ágilmente para poder iniciar y la verdad es que vemos que hay una presión jurídica insistiendo incumplimientos y por el contrario no se está viendo el esfuerzo nuestro para poner a punto el proyecto, pues yo le insistí al Dr. Edgar que son actividades muy sencilla seguramente las vamos a poder sacar adelante en los tiempos previstos, son muy cercanos a los previstos, pero sí necesitamos de que haya ese reconocimiento porque prácticamente las sedes estaban mal planificadas, no hay una concordancia dentro de lo que cotizamos en las propuestas con lo que se está viendo realmente, y queremos que se tenga eso en cuenta, nuestros profesionales van a tocar estos temas y cuales quedan cómo compromisos, pero si quisiera que la entidad y la interventoría quitara esa palabra de incumplimiento que se ha manifestado tanto a la aseguradora cómo a la entidad, queremos qué no se siga manifestando, pues vemos como contratistas que no se ve lo que estamos haciendo, en tratar de solucionar los temas, el hablar que el 283% de ítems no son contractuales es una cifra que deben tener en cuenta en lo que fue la planificación en lo precontractual, yo creo que 13 días es un esfuerzo que se debe tener en cuenta, nos comprometemos a sacarlo lo más adelante posible y no queremos que en vez de contratar ahora, tener que contratar un pull de abogados para demostrar estos temas ante la entidad y ante los entes que no estén supervisando, Si les pido el favor que oigan a los profesionales nuestros para la exposición de todos los temas.

*Interviene Sindy (Contratista de obra): quisiera aclarar de cierta forma que como bien todos sabemos dentro de las primeras actividades que tenemos contemplado para el inicio de obra en cada una de las sedes, la implementación de los protocolos de bioseguridad, nosotros estas actividades si o si las tenemos que desarrollar porque precisamente de eso depende que nos dejen ingresar, entonces no sé si cuando el ingeniero Diego se refiere a que estamos iniciando con actividades no previstas hace alusión a esos ítems que tenemos de implementación de protocolos de seguridad, también es de recordar que nosotros ya enviamos por aparte los APU´s , no previstos, también se enviaron los APU´s para la implementación de los protocolos de bioseguridad.

*La Interventoría: se aclara que una cosa es que se implemente y otra cosa es que se inicie obra con actividades no previstas.

*Dayana Katherine Cruz – Consorcio (Contratista de obra): proyecta un cuadro donde expone, nosotros tenemos bastante avanzado precisamente los APU´s contractuales y se puede ver que efectivamente, que prácticamente se está estructurando el proyecto en esta zona y están pidiendo estructurarlo en 1 mes, nosotros desde presupuesto tenemos una empresa que estructura precisamente proyectos y estructuramos para otras entidades, es bastante complejo todo lo que están requiriendo las sedes, que necesitan, que es urgente, que es prioridad y pues prácticamente estamos yendo a obra y estructurando todo lo que necesitan, generalmente somos 11 personas que estamos trabajando sólo en este tema, entonces ahí está la cuestión de que se está trabajando pero tenemos también el control de presupuestos de programación y acá tenemos el resumen de en qué momento se ha enviado (proyecta imagen), de que presupuestos se han enviado y cuales están en revisión, que ha sucedido, cuáles no se van a realizar, todo actualizado y se ve realmente el trabajo y los envíos que se han hecho.

*Damaris Andrea Calvo López - Consorcio(Contratista de obra): en las programaciones tenemos como primera actividad después de la implementación de los protocolos de bioseguridad, todo lo relacionado con los equipos, tenemos la parte de la mecánica de los aires, pero tengo entendido, esos no son no previstos, tenemos un capítulo de impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, servicio jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistema contraincendios, sistemas de refrigeración, hay unos que son para la instalación mensual o bimensual trimestral, semestral y anual y se usa de acuerdo a los equipos. Lorena y Daniel me complementan al respecto esta información.

*Daniel (Contratista de obra): Todas las programaciones empiezan por el capítulo 7 a petición del contratista ya que las cuadrillas estaban listas para esto, obviamente refuerzo la idea de Katherine de que de que hay demasiados no previstos complementos de esto, esto es un mantenimiento predictivo, pero en los no previstos tenemos actividades correctivas.

Es importante dejar claro lo que nos han trasmitido los residentes qué el personal del Sena desde Bogotá envió unos ítems, ellos trataron de acomodar a unos que habían, entonces al llegar a la zona ya empezaron a mostrar que la necesidad principal era otra, también se tomo mucho en cuenta que es lo más urgente, entonces lo que está sucediendo es que la mayoría de cosas que se requirieron no estaban en el presupuesto general, que fue lo contratado y entonces ahorita nos estamos viendo afectados en toda la estructuración.

*Luis Granados: sede Gaira, hay muchas dependencias que están dentro de ese mismo contrato, les aclaro, lo que está pasando en Gaira, el día 15 de esta semana se visitó esa sede, para revisar nuevamente la parte eléctrica porque la sede es muy extensa y no se pudo revisar la primera vez que se visitó, allá hay bastante no previsto, lo que nos dice la administradora del centro es que primero le formulemos todo el proyecto y que luego nos dice que podemos hacer, luego de eso nos priorice actividades, entonces la verdad eso nos genera un retraso, por eso no hemos podido enviar, los presupuestos de Magdalena se van a enviar el día de hoy.

* Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): pregunta quién lo atendió en Gaira? Responden que Nidia Acosta, se pregunta por qué Nidia Acosta quiere unas cosas diferentes del proyecto, que aparezcan actividades nuevas aparecerán, pero esas se van a estudio, pero hay que continuar con el proyecto.

*Damaris Calvo - Consorcio (Contratista de obra): informa en Malambo cuando se realiza la visita se identificó qué es una sede nueva que todavía cuenta con garantía de acuerdo la construcción, en el día de ayer nosotros remitimos informe a la interventoría de la visita enunciando este tema y solicitando la aclaración de una placa que está solicitando el administrador de este centro.

*Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): Una placa sobre un edificio que está en garantía? Eso no es mantenimiento.

Aclaran que es una placa sobre suelo, ellos tienen una torre de trabajo en alturas, pero la tienen sobre tierra, el señor de allá está pidiendo que le hagamos una placa en esa zona. Eduardo Gómez se llama el señor que dio la información de solicitud de la placa, informa el consorcio.

*Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): aclara que esto es una obra de adecuación y este proyecto el objetivo es mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo; se va a hablar con el director del centro doctor Víctor Arbeláez y el administrador para aclararle el tema, es un mantenimiento, no vamos a construir una placa.

*Interviene Jorge Molina (representante legal del consorcio): manifiesta e insiste que la entidad y la interventoría miren que lo que se ha presentado en tema de fuerza mayor por qué insiste en que de 196 ítems contractuales están presentando 456, informa que se ha estado haciendo la visita en conjunto con la interventoría y esos ítems no previstos han sido solicitados en esos recorridos, pero es la directriz que se nos da y si queremos que sean más claros en los recorridos y qué ojalá la persona que proyectó el mantenimiento este presente, porque a veces están funcionarios que empiezan a solicitar ítems por fuera del contrato, pero

insiste que por favor ambas partes se den cuenta de lo que se está haciendo y que lo van a terminar lo más rápido posible, expone que ya vamos a empezar obras y tengan la tranquilidad que lo vamos a realizar en el plazo propuesto, pues ya hay algunas actividades que por ser críticas si no hay una aprobación rápida de los no previstos, se van a ver afectadas y empiezan a correr la fecha de cierre, pero se ha visto el esfuerzo y el interés de iniciar son simplemente es que nos sigamos apoyando.

*Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): manifiesta que se debe iniciar e ir quitando lo que se tenga que quitar, enfatiza, que sabe que van a salir actividades no previstas, pero la invitación es a iniciar, hay que arrancar, porque si no tocaría el proyecto cerrarlo hasta que no esté la adición. El Arquitecto habla por teléfono con el director de la sede de Malambo para aclarar el tema de la placa. Hay que avanzar y actuar, porque si no nos coge el 31 de diciembre todavía en la parte de planificación del proyecto.

*La Interventoría: aclara que la interventoría muestra las cosas que hacen falta, que deben ser entregadas para el inicio de los trabajos mantenimiento y también el contratista de obra manifestó los inconvenientes que ha tenido y hay una cantidad de no previstos que es el inconveniente más grande que se está presentando, entonces sugiere que el contratista informe en qué tiempo nos va a entregar todos los diagnósticos, las programaciones que hacen falta, los presupuestos que hacen falta, así mismo ellos están manifestando que hay muchos ítems no previstos, pero también necesitamos conocer los APU´s para saber que exista la posibilidad de ser incluidos contractualmente, que se puedan hacer un balance de cantidades menores y mayores cantidades de obra, para ver si pueden ser también incluidos dentro del presupuesto, que nos digan cuándo nos van a entregar la documentación que hacen falta de los diagnósticos, cuándo van a estar los APU´s de los ítems no previstos y de alguna forma tenemos que iniciar con esos ítems contractuales, que ya están.

*Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): interviene señalando la necesidad de la entidad de iniciar y empezar a trabajar y ejecutar el proyecto.

*Interviene Jorge Molina (representante legal del consorcio): Dr. Edgar insisto que vamos a ejecutar lo más rápido, pero quisiéramos saber cuánto puede durar esa aprobación de los no previsto, nos preocupa.

*Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): indica que ya se tiene la viabilidad jurídica en el tema de bioseguridad, nosotros no podemos medir una decisión y afectar el presupuesto porque requiere tener un sustento, entonces por eso está la interventoría, ya se negoció el costo la implementación de los protocolos de bioseguridad.

*La Interventoría: nosotros recibimos radicación de una propuesta del reconocimiento económico el día de ayer, las manifestaciones de los inconvenientes presentados por el contratista, si bien son a lugar, no han sido sustentados en un documentos, que pueda dejar trazabilidad de ello, pero además si ha sido así, porque entonces la programación esta presentada de esta manera, en unos comités se hablado de unos unos ítems no previstos, pero entonces ya estamos hablando de 400 APU´s, tengo varias sedes con las que propuse iniciar con actividades no previstas, voy presentando esos no previstos para ir solucionando mi problema para el inicio de obra, y si definitivamente es muy difícil presentar un no previsto en debida forma, porque hay otro inconveniente, entonces plantee las actividades que si son contractuales para iniciar obra. Lo otro es que si me van a poner problema porque no he implementado los protocolos, pues también debo ir implementando esos protocolos para inciar obra, no entiendo como el hecho que hayan 400 APU´s en que puede perjudicar el inicio de otro tipo de actividades, no nos podemos quedar en solo los argumentos de los ítems no previstos, y no reconocer que hay una programación mal planteada y aunque hay unas fechas, ustedes mismos las están incumpliendo, por qué comprometerme que voy a arrancar un día, si no lo voy a hacer, yo los invito a que miremos el tema logístico de otra manera, como lo dije anteriormente, estamos dispuestos a acompañarlos y hacerles ver cuáles son esos documentos y que no se cometan esos errores, dejando percibir que hay una mala organización y sincronización, una mala armonía, de manera respetuosa y cordial hacer lo que nos esta pidiendo la entidad y es que empecemos actividades en las sedes de alguna manera, había unas observaciones y correcciones a algunos APUS contractuales, sencillas, obvias que se caían de su peso, a la fecha no han sido atendidas tampoco, por ejemplo como planteo pintar una fachada sin andamio, yo creo que hay que

sincronizar mejor, hay temas de comunicación con las diferentes sedes, y los profesionales que tienen allá, hay falta de coordinación, yo creo que si logramos sincronizar las tareas en las sedes, con los profesionales, y los apus contractuales.

*Interviene Jorge Molina (representante legal del consorcio): solicita realizar comités permanentes,

*La Interventoría: les responde que nos reunamos, y poder ver la forma de arrancar con lo que se tiene.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS

Se concreta realizar una reunión para el lunes 21 de septiembre de 2020 en las oficinas de la interventoría, donde participaran el contratista, el interventor y el equipo de supervisión del Sena, donde se propone revisar como avanzar para dar inicio a las obras, y solucionar los inconvenientes presentados en las sedes, según lo expuesto en la reunión.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Edgar de la Hoz Hernández;	Grupo Construcciones	
Andrés Ricardo Sánchez Molano;		
Diego Claro	Contratista Interventoría	
Luis Enrique Castro Ruiz	Abogado Sena	
Jorge Alfonso Molina	Contratista de obra	
Sindy Paola Castro Aguirre		
Paola Molina		
Tatiana Celis Díaz	Contratista Interventoría	
Dayana Katherine Cruz	Contratista de obra	
Damaris Andrea Calvo		

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Luis Granados	Sede Gaira	

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
11/09/2020	CINP-BTA-023-0086-4840	Informes semanales No. 1 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0087-4845	Comunicado DCS-052-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0088-4846	Comunicado DCS-052-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0089-4847	Comunicado DCS-054-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0090-4848	Comunicado DCS-054-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0091-4850	Solicitud información dirección oficina Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0092-4851	Comunicado DCS-064-CO1. 6309; Personal Regional Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0093-4860	Comunicado DCS-052-CO1. 6309; Ingreso de personal Regional Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0094-4863	Comunicado DCS-065-CO1. 6309 Ingreso personal Regional Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
14/09/2020	CINP-BTA-023-0095-4866	Informes semanales No. 2 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0096-4885	Comunicado DCS-064-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0097-4886	Comunicado DCS-064-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/09/2020	CINP-BTA-023-0098-4887	Comunicado DCS-066-CO1. 6309 Documentos personal, Regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
14/09/2020	CINP-BTA-023-0099-4898	Comunicado DCS-057-CO1.6309; Análisis de Precios Unitarios contractuales del Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/09/2020	CINP-BTA-023-0100-4903	Comunicado DCS-055-CO1.6309; Programación Regional Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0101-4985	Inicio de obras regional Sucre y Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0102-4986	Inconvenientes en el ingreso del personal de interventoría Regional Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0103-4987	Solicitud programación de obra en formato digital Project.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0104-4988	Comunicado DCS-059-CO1.6309; Cumplimiento obligaciones contractuales.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0105-4989	Oficio 9-2020-033391 NIS 2020-02-197744; Respuesta programación PAC.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0106-4990	Oficio 9-2020-033382 NIS 2020-02-197738; Documentación faltante, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0107-4991	Comunicado DCS-060-CO1.6309; Ingreso personal Regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0108-4992	Comunicado DCS-060-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0109-4993	Comunicado DCS-060-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0110-4994	Atraso en el inicio de las actividades en las sedes del Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0111-4995	Incumplimiento de obligaciones contractuales.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
16/09/2020	CINP-BTA-023-0112-4996	Seguimiento al programa de obra del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial sedes urbana y rural en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0113-5000	Comunicado DCS-067-CO1. 6309; Relación del personal regional Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0114-5001	Comunicado DCS-067-CO1-.6309. Presupuesto, programación, informe diagnóstico y relación de personal para las sedes Centro Nacional Colombo Alemana y Centro Industrial y de Aviación en Barranquilla, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0115-5002	Comunicado DCS-067-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0116-5003	Comunicado DCS-067-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0117-5004	Comunicado DCS-063-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0118-5005	Comunicado DCS-063-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0119-5006	Aclaración sede alterna sede Centro Industrial y de Aviación, Barranquilla, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0120-5007	Comunicado DCS-069-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0121-5008	Comunicado DCS-069-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0122-5009	Comunicado DCS-069-CO1.6309 – Observaciones Documentos diagnóstico Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0123-5010	Comunicado DCS-058-CO1.6309 y DCS-077-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Regional Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0124-5011	Comunicado DCS-058-CO1.6309 y DCS-077-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Regional Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/09/2020	CINP-BTA-023-0126-5056	Comunicado DCS-079-CO1 6309, Reunión Lunes 21 de Septiembre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/09/2020	CINP-BTA-023-0127-5067	Comunicado DCS-171-CO1 2328, APU de actividades no previstas.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/09/2020	CINP-BTA-023-0128-5071	Comunicado DCS-074-CO1. 6309, Relación personal técnico Aires Acondicionados Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/09/2020	CINP-BTA-023-0129-5119	Programación Visita Diagnostico Sede De Formación Turística Gente De Mar –Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/09/2020	CINP-BTA-023-0130-5120	Oficio 9-2020-033897 NIS 2020-02-210052; Documentación faltante, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0131-5174	Seguimiento programación contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0132-5175	Sede Centro Nacional Colombo Alemán, Malambo, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0133-5176	Comunicado DCS-080-CO1. 6309; Ingreso personal Regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0134-5177	Presupuestos contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0135-5178	Reiteración de Retraso en el inicio de las actividades en las sedes del Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0136-5179	Atrasos en el inicio de las actividades programadas en el departamento del Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0137-5181	Comunicado DCS-069-CO1. 6309; Ingreso personal Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0138-5182	Inicio de obras Regional Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
23/09/2020	CINP-BTA-023-0139-5183	Reiteración de Retraso en el inicio de las actividades en las sedes del Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0140-5184	Encuesta previo al ingreso del personal, Regional San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0141-5185	Atrasos en el inicio de las actividades programadas en el departamento del Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0142-5186	Diagnósticos contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0143-5187	Correo electrónico; Observaciones actividades a ejecutar Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/09/2020	CINP-BTA-023-0144-5272	Comunicado DCS-068-CO1. 6309; Presupuesto de bioseguridad sede SENA Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/09/2020	CINP-BTA-023-0145-5273	Comunicado DCS-092-CO1.6309; Acompañamiento mantenimientos de aire, Regional Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/09/2020	CINP-BTA-023-0146-5274	Comunicado DCS-084-CO1. 6309; comunicado CINP-BTA-023-0125-5049; Observaciones Sede Formación Turística Gente De Mar, Regional San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/09/2020	CINP-BTA-023-0147-5275	Cumplimientos de normas de circulación y residencia OCCRE según decreto 2762 de 1991.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/09/2020	CINP-BTA-023-0148-5277	Comunicado DCS-100-CO1.6309; relación de personal para iniciar labores en los aires acondicionados de las sedes del departamento de CORDOBA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/09/2020	CINP-BTA-023-0149-5293	Oficio Radicado 92020037345 NIS 2020-02-210495; Solicitud de entrega de requisitos para el inicio de Trámite de Sustitución de Vigencias.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/09/2020	CINP-BTA-023-0150-5294	Comunicados DCS-097-CO1.6309 y DCS-098-CO1.6309; Ajustes APU´s contractuales.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/09/2020	CINP-BTA-023-0151-5295	Comunicado DCS-088-CO1.6309; Relación y documentos del personal, programación y presupuesto del Departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
29/09/2020	CINP-BTA-023-0152-5315	Informes semanales No. 3 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0153-5341	Comunicado DCS-107-CO1.6309; DCS-104-CO1.6309, relación de personal para iniciar labores en el lavado de tanque, y para revisión del sistema eléctrico de las sedes del departamento de CORDOBA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0154-5342	Comunicado DCS-104-CO1. 6309 Relación personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0155-5344	Comunicado DCS-095-CO1. 6309; Solicitud de ingreso de personal Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0156-5346	Comunicado DCS-096-CO1. 6309; Solicitud de ingreso de personal Departamento Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0157-5347	Comunicado DCS-096-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0158-5348	Comunicado DCS-090-CO1. 6309; Solicitud ingreso personal Departamento Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0159-5349	Comunicado DCS-090-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0160-5350	Comunicado DCS-088-CO1. 6309; Solicitud de ingreso Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0161-5351	Comunicado DCS-089-CO1. 6309; Solicitud ingreso Departamento Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0162-5352	Comunicado DCS-100-CO1. 6309; Solicitud ingreso de personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0163-5353	Comunicado DCS-100-CO1. 6309; Ingreso personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0164-5354	Comunicado DCS-105-CO1. 6309; Respuesta aprobación personal.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
30/09/2020	CINP-BTA-023-0165-5355	Comunicado DCS-106-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0166-5356	Comunicado DCS-107-CO1. 6309; Solicitud ingreso personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0167-5357	Correo electrónico, Solicitud corrección acta de inicio Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0168-5358	Comunicado DCS-087-CO1. 6309; Primer Informe Mensual del Plan de Manejo Ambiental – PMA, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0169-5359	Comunicado DCS-102-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0170-5360	Comunicado DCS-102-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0171-5361	Comunicado DCS-112-CO1. 6309; Solicitud de ingreso de personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0172-5372	Oficio Radicado 9-2020-037345 NIS 2020-02-210495; Solicitud entrega de requisitos para el inicio del trámite de sustitución de vigencias.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0173-5413	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0174-5414	Reiteración de Documentación pendiente por Entregar en las sedes del Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0175-5415	Aclaración Intervención sedes Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0176-5416	Solicitud de entrega de documentos de periodicidad mensual.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0177-5417	Comunicado DCS-064-CO1 6309; Solicitud de ajuste al presupuesto entregado para la sede Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Rural, Sabanalarga, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0178-5418	Comunicado DCS-085-CO1. 6309; Presupuesto y programación de las sedes Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Corregimientos de Santa Isabel y Los Garzones Montería-Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0179-5419	Comunicado DCS-085-CO1. 6309; Presupuesto y programación de las sedes Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Corregimientos de Santa Isabel y Los Garzones Montería-Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0180-5420	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0181-5423	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de BOLIVAR.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0182-5425	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de SUCRE.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0183-5426	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de GUAJIRA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0184-5427	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento del MAGDALENA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0185-5428	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de CESAR.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0186-5429	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de ATLÁNTICO.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0187-5430	Comunicado DCS-094-CO1.6309; APU´s no previstos, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0188-5431	Comunicado DCS-113-CO1. 6309; solicitud de valor del presupuesto asignado por sede.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0189-5462	Oficio No. 92020039052 NIS 2020-01-224673; Respuesta Comunicado No. CINP-BTA-023-0132-5175 sede en Malambo, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0190-5463	Remisión Acta de seguimiento del 30 septiembre - Sede regional San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
5/10/2020	CINP-BTA-023-0191-5465	Oficio No. 92020039084 NIS 2020-01-232142; Reiteración solicitud entrega de documentación para el trámite de actualización de vigencias.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0192-5466	Solicitud de soportes de afiliación del personal y concepto de actitud laboral.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0193-5467	Solicitud de soportes de implementación de protocolos de bioseguridad regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0194-5469	Solicitud de soportes de implementación de protocolos de bioseguridad regional Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0195-5470	Solicitud de soportes de afiliación del personal y concepto de actitud laboral.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0196-5471	Informe Patologías Sede Lorica, Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0197-5472	Comunicados DCS-103-CO1.6309, DCS-115-CO1.6309, DCS-117-CO1-6309 – Presupuestos, Programaciones y Documentos diagnóstico Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0198-5473	Comunicado; DCS-118-CO1.6309-Respuesta a incumplimiento- respuesta oficio No. 9-2020-036791, implementación protocolos de bioseguridad.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0199-5474	Comunicado DCS-127-CO1.6309; Solicitud de ingreso personal Riohacha -Departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0200-5475	Comunicado DCS-127-CO1.6309; Solicitud de ingreso personal Riohacha- Departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0201-5478	Comunicado DCS-124-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0202-5501	Informes semanales No. 4 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0203-5503	Informes semanales No. 5 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0204-5512	Comunicado DCS-130-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0121-5008, CINP- BTA-023-0156-5346 y DCS-096-CO1. 6309; Solicitud de ingreso de personal Departamento Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0205-5513	Comunicado DCS-130-CO1. 2323; Ingreso de personal Departamento Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0206-5514	Comunicado DCS-131-CO1. 2323; Ingreso personal Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0207-5515	Comunicado DCS-131-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0165-5355 y DCS-106-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0208-5516	Comunicado DCS-125-CO1. 2323; Ingreso personal departamento Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0209-5517	Comunicado DCS-125-CO1. 2323; Respuesta a observaciones de los oficios CINP-BTA-023-0124-5011, CINP-BTA-023-0161-5351 y comunicado DCS-089-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal departamento Bolívar, con fecha 17 y 30 de septiembre de 2020.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0210-5522	Test condición de salud ingreso a las instalaciones del Sena San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
7/10/2020	CINP-BTA-023-0211-5549	Comunicado DCS-119-CO1.6309; Respuesta comunicado No. CINP-BTA-023-0167-5357, Correo electrónico, Solicitud corrección acta de inicio contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/10/2020	CINP-BTA-023-0212-5552	Comunicado DCS-132-CO1. 2323; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
7/10/2020	CINP-BTA-023-0213-5555	Comunicado DCS-132-CO1. 2323; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0214-5564	Comunicado DCS-134-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0215-5567	Comunicado DCS-131-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0165-5355 y DCS-106-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0216-5569	Comunicado DCS-129-CO1.6309; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0217-5571	Comunicado DCS-129-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico, con fecha 30 de septiembre de 2020.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0218-5572	Comunicado DCS-108-CO1.6309; Programación y presupuesto sede Centro Nacional Colombo Alemán, Barranquilla.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0219-5577	Informes semanales No. 6 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
8/10/2020	CINP-BTA-023-0220-5580	Comunicado DCS-118-CO1. 6309; Respuesta a incumplimiento.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0221-5594	Comunicado DCS-111-CO1. 6309; Formatos de calidad.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0222-5595	Comunicado DCS-109-CO1.6309, Presupuestos y programaciones departamento del Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0223-5596	Comunicado DCS-083-CO1. 6309; Presupuesto y programación departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0224-5597	Correo electrónico; Requerimiento para la Sede de Lorica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0225-5598	Comunicado DCS-133-CO1.6309; APUS no previstos contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0226-5599	Comunicado DCS-128-CO1. 2323; Solicitud de Plan de Choque para recuperar a atraso en las actividades en el Departamento de GUAJIRA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0227-5600	Comunicado DCS-139-CO1. 2323; Observaciones intervenciones departamento Cordoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0228-5602	Comunicado DCS-145-CO1.2323; Relación y documentos del personal, impermeabilización departamento de Magdalena sede Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0229-5612	Comunicado DCS-133-CO1.2323; Remisión APU No previsto NP.10.501. Desmonte de manto existente.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0230-5613	Comunicado DCS-138-CO1.2323; Relación y documentos del personal, manto asfaltico departamento de Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0231-5619	Comunicado DCS-138-CO1.2323; Relación y documentos del personal, manto asfaltico departamento de Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0232-5622	Comunicado DCS-143-CO1.2323; Relación y documentos del personal, manto asfaltico departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0233-5623	Comunicado DCS-143-CO1.2323; Relación y documentos del personal, manto asfaltico departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0234-5625	Comunicado DCS-144-CO1.2323; Relación y documentos del personal, para iniciar labores como coordinadores SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0235-5626	Comunicado DCS-144-CO1.2323; Relación y documentos del personal, para iniciar labores como coordinadores SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0236-5627	Comunicado DCS-129-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico, con fecha 30 de septiembre de 2020.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0237-5628	Comunicado DCS-129-CO1.6309; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico, con fecha 30 de septiembre de 2020.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0238-5629	Comunicado DCS-141-CO1. 2323; Solicitud de ingreso personal departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0239-5631	Comunicado DCS-141-CO1. 2323; Solicitud de Ingreso personal departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0240-5635	Comunicado DCS-135-CO1. 2323; Flujos de Caja Magdalena, Guajira, Sucre y Bolivar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
		CORRESPÓNDENCIA RECIBIDA		
14/09/2020	DCS-069-CO1.6309 -	GUAJIRA PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
15/09/2020	DCS-071-CO1. 6309	Aclaración de intervención de la sede alterna del centro Industrial y de Aviación Atlántico #071	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
16/09/2020	DCS-074-CO1. 6309	- ENVIO DE DOCUMENTACION PERSONAL SUCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
16/09/2020	DCS-077-CO1. 6309 -	PROGRAMACIÓN BOLIVAR	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
16/09/2020	DCS-079-CO1.6309 -	SOLICITUD DE LOCACIONES PARA AJUSTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DEL DÍA LUNES 21-09-	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
17/09/2020	DCS-080-CO1.6309 -	DOCUMENTOS PERSONAL DE VALLEDUPAR	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
17/09/2020	DCS-081-CO1. 6309	Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-0083-4794. APU	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
17/09/2020	DCS-082-CO1. 6309	Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-0099-4898. (1) APU	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-083-CO1. 6309 -	PRESUPUESTO & PROGRAMACIÓN Regional Bolívar	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
18/09/2020	DCS-084-CO1. 6309 -	RTA OBSERVACIONES PRESUPUESTO SAN ANDRES	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-085-CO1. 6309 -	PRESUPUESTO & PROGRAMACIÓN CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
22/09/2020	DCS-087-CO1. 6309;	ENTREGA DEL PRIMER INFORME MENSUAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
23/09/2020	DCS-088-CO1. 6309;	relacion de personal ATLÁNTICO SEDES CENTRO INDUSTRIAL Y CENTRO COLOMBOALEMAN	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
23/09/2020	DCS-089-CO1. 6309-	relacion de personal BOLIVAR SEDES CENTRO NAUTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
23/09/2020	DCS-090-CO1. 6309 -	Relación y documentos del personal, programación y presupuesto SUCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
23/09/2020	DCS-092-CO1. 6309	Acompañamiento aires acondicionados SUCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
25/09/2020	DCS-094-CO1. 6309 -	APUs NO PREVISTOS Manto Asfáltico LOTE_1	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
25/09/2020	DCS-095-CO1. 6309	ENVIO DE DOCUMENTACION SABANALARGA EL CANEY	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
24/09/2020	DCS-096-CO1. 6309 -	ENVIO DE DOCUMENTACION RIOHACHA SEDE COMERCIO Y SERVICIO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
25/09/2020	DCS-097-CO1. 6309	Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-0083-4794. APU	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
25/09/2020	DCS-098-CO1. 6309	Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-0099-4898. APU	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
25/09/2020	DCS-100-CO1. 609	relacion de personal MONTERIA -CCIT CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
01/10/2020	DCS-101-CO1. 6309-	Presupuesto & Programación San Andrés	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
26/09/2020	DCS-102-CO1. 6309 -	relacion de personalLAVADO DE TANQUES ATLANTICO SEDES CENTRO INDUSTRIAL Y CENTRO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
29/09/2020	DCS-103-CO1. 6309-	PRESUPUESTO & PROGRAMACIÓN MAGDALENA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
26/09/2020	DCS-104-CO1. 6309 -	relacion de personal LAVADO DE TANQUES CÓRDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
26/09/2020	DCS-105-CO1. 6309	Respuesta de relacion de personal inicio de obra GUAJIRA-ATLANTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-106-CO1. 6309-	relacion de personal MAGDALENA - CENTRO LOGISTICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-107-CO1. 6309 -	Documentos del electrico para la visita de diagnostico CÓRDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-108-CO1. 6309 -	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN ATLANTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-109-CO1. 6309 -	PRESUPUESTO & PROGRAMACIÓN CESAR	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
29/09/2020	DCS-111-CO1. 6309-	Formatos de calidad	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
29/09/2020	DCS-112-CO1. 6309;	Documentos del electrico para la visita de diagnostico CABD EL PORVENIR SANTA ISABEL CÓRDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
29/09/2020	DCS-113-CO1. 6309;	TOPES PRESUPUESTALES	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
29/09/2020	DCS-114-CO1. 6309;	RTA CUMPLIMIENTO DE NORMAS CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA OCCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
01/10/2020	DCS-115-CO1. 6309-	Presupuestos y programación Fundación, El Banco y Gaira- MAGDALENA.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
30/09/2020	DCS-117-CO1. 6309;	PROGRAMACIONES MAGDALENA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
01/10/2020	DCS-118-CO1. 6309-	Respuesta a incumplimiento	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
01/10/2020	DCS-119-CO1. 6309	correccion de acta de inicio lote 1	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-124-CO1. 6309	RESPUESTA CINP-BTA-023-0162-5352_COMUNICADO -DCS100-CO1-6309 PERSONAL CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-125-CO1. 6309-	RESPUESTA CINP-BTA-023-0161-535 PERSONAL BOLIVAR	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-126-CO1. 6309 -	Consolidado APUs NPs Lote 1 MA,COR,ATL,GUA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-127-CO1. 6309	Documentos del electrico para la visita de diagnostico Riohacha GUAJIRA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-128-CO1. 6309 -	SOLICITUD DE PLAN DE CHOQUE PARA RECUPERAR ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-129-CO1. 6309	RESPUESTA CINP-BTA-023-0160-5350_ COMUNICADO DCS-088-CO1 PERSONAL ATLANTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-130-CO1. 6309 -	RESPUESTA COMUNICADO DCS-096-CO1. 6309_ SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL DEPARTAMENTO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-131-CO1. 6309-	RESPUESTA ComunicadoCINP-BTA-023-0165-5355, DCS-106-CO1. 6309 personal MAGDALENA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-132-CO1. 6309 -	RESPUESTA CINP-BTA-023-0160-5350_ COMUNICADO DCS-088-CO1- personal ATLANTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-133-CO1.6309 -	Respuesta Oficio CINP-BTA-023-0187-5430 APU NP	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
06/10/2020	DCS-134-CO1. 6309 -	DOCUMENTOS DEL SST DE LA GUAJIRA - CENTRO LOGISTICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
06/10/2020	DCS-136-CO1. 2323	PRESUPUESTOS LOTE 1	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-137-CO1. 6309	DIFICULTADES PARA EL INGRESO DEL PERSONAL OFICINA DEL SENA VALLEDUPAR	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
08/10/2020	DCS-138-CO1 2323 -	relacion de personal para manto asfaltico SUCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-139-CO1.2323	Oficio Regional Cordoba - Respuesta incumplimiento	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-140-CO1.2323-	RESPUESTA CINP-BTA-023-0189-5462 MALAMBO-ATLANTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-141-CO1. 6309-	RESPUESTA CINP-BTA-023-0201-5478CINP-BTA-023-0201-5478-personal CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-142-CO1.2323	RTA PERSONAL OCCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
08/10/2020	DCS-143-CO1 2323 -	relacion de personal para manto asfaltico CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
08/10/2020	DCS-144-CO1 2323 -	relacion de los coordinadores de SST Magdalena. Cesar y Atlantico	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
08/10/2020	DCS-145-CO1 2323 -	relacion de personal impermeabilización MAGDALENA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
15/10/2020	DCS-146-CO1. 6309-	Presupuestos y programaciones de regional SAN ANDRES	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
09/10/2020	DCS-147-CO1. 6309-	Plan de contingencia.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
09/10/2020	DCS-148-CO1.2323 -	ENVIO DE DOCUMENTACION PERSONAL MAICAO-GUAJIRA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
10/10/2020	DCS-149-CO1. 2323 -	FORMATO DE SINTOMATOLOGIA DE COVID 19 Y TOMA DE TEMPERATURA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construcción	**$ 8.777.298.757**	Valor Etapa Construcción	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 8.777.298.757	Valor Actualizado Contrato	$691.547.950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRÍGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	YALILE RINCÓN RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	**NA**
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	**NA**
% DE DIFERENCIA	**NA**
ALERTAS	

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
	ALERTAS		0,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-44092,00**	**44092,00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/09/2020		1/12/2020		**-44093,00**	**44166,00**
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		30/11/2020		**-44093,00**	**44165,00**
3	SERVICIO DE JARDINERIA	19/09/2020		7/10/2020		**-44093,00**	**44111,00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		29/09/2020		**-44093,00**	**44103,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21/09/2020		6/10/2020		**-44095,00**	**44110,00**
10	NO PREVISTOS	21/09/2020		25/11/2020		**-44095,00**	**44160,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-44092,00**	**44092,00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/09/2020		18/11/2020		**-44096,00**	**44153,00**
3	SERVICIO DE JARDINERIA	19/09/2020		26/09/2020		**-44093,00**	**44100,00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**-44093,00**	**44095,00**
10	NO PREVISTOS	19/09/2020		25/11/2020		**-44093,00**	**44160,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-44092,00**	**44092,00**
2	SISTEMA ELÉCTRICO	19/09/2020		21/10/2020		**-44093,00**	**44125,00**
3	SERVICIO DE JARDINERIA	19/09/2020		7/10/2020		**-44093,00**	**44111,00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		21/09/2020		**-44093,00**	**44095,00**
10	NO PREVISTOS	21/10/2020		23/11/2020		**-44125,00**	**44158,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-44092,00**	**44092,00**
3	SERVICIO DE JARDINERIA	19/09/2020		1/12/2020		**-44093,00**	**44166,00**
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		5/10/2020		**-44093,00**	**44109,00**
10	NO PREVISTOS	19/09/2020		15/10/2020		**-44093,00**	**44119,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-44138,00**	**44138,00**
5	LAVADO DE TANQUES	17/11/2020		17/11/2020		**-44152,00**	**44152,00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**-44139,00**	**44166,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		19/11/2020		**-44139,00**	**44154,00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	10/11/2020		30/11/2020		**-44145,00**	**44165,00**
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		1/12/2020		**-44139,00**	**44166,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/10/2020		13/10/2020		**-44117,00**	**44117,00**
2	SISTEMA ELÉCTRICO	14/10/2020		1/12/2020		**-44118,00**	**44166,00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/10/2020		1/12/2020		**-44118,00**	**44166,00**
5	LAVADO DE TANQUES	26/10/2020		30/10/2020		**-44130,00**	**44134,00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/10/2020		1/12/2020		**-44118,00**	**44166,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	14/10/2020		1/12/2020		**-44118,00**	**44166,00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020		**-44135,00**	**44166,00**
10	NO PREVISTOS	14/10/2020		1/12/2020		**-44118,00**	**44166,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020

CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020		30/09/2020		**-44104,00**	**44104,00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	1/10/2020		30/11/2020		**-44105,00**	**44165,00**
5	LAVADO DE TANQUES	14/10/2020		29/10/2020		**-44118,00**	**44133,00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	1/10/2020		1/12/2020		**-44105,00**	**44166,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/10/2020		3/11/2020		**-44105,00**	**44138,00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/10/2020		9/10/2020		**-44109,00**	**44113,00**
10	NO PREVISTOS	1/10/2020		17/11/2020		**-44105,00**	**44152,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-44138,00**	**44138,00**
5	LAVADO DE TANQUES	12/11/2020		19/11/2020		**-44147,00**	**44154,00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020		1/12/2020		**-44139,00**	**44166,00**
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		24/11/2020		**-44139,00**	**44159,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020		29/09/2020		**-44103,00**	**44103,00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		21/11/2020		**-44104,00**	**44156,00**
3	SERVICIO DE JARDINERIA	30/09/2020		14/11/2020		**-44104,00**	**44149,00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	30/09/2020		13/10/2020		**-44104,00**	**44117,00**
5	LAVADO DE TANQUES	6/10/2020		20/10/2020		**-44110,00**	**44124,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/09/2020		1/12/2020		**-44104,00**	**44166,00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	6/10/2020		14/11/2020		**-44110,00**	**44149,00**
10	NO PREVISTOS	30/09/2020		14/11/2020		**-44104,00**	**44149,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020		30/09/2020		**-44104,00**	**44104,00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	1/10/2020		21/10/2020		**-44105,00**	**44125,00**
2	SISTEMA ELÉCTRICO	1/10/2020		30/10/2020		**-44105,00**	**44134,00**
3	SERVICIO DE JARDINERIA	1/10/2020		27/10/2020		**-44105,00**	**44131,00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	30/10/2020		1/12/2020		**-44134,00**	**44166,00**
5	LAVADO DE TANQUES	1/10/2020		18/11/2020		**-44105,00**	**44153,00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/10/2020		23/10/2020		**-44109,00**	**44127,00**
10	NO PREVISTOS	1/10/2020		7/10/2020		**-44105,00**	**44111,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - DIRECCIÓN REGIONAL

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0,00**	**0,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020		30/09/2020		**-44104,00**	**44104,00**
1	IMPERMEABILIZACIONES	1/10/2020		15/10/2020		**-44105,00**	**44119,00**
2	SISTEMA ELÉCTRICO	1/10/2020		14/10/2020		**-44105,00**	**44118,00**
3	SERVICIO DE JARDINERIA	1/10/2020		14/10/2020		**-44105,00**	**44118,00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	1/10/2020		7/10/2020		**-44105,00**	**44111,00**
5	LAVADO DE TANQUES	1/10/2020		9/10/2020		**-44105,00**	**44113,00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	1/10/2020		30/11/2020		**-44105,00**	**44165,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/10/2020		1/12/2020		**-44105,00**	**44166,00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/10/2020		3/11/2020		**-44107,00**	**44138,00**
10	NO PREVISTOS	1/10/2020		20/11/2020		**-44105,00**	**44155,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**102**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**58**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	N/A
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS

- Se remite oficio CINP-BTA-023-0152-5315 del 29 de septiembre al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA por medio del cual se remiten los Informes Semanales No. 3 del Contrato de Interventoría.
- Se remite oficio CINP-BTA-023-0156-5346 del 30 de septiembre al CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA dando respuesta al Comunicado DCS-096-CO1. 6309; Ingreso personal Regional Guajira.
- Se remite oficio CINP-BTA-023-0157-5347 del 30 de septiembre al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA informando respuesta al Comunicado DCS-096-CO1. 6309; Ingreso personal Regional Guajira.
- Se remite oficio CINP-BTA-023-0165-5355 del 30 de septiembre al CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA dando respuesta al comunicado DCS-106-CO1. 6309; Ingreso personal Regional Magdalena.
- Se remite oficio CINP-BTA-023-0143-5187 del 23 de septiembre al CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA se remiten observaciones actividades a ejecutar en la Regional Guajira, realizadas vía Correo electrónico por la entidad.
- Se remite oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre al CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA con Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de GUAJIRA.
- Se remite oficio CINP-BTA-023-0184-5427 del 02 de octubre al CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA con Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento del Magdalena.
- Se recibe oficio DCS-118-CO1.6309 del 01 de octubre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA donde remiten respuestas a los incumplimientos citados por la Interventoría.
- Se recibe oficio DCS-115-CO1.6309 del 01 de octubre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA donde remiten las Programaciones faltantes de las sedes del Magdalena.
- Se recibe oficio DCS-094-CO1.6309 del 28 de septiembre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA donde remiten los APU´s No Previstos para la actividad de Manto Asfáltico.
- Se recibe oficio DCS-117-CO1.6309 del 30 de septiembre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA donde remiten las Programaciones de las sedes Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena – Ciénaga, Dirección Regional – Santa Marta, Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena – Santa Marta, Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena – IPC Santa Marta.
- Se recibe oficio DCS-113-CO1.6309 del 29 de septiembre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA donde solicitan los valores de los presupuestos asignados por Sedes.
- Se recibe oficio DCS-103-CO1.6309 del 29 de septiembre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA donde remiten Presupuesto y Programación para las sedes Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - Ciénaga, Dirección Regional - Santa Marta, Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena – Santa Marta, Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena – IPC Santa Marta.
- Se recibe oficio DCS-106-CO1.6309 del 28 de septiembre del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA donde remiten relación de personal refrigeración de la sede Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena.

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY CASTRO AGUIRRE		
2	RESIDENTE ELÉCTRICO			
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO			
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
5	RESIDENTE SISO DE OBRA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020

PERSONAL DE INTERVENTORÍA


nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7762738154	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7762780691	
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCÓN RUIZ	7762756731	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12/08/2020	30/08/2020	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se revisa la programación con base en el oficio DCS-036-CO1 presentado por el contratista
31/08/2020	6/09/2020	SEMANA No. 2	7-sep-20	Se revisa la programación con base en el oficio DCS-036-CO1 presentado por el contratista
7/09/2020	13/09/2020	SEMANA No. 3	14-sep-20	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad
14/09/2020	20/09/2020	SEMANA No. 4	21-sep-20	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad
21/09/2020	27/09/2020	SEMANA No. 5	28-sep-20	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad
28/09/2020	4/10/2020	SEMANA No. 6	5-oct-20	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad
		SEMANA No. 7		

CINCO	5	días del mes de	OCTUBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

Anexo No. 14: Registro fotográfico.

GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

FECHA	11/10/2020	MES DOS DE OBRA	No. 2	DEL	12/09/2020	AL	11/10/2020

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES DOS DE OBRA



FOTOGRAFÍA No. 1: Mantenimiento Aires acondicionados



FOTOGRAFÍA No. 2: Mantenimiento Aires Acondicionados



FOTOGRAFÍA No. 3: Implementación Protocolo de Bioseguridad



FOTOGRAFÍA No. 4: Mantenimiento Aires Acondicionados



FOTOGRAFÍA No. 5: Mantenimiento Aires Acondicionados



FOTOGRAFÍA No. 6: Mantenimiento Aires Acondicionados

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma


Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

NO APLICA

Anexo No. 16: Programación actualizada. (CD)

PRESUPUESTO CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
1			**PRESUPUESTO CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-FONSECA-GUAJIRA**	**56 days**	**Sep 18 '20**	**Dec 1 '20**
2			PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 day	Sep 18 '20	Sep 18 '20
3		**3**	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**55 days**	**Sep 19 '20**	**Dec 1 '20**
4		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	30 days	Sep 19 '20	Oct 28 '20
5		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	25 days	Oct 28 '20	Dec 1 '20
6		3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	30 days	Sep 19 '20	Oct 28 '20
7		3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	12 days	Sep 19 '20	Oct 5 '20
8		**5**	**LAVADO TANQUES**	**12 days**	**Sep 19 '20**	**Oct 5 '20**
9		5.2.2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
10		5.3.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO (NO INCLUYE REPARACION DE ENCHAPE E IMPERMEABILIZACION)	1 day	Sep 21 '20	Sep 22 '20
11		5.3.4	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO EN CONCRETO CON SIKA MONOTOP - 107	3 days	Sep 22 '20	Sep 25 '20
12		5.3.5	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA	7 days	Sep 25 '20	Oct 5 '20
13		5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE GLOBO D=1"	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
14		**NP**	**NO PREVISTOS**	**20 days**	**Sep 19 '20**	**Oct 15 '20**
15		NP-10.337	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
16		NP-10.338	Suministro e Instalación de valvulas Fluxometro en Baño mujeres, 4 sanitarios y 3 en Lavamanos	7 days	Sep 21 '20	Sep 29 '20

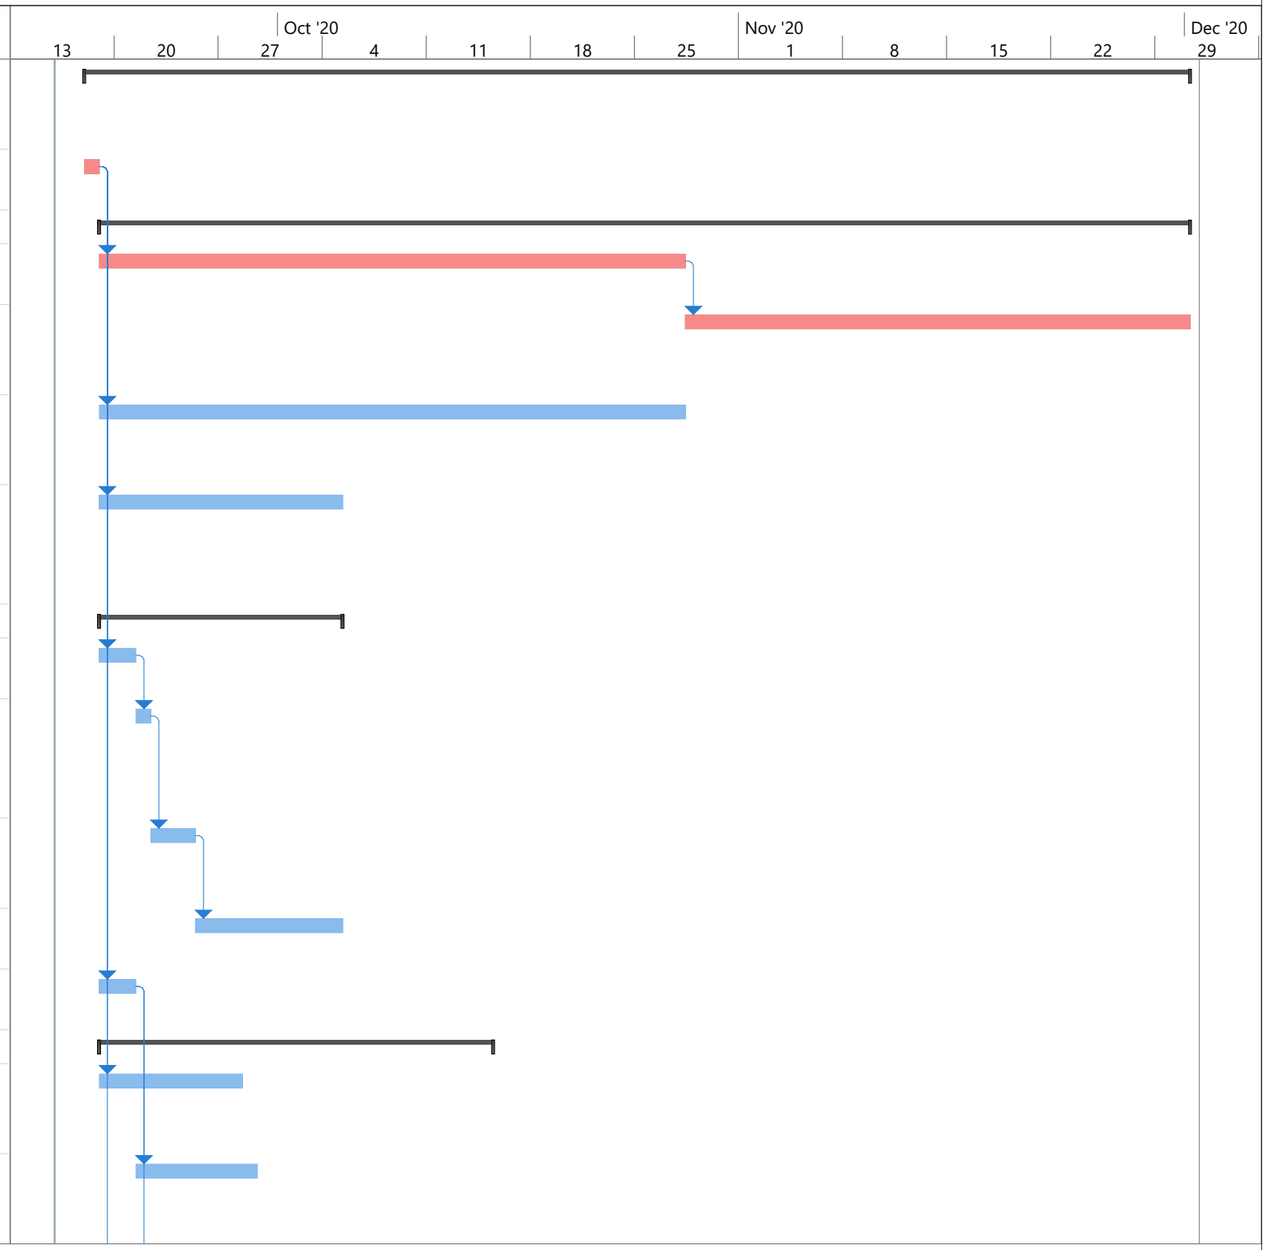


Projecto: CENTRO AGROEMPRE
Date: Sep 16 '20

División crítica		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Tareas críticas	
Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone			
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress			
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress			

Aprobó:

PRESUPUESTO CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
17		NP-10.339	Suministro e Instalación de valvulas Fluxometro en Baño Hombres, 3 en Lavamanos, 5 en orinales y 3 en Sanitarios.	7 days	Sep 21 '20	Sep 29 '20
18		NP-10.341	ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI	20 days	Sep 19 '20	Oct 15 '20

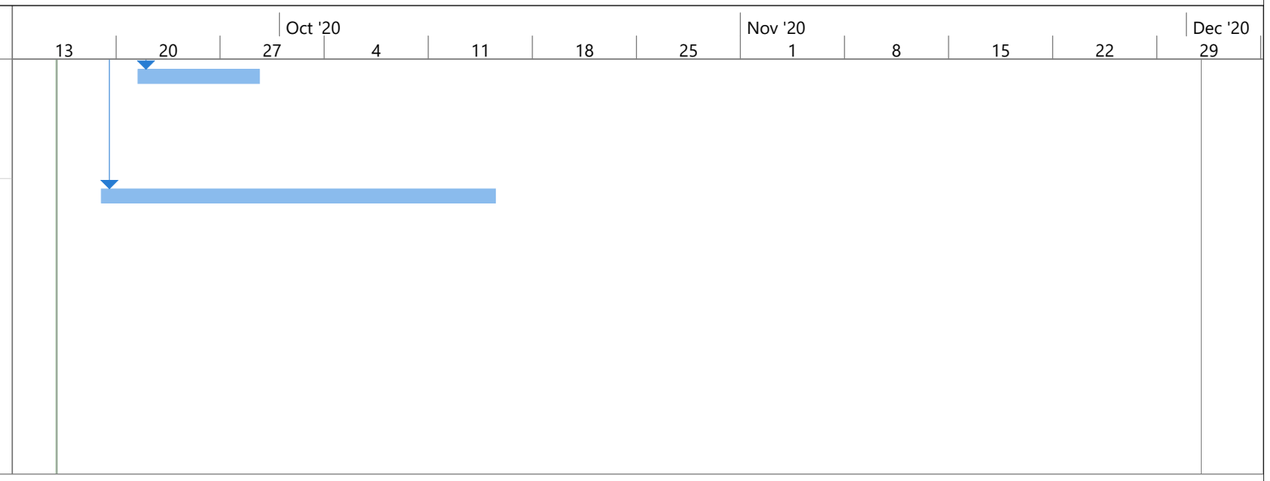


Projecto: CENTRO AGROEMPRE
Date: Sep 16 '20

División crítica		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Tareas críticas
Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline		
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress		
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress		

Aprobó:

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
1			**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO**	**52 days**	**Sep 18 '20**	**Nov 25 '20**
2			PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 day	Sep 18 '20	Sep 18 '20
3		**1**	**IMPERMEABILIZACIONES**	**43 days**	**Sep 22 '20**	**Nov 18 '20**
4		1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	42 days	Sep 22 '20	Nov 17 '20
5		1.9	INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO #4 INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	1 day	Nov 17 '20	Nov 18 '20
6		**3**	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**6 days**	**Sep 19 '20**	**Sep 26 '20**
7		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	3 days	Sep 19 '20	Sep 23 '20
8		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	3 days	Sep 23 '20	Sep 26 '20
9		3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	6 days	Sep 19 '20	Sep 26 '20
10		3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	6 days	Sep 19 '20	Sep 26 '20
11		**5**	**LAVADO DE TANQUES**	**1 day**	**Sep 19 '20**	**Sep 21 '20**
12		5.2.2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
13		**NP**	**NO PREVISTO**	**51 days**	**Sep 19 '20**	**Nov 25 '20**
14		NP-10.342	Aplicación de pintura epoxica aluminio para mantenimiento	7 days	Nov 17 '20	Nov 25 '20
15		NP-10.343	DESMONTE MANTO ASFALTICO PARA INSTALACION DE MANTO NUEVO	4 days	Sep 19 '20	Sep 24 '20

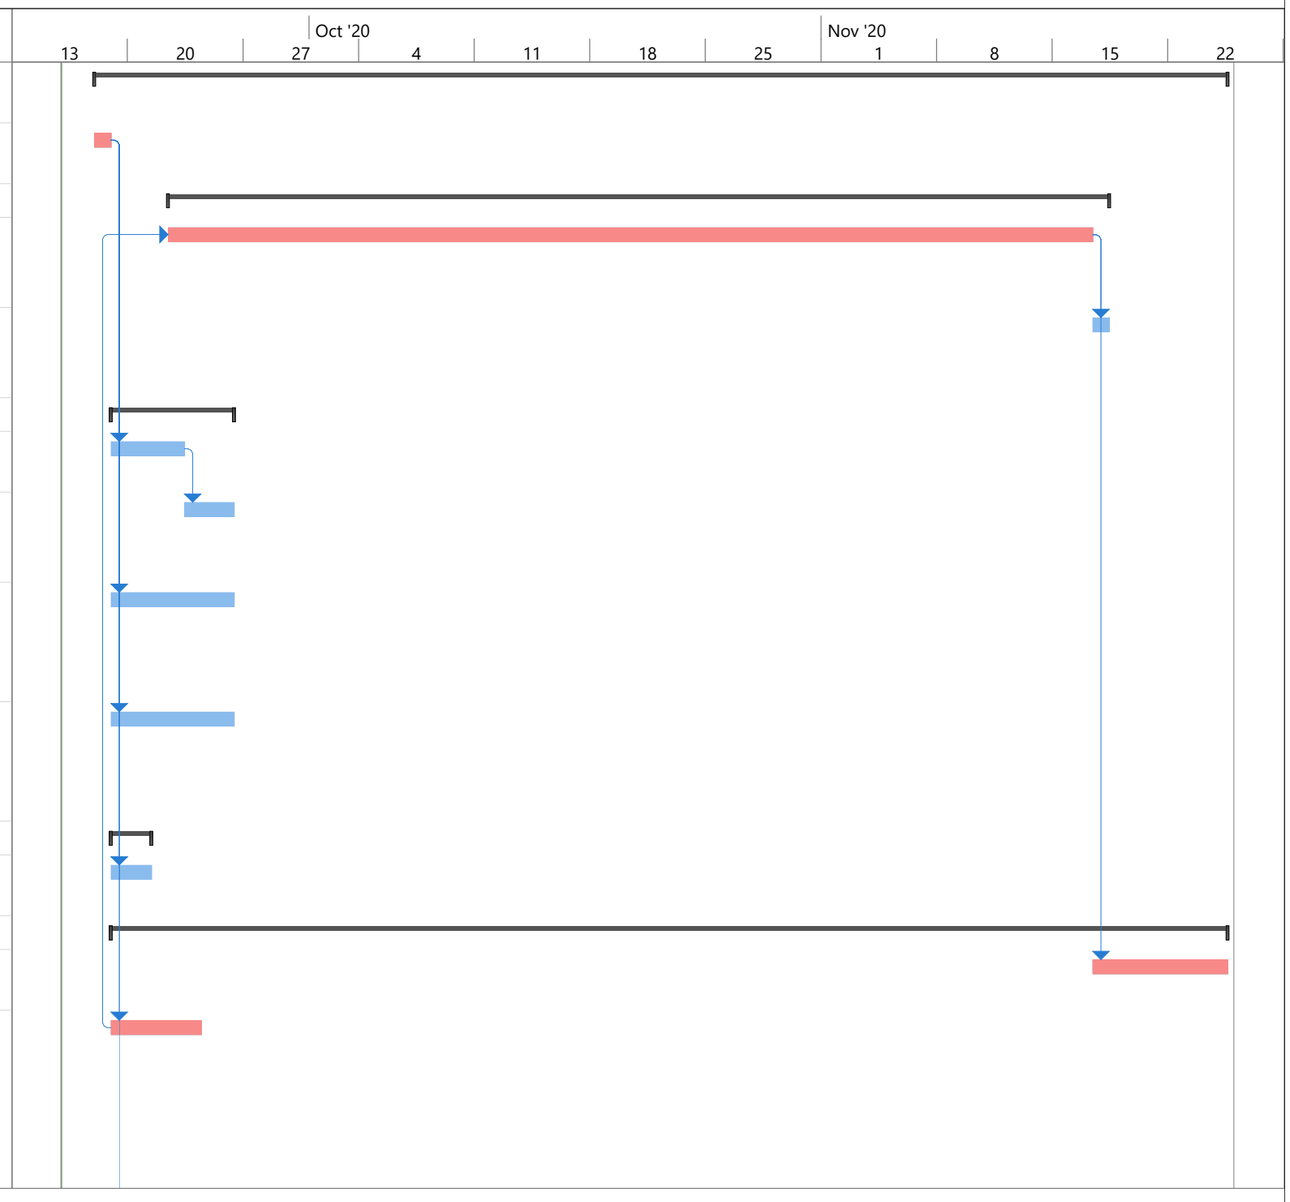


Project: CIEA-MAICAO
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
16		NP-10.341	ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI	20 days	Sep 19 '20	Oct 15 '20

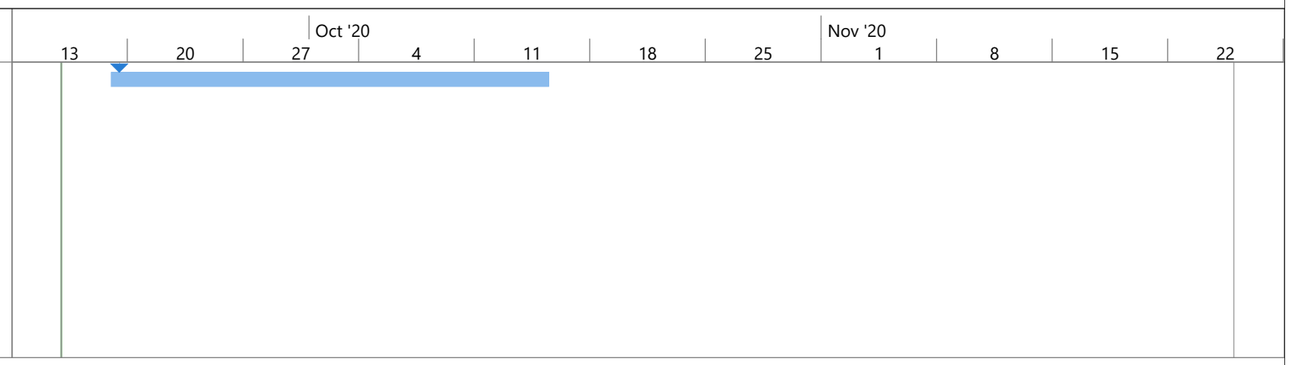


Project: CIEA-MAICAO
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
1			**SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA**	**56 days**	**Sep 18 '20**	**Dec 1 '20**
2			PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 day	Sep 18 '20	Sep 18 '20
3		**1**	**IMPERMEABILIZACIONES**	**55 days**	**Sep 19 '20**	**Dec 1 '20**
4		1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	42 days	Oct 2 '20	Nov 27 '20
5		1.5	CORRECCION FILTRACION BAJO PLACA CON CEMENTO HIDRAULICO	6 days	Sep 19 '20	Sep 26 '20
6		1.7	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON MORTER PLASTICO PREPARADO	2 days	Nov 27 '20	Dec 1 '20
7		**2**	**SISTEMA ELÉCTRICO**	**54 days**	**Sep 19 '20**	**Nov 30 '20**
8		2.1	ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACION, CUADRO DE CARGAS,IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES EXIGIDO EN EL RETIE, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO.	25 days	Sep 19 '20	Oct 21 '20
9		2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Oct 21 '20	Oct 30 '20
10		2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Oct 21 '20	Oct 30 '20
11		2.9	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Oct 21 '20	Oct 30 '20

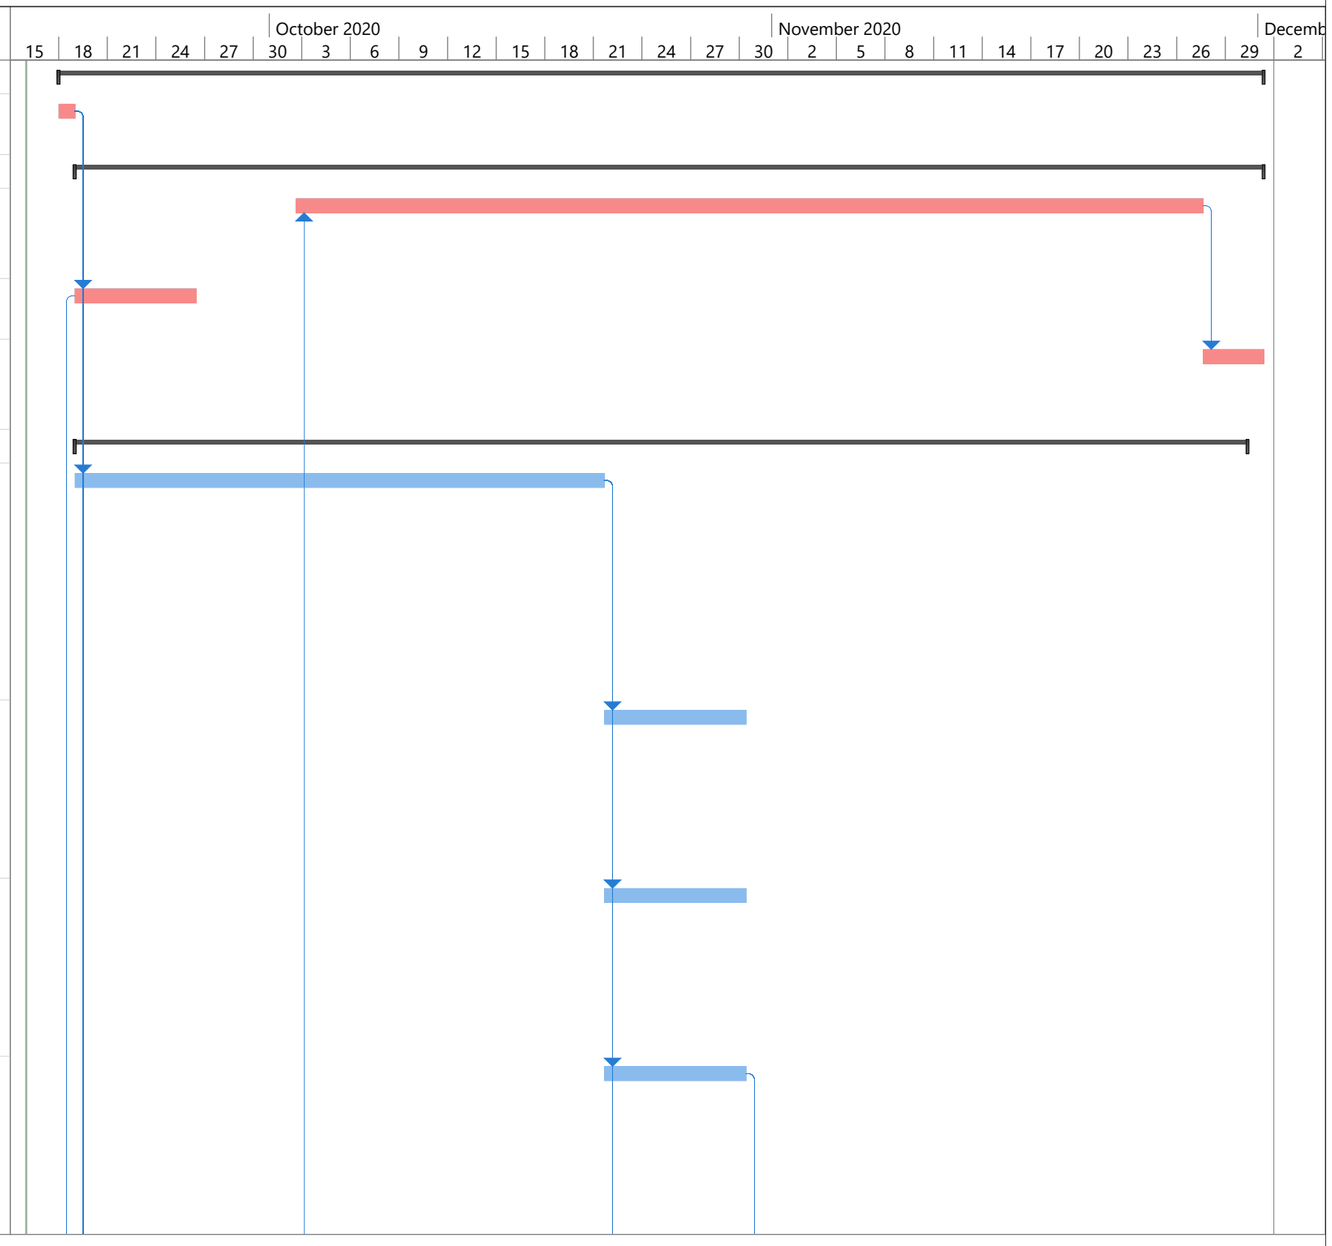


Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
12		2.11	CODIFICACION POR CODIGO DE COLORES DE ACUERDO AL "RETIE"; MEDIANTE CINTAS, PREFORMADOS EN CONDUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE CADA ACOMETIDA.	2 days	Oct 30 '20	Nov 3 '20
13		2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	7 days	Oct 30 '20	Nov 9 '20
14		2.13	CAMBIO DE CONDUCTORES ACOMETIDAS TRIFASICAS DESDE CALIBRE 3X8 HASTA ACOMETIDAS EN CALIBRE 3X1/0	3 days	Oct 30 '20	Nov 4 '20
15		2.16	PLANTA ELÉCTRICA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 12 MESES O 150 HORAS DE OPERACIÓN.	25 days	Oct 21 '20	Nov 24 '20
16		2.17	TRANSFERENCIA AUTOMATICA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REQUINTADA DE CONEXIONADO DE CONDUCTORES.	3 days	Oct 21 '20	Oct 26 '20
17		2.20	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE TRAMOS, COLOCACIÓN DE TAPAS A CANALETA METÁLICA DOBLE COMPARTIMENTO 12X5 CM.	6 days	Oct 21 '20	Oct 29 '20
18		2.21	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA UNA VEZ AL AÑO. SE DEBE OBTENER UNA LECTURA DE 3 OHMIOS O MENOR.	2 days	Nov 24 '20	Nov 26 '20
19		2.22	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.	2 days	Nov 26 '20	Nov 30 '20
20		**3**	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**14 days**	**Sep 19 '20**	**Oct 7 '20**
21		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
22		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	7 days	Sep 28 '20	Oct 7 '20

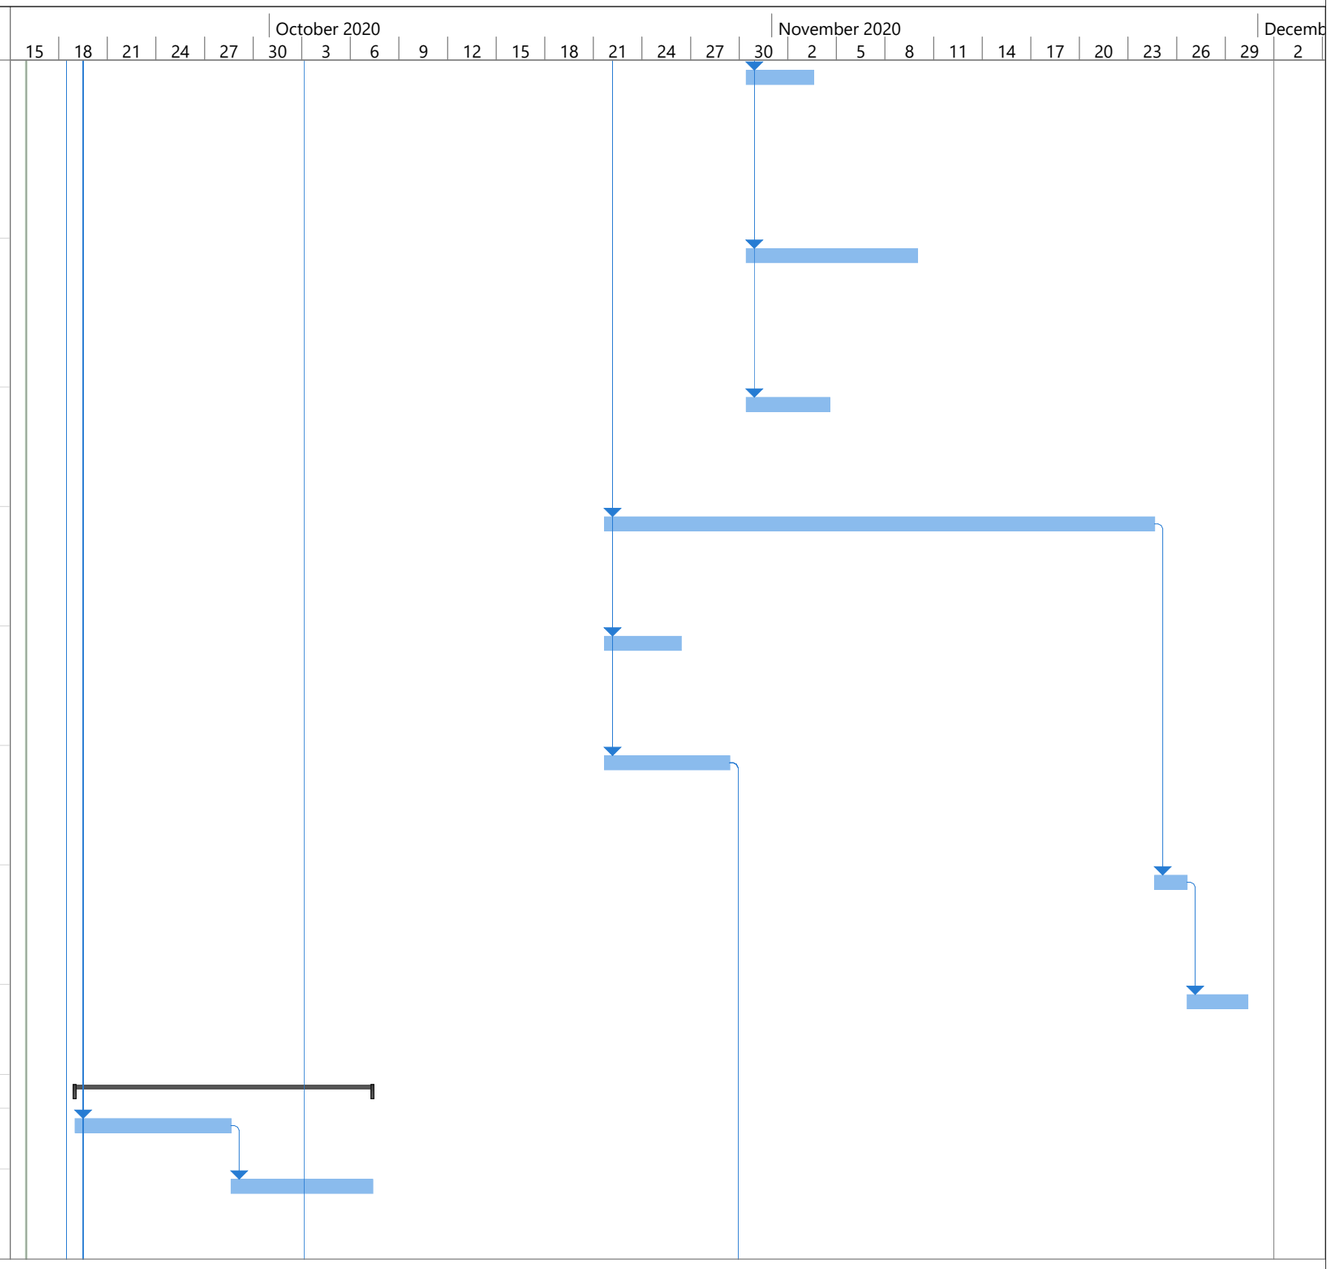


Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica	Project Summary	Duration-only	External Tasks	Tareas críticas
Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline	
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Progress	
Summary	Manual Task	Finish-only	Manual Progress	

Aprobó:

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
23		3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
24		3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	3 days	Sep 19 '20	Sep 23 '20
25		**5**	**LAVADO DE TANQUES**	**8 days**	**Sep 19 '20**	**Sep 29 '20**
26		5.2.2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
27		5.3.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO (NO INCLUYE REPARACION DE ENCHAPE E IMPERMEABILIZACION)	1 day	Sep 21 '20	Sep 22 '20
28		5.3.4	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO EN CONCRETO CON SIKA MONOTOP - 107	4 days	Sep 22 '20	Sep 26 '20
29		5.3.5	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA	2 days	Sep 26 '20	Sep 29 '20
30		5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE GLOBO D=1"	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
31		**8**	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	**12 days**	**Sep 21 '20**	**Oct 6 '20**
32		8.37	TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 MORTERO 1:3	12 days	Sep 21 '20	Oct 6 '20
33		**NP**	**NO PREVISTOS**	**50 days**	**Sep 21 '20**	**Nov 25 '20**
34		NP-10.341	ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI	20 days	Oct 29 '20	Nov 25 '20
35		NP-10.342	Aplicación de pintura epoxica aluminio para mantenimiento	20 days	Sep 21 '20	Oct 16 '20

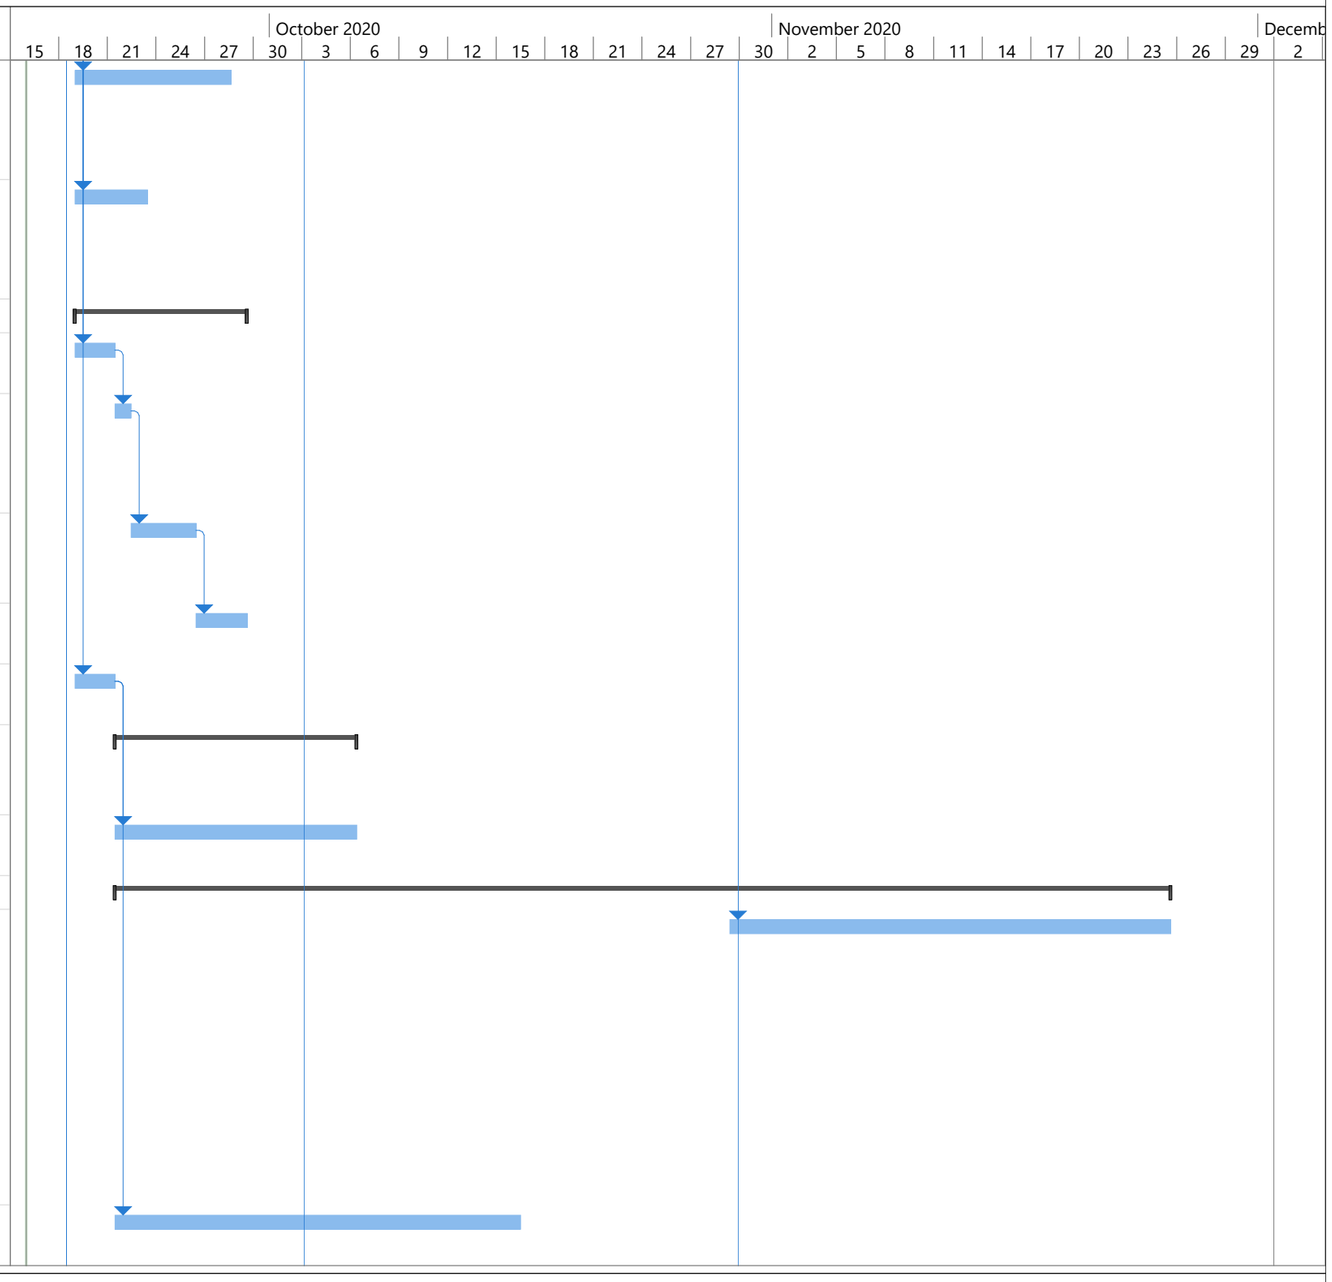


Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
36		NP-10.345	Mantenimiento de subestacion electrica Sede Comercio y Servicio	20 days	Oct 29 '20	Nov 25 '20
37		NP-10.346	Mantenimiento de Estructura de Kiosko incluye inmunizacion	20 days	Oct 29 '20	Nov 25 '20
38		NP-10.347	RETIRO DE MANTO ASFALTICO PARA INSTALACION DE MANTO NUEVO (INCLUYE DESALOJO)	7 days	Sep 24 '20	Oct 2 '20

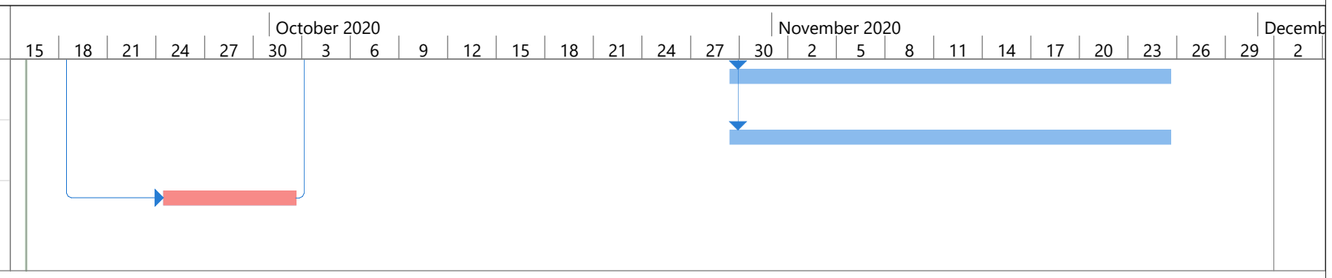


Project: SEDE COMERCIO Y SER
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

ID	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
1		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA**	**50 days**	**Sep 18 '20**	**Nov 23 '20**
2		PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 day	Sep 18 '20	Sep 18 '20
3	**2**	**SISTEMAS ELECTRICOS**	**25 days**	**Sep 19 '20**	**Oct 21 '20**
4	2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
5	2.3	MARCACIÓN DE TUBERÍA EMT CON COLOR ANARANJADO.	2 days	Sep 28 '20	Sep 30 '20
6	2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Sep 30 '20	Oct 9 '20
7	2.7	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS.	7 days	Sep 30 '20	Oct 9 '20
8	2.9	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
9	2.11	CODIFICACION POR CODIGO DE COLORES DE ACUERDO AL "RETIE"; MEDIANTE CINTAS, PREFORMADOS EN CONDUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE CADA ACOMETIDA.	2 days	Sep 30 '20	Oct 2 '20
10	2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	7 days	Oct 2 '20	Oct 13 '20
11	2.13	CAMBIO DE CONDUCTORES ACOMETIDAS TRIFASICAS DESDE CALIBRE 3X8 HASTA ACOMETIDAS EN CALIBRE 3X1/0	7 days	Oct 13 '20	Oct 21 '20
12	**3**	**SERVICIO JARDINERIA**	**14 days**	**Sep 19 '20**	**Oct 7 '20**
13	3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
14	3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	7 days	Sep 24 '20	Oct 2 '20

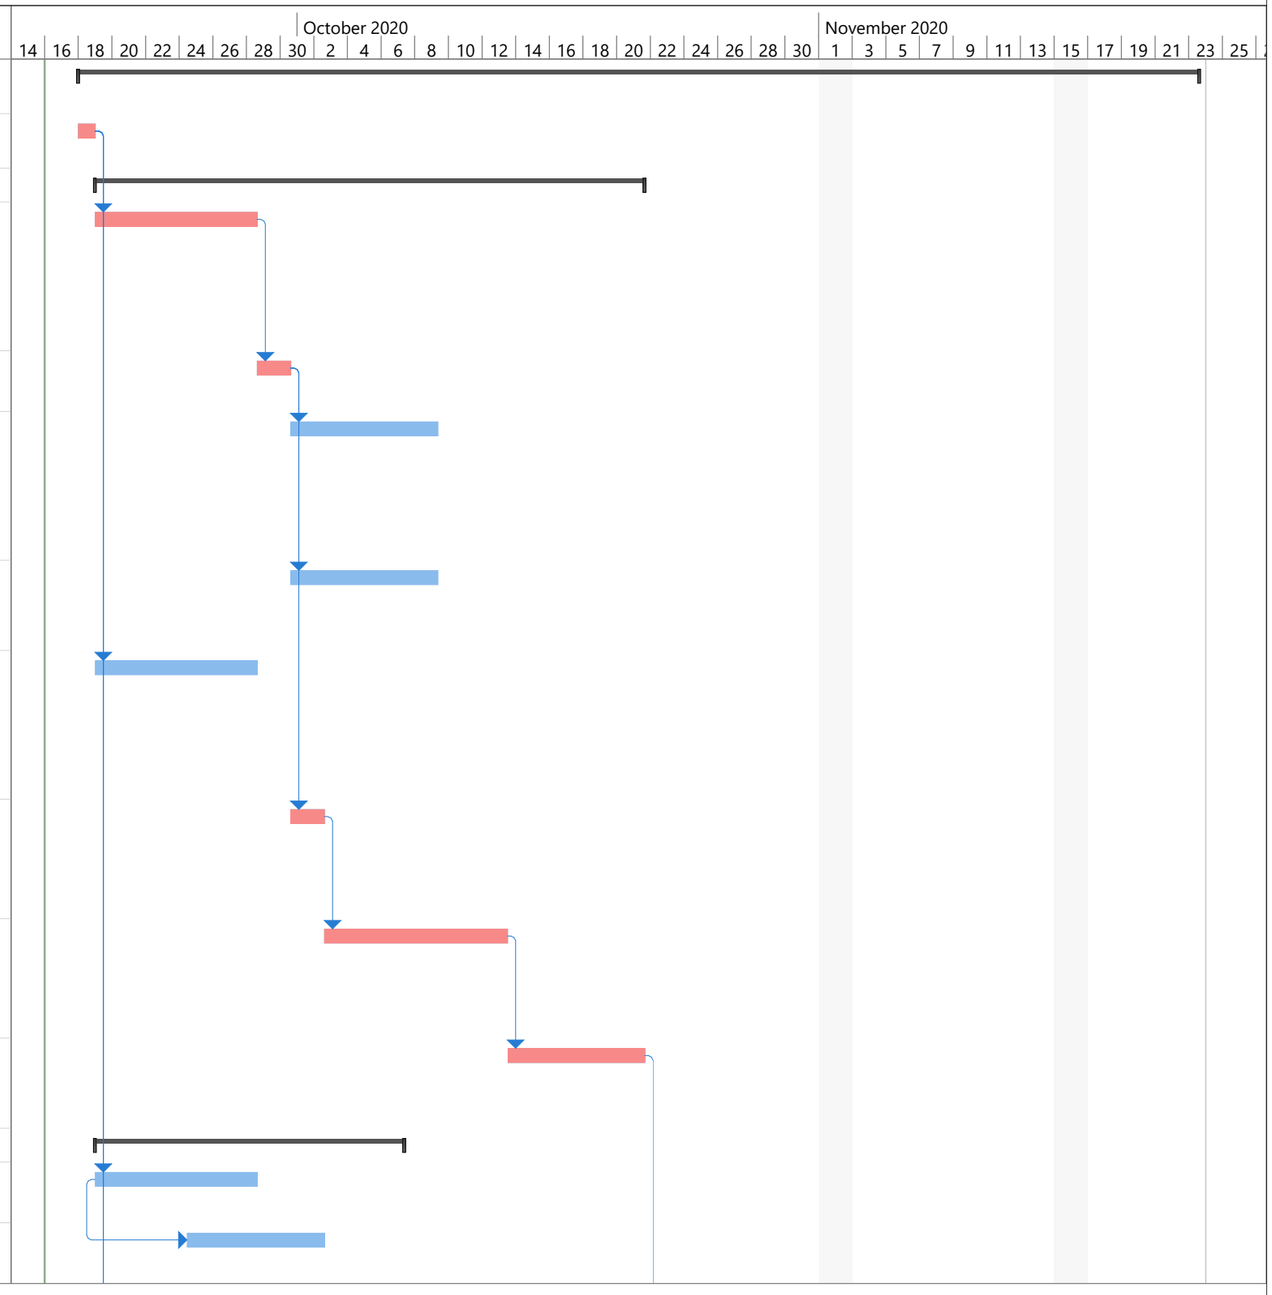


Project: CENTRO INDUSTRIAL Y
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

ID	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish
15	3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	14 days	Sep 19 '20	Oct 7 '20
16	3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	7 days	Sep 19 '20	Sep 28 '20
17	**5**	**LAVADO DE TANQUES**	**1 day**	**Sep 19 '20**	**Sep 21 '20**
18	5.2.2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE	1 day	Sep 19 '20	Sep 21 '20
19	**NP**	**NO PREVISTOS**	**24 days**	**Oct 21 '20**	**Nov 23 '20**
20	NP-10.349	Mantenimientos de Plantas Electricas CIEA	4 days	Oct 21 '20	Oct 27 '20
21	NP-10.341	ANEXO 3: ACCIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE TRIMESTRALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 1. LAVAR Y DESINCRUSTAR O SOPLAR LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y DE CONDENSACIÓN 2. LIMPIEZA DE ASPAS DE VENTILADORES DE CONDENSACIÓN. 3. LIMPIEZA DE REJILLAS Y DI	20 days	Oct 27 '20	Nov 23 '20

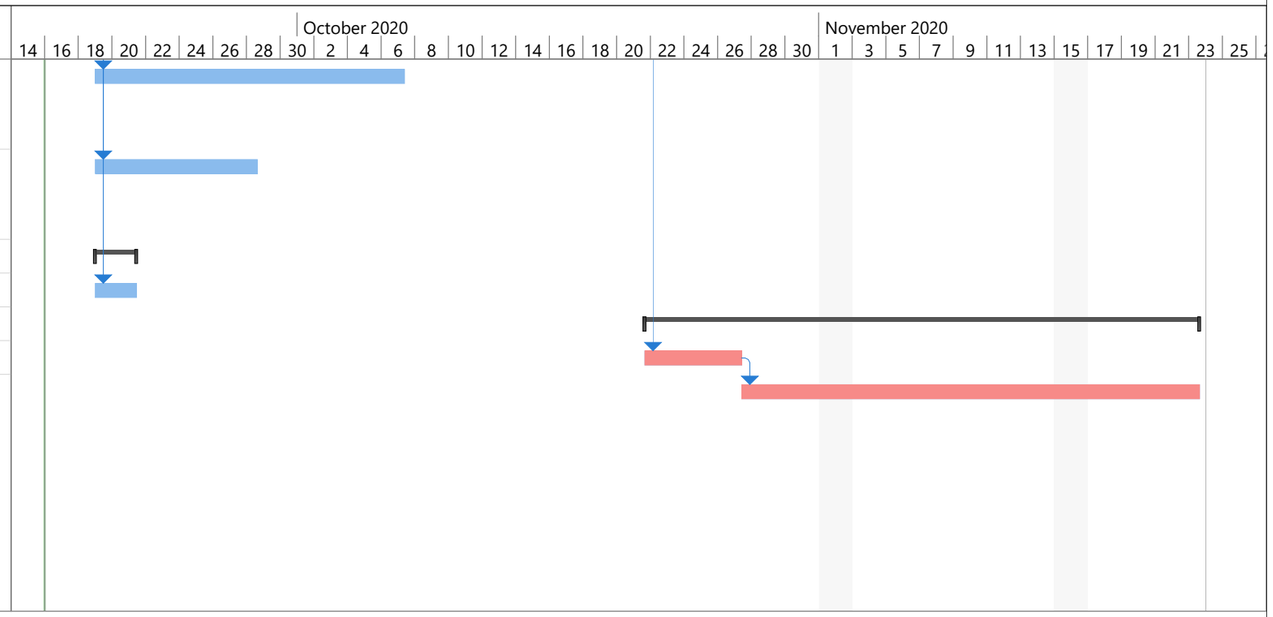

Project: CENTRO INDUSTRIAL Y
Date: Sep 16 '20

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:
