Medellín, 06 de mayo de 2026.

Int – 20260072 – Con - 112

Señores:
Renting de Antioquia, EICE, RENTAN.
Atn: Ing. Catalina Castrillón Torres.
Subgerente de ejecución

Referencia: Contrato No. 25OO111B2821 Cuyo objeto es: *"Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (Lote 2 Occidente)".*

Asunto: Programación de obra.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal del contrato correspondiente al Lote 2 – Subregión Occidente, y en atención a la documentación presentada por el contratista de obra, nos permitimos remitir para su conocimiento y fines pertinentes la Programación de Obra, aprobada por interventoría.

Se anexa a la presente comunicación.

Cordialmente,

Carlos A Mejía G.

Ing. Carlos Mejía.
Residente de interventoría.
Consorcio Temporales.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA INSFRAESTRUCTURA FISICA - SIF
PROGRAMA DE INVERSIÓN

EL PROGRESO

FECHA: (Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

CONTRATO No: 2GCO113923/21 DE 2023

OBJETO:
"ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE"

CONTRATISTA: CONSORCIO EL PROGRESO - NIT 902.017.242-2


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **INTERVENTOR:** CONSORCIO TEMPORALES

PLAZO INICIAL: 18 MESES (Mes, semana, quincena, mes calendario, día calendario)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/02/2026 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Relacione la suspensión más reciente, si ha sucedido más de una) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (CHB): $ 104.939.812.998,00 (Pesos colombianos solamente)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (CHB): $ 104.869.812.998,00


PLAZO ACUMULADO: (Mes, semana, quincena, mes calendario, día calendario, incluyendo las suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 09/03/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Relacione la suspensión más reciente, si ha sucedido más de una) (Indique día/mes/año)
VALOR APORTE (Incluido IVA) (AI): $ - (Pesos colombianos solamente)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA $/Mes de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA $/Mes de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) AVANCE/ INVERSIÓN PROGRAMADA % Inicial programado VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA $/Mes de pesos % Ejecutado	% Programado $ Inicial programado $ Inicio-Ejecutado	1 feb-26	2 mar-26	3 abr-26	4 may-26	5 jun-26	6 jul-26	7 ago-26	8 sep-26	9 oct-26	10 nov-26	11 dic-26	12 ene-27	13 feb-27	14 mar-27	15 abr-27	16 may-27	17 jun-27	18 jul-27	19 ago-27
VÍA MISERENGA - EBEJICO																							
CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$361.779,29	0,38%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$174.339	$174.339	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	$156.584,15	0,17%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$174.339	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS	$161.153,08	0,17%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$174.339	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	$24.366,01	0,03%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$174.339	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES	$91.862,38	0,07%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$174.339	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 6 - ESTABILIZACIÓN CON MATERIAL GRANULAR	$464.163,37	0,48%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$174.339	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL	$14.706,76	0,02%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$174.339	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
VÍA FRONTINO - NUTIBARA																							
CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$3.404.648,23	3,81%	0,00%	% P	0,001%	0,027%	0,026%	0,027%	0,186%	0,046%	0,091%	0,072%	0,091%	0,072%	0,209%	0,261%	0,209%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$3.370	$250.410	$243.540	$250.410	$1.760.130	$433.247	$859.341	$680.014	$859.341	$677.216	$2.029.340	$2.529.340	$2.029.340	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	$4.099.793,66	4,34%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS	$4.077.821,00	4,34%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	$829.193,30	0,84%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES	$941.297,61	0,97%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 6 - ESTABILIZACIÓN CON MATERIAL GRANULAR	$15.674.137,39	16,59%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL	$367.718,97	0,39%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
VÍA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN																							
CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$5.263.925,30	5,56%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,001%	0,000%	0,000%	0,430%	0,842%	0,611%	0,819%	0,750%	0,819%	0,750%	1,281%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$970.000	$0	$0	$7.920.000	$15.500.000	$11.250.000	$15.080.000	$13.800.000	$15.080.000	$13.800.000	$23.600.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	$4.191.303,27	4,26%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS	$4.779.074,55	5,05%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	$703.753,65	0,74%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES	$820.089,23	0,87%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 6 - ESTABILIZACIÓN CON MATERIAL GRANULAR	$11.885.697,87	12,58%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL	$424.070,62	0,45%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
VÍA TITIRIBÍ - AMAGA																							
CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$1.241.242,99	1,31%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,091%	1,302%	0,345%	0,317%	0,317%	0,212%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	$765.210,64	0,83%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS	$913.970,52	0,98%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	$127.600,08	0,13%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES	$178.963,86	0,19%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 6 - ESTABILIZACIÓN CON MATERIAL GRANULAR	$2.017.142,24	2,13%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,277%	0,464%	0,464%	0,310%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$37.000	$37.000	$37.000	$37.000	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL	$73.543,78	0,08%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
VÍA SOMETRAN - BELMIRA - HORIZONTES																							
CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$4.830.647,14	5,11%	0,00%	% P	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$3.370	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	$4.979.399,00	5,27%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0			$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS	$4.961.179,68	5,25%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1				**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - Subregión de**	**365 días**	**lun 20/04/26**	**lun 19/04/27**
2				**VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12**	**365 días**	**lun 20/04/26**	**lun 19/04/27**
3				**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**297 días**	**jue 30/04/26**	**sáb 20/02/27**
4		77	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de	180 días	jue 9/07/26	lun 4/01/27
5		78	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	180 días	jue 9/07/26	lun 4/01/27
6		79	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y	180 días	jue 9/07/26	lun 4/01/27
7		80	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección,	180 días	jue 9/07/26	lun 4/01/27
8		81	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	180 días	jue 9/07/26	lun 4/01/27
9		82	6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	210 días	vie 24/07/26	jue 18/02/27
10		83	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás	210 días	dom 26/07/26	sáb 20/02/27
11		84	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane	150 días	jue 30/04/26	sáb 26/09/26

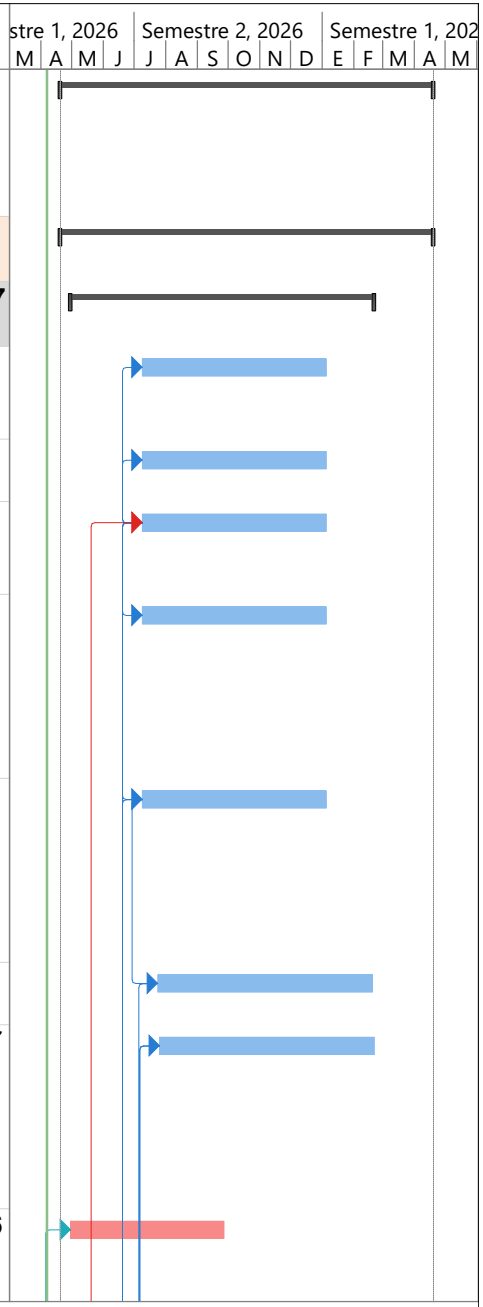


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
12		85	8.27-2	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión	210 días	jue 9/07/26	mié 3/02/27
13		86	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	210 días	sáb 25/07/26	vie 19/02/27
14		87	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	180 días	jue 9/07/26	lun 4/01/27
15				**CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS**	**184 días**	**jue 15/10/26**	**vie 16/04/27**
16		88	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y	180 días	jue 15/10/26	lun 12/04/27
17		89	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	180 días	sáb 17/10/26	mié 14/04/27
18		90	6.2.50-1	Concreto Clase C (28 MPa). Cuneta	180 días	lun 19/10/26	vie 16/04/27
19		91	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	180 días	lun 19/10/26	vie 16/04/27
20		92	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	180 días	sáb 17/10/26	mié 14/04/27
21				**CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**	**150 días**	**mié 29/07/26**	**vie 25/12/26**
22		93	8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de	150 días	mié 29/07/26	vie 25/12/26
23		94	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.	150 días	mié 29/07/26	vie 25/12/26

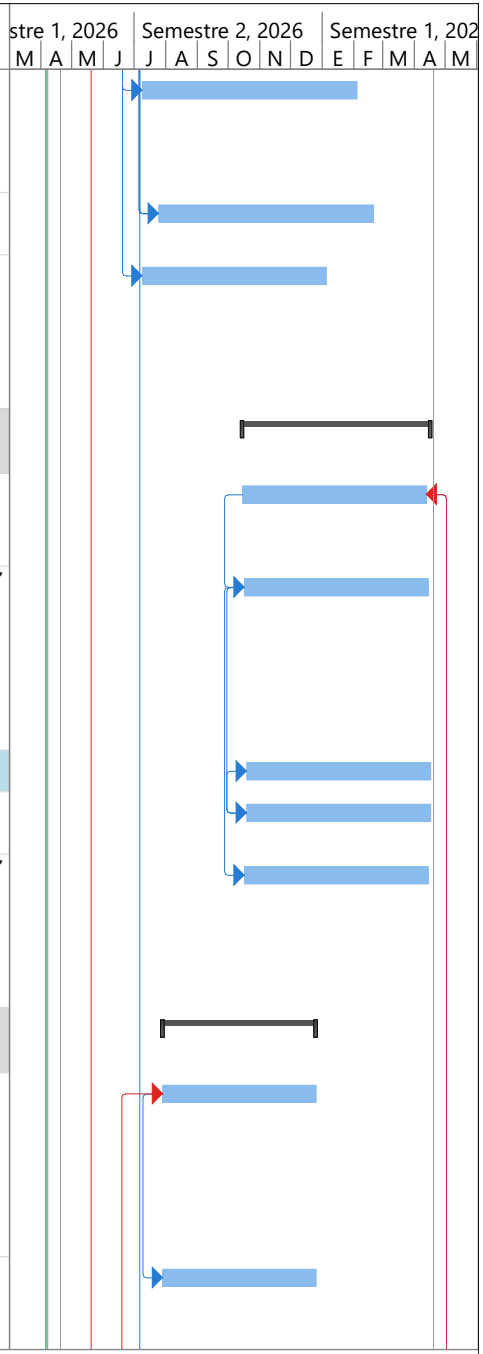


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
24				**CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**	**152 días**	**sáb 14/11/26**	**mié 14/04/27**
25		95	4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material	150 días	sáb 14/11/26	lun 12/04/27
26		96	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	150 días	lun 16/11/26	mié 14/04/27
27		97	14.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano,	150 días	lun 16/11/26	mié 14/04/27
28				**CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**	**183 días**	**dom 26/07/26**	**dom 24/01/27**
29		98	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y	180 días	dom 26/07/26	jue 21/01/27
30		99	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	180 días	mar 28/07/26	sáb 23/01/27
31		100	8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21	180 días	mié 29/07/26	dom 24/01/27
32		101	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	180 días	mié 29/07/26	dom 24/01/27
33				**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**	**325 días**	**sáb 30/05/26**	**lun 19/04/27**
34		102	4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye	90 días	sáb 30/05/26	jue 27/08/26
35		103	5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo	150 días	lun 29/06/26	mié 25/11/26

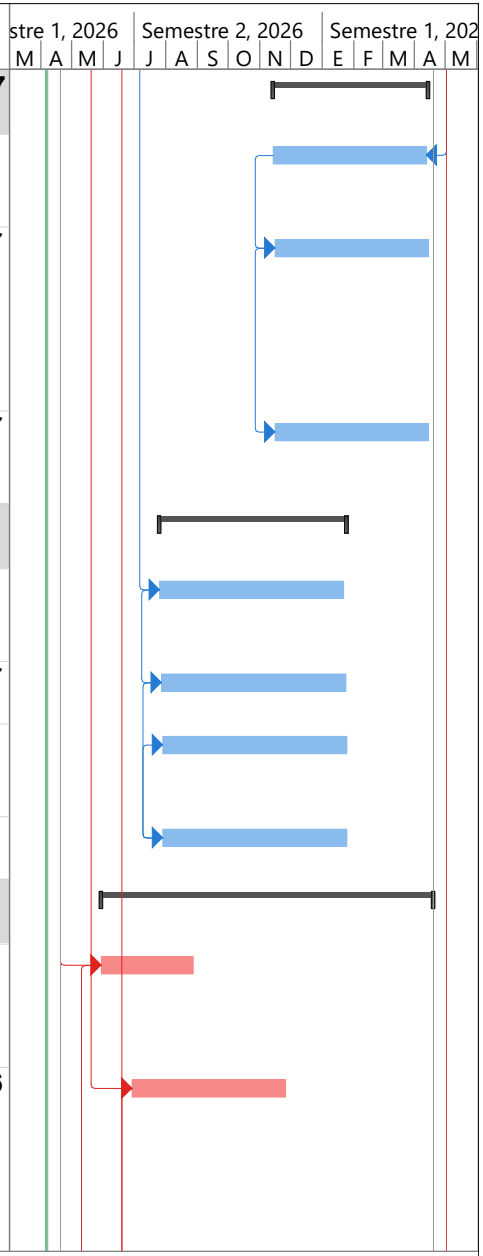


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
36		104	5.2.16	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de	80 días	dom 6/12/26	mar 23/02/27
37		105	5.2.13	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en	100 días	vie 28/08/26	sáb 5/12/26
38		106	4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del	80 días	lun 16/11/26	mié 3/02/27
39		107	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación	180 días	sáb 8/08/26	mié 3/02/27
40		108	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo	180 días	sáb 8/08/26	mié 3/02/27
41		109	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo	120 días	lun 14/12/26	lun 12/04/27
42		110	7.1.12.2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	55 días	mié 24/02/27	lun 19/04/27
43		111	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	180 días	sáb 8/08/26	mié 3/02/27

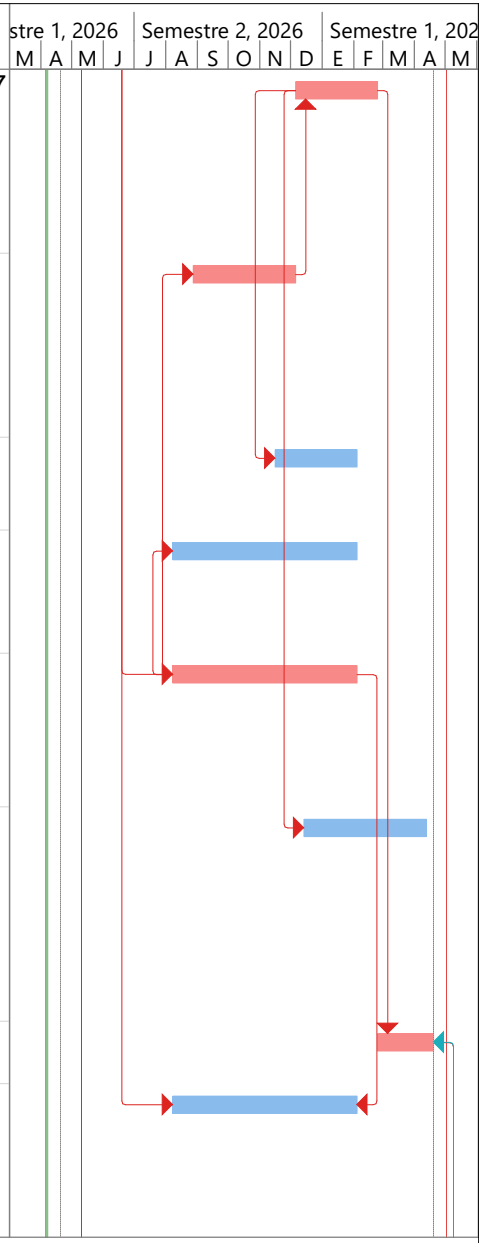


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
44		112	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto	90 días	sáb 30/05/26	jue 27/08/26
45				**CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL**	**14 días**	**mar 6/04/27**	**lun 19/04/27**
46		113	12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en	14 días	mar 6/04/27	lun 19/04/27
47		114	12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en	14 días	mar 6/04/27	lun 19/04/27
48				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)**	**364 días**	**lun 20/04/26**	**dom 18/04/27**
49				Plan de Manejo Ambiental, Social y SST (Incluye IVA)	364 días	lun 20/04/26	dom 18/04/27
50				**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)**	**364 días**	**lun 20/04/26**	**dom 18/04/27**
51				Plan de Manejo de Transito (PMT) (Incluye IVA)	364 días	lun 20/04/26	dom 18/04/27
52				**CARACTERIZACION VIAL**	**30 días**	**dom 21/03/27**	**lun 19/04/27**
53				Caracterización Vial	30 días	dom 21/03/2	lun 19/04/27
54				**PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS**	**364 días**	**lun 20/04/26**	**dom 18/04/27**
55				Provisión para el Pago de Prima de Garantías	364 días	lun 20/04/26	dom 18/04/27
56				**PROVISIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS**	**364 días**	**lun 20/04/26**	**dom 18/04/27**
57				Provisión para Actualización de Precio	364 días	lun 20/04/26	dom 18/04/2

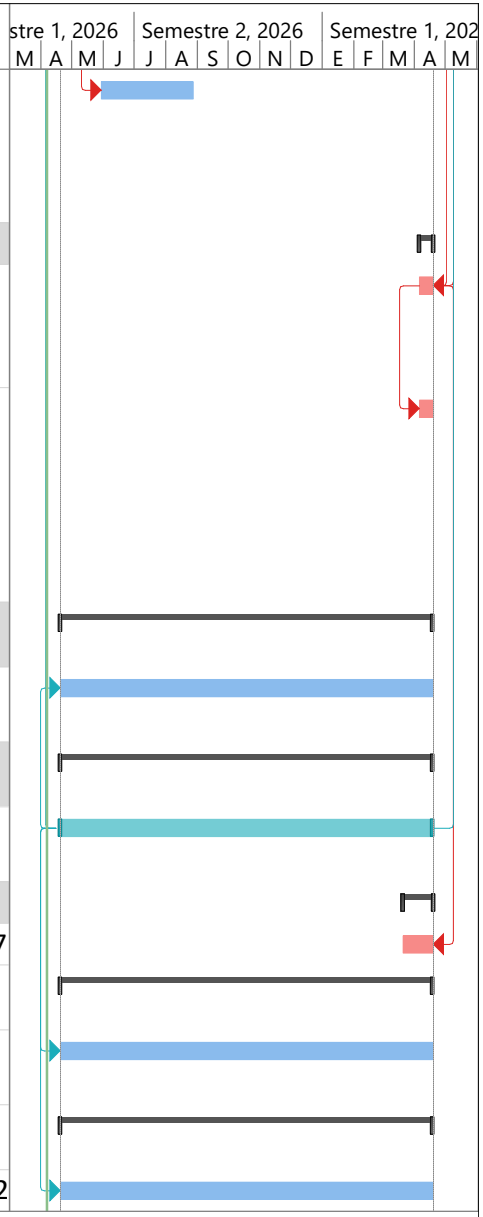


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1				**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - Subregión de**	**424 días**	**mar 10/02/26**	**vie 9/04/27**
2				**VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14**	**424 días**	**mar 10/02/26**	**vie 9/04/27**
3				**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**342 días**	**mié 25/02/26**	**lun 1/02/27**
4		39	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de	180 días	lun 15/06/26	vie 11/12/26
5		40	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	180 días	lun 15/06/26	vie 11/12/26
6		41	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y	180 días	lun 15/06/26	vie 11/12/26
7		42	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección,	180 días	lun 15/06/26	vie 11/12/26
8		43	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	180 días	lun 15/06/26	vie 11/12/26
9		44	6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	210 días	dom 5/07/26	sáb 30/01/27
10		45	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás	210 días	mar 7/07/26	lun 1/02/27
11		46	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane	150 días	mié 25/02/26	vie 24/07/26

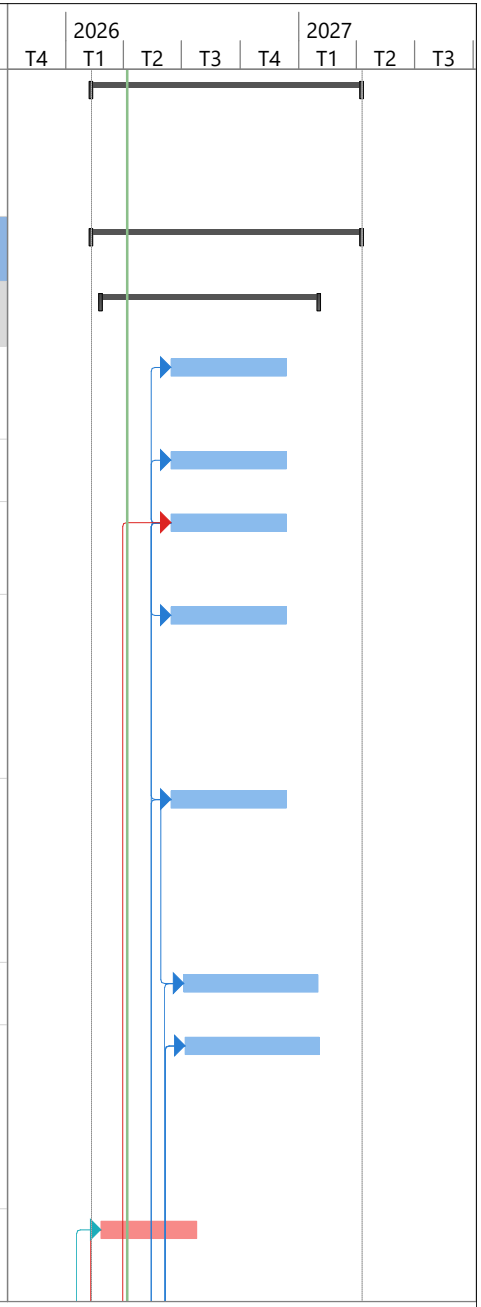


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
12		47	8.27-1	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión	180 días	lun 15/06/26	vie 11/12/26
13		48	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	210 días	lun 6/07/26	dom 31/01/27
14		49	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	180 días	lun 15/06/26	vie 11/12/26
15				**CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS**	**184 días**	**lun 5/10/26**	**mar 6/04/27**
16		50	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y	180 días	lun 5/10/26	vie 2/04/27
17		51	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	180 días	mié 7/10/26	dom 4/04/27
18		52	6.2.50	Concreto Clase C (28 MPa). Cuneta	180 días	vie 9/10/26	mar 6/04/27
19		53	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	180 días	vie 9/10/26	mar 6/04/27
20		54	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	180 días	mié 7/10/26	dom 4/04/27
21				**CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**	**150 días**	**mié 15/07/26**	**vie 11/12/26**
22		55	8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de	150 días	mié 15/07/26	vie 11/12/26
23		56	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.	150 días	mié 15/07/26	vie 11/12/26

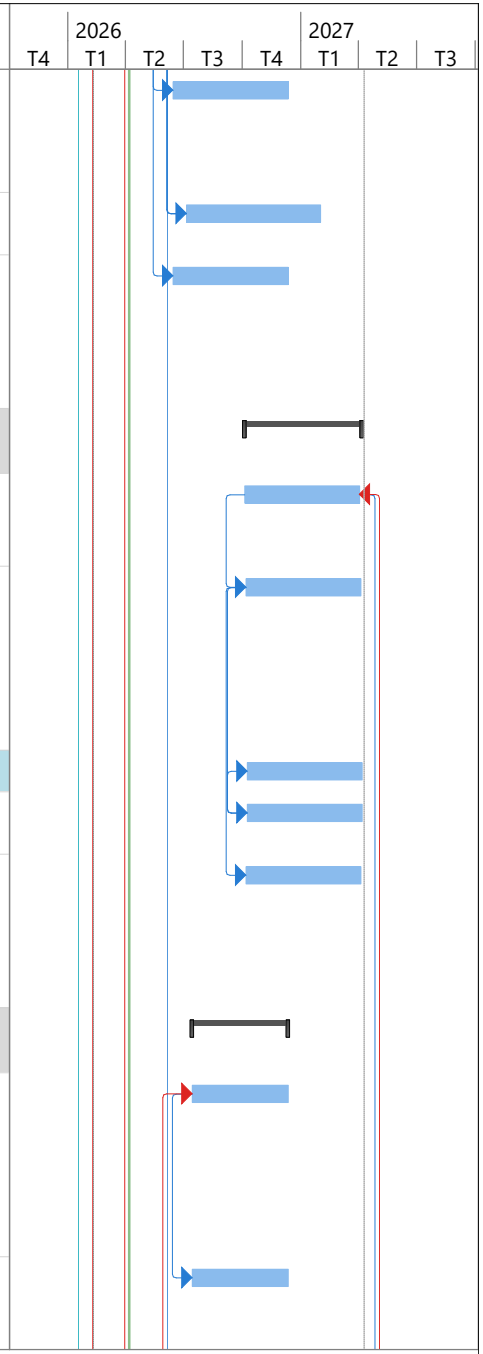


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
24				**CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**	**152 días**	**mié 28/10/26**	**dom 28/03/27**
25		57	4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material	150 días	mié 28/10/26	vie 26/03/27
26		58	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	150 días	vie 30/10/26	dom 28/03/27
27		59	14.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano,	150 días	vie 30/10/26	dom 28/03/27
28				**CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**	**183 días**	**mar 7/07/26**	**mar 5/01/27**
29		60	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y	180 días	mar 7/07/26	sáb 2/01/27
30		61	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	180 días	jue 9/07/26	lun 4/01/27
31		62	8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21	180 días	vie 10/07/26	mar 5/01/27
32		63	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	180 días	vie 10/07/26	mar 5/01/27
33				**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**	**359 días**	**jue 16/04/26**	**vie 9/04/27**
34		64	4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye	70 días	jue 16/04/26	mié 24/06/26
35		65	5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo	150 días	lun 15/06/26	mié 11/11/26

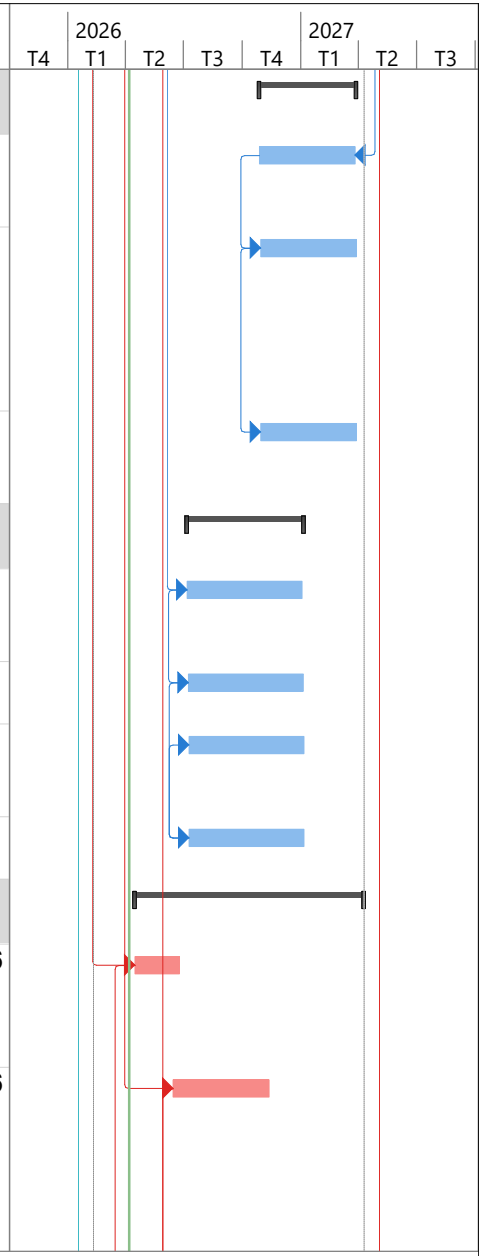


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
36		66	5.2.16	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de	70 días	mar 22/12/26	lun 1/03/27
37		67	5.2.13	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en	100 días	dom 13/09/26	lun 21/12/26
38		68	4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del	90 días	dom 22/11/26	vie 19/02/27
39		69	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación	170 días	vie 14/08/26	sáb 30/01/27
40		70	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo	170 días	vie 14/08/26	sáb 30/01/27
41		71	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del	70 días	mié 30/12/26	mar 9/03/27
42		72	7.1.12.2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	39 días	mar 2/03/27	vie 9/04/27
43		73	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	170 días	vie 14/08/26	sáb 30/01/27
44		74	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto	70 días	jue 16/04/26	mié 24/06/26

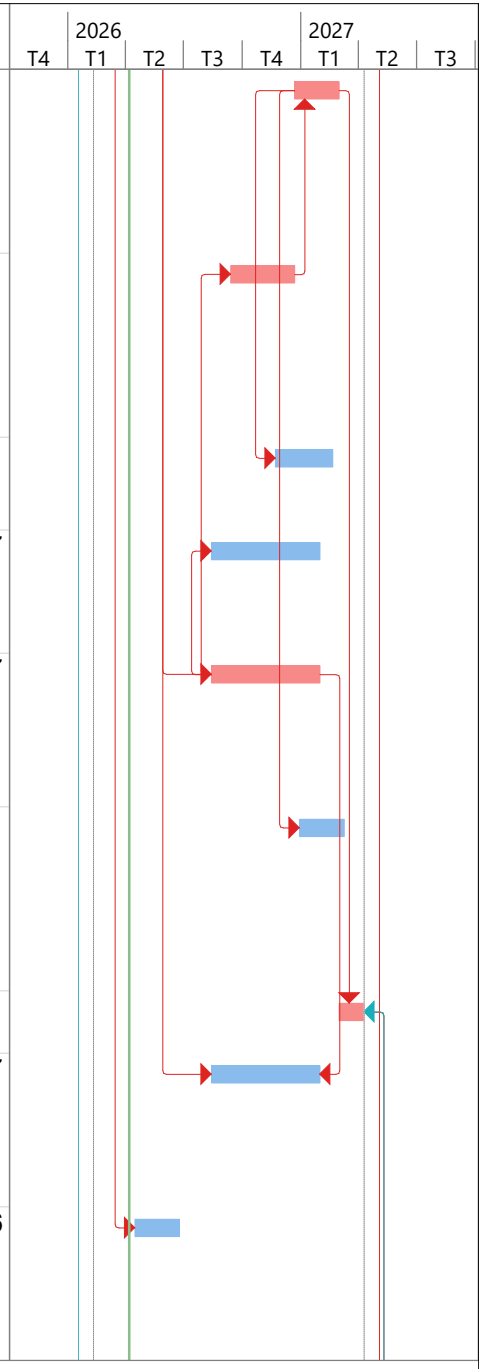


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
45				**CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL**	**13 días**	**dom 28/03/27**	**vie 9/04/27**
46		75	12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en	13 días	dom 28/03/27	vie 9/04/27
47		76	12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en	13 días	dom 28/03/27	vie 9/04/27
48				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)**	**423 días**	**mar 10/02/26**	**jue 8/04/27**
49				Plan de Manejo Ambiental, Social y SST (Incluye IVA)	423 días	mar 10/02/26	jue 8/04/27
50				**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)**	**423 días**	**mar 10/02/26**	**jue 8/04/27**
51				Plan de Manejo de Transito (PMT) (Incluye IVA)	423 días	mar 10/02/26	jue 8/04/27
52				**CARACTERIZACION VIAL**	**25 días**	**mar 16/03/27**	**vie 9/04/27**
53				Caracterización Vial	25 días	mar 16/03/27	vie 9/04/27
54				**PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS**	**423 días**	**mar 10/02/26**	**jue 8/04/27**
55				Provisión para el Pago de Prima de Garantías	423 días	mar 10/02/26	jue 8/04/27
56				**PROVISIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS**	**423 días**	**mar 10/02/26**	**jue 8/04/27**
57				Provisión para Actualización de Precio	423 días	mar 10/02/26	jue 8/04/27

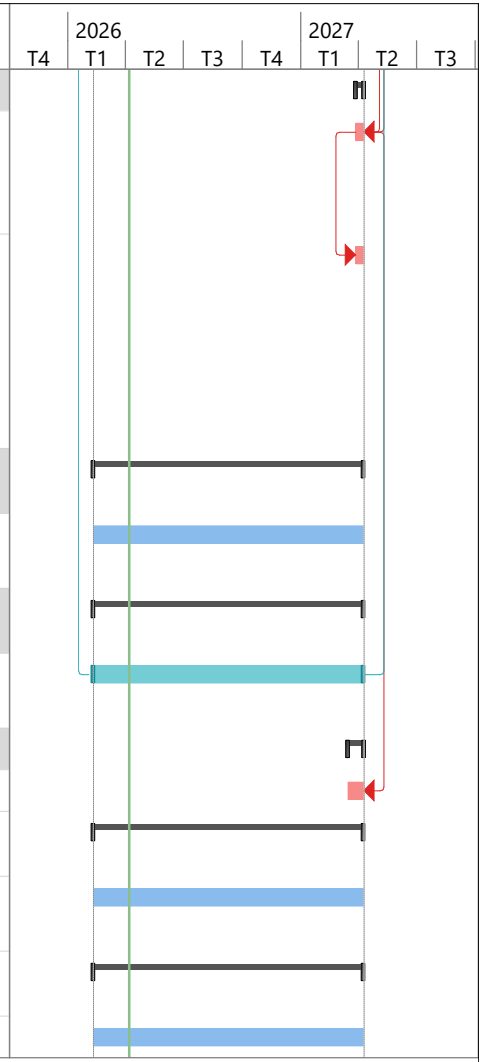


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1				**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - Subregión de**	**89 días**	**mar 2/02/27**	**sáb 1/05/27**
2				**VIA MISERENGA-EBEJICO 62AN17 TRAMO E28**	**89 días**	**mar 2/02/27**	**sáb 1/05/27**
3				**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**52 días**	**vie 5/02/27**	**dom 28/03/27**
4		1	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la	10 días	sáb 20/02/27	lun 1/03/27
5		2	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	10 días	sáb 20/02/27	lun 1/03/27
6		3	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	10 días	sáb 20/02/27	lun 1/03/27
7		4	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección,	10 días	sáb 20/02/27	lun 1/03/27
8		5	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor	10 días	sáb 20/02/27	lun 1/03/27
9		6	6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	15 días	dom 7/03/27	dom 21/03/27
10		7	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás	20 días	mar 9/03/27	dom 28/03/27

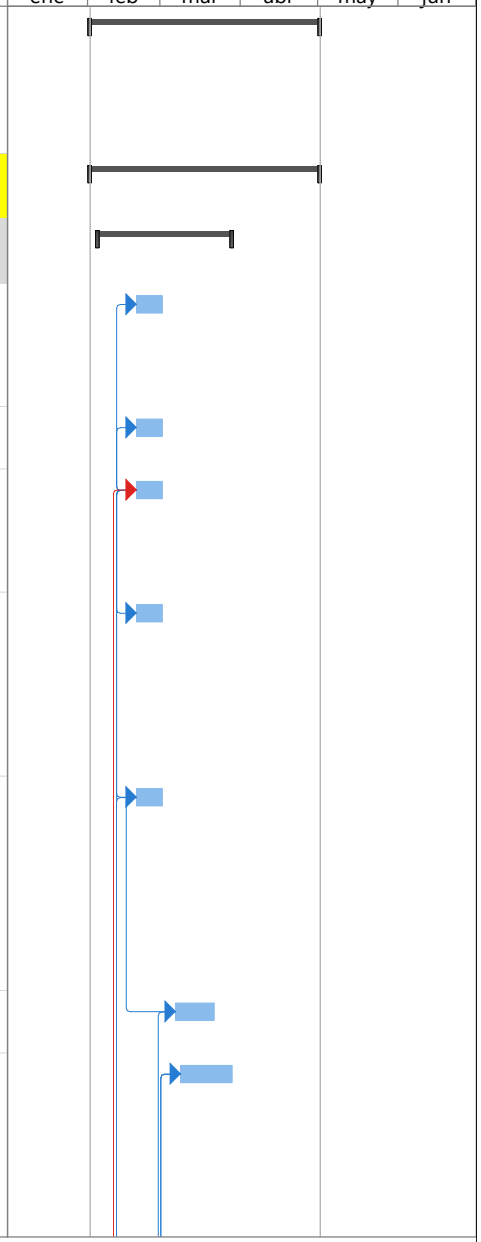


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
11		8	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane	20 días	vie 5/02/27	mié 24/02/27
12		9	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión	10 días	sáb 20/02/27	lun 1/03/27
13		10	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	20 días	lun 8/03/27	sáb 27/03/27
14		11	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	10 días	sáb 20/02/27	lun 1/03/27
15				**CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS**	**17 días**	**mié 14/04/27**	**vie 30/04/27**
16		12	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	15 días	mié 14/04/27	mié 28/04/27
17		13	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor	15 días	mié 14/04/27	mié 28/04/27
18		14	6.2.50	Concreto Clase C (28 MPa). Cuneta	15 días	vie 16/04/27	vie 30/04/27
19		15	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	15 días	vie 16/04/27	vie 30/04/27
20		16	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	15 días	mié 14/04/27	mié 28/04/27
21				**CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**	**12 días**	**mié 17/03/27**	**dom 28/03/27**

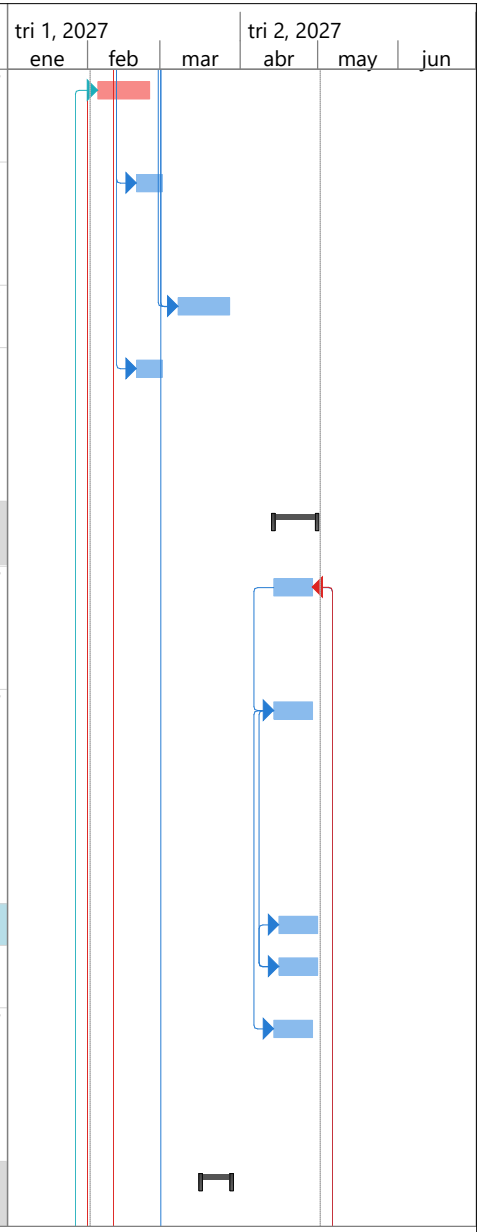


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
22		17	8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición	12 días	mié 17/03/27	dom 28/03/27
23		18	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.	12 días	mié 17/03/27	dom 28/03/27
24				**CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**	**14 días**	**sáb 17/04/27**	**vie 30/04/27**
25		19	4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material	12 días	sáb 17/04/27	mié 28/04/27
26		20	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor	12 días	lun 19/04/27	vie 30/04/27
27		21	14.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	12 días	lun 19/04/27	vie 30/04/27
28				**CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**	**20 días**	**mar 9/03/27**	**dom 28/03/27**
29		22	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	15 días	mar 9/03/27	mar 23/03/27
30		23	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	17 días	jue 11/03/27	sáb 27/03/27
31		24	8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21	17 días	vie 12/03/27	dom 28/03/27
32		25	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	17 días	vie 12/03/27	dom 28/03/27
33				**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**	**76 días**	**lun 15/02/27**	**sáb 1/05/27**

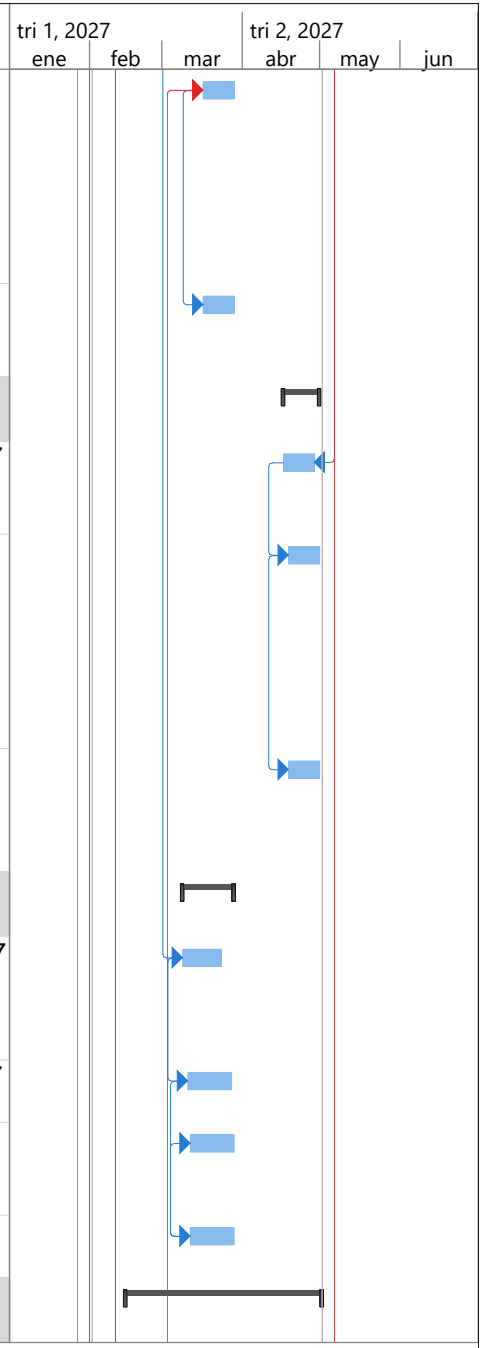


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
34		26	4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye	8 días	lun 15/02/27	lun 22/02/27
35		27	5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo	8 días	dom 7/03/27	dom 14/03/27
36		28	5.2.16	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de	4 días	lun 29/03/27	jue 1/04/27
37		29	5.2.13	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en	4 días	jue 25/03/27	dom 28/03/27
38		30	4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio	8 días	vie 19/03/27	vie 26/03/27
39		31	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	8 días	lun 15/03/27	lun 22/03/27
40		32	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo	8 días	lun 15/03/27	lun 22/03/27

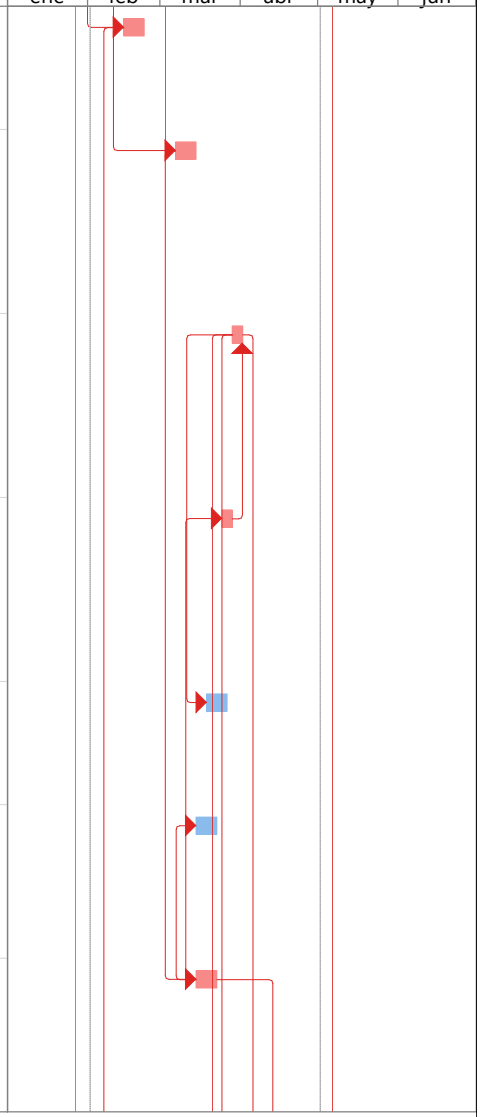


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
41		33	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo	4 días	mar 6/04/27	vie 9/04/27
42		34	7.1.12.2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	30 días	vie 2/04/27	sáb 1/05/27
43		35	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	8 días	lun 29/03/27	lun 5/04/27
44		36	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto	8 días	lun 15/02/27	lun 22/02/27
45				**CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL**	**4 días**	**mié 28/04/27**	**sáb 1/05/27**
46		37	12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en	4 días	mié 28/04/27	sáb 1/05/27
47		38	12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en	4 días	mié 28/04/27	sáb 1/05/27
48				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)**	**88 días**	**mar 2/02/27**	**vie 30/04/27**
49				Plan de Manejo Ambiental, Social y SST (Incluye IVA)	88 días	mar 2/02/27	vie 30/04/27
50				**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)**	**88 días**	**mar 2/02/27**	**vie 30/04/27**
51				Plan de Manejo de Transito (PMT) (Incluye IVA)	88 días	mar 2/02/27	vie 30/04/27
52				**CARACTERIZACION VIAL**	**3 días**	**jue 29/04/27**	**sáb 1/05/27**

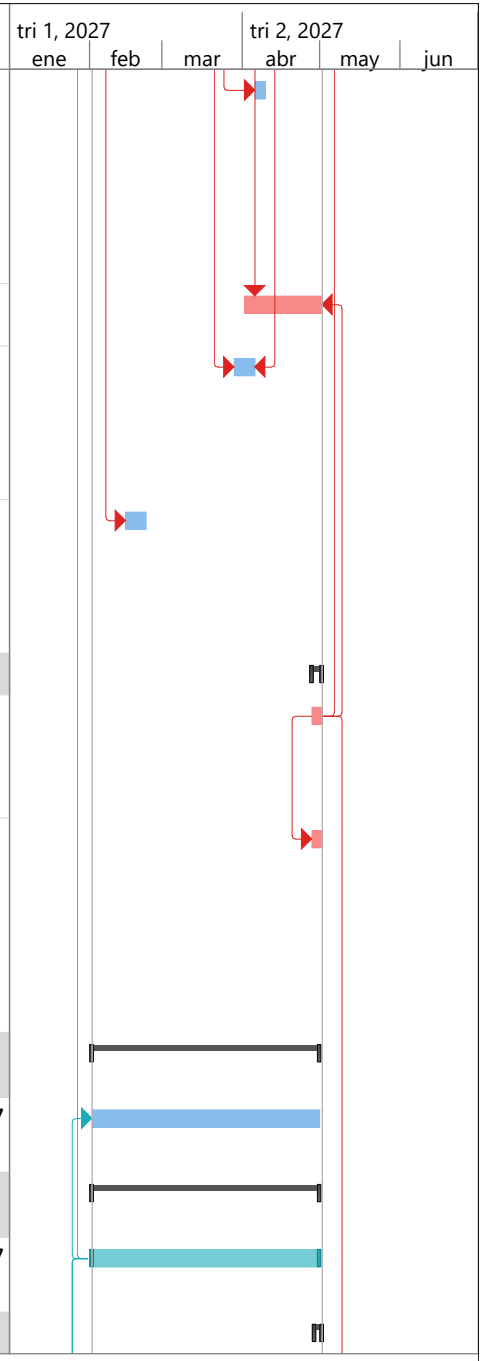


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53				Caracterización Vial	3 días	jue 29/04/27	sáb 1/05/27
54				**PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS**	**88 días**	**mar 2/02/27**	**vie 30/04/27**
55				Provisión para el Pago de Prima de Garantías	88 días	mar 2/02/27	vie 30/04/27
56				**PROVISIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS**	**88 días**	**mar 2/02/27**	**vie 30/04/27**
57				Provisión para Actualización de Precio	88 días	mar 2/02/27	vie 30/04/27

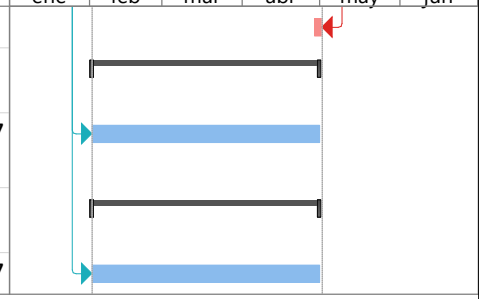


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1				**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - Subregión de**	**547 días**	**mar 10/02/26**	**mar 10/08/27**
2				**VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES**	**547 días**	**mar 10/02/26**	**mar 10/08/27**
3				**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**382 días**	**mié 25/02/26**	**sáb 13/03/27**
4		153	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la	210 días	lun 15/06/26	dom 10/01/27
5		154	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	210 días	lun 15/06/26	dom 10/01/27
6		155	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	210 días	lun 15/06/26	dom 10/01/27
7		156	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección,	210 días	lun 15/06/26	dom 10/01/27
8		157	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor	210 días	lun 15/06/26	dom 10/01/27
9		158	6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	250 días	dom 5/07/26	jue 11/03/27
10		159	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su	250 días	mar 7/07/26	sáb 13/03/27

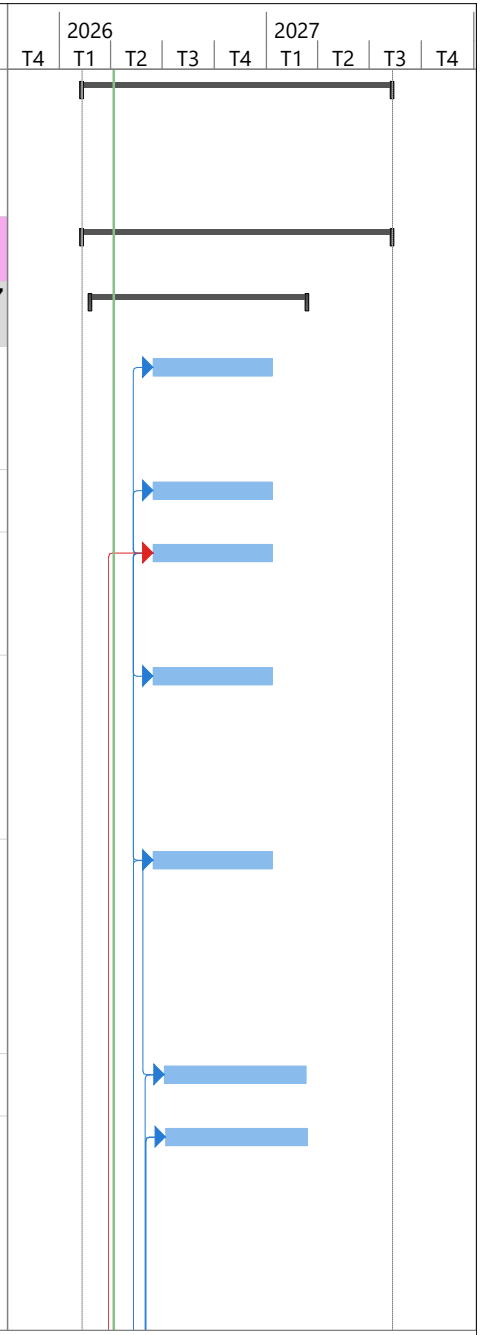


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
11		160	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	150 días	mié 25/02/26	vie 24/07/26
12		161	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión	210 días	lun 15/06/26	dom 10/01/27
13		162	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	250 días	lun 6/07/26	vie 12/03/27
14		163	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	210 días	lun 15/06/26	dom 10/01/27
15				**CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS**	**214 días**	**mié 6/01/27**	**sáb 7/08/27**
16		164	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	210 días	mié 6/01/27	mar 3/08/27
17		165	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor	210 días	vie 8/01/27	jue 5/08/27
18		166	6.2.50	Concreto Clase C (28 MPa). Cuneta	210 días	dom 10/01/27	sáb 7/08/27
19		167	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	210 días	dom 10/01/27	sáb 7/08/27
20		168	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	210 días	vie 8/01/27	jue 5/08/27
21				**CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**	**180 días**	**mié 15/07/26**	**dom 10/01/27**

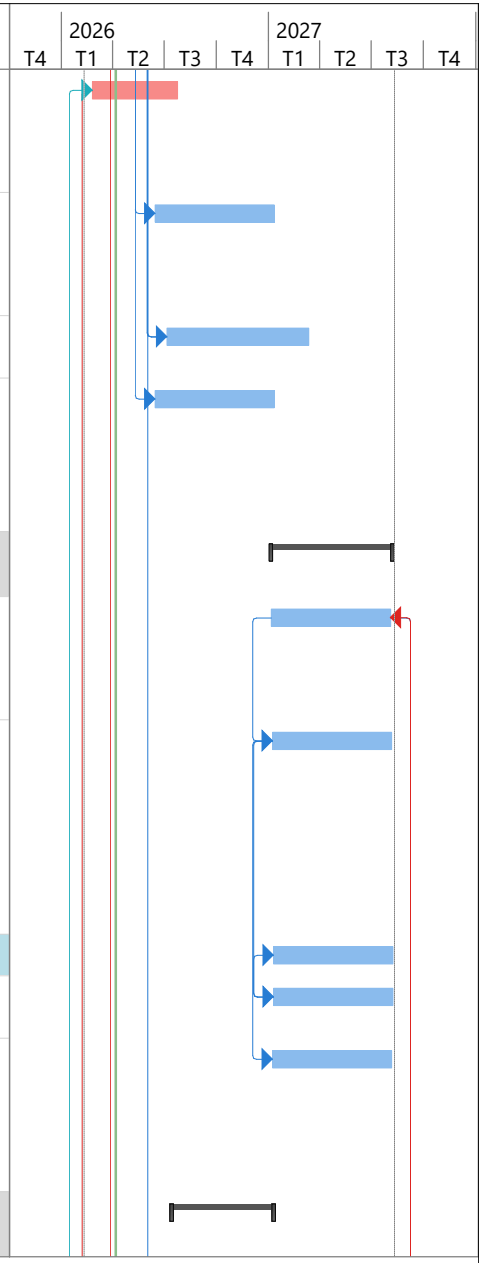


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
22		169	8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de	180 días	mié 15/07/26	dom 10/01/27
23		170	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.	180 días	mié 15/07/26	dom 10/01/27
24				**CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**	**182 días**	**vie 5/02/27**	**jue 5/08/27**
25		171	4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material	180 días	vie 5/02/27	mar 3/08/27
26		172	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	180 días	dom 7/02/27	jue 5/08/27
27		173	14.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano,	180 días	dom 7/02/27	jue 5/08/27
28				**CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**	**213 días**	**mar 7/07/26**	**jue 4/02/27**
29		174	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y	210 días	mar 7/07/26	lun 1/02/27
30		175	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	210 días	jue 9/07/26	mié 3/02/27
31		176	8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21	210 días	vie 10/07/26	jue 4/02/27
32		177	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	210 días	vie 10/07/26	jue 4/02/27
33				**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**	**482 días**	**jue 16/04/26**	**mar 10/08/27**
34		178	4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye	90 días	jue 16/04/26	mar 14/07/26

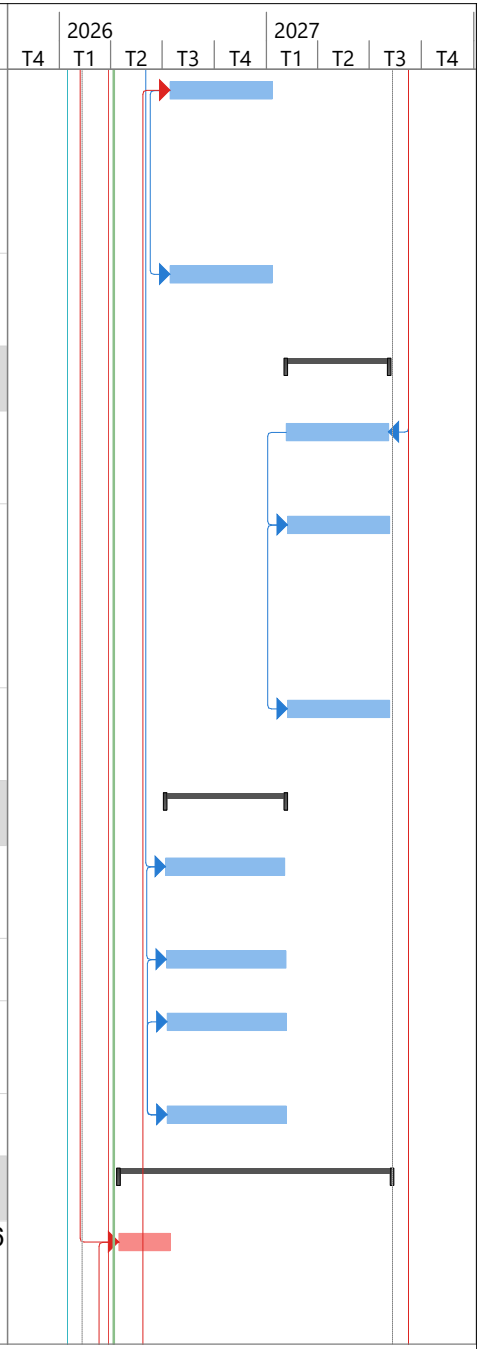


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
35		179	5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo	180 días	lun 15/06/26	vie 11/12/26
36		180	5.2.16	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de	70 días	mié 10/02/27	mar 20/04/27
37		181	5.2.13	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en	120 días	mar 13/10/26	mar 9/02/27
38		182	4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio	100 días	lun 11/01/27	mar 20/04/27
39		183	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	240 días	vie 14/08/26	sáb 10/04/27
40		184	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo	240 días	vie 14/08/26	sáb 10/04/27
41		185	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo	70 días	jue 18/02/27	mié 28/04/27
42		186	7.1.12.2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	112 días	mié 21/04/27	mar 10/08/27

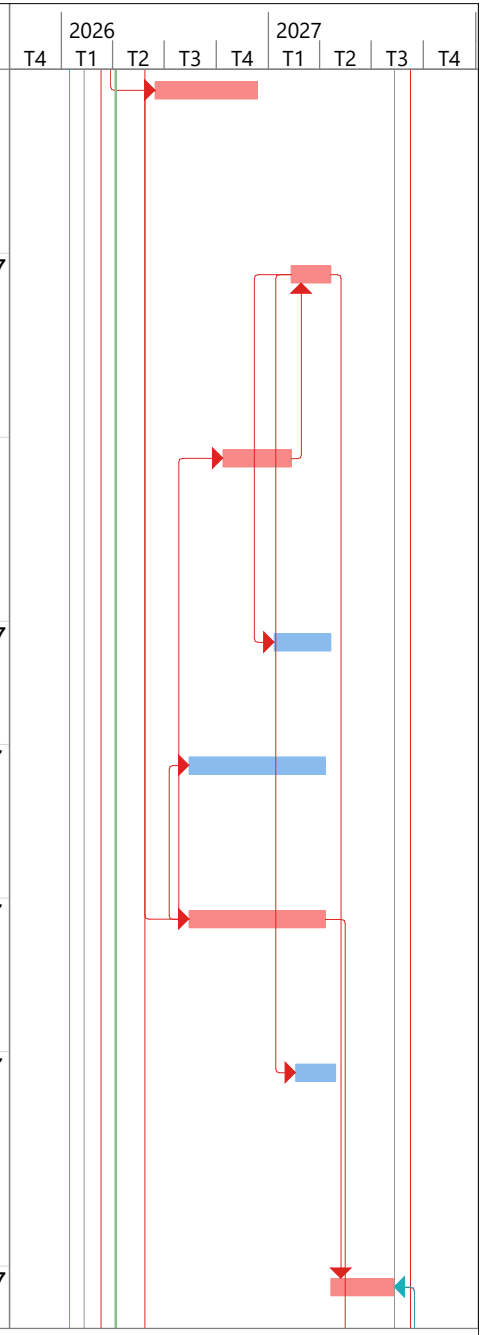


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
43		187	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	240 días	vie 14/08/26	sáb 10/04/27
44		188	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto	90 días	jue 16/04/26	mar 14/07/26
45				**CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL**	**14 días**	**mié 28/07/27**	**mar 10/08/27**
46		189	12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en	14 días	mié 28/07/27	mar 10/08/27
47		190	12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en	14 días	mié 28/07/27	mar 10/08/27
48				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)**	**546 días**	**mar 10/02/26**	**lun 9/08/27**
49				Plan de Manejo Ambiental, Social y SST (Incluye IVA)	546 días	mar 10/02/26	lun 9/08/27
50				**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)**	**546 días**	**mar 10/02/26**	**lun 9/08/27**
51				Plan de Manejo de Transito (PMT) (Incluye IVA)	546 días	mar 10/02/26	lun 9/08/27
52				**CARACTERIZACION VIAL**	**30 días**	**lun 12/07/27**	**mar 10/08/27**
53				Caracterización Vial	30 días	lun 12/07/27	mar 10/08/2
54				**PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS**	**546 días**	**mar 10/02/26**	**lun 9/08/27**
55				Provisión para el Pago de Prima de Garantías	546 días	mar 10/02/26	lun 9/08/27
56				**PROVISIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS**	**546 días**	**mar 10/02/26**	**lun 9/08/27**
57				Provisión para Actualización de Precio	546 días	mar 10/02/2	lun 9/08/27

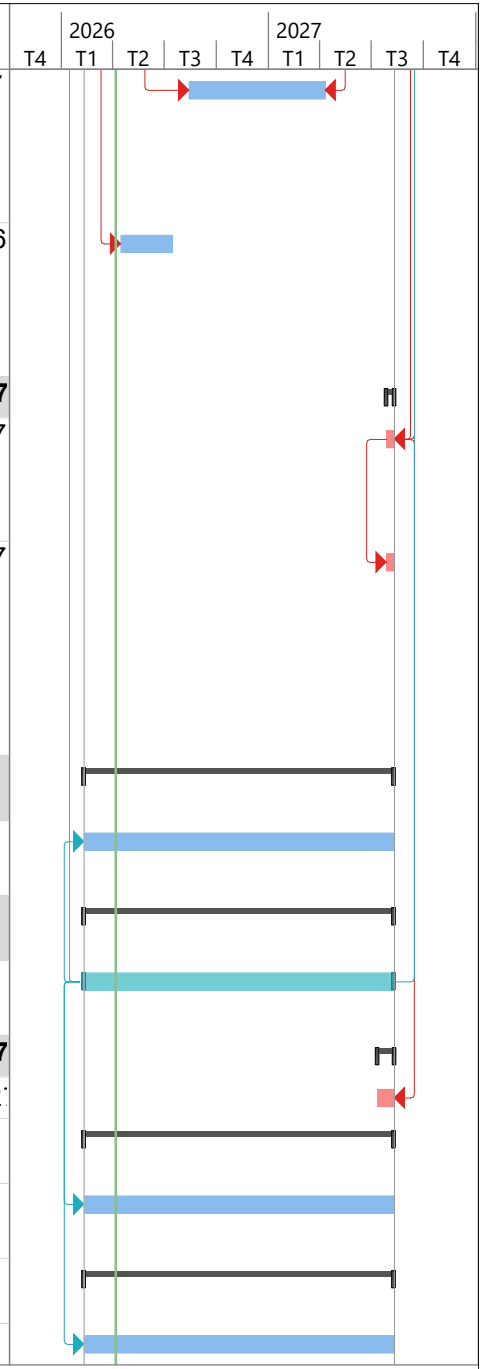


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1				**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - Subregión de**	**242 días**	**lun 9/11/26**	**jue 8/07/27**	
2				**VIA TITIRIIBI-ARMENIA 60AN08-1 TRAMO E20**	**242 días**	**lun 9/11/26**	**jue 8/07/27**	
3				**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**197 días**	**jue 19/11/26**	**jue 3/06/27**	
4		115	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de	90 días	lun 18/01/27	sáb 17/04/27	6CC
5		116	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	90 días	lun 18/01/27	sáb 17/04/27	6CC
6		117	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y	90 días	lun 18/01/27	sáb 17/04/27	34CC+30 días
7		118	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección,	90 días	lun 18/01/27	sáb 17/04/27	6CC
8		119	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	90 días	lun 18/01/27	sáb 17/04/27	6CC
9		120	6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	120 días	mar 2/02/27	mar 1/06/27	8CC+15 días
10		121	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás	120 días	jue 4/02/27	jue 3/06/27	13CC+1 día
11		122	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane	90 días	jue 19/11/26	mar 16/02/27	51CC+10 días

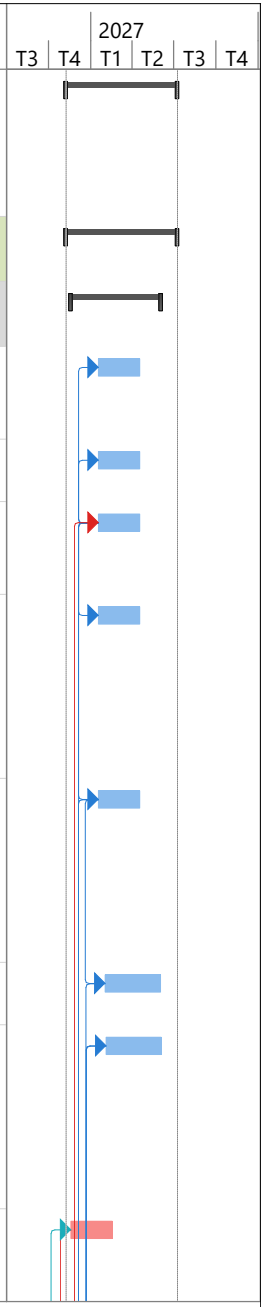


Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
12		123	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión	120 días	lun 18/01/27	lun 17/05/27	6CC
13		124	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	120 días	mié 3/02/27	mié 2/06/27	9CC+1 día
14		125	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	90 días	lun 18/01/27	sáb 17/04/27	8CC
15				**CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS**	**64 días**	**lun 3/05/27**	**lun 5/07/27**	
16		126	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y	60 días	lun 3/05/27	jue 1/07/27	46FF-7 días
17		127	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	60 días	mié 5/05/27	sáb 3/07/27	16CC+2 días
18		128	6.2.50	Concreto Clase C (28 MPa). Cuneta	60 días	vie 7/05/27	lun 5/07/27	19CC
19		129	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	60 días	vie 7/05/27	lun 5/07/27	17CC+2 días
20		130	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	60 días	mié 5/05/27	sáb 3/07/27	17CC
21				**CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**	**60 días**	**mié 17/02/27**	**sáb 17/04/27**	
22		131	8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de	60 días	mié 17/02/27	sáb 17/04/27	35CC+30 días
23		132	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.	60 días	mié 17/02/27	sáb 17/04/27	22CC

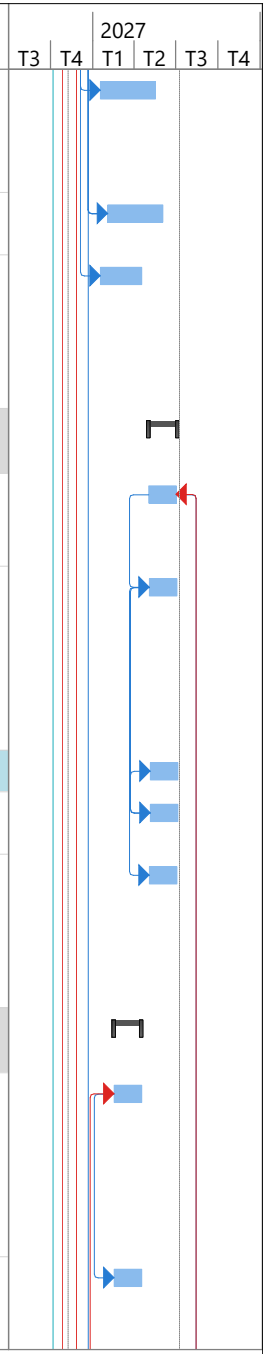

Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
24				**CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**	**62 días**	**lun 3/05/27**	**sáb 3/07/27**	
25		133	4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material	60 días	lun 3/05/27	jue 1/07/27	16FF
26		134	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	60 días	mié 5/05/27	sáb 3/07/27	25CC+2 días
27		135	14.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano,	60 días	mié 5/05/27	sáb 3/07/27	26CC
28				**CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**	**63 días**	**jue 4/02/27**	**mié 7/04/27**	
29		136	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y	60 días	jue 4/02/27	dom 4/04/27	10CC
30		137	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	60 días	sáb 6/02/27	mar 6/04/27	29CC+2 días
31		138	8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21	60 días	dom 7/02/27	mié 7/04/27	32CC
32		139	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa	60 días	dom 7/02/27	mié 7/04/27	30CC+1 día
33				**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**	**202 días**	**sáb 19/12/26**	**jue 8/07/27**	
34		140	4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye	40 días	sáb 19/12/26	mié 27/01/27	11CC+30 días
35		141	5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo	50 días	lun 18/01/27	lun 8/03/27	34CC+30 días

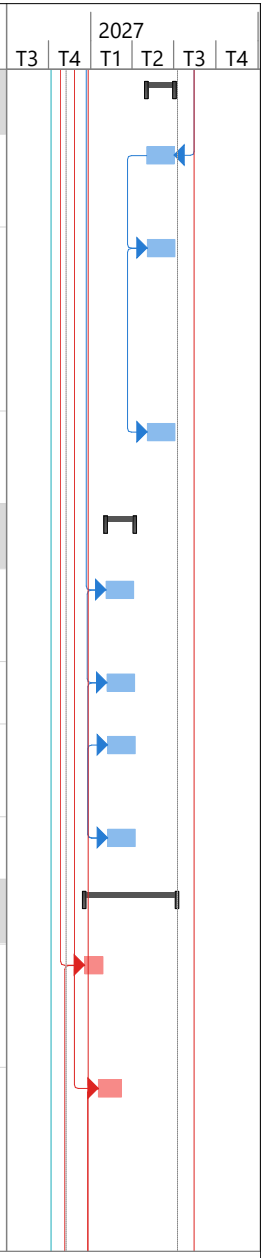

Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
36		142	5.2.16	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de	35 días	lun 3/05/27	dom 6/06/27	37
37		143	5.2.13	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en	65 días	sáb 27/02/27	dom 2/05/27	40CC+20 días
38		144	4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del	50 días	dom 18/04/27	dom 6/06/27	36CC-15 días
39		145	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación	70 días	dom 7/02/27	sáb 17/04/27	40CC
40		146	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo	70 días	dom 7/02/27	sáb 17/04/27	35CC+20 días
41		147	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del	35 días	mar 11/05/27	lun 14/06/27	36CC+8 días
42		148	7.1.12.2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	32 días	lun 7/06/27	jue 8/07/27	36;51FF-3 días
43		149	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30%	70 días	dom 7/02/27	sáb 17/04/27	35CC;40FF
44		150	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto	40 días	sáb 19/12/26	mié 27/01/27	34CC

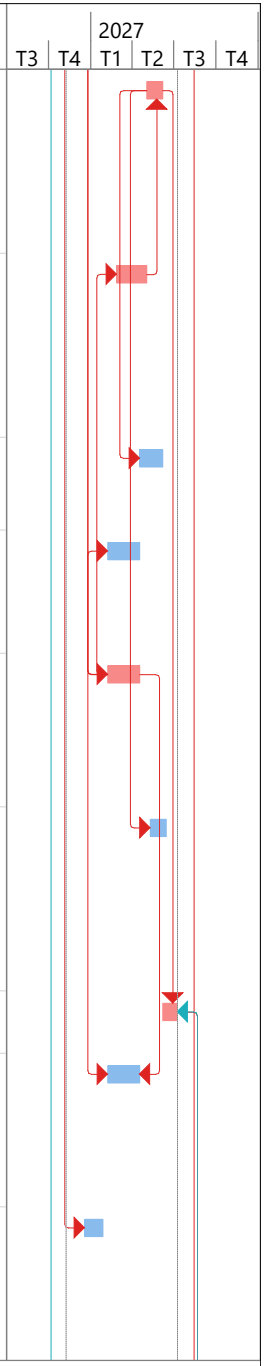

Id	Modo de tarea	N°	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
45				**CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL**	**10 días**	**mar 29/06/27**	**jue 8/07/27**	
46		151	12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en	10 días	mar 29/06/27	jue 8/07/27	42FF
47		152	12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en	10 días	mar 29/06/27	jue 8/07/27	46CC
48				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)**	**241 días**	**lun 9/11/26**	**mié 7/07/27**	
49				Plan de Manejo Ambiental, Social y SST (Incluye IVA)	241 días	lun 9/11/26	mié 7/07/27	51CC
50				**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)**	**241 días**	**lun 9/11/26**	**mié 7/07/27**	
51				Plan de Manejo de Transito (PMT) (Incluye IVA)	241 días	lun 9/11/26	mié 7/07/27	
52				**CARACTERIZACION VIAL**	**15 días**	**jue 24/06/27**	**jue 8/07/27**	
53				Caracterización Vial	15 días	jue 24/06/27	jue 8/07/27	46FF
54				**PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS**	**241 días**	**lun 9/11/26**	**mié 7/07/27**	
55				Provisión para el Pago de Prima de Garantías	241 días	lun 9/11/26	mié 7/07/27	51CC
56				**PROVISIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS**	**241 días**	**lun 9/11/26**	**mié 7/07/27**	
57				Provisión para Actualización de Precio	241 días	lun 9/11/26	mié 7/07/27	51CC

