AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	416
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HOSPITAL 002** AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META **CONTRATO N° 511 23 PY 331-2021 PARCIAL N°13 C1-6 C416**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
1.	oficio radicado de la parcial n°13 de obra	75178-75179
2.	Lista de chequeo	75180-75181
3.	Acta pago de obra	75182-75230
4.	Memoria de calculo obra	75231-75375

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	511 23 PY 331-2021 PARCIAL N°13 C1-6 C416

Firma		Firma	
Nombre:	**JUAN CARLOS RODRIGUEZ**	Nombre:	**CESAR ASHLEY MORA BARNEY**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Consorcio Inter Hospital

25/28

Villavicencio, 21 abril de 2026 OF-CO-511-2024-790

Señores:
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
Ing. GINA ELAICA NIETO
Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de proyectos AIM
Email: contactenos@aim-meta.gov.co
CC[1] interventoria@aim-meta.gov.co , direccionoperativa@idm-meta.gov.co
CCO[2] davidfs765@gmail.com
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No 0511 DE 2023.
"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE – META"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0572 DE 2023.
"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META"

ASUNTO: RADICADO DE LA PARCIAL N°13 DE OBRA

Cordial saludo:

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta interventoría, por medio de la presente me permito radicar la Parcial N.º 13 de obra, correspondiente al periodo comprendido entre el 06 de diciembre de 2025 al 15 marzo de 2026

Se anexa la documentación requerida conforme a la Lista de Chequeo para Pago Parcial – Formato 112-ECP-FR-173-V05, con fecha del 09 de septiembre de 2024, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el contrato de obra.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
Radicado N° 1470-26
Fecha: 21 - Abril - 2026
Hora: 11:13am Folios: 7 carpetas
Recibido por: Maria Beltran

SANDRA PATRICIA ECHEVERRI ALVAREZ
Consorcio Inter Hospital
Proyecto: Ing. Jhon Sabogal R
Anexamos: carpetas (1 de 7) del cobro de acta parcial N°13

25179

Villavicencio, abril 16 de 2026.
CE-205-125-745

RECIBIDO POR: Samuel
FECHA: 16/4/26
HORA: 15:18
CONSECUTIVO No. 745

Señores:
CONSORCIO INTER HOSPITAL
Atn. Ing. Edwin Fabián Henao Camargo
Representante legal
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 511 DE 2023 *"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E."*

ASUNTO: ACTA PARCIAL No. 13

Respetados señores:

Adjunto a la presente hacemos entrega del Acta Parcial No. 13 con lista de chequeo y anexos correspondientes, para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente.

JUAN C. RODRIGUEZ S
Director de Obra
coordinador.hospital@cyg.com.co

Anexos folios: (1 AZ)

Elaboró: JJO
Revisó: JCR
Aprobó: DAE

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

7518

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	N/A
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	SI
FACTURA	-	SI pte
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	SI
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

751 81

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Firma
Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 572 DE 2023
M.P. 25202 - 193880 CND

Firma
Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK
RESPONSABLE DEL ARCHIVO
M.P.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75182

ACTA PAGO DE OBRA
112-ECP-FR-029

Carrera 38 N. 25-05 Barrio 7 de agosto – Villavicencio
Email: coordinador.hospital@cyg.com.co
Tel. 321-3370874

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvl.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	COMPONENTE ARQUITECTONICO													
1,1	PRELIMINARES DEMOLICIONES													
1.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	19.147,50	$ 6.101,00	$ 116.818.898,00	19.147,50	$ 116.818.898,00	15.994,14	$ 97.580.248,00	1.303,52	$ 7.952.776,00	17.297,66	$ 105.533.024,00	90,34
	SUBTOTAL				$ 116.818.898,00		$ 116.818.898,00		$ 97.580.248,00		$ 7.952.776,00		$ 105.533.024,00	
1,2	DESMONTE Y DEMOLICIONES													
1.2.1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	269,57	$ 421.528,00	$ 113.629.280,00	552,04	$ 232.700.317,00	502,00	$ 211.607.056,00	0,00	$ -	502,00	$ 211.607.056,00	90,94
1.2.2	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	217,35	$ 12.324,00	$ 2.678.621,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
1.2.3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	305,65	$ 487.768,00	$ 149.087.255,00	162,91	$ 79.462.285,00	157,50	$ 76.823.460,00	4,19	$ 2.043.748,00	161,69	$ 78.867.208,00	99,25
1.2.4	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	3.151,74	$ 16.618,00	$ 52.375.605,00	2.440,78	$ 40.560.882,00	2.287,09	$ 38.006.862,00	0,00	$ -	2.287,09	$ 38.006.862,00	93,70
1.2.5	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	490,72	$ 433.572,00	$ 212.762.018,00	272,92	$ 118.330.470,00	260,00	$ 112.728.720,00	0,00	$ -	260,00	$ 112.728.720,00	95,27
1.2.6	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	125,94	$ 334.814,00	$ 42.167.279,00	271,76	$ 90.989.053,00	151,93	$ 50.868.291,00	53,80	$ 18.012.993,00	205,73	$ 68.881.284,00	75,70
1.2.7	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	2.295,62	$ 23.150,00	$ 53.143.603,00	2.320,35	$ 53.716.103,00	2.320,35	$ 53.716.103,00	0,00	$ -	2.320,35	$ 53.716.103,00	100,00
1.2.8	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	2.295,62	$ 26.654,00	$ 61.187.455,00	2.320,35	$ 61.846.609,00	2.320,35	$ 61.846.609,00	0,00	$ -	2.320,35	$ 61.846.609,00	100,00
1.2.9	DEMOLICIÓN MECANICA PLACA ALIGERADA CONCRETO REFORZADO E= 0.25 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGMANUAL	M2	450,66	$ 120.870,00	$ 54.471.274,00	804,02	$ 97.181.897,00	799,39	$ 96.622.269,00	0,00	$ -	799,39	$ 96.622.269,00	99,42
1.2.10	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	68,00	$ 112.748,00	$ 7.666.864,00	47,00	$ 5.299.156,00	45,00	$ 5.073.660,00	0,00	$ -	45,00	$ 5.073.660,00	95,74
1.2.11	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	128,00	$ 20.976,00	$ 2.684.928,00	236,26	$ 4.955.790,00	236,26	$ 4.955.790,00	0,00	$ -	236,26	$ 4.955.790,00	100,00
1.2.12	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	15,00	$ 52.441,00	$ 786.615,00	18,00	$ 943.938,00	12,00	$ 629.292,00	6,00	$ 314.646,00	18,00	$ 943.938,00	100,00
1.2.13	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	170,27	$ 259.921,00	$ 44.256.325,00	317,32	$ 82.478.132,00	214,99	$ 55.880.416,00	72,00	$ 18.714.312,00	286,99	$ 74.594.728,00	90,44
1.2.14	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS SITIO AUTORIZADO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE KM 18 VIA CAÑOS NEGROS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS)	TON	3.225,56	$ 66.090,00	$ 213.177.509,00	4.100,00	$ 270.969.000,00	2.965,19	$ 195.969.407,00	798,00	$ 52.739.820,00	3.763,19	$ 248.709.227,00	91,79
1.2.15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	104,83	$ 23.959,00	$ 2.511.670,00	191,44	$ 4.586.711,00	70,16	$ 1.680.963,00	0,00	$ -	70,16	$ 1.680.963,00	36,65
1.2.16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	25,00	$ 20.976,00	$ 524.400,00	42,00	$ 880.992,00	32,00	$ 671.232,00	10,00	$ 209.760,00	42,00	$ 880.992,00	100,00
1.2.17	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	16,00	$ 41.953,00	$ 671.248,00	19,00	$ 797.107,00	16,00	$ 671.248,00	3,00	$ 125.859,00	19,00	$ 797.107,00	100,00
1.2.18	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1.986,37	$ 8.038,00	$ 15.966.466,00	1.934,91	$ 15.552.807,00	1.934,90	$ 15.552.726,00	0,00	$ -	1.934,90	$ 15.552.726,00	100,00
	SUBTOTAL				$ 1.029.748.425,00		$ 1.161.251.249,00		$ 983.304.104,00		$ 92.161.138,00		$ 1.075.465.242,00	
1,3	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
1.3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	34.529,81	$ 41.950,00	$ 1.448.525.530,00	33.150,28	$ 1.390.654.246,00	29.879,87	$ 1.253.460.547,00	0,00	$ -	29.879,87	$ 1.253.460.547,00	90,13
1.3.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	156,89	$ 104.882,00	$ 16.454.675,00	3.899,44	$ 408.981.066,00	3.642,76	$ 382.059.955,00	0,00	$ -	3.642,76	$ 382.059.955,00	93,42
1.3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	10.905,41	$ 73.847,00	$ 805.331.443,00	1.233,70	$ 91.105.044,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS													
N.P.P.P.1.3.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	-	$ 259.921,00	$ -	6.289,00	$ 1.634.643.169,00	6.185,09	$ 1.607.634.778,00	103,20	$ 26.823.847,00	6.288,29	$ 1.634.458.625,00	99,99
N.P.1.3.5	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION SITIO AUTORIZADO (NO INCLUYE TRANSPORTE)	TON		$ 27.720,00	$ -	69.977,37	$ 1.939.772.696,00	68.551,37	$ 1.900.243.976,00	1.143,80	$ 31.706.136,00	69.695,17	$ 1.931.950.112,00	99,60
N.P.1.3.6	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN CONGLOMERADO H > 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	-	$ 423.048,84	$ -	527,75	$ 223.264.025,00	394,50	$ 166.892.767,00	0,00	$ -	394,50	$ 166.892.767,00	-
N.P.1.3.7	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3	-	$ 37.447,27	$ -	$ 1.008,66	$ 37.771.583,00	94,70	$ 3.546.256,00	347,39	$ 13.008.807,00	442,09	$ 16.555.063,00	43,83
	SUBTOTAL				$ 2.270.311.648,00		$ 5.726.191.809,00		$ 5.313.838.279,00		$ 71.538.790,00		$ 5.385.377.069,00	
1,4	FACHADA													
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO SISTEMA SOL LITE, CON PROTECCION A RAYOS UV Y CONTROL SOLAR (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	1.080,04	$ 1.935.984,00	$ 2.090.930.673,00	1.038,87	$ 2.011.235.698,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.4.2	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	972,33	$ 1.220.670,00	$ 1.186.892.230,00	852,21	$ 1.040.267.181,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.4.3	TABLERO EN CONCRETO 27.5 MPA (4000 PSI) AUTONIVELANTE, AUTO COMPACTANTE Y DE COLOR SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	509,20	$ 2.507.067,00	$ 1.276.586.482,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75183

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyt.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UNO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS VENTANAS SISTEMA SOL LITE CON PROTECCION A RAYOS UV Y CONTROL SOLAR CRISTAL 4+4 MM CON MANIJA DE ACERO + CERRADURA CONTRA FACHADAS SALAS DE ESPERA DEL PISO 2 AL 8	M2	-	$ 2.983.665,86	$ -	303,59	$ 905.811.058,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO GRAN FORMATO COLOR ARENA PARA FACHADAS	M2	-	$ 388.208,87	$ -	4.216,96	$ 1.637.061.276,00	109,67	$ 42.574.867,00	481,12	$ 186.775.052,00	590,79	$ 229.349.919,00	14,01
N.P. 1.4.6	HILADA DE LADRILLO GRAN FORMATO (39x5x11cm)PARADO PARA VANOS	ML	-	$ 160.693,14	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.4.7	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA	M3	-	$ 2.311.048,95	$ -	31,53	$ 72.867.373,00	0,00	$ -	2,95	$ 6.817.594,00	2,95	$ 6.817.594,00	9,36
N.P. 1.4.8	DINTELES EN CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI H = 0.60 M	M3		$ 2.311.048,95	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.4.9	MORTERO TIPO GROUTING PARA DOVELAS EN MURO LADRILLO GRAN FORMATO	LT	-	$ 40.394,50	$ -	5.684,49	$ 229.622.131,00	4.780,00	$ 193.085.710,00	904,49	$ 36.536.421,00	5.684,49	$ 229.622.131,00	100,00
N.P. 1.4.10	ANCLAJES 5/8" PARA VARILLA DE 1/2" X 10 CM INCLUYE EPOXICO	UN	-	$ 99.147,15	$ -	3.254,00	$ 322.624.826,00	783,00	$ 77.632.218,00	0,00	$ -	783,00	$ 77.632.218,00	24,06
N.P. 1.4.11	ANCLAJES 1/2" PARA VARILLA DE 3/8" X 10 CM CON EPOXICO	UN	-	$ 87.379,32	$ -	3.696,00	$ 322.953.967,00	784,00	$ 68.505.387,00	0,00	$ -	784,00	$ 68.505.387,00	21,21
N.P. 1.4.12	LAVADO DE LADRILLO A LA VISTA	M2	-	$ 39.309,95	$ -	4.809,58	$ 189.064.349,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.4.13	IMPERMEABILIZACION LADRILLO A LA VISTA	M2	-	$ 38.433,00	$ -	4.437,21	$ 170.535.292,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.4.14	HILADA EN LADRILLO GRAN FORMATO CORTADO PARA AJUSTE A ESPESOR DE MURO EN VANOS, INCLUYE CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN Y EQUIPO	ML	-	$ 139.149,69	$ -	578,88	$ 80.550.973,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.4.15	RELLENO FLUIDO CEMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA PARA REFUERZO VERTICAL EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL	LT	-	$ 20.197,25	$ -	15.445,35	$ 311.953.595,00	0,00	$ -	1.280,00	$ 25.852.480,00	1.280,00	$ 25.852.480,00	8,29
	SUBTOTAL				$ 4.554.409.385,00		$ 7.294.547.719,00		$ 381.798.182,00		$ 255.981.547,00		$ 637.779.729,00	
1,5	MAMPOSTERÍA													
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0 30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	8.402,50	$ 63.241,00	$ 531.382.503,00	6.421,72	$ 406.115.995,00	2.462,47	$ 155.729.065,00	1.191,36	$ 75.342.798,00	3.653,83	$ 231.071.863,00	56,90
1,5,2	VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	82,71	$ 1.554.843,00	$ 128.584.523,00	99,17	$ 107.534.856,00	24,67	$ 38.353.043,00	12,08	$ 18.780.087,00	36,75	$ 57.133.130,00	53,13
1,5,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	124,32	$ 1.593.776,00	$ 198.138.232,00	141,67	$ 225.790.246,00	37,59	$ 59.910.040,00	14,99	$ 23.890.702,00	52,58	$ 83.800.742,00	37,11
1,5,4	MESON EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	13,43	$ 2.255.398,00	$ 30.285.823,00	8,55	$ 19.283.653,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,5	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	134,28	$ 285.042,00	$ 38.275.867,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION	M2	14.301,92	$ 30.282,00	$ 433.090.799,00	13.648,77	$ 413.312.053,00	801,61	$ 24.274.354,00	5.495,41	$ 166.412.006,00	6.297,02	$ 190.686.360,00	46,14
1,5,7	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION	M2	2.667,08	$ 41.479,00	$ 110.627.712,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,8	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	15.401,47	$ 10.248,00	$ 157.834.265,00	37.074,47	$ 379.939.202,00	8.290,25	$ 84.958.482,00	3.467,71	$ 35.537.092,00	11.757,96	$ 120.495.574,00	31,71
1,5,9	INSTALACION ASCENSOR CAMILLERO CON UNA CAPACIDAD DE 1200 KG MANIOBRA DUPLEX	UN	2,00	$ 69.564.722,00	$ 139.129.444,00	6,00	$ 417.388.332,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,10	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	10,00	$ 1.017.680,00	$ 10.176.800,00	11,00	$ 11.194.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,11	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	89,00	$ 459.734,00	$ 40.916.326,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,12	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA	UN	9,00	$ 636.368,00	$ 5.727.312,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	120,00	$ 569.912,00	$ 68.389.440,00	135,00	$ 76.938.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,14	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	11,00	$ 1.023.295,00	$ 11.256.245,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS	UN	10,00	$ 358.900,00	$ 3.589.000,00	11,00	$ 3.947.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,16	INSTALACION ASCENSOR CON UNA CAPACIDAD DE 1200 KG MANIOBRA CUADRUPLEX	UN	4,00	$ 81.951.703,00	$ 327.806.812,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,17	COLUMNA FALSA EN SUPERBOARD PARA PERIMETRO DE COLUMNAS METÁLICAS, CAL 8MM INCLUYE PINTURA SECCIÓN DE 0.80 X 0.40	ML	1.969,30	$ 564.118,00	$ 1.110.917.577,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP 1.5.18	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 320.892,36	$ -	20,00	$ 6.417.847,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 1.5.19	SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN QUARZTONE BLANCO	M2		$ 982.500,00	$ -	141,19	$ 138.719.175,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 3.346.128.700,00		$ 2.206.581.659,00		$ 363.224.984,00		$ 319.962.685,00		$ 683.187.669,00	
1,6	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA													
1,6,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	29,00	$ 571.367,00	$ 16.569.643,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75184

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conisterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conisterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N°ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS - Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE 2.0X2.15 ENTAMBORADA EN MADERA, VISOR, GUARDACAMILLA Y GUARDA PIES EN ACERO TIPO 304, CHAPA DE SEGURIDAD, PASADORES, BISAGRA PIVOTE DE REBOTE Y PINTURA.	UN	26,00	$ 5.397.295,00	$ 140.329.670,00	-	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO SIS PROYECTANTE. PISAVIDRIOS PRES	M2	326,67	$ 382.801,00	$ 125.051.134,00	127,37	$ 48.757.363,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MADERA ENTAMBORADA TIPO PRESTIGE 0.90X2 m INCLUYE MARCO Y CHAPA	UN	251,00	$ 649.497,00	$ 163.023.747,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE	M2	48,09	$ 1.467.270,00	$ 70.563.949,00	65,05	$ 95.445.914,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	106,00	$ 463.663,00	$ 49.148.278,00	274,12	$ 127.099.302,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	106,00	$ 178.034,00	$ 18.871.604,00	138,00	$ 24.568.692,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.8	HOJA TRIPLEX 1.00X2.10 GUARDACAMILLA Y GUARDAPIES, PLOMADA INCLUYE CHAPA DE BOLA (PINTURA)	UN	2,00	$ 3.696.322,00	$ 7.392.644,00	2,00	$ 7.392.644,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.9	DOS HOJAS TRIPLEX 1.20X2.10 CADA UNA, GUARDACAMILLA Y GUARDAPIES, PLOMADA INCLUYE CHAPA DE BOLA (PINTURA)	UN	5,00	$ 7.331.435,00	$ 36.657.175,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.10	MARCO Y CONTRAMARCO ELABORA EN LAMINA COLD ROLLD CALIBRE 16 BLINDADO POR LA PARTE INTERNA EN PLOMO DE 2MM, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE 1.25X0.90M Y VIDRIO PLOMADO ESPESOR DE 15 MM	UN	2,00	$ 24.223.814,00	$ 48.447.628,00	-	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.11	MARCO Y CONTRAMARCO ELABORA EN LAMINA COLD ROLLD CALIBRE 16 BLINDADO POR LA PARTE INTERNA EN PLOMO DE 2MM, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE 0.85X2.50M Y VIDRIO PLOMADO ESPESOR DE 12 MM	UN	3,00	$ 5.724.404,00	$ 17.173.212,00	-	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA HOJA DE (0.8-1) X2.15 ENTAMBORADA EN MADERA, VISOR, GUARDACAMILLA Y GUARDA PIES EN ACERO TIPO 304, CHAPA DE SEGURIDAD, PASADORES, BISAGRA PIVOTE DE REBOTE Y PINTURA	UN	3,00	$ 2.768.989,00	$ 8.306.967,00	3,00	$ 8.306.967,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.13	GUARDA CAMILLA EN PVC CON ALMA CONTRAIMPACTO	ML	257,48	$ 101.790,00	$ 26.208.889,00	238,46	$ 24.272.731,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO MADERA CEDRO E=0.10M	ML	5,00	$ 192.089,00	$ 960.445,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 1.6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METALICO TUBULAR DE 2" DE DIAMETRO, MONTADO SOBRE SOPORTES METALICOS FIJADOS A LA PARED MEDIANTE ANCLAJES DE EXPANSIÓN DE ACERO INOXIDABLE.	ML	-	$ 490.401,57	$ -	94,05	$ 46.122.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA COMPUESTA POR PLATINAS VERTICALES 3/16" X 8 cm/4cm, PASAMANOS DIVISORIOS EN 1/2, BUJE Y PERNO DE ACRO + PASAMANOS PRINCIPAL EN 1 3/4 TODO EN ACERO INOXIDABLE	ML	-	$ 841.993,84	$ -	751,90	$ 633.095.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.6.17	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE 18 INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.	M2	-	$ 528.523,27	$ -	153,79	$ 81.281.594,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.6.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN MDF, ESTRUCTURA EN PINO ENCHAPADA EN FORMICA BLANCA. INCLUYE CANTO FLEXIBLE Y MARCO	M2	-	$ 569.028,42	$ -	311,48	$ 177.240.972,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.6.19	PUERTA CORTAFUEGO 1 HOJA, RESISTENCIA AL FUEGO 120 MIN DE ALTA DENSIDAD, CALIBRE 18 Y CALIBRE 16, LAMINA GALVANIZADA + ACABADO BLANCO DE 1,00X2,30 (MEDIDA EXTERNA) MARCO ESTANDAR. INCLUYE BARRA ANTIPANICO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. NO INCLUYE CILINDRO (PUERTAS SIN LLAVE) BRAZO CIERRAPUERTAS. INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS EN MUROS DE MAMPOSTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FABRICACION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UN	-	$ 6.756.227,48	$ -	22,00	$ 148.637.005,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.6.20	DIVISIONES PARA BAÑO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CALIBRE 20, ETAMBORADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO (BISAGRAS, SEGUROS, PINES, ANGULOS Y PLATINAS)	M2	-	$ 1.613.117,45	$ -	82,92	$ 133.759.699,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA DE DOBLE HOJA CON VISOR, GUARDACAMILLA Y GUARDA PIES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, PASADORES SUPERIOR E INFERIOR, BISAGRAS TIPO PIVOTE DE REBOTE, ACABADO CON PINTURA, ÁREA TOTAL INSTALADA EN MADERA SEGÚN DIMENSIONES DEL PROYECTO	M2	-	$ 1.254.844,57	$ -	179,14	$ 224.792.856,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 728.704.985,00		$ 1.780.773.175,00		$ -		$ -		$ -	
1,7	PISOS Y ENCHAPES													
1.7.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=50MM	M2	8.425,45	$ 40.189,00	$ 338.610.410,00	10.184,27	$ 409.295.627,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.7.2	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	7.989,24	$ 162.985,00	$ 1.302.126.281,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.7.3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	5.026,88	$ 60.276,00	$ 303.000.219,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75185

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1.7.4	APLICACION DE SISTEMA DE PISOS DE ALTA TECNOLOGÍA, EN URETANO CEMENTICIO DE ALTO DESEMPEÑO, CON ADITIVO ANTIMICROBIANO, CON ALTA RESISTENCIA A LOS QUÍMICOS, CHOQUES TÉRMICOS Y A LAS TRANSMISIÓN DE HUMEDAD	M2	436,21	$ 798.858,00	$ 348.469.848,00	-	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.7.5	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30X0.60 BRILLANTE	M2	2.093,83	$ 157.152,00	$ 329.049.258,00	1.388,29	$ 218.172.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.7.6	PISO CONDUCTIVO EPOXI QUARZ ANTIESTATICO INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	59,78	$ 904.932,00	$ 54.096.835,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS													
N.P. 1.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA DE MARMOL ROYAL VETA / GRES / PORCELANICO PARA EXTERIOR ANTIDESLIZANTE EN AREA EXTERIOR DEL PRIMER PISO Y ESCALERAS DE ACCESO	M2	-	$ 346.335,14	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA PULIDA DE 10 CM DE ALTURA, EN ÁREAS INTERIORES O EXTERIORES, CON PEGANTE ESPECIALIZADO Y BOQUILLAS IMPERMEABLES. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INSTALACIÓN Y LIMPIEZA FINAL.	ML	-	$ 56.770,76	$ -	415,16	$ 23.568.949,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.7.9	PISO EXTERIOR EN CONCRETO ESCOBILLADO Y RATONEADO	M3	-	$ 1.164.305,21	$ -	82,29	$ 95.810.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.7.10	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	-	$ 183.520,18	$ -	272,07	$ 49.930.335,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.7.11	LOSA TIPO SOBREPLACA O PISO FALSO COMPUESTA POR ESTERILLA NO RECUPERABLE, VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO Y PLACA SUPERIOR f'c = 21 Mpa CON ESPESOR DE 5CM.	M2	-	$ 271.715,41	$ -	2.100,12	$ 570.634.967,00	1.604,38	$ 435.934.769,00	241,00	$ 65.483.414,00	1.845,38	$ 501.418.183,00	87,87
N.P. 1.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO HOMOGENEO EN ROLLO	M2	-	$ 162.985,00	$ -	5.274,72	$ 859.700.239,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PISO VINILICO TIPO MEDIACAÑA	ML	-	$ 51.751,93	$ -	2.026,71	$ 104.886.154,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.7.14	PISO EN PORCELANATO PARA EXTERIOR ANTIDESLIZANTE	M2	-	$ 173.473,00	$ -	1.177,95	$ 204.342.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.7.15	PORCELANATO PARA PISO 0.30X0.60 MATE	M2		$ 147.152,00	$ -	1.322,07	$ 194.545.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 2.675.352.851,00		$ 2.730.887.262,00		$ 435.934.769,00		$ 65.483.414,00		$ 501.418.183,00	
1,8	ACABADOS													
1.8.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	12.689,12	$ 14.194,00	$ 180.109.426,00	11.119,61	$ 157.831.744,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.8.2	ESTUCO PLASTICO	M2	15.111,68	$ 20.740,00	$ 313.416.160,00	11.119,61	$ 230.620.711,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.8.3	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INC PINTURA	M2	6.712,02	$ 116.912,00	$ 784.715.682,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN POLIURETANO, INCLUYE IMPRIMANTE, BASE, SELLANTE Y ENDURECEDOR DE CUARZO	M2	1.843,38	$ 380.867,00	$ 702.082.610,00	291,92	$ 111.182.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO EN PVC	M2	666,06	$ 308.262,00	$ 205.320.988,00	1.228,12	$ 378.582.727,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.8.6	PINTURA ANTIBACTERIAL TIPO VIRAL ZERO, PARA ZONAS DE ASEPSIA	M2	1.198,51	$ 26.676,00	$ 31.971.319,00	668,04	$ 17.820.635,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1.8.7	CONSTRUCCION DE CUBIERTA VERDE, SISTEMA URBANSCAPE O SIMILAR, SISTEMA MULTICAPA CON MEMBRANA ANTI RAICES.SISTEMA DE DRENAJE, SUSTRATO DE CULTIVO Y CAPA VEGETAL NO INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE PLACA	M2	650,00	$ 364.146,00	$ 236.694.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS													
N.P. 1.8.8	CIELO RASO EN PLACA DRYWALL TIPO RF INCLUYE PINTURA INTUMESCENTE	M2	-	$ 359.381,74	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.8.9	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON PLACA RF-120, ACABADO EN PINTURA VINILICA (3 MANOS)	M2	-	$ 243.801,91	$ -	6.146,12	$ 1.498.435.795,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION EN CIELO RASO	ML	-	$ 23.248,00	$ -	1.314,92	$ 30.569.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL METALICO PARA VANO DE VENTANAS	ML		$ 410.436,12	$ -	451,90	$ 185.476.083,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA PVC FLEXIBLE 1.5 mm CERTIFICADA PARA AGUA POTABLE, PARA IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE TANQUE SUBTERRÁNEO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M2		$ 275.899,94	$ -	290,49	$ 80.146.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.8.13	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM. INCLUYE PINTURA (FOSO ASCENSORES)	M2		$ 204.075,32	$ -	789,59	$ 161.135.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 1.8.14	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA VERDE EXTENSIVA LIVIANA, SISTEMA MULTICAPA SIMPLIFICADO CON MEMBRANA ANTI RAIZ, CAPA DRENANTE EN POLIETILENO, SUSTRATO ORGÁNICO LIVIANO Y SIEMBRA DIRECTA DE ESPECIES TAPIZANTES. NO INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA.	M2		$ 254.902,20	$ -	864,47	$ 220.355.305,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 2.454.311.085,00		$ 3.072.156.961,00		$ -		$ -		$ -	
	SUBTOTAL COMPONENTE ARQUITECTONICO				$ 17.175.785.977,00		$ 24.089.208.732,00		$ 7.575.680.566,00		$ 813.080.350,00		$ 8.388.760.916,00	
2	COMPONENTE ESTRUCTURAL													
2,1	PRELIMINARES													
2.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2.571,13	$ 6.101,00	$ 15.686.464,00	2.582,88	$ 15.758.151,00	2.571,13	$ 15.686.464,00	0,00	$ -	2.571,13	$ 15.686.464,00	99,55
2.1.2	CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC.	UN	1,00	$ 5.482.267,00	$ 5.482.267,00	1,00	$ 5.482.267,00	1,00	$ 5.482.267,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.482.267,00	100,00

Calle 15 No. 40 -03 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aam-meta.gov.co
https://aam-meta.gov.co

75186

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	5/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyk.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2,1,3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	200,00	$ 76.532,00	$ 15.306.400,00	200,00	$ 15.306.400,00	200,00	$ 15.306.400,00	0,00	$ -	200,00	$ 15.306.400,00	100,00
	SUBTOTAL				$ 36.475.131,00		$ 36.546.818,00		$ 36.475.131,00		$ -		$ 36.475.131,00	
2,2	ACERO ESTRUCTURAL													
2,2,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	879.003,87	$ 27.717,00	$ 24.363.350.290,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,2,2	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	43.950,19	$ 25.337,00	$ 1.113.565.964,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (ASTM A1011 Gr.50, ASTM A307 Gr.2, ASTM A325, ASTM A36 Gr.36, ASTM A500 Gr.C, ASTM A53 Gr.B, ASTM A563 DH, ASTM A572 Gr.50, ASTM F1554 Gr105) INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGUN NORMA SSPC-CP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA.	KG	-	$ 36.455,62	$ -	958.751,90	$ 34.951.894.941,00	939.740,42	$ 34.258.819.650,00	0,00	$ -	939.740,42	$ 34.258.819.650,00	98,02
N.P. 2.2.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ASCENSORES Y CUBIERTA	KG		$ 20.682,14	$ -	18.377,40	$ 380.083.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE FACHADA	KG		$ 22.075,01	$ -	5.039,55	$ 111.248.117,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 25.476.916.254,00		$ 35.443.227.018,00		$ 34.258.819.650,00		$ -		$ 34.258.819.650,00	
2,3	CONCRETOS													
2,3,1	ZAPATA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	116,11	$ 1.318.143,00	$ 153.049.584,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,2	VIGA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	277,24	$ 1.397.100,00	$ 387.332.004,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,3	COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	416,27	$ 1.842.389,00	$ 766.931.269,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,4	VIGA AÉREA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.710,90	$ 1.803.256,00	$ 3.084.469.388,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,5	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.859,86	$ 1.802.712,00	$ 3.352.791.940,00	828,87	$ 1.496.016.607,00	828,04	$ 1.492.717.645,00	0,00	$ -	828,04	$ 1.492.717.645,00	99,78
2,3,6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	323,66	$ 1.264.869,00	$ 409.387.501,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.225,06	$ 1.382.108,00	$ 1.693.165.226,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,8	ESCALERAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	58,34	$ 1.888.269,00	$ 110.162.780,00	58,34	$ 110.162.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,9	RAMPA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	21,05	$ 1.776.395,00	$ 37.393.115,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 2.3.10	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.60 M EN CONCRETO 35 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (losa superior=0.10m)	M2	-	$ 421.504,68	$ -	3.779,14	$ 1.592.925.196,00	3.779,14	$ 1.592.925.197,00	0,00	$ -	3.779,14	$ 1.592.925.197,00	100,00
N.P. 2.3.11	RAMPA VEHICULAR EN PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.60 M EN CONCRETO 35 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (losa superior=0,12m)	M2	-	$ 468.351,39	$ -	351,42	$ 164.588.045,00	300,37	$ 140.678.707,00	0,00	$ -	300,37	$ 140.678.707,00	85,47
N.P. 2.3.12	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.342.994,91	$ -	10,30	$ 13.832.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2.3.13	PUNTALES EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI) DEBAJO DE RAMPAS PEATONALES	M3	-	$ 1.475.525,52	$ -	2,84	$ 4.190.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2.3.14	CONSTRUCCIÓN ANILLO DEL CAISSON MEDIA LUNA EN CONCRETO 4000 PSI - 35 MPa ØINT= 3.00 M, ØEXT= 3.24 M PROFUNDIDAD MAYOR A 10 M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	-	$ 1.325.388,42	$ -	57,46	$ 76.156.819,00	57,46	$ 76.156.819,00	0,00	$ -	57,46	$ 76.156.819,00	100,00
N.P. 2.3.15	SOLADO. LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	-	$ 739.742,94	$ -	51,16	$ 37.845.249,00	45,02	$ 33.303.227,00	0,00	$ -	45,02	$ 33.303.227,00	88,00
N.P. 2.3.16	CONECTORES MECANICOS PARA VARILLAS #5	UND	-	$ 25.272,57	$ -	270,00	$ 6.823.594,00	76,00	$ 1.920.715,00	0,00	$ -	76,00	$ 1.920.715,00	28,15
N.P. 2.3.17	CONECTORES MECANICOS PARA VARILLAS #6	UND	-	$ 28.316,32	$ -	182,00	$ 5.153.570,00	182,00	$ 5.153.570,00	0,00	$ -	182,00	$ 5.153.570,00	100,00
N.P. 2.3.18	CONECTORES MECANICOS PARA VARILLAS #7	UND		$ 33.542,53	$ -	40,00	$ 1.341.701,00	40,00	$ 1.341.701,00	0,00	$ -	40,00	$ 1.341.701,00	100,00
N.P. 2.3.19	CONECTORES MECANICOS PARA VARILLAS #8	UND	-	$ 36.660,33	$ -	318,00	$ 11.657.985,00	149,00	$ 5.462.389,00	0,00	$ -	149,00	$ 5.462.389,00	46,86
N.P. 2.3.20	ZAPATA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.242.468,80	$ -	212,33	$ 263.813.400,00	212,33	$ 263.813.400,00	0,00	$ -	212,33	$ 263.813.400,00	100,00
N.P. 2.3.21	VIGA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.321.847,51	$ -	273,36	$ 361.285.563,00	237,04	$ 313.283.325,00	0,00	$ -	237,04	$ 313.283.325,00	86,71
N.P. 2.3.22	COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.767.431,63	$ -	166,70	$ 294.630.853,00	158,82	$ 280.703.491,00	0,00	$ -	158,82	$ 280.703.491,00	95,27
N.P. 2.3.23	VIGA AÉREA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.728.188,64	$ -	382,20	$ 660.513.698,00	346,16	$ 598.229.780,00	8,70	$ 15.035.241,00	354,86	$ 613.265.021,00	92,85

75187

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	8/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P. 2.3.24	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.141.834,70	$ -	260,64	$ 297.607.796,00	13,49	$ 15.403.350,00	0,00	$ -	13,49	$ 15.403.350,00	5,18
N.P. 2.3.25	LOSA ENTREPISO DE CONCRETO DE 34.5 Mpa (5000 PSI) E=0.10 M CON LAMINA COLABORANTE 2" CAL. 22	M2	-	383.157,81	$ -	9.027,99	$ 3.459.144.977,00	7.381,00	$ 2.828.087.796,00	918,25	$ 351.834.659,00	8.299,25	$ 3.179.922.455,00	91,93
N.P. 2.3.26	GEOTEXTIL NT 1600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	-	7.592,94	$ -	2.415,99	$ 18.344.467,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2.3.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE IGOL DENSO o SIMILAR EN MUROS DE CONTENCIÓN.	M2	-	155.554,70	$ -	1.624,34	$ 252.673.721,00	697,05	$ 108.429.403,00	470,24	$ 73.148.042,00	1.167,29	$ 181.577.445,00	71,86
N.P. 2.3.28	GROUTING DE NIVELACIÓN fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LT	-	53.272,53	$ -	5.880,00	$ 313.242.476,00	4.279,92	$ 228.002.166,00	0,00	$ -	4.279,92	$ 228.002.166,00	72,79
N.P. 2.3.29	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA, VACIADO ALTURA MAYOR A 11 MT, ALTAMENTE FLUIDO Y COHESIVO, AGREGADO 3/8" (RELLENO COLUMNA METALICAS)	M3	-	1.341.775,39	$ -	185,51	$ 248.912.753,00	179,37	$ 240.674.251,00	0,00	$ -	179,37	$ 240.674.251,00	96,69
N.P. 2.3.30	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PEDESTALES DE CONCRETO 35 Mpa (5000 PSI) AUTONIVELANTE PREMEZCLADO PARA COLUMNAS ESTRUCTURALES.	M3	-	2.931.648,81	$ -	81,67	$ 239.427.758,00	78,89	$ 231.277.775,00	0,00	$ -	78,89	$ 231.277.775,00	96,60
N.P. 2.3.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR CON TUBERIA DE 100 MM EN MUROS DE CONTENCIÓN- ZONA PUNTOS FIJOS EJES 1(A-I); A(1-2)-8(A-I);A(7-8)	M2	-	212.297,10	$ -	424,84	$ 90.192.300,00	424,84	$ 90.192.300,00	0,00	$ -	424,84	$ 90.192.300,00	100,00
N.P. 2.3.32	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (TANQUE SUBTERRANEO)	M3	-	$ 1.284.732,13	$ -	43,63	$ 56.052.863,00	0,00	$ -	23,74	$ 30.499.541,00	23,74	$ 30.499.541,00	54,41
N.P. 2.3.33	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 27.5 MPa (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (TANQUE SUBTERRANEO)	M3	-	$ 1.715.632,58	$ -	153,97	$ 264.155.948,00	12,55	$ 21.531.189,00	61,97	$ 106.317.751,00	74,52	$ 127.848.940,00	48,40
N.P. 2.3.34	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (TANQUE SUBTERRANEO)	M3	-	$ 1.709.559,10	$ -	30,03	$ 51.338.060,00	0,00	$ -	4,30	$ 7.351.104,00	4,30	$ 7.351.104,00	14,32
N.P. 2.3.35	SELLO PARA JUNTAS DE PUENTES CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-	$ 123.686,64	$ -	146,68	$ 18.142.356,00	0,00	$ -	62,27	$ 7.701.967,00	62,27	$ 7.701.967,00	42,45
N.P. 2.3.36	CONSTRUCCION DE HUELLA DE ESCALERA EN CONCRETO FLUIDO f'c=3.000 psi, ESPESOR 8 CM. CON ACABADO SUPERFICIAL PULIDO MEDIANTE APLICACIÓN DE ENDURECEDOR. INCLUYE CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE.	M2	-	$ 199.374,45	$ 0,00	419,70	$ 83.677.457,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2.3.37	CONECTORES MECANICOS PARA VARILLAS #4	UN	-	$ 25.256,99	$ 0,00	1.194,00	$ 30.156.846,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2.3.38	VIGA AEREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.905.286,58	$ 0,00	6,30	$ 12.003.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 9.994.682.807,00**		**$ 10.536.011.384,00**		**$ 8.569.288.196,00**		**$ 591.888.305,00**		**$ 9.161.176.501,00**	
2,4	**ACERO DE REFUERZO**													
2.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	544.282,55	$ 10.248,00	$ 5.577.807.572,00	380.596,89	$ 3.900.356.936,00	302.570,41	$ 3.100.741.562,00	0,00	$ -	302.570,41	$ 3.100.741.562,00	79,50
2.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	52.681,69	$ 11.029,00	$ 581.026.359,00	49.261,12	$ 543.300.892,00	40.399,12	$ 445.561.895,00	0,00	$ -	40.399,12	$ 445.561.895,00	82,01
	SUBTOTAL				**$ 6.158.833.931,00**		**$ 4.443.657.828,00**		**$ 3.546.303.457,00**		**$ -**		**$ 3.546.303.457,00**	
	SUBTOTAL COMPONENTE ESTRUCTURAL				**$ 41.666.908.123,00**		**$ 50.459.443.048,00**		**$ 46.410.886.434,00**		**$ 591.888.305,00**		**$ 47.002.774.739,00**	
3	**COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO**													
3,1	**OBRAS PRELIMINARES**													
3.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	806,38	$ 6.127,00	$ 4.940.690,00	813,10	$ 4.981.864,00	0,00	$ -	373,27	$ 2.287.025,00	373,27	$ 2.287.025,00	45,91
	SUBTOTAL				**$ 4.940.690,00**		**$ 4.981.864,00**		**$ -**		**$ 2.287.025,00**		**$ 2.287.025,00**	
3,2	**EXCAVACIONES**													
3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	191,05	$ 94.394,00	$ 18.033.879,00	446,87	$ 42.181.847,00	156,83	$ 14.803.811,00	20,00	$ 1.887.880,00	176,83	$ 16.691.691,00	39,57
3.2.2	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTE	VJ	10,18	$ 259.921,00	$ 2.646.987,00	32,66	$ 8.489.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP 3.2.3	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3		$ 41.950,00	$ -	297,35	$ 12.473.833,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 20.680.866,00**		**$ 63.144.700,00**		**$ 14.803.811,00**		**$ 1.887.880,00**		**$ 16.691.691,00**	
3,3	**RELLENOS**													
3.3.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACION MECANICA	M3	68,44	$ 30.310,00	$ 2.074.283,00	193,52	$ 5.865.591,00	87,61	$ 2.655.459,00	0,00	$ -	87,61	$ 2.655.459,00	45,27
3.3.2	RELLENO CON ARENA	M3	51,33	$ 118.873,00	$ 6.101.359,00	393,46	$ 46.771.771,00	53,22	$ 6.326.421,00	0,00	$ -	53,22	$ 6.326.421,00	13,53
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP 3.3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	-	$ 73.847,00	$ -	258,50	$ 19.089.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	-	$ 2.257,27	$ -	2.543,64	$ 5.741.682,00	0,00	$ -	1.508,40	$ 3.404.866,00	1.508,40	$ 3.404.866,00	59,30
	SUBTOTAL				**$ 8.175.642,00**		**$ 77.468.494,00**		**$ 8.981.880,00**		**$ 3.404.866,00**		**$ 12.386.746,00**	
3,4	**RED DE SUMINISTRO**													

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	8/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyt.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3,4,1	ACOMENTIDA													
3,4,1,1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	111,28	$ 56.121,00	$ 6.245.145,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,1,2	ACCESORIO PVCP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13,00	$ 61.623,00	$ 801.099,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,1,3	VALVULA DE BOLA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 574.031,00	$ 1.722.093,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,1,4	MACROMEDIDOR 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 1.116.778,00	$ 1.116.778,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP 3,4,1,5	CONEXION A RED EXISTENTE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HIERRO DUCTIL EXTREMOS BRIDADOS 10" X 10" X 10", JUEGO DE TORNILLERIA + SELLO HIDRAULICO DE 10",UNION AUTOPORTANTE DE 10", UNION BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL DE 10" PARA TUBERIA EXISTENTE	UN	-	$ 11.345.340,11	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION HD EXTREMOS BRIDADOS 10" X 3". INCLUYE JUEGO DE TORNILLERIA + SELLO HIDRAULICO DE 3".	UN	-	$ 1.688.779,64	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA DE 3" EXTREMOS BRIDADOS, (MODO DE OPERACION DADO) INCLUYE JUEGO DE TORNILLERIA + SELLO HIDRAULICO DE 3"	UN	-	$ 2.752.183,47	$ -	1,00	$ 2.752.183,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL DE 3"	UN	-	$ 905.526,57	$ -	1,00	$ 905.527,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVCP 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	-	$ 62.173,92	$ -	99,20	$ 6.167.853,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC Ø3" UM	UN	-	$ 129.727,40	$ -	3,00	$ 389.182,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 160MM PE 100 RDE 11. (232 PSI). INCLUYE SOLDADURA POR TERMOFUSION.	ML	-	$ 445.651,77	$ -	42,90	$ 19.118.461,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 ° DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 160MM, RDE 11/ PN 16. INCLUYE UNION A TOPE POR TERMOFUSION.	UN	-	$ 656.143,68	$ -	4,00	$ 2.624.575,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA TERMOENSAMBLADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 160 MM X 90 MM, RDE 11/ PN 16. INCLUYE UNION A TOPE POR TERMOFUSION.	UN	-	$ 1.022.354,24	$ -	1,00	$ 1.022.354,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA BRIDA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 90 MM. RDE 11/ PN 16. INCLUYE UNION A TOPE POR TERMOFUSION.	UN	-	$ 957.800,65	$ -	1,00	$ 957.801,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA BRIDA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 160 MM. RDE 11/ PN 16. INCLUYE UNION A TOPE POR TERMOFUSION.	UN	-	$ 1.115.437,32	$ -	1,00	$ 1.115.437,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA METALICA PARA TUBERIA DE 90 MM	UN	-	$ 313.204,93	$ -	1,00	$ 313.205,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA METALICA PARA TUBERIA DE 160 MM	UN	-	$ 546.942,25	$ -	1,00	$ 546.942,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA PVC SOLDAR PARA TUBERIA PVC CONEXIONES DE 3" Y 4"	UN	-	$ 152.814,03	$ -	2,00	$ 305.628,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA EN POLIETILENO 6" X 4". INCLUYE UNION A TOPE POR TERMOFUSION.	UN	-	$ 754.411,66	$ -	1,00	$ 754.412,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,20	CONSTRUCCION DE CAJA EN LADRILLO RECOCIDO, PARA INSTALACION DE VALVULA DE 3". INCLUYE PISO EN CONCRETO REFORZADO Y TAPA NP 0-13. 0,64 X 0,74 X H= 1,00.	UN	-	$ 2.589.537,83	$ -	1,00	$ 2.589.538,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MEDICION INCLUYE: MACROMEDIDOR MECANICO DE TURBINA DE 3", VENTOSA, CODOS DE 90, ADAPATORES MACHO, REGISTRO DE BOLA, FILTRO EN Y, NIPLES.	UN	-	$ 7.992.043,91	$ -	1,00	$ 7.992.044,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,22	CONSTRUCCION DE CAJA EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.50x2.50x1.20 m e=0,15m) PARA MONTAJE DE MACROMEDIDOR 3", VALVULA DE CORTE Y ACCESORIOS. INCLUYE TAPA EN LAMINA ALFAJOR CAL. 1/4"	UN	-	$ 5.752.138,65	$ -	1,00	$ 5.752.139,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,23	TUBERIA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-	$ 98.613,43	$ -	62,75	$ 6.187.993,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,24	ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-	$ 78.664,05	$ -	27,00	$ 2.123.929,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,25	VALVULA DE BOLA 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	$ 875.726,92	$ -	3,00	$ 2.627.181,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA EN BRONCE COMPLETA. INCLUYE BOLA DE COBRE DE 3". ADAPATADOR MACHO DE 3" PVC	UN	-	$ 1.908.024,07	$ -	3,00	$ 5.724.072,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,1,27	INSTALACION DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE TIPO SISTEMA VARIVOOSTER CON TRES BOMBAS MODELO SVB20A-10-3-500 Y/O SIMILAR , CON TANQUE PULMON DE 500 LITROS, POTENCIA DE CADA BOMBA DE 10 HP , CAUDAL 264 GPM Y PRESIÓN DE 68 MCA. INCLUYE VALVULA CHEQUE PASAMURO, VALVULA ANTIVIBRACION Y NIPLES EN AC SCH 40.	UN	-	$ 3.570.599,18	$ -	1,00	$ 3.570.599,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75189

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyt.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 3.4.1.28	INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EYECTOR CUARTO DE BOMBAS, WQ 60-10-4 Y/O SIMILAR DE 5.5 HP ALTURA DINAMICA DE 10 MCA Y CAUDAL DE 15.77 LPS	UN	-	$ 721.596,26	$ -	2,00	$ 1.443.193,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.29	PASAMURO EN AC SCH 40 6" EXTREMO B X B L= 0,60	UN	-	$ 1.344.347,32	$ -	1,00	$ 1.344.347,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.30	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE RECOLECCION DE AGUAS. CONCRETO DE 3000 PSI. SECCION DE 0,30 DE ANCHO X 0,30 M DE ALTO. INCLUYE REJILLA EN ANGULO DE 1" Y VARILLA DE 1/2" TRANSVERSAL C/U 4 CM.	ML	-	$ 729.701,24	$ -	7,55	$ 5.509.244,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.31	LINEA DE CONDUCCION EN TUBERIA AC DE 6" SCH 40 SOLDADA PARA CONEXIÓN DE EQUIPO DE PRESION CONSTANTE A RED DE POLIETILENO. INCLUYE PINTURA, CODOS HD DE 6" BRIDADOS, TORNILLERIA Y SELLO HIDRAULICO.NO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN BOMBA.	UN	-	$ 6.303.388,00	$ -	1,00	$ 6.303.388,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SUCCION. INCLUYE CODO HD 6", NIPLE EN AC SCH 40 Y PLACA ANTIVORTICE PARA DIAMETRO DE 6"	UN	-	$ 3.408.150,91	$ -	3,00	$ 10.224.453,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.33	ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI (0.50 x 0.50 x 0.50) PARA TUBERIA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	UN	-	$ 249.220,26	$ -	19,00	$ 4.735.185,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE TIPO MILAN DE 3". INCLUYE ACCESORIOS.	UN	-	$ 5.321.141,86	$ -	2,00	$ 10.642.283,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION Y MONTAJE DE RED DE IMPULSION ENTRE EL POZO EYECTOR DEL CUARTO DE MAQUINAS Y LA CAJA DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO PLUVIAL. INCLUYE ACCESORIOS EN HD DE 6", TUBERIA SCH 40 Ø 6". BRIDAS DE CONEXIÓN.	UN	-	$ 27.670.120,85	$ -	1,00	$ 27.670.121,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO DE VENTILACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO. . INCLUYE NIPLES Y CODOS DE 6" EN ACERO GALVANIZADO.	UN	-	$ 1.913.354,03	$ -	10,00	$ 19.133.540,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.37	ESCALERA TIPO GATO. PARALES EN ANGULO DE 2 1/2" X 1/4". PASO C/U 0,30 PLATINA DE 2" X 1/4".	ML	-	$ 574.256,38	$ -	19,14	$ 10.991.267,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR. 0,80 X 0,80	M2	-	$ 333.600,19	$ -	2,64	$ 880.705,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.39	CONEXION A RED EXISTENTE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HIERRO DUCTIL EXTREMOS BRIDADOS 8" X 8" X 8". JUEGO DE TORNILLERIA + SELLO HIDRAULICO DE 8".UNION AUTOPORTANTE DE 8". UNION BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL DE 8" PARA TUBERIA EXISTENTE	UN	-	$ 11.018.521,56	$ -	1,00	$ 11.018.522,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION HD EXTREMOS BRIDADOS 8" X 3". INCLUYE JUEGO DE TORNILLERIA + SELLO HIDRAULICO DE 3".	UN	-	$ 1.650.663,47	$ -	1,00	$ 1.650.663,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.41	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	-	$ 14.400,04	$ -	4,00	$ 57.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.42	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	-	$ 13.693,50	$ -	15,00	$ 205.403,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.43	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	-	$ 382.408,47	$ -	4,20	$ 1.606.116,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.44	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	-	$ 259.921,00	$ -	1,00	$ 259.921,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.45	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS SITIO AUTORIZADO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE KM 18 VIA CAÑOS NEGROS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS)	TON	-	$ 66.090,00	$ -	10,08	$ 666.187,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.46	ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.724.678,29	$ -	0,32	$ 551.897,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.47	MEZCLA ASFALTICA RECICLADA EN CALIENTE DE TIPO MDC-25 PARA BACHEO	M3	-	$ 224.785,00	$ -	4,00	$ 899.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.4.1.48	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3-KM		$ 2.629,01	$ -	69,08	$ 181.612,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 9.885.115,00**		**$ 189.515.642,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3.4.2	**RED INTERNA DE SUMINSTRO AGUA FRIA**													
3.4.2.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	337,96	$ 14.174,00	$ 4.790.245,00	437,80	$ 6.205.377,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.2	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	477,39	$ 24.381,00	$ 11.639.246,00	548,40	$ 13.321.778,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.3	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	139,89	$ 29.431,00	$ 4.117.103,00	177,00	$ 5.209.287,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.4	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	262,80	$ 40.718,00	$ 10.700.690,00	244,00	$ 9.935.192,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.5	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	38,57	$ 56.121,00	$ 2.164.587,00	140,00	$ 7.856.940,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.6	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	250,76	$ 20.305,00	$ 5.091.933,00	20,00	$ 406.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.7	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	47,35	$ 117.836,00	$ 5.579.535,00	8,00	$ 942.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.8	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	293,00	$ 4.837,00	$ 1.417.241,00	800,00	$ 3.869.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.9	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	791,00	$ 11.372,00	$ 8.995.252,00	1.055,00	$ 11.997.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.10	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	178,00	$ 12.317,00	$ 2.192.426,00	227,00	$ 2.795.959,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.11	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	94,00	$ 25.307,00	$ 2.378.858,00	117,00	$ 2.960.919,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.12	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17,00	$ 61.623,00	$ 1.047.591,00	30,00	$ 1.848.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.13	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	140,00	$ 6.518,00	$ 912.520,00	22,00	$ 143.396,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.14	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 151.293,00	$ 2.420.688,00	4,00	$ 605.172,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.4.2.15	ABRAZADERA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	112,65	$ 9.320,00	$ 1.049.929,00	187,00	$ 1.742.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	8/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3,4,2,16	ABRAZADERA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	159,13	$ 10.887,00	$ 1.732.448,00	205,00	$ 2.231.835,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,17	ABRAZADERA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	46,63	$ 11.110,00	$ 518.059,00	63,00	$ 699.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,18	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	87,60	$ 12.297,00	$ 1.077.217,00	84,00	$ 1.032.948,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,19	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,86	$ 12.878,00	$ 165.568,00	48,00	$ 618.144,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,20	ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18,79	$ 10.902,00	$ 204.812,00	2,00	$ 21.804,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,21	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	15,78	$ 16.240,00	$ 256.321,00	3,00	$ 48.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,22	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	68,00	$ 112.372,00	$ 7.641.296,00	75,00	$ 8.427.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,23	VALVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	15,00	$ 168.502,00	$ 2.527.530,00	13,00	$ 2.190.526,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,24	VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 273.196,00	$ 819.588,00	11,00	$ 3.005.156,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,25	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 35.764,00	$ 178.820,00	40,00	$ 1.430.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,26	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	192,00	$ 62.785,00	$ 12.054.720,00	192,00	$ 12.054.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,27	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	111,00	$ 103.996,00	$ 11.543.556,00	101,00	$ 10.503.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,28	INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DE TRES (3) BOMBAS EN PARALELO DE 10 HP PARA UN CAUDAL DE BOMBEO CADA UNO DE 4.96 L/S Y UNA ALTURA DINAMICA TOTAL DE 65.43 M.C.A. INCLUYE 1 TANQUE PULMON DE 300 L	UN	1,00	$ 4.935.894,00	$ 4.935.894,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,29	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 76.847,00	$ 153.694,00	1,00	$ 76.847,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,30	VALVULA DE PURGA 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 1.321.401,00	$ 1.321.401,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,31	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	777,49	$ 17.231,00	$ 13.396.930,00	28,00	$ 482.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,32	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	304,00	$ 4.082,00	$ 1.240.928,00	19,00	$ 77.558,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP 3,4,2,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION Ø 3". INCLUYE VALVULA CHEQUE.	UN	-	$ 4.121.788,64	$ -	1,00	$ 4.121.789,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,2,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION Ø 2". RANGO DE AJUSTE DE 15 - 232 PSI.	UN	-	$ 2.565.922,30	$ -	1,00	$ 2.565.922,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,2,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION Ø 2 1/2". RANGO DE AJUSTE DE 15 - 232 PSI.	UN	-	$ 3.309.074,98	$ -	2,00	$ 6.618.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,2,36	TUBERIA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	-	$ 98.613,43	$ -	15,00	$ 1.479.201,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,2,37	ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	-	$ 78.664,05	$ -	8,00	$ 629.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,2,38	VALVULA DE BOLA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-	$ 575.652,89	$ -	3,00	$ 1.726.959,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,2,39	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE VENTOSA PARA COLUMNA DE AGUA. INCLUYE VALVULA VENTOSA DOBLE CAMARA TRIPLE ACCION ROSCADA DE 2", ADAPTADORES MACHO PVC DE 2" Y VALVULA DE BOLA PARA CORTE DE AGUA	UN	-	$ 2.031.517,83	$ -	1,00	$ 2.031.518,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,2,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA 3"	UN	-	$ 875.711,85	$ -	1,00	$ 875.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 124.266.626,00		$ 132.792.693,00		$ -		$ -		$ -	
3,4,3	MONTAJE APARATOS													
3,4,3,1	MONTAJE SANITARIO DE FLUXOMETRO	UN	100,00	$ 88.629,00	$ 8.862.900,00	101,00	$ 8.951.529,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,3,2	MONTAJE DE DUCHA	UN	12,00	$ 56.069,00	$ 672.828,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,3,3	MONTAJE LAVAMANOS	UN	137,00	$ 60.452,00	$ 8.281.924,00	136,00	$ 8.221.472,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,3,4	MONTAJE LAVAPLATOS	UN	20,00	$ 52.319,00	$ 1.046.380,00	24,00	$ 1.255.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,3,5	MONTAJE ORINAL	UN	11,00	$ 63.269,00	$ 695.959,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,3,6	LLAVE MANGUERA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	23,00	$ 39.480,00	$ 908.040,00	25,00	$ 987.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP 3,4,3,7	SUMINISTRO SANITARIO DE FLUXOMETRO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	-	$ 1.965.471,36	$ -	92,00	$ 180.823.365,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,3,8	SUMINISTRO Y MONTAJE DUCHA	UN	-	$ 197.830,58	$ -	24,00	$ 4.747.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,4,3,9	SUMINISTRO Y MONTAJE ORINAL CON FLUXOMETRO	UN	-	$ 1.027.289,13	$ -	11,00	$ 11.300.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 20.468.031,00		$ 216.287.136,00		$ -		$ -		$ -	
3,5	RED SANITARIA													
3,5,1	REDES DE AGUA RESIDUAL INTERNA													
3,5,1,1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	587,03	$ 27.626,00	$ 16.217.291,00	562,20	$ 15.531.337,00	170,45	$ 4.708.852,00	290,40	$ 8.022.590,00	460,85	$ 12.731.442,00	81,97
3,5,1,2	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	100,08	$ 40.701,00	$ 4.073.356,00	110,00	$ 4.477.110,00	40,65	$ 1.654.496,00	34,80	$ 1.416.395,00	75,45	$ 3.070.890,00	68,59
3,5,1,3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	717,53	$ 61.741,00	$ 44.301.020,00	620,40	$ 38.304.116,00	186,89	$ 11.538.775,00	332,03	$ 20.499.964,00	518,92	$ 32.038.640,00	83,64
3,5,1,4	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	38,88	$ 102.245,00	$ 3.975.286,00	53,00	$ 5.418.985,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,5	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	567,50	$ 12.960,00	$ 7.354.800,00	689,00	$ 8.929.440,00	322,00	$ 4.173.120,00	346,00	$ 4.484.160,00	668,00	$ 8.657.280,00	96,95
3,5,1,6	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	63,00	$ 23.210,00	$ 1.462.230,00	75,00	$ 1.740.750,00	36,00	$ 835.560,00	39,00	$ 905.190,00	75,00	$ 1.740.750,00	100,00
3,5,1,7	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	512,50	$ 39.832,00	$ 20.413.900,00	524,00	$ 20.871.968,00	201,00	$ 8.006.232,00	311,00	$ 12.387.752,00	512,00	$ 20.393.984,00	97,71

75191

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyt.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conisterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conisterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N°ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA								
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3.5.1.8	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40,00	$ 179.568,00	$ 7.182.720,00	9,00	$ 1.616.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.5.1.9	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	195,68	$ 12.297,00	$ 2.406.236,00	187,40	$ 2.304.458,00	91,00	$ 1.119.027,00	96,00	$ 1.180.512,00	187,00	$ 2.299.539,00	99,79
3.5.1.10	ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,36	$ 13.412,00	$ 447.424,00	60,00	$ 804.720,00	31,00	$ 415.772,00	6,00	$ 80.472,00	37,00	$ 496.244,00	61,67
3.5.1.11	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	239,18	$ 16.240,00	$ 3.884.229,00	320,00	$ 5.196.800,00	112,00	$ 1.818.880,00	95,00	$ 1.542.800,00	207,00	$ 3.361.680,00	64,69
3.5.1.12	ABRAZADERA 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,96	$ 18.979,00	$ 245.968,00	18,00	$ 341.622,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 111.964.460,00**		**$ 105.537.418,00**		**$ 34.270.714,00**		**$ 50.519.735,00**		**$ 84.790.449,00**	
3.5.2	**SALIDAS SANITARIAS**													
3.5.2.1	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	137,00	$ 95.919,00	$ 13.140.903,00	136,00	$ 13.044.984,00	38,00	$ 3.644.922,00	54,00	$ 5.179.626,00	92,00	$ 8.824.548,00	67,65
3.5.2.2	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 74.556,00	$ 894.672,00	24,00	$ 1.789.344,00	8,00	$ 596.448,00	1,00	$ 74.556,00	9,00	$ 671.004,00	37,50
3.5.2.3	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	114,00	$ 75.884,00	$ 8.650.776,00	90,00	$ 6.829.560,00	34,00	$ 2.580.056,00	50,00	$ 3.794.200,00	84,00	$ 6.374.256,00	93,33
3.5.2.4	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	20,00	$ 82.860,00	$ 1.657.200,00	24,00	$ 1.988.640,00	9,00	$ 745.740,00	5,00	$ 414.300,00	14,00	$ 1.160.040,00	58,33
3.5.2.5	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	100,00	$ 92.146,00	$ 9.214.600,00	102,00	$ 9.398.892,00	28,00	$ 2.580.088,00	6,00	$ 552.876,00	34,00	$ 3.132.964,00	33,33
3.5.2.6	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	11,00	$ 91.964,00	$ 1.011.604,00	11,00	$ 1.011.604,00	3,00	$ 275.892,00	0,00	$ -	3,00	$ 275.892,00	27,27
	SUBTOTAL				**$ 34.569.755,00**		**$ 34.063.024,00**		**$ 10.423.146,00**		**$ 10.015.558,00**		**$ 20.438.704,00**	
3,6	**RED EXTERIOR AGUA RESIDUALES**													
3,6,1	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	153,16	$ 102.245,00	$ 15.659.844,00	35,57	$ 3.636.855,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,2	TUBERIA PVCS 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	34,36	$ 182.649,00	$ 6.275.820,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	5,00	$ 723.170,00	$ 3.615.850,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	4,00	$ 1.059.054,00	$ 4.236.216,00	7,00	$ 7.413.378,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO UN F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA H.D PARA TRAF_PESADO) SEGÚN LA NORMA EN124	UN	1,00	$ 2.242.958,00	$ 2.242.958,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,6	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN	1,00	$ 27.373,00	$ 27.373,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,7	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	ML	1,00	$ 1.100.865,00	$ 1.100.865,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,8	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	1,00	$ 1.074.692,00	$ 1.074.692,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEPARADOR DE GRASAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE), RECTANGULAR, DE 1000 LITROS, DE 1235X720X1250 mm	UN	1,00	$ 3.250.084,00	$ 3.250.084,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP 3,6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE Ø 6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	-	$ 99.460,04	$ -	146,32	$ 14.552.993,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE Ø 8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	-	$ 122.452,28	$ -	52,80	$ 6.465.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,6,12	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.90 X 0.90 X 0.90 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	-	$ 984.401,23	$ -	4,00	$ 3.937.605,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,6,13	CONSTRUCCION DE SEPARADOR DE GRASAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, RECTANGULAR, 1,30 X 1,10 X H MINIMA 0,75. INCLUYE ACCESORIOS DE ENTRADA Y DE SALIDA. TAPA EN CONCRETO REFORZADO	UN	-	$ 3.128.379,49	$ -	1,00	$ 3.128.379,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,6,14	CAJA EN CONCRETO PARA INACTIVACION PARA AGUAS CONTAMINADAS 1.55X1.55 M H=1.20M	UN	-	$ 2.988.571,96	$ -	1,00	$ 2.988.572,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,6,15	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN	-	$ 278.168,00	$ -	1,00	$ 278.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,6,16	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=2.60M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	-	$ 2.065.223,76	$ -	1,00	$ 2.065.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,6,17	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=2.00M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6	ML	-	$ 2.576.053,07	$ -	3,20	$ 8.243.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,6,18	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=2.40M (CONCRETO UN FC=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA H.D PARA TRAF_PESADO) SEGÚN LA NORMA EN124 (SE INCLUYE SUMINISTRO DE TAPA)	UN	-	$ 3.355.680,40	$ -	1,00	$ 3.355.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,6,19	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA		$ 246.425,12	$ -	30,00	$ 7.392.754,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3,6,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO DE MADERA PARA EXCAVACION DE ZANJA SANITARIA A CIELO ABIERTO CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 2,20 M.	M2		$ 259.897,95	$ -	116,78	$ 30.350.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75192

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021006500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	8/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	
NP 3.6.21	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	-	$ 14.400,04	$ -	9,00	$ 129.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.6.22	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	-	$ 13.693,50	$ -	36,54	$ 500.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.6.23	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECANICO	M3	-	$ 382.408,47	$ -	17,05	$ 6.520.064,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.6.24	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	-	$ 259.921,00	$ -	3,00	$ 779.763,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.6.25	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS SITIO AUTORIZADO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE KM 18 VIA CAÑOS NEGROS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS)	TON	-	$ 66.090,00	$ -	40,93	$ 2.705.064,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.6.26	ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	-	$ 1.724.678,29	$ -	3,00	$ 5.174.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.6.27	MEZCLA ASFALTICA RECICLADA EN CALIENTE DE TIPO MDC-25 PARA BACHEO	M3	-	$ 224.785,00	$ -	5,68	$ 1.276.779,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.6.28	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3-KM	-	$ 2.629,01	$ -	98,18	$ 258.116,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.6.29	REPOSICION DE SARDINEL TIPO A-10 PREFABRICADO EN CONCRETO SIMPLE EN ZONAS INTERVENIDAS POR OBRAS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO. INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DEL SARDINEL EXISTENTE. EXCAVACION MANUAL.	ML	-	$ 126.074,48	$ -	2,00	$ 252.149,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	SUBTOTAL				$ 37.483.702,00		$ 111.405.271,00		$ -		$ -		$ -		
3,6,1	VENTILACION														
3.6.1.1	TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	107,94	$ 20.821,00	$ 2.225.831,00	200,00	$ 4.124.200,00	5,10	$ 105.167,00	86,75	$ 1.788.872,00	91,85	$ 1.894.039,00	45,93	
3.6.1.2	TUBERIA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	371,87	$ 27.973,00	$ 10.402.320,00	352,87	$ 9.870.833,00	53,60	$ 1.499.353,00	150,68	$ 4.214.972,00	204,28	$ 5.714.325,00	57,89	
3.6.1.3	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	99,60	$ 44.301,00	$ 4.412.388,00	136,00	$ 6.024.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.6.1.4	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	165,00	$ 12.960,00	$ 2.138.400,00	144,00	$ 1.866.240,00	0,00	$ -	80,00	$ 1.036.800,00	80,00	$ 1.036.800,00	55,56	
3.6.1.5	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	146,00	$ 23.210,00	$ 3.388.660,00	129,00	$ 2.994.090,00	42,00	$ 974.820,00	74,00	$ 1.717.540,00	116,00	$ 2.692.360,00	89,92	
3.6.1.6	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 39.832,00	$ 1.194.960,00	15,00	$ 597.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.6.1.7	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	35,98	$ 12.297,00	$ 442.446,00	80,00	$ 983.760,00	0,00	$ -	31,00	$ 381.207,00	31,00	$ 381.207,00	38,75	
3.6.1.8	ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	123,96	$ 13.412,00	$ 1.662.507,00	118,00	$ 1.582.616,00	16,00	$ 214.592,00	79,00	$ 1.059.548,00	95,00	$ 1.274.140,00	80,51	
3.6.1.9	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,20	$ 16.240,00	$ 539.168,00	46,00	$ 747.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	SUBTOTAL				$ 26.406.672,00		$ 28.791.195,00		$ 2.793.932,00		$ 10.198.939,00		$ 12.992.871,00		
3,7	RED AGUA LLUVIA														
3,7,1	RED DE AGUA LLUVIA INTERNA														
3.7.1.1	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	400,83	$ 61.741,00	$ 24.747.645,00	347,86	$ 21.477.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.2	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	102,45	$ 102.245,00	$ 10.475.000,00	263,16	$ 26.906.794,00	126,40	$ 12.923.768,00	0,00	$ -	126,40	$ 12.923.768,00	48,03	
3.7.1.3	TUBERIA PVCS 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,88	$ 182.649,00	$ 3.631.062,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	57,00	$ 39.832,00	$ 2.270.424,00	46,00	$ 1.832.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.5	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 179.568,00	$ 1.436.544,00	65,00	$ 11.671.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.6	ACCESORIO PVCS 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 245.029,00	$ 735.087,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.7	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	118,98	$ 16.240,00	$ 1.932.289,00	116,00	$ 1.883.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.8	ABRAZADERA 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	43,10	$ 18.979,00	$ 817.932,00	88,00	$ 1.670.152,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.9	ABRAZADERA 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,63	$ 19.922,00	$ 132.016,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.10	JUNTA DE EXPANSION PVC 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 144.531,00	$ 867.186,00	4,00	$ 578.124,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.11	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 ANCHO DE 200 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 82.384,00	$ 3.295.360,00	37,20	$ 3.064.685,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.12	SUMIDERO LONGITUDINAL DE MAMPOSTERIA, DE 500 MM DE ANCHO Y 400 MM DE ALTO, CON REJILLA DE ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO	ML	99,99	$ 859.869,00	$ 85.978.301,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.13	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM (4")	ML	195,68	$ 61.843,00	$ 12.101.438,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.14	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM (2 1/2") SUMINISTRO E INSTALACION	ML	231,00	$ 33.845,00	$ 7.818.195,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.15	CAJA DE INSPECCION DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METALICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	11,00	$ 828.296,00	$ 9.111.256,00	10,00	$ 8.282.960,00	0,00	$ -	7,00	$ 5.798.072,00	7,00	$ 5.798.072,00	70,00	
3.7.1.16	INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE IHM WQK48-30-7,5 10 HP 220V O SIMILAR, INCLUYE ARRANCADOR Y SWITCH FLOTADOR	UN	1,00	$ 6.029.067,00	$ 6.029.067,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.17	INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE IHM WQK30-20-3,7 5HP 220V O SIMILAR, INCLUYE ARRANCADOR Y SWITCH FLOTADOR	UN	1,00	$ 5.173.592,00	$ 5.173.592,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
3.7.1.18	CANAL LAMINA GOLD ROLLED CAL.20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ANCHO 30 CMS SUMINISTRO E INSTALACION	ML	20,00	$ 94.991,00	$ 1.899.820,00	18,45	$ 1.752.584,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP 3.7.1.19	CONEXIÓN TUBERIA PVC S 6" CON SISTEMA DE SUBDRENAJE. INCLUYE SILLA TEE PVC DE 6" X 4". CODO PVC S DE 4"	UN	-	$ 304.537,17	$ -	26,00	$ 7.917.966,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.7.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE Ø 6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	-	$ 99.460,04	$ -	139,96	$ 13.920.427,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	

75193

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@evg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UNO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 3.7.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE Ø 8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	-	$ 122.452,28	$ -	19,29	$ 2.362.104,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.7.1.22	CARCAMO DE RECOLECCION DE AGUAS SECCION DE 0,30 DE ANCHO X 0,3 M DE ALTO, CON REJILLA DE ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO	ML	-	$ 590.314,11	$ -	19,48	$ 11.499.319,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.7.1.23	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO UN F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA H.D PARA TRAF_PESADO) SEGÚN LA NORMA EN124	UN	-	$ 2.562.151,00	$ -	2,00	$ 5.124.302,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.7.1.24	CAÑUELA POZO DE INSPECCION PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN	-	$ 278.168,00	$ -	2,00	$ 556.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.7.1.25	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	ML	-	$ 1.144.392,00	$ -	3,80	$ 4.348.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.7.1.26	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	-	$ 1.074.692,00	$ -	2,00	$ 2.149.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.7.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE EN PVC 3/4" AISLADA (AIRES ACONDICIONADOS)	ML	-	$ 67.199,75	$ -	860,34	$ 57.814.633,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.7.1.28	CONSTRUCCION DE CANAL PERIMETRAL EN TERRENO NATURAL (0,30X0,18) VACIADA EN SITIO PARA RECOLECCION DE AGUA DE ESCORRENTIA A MEDIA LADERA.	ML	-	$ 220.443,18	$ -	200,00	$ 44.088.636,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 178.452.214,00		$ 228.902.352,00		$ 12.923.768,00		$ 5.798.072,00		$ 18.721.840,00	
3,7,2	SALIDAS AGUA LLUVIAS													
3.7.2.1	SIFON 180° PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31,00	$ 12.049,00	$ 373.519,00	43,00	$ 518.107,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 373.519,00		$ 518.107,00		$ -		$ -		$ -	
3,8	RED AGUA LLUVIA REDES EXTERNA													
3.8.1	TUBERIA PVCS 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	17,73	$ 102.245,00	$ 1.812.804,00	147,73	$ 15.104.654,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.8.2	TUBERIA PVCS 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,04	$ 182.649,00	$ 3.477.637,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	95,22	$ 166.807,00	$ 15.883.363,00	67,62	$ 11.279.489,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.8.4	CAJA DE INSPECCION DE 0.8 X 0.8 X 0.8 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	4,00	$ 828.296,00	$ 3.313.184,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.8.5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO UN F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA H.D PARA TRAF_PESADO) SEGÚN LA NORMA EN124	UN	1,00	$ 2.562.151,00	$ 2.562.151,00	2,00	$ 5.124.302,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.8.6	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN	1,00	$ 278.168,00	$ 278.168,00	2,00	$ 556.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.8.7	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	ML	1,20	$ 1.144.392,00	$ 1.373.270,00	3,64	$ 4.165.587,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.8.8	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	1,00	$ 1.074.692,00	$ 1.074.692,00	2,00	$ 2.149.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP 3.8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE Ø 6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	-	$ 99.460,04	$ -	4,48	$ 445.581,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	-	$ 1.059.054,00	$ -	8,00	$ 8.472.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.11	CAJA DE INSPECCIÓN DE 2.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	-	$ 2.348.263,83	$ -	1,00	$ 2.348.264,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.12	CARCAMO DE RECOLECCION DE AGUAS SECCION DE 0,50 DE ANCHO X 0,5 M DE ALTO, CON REJILLA DE ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO	ML	-	$ 1.229.121,08	$ -	15,94	$ 19.592.190,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.13	SUMINISTRO E INSTALACION Y MONTAJE DE RED DE IMPULSION ENTRE EL POZO EYECTOR Y ALCANTARILLADO PLUVIAL. INCLUYE ACCESORIOS EN HD DE 6". TUBERIA SCH 40 Ø 6", BRIDAS DE CONEXION Y ANCLAJE A MURO.	UN	-	$ 28.921.604,41	$ -	1,00	$ 28.921.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.14	ESCALERA TIPO GATO, PARALES EN ANGULO DE 2 1/2" X 1/4", PASO C/U 0,30 PLATINA DE 2" X 1/4"	ML	-	$ 562.566,75	$ -	4,50	$ 2.531.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO SCH 40 Ø 6" L = 0.6 EXTREMOS BRIDADOS	UN	-	$ 1.737.138,21	$ -	1,00	$ 1.737.138,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO SCH 40 Ø 6" L = 0.8 EXTREMO L X B	UN	-	$ 1.804.223,31	$ -	1,00	$ 1.804.223,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.17	INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EYECTOR SOTANO, WQ 65-15-5.5 Y/O SIMILAR. DE 7.5 HP ALTURA DINAMICA DE 15 MCA Y CAUDAL DE 23.40 LPS	UN	-	$ 326.810,61	$ -	2,00	$ 653.621,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE Ø 8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	-	$ 122.452,28	$ -	93,25	$ 11.418.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75194

CONTRATO N°:	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°:	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 3.8.19	CONEXIÓN POZO EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICION DE POZO EXISTENTE EN DIAMETROS DE 8" A 12". CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETOS.	UN	-	$ 1.133.948,84	$ -	1,00	$ 1.133.949,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA POZO DE SEGURIDAD PARA TRAFICO PESADO	UN		$ 1.613.835,31	$ -	1,00	$ 1.613.835,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.21	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA		$ 246.425,12	$ -	30,00	$ 7.392.754,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.22	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	-	$ 14.400,04	$ -	9,00	$ 129.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.23	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	-	$ 13.693,50	$ -	37,74	$ 516.793,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.24	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECANICO	M3	-	$ 382.408,47	$ -	16,35	$ 6.252.378,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.25	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	-	$ 259.921,00	$ -	3,00	$ 779.763,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.26	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS SITIO AUTORIZADO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE KM 18 VIA CAÑOS NEGROS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS)	TON	-	$ 66.090,00	$ -	39,23	$ 2.592.711,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.27	ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.724.678,29	$ -	2,88	$ 4.967.073,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.28	MEZCLA ASFALTICA RECICLADA EN CALIENTE DE TIPO MDC-25 PARA BACHEO	M3	-	$ 224.785,00	$ -	8,74	$ 1.964.621,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.29	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3-KM	-	$ 2.629,01	$ -	164,72	$ 433.051,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.30	REPOSICION DE SARDINEL TIPO A-10 PREFABRICADO EN CONCRETO SIMPLE EN ZONAS INTERVENIDAS POR OBRAS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO. INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DEL SARDINEL EXISTENTE, EXCAVACION MANUAL.	ML	-	$ 126.074,48	$ -	2,00	$ 252.149,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.31	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DISIPADOR DE ENERGÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 0.50 M X 0.50 M (DIMENSIÓN INTERNA), PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, CON MUROS LATERALES DE ESPESOR 20 CM, CONFORMANDO UN ANCHO TOTAL DE 0.90 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL, FORMALETA, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL (FC=280 KG/CM²), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (SEGÚN DISEÑO), CURADO DEL CONCRETO, DESENCOFRADO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE.	M3	-	$ 2.013.867,36	$ -	0,80	$ 1.611.094,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.32	CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO 28 MPa (fc = 280 kg/cm²) REFORZADO IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURA DE BIORETENCION TIPO SUD (SOLUCIONES URBANAS DE DRENAJE SOSTENIBLES).	M3	-	$ 2.491.424,89	$ -	35,38	$ 88.146.613,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE PVC O HDPE DE ESPESOR MINIMO 1 mm, EN ESTRUCTURA DE BIORETENCION PARA CONTROL DE INFILTRACION DE AGUAS LLUVIAS.	M2	-	$ 183.067,99	$ -	204,87	$ 37.505.139,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.34	ENROCADO CAPA FILTRANTE	M3	-	$ 185.488,04	$ -	74,53	$ 13.824.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.35	SUSTRATO (arena, tierra vegetal, contenido organico y compost)	M3	-	$ 172.176,01	$ -	80,01	$ 13.775.803,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.36	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ESPECIES VEGETALES EN ZONA DE BIORRETENCION PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS	M2	-	$ 90.538,93	$ -	160,00	$ 14.486.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.37	TUBERIA PERFORADA Ø 6" PVC CON ORIFICIOS DE 3/4"	ML	-	$ 93.427,03	$ -	88,15	$ 8.235.593,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.8.38	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	-	$ 179.568,00	$ -	24,00	$ 4.309.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 29.775.269,00**		**$ 326.228.234,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,9	**REDES CONTRA INCENDIOS**													
3,9,1	**REDES CONTRA INCENDIO INTERNAS**													
3,9,1,1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2.055,93	$ 34.916,00	$ 71.784.852,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,2	TUBERIA AC SCH 10 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	244,33	$ 45.541,00	$ 11.127.033,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,3	TUBERIA AC SCH 10 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	221,92	$ 47.744,00	$ 10.595.348,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,4	TUBERIA AC SCH 10 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	950,74	$ 58.171,00	$ 55.305.497,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,5	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	448,57	$ 83.940,00	$ 37.652.966,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,6	TUBERIA AC SCH 10 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	694,38	$ 96.174,00	$ 66.781.302,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,7	TUBERIA AC SCH 10 4"	ML	413,38	$ 119.614,00	$ 49.446.035,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,8	ACCESORIO AG 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	706,00	$ 8.772,00	$ 6.193.032,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,9	ACCESORIO ACERO RANURADO 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	106,00	$ 13.283,00	$ 1.407.998,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,10	ACCESORIO ACERO RANURADO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	71,00	$ 19.693,00	$ 1.398.203,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,11	ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 27.407,00	$ 767.396,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,12	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	121,00	$ 37.116,00	$ 4.491.036,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,13	ACCESORIO ACERO RANURADO 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	154,00	$ 47.223,00	$ 7.272.342,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,14	ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	79,00	$ 67.343,00	$ 5.320.097,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,15	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	212,00	$ 16.272,00	$ 3.449.664,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,16	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	142,00	$ 15.788,00	$ 2.241.896,00	40,00	$ 631.520,00	4,00	$ 63.152,00	36,00	$ 568.368,00	40,00	$ 631.520,00	100,00
3,9,1,17	COUPLING PARA UNION RANURADA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56,00	$ 18.212,00	$ 1.019.872,00	192,00	$ 3.496.704,00	108,00	$ 1.966.896,00	84,00	$ 1.529.808,00	192,00	$ 3.496.704,00	100,00

75195

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA								
								ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR		CANT.	VALOR		CANT.	VALOR	%
3.9.1.18	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	242,00	$ 24.911,00	$ 6.028.462,00	49,00	$ 1.220.639,00	49,00	$ 1.220.639,00		0,00	$ -		49,00	$ 1.220.639,00	100,00
3.9.1.19	COUPLING PARA UNION RANURADA 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	308,00	$ 41.709,00	$ 12.848.372,00	61,00	$ 2.544.249,00	57,00	$ 2.377.413,00		4,00	$ 166.836,00		61,00	$ 2.544.249,00	100,00
3.9.1.20	COUPLING PARA UNION RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	158,00	$ 31.099,00	$ 4.913.642,00	74,00	$ 2.301.326,00	37,00	$ 1.150.663,00		37,00	$ 1.150.663,00		74,00	$ 2.301.326,00	100,00
3.9.1.21	STRAP 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	76,00	$ 14.491,00	$ 1.101.316,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.22	STRAP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	39,00	$ 15.873,00	$ 619.047,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.23	STRAP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	558,00	$ 17.299,00	$ 9.652.842,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.24	STRAP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	74,00	$ 22.288,00	$ 1.649.312,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.25	Tee MECANICA 2" X 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	26,00	$ 37.357,00	$ 971.282,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.26	Tee MECANICA 2" X 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 15.163,00	$ 90.978,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.27	Tee MECANICA 2 1/2" X 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 24.222,00	$ 193.776,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.28	Tee MECANICA 2 1/2" X 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 38.331,00	$ 459.972,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.29	Tee MECANICA 3" X 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 32.107,00	$ 224.749,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.30	Tee MECANICA 3" X 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 50.570,00	$ 707.980,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.31	REDUCCION CONCENTRICA 1 1/2" X 1 1/4" S SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 16.526,00	$ 198.312,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.32	REDUCCION CONCENTRICA 2" X 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8,00	$ 22.392,00	$ 179.136,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.33	REDUCCION CONCENTRICA 2 1/2" X 1 1/2" S SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 23.055,00	$ 322.770,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.34	REDUCCION CONCENTRICA 2 1/2" X 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 30.014,00	$ 270.126,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.35	REDUCCION CONCENTRICA 3" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	13,00	$ 30.983,00	$ 402.779,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.36	REDUCCION CONCENTRICA 4" X 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 116.156,00	$ 929.248,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.37	PINTURA ESMALTE TUBERIA 1/2" - 1" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	2.055,93	$ 3.049,00	$ 6.268.531,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.38	PINTURA ESMALTE TUBERIA 1 1/4" - 2" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	1.416,99	$ 5.000,00	$ 7.084.950,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.39	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	2.427,47	$ 7.341,00	$ 17.820.057,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.40	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE ADITAMENTOS)	UN	20,00	$ 2.924.608,00	$ 58.492.160,00	20,00	$ 58.492.160,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.41	ESTACION DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	10,00	$ 4.553.650,00	$ 45.536.500,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.42	SOPORTE SISMO RESISTENTE 4" LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	128,00	$ 215.427,00	$ 27.574.656,00	128,00	$ 27.574.656,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.43	SOPORTE SISMO RESISTENTE CUATRO VIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 193.273,00	$ 4.058.733,00	21,00	$ 4.058.733,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.44	PUNTO ROCIADOR 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.229,00	$ 68.857,00	$ 84.625.253,00	867,00	$ 59.699.019,00	422,00	$ 29.057.654,00		422,00	$ 29.057.654,00		844,00	$ 58.115.308,00	97,35
3.9.1.45	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACION	UN	845,00	$ 59.362,00	$ 38.288.490,00	661,00	$ 39.238.282,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.46	ROCIADOR UP RIGHT K 5.6 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	584,00	$ 43.275,00	$ 25.272.600,00	206,00	$ 8.914.650,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.47	ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	480,52	$ 10.902,00	$ 5.238.685,00	700,00	$ 7.631.400,00	0,00	$ -		466,00	$ 5.080.332,00		466,00	$ 5.080.332,00	66,57
3.9.1.48	ABRAZADERA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	122,74	$ 10.887,00	$ 1.336.307,00	28,00	$ 304.836,00	0,00	$ -		28,00	$ 304.836,00		28,00	$ 304.836,00	100,00
3.9.1.49	ABRAZADERA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80,28	$ 11.110,00	$ 891.911,00	57,00	$ 633.270,00	0,00	$ -		57,00	$ 633.270,00		57,00	$ 633.270,00	100,00
3.9.1.50	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	285,89	$ 12.297,00	$ 3.515.548,00	270,00	$ 3.320.190,00	226,00	$ 2.779.122,00		44,00	$ 541.068,00		270,00	$ 3.320.190,00	100,00
3.9.1.51	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	204,75	$ 12.878,00	$ 2.636.813,00	136,00	$ 1.751.408,00	48,00	$ 618.144,00		37,00	$ 476.486,00		85,00	$ 1.094.630,00	62,50
3.9.1.52	ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	219,52	$ 13.412,00	$ 2.944.247,00	141,00	$ 1.891.092,00	30,00	$ 402.360,00		111,00	$ 1.488.732,00		141,00	$ 1.891.092,00	100,00
3.9.1.53	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	103,87	$ 16.240,00	$ 1.686.795,00	91,00	$ 1.477.840,00	92,00	$ 1.494.080,00		0,00	$ -		92,00	$ 1.494.080,00	101,10
3.9.1.54	VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 552.776,00	$ 1.105.552,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.55	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA DE 4 X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,00	$ 1.092.932,00	$ 2.185.864,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.56	VALVULA ANGULAR 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 566.786,00	$ 11.335.720,00	20,00	$ 11.335.720,00	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.57	INSTALACION EQUIPO CONTRA INCENDIO LISTADO ELECTRICO SCF-150-125-250 200 HP 406 V. COMPUESTO POR: BOMBA ELECTRICA DE 1000 GPM-PRESION NOMINAL 187 PSI, MOTOR ELECTRICO DE 200 HP, ULTABLERO CONTROLADOR BOMBA ELECTRICA , MOTOBOMBA JOCKEY 16.5 GPM-PRESION NOMINAL 197 PSI-POTENCIA 5HP-VOLTAJE 440 V/3 FASES, TABLERO CONTROLADOR BOMBA JOCKEY-POTENCIA 5 HP-VOLTAJE 460 V, ACCESORIOS INCLUIDOS: MANOMETRO Y VACUOMETRO DE CARATULA DE 3 1/2" PARA DESCARGA Y SUCCION, VALVULA DESAIREADORA, VALVULA DE ALIVIO,MEDIDOR DE FLUJO DE 6", CABEZAL DE PRUEBAS DE 6" CON 4 SET DE VALVULAS DE 2 1/2", INCREMENTADOR CONCENTRICO EN LA DESCARGA 952-D-5*5-104 / DN125-150, REDUCTOR EXCENTRICO EN LA SUCCION 952-S-8*5-104/DN200-150	UN	1,00	$ 6.110.541,00	$ 6.110.541,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.58	TUBERIA AC SCH 10 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	99,45	$ 179.466,00	$ 17.847.884,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
3.9.1.59	ACCESORIO ACERO RANURADO 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 119.889,00	$ 1.438.668,00	-	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS															
NP 3.9.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 40 1"	ML	-	$ 60.046,53	$ -	1.419,94	$ 85.262.470,00	694,39	$ 41.695.710,00		703,61	$ 42.249.339,00		1.398,00	$ 83.945.049,00	98,45
NP 3.9.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 40 1 1/4"	ML	-	$ 68.349,94	$ -	157,75	$ 10.782.203,00	72,47	$ 4.953.320,00		77,53	$ 5.299.171,00		150,00	$ 10.252.491,00	95,09

75196

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cve.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	
NP 3.9.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 40 1 1/2"	ML	-	$ 81.960,14	$ -	206,87	$ 16.955.094,00	64,54	$ 5.289.707,00	137,46	$ 11.266.241,00	202,00	$ 16.555.948,00	97,65	
NP 3.9.1.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 2"	ML	-	$ 119.957,05	$ -	854,10	$ 102.455.316,00	534,30	$ 64.093.052,00	313,70	$ 37.630.527,00	848,00	$ 101.723.579,00	99,29	
NP 3.9.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 2 1/2"	ML	-	$ 128.566,54	$ -	453,26	$ 58.274.070,00	220,35	$ 28.329.637,00	33,65	$ 4.326.264,00	254,00	$ 32.655.901,00	56,04	
NP 3.9.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 3"	ML	-	$ 198.877,04	$ -	489,58	$ 97.366.221,00	210,78	$ 41.919.302,00	278,80	$ 55.446.919,00	489,58	$ 97.366.221,00	100,00	
NP 3.9.1.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 4"	ML	-	$ 264.962,60	$ -	509,93	$ 135.112.379,00	279,18	$ 73.972.259,00	177,02	$ 46.903.679,00	456,20	$ 120.875.938,00	89,46	
NP 3.9.1.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RANURADO UL/FM 1-1/4" INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 46.915,73	$ -	-	$ -	2,00	$ 93.832,00	0,00	$ -	2,00	$ 93.832,00	-	
NP 3.9.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RANURADO UL/FM 1 1/2" INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 48.909,42	$ -	40,00	$ 1.956.377,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RANURADO UL/FM 2" INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 66.599,66	$ -	16,00	$ 1.065.595,00	32,00	$ 2.131.190,00	0,00	$ -	32,00	$ 2.131.190,00	200,00	
NP 3.9.1.70	SUMINISTRO E INSTALACION CODO RANURADO UL/FM 2 1/2" INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 83.158,16	$ -	13,00	$ 1.081.056,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RANURADO UL/FM DE 3". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 143.833,82	$ -	37,00	$ 5.321.851,00	1,00	$ 143.834,00	0,00	$ -	1,00	$ 143.834,00	2,70	
NP 3.9.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RANURADO UL/FM DE 4". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 132.633,98	$ -	18,00	$ 2.387.412,00	14,00	$ 1.856.876,00	0,00	$ -	14,00	$ 1.856.876,00	77,78	
NP 3.9.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RANURADA UL /FM DE 6" X 6". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 547.933,14	$ -	5,00	$ 2.739.666,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RANURADO UL/FM 6". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 381.742,08	$ -	3,00	$ 1.145.226,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RANURADA UL /FM DE 1" X 1". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 94.279,61	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL /FM DE 4" X 3" INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 226.808,09	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 2" X 1 1/4". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 90.422,65	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 2" X 1 1/2". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 91.983,87	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 2 1/2" X 1 1/4". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 104.330,46	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 2 1/2" X 1 1/2". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 111.391,74	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 3" X 1 1/4". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 162.913,09	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 3" X 1 1/2". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 170.818,07	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANURADA UL/FM DE 1 1/2" X 1 1/4". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 45.897,89	$ -	12,00	$ 550.775,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANURADA UL/FM DE 2" X 1 1/4" INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 54.893,66	$ -	106,00	$ 5.818.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANURADA UL/FM DE 2 1/2" X 1 1/2". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 58.369,79	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANURADA UL/FM DE 2 1/2" X 2". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 60.816,43	$ -	12,00	$ 729.797,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANURADA UL/FM DE 3" X 2 1/2. INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 95.525,94	$ -	19,00	$ 1.814.993,00	1,00	$ 95.526,00	0,00	$ -	1,00	$ 95.526,00	5,26	
NP 3.9.1.88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANURADA UL/FM DE 4" X 3". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 127.171,71	$ -	7,00	$ 890.202,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA 1" FM. INCLUYE STRAP ROSCADO UL/FM Y NIPLE GALVANIZADO	UN	-	$ 612.322,68	$ -	5,00	$ 3.061.613,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 6". INCLUYE COUPLING	ML	-	$ 376.209,44	$ -	131,00	$ 49.283.437,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 1 1/2" X 1". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 117.346,93	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 2 1/2" X 1". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 125.461,13	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RANURADA UL/FM DE 2 1/2" X 2 1/2". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 119.631,70	$ -	8,00	$ 957.054,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
NP 3.9.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 2" X 1". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 112.738,62	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	

75192

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	5/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.537.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvz.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conInterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conInterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 3.9.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 3" X 1" INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 188.278,90	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 3" X 2 1/2". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 193.895,89	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 3" X 2" INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 179.270,72	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RANURADA UL/FMDE 3" X 3" INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 239.608,82	$ -	20,00	$ 4.792.176,00	2,00	$ 479.218,00	0,00	$ -	2,00	$ 479.218,00	10,00
NP 3.9.1.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA RANURADA UL/FM DE 4" X 2". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 205.738,92	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RANURADA UL/FM DE 4" X 4". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 276.963,95	$ -	52,00	$ 14.402.125,00	2,00	$ 553.928,00	0,00	$ -	2,00	$ 553.928,00	3,85
NP 3.9.1.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANUARADA UL/FM DE 1 1/4" X 1" INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 61.505,80	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.102	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 6". NO INCLUYE VARILLA ROSCADA NI ANCLAJE	UN	-	$ 26.773,71	$ -	65,00	$ 1.740.291,00	12,00	$ 321.285,00	0,00	$ -	12,00	$ 321.285,00	18,46
NP 3.9.1.103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANURADA UL/FM DE 2" X 1 1/2". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 61.576,20	$ -	3,00	$ 184.729,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANURADA UL/FM DE 4" X 2". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 101.853,84	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANURADA UL/FM DE 1 1/2" X 1". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 56.761,92	$ -	17,00	$ 964.953,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA COPA RANURADA UL/FM DE 2" X 1". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 64.048,27	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.107	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA DE 6 X 2 1/2" X 2 1/2". UL/FM	UN	-	$ 3.810.394,77	$ -	1,00	$ 3.810.395,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RANURADO UL/FM DE 1". INCLUYE COUPLING RANURADO	UN	-	$ 72.444,69	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AWWA C- 900 PVC DE 6" DR 18. NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO	ML	-	$ 345.436,43	$ -	20,20	$ 6.977.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.110	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR HD SERIE 1100 C 900	UN	-	$ 1.059.332,08	$ -	1,00	$ 1.059.332,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.111	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR HD SERIE 1200 C 900 (PARA ACCESORIOS)	UN	-	$ 1.300.261,65	$ -	9,00	$ 11.702.355,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA PVC C - 900 6"	UN	-	$ 3.315.051,89	$ -	1,00	$ 3.315.052,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.113	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR CAMPANA X BRIDA C - 900	UN	-	$ 3.299.060,30	$ -	3,00	$ 9.897.181,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.114	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR HD SERIE 4000 C 900	UN	-	$ 1.021.855,05	$ -	3,00	$ 3.065.565,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.115	SUMINISTRO E INSTALACION DECODO X 90° PVC C - 900	UN	-	$ 2.221.293,54	$ -	3,00	$ 6.663.881,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.116	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN AC SCH 40 DE 6" PARA LINEA DE CONEXIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO A RED DE POLIETILENO. INCLUYE TUBERIA AC SCH 40 DE 6", SOLDADURA, PINTURA Y BRIDAS DE CONEXIÓN	ML	-	$ 699.456,23	$ -	8,60	$ 6.015.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.117	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO AC SCH 40 DE 6" L= 0.60 EXTREMOS BRIDADOS. Z =0,30	UN	-	$ 1.534.863,88	$ -	2,00	$ 3.069.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.118	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN AC SCH 40 DE 6" EXTREMOS BRIDADOS. INCLUYE SELLO HIDRAULICO Y TORNILLERIA	UN	-	$ 3.052.820,37	$ -	4,00	$ 12.211.281,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.119	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SUCCION. INCLUYE CODO HD 6", NIPLE EN AC SCH 40 Y PLACA ANTIVORTICE PARA DIAMETRO DE 6"	UN	-	$ 3.473.357,52	$ -	1,00	$ 3.473.358,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.120	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 6" ROSCADO. PARA CONEXIÓN SIAMESA. INCLUYE UNION RIGIDA DE 6"	UN	-	$ 495.907,71	$ -	1,00	$ 495.908,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.121	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE DE 6" , PARA CONEXIÓN SIAMESA. INCLUYE UNIONES RIGIDAS	UN	-	$ 2.040.316,94	$ -	1,00	$ 2.040.317,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.122	ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI (0.50 x 0.50 x 0.50) PARA TUBERIA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	UN	-	$ 249.220,26	$ -	7,00	$ 1.744.542,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.123	INSTALACION EQUIPO CONTRA INCENDIO LISTADO, COMPUESTO POR: BOMBA ELECTRICA DE 500 GPM-PRESION NOMINAL 200 PSI, ULTABLERO CONTROLADOR BOMBA ELECTRICA , TABLERO CONTROLADOR BOMBA JOCKEY-POTENCIA 5 HP-VOLTAJE 460 V, ACCESORIOS INCLUIDOS: SUCCION DE 5", DESCARGA DE 5" VALVULA DE ALIVIO DE 3", DESCARGA DE VALVULA DE ALIVIO 5", DISPOSITIVO DE MEDICION DE 5",. VALVULAS DE MANGUERA DE 2 1/2", CABEZAL DE MANGUERA DE 4". JUNTAS DE EXPANSION, VALVULA PRINCIPAL. ACCESORIOS Y NIPLES PARA MONTAJE	UN	-	$ 4.825.523,72	$ -	1,00	$ 4.825.524,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.124	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO DE PRESION UL/FM DE 4"	UN	-	$ 19.097.016,92	$ -	2,00	$ 38.194.034,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.125	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO DE PRESION UL/FM DE 3"	UN	-	$ 16.377.413,26	$ -	8,00	$ 131.019.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.126	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION PARA RED CONTRA INCENDIO Y CONTROL PARA ROCIADORES RANURADA PARA TUBERIA PRINCIPAL DE 4"	UN	-	$ 17.975.372,98	$ -	2,00	$ 35.950.746,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75198

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@vyt.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 3.9.1.127	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION PARA RED CONTRA INCENDIO Y CONTROL PARA ROCIADORES RANURADA PARA TUBERIA PRINCIPAL DE 3"	UN	-	$ 16.011.642,90	$ -	7,00	$ 112.081.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.128	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION PARA RED CONTRA INCENDIO Y CONTROL PARA ROCIADORES RANURADA PARA TUBERIA PRINCIPAL DE 2 1/2"	UN	-	$ 5.119.750,29	$ -	1,00	$ 5.119.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.129	TEE ROSCADA DE 1"	UN	-	$ 71.384,82	$ -	209,00	$ 14.919.427,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.130	TEE MECANICA DE 4" A 2". NO INCLUYE COUPLING	UN	-	$ 103.306,82	$ -	88,00	$ 9.091.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.131	TEE MECANICA DE 3" A 2". NO INCLUYE COUPLING	UN	-	$ 95.731,53	$ -	20,00	$ 1.914.631,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.132	TEE MECANICA DE 3" A 1 1/2". NO INCLUYE COUPLING	UN	-	$ 67.642,07	$ -	18,00	$ 1.217.557,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.133	TEE MECANICA DE 3" A 1 1/4". NO INCLUYE COUPLING	UN		$ 45.034,66	$ -	1,00	$ 45.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.134	TEE MECANICA DE 3" A 1". NO INCLUYE COUPLING	UN		$ 90.547,71	$ -	28,00	$ 2.535.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.135	TEE MECANICA DE 2 1/2" A 1 1/2". NO INCLUYE COUPLING	UN		$ 69.145,36	$ -	16,00	$ 1.106.326,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.136	TEE MECANICA DE 2 1/2" A 1 1/4". NO INCLUYE COUPLING	UN		$ 66.920,98	$ -	19,00	$ 1.271.499,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.137	TEE MECANICA DE 2 1/2" A 1". NO INCLUYE COUPLING	UN		$ 65.207,50	$ -	36,00	$ 2.347.470,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.138	TEE MECANICA DE 2" A 1 1/4". NO INCLUYE COUPLING	UN		$ 52.345,49	$ -	9,00	$ 471.109,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.139	TEE RANURADA DE 1 1/2". INCLUYE COUPLING	UN		$ 69.118,84	$ -	6,00	$ 414.713,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.140	CODO ROSCADO DE 1 1/4"	UN		$ 43.945,87	$ -	89,00	$ 3.911.182,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.141	CODO ROSCADO DE 1"	UN		$ 40.859,51	$ -	578,00	$ 23.616.797,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.142	REDUCCION RANURADA DE 4" A 2 1/2". INCLUYE COUPLING	UN		$ 114.911,88	$ -	21,00	$ 2.413.149,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.143	REDUCCION RANURADA DE 4 A 1 1/2". INCLUYE COUPLING	UN		$ 100.351,79	$ -	20,00	$ 2.007.036,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.144	REDUCCION RANURADA DE 3" A 2". INCLUYE COUPLING	UN		$ 111.632,09	$ -	2,00	$ 223.264,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.145	REDUCCION ROSCADA DE 1 1/4" A 1"	UN		$ 41.617,13	$ -	148,00	$ 6.159.335,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.146	STRAP DE 3" A 1"	UN		$ 56.125,54	$ -	12,00	$ 673.506,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.147	STRAP DE 2 1/2" A 1"	UN		$ 55.601,54	$ -	73,00	$ 4.058.912,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.148	STRAP DE 2" A 1"	UN		$ 50.154,11	$ -	211,00	$ 10.582.517,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.149	STRAP DE 1 1/2" A 1"	UN		$ 48.935,38	$ -	66,00	$ 3.229.735,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.150	STRAP DE 1 1/4" A 1"	UN		$ 48.630,15	$ -	57,00	$ 2.771.919,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.151	SEMICODO RANURADO DE 3". INCLUYE COUPLING	UN		$ 137.488,34	$ -	32,00	$ 4.399.627,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.152	PASA MUROS 4" L=0.80. INCLUYE PLACA ANTIVÓRTICE	UN		$ 2.324.865,83	$ -	6,00	$ 15.149.194,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.153	PASA MUROS 2" L=0.80 INCLUYE PLACA ANTIVÓRTICE	UN		$ 1.292.602,77	$ -	2,00	$ 2.585.205,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.154	PASA MUROS 3" L=0.80 INCLUYE PLACA ANTIVÓRTICE	UN		$ 1.692.326,75	$ -	3,00	$ 5.076.980,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
NP 3.9.1.155	PUNTO DE SOPORTERIA. INCLUYE VARILLA ROSCADA L=1M	UN		$ 14.815,45	$ -	3.113,00	$ 46.120.496,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 751.313.125,00**		**$ 1.414.659.362,00**		**$ 307.058.799,00**		**$ 244.120.193,00**		**$ 551.178.992,00**	
3,9,2	**SEGURIDAD HUMANA**													
3.9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON LUZ DE ESTROBO EN EL TECHO	UN	21,00	$ 353.191,00	$ 7.417.011,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO	UN	140,00	$ 575.989,00	$ 80.638.460,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISADOR MANUAL DIRECCIONABLE	UN	21,00	$ 401.202,00	$ 8.425.242,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.9.2.4	TUBERIA PARA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC RÍGIDO, BLINDADO, ENCHUFABLE, DE COLOR NEGRO, DE 16 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP547. INCLUYE ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES).	ML	1.324,18	$ 53.645,00	$ 71.035.636,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL REF: NFS-320. MARCA: NOTIFIER o SIMILAR	UN	1,00	$ 13.378.867,00	$ 13.378.867,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO RAWELT 2400 5 SALIDAS Ø 3/4" REF: RC-0391. MARCA: RAWELT O SIMILAR	UN	63,00	$ 156.804,00	$ 9.878.652,00	93,00	$ 14.582.772,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 .REF: TC-0416. MARCA: RAWELT O SIMILAR	UN	63,00	$ 15.712,00	$ 989.856,00	93,00	$ 1.461.216,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA	UN	121,00	$ 24.129,00	$ 2.919.609,00	121,00	$ 2.919.609,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3.9.2.9	LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	112,00	$ 691.856,00	$ 77.487.872,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 3.9.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE HUMO, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 728.927,52	$ -	721,00	$ 525.556.742,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA (SÓTANOS Y PLANTAS DE EMERGENCIA), INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 617.459,73	$ -	110,00	$ 67.920.570,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75199

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	8/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P. 3.9.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA SENSOR DE HUMO O TEMPERATURA, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 124.505,34	$ -	831,00	$ 103.463.938,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN STOPPER (PROTECTOR ACRILICO PARA ESTACIONES MANUALES Y EVITAR FALSAS ALARMAS), INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 1.145.567,03	$ -	53,00	$ 60.715.053,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE AISLAMIENTO DE FALLOS DE CORTO CIRCUITO EN EL LAZO DE DETECCION DE INCENDIO (UN MÓDULO POR PISO). INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 1.055.930,79	$ -	10,00	$ 10.559.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE MONITOREO (4 MÓDULOS POR PISO, VÁLVULAS OS&Y, SENSOR DE FLUJO). INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 728.421,61	$ -	40,00	$ 29.136.864,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE RELEVO (ENVIAR ELEVADORES AL PRIMER PISO EN CASO DE INCENDIO, PRESURICACIÓN DE ESCALERAS Y MENSAJES DE AUDIO EVACUACIÓN). INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 1.093.257,80	$ -	15,00	$ 16.398.867,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE CONTROL (DOS POR PISO, PARA CONTROLAR LA ACTIVACIÓN DEL LAS SIRENAS ESTROBO POR CADA PISO DE MANERA INDEPENDIENTE Y CONTROLAR LA EVACUACIÓN). INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 1.105.261,12	$ -	20,00	$ 22.105.222,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL COMPACTA DIRECCIONABLE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS 8 LAZOS DE 159 DETECTORES CADA UNO. 4000 EVENTOS. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 111.633.930,05	$ -	1,00	$ 111.633.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO. INCLUYE GABINETE Y ACCESORIOS DE MONTAJE. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 2.666.834,03	$ -	2,00	$ 5.333.668,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.20	SUMINISTRO DE FUENTES DE PODER AUXILIAR 8 AMPERIOS. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 17.910.112,14	$ -	2,00	$ 35.820.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍAS DE 12V - 18 AMPERIOS. PAQUETE POR DOS UNIDADES, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 2.814.073,67	$ -	1,00	$ 2.814.074,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍAS DE 12V - 7 AMPERIOS, PAQUETE POR DOS UNIDADES, INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 2.248.590,33	$ -	2,00	$ 4.497.181,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 3.9.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2400. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN		$ 24.389,41	$ -	1.356,00	$ 33.072.040,00	618,00	$ 15.072.655,00	0,00	$ -	618,00	$ 15.072.655,00	45,58
	SUBTOTAL				**$ 272.171.205,00**		**$ 1.047.991.278,00**		**$ 15.072.655,00**		**$ -**		**$ 15.072.655,00**	
	SUBTOTAL COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO				**$ 1.630.926.891,00**		**$ 3.982.286.770,00**		**$ 406.328.705,00**		**$ 328.232.268,00**		**$ 734.560.973,00**	
4	COMPONENTE ELECTRICO													
4,1	**DESMONTE Y REUBICACIÓN DE REDES**													
4.1.1	RETIRO DE LUMINARIA O REFLECTOR; INCLUYE ENTREGA EN PERIMETRO URBANO	UN	13,00	$ 59.654,00	$ 775.502,00	13,00	$ 775.502,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.1.2	RETIRO DE RED DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA (13.2 KV); INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	ML	29,60	$ 14.913,00	$ 441.425,00	29,60	$ 441.425,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.1.3	RETIRO DE RED DE BAJA TENSION O ALUMBRADO PUBLICO ABIERTA O TRENZADA; INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	ML	72,30	$ 7.457,00	$ 539.141,00	72,30	$ 539.141,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.1.4	RETIRO DE RED DE BAJA TENSION O ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRÁNEA; INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	ML	80,00	$ 8.948,00	$ 715.840,00	80,00	$ 715.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.1.5	DESMONTE DE ESTRUCTURA RED DE MEDIA TENSIÓN; INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	UN	1,00	$ 119.307,00	$ 119.307,00	1,00	$ 119.307,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.1.6	DESMONTE DE ESTRUCTURA RED DE BAJA TENSION O ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	UN	8,00	$ 89.481,00	$ 715.848,00	8,00	$ 715.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.1.7	DESMONTE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 112,5 KVA; INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	UN	1,00	$ 794.376,00	$ 794.376,00	1,00	$ 794.376,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.1.8	DESMONTE DE POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS; INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	UN	8,00	$ 266.020,00	$ 2.128.160,00	8,00	$ 2.128.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 6.229.599,00**		**$ 6.229.599,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4,2	**ACOMETIDA RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN**													
4.2.1	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	6,00	$ 1.170.574,00	$ 7.023.444,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.2	POSTE DE CONCRETO LINEA DE 16 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	$ 3.854.683,00	$ 3.854.683,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA NORMA CODENSA LA464 PARA 34,5 KV	UN	2,00	$ 1.169.122,00	$ 2.338.244,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.4	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METALICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (LA202)	UN	2,00	$ 437.758,00	$ 875.516,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75200

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyc.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conInterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conInterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4.2.5	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	ML	10,00	$ 11.055,00	$ 110.550,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.6	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 4/0 PARA RED COMPACTA EN 35KV	ML	10,00	$ 111.409,00	$ 1.114.090,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA NORMA CODENSA LA121 CON BAJANTE GALVANIZADA DE 6" - (TRANSICIÓN A CIRCUITO SUBTERRÁNEO 34.5KV CON SECCIONADORES TIPO CUCHILLA Y PARARRAYOS) - NO INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS	UN	1,00	$ 14.397.472,00	$ 14.397.472,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR PARA 34,5 KV, INCLUYE PARAMETRIZACIÓN DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE EMSA Y TRANSFORMADOR PARA SU FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 120.946.111,00	$ 120.946.111,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (3) DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA 35KV	UN	1,00	$ 2.875.927,00	$ 2.875.927,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.10	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN PARA RED DE MEDIA TENSIÓN SIMILAR A NORMA CODENSA CS207 PARA DOS DUCTOS PVC DE 6" - NO INCLUYE ROTURA DE VIA NI REPOSICIÓN	ML	556,10	$ 256.647,00	$ 142.721.397,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.11	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SIMILAR A NORMA CODENSA CS 280 PARA RED DE MEDIA TENSIÓN EN 34,5 KV	UN	14,00	$ 6.832.928,00	$ 95.660.992,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.12	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SIMILAR A NORMA CODENSA CS278 PARA RED DE MEDIA TENSIÓN EN 34,5 KV	UN	2,00	$ 4.773.251,00	$ 9.546.502,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED MEDIA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE XLPE – 35KV 4/0 AWG (133%) (TRES LINEAS)	ML	628,10	$ 979.810,00	$ 615.418.661,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR PARA 35 KV (JUEGO X 3 UNIDADES)	UN	7,00	$ 2.489.063,00	$ 17.423.441,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.15	INSTALACIÓN DE CELDA DUPLEX CON SECCIONADORES TRIPOLARES EN AIRE 35 KV, OPERACIÓN BAJO CARGA, DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS 519-5, INCLUYE FUSIBLES TIPO HH DE 50A (6) - EN CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 1.361.103,00	$ 1.361.103,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.16	INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA PARA MEDIA TENSIÓN (35KV) EN 3 ELEMENTOS INCLUYE TC'S Y TP'S, BORNERA, Y MEDIDOR ELECTRONICO BIDIRECCIONAL DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE327	UN	1,00	$ 1.361.103,00	$ 1.361.103,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.17	INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800KVA A 35KV - DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS518-2	UN	1,00	$ 788.394,00	$ 788.394,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.18	INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 600KVA A 35KV - DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS518-2	UN	1,00	$ 788.394,00	$ 788.394,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.19	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA CLASE H, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34500/460-266V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, INCLUYE DPS A INSTALAR EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, RIELES DE PISO, BASE PARA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 1.387.253,00	$ 1.387.253,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.20	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 600 KVA CLASE H, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34500/214-124V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, INCLUYE DPS A INSTALAR EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, RIELES DE PISO, BASE PARA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 1.387.253,00	$ 1.387.253,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y TABLEROS. INCLUYE 10 VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" X 2,4M, 78 METROS DE CABLE 2/0 COBRE DESNUDO, SOLDADURA EXOTERMICA, TERMINALES DE PONCHAR, PLATINA DE COBRE, DUCTO PVC DE 1" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ACUERDO A PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO	UN	1,00	$ 11.080.452,00	$ 11.080.452,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.22	INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA DE 600 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE - TENSIÓN DE SALIDA 214V FASE - FASE - INCLUYE DUCTO METALICO DE ESCAPE AUTOSOPORTADO DE 10" CON LENGUETA DE ESCAPE	UN	1,00	$ 2.417.483,00	$ 2.417.483,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.23	INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 800 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE - TENSIÓN DE SALIDA 460V FASE - FASE - INCLUYE DUCTO METALICO DE ESCAPE AUTOSOPORTADO DE 10" CON LENGUETA DE ESCAPE	UN	1,00	$ 2.417.483,00	$ 2.417.483,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.24	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	1.112,20	$ 10.951,00	$ 12.179.702,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.2.25	MEZCLA ASFALTICA RECICLADA EN CALIENTE DE TIPO MDC-25 PARA BACHEO	M3	27,81	$ 224.785,00	$ 6.251.271,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 1.075.326.921,00		$ -		$ -		$ -		$ -	

7520/

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,3	RED BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS PRINCIPALES													
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA SOPORTADA EN TECHO DE 1600A - 130X170MM ALUMINIO PARA ACOMETIDA GENERAL TRANSFORMADOR - GABINETE GENERAL RED NORMAL SISTEMA DE 460V; INCLUYE UNIDAD ALIMENTACIÓN TRANSICIÓN ELECTROBARRA A CABLE, TRENZAS FLEXIBLES PARA CONEXIÓN, ANGULOS VERTICALES 2000A (2), ANGULOS HORIZONTALES 200A (2), SECCIONES DE 3 METROS (3), SECCIONES DE 1,5 METROS (1) Y ACCESORIOS DE SOPORTE	UN	1,00	$ 108.191.732,00	$ 108.191.732,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA SOPORTADA EN TECHO DE 1600A - 130X170MM ALUMINIO PARA ACOMETIDA GENERAL PLANTA DE EMERGENCIA - GABINETE GENERAL PLANTA SISTEMA DE SISTEMA DE 460V; INCLUYE UNIDAD ALIMENTACIÓN TRANSICIÓN ELECTROBARRA A CABLE, TRENZAS FLEXIBLES PARA CONEXIÓN, ANGULOS VERTICALES 2000A (2), ANGULOS HORIZONTALES 200A (2), SECCIONES DE 3 METROS (2), SECCIONES DE 1,5 METROS (1) SECCIONES DE 1 METRO (1), BARRERRA CORTAFUEGO (1) Y ACCESORIOS DE SOPORTE	UN	1,00	$ 106.798.229,00	$ 106.798.229,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA SOPORTADA EN TECHO DE 2000A - 130X220MM ALUMINIO PARA ACOMETIDA GENERAL TRANSFORMADOR - GABINETE GENERAL RED NORMAL SISTEMA DE 214V; INCLUYE UNIDAD ALIMENTACIÓN TRANSICIÓN ELECTROBARRA A CABLE, TRENZAS FLEXIBLES PARA CONEXIÓN, ANGULOS VERTICALES 2000A (2), SECCIONES DE 1,5 METROS (1) Y ACCESORIOS DE SOPORTE	UN	1,00	$ 47.891.254,00	$ 47.891.254,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA SOPORTADA EN TECHO DE 2000A - 130X220MM ALUMINIO PARA ACOMETIDA GENERAL PLANTA EMERGENCIA - GABINETE GENERAL PLANTA SISTEMA DE 214V; INCLUYE UNIDAD ALIMENTACIÓN TRANSICIÓN ELECTROBARRA A CABLE, TRENZAS FLEXIBLES PARA CONEXIÓN, ANGULOS VERTICALES 2000A (2), ANGULOS HORIZONTALES 2000A (2), SECCIONES DE 3 METROS (6), SECCIONES DE 1,5 METROS (1), SECCIONES DE 1 METRO (1), BARRERRA CORTAFUEGO (2) Y ACCESORIOS DE SOPORTE	UN	1,00	$ 214.211.246,00	$ 214.211.246,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 60X60 PARA ACOMETIDA RED CONTRA INCENDIOS	UN	3,00	$ 408.689,00	$ 1.226.067,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 3" PARA ACOMETIDA SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE E INSTALACIÓN	ML	48,40	$ 316.762,00	$ 15.331.281,00	48,40	$ 15.331.281,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRANSFERENCIA RED CONTRA INCENDIOS - GABINETE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO RED CONTRA INCENDIOS EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X350MCM+1/0T	ML	60,90	$ 875.211,00	$ 53.300.350,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 225KVA - 460V (RED CONTRA INCENDIOS), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,6M X1,0M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 300 AMPERIOS A 460V CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACION, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 30.384.333,00	$ 30.384.333,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL SISTEMA BOMBEO RED CONTRA INCENDIOS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFASICO DE 25X5MM (350 AMPERIOS), UN BREAKER DE 3X300A - 460V ICU 50KA SOLO MAGNETICO, UN BREAKER DE 3X30A - 460V ICU 50KA SOLO MAGNETICO Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 7.831.435,00	$ 7.831.435,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 3" POR PLACA O MURO - BOMBA RED CONTRA INCENDIOS	ML	3,10	$ 46.582,00	$ 144.404,00	146,00	$ 6.800.972,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO - BOMBA JOCKEY Y SEÑAL PARA TANQUE	ML	7,50	$ 11.378,00	$ 85.335,00	51,00	$ 580.278,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3" SOBREPUESTA BOMBAS RCI: INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	1,50	$ 80.873,00	$ 121.310,00	5,00	$ 404.365,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1" SOBREPUESTA BOMBAS RCI, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	1,50	$ 23.016,00	$ 34.524,00	3,00	$ 69.048,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTROBOMBA RED CONTRA INCENDIOS - EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X350MCM+1/0T	ML	6,10	$ 875.211,00	$ 5.338.787,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL ELECTROBOMBA JOCKEY EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X12+12T	ML	5,50	$ 30.129,00	$ 165.710,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SEÑAL BOMBAS SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS, ENCAUCHETADO 3X16	ML	9,50	$ 14.237,00	$ 135.252,00	150,00	$ 2.135.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

25202

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	5/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL RED NORMAL UNO 460V, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1.8M X 1.2M X 0,4M, BARRAJE TRIFASICO DE 80X10MM (1380 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3X1200A - 460V ICU70KA, UN(1) BREAKER DE 3X630A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X400A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X300A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X70A - 460V ICU 70KA, DPS CLASE I+II DE 70KA - 460V. ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 30.764.106,00	$ 30.764.106,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL PLANTA 460V, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFASICO DE 80X10MM (1380 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X630A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X400A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X70A - 460V ICU 70KA, DPS CLASE I+II DE 70KA - 460V, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 20.429.497,00	$ 20.429.497,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL RED NORMAL 214V, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFASICO DE 160X10MM (2500 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3X1800A ICU70KA, UN(1) BREAKER DE 3X800A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X630A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X400A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X200A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X170A ICU50KA, UN(1) BREAKER DE 3X50A ICU 70KA, DPS CLASE I+II DE 70KA - 214V. ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 41.633.245,00	$ 41.633.245,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL PLANTA 214V, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFASICO DE 160X10MM (2500 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X800A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X630A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X400A, UN(1) BREAKER DE 3X170A ICU50KA, UN(1) BREAKER DE 3X50A ICU 70KA, DPS CLASE I+II DE 70KA - 214V. ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 29.708.769,00	$ 29.708.769,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P.4.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS DE 220V (TGA-2), SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 334.832.799,57	$ -	1,00	$ 334.832.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.4.3.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE PLANTA DE 220V, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 317.532.899,95	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.4.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS DE 440V (TGA-1), SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 88.852.569,57	$ -	1,00	$ 88.852.570,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.4.3.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES A 440V, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 89.000.247,54	$ -	1,00	$ 89.000.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.4.3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES A 208V, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 72.584.992,56	$ -	1,00	$ 72.584.993,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 713.726.866,00**		**$ 610.592.105,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4,4	**TABLEROS, TRANSFERENCIAS Y ACOMETIDAS PRINCIPALES SISTEMA A 460V**													
4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 6" POR PLACA O MURO - ACOMETIDA PRINCIPAL AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS PRINCIPALES (TRANSFERENCIA Y TABLERO)	ML	9,00	$ 200.061,00	$ 1.800.549,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS PRINCIPALES (TRANSFERENCIA Y TABLERO) EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2x(3X500MCM+500MCM(N))+3/0T	ML	15,00	$ 2.764.915,00	$ 41.473.725,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 500KVA - 460V (AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS PRINCIPALES), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1.8M X1.0M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 630 AMPERIOS A 460V CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 44.176.042,00	$ 44.176.042,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

25203

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvz.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	interventorhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conintechospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 19/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL A.A. EQUIPOS PRINCIPALES, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1.2M X 0.8M X 0.4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 60X5MM (740 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X400A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X300A - 460V ICU 50KA, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 14.631.855,00	$ 14.631.855,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 60X60 PARA ACOMETIDAS PARCIAL GABINETE AIRES ACONDICIONADOS EN TERRAZA -	UN	6,00	$ 408.589,00	$ 2.452.134,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 4" POR CIELO FALSO O BUITRON TABLEROS A.A. EN TERRAZA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	66,90	$ 168.202,00	$ 11.252.714,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TABLEROS AIRES ACONDICIONADOS EN TERRAZA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X500MCM+1/0T	ML	80,40	$ 1.084.711,00	$ 87.210.764,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A. EN TERRAZA (1), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 25X5MM (350 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3x300A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X170A - 460V ICU 50KA, TRES(3) BREAKER DE 3X40A - 460V ICU 50KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXION Y MONTAJE	UN	1,00	$ 9.482.324,00	$ 9.482.324,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO A.A. EN TERRAZA (2), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 40X5MM (515 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3x400A - 460V ICU 50KA, DOS(2) BREAKER DE 3X170A - 460V ICU 50KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXION Y MONTAJE	UN	1,00	$ 11.186.643,00	$ 11.186.643,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 3" POR PLACA O MURO - EQUIPOS A.A. EN TERRAZA	ML	26,30	$ 46.582,00	$ 1.225.107,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO - EQUIPOS A.A. EN TERRAZA	ML	38,00	$ 11.378,00	$ 432.364,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3" SOBREPUESTA EQUIPOS A.A. EN TERRAZA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	4,50	$ 80.873,00	$ 363.929,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE 1" SOBREPUESTA EQUIPOS A.A. EN TERRAZA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	4,50	$ 23.016,00	$ 103.572,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EQUIPOS CHILLER - EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2/0+2T	ML	33,80	$ 316.098,00	$ 10.684.112,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BOMBAS CENTRIFUGAS EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X6+6T	ML	39,50	$ 94.815,00	$ 3.745.193,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 4" POR PLACA O MURO - ACOMETIDA PRINCIPAL EQUIPOS A 460V (TRANSFERENCIA Y TABLERO)	ML	9,40	$ 102.079,00	$ 959.543,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EQUIPOS NO ESENCIALES (TRANSFERENCIA Y TABLERO) EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X500MCM+500MCM(N))+1/0T	ML	16,90	$ 1.409.305,00	$ 23.817.255,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 300KVA - 460V (EQUIPOS NO ESENCIALES), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,2M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 400 AMPERIOS A 460V CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 32.655.935,00	$ 32.655.935,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EQUIPOS NO ESENCIALES, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 50X5MM (515 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X125A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X70A - 460V ICU 50KA, TRES(3) BREAKER DE 3X63A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X50A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X30A - 460V ICU 50KA, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXION Y MONTAJE	UN	1,00	$ 13.987.393,00	$ 13.987.393,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 400X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - RED EQUIPOS NO ESENCIALES	ML	35,00	$ 198.051,00	$ 6.931.785,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 200X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - ACOMETIDA RESONADOR	ML	10,00	$ 181.997,00	$ 1.819.970,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 40X40 PARA ACOMETIDAS EQUIPOS ESPECIALES - PRIMER PISO	UN	4,00	$ 353.019,00	$ 1.412.076,00	8,00	$ 2.824.152,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.4.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 40X40 PARA ACOMETIDAS GABINETES DE BOMBEO - SOTANO DOS	UN	2,00	$ 353.019,00	$ 706.038,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

2304

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	5/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyc.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	
4.4.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OCHO DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS NO ESENCIALES	ML	4,50	$ 261.187,00	$ 1.175.342,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS NO ESENCIALES	ML	20,40	$ 135.288,00	$ 2.759.875,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS NO ESENCIALES	ML	27,80	$ 94.595,00	$ 2.629.741,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS NO ESENCIALES	ML	38,80	$ 65.548,00	$ 2.543.262,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT 2 DUCTOS DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDAS GABINETES EQUIPOS DE BOMBEO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	30,90	$ 181.365,00	$ 5.604.179,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDAS GABINETES EQUIPOS DE BOMBEO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	12,50	$ 108.933,00	$ 1.361.663,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2/0+2/0N+4T	ML	25,30	$ 383.984,00	$ 9.714.795,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2+2N+8T	ML	141,20	$ 225.374,00	$ 31.822.809,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2X4+4N+8T	ML	41,60	$ 127.992,00	$ 5.324.467,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X4+4N+8T	ML	90,16	$ 161.397,00	$ 14.541.870,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3X50A - 460V ICU 50KA, TRES(3) BREAKER DE 3X20A - 460V ICU 50KA, UN(1) MINIBREAKER DE 2X6A - 460V ICU 10KA, TRES(3) CONJUNTOS ARRANCADOR COMPACTO PARA BOMBA DE 10HP - 460V ACCIONADOS POR PLC, UN(1) PLC PARA CONTROL EQUIPOS DE BOMBEO Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 22.203.977,00	$ 22.203.977,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFASICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3X30A - 460V ICU 50KA, DOS(2) BREAKER DE 3X20A - 460V ICU 50KA, DOS(2) CONJUNTOS ARRANCADOR COMPACTO PARA BOMBA DE 10HP - 460V ACCIONADOS POR FLOTADOR Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 17.239.734,00	$ 17.239.734,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO -	ML	23,40	$ 11.378,00	$ 266.245,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 30X30 PARA ACOMETIDA BOMBA AGUAS LLUVIA	UN	4,00	$ 334.872,00	$ 1.339.488,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1" SOBREPUESTA ACOMETIDA BOMBA AGUAS LLUVIA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	54,00	$ 63.523,00	$ 3.430.242,00	54,00	$ 3.430.242,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1" SOBREPUESTA BOMBAS, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	6,00	$ 23.016,00	$ 138.096,00	6,00	$ 138.096,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X12+12T	ML	27,60	$ 30.129,00	$ 831.560,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X10+10T	ML	65,90	$ 41.904,00	$ 2.761.474,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SEÑAL BOMBAS. ENCAUCHETADO 3X16	ML	79,50	$ 14.237,00	$ 1.131.842,00	50,00	$ 711.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 4" POR PLACA O MURO	ML	1,80	$ 102.079,00	$ 183.742,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X350MCM+1/0T	ML	4,80	$ 875.211,00	$ 4.201.013,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.4.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES A 460V DE NUEVE (9) PASOS AUTOMATICOS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,0M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 25X5MM (350 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X63A - 460V ICU50KA, CUATRO (4) BREAKER DE 3X40A - 460V ICU 50KA, CUATRO(4) BREAKER DE 3X20A - 460V ICU50KA, UN(1) MINIBREAKER DE 2X8A - 460V ICU 10KA, UN(1) CONTACTOR DE 70A EN AC3 ACCIONADO POR PLC, CUATRO (4) CONTACTORES DE 50A EN AC3 ACCIONADOS POR PLC, CUATRO CONTACTORES DE 30A ACCIONADOS POR PLC, UN (1) CONDENSADOR DE 30 KVAR - 460V, CUATRO(4) CONDENSADORES DE 20KVAR - 460V, CUATRO CONDENSADORES DE 10KVAR- 460V, UN(1) MODULO DE CONTROL PARA BANCO DE CONDENSADORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXION Y MONTAJE	UN	1,00	$ 26.355.231,00	$ 26.355.231,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	

75201

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyt.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	corinterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	corinterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
	DESCRIPCION	UNO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	ITEMS NO PREVISTOS					CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P. 4.4.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X2/0+2/0N+2T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 729.815,49	$ -	15,00	$ 10.947.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.4.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X2+2N+6T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 346.984,36	$ -	310,00	$ 107.565.152,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.4.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2(3X250MCM+1X250MCM-NI+1X1/0T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 2.371.284,03	$ -	50,00	$ 118.564.202,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.4.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X6+6N+8T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 161.094,62	$ -	172,00	$ 27.708.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.4.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA RCI - 300A, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 47.164.952,14	$ -	1,00	$ 47.164.952,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.4.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA EQUIPOS MEDICOS - 400A, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 43.439.181,14	$ -	1,00	$ 43.439.181,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.4.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA EQUIPOS DE BOMBEO - 100A, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 30.627.326,05	$ -	1,00	$ 30.627.326,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.4.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPOS DE BOMBEO, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 45.057.162,14	$ -	1,00	$ 45.057.162,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.4.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPOS MEDICOS, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 59.524.484,91	$ -	1,00	$ 59.524.485,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL													
4,5	TABLEROS, TRANSFERENCIAS Y ACOMETIDAS PRINCIPALES SISTEMA A 214V				$ 480.071.669,00		$ 497.702.307,00		$ -		$ -		$ -	
4,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 6" POR PLACA O MURO	ML	37,60	$ 200.061,00	$ 7.522.294,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3x(3X500MCM+500MCM(N))+3/0T	ML	43,60	$ 4.078.206,00	$ 177.809.782,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 300KVA (RED EMERGENCIA UNO), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,0M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 800 AMPERIOS CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACION, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 43.861.849,00	$ 43.861.849,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EMERGENCIA UNO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 50X10MM (920 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X125A - ICU 50KA, DOS(2) BREAKER DE 3X100A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X80A ICU 50KA, SEIS(6) BREAKER DE 3X70A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X63A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X40A ICU 50KA, TRES(3) BREAKER DE 3X30A ICU 50KA, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXION Y MONTAJE	UN	1,00	$ 20.901.830,00	$ 20.901.830,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDA TABLERO RED REGULADA UNO	ML	2,20	$ 94.595,00	$ 208.109,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DOS DUCTOS DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDA TABLERO RED REGULADA UNO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	6,40	$ 181.365,00	$ 1.160.736,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDA UPS UNO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	5,60	$ 108.933,00	$ 610.025,00	171,00	$ 18.627.543,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2/0+2/0N+4T	ML	26,10	$ 383.984,00	$ 10.021.982,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED REGULADA UNO, INCLUYE GABINETE METÁLICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFASICO DE 15X2MM (140 AMPERIOS), DOS (2) BREAKER DE 3X125A ICU 50KA, CUATRO (4) BREAKER DE 3X30A ICU 25KA, CINCO (5) BREAKER DE 1X30A ICU 25KA, CONMUTABLE DE TRES POSICIONES DE 3X125 AMPERIOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 9.543.067,00	$ 9.543.067,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75206

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UNO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA DE 60 KVA - RED REGULADA - INCLUYE BANCO DE BATERIAS PARA RESPALDO DE 30 MINUTOS	UN	2,00	$ 184.670.190,00	$ 369.340.380,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 4" POR PLACA O MURO - ACOMETIDA TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DOS (TRANSFERENCIA Y TABLERO)	ML	10,90	102.079,00	$ 1.112.661,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 4" POR CIELO FALSO O BUITRON- ACOMETIDA TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DOS, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	14,00	168.202,00	$ 2.354.828,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2x(3X500MCM+500MCM(N))+3/0T	ML	29,90	2.764.915,00	$ 82.670.959,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 225KVA (RED EMERGENCIA DOS), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,2M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 600 AMPERIOS CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACION Y MONTAJE	UN	1,00	43.530.210,00	$ 43.530.210,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EMERGENCIA DOS INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X630A ICU 50KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 30X10MM (660 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X125A - ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X80A ICU 50KA, CUATRO(4) BREAKER DE 3X70A ICU 50KA, DOS(2) BREAKER DE 3X63A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X50A ICU 70KA, DOS(2) BREAKER DE 3X50A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X30A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X20A ICU 50KA, DPS CLASE II DE 70KA - 214V, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	19.804.200,00	$ 19.804.200,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED REGULADA DOS, INCLUYE GABINETE METÁLICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 15X2MM (140 AMPERIOS), DOS (2) BREAKER DE 3X125A ICU 50KA, DOS(2) BREAKER DE 3X40A ICU 25KA, TRES (3) BREAKER DE 3X30A ICU 25KA, TRES (3) BREAKER DE 1X30A ICU 25KA, CONMUTABLE DE TRES POSICIONES DE 3X125 AMPERIOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	9.792.782,00	$ 9.792.782,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 4" POR PLACA O MURO -	ML	14,00	102.079,00	$ 1.429.106,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X500MCM+500MCM(N))+2/0T	ML	26,50	1.410.739,00	$ 37.384.584,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 125KVA (EQUIPOS MENORES A.A.), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,2M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE350 AMPERIOS CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	32.655.935,00	$ 32.655.935,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPOS MENORES A.A. INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFASICO DE 40X5MM (515 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X125A - ICU 50KA, CUATRO(4) BREAKER DE 3X50A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X40A ICU 50KA, CUATRO(4) BREAKER DE 3X30A ICU 50KA, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	15.716.883,00	$ 15.716.883,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 400X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - RED TABLEROS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	60,00	198.051,00	$ 11.883.060,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1 1/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - TABLEROS EQUIPOS MENORES A.A	ML	123,20	88.762,00	$ 10.935.478,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X8+8N+8T	ML	97,50	75.676,00	$ 7.378.410,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X4+4N+8T	ML	23,80	161.397,00	$ 3.841.249,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN SOTANO DOS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X50A ICU 25KA, BARRAJE TRIFASICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), SEIS (6) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	5.291.537,00	$ 5.291.537,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75207

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cya.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
								CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	
4.5.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN SOTANO UNO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X50A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), SEIS (6) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 5.716.568,00	$ 5.716.568,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN PRIMER PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X50A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), CUARENTA Y CUATRO (44) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 10.548.296,00	$ 10.548.296,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN SEGUNDO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X50A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), DOS (2) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA, CATORCE (14) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 6.279.552,00	$ 6.279.552,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE,TABLERO A.A Y VENTILACIÓN TERCER PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), QUINCE (15) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 5.701.612,00	$ 5.701.612,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN CUARTO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), TRECE (13) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 5.479.343,00	$ 5.479.343,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN QUINTO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), VENTIUN (21) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 6.513.877,00	$ 6.513.877,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN SEXTO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), VENTICUATRO (24) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 6.847.281,00	$ 6.847.281,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN SEPTIMO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X40A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA, DIECISEIS (16) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 6.337.781,00	$ 6.337.781,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN OCTAVO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X125A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 14X2MM (140 AMPERIOS), DOS(2) BREAKER DE 3X40A ICU 25KA, ONCE (11) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 7.277.853,00	$ 7.277.853,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 2" POR PLACA O MURO ACOMETIDA TABLERO GENERAL RED VITAL (TRANSFERENCIA Y TABLERO)	ML	24,20	$ 21.768,00	$ 526.786,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL RED VITAL (TRANSFERENCIA Y TABLERO) EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2/0+2/0N+4T	ML	31,70	$ 383.984,00	$ 12.172.293,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 75KVA (RED EMERGENCIA DGS), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1.8M X1.0M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 200 AMPERIOS CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SENALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 30.724.407,00	$ 30.724.407,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
4.5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED VITAL, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 30X10MM (220 AMPERIOS), ONCE (11) BREAKER DE 3X30A ICU 50KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXION Y MONTAJE	UN	1,00	$ 12.719.045,00	$ 12.719.045,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS														
N.P. 4.5.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA DE 800 A DESDE TRANFERENCIA DE RED DE EMERGENCIA 2 POR LA VERTICAL DE CUARTOS TECNICOS, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 242.489.330,37	$ -	1,00	$ 242.489.330,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	

75208

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	8/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P. 4.5.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE FLEXIBLE DE 800 A, DE TRABSFERENCIA DE RED DE EMERGENCIA 2 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 2.930.949,88	$ -	10,00	$ 29.309.499,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACÓN TIPO PLUG-IN DESDE 32A HASTA 100A (INCLUYE BREAKER Y MANDO ROTATIVO).	UN	-	$ 9.598.425,36	$ -	26,00	$ 249.559.059,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACÓN TIPO PLUG-IN DESDE 100A HASTA 200A (INCLUYE BREAKER Y MANDO ROTATIVO).	UN	-	$ 11.879.422,81	$ -	3,00	$ 35.638.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACÓN TIPO PLUG-IN DESDE 200A HASTA 400A (INCLUYE BREAKER Y MANDO ROTATIVO).	UN	-	$ 14.883.359,67	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PORTACABLES DE 30 CMS X 10 CMS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 331.144,40	$ -	800,00	$ 264.915.384,00	551,00	$ 182.460.564,00	0,00	$ -	551,00	$ 182.460.564,00	68,88
N.P. 4.5.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PORTACABLES DE 20 CMS X 10 CMS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 256.869,27	$ -	770,00	$ 197.789.338,00	480,00	$ 123.297.250,00	0,00	$ -	480,00	$ 123.297.250,00	62,34
N.P. 4.5.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 10(3X500MCM+1X500MCM-N)+2X350T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 23.888.860,83	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2(3X1/0 AWG+2/0 AWG-N)+1/0T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 1.154.769,17	$ -	90,00	$ 103.929.225,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2(3X2/0 AWG+2/0 AWG-N)+1X2T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 1.268.598,38	$ -	55,00	$ 69.772.911,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2(3X350 MCM+1X350 MCM-N)+1X2/0T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 3.204.257,33	$ -	50,00	$ 160.212.867,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2(3X4/0 AWG+ 4/0 AWG -N)+1/0T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 2.015.260,78	$ -	50,00	$ 100.763.039,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2X10 + 10 -N + 10T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 64.297,92	$ -	350,00	$ 22.504.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3(3X500MCM+1X500MCM-N)+1X4/0T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 7.026.581,76	$ -	35,00	$ 245.930.362,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X 1/0 AWG + 1/0 AWG-N + 4T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 560.170,08	$ -	21,00	$ 11.763.572,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X10 AWG + 10 AWG-N +10T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 80.264,13	$ -	140,00	$ 11.236.978,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X 2/0 AWG + 2/0 AWG-N + 4T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 741.552,42	$ -	497,00	$ 368.551.553,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X 2 AWG +1/0 AWG-N + 2T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 485.279,80	$ -	15,00	$ 7.279.197,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X 4 AWG + 4 AWG-N + 8T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 228.439,91	$ -	168,00	$ 38.377.905,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 4(3X500MCM +1X500MCM-N)+1X4/0T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 9.751.771,80	$ -	51,50	$ 502.216.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 500 LSZH, PARA CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 656.433,95	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4/0 LSZH, PARA CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 255.932,07	$ -	55,00	$ 14.076.264,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2/0 LSZH, PARA CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 172.852,92	$ -	25,00	$ 4.321.323,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA ELÉCTRICA DE BAJA TENSION TIPO CAMARA TECNICA PARA ACOMETIDA DE LOS EQUIPOS DE PRESION, CON MARCO Y TAPA E INCLUYE ADECUACION COMPLETA PARA INSTALACION ELECTRICA	UN	-	$ 3.456.743,88	$ -	6,00	$ 20.740.463,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.5.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN ELECTRICA EN TUBERIA PVC DE 2X2" PARA BOMBAS. INCLUYE OBRAS CIVILES DE EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACIÓN MANUAL.	ML	-	$ 122.523,74	$ -	35,00	$ 4.288.331,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75209

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conginterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conginterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACION:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	%
	SUBTOTAL				$ 1.043.606.630,00		$ 2.724.292.931,00		$ 305.757.814,00		$ -		$ 305.757.814,00	
4,6	ACOMETIDAS, TABLEROS PARCIALES E INSTALACIONES INTERNAS RED EMERGENCIA													
4,6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 400X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - RED DE EMERGENCIA	ML	60,00	$ 198.051,00	$ 11.883.060,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 400X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - RED DE EMERGENCIA - REGULADA	ML	60,00	$ 198.051,00	$ 11.883.060,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 30X30 PARA ACOMETIDAS PARCIALES ASCENSORES	UN	10,00	$ 334.872,00	$ 3.348.720,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT 4 DUCTOS DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDAS GABINETES ASCENSORES; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	48,00	$ 342.566,00	$ 16.443.168,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDAS GABINETES ASCENSORES; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	229,10	$ 108.933,00	$ 24.956.550,00	30,10	$ 3.278.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X1/0+1/0N+4T	ML	406,90	$ 375.266,00	$ 152.695.735,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL ASCENSORES, INCLUYE GABINETE METALCO DE 0.6M X 0.6M X 0.3M CON SELECTOR DE BLOQUEO PARA MANTENIMIENTO, BARRAJE (NEUTRO Y TIERRA) DE 12X2MM (110 AMPERIOS), BREAKER DE 3X70A ICU 25KA, Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXION Y MONTAJE	UN	6,00	$ 3.363.140,00	$ 20.178.840,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 30X30 PARA ACOMETIDAS PARCIALES RED NORMAL Y REGULADA	UN	35,00	$ 334.872,00	$ 11.720.520,00	21,00	$ 7.032.312,00	8,00	$ 2.678.976,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.678.976,00	38,10
4,6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1 1/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - TABLEROS EMERGENCIA Y REGULADOS	ML	95,80	$ 80.802,00	$ 7.740.632,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO -	ML	11,90	$ 11.378,00	$ 135.398,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 1 1/4" POR CIELO FALSO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - RED DE EMERGENCIA	ML	644,30	$ 58.994,00	$ 38.009.834,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - RED EMERGENCIA SEPTIMO PISO SFV	ML	52,80	$ 94.595,00	$ 4.994.616,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X8+8N+8T	ML	346,40	$ 75.676,00	$ 26.214.166,00	358,00	$ 27.092.008,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2+2N+8T	ML	88,10	$ 225.374,00	$ 19.855.449,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X6+6N+8T	ML	14,20	$ 107.535,00	$ 1.526.997,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X4+4N+8T	ML	335,20	$ 161.397,00	$ 54.100.274,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 1X8+8N+8T	ML	156,10	$ 47.254,00	$ 7.376.349,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X1/0+6T	ML	65,70	$ 278.609,00	$ 18.304.611,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X30A ICU 25KA	UN	3,00	$ 1.530.957,00	$ 4.592.871,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X100A ICU 25KA	UN	2,00	$ 2.582.402,00	$ 5.164.804,00	1,00	$ 2.582.402,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X40A ICU 25KA	UN	1,00	$ 1.625.945,00	$ 1.625.945,00	14,00	$ 22.763.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X63A ICU 25KA	UN	3,00	$ 2.015.788,00	$ 6.047.364,00	7,00	$ 14.110.516,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X80A ICU 25KA	UN	1,00	$ 2.316.939,00	$ 2.316.939,00	5,00	$ 11.584.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X80A ICU 25KA	UN	1,00	$ 2.015.788,00	$ 2.015.788,00	3,00	$ 6.047.364,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X70A ICU 25KA	UN	2,00	$ 2.316.939,00	$ 4.633.878,00	1,00	$ 2.316.939,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X60A ICU 25KA	UN	2,00	$ 1.650.852,00	$ 3.301.704,00	1,00	$ 1.650.852,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X70A ICU 25KA	UN	2,00	$ 2.015.788,00	$ 4.031.576,00	4,00	$ 8.063.152,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 8 CIRCUITOS	UN	1,00	$ 664.728,00	$ 664.728,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL RED REGULADA DE 8 CIRCUITOS	UN	7,00	$ 664.728,00	$ 4.653.096,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75210

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	5/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyc.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4.6.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL RED REGULADA DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X30A ICU 25KA	UN	9,00	$ 1.530.957,00	$ 13.778.613,00	2,00	$ 3.061.914,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL RED REGULADA DE 4 CIRCUITOS	UN	1,00	$ 519.720,00	$ 519.720,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL RED REGULADA DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X40A ICU 25KA	UN	1,00	$ 1.990.881,00	$ 1.990.881,00	1,00	$ 1.990.881,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 25X25 - TOMAS NORMALES Y REGULADAS	UN	46,00	$ 301.582,00	$ 13.872.772,00	28,00	$ 8.444.296,00	17,00	$ 5.126.894,00	0,00	$ -	17,00	$ 5.126.894,00	60,71
4.6.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1" PARA TOMA CORRIENTE NORMAL Y REGULADA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	166,40	$ 68.272,00	$ 11.360.461,00	517,00	$ 35.296.624,00	166,38	$ 11.359.095,00	0,00	$ -	166,38	$ 11.359.095,00	32,18
4.6.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" PARA TOMA CORRIENTE NORMAL Y REGULADA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	522,20	$ 53.867,00	$ 28.129.347,00	6.850,00	$ 368.988.950,00	2.758,00	$ 148.565.186,00	0,00	$ -	2.758,00	$ 148.565.186,00	40,26
4.6.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 3/4" POR CIELO FALSO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - TOMA CORRIENTES NORMALES Y REGULADAS	ML	816,90	$ 39.871,00	$ 32.570.620,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO	ML	148,60	$ 11.378,00	$ 1.690.771,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TOMAS EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 1X12+12N+12T	ML	737,70	$ 23.230,00	$ 17.136.771,00	15.177,70	$ 352.577.971,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN DUCTERIA PVC (INCRUSTADA EN MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	1.024,00	$ 165.755,00	$ 169.733.120,00	904,00	$ 149.842.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL MONOFÁSICA 20A EN DUCTERIA PVC (INCRUSTADA EN MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12 - CUARTO PISO	UN	5,00	$ 204.858,00	$ 1.024.290,00	5,00	$ 1.024.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN DUCTERIA EMT (A LA VISTA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	18,00	$ 284.969,00	$ 5.129.442,00	27,00	$ 7.694.163,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARATOMACORRIENTE TIPO GFCI EN DUCTERIA PVC (INCRUSTADA EN MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	71,00	$ 255.411,00	$ 18.134.181,00	109,00	$ 27.839.799,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SIN TOMA (FLUXOMETRO) EN DUCTERIA PVC (INCRUSTADA EN MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	92,00	$ 147.180,00	$ 13.540.560,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARATOMACORRIENTE REGULADA EN DUCTERIA EMT 3/4" (A LA VISTA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12 -	UN	5,00	$ 398.048,00	$ 1.990.240,00	61,00	$ 24.289.928,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARATOMACORRIENTE REGULADA EN DUCTERIA PVC 3/4" (INCRUSTADA EN MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12 - SOTANO DOS	UN	372,00	$ 251.570,00	$ 93.584.040,00	330,00	$ 83.018.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN DUCTERIA EMT (POR MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	192,00	$ 274.729,00	$ 52.747.968,00	111,00	$ 30.494.919,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN DUCTERIA EMT (POR MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	42,00	$ 343.225,00	$ 14.415.450,00	13,00	$ 4.461.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.6.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO EN DUCTERIA EMT (POR MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	183,00	$ 396.977,00	$ 72.646.791,00	121,00	$ 48.034.217,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 4.6.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA RED DE EMERGENCIA 1, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 142.497.352,68	$ -	1,00	$ 142.497.353,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA RED DE EMERGENCIA 2, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 100.754.707,11	$ -	1,00	$ 100.754.707,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO RED DE EMERGENCIA 1 (TGD-RE1), SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 24.981.103,86	$ -	1,00	$ 24.981.104,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO RED DE EMERGENCIA 2 (TGD-RE2), SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 24.981.103,86	$ -	1,00	$ 24.981.104,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BY PASS 1, 50KVA A 220V, DE PISO 1, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 27.532.936,32	$ -	1,00	$ 27.532.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BY PASS 2, 50KVA A 220V, DE PISO 4, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 27.532.936,32	$ -	1,00	$ 27.532.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 50 KVA - RED REGULADA - INCLUYE BANCO DE BATERIAS PARA RESPALDO DE 30 MINUTOS	UN	-	$ 361.129.347,36	$ -	2,00	$ 722.258.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

7521

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cva.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conjinterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conjinterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P. 4.6.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA DE 1600 A DESDE TRANSFERENCIA DE RED DE EMERGENCIA 1 POR LA VERTICAL DE CUARTOS TECNICOS, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 393.294.659,67	$ -	1,00	$ 393.294.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE FLEXIBLE DE 1600 A, DE TRANSFERENCIA DE RED DE EMERGENCIA 1 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 7.741.753,71	$ -	8,00	$ 61.934.030,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BY PASS 3, 10KVA A 220V, DE SOTANO, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 24.685.632,35	$ -	1,00	$ 24.685.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BY PASS 4, 10KVA A 220V, DE PISO 4, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 24.685.632,35	$ -	1,00	$ 24.685.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA DE 10 KVA - CUARTO DE MONITOREO Y PISO 3 - INCLUYE BANCO DE BATERIAS PARA RESPALDO DE 5 MINUTOS	UN	-	$ 63.829.442,66	$ -	2,00	$ 127.658.885,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X 6 AWG + 4 AWG-N + 6T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 222.481,17	$ -	110,00	$ 24.472.929,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X 2 AWG +1/0 AWG-N + 2T EN CABLE LSZH, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 485.279,80	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI EN DUCTERIA EMT (A LA VISTA), CAJA RADWEL Y CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO 12, PARA ZONAS HÚMEDAS	UN	-	$ 485.598,69	$ -	63,00	$ 30.592.717,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN DUCTERIA EMT 3/4" (A LA VISTA), CAJA RADWEL Y CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO 12	UN	-	$ 498.935,87	$ -	4,00	$ 1.995.743,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN DUCTERIA EMT (A LA VISTA), CAJA RADWEL Y CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO 12	UN	-	$ 388.779,03	$ -	22,00	$ 8.553.139,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT 3" SOBREPUESTA ACOMETIDAS GABINETES EQUIPOS Y/O TABLEROS. INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	-	$ 262.471,31	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 4", INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	-	$ 653.719,74	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA DE COLOR BLANCO PARA PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	-	$ 168.757,16	$ -	400,00	$ 67.502.864,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 4", INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	-	$ 398.313,30	$ -	12,00	$ 4.779.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 20X20 METALICA	UN	-	$ 143.755,21	$ -	21,00	$ 3.018.859,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X125A ICU 25KA	UN	-	$ 2.143.684,44	$ -	1,00	$ 2.143.684,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X125A ICU 25KA	UN	-	$ 2.573.343,48	$ -	1,00	$ 2.573.343,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X4+1X4N+1X8T EN CABLE LSZH, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 194.115,99	$ -	200,00	$ 38.823.198,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.6.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3X8+1X8N+1X8T EN CABLE LSZH, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 113.670,71	$ -	165,00	$ 18.755.667,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 1.034.412.910,00**		**$ 3.159.583.427,00**		**$ 167.730.151,00**		**$ -**		**$ 167.730.151,00**	
4,7	**ACOMETIDAS PARCIALES E INSTALACIONES INTERNAS EQUIPOS MENORES A.A.**													
4,7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 40X40 PARA ACOMETIDA EQUIPOS MENORES A.A.	UN	1,00	$ 353.019,00	$ 353.019,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 30X30 PARA ACOMETIDA EQUIPOS MENORES A.A.	UN	76,00	$ 334.872,00	$ 25.450.272,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON. INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	45,90	$ 135.288,00	$ 6.209.719,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON. INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	67,30	$ 115.189,00	$ 7.752.220,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75212

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyt.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	111,50	$ 94.595,00	$ 10.547.343,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	94,10	$ 65.548,00	$ 6.168.067,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 1" POR CIELO FALSO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	119,20	$ 61.031,00	$ 7.274.895,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 3/4" POR CIELO FALSO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	1.066,20	$ 39.871,00	$ 42.510.460,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT CUATRO DUCTOS DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A. ; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	5,80	$ 342.566,00	$ 1.986.883,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1 1/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	ML	63,50	$ 80.802,00	$ 5.139.007,00	1.875,00	$ 151.503.750,00	672,50	$ 54.339.345,00	944,00	$ 76.277.088,00	1.616,50	$ 130.616.433,00	86,21
4.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	ML	52,90	$ 68.272,00	$ 3.611.589,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	ML	104,00	$ 53.867,00	$ 5.602.168,00	4.207,50	$ 226.645.403,00	1.628,75	$ 87.735.876,00	1.219,50	$ 65.690.807,00	2.848,25	$ 153.426.683,00	67,69
4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1" SOBREPUESTA INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	ML	22,10	$ 23.016,00	$ 508.654,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	ML	108,70	$ 18.970,00	$ 2.062.039,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EQUIPOS MENORES A.A. EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X10+10T -	ML	32,20	$ 41.904,00	$ 1.349.309,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EQUIPOS MENORES A.A. EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X12+12T -	ML	236,40	$ 30.129,00	$ 7.122.496,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EQUIPOS MENORES A.A. EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2X12+12T -	ML	6.009,10	$ 23.230,00	$ 139.591.393,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4.7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO AIRES ACONDICIONADOS (NO INCLUYE DUCTERIA NI CABLE) -	UN	162,00	$ 93.423,00	$ 15.134.526,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 4.7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 143.572.993,68	$ -	1,00	$ 143.572.994,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA DE 1500 A DESDE TRANFERENCIA DE AIRE ACONDICIONADO POR LA VERTICAL DE CUARTOS TECNICOS, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 343.063.222,13	$ -	1,00	$ 343.063.222,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.7.21	Suministro e Instalación de Tuberia Metalica EMT de 1/2" Para Sistema Detección Incendios; Incluye Abrazaderas (Aires Acondicionados)	ML	-	$ 37.804,00	$ -	4.800,00	$ 181.459.200,00	0,00	$ -	2.463,00	$ 93.111.252,00	2.463,00	$ 93.111.252,00	51,31
N.P. 4.7.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE FLEXIBLE DE 1500 A. DE TRANSFERENCIA DE RED DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 7.709.868,80	$ -	8,00	$ 61.678.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.7.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACÓN TIPO PLUG-IN DESDE 200A HASTA 630A (INCLUYE BREAKER Y MANDO ROTATIVO)	UN	-	$ 21.537.417,51	$ -	3,00	$ 64.612.253,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.7.24	Suministro e Instalacion Cable de Cu AWG, LSZH N°2 (F) + N°2 (T) LIBRE DE HALOGENOS y conductores con cumplimiento RETIE (AIRES ACONDICIONADOS)	ML	-	$ 122.727,03	$ -	6.485,00	$ 795.884.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.7.25	Suministro e Instalacion Cable de Cu AWG, LSZH N°4 (F) + N°10 (T) LIBRE DE HALOGENOS y conductores con cumplimiento RETIE (AIRES ACONDICIONADOS	ML	-	$ 68.442,41	$ -	4.615,00	$ 315.861.722,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.7.26	Suministro e Instalacion Cable de Cu AWG, LSZH N°12 (F) + N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS y conductores con cumplimiento RETIE (AIRES ACONDICIONADOS)	ML	-	$ 29.781,52	$ -	9.485,00	$ 282.477.717,00	0,00	$ -	7.090,00	$ 211.150.977,00	7.090,00	$ 211.150.977,00	74,75
N.P. 4.7.27	Suministro e Instalacion Cable de Cu 2XN°18 APANTALLADO de control con cumplimiento RETIE (AIRES ACONDICIONADOS)	ML	-	$ 32.026,40	$ -	4.800,00	$ 153.726.720,00	0,00	$ -	1.795,00	$ 57.487.388,00	1.795,00	$ 57.487.388,00	37,40
N.P. 4.7.28	Suministro e instalación de tubería a 1 1/4" tipo IMC (Aires Acondicionados)	ML	-	$ 228.715,58	$ -	900,00	$ 205.844.022,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.7.29	Suministro e Instalacion Cable de Cu AWG, LSZH N°10 (F) + N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS y conductores con cumplimiento RETIE (aires acondicionados)	ML	-	$ 41.580,38	$ -	3.995,00	$ 166.113.618,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

25213

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyc.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P. 4.7.30	Suministro e instalacion Cable de Cu AWG, LSZH N°8 (F) + N°10 (T) LIBRE DE HALOGENOS y conductores con cumplimiento RETIE (aires acondicionados)	ML	-	$ 48.803,72	$ -	1.690,00	$ 82.478.287,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.7.31	Suministro e instalación de tuberia a 3/4" tipo IMC (aires acondicionados)	ML	-	$ 99.581,09	$ -	101,25	$ 10.082.585,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 288.374.059,00		$ 3.185.005.233,00		$ 142.075.221,00		$ 503.717.512,00		$ 645.792.733,00	
4,8	ACOMETIDAS PARCIALES, TABLEROS PARCIALES E INSTALACIONES INTERNAS RED VITAL													
4,8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 400X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - RED VITAL	ML	60,00	$ 198.051,00	$ 11.883.060,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,2	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TENSIÓN SIMILAR A NORMA CODENSA CS207 PARA DOS DUCTOS PVC DE 2" - ILUMINACIÓN EXTERIOR	ML	205,70	$ 69.844,00	$ 14.366.911,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,3	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TENSIÓN SIMILAR A NORMA CODENSA CS207 PARA DOS DUCTOS PVC DE 1" - ALIMENTACION MASTILES METALICOS - ILUMINACIÓN EXTERIOR	ML	47,20	$ 48.391,00	$ 2.284.055,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 25X25 - ILUMINACIÓN EXTERIOR	UN	2,00	$ 301.582,00	$ 603.164,00	2,00	$ 603.164,00	2,00	$ 603.164,00	0,00	$ -	2,00	$ 603.164,00	100,00
4,8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO - ILUMINACIÓN EXTERIOR	ML	84,80	$ 11.378,00	$ 964.854,00	200,00	$ 2.275.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1 1/4" SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE -	ML	118,50	$ 80.802,00	$ 9.575.037,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X8+8N+8T	ML	117,70	$ 75.676,00	$ 8.907.065,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO ILUMINACIÓN EXTERIOR EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X6+6T	ML	223,70	$ 38.362,00	$ 8.581.579,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL ILUMINACIÓN EXTERIOR EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2X12+12T	ML	256,50	$ 23.230,00	$ 5.958.495,00	1.921,00	$ 44.624.830,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL ILUMINACIÓN SOTANO DOS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), TRES (3) BREAKER DE 1X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 4.257.231,00	$ 4.257.231,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL ILUMINACIÓN SOTANO UNO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFASICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA, TRES (3) BREAKER DE 1X20A ICU 25KA, UN CONTACTOR DE 30 EN AC3 CONTROLADO POR RELOJ PROGRAMABLE, PROGRAMADOR HORARIO Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 5.546.473,00	$ 5.546.473,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X30A ICU 25KA	UN	9,00	$ 1.530.957,00	$ 13.778.613,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACION EN DUCTERIA PVC SCH40 (POR CIELO FALSO) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	1.922,00	$ 241.679,00	$ 464.507.038,00	58,00	$ 14.017.382,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN DUCTERIA EMT (A LA VISTA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	472,00	$ 338.093,00	$ 159.579.896,00	2.849,00	$ 963.226.957,00	282,00	$ 95.342.226,00	0,00	$ -	282,00	$ 95.342.226,00	9,90
4,8,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO 40W ;	UN	1.068,00	$ 283.091,00	$ 302.341.188,00	351,00	$ 99.364.941,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 40W	UN	306,00	$ 269.391,00	$ 82.433.646,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 24W -	UN	297,00	$ 92.486,00	$ 27.468.342,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED AVISO SALIDA 3W.	UN	61,00	$ 169.782,00	$ 10.356.702,00	86,00	$ 14.601.252,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMERGENCIA LED 3W.	UN	278,00	$ 157.358,00	$ 43.745.524,00	674,00	$ 106.059.292,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 600W	UN	171,00	$ 128.058,00	$ 21.897.918,00	236,00	$ 30.221.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL TIPO GHFC 1; RANGO DE APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 2 A 2/0 Y DERIVACIÓN DE 14 A 6 - ILUMINACIÓN EXTERIOR	UN	81,00	$ 81.538,00	$ 6.604.578,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MASTILES METALICOS EN CIMENTACION, INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4M, CABLE DE COBRE NO 1/0 AWG Y TERMINALES DE PONCHAR - ILUMINACIÓN EXTERIOR	UN	27,00	$ 448.677,00	$ 12.114.279,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL METALICO DE 3M CERTIFICADO - ILUMINACIÓN EXTERIOR	UN	27,00	$ 1.683.598,00	$ 45.457.146,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO EXTERIOR SKYLINE 45W	UN	27,00	$ 2.590.930,00	$ 69.955.110,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 4,8,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN DUCTERIA PVC SCH40 (POR CIELO FALSO) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	-	$ 164.748,91	$ -	159,00	$ 26.195.077,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75219

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cve.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P. 4.8.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN DUCTERIA PVC SCH40 (POR CIELO FALSO) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	-	$ 198.782,81	$ -	12,00	$ 2.385.394,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN DUCTERIA PVC SCH40 (POR CIELO FALSO) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	-	$ 236.503,95	$ -	13,00	$ 3.074.551,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTABLE EN DUCTERIA EMT (A LA VISTA), CAJA RADWEL Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	-	$ 336.923,67	$ -	24,00	$ 8.086.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 50 W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	-	$ 416.207,21	$ -	114,00	$ 47.447.622,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 36 W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	-	$ 340.177,15	$ -	47,00	$ 15.988.326,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA DE 36 W CON DRIVER DE EMERGENCIA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	-	$ 1.350.695,75	$ -	85,00	$ 114.809.139,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA DE 15 W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 358.367,55	$ -	809,00	$ 289.919.348,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA DE 20 W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 395.215,89	$ -	162,00	$ 64.024.974,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA DE 22 W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 415.072,22	$ -	32,00	$ 13.282.311,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO APLIQUE DE 18 W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 114.388,71	$ -	88,00	$ 10.066.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	-	$ 953.543,08	$ -	7,00	$ 6.674.802,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA DE 3 W - EMERGENCIA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	-	$ 412.592,81	$ -	46,00	$ 18.979.269,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR ULTRASÓNICO PARA ZONA DE BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 2.103.367,66	$ -	87,00	$ 182.992.986,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA WALL PACK 30W, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 1.057.874,15	$ -	11,00	$ 11.636.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DELUMINARIA TIPO STEP LIGHT 1W, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 206.514,38	$ -	15,00	$ 3.097.716,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA EQUIPOS DE RED VITAL, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 37.127.921,72	$ -	1,00	$ 37.127.922,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO RED VITAL, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 33.095.311,72	$ -	1,00	$ 33.095.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA AUTOMÁTICO FORMATO CAJA MOLDEADA (ASCENSOR)., SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	-	$ 4.136.804,48	$ -	12,00	$ 49.641.654,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO SIN ESPACIO DE TOTALIZADOR (ASCENSOR), SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UN	-	$ 758.050,88	$ -	6,00	$ 4.548.305,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN DUCTERIA EMT (A LA VISTA), CAJA RADWEL Y CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO 12, PARA FOSO DE ASCENSORES	UN	-	$ 388.492,85	$ -	63,00	$ 24.475.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DE 40W SECURE, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. (ZONA DE GASES MEDICINALES)	UN		$ 6.688.533,90	$ -	8,00	$ 53.508.271,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DE 40W SECURE + EMERGENCIA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. (ZONA DE GASES MEDICINALES)	UN		$ 9.841.862,56	$ -	4,00	$ 39.367.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SENCILLA + CLAVIJA PARA ÁREA CLASIFICADA MONOFÁSICA 120 V, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. (ZONA DE GASES MEDICINALES)	UN		$ 7.346.817,06	$ -	8,00	$ 58.774.536,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO ÁREA CLASIFICADA PARA CUARTO DE GASES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN (ZONA DE GASES MEDICINALES)	UN		$ 996.249,54	$ -	10,00	$ 9.962.495,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4.8.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACION PARA CUARTOS DE GASES MEDICINALES, INCLUYE TUBERÍA IMC DE 3/4", CONDULETA REDONDA, SELLO CORTAFUEGO, UNIONES UNIVERSALES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	UN		$ 3.774.319,29	$ -	16,00	$ 60.389.109,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 1.333.167.904,00		$ 2.464.545.715,00		$ 95.945.390,00		$ -		$ 95.945.390,00	

7521

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL	8/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,9	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS													
4,9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE CONTINUIDAD PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN CABLE DE COBRE DESNUDO NO 1/0. INSTALADO EN LA EXCAVACIÓN Y BAJANTES DE CUBIERTA	ML	503,30	$ 77.698,00	$ 39.105.403,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA FRANKLYN DE 0.6M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE SOPORTE PARA FIJACIÓN SOBRE CUBIERTA, CONEXION A ALAMBRON ALUMINIO ALEACIÓN 6201 CON CONECTOR ESPECIAL PARA DERIVACIÓN ALAMBRON - ALAMBRON.	UN	32,00	$ 703.994,00	$ 22.527.808,00	32,00	$ 22.527.808,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON DE ALUMINIO ALEACIÓN 6201	ML	195,90	$ 15.349,00	$ 3.006.869,00	270,00	$ 4.144.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,4	SOPORTE PARA CONDUCTOR DEHNSNAP PLASTICO GRIS - M6	UN	143,00	$ 37.128,00	$ 5.309.304,00	270,00	$ 10.024.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ELECTRODO PUESTA A TIERRA SIPRA, INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M Y SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA - CABLE.	UN	16,00	$ 367.837,00	$ 5.885.392,00	30,00	$ 11.035.110,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA CABLE - CABLE	UN	8,00	$ 62.502,00	$ 500.016,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CRUZ PARALELO ALAMBRON ALUMINIO - ALAMBRON ALUMINIO	UN	6,00	$ 152.078,00	$ 912.468,00	10,00	$ 1.520.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO ALAMBRON ALUMINIO - COBRE	UN	6,00	$ 130.132,00	$ 780.792,00	4,00	$ 520.528,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC 1" INCRUSTADO EN MURO PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	ML	180,00	$ 11.378,00	$ 2.048.040,00	200,00	$ 2.275.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,10	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA AP280	UN	8,00	$ 329.765,00	$ 2.638.120,00	19,00	$ 6.265.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 4,9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2/0 AWG PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS CORRECTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ML	-	$ 104.857,20	$ -	800,00	$ 83.886.235,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 4,9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA TIPO PESADO PARA ATERRIZAR DE ACERO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS CORRECTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	UN	-	$ 82.031,82	$ -	10,00	$ 820.318,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL													
4,10	SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID				$ 82.714.212,00		$ 143.020.704,00		$ -		$ -		$ -	
4,10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA PANELES EN PERFILES DE ALUMINIO INCLUYE BORNERAS DE PUESTA A TIERRA, SOPORTES DE FIJACION A TECHO Y PANELES	UN	72,00	$ 544.093,00	$ 39.174.696,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,2	INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 450WP.	UN	72,00	$ 132.382,00	$ 9.531.504,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROINVERSOR ENPHASE IQ+	UN	72,00	$ 1.266.077,00	$ 91.215.144,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN PARA MICROINVERSORES IQ+ TIPO PORTRAIT	UN	72,00	$ 174.240,00	$ 12.545.280,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE RAMAL PARA MODULOS IQ+	UN	6,00	$ 184.475,00	$ 1.106.850,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MODULO DE COMUNICACION SFV ENVOY, INCLUYE ACCESO A PLATAFORMA DE MONITOREO REMOTO	UN	1,00	$ 5.442.868,00	$ 5.442.868,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA INTEGRACION RAMALES SISTEMA FOTOVOLTAICO AC COMBINER BOX	UN	1,00	$ 6.743.363,00	$ 6.743.363,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,8	CAJA METALICA DE EMPALMES USO INTEMPERIE GRADO IP67 - 100X100X100 MM	UN	6,00	$ 227.950,00	$ 1.367.700,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,9	CAJA METALICA DE EMPALMES USO INTEMPERIE GRADO IP67 - 200X200X100 MM	UN	6,00	$ 318.140,00	$ 1.908.840,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1"	ML	26,70	$ 23.016,00	$ 614.527,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 2"	ML	6,70	$ 61.358,00	$ 411.099,00	23,00	$ 1.411.234,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL CONEXIÓN RAMALES SFV EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2X10+10T	ML	26,70	$ 33.702,00	$ 899.843,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 4,10,13	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR LED AUTÓNOMA DE 40W PARA EXTERIORES, TIPO POSTE, CON PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO INTEGRADO DE 18V/35W, BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE LITIO TIPO LIFEPO, DE 12V/15AH, CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 10 HORAS CONTINUAS. INCLUYE SENSOR CREPUSCULAR PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO, BRAZO METÁLICO, POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 3 METROS DE ALTURA, BASE CON ANCLAJES EN CONCRETO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. PROTECCIÓN IP65. RESISTENCIA A INTEMPERIE. USO EN ZONA DE CUBIERTA PARA ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD O AMBIENTAL. NO REQUIERE CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA."	UN	-	$ 5.373.250,00	$ -	3,00	$ 16.119.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 170.961.714,00		$ 17.530.984,00		$ -		$ -		$ -	
	SUBTOTAL COMPONENTE ELECTRICO				$ 6.228.592.484,00		$ 12.808.503.005,00		$ 711.508.576,00		$ 503.717.512,00		$ 1.215.226.088,00	

75216

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	8/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyz.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2025		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
5	COMPONENTE VOZ Y DATOS CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS													
5,1	REDES GENERALES Y ACOMETIDA													
5,1,1	Suministro e instalación de Bajante en Ducto Galvanizado IMC de 2" Acometida Redes Comunicaciones	UN	1,00	$ 1.357.508,00	$ 1.357.508,00	1,00	$ 1.357.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,2	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	2,00	$ 679.686,00	$ 1.359.372,00	2,00	$ 1.359.372,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,3	Construcción de Caja de Inspección Similar a Norma CODENSA CS280 Para Redes de Comunicaciones	UN	1,00	$ 6.905.316,00	$ 6.905.316,00	1,00	$ 6.905.316,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,4	Construcción Canalización Para Red de Comunicaciones Similar a Norma CODENSA CS207 Para Dos Ductos PVC de 2"	ML	35,80	$ 69.844,00	$ 2.500.415,00	35,80	$ 2.500.415,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,5	Suministro e Instalación de Tuberia Metalica EMT 2 Ductos de 2" Sobrepuesta Acometida Voz Datos, Incluye Accesorios de Soporte	ML	29,00	$ 181.365,00	$ 5.259.585,00	123,00	$ 22.307.895,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,6	Suministro e Instalación de Escalerilla Metalica Porta Conductores de 400x100mm, Incluye Accesorios Para Fijación a Pared y Amarres Conductores - Red Voz y Datos	ML	35,00	$ 198.051,00	$ 6.931.785,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,7	Suministro e Instalación de Escalerilla Metalica Porta Conductores de 400x100mm, Incluye Accesorios Para Fijación a Pared y Amarres Conductores - Red CCTV	ML	35,00	$ 198.051,00	$ 6.931.785,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,8	Suministro e Instalación de Fibra Optica Monomodo x 12 Hilos - Conexión Racks Principal - a Racks en Cuarto y Septimo Piso	ML	79,00	$ 60.378,00	$ 4.769.862,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,9	Suministro e Instalación de Rack de Piso Para Red Comunicaciones 45UR, Voz, Datos; Incluye Switches, Patch Panel, Patch Cords, Planta IP -	UN	3,00	$ 192.529.606,00	$ 577.588.818,00	5,00	$ 962.648.030,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,10	Suministro e Instalación de Rack de Piso Para Red Comunicaciones 40UR, CCTV; Incluye Switches, Patch Panel, Patch Cords, -	UN	3,00	$ 155.674.767,00	$ 467.024.301,00	3,00	$ 467.024.301,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 5,1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2U, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 351.234,69	$ -	71,00	$ 24.937.863,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 5,1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 4.827.141,02	$ -	16,00	$ 77.234.256,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 5,1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TIERRAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	-	$ 831.592,68	$ -	8,00	$ 6.652.741,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 5,1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 400X54MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y VELCRO PARA UTP - RED VOZ Y DATOS	ML	-	$ 268.745,06	$ -	180,00	$ 48.374.111,00	50,00	$ 13.437.253,00	0,00	$ -	50,00	$ 13.437.253,00	27,78
N.P. 5,1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 300X54MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y VELCRO PARA UTP - RED VOZ Y DATOS	ML	-	$ 224.534,71	$ -	339,00	$ 76.117.267,00	174,00	$ 39.069.040,00	0,00	$ -	174,00	$ 39.069.040,00	51,33
N.P. 5,1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 200X54MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y VELCRO PARA UTP - RED VOZ Y DATOS	ML	-	$ 182.666,91	$ -	216,00	$ 39.456.053,00	52,00	$ 9.498.679,00	0,00	$ -	52,00	$ 9.498.679,00	24,07
	SUBTOTAL				$ 1.080.628.747,00		$ 1.736.874.928,00		$ 62.004.972,00		$ -		$ 62.004.972,00	
5,2	RED COMUNICACIONES, VOZ, DATOS Y SISTEMA DE VIDEO													
5,2,1	Suministro e Instalación de Caja de Paso 60x60 Para Red Voz, Datos	UN	14,00	$ 408.689,00	$ 5.721.646,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,2	Suministro e Instalación de Caja de Paso 40x40 Para Red Voz, Datos	UN	4,00	$ 353.019,00	$ 1.412.076,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,3	Suministro e Instalación de Caja de Paso 30x30 Para Red Voz, Datos	UN	48,00	$ 334.872,00	$ 16.073.856,00	29,00	$ 9.711.288,00	1,00	$ 334.872,00	0,00	$ -	1,00	$ 334.872,00	3,45
5,2,4	Suministro e Instalación de Catorce Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	3,50	$ 324.482,00	$ 1.135.687,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,5	Suministro e Instalación de Doce Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	13,70	$ 301.221,00	$ 4.126.728,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,6	Suministro e Instalación de Diez Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	6,90	$ 248.134,00	$ 1.712.125,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,7	Suministro e Instalación de Ocho Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	23,60	$ 195.046,00	$ 4.603.086,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,8	Suministro e Instalación de Seis Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	24,40	$ 124.179,00	$ 3.029.968,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,9	Suministro e Instalación de Cinco Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	20,50	$ 112.549,00	$ 2.307.255,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,10	Suministro e Instalación de Cuatro Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	72,90	$ 100.919,00	$ 7.356.995,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,11	Suministro e Instalación de Tres Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	44,00	$ 89.288,00	$ 3.928.672,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,12	Suministro e Instalación de Dos Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	124,10	$ 68.710,00	$ 8.526.911,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,13	Suministro e Instalación de Un Ducto PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	41,40	$ 57.080,00	$ 2.363.112,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

25212

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	5/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cva.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	
5.2.14	Suministro e Instalación de Un Ducto PVC de 3/4" por Placa o Muro Red Voz y Datos	ML	2.681,00	$ 9.144,00	$ 24.515.064,00	1.260,00	$ 11.521.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.15	Suministro e Instalación de Tubería Metalica EMT de 1" Para Red Voz Datos; Incluye Accesorios de Soporte -	ML	44,20	$ 68.272,00	$ 3.017.622,00	44,20	$ 3.017.622,00	22,00	$ 1.501.984,00	0,00	$ -	22,00	$ 1.501.984,00	49,77	
5.2.16	Suministro e Instalación de Tubería Metalica EMT de 3/4" Para Red Voz Datos; Incluye Accesorios de Soporte -	ML	233,10	$ 53.867,00	$ 12.556.398,00	321,00	$ 17.291.307,00	131,00	$ 7.056.577,00	0,00	$ -	131,00	$ 7.056.577,00	40,81	
5.2.17	Suministro e Instalación de Cable UTP Categoria 6A - Voz Datos	ML	13.423,60	$ 15.663,00	$ 210.253.847,00	27.423,60	$ 429.535.847,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.18	Suministro e Instalación de Salida Voz y Datos Certificada, no Incluye Canalización ni cable UTP, Incluye Tomas RJ 45 Categoria 6A	UN	353,00	$ 164.260,00	$ 57.983.780,00	353,00	$ 57.983.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.19	Suministro e Instalación de Salida Datos Certificada, no Incluye Canalización ni cable UTP, Incluye Toma RJ 45 Categoria 6A	UN	25,00	$ 120.626,00	$ 3.015.700,00	169,00	$ 20.386.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.20	Suministro e Instalación de Caja de Paso 30x30 Para Red CCTV	UN	41,00	$ 334.872,00	$ 13.729.752,00	20,00	$ 6.697.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.21	Suministro e Instalación de Tubería Metalica EMT de 1" Para Red CCTV; Incluye Accesorios de Soporte -	ML	88,70	$ 68.272,00	$ 6.055.726,00	88,70	$ 6.055.726,00	41,00	$ 2.799.152,00	0,00	$ -	41,00	$ 2.799.152,00	46,22	
5.2.22	Suministro e Instalación de Tubería Metalica EMT de 3/4" Para Red CCTV; Incluye Accesorios de Soporte -	ML	150,40	$ 53.867,00	$ 8.101.597,00	150,40	$ 8.101.597,00	74,00	$ 3.986.158,00	0,00	$ -	74,00	$ 3.986.158,00	49,20	
5.2.23	Suministro e Instalación de Cuatro Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV	ML	17,30	$ 100.919,00	$ 1.745.899,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.24	Suministro e Instalación de Dos Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV-Datos	ML	41,90	$ 68.710,00	$ 2.878.949,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.25	Suministro e Instalación de Un Ducto PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV-Datos	ML	2,10	$ 57.080,00	$ 119.868,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.26	Suministro e Instalación de Dos Ductos PVC de 1 1/2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV-Datos	ML	43,20	$ 63.323,00	$ 2.735.554,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.27	Suministro e Instalación de Dos Ductos PVC de 1 1/4" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV	ML	95,80	$ 58.655,00	$ 5.619.149,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.28	Suministro e Instalación de Dos Ductos PVC de 1" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV	ML	512,90	$ 55.562,00	$ 28.497.750,00	512,90	$ 28.497.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.29	Suministro e Instalación de Un Ducto PVC de 3/4" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV	ML	385,50	$ 33.454,00	$ 12.896.517,00	475,00	$ 15.890.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.30	Suministro e Instalación de Cable UTP Categoria 6A Para Camaras	ML	4.012,80	$ 15.663,00	$ 62.852.486,00	6.712,80	$ 105.142.586,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5.2.31	Instalación de Camara Tipo Domo IP 5MP - POE -	UN	134,00	$ 43.768,00	$ 5.864.912,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS														
N.P.5.2.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 400X54MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y VELCRO PARA UTP - RED SEGURUDAD Y CONTROL	ML	-	$ 268.745,06	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.5.2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 300X54MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y VELCRO PARA UTP - RED SEGURUDAD Y CONTROL	ML	-	$ 224.534,71	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.5.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 200X54MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y VELCRO PARA UTP - SEGURUDAD Y CONTROL	ML		$ 182.666,91	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.5.2.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO X 12 HILOS - CONEXIÓN ENTRE RACKS DE CCTV Y VOZ Y DATOS	ML	-	$ 89.183,56	$ -	135,00	$ 12.039.781,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	SUBTOTAL														
5,3	RED SONIDO				$ 524.738.687,00		$ 731.872.946,00		$ 15.678.743,00		$		$ 15.678.743,00		
5,3,1	Suministro e Instalación de Escalerilla Metalica Porta Conductores de 400x100mm, Incluye Accesorios Para Fijación a Pared y Amarres Conductores - Red Sonido	ML	35,00	$ 198.051,00	$ 6.931.785,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5,3,2	Suministro e Instalación de Strip Sonido 30x30x15	UN	8,00	$ 757.167,00	$ 6.057.336,00	8,00	$ 6.057.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5,3,3	Suministro e Instalación de Un Ducto PVC de 3/4" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Sonido	ML	911,40	$ 33.454,00	$ 30.489.976,00	911,40	$ 30.489.976,00	737,00	$ 24.655.598,00	0,00	$ -	737,00	$ 24.655.598,00	80,86	
5,3,4	Suministro e Instalación de Cable Polarizado 2x12	ML	935,40	$ 21.921,00	$ 20.504.903,00	1.185,00	$ 25.978.385,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5,3,5	Suministro e Instalación de Torna Sonido Para Parlante	UN	86,00	$ 201.944,00	$ 17.367.184,00	87,00	$ 17.569.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	SUBTOTAL														
5,4	RED DETECCIÓN DE INCENDIOS				$ 81.351.184,00		$ 80.092.825,00		$ 24.655.598,00		$		$ 24.655.598,00		
5,4,1	Suministro e Instalación de Escalerilla Metalica Porta Conductores de 400x100mm, Incluye Accesorios Para Fijación a Pared y Amarres Conductores - Red Detección Incendios	ML	35,00	$ 198.051,00	$ 6.931.785,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5,4,2	Suministro e Instalación de Tubería Metalica EMT de 1/2" Para Sistema Detección Incendios; Incluye Abrazaderas -	ML	3.396,70	$ 37.804,00	$ 128.408.847,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5,4,3	Suministro e Instalación de Detector Optico Termico (Humo o Temperatura) Direccionable	UN	767,00	$ 880.403,00	$ 675.269.101,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
5,4,4	Suministro e Instalación de Sirena con Estrobo 2W, Color Rojo	UN	53,00	$ 1.459.169,00	$ 77.335.957,00	53,00	$ 77.335.957,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	

25218

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
5,4,5	Suministro e Instalación de Activación Manual Rearmable Para Sistema Algoritmico Direccionable, Con Aislador de Circuito Color Rojo	UN	53,00	$ 829.256,00	$ 43.950.568,00	53,00	$ 43.950.568,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,4,6	Instalación de Central Compacta Direccionable Sistema Detección Incendios 150 Elementos, 4000 Eventos	UN	8,00	954.459,00	$ 7.635.672,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,4,7	Suministro e Instalación de Cable FPLR 2x14 AWG Solido HT 105 Grados Centigrados Apantallado Rojo Sotano Dos	ML	3.396,70	$ 18.643,00	$ 63.324.678,00	3.396,70	$ 63.324.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 5,4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR 2X16 AWG SÓLIDO HT 105 GRADOS CENTIGRADOS APANTALLADO ROJO	ML	-	$ 18.348,58	$ -	3.850,00	$ 70.642.033,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL													
	SUBTOTAL COMPONENTE VOZ Y DATOS CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS				$ 1.002.856.608,00		$ 255.253.236,00		$ -		$ -		$ -	
6	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS				$ 2.689.575.226,00		$ 2.804.093.935,00		$ 102.339.313,00		$ -		$ 102.339.313,00	
6,01	UNIDADES ENFRIADORAS													
6,01,1	Instalacion de Chiller Enfriado por Aire tipo SCROLL. Cap. 100 Ton, 460V-3Ph-60Hz	und	3,00	$ 10.487.344,00	$ 31.462.032,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 6,01,2	Instalacion Unidad tipo paquete condensado por aire de 25 TR. 220/3/60	und	-	$ 8.282.115,80	$ -	2,00	$ 16.564.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6,01,3	Instalacion Unidad condensadora de refrigerante variable de 16 TR. 220/3/60	und	-	$ 5.177.335,07	$ -	7,00	$ 36.241.345,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6,01,4	Instalacion Unidad condensadora de refrigerante variable de 14 TR. 220/3/60	und	-	$ 4.611.650,06	$ -	3,00	$ 13.834.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6,01,5	Instalacion Unidad condensadora de refrigerante variable de 13 TR. 220/3/60	und	-	$ 4.217.373,38	$ -	2,00	$ 8.434.747,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6,01,6	Instalacion Unidad condensadora de refrigerante variable de 10 TR. 220/3/60	und	-	$ 3.752.351,30	$ -	8,00	$ 30.018.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6,01,7	Instalacion Unidad condensadora tipo split de 7.5 TR. 220/3/60	und	-	$ 3.287.329,22	$ -	2,00	$ 6.574.658,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 31.462.032,00		$ 111.668.742,00		$ -		$ -		$ -	
6,2	BOMBAS DE AGUA FRIA													
6,2,1	Instalacion de bomba centrifuga control Sensorless 360GPM @125 ft. (15kW), 460V-3Ph-60Hz	und	3,00	$ 12.609.928,00	$ 37.829.784,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 37.829.784,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
6,3	UNIDADES INTERIORES													
6,3,1	Instalacion de consola de pared hidronica 9.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	3,00	$ 2.551.271,00	$ 7.653.813,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,2	Instalacion de cassete de 4 vias hidronico 24.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	2,00	$ 2.932.724,00	$ 5.865.448,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,3	Instalacion de fancoil hidrónico de baja presion estatica 9.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	31,00	$ 2.551.271,00	$ 79.089.401,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,4	Instalacion de fancoil hidrónico de baja presion estatica 12.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	16,00	$ 2.551.271,00	$ 40.820.336,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,5	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 18.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	18,00	$ 2.551.271,00	$ 45.922.878,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,6	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 24.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	30,00	$ 2.932.724,00	$ 87.981.720,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,7	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 30.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	14,00	$ 2.932.724,00	$ 41.058.136,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,8	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 36.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	18,00	$ 2.932.724,00	$ 52.789.032,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,9	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 42.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	12,00	$ 3.102.725,00	$ 37.232.700,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,10	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 48.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	7,00	$ 3.102.725,00	$ 21.719.075,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,11	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 54.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	5,00	$ 3.102.725,00	$ 15.513.625,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,12	Instalacion de unidad manejadora de aire interior 76.311 Btu/h@2400CFM, 220V-3Ph-60Hz	und	1,00	$ 3.046.275,00	$ 3.046.275,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 6,3,13	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo fancoil oculto de 8 TR. 220/1/60	und	-	$ 3.287.329,22	$ -	15,00	$ 49.309.938,00	0,00	$ -	7,00	$ 23.011.305,00	7,00	$ 23.011.305,00	46,67
N.P. 6,3,14	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo fancoil oculto de 6 TR. 220/1/60	und	-	$ 2.191.214,94	$ -	13,00	$ 28.485.794,00	0,00	$ -	2,00	$ 4.382.430,00	2,00	$ 4.382.430,00	15,38
N.P. 6,3,15	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo fancoil oculto de 5 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.918.236,40	$ -	2,00	$ 3.836.473,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.836.473,00	2,00	$ 3.836.473,00	100,00
N.P. 6,3,16	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo fancoil oculto de 4 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.918.236,40	$ -	4,00	$ 7.672.946,00	0,00	$ -	3,00	$ 5.754.709,00	3,00	$ 5.754.709,00	75,00
N.P. 6,3,17	InstalacionUnidad interior de refrigerante variable tipo fancoil oculto de 3 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.657.056,48	$ -	3,00	$ 4.971.169,00	0,00	$ -	3,00	$ 4.971.169,00	3,00	$ 4.971.169,00	100,00
N.P. 6,3,18	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo fancoil oculto de 2.5 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.657.056,48	$ -	7,00	$ 11.599.395,00	0,00	$ -	5,00	$ 8.285.282,00	5,00	$ 8.285.282,00	71,43
N.P. 6,3,19	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo fancoil oculto de 2 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.657.056,48	$ -	1,00	$ 1.657.056,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.657.056,00	1,00	$ 1.657.056,00	100,00

2524

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P. 6.3.20	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo fancoil oculto de 1.5 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.451.526,86	$ -	6,00	$ 8.709.161,00	0,00	$ -	3,00	$ 4.354.581,00	3,00	$ 4.354.581,00	50,00
N.P. 6.3.21	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo fancoil oculto de 1 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.451.526,86	$ -	4,00	$ 5.806.107,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6.3.22	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo cassette de 4 vias de 4 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.799.554,86	$ -	1,00	$ 1.799.555,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6.3.23	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo cassette de 4 vias de 1.5 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.337.697,76	$ -	2,00	$ 2.675.396,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.337.698,00	1,00	$ 1.337.698,00	50,00
N.P. 6.3.24	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo pared de 1 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.251.767,89	$ -	1,00	$ 1.251.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6.3.25	Instalacion Unidad interior de refrigerante variable tipo pared de 0.75 TR. 220/1/60	und	-	$ 1.251.767,89	$ -	5,00	$ 6.258.839,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.503.536,00	2,00	$ 2.503.536,00	40,00
N.P. 6.3.26	Instalacion Unidad manejadora 1 a 1 de 7.5 TR. 220/1/60	und	-	$ 2.121.223,37	$ -	2,00	$ 4.242.447,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 438.692.439,00		$ 138.276.044,00		$ -		$ 60.094.239,00		$ 60.094.239,00	
6,4	UNIDADES DE VENTILACION													
6.4.1	Instalacion de ventilador para presurización de escaleras (VPE-1)	und	2,00	$ 1.495.086,00	$ 2.990.172,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.4.2	Instalacion de ventilador de extraccion de sotanos axial (VE-S1)	und	4,00	$ 846.569,00	$ 3.386.276,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.4.3	Instalacion de ventilador tipo JETFAN (VE-S2)	und	8,00	$ 888.973,00	$ 7.111.784,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.4.4	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-01)	und	1,00	$ 3.757.928,00	$ 3.757.928,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.4.5	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-02)	und	1,00	$ 3.757.928,00	$ 3.757.928,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.4.6	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-03)	und	1,00	$ 3.953.878,00	$ 3.953.878,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.4.7	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-04)	und	1,00	$ 3.757.928,00	$ 3.757.928,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.4.8	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-05)	und	1,00	$ 2.198.107,00	$ 2.198.107,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.4.9	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-06)	und	1,00	$ 2.150.273,00	$ 2.150.273,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 6.4.10	Instalacion JF-01-08. Unidad de ventilación tipo Jetfan de 4700 CFM	und	-	$ 1.117.114,11	$ -	8,00	$ 8.936.913,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6.4.11	Instalacion VE-P. Unidad de ventilación axial de 9400 CFM	und	-	$ 1.773.809,89	$ -	4,00	$ 7.095.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6.4.12	Instalacion VE-01. Unidad de extracción tipo hongo de 7095 CFM	und	-	$ 1.902.704,71	$ -	1,00	$ 1.902.705,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6.4.13	Instalacion VE-02. Unidad de extracción tipo hongo de 4450 CFM	und	-	$ 1.902.704,71	$ -	1,00	$ 1.902.705,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6.4.14	Instalacion VE-03. Unidad de extracción tipo hongo de 2780 CFM	und	-	$ 1.507.403,27	$ -	1,00	$ 1.507.403,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6.4.15	Instalacion VE-04. Unidad de extracción tipo hongo de 1975 CFM	und	-	$ 1.507.403,27	$ -	1,00	$ 1.507.403,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6.4.16	Instalacion VE-05. Unidad de extracción tipo helicocentrifugo de 855 CFM	und	-	$ 1.507.403,27	$ -	1,00	$ 1.507.403,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 6.4.17	Instalacion VP. Unidad de ventilación plenum fan de 15000 CFM	und	-	$ 2.134.079,10	$ -	2,00	$ 4.268.158,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 33.064.274,00		$ 28.627.930,00		$ -		$ -		$ -	
6,5	REJILLAS													
6.5.1	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS3V 6"x6")	und	10,00	$ 111.425,00	$ 1.114.250,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.2	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS4V 9"x9")	und	87,00	$ 153.435,00	$ 13.348.845,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.3	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS3V 9"x9")	und	69,00	$ 153.435,00	$ 10.587.015,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.4	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS2V 9"x9")	und	26,00	$ 153.435,00	$ 3.989.310,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.5	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS4V 12"x12")	und	98,00	$ 195.444,00	$ 19.153.512,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.6	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS3V 12"x12")	und	53,00	$ 195.444,00	$ 10.358.532,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.7	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS2V 12"x12")	und	31,00	$ 195.444,00	$ 6.058.764,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.8	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS4V 15"x15")	und	2,00	$ 266.678,00	$ 533.356,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.9	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS3V 15"x15")	und	3,00	$ 266.678,00	$ 800.034,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.10	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS2V 15"x15")	und	2,00	$ 266.678,00	$ 533.356,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.11	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS4V 18"x18")	und	2,00	$ 321.473,00	$ 642.946,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.12	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 6"x6")	und	95,00	$ 75.780,00	$ 7.199.100,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.13	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 8"x6")	und	2,00	$ 86.703,00	$ 173.406,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.14	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 8"x8")	und	12,00	$ 99.186,00	$ 1.190.232,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.15	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 10"x10")	und	18,00	$ 117.912,00	$ 2.122.416,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.16	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 12"x12")	und	28,00	$ 147.560,00	$ 4.131.680,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.5.17	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 14"x14")	und	48,00	$ 189.692,00	$ 9.105.216,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

75220

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvl.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	
6.5.18	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 16"x16")	und	11,00	$ 230.263,00	$ 2.532.893,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6.5.19	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 18"x18")	und	37,00	$ 270.835,00	$ 10.020.895,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6.5.20	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 20"x20")	und	24,00	$ 351.637,00	$ 8.439.288,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6.5.21	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 24"x24")	und	17,00	$ 473.351,00	$ 8.046.967,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6.5.22	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 28"x24")	und	5,00	$ 517.044,00	$ 2.585.220,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6.5.23	Suministro e instalacion de rejilla de suministro con damper (RS 28"x14")	und	14,00	$ 429.898,00	$ 6.018.572,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6.5.24	Suministro e instalacion de rejilla de suministro con damper (RS 40"x30")	und	2,00	$ 1.173.817,00	$ 2.347.634,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6.5.25	Suministro e instalacion de rejilla tipo louver (RTLV 24"x12")	und	4,00	$ 318.969,00	$ 1.275.876,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6.5.26	Suministro e instalacion de rejilla tipo louver (RTLV 38"x38")	und	1,00	$ 1.457.194,00	$ 1.457.194,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6.5.27	Suministro e instalacion de rejilla tipo louver (RTLV 52"x38")	und	5,00	$ 1.873.127,00	$ 9.365.635,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS														
N.P.6.5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 3 VÍAS CON DAMPER DE 6"X6"	und	-	$ 334.325,31	$ -	2,00	$ 668.651,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 4 VÍAS CON DAMPER DE 9"X9"	und	-	$ 408.895,60	$ -	47,00	$ 19.218.093,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 2 VÍAS CON DAMPER DE 9"X9"	und	-	$ 443.795,23	$ -	1,00	$ 443.795,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 4 VÍAS CON DAMPER DE 12"X12"	und	-	$ 511.913,26	$ -	53,00	$ 27.131.403,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 2 VÍAS CON DAMPER DE 12"X12"	und	-	$ 558.575,21	$ -	1,00	$ 558.575,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 4 VÍAS CON DAMPER DE 15"X15"	und	-	$ 691.392,98	$ -	4,00	$ 2.765.572,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 4 VÍAS CON DAMPER DE 4"X4"	und	-	$ 305.880,94	$ -	4,00	$ 1.223.524,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 4 VÍAS CON DAMPER DE 6"X6"	und	-	$ 305.880,94	$ -	70,00	$ 21.411.666,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 4 VÍAS CON DAMPER DE 12"X6"	und	-	$ 398.274,31	$ -	18,00	$ 7.168.938,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 4 VÍAS CON DAMPER DE 12"X9"	und	-	$ 419.090,77	$ -	51,00	$ 21.373.629,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 4 VÍAS CON DAMPER DE 15"X9"	und	-	$ 465.395,86	$ -	4,00	$ 1.861.583,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 4 VÍAS CON DAMPER DE 18"X12"	und	-	$ 637.018,31	$ -	1,00	$ 637.018,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 4 VÍAS CON DAMPER DE 24"X12"	und	-	$ 727.502,32	$ -	1,00	$ 727.502,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 2 VÍAS CON DAMPER DE 6"X6"	und	-	$ 334.325,31	$ -	2,00	$ 668.651,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CON MARCO DE MONTAJE DE 2 VÍAS CON DAMPER DE 21"X9"	und	-	$ 652.112,91	$ -	2,00	$ 1.304.226,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 6"x6"	und	-	$ 195.020,16	$ -	51,00	$ 9.946.026,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 10"x10"	und	-	$ 281.534,55	$ -	18,00	$ 5.067.622,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 12"x6"	und	-	$ 258.375,32	$ -	7,00	$ 1.808.627,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 12"x8"	und	-	$ 275.218,27	$ -	14,00	$ 3.853.056,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 12"x12"	und	-	$ 318.429,65	$ -	5,00	$ 1.592.148,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 14"x8"	und	-	$ 297.375,45	$ -	16,00	$ 4.758.007,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 16"x8"	und	-	$ 310.010,42	$ -	6,00	$ 1.860.063,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 16"x12"	und	-	$ 362.648,76	$ -	2,00	$ 725.298,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.5.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 18"x6"	und	-	$ 307.904,49	$ -	6,00	$ 1.847.427,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	

75221

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	5/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P.6.5.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 20"x10"	und	-	$ 418.586,77	$ -	1,00	$ 418.587,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.5.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 24"x12"	und	-	$ 488.259,72	$ -	4,00	$ 1.953.039,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.5.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 24"x18"	und	-	$ 656.987,11	$ -	4,00	$ 2.627.948,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.5.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 30"x12"	und	-	$ 600.228,55	$ -	1,00	$ 600.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.5.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 30"x18"	und	-	$ 809.969,75	$ -	13,00	$ 10.529.607,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.5.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON MARCO DE MONTAJE TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 30"x24"	und	-	$ 1.019.711,85	$ -	5,00	$ 5.098.559,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.5.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LOUVER TOMA Y DESCARGA DE AIRE SIN DAMPER DE 24"X24"	und	-	$ 960.992,58	$ -	11,00	$ 10.570.918,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL													
6.6	DAMPER DE BALANCEO				$ 143.132.144,00		$ 170.419.989,00		$ -		$ -		$ -	
6.6.1	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 4"x4")	und	51,00	$ 73.968,00	$ 3.772.368,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.6.2	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 8"x4")	und	54,00	$ 73.968,00	$ 3.994.272,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.6.3	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 10"x4")	und	16,00	$ 69.735,00	$ 1.115.760,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.6.4	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 10"x6")	und	1,00	$ 72.501,00	$ 72.501,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.6.5	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 12"x4")	und	15,00	$ 76.084,00	$ 1.141.260,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.6.6	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 12"x6")	und	13,00	$ 80.317,00	$ 1.044.121,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.6.7	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 14"x8")	und	1,00	$ 86.667,00	$ 86.667,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.6.8	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 18"x8")	und	1,00	$ 109.948,00	$ 109.948,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.6.9	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 28"x14")	und	14,00	$ 220.003,00	$ 3.080.042,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6.6.10	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 30"x40")	und	2,00	$ 450.697,00	$ 901.394,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P.6.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 6"X4"	und	-	$ 368.679,38	$ -	1,00	$ 368.679,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 8"X4"	und	-	$ 378.876,17	$ -	4,00	$ 1.515.505,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 8"X6"	und	-	$ 393.959,73	$ -	2,00	$ 787.919,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 8"X8"	und	-	$ 478.247,55	$ -	5,00	$ 2.391.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 10"X6",	und	-	$ 465.050,10	$ -	1,00	$ 465.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 10"X8"	und	-	$ 530.671,83	$ -	3,00	$ 1.592.015,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 10"X10"	und	-	$ 601.874,62	$ -	1,00	$ 601.875,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 12"X8"	und	-	$ 611.899,75	$ -	2,00	$ 1.223.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 12"X10"	und	-	$ 678.385,96	$ -	5,00	$ 3.391.928,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 14"X8"	und	-	$ 669.636,76	$ -	4,00	$ 2.678.547,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 14"X10"	und	-	$ 827.331,59	$ -	4,00	$ 3.309.326,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 16"X10"	und	-	$ 907.608,11	$ -	3,00	$ 2.722.824,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 18"X12"	und	-	$ 980.597,08	$ -	2,00	$ 1.961.194,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 20"X12"	und	-	$ 1.149.228,04	$ -	3,00	$ 3.447.684,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 20"X14"	und	-	$ 1.302.725,01	$ -	1,00	$ 1.302.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 20"X16"	und	-	$ 1.361.907,33	$ -	2,00	$ 2.723.815,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.6.6.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 24"X12"	und	-	$ 1.293.123,12	$ -	1,00	$ 1.293.123,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	8/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyt.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	383 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	
N.P.6.6.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 24"X14"	und	-	$ 1.467.772,56	$ -	2,00	$ 2.935.545,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 24"X16"	und	-	$ 1.688.134,34	$ -	1,00	$ 1.688.134,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER DE BALANCEO MANUAL CON MECANISMO TIPO PIÑON DE 24"X20"	und	-	$ 2.069.622,40	$ -	1,00	$ 2.069.622,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X6"	und	-	$ 200.339,80	$ -	120,00	$ 24.039.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 10"X6"	und	-	$ 227.701,89	$ -	3,00	$ 683.106,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 12"X6"	und	-	$ 247.754,04	$ -	13,00	$ 3.220.803,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 12"X8"	und	-	$ 269.907,63	$ -	3,00	$ 809.723,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 12"X12"	und	-	$ 318.429,65	$ -	3,00	$ 955.289,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 16"X8"	und	-	$ 310.010,42	$ -	1,00	$ 310.010,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 16"X12"	und	-	$ 378.581,31	$ -	2,00	$ 757.163,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 18"X6"	und	-	$ 307.904,49	$ -	1,00	$ 307.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.6.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 18"X12"	und	-	$ 408.153,85	$ -	2,00	$ 816.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	SUBTOTAL				$ 15.318.333,00		$ 70.370.550,00		$ -		$ -		$ -		
6,7	DUCTERIA														
6,7,1	Suministro e instalacion de ducteria en lamina poliisocianurato con cara exterior e interior en laminado de aluminio, espesor 20mm	m2	2.535,00	$ 149.430,00	$ 378.865.050,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,7,2	Suministro e instalacion de ducteria en lamina galvanizada cal.24, sistema TDF	m2	2.725,00	$ 120.721,00	$ 328.964.725,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,7,3	Suministro e instalacion de ducteria en lamina galvanizada cal.22, sistema TDF	m2	310,00	$ 134.117,00	$ 41.576.270,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,7,4	Suministro e instalacion de ducteria en lamina galvanizada cal.18	m2	44,00	$ 213.046,00	$ 9.374.024,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS														
N.P.6.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO CON SISTEMA DE UNION ESPECIFICO	m2	-	$ 443.222,61	$ -	3.864,95	$ 1.713.033.227,00	575,50	$ 255.074.612,00	1.125,57	$ 498.878.073,00	1.701,07	$ 753.952.685,00	44,01	
N.P.6.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 RECUBRIMIENTO Z120	m2	-	$ 446.768,87	$ -	1.530,01	$ 683.560.839,00	0,00	$ -	358,15	$ 160.010.271,00	358,15	$ 160.010.271,00	23,41	
N.P.6.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 RECUBRIMIENTO Z120	m2	-	$ 478.466,23	$ -	72,56	$ 34.717.510,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.7.8	PRUEBAS PRESOSTATICAS, DE GASES, DE ESTANQUEIDAD Y DE SOLDADURA EN SISTEMA HVAC	UN		$ 91.267.378,65	$ -	1,00	$ 91.267.379,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	SUBTOTAL				$ 758.720.069,00		$ 2.522.578.955,00		$ 255.074.612,00		$ 658.888.344,00		$ 913.962.956,00		
6,8	TUBERIA DE AGUA FRIA														
6,8,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø3/4"	m	650,00	$ 180.916,00	$ 117.595.400,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,8,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø1"	m	512,00	$ 187.908,00	$ 96.208.896,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,8,3	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø1-1/4"	m	658,00	$ 254.901,00	$ 167.724.858,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,8,4	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø1-1/2"	m	238,00	$ 300.651,00	$ 71.554.938,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,8,5	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø2"	m	343,00	$ 480.553,00	$ 164.829.679,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,8,6	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø2-1/2"	m	70,00	$ 550.569,00	$ 38.539.830,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,8,7	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø3"	m	185,00	$ 634.186,00	$ 117.324.410,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,8,8	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø4"	m	42,00	$ 888.057,00	$ 37.298.394,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,8,9	Suministro e instalacion de tuberia PVC aislado RDE 21 Ø6"	m	94,00	$ 1.385.141,00	$ 130.203.254,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS														
N.P.6.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1-5/8" CON AISLAMIENTO TERMICO DE CELDA CERRADA	m	-	$ 537.498,67	$ -	157,98	$ 84.914.040,00	0,00	$ -	25,56	$ 13.738.466,00	25,56	$ 13.738.466,00	16,18	
N.P.6.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1-3/8" CON AISLAMIENTO TERMICO DE CELDA CERRADA	m	-	$ 452.840,36	$ -	156,54	$ 70.887.630,00	0,00	$ -	20,48	$ 9.274.171,00	20,48	$ 9.274.171,00	13,08	
N.P.6.8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1-1/8" CON AISLAMIENTO TERMICO DE CELDA CERRADA	m	-	$ 300.179,26	$ -	279,75	$ 83.975.148,00	0,00	$ -	58,51	$ 17.563.489,00	58,51	$ 17.563.489,00	20,92	
N.P.6.8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 7/8" CON AISLAMIENTO TERMICO DE CELDA CERRADA	m	-	$ 218.764,28	$ -	325,74	$ 71.260.277,00	0,00	$ -	64,05	$ 14.011.852,00	64,05	$ 14.011.852,00	19,66	
N.P.6.8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 3/4" CON AISLAMIENTO TERMICO DE CELDA CERRADA	m	-	$ 202.405,75	$ -	495,93	$ 100.379.084,00	0,00	$ -	91,83	$ 18.586.920,00	91,83	$ 18.586.920,00	18,52	

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	8/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvit.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cointerhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P.6.8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 5/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	m	-	$ 168.118,36	$ -	323,88	$ 54.450.174,00	0,00	$ -	97,71	$ 16.426.845,00	97,71	$ 16.426.845,00	30,17	
N.P.6.8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1/2" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	m	-	$ 126.609,12	$ -	263,09	$ 33.309.593,00	0,00	$ -	48,26	$ 6.110.156,00	48,26	$ 6.110.156,00	18,34	
N.P.6.8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 3/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	m	-	$ 96.158,58	$ -	652,38	$ 62.731.934,00	0,00	$ -	165,02	$ 15.868.089,00	165,02	$ 15.868.089,00	25,30	
N.P.6.8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1/4" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	m	-	$ 70.446,79	$ -	162,28	$ 11.432.105,00	0,00	$ -	32,28	$ 2.274.022,00	32,28	$ 2.274.022,00	19,89	
	SUBTOTAL														
6,9	ACCESORIO TUBERIAS				$ 941.279.659,00		$ 573.339.985,00		$ -		$ 113.854.010,00		$ 113.854.010,00		
6,9,1	Suministro e instalacion de valvula de compuerta en bronce Ø2-1/2"	UN	6,00	$ 429.738,00	$ 2.578.428,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,9,2	Suministro e instalacion de valvula de compuerta en bronce Ø3"	UN	6,00	$ 491.152,00	$ 2.946.912,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,9,3	Suministro e instalacion de valvula de compuerta en bronce Ø4"	UN	2,00	$ 904.859,00	$ 1.809.718,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,9,4	Suministro e instalacion de tanque de expansion cerrado 48,5 Galones	UN	1,00	$ 10.261.947,00	$ 10.261.947,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,9,5	Suministro e instalacion de separador de aire VORTEX@720GPM	UN	1,00	$ 28.575.791,00	$ 28.575.791,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,9,6	Suministro e instalacion de valvula de control proporcional independiente de la presion Ø3"(Bypass)	UN	1,00	$ 6.004.925,00	$ 6.004.925,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,9,7	Suministro e instalacion de valvula de flujo turbina Ø6"	UN	1,00	$ 4.811.381,00	$ 4.811.381,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS														
N.P.6.9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y-BRANCH PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO K UNIDADES EXTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	UN	-	$ 3.549.665,56	$ -	9,00	$ 31.946.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y-BRANCH PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO K UNIDADES INTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	UN	-	$ 2.188.232,32	$ -	73,00	$ 159.740.959,00	0,00	$ -	27,00	$ 59.082.273,00	27,00	$ 59.082.273,00	36,99	
	SUBTOTAL														
6,10	TABLEROS ELECTRICOS FUERZA/CONTROL				$ 56.989.102,00		$ 191.687.949,00		$ -		$ 59.082.273,00		$ 59.082.273,00		
6,10,1	Suministro e instalacion TAE-S1(FUERZA Y CONTROL EXTRACCION SOTANOS)	UN	1,00	$ 13.132.335,00	$ 13.132.335,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,2	Suministro e instalacion TAE-01	UN	1,00	$ 6.583.004,00	$ 6.583.004,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,3	Suministro e instalacion TAE-02	UN	1,00	$ 6.476.846,00	$ 6.476.846,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,4	Suministro e instalacion TAE-03	UN	1,00	$ 4.124.556,00	$ 4.124.556,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,5	Suministro e instalacion TAE-04	UN	1,00	$ 4.050.356,00	$ 4.050.356,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,6	Suministro e instalacion TAE-05	UN	1,00	$ 4.639.650,00	$ 4.639.650,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,7	Suministro e instalacion TAE-06	UN	1,00	$ 4.853.235,00	$ 4.853.235,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,8	Suministro e instalacion TAE-07	UN	1,00	$ 4.543.373,00	$ 4.543.373,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,9	Suministro e instalacion TAE-08	UN	1,00	$ 6.508.292,00	$ 6.508.292,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,10	Suministro e instalacion TAE-09A/9B	UN	2,00	$ 2.212.869,00	$ 4.425.738,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,11	Suministro e instalacion TAE-09C	UN	1,00	$ 9.162.713,00	$ 9.162.713,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,12	Suministro e instalacion TAE-09D	UN	1,00	$ 9.908.236,00	$ 9.908.236,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,13	Suministro e instalacion de sensor de CO para 200m2	UN	12,00	$ 871.395,00	$ 10.456.740,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,14	Suministro e instalacion de switch presion diferencial para filtros	UN	1,00	$ 689.949,00	$ 689.949,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,15	Suministro e instalacion de transmisor de presion diferencial para filtro	UN	1,00	$ 1.093.687,00	$ 1.093.687,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,16	Suministro e instalacion de sensor de velocidad en ducto	UN	1,00	$ 1.049.298,00	$ 1.049.298,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,17	Suministro e instalacion de sensor de temperatura en ducto	UN	1,00	$ 911.477,00	$ 911.477,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,18	Suministro e instalacion de switch de presion diferencial en tuberia	UN	3,00	$ 1.700.769,00	$ 5.102.307,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,19	Suministro e instalacion de transmisor de presion diferencial en tuberia	UN	1,00	$ 4.640.016,00	$ 4.640.016,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,20	Suministro e instalacion de sensor de temperatura en tuberia	UN	2,00	$ 2.027.352,00	$ 4.054.704,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,21	Suministro e instalacion de kit de control para unidad de presurizacion de escalera	UN	2,00	$ 25.905.938,00	$ 51.811.876,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,22	Suministro e instalacion de sistema de control para UMA-01	UN	1,00	$ 13.957.325,00	$ 13.957.325,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,23	Suministro e instalacion de control central de planta de agua fria	UN	1,00	$ 29.037.304,00	$ 29.037.304,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
6,10,24	Suministro e instalacion de termostato de zona	UN	152,00	$ 398.939,00	$ 60.638.728,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS														
N.P.6.10.25	Control centralizado para sistemas de refrigerante variable	UN		$ 42.636.267,42	$ -	1,00	$ 42.636.267,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.10.26	Sistema de control para extracción de sotanos	UN		$ 195.499.337,18	$ -	1,00	$ 195.499.337,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.10.27	Suministro e instalación de Tablero general de acometidas (TGA-1, en cubierta 2).	UN		$ 55.076.196,70	$ -	1,00	$ 55.076.197,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.10.28	Suministro e instalación de Tablero general de acometidas (TGA-2,en cubierta 9).	UN		$ 44.471.682,94	$ -	1,00	$ 44.471.683,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.10.29	Suministro e instalación de Tablero general de acometidas (TGA-3, piso 4).	UN		$ 82.720.533,85	$ -	1,00	$ 82.720.534,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.6.10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE CO2	UN		$ 4.123.057,82	$ -	12,00	$ 49.476.694,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	SUBTOTAL				$ 261.851.745,00		$ 469.880.712,00		$ -		$ -		$ -		

75224

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cva.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consinterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consinterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL COMPONENTE AIRES ACONDICIONADO				$ 2.718.339.581,00		$ 4.276.850.856,00		$ 255.074.612,00		$ 891.918.866,00		$ 1.146.993.478,00	
7	SUMINISTRO DE EQUIPOS													
7,1	SUMINISTRO DE EQUIPOS (ARQUITECTONICO)													
7.1.1	SUMINISTRO ASCENSOR CAMILLERO CON UNA CAPACIDAD DE 1200 KG MANIOBRA DUPLEX	UN	2,00	$ 473.119.868,00	$ 946.239.736,00	6,00	$ 2.838.719.208,00	6,00	$ 2.838.719.208,00	0,00	$ -	6,00	$ 2.838.719.208,00	100,00
7.1.2	SUMINISTRO ASCENSOR CON UNA CAPACIDAD DE 1200 KG MANIOBRA CUADRUPLEX	UN	4,00	498.983.074,00	$ 1.995.932.296,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 2.942.172.032,00		$ 2.838.719.208,00		$ 2.838.719.208,00		$ -		$ 2.838.719.208,00	
7,2	SUMINISTRO DE EQUIPOS HIDRAULICOS E HIDROSANITARIOS													
7.2.1	SUMINISTRO EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DE TRES (3) BOMBAS EN PARALELO DE 10 HP PARA UN CAUDAL DE BOMBEO CADA UNO DE 4,96 L/S Y UNA ALTURA DINAMICA TOTAL DE 65,43 M.C.A, INCLUYE 1 TANQUE PULMON DE 300 L	UN	1,00	$ 89.762.330,00	$ 89.762.330,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7.2.2	SUMINISTRO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE IHM WQK48-30-7,5 10 HP 220V O SIMILAR, INCLUYE ARRANCADOR Y SWITCH FLOTADOR	UN	1,00	$ 22.576.848,00	$ 22.576.848,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7.2.3	SUMINISTRO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE IHM WQK30-20-3,7 5HP 220V O SIMILAR, INCLUYE ARRANCADOR Y SWITCH FLOTADOR	UN	1,00	$ 13.238.181,00	$ 13.238.181,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7.2.4	SUMINISTRO EQUIPO CONTRA INCENDIO LISTADO ELECTRICO SCF-150-125-250 200 HP 406 V, COMPUESTO POR BOMBA ELECTRICA DE 1000 GPM-PRESION NOMINAL 187 PSI, MOTOR ELECTRICO DE 200 HP, ULTABLERO CONTROLADOR BOMBA ELECTRICA , MOTOBOMBA JOCKEY 16,5 GPM-PRESION NOMINAL 197 PSI-POTENCIA 9HP-VOLTAJE 440 V/3 FASES, TABLERO CONTROLADOR BOMBA JOCKEY-POTENCIA 5 HP-VOLTAJE 460 V, ACCESORIOS INCLUIDOS: MANOMETRO Y VACUOMETRO DE CARATULA DE 3 1/2" PARA DESCARGA Y SUCCION, VALVULA DESAIREADORA, VALVULA DE ALIVIO,MEDIDOR DE FLUJO DE 6", CABEZAL DE PRUEBAS DE 6" CON 4 SET DE VALVULAS DE 2 1/2", INCREMENTADOR CONCENTRICO EN LA DESCARGA 952-D-5"6-104 / DN125-150, REDUCTOR EXCENTRICO EN LA SUCCION 952-S-8"6-104/DN200-150	UN	1,00	$ 432.672.861,00	$ 432.672.861,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P.7.2.5	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE TIPO SISTEMA VARIVOOSTER CON TRES BOMBAS MODELO SVB20A-10-3-500 Y/O SIMILAR , CON TANQUE PULMON DE 500 LITROS, POTENCIA DE CADA BOMBA DE 10 HP , CAUDAL 264 GPM Y PRESION DE 68 MCA. INCLUYE VALVULA CHEQUE PASAMURO, VALVULA ANTIVIBRACION Y NIPLES EN AC SCH 40.	UN	-	$ 95.519.136,72	$ -	1,00	$ 95.519.137,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.2.6	SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EYECTOR CUARTO DE BOMBAS, WQ 60-10-4 Y/O SIMILAR DE 5,5 HP ALTURA DINAMICA DE 10 MCA Y CAUDAL DE 15,77 LPS	UN	-	$ 19.260.220,23	$ -	2,00	$ 38.520.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.2.7	SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EYECTOR SOTANO. WQ 65-15-5,5 Y/O SIMILAR DE 7,5 HP ALTURA DINAMICA DE 15 MCA Y CAUDAL DE 23,40 LPS. INCLUYE ACCESORIO Y BRIDA DE CONEXIÓN	UN	-	$ 33.505.219,34	$ -	2,00	$ 67.010.439,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.2.8	EQUIPO CONTRA INCENDIO LISTADO, COMPUESTO POR BOMBA ELECTRICA DE 500 GPM-PRESION NOMINAL 200 PSI, ULTABLERO CONTROLADOR BOMBA ELECTRICA , TABLERO CONTROLADOR BOMBA JOCKEY-POTENCIA 5 HP-VOLTAJE 460 V, ACCESORIOS INCLUIDOS: SUCCION DE 5", DESCARGA DE 5" VALVULA DE ALIVIO DE 3", DESCARGA DE VALVULA DE ALIVIO 5", DISPOSITIVO DE MEDICION DE 5", VALVULAS DE MANGUERA DE 2 1/2", CABEZAL DE MANGUERA DE 4", JUNTAS DE EXPANSION, VALVULA PRINCIPAL ACCESORIOS Y NIPLES PARA MONTAJE.	UN	-	$ 382.770.960,37	$ -	1,00	$ 382.770.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				$ 558.250.220,00		$ 583.820.976,00		$ -		$ -		$ -	
7,3	SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS													
7.3.1	SUMINISTRO DE CELDA DUPLEX CON SECCIONADORES TRIPOLARES EN AIRE 35 KV, OPERACIÓN BAJO CARGA, DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS 519-5, INCLUYE FUSIBLES TIPO HH DE 50A (6) - EN CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 44.928.662,00	$ 44.928.662,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7.3.2	SUMINISTRO DE CELDA DE MEDIDA PARA MEDIA TENSIÓN (35KV) EN 3 ELEMENTOS INCLUYE TC'S Y TP'S, BORNERA, Y MEDIDOR ELECTRONICO BIDIRECCIONAL DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE327	UN	1,00	$ 39.540.592,00	$ 39.540.592,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7.3.3	SUMINISTRO DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800KVA A 35KV - DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS518-2	UN	1,00	$ 19.452.720,00	$ 19.452.720,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7.3.4	SUMINISTRO DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 600KVA A 35KV - DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS518-2	UN	1,00	$ 19.452.720,00	$ 19.452.720,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7.3.5	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA CLASE H, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34500/460-266V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, INCLUYE DPS A INSTALAR EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSION, RIELES DE PISO, BASE PARA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 129.855.526,00	$ 129.855.526,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

Calle 15 No. 48 -03 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

25225

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conInterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conInterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	
7.3.6	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 600 KVA CLASE H, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34500/214-124V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, INCLUYE DPS A INSTALAR EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, RIELES DE PISO, BASE PARA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 112.045.594,00	$ 112.045.594,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.3.7	SUMINISTRO DE PLANTA ELÉCTRICA DE 600 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE: CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE - TENSIÓN DE SALIDA 214V FASE - FASE - INCLUYE DUCTO METALICO DE ESCAPE AUTOSOPORTADO DE 10" CON LENGUETA DE ESCAPE	UN	1,00	$ 520.876.998,00	$ 520.876.998,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.3.8	SUMINISTRO DE PLANTA ELÉCTRICA DE 800 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE: CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE - TENSIÓN DE SALIDA 460V FASE - FASE - INCLUYE DUCTO METALICO DE ESCAPE AUTOSOPORTADO DE 10" CON LENGUETA DE ESCAPE	UN	1,00	$ 592.555.558,00	$ 592.555.558,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.3.9	SUMINISTRO DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 450WP	UN	72,00	$ 1.098.803,00	$ 79.113.816,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS														
N.P.7.3.10	SUMINISTRO CELDA DE MEDIA TENSIÓN A 34.5 KV SF6 PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES. INCLUYE FUSIBLESSUMINISTRO DE CELDA PARA PROTECCIÓN, 36 KV - 630 A - 20KA, DE USO INTERIOR, OPERACIÓN MANUAL REFERENCIA SYSTEM6, TIPO TM, PARA UTILIZAR CON FUSIBLES DE MEDIA TENSIÓN TIPO HH SERIE 36 KV, ACORDES A LA NORMA DIN 43625, COMPUESTA DE: 1. SECCIONADOR DE LINEA TRIPOLAR, DE OPERACIÓN BAJO CARGA, AISLADO EN SF6. 2. SECCIONADOR DE TIERRA TRIPOLAR SUPERIOR, AISLADO EN SF6. 3. SECCIONADOR DE TIERRA TRIPOLAR INFERIOR, AISLADO EN AIRE. 4. JUEGO DE BARRAS DE INTERCONEXIÓN SUPERIOR. 5. MECANISMO PARA OPERACIÓN MANUAL CON PALANCA. 6. BOBINA DE DISPARO 120 VAC. 7. TERNA INDICADORA DE PRESENCIA DE TENSIÓN + AISLADORES CAPACITIVOS. 8. BASE PORTA FUSIBLES + SISTEMA MECÁNICO DE OPERACIÓN TRIPOLAR POR FUSIÓN FUSIBLE 9. SEÑALIZACIÓN MECÁNICA DE FUSIÓN DE FUSIBLE. 10. BORNE PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE. 11. RESISTENCIA ANTICONDENSACIÓN 220 VAC.	UN	-	$ 91.366.772,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.3.11	SUMINISTRO DE CELDA DE ENTRADA O SALIDA, 36 KV – 630 A – 20 KA, DE USO INTERIOR, OPERACIÓN MANUAL, REFERENCIA SYSTEM6, TIPO I, COMPUESTA DE: 1. SECCIONADOR DE LINEA TRIPOLAR, DE OPERACIÓN BAJO CARGA, AISLADO EN SF6. 2. SECCIONADOR DE TIERRA TRIPOLAR SUPERIOR, AISLADO EN SF6. 3. JUEGO DE BARRAS DE INTERCONEXIÓN SUPERIOR. 4. MECANISMO PARA OPERACIÓN MANUAL CON PALANCA. 5. TERNA INDICADORA DE PRESENCIA DE TENSIÓN + AISLADORES CAPACITIVOS. 6. BORNE PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE. 7. RESISTENCIA ANTICONDENSACIÓN 220 VAC	UN	-	$ 83.040.104,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.3.12	SUMINISTRO DE CELDA PARA MEDIDA, 36 KV – 630A – 20KA, DE USO INTERIOR, REFERENCIA SYSTEM6, TIPO MA, COMPUESTA DE: 1. TABLERO PARA MEDIDOR. 2. TRES (3) TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE RELACIÓN (ESPECIFICAR). 3. TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE RELACIÓN(ESPECIFICAR). 4. BARRAS DE INTERCONEXIÓN. 5. BANDEJA PARA INSTALAR BORNERA DE CONEXIÓN Y MEDIDOR. 6. RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN 220 VAC. 7. UNA (1) BORNERA DE CONEXIÓN TRES ELEMENTOS. 8. CABLEADO DE BAJA TENSIÓN. NO INCLUYE MEDIDOR, MÓDEM DE COMUNICACIÓN (ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR LA COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA).	UN	-	$ 162.568.280,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.3.13	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1250 KVA, CLASE F, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34500/208-110 V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, INCLUYE DPS A INSTALAR EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, RIELES DE PISO.	UN	-	$ 528.717.000,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.3.14	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 500 KVA, CLASE F, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34500/440-253 V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, INCLUYE DPS A INSTALAR EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, RIELES DE PISO.	UN	-	$ 343.037.333,33	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.3.15	SUMINISTRO DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 500 KVA CLASE F.	UN	-	$ 33.278.350,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.3.16	SUMINISTRO DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1250 KVA CLASE F.	UN	-	$ 44.819.565,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	SUBTOTAL				$ 1.557.822.186,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-	
7,4	SUMINISTRO DE EQUIPOS VOZ-DATOS-CCTV-SONIDO Y DETECCIÓN INCENDIOS														

75226

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA							
									ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	
7.4.1	Suministro de Camara Tipo Domo IP 5MP - POE -	UN	134,00	$ 413.573,00	$ 55.418.782,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.4.2	Suministro de Parlante Incrustar en Techo	UN	86,00	$ 485.940,00	$ 41.790.840,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.4.3	Suministro de Central Compacta Direccionable Sistema Detección Incendios 150 Elementos, 4000 Eventos	UN	8,00	$ 5.514.600,00	$ 44.116.800,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS															
N.P.7.4.4	SUMINISTRO DE CÁMARA TIPO MINIDOMO IP 5MP - POE - CON TECNOLOGÍA IR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN EN BAJA ILUMINACIÓN	UN	-	$ 2.558.500,00	$ -		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.4.5	SUMINISTRO DE CÁMARA TIPO BALA IP 5MP - POE - CON TECNOLOGÍA IR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN EN BAJA ILUMINACIÓN	UN	-	$ 3.213.000,00	$ -		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.4.6	SUMINISTRO DE CÁMARA TIPO PTZ IP 2MP	UN	-	$ 14.898.800,00	$ -		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.4.7	SUMINISTRO DE SOPORTE CON ALIMENTACIÓN PARA CÁMARA TIPO PTZ IP 2MP	UN	-	$ 2.320.500,00	$ -		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	SUBTOTAL				$ 141.326.422,00			$ -		$ -		$ -		$ -		
7.5	SUMINISTRO DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS															
7.5.1	SUMINISTRO DE CHILLER ENFRIADO POR AIRE TIPO SCROLL CAP. 100 TON 460V-3PH-60HZ	UN	3,00	$ 448.911.357,00	$ 1.346.734.071,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.2	SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA CONTROL SENSORLESS 360GPM @125 FT, (15KW), 460V-3PH-60HZ	UN	3,00	$ 88.936.507,00	$ 266.809.521,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.3	SUMINISTRO DE CONSOLA DE PARED HIDRONICA 9.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	3,00	$ 2.201.850,00	$ 6.605.550,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.4	SUMINISTRO DE CASSETE DE 4 VIAS HIDRONICO 24.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	2,00	$ 2.755.187,00	$ 5.510.374,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.5	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE BAJA PRESION ESTATICA 9.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	31,00	$ 2.201.850,00	$ 68.257.350,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.6	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE BAJA PRESION ESTATICA 12.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	16,00	$ 2.755.187,00	$ 44.082.992,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.7	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 18.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	18,00	$ 2.268.091,00	$ 40.825.638,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.8	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 24.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	30,00	$ 3.003.667,00	$ 90.110.010,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.9	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 30.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	14,00	$ 3.065.629,00	$ 42.918.806,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.10	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 36.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	18,00	$ 3.232.829,00	$ 58.190.922,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.11	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 42.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	12,00	$ 3.814.188,00	$ 45.770.256,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.12	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 48.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	7,00	$ 4.000.076,00	$ 28.000.532,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.13	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 54.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	5,00	$ 4.151.539,00	$ 20.757.695,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.14	SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE INTERIOR 76.311 BTU/H@2400CFM, 220V-3PH-60HZ	UN	1,00	$ 29.446.357,00	$ 29.446.357,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.15	SUMINISTRO DE VENTILADOR PARA PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS (VPE-1)	UN	2,00	$ 22.696.567,00	$ 45.393.134,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.16	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCION DE SOTANOS AXIAL (VE-S1)	UN	4,00	$ 4.311.704,00	$ 17.246.816,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.17	SUMINISTRO DE VENTILADOR TIPO JETFAN (VE-S2)	UN	8,00	$ 7.462.714,00	$ 59.701.712,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.18	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-01)	UN	1,00	$ 103.170.613,00	$ 103.170.613,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.19	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-02)	UN	1,00	$ 79.942.346,00	$ 79.942.346,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.20	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-03)	UN	1,00	$ 211.188.090,00	$ 211.188.090,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.21	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-04)	UN	1,00	$ 157.126.432,00	$ 157.126.432,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.22	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-05)	UN	1,00	$ 45.433.990,00	$ 45.433.990,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
7.5.23	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-06)	UN	1,00	$ 45.433.990,00	$ 45.433.990,00		-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
	ITEMS NO PREVISTOS															
N.P.7.5.24	UNIDAD TIPO PAQUETE CONDENSADO POR AIRE DE 25 TR. 220/3/60	UN	-	$ 107.820.418,86	$ -		2,00	$ 215.640.838,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.5.25	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 16 TR. 220/3/60	UN	-	$ 54.270.058,29	$ -		7,00	$ 379.890.408,00	7,00	$ 379.890.408,00	0,00	$ -	7,00	$ 379.890.408,00	100,00	
N.P.7.5.26	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 14 TR. 220/3/60	UN	-	$ 49.741.256,25	$ -		3,00	$ 149.223.769,00	3,00	$ 149.223.769,00	0,00	$ -	3,00	$ 149.223.769,00	100,00	
N.P.7.5.27	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 13 TR. 220/3/60	UN	-	$ 45.426.789,87	$ -		2,00	$ 90.853.580,00	2,00	$ 90.853.580,00	0,00	$ -	2,00	$ 90.853.580,00	100,00	
N.P.7.5.28	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 10 TR. 220/3/60	UN	-	$ 38.002.614,30	$ -		8,00	$ 304.020.914,00	8,00	$ 304.020.914,00	0,00	$ -	8,00	$ 304.020.914,00	100,00	
N.P.7.5.29	UNIDAD CONDENSADORA TIPO SPLIT DE 7.5 TR. 220/3/60	UN	-	$ 28.731.282,65	$ -		2,00	$ 57.462.565,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	
N.P.7.5.30	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 8 TR. 220/1/60	UN	-	$ 25.335.239,23	$ -		15,00	$ 380.028.588,00	13,00	$ 329.358.110,00	0,00	$ -	13,00	$ 329.358.110,00	86,67	
N.P.7.5.31	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 6 TR. 220/1/60	UN	-	$ 21.013.820,87	$ -		13,00	$ 273.179.671,00	12,00	$ 252.165.850,00	0,00	$ -	12,00	$ 252.165.850,00	92,31	

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	5/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P.7.5.32	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 5 TR. 220/1/60	UN	-	$ 9.083.166,47	$ -	2,00	$ 18.166.333,00	2,00	$ 18.166.333,00	0,00	$ -	2,00	$ 18.166.333,00	100,00
N.P.7.5.33	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 4 TR. 220/1/60	UN	-	$ 8.901.530,82	$ -	4,00	$ 35.606.123,00	4,00	$ 35.606.123,00	0,00	$ -	4,00	$ 35.606.123,00	100,00
N.P.7.5.34	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 3 TR. 220/1/60	UN	-	$ 8.774.240,09	$ -	3,00	$ 26.322.720,00	3,00	$ 26.322.720,00	0,00	$ -	3,00	$ 26.322.720,00	100,00
N.P.7.5.35	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 2.5 TR. 220/1/60	UN	-	$ 8.537.970,35	$ -	7,00	$ 59.765.792,00	7,00	$ 59.765.792,00	0,00	$ -	7,00	$ 59.765.792,00	100,00
N.P.7.5.36	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 2 TR. 220/1/60	UN	-	$ 7.030.260,58	$ -	1,00	$ 7.030.261,00	1,00	$ 7.030.261,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.030.261,00	100,00
N.P.7.5.37	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 1.5 TR. 220/1/60	UN	-	$ 7.012.048,82	$ -	6,00	$ 42.072.293,00	6,00	$ 42.072.293,00	0,00	$ -	6,00	$ 42.072.293,00	100,00
N.P.7.5.38	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 1 TR. 220/1/60	UN	-	$ 5.558.879,13	$ -	4,00	$ 22.235.517,00	4,00	$ 22.235.517,00	0,00	$ -	4,00	$ 22.235.517,00	100,00
N.P.7.5.39	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS DE 4 TR. 220/1/60	UN	-	$ 10.289.192,20	$ -	1,00	$ 10.289.192,00	1,00	$ 10.289.192,00	0,00	$ -	1,00	$ 10.289.192,00	100,00
N.P.7.5.40	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS DE 1.5 TR. 220/1/60	UN	-	$ 8.093.823,08	$ -	2,00	$ 16.187.646,00	1,00	$ 8.093.823,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.093.823,00	50,00
N.P.7.5.41	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO PARED DE 1 TR. 220/1/60	UN	-	$ 4.549.562,78	$ -	1,00	$ 4.549.563,00	1,00	$ 4.549.563,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.549.563,00	100,00
N.P.7.5.42	UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO PARED DE 0.75 TR. 220/1/60	UN	-	$ 4.056.751,65	$ -	5,00	$ 20.283.758,00	5,00	$ 20.283.758,00	0,00	$ -	5,00	$ 20.283.758,00	100,00
N.P.7.5.43	UNIDAD MANEJADORA 1 A 1 DE 7.5 TR. 220/1/60	UN	-	$ 30.833.916,26	$ -	2,00	$ 61.667.833,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.5.44	JF-01-08. UNIDAD DE VENTILACIÓN TIPO JETFAN DE 4700 CFM	UN	-	$ 24.913.919,73	$ -	8,00	$ 199.311.358,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.5.45	VE-P. UNIDAD DE VENTILACIÓN AXIAL DE 9400 CFM	UN	-	$ 23.785.367,76	$ -	4,00	$ 95.141.471,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.5.46	VE-01. UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DE 7095 CFM	UN	-	$ 31.797.704,40	$ -	1,00	$ 31.797.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.5.47	VE-02. UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DE 4450 CFM	UN	-	$ 19.255.780,32	$ -	1,00	$ 19.255.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.5.48	VE-03. UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DE 2780 CFM	UN	-	$ 10.720.023,37	$ -	1,00	$ 10.720.023,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.5.49	VE-04. UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DE 1975 CFM	UN	-	$ 13.751.004,54	$ -	1,00	$ 13.751.005,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.5.50	VE-05. UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRIFUGO DE 855 CFM	UN	-	$ 10.117.269,33	$ -	1,00	$ 10.117.269,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.5.51	VP. UNIDAD DE VENTILACIÓN PLENUM FAN DE 15000 CFM	UN	-	$ 47.320.809,34	$ -	2,00	$ 94.641.619,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.7.5.52	SUMINISTRO REFRIGERANTE R410A	LB	-	$ 40.592,16	$ -	380,00	$ 15.425.021,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 2.858.657.197,00**		**$ 2.664.638.614,00**		**$ 1.759.928.006,00**		**$ -**		**$ 1.759.928.006,00**	
	SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS				**$ 8.058.228.057,00**		**$ 6.087.178.798,00**		**$ 4.598.647.214,00**		**$ -**		**$ 4.598.647.214,00**	
	COMPONENTES DE PRESUPUESTO													
	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL INCLUYE EQUIPOS ESPECIALES Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID DE 32,4 KVA	GB	1,00	$ 83.046.600,00	$ 83.046.600,00	1,00	$ 83.046.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	INSPECCION Y CERTIFICACION RETILAP	UN	1,00	$ 23.109.320,00	$ 23.109.320,00	1,00	$ 23.109.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UN	1,00	$ 85.045.879,00	$ 85.045.879,00	1,00	$ 85.045.879,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UN	1,00	$ 29.939.133,00	$ 29.939.133,00	1,00	$ 29.939.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P.CPM01	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS, CABLE CAT 6A	UN	-	$ 69.622,96	$ -	851,00	$ 59.249.139,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P.CPM02	CERTIFICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO POR HILO	UN	-	$ 105.469,17	$ -	144,00	$ 15.187.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	CERTIFICACION TRANSPORTE VERTICAL	UN	-	$ 692.700,00	$ -	6,00	$ 4.156.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 221.140.932,00**		**$ 299.733.831,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 80.389.497.271,00**		**$ 104.807.298.975,00**		**$ 60.060.465.420,00**		**$ 3.128.837.301,00**		**$ 63.189.302.721,00**	60,29%

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 80.389.497.271,00
VALOR ADICIONAL		$ 24.417.801.704,00
VALOR TOTAL		$ 104.807.298.975,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 104.807.298.975,00
ANTICIPO	40%	$ 41.922.919.590,00
PRESENTE ACTA		$ 3.128.837.301,00
ACUMULADO		$ 63.189.302.721,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
	RELACIÓN DE ACTAS	AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	$ 4.562.199.028,00	$ 1.824.879.611,20	$ 2.737.319.416,80
ACTA 2	$ 2.393.262.856,00	$ 957.305.142,40	$ 1.435.957.713,60
ACTA 3	$ 1.072.219.127,00	$ 428.887.650,80	$ 643.331.476,20
ACTA 4	$ 1.156.688.406,00	$ 462.675.362,40	$ 694.013.043,60
ACTA 5	$ 6.751.948.714,00	$ 2.700.779.485,60	$ 4.051.169.228,40
ACTA 6	$ 4.773.080.687,00	$ 1.909.232.274,80	$ 2.863.848.412,20
ACTA 7	$ 5.544.779.985,00	$ 2.217.911.994,00	$ 3.326.867.991,00
ACTA 8	$ 9.329.370.134,00	$ 3.731.748.053,60	$ 5.597.622.080,40
ACTA 9	$ 7.158.626.757,00	$ 2.863.450.702,80	$ 4.295.176.054,20

75228

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conjnterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conjnterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA					
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR %
	ACTA 10								$ 2.789.660.215,00				$ 1.115.864.086,00 $ 1.673.796.129,00
	ACTA 11								$ 4.576.683.471,00				$ 1.830.673.388,40 $ 2.746.010.082,60
	ACTA 12								$ 9.951.946.040,00				$ 3.980.778.416,00 $ 5.971.167.624,00
	PRESENTE ACTA								$ 3.128.837.301,00				$ 1.251.534.920,40 $ 1.877.302.380,60
	TOTALES								$ 63.189.302.721,00				$ 25.275.721.088,40 $ 37.913.581.632,60

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	63.189.302.721,00	60,29
POR EJECUTAR	$	41.617.996.254,00	39,71
POR AMORTIZAR	$	16.647.198.501,60	39,71
TOTALES	$	104.807.298.975,00	100,00

RELACION DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500331 (Registro Presupuestal No. 1002-2.3.19.1006.0300.003-00AD de 2023)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO INICIAL	$ 32.155.798.908,40			$ 32.155.798.908,40
2	PAGO PARCIAL N°1	$ 4.562.199.028,00	$ 1.824.879.611,20	$ 2.737.319.416,80	$ 34.893.118.325,20
3	PAGO PARCIAL N°2	$ 2.393.262.856,00	$ 957.305.142,40	$ 1.435.957.713,60	$ 36.329.076.038,80
4	PAGO PARCIAL N°3	$ 1.072.219.127,00	$ 428.887.650,80	$ 643.331.476,20	$ 36.972.407.515,00
5	PAGO PARCIAL N°4	$ 1.156.888.406,00	$ 462.675.362,40	$ 694.013.043,60	$ 37.666.420.558,60
6	PAGO PARCIAL N°5	$ 6.751.948.714,00	$ 2.700.779.485,60	$ 4.051.169.228,40	$ 41.717.589.787,00
7	PAGO PARCIAL N°6	$ 4.773.080.687,00	$ 1.909.232.274,80	$ 2.863.848.412,20	$ 44.581.438.199,20
8	PAGO PARCIAL N°7	$ 5.544.779.985,00	$ 2.217.911.994,00	$ 3.326.867.991,00	$ 47.908.306.190,20
9	PAGO PARCIAL N°8	$ 9.329.370.134,00	$ 3.731.748.053,60	$ 5.597.622.080,40	$ 53.505.928.270,60
10	PAGO PARCIAL N°9	$ 7.158.626.757,00	$ 2.863.450.702,80	$ 4.295.176.054,20	$ 57.801.104.324,80
11	PAGO PARCIAL N°10	$ 2.789.660.215,00	$ 1.115.864.086,00	$ 1.673.796.129,00	$ 59.474.900.453,80
12	ANTICIPO 1	$ 9.767.120.681,60			$ 69.242.021.135,40
13	PAGO PARCIAL N°11	$ 4.576.683.471,00	$ 1.830.673.388,40	$ 2.746.010.082,60	$ 71.988.031.218,00
14	PAGO PARCIAL N°12	$ 9.951.946.040,00	$ 3.980.778.416,00	$ 5.971.167.624,00	$ 77.959.198.842,00
15	PRESENTE ACTA	$ 3.128.837.301,00	$ 1.251.534.920,40	$ 1.877.302.380,60	$ 79.836.501.222,60
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 24.970.797.752,40			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS MCTE $**

NOTAS
El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3. Que la interventona certifica que el contratista Consorcio Hospital 002 identificado con el NIT 901.752.517-0 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N° 511 de 2023 representado legalmente por el Consorcio Hospital 002, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ___ de fecha ____ NO X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: **viernes, 17 de abril de 2026**

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO TROCHEZ ARIAS
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 175252-T

Firma:
Nombre: EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma:
Nombre: ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 117585-T

75229

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	13	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	6/12/2025 a 17/4/2026
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 104.807.298.975,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 109.637.519.295,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conInterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	MARIA XIMENA JARAMILLO CARVAJAL
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	conInterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	353 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17/4/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/04/2026		OBRA EJECUTADA					
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

75230

2523

MEMORIA DE CALCULO OBRA 112-ECP-FR-027

Carrera 38 N. 25-05 Barrio 7 de agosto – Villavicencio
Email: coordinador.hospital@cyg.com.co
Tel. 321-3370874

75232

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,1,1	**LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		
	AREA (M2)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M2)
AREA SOTANO	2.582,88	1,00	2.582,88
AREA SEMISOTANO	2.582,88	1,00	2.582,88
AREA PISO 1	2.679,07	1,00	2.679,07
AREA PISO 2	2.193,99	1,00	2.193,99
AREA PISO 3,4,5,6,7,8	1.077,03	6,00	6.462,18
CUBIERTA N+35.50	610,11	1,00	610,11
CUBIERTA N+37.40	90,20	1,00	90,20
TANQUE	96,36	1,00	96,36
PASAN:		**TOTAL**	**17.297,66**
		DSC ACTAC ANTERIORES (-)	**15.994,14**
		TOTAL PRESENTE ACTA	**1.303,52**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,1,1	**LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS**	**M2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







4523

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		ANCHO (M)	ALTO (M)	PROFUNDIDAD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
EDIFICIO UNP						
ZAPATAS		1,20	1,20	0,30	25,00	10,80
VIGAS DE CIMENTACION	1-2	0,25	0,50	5,27	1,00	0,66
	1-7	0,25	0,50	3,59	1,00	0,45
	2-3	0,25	0,50	4,10	1,00	0,51
	3-4	0,25	0,50	3,86	1,00	0,48
	3-8	0,25	0,50	3,67	1,00	0,46
	4-5	0,25	0,50	5,74	1,00	0,72
	4-9	0,25	0,50	3,91	1,00	0,49
	5-6	0,25	0,50	6,35	1,00	0,79
	5-10	0,25	0,50	3,97	1,00	0,50
	6-11	0,25	0,50	3,83	1,00	0,48
	7-8	0,25	0,50	7,68	1,00	0,96
	7-12	0,25	0,50	1,73	1,00	0,22
	8-9	0,25	0,50	3,88	1,00	0,49
	8-13	0,25	0,50	0,80	1,00	0,10
	9-10	0,25	0,50	5,73	1,00	0,72
	9-14	0,25	0,50	1,02	1,00	0,13
	10-11	0,25	0,50	6,39	1,00	0,80
	10-15	0,25	0,50	1,39	1,00	0,17
	11-16	0,25	0,50	1,55	1,00	0,19
	12-13	0,25	0,50	7,20	1,00	0,90
VIGAS DE CIMENTACION	12-17	0,25	0,50	3,79	1,00	0,47
	13-14	0,25	0,50	3,91	1,00	0,49
	13-18	0,25	0,50	4,91	1,00	0,61
	14-15	0,25	0,50	5,75	1,00	0,72
	14-19	0,25	0,50	4,24	1,00	0,53
	15-16	0,25	0,50	6,39	1,00	0,80
	15-21	0,25	0,50	3,70	1,00	0,46
	16-22	0,25	0,50	3,70	1,00	0,46
	17-18	0,25	0,50	4,52	1,00	0,57
	18-19	0,25	0,50	3,71	1,00	0,46
	19-20	0,25	0,50	3,06	1,00	0,38
	19-23	0,25	0,50	5,37	1,00	0,67
	20-21	0,25	0,50	2,39	1,00	0,30
	20-24	0,25	0,50	5,33	1,00	0,67
	21-22	0,25	0,50	6,41	1,00	0,80
	21-25	0,25	0,50	5,41	1,00	0,68
PASAN:	-				SUBTOTAL	30,08
					TOTAL	30,08

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

EDIFICIO UNP						
VIGAS DE CIMENTACION	23-24	0,25	0,50	2,83	1,00	0,35
	24-25	0,25	0,50	2,50	1,00	0,31
MIGRACION						
ZAPATAS		1,00	1,00	0,30	5,00	1,50
VIGAS CONTRAPISO		0,25	0,50	121,66	1,00	15,21
FISCALIA						
ZONA 1	VIGA CIMENTACION	0,35	0,50	180,17	1,00	31,53
PORTICO	VIGA CIMENTACION	0,35	0,50	7,28	1,00	1,27
ZONA 2	VIGA CIMENTACION	0,25	0,25	59,31	1,00	3,71
ZONA 3	VIGA CIMENTACION	0,30	0,50	93,70	1,00	14,06
ZONA 4	VIGA CIMENTACION	0,20	0,25	119,45	1,00	5,97
ZONA 5	VIGA CIMENTACION	0,25	0,50	49,21	1,00	6,15
ZAPATAS		1,20	1,20	0,30	38,00	16,42
CASETA 1						
VIGAS DE CIMENTACION		0,50	0,32	13,08	1,00	2,09
CASETA 2						
VIGAS DE CIMENTACION		0,50	0,32	21,74	1,00	3,48
PORTERIA						
VIGAS DE CIMENTACION		0,50	0,32	12,84	1,00	2,05
CAMPAMENTO						
VIGAS DE CIMENTACION		0,25	0,25	100,33	1,00	6,27
PASAN:	**30,08**				**SUBTOTAL**	**110,38**
					TOTAL	**140,46**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7523

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

OTROS						
VIGAS CIMENTACION PASILLO	ZONA 2	0,25	0,25	16,91	1,00	1,06
	ZONA 3	0,20	0,20	21,32	1,00	0,85
	CAMPAMENTO	0,20	0,20	33,11	1,00	1,32
ZAPATAS MURO CONTENCION	CARA 1	30,75	0,35	0,95	1,00	10,22
	CARA 2	1,75	0,35	12,70	1,00	7,78
					SUBTOTAL	**21,24**
PASAN:	**140,46**				**TOTAL**	**161,69**
					DSC ACTAS ANTERIORES (-)	**157,50**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**4,19**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

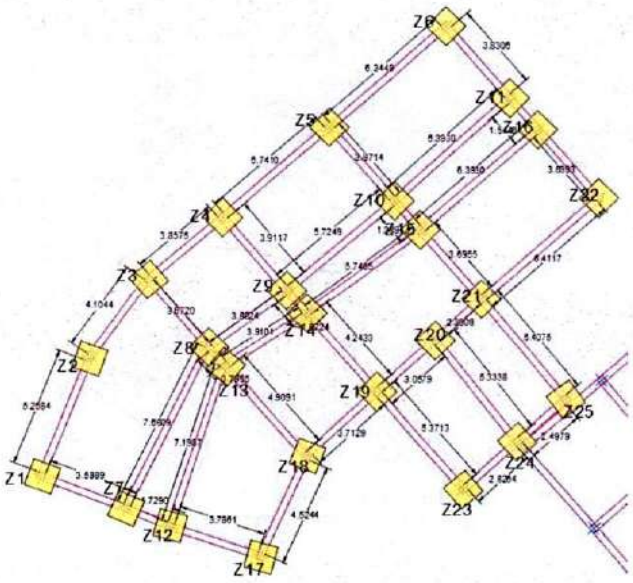

UNP





MIGRACION

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**	
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

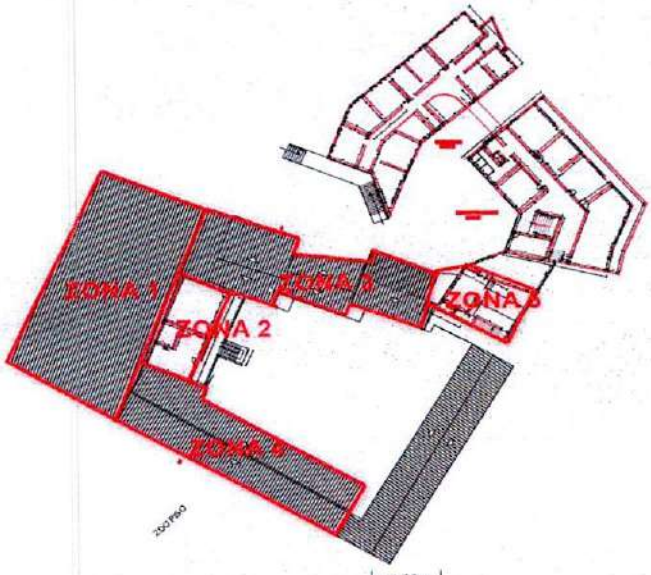

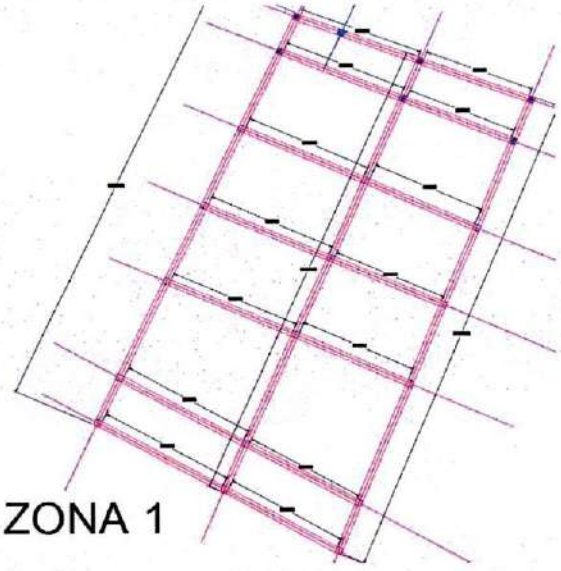


ZONA 1



DETALLE CIMENTACION ZONA 1

VISTA DE SECCION




VISTA EN PLANTA

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

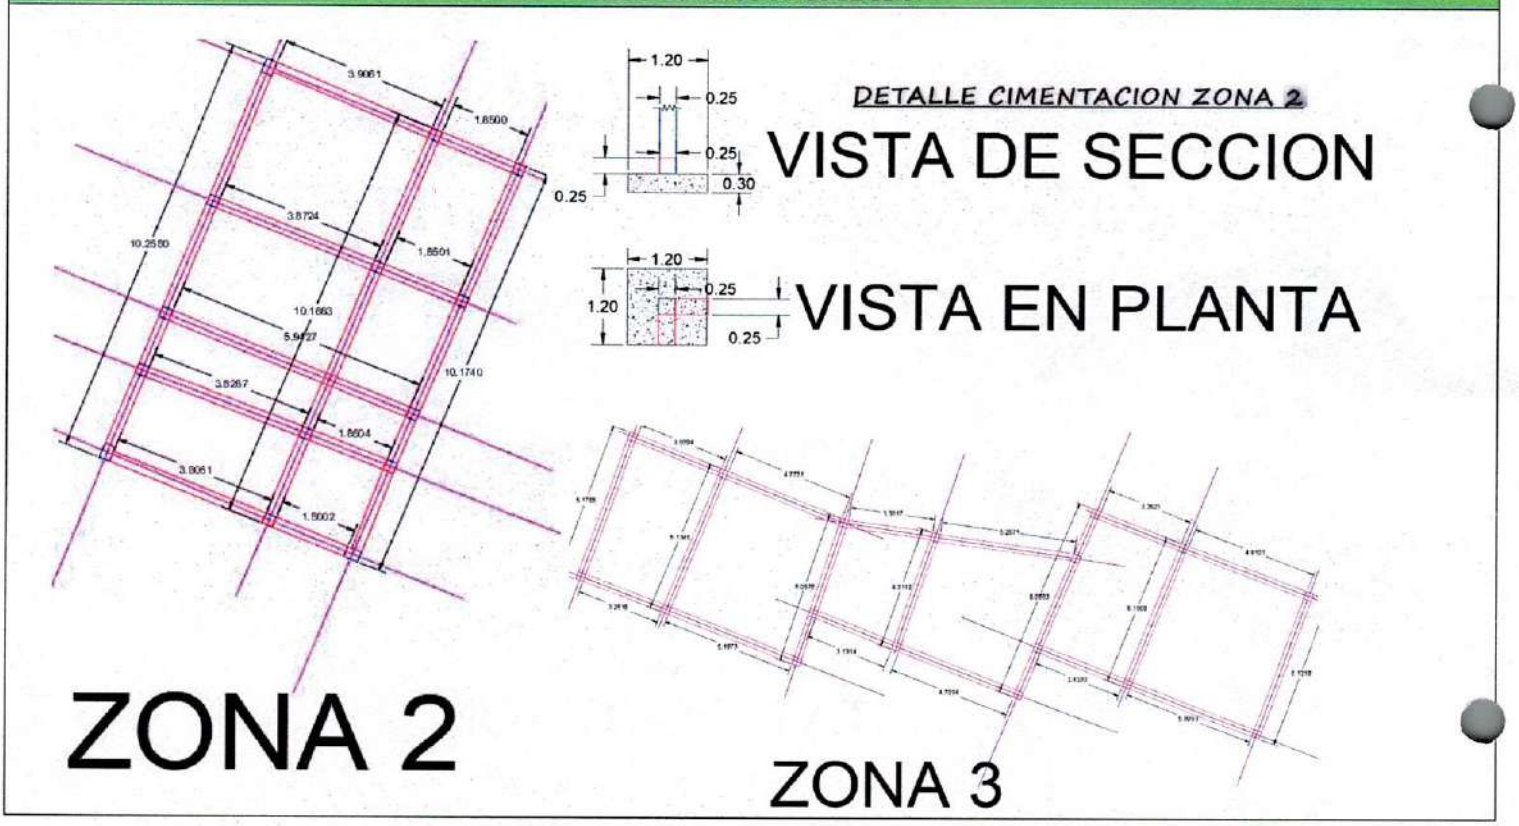

45236


CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**	
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



ZONA 4

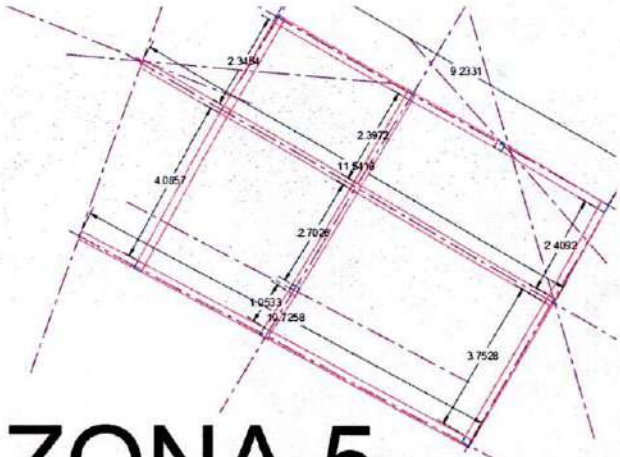

ZONA 5

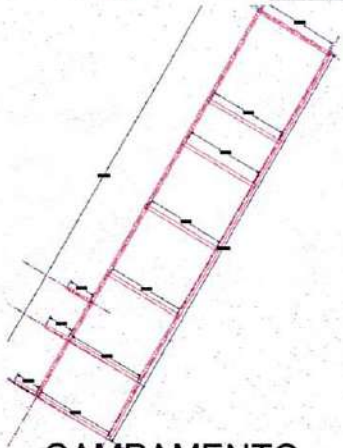

CAMPAMENTO

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







75237

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,6	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES			
		AREA (M2)	LARGO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
MIGRACION COLOMBIA					
VIGA CIMENTACION		0,64	96,24	1,00	61,59
NUDOS		1,00	1,80	23,00	41,40
CAMPAMENTO					
VIGA CIMENTACION		0,15	100,33	1,00	15,05
FISCALIA					
ZONA 3	VIGA CIMENTACION	0,52	93,70	1,00	48,72
ZONA 4	VIGA DE CIMENTACION	0,06	119,45	1,00	7,47
ZONA 5	VIGA DE CIMENTACION	0,64	49,21	1,00	31,49
PASAN: -				**TOTAL**	**205,73**
				DSC ACTAS ANTERIORES (-)	**151,93**
				TOTAL PRESENTE ACTA	**53,80**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,6	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

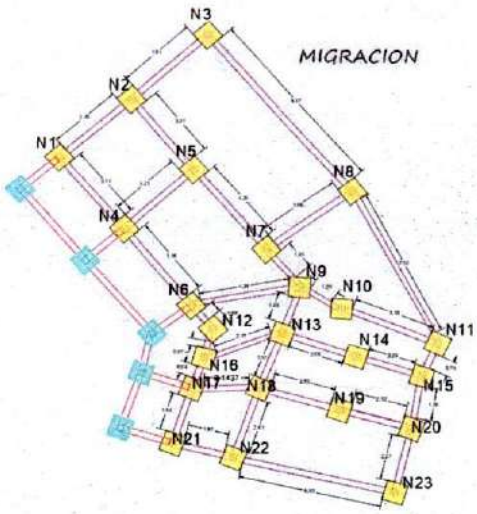




DETALLE CIMENTACION ZONA 3

VISTA DE SECCION



DETALLE CIMENTACION ZONA 4

VISTA DE SECCION



DETALLE CIMENTACION ZONA 5

VISTA DE SECCION


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4523

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**	
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,6	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

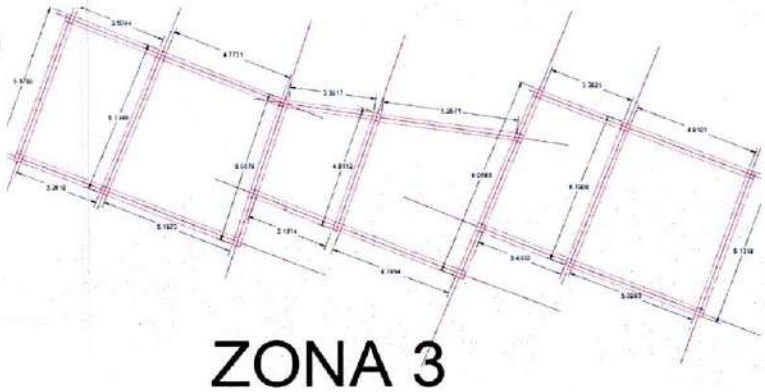

ZONA 3



ZONA 5



ZONA 4



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75239

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,12	**DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**UN**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	AREA	LONGITUD	CANTIDAD (UN)	TOTAL (UN)
AREA FISCALIA			3,00	3,00
AREA FISCALIA SECTOR CAMPAMENTO			6,00	6,00
AREA UNP 1ER PISO			1,00	1,00
AREA MIGRACION COLOMBIA 2 PISO			4,00	4,00
AREA MIGRACION COLOMBIA PRIMER PISO			4,00	4,00
PASAN: -			**TOTAL**	**18,00**
			DSC ACTAS ANTERIORES (-)	**12,00**
			TOTAL PRESENTE ACTA	**6,00**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,12	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

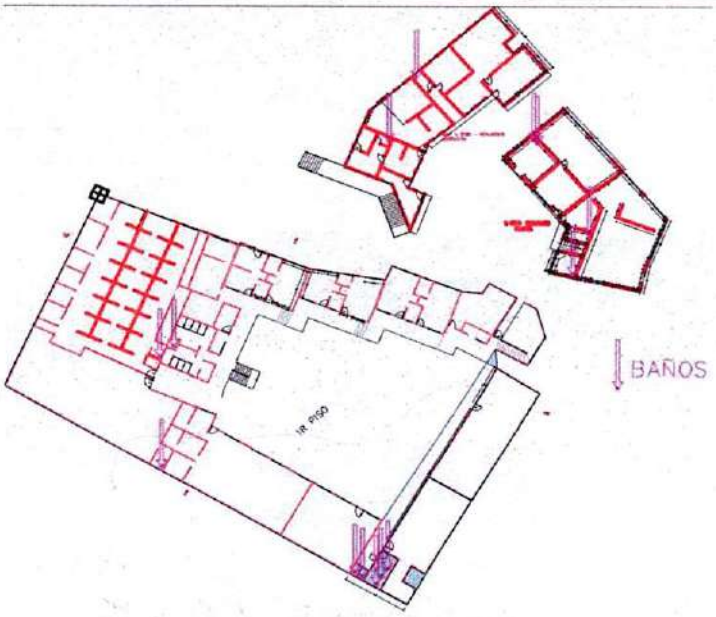



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,13	**TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**	**VJ**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VOLUMEN (M3)	FACTOR EXPANSION	VIAJES (x7M3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (VJ)
MATERIAL DE ESCOMBROS DE OBRA, DEMOLICION DE MURO EXISTENTE DE CONCRETO	1674,09	1,20	286,99	1,00	286,99
PASAN: -				TOTAL	286,99
				DSC ACTAS ANTERIORES (-)	214,99
				TOTAL PRESENTE ACTA	72,00

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,13	**TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**	**VJ**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,14	**DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS SITIO AUTORIZADO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE KM 18 VIA CAÑOS NEGROS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS)**	**TON**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	VOLUMEN (M3)	**DENSIDAD (TON/M3)**	**PESO (TON)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL (TON)**
MATERIAL DE ESCOMBROS DE OBRA, DEMOLICION DE MURO EXISTENTE DE CONCRETO	1980,63	1,90	3763,19	1,00	3.763,19
PASAN:				**TOTAL**	**3.763,19**
				DSC ACTAS ANTERIORES (-)	**2.965,19**
				TOTAL PRESENTE ACTA	**798,00**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,14	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS SITIO AUTORIZADO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE KM 18 VIA CAÑOS NEGROS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS)	TON

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





75242


CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**


CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (UN)
AREA FISCALIA			6,00	6,00
REA FISCALIA SECTOR CAMPAMENTO			10,00	10,00
AREA UNP 1ER PISO			2,00	2,00
AREA MIGRACION COLOMBIA 2 PISO			12,00	12,00
AREA MIGRACION COLOMBIA PRIMER PISO			12,00	12,00
PASAN: -			**TOTAL**	**42,00**
			DSC ACTAS ANTERIORES (-)	**32,00**
			TOTAL PRESENTE ACTA	**10,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

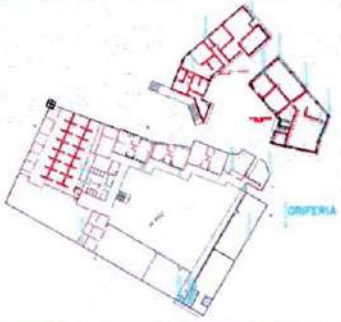



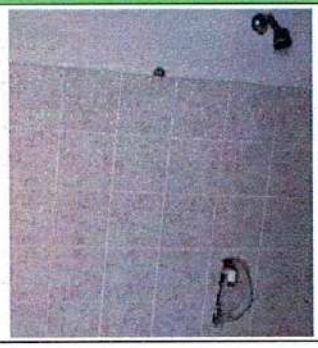

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7543


CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,17	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (UN)
AREA FISCALIA			3,00	3,00
AREA FISCALIA SECTOR CAMPAMENTO			3,00	3,00
AREA UNP 1ER PISO			1,00	1,00
AREA MIGRACION COLOMBIA 2 PISO			6,00	6,00
AREA MIGRACION COLOMBIA PRIMER PISO			6,00	6,00
PASAN: -			TOTAL	19,00
			DSC ACTAS ANTERIORES (-)	16,00
			TOTAL PRESENTE ACTA	3,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

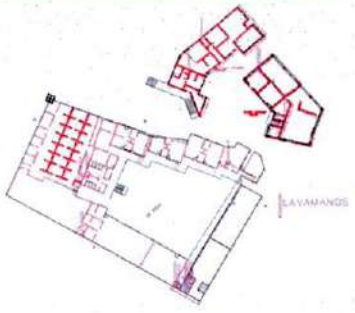





Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P.P.P.1,3,4	**TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**	**VJ**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VOLUMEN (M3)	FACTOR EXPANSION	VIAJES (x7M3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (VJ)
MATERIAL DE EXCAVACION ZONA DE VIA DE SUBSESTACION ELECTRICA	36681,70	1,20	6288,29	1,00	6.288,29
PASAN: -				TOTAL	6.288,29
				DSC ACTAS ANTERIORES (-)	6.185,09
				TOTAL PRESENTE ACTA	103,20

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P.P.P.1,3,4	**TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**	**VJ**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

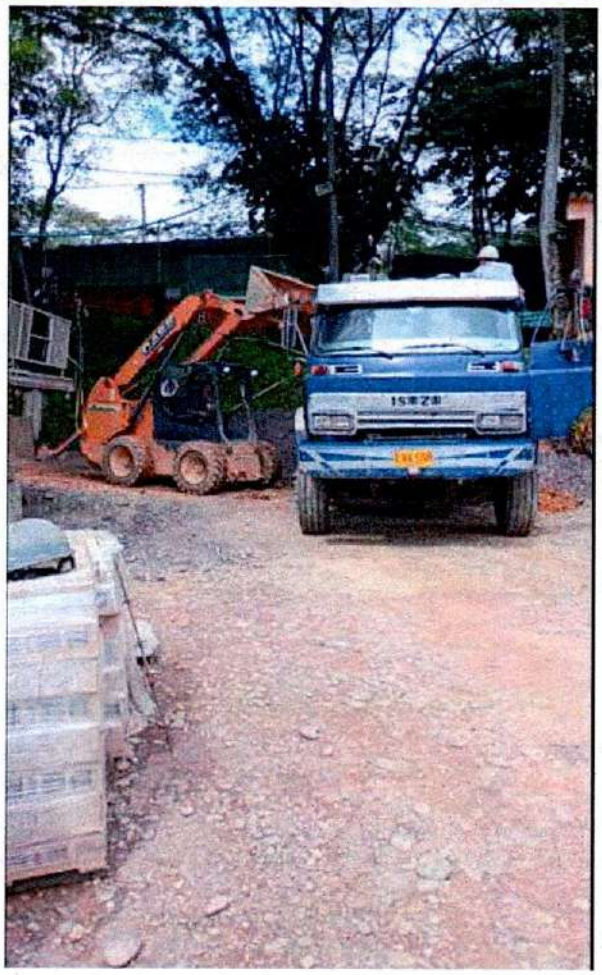



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75245

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P.1,3,5	**DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION SITIO AUTORIZADO (NO INCLUYE TRANSPORTE)**	**TON**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VOLUMEN (M3)	DENSIDAD (TON/M3)	PESO (TON)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (TON)
MATERIAL DE EXCAVACION ZONA DE VIA DE SUBSESTACION ELECTRICA	36681,67	1,90	69695,17	1,00	69.695,17
PASAN:				TOTAL	69.695,17
				DSC ACTAS ANTERIORES (-)	68.551,37
				TOTAL PRESENTE ACTA	1.143,80

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P.1,3,5	**DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION SITIO AUTORIZADO (NO INCLUYE TRANSPORTE)**	**TON**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75246

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P.1,3,5	**DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION SITIO AUTORIZADO (NO INCLUYE TRANSPORTE)**	**TON**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA


ZODME GUATIQUIA S.A.S
NIT. 901313682-5
CERTIFICADO
CERTIFICA
N° 1244
Que la empresa CONSORCIO HOSPITAL 002, con NIT 901752517-0, hace disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, RCD (**DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION**), producto de la actividad de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas que se generaron de **DISPOSICION PROVENIENTE DE HOSPITAL DEL MES DE NOVIEMBRE**, y que se relacionan a continuación:
TIPO DE MATERIAL | VOLUMEN
DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION | **114.00** m³
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION | **113.00** m³
Esta disposición se hizo en la ZODME GUATIQUIA, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta margen izquierda del río Guatiquía, sector vanguardia y que se encuentra debidamente autorizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", según los permisos otorgados mediante los oficios, No. PM GA 3.17.6217 Y PM GA 3.18.4464, PS-GJ.1.2.6.19.2437
La presente se expide en Villavicencio a los 1 días del mes 12 del año 2023
MAURICIO VELASQUEZ ZAPATA
Representante Legal
Vereda Vanguardia Sector la Playa
ZODME GUATIQUIA Cel.: 350 370 83 94
Villavicencio - Meta


ZODME GUATIQUIA S.A.S
NIT. 901313682-5
CERTIFICADO
CERTIFICA
N° 1271
Que la empresa CONSORCIO HOSPITAL 002, con NIT 901752517-0, hace disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, RCD (**DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION**), producto de la actividad de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas que se generaron de **DISPOSICION PROVENIENTE DE HOSPITAL DEL MES DE DICIEMBRE**, y que se relacionan a continuación:
TIPO DE MATERIAL | VOLUMEN
DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION | **174.00** m³
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION | **102.00** m³
Esta disposición se hizo en la ZODME GUATIQUIA, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta margen izquierda del río Guatiquía, sector vanguardia y que se encuentra debidamente autorizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", según los permisos otorgados mediante los oficios, No. PM GA 3.17.6217 Y PM GA 3.18.4464, PS-GJ.1.2.6.19.2437
La presente se expide en Villavicencio a los 0 días del mes 1 del año 2024
MAURICIO VELASQUEZ ZAPATA
Representante Legal


ZODME GUATIQUIA
NIT. 901.313.682-5
CERTIFICADO
CERTIFICA
N° 1278
Que la empresa CONSORCIO HOSPITAL 002, con NIT 901752517-0, hace disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, RCD (**DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION**), producto de la actividad de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas que se generaron de **DISPOSICION PROVENIENTE DE HOSPITAL DEL MES DE ENERO**, y que se relacionan a continuación:
TIPO DE MATERIAL | VOLUMEN
DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION | **114.00** m³
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION | **96.00** m³
Esta disposición se hizo en la ZODME GUATIQUIA, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta margen izquierda del río Guatiquía, sector vanguardia y que se encuentra debidamente autorizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", según los permisos otorgados mediante los oficios, No. PM GA 3.17.6217 Y PM GA 3.18.4464, PS-GJ.1.2.6.19.2437
La presente se expide en Villavicencio a los 4 días del mes 2 del año 2024
MAURICIO VELASQUEZ ZAPATA
Representante Legal
Vereda Vanguardia Sector la Playa
ZODME GUATIQUIA Cel.: 350 370 83 94
Villavicencio - Meta

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P. 1,3,7	**RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL**	**M3**

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	ALTO (M)	PROFUNDIDAD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
RELLENO PRIMER TRAMO DE RAMPA VEHICULAR							
DETALLE	**EJES**		**SECCION**				
cim a ss	3'	4	1,85		7,00	1,00	12,95
RELLENO ZAPATAS							
Z1			1,45	1,45	1,00	2,00	4,21
DSC CONCRETO Z1				0,84		-2,00	-1,68
Z2			1,65	1,65	1,00	2,00	5,45
DSC CONCRETO Z2				1,09		-2,00	-2,18
Z3			1,85	1,85	1,00	4,00	13,69
DSC CONCRETO Z3				1,71		-4,00	-6,84
Z4			2,05	2,05	1,00	3,00	12,61
DSC CONCRETO Z4				2,10		-3,00	-6,30
Z5			2,35	2,35	1,00	1,00	5,52
DSC CONCRETO Z5				2,88		-1,00	-2,88
Z6			2,65	2,65	1,65	1,00	11,59
DSC CONCRETO Z6				4,18		-1,00	-4,18
Z7			2,85	2,85	1,65	1,00	13,40
DSC CONCRETO Z7				5,19		-1,00	-5,19
Z7			2,85	2,85	1,00	1,00	8,12
DSC CONCRETO Z7				5,19		-1,00	-5,19
Z8			3,05	3,05	1,00	2,00	18,61
DSC CONCRETO Z8				7,44		-2,00	-14,88
Z9			2,75	3,85	1,10	2,00	23,29
DSC CONCRETO Z9				9,91		-2,00	-19,82
PASAN:		-				**SUBTOTAL**	**60,30**
						TOTAL	**60,30**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 1,3,7	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	ALTO (M)	PROFUNDIDAD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
Z10			3,15	3,15	1,00	4,00	39,69
DSC CONCRETO Z10				7,28		-4,00	-29,12
Z11			3,25	3,25	1,00	2,00	21,13
DSC CONCRETO Z11				7,78		-2,00	-15,56
Z12			3,45	3,45	1,00	2,00	23,81
DSC CONCRETO Z12				9,21		-2,00	-18,42
Z13			3,65	3,65	1,20	4,00	63,95
DSC CONCRETO Z13				11,49		-4,00	-45,96
Z14			3,15	3,85	1,00	2,00	24,26
DSC CONCRETO Z14				10,75		-2,00	-21,50
Z15			3,85	3,85	1,20	1,00	17,79
DSC CONCRETO Z15				12,65		-1,00	-12,65
RELLENO CONTRAPISO							
SOTANO				2396,74	0,10	1,00	239,67
PASAN:		60,30				SUBTOTAL	287,09
						TOTAL PRESENTE ACTA	347,39

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


8254

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**


CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P. 1,3,7	**RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

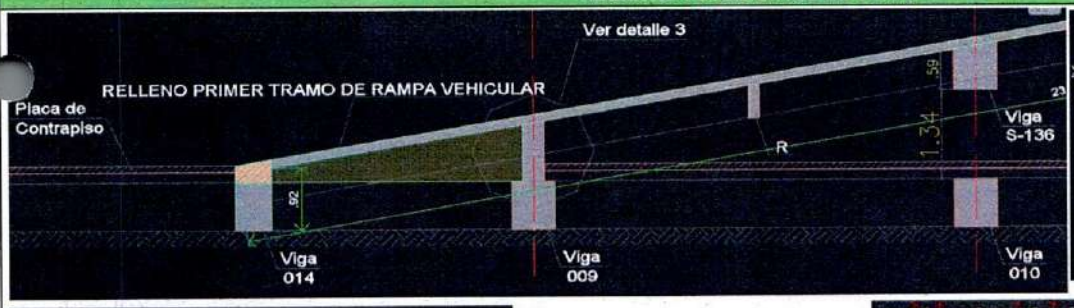





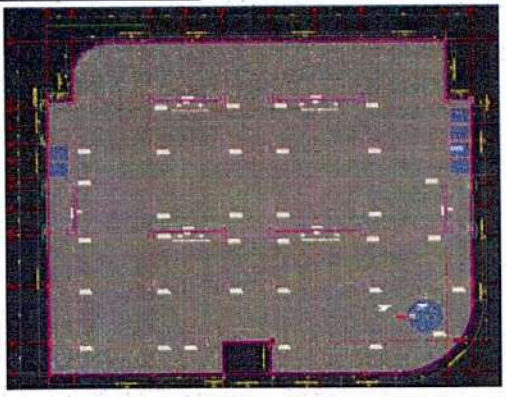





CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**

FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P. 1,4,5	**SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO GRAN FORMATO COLOR ARENA PARA FACHADAS**	**M2**

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES			
		ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
FACHADA					
MURO EJE 8	1	1,98	20,21	1,00	39,91
	1	1,99	20,21	1,00	40,12
DSC AREA DE VENTANA EN PISO 1 (-)	DSC VENTANA (-)	1,00	1,00	-1,00	-1,00
MURO FACHADA EJE 8 PISO 2	A	1,99	12,59	1,00	25,05
	B	1,99	6,72	1,00	13,37
	B	1,93	6,72	1,00	12,97
	VENTANA B	0,56	0,62	1,00	0,35
FACHA FRONTAL	DUCTO 1	1,51	3,94	1,00	5,95
		1,51	0,80	1,00	1,21
	DUCTO 2	1,54	3,99	1,00	6,12
		1,54	0,81	1,00	1,24
MURO FACHADA EJE 1 PISO 1	PISO 1 A	1,98	12,06	1,00	23,88
	PISO 1 B	1,98	8,16	1,00	16,16
	DSC PUERTA (-)	2,00	1,00	-1,00	-2,00
	PISO 1 A	1,99	12,06	1,00	24,00
	PISO 1 B	1,99	8,16	1,00	16,24
MURO FACHADA EJE 1 PISO 2	PISO 2 A	1,97	13,05	1,00	25,71
	PISO 2 A	1,97	12,05	1,00	23,74
MURO FACHADA EJE 8 PISO 2	A	1,94	11,59	1,00	22,48
	VENTANA PISO 2	1,00	0,72	1,00	0,72
MURO FACHADA EJE 8 PISO 3	PISO 3 A	1,96	12,59	1,00	24,68
	PISO 3 B	1,96	7,62	1,00	14,94
	PISO 3 A	1,94	11,59	1,00	22,48
	VENTANA PISO 3	1,00	0,72	1,00	0,72
	PISO 3 B	1,94	7,62	1,00	14,78
MURO FACHADA EJE 8 PISO 4	PISO 4 A	1,99	12,59	1,00	25,05
	PISO 4 B	1,99	7,62	1,00	15,16
MURO FACHADA EJE 1 PISO 2	PISO 2 A	1,97	6,77	1,00	13,34
	PISO 2 A	1,97	6,77	1,00	13,34
	VENTANA PISO 2	1,00	0,70	1,00	0,70
PASAN:	-			SUBTOTAL	441,41
				TOTAL	441,41

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 1,4,5	**SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO GRAN FORMATO COLOR ARENA PARA FACHADAS**	**M2**

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES			
		ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
FACHADA					
MURO FACHADA EJE 1 PISO 2	DUCTO PISO 2	0,61	0,61	1,00	0,37
MURO FACHADA EJE 1 PISO 3	PISO 3 A	1,97	20,21	1,00	39,81
	PISO 3 B	2,00	20,21	1,00	40,42
DSC VENTANA (-)		1,00	1,00	-1,00	-1,00
MURO FACHADA EJE 1 PISO 4	PISO 4 A	1,92	12,55	1,00	24,10
MURO FACHADA EJE 1 PISO 1 ENTRE EJE F - I		1,94	18,84	1,00	36,55
		5,30	0,65	1,00	3,45
		1,58	0,65	1,00	1,03
		2,98	0,65	1,00	1,94
		1,98	0,65	1,00	1,29
FACHA FRONTAL	DUCTO 1	0,30	3,94	1,00	1,18
		0,30	0,80	1,00	0,24
PASAN:	**441,41**			**SUBTOTAL**	**149,38**
				TOTAL	**590,79**
				DSC ACTAS ANTERIORES (-)	**109,67**
				TOTAL PRESENTE ACTA	**481,12**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**


CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P. 1,4,5	**SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO GRAN FORMATO COLOR ARENA PARA FACHADAS**	**M2**


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

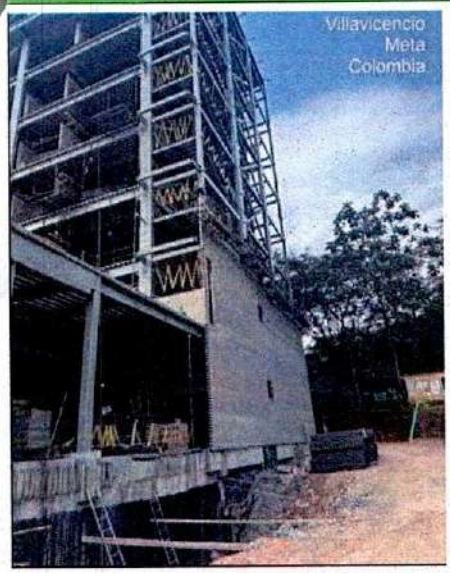

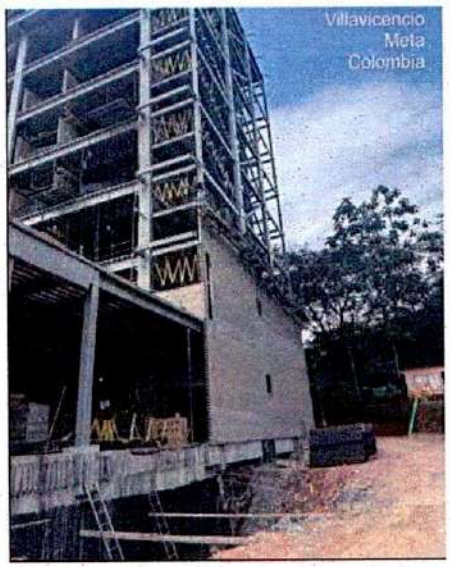

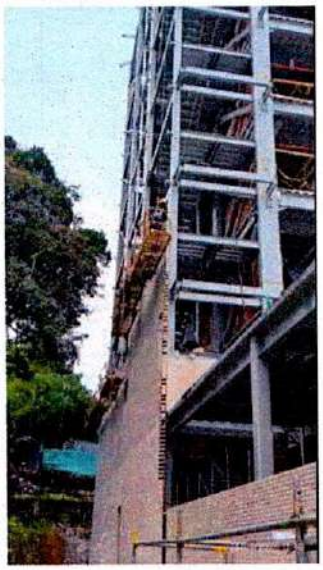

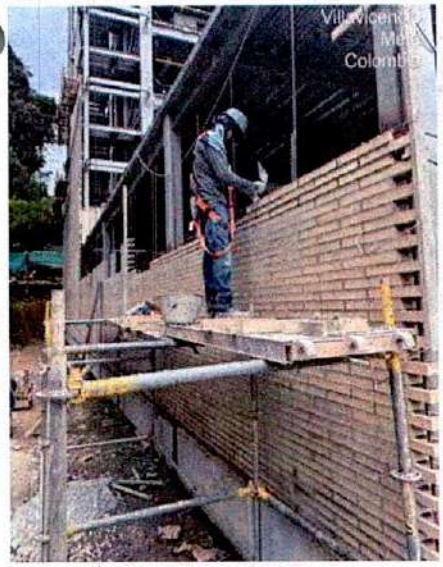

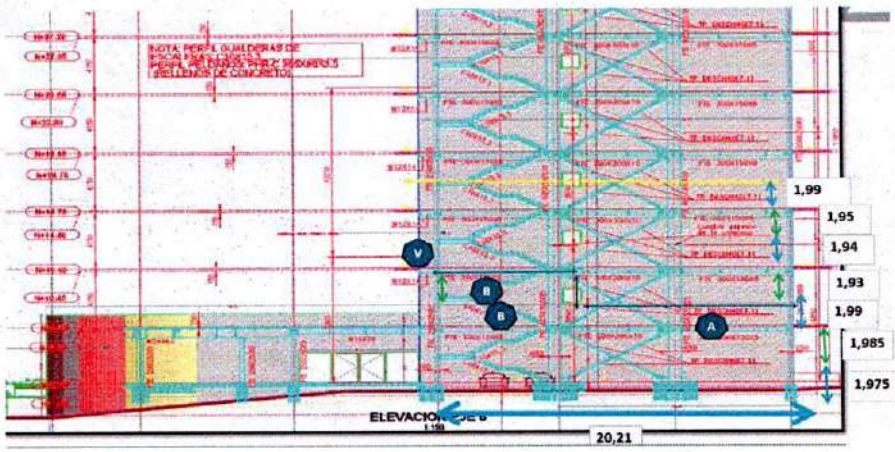



CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 1,4,5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO GRAN FORMATO COLOR ARENA PARA FACHADAS	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

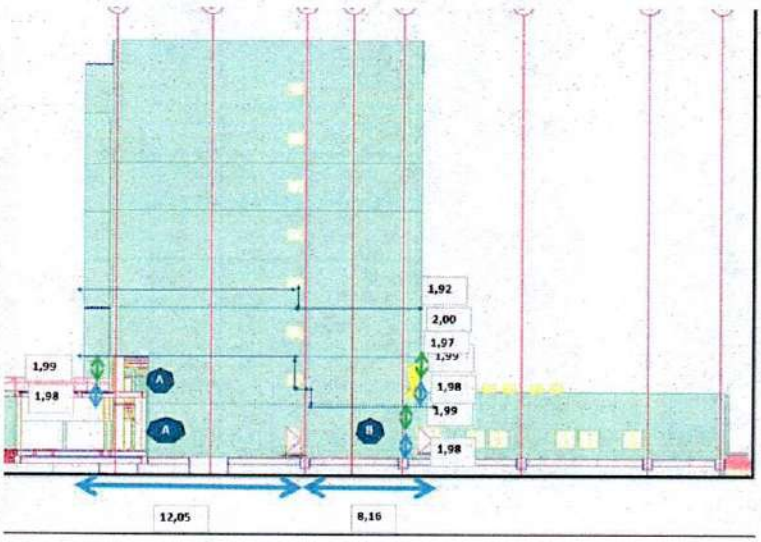

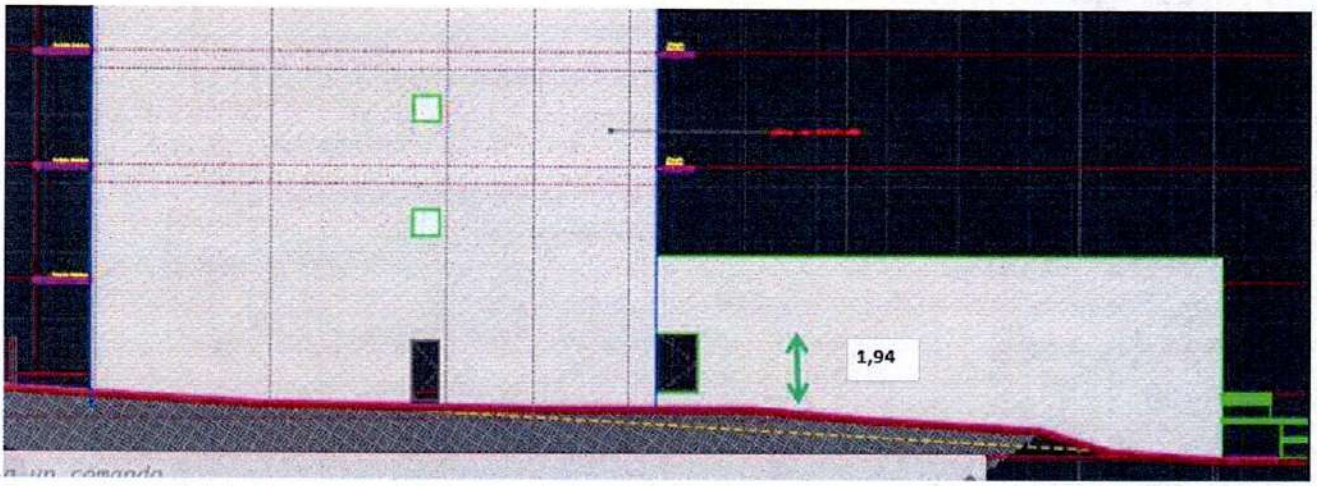

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 1,4,7	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA	M^3

N° PISO	PISO	UBICACIÓN		TIPO VE	DIMENSIONES		VOLUMEN
		EJE		REFERENCIA	LONGITUD (M)	AREA (M2)	
FACHADA POSTERIOR	SEGUNDO PISO	2-3	B	A2-3	4,08	0,100	0,41
	TERCER PISO	7--5	B	A3-1	15,63	0,040	0,63
		4--2	B	A3-2	16,10	0,040	0,64
	CUARTO PISO	7--5	B	A4-1	15,63	0,040	0,63
		4--2	B	A4-2	16,02	0,040	0,64
PASAN:	-					TOTAL	2,95
						DSC ACTAS ANTERIORES (-)	-
						TOTAL PRESENTE ACTA	2,95

Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

ta: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**


N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P. 1,4,7	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA	M^3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

FACHADA POSTERIOR





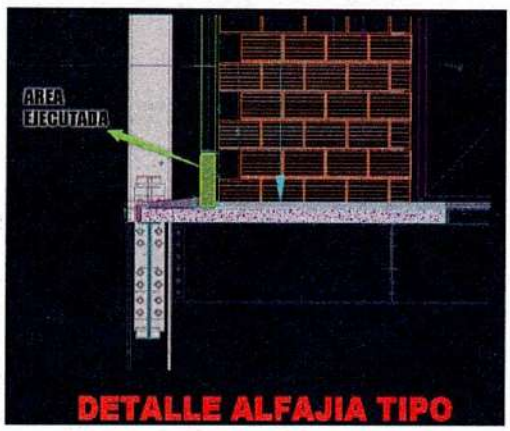

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

A5252

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 1,4,9	MORTERO TIPO GROUTING PARA DOVELAS EN MURO LADRILLO GRAN FORMATO	LT

DESCRIPCION	DIMESIONES						
	ÁREA CELDAS POR BLOQUE (M2)	ANCHO MURO (M)	CANTIDAD DE BLOQUES (UN)	ALTO MURO (M)	DOVELAS (M3)	CONVERSION A LT	TOTAL (LT)
SEMISÓTANO	0,016	4,40	11,28	4,00	0,73	725,66	725,66
	0,016	4,40	11,28	4,00	0,73	725,66	725,66
	0,016	4,10	10,51	3,50	0,59	591,66	591,66
	0,016	4,40	11,28	4,00	0,73	725,66	725,66
	0,016	4,40	11,28	4,00	0,73	725,66	725,66
	0,016	2,85	7,31	3,50	0,41	411,13	411,13
	0,016	0,43	1,10	3,50	0,06	62,05	62,05
	0,016	1,92	4,92	1,30	0,10	102,91	102,91
	0,016	0,89	2,27	3,50	0,13	128,00	128,00
	0,016	1,05	2,70	1,30	0,06	56,39	56,39
	0,016	1,85	4,75	3,50	0,27	267,55	267,55
	0,016	1,92	4,92	1,30	0,10	102,91	102,91
	0,016	1,56	4,00	3,50	0,22	224,98	224,98
	0,016	0,88	2,25	3,50	0,13	126,56	126,56
	0,016	1,94	4,97	1,30	0,10	103,98	103,98
	0,016	3,14	8,05	3,50	0,45	452,98	452,98
	0,016	0,07	0,19	3,50	0,01	10,68	10,68
	0,016	1,94	4,97	1,30	0,10	103,98	103,98
	0,016	0,25	0,64	3,50	0,04	36,08	36,08
PASAN:	-				TOTAL		5.684,49
					DSC ACTAS ANTERIORES (-)		4.780,00
					TOTAL PRESENTE ACTA		904,49

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 1,4,9	MORTERO TIPO GROUTING PARA DOVELAS EN MURO LADRILLO GRAN FORMATO	LT

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

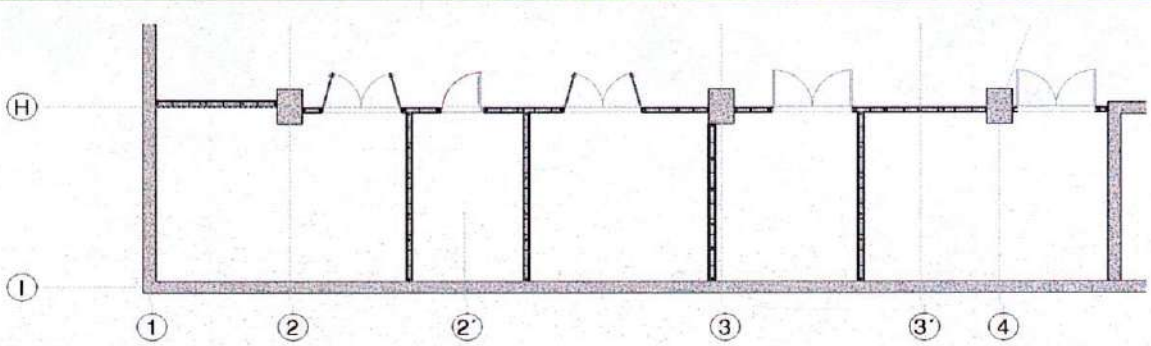



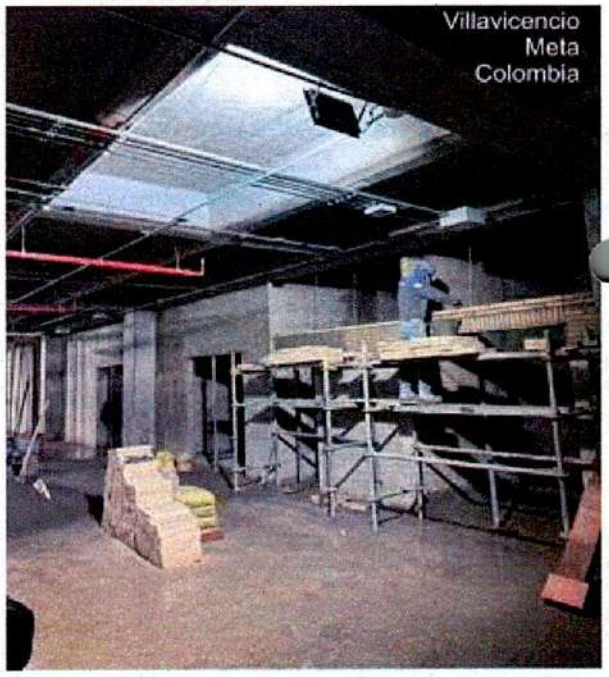

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4253

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P. 1,4,15	**RELLENO FLUIDO CEMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA PARA REFUERZO VERTICAL EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL**	**LT**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	AREA CELDA (M2)	CANTIDAD DE BLOQUES (UN)	ALTO (M)	DOVELAS (M3)	CONVERSION A LT	TOTAL (LT)
FACHADA						
DOVELAS FACHADA EJE 8	0,004		84,70	0,34	340,00	340,00
	0,004		43,47	0,17	170,00	170,00
	0,004		18,30	0,07	70,00	70,00
ventana parte superior piso 1	0,004		4,00	0,02	20,00	20,00
ventana ducto	0,004		4,96	0,02	20,00	20,00
fachada frontal	0,004		24,40	0,10	100,00	100,00
fachada eje 1	0,004		91,68	0,37	370,00	370,00
	0,004		48,62	0,19	190,00	190,00
PASAN:	-				**TOTAL**	**1.280,00**
					DSC ACTAS ANTERIORES (-)	-
					TOTAL PRESENTE ACTA	**1.280,00**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 1,4,15	RELLENO FLUIDO CEMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA PARA REFUERZO VERTICAL EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL	LT


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

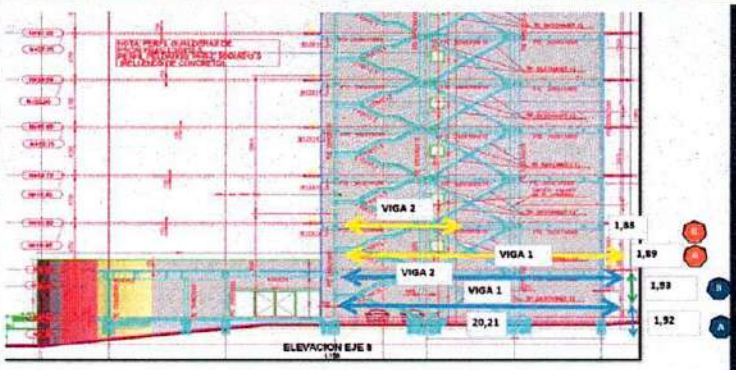

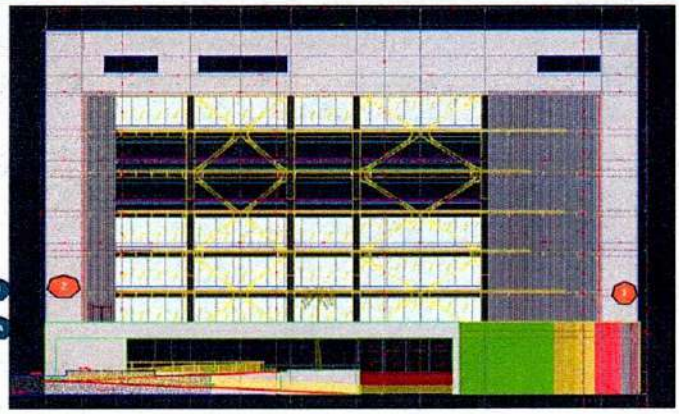



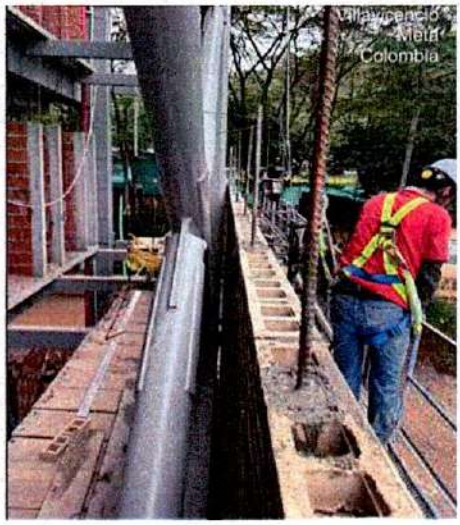

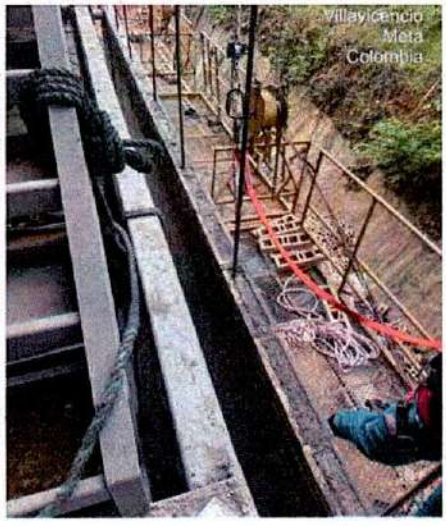

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
	PISO 2			
AREA B	2,29	1,84	1,00	4,21
	2,29	1,98	1,00	4,54
	2,29	1,98	1,00	4,53
	2,29	1,53	1,00	3,50
	2,29	1,51	1,00	3,45
	2,29	1,39	1,00	3,18
	2,29	1,39	1,00	3,18
	2,29	1,63	1,00	3,73
	2,29	1,31	1,00	2,99
	2,29	1,39	1,00	3,19
	2,29	1,49	1,00	3,41
	2,29	2,57	1,00	5,88
	2,29	1,96	1,00	4,48
	2,29	1,59	1,00	3,64
	2,29	2,37	1,00	5,44
	2,29	1,43	1,00	3,27
	2,29	0,62	1,00	1,43
	2,29	1,10	1,00	2,52
	2,29	1,02	1,00	2,33
	2,29	1,81	1,00	4,15
	2,29	2,52	1,00	5,77
	2,29	0,41	1,00	0,93
	2,29	1,05	1,00	2,41
	2,29	2,62	1,00	6,00
	2,29	2,05	1,00	4,70
	2,29	1,70	1,00	3,89
	2,29	1,55	1,00	3,55
	2,29	1,54	1,00	3,54
	2,29	1,10	1,00	2,53
	2,29	2,34	1,00	5,36
	2,29	1,57	1,00	3,60
	2,29	2,98	1,00	6,83
PASAN: -			SUBTOTAL	122,16
			TOTAL	122,16

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 2				
AREA B	2,29	0,19	1,00	0,43
AREA C	2,29	1,52	1,00	3,48
	2,29	1,52	1,00	3,48
	2,29	0,50	1,00	1,15
	2,29	0,41	1,00	0,94
	2,29	2,63	1,00	6,02
	2,29	1,50	1,00	3,45
	2,29	0,63	1,00	1,44
	2,29	1,60	1,00	3,66
	2,29	1,39	1,00	3,19
	2,29	1,60	1,00	3,66
	2,29	2,01	1,00	4,61
	2,29	2,20	1,00	5,04
	2,29	2,43	1,00	5,56
	2,29	1,72	1,00	3,94
	2,29	1,66	1,00	3,79
	2,29	1,28	1,00	2,92
	2,29	1,50	1,00	3,44
	2,29	1,60	1,00	3,67
	2,29	1,60	1,00	3,67
	2,29	1,49	1,00	3,41
	2,29	0,51	1,00	1,16
	2,29	0,51	1,00	1,17
	2,29	1,70	1,00	3,89
	2,29	1,84	1,00	4,20
AREA D	2,29	1,70	1,00	3,90
	2,29	1,70	1,00	3,90
	2,29	1,70	1,00	3,90
	2,29	0,37	1,00	0,85
	2,29	0,36	1,00	0,82
	2,29	1,48	1,00	3,38
PASAN: 122,16			SUBTOTAL	98,12
			TOTAL	220,28

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 2				
AREA D	2,29	2,21	1,00	5,06
	2,29	2,46	1,00	5,64
	2,29	2,42	1,00	5,54
	2,29	2,06	1,00	4,73
	2,29	2,20	1,00	5,05
	2,29	0,09	1,00	0,21
	2,29	2,82	1,00	6,46
	2,29	1,72	1,00	3,93
	2,29	0,42	1,00	0,95
	2,29	2,08	1,00	4,75
	2,29	2,30	1,00	5,27
	2,29	1,69	1,00	3,88
	2,29	1,60	1,00	3,66
	2,29	2,25	1,00	5,15
	2,29	1,73	1,00	3,97
	2,29	1,63	1,00	3,72
	2,29	1,90	1,00	4,35
	2,29	1,86	1,00	4,26
	2,29	2,14	1,00	4,91
	2,29	0,94	1,00	2,16
	2,29	1,66	1,00	3,79
	2,29	0,52	1,00	1,20
AREA E	2,29	1,52	1,00	3,48
	2,29	1,33	1,00	3,04
PISO 3				
AREA A	2,29	1,18	1,00	2,71
	2,29	1,44	1,00	3,30
	2,29	2,79	1,00	6,39
AREA B	2,29	1,62	1,00	3,72
	2,29	1,24	1,00	2,84
	2,29	1,72	1,00	3,95
PASAN: 220,28			SUBTOTAL	118,07
			TOTAL	338,35

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3				
AREA B	2,29	1,14	1,00	2,62
	2,29	1,40	1,00	3,21
	2,29	2,82	1,00	6,47
	2,29	1,40	1,00	3,21
	2,29	2,74	1,00	6,28
	2,29	1,40	1,00	3,21
	2,29	1,64	1,00	3,76
	2,29	0,74	1,00	1,69
	2,29	0,31	1,00	0,70
	2,29	1,64	1,00	3,76
	2,29	1,53	1,00	3,50
	2,29	1,66	1,00	3,80
	2,29	1,50	1,00	3,44
	2,29	2,26	1,00	5,19
	2,29	1,45	1,00	3,32
	2,29	1,27	1,00	2,91
	2,29	0,40	1,00	0,91
	2,29	2,32	1,00	5,31
	2,29	1,72	1,00	3,93
	2,29	1,82	1,00	4,16
	2,29	1,50	1,00	3,44
	2,29	1,21	1,00	2,78
	2,29	1,69	1,00	3,88
	2,29	1,78	1,00	4,08
	2,29	1,78	1,00	4,08
	2,29	2,69	1,00	6,16
	2,29	1,04	1,00	2,38
	2,29	2,69	1,00	6,16
	2,29	2,79	1,00	6,39
	2,29	0,41	1,00	0,94
	2,29	1,48	1,00	3,40
	2,29	2,85	1,00	6,53
PASAN: 338,35			SUBTOTAL	121,60
			TOTAL	459,95

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
	PISO 3			
AREA C	2,29	0,32	1,00	0,73
	2,29	1,88	1,00	4,31
	2,29	0,78	1,00	1,79
	2,29	1,32	1,00	3,02
	2,29	1,88	1,00	4,31
	2,29	1,88	1,00	4,31
	2,29	1,42	1,00	3,25
	2,29	1,89	1,00	4,33
	2,29	2,85	1,00	6,53
	2,29	2,74	1,00	6,28
	2,29	0,62	1,00	1,42
	2,29	1,20	1,00	2,75
	2,29	0,98	1,00	2,25
	2,29	1,20	1,00	2,75
	2,29	1,30	1,00	2,98
	2,29	0,93	1,00	2,13
	2,29	2,21	1,00	5,06
	2,29	1,51	1,00	3,47
	2,29	1,52	1,00	3,48
	2,29	1,68	1,00	3,84
	2,29	1,68	1,00	3,85
	2,29	0,48	1,00	1,10
	2,29	1,44	1,00	3,29
	2,29	1,44	1,00	3,29
	2,29	0,48	1,00	1,10
	2,29	1,44	1,00	3,29
	2,29	1,44	1,00	3,29
	2,29	0,48	1,00	1,10
	2,29	1,34	1,00	3,08
	2,29	1,63	1,00	3,73
	2,29	0,38	1,00	0,87
	2,29	1,68	1,00	3,84
PASAN: 459,95			SUBTOTAL	100,82
			TOTAL	560,77

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3				
AREA C	2,29	1,58	1,00	3,62
	2,29	1,30	1,00	2,97
	2,29	1,49	1,00	3,42
	2,29	1,49	1,00	3,42
	2,29	2,40	1,00	5,51
	2,29	0,20	1,00	0,45
	2,29	1,96	1,00	4,50
	2,29	2,85	1,00	6,53
	2,29	1,13	1,00	2,60
	2,29	2,85	1,00	6,53
	2,29	1,59	1,00	3,65
	2,29	2,85	1,00	6,53
	2,29	1,51	1,00	3,47
	2,29	2,27	1,00	5,19
	2,29	2,85	1,00	6,53
AREA D	2,29	0,25	1,00	0,57
	2,29	0,18	1,00	0,41
	2,29	2,85	1,00	6,53
	2,29	2,79	1,00	6,40
	2,29	0,22	1,00	0,51
	2,29	2,82	1,00	6,45
	2,29	2,72	1,00	6,22
	2,29	1,32	1,00	3,02
	2,29	0,17	1,00	0,40
	2,29	2,75	1,00	6,30
	2,29	0,55	1,00	1,25
	2,29	1,55	1,00	3,54
	2,29	1,65	1,00	3,77
	2,29	1,23	1,00	2,81
	2,29	0,20	1,00	0,46
	2,29	2,82	1,00	6,45
	2,29	0,88	1,00	2,01
PASAN: 560,77			SUBTOTAL	122,02
			TOTAL	682,79

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75257

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3				
AREA D	2,29	0,55	1,00	1,25
	2,29	2,86	1,00	6,55
	2,29	2,84	1,00	6,51
	2,29	2,80	1,00	6,40
	2,29	1,71	1,00	3,92
	2,29	1,71	1,00	3,92
	2,29	2,81	1,00	6,44
	2,29	1,37	1,00	3,14
	2,29	0,25	1,00	0,56
	2,29	1,45	1,00	3,32
	2,29	1,28	1,00	2,93
	2,29	1,65	1,00	3,78
	2,29	0,45	1,00	1,03
	2,29	1,23	1,00	2,81
	2,29	0,20	1,00	0,45
	2,29	1,46	1,00	3,33
	2,29	0,45	1,00	1,03
	2,29	2,75	1,00	6,29
	2,29	1,18	1,00	2,70
	2,29	2,27	1,00	5,19
	2,29	1,51	1,00	3,46
	2,29	1,77	1,00	4,05
	2,29	0,31	1,00	0,70
	2,29	2,22	1,00	5,07
	2,29	2,08	1,00	4,77
	2,29	2,30	1,00	5,27
	2,29	1,74	1,00	4,00
	2,29	1,74	1,00	4,00
	2,29	1,76	1,00	4,02
	2,29	1,79	1,00	4,10
	2,29	0,51	1,00	1,17
	2,29	0,59	1,00	1,36
PASAN: 682,79			SUBTOTAL	113,52
			TOTAL	796,31

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3				
AREA D	2,29	0,40	1,00	0,90
	2,29	1,56	1,00	3,58
	2,29	1,57	1,00	3,59
	2,29	1,65	1,00	3,78
	2,29	1,63	1,00	3,73
	2,29	2,05	1,00	4,69
	2,29	1,72	1,00	3,93
	2,29	0,94	1,00	2,16
	2,29	1,73	1,00	3,97
PISO 4				
AREA B	2,60	2,80	1,00	7,28
	2,60	2,80	1,00	7,28
	2,60	2,80	1,00	7,28
	2,60	2,80	1,00	7,28
	2,60	1,52	1,00	3,95
	2,60	1,53	1,00	3,97
	2,60	2,14	1,00	5,58
	2,60	2,15	1,00	5,5
	2,60	2,15	1,00	5,59
	2,60	2,47	1,00	6,42
	2,60	0,34	1,00	0,87
	2,60	0,27	1,00	0,69
	2,60	2,60	1,00	6,75
	2,60	1,25	1,00	3,25
	2,60	1,87	1,00	4,85
	2,60	0,34	1,00	0,87
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	1,75	1,00	4,55
	2,60	2,06	1,00	5,37
	2,60	0,34	1,00	0,87
	2,60	0,27	1,00	0,69
	2,60	2,79	1,00	7,25
			SUBTOTAL	130,07
PASAN: 796,31			TOTAL	926,38

45258

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 4				
AREA B	2,60	2,73	1,00	7,09
	2,60	1,90	1,00	4,94
	2,60	0,73	1,00	1,89
	2,60	1,63	1,00	4,24
	2,60	1,63	1,00	4,24
	2,60	2,80	1,00	7,27
	2,60	1,63	1,00	4,23
	2,60	1,63	1,00	4,24
	2,60	1,39	1,00	3,61
	2,60	1,39	1,00	3,61
	2,60	2,67	1,00	6,94
	2,60	2,01	1,00	5,21
	2,60	2,03	1,00	5,28
	2,60	1,63	1,00	4,23
	2,60	1,63	1,00	4,23
	2,60	2,55	1,00	6,62
	2,60	1,65	1,00	4,28
	2,60	1,68	1,00	4,36
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,77	1,00	4,60
	2,60	1,70	1,00	4,41
	2,60	0,82	1,00	2,14
	2,60	1,77	1,00	4,60
AREA C	2,60	1,65	1,00	4,29
	2,60	0,34	1,00	0,87
	2,60	1,84	1,00	4,80
	2,60	2,01	1,00	5,21
	2,60	2,79	1,00	7,25
	2,60	1,43	1,00	3,73
	2,60	1,74	1,00	4,54
	2,60	0,67	1,00	1,73
	2,60	2,69	1,00	7,00
PASAN: 926,38			SUBTOTAL	146,30
			TOTAL	1.072,68

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 4				
AREA C	2,60	2,10	1,00	5,46
	2,60	1,58	1,00	4,11
	2,60	1,59	1,00	4,13
	2,60	1,05	1,00	2,72
	2,60	2,93	1,00	7,61
	2,60	1,83	1,00	4,75
	2,60	1,31	1,00	3,40
	2,60	0,34	1,00	0,87
	2,60	1,24	1,00	3,22
	2,60	1,73	1,00	4,49
	2,60	1,09	1,00	2,84
	2,60	0,48	1,00	1,25
	2,60	0,48	1,00	1,25
	2,60	1,81	1,00	4,72
	2,60	1,09	1,00	2,84
	2,60	0,48	1,00	1,25
	2,60	0,48	1,00	1,25
	2,60	1,73	1,00	4,49
	2,60	1,09	1,00	2,84
	2,60	0,82	1,00	2,12
AREA D	2,60	1,24	1,00	3,22
	2,60	2,74	1,00	7,13
	2,60	1,94	1,00	5,04
	2,60	1,97	1,00	5,12
	2,60	1,42	1,00	3,69
	2,60	0,32	1,00	0,82
	2,60	2,21	1,00	5,76
	2,60	1,42	1,00	3,69
	2,60	1,21	1,00	3,16
	2,60	2,27	1,00	5,89
	2,60	2,17	1,00	5,64
	2,60	2,15		5,60
PASAN: 1.072,68			SUBTOTAL	120,37
			TOTAL	1.193,05

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 4				
AREA D	2,60	1,41	1,00	3,68
	2,60	2,18	1,00	5,66
	2,60	2,80	1,00	7,28
	2,60	2,73	1,00	7,09
	2,60	1,93	1,00	5,01
	2,60	2,03	1,00	5,28
	2,60	0,75	1,00	1,94
	2,60	0,51	1,00	1,33
	2,60	1,73	1,00	4,50
	2,29	2,11	1,00	4,83
	2,29	0,34	1,00	0,77
	2,29	2,30	1,00	5,27
	2,29	2,62	1,00	5,99
	2,29	2,00	1,00	4,57
	2,29	1,90	1,00	4,34
	2,29	2,25	1,00	5,15
	2,29	1,90	1,00	4,34
	2,29	1,90	1,00	4,34
	2,29	3,04	1,00	6,96
	2,29	1,90	1,00	4,34
	2,29	1,90	1,00	4,35
	2,29	2,74	1,00	6,28
	2,29	1,82	1,00	4,17
	2,29	1,89	1,00	4,34
PISO 5				
AREA B	2,60	2,33	1,00	6,06
	2,60	1,41	1,00	3,65
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	1,75	1,00	4,55
	2,60	0,57	1,00	1,49
	2,60	0,50	1,00	1,30
	2,60	2,57	1,00	6,68
PASAN: 1.193,05			SUBTOTAL	139,05
			TOTAL	1.332,10

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 5				
AREA B	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	2,49	1,00	6,48
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	1,41	1,00	3,65
	2,60	0,19	1,00	0,50
	2,60	2,43	1,00	6,32
	2,60	1,25	1,00	3,25
	2,60	0,43	1,00	1,11
	2,60	1,44	1,00	3,75
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	0,99	1,00	2,57
	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	2,49	1,00	6,48
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	2,43	1,00	6,32
	2,60	1,41	1,00	3,65
	2,60	1,25	1,00	3,25
	2,60	0,43	1,00	1,11
	2,60	0,21	1,00	0,54
	2,60	1,44	1,00	3,74
	2,60	1,03	1,00	2,67
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	1,41	1,00	3,65
	2,60	2,43	1,00	6,32
	2,60	1,25	1,00	3,25
	2,60	0,20	1,00	0,53
			SUBTOTAL	128,95
PASAN: 1.332,10			TOTAL	1.461,05

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
	PISO 5			
AREA B	2,60	0,43	1,00	1,11
	2,60	1,44	1,00	3,75
	2,60	0,99	1,00	2,57
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	2,43	1,00	6,32
	2,60	1,40	1,00	3,65
	2,60	1,25	1,00	3,25
	2,60	0,43	1,00	1,11
	2,60	2,58	1,00	6,70
	2,60	1,03	1,00	2,67
	2,60	1,17	1,00	3,05
	2,60	2,35	1,00	6,10
	2,60	1,74	1,00	4,51
	2,60	0,57	1,00	1,49
	2,60	0,50	1,00	1,30
	2,60	2,57	1,00	6,67
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	1,42	1,00	3,68
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	2,58	1,00	6,70
	2,60	2,41	1,00	6,25
	2,60	2,57	1,00	6,68
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	1,02	1,00	2,65
	2,60	0,38	1,00	0,98
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	2,38	1,00	6,19
PASAN: 1.461,05			SUBTOTAL	132,06
			TOTAL	1.593,11

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 5				
AREA B	2,60	0,36	1,00	0,94
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	2,57	1,00	6,68
	2,60	2,40	1,00	6,25
	2,60	2,38	1,00	6,19
	2,60	0,38	1,00	0,98
	2,60	1,03	1,00	2,67
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	2,58	1,00	6,70
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	0,36	1,00	0,94
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	2,58	1,00	6,70
	2,60	2,40	1,00	6,25
	2,60	0,36	1,00	0,94
	2,60	2,58	1,00	6,70
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	1,03	1,00	2,67
	2,60	0,43	1,00	1,11
	2,60	2,43	1,00	6,32
	2,60	1,25	1,00	3,25
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	2,57	1,00	6,68
	2,60	2,40	1,00	6,25
	2,60	2,40	1,00	6,25
	2,60	0,35	1,00	0,91
	2,60	1,02	1,00	2,65
	2,60	1,18	1,00	3,07
	2,60	2,57	1,00	6,68
			SUBTOTAL	135,22
PASAN: 1.593,11			TOTAL	1.728,33

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7526

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 5				
AREA B	2,60	1,35	1,00	3,52
	2,60	1,40	1,00	3,65
	2,60	1,51	1,00	3,92
	2,60	1,50	1,00	3,91
	2,60	1,76	1,00	4,58
	2,60	1,75	1,00	4,55
	2,60	0,57	1,00	1,48
	2,60	1,37	1,00	3,55
	2,60	0,37	1,00	0,96
	2,60	1,68	1,00	4,36
	2,60	1,67	1,00	4,33
	2,60	1,85	1,00	4,82
	2,60	1,78	1,00	4,64
	2,60	1,88	1,00	4,88
	2,60	1,88	1,00	4,88
	2,60	2,14	1,00	5,57
	2,60	1,93	1,00	5,01
	2,60	2,78	1,00	7,22
	2,60	1,65	1,00	4,29
	2,60	0,49	1,00	1,27
	2,60	1,68	1,00	4,38
	2,60	1,74	1,00	4,53
	2,60	1,54	1,00	4,02
	2,60	0,60	1,00	1,56
	2,60	0,38	1,00	1,00
LATERALES PISO 5	0,42	2,44	1,00	1,02
	2,60	1,35	1,00	3,50
	0,42	3,04	1,00	1,27
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,04	1,00	1,28
PASAN: 1.728,33			SUBTOTAL	110,02
			TOTAL	1.838,35

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 5				
LATERALES PISO 5	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,04	1,00	1,27
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,04	1,00	1,28
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	2,41	1,00	1,01
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,04	1,00	1,27
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,04	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
PISO 6				
AREA B	2,60	2,36	1,00	6,12
	2,60	1,41	1,00	3,65
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	2,58	1,00	6,70
	2,60	0,50	1,00	1,30
	2,60	0,57	1,00	1,49
	2,60	1,73	1,00	4,49
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	2,49	1,00	6,47
			SUBTOTAL	87,39
PASAN: 1.838,35			TOTAL	1.925,74

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75262

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 6				
AREA B	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	1,44	1,00	3,74
	2,60	0,20	1,00	0,52
	2,60	1,41	1,00	3,65
	2,60	1,25	1,00	3,25
	2,60	2,43	1,00	6,32
	2,60	0,43	1,00	1,11
	2,60	1,03	1,00	2,67
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	2,49	1,00	6,48
	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	1,03	1,00	2,67
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	1,44	1,00	3,75
	2,60	0,20	1,00	0,52
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	0,38	1,00	0,98
	2,60	2,38	1,00	6,19
	2,60	1,41	1,00	3,65
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	2,49	1,00	6,48
	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	1,44	1,00	3,75
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	1,03	1,00	2,67
	2,60	0,43	1,00	1,11
	2,60	1,25	1,00	3,25
	2,60	2,43	1,00	6,32
	2,60	1,41	1,00	3,65
PASAN: 1.925,74			SUBTOTAL	123,47
			TOTAL	2.049,21

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 6				
AREA B	2,60	0,20	1,00	0,52
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	2,49	1,00	6,47
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	0,98	1,00	2,55
	2,60	0,43	1,00	1,11
	2,60	2,43	1,00	6,32
	2,60	1,25	1,00	3,25
	2,60	1,40	1,00	3,65
	2,60	2,57	1,00	6,68
	2,60	2,36	1,00	6,12
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	1,74	1,00	4,52
	2,60	0,56	1,00	1,45
	2,60	0,50	1,00	1,30
	2,60	2,58	1,00	6,70
	2,60	1,41	1,00	3,65
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	2,57	1,00	6,68
	2,60	2,41	1,00	6,25
	2,60	0,56	1,00	1,46
	2,60	2,57	1,00	6,68
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	1,02	1,00	2,65
	2,60	0,35	1,00	0,91
	2,60	2,40	1,00	6,25
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	1,78	1,00	4,62
			SUBTOTAL	132,61
PASAN: 2.049,21			TOTAL	2.181,82

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75263

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 6				
AREA B	2,60	2,57	1,00	6,68
	2,60	2,40	1,00	6,25
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	1,03	1,00	2,67
	2,60	0,38	1,00	0,98
	2,60	2,38	1,00	6,19
	2,60	0,36	1,00	0,94
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	2,58	1,00	6,70
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	1,77	1,00	4,61
	2,60	2,57	1,00	6,68
	2,60	2,40	1,00	6,25
	2,60	0,36	1,00	0,94
	2,60	2,58	1,00	6,70
	2,60	1,35	1,00	3,51
	2,60	1,20	1,00	3,12
	2,60	1,03	1,00	2,67
	2,60	0,38	1,00	0,98
	2,60	2,38	1,00	6,19
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	1,78	1,00	4,62
	2,60	2,57	1,00	6,68
	2,60	2,40	1,00	6,25
	2,60	2,41	1,00	6,25
	2,60	0,35	1,00	0,91
	2,60	1,03	1,00	2,67
	2,60	1,17	1,00	3,05
	2,60	2,58	1,00	6,70
	2,60	1,35	1,00	3,52
	2,60	1,41	1,00	3,65
	2,60	2,15	1,00	5,58
PASAN: 2.181,82			SUBTOTAL	137,80
			TOTAL	2.319,62

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 6				
AREA B	2,60	1,67	1,00	4,33
	2,60	1,85	1,00	4,82
	2,60	1,88	1,00	4,88
	2,60	1,68	1,00	4,38
	2,60	1,87	1,00	4,87
	2,60	1,93	1,00	5,01
	2,60	2,14	1,00	5,57
	2,60	2,89	1,00	7,52
	2,60	1,66	1,00	4,30
	2,60	0,49	1,00	1,26
	2,60	0,60	1,00	1,56
	2,60	0,38	1,00	0,99
	2,60	1,58	1,00	4,12
	2,60	1,86	1,00	4,83
	2,60	1,58	1,00	4,12
AREA C	2,60	1,51	1,00	3,92
	2,60	1,70	1,00	4,43
	2,60	1,86	1,00	4,84
	2,60	1,76	1,00	4,56
	2,60	0,54	1,00	1,41
	2,60	1,37	1,00	3,55
LATERALES PISO 6	0,42	2,44	1,00	1,02
	2,60	1,35	1,00	3,50
	0,42	3,04	1,00	1,27
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,04	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
			SUBTOTAL	107,99
PASAN: 2.319,62			TOTAL	2.427,61

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 6				
LATERALES PISO 6	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	2,41	1,00	1,01
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,04	1,00	1,27
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,04	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
	0,42	3,05	1,00	1,28
	0,42	3,05	1,00	1,28
	2,60	1,35	1,00	3,51
PISO 2 MUROS PLOMADOS				
SALA RX 2	2,60	0,72	1,00	1,88
	2,60	4,70	1,00	12,23
	2,60	2,84	1,00	7,38
	2,60	1,57	1,00	4,08
	2,60	1,33	1,00	3,47
	2,60	0,89	1,00	2,31
	1,10	1,50	1,00	1,65
	2,60	2,20	1,00	5,72
	2,60	0,58	1,00	1,50
	2,60	0,64	1,00	1,66
SALA RX 1	2,60	0,61	1,00	1,58
	2,60	4,56	1,00	11,86
	2,60	6,54	1,00	17,00
PASAN: 2.427,61			SUBTOTAL	107,19
			TOTAL	2.534,80

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 2 MUROS PLOMADOS				
SALA RX 1	2,60	1,43	1,00	3,72
	1,10	1,50	1,00	1,65
	2,60	1,82	1,00	4,74
	2,60	0,89	1,00	2,31
	2,60	0,57	1,00	1,48
	2,60	0,41	1,00	1,07
	2,60	1,26	1,00	3,28
	2,60	0,41	1,00	1,07
SALA TELECOMANDO	2,60	0,64	1,00	1,67
	2,60	0,63	1,00	1,64
	2,60	0,63	1,00	1,64
	2,60	0,64	1,00	1,67
	2,60	3,94	1,00	10,23
	2,60	0,20	1,00	0,52
	2,60	0,50	1,00	1,30
	1,10	1,50	1,00	1,65
	2,60	0,22	1,00	0,57
	2,60	1,02	1,00	2,65
	2,60	1,37	1,00	3,56
PISO 3 MUROS PLOMADOS				
MAMOGRAFIA	2,60	3,84		9,98
	2,60	0,93		2,42
	2,60	0,98		2,55
	2,60	2,50		6,49
	2,60	0,84		2,18
	1,10	1,50		1,65
	2,60	0,68		1,76
	2,60	0,38		0,98
	2,60	0,68		1,77
	2,60	0,89		2,31
			SUBTOTAL	78,53
PASAN: 2.534,80			TOTAL	2.613,33

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5975

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3 MUROS PLOMADOS				
MAMOGRAFIA	2,60	0,59		1,53
SALA DE TOMOGRAFIA	2,60	1,16		3,02
	2,60	0,43		1,12
	2,60	6,30		16,38
	2,60	0,66		1,72
	2,60	1,03		2,68
	2,60	1,57		4,08
	2,60	1,36		3,52
	2,60	1,66		4,32
	1,10	1,50		1,65
	2,60	2,26		5,89
PISO 3	2,60	1,56		4,05
	2,60	2,27		5,89
	2,60	2,27		5,89
PISO 4				
PISO 4	2,60	1,75		4,56
	2,60	1,68		4,38
	2,60	1,57		4,08
	2,60	0,40		1,03
	2,60	0,60		1,56
	2,60	2,69		6,99
	2,60	1,73		4,49
	2,60	1,11		2,88
	2,60	1,18		3,08
	2,60	1,44		3,75
	2,60	2,84		7,38
	0,42	3,20		1,34
PISO 5				
AREA D	2,60	2,69		6,99
	2,60	1,73		4,49
	2,60	1,12		2,91
PASAN: 2.613,33			SUBTOTAL	121,63
			TOTAL	2.734,97

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 5				
AREA A	2,60	1,60		4,16
	2,60	1,95		5,07
PISO 7				
AREA C	2,60	2,80		7,28
	2,60	2,80		7,28
	2,60	2,80		7,28
	2,60	2,80		7,28
	2,60	1,38		3,58
	2,60	1,38		3,58
	2,60	1,47		3,81
	2,60	2,19		5,69
	2,60	2,19		5,69
	2,60	1,76		4,58
	2,60	1,77		4,61
	2,60	1,26		3,28
	2,60	1,47		3,83
	2,60	1,41		3,67
	2,60	1,42		3,70
	2,60	1,66		4,32
	2,60	1,69		4,38
	2,60	0,67		1,75
	2,60	0,64		1,68
	2,60	2,24		5,84
PISO 1				
AREA B	2,60	1,50		3,90
	2,60	1,42		3,70
	2,60	1,42		3,70
	2,60	1,85		4,81
	2,60	2,10		5,46
	2,60	1,73		4,49
	2,60	0,87		2,27
			SUBTOTAL	130,65
PASAN: 2.734,97			TOTAL	2.865,62

9257

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 1				
AREA B	2,60	1,79		4,64
	2,60	1,81		4,71
	2,60	1,35		3,52
	2,60	0,55		1,43
	2,60	1,28		3,32
	2,60	2,30		5,97
	2,60	1,73		4,49
	2,60	1,53		3,97
	2,60	2,31		6,00
	2,60	1,24		3,23
	2,60	1,42		3,70
	2,60	1,42		3,70
	2,60	1,54		4,01
	2,60	1,56		4,07
	2,60	1,57		4,09
	2,60	1,96		5,08
	2,60	1,88		4,88
	2,60	2,73		7,09
	2,60	2,88		7,50
	2,60	2,85		7,41
	2,60	2,37		6,17
	2,60	2,33		6,05
	2,60	1,64		4,26
	2,60	1,64		4,26
	2,60	2,33		6,06
	2,60	1,73		4,49
	2,60	2,37		6,16
	2,60	1,85		4,81
	2,60	2,36		6,15
	2,60	2,63		6,84
	2,60	2,36		6,12
PASAN: 2.865,62			SUBTOTAL	154,15
			TOTAL	3.019,77

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 1				
AREA B	2,60	1,85		4,81
	2,60	2,63		6,84
	2,60	1,16		3,01
	2,60	1,56		4,04
	2,60	1,85		4,81
	2,60	1,87		4,87
	2,60	1,85		4,81
	2,60	1,83		4,77
	2,60	1,85		4,81
	2,60	1,40		3,64
	2,60	1,73		4,49
	2,60	1,70		4,42
	2,60	2,90		7,54
	2,60	2,79		7,26
	2,60	1,78		4,62
	2,60	2,27		5,91
	2,60	0,93		2,42
	2,60	0,56		1,45
	2,60	1,75		4,55
	2,60	1,62		4,21
	2,60	0,55		1,43
	2,60	1,79		4,65
	2,60	2,00		5,19
	2,60	2,15		5,58
	2,60	1,71		4,44
	2,60	1,71		4,44
PISO 3				
EJE 2 Y 7	2,60	1,18		3,08
	2,60	1,44		3,75
	2,60	2,92		7,60
	2,60	1,26		3,27
			SUBTOTAL	**136,70**
PASAN: 3.019,77			**TOTAL**	**3.156,47**

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3				
EJE 2 Y 7	2,60	1,72		4,47
	2,60	2,69		6,99
PISO 5				
EJE 2	2,60	2,00		5,20
PISO 6				
EJE 2 Y 7	2,60	1,20		3,11
	2,60	1,83		4,75
	2,60	2,69		6,99
	2,60	2,97		7,71
	2,60	0,75		1,95
	2,60	2,09		5,44
PISO 1				
AREA B	1,95	3,35		6,52
	2,60	1,96		5,10
	2,60	0,63		1,63
	2,60	2,28		5,94
	2,60	0,77		2,00
	2,60	1,45		3,77
	2,60	2,70		7,01
	2,60	0,43		1,11
	2,60	1,11		2,89
	2,60	0,67		1,74
PISO 2				
AREA D	2,60	1,67		4,34
	2,60	1,75		4,55
	2,60	0,52		1,36
	2,60	2,27		5,89
	2,60	2,27		5,89
	2,60	2,24		5,81
	2,60	1,93		5,01
	2,60	0,93		2,41
PASAN: 3.156,47			**SUBTOTAL**	**119,59**
			TOTAL	**3.276,06**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 2				
AREA D	2,60	1,71		4,45
	2,60	1,51		3,92
AREA C	2,60	1,60		4,16
	2,60	1,72		4,47
	2,60	1,88		4,88
	2,60	0,71		1,84
	2,60	1,60		4,16
	2,60	1,62		4,20
	2,60	2,57		6,68
	2,60	2,27		5,89
	2,60	2,88		7,49
	2,60	1,51		3,92
	2,60	1,63		4,23
AREA B	2,60	2,22		5,77
	2,60	2,27		5,89
PISO 2 ASCENSORES				
AREA ASCENSORES	2,60	1,87		4,86
	2,60	1,87		4,86
	2,60	1,94		5,03
	2,60	1,60		4,15
	2,60	1,58		4,11
	2,60	0,50		1,30
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,48		1,24
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	1,10		2,86
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,51		1,32
			SUBTOTAL	109,77
PASAN: 3.276,06			TOTAL	3.385,83

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8257

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 2 ASCENSORES				
AREA ASCENSORES	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,35
	2,60	0,52		1,34
	2,60	1,87		4,86
	2,60	1,87		4,86
	2,60	1,94		5,03
	2,60	1,60		4,15
	2,60	1,58		4,12
	2,60	0,48		1,24
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,35
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	1,00		2,59
	2,60	3,00		7,79
	2,60	1,45		3,77
	2,60	2,28		5,92
	2,60	0,60		1,56
	1,95	3,21		6,26
	2,60	0,74		1,91
	2,60	1,88		4,89
	1,95	2,20		4,29
PISO 3 ASCENSORES				
AREA ASCENSORES	2,60	1,60		4,15
	2,60	1,58		4,11
	2,60	0,50		1,30
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,48		1,24
PASAN: 3.385,83			SUBTOTAL	88,84
			TOTAL	3.474,67

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 2 ASCENSORES				
AREA ASCENSORES	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	1,10		2,86
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,51		1,32
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,35
	2,60	0,52		1,34
	2,60	1,60		4,15
	2,60	1,58		4,12
	2,60	0,48		1,24
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,35
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	1,00		2,59
	2,60	3,00		7,79
	2,60	1,45		3,77
	2,60	2,28		5,92
	2,60	0,60		1,56
	1,95	3,21		6,26
	2,60	0,74		1,91
	2,60	1,88		4,89
	1,95	2,20		4,29
PISO 2 CUARTO TECNICO	1,28	3,21		4,11
	1,28	2,60		3,33
PISO 3 CUARTO TECNICO	1,28	3,21		4,11
	1,28	2,60		3,33
			SUBTOTAL	85,02
PASAN: 3.474,67			TOTAL	3.559,69

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 4 ASCENSORES				
AREA ASCENSORES PISO 4	2,60	0,50		1,30
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,48		1,24
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	1,10		2,86
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,35
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,35
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,48		1,24
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,35
	2,60	0,52		1,34
	2,60	0,52		1,34
	2,60	1,00		2,60
	2,60	3,00		7,80
	2,60	1,45		3,77
	2,60	2,28		5,92
	2,60	0,60		1,56
	2,60	0,74		1,91
	2,60	1,88		4,89
	1,95	3,21		6,26
	1,95	2,60		5,07
PISO 2	1,62	1,62		2,62
	1,62	1,25		2,03
PASAN: 3.559,69			SUBTOTAL	72,58
			TOTAL	3.632,27

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 2	1,62	1,94		3,14
	0,82	1,26		1,03
PISO 1 CUARTO TECNICO	1,30	3,21		4,17
	2,42	2,34		5,66
PISO 4 CUARTO TECNICO	1,30	3,21		4,17
	1,30	2,60		3,38
PASAN: 3.632,27			SUBTOTAL	21,57
			TOTAL	3.653,83
			DSC ACTAS ANTERIORES (-)	2.462,47
			TOTAL	1.191,36

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

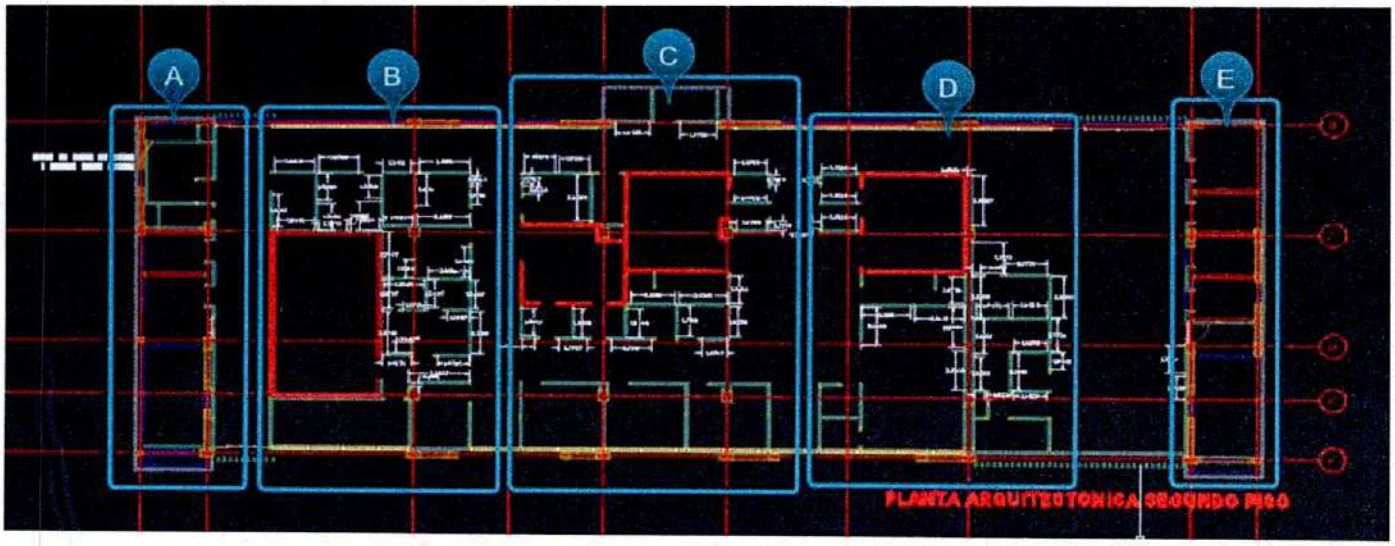

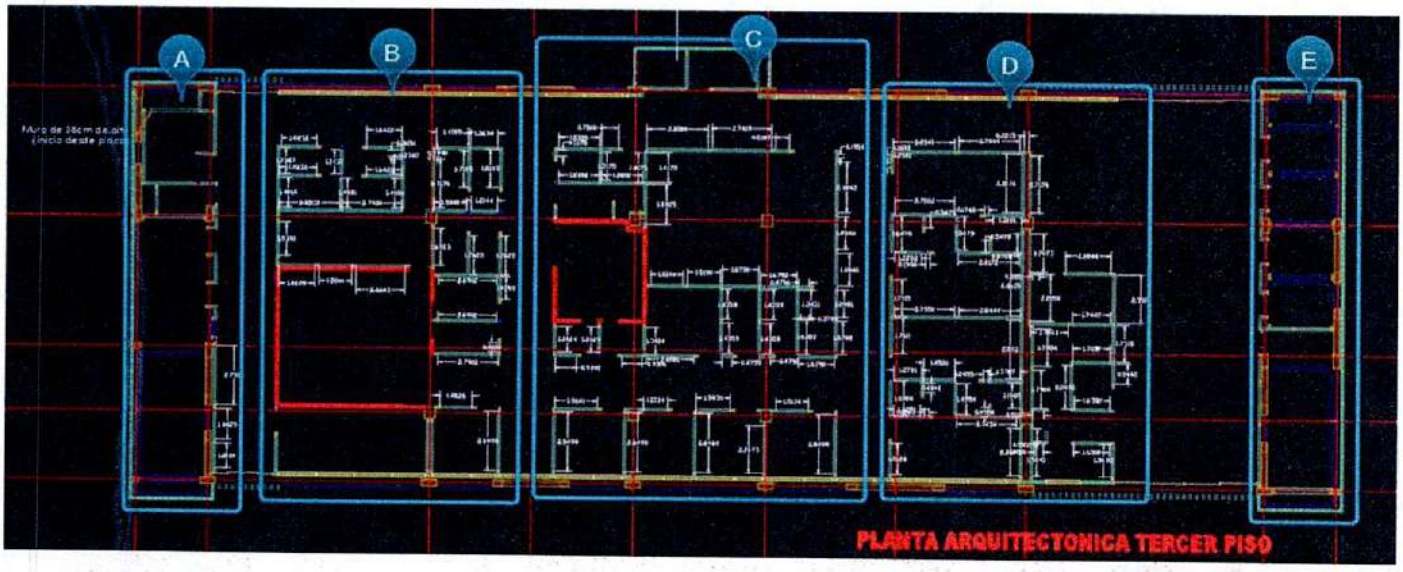


CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	**M2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

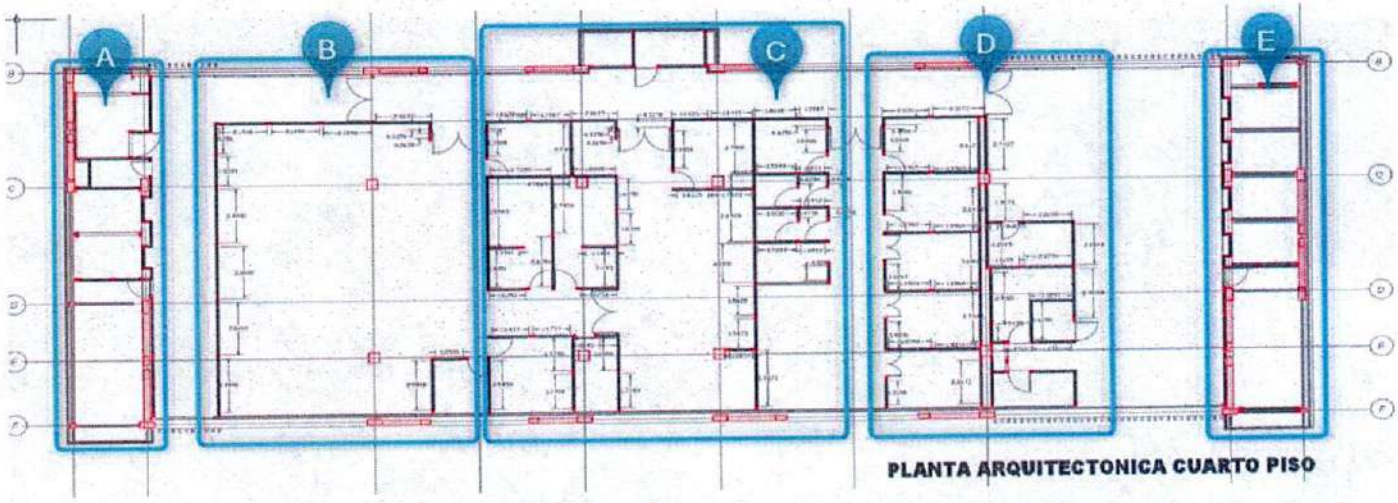

PLANTA ARQUITECTONICA CUARTO PISO

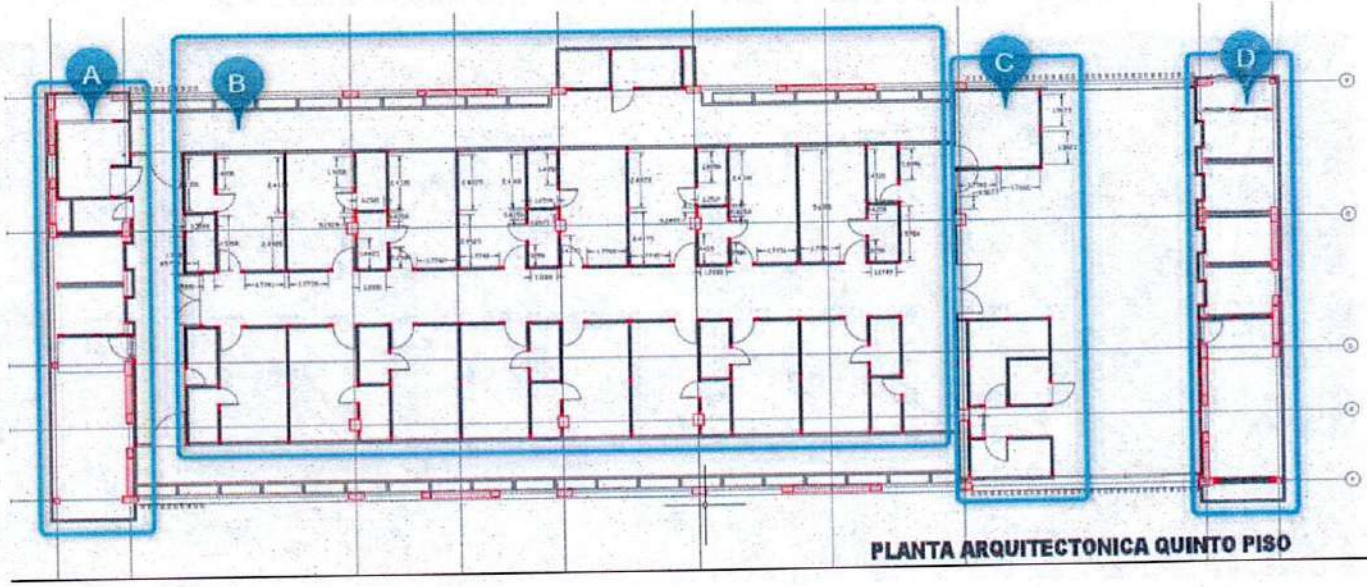


PLANTA ARQUITECTONICA QUINTO PISO

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

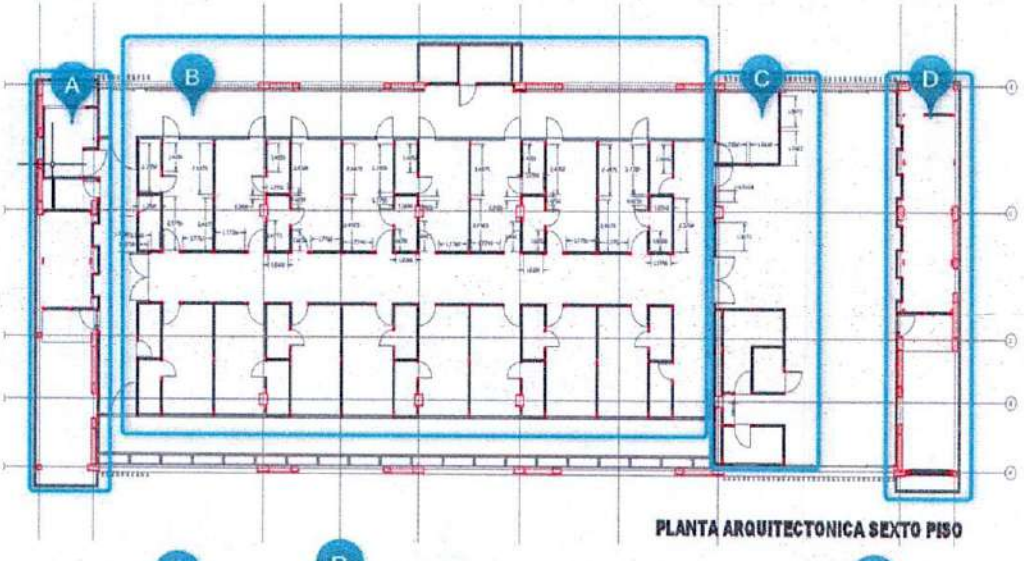

PLANTA ARQUITECTONICA SEXTO PISO

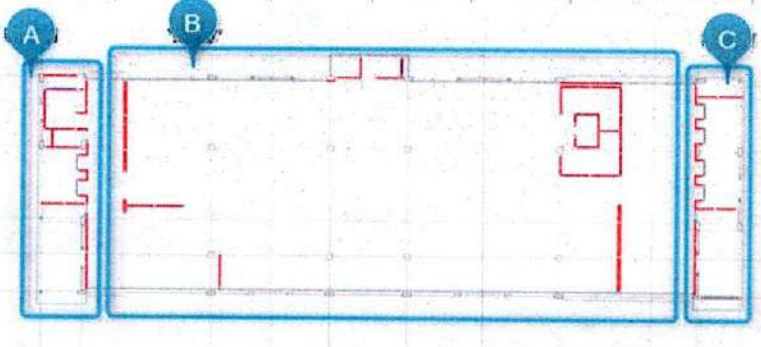


PLANTA SEPTIMO PISO

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**


CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,1	**MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)**	**M2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

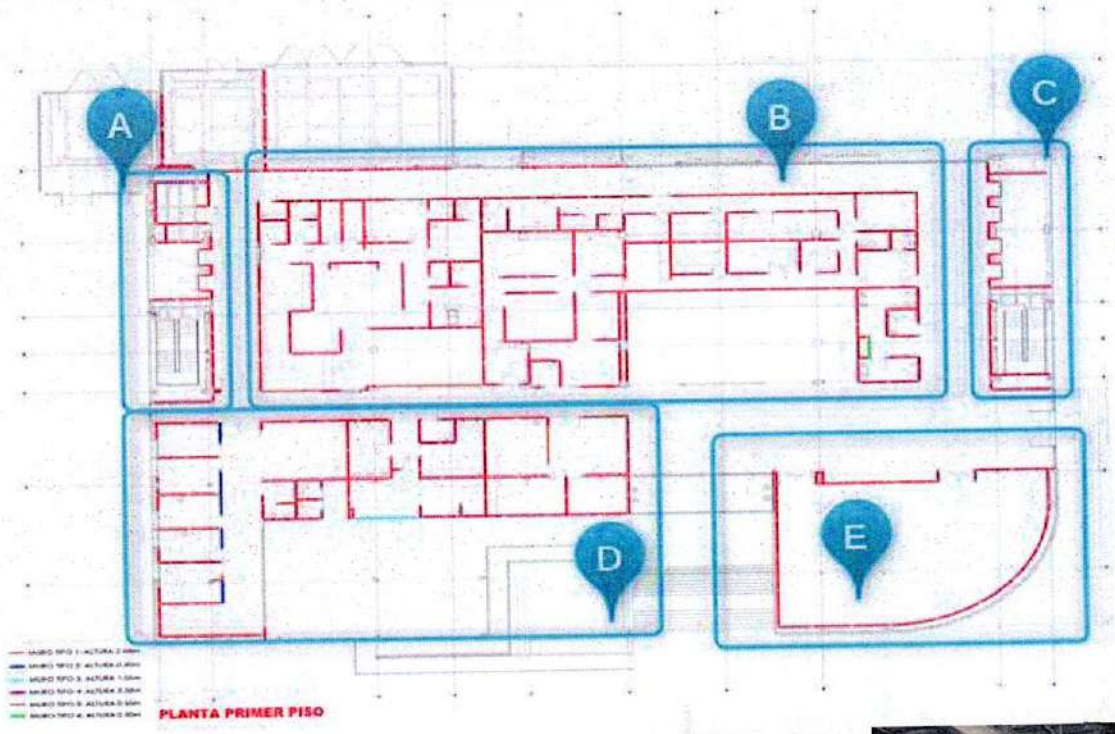


PLANTA PRIMER PISO

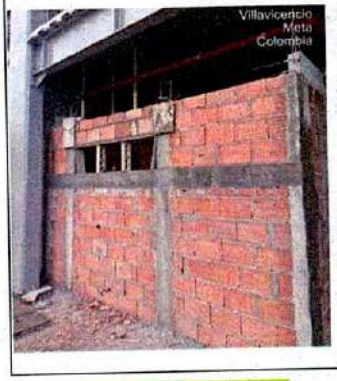

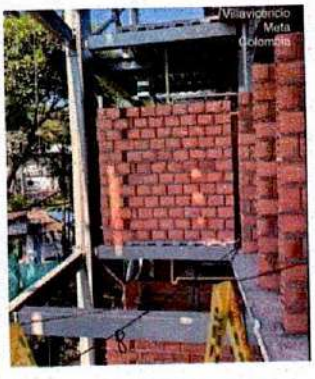



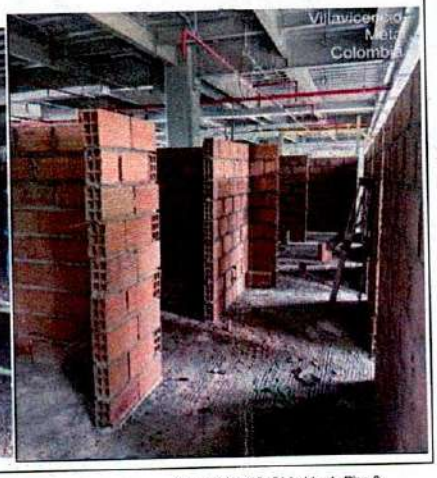

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 2					
AREA B	0,10	0,20	9,97	1,00	0,20
	0,10	0,20	3,24	1,00	0,06
	0,10	0,20	5,35	1,00	0,11
	0,10	0,20	3,24	1,00	0,06
	0,10	0,20	10,17	1,00	0,20
	0,10	0,20	2,91	1,00	0,06
	0,10	0,20	4,41	1,00	0,09
	0,10	0,20	2,91	1,00	0,06
	0,10	0,20	2,33	1,00	0,05
	0,10	0,20	4,31	1,00	0,09
	0,10	0,20	1,64	1,00	0,03
	0,10	0,20	4,31	1,00	0,09
	0,10	0,20	4,30	1,00	0,09
	0,10	0,20	0,92	1,00	0,02
	0,10	0,20	7,13	1,00	0,14
AREA C	0,10	0,20	5,13	1,00	0,10
	0,10	0,20	1,83	1,00	0,04
	0,10	0,20	1,80	1,00	0,04
	0,10	0,20	5,01	1,00	0,10
	0,10	0,20	2,45	1,00	0,05
	0,10	0,20	1,11	1,00	0,02
	0,10	0,20	3,58	1,00	0,07
	0,10	0,20	2,83	1,00	0,06
	0,10	0,20	5,40	1,00	0,11
	0,10	0,20	1,80	1,00	0,04
	0,10	0,20	1,80	1,00	0,04
	0,10	0,20	1,80	1,00	0,04
	0,10	0,20	1,91	1,00	0,04
	0,10	0,20	1,90	1,00	0,04
	0,10	0,20	1,79	1,00	0,04
	0,10	0,20	3,32	1,00	0,07
AREA D	0,10	0,20	2,46	1,00	0,05
PASAN: -				SUBTOTAL	2,30
				TOTAL	2,30

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,2	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 2					
AREA D	0,10	0,20	5,08	1,00	0,10
	0,10	0,20	6,70	1,00	0,13
	0,10	0,20	3,66	1,00	0,07
	0,10	0,20	2,14	1,00	0,04
	0,10	0,20	1,93	1,00	0,04
	0,10	0,20	4,16	1,00	0,08
	0,10	0,20	3,79	1,00	0,08
	0,10	0,20	2,55	1,00	0,05
	0,10	0,20	1,93	1,00	0,04
	0,10	0,20	3,79	1,00	0,08
	0,10	0,20	6,58	1,00	0,13
	0,10	0,20	3,33	1,00	0,07
	0,10	0,20	1,90	1,00	0,04
	0,10	0,20	1,90	1,00	0,04
	0,10	0,20	1,90	1,00	0,04
	0,10	0,20	3,03	1,00	0,06
VIGAS PISO 3					
AREA B	0,10	0,25	6,14	1,00	0,15
	0,10	0,25	5,31	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,77	1,00	0,14
	0,10	0,25	5,87	1,00	0,15
	0,10	0,25	5,67	1,00	0,14
	0,10	0,25	3,04	1,00	0,08
	0,10	0,25	1,29	1,00	0,03
	0,10	0,25	3,02	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,12	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,22	1,00	0,08
	0,10	0,25	2,92	1,00	0,07
	0,10	0,25	9,85	1,00	0,25
	0,10	0,25	2,09	1,00	0,05
	0,10	0,25	2,99	1,00	0,07
	0,10	0,25	2,88	1,00	0,07
				SUBTOTAL	**2,66**
PASAN: 2,30				**TOTAL**	**4,96**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75273

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 3					
AREA B	0,10	0,25	2,98	1,00	0,07
	0,10	0,25	2,99	1,00	0,07
	0,10	0,25	2,90	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,25	1,00	0,08
	0,10	0,25	2,45	1,00	0,06
AREA C	0,10	0,25	13,16	1,00	0,33
	0,10	0,25	1,72	1,00	0,04
	0,10	0,25	4,05	1,00	0,10
	0,10	0,25	1,52	1,00	0,04
	0,10	0,25	3,71	1,00	0,09
	0,10	0,25	9,65	1,00	0,24
	0,10	0,25	8,77	1,00	0,22
	0,10	0,25	3,27	1,00	0,08
	0,10	0,25	1,68	1,00	0,04
	0,10	0,25	3,27	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,27	1,00	0,08
	0,10	0,25	1,50	1,00	0,04
	0,10	0,25	1,49	1,00	0,04
	0,10	0,25	1,50	1,00	0,04
	0,10	0,25	13,16	1,00	0,33
	0,10	0,25	3,41	1,00	0,09
	0,10	0,25	3,15	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,13	1,00	0,08
	0,10	0,25	5,65	1,00	0,14
	0,10	0,25	3,15	1,00	0,08
	0,10	0,25	2,67	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,01	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,13	1,00	0,08
AREA D	0,10	0,25	2,45	1,00	0,06
	0,10	0,25	6,47	1,00	0,16
	0,10	0,25	15,44	1,00	0,39
	0,10	0,25	5,94	1,00	0,15
PASAN: 4,96				SUBTOTAL	3,60
				TOTAL	8,56

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,2	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 3					
AREA D	0,10	0,25	5,94	1,00	0,15
	0,10	0,25	1,65	1,00	0,04
	0,10	0,25	1,63	1,00	0,04
	0,10	0,25	1,65	1,00	0,04
	0,10	0,25	5,94	1,00	0,15
	0,10	0,25	5,94	1,00	0,15
	0,10	0,25	5,97	1,00	0,15
	0,10	0,25	1,65	1,00	0,04
	0,10	0,25	1,65	1,00	0,04
	0,10	0,25	1,65	1,00	0,04
	0,10	0,25	2,67	1,00	0,07
	0,10	0,25	8,63	1,00	0,22
	0,10	0,25	3,02	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,02	1,00	0,08
	0,10	0,25	4,50	1,00	0,11
	0,10	0,25	4,15	1,00	0,10
	0,10	0,25	2,67	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,79	1,00	0,09
	0,10	0,25	3,79	1,00	0,09
	0,10	0,25	3,74	1,00	0,09
	0,10	0,25	6,48	1,00	0,16
	0,10	0,25	1,82	1,00	0,05
	0,10	0,25	2,14	1,00	0,05
	0,10	0,25	3,74	1,00	0,09
	0,10	0,25	1,77	1,00	0,04
VIGAS PISO 4					
VIGA SOPORTE DE EQUIPOS	0,10	0,30	4,81	1,00	0,14
AREA B	0,10	0,25	15,44	1,00	0,39
	0,10	0,25	9,73	1,00	0,24
	0,10	0,25	1,02	1,00	0,03
	0,10	0,25	2,45	1,00	0,06
	0,10	0,25	2,80	1,00	0,07
				SUBTOTAL	3,16
PASAN: 8,56				TOTAL	11,72

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,2	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 4					
AREA B	0,10	0,25	2,55	1,00	0,06
AREA C	0,10	0,25	5,97	1,00	0,15
	0,10	0,25	8,85	1,00	0,22
	0,10	0,25	1,02	1,00	0,03
	0,10	0,25	6,06	1,00	0,15
	0,10	0,25	5,95	1,00	0,15
	0,10	0,25	2,89	1,00	0,07
	0,10	0,25	5,75	1,00	0,14
	0,10	0,25	5,85	1,00	0,15
	0,10	0,25	1,59	1,00	0,04
	0,10	0,25	1,59	1,00	0,04
	0,10	0,25	5,97	1,00	0,15
	0,10	0,25	3,95	1,00	0,10
	0,10	0,25	3,95	1,00	0,10
	0,10	0,25	3,95	1,00	0,10
	0,10	0,25	2,43	1,00	0,06
	0,10	0,25	2,44	1,00	0,06
AREA D	0,10	0,25	6,90	1,00	0,17
	0,10	0,25	3,87	1,00	0,10
	0,10	0,25	3,56	1,00	0,09
	0,10	0,25	8,91	1,00	0,22
	0,10	0,25	15,45	1,00	0,39
	0,10	0,25	1,36	1,00	0,03
	0,10	0,25	3,21	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,21	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,21	1,00	0,08
	0,10	0,25	1,68	1,00	0,04
	0,10	0,25	1,68	1,00	0,04
	0,10	0,25	2,45	1,00	0,06
AREA E	0,10	0,25	4,63	1,00	0,12
	0,10	0,25	15,44	1,00	0,39
	0,10	0,25	3,02	1,00	0,08
PASAN: 11,72				SUBTOTAL	3,74
				TOTAL	15,46

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,2	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 4					
AREA E	0,10	0,25	4,18	1,00	0,10
	0,10	0,25	8,65	1,00	0,22
	0,10	0,25	4,18	1,00	0,10
	0,10	0,25	4,19	1,00	0,10
	0,10	0,25	4,24	1,00	0,11
	0,10	0,25	2,68	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,14	1,00	0,08
	0,10	0,25	4,50	1,00	0,11
	0,10	0,25	3,79	1,00	0,09
	0,10	0,25	3,79	1,00	0,09
	0,10	0,25	6,60	1,00	0,16
	0,10	0,25	4,15	1,00	0,10
	0,10	0,25	1,96	1,00	0,05
	0,10	0,25	2,14	1,00	0,05
	0,10	0,25	3,63	1,00	0,09
VIGAS PISO 5					
AREA B	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	1,35	1,00	0,03
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	3,19	1,00	0,08
	0,10	0,25	1,35	1,00	0,03
	0,10	0,25	1,66	1,00	0,04
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	1,35	1,00	0,03
	0,10	0,25	3,19	1,00	0,08
	0,10	0,25	1,66	1,00	0,04
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	3,19	1,00	0,08
	0,10	0,25	1,35	1,00	0,03
				SUBTOTAL	2,87
PASAN:	15,46			TOTAL	18,33

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,2	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 5					
AREA B	0,10	0,25	1,66	1,00	0,04
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	1,35	1,00	0,03
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	32,55	1,00	0,81
	0,10	0,25	32,56	1,00	0,81
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	1,35	1,00	0,03
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	4,35	1,00	0,11
	0,10	0,25	1,35	1,00	0,03
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	1,35	1,00	0,03
	0,10	0,25	4,35	1,00	0,11
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	4,35	1,00	0,11
	0,10	0,25	1,35	1,00	0,03
	0,10	0,25	5,38	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,38	2,00	0,27
	0,10	0,25	5,38	3,00	0,40
	0,10	0,25	1,35	4,00	0,14
	0,10	0,25	5,38	5,00	0,67
AREA C	0,10	0,25	3,61	1,00	0,09
	0,10	0,25	3,91	1,00	0,10
	0,10	0,25	1,98	1,00	0,05
	0,10	0,25	8,66	1,00	0,22
	0,10	0,25	4,21	1,00	0,11
PASAN: 18,33				SUBTOTAL	5,75
				TOTAL	24,08

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 5					
AREA C	0,10	0,25	4,18	1,00	0,10
	0,10	0,25	1,93	1,00	0,05
	0,10	0,25	2,14	1,00	0,05
	0,10	0,25	4,08	1,00	0,10
	0,10	0,25	3,74	1,00	0,09
	0,10	0,25	3,74	1,00	0,09
	0,10	0,25	2,70	1,00	0,07
	0,10	0,25	1,78	1,00	0,04
PASAN: 24,08				SUBTOTAL	0,59
				TOTAL	24,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

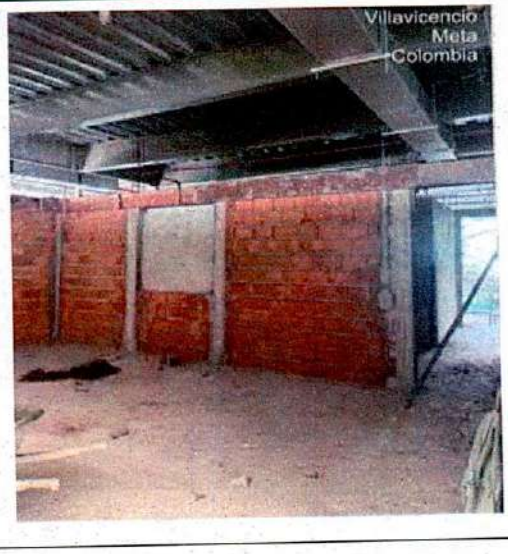

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,2	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 2					
PISO 2	0,10	0,25	12,34	1,00	0,31
	0,10	0,25	3,61	1,00	0,09
	0,10	0,25	2,68	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,62	1,00	0,09
	0,10	0,25	3,74	1,00	0,09
	0,10	0,25	2,68	1,00	0,07
	0,10	0,25	5,47	1,00	0,14
	0,10	0,25	3,36	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,24	1,00	0,08
	0,10	0,25	5,36	1,00	0,13
	0,10	0,25	10,63	1,00	0,27
AREA ASCENSORES EJE 2	0,10	0,25	12,94	1,00	0,32
	0,10	0,25	3,78	1,00	0,09
	0,10	0,25	0,72	1,00	0,02
	0,10	0,25	0,72	1,00	0,02
	0,10	0,25	0,72	1,00	0,02
	0,10	0,25	0,72	1,00	0,02
PISO 2	0,10	0,25	4,52	1,00	0,11
	0,10	0,25	2,91	1,00	0,07
	0,10	0,25	4,41	1,00	0,11
	0,10	0,25	2,32	1,00	0,06
	0,10	0,25	4,29	1,00	0,11
	0,10	0,25	1,64	1,00	0,04
	0,10	0,25	4,31	1,00	0,11
PISO 2	0,10	0,25	0,92	1,00	0,02
	0,10	0,25	4,31	1,00	0,11
	0,10	0,25	3,11	1,00	0,08
	0,10	0,25	0,41	1,00	0,01
	0,10	0,25	15,56	1,00	0,39
	0,10	0,25	2,45	1,00	0,06
	0,10	0,25	9,39	1,00	0,23
PASAN: 24,67				SUBTOTAL	3,42
				TOTAL	28,09

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 2					
PISO 2	0,10	0,25	12,46	1,00	0,31
	0,10	0,25	2,81	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,64	1,00	0,09
	0,10	0,25	1,02	1,00	0,03
	0,10	0,25	1,25	1,00	0,03
	0,10	0,25	9,16	1,00	0,23
	0,10	0,25	10,21	1,00	0,26
	0,10	0,25	1,80	1,00	0,04
	0,10	0,25	1,92	1,00	0,05
	0,10	0,25	10,21	1,00	0,26
	0,10	0,25	5,19	1,00	0,13
	0,10	0,25	1,72	1,00	0,04
	0,10	0,25	8,25	1,00	0,21
	0,10	0,25	2,41	1,00	0,06
	0,10	0,25	0,56	1,00	0,01
	0,10	0,25	1,00	1,00	0,02
	0,10	0,25	0,41	1,00	0,01
	0,10	0,25	3,33	1,00	0,08
	0,10	0,25	1,89	1,00	0,05
	0,10	0,25	1,79	1,00	0,04
AREA CUARTO TECNICO	0,10	0,25	4,58	1,00	0,11
	0,10	0,25	1,04	1,00	0,03
	0,10	0,25	1,32	1,00	0,03
	0,10	0,25	3,24	1,00	0,08
AREA CUARTO TECNICO	0,10	0,25	1,26	1,00	0,03
	0,10	0,25	2,98	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,60	1,00	0,09
	0,10	0,25	3,60	1,00	0,09
	0,10	0,25	3,30	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,30	1,00	0,08
PISO 2	0,10	0,25	2,44	1,00	0,06
	0,10	0,25	7,62	1,00	0,19
				SUBTOTAL	2,98
PASAN: 28,09				TOTAL	31,07

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 2					
PISO 2	0,10	0,25	3,12	1,00	0,08
	0,10	0,25	1,91	1,00	0,05
	0,10	0,25	2,02	1,00	0,05
	0,10	0,25	15,58	1,00	0,39
	0,10	0,25	2,03	1,00	0,05
	0,10	0,25	1,93	1,00	0,05
	0,10	0,25	1,93	1,00	0,05
	0,10	0,25	3,75	1,00	0,09
	0,10	0,25	5,08	1,00	0,13
	0,10	0,25	5,08	1,00	0,13
	0,10	0,25	12,24	1,00	0,31
	0,10	0,25	2,67	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,04	1,00	0,08
	0,10	0,25	4,48	1,00	0,11
	0,10	0,25	4,16	1,00	0,10
	0,10	0,25	2,67	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,91	1,00	0,10
	0,10	0,25	3,79	1,00	0,09
	0,10	0,25	1,93	1,00	0,05
	0,10	0,25	2,14	1,00	0,05
	0,10	0,25	3,66	1,00	0,09
	0,10	0,25	3,79	1,00	0,09
	0,10	0,25	1,77	1,00	0,04
	0,10	0,25	6,48	1,00	0,16
	0,10	0,25	18,38	1,00	0,46
	0,10	0,25	3,89	1,00	0,10
	0,10	0,25	1,93	1,00	0,05
VIGAS PISO 3					
MUROS PLOMADOS	0,10	0,25	4,43	1,00	0,11
	0,10	0,25	4,06	1,00	0,10
	0,10	0,25	4,80	1,00	0,12
PASAN: 31,07				SUBTOTAL	3,42
				TOTAL	34,49

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**

FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,2	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 3					
MUROS PLOMADOS	0,10	0,25	3,39	1,00	0,08
	0,10	0,25	0,43	1,00	0,01
	0,10	0,25	0,77	1,00	0,02
	0,10	0,25	0,88	1,00	0,02
	0,10	0,25	1,86	1,00	0,05
	0,10	0,25	4,10	1,00	0,10
	0,10	0,25	7,06	1,00	0,18
	0,10	0,25	6,68	1,00	0,17
	0,10	0,25	7,29	1,00	0,18
	0,10	0,25	3,16	1,00	0,08
	0,10	0,25	2,68	1,00	0,07
	0,10	0,25	2,68	1,00	0,07
AREA CUARTO TECNICO PISO 3	0,10	0,25	2,18	1,00	0,05
	0,10	0,25	0,80	1,00	0,02
	0,10	0,25	1,30	1,00	0,03
	0,10	0,25	3,40	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,61	1,00	0,09
	0,10	0,25	2,89	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,61	1,00	0,09
	0,10	0,25	2,89	1,00	0,07
				SUBTOTAL	1,54
PASAN: 34,49				TOTAL	36,03

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**

FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,2	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
VIGAS PISO 4					
CUARTO FALTANTE	0,10	0,25	2,68	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,63	1,00	0,09
	0,10	0,25	1,87	1,00	0,05
AREA CUARTO TECNICO PISO 4	0,10	0,25	2,18	1,00	0,05
	0,10	0,25	0,80	1,00	0,02
	0,10	0,25	1,30	1,00	0,03
	0,10	0,25	3,40	1,00	0,08
	0,10	0,25	3,61	1,00	0,09
	0,10	0,25	2,89	1,00	0,07
	0,10	0,25	3,61	1,00	0,09
	0,10	0,25	2,89	1,00	0,07
PASAN: 36,03				SUBTOTAL	0,72
				TOTAL	36,75
				DSC ACTAS ANTERIORES (-)	24,67
				TOTAL	12,08

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

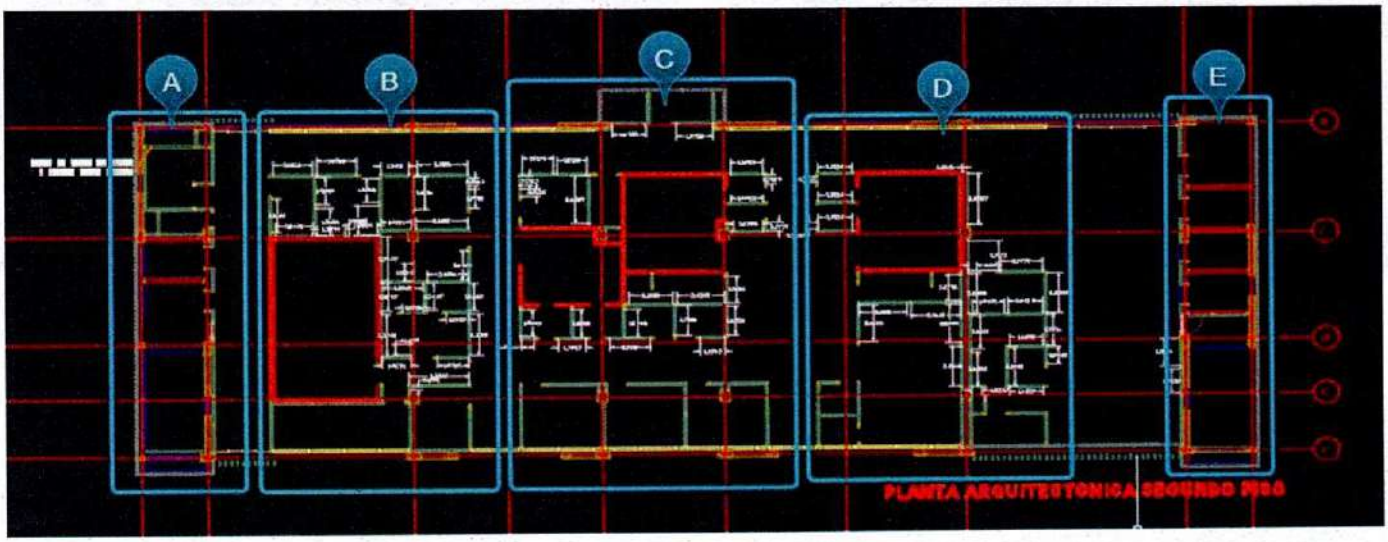

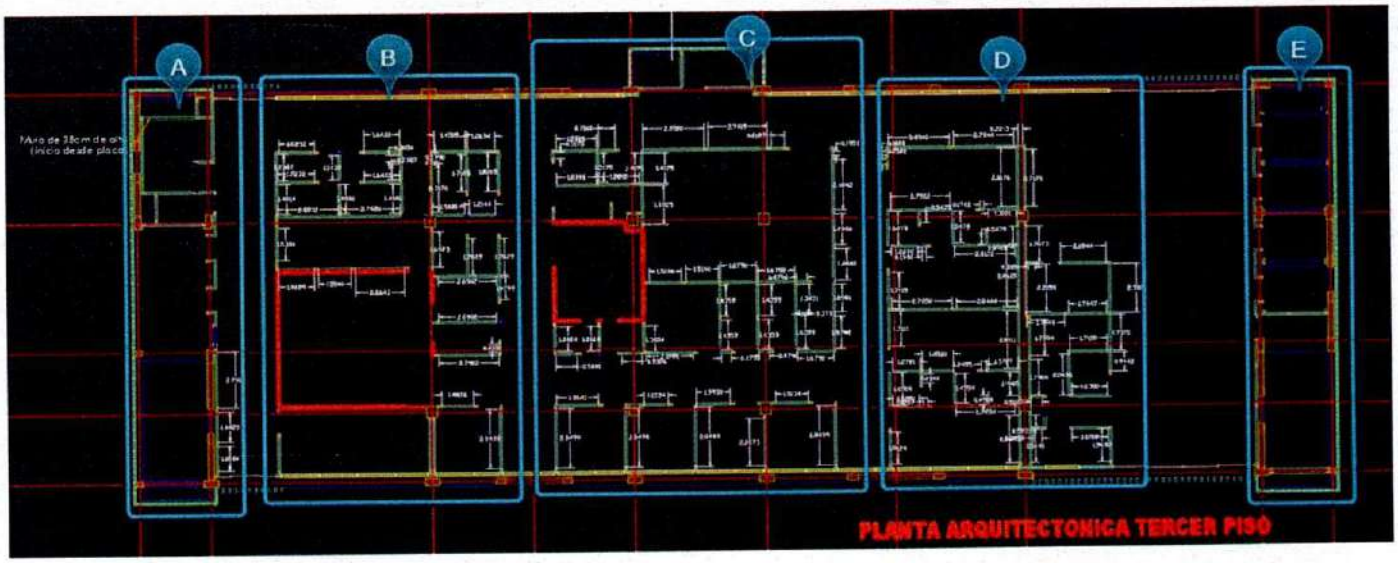

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**


CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,2	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



PLANTA ARQUITECTONICA CUARTO PISO

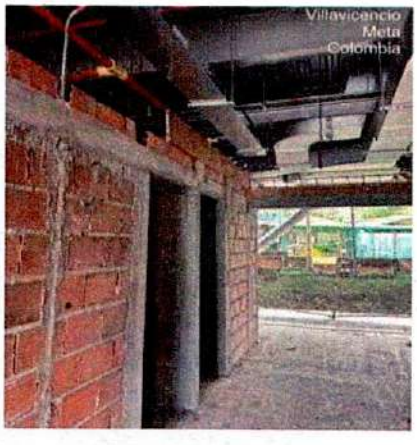

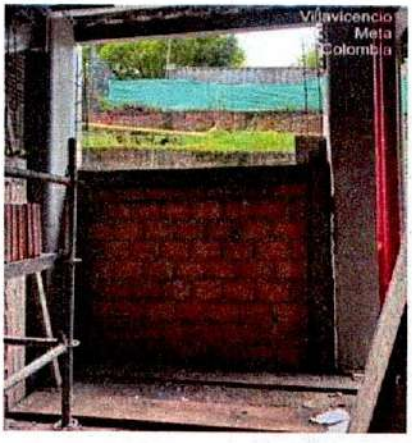



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

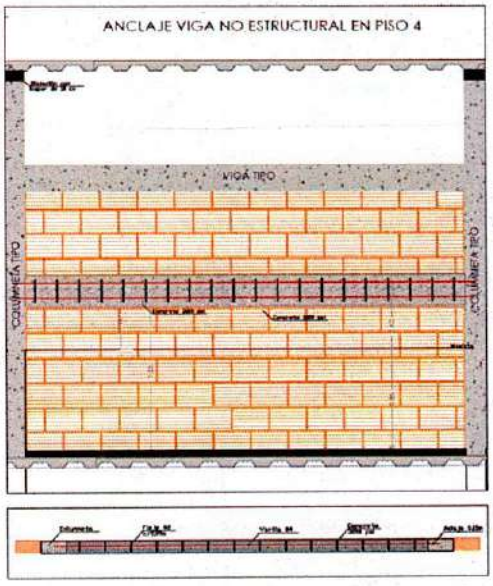


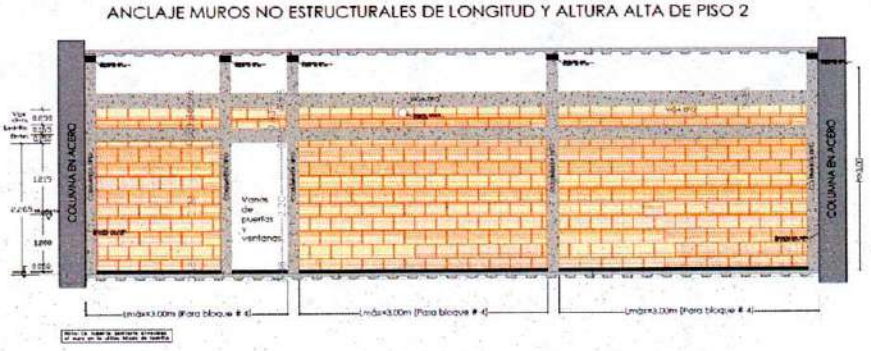

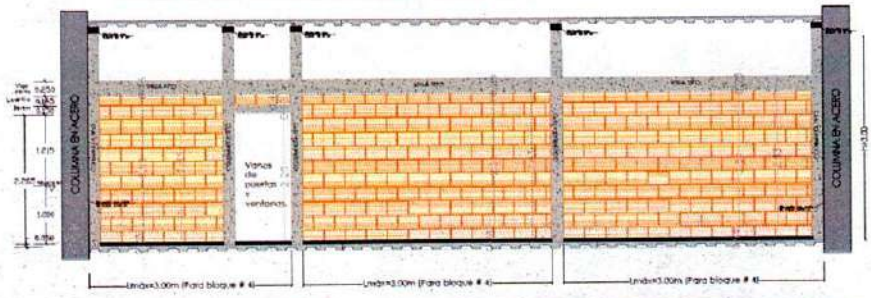

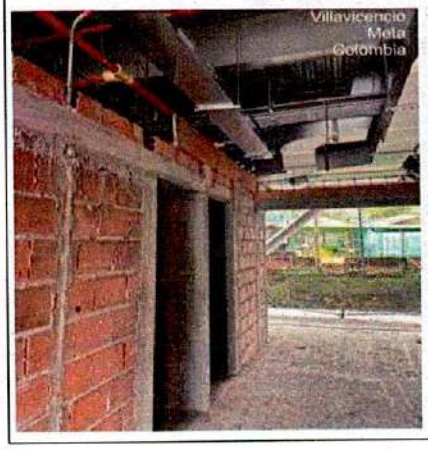

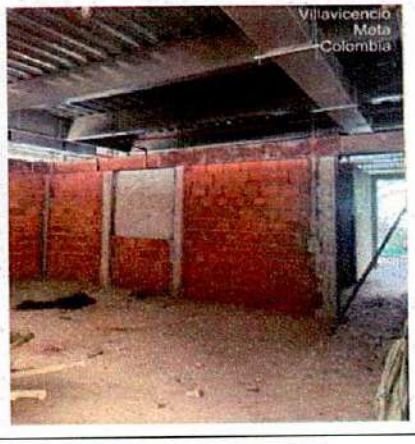

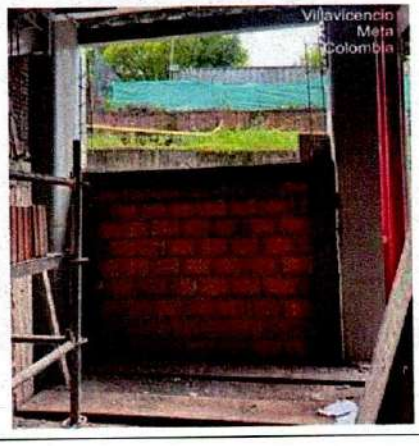

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0825

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,3	**COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
COLUMNAS PISO 2					
COLUMNAS	0,10	0,20	2,29	93,00	4,26
COLUMNAS	0,10	0,20	2,29	4,00	0,18
COLUMNETAS	0,10	0,20	2,29	3,00	0,14
COLUMNAS PISO 3					
COLUMNAS	0,10	0,20	2,29	128,00	5,86
COLUMNAS	0,10	0,20	2,60	39,00	2,03
PANTALLAS	0,10	0,20	2,60	4,00	0,21
CUELLOS	0,10	0,20	1,00	128,00	2,56
COLUMNAS	0,10	0,20	2,60	2,00	0,10
PANTALLA (DOBLE)	0,10	0,20	2,60	2,00	0,10
COLUMNAS PISO 4					
COLUMNAS	0,10	0,20	2,60	117,00	6,08
COLUMNETAS	0,10	0,20	2,60	2,00	0,10
COLUMNAS PISO 5					
COLUMNAS	0,10	0,20	2,60	7,00	0,36
COLUMNETAS	0,10	0,20	2,60	20,00	1,04
COLUMNAS	0,10	0,20	2,60	133,00	6,92
COLUMNAS PISO 6					
COLUMNAS	0,10	0,20	2,60	27,00	1,40
COLUMNETAS	0,10	0,20	2,60	112,00	5,82
PANTALLA (DOBLE)	0,10	0,20	2,60	8,00	0,42
PASAN: -				SUBTOTAL	37,59
				TOTAL	37,59

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,3	**COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M3)
COLUMNAS PISO 2					
COLUMNAS	0,10	0,20	2,60	142,00	7,38
PANTALLA	0,10	0,40	2,60	1,00	0,10
CUARTO TECNICO	0,10	0,20	1,90	2,00	0,08
COLUMNAS PISO 3					
COLUMNAS	0,10	0,20	2,60	89,00	4,63
PANTALLA	0,10	0,40	2,60	1,00	0,10
CUARTO TECNICO	0,10	0,20	1,90	4,00	0,15
COLUMNAS PISO 4					
COLUMNAS	0,10	0,20	2,60	46,00	2,39
CUARTO TECNICO	0,10	0,20	1,90	4,00	0,15
PASAN: **37,59**				**SUBTOTAL**	**14,99**
				TOTAL	**52,58**
				DSC ACTAS ANTERIORES (-)	**37,59**
				TOTAL	**14,99**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS


Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**	
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,3	**COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

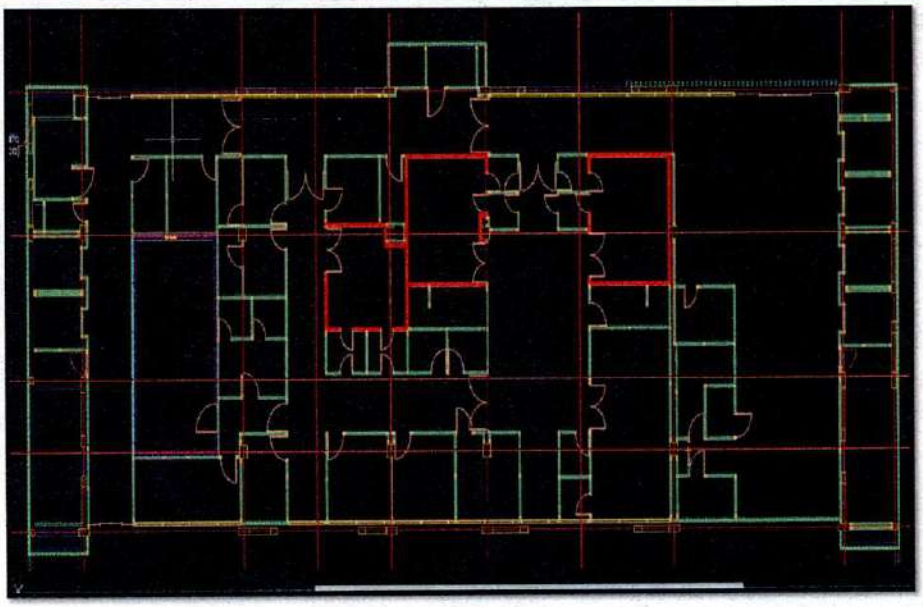

COLUMNETAS PISO 2

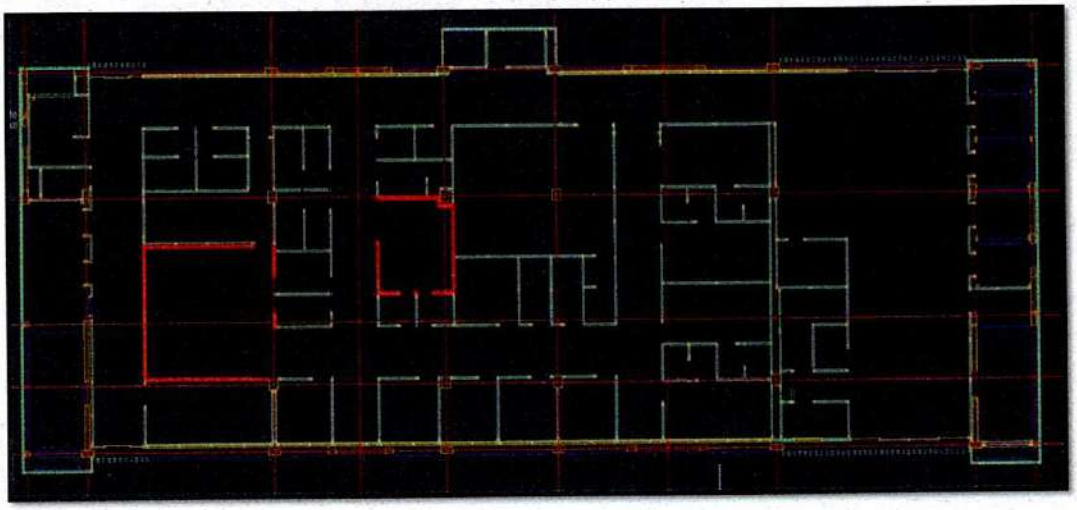

COLUMNETAS PISO 3

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


75282

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

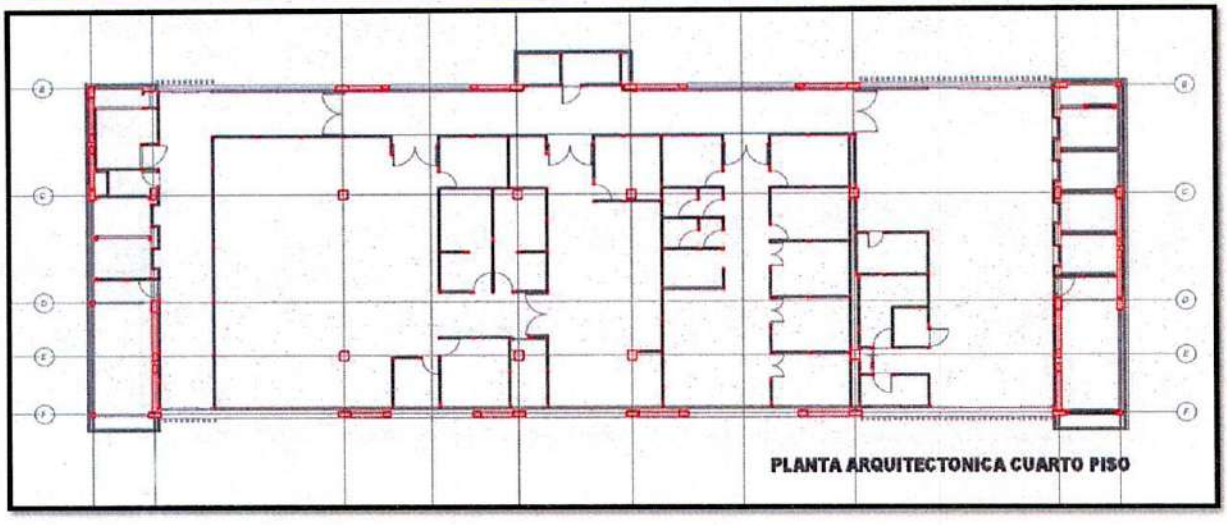

ANCLAJE MUROS NO ESTRUCTURALES DE LONGITUD Y ALTURA ALTA DE PISO 2

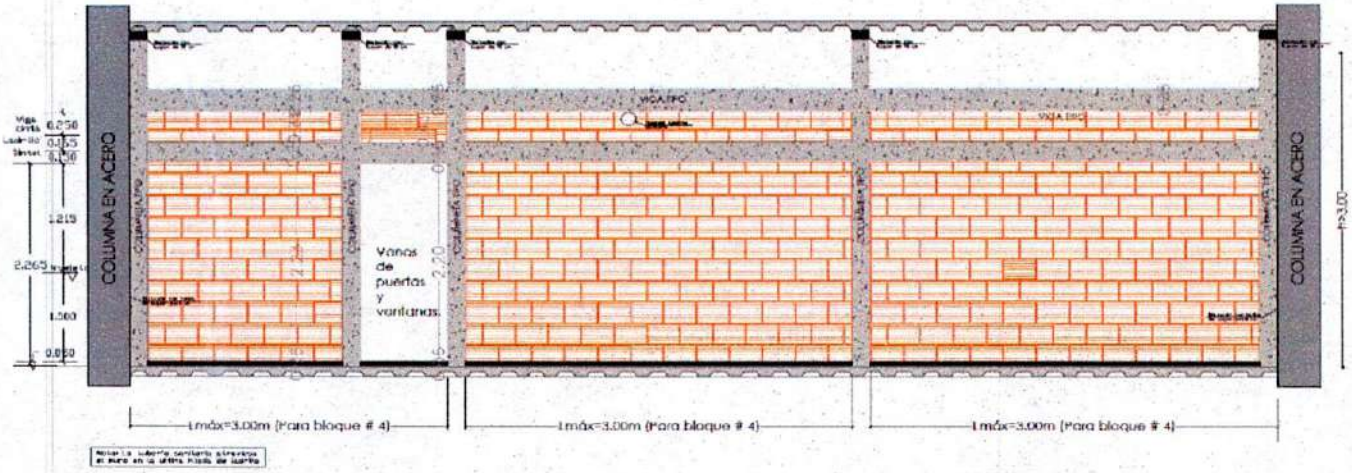


CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

ANCLAJE MUROS NO ESTRUCTURALES DE LONGITUD Y ALTURA ALTA DE PISO 3 A 8

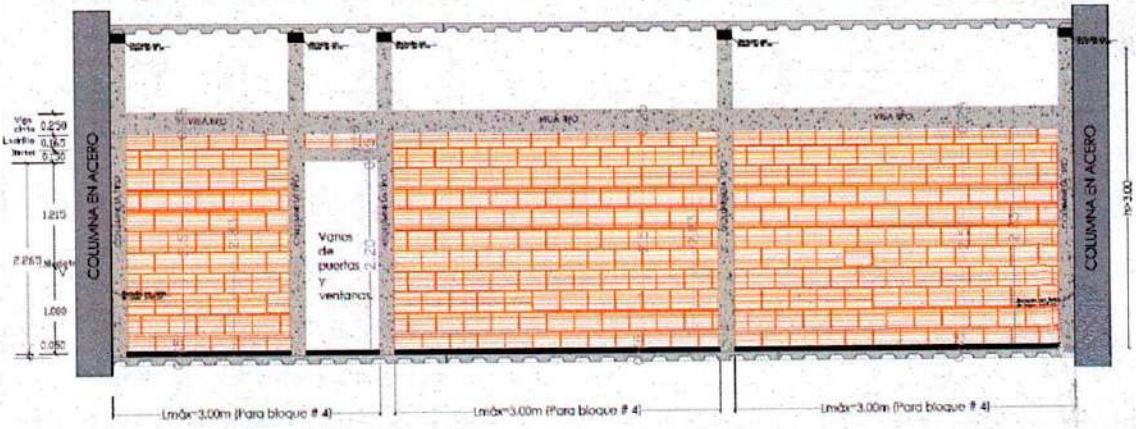

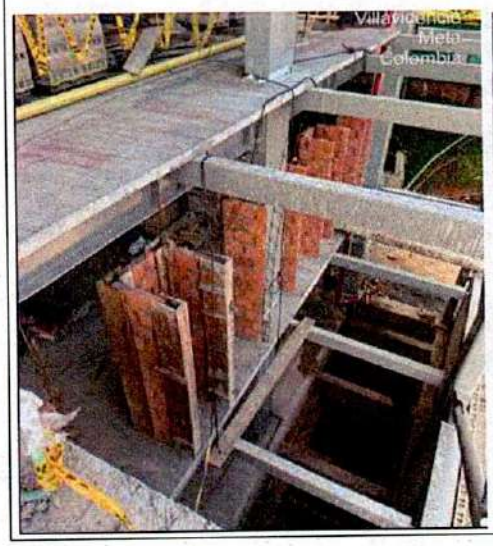

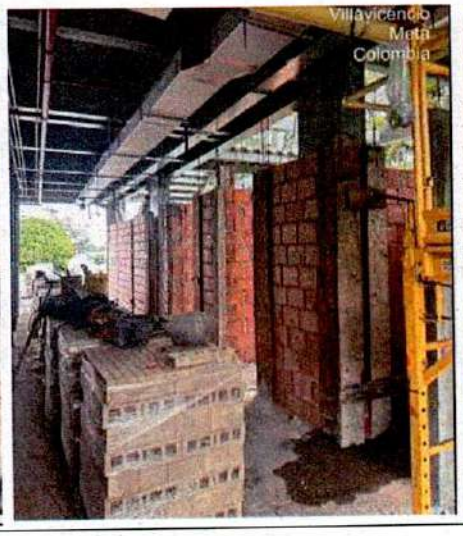

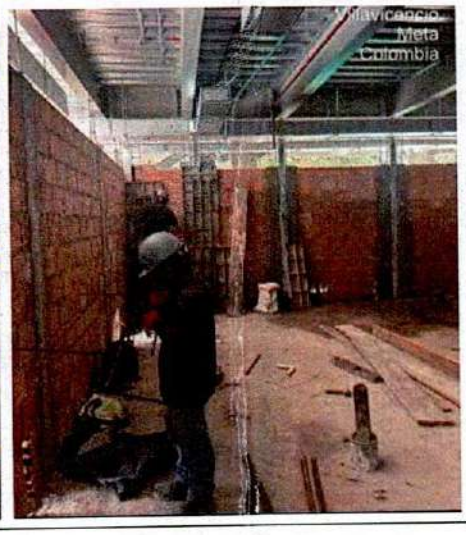

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75283

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**

FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,5,6	**PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PAÑETE PISO 3				
AREA B	2,83	3,22	1,00	9,11
	2,83	3,00	1,00	8,49
	2,83	3,14	1,00	8,89
	2,83	1,94	1,00	5,49
	2,83	2,02	1,00	5,72
	2,83	5,76	1,00	16,30
	2,83	6,03	1,00	17,05
	2,83	6,05	1,00	17,12
	2,83	2,11	1,00	5,96
	2,83	2,99	1,00	8,46
	2,83	1,24	1,00	3,51
	2,83	3,10	1,00	8,77
	2,83	3,10	1,00	8,77
	2,83	3,00	1,00	8,49
	2,83	3,09	1,00	8,74
	2,83	0,71	1,00	2,01
	2,83	1,90	1,00	5,38
	2,83	1,90	1,00	5,38
	2,83	3,25	1,00	9,20
	2,83	3,25	1,00	9,20
	2,83	0,81	1,00	2,29
	2,83	3,32	1,00	9,40
	2,83	2,12	1,00	5,99
AREA C	2,83	3,16	1,00	8,94
	2,83	6,91	1,00	19,56
	2,83	6,81	1,00	19,27
	2,83	3,71	1,00	10,50
	2,83	6,39	1,00	18,08
	2,83	9,86	1,00	27,90
	2,83	3,25	1,00	9,20
	2,83	4,16	1,00	11,78
	2,83	2,09	1,00	5,92
PASAN: -			SUBTOTAL	320,87
			TOTAL	320,87

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PAÑETE PISO 3				
AREA C	2,83	7,77	1,00	21,99
	2,83	1,60	1,00	4,53
	2,83	3,25	1,00	9,20
	2,83	3,15	1,00	8,90
	2,83	1,28	1,00	3,62
	2,83	1,18	1,00	3,34
	2,83	1,60	1,00	4,53
	2,83	1,60	1,00	4,53
	2,83	2,26	1,00	6,41
	2,83	2,16	1,00	6,12
	2,83	1,60	1,00	4,53
	2,83	1,60	1,00	4,53
	2,83	1,50	1,00	4,25
	2,83	1,50	1,00	4,25
	2,83	3,74	1,00	10,58
	2,83	3,28	1,00	9,27
	2,83	3,28	1,00	9,27
	2,83	1,55	1,00	4,38
	2,83	1,55	1,00	4,38
	2,83	3,25	1,00	9,20
	2,83	3,15	1,00	8,90
	2,83	1,90	1,00	5,37
	2,83	1,79	1,00	5,07
	2,83	3,43	1,00	9,72
	2,83	3,36	1,00	9,50
	2,83	0,78	1,00	2,20
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	3,27	1,00	9,26
	2,83	1,68	1,00	4,75
	2,83	3,37	1,00	9,54
	2,83	3,27	1,00	9,26
	2,83	0,68	1,00	1,92
PASAN: 320,87			SUBTOTAL	215,22
			TOTAL	536,09

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PAÑETE PISO 3				
AREA C	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	1,68	1,00	4,75
	2,83	3,37	1,00	9,54
	2,83	1,88	1,00	5,32
	2,83	1,91	1,00	5,41
	2,83	1,91	1,00	5,41
	2,83	2,68	1,00	7,59
	2,83	2,68	1,00	7,59
	2,83	3,25	1,00	9,20
AREA D	2,83	6,47	1,00	18,31
	2,83	1,03	1,00	2,91
	2,83	0,93	1,00	2,63
	2,83	5,94	1,00	16,81
	2,83	2,90	1,00	8,21
	2,83	1,85	1,00	5,24
	2,83	3,92	1,00	11,09
	2,83	3,12	1,00	8,83
	2,83	1,98	1,00	5,60
	2,83	0,61	1,00	1,73
	2,83	2,48	1,00	7,02
	2,83	5,48	1,00	15,51
	2,83	1,87	1,00	5,29
	2,83	1,92	1,00	5,42
	2,83	1,91	1,00	5,41
	2,83	5,94	1,00	16,82
	2,83	2,91	1,00	8,24
	2,83	5,94	1,00	16,82
	2,83	2,91	1,00	8,24
	2,83	1,91	1,00	5,41
	2,83	1,91	1,00	5,41
	2,83	2,91	1,00	8,24
	2,83	3,05	1,00	8,63
PASAN: 536,09			SUBTOTAL	254,55
			TOTAL	790,64

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PAÑETE PISO 3				
AREA D	2,83	2,02	1,00	5,73
	2,83	1,85	1,00	5,24
PISO 3				
AREA B	2,83	1,29	1,00	3,65
	2,83	2,02	1,00	5,73
	2,83	1,92	1,00	5,44
	2,83	1,92	1,00	5,44
	2,83	3,04	1,00	8,61
	2,83	3,04	1,00	8,61
	2,83	1,94	1,00	5,50
	2,83	1,84	1,00	5,21
	2,83	1,84	1,00	5,21
	2,83	3,14	1,00	8,90
	2,83	5,77	1,00	16,32
	2,83	6,03	1,00	17,05
	2,83	6,13	1,00	17,35
	2,83	2,11	1,00	5,97
	2,83	2,11	1,00	5,97
	2,83	3,12	1,00	8,82
	2,83	3,12	1,00	8,82
	2,83	3,22	1,00	9,11
	2,83	2,00	1,00	5,67
	2,83	2,00	1,00	5,67
	2,83	2,12	1,00	5,99
	2,83	2,00	1,00	5,67
	2,83	1,35	1,00	3,82
	2,83	1,54	1,00	4,35
	2,83	3,12	1,00	8,82
	2,83	3,12	1,00	8,82
	2,83	1,98	1,00	5,61
	2,83	1,98	1,00	5,61
PASAN: 790,64			SUBTOTAL	222,71
			TOTAL	1.013,35

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3				
AREA B	2,83	1,98	1,00	5,61
	2,83	1,98	1,00	5,61
	2,83	3,11	1,00	8,79
	2,83	1,53	1,00	4,32
	2,83	1,36	1,00	3,86
	2,83	1,24	1,00	3,51
	2,83	1,24	1,00	3,51
	2,83	3,09	1,00	8,75
	2,83	3,09	1,00	8,75
	2,83	2,99	1,00	8,46
	2,83	2,99	1,00	8,46
	2,83	0,81	1,00	2,29
	2,83	0,70	1,00	1,97
	2,83	1,90	1,00	5,37
	2,83	1,90	1,00	5,37
	2,83	3,25	1,00	9,20
	2,83	3,25	1,00	9,20
AREA C	2,83	3,16	1,00	8,94
	2,83	0,62	1,00	1,75
	2,83	0,51	1,00	1,45
	2,83	1,98	1,00	5,61
	2,83	0,98	1,00	2,77
	2,83	1,52	1,00	4,29
	2,83	1,52	1,00	4,29
	2,83	1,63	1,00	4,62
	2,83	1,98	1,00	5,61
	2,83	2,10	1,00	5,93
	2,83	4,16	1,00	11,78
	2,83	2,09	1,00	5,92
	2,83	6,95	1,00	19,66
	2,83	9,81	1,00	27,76
PASAN: 1.013,35			SUBTOTAL	213,41
			TOTAL	1.226,76

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3				
AREA C	2,83	3,70	1,00	10,46
	2,83	9,86	1,00	27,92
	2,83	6,38	1,00	18,05
	2,83	7,77	1,00	21,99
	2,83	1,88	1,00	5,32
	2,83	3,36	1,00	9,50
	2,83	1,68	1,00	4,75
	2,83	3,24	1,00	9,17
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	0,78	1,00	2,21
	2,83	3,37	1,00	9,54
	2,83	1,68	1,00	4,75
	2,83	3,26	1,00	9,22
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	0,78	1,00	2,20
	2,83	3,36	1,00	9,51
	2,83	3,43	1,00	9,72
	2,83	1,50	1,00	4,25
	2,83	2,44	1,00	6,91
	2,83	3,74	1,00	10,58
	2,83	1,50	1,00	4,25
	2,83	1,18	1,00	3,34
	2,83	1,60	1,00	4,53
	2,83	1,60	1,00	4,53
	2,83	1,50	1,00	4,25
	2,83	1,60	1,00	4,54
	2,83	1,18	1,00	3,34
	2,83	1,28	1,00	3,62
	2,83	3,27	1,00	9,24
	2,83	3,15	1,00	8,90
	2,83	2,26	1,00	6,41
PASAN: 1.226,76			SUBTOTAL	236,84
			TOTAL	1.463,60

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75286

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	**PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3				
AREA C	2,83	2,16	1,00	6,12
	2,83	3,25	1,00	9,20
	2,83	3,25	1,00	9,20
	2,83	1,53	1,00	4,34
	2,83	1,53	1,00	4,34
	2,83	3,25	1,00	9,20
	2,83	3,15	1,00	8,90
	2,83	1,90	1,00	5,37
	2,83	1,79	1,00	5,07
	2,83	1,93	1,00	5,46
	2,83	1,93	1,00	5,46
	2,83	2,67	1,00	7,55
	2,83	2,67	1,00	7,55
	2,83	3,25	1,00	9,20
	2,83	3,25	1,00	9,20
AREA D	2,83	6,47	1,00	18,30
	2,83	5,94	1,00	16,82
	2,83	0,93	1,00	2,64
	2,83	1,03	1,00	2,92
	2,83	2,90	1,00	8,20
	2,83	3,12	1,00	8,82
	2,83	1,89	1,00	5,36
	2,83	3,15	1,00	8,92
	2,83	1,85	1,00	5,23
	2,83	2,03	1,00	5,74
	2,83	1,77	1,00	5,02
	2,83	1,75	1,00	4,95
	2,83	3,02	1,00	8,54
	2,83	2,90	1,00	8,20
	2,83	5,92	1,00	16,77
	2,83	1,91	1,00	5,41
PASAN: 1.463,60			SUBTOTAL	238,00
			TOTAL	1.701,60

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	**PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN**	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3				
AREA D	2,83	3,92	1,00	11,10
	2,83	5,92	1,00	16,77
	2,83	1,94	1,00	5,48
	2,83	2,91	1,00	8,24
	2,83	1,92	1,00	5,42
	2,83	3,13	1,00	8,85
	2,83	1,85	1,00	5,24
	2,83	2,02	1,00	5,73
	2,83	3,05	1,00	8,62
	2,83	1,75	1,00	4,95
	2,83	2,68	1,00	7,59
	2,83	1,91	1,00	5,41
	2,83	1,91	1,00	5,41
	2,83	1,97	1,00	5,57
	2,83	0,59	1,00	1,67
	2,83	0,59	1,00	1,67
	2,83	2,48	1,00	7,03
	2,83	2,38	1,00	6,75
	2,83	5,48	1,00	15,50
	2,83	2,30	1,00	6,51
	2,83	3,79	1,00	10,72
	2,83	2,30	1,00	6,51
	2,83	3,64	1,00	10,30
	2,83	1,73	1,00	4,90
	2,83	1,92	1,00	5,42
	2,83	3,96	1,00	11,21
	2,83	2,34	1,00	6,63
	2,83	2,03	1,00	5,74
	2,83	0,69	1,00	1,96
	2,83	0,69	1,00	1,96
	2,83	0,80	1,00	2,26
			SUBTOTAL	211,12
PASAN: 1.701,60			TOTAL	1.912,72

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 3				
AREA D	2,83	0,68	1,00	1,91
	2,83	0,68	1,00	1,91
	2,83	1,76	1,00	4,99
	2,83	2,05	1,00	5,80
	2,83	1,94	1,00	5,48
	2,83	1,77	1,00	5,01
	2,83	1,87	1,00	5,29
PISO 4				
AREA B	2,83	15,55	1,00	43,99
	2,83	15,44	1,00	43,71
	2,83	9,71	1,00	27,49
	2,83	9,50	1,00	26,88
	2,83	1,00	1,00	2,83
	2,83	1,13	1,00	3,20
AREA C	2,83	5,95	1,00	16,84
	2,83	2,09	1,00	5,91
	2,83	1,99	1,00	5,63
	2,83	3,70	1,00	10,48
	2,83	1,95	1,00	5,51
	2,83	1,00	1,00	2,83
	2,83	1,13	1,00	3,20
	2,83	2,89	1,00	8,18
	2,83	2,89	1,00	8,18
	2,83	3,79	1,00	10,72
	2,83	2,05	1,00	5,80
	2,83	6,06	1,00	17,15
	2,83	1,59	1,00	4,50
	2,83	2,16	1,00	6,10
	2,83	1,83	1,00	5,17
	2,83	1,93	1,00	5,45
	2,83	5,98	1,00	16,91
PASAN: 1.912,72			SUBTOTAL	317,05
			TOTAL	2.229,77

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	**PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 4				
AREA C	2,83	5,98	1,00	16,91
	2,83	1,59	1,00	4,50
	2,83	2,16	1,00	6,10
	2,83	1,83	1,00	5,16
	2,83	1,93	1,00	5,45
	2,83	6,06	1,00	17,15
	2,83	1,65	1,00	4,67
	2,83	1,55	1,00	4,39
	2,83	2,80	1,00	7,91
	2,83	2,90	1,00	8,19
	2,83	2,95	1,00	8,33
	2,83	2,95	1,00	8,33
	2,83	3,93	1,00	11,11
	2,83	3,80	1,00	10,75
	2,83	3,95	1,00	11,16
	2,83	3,95	1,00	11,16
	2,83	1,02	1,00	2,90
	2,83	1,12	1,00	3,18
	2,83	4,07	1,00	11,50
	2,83	3,95	1,00	11,16
AREA D	2,83	7,12	1,00	20,14
	2,83	3,58	1,00	10,13
	2,83	3,64	1,00	10,30
	2,83	3,69	1,00	10,45
	2,83	2,76	1,00	7,80
	2,83	2,87	1,00	8,12
	2,83	3,66	1,00	10,37
	2,83	8,46	1,00	23,95
AREA E	2,83	4,73	1,00	13,38
PISO 4				
AREA C	2,83	2,83	1,00	7,99
PASAN: 2.229,77			SUBTOTAL	292,64
			TOTAL	2.522,41

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 4				
AREA C	2,83	3,57	1,00	10,12
	2,83	1,59	1,00	4,50
	2,83	2,83	1,00	7,99
	2,83	3,60	1,00	10,20
	2,83	1,59	1,00	4,50
	2,83	1,02	1,00	2,90
	2,83	3,96	1,00	11,21
	2,83	4,05	1,00	11,45
AREA D	2,83	1,35	1,00	3,81
	2,83	1,35	1,00	3,81
	2,83	8,90	1,00	25,18
	2,83	1,23	1,00	3,48
	2,83	1,23	1,00	3,48
	2,83	3,32	1,00	9,40
	2,83	3,32	1,00	9,40
	2,83	1,68	1,00	4,75
	2,83	1,88	1,00	5,32
	2,83	1,24	1,00	3,52
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	3,32	1,00	9,40
	2,83	1,68	1,00	4,75
	2,83	1,88	1,00	5,32
	2,83	1,24	1,00	3,52
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	0,68	1,00	1,92
	2,83	3,32	1,00	9,40
	2,83	2,89	1,00	8,18
PASAN: 2.522,41			SUBTOTAL	190,95
			TOTAL	2.713,36

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 4				
AREA D	2,83	3,21	1,00	9,08
	2,83	1,99	1,00	5,63
	2,83	2,09	1,00	5,91
AREA E	2,83	2,09	1,00	5,91
	2,83	1,99	1,00	5,63
	2,83	4,19	1,00	11,86
	2,83	2,89	1,00	8,18
	2,83	4,29	1,00	12,15
	2,83	4,22	1,00	11,93
	2,83	2,46	1,00	6,97
	2,83	4,29	1,00	12,15
	2,83	2,15	1,00	6,07
	2,83	2,24	1,00	6,34
	2,83	4,29	1,00	12,15
	2,83	3,04	1,00	8,60
	2,83	4,19	1,00	11,86
	2,83	1,62	1,00	4,58
	2,83	1,72	1,00	4,86
	2,83	4,29	1,00	12,14
	2,83	2,98	1,00	8,43
	2,83	4,22	1,00	11,93
	2,83	1,62	1,00	4,58
	2,83	1,72	1,00	4,87
	2,83	4,33	1,00	12,26
	2,83	2,69	1,00	7,62
	2,83	1,61	1,00	4,57
	2,83	1,61	1,00	4,57
	2,83	3,14	1,00	8,89
	2,83	1,98	1,00	5,60
	2,83	0,62	1,00	1,74
	2,83	0,62	1,00	1,74
PASAN: 2.713,36			SUBTOTAL	238,80
			TOTAL	2.952,16

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/10/2026
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 13**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (M2)
PISO 4				
AREA E	2,83	2,48	1,00	7,00
	2,83	2,37	1,00	6,70
	2,83	2,30	1,00	6,51
	2,83	2,30	1,00	6,51
	2,83	3,79	1,00	10,72
	2,83	3,64	1,00	10,30
	2,83	1,73	1,00	4,90
	2,83	1,93	1,00	5,45
	2,83	4,15	1,00	11,74
	2,83	2,37	1,00	6,72
	2,83	2,03	1,00	5,74
	2,83	5,48	1,00	15,51
	2,83	0,71	1,00	2,02
	2,83	0,71	1,00	2,02
	2,83	1,77	1,00	5,01
	2,83	0,70	1,00	1,97
	2,83	0,70	1,00	1,97
	2,83	2,05	1,00	5,80
	2,83	1,95	1,00	5,52
	2,83	1,77	1,00	5,01
	2,83	1,87	1,00	5,29
	2,83	0,80	1,00	2,26
PISO 3				
BAÑO 1	2,83	1,92	1,00	5,44
	2,83	1,55	1,00	4,39
	2,83	2,02	1,00	5,71
	2,83	2,82	1,00	7,99
	2,83	2,74	1,00	7,76
	2,83	1,55	1,00	4,39
	2,83	1,84	1,00	5,21
BAÑO 2	2,83	0,68	1,00	1,92
PASAN: 2.952,16			SUBTOTAL	177,48
			TOTAL	3.129,64
