canalización correspondiente al sistema de detección de incendios, seguido del corte y preparación de la tubería EMT de 1/2". Posteriormente se realiza su instalación sobrepuesta en muros, losas o estructuras, fijándola mediante abrazaderas y elementos de anclaje. Se instalan los accesorios de conexión y curvas requeridas, garantizando la continuidad de la canalización. Finalmente se verifica la correcta instalación del sistema para permitir el tendido del cableado del sistema de detección de incendios.

- *N.P.4,7,26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE CU AWG, LSZH N°12 (F) + N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y CONDUCTORES CON CUMPLIMIENTO RETIE (AIRES ACONDICIONADOS):* El proceso consiste en el suministro y tendido de conductores eléctricos de cobre calibre N°12 con aislamiento LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme a los requisitos del RETIE. La actividad inicia con la verificación de la canalización instalada, seguido del tendido de los conductores fase (F) y tierra (T) a través de la tubería EMT mediante guía o sonda pasacables. Posteriormente se realiza la conexión de los conductores en tableros, equipos de aire acondicionado o cajas de paso, garantizando la correcta identificación y ajuste de las terminales. Finalmente se verifica la continuidad, aislamiento y correcta instalación del cableado.

- *N.P.4,7,27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE CU 2XN°18 APANTALLADO DE CONTROL CON CUMPLIMIENTO RETIE (AIRES ACONDICIONADOS):* La actividad comprende el suministro y tendido de cable de control de cobre 2 x N°18 apantallado, utilizado para señales de control del sistema de aire acondicionado. El proceso inicia con la verificación de la canalización eléctrica instalada, seguido del tendido del cable a través de la tubería mediante guía pasacables, evitando tensiones o daños en el aislamiento. Posteriormente se realizan las conexiones en los equipos de control, sensores o tableros, asegurando la correcta conexión del apantallamiento para evitar interferencias electromagnéticas. Finalmente se verifica la continuidad y funcionamiento del circuito de control conforme a las especificaciones del sistema.

6,3 UNIDADES INTERIORES

- *N.P. 6,3,13 INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 8 TR. 220/1/60:* El proceso consiste en la instalación y montaje del equipo en la ubicación definida en planos, mediante soportes metálicos, varillas roscadas o estructuras de suspensión ancladas a la losa o estructura. Posteriormente se realiza la nivelación y fijación del equipo, seguido de la conexión a las tuberías de refrigerante, drenaje de condensados, ductería de aire y alimentación eléctrica, conforme al diseño del sistema VRF. Finalmente se verifica la alineación, fijación y condiciones de operación del equipo.

- *N.P. 6,3,14 INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 6 TR. 220/1/60:* Comprende la ubicación, suspensión y fijación del equipo fancoil oculto en el espacio técnico definido, mediante soportes y elementos de anclaje. Posteriormente se realizan las conexiones a ductería, tuberías de refrigerante,

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

drenaje de condensados y alimentación eléctrica, verificando su correcta alineación, nivelación y condiciones para su operación dentro del sistema de climatización.

- *N.P. 6,3,15 INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 5 TR. 220/1/60:* La actividad consiste en el montaje del equipo mediante sistemas de suspensión o soportes estructurales, seguido de su nivelación y fijación en la posición indicada en planos. Posteriormente se realizan las conexiones a la red de refrigerante, drenaje, ductería y alimentación eléctrica, garantizando su correcta integración al sistema VRF.

- *N.P. 6,3,16 INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 4 TR. 220/1/60:* Se realiza el montaje del equipo en la ubicación definida, mediante sistemas de anclaje y suspensión a la estructura. Posteriormente se ejecutan las conexiones de refrigerante, drenaje de condensados, ductería y alimentación eléctrica, verificando la correcta fijación y nivelación del equipo.

- *N.P, 6,3,17 INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 3 TR. 220/1/60:* Comprende la instalación del equipo mediante soportes o varillas roscadas ancladas a la estructura, seguido de la nivelación y ajuste del equipo. Posteriormente se realizan las conexiones de refrigerante, drenaje, ductería y alimentación eléctrica, conforme al diseño del sistema.

- *N.P 6,3,18 INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 2.5 TR. 220/1/60:* Incluye el montaje del equipo en la ubicación definida, mediante sistemas de suspensión y fijación estructural, seguido de la conexión a las redes de refrigerante, drenaje de condensados, ductos de aire y alimentación eléctrica, garantizando su correcta instalación.

- *N.P. 6,3,19 INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 2 TR. 220/1/60:* La actividad comprende la instalación del equipo mediante soportes metálicos o varillas roscadas, seguido de la conexión a las redes de refrigerante, drenaje de condensados, ductería y alimentación eléctrica, asegurando su correcta alineación y fijación.

- *N.P. 6,3,20 INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 1.5 TR. 220/1/60:* Consiste en el montaje del equipo en la ubicación indicada en planos, mediante sistemas de anclaje y suspensión a la estructura, seguido de la conexión a tuberías de refrigerante, drenaje, ductería y alimentación eléctrica, verificando su correcta instalación.

- *N.P. 6,3,23 INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 1.5 TR. 220/1/60:* El proceso comprende el montaje del equipo tipo cassette en el espacio previsto del cielo raso, mediante sistemas de suspensión y anclaje a la losa o estructura. Posteriormente se realizan las conexiones de refrigerante,

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

drenaje de condensados y alimentación eléctrica, finalizando con la instalación del panel decorativo y verificación del correcto funcionamiento del equipo.

- *N.P. 6,3,25 INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO PARED DE 0.75 TR. 220/1/60:* Consiste en la instalación del soporte metálico en el muro, seguido del montaje y fijación de la unidad interior sobre el soporte. Posteriormente se realizan las conexiones a las tuberías de refrigerante, drenaje de condensados y alimentación eléctrica, verificando su correcta fijación y funcionamiento.

6,7 DUCTERIA

- *N.P.6,7,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO CON SISTEMA DE UNION ESPECIFICO:* La actividad consiste en el suministro e instalación de conductos en poliisocianurato, material aislante de alta eficiencia térmica y resistencia mecánica, utilizando un sistema de unión específico que garantiza hermeticidad y continuidad en la red de aire acondicionado; se realizó la recepción y verificación de los paneles de poliisocianurato conforme a las especificaciones técnicas, el corte y conformado de los tramos de ductería según planos de climatización, la aplicación del sistema de unión con adhesivos y accesorios especializados para asegurar un sellado adecuado, y el montaje de los conductos en las rutas definidas con soportes metálicos y fijaciones que garantizan estabilidad y alineación; finalmente se verificó la correcta instalación y funcionalidad del sistema, cumpliendo con las normas técnicas vigentes para instalaciones de aire acondicionado eficientes y seguras.

- *N.P.6,7,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 RECUBRIMIENTO Z120:* El proceso inicia con el replanteo del recorrido de la red de refrigerante según los planos del sistema de climatización. Posteriormente se realiza el corte, limpieza y preparación de la tubería de cobre tipo K, seguido de la unión mediante soldadura fuerte o conexiones mecánicas según especificación. Las tuberías se instalan sobre soportes o abrazaderas metálicas ancladas a la estructura, garantizando su correcta alineación. Finalmente se procede a la instalación del aislamiento térmico de celda cerrada para evitar pérdidas de temperatura y condensación, verificando la continuidad del aislamiento y la hermeticidad de las conexiones.

6.8 TUBERIA DE AGUA FRIA

(El proceso constructivo es el mismo para todos los diámetros, variando únicamente el tamaño de la tubería)

El proceso inicia con el replanteo del recorrido de la red de refrigerante según los planos del sistema de climatización. Posteriormente se realiza el corte, limpieza y preparación de la tubería de cobre tipo K, seguido de la unión mediante soldadura fuerte o conexiones mecánicas según especificación. Las tuberías se instalan sobre soportes o abrazaderas metálicas ancladas a la estructura, garantizando su correcta alineación. Finalmente se procede a la instalación del

aislamiento térmico de celda cerrada para evitar pérdidas de temperatura y condensación, verificando la continuidad del aislamiento y la hermeticidad de las conexiones *(Aplica para diámetros: 1-5/8", 1-3/8", 1-1/8", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 1/4").*

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1-5/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1-3/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1-1/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 7/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 3/4" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 5/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1/2" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 3/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1/4" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA

6.9 ACCESORIOS TUBERIAS

- *N.P 6,9,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y-BRANCH PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO K UNIDADES INTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA:* Consiste en la instalación de derivaciones en la tubería de cobre por medio de accesorios tipo Y-Branch. Posteriormente se realizan las conexiones a las tuberías de refrigerante, drenaje de condensados y alimentación eléctrica, verificando su correcta fijación y funcionamiento.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

1. ESTRUCTURAS DE CONCRETO

- RESISTENCIA MEZCLA DE CONCRETO LABORATORIO

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia de la mezcla de concreto a 4,7 y 28 días.

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
COLUMNAS CONFINAMIENTO MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 5	25/11/2025	NSR-10
COLUMNAS CONFINAMIENTO MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO 5	28/11/2025	NSR-10
VIGAS CONFINAMIENTO MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO	3/12/2025	NSR-10
VIGAS CONFINAMIENTO MAMPOSTERÍA INTERIOR PISO	6/12/2025	NSR-10
SOLADOS TANQUE; 1ER ANILLO CAISSON POZO EYECTOR SÓTANO	9/12/2025	NSR-10
1ER ANILLO CAISSON POZO EYECTOR SÓTANO	10/12/2025	NSR-10
2DO ANILLO CAISSON POZO EYECTOR SÓTANO	11/12/2025	NSR-10
3ER ANILLO CAISSON POZO EYECTOR SÓTANO, SOLADOS TANQUE	27/11/2025	NSR-10
3ER ANILLO CAISSON POZO EYECTOR SÓTANO, SOLADOS TANQUE	18/12/2025	NSR-10
VIGA MÉNSULA TRAMO EJE 1 ENTRE B-F Y RELLENO DE COLUMNAS METÁLICAS ZONA PLATAFORMA	2/12/2025	NSR-10
2DO ANILLO CAISSON POZO EYECTOR TANQUE; RELLENO DE COLUMNAS METÁLICAS	3/12/2025	NSR-10
3ER ANILLO CAISSON POZO EYECTOR TANQUE; 5TO ANILLO CAISSON POZO EYECTOR SÓTANO	5/12/2025	NSR-10
VIGA MÉNSULA TRAMO EJE 1 ENTRE F-I Y UN MOCHITO EN EJE 8	6/12/2025	NSR-10
4TO ANILLO CAISSON POZO EYECTOR TANQUE; CAJAS DE INSPECCIÓN SÓTANO	11/12/2025	NSR-10
PLACA CONTRAPISO POZO EYECTOR SÓTANO; PLACA STEELDECK 2DO PISO PLATAFORMA EJES F-I; CAJAS DE INSPECCIÓN SÓTANO	12/12/2025	NSR-10
PLACA STEELDECK 2DO PISO PLATAFORMA EJES F-I (5-8); 5TO ANILLO CAISSON POZO	17/12/2025	NSR-10

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
EYECTOR TANQUE; CAJAS DE INSPECCIÓN SÓTANO		
PLACA CONTRAPISO CUARTO TECNICO DE BOMBAS TANQUE 1ER TRAMO; PLACA STEELDECK N+37.4 ZONA DE ASCENSORES ENTRE EJES 1-2 Y 7-8; REMATES SOBREPISO 1	5/02/2026	NSR-10
VIGA MENSULA EJE I ENTRE 1-6	7/02/2026	NSR-10
MURO DE POZO EYECTOR SOTANO 2DO TRAMO; SOBREPISO REMATES	10/02/2026	NSR-10
MUROS TANQUE RCI ALTURA 4.58m; VIGA MENSULA EJE DE 6 A 7 Y ZONA DE CURVA	13/02/2026	NSR-10
MURO INTERNO POZO EYECTOR TANQUE COMPLETO; SOBREPISO PISO 1 RE	17/02/2026	NSR-10
PLACA CONTRAPISO TANQUE AGUA POTABLE CON CARCAMO MUROS ALTURA DE 1.2M	20/02/2026	NSR-10
MUROS LATERALES CUARTO TECNICO DE BOMBAS Y TANQUE AGUA POTABLE H=2.30m; PUNTALES TIPO 4 ACCESO ESCALERAS EJE 8	20/02/2026	NSR-10
PLACA CONTRAPISO CUARTO TECNICO DE BOMBAS TANQUE 1ER TRAMO; PLACA STEELDECK N+37.4 ZONA DE ASCENSORES ENTRE EJES 1-2 Y 7-8; REMATES SOBREPISO 1	26/02/2026	NSR-10
VIGA MENSULA EJE I ENTRE 1-6	28/02/2026	NSR-10
MUROS TANQUE RCI ALTURA 4.58m; VIGA MENSULA EJE DE 6 A 7 Y ZONA DE CURVA	6/03/2026	NSR-10
MUROS LATERALES CUARTO TECNICO DE BOMBAS Y TANQUE AGUA POTABLE H=2.30m; PUNTALES TIPO 4 ACCESO ESCALERAS EJE 8	13/03/2026	NSR-10
MUROS LATERALES CUARTO TECNICO DE BOMBAS Y TANQUE AGUA POTABLE H=COMPLETO; VIGAS (VE-1 Y VE-2) ACCESO ESCALERAS EJE 8	20/03/2026	NSR-10
SUBESTACION CIMENTACION 1RA ETAPA A NIVEL +2.35, jardinera de muros en zona de matera	5/03/2026	NSR-10
COLUMNAS SUBESTACION EJE A-3 Y A-3'; VIGA MENSULA PARA ACCESO EJE 8 ENTRE F-G	11/03/2026	NSR-10
DOVELAS EJE B ENTRE 7-8 NIVEL 6TO PISO	13/03/2026	NSR-10

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
COLUMNAS CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1	16/03/2026	NSR-10
PLACA SUBESTASCION ENTRE 3'-3 A-B; ESCALERAS ACCESO EJE 8 Y SOBREPISO EJE 8; PLACA CONTRAPISO CUARTO TECNICO SOTANO	19/03/2026	NSR-10

- PLANTA – GRAVICON

Por parte del proveedor se realiza control en planta de resistencia del material despachado a la obra, cuya relación se presenta en la siguiente tabla.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días.	7/12/2025	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días.	11/12/2025	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días.	8/12/2025	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días.	12/12/2025	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días.	13/12/2025	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días.	17/12/2025	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días.	19/12/2025	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días.	9/02/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días.	13/02/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días.	16/02/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días.	20/02/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días.	23/02/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días.	7/03/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días.	11/03/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días.	12/03/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días.	16/03/2026	NSR-10

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 4 días.	16/03/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días.	19/03/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 4 días.	24/03/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días.	27/03/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días.	27/03/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días.	31/03/2026	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 4 días.	30/03/2026	NSR-10

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/12/2025 al 31/03/2026	Documentación en campo	Revisión de pre operacionales y permisos de trabajo
01/12/2025 al 31/03/2026	Elementos de protección personal	Entrega de los elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades de obra.
01/12/2025 al 31/03/2026	Gestión ambiental y sanitaria	Orden y aseo
01/12/2025 al 31/03/2026	Medicina preventiva	Desarrollo de programas preventivos a evitar enfermedades profesionales
01/12/2025 al 31/03/2026	Gestión del peligro	Aseguramiento de los trabajos críticos
01/12/2025 al 31/03/2026	Señalización	Señalización e instalación de señales preventivas e informativas
01/12/2025 al 31/03/2026	Trabajo en alturas	De trabajo prioritarios alturas, confinados y cargas.
01/12/2025 al 31/03/2026	Preparación y respuestas ante emergencias	Establecer rutas de evacuación, puntos de encuentro y socializarlos con la población trabajadora.

Anexo: Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4454

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Cumplimiento de los requisitos legales.	01/12/2025 al 31/03/2026	Suministro de concreto por parte de la empresa Gravicon
Cumplimiento de los requisitos legales.	01/12/2025 al 31/03/2026	Suministro de Acero sismo resistente corrugado por la empresa Grupo Siderúrgico Reyna.
Cumplimiento de los requisitos legales.	01/12/2025 al 31/03/2026	Mantenimiento baños portátiles con la empresa Soluciones Integrales de América S.A.S
Cumplimiento de los requisitos legales.	01/12/2025 al 31/03/2026	Suministro de ladrillo por parte de la empresa Ladrillera Santafé
Cumplimiento de los requisitos legales.	01/12/2025 al 31/03/2026	Suministro de grava de ½ y arena lavada por parte de la empresa Inversiones el Cóndor de Colombia SAS.
Cumplimiento de los requisitos legales.	01/12/2025 al 31/03/2026	Suministro de mortero seco por parte de la empresa Cemex
Cumplimiento de los requisitos legales.	01/12/2025 al 31/03/2026	Suministro de bloque #4 por parte de la empresa Simet.

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Juan Carlos Rodríguez Sánchez	Director Proyecto	100
Roberto Hernán Hurtado Robledo	Residente de Obra	100
Federico Jaramillo Saakan	Residente SST	100
Juan Manuel Santamaría Castillo	Inspector de Obra	100
José Luis Clavijo Olmos	Arquitecto Residente	100
Jaime Eliseo Buitrago Nova	Especialista Estructural	100
Eduardo Andrés Moreno Gutiérrez	Ingeniero Electricista	50

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planillas de pago correspondientes al mes de diciembre de 2025 N°: 9497555969, 9496124835, 9497556276, 9497303002, 2002958, 6506108, 9497598586, 9497680306, 9497654088, 5244813, 9496843015, 27081823, 6002384256, 9497969659, 5225316, 1078763243, 41528166.

Se presenta planillas de pago correspondientes al mes de enero de 2026 No: 9499333013, 9498822785, 9499286349, 9499245960, 49195843, 9498912628, 9499771345, 9499281465, 9499296503, 48899822, 9499094937, 49080313, 6005756235, 52955769, 63578954, 1078763243, 9501156070.

Se presenta planilla de pago al mes de febrero de 2026 No: 9501156070, 9502306932, 66609177, 9501117619, 9500652242, 9500827258, 203543903, 66304363, 9501366549, 9501484676, 9500978641, 9501095507, 66066199, 9500851378, 9502944516, 67249097, 65904626, 6010021911, 62489154.

Anexo: Formato 112-ECP-FR-021-V01-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	N/A
Empleos directos generados:	
Empleos indirectos generados:	

Nota: En lo referente al componente de **Gestión Social**, se informa que el reporte detallado de los indicadores de empleabilidad, incluyendo la discriminación de **empleos directos e indirectos** generados por el contrato 511 de 2023, se encuentra plenamente documentado en los Informes Mensuales de Obra de diciembre de 2025, así como enero, febrero y marzo de 2026. Toda la información técnica relacionada con el personal vinculado (fichas de ingreso, seguridad social y cumplimiento de mano de obra local) ha sido sometida a revisión y aprobación por parte de la Interventoría en dichos periodos. Por lo tanto, para efectos del trámite del **Acta Parcial de Cobro No. 13**, se remite a los citados informes de gestión como el soporte oficial de la ejecución social, evitando la redundancia de datos en este documento de carácter financiero.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	N/A
Etaria (Edad)	20 a 59 años	
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	
Grupos étnicos	Población Indígena	
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	
Grupos étnicos	Población Raizal	
Género	Masculino	
Género	Femenino	
Población Vulnerable	Desplazados	
Población Vulnerable	Discapacitados	
Población Vulnerable	Víctimas	
Total		

Nota: Se informa que la clasificación demográfica de la mano de obra vinculada al proyecto —la cual incluye la caracterización por género, grupos etarios, niveles de escolaridad y procedencia geográfica (local y nacional)— se encuentra detalladamente relacionada en los anexos de Gestión Social de los Informes Mensuales de Obra correspondientes al periodo diciembre 2025 - marzo 2026. Dado que dicha información técnica y estadística ha sido previamente validada y aprobada por la Interventoría en sus respectivos cortes mensuales, para efectos de la presente Acta Parcial de Cobro No. 13 se remite a los citados documentos de gestión. Lo anterior obedece a la naturaleza ejecutiva de este informe de pago, evitando la duplicidad de la data sociodemográfica que ya reposa en el expediente técnico del contrato.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DÍAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
PRORROGA No. 1 17 de enero de 2025	3 MESES	*Que las mayores cantidades de obra que se generan en los ítems contractuales, la inclusión de ítems no previstos en cada uno de los componentes evaluados, así como la inclusión de equipos para suministro que requieren unos tiempos para su compra y llegada a obra, originan la necesidad de solicitar una prórroga por un plazo de tres (3) meses al plazo contractual inicial para la ejecución correcta de todas las actividades incorporadas mediante esta modificatoria.*	06 folios
PRORROGA No. 2 5 de junio de 2025	4 MESES	*Que en el comité técnico jurídico realizado en la SUBGERENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM, se viabilizo soportado por la argumentación del contratista de obra y la viabilidad jurídica una prórroga de **cuatro (4) meses al plazo contractual** para la ejecución correcta de todas las actividades incorporadas en un PLAN DE CONTINGENCIA SEMANAL, que permita establecer como se propone subsanar el incumplimiento parcial y evitar el incumplimiento total de las obligaciones contractuales con relación al avance, dicho documento es de obligatorio presentación, y cumplimiento como quedo estipulado en el acta técnico jurídica del día 26 de mayo de 2025.*	05 folios
PRORROGA No. 3 8 de octubre de 2025	6 MESES	*Como resultado de los ajustes técnicos implementados en los distintos componentes del proyecto —incluyendo rediseños en los sistemas hidrosanitario, pluvial, contra incendios, eléctrico, de ventilación mecánica (HVAC) y de seguridad humana— se ha generado la necesidad de incorporar mayores cantidades de obra y la inclusión de nuevos ítems no previstos inicialmente. Estas modificaciones, debidamente justificadas y documentadas, implican una adición tanto en valor como en plazo de ejecución. En consecuencia, se solicita una **prórroga de seis (6) meses adicionales** a partir de la actual fecha de terminación contractual, con el fin de garantizar la adecuada finalización de las actividades pendientes, la verificación técnica correspondiente y el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto.*	08 folios
PRORROGA No. 4 10 de abril de 2026	6 MESES	*La prórroga obedece a la necesidad de tiempo para la ejecución de los ajustes técnicos necesarios para*	07 folios

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DÍAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
		culminación adecuada del contrato 511 de 2023, que se establecen en la modificación N°5. • *Ejecución de mayores cantidades.* • *Incorporación de ítems no previstos.* • *Ajustes técnicos que impactaron la programación.* • *Coordinación interdisciplinaria y certificaciones obligatorias.* • *Reubicación y rediseño parcial de sistemas.* *Una vez radicado por el contratista de obra la modificación N°5 y ser revisada por interventoría y supervisión, Las partes concluyen la necesidad de realizar un ajuste al proyecto, el cual contempla:* • *Mayores y menores cantidades de obra.* • *La inclusión de ítems nuevos.* • *Prórroga del contrato de obra e interventoría por un plazo de SEIS (6) meses.* *Se considera pertinente realizar por las partes la modificación No. 05 y Prorroga No. 04, al contrato de obra No. 511 de 2023.*	

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
ADICION No. 1 8 de octubre de 2025	$ 24.417.801.704,00	*Como resultado de los ajustes técnicos implementados en los distintos componentes del proyecto —incluyendo rediseños en los sistemas hidrosanitario, pluvial, contra incendios, eléctrico, de ventilación mecánica (HVAC) y de seguridad humana— se ha generado la necesidad de incorporar mayores cantidades de obra y la inclusión de nuevos ítems no previstos inicialmente. Estas modificaciones, debidamente justificadas y documentadas, implican una adición tanto en valor como en plazo de ejecución.* *Las partes concluyen la necesidad de realizar un ajuste al proyecto, el cual contempla:* • *Mayores y menores cantidades de obra.* • *La inclusión de ítems nuevos.* • *Prórroga del contrato de obra e interventoría por un plazo de seis (6) meses.* *Se considera pertinente realizar por las partes la modificación No. 04, al contrato de obra No. 511 de 2023.*	08 folios

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
ACTA MODIFICATORIA No. 01 30 de abril de 2024	$ 80.389.497.271	*Que en el desarrollo de las labores iniciales de excavación de los sótanos de parqueaderos y confirmación de taludes del proyecto, se requiere contemplar actividades necesarias que generan modificaciones en las cantidades e inclusión de nuevos precios unitarios para llevar a cabo la obra de manera adecuada. Por consiguiente, se hace un balance económico al componente arquitectónico, donde se incluye el transporte y disposición final de material sobrante de la excavación.*	04 folios
ACTA MODIFICATORIA No. 02 12 de septiembre de 2024	$ 80.389.497.271	*Que a través de los diferentes comités de obra realizados durante el desarrollo del proyecto y los ajustes realizados por los consultores, además de los diversos requisitos necesarios para la ejecución correcta de la obra, se ha evidenciado que, se requiere contemplar actividades necesarias que generan modificaciones en las cantidades e inclusión de nuevos precios unitarios para llevar a cabo la obra de manera adecuada. En virtud de lo anterior y acorde con lo planteado por las partes se considera pertinente realizar una modificación de mayores o menores cantidades e ítems no previstos, al contrato de obra No. 511 de 2023.* *1,0 COMPONENTE ARQUITECTONICO* *2,0 COMPONENTE ESTRUCTURAL*	04 folios
ACTA MODIFICATORIA No. 03 17 de enero de 2025	$ 80.389.497.271	*Que a lo largo de los diferentes comités de obra realizados durante la ejecución del contrato, que los ajustes efectuados por los consultores a los diseños, y posteriormente apropiados e implementados, requieren para una correcta ejecución de la obra incluir actividades adicionales que implican modificaciones en las cantidades de obra y la incorporación de nuevos precios unitarios, en los siguientes componentes:* *2,0 COMPONENTE ESTRUCTURAL* *3,0 COMPONENTE HIDRA ULICO E HIDROLOGICO* *4,0 COMPONENTE ELECTRICO* *5,0 COMPONENTE VOZ YDA TOS— CCTV* *6,0 COMPONENTE AIRES ACONDICIONADOS* *7,0 COMPONENTE SUMINISTRO*	06 folios
ACTA MODIFICATORIA No. 04 8 de octubre de 2025	$104.807.298.975,00	*Como resultado de los ajustes técnicos implementados en los distintos componentes del proyecto —incluyendo rediseños en los sistemas hidrosanitario, pluvial, contra incendios, eléctrico, de ventilación mecánica (HVAC) y de seguridad humana— se ha generado la necesidad de incorporar mayores cantidades de obra y la inclusión de nuevos ítems no previstos inicialmente. Estas modificaciones, debidamente justificadas y documentadas, implican una adición tanto en valor como en plazo de ejecución.* *Las partes concluyen la necesidad de realizar un ajuste al proyecto, el cual contempla:* • *Mayores y menores cantidades de obra.* • *La inclusión de ítems nuevos.* • *Prórroga del contrato de obra e interventoría por un plazo de seis (6) meses.*	08 folios

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
		Se considera pertinente realizar por las partes la modificación No. 04, al contrato de obra No. 511 de 2023.	
ACTA MODIFICATORIA No. 05 10 de abril de 2026	$104.807.298.975,00	*La prórroga obedece a la necesidad de tiempo para la ejecución de los ajustes técnicos necesarios para culminación adecuada del contrato 511 de 2023, que se establecen en la modificación N°5.* • *Ejecución de mayores cantidades.* • *Incorporación de ítems no previstos.* • *Ajustes técnicos que impactaron la programación.* • *Coordinación interdisciplinaria y certificaciones obligatorias.* • *Reubicación y rediseño parcial de sistemas.* *Una vez radicado por el contratista de obra la modificación N°5 y ser revisada por interventoría y supervisión, Las partes concluyen la necesidad de realizar un ajuste al proyecto, el cual contempla:* • *Mayores y menores cantidades de obra.* • *La inclusión de ítems nuevos.* • *Prórroga del contrato de obra e interventoría por un plazo de SEIS (6) meses.* *Se considera pertinente realizar por las partes la modificación No. 05 y Prorroga No. 04, al contrato de obra No. 511 de 2023.*	07 folios

2. GARANTÍAS

ACTA DE INCIO (12/12/2023)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100035762**
ANEXO N°	**3**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100009403**
ANEXO N°	**3**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**14/12/2023**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS MUNDIAL**

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	12/12/2023	11/07/2025	$ 8.038.949.727,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/12/2023	11/07/2025	$ 32.155.798.908,80
PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2023	11/03/2028	$ 4.019.474.863,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/03/2030	$ 8.038.949.727,20
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/03/2025	$ 4.019.474.864,00

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ACTA DE MODIFICATORIA No. 01 (30/04/2024)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100035762
ANEXO N°	4
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100009403
ANEXO N°	4
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	31/05/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	12/12/2023	11/07/2025	$ 8.038.949.728,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/12/2023	11/07/2025	$ 32.155.798.909,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2023	11/03/2028	$ 4.019.474.864,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/03/2030	$ 8.038.949.728,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/03/2025	$ 4.019.474.864,00

ACTA DE MODIFICATORIA No. 02 (12/09/2024)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100035762
ANEXO N°	5
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100009403
ANEXO N°	5
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	26/09/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	12/12/2023	11/07/2025	$ 8.038.949.728,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/12/2023	11/07/2025	$ 32.155.798.909,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2023	11/03/2028	$ 4.019.474.864,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/03/2030	$ 8.038.949.728,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/03/2025	$ 4.019.474.864,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ACTA DE MODIFICATORIA No. 03 Y PRORROGA No. 1 (17/01/2025)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100035762
ANEXO N°	6
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100009403
ANEXO N°	6
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	30/01/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	12/12/2023	11/10/2025	$ 8.038.949.728,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/12/2023	11/10/2025	$ 32.155.798.909,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2023	11/06/2028	$ 4.019.474.864,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/06/2030	$ 8.038.949.728,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/06/2025	$ 4.019.474.864,00

CESION DE POSICIÓN CONSORCIAL - RESOLUCION No. 100-37-082 DE 2025 (20/05/2025)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100035762
ANEXO N°	7-8
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100009403
ANEXO N°	7-8
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	13/06/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	12/12/2023	11/10/2025	$ 8.038.949.728,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/12/2023	11/10/2025	$ 32.155.798.909,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2023	11/06/2028	$ 4.019.474.864,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/06/2030	$ 8.038.949.728,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/06/2025	$ 4.019.474.864,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

PRORROGA No. 2 (05/06/2025)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100035762
ANEXO N°	9-10
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100009403
ANEXO N°	9-10
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	13/06/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	12/12/2023	11/02/2026	$ 8.038.949.728,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/12/2023	11/02/2026	$ 32.155.798.909,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2023	11/10/2028	$ 4.019.474.864,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/10/2030	$ 8.038.949.728,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/10/2025	$ 4.019.474.864,00

ACTA DE MODIFICATORIA No. 04, ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 3 (08/10/2025)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100035762
ANEXO N°	11
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100009403
ANEXO N°	11
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20/10/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	12/12/2023	11/08/2026	$ 10.480.729.897,50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/12/2023	11/08/2026	$ 41.922.919.590,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2023	11/04/2029	$ 5.240.364.948,75
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/04/2031	$ 10.480.729.897,50
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/04/2026	$ 5.240.364.948,75

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

25452

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ACTA DE MODIFICATORIA No. 05 Y PRORROGA No. 4 (10/04/2026)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100035762
ANEXO N°	12
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100009403
ANEXO N°	12
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	PENDIENTE APROBACION ENTIDAD
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	12/12/2023	11/02/2027	$ 10.480.729.897,50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/12/2023	11/02/2027	$ 41.922.919.590,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2023	11/10/2029	$ 5.240.364.948,75
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/10/2031	$ 10.480.729.897,50
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/10/2026	$ 5.240.364.948,75

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANT.	1024	23-1-2024		$ 32.155.798.908,40			$ 32.155.798.908,40
1	20524	26-08-2024	4,35%	$ 4.562.199.028,00	$ 1.824.879.611,20	$ 798.384.832,00	$ 34.893.118.325,20
2	27324	01-11-2024	2,26%	$ 2.393.262.856,00	$ 957.305.142,40	$ 418.821.000,00	$ 36.329.076.038,80
3	29724	24-11-2024	1,02%	$ 1.072.219.127,00	$ 428.887.650,80	$ 187.638.350,00	$ 36.972.407.515,00
4	33024	18-12-2024	1,10%	$ 1.156.688.406,00	$ 462.675.362,40	$ 202.420.470,00	$ 37.666.420.558,60
5	3125	21-02-2025	6,44%	$ 6.751.948.714,00	$ 2.700.779.485,60	$ 1.181.591.023,00	$ 41.717.589.787,00
6	7225	04-04-2025	4,55%	$ 4.773.080.687,00	$ 1.909.232.274,80	$ 835.289.122	$ 44.581.438.199,20
7	15025	23-05-2025	5,29%	$ 5.544.779.985,00	$ 2.217.911.994,00	$ 970.336.500	$ 47.908.306.190,20
8	21825	11-07-2025	8,90%	$ 9.329.370.134,00	$ 3.731.748.053,60	$ 1.632.639.775	$ 53.505.928.270,60
9	24725	29-07-2025	6,83%	$ 7.158.626.757,00	$ 2.863.450.702,80	$ 1.252.759.683	$ 57.801.104.324,80
10	30025	25-09-2025	2,66%	$ 2.789.660.215,00	$ 1.115.864.086,00	$ 488.190.535,00	$ 59.474.900.453,80
ANT 1	2230	6-11-2025		$ 9.767.120.681,60			$ 69.242.021.135,40
11	36125	14-11-2025	4,37%	$ 4.576.683.471,00	$ 1.830.673.388,40	$ 800.919.605,00	$ 71.988.031.218,00

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
12	46825	22/12/2025	9,50%	$ 9.951.946.040,00	$ 3.980.778.416,00	$ 1.741.590.557,00	$ 77.959.198.842,00
TOTALES			57,31%	$ 77.959.198.842,00	$ 24.024.186.168,00	$ 10.510.581.452,00	

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *06/12/2025 AL 17/04/2026*

Avance físico ejecutado 63,98% y avance financiero ejecutado 76,17%

2. ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR REPROGRAMADO ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	TOTAL ANTICIPO (MENOS FONSEG 5%)	VALOR EJECUTADO	SALDO
1	PAGO DE SALARIOS Y JORNALES	$ 1.607.789.945,42	$ 964.673.967,25	$ 293.013.620,45	$ 1.257.687.587,70	$ 1.194.803.208,32	$ 595.041.489,14	$ 599.761.719,18
2	MATERIALES Y SUBCONTRATOS DE OBRA	$ 27.332.429.072,14	$ 31.191.124.941,15	$ 9.474.107.061,15	$ 40.665.232.002,30	$ 38.631.970.402,18	$ 34.886.875.907,99	$ 3.745.094.494,61
3	TRANSPORTE	$ 1.607.789.945,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 1.607.789.945,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES		$ 32.155.798.908,40	$ 32.155.798.908,40	$ 9.767.120.681,60	$ 41.922.919.590,00	$ 39.826.773.610,50	$ 35.481.917.397,13	$ 4.344.856.213,79

ÍTEM	COMPROBANTE No.	FECHA COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	5833a	27/02/2024	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$1.460.504.653,00	Materiales y subcontratos de obra.	Anticipo 60% del contrato CE-205147-001
2	9904	1/04/2024	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS NIT: 901.093.535-5	$2.479.979.235,00	Materiales y subcontratos de obra.	Anticipo 40% al contrato de obra No CE-205-147-002
3	10217a	3/04/2024	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$6.763.416.639,19	Materiales y subcontratos de obra.	Anticipo del 60% del contrato CE-205-147-003
4	14585	9/05/2024	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$1.409.947.019,00	Materiales y subcontratos de obra.	Por anticipo del 60% del Otro Si No. 1 Contrato de obra N. CE-205-147-001
5	16165c	22/05/2024	GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS NIT: 900.601.327 - 7	$1.000.000.038,80	Materiales y subcontratos de obra.	Pago factura proforma 56210 - compra de hierro
6	17644	5/06/2024	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$ 867.719.110,76	Materiales y subcontratos de obra.	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-001
7	18355	13/06/2024	PILASTRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION	$ 422.370.554,00	Materiales y subcontratos de obra.	Anticipo del 25% del Contrato de obra No CE-205-147-004

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ÍTEM	COMPROBANTE No.	FECHA COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
			S.A.S. NIT 900.427.040-3			
8	31191	27/09/2024	GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS NIT: 900.601.327 - 7	$ 400.000.000,00	Materiales y subcontratos de obra.	Pago factura proforma 62360 - compra de acero figurado
9	33162	15/10/2024	POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS NIT: 900.276.725	$ 1.658.400.000,00	Materiales y subcontratos de obra.	Anticipo del 30% del contrato CE-205-147-005
10	32723	10/10/24	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS NIT: 901.093.535-5	$ 310.178.546,24	Materiales y subcontratos de obra.	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-002
11	37109	20/11/2024	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS NIT 901.672.134-1	$ 342.270.975,71	Materiales y subcontratos de obra	Anticipo del 30% del contrato CE-205-147-006
12	37297	21/11/2024	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 175.915.825,95	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso corte de obra No. 1 del contrato No CE-205-147-004
13	37520	25/11/2024	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 592.442.255,70	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-003
14	39476	10/12/2024	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$ 129.529.576,41	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-001
15	39460	10/12/2024	GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS NIT: 900.601.327 - 7	$ 400.000.038,00	Materiales y subcontratos de obra	Pago factura proforma 65652 - compra de acero figurado
16	1018	15/01/2025	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 185.105.890,8	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso corte de obra No. 2 del contrato No CE-205-147-004
17	1585	21/01/2025	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$ 57.896.574,4	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-001
18	1667	21/01/2025	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS NIT: 901.093.535-5	$ 228.997.777,79	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-002
19	2526	29/01/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 300.018.408,775	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-003
20	3222	03/02/2025	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS NIT 901.672.134-1	$ 399.316.138,33	Materiales y subcontratos de obra	Segundo anticipo del 35% del contrato CE-205-147-006
21	3203	03/02/2025	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$ 1.314.942.443,00	Materiales y subcontratos de obra	Por anticipo del 60% del Otro Si No. 3 Contrato de obra N. CE-205-147-001

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ÍTEM	COMPROBANTE No.	FECHA COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
22	8372	18/03/2025	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 450.261.344,14	Pago de salarios y jornales	Reembolso nóminas y parafiscales diciembre 2023 a enero 2025
23	5047	19/02/2025	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS NIT: 901.093.535-5	$ 674.866.297,00	Materiales y subcontratos de obra	Anticipo del 60% del contrato CE-205-147-008
24	6429	28/02/2025	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 86.851.396,99	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso corte de obra No. 3 del contrato No CE-205-147-004
25	6715	04/03/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 543.797.756,43	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra No. 3 según contrato CE-205-147-003
26	7041	06/03/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 365.697.506,00	Materiales y subcontratos de obra	Anticipo del 65% del contrato CE-205-147-007
27	8675	20/03/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 375.091.104,68	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-003
28	11369	11/04/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 228.156.162,68	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-003
29	14764	9/05/2025	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS NIT: 901.093.535-5	$ 318.233.112,29	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra No. 3 según contrato CE-205-147-002
30	14025	5/05/2025	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 88.003.430,00	Pago de salarios y jornales	Reembolso nóminas y parafiscales enero 2025 a abril 15 de 2025
31	14827	12/05/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 503.407.538,20	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra No. 6 según contrato CE-205-147-003
32	14802	9/05/2025	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$ 106.859.955,10	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-001
33	15633	16/05/2025	CAPITALAIRES SAS NIT: 900.503.890-2	$ 788.243.552,00	Materiales y subcontratos de obra	Anticipo del contrato No CE-205-147-010 30% componente suministro
34	16063	21/05/2025	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 179.737.142,00	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso corte de obra No. 4 del contrato No CE-205-147-004
35	16360	22/05/2025	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 56.776.715,00	Pago de salarios y jornales	Reembolso nóminas enero 2025 a abril 15/25

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ÍTEM	COMPROBANTE No.	FECHA COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
37	29467	29/08/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 354.111.086,73	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra No. 7 según contrato CE-205-147-003
36	16505	22/05/2025	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS NIT 901.672.134-1	$ 329.069.896,42	Materiales y subcontratos de obra	Tercer anticipo del 35% del contrato CE-205-147-006
38	18741	10/06/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 120.381.039,95	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra No. 1 según contrato CE-205-147-007
39	18769	10/06/2025	CAPITALAIRES SAS NIT: 900.503.890-2	$ 444.532.931,00	Materiales y subcontratos de obra	Anticipo del contrato No CE-205-147-010 30% componente instalación
40	31413	12/09/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 309.709.461,48	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra No. 8 según contrato CE-205-147-003
41	31416	15/09/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 34.543.463,35	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra No. 2 según contrato CE-205-147-007
42	30166	04/09/2025	GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS NIT: 900.601.327 - 7	$ 40.339.732,00	Materiales y subcontratos de obra	Pago factura proforma 77077 - compra de acero figurado
43	30157	04/09/2025	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 51.767.202,00	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso Pago factura 16853 - compra de acero figurado
44	38300	06/11/2025	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 136.108.095,00	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso Pago facturas Grupo Reyna - compra de acero figurado
45	38299	06/11/2025	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 21.542.488,00	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso Pago facturas Grupo Reyna - compra de acero figurado
46	43861	11/12/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 393.328.272,16	Materiales y subcontratos de obra	Pago factura FEIN 1205 - Corte de obra
47	38791	06/11/2025	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$ 284.405.296,00	Materiales y subcontratos de obra	Anticipo otrosi No. 2 contrato CE-205-147-004
48	38788	06/11/2025	CAPITALAIRES SAS NIT: 900.503.890-2	$ 796.046.878,00	Materiales y subcontratos de obra	Anticipo OTROSI No. 1 del contrato No CE-205-147-010
49	40526	18/09/2025	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 264.960.000,00	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso compra ladrillo gran formato
50	41270	25/11/2025	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS NIT: 901.093.535-5	$ 309.960.072,34	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-002

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ÍTEM	COMPROBANTE No.	FECHA COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
51	41310	26/11/2025	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS NIT: 901.093.535-5	$ 176.109.671,70	Materiales y subcontratos de obra	Devolución retegarantía contrato CE-205-147-002
52	41293	22/11/2025	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$ 769.301.185,09	Materiales y subcontratos de obra	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-001
53	41308	26/11/2025	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$ 419.386.356,84	Materiales y subcontratos de obra	Devolución retegarantía contrato CE-205-147-001
54	41331	26/11/2025	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$ 1.252.716.875,00	Materiales y subcontratos de obra	Anticipo del contrato No CE-205-147-012
55	PENDIENTE SOPORTE FIDUCIA	9/12/2025	VENTANAR SAS NIT: 890.207.543	$ 609.212.482,00	Materiales y subcontratos de obra	Anticipo del contrato No CE-205-147-013
56	PENDIENTE SOPORTE FIDUCIA	04/03/2026	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 275.886.811,00	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso anticipo contrato CE-205-147-014
57	PENDIENTE SOPORTE FIDUCIA	04/03/2026	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 121.881.600,00	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso compra ladrillo gran formato
58	PENDIENTE SOPORTE FIDUCIA	04/03/2026	CAPITALAIRES SAS NIT: 900.503.890-2	$ 317.823.634,66	Materiales y subcontratos de obra	Corte de obra No. 3 del contrato No CE-205-147-010
59	PENDIENTE SOPORTE FIDUCIA	04/03/2026	POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS NIT: 900.276.725	$ 1.824.610.869,00	Materiales y subcontratos de obra	Anticipo Otrosí No. 1 del contrato CE-205-147-005
60	PENDIENTE SOPORTE FIDUCIA	18/03/2026	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT: 901.752.517-0	$ 159.250.245,70	Materiales y subcontratos de obra	Reembolso corte No. 1 contrato CE-205-147-012
			TOTAL	**$ 35.481.917.397,13**		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. COMPONENTE ARQUITECTONICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	1303,52 M3	6,81%
1,1,1			
	OBSERVACIONES		
	Localización y replanteo		

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	4,19 M3	2,57%



OBSERVACIONES
Demolición manual de cimiento enterrado, con recolección, trasiego interno y cargue manual del material producto de la demolición.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,2,6	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	53,8 M3	19,80%
			
	OBSERVACIONES		
	Demolición de elemento en concreto ciclópeo mediante herramientas mecánicas menores y retiro del material con trasiego y cargue manual.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,2.12	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	6,00 un	33,33%
			
	OBSERVACIONES		
	Retiro de aparato sanitario existente mediante desconexión de redes hidráulicas y traslado al sitio de almacenamiento o disposición.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

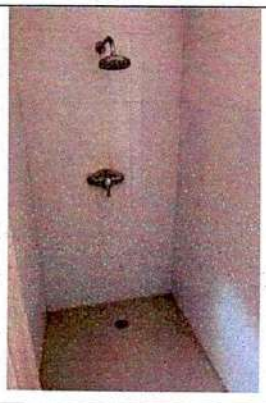
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,2,13	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	72 vj	22,69%
			
	OBSERVACIONES		
	Cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción en sitio autorizado.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,2,14	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS SITIO AUTORIZADO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE KM 18 VIA CAÑOS NEGROS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS)	798 ton	19,46%
			
	OBSERVACIONES		
	Cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción en sitio autorizado.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE ARQUITECTONICO	**EJECUTADO**	**%**
1,2,16	**DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**10,00 un**	**23,81%**
			
	OBSERVACIONES		
	Desmonte de accesorios de ducha y grifería mediante desconexión hidráulica y traslado al punto de acopio.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE ARQUITECTONICO	**EJECUTADO**	**%**
1,2,17	**DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**3,00 un**	**15,79%**
			
	OBSERVACIONES		
	Retiro de lavamanos existente con desconexión de accesorios y traslado al área de almacenamiento o cargue.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.P.P.1,3,4	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	103,20 vj	1,64%
			
	OBSERVACIONES		
	Cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción en sitio autorizado.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.1,3,5	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION SITIO AUTORIZADO (NO INCLUYE TRANSPORTE)	1143,80 ton	1,63%
			
	OBSERVACIONES		
	Disposición final de residuos de excavación en sitio autorizado.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.1,3,7	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	347,39 m3	34,44%
			
	OBSERVACIONES		
	Rellenos rampa vehicular		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 1,4,5	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO GRAN FORMATO COLOR ARENA PARA FACHADAS	481,12 m2	11,41%
			
	OBSERVACIONES		
	Mampostería en ladrillo gran formato color arena para fachada, instalada con mortero y alineación conforme a diseño arquitectónico.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

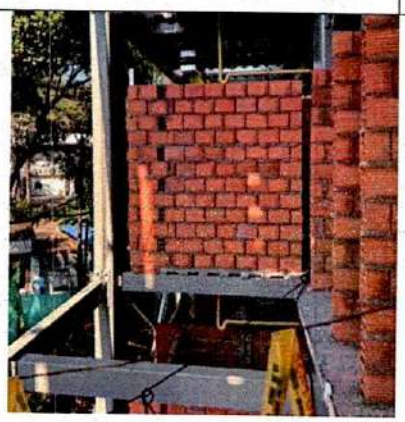
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 1,4,7	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA	2,95 m3	9,36%
			
	OBSERVACIONES		
	Construcción de alfajía en concreto con formaleta, vaciado, acabado a la vista y proceso de curado.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 1,4,9	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	MORTERO TIPO GROUTING PARA DOVELAS EN MURO LADRILLO GRAN FORMATO	904,49 lt	15,91 %
			
	OBSERVACIONES		
	Inyección de mortero tipo grouting en dovelas del muro para confinamiento y refuerzo estructural de la mampostería.		

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

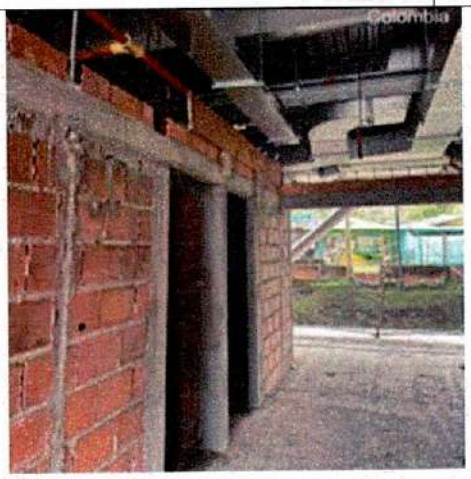
CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
N.P. 1,4,15	RELLENO FLUIDO CEMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA PARA REFUERZO VERTICAL EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL	1280,00 lt	8,29%
	 		
	OBSERVACIONES		
	Se evidencia la aplicación de fluido cementicio en dovelas de muro de ladrillo gran formato, garantizando relleno uniforme, adherencia y cumplimiento de las especificaciones constructivas		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	1191,36 m2	18,55%
			
	OBSERVACIONES		
	Construcción de muro en bloque de concreto Flexa No. 4 asentado con mortero tipo S para conformación de divisiones.		

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,5,2	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	12,08 m3	17,46%
			
	OBSERVACIONES		
	Armado, formaleteado y vaciado de viga aérea en concreto de 3000 PSI. Confinamiento de muros internos.		

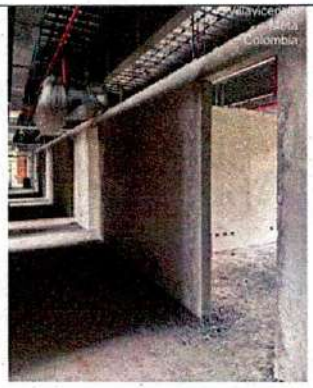
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,5,3	COMPONENTE ARQUITECTONICO	EJECUTADO	%
	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	14,99 m3	10,58%
			
	OBSERVACIONES		
	Armado, formaleteado y vaciado de columna estructural en concreto de 3000 PSI mezclado en obra.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,5,6	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	**EJECUTADO**	**%**
	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	**5495,41 m2**	**40,26%**
			
	OBSERVACIONES		
	Aplicación de pañete en muros interiores con mortero 1:4, incluyendo formación de filos y juntas de dilatación.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,5,8	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	**EJECUTADO**	**%**
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	**3467,71 kg**	**9,35%**
			
	OBSERVACIONES		
	Suministro, figurado, armado y colocación de acero de refuerzo para elementos estructurales según planos.		

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 1,7,11	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	**EJECUTADO**	**%**
	LOSA TIPO SOBREPLACA O PISO FALSO COMPUESTA POR ESTERILLA NO RECUPERABLE, VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO Y PLACA SUPERIOR f'c = 21 Mpa CON ESPESOR DE 5CM.	**241,00 m2**	**11,48%**
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de sistema de entrepiso con viguetas, esterilla no recuperable y vaciado de placa superior de concreto.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 2,3,23	**COMPONENTE ESTRUCTURAL**	**EJECUTADO**	**%**
	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	**8,70 m3**	**2,28%**
			
	OBSERVACIONES		
	Armado de acero, formaleteado y vaciado de concreto estructural para conformación de viga aérea.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 2,3,25	**COMPONENTE ESTRUCTURAL**	**EJECUTADO**	**%**
	LOSA ENTREPISO DE CONCRETO DE 34.5 Mpa (5000 PSI) E=0,10 M CON LAMINA COLABORANTE 2" CAL. 22	**918,25 m2**	**10,17%**
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de lámina colaborante y refuerzo para posterior vaciado de losa estructural de entrepiso.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 2,3,27	**COMPONENTE ESTRUCTURAL**	**EJECUTADO**	**%**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE IGOL DENSO o SIMILAR EN MUROS DE CONTENCIÓN.	**470,24 m2**	**28,95%**
			
	OBSERVACIONES		
	Aplicación de impermeabilizante asfáltico sobre muro de contención para protección contra humedad del terreno.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 2,3,32	COMPONENTE ESTRUCTURAL	EJECUTADO	%
	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (TANQUE SUBTERRANEO)	23,74 m3	54,41%
			
	OBSERVACIONES		
	Fundida placas de contrapiso tanque de almacenamiento		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 2,3,33	COMPONENTE ESTRUCTURAL	EJECUTADO	%
	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (TANQUE SUBTERRANEO)	61,97 m2	40,25%
			
	OBSERVACIONES		
	Construcción de muro estructural en concreto impermeabilizado para conformación de tanque subterráneo.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 2,3,34	COMPONENTE ESTRUCTURAL	EJECUTADO	%
	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (TANQUE SUBTERRANEO)	4,30 m3	14,32%
			
	OBSERVACIONES		
	Vaciado de placa estructural impermeabilizada para entrepiso o cubierta del tanque subterráneo.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 2,3,35	COMPONENTE ESTRUCTURAL	EJECUTADO	%
	SELLO PARA JUNTAS DE PUENTES CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	62,27 ml	42,45%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de cinta flexible de PVC de 22 cm para sellado e impermeabilización de juntas en estructuras, garantizando la continuidad y estanqueidad de la junta estructural.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,1,1	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	373,27 ml	45,91%
			
	OBSERVACIONES		
	Marcación y verificación en campo del trazado y niveles de redes mediante control topográfico.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,2,1	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	20 m3	4,48%
			
	OBSERVACIONES		
	Se evidencian excavaciones manuales para filtros y redes hidrosanitarias		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

25463

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	1.508,40 m3-km	59,30%
NP 3,3,4			
	OBSERVACIONES		
	Traslado interno o externo de materiales desde el punto de acopio hasta el frente de trabajo.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	290,4 ml	51,65%
3,5,1,1			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería sanitaria PVC de 2" para conducción de aguas residuales, con uniones y accesorios según diseño hidráulico.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

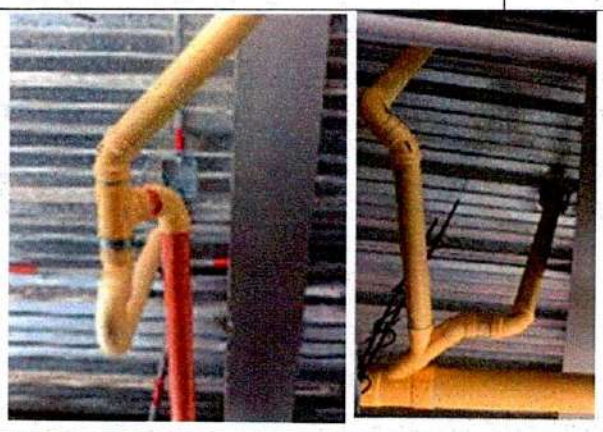
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,5,1,2	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	34,80 ml	31,64%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería sanitaria PVC de 3" para conducción de aguas residuales, con uniones y accesorios según diseño hidráulico.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,5,1,3	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	332,03 ml	53,52%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería sanitaria PVC de 4" para conducción de aguas residuales, con uniones y accesorios según diseño hidráulico.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	**EJECUTADO**	**%**
	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**346 un**	**50,22%**
3,5,1,5			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de accesorios PVC sanitario de 2" para conexión y direccionamiento de la red de evacuación.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	**EJECUTADO**	**%**
	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**39,00 un**	**52,00%**
3,5,1,6			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de accesorios PVC sanitario de 3" para conexión y direccionamiento de la red de evacuación.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,5,1,7	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	311,00 un	59,35%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de accesorios PVC sanitario de 4" para conexión y direccionamiento de la red de evacuación.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,5,1,9	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	96,00 un	51,23%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica para soporte y fijación de tubería.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	**EJECUTADO**	**%**
	ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**6 un**	**10,00%**
3,5,1,10	 		
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica para soporte y fijación de tubería		

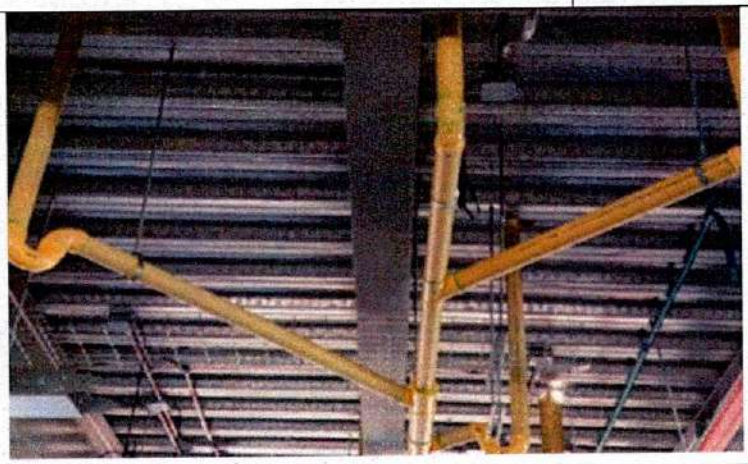
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	**EJECUTADO**	**%**
	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**95 un**	**29,69%**
3,5,1,11	 		
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica para soporte y fijación de tubería		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,5,2,1	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	54,00 un	39,71%
	 		
	OBSERVACIONES		
	Instalación de punto sanitario en tubería PVC de 2" para conexión de lavamanos.		

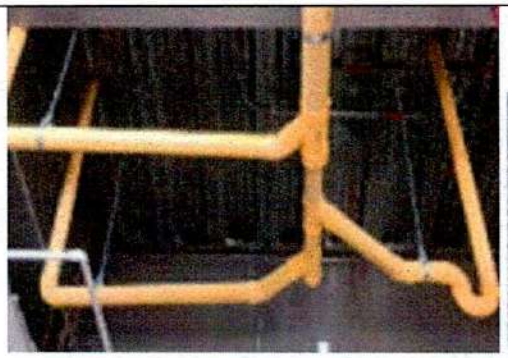
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,5,2,2	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1,00 un	4,17%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de salida sanitaria de 2" para evacuación de aguas en ducha.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	50,00 un	55,56%
3,5,2,3	 		
	OBSERVACIONES		
	Instalación de punto sanitario con sifón de piso en tubería de 2" para drenaje de áreas húmedas.		

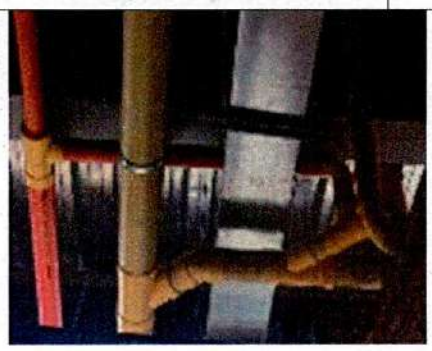
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	5,00 un	20,83%
3,5,2,4	 		
	OBSERVACIONES		
	Instalación de punto sanitario en tubería de 2" para descarga de aguas del lavaplatos.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,5,2,5	**COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO**	**EJECUTADO**	**%**
	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**6,00 un**	**5,88%**
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de salida sanitaria en tubería de 4" para conexión de sanitarios.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,6,1,1	**COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO**	**EJECUTADO**	**%**
	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**86,75 ml**	**43,38%**
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería PVC liviana de 2" para ventilación de aguas residuales en la red sanitaria.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	TUBERÍA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	150,68 ml	42,70%
3,6,1,2			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería PVC liviana de 3" para ventilación de aguas residuales en la red sanitaria.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	80,00 un	55,56%
3,6,1,4			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de accesorios PVC sanitario de 2" para conexión y direccionamiento de la red de evacuación.		

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,6,1,5	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	74,00 un	57,36%
	 		
	OBSERVACIONES		
	Instalación de accesorios PVC sanitario de 3" para conexión y direccionamiento de la red de evacuación.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,6,1,7	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	31 un	38,75%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica de soporte para tubería sanitaria.		

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	79,00 un	66,95%
3,6,1,8			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica de soporte para tubería sanitaria.		

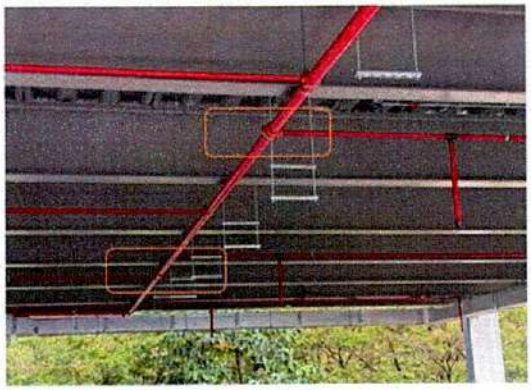
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	7 un	70,00%
3,7,1,15			
	OBSERVACIONES		
	Construcción de cajas de inspección		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

TEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,9,1,16	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	36 un	90,0%
			
	OBSERVACIONES		
	Redes contra incendios		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,9,1,17	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	COUPLING PARA UNION RANURADA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	84 un	43,75%
			
	OBSERVACIONES		
	Redes contra incendios		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

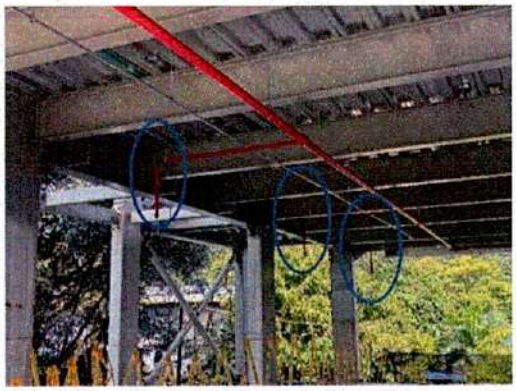
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,9,1,19	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	COUPLING PARA UNION RANURADA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4 un	6,56%
			
	OBSERVACIONES		
	Redes contra incendios		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,9,1,20	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	COUPLING PARA UNION RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	37 un	50,0%
			
	OBSERVACIONES		
	Redes contra incendios		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

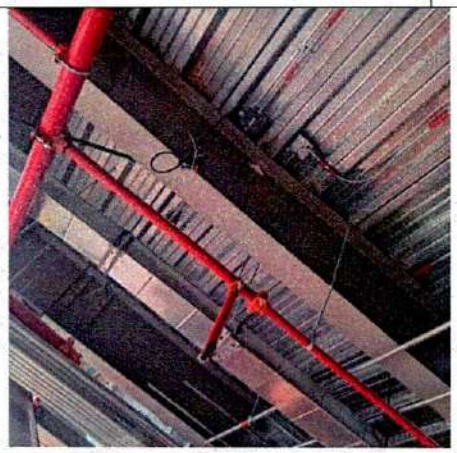
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,9,1,44	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	PUNTO ROCIADOR 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	422 un	48,67%
			
	OBSERVACIONES		
	Redes contra incendios		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,9,1,47	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	466,00 un	66,57%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica de soporte para tubería del sistema contra incendio.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ABRAZADERA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	28,00 un	100,00%
3,9,1,48			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica de soporte para tubería del sistema contra incendio.		

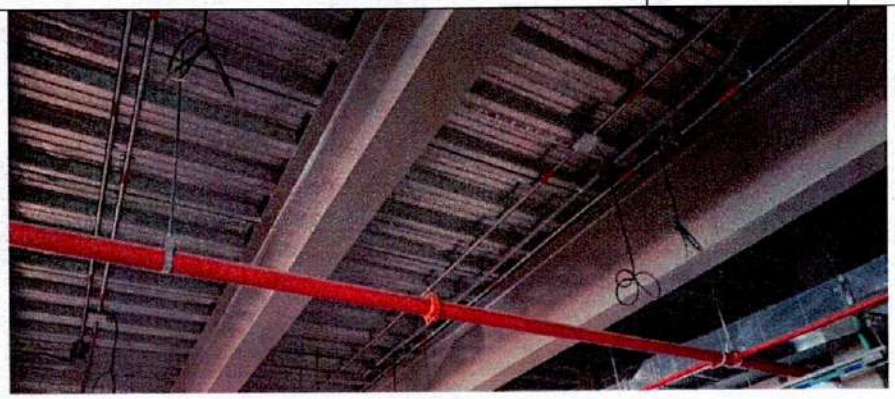
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ABRAZADERA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	57,00 un	100,00%
3,9,1,49			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica de soporte para tubería del sistema contra incendio.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	44,00 un	16,30%
3,9,1,50			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica de soporte para tubería del sistema contra incendio.		

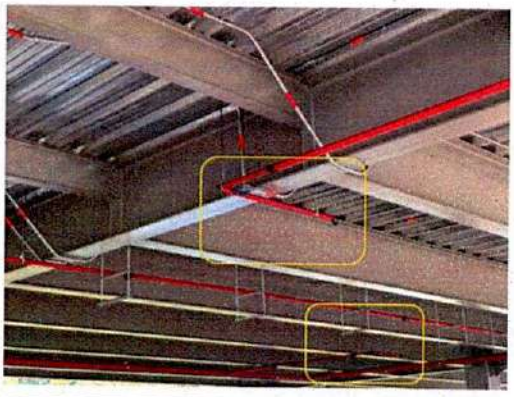
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	37,00 un	27,21%
3,9,1,51			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica de soporte para tubería del sistema contra incendio.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,9,1,52	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	111,00 un	78,72%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de abrazadera metálica de soporte para tubería del sistema contra incendio.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP 3,9,1,60	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 1"	703,61 ml	49,55%
			
	OBSERVACIONES		
	Redes contra incendios		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP 3,9,1,61	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 1 1/4"	77,53 ml	49,15%
			
	OBSERVACIONES		
	Redes contra incendios		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP 3,9,1,62	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 1 1/2"	137,46 ml	66,45%
			
	OBSERVACIONES		
	Redes contra incendios		

GOBERNACIÓN DEL META

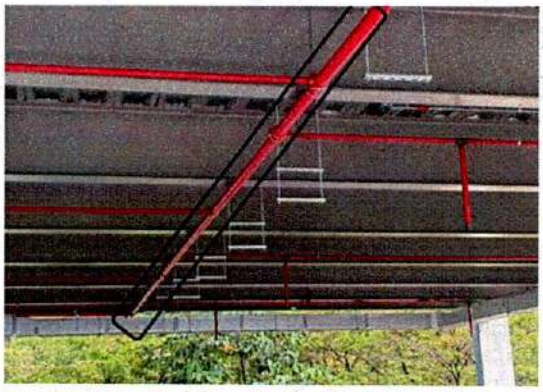
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

28482

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP 3,9,1,63	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 2"	313,70 ml	36,73%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de acero ranurada ASTM A795 para red contra incendio mediante acoples mecánicos.		

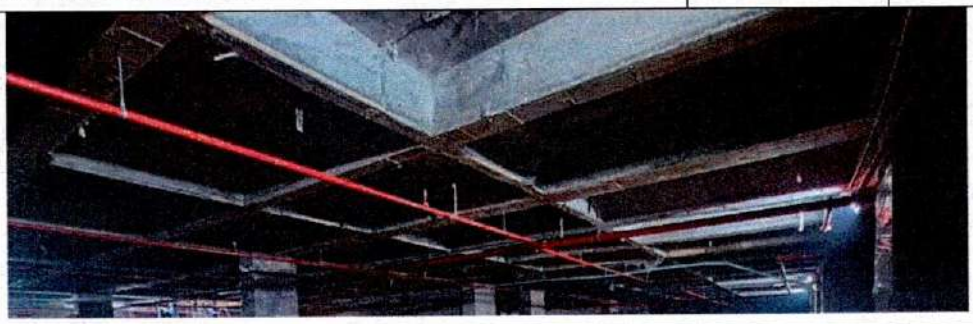
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP 3,9,1,64	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 2 1/2"	33,65 ml	7,42%
			
	OBSERVACIONES		
	Redes contra incendios		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP 3,9,1,65	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 3"	278,80 ml	56,95%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje de tubería de acero ranurada para distribución de red contra incendio.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP 3,9,1,66	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 4"	177,02 ml	34,71%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería principal de red contra incendio con sistema de unión ranurado.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75483

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4,7,10	COMPONENTE ELECTRICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1 1/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	944,00 ml	50,35%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de canalización eléctrica metálica EMT fijada a estructura para conducción de cables.		

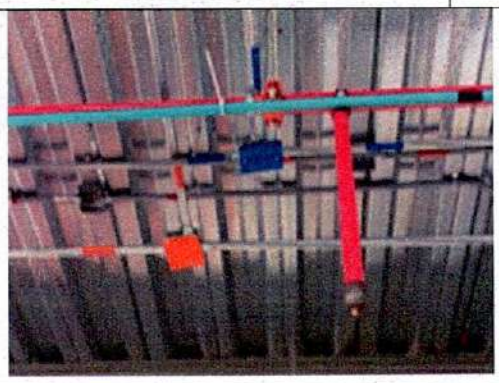
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4,7,12	COMPONENTE ELECTRICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	1219,50	28,98%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje de tubería metálica EMT con accesorios y soportes para canalización eléctrica.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

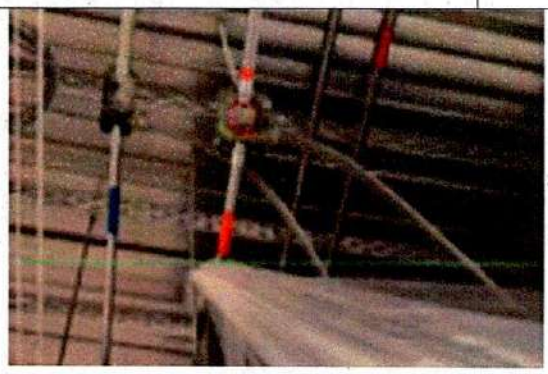
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 4,7,21	COMPONENTE ELECTRICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA EMT DE 1/2" PARA SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS; INCLUYE ABRAZADERAS (AIRES ACONDICIONADOS)	2463,00 ml	51,31%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de canalización EMT para sistema de detección de incendios.		

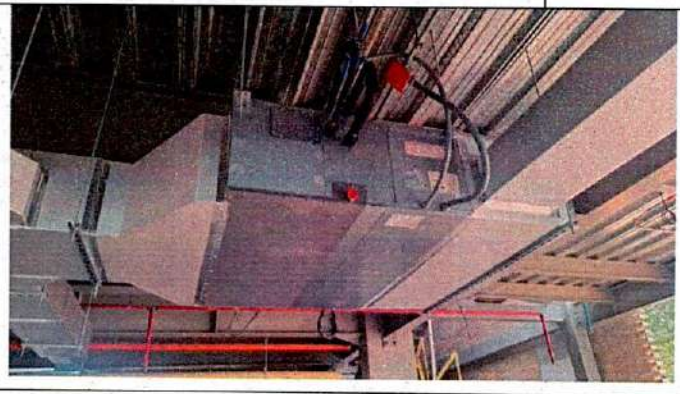
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 4,7,26	COMPONENTE ELECTRICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE CU AWG, LSZH N°12 (F) + N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y CONDUCTORES CON CUMPLIMIENTO RETIE (AIRES ACONDICIONADOS)	7.090,00 ml	74,75%
			
	OBSERVACIONES		
	Tendido de conductores eléctricos libres de halógenos para alimentación de equipos.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 4,7,27	COMPONENTE ELECTRICO	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE CU 2XN°18 APANTALLADO DE CONTROL CON CUMPLIMIENTO RETIE (AIRES ACONDICIONADOS)	1.795,00 ml	37,40%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de cable de control apantallado para señales de equipos de aire acondicionado.		

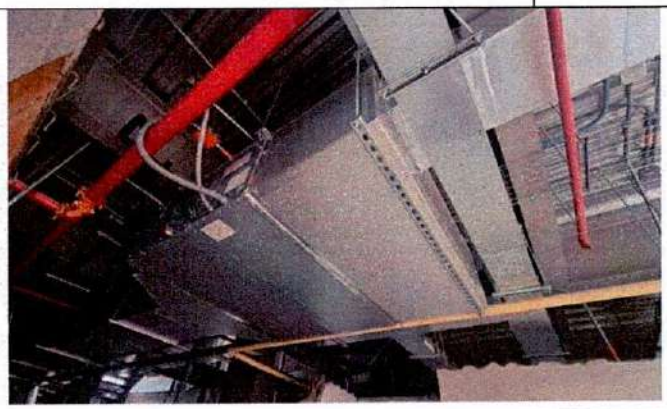
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 6,3,13	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 8 TR. 220/1/60	7,00 un	46,67%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje y fijación de unidad interior tipo fancoil oculto con conexión a redes del sistema de climatización.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

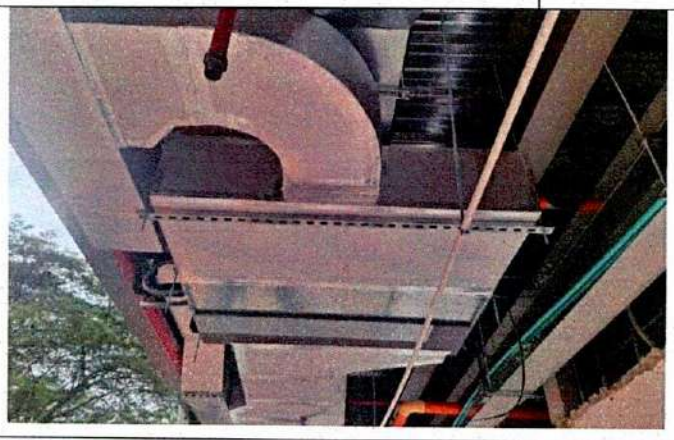
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 6,3,14	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 6 TR. 220/1/60	2,00 un	15,38%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje y fijación de unidad interior tipo fancoil oculto con conexión a redes del sistema de climatización.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 6,3,15	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 5 TR. 220/1/60	2,00	100,00%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje y fijación de unidad interior tipo fancoil oculto con conexión a redes del sistema de climatización.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

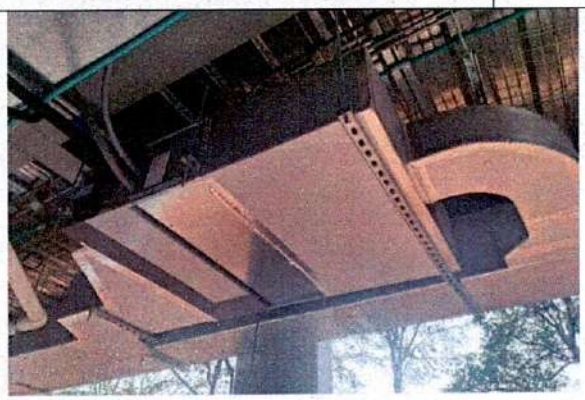
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
N.P. 6,3,16	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 4 TR. 220/1/60	3,00 un	75,00%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje y fijación de unidad interior tipo fancoil oculto con conexión a redes del sistema de climatización.		

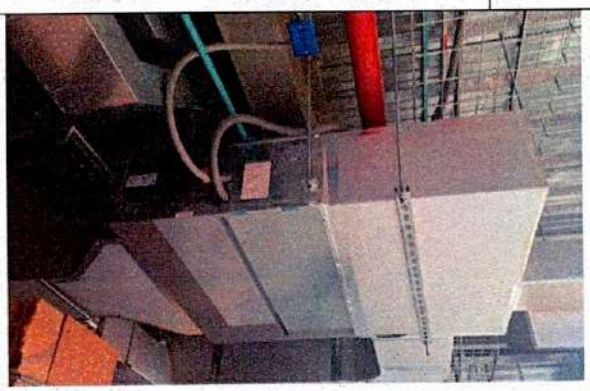
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
N.P. 6,3,17	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 3 TR. 220/1/60	3,00 un	100,00%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje y fijación de unidad interior tipo fancoil oculto con conexión a redes del sistema de climatización.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 6,3,18	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 2.5 TR. 220/1/60	5,00 un	71,43%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje y fijación de unidad interior tipo fancoil oculto con conexión a redes del sistema de climatización.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 6,3,19	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 2 TR. 220/1/60	1,00 un	100,00%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje y fijación de unidad interior tipo fancoil oculto con conexión a redes del sistema de climatización.		

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

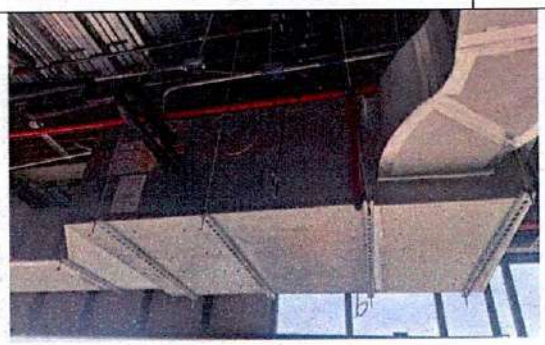
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 6,3,20	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL OCULTO DE 1.5 TR. 220/1/60	3,00 un	50,00%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje y fijación de unidad interior tipo fancoil oculto con conexión a redes del sistema de climatización.		

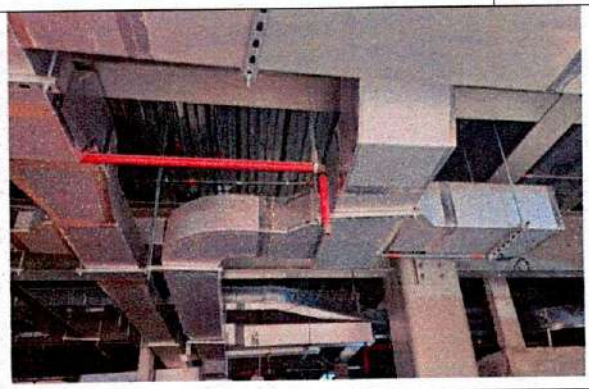
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 6,3,23	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 1.5 TR. 220/1/60	1,00 un	50,00%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de unidad interior tipo cassette suspendida en cielo raso.		

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P. 6,3,25	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO PARED DE 0.75 TR. 220/1/60	2,00 un	40,00%
			
	OBSERVACIONES		
	Montaje de unidad interior tipo pared con conexión a sistema VRF.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,7,5	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO CON SISTEMA DE UNION ESPECIFICO	1125,57 m2	29,12%
			
	OBSERVACIONES		
	Fabricación e instalación de ductos aislados para distribución de aire acondicionado.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4548

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,7,6	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 RECUBRIMIENTO Z120	358,15 m2	23,41%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de ductería metálica galvanizada para conducción de aire del sistema HVAC.		

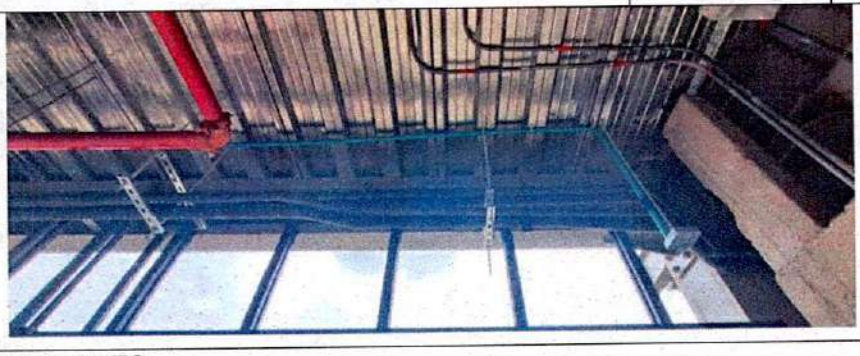
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,8,10	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1-5/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	25,56 ml	16,18%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de cobre para transporte de refrigerante con aislamiento térmico de celda cerrada.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,8,11	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1-3/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	20,48 ml	13,08%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de cobre para transporte de refrigerante con aislamiento térmico de celda cerrada.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,8,12	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1-1/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	58,51 ml	20,92%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de cobre para transporte de refrigerante con aislamiento térmico de celda cerrada.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,8,13	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 7/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	64,05 ml	19,66%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de cobre para transporte de refrigerante con aislamiento térmico de celda cerrada.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,8,14	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 3/4" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	91,83 ml	18,52%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de cobre para transporte de refrigerante con aislamiento térmico de celda cerrada.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,8,15	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 5/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	97,71 ml	30,17%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de cobre para transporte de refrigerante con aislamiento térmico de celda cerrada.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,8,16	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1/2" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	48,26 ml	18,34%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de cobre para transporte de refrigerante con aislamiento térmico de celda cerrada.		

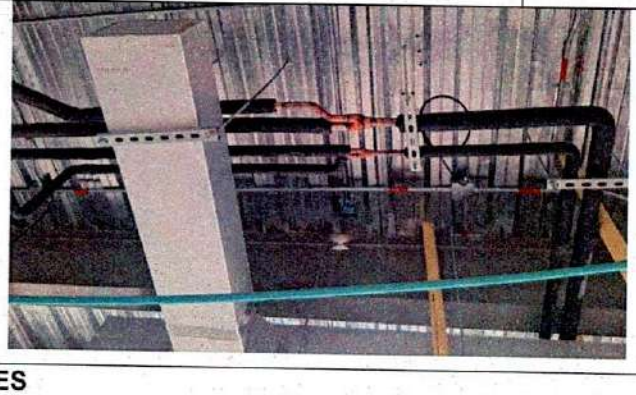
GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,8,17	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 3/8" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	165,02 ml	25,30%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de cobre para transporte de refrigerante con aislamiento térmico de celda cerrada.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6,8,18	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1/4" CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	32,28 ml	19,89%
			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de cobre para transporte de refrigerante con aislamiento térmico de celda cerrada.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y-BRANCH PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO K UNIDADES INTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE CELDA CERRADA	27,00 ml	36,99%
N.P.6,9,9			
	OBSERVACIONES		
	Instalación de tubería de cobre para transporte de refrigerante con aislamiento térmico de celda cerrada.		

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El avance de obra, para la fecha de la presente parcial, es del 2,99%, que corresponden a TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS MCTE ($ 3.128.837.301,00).

- El acta parcial de obra No. 13, corresponde a las actividades realizadas desde el 6 de diciembre de 2025 al 17 de abril de 2026, las cuales se encuentran descritas en el Anexo 1 del presente informe.
- Como soportes de las actividades realizadas y contempladas en la presente Acta de Pago Parcial No. 13, se elaboraron memorias de cálculo de cantidades donde se corroboran la ejecución de las mismas, debidamente contabilizadas y avaladas por la interventoría.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 13

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Memorias de cálculo de cantidades y registro fotográfico detallado. (Se anexa de acuerdo a la lista de chequeo)
- Copia de la bitácora de la obra. (Se anexa de acuerdo a la lista de chequeo)
- Anexo Seguimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Se anexa de acuerdo a la lista de chequeo)
- Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social. (Se anexa de acuerdo a la lista de chequeo)
- Anexo ensayos y resultados de laboratorio. (Se anexa de acuerdo a la lista de chequeo)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 17 días del mes de abril del 2026.

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25700-62356 CND

Firma

Nombre: ROBERTO HERNÁN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1 de 57

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022

Carrera 38 N. 25-05 Barrio 7 de agosto – Villavicencio
Email: coordinador.hospital@cyg.com.co
Tel. 321-3370874

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	XII	2025	7:10	16:10

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	7					
OFICIAL	26					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	26					
CELADOR	2					
TOPOGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO SISO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.5.2 VIGA AEREA CONCRETO 3.000 PSI MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	VIGUETAS ESCALERAS ACCENTAMIENTO HUECO PISO 6	2.32		
1.5.16 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE ARIOS Y DILATACIONES	M2	PAÑETE MUROS 40 PB	147.29		
1.5.1 MURO EN BLOQUE 10x20x30 MORTERO 1:4	M2	MURO EN BLOQUE FLEJES +4	6.53		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

64022 25493

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	XII	2025	7:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion tuberias, bandeja porta cables, cableado de iluminacion y sensores.
Levante de mamposteria en piso 7°.
Fundida de elementos de confinamiento en piso 5°
Instalacion de tuberia hidraulico, sanitaria y red contra incendio
Trabajo de aires acondicionado en tuberia y ventilacion, pimer nivel en piso 10, instalacion de aceros de refuerzo tanque almacenamiento agua excavacion de foso ejector y tanque almacenamiento agua.
Instalacion de ladrillo gran formato en ejes 1 y 8

TODAS LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CON EL PROPOSITO DE MANTENER LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	XII	2024	7:30	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	7					
OFICIAL	28					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	30					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO 5150						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1:5:2 VIGA DE 3.000 PSI MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	VIGUETAS ELEMENTOS CONFINAMIENTO MUROS 6° PISO	2.37		
1:5:3 COLUMNA EN CONCRETO 3.000 PSI MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	COLUMNETAS ELEMENTOS CONFINAMIENTO MUROS 6° PISO	2.405		
1:5:6 PAÑETE MUROS INTERIOR MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	PAÑETE MUROS 4° PISO	147,27		
NO 1:4:3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO COMUN FACHADA	M2	EJE 8 ENTRE A-H EJE 1 A-H.	4.32		
1:3 1 MURO EN BLOQUE H.E. 0.20x0.10x0.20 MORTERO 1:4	M2	MUROS 1ER PISO Y 7° PISO	6,53		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

64025

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	2	XII	2025	7:10	16:10

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberias bandejas portacable, cableado de iluminacion y sensores. levante de mamposteria en piso 1, Fundida de elementos de confinamiento en piso 6to Instalacion de tuberia hidraulica, sanitaria y red contra incendio Trabajo de Aires Acondicionado en tuberias y ductos, pañete en muros piso 6to, Instalacion Aceros de refuerzo Tanque de Almacenamiento de agua. excavacion en foso Efector. y Tanque de Almacenamiento de agua, Instalacion de ladrillo gran formato en ejg pxp

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

6026 25496

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	XII	2025	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005000331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	7					
OFICIAL	30					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	30					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO 318	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1:5:3 COLUMNA EN CONCRETO 3.000PSI MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCC	M3	COLUMNETAS ALREDEDORES DE CONFIGURACION MUROS 6° PISO	2.41		
NP 2.3.25 LOSA ENTREPISE EN CONCRETO 3.000PSI E=10CM CON LAMINA COLABORANTE	M2	PLACA ENTREPISO 20 PISO EJES 1-4 ENTRE H-L	253.24		
1:5:6 PAÑETE MUROS INTERNOS MORTERO 1:4 INCLUYE PILOS Y DILATACIONES	M2	PAÑETE MUROS PISO 46	147.27		
NP 1:4:5 SUMINISTRO E IMS LADRILLO GRAN FORMATO PACHADA	M2	EJE B A-H EJE 1 A-H	4.92		
1:5:1 MURO EN BLOQUE ZOCLO N°40 0.10X0.20X0.30 MORTERO 1:4	M2	PISO 1 PISO 7	6.53		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DESEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	3	XII	2025	7:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberia, bandeja porta cables, cableado de ILUMINACION Y sensores levante de MAMPOSTERIA en PISO 1, FUNDIDA de elementos de CONFINAMIENTO PISO 60 INSTALACION de TUBERIA HIDRAULICA, SANITA RIA Y red contra INCENDIO, Trabajos en AIRE Acondicionado en TUBERIAS Y DUCTERIAS, PANETE en muros de PISO 4, INSTALACION Aceros de REFUERZO TANQUE de ALMACENA MIENTO de AGUA
INSTALACION de LADRILLO gran FORMATO e/p 1.48
EXCAVACION POZO efectoE Y TANQUE ALMACENA MIENTO de AGUA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional:25202-148783 CND	12
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

25498

610028

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	4				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	6					
OFICIAL	26					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	24					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO S190	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP 2:3:25 LOSA ENTREPISO EN CONCRETO 5.000PSI EN 10CM LAMINA COLABORANTE	M2	Placa entrepiso 2º Piso eje 4-6 entre H-L	253.24		
NP 2:3:29 CONCRETO 3.000 PSI PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCION CONVENCIONAL RELLENO CON MUSSERETA	M3	columnas 1er A 2º Piso eje H-L 1-4	2.04		
1:5:6 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y SALIDAS DE LUZ	M2	Pañete muros 4º Piso	147.27		
NP 1:4:8 SUMINISTRO Y PEGADO LADRILLO HOGAR + FORMALETA	M2	eje 20 - A-H eje 1 - A-H	4.32		
1:5:1 MURO EN BLOQUE TIERRA e=10 0.10x0.20 x0.30 MORTERO 1:4	M2	Piso 1 Piso 7.	6.53		
1:3:2 Viga Aerea concreto 3.000PSI Mezcla en Obra	M3	Piso 5-6.	2.32		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	4	XII	2025	7:0	16:0

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de Tuberias, bandeja porta cable y cableado de Iluminacion y sensores Levante de Mamposteria en piso 1 Fundida de elementos de confinamiento Instalacion Tuberia Hidraulica, Sanitaria y Red contra Incendio Trabajos en Alturas Instalacion de tuberia y ductos Pañete en muros de piso 40, Instalacion de Aceros de Reforzo Tanque de Almacenamiento Agua, Retiro de material de excavacion de Foso Efector, Fundida Base concreto Foso efector, Instalacion Cadillo gran formato ejes 1-4 Reactivacion Malla electrosoldada en placa en 2° Piso ejes 14 - C-F-J

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	5	XII	2023	7:00	15:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	6					
OFICIAL	25					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	23					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO SISO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1:5:6 Pañete muros interiores, acabado 1:4 incluye filos y rallacreciones	M2	Pañete muros 5 4o piso	147,22		
NP 2:3:25 Losa entrepiso en concreto 5.000 psi e=10c incluye formaleta y refuerzo.	M2	Placa entrepiso 2o Piso ejes 6-8 entre H-L	253,24		
NP 1:4:5 Sardinel gran formaleta y fachada	M2	Eje 8 entre A-H eje 1 entre A-H	4.32		
1:5:1 Muro en bloque arcilla NO A 0.110x0.120x0.2 mortero 1:4	M2	Piso 4to Piso 7mo	6,53		
1:5:2 Viga aereo en concreto 3000 mezclado en obra	M3	Piso 6-7	2.32		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75501
64031

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	5	XII	2024	8:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberias, bandeja porta cable. y cableado de iluminacion y sensores
levante en mamposteria en piso 1
Fundida de elementos de confinamiento
Instalacion de tuberia hidraulica, sanitaria y red contra incendio, Trabajo de Aires Acondicionado en tuberias y duc
terias, Pañetes en muros de piso 1, instala
cion de Aceros de Refuerzo tanque de
almacenamiento agua, Retiro de mate
rial de excavacion de foso efector, Fun
dida Anillo cassion tanque
Fundida tramo de Placa de entrepiso 2º piso
ejes 1 A L 4 entre H-J, Instalacion ladrillo
gran formato en ejes 1 y 8, Reactivacion instala
cion malla electrosoldada en placa entrepiso 2 eje H2-8-J

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional:25700-62358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional:25202-146763 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	XII	2025	7:10	16:50

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	6					
OFICIAL	25					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	27					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO S130	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.P 1:4:5 SUMINISTRO E INSTALACION LADRILLO FAMA FACHADAS	M2	EJE 8 ENTRE A-H EJE 1 ENTRE A-H	4.32		
1:5:1 MURO EN BLOQUE FLEKO NOX 0.10X0.20X0.39 MORTERO 1:4	M2	PRIMER PISO 70 M2 L50	6.53		
1:5:2 VIGA ATADO EN CONCRETO 3.000PSI MEZCLA EN OBRA	M3	CONFINAMIENTO EN MUROS 4TO PISO	2.32		
1:5:6 PAÑETE MUROS ENTREPISOS MORTERO 1:4 INCLUYE FIBRAS Y ADITIVOS	M2	PAÑETE MUROS 4° Y 5° PISO	133.86		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

64032
25502

75503

6/023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			OBRA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	XII	2023	7:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

INSTALACION DE TUBERIAS, BANDEJA PORTA CABLE Y CABLEADO DE ILUMINACION Y SENSORES LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN PISO 1, FUNDIDA DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA, SANITARIA Y RED CONTRA INCENDIO TRABAJO DE DIMES ACONDICIONADO EN TUBERIAS Y DUCTERIAS PUNTO ELECTRICO, DEL PISO 2, INSTALACION DE ACEROS DE REFUERZO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, FUNDIDA TRAMO DE PLACA DE ENTREPISO 2° PISO EJES 1-4 ENTRE H-J. INSTALACION LADRILLO GRAS FORMALETA EJES 1 Y 2, INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA EN PLACAS ENTREPISO DE 2° PISO EJES H-L -B-5

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN HACER REFERENCIA A LA RESIDENCIA DE INTERVENTORIA, SOBRE EL OBJETO DE LA FISCALIZACION Y LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	XII	2023	7:00	6:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA*	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MD 1:4:5 SUMINISTRO E INSTALACION LADRILLO GRAN FORMATO	M2	LADRILLO FACHADA EJE B ENTRE A-H Y EJ 1.	4.32		
1:5:1 MURO EN BLOQUE FLEXANO4 D.10X0,12X0,30 MORTERO 1:4	M2	MURO EN PISO 10 Y 70	6.53		
1:5:6 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y ELABORACION	M2	PAÑETE PISO -4 Y 5°	133.86		
1:5:8 ACERO REFUERZO INCLUYE FIGURADO ARMADO Y COLOCACION	kg	CONFINAMIENTO VIGAS TAS 1/90 LUMINETAS PISO 6 Y 7	105.13		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	XII	2024	7:00	4:00

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberia, bandeja porta cable y cableado de Iluminacion y red sonora
Levante de mamposteria en piso 1, fundida de elementos de confinamiento piso 3 & 4 5, instalacion de tuberia hidraulica, sanitaria y gas contra incendio, trabajos de aires acondicionado, instalacion de rejillas y ductos en lamina galvanizada, huecos de piso 4 y 5, instalacion de aceros de refuerzo tanque de almacenamiento agua, colocacion de mallas en placa de entrepiso ejes 5-8 entre H-J piso 2 instalacion de platinas para anclaje de ladrillo gran formato fachadas ejes 8-9 1

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51511 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444498 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	XII	2025	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
JARDINERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP 1:4:5 SUMINISTRO E INSTALACION LADRILLO GRES FORMATO	M2	LADRILLO PASTELERO EJES ENTRE A-H Y EJES ENTRE A-4	4.32		
1:5:1 MURO EN BLOQUE FLEXA #4 0,10X0,20X0,30 MORTERO 1:4	M2	MUROS EN PISO 10 Y 20	6,53		
1:5:6 PAÑETE ENMUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y BOLEADOS	M2	PAÑETE PISO 40 Y 50	133.86		
1:5:16 ACERO DE REFUERZO INCLUYE FIGURADO Y ARMADO	KG	CONFINAMIENTO VIGUETAS Y COLUMNETAS PISO 6° Y 7°	105,13		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	9	2025	7:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberias, bandeja porta cables y cableado de iluminacion y sensores, levante de mamposteria en piso 1 fundidos de escaleras de conf finamiento pisos 6° y 5°
Instalacion de tuberia hidraulica sanitaria y red contra incendio
Trabajos de altura coordinados con uso de arnes y eslingas
Pañete en muros de piso 4°
excavacion cajon tanque almacenamiento
Fundida de placa entre piso eje 5-8 entre A-J piso 2°, Instalacion para tinas para anclaje de ladrillo y mampostaria fachada eje 8, Fundida caja inspeccion en sotano

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados ó otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	XII	2023	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MP 1:4:8 SUMINISTRO E INSTALACION LADRILLO FAROL FACHADA	M2	LADRILLO FACHADA EJE B ENTRE 1-H Y EJE 1 ENTRE A-H.	4.92		
1:5:1 MURO EN BLOQUE. ESPESOR 40,10x0,20x0,20 MORTERO 1:4	M2	MURO EN PISO 1° Y 2°	6,53		
1:5:6 PAÑETE EN MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	PAÑETE PISO 4° Y 5°	133.80		
1:5:8 ACERO DE REFUERZO INCLUYE FIGURADO Y ANCLAJE	KG	CONTINUAMIENTO VIGUETAS VIGUETAS Y SOBRECIMIENTAS PISO 6° Y 7°	104.13		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	XII	2025	7:20	16:30

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberias, bandeja porta cable y cableado de iluminacion y sensores
Levante de mamposteria en piso 1, Fundida de elementos de confinamiento piso 6° y 5°
Instalacion de tuberia hidraulica, sanitaria y red contra incendio
Trabajos de Alves, Acondicionamiento de tuberias y ducterias
Pañete en muros de piso 4°
Instalacion de aceros de refuerzo en Areas de tanque
Instalacion de platinas para anclaje de ladrillo gran formato fachada. eje 8

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-145763 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	XII	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
N.P 1:4:5 SUMINISTRO e instalacion Ladrillo 9 tram FORMATO	M2	ladrillo Fachada ESE 0-A-H Piso 1-A-H	4.32		
1:5:1 MURO EN Bloque N° 0,10x0,20x0,30	M2	MUROS EN PISO 10 Y 7.5	6,53		
1:5:6 Pañete en muros Interiores	M2	Pañete MUROS PISOS 10 Y 5.6	133.84		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	XII	2025	7:0	16:0

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de Tuberias bandejas porta cable y cableado de Iluminacion y sensores Levante de Mamposteria en piso 1, Fundido de elementos de confinamiento piso 4° y 5° Instalacion de Tuberia Hidraulica, Sanitaria y Red contra Incendio
Trabajos de aires Acondicionado en tuberias y ducterias.
Paños en muros de concreto, Instalacion Aceros de Refuerzo en Areas de tanque
Retiro de material sobrante en el sotano
Retiro de material en Area de tanque
Instalacion de platinas para Anclaje de ladrillo gran formato Fachadas ejes 8

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	X11	2025	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005800331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP 1:4:5 Suministro e instalacion ladrillo gran formato	M2	ladrillo Facheado Eje E entre 1-4 y ejes 11-14	4:32		
1:5:1 Muro en Bloque Fibra NO 4 6x10x20A 6mo Mortero 1:4	M2	Muros en Pisos 4° y 7°	6:53		
1:5:6 Pañete en muros interiores, Mortero 1:4 Incluye Pilos y Vallatech	M2	Pañete muros Pisos 4° y 5°	133.8		
1:5:8 Acero de refuerzo Fluctuante Suministro Figurado Amarre	kg	confinamiento Columnetas y columnas Pisos 6° y 7°	105.13		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

64042

7-5512

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

75513.

64043

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	Nov	2024	7:10	16:0

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion Tuberias bandeja portacable y cableado de Iluminacion y sensores levante de Mamposteria en PISO 1 Fundida de elementos de confinamiento PISO 4°PISO Instalacion de tuberia HIDRAULICA, Sanitaria y Red contra Incendio Trabajos de Aires Acondicionado entubado y ductoria en PISO 2 PISO 3 PISO 4 Instalacion de Puertas de Acceso de Refuerzo en Acero, de tanque

LAS OBSERVACIONES CONSIGNADAS EN ESTA BITACORA SON RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR DEL OBJETO DE OBRA CONSTRUCCIÓN QUE LA SUSCRIBE

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	AGO	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1:4:3 (M-P) SUMINISTRO E INSTALACION LADRILLO GRAN FORMATO.	M2	LADRILLO FACHADA EJE B ENTRE A-H Y EJE E ENTRE A-H	4,32		
1:5:1 MURO EN BLOQUE FACHADA P1-U MUROTEXTO P1-U	M2	MUROS EN PISO 1 Y 2	6,53		
1:5:6 PAREDES EN MUROS INTERIORES MUROTEXTO 1:4 INCLUYE PINTURA, EDILIZACIA	M2	PAREDES MUROS PISOS 1 Y 2	133,80		
1:5:18 ACERO REFUERZO INCLUYE SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE	KG	CONFINAMIENTO MUROS PISOS 1 Y 2	105,13		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	XII	2025	7:10	16:10

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de Tuberias, bandejas porta cable cableado de Iluminacion y sensores levante de mamposteria en 1er PISO Fundida de elementos de confinamiento Piso 1 y 2, Instalacion de TUBERIA HIDRAULICA, sanitaria. y Red contra Incendio. Trabajos de AIRES Acondicionados en tuberia PLANTA ALTA, PARETE EJES A-H/2-5 de 4.0 y 3.5 PISO Instalacion de Aceros de refuerzo en Area de TANQUES, RETIRO de MATERIAL PROVENIENTE de excavacion Replanteo de Muro PISO 1 y 2

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444456 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	16	XII	2024	7:30	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META".		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	8					
OFICIAL	30 3					
OPERARIO						
AYUDANTE	27					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO SISO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1:3:3 Relleno con material selecto mixto de río sin piedra de tamaño max 2" Nivelacion compactacion	M3	Eje B entre A-L.	31.25		
NP 1:2:5 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	Transporte a sitio Autorizado zona Norte.	82.01		
1:5:8 Acero de refuerzo incluye suministro figurado y armado, colocacion y amarre	kg	Placa 2° piso ejes H-L entre 1 al 8	248.17		
NP 2:2:3 Suministro e instalacion estructura metalica incluye pintura anticorr.	kg	Tramos Ascensores Eje B.	873.63		
NP 2:3:33 Muro de contencion en concreto 4.000 psi tanque suministro	M3	Borde perimetral para instalar cinta PVC	11.50		
NP 3:9:1:62 Suministro e instalacion de tuberia acero galvanizada 1 1/2	ML	Red contra incendio Piso 6° y 7°	31.36		
NP 3:9:1:65 Suministro e instalacion tub. A.C roscada galvanizada 3"	ML	Red contra incendio Piso 6° y 7°	33.15		
4:7:17 Suministro e instalacion tuberia metalica EMT 3/4 sobre puesta.	ML	Red electrica Piso 6°.	149.10		
NP 4:7:21 Suministro e instalacion tuberia metalica EMT 1/2 Red contra incendio	ML	detector contra incendio Piso 50 y 60	130.47		
NP 4:7:26 Suministro e instalacion sobre cubierta de 12 Tubo de Alojamiento A.A.	ML	Red Aires Acondicionado Piso Piso 50 -	215.45		
NP 4:7:27 Suministro e instalacion cable cu 2 x N°6 Apantallado Belle A.A.	ML	Red Aires Acondicionado Piso Piso 50	100		
NP 6:3:6 Suministro e instalacion conducto en lamina galvanizada cal 24	M2	Ductos Aires Acondicionado	40.93		
NP 6:8:15 Suministro e instalacion tub. conduit tipo E 3/6 con soporte	ML	Red Aires Acondicionado	10.03		
NP 6:8:16 Tuberia cu tipo E 3/6 distanciamiento	ML	Red Aire Acondicionado	13.2		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	XII	2025	7:10	16:10

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberias y cableado de iluminacion y sensores
levante de mamposteria en piso 1, fundida de elementos piso de confinamiento piso 1 y 2, instalacion de tuberia hidraulica, sanitaria y red contra incendio
Trabajo de aires acondicionados instalacion y adecuacion de ductos
Fundida de placa de entrepiso entre ejes 4-5, pañete en muros de piso 4°
Fundida de elementos pesp ejector
Fundida de columnas metalicas restantes
Fundida de caja de inspeccion en sotano

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER CLARAS PARA EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO POR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444498 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146763 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	07	XII	2023	7:30	16:10

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	8					
OFICIAL	30					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	29					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1:5:6 Pañete muros entre Riostes Mortero 1:4 Incluye filos y dilataciones	M2	Piso 40	125.03		
1:5:8 Acero de refuerzo Incluye Suministro figurado Y armado	kg	Pla 20 piso ese H-1 cal 8	248.17		
NP 2:2:3 Suministro e instalacion estructura Metalica Incluye Pintura Poliuret.	kg	zona Ascensores ese 8 entre A-H.	873.63		
NP 2:3:33 Muro contencion en concreto 4000 PSI Incl Impermeabilizado Tongueo	M3	Muro Contencion Area que para Instalacion cisterna PCI	11:50		
NP 3:9:1:60 Suministro e Instalacion Tub. Acero Ranurado 1½	ML	Red contra Incendio Piso 70	81.75		
NP 3:9:1:62 Suministro e Instalacion de Tuberia AC Roja Ranurado 2"	ML	Red contra Incendio Piso 70	51.12		
NP 3:9:1:65 Suministro e Instalacion de Tub. A.C Roja Ranurado 3"	ML	Red contra Incendio Piso 70	33,15		
4:7:17 Suministro e Instalacion Tuberia Metalica Tipo EMT 3/4	ML	Red Electrica Piso 6° Incluye Accesorios de soporte	149.10		
NP 4:7:21 Suministro e Instalacion Tuberia Metalica 1½"	ML	Red Electrica Piso 60 Incluye Accesorios de soporte	20.12		
NP 4:7:26 Suministro e Instalacion cableado No.12 Libre Halogeno	ML	Red Aires Acondicionados Nodos Piso 60	215.45		
NP 4:7:27 Suministro e Instalacion Cableado No.10 Apantallado Aire acondicionado	ML	Red Aires Acondicionados Piso 60	100		
NP 6:7:6 Suministro e Instalacion conducto Lamina Galv.	M2	Red Aire Acond. Ductos	40.93		
NP 6:8:15 Suministro e Instalacion Tuberia Sch 40 con Aislamiento	ML	Red Aire Acondicionado	10.03		
NP 6:8:16 Suministro e Instalacion Tuberia cobre Aislamiento	ML	Red Aire Acondicionado	13.2		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	XII	2025	7:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de TUBERIAS y cableado de Iluminacion y Sensores
Levante de mampostería en PISO 1, Fundido de elementos de confinamiento PISO 1 Y 3, Instalacion de TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA, Trabajos en Alturas ACON operadores
ESTA ACTA DE OBSERVACIONES SE GENERA EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA PARA EL ACCESO DE PERSONAL A OBRAS Y EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA.
Pañete en muros de PISO 3
Trabajos en Aceros de refuerzo para Tanque de Almacenamiento
Levante de ladrillo gran formato en eje 0 y 1 entre A - 1t
Trabajos en Aceros de Refuerzo escalera de Acceso PPal Sobre eje Lentve 5 y 6.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	XII	2023	7:30	14:5

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	8					
OFICIAL	27					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	20					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO 3120	5					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP 1:3:5 Disposicion final material de excavacion SITIO autorizado	TON	Disposicion Material Sitio Autorizado ZOTMIC	82.01		
NP 1:4:9 Muro tipo Shotcrete para ductos en muro ladrillo gran formato	LT	Pañete muros piso 50	25		
1:4:8 Acero de refuerzo incluye suministro, figurado, armado y colocacion	kg	Acero Tanque SUA Tesoreo y RCI	248,17		
NP 2:2:3 Suministro e instalacion estructura metalica incluye pintura poliuretano	kg	Zona Ascensores eje 8 y eje 1	873,63		
NP 2:3:33 Muro de contencion en concreto 4.000 PSI impermeabilizado, suministro e instalacion	M3	Muro Inicial tanque para instalar cinta PVC	11.50		
NP 3:9:1:60 Suministro e instalacion Tuberia A-C RO galvanizado Ø 1"	ML	Red contra incendio piso 7o	81.75		
NP 3:9:1:63 Suministro e instalacion Tuberia A-C RO galvanizado Ø 2"	ML	Red contra incendio piso 7o	51.12		
4:7:10 Instalacion tuberia metalica con soporte sobre puesto	ML	Red electrica tuberia pedestal piso 8	44.5		
NP 4:7:21 Tuberia metalica EMT 1/2 para detection incendio aires acondicionados	ML	Red electrica tuberia metalica EMT 1/2	387		
NP 4:7:210 Suministro e instalacion cable cu 12 AWG THW 12 detection incendio	ML	Red contra incendio	215.45		
NP 4:7:24 Suministro e instalacion cable cu 2x14 AWG apantallado aires acondicionados	ML	Red Aire Acondicionado Piso 8	100		
NP 6:7:6 Suministro e instalacion conductor alimentacion	MZ	Ductos Aire Acondicionado Piso 8	40.93		
NP 6:7:14 Tuberia cobre tipo K 3/4" con aislamiento	ML	Instalacion electrica	10.82		
NP 6:9:19 Suministro e instalacion de Y branch para tuberia cobre tipo K diametros intermedios	UN	Instalacion electrica	144.33		

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

75521

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	XII	2024	7:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberias y cableado de iluminacion y sensores.
levante de mamposteria en PISO 1, fundida de elementos de confinamiento PISO 1 y 3
INSTALACION de tuberia HIDRAULICA, SANITARIA Y RED CONTRA INCENDIO
[illegible]
y divisiones
PAÑETE en muros de PISO 3° AREAS HUMEDAS
levante de ladrillo gran FORMATO en ejes 8 y 1 entre A y H.
Trabajos de Aceros de refuerzo escalera de Acceso PRINCIPAL sobre eje 2 entre 5 y 6

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62355 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444498 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

64052

7552

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	19	XII	2025	7:10	16:50

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	7					
OFICIAL	25					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	21					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO SISO	4					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NO 1:4:9 MAMPOSTERIA TIPO ESTRUCTURAL PARA BOVEDAS EN MURO LADRILLO GRANPORTATO	LT	MAMPOSTERIA FACHADA GRANPORTATO	25		
1:5:6 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE ANCLAJES Y DILATACIONES	M2	PAÑETE MUROS PISO 40	125.03		
1:5:10 ACERO REFUERZO INCLUYE SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO	kg	ACERO TANQUE SUMINISTRO Y REI	248.17		
NP 2:2:3 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	kg	EJE 80 Y 1 CONE ASCENSORES	873.63		
NP 2:3:35 SELLO PARA JUNTAS DE DILATACION Y PARA CINTA FLEXIBLE PVC.	ML	CINTA PVC MUROS TANQUE SUMINISTRO AGUA Y TEST	9:54		
3:9:1:44 ANILLO SELLADOR SUMINISTRO E INSTALACION	UN	RED CONTRA INCENDIO	46		
NP 3:9:1:62 SUMINISTRO TUBERIA PVC PARA ENTERRADO 4" 1/2	ML	RED CONTRA INCENDIO	31.36		
4:7:12 INSTALACION TUBERIA METALICA EMT 3/4 SOBRE MUROS	ML	RED ELECTRICA Estudiantes 6	149.10		
NP 4:7:21 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA METALICA EMT DE 1" SISTEMA DETECCION INCEN	ML	RED ELECTRICA 80 INSTALACION ELECTRICA DETECCION INCENDIO	30.42		
NP 4:7:26 SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO AWG 12 SISTEMA DETECCION INCENDIO	ML	INSTALACION ELECTRICA DETECCION INCENDIO	215.45		
NP 4:7:27 SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO 2X4 AWG APANTALLADO	ML	CABLE ELECTRICO PARA RED AIRE ACONDICIONADO	100		
NP 5:7:6 SUMINISTRO CANALETA GALVANIZADA 20X12	M2	DUCTERIA AIRE ACON DISTRIBUCION	40.93		
NP 6:10:14 TUB. COBRE TIPO L 3/4 CON AISLAMIENTO TERM	ML	RED AIRE ACONDICIONADO MUCHO	10.82		
NP 6:10:17 TUBERIA COBRE TIPO L 3/8 CON AISLAMIENTO	ML	RED AIRE ACONDICIONADO	119.40		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

64053 25523

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	XII	2024	7:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberia y cableado de Iluminacion y sensores
levante de mamposteria en piso 1, Fundida de elementos de confinamiento piso 1 y 2, Instalacion de tuberia Hidraulica Sanitaria Trabajos de Aires Acondicionados en tuberia y ductoria.
PARA LOS DESEMBARQUES DEBERÁ HABER LA PRESENCIA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA CON EL OBJETO DE SER NOTIFICADO DE LA CONSIGNACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Levante de muro 3 pisos Terminados
levante de ladrillo gran formato en ejes entre A-H, Instalacion de platinas en eje 1 entre A-H.
Trabajos en Acero de refuerzo escaleras de Acceso Principal sobre ejes entre 5-6
Fundida Placa tanque de Almacenamiento RCI y Pozo eyector

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-82358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-148783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	XII	2025	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	8					
OFICIAL	25					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	23					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO S130	5					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1:3:3 Relleno MATERIAL MATO RIO S/N PROCESAR TOM. MAXIMO 21	M3	Relleno este se entre H-L.	31.25		
NP 1:3:4 Transporte disposi cion final de escombros y Sobrantes	VJ	TRANSPORTE ESCOMBROS AL SITIO AUTORIZADO ZODME.	18.80		
NP 1:3:5 DISPOSICION FINAL DE SITIO AUTORIZA DO	TON	SITIO AUTORIZADO ZODME	82.01		
1:5:8 Acero Refuerzo Incluye Suministro FIGURA DO Armado	kg	Tanque Suminis TRO Y RCI.	248,17		
NP 2.12.3 ESTRUCTURA METALICA - INSTALACION INCLUYE PINTURA	kg	ZONA ASCENSORES EJE 8 Y EJE F	873.63		
NP2:3:33 Jelo para Juntas dependientes con cinta Flexible.	ML	CINTA PVC. Tanque SUMINISTRO Y RCD	9.54		
3:9:1:44 PUNTO Recarga In SUMINISTRO E-INSTA LACION	UN		46		
NP 3:9:1:67 [illegible]		Red contra Incendios PISO 8	31.36		
4:7:10 SUMINISTRO INSTALA CION TUBERIA PVC SANITARIA	ML	[illegible] PISO 8	[illegible]		
NP 4:7:21 SUMINISTRO E INS TALACION TUBO METALICO EMT 1/2 DETECCION DE	ML	RED ELECTRICA DETEC CION INCENDIO	138.47		
NP 4:7:26 SUMINISTRO CABLE CU NOVE LIBRE HALOGENO	ML	Red electrica PISO 8°	215.48		
NP 4:7:27 CONDUCTOR 2X NO 18 APANTALLADO ALMES	ML	Red electrica Torre AIRES ACONDICIONADOS	100		
NP 6:9:14 INSTALACION TUBERIA PVC 3/4 AISLAMIENTO TERMICO	ML	Red Aire-Acond	10.82		
NP 6:10:16 TUBERIA COBRE TIPO K 1/2 AISLAMIENTO TERMICO	ML	Red AIRE ACOND	10,03		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	XII	2025	7:00	11:00

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberias y cableado de iluminacion y sensores.
levante de mampostería en piso 1 y 2
fundida de elementos de confinamiento piso 1 y 6, instalacion de tuberia hidraulica, y sanitario.
trabajos en aires acondicionados en tuberia y ductos, pozuelos en ductos de piso 3. en ateas, humedad
levante de muros ladrillo gran formato en eje 8 entre A-H.
instalacion de platinas en eje. 1 entre A-H
trabajos en dados de refuerzo, escalera de acceso principal sobre ejes 1 entre 5-6
retiro de material acopiado en el sotano

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146763 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	XII	2025	7:10	16:10

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	8					
OFICIAL	23					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	21					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO SISO	5					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP 1:3:4 Transporte Disposicion final de escombros y sobrante	M3	Transporte desde obra hasta sitio autorizado	18.8		
NP 1:3:5 Disposicion final de material de excavacion sitio autorizado	TON	escombros hasta sitio autorizado	82,01		
F:5:8 Acero de refuerzo incluye figurado alambre de colocacion diante	kg	Acero tanque suministro	748,17		
NP 2:2:3 Suministro e instalacion estructura metalicas	kg	rampa descanso res ese 8 y este	873,63		
NP 2:3:32 Placa contra piso e=10cm f'c=3000psi reforzado a doble via	M3	Placa tanque de suministro y red.	11.87		
NP 2:3:35 Sello para juntas puentes flexi pvc. 9inch	ML	sello cinta pvc muros contra placa	9.50		
3:9:1:40 Punto hidraulico en suministro e instalacion	UN	Red contra incendio	46		
3:9:1:60 Suministro e instalacion [illegible]	ML	Red contra incendio piso 7b	81.73		
NP 3:9:1:63 Tuberia AC para red humeda 2"	ML	Red contra incendio sitio pic piso 6	31.13		
4:7:10 Tubo metalico EMT 1/2 sobrepuesto	ML	Red electrica piso 6b	44.5		
NP 4:7:21 Tuberia metalica EMT 1/2	ML	Red electrica piso 6b	138.47		
NP 4:7:26 cable cu thw 12 libre halogeno	ML	Red electrica	215.45		
NP 6:1:3 Conductores en [illegible]	M2	Conductos y Aires acondicionado	58.81		
NP 8:7:1 Instalacion de [illegible]	UN	Instalaciones electro	14.33		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

6/056 AS526

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	XII	2025	7:0	16:0

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberias y cableado.
levante de mamposteria en piso 1, Fundida de elementos de confinamiento Piso 2 y 4

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444498 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	ABR	2025	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	7					
OFICIAL	23					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	20					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO 5180	4					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP 1:3:4 Transporte dis Posicion Final de escombros Sobrantes	VJ	Transporte elevado excavacion desde la obra HASTA SITIO AUTORIZADO	18.8		
NP 1:4:9 Mortero tipo pega Tina para elevelas en muro Ladrillo Gran Formato	UN	ladrillo gran formato Fachada eje 8 de A-H.	25		
1:5:3 Columna en concreto 3.000 Psi Mezcla en obra suministro y construccion	M3	segundo Piso eje 1-4 / 8 entre L-K.	4.72		
1:5:6 Pañete muros interiores Mortero 1:4 Incluye Filos y elaboraciones	M2	Pañete Muros Piso 8P y 10	125,03		
1:5:8 Acero de refuerzo, Incluye suministro, Figurado Armado, colocacion y amarre.	KG	Acero Tanque Sub Terraneo	248.17		
NP 2:3:3 Suministro e instalacion de estructura metalica Incluye pintura poliuretano	KG	Estructura Metalica zona Ascensores	873.63		
NP 2:3:32 Placa de contrapiso en concreto impermeabilizado 4.000psi premezclado tanque subterraneo	M3	Placa de Piso Tanques Subterraneo y PCI	11.87		
3:9:1:4 Punto regulador 1" suministro y instalacion	UN	Red contra incendios Piso 6P	46.		
NP 3:9:1:61 Suministro e instalacion tubo A.C roscado Pavco 1 1/4	ML	Red contra incendios Piso 6P	205		
NP 3:9:1:63 Suministro e instalacion de tuberia A.C Roscada 2"	ML	Red contra incendio	51.12		
4:7:1:6 Suministro e instalacion tuberia metalica EMT 1 1/4 sobrepuesta	ML	Red electrica, Piso 6P	44.5		
NP 4:7:2:1 Suministro e instalacion tuberia metalica EMT 1/2 sobrepuesta incluye accesorios	ML	Red electrica, Piso 8P	138,147		
NP 4:7:2:3 Suministro e instalacion cable de cobre 12 AWG libre de halogeno	ML	Red electrica	215,45		
NP 6:7:1:6 Suministro Conduit EMT galvanizado	M2	Pintura Red Aire Acondicionado	58,81		
NP 7:9:1:9 Suministro de y Instalacion tuberia cuticor Incluye accesorios	UN	Red electrica	1433		

OBSERVACIONES: [redacted] DE LA INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO ES POSIBLE APROBAR LA ACTIVIDAD

Calle 5 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

6008 75528

25529

64059

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	XII	2025	7:0	16:30

OBSERVACIONES GENERALES

Instalacion de tuberias y cableado
Instalacion red de cobre. de puesta a tierra en sotano
Levante de Mamposteria en piso 2 Pendiente de elementos de confinamiento Piso 2 y 4
Instalacion de tuberia Hidraulica, Sanitaria
Trabajo de Anclajes en tuberias y ductetias, Pañete en muros de Piso 5 0
Levante de ladrillo gran formato en 8 entre A-H; Trabajo en Aceros de Refuerzo escalera de Acceso Pericial sobre eje L entre 5-6
Retiro material de excavacion en sotano

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

66+75 75530

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	02	JT	2026	7:0	16:0

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75531
66276

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	02	11	2026	7:0	16:6

OBSERVACIONES GENERALES

PAÑETE Y FILOS, FUNDIDA DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO, LEVANTAMIENTO EN BLOQUE #4 APLICACION DE PRIMERA MANO DE ESTUCO EN PAREDES, INSTALACION DE LADRILLO GRAN FORMATO SOBRE EJE 8 Y EJE 1, INSTALACION DE PLATINAS DE ANCLAJE PARA MUROS DE FACHADA, INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE GASFITERIA DE AIRES ACONDICIONADO, TUBERIA ELECTRICA PARA EQUIPOS DE AIRE Y TUB. COBRE INSTALACION DE CABLEADO PARA LUMINARIAS Y SENSORES, TRABAJO EN ACEROS DE REFUERZO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

TODAS LAS OBSERVACIONES CONSIGNADAS EN ESTA BITACORA SON DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL RESIDENTE DE OBRA Y/O INTERVENTORIA Y EN NINGUN CASO SU CONSIGNACION DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional:25202-146783 CND	R
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

25532

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	5	01	2026	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	3					
OFICIAL	17					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	23					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO 5150	9					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
AP 1:4:5 SUMINISTRO E INSTALACION LADRILLO SANTAFORMEN PARA FACHADAS	M2	MURO EJE B Y EJE 1	39.15		
1:5:1 MURO EN BLOCK DE CONCRETO N°4, (40x20x20) ESPESOR 1:4	M2	PISO 10 Y 60	98.98		
3:6:1:7 TUBERIA PVC L 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	PISO 60	22.91		
AP 1:4:9 MORTERO TIPO GROUTING PARA DOVELAS EN MURO LADRILLO SANTAFORMEN	LT	GROUTING CELDAS LADRILLO SANTAFORMEN EJE B Y EJE 1	106.60		
3-6-1-18 SUMIDERO de 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	TUBERIA SANITARIA EJE B	18.25		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	*NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	5	01	2026	7:10	16:30

OBSERVACIONES GENERALES

Panete en piso 50, Fundida de elementos de confinamiento en pisos 3 y 2
Instalacion de Mampostería en piso 3 en el eje de puntos fijos
Instalacion de ladrillo gran formato sobre el eje B
Instalacion de tuberia sanitaria e hidraulica
Instalacion de cableado encobre para puesta a tierra en sotano
Retiro y nivelacion en material en sotano sobre el Eje 1-4 entre H-L.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional:25700-62358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

25534.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	01	2026	7:10	17:50

OBSERVACIONES GENERALES

Pañete de muros piso 50, fundida de elementos de confinamiento en 2do y 3er piso
Instalacion mamposteria muros en piso 3 en la zona de puntos fijos
Instalacion de ladrillo gran formato sobre eje 8 y eje 1
[illegible] instalacion de cableado en cobre para puesta en tierra en sotano
Demolicion y nivelacion de material en el sotano sobre ejes 1-4 entre H-L.
Instalacion de ductería de Aires Acondicionado y de tubería electrica para equipos de Aire Acondicionado

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	7	01	2026	7:0	16:0

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	5					
OFICIAL	29					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	26					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO SISO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP1:4:5 SUMINISTRO INSTALACION LADRILLO FORMATO PARA FACHADA	M2	EJE 8 Y EJE 1	39.15		
1:5:1 MURO EN BLOQUE FLEXA NOA 1.0X0.20X0.30 MORTERO TIPO 1:4	M2	FLEXA +4 PISO 10 Y PISO 70	96,98		
3.6.1.1 TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	TUBERIA PISO 70	17,35		
NP1:3:4 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	TRANSPORTE ASITEC AUTORIZADO ESCOMBROS	12.3		
NP1:4:9 MORTERO TIPO GROUTING PARA ALOJAR LAS EN MURO LADRILLO GRAN FORMATO	LT	GROUTING - CESTA LADRILLO GRAN FORMATO	106,66		
3-6-1-18 ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	TUBERIA SANITARIA	18,25		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

755536

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	7	01	2025	7:0	16:0

OBSERVACIONES GENERALES

Parete de ladrillo piso 5, fundida de elementos de confinamiento en piso
Instalacion Mampostería bloque +4 en piso en diferentes puntos fijos
Instalacion de ladrillo gran formato sobre eje 8 y eje 1
Instalacion tubería sanitario e hidraulica
~~Retie y vinculacion y interventoria~~
sobre eje 1-4 entre H-L.
Instalacion de ductería de Aires Acondicionados y de tubería electrica para equipos de aire.

NOTA: LAS OBSERVACIONES CONSIGNADAS POR EL RESIDENTE, INTERVENTOR, EL OBJETO DE SU EJECUCIÓN Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-82358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

62782
A5534

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	01	2026	7:30	16:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	6					
OFICIAL	31					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	26					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO SISO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP1:4.5.10 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA GRAN FORTE FACHADA	M2	EJE 8 Y EJE J	39,15		
1:5.1 MURO BLOQUE FLEXO N°4 (0,10 x 0,20 x 0,40) MORTERO FIRO A	M2	MUROS PISOS 1 Y 70.	96,98		
3.6.1.1 TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	PISO 70	17,35		
3.6.1.2 TUBERIA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	PISO 70 SANITARIO	22.91		
NP1:3.4 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	TRANSPORTE EXCAVACIONES AL SITIO AUTORIZADO	123.		
NP1:4.9 MORTERO TIPO GROUTING PARA DOVELAS TUNNELLIC GRAN FORTE	LT	GROUTING DOVELAS	106.66		
3.6.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION	UN	OBRAS VARIAS PISO 1 SANIT. E OPTICA	18,25		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			OBRA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	06	01	2026	7:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

Ponete en PISO 5, FUNdida elementos de con
Finamiento en PISOS 6-7°
INSTALACION de mamposteria bloqueta
en PUNTOS FIJOS
INSTALACION de ladrillo gran FORMATO
Sobre eje 8 y eje 1
INSTALACION de ELECTRICA (OTEL DUCTOS DE CONEXION DE LOZA SANITARIA)
e HIDRAULICA
RETIRO y NIVELACION de MATERIAL del SITIO
Sobre eje H-4 entre H-L
INSTALACION de DUCTERIA de AIRES ACONDICIONA
DO y de TUBERIA ELECTRICA para EQUIPOS de
AIRE
INSTALACION de elementos metalicos para
ASCENSORES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

25539

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	01	2026	7 CALE	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	3					
OFICIAL	32					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	26					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO $150	6					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP 1:4:5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO GRAN FORMATO	M2	ESC 6 Y ESC 1	39.15		
1:5:1 MURO EN BLOQUE FLEXA N°4 (10X20X30) MORTERO TIPO 4	M2	MAMPOSTERIA PISO 1-6-7.	96,98		
1:5:6 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	PAÑETE MUROS 7° PISO Y 2° PISO	103		
3:5:2:4 SUMINISTRO SANITARIO LAVAPLATOS 2"	UN	INSTALACION SANITARIA 1ER PISO	2.5		
3:6:1:1 TUBERIA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	TUBERIA SANITARIA 1ER PISO	17.35		
3.6.1.2 TUBERIA PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	TUBERIA SANITARIA 6° PISO	22.91		
NP 1:3:4 ITEM SUMINISTRO DISPOSICION FINAL ESCOMBROS	VJ.	ITEM SUMINISTRO ESCOMBROS AL SITIO DISPOSICION AUTORIZADO.	12.3		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA		OBSERVACIONES
		NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
NP 1:4:9 MORTERO TIPO 9 PARA PEGA DE LADRILLO GRAN FORMATO	LT	MORTERO TIPO 9 PEGA GRAN FORMATO 106.62

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	01	2026	7:10	16:20

OBSERVACIONES GENERALES

Pañete en piso 5, Fundida elementos de confinamiento en diferentes pisos
Instalacion de Ladrillo gran formato sobre ejes B y eje 1
Instalacion de Tuberia Sanitaria e hidraulica
Retiro y Nivelacion con material del sitio
Instalacion de ductoria de Aires Acondicionados y de Tuberia electrica para equipos de Aire Acondicionado
Instalacion de cableado para luminarias y sensores
Regatas para Tubos electricos en muro fachada
Instalacion de Anclajes para muros de fachada

CUALQUIER OTRA OBSERVACIONES RELEVANTES POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA COMO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA ACTIVIDAD

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444498 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-148783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD /MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	02	2026	7:0	11:3

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	7					
OFICIAL	32					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	26					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP1:4: 5 SUMINISTRO EJMS Talacion Ladrillo Stan FORMATO FACHADA	M2	EJE 8 Y EJE 1	39,15		
1:5:1 MURO BLOQUE PLEX NSR CO,10X0,20X0,30 MORTERO TIPO A	M2	MUROS DISCO 1° Y PISO 2°	96,98		
1:5:6 PAÑETE DE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIO	MJ	PAÑETE MUROS 6° PISO	103		
3:5:1:1 TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALAC	ML	TUBERIA SANI 1ERA PISO 7°	32,62		
3:5:2:4 SALIDA SANITA PVC 4"	UN	TUBERIA SANITA 1ER PISO	2.5		
3:6:1:1 TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALAC	ML	TUBERIA 1ER PISO Y 2° PISO	17,35		
3:6:1:2 TUBERIA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALAC	ML	TUBERIA 1ER PISO Y 2° PISO	22,81		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA		OBSERVACIONES
NP1:3:4 TRANSPORTE EL DISTOCICION FINAL ESCOMBR	VJ	TODAS LAS CANTIDADES DE OBRA SERAN REVISADAS POR EL INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA SU APROBACION
NP1:3:5 DISPOSICION FINAL ESCOMBROS SITIO AUTORIZAD	TN	SITIO AUTORIZADO 20DMe 136,32
NP 1:4:9 MORTERO TIPO SIKATOP PARA DOVELAS LADRILLO GRAN FORMATO	LT	ROUTING CELDAS LADRILLO GRAN FORMATO 106.66

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	1	2025	7:00	11:00

OBSERVACIONES GENERALES

Pañete muros 5° piso, Fundida de elementos de confinamiento en diferentes pisos, Instalacion de mamposteria blanca en puntos fijos
Instalacion de ladrillo 9cm. portante sobre eje 8 y eje y
Instalacion de tuberia sanitaria e hidraulica sobre eje 1-2 entre H-I
Instalacion de ductoria de Aires Acondicionados y Tuberia electrica para Equipos de Aire
Instalacion de cableado para luminaria y sensores de pasos. para tubería electrica en muros
Instalacion puntos de anclaje para muros de fachada.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62256 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	01	2026	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	6					
OFICIAL	31					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	30					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO SISO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROGESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP1:4:5 SUMINISTRO E INSTALACION LADRILLO FACHADA	M2	EJE 8 Y EJE 1	39,15		
1:8:1 MURO EN BLOQUE FLEXA + 4 CM DE MORTERO 1:4	M2	MAMPOSTERIA 1ER PISO Y 2D PISO	96,88		
1:5:6 PAÑETE EN MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACION	M2	PAÑETE MUROS 6TA	103		
3:5:1:1 TUBERIA PVC $ 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	TUBERIA SANITARIA PISO 2D	32.62		
3:6:1:1 TUBERIA PVC L 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	TUBERIA 2D PISO Y 1ER PISO	17.35		
3:6:1:2 TUBERIA PVC L 3" SUMINISTRO E INSTALAC.	ML	TUBERIA 2" 1ER PISO	22.91		
NP1:3:5 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	TN	DISPOSICION SITIO AUTORIZADO ZODME	136.32		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA		OBSERVACIONES	
		NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD	
NP1:3:7 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE EXCAVACION	M3	RELLENO EN SOTANO ENTRE EJE DE EXCAVACION	2523
NP:1:4:9 MORTERO AUTONIVELANTE PARA GROUTING PARA NIVELACION EN MAQUINARIA	L7	GROUTING ALREDEDOR DE LA DIL LLO GRAN FORMAT	106,66

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	I	2025	7:00	11:00

OBSERVACIONES GENERALES

Parete Muros 5° Piso, Fundida de elementos de confinamiento en diferentes pisos, Instalacion de Reapostenia bajo que #4 en puntos fijos
Instalacion de Ladrillo 9cm. Torreate sobre eje B y eje 4
Instalacion de tuberia sanitaria e hidraulica sobre eje 1-4 entre H-L
Instalacion de ductoria de Aires Acondicionados y tuberia electrica para equipos de Aire
Instalacion de cableado para luminaria y tomas regulados para tubería electrica en muros
Instalacion de puntos de anclaje para muros de fachada.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51911 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62358 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	01	2026	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	6					
OFICIAL	31					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	30					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO SISO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP1:4:5 SUMINISTRO E INSTALACION LOSA FONDO EN CONCRETO F'C 4000 PSI	M2	EJE 8 Y EJE 1	39,15		
1:5:1 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO FLEXA + 4 (0,19X0,12X0,39) MORTERO 1:4	M2	MAMPOSTERIA 1ER PISO Y 2D PISO	96,88		
1:5:6 PAÑETE EN MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	PAÑETE MUROS 6 Y 7	103		
3:5:1:1 TUBERIA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	TUBERIA SANITARIA PISO 2D	32.62		
3:6 1:1 TUBERIA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	TUBERIA 2D PISO Y 1ER PISO	17.35		
3:6:1:2 TUBERIA PVC 3" SUMINISTRO E INSTALAC.	ML	TUBERIA 2" 1ER PISO	22.91		
NP1:9:5 DISPOSICION SOBRANTES	TN	DISPOSICION SITIO AUTORIZADO ZODME	136.32		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA		OBSERVACIONES		
		NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD		
NP1:3:2 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE EXCAVACION	M3	RELLENO EN SOTANO ENTRE EJES DE EXCAVACION	2523	
NP1:14:9 MORTERO TIPO GROUTING PARA BOLSILLOS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL	LT	GROUTING DOVELAS Y LADRILLO GRAN FORMATO	106,66	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	01	2025	7:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

Formaleta muros Piso 50, Fundida de este muros de confinamiento en diferentes pisos, Instalacion mamposteria bloque #4 Puntos Fijos
Instalacion de mamposteria en bloque #4 Puntos Fijos
Instalacion de cordillo sin fundir en eje 8 y eje 7, Instalacion de tuberia sanitaria e hidraulica retiro y nivelacion con material de sobre este lacion con material de sobre eje 1-4 y eje H-L
Instalacion de tuberia electrica para retiro y nivelacion con material de sobre
Instalacion cableado luminaria y sensores

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER PRECISAS Y DE RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-82356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	12
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	01	2026	7:30	16:2

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°572 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	6					
OFICIAL	32					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	34					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP 1:4:5 SUMINISTRO E INSTALACION LADRILLO GRAN FORMATO TU FACHADAS	M2	EJES 8 Y EJE 1	39.19		
1:5:1 MADERO EN BRUTO FLEXAL (0.10X0.20X0.30) MORTERO TIPO 1:4	M2	MAMPOSTERIA PISO 7°	96.98		
1:5:6 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4	M2	PAÑETE MUROS PISO 6°	103		
3.5.1.1 TUBERIA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	TUBERIA SANITARIA	32,62		
3:5:2:6 Salida Sanitaria Ornal 2"	UN	SALIDA PVC SANITARIA PISO 1,0	2		
NP 1:3:5 DISPOSICION FINAL MATERIAL DE EXCAVACION SITIO AUTORIZADO	TN	DISPOSICION EXCOM VIAJES SITIO AUT DISPONIBLE	136,32		
NP 1:3:7 Relleno en Material Seleccionado Proveniente Excavacion	M3	Relleno Material Excavacion Sobrante	25,23		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
NP 1:4:9 MORTERO TIPO 8 GROUTING PARA CHAFLANES LADRILLO GRAN FORMATO	GROUTING PARA CHAFLANES LADRILLO GRAN FORMATO

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	01	2026	7:00	16:00

OBSERVACIONES GENERALES

Pañete de MUROS en PISOS, FUNDIDA de elementos de confinamiento en diferentes PISOS
Instalacion de MAMPOSTERIA en el AREA de Puntos FIJOS
Instalacion de ladrillo gran FORMATO sobre eje 8 y eje 1
~~INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA~~ ELECTRICA, Retiro de Material ACOPIADO en SOTANO, Instalacion de ductERIA de AIRE Acondicionado y de TUBERIA electrica para EQUIPOS de AIRE, INSTALACION de CABLEADO para LUMINARIAS y SENSORES Regatas para TUBERIA electrica en MUROS
Trabajos REMATE en PLACA de SOBREPISO

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:17202-51811 CDS	
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25700-25724 CND	
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:25700-62356 CND	
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:25202-21444496 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: RODRIGO ANDRES SALGADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:25202-146783 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

75549

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	01	2025	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	N° 811 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N°672 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE-META"		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	6					
OFICIAL	34					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	36					
CELADOR	2					
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO	1					
OTRO	1					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
NP 1.4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO FAN FOR MURO FACHADA	M2	EJE B Y EJE 1	39,15		
1.5.1 MURO EN BLOQUE FLEXA NO 4 (0.110 x 0.070 x 0.130 MORTERO TIPO 1:4	M2	MAMPOSTERIA PISO 4 Y 5	96,98		
1.5.6 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	PAÑETE EN MUROS 6480	103		
NP 1.3.5 DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION SITIO AUTORIZADO (NO TRANSPORTE)	TN	DISPOSICION FINAL SITIO AUTORIZADO DISTANCIA	13682		
NP 1.3.1 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE EXCAVACION COMPACTACION MANUAL	M3	RELLENO EN GOTERAS CON MATERIAL EXCAVACION	2023		
NP 1.4.9 MORTERO TIPO GROUTING PARA DOVELAS Y MURO LADRILLO GRAN FORMATO	LT	GROUTING DOVELAS GRAN FORMATO	10664		
NP 2.3.35 SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIONES CON CINTA FLEXIBLE PARA 22 CM SUMINISTRO	ML	CINTA EN JUNTAS.	9,33		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co
