SOMOS, SOMOS HUILENSES GRANDES · Gobernación del Huila GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 3 Pagina 1 de 1

ACTA No 3 RECIBO FINAL

CONTRATO DE:	ORDEN DE SERVICIO	Nº:	16	AÑO:	2025		VALOR CONTRATO:		$ 848.000.000,00
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	3	HOJA	1	DE 1	PLAZO INICIAL (MESES)	3	ADICIONAL
CONTRATISTA:	MASSEQ S.A.S.	FECHA DE ACTA	DD/MM/AA						0,00
INTERVENTOR:	INEXPOTRANS S.A.S.		1-mar-26				PLAZO ADICIONAL (MESES)	0	V.R. TOTAL
INICIACIÓN	Nº SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No.061 DEL 2 DE JUNIO DEL 2025 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA"				PLAZO TOTAL (MESES)	3	848.000.000,00
01/dic/2025	Nº 1 DD/MM/AA – DD/MM/AA Nº 2 DD/MM/AA – DD/MM/AA Nº 3 DD/MM/AA – DD/MM/AA								

			CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACION 1			ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL
1	PRELIMINARES															
1,01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES (Incluye Disposición En Sitio Autorizado)	M2	240,00	$ 60.000,00	$ 14.400.000,00	-	-92,09	-$ 5.525.106,27	90,435	$ 5.426.100,00	10,65	$ 639.250,00	46,83	$ 2.809.543,00	147,91	$ 8.874.893,00
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (Incluye Disposición En Sitio Autorizado)	m3	58,40	$ 220.000,00	$ 12.848.000,00			$ 0,00	58,40	$ 12.848.000,00	-	$ -	-	$ -	58,40	$ 12.848.000,00
2	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA															
2,01	EXCAVACIÓN GRANULARES DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES, Incluye Disposición En Sitio Autorizado	m³	901,77	$ 30.000,00	$ 27.053.191,00	-	-4,45	-$ 133.472,39	420,72	$ 12.621.600,00	438,20	$ 13.146.119,00	38,40	$ 1.152.000,00	897,32	$ 26.919.719,00
3	BOX CULVERT															
3,01	Suministro e instalación de box culvert en concreto prefabricado Sección (dimensión interna | base = 3.0m | altura = 2.0m | long. = 1m | Prefabricado	ml	20,00	$ 15.670.000,00	$ 313.400.000,00			$ 0,00	20,00	$ 313.400.000,00	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 313.400.000,00
3,02	CONCRETO RESISTENCIA 25 MPa (IMPERMEABILIZADO)	M3	60,00	$ 1.470.000,00	$ 88.200.000,00	-	-21,39	-$ 31.443.300,00	-	$ 0,00	38,61	$ 56.756.700,00	0,00	$ -	38,61	$ 56.756.700,00
3,03	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa	KG	5.400,00	$ 8.500,00	$ 45.900.000,00	-	-1916,46	-$ 16.289.910,00	-	$ 0,00	3483,54	$ 29.610.090,00	0,00	$ -	3.483,54	$ 29.610.090,00
3,04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE TRANSPORTE	M3	335,38	$ 215.000,00	$ 72.107.284,00	+	167,08	$ 35.922.690,65	248,63	$ 53.454.375,00	86,75	$ 18.651.250,00	167,09	$ 35.924.350,00	502,47	$ 108.029.975,00
4	MEJORAMIENTO SUBRASANTE y SOCAVACIÓN														-	
4,01	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	M2	600,00	$ 9.000,00	$ 5.400.000,00	-	-483,44	-$ 4.350.960,00	-	$ 0,00	116,56	$ 1.049.040,00	0,00	$ -	116,56	$ 1.049.040,00
4,02	BOLSAS DE GEOTEXTIL GIGANTES (BGG) Megabolsas Rellenas con Material Estabilizado con	M3	135,00	$ 212.000,00	$ 28.620.000,00	-	-18,00	-$ 3.816.000,00	117,00	$ 24.804.000,00	0,00	$ -	-	$ -	117,00	$ 24.804.000,00
4,03	Suministro de Cemento Tipo I para mezcla suelo cemento relleno Megabolsas al 10%	Kg	21.600,00	$ 920,00	$ 19.872.000,00			$ 0,00	21.600,00	$ 19.872.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	21.600,00	$ 19.872.000,00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS															
5,01	SUBBASE GRANULAR CLASE A (Según norma INVIAS 2022; incluye suministro, transporte,	M3	80,00	$ 225.000,00	$ 18.000.000,00	+	91,36	$ 20.556.000,00	-	$ 0,00	63,37	$ 14.258.250,00	107,99	$ 24.297.750,00	171,36	$ 38.556.000,00
5,02	BASE GRANULAR CLASE A (Según norma INVIAS 2022; incluye suministro, transporte,	M3	40,00	$ 240.000,00	$ 9.600.000,00	+	16,14	$ 3.873.600,00	-	$ 0,00	38,14	$ 9.153.600,00	18,00	$ 4.320.000,00	56,14	$ 13.473.600,00
5,03	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-40	M2	200,00	$ 12.000,00	$ 2.400.000,00	+	28,08	$ 336.960,00	-	$ 0,00	168,08	$ 2.016.960,00	60,00	$ 720.000,00	228,08	$ 2.736.960,00
5,04	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	19,27	$ 1.850.000,00	$ 35.649.500,00	+	3,54	$ 6.549.000,00	-	$ 0,00	16,81	$ 31.098.500,00	6,00	$ 11.100.000,00	22,81	$ 42.198.500,00
6	SEÑALIZACIÓN															
6,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA	UND	2,00	$ 980.000,00	$ 1.960.000,00	-	-2,00	-$ 1.960.000,00	-	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ 0,00
6,02	TACHA REFLECTIVA TIPO ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLASTICO	UND	100,00	$ 14.000,00	$ 1.400.000,00	-	-100,00	-$ 1.400.000,03	-	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ 0,00
6,03	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	200,00	$ 4.500,00	$ 900.000,00	-	-200,00	-$ 900.000,00	-	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ 0,00
7	TRANSPORTE														-	
7,01	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 14 m3)	M3/KM	52.456,42	$ 1.950,00	$ 102.290.025,00	-	-728	-$ 1.419.501,61	26.019,11	$ 50.737.273,00	23413,06	$ 45.655.463,00	2296,30	$ 4.477.787,00	51.728,47	$ 100.870.523,00
VALOR TOTAL					$ 800.000.000,00			$ 0,00		$ 493.163.348,00		$ 222.035.222,00		$ 84.801.430,00		$ 800.000.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTO					$ 615.384.615,38			$ 0,00		$ 379.356.421,54		$ 170.796.324,62		$ 65.231.869,23		$ 615.384.615,38
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN			24%		$ 147.692.307,69		24%	$ 0,00	24%	$ 91.045.541,17	24%	$ 40.991.117,91	24%	$ 15.655.648,62	24%	$ 147.692.307,69
COSTOS DE IMPREVISTOS			1%		$ 6.153.846,15		1%	$ 0,00	1%	$ 3.793.564,22	1%	$ 1.707.963,25	1%	$ 652.318,69	1%	$ 6.153.846,15
COSTOS DE UTILIDAD			5%		$ 30.769.230,77		5%	$ 0,00	5%	$ 18.967.821,08	5%	$ 8.539.816,23	5%	$ 3.261.593,46	5%	$ 30.769.230,77
VALOR TOTAL					$ 800.000.000,00			$ 0,00		$ 493.163.348,00		$ 222.035.222,00		$ 84.801.430,00		$ 800.000.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 24.000.000,00			$ 0,00		$ 24.000.000,00	$	$ -	$	$ -		$ 24.000.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA					$ 9.600.000,00			$ 0,00		$ 0,00	$	$ 9.600.000,00	$	$ -		$ 9.600.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT					$ 14.400.000,00			$ 0,00		$ 0,00	$	$ 14.400.000,00	$	$ -		$ 14.400.000,00
VALOR TOTAL					$ 848.000.000,00			$ 0,00		$ 517.163.348,00		$ 246.035.222,00		$ 84.801.430,00		$ 848.000.000,00

NOTA: La facturación presente corresponde 100% al municipio de Acevedo Huila.

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.

SE AMORTIZARA EL 0% POR COSTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR UN VALOR DE	$ 0,00	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0,00

No.	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	% A PAGAR	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SALDO POR AMOTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ 517.163.348,00	60,99%	$ -	$ -	$ 517.163.348,00
2	ACTA PARCIAL No. 2	$ 246.035.222,00	29,01%	$ -	$ -	$ 246.035.222,00
3	ACTA PARCIAL No. 3	$ 84.801.430,00	10,00%	$ -	$ -	$ 84.801.430,00

R.L JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ
Contratista

R.L GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
Interventor (a) o supervisor (a)

	REVISÓ	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

Powered by CamScanner


Gobernación del Huila	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTLO DEL HUILA"				+eq CONSTRUIMOS CONFIANZA

CONTRATO:	OBRA PUBLICA	MES	1	AÑO	2026
CONTRATISTA:	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S.	INTERVENTOR:		INEXPOTRANS S.A.S.	
ITEM: 1.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES (Incluye Disposición En Sitio Autorizado)				
UNIDAD	M2	FECHA:		1/03/2026	


DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES (Incluye Disposición En Sitio Autorizado)

Descripción	Ancho	Largo	Total
Demolición de pavimento flexible Calzada pendiente por facturar Acta No. 3	3,10	15,09	46,83
		Total	46,83

ESQUEMAS

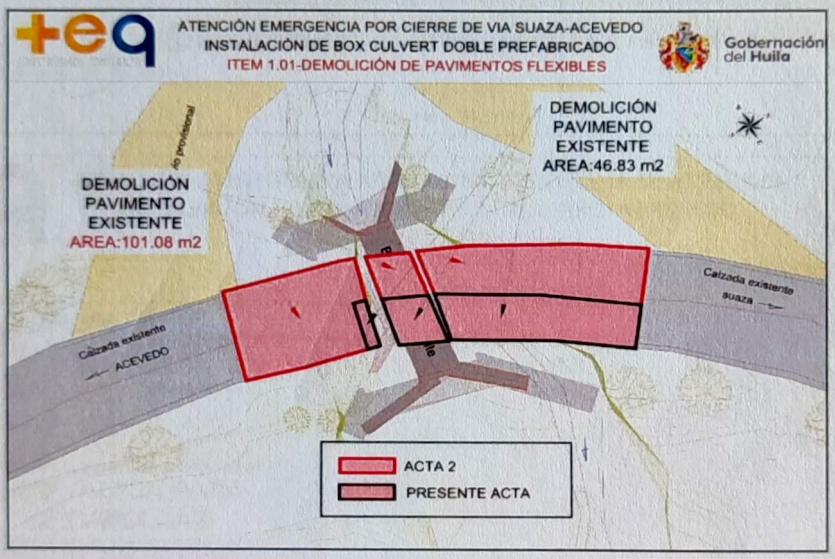

REGISTRO FOTOGRAFICO

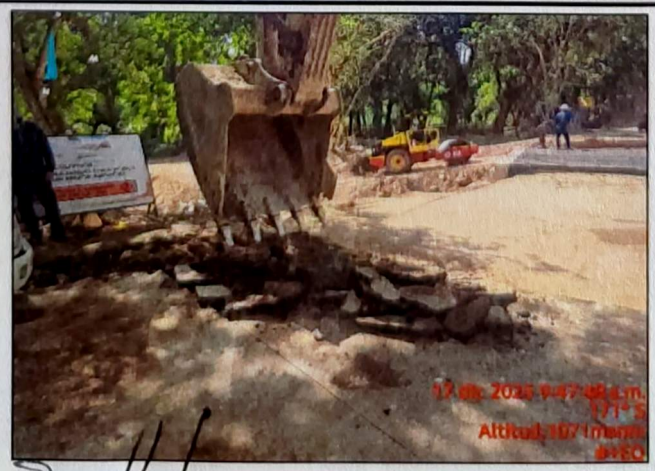

JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ
RL. MASSEQ S.A.S.
CONTRATISTA

GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
RL. INEXPOTRANS S.A.S.
INTERVENTOR


Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTLO DEL HUILA"			+eq CONSTRUIMOS CONFIANZA	
CONTRATO:	OBRA PUBLICA	MES	1	AÑO	2026
CONTRATISTA:	MASSEQ S.A.S.	**INTERVENTOR:**		INEXPOTRANS S.A.S.	
ITEM: 2.01	EXCAVACIÓN GRANULARES DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES, Incluye Disposición En Sitio Autorizado				
UNIDAD	m³	**FECHA:**		1-mar-26	

EXCAVACIÓN GRANULARES DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES, Incluye Disposición En Sitio Autorizado

Descripción	Ancho	Largo	Espesor	Total m3
Excavacion para subrasante via	2,39	25,09	0,64	38,40
			Total	**38,40**

ESQUEMAS

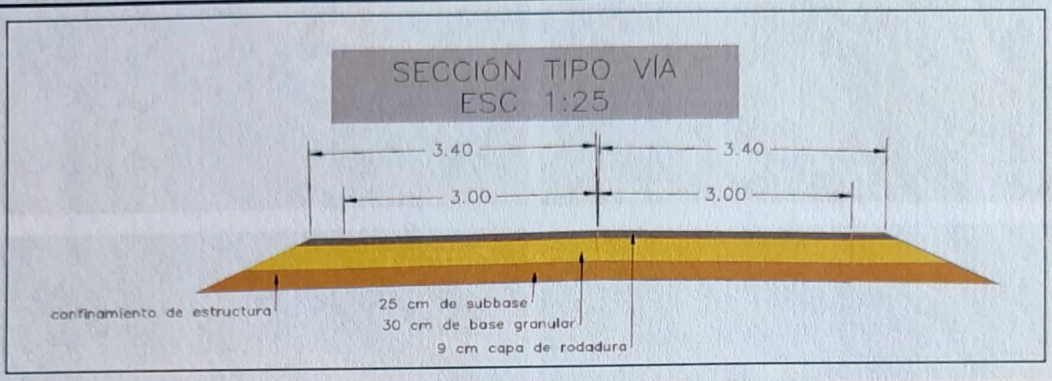



REGISTRO FOTOGRAFICO





Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	BOXCULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTLO DEL HUILA"	+eq CONSTRUIMOS CONFIANZA

CONTRATO:	OBRA PUBLICA	MES	1	AÑO	2026
CONTRATISTA:	MASSEQ S.A.S.		INTERVENTOR:	INEXPOTRANS S.A.S.	
ITEM: 2.01	EXCAVACIÓN GRANULARES DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES, Incluye Disposición En Sitio Autorizado				
UNIDAD	m³		FECHA:	1-mar-26	













JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ
RL. MASSEQ S.A.S.
CONTRATISTA

GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
RL. INEXPOTRANS S.A.S.
INTERVENTOR

Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTLO DEL HUILA"	+eq CONSTRUIMOS CONFIANZA

CONTRATO:	OBRA PUBLICA	MES	1	AÑO	2026
CONTRATISTA:	MASSEQ S.A.S.		**INTERVENTOR:**	INEXPOTRANS S.A.S.	
ITEM: 3.04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE TRANSPORTE				
UNIDAD	M3		**FECHA:**	1-mar-26	

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	Area	Altura	Cantidad	Exp	Total (M3)
Relleno con crudo en aletas	0,00	2,21		1,30	-
Relleno a subrasante (atraque box)	65,00	2,57		1,30	167,09
				Total	**167,09**

ESQUEMA



REGISTRO FOTOGRAFICO









JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ
RL. MASSEQ S.A.S.
CONTRATISTA

GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
RL. INEXPOTRANS S.A.S.
INTERVENTOR

Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTLO DEL HUILA"	+eq CONSTRUIMOS CONFIANZA

CONTRATO:	OBRA PUBLICA	MES	1	AÑO	2026
CONTRATISTA:	MASSEQ S.A.S.		**INTERVENTOR:**	INEXPOTRANS S.A.S.	
ITEM: 5,01	SUBBASE GRANULAR CLASE A (Según norma INVIAS 2022; incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución en obra)				
UNIDAD	M3		**FECHA:**	1-mar-26	

SUBBASE GRANULAR CLASE A (Según norma INVIAS 2022; incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución en obra)

Descripción	Area	Espesor	Cantidad	Total m3
Subbase-granular-estabilizada entre megabolsas	56,11	1,66	1,00	92,99
Subbase granular -via	60,00	0,25	1,00	15,00
			Total	**107,99**

ESQUEMAS



REGISTRO FOTOGRAFICO









JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ
RL. MASSEQ S.A.S.
CONTRATISTA

GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
RL. INEXPOTRANS S.A.S.
INTERVENTOR

Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTLO DEL HUILA"			+eq CONSTRUIMOS CONFIANZA	
CONTRATO:	OBRA PUBLICA	MES	1	AÑO	2026
CONTRATISTA:	MASSEQ S.A.S.		INTERVENTOR:	INEXPOTRANS S.A.S.	
ITEM: 5,02	BASE GRANULAR CLASE A (Según norma INVIAS 2022; incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución en obra)				
UNIDAD	M3		FECHA:	1-mar-26	

BASE GRANULAR CLASE A (Según norma INVIAS 2022; incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución en obra)

Descripción	Area	Espesor	Cantidad	Total m3
Base granular-via	60,00	0,30	1,00	18,00
			Total	18,00

ESQUEMAS



REGISTRO FOTOGRAFICO









JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ
RL. MASSEQ S.A.S.
CONTRATISTA

GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
RL. INEXPOTRANS S.A.S.
INTERVENTOR

Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTLO DEL HUILA"	+eq CONSTRUIMOS CONFIANZA

CONTRATO:	OBRA PUBLICA	MES	1	AÑO	2026
CONTRATISTA:	MASSEQ S.A.S.		**INTERVENTOR:**	INEXPOTRANS S.A.S.	
ITEM: 5,03	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40				
UNIDAD	M2		**FECHA:**	1-mar-26	

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40

Descripción	Area	Espesor	Cantidad	Total m3
Imprimación vía	60,00		1,00	60,00
			Total	60,00

ESQUEMAS



REGISTRO FOTOGRAFICO





JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ
RL. MASSEQ S.A.S.
CONTRATISTA

GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
RL. INEXPOTRANS S.A.S.
INTERVENTOR

Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN BOXCULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTLO DEL HUILA"				CONSTRUIMOS CONFIANZA
CONTRATO:	OBRA PUBLICA	MES	1	AÑO	2026
CONTRATISTA:	MASSEQ S.A.S.		INTERVENTOR:	INEXPOTRANS S.A.S.	
ITEM: 5,04	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19				
UNIDAD	M3		FECHA:	1-mar-26	

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

Descripción	Area	Espesor	Cantidad	Total m3
Pavimento flexible con MDC-19	60,00	0,10	1,00	6,00
			Total	6,00

ESQUEMAS



REGISTRO FOTOGRAFICO



Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	BOXCULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTLO DEL HUILA"			+eq CONSTRUIMOS CONFIANZA	
CONTRATO:	OBRA PUBLICA	MES	1	AÑO	2026
CONTRATISTA:	MASSEQ S.A.S.		INTERVENTOR:	INEXPOTRANS S.A.S.	
ITEM: 5,04	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19				
UNIDAD	M3		FECHA:	1-mar-26	





JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ
RL. MASSEQ S.A.S.
CONTRATISTA

GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
RL. INEXPOTRANS S.A.S.
INTERVENTOR

Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN BOXCULVERT DOBLE PREFABRICADO EN LA VÍA SUAZA ACEVEDO LOCALIZACIÓN QUEBRADA PUEBLO VIEJO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTLO DEL HUILA"	+eq CONSTRUIMOS CONFIANZA

CONTRATO:	OBRA PUBLICA	MES	1	AÑO	2026
CONTRATISTA:	MASSEQ S.A.S.		**INTERVENTOR:**	INEXPOTRANS S.A.S.	
ITEM: 7,01	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 14 m3)				
UNIDAD	M3/KM		**FECHA:**		1-mar-26

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 14 m3)

DESCRIPCIÒN	Vol	Esp	Altura	Distancia	Exp.	Total m3
Escombro Pav	4,68	0,10	1,00	41,00	1,30	249,58
Demolición	-	-	-	41,00	1,30	-
Excavación	38,40			41,00	1,30	2.046,72
						-
					Total	**2.296,30**

REGISTRO FOTOGRAFICO









JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ
RL. MASSEQ S.A.S.
CONTRATISTA

GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
RL. INEXPOTRANS S.A.S.
INTERVENTOR

Powered by CamScanner
