
DETERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RIO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LA FUENTE
		INTERVENTOR:	CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO: CAMPAMENTOS TEMPORALES DEL CONTRATISTA

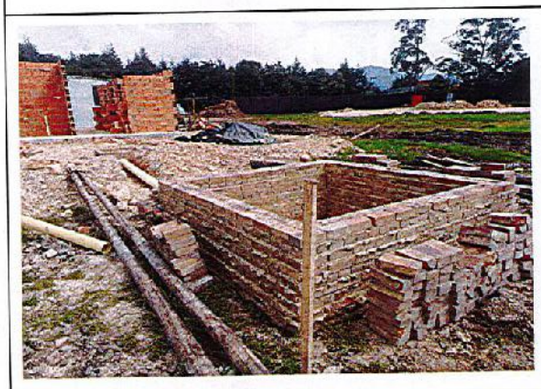


Construcción de campamento adecuando pozo séptico




Adecuación zona de baños de campamento




Construcción campamento con zona de oficinas y baños

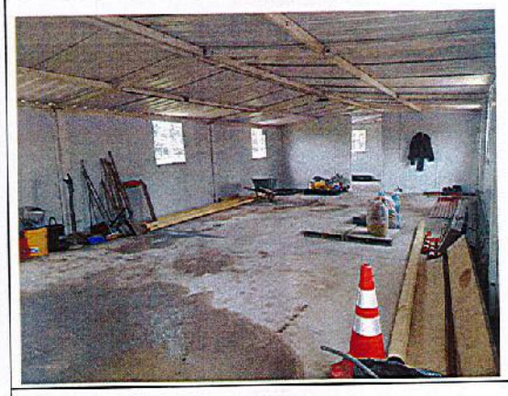

Espacio construido para zona de oficinas

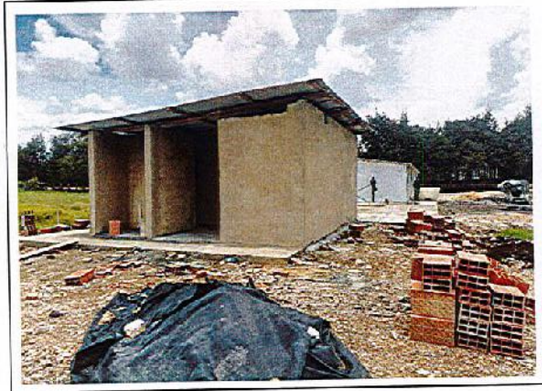

Adecuación zona de baños de campamento

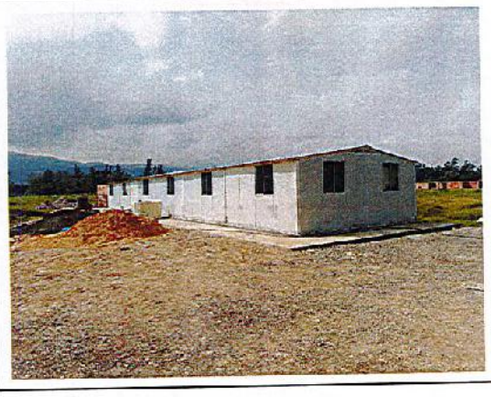


Construcción campamento adecuando zonas aledañas

DETERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSION: FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RIO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA: INTERVENTOR:	CONSORCIO VIA LA FUENTE CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO: DESCAPOTE MECANICO Y LIMPIEZA HASTA E=20CM (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES

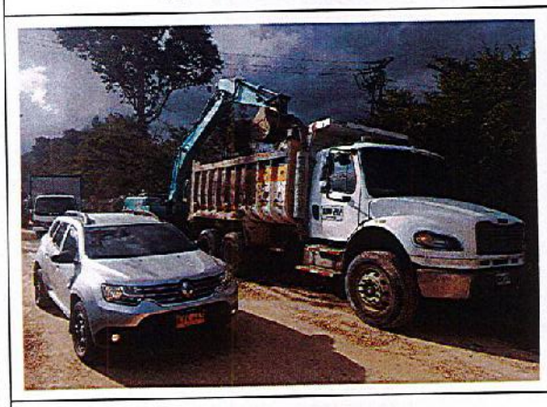

Descapote de borde vía para implementar paso peatonal




Descapote de borde vía para iniciar excavación de caja




Descapote por borde vía (vallado izquierdo) para construcción estructura del pavimento



Descapote de borde vía para implementar paso peatonal

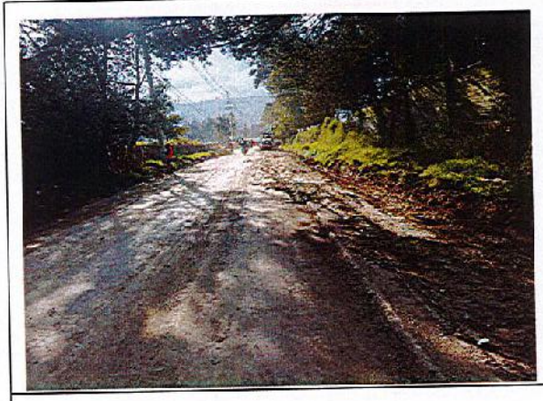

Descapote de borde vía para implementar paso peatonal

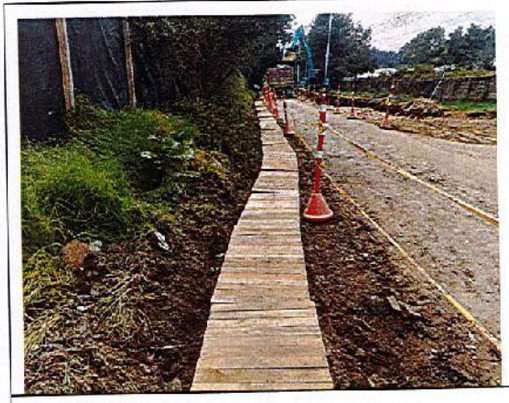


Implementación paso peatonal, descapotando borde de la vía

PETROTANSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RIO BOGOTA HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LA FUENTE
		INTERVENTOR:	CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2025	AL:	31/03/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO: FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR DE 10 CM

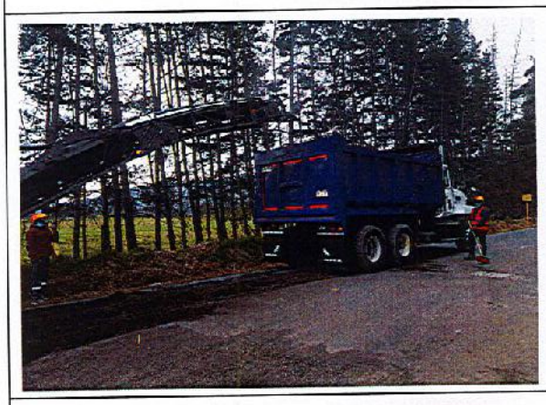

Fresado del pavimento Tramo 1



Fresado del pavimento Tramo 2



Fresado del pavimento Tramo 1



Fresado del pavimento Tramo 1



Fresado del pavimento Tramo 2



Fresado del pavimento Tramo 1

DETERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:


OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA: INTERVENTOR:	CONSORCIO VIA LA FUENTE CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO: EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)



Excavación mecánica de caja para instalar capas de la estructura del pavimento Frente 1

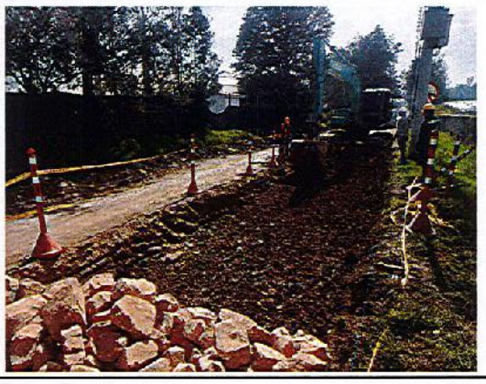

Excavación mecánica de caja para instalar capas de la estructura del pavimento Frente 2




Excavación mecánica de caja para instalar capas de la estructura del pavimento Frente 1



Excavación mecánica de caja para instalar capas de la estructura del pavimento Frente 2



Excavación mecánica de caja para instalar capas de la estructura del pavimento Frente 1

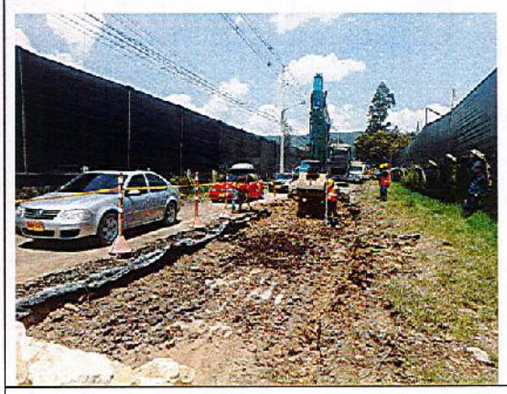

Excavación mecánica de caja para instalar capas de la estructura del pavimento Frente 2

DETERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA.


OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA: INTERVENTOR:	CONSORCIO VIA LA FUENTE CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2026


REGISTRO FOTOGRÁFICO: TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES



Transporte proveniente de la excavación Frente 1

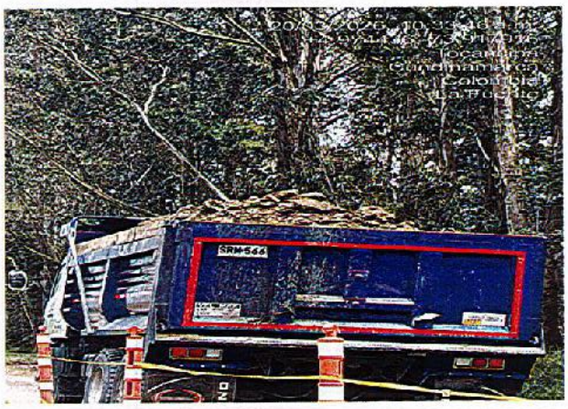

Transporte material proveniente de la excavación

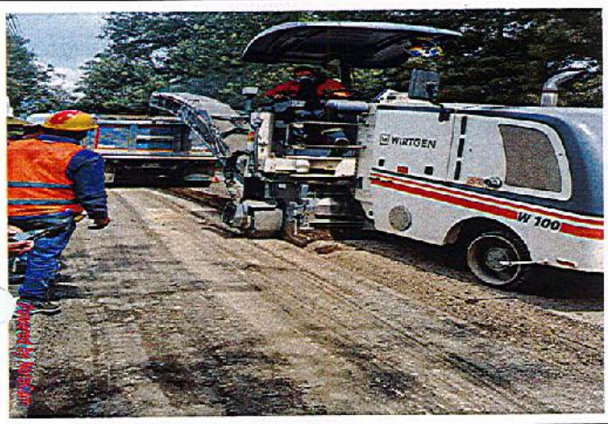

Transporte material proveniente del fresado Frente 1




Material proveniente del fresado Frente 2

DETERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RIO BOGOTA HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LA FUENTE
		INTERVENTOR:	CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2026


REGISTRO FOTOGRÁFICO: RAJÓN SELECCIONADO

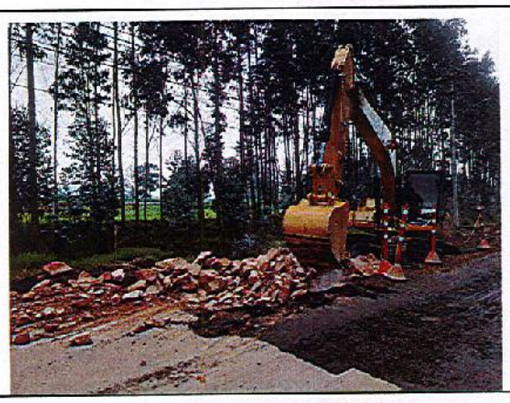

Instalación de mejoramiento en rajón e = 0.40 m Tramo 1




Instalación de mejoramiento en rajón e = 0.40 m Tramo 2

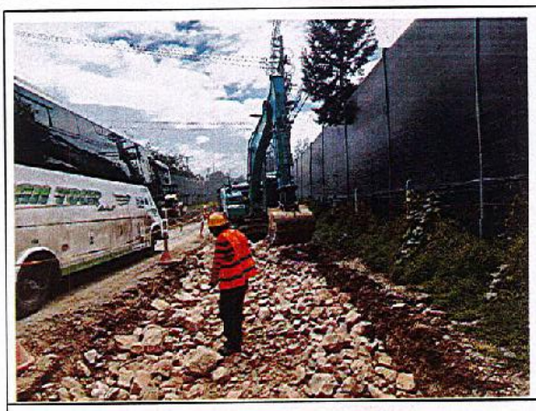


Instalación de mejoramiento en rajón e = 0.40 m Tramo 2



Instalación de mejoramiento en rajón e = 0.40 m Tramo 1

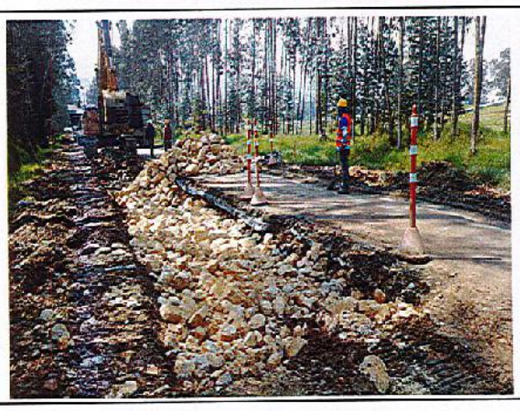

Instalación de mejoramiento en rajón e = 0.40 m Tramo 1

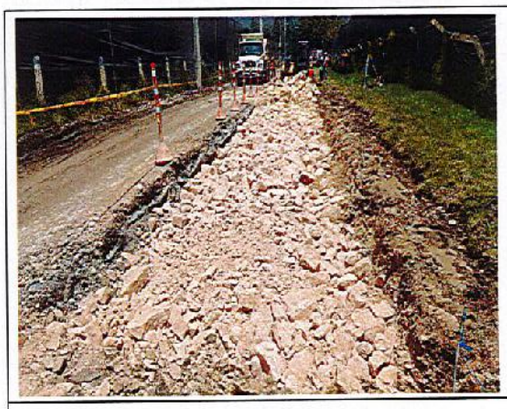


Instalación de mejoramiento en rajón e = 0.40 m Tramo 2

DETERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:


OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RIO BOGOTA HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LA FUENTE
		INTERVENTOR:	CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO: MATERIAL DE SELLO (B-200)

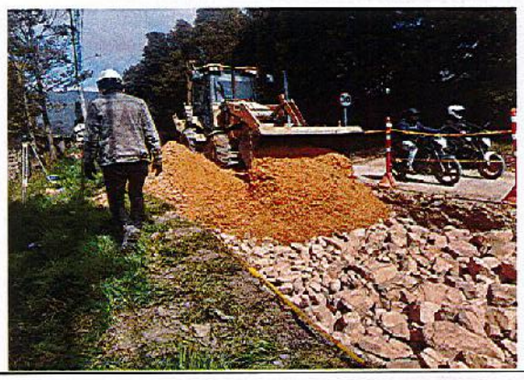

Suministro e instalación de material de sello (B-200) Frente 2

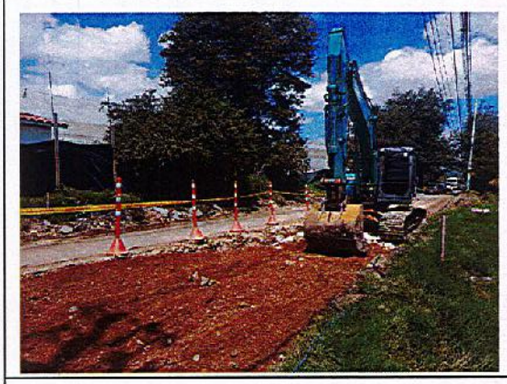

Extendida de material de sello B-200 sobre capa de rajón Frente 2



Extendida y compactación de sello B-200 Frente 1



Extendida de material de sello B-200 Frente 1



Suministro e instalación de material de sello Frente 2



Extendida y compactación de material de sello Frente 1

DEVERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA: INTERVENTOR:	CONSORCIO VIA LA FUENTE CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	18/03/2026	AL:	31/03/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN




SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T-2400 FRENTE 2




SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T-2400 FRENTE 1



SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T-2400 FRENTE 1

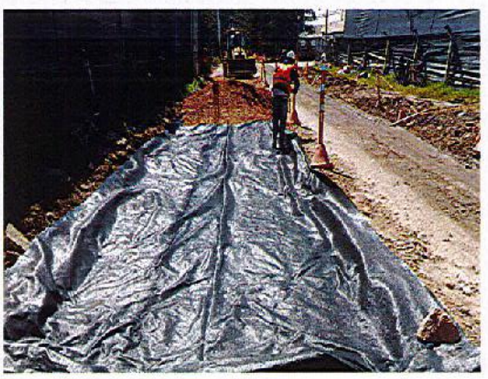

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T-2400 FRENTE 2

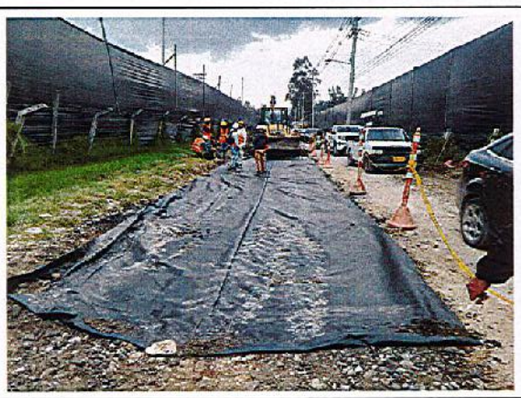

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T-2400 FRENTE 2




SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T-2400 FRENTE 1

DETERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSION: FECHA:


OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPA- ZIPAQUIRA DESDE EL PUENTE RIO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LA FUENTE
		INTERVENTOR:	CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2025


REGISTRO FOTOGRÁFICO: SUBBASE GRANULAR

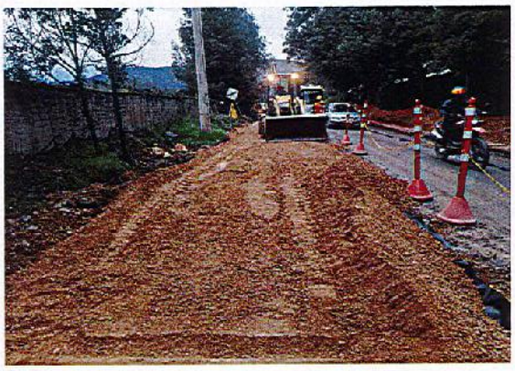


SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE SBG TRAMO 2

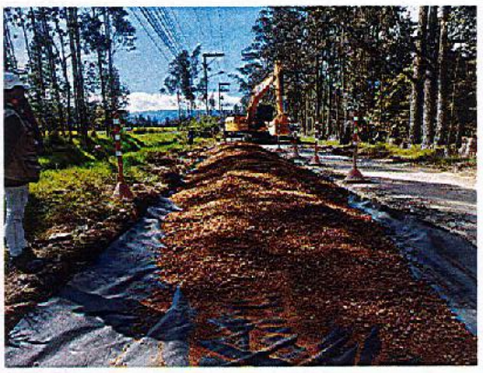

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE SBG TRAMO 1

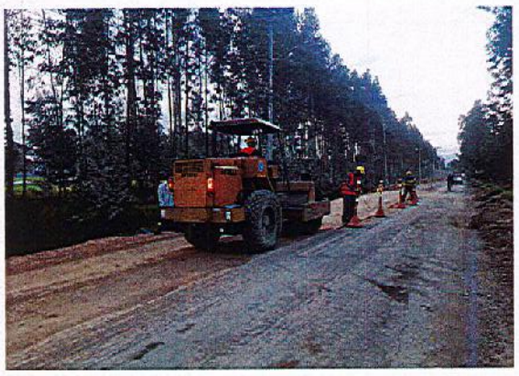

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE SBG TRAMO 1

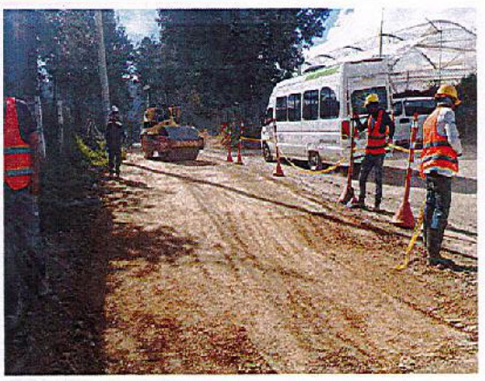

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE SBG TRAMO 2



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE SBG TRAMO 2




SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE SBG TRAMO 1

DETERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL AERA	CODIGO No. VERSION: FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RIO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LA FUENTE
		INTERVENTOR:	CONSORCIO DEL AERA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2026


REGISTRO FOTOGRÁFICO: PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PARA 21 MESES

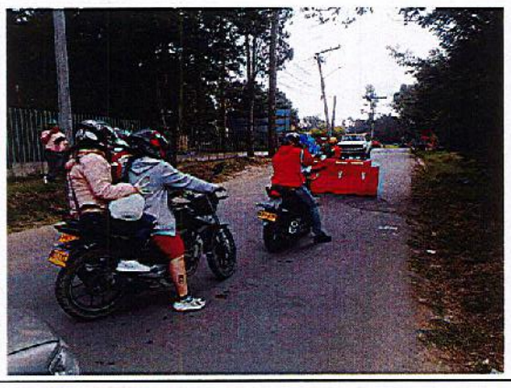


CIERRE VIAL AL INICIO DEL PROYECTO (KIT DE APROXIMACION)




CIERRE VIAL EN TRAMO 2 (KIT DE APROXIMACION)

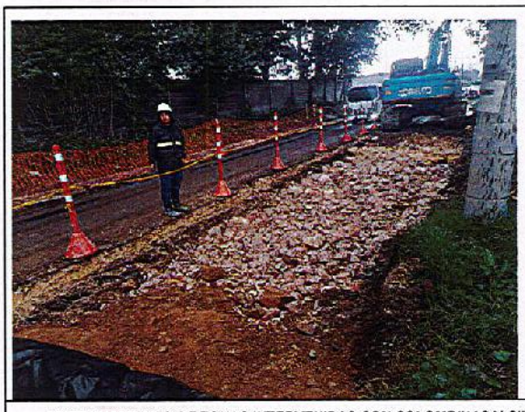

ACIRDONAMIENTO DE ZONAS INTERVENIDAS CON COLOMBINAS Y CINTA PREVENTIVA

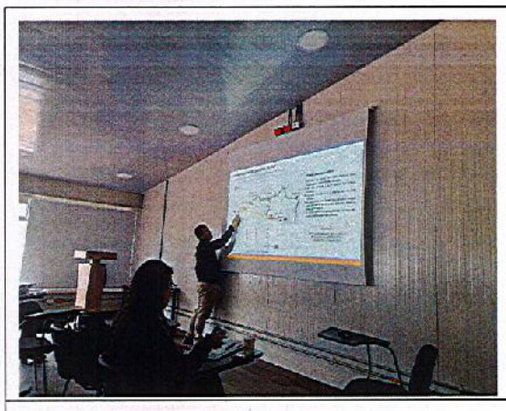

SOCIALIZACION PMT CON INDUSTRIAS DE FLORES

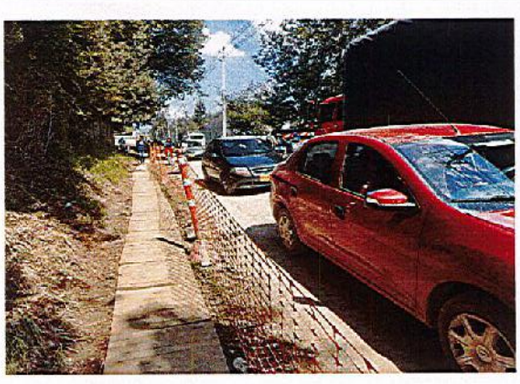

IMPLEMENTACION PASO PEATONAL TRAMO 2



CIERRE VIAL CON PASACALLE INFORMATIVO TRAMO 1


DEVELCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRA DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA: INTERVENTOR:	CONSORCIO VIA LA FUENTE CONSORCIO DEL ABRA


INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

NOTA: Se adjunta evidencia fotografica de la gestión por parte de interventoría. El contratista no adjunta evidencia de estos hallazgos cerrados sin embargo en obra se ha visto algunos subsanados.

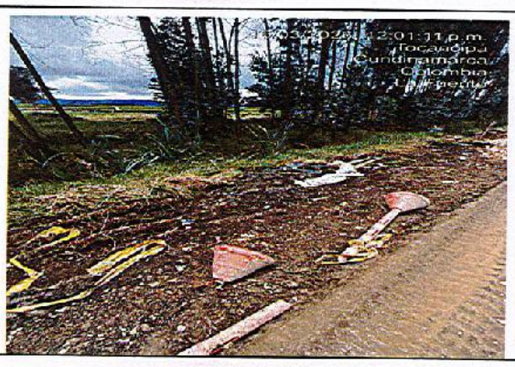


Residuos mal dispuestos

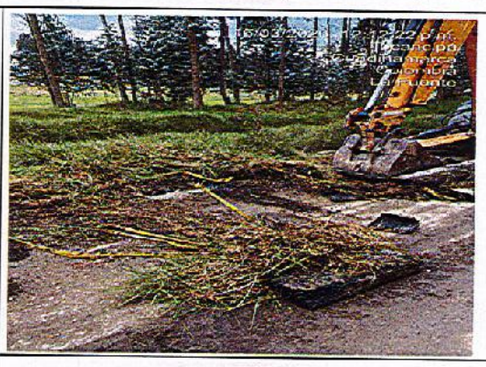


Residuos mal dispuestos




Señalizaciones caidas

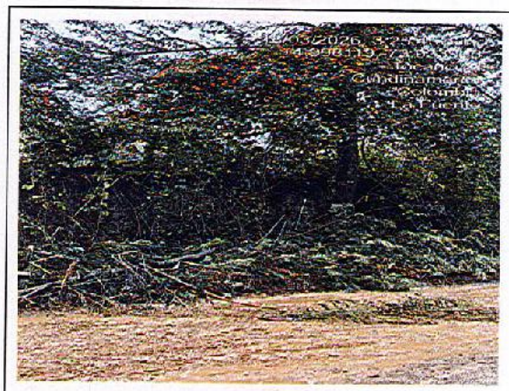

Residuos orgánicos mal dispuestos

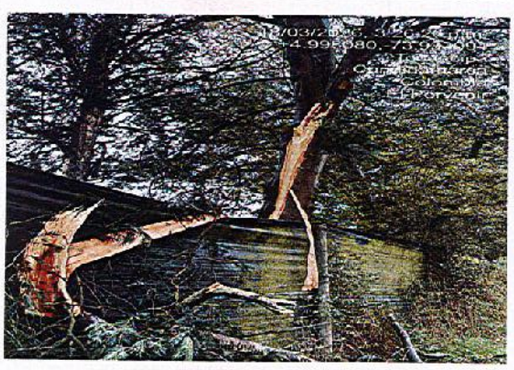

Afectación a arboles con maquinaria

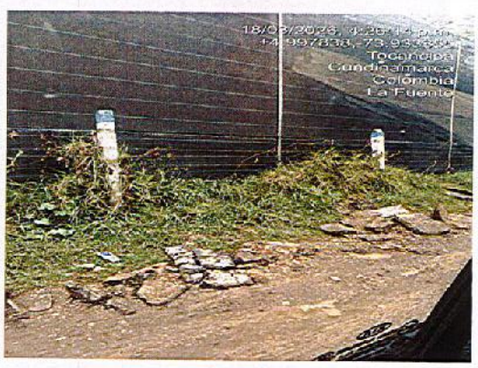

Residuos de escombro




Volquetas sin cubrir




Material granular sin cubrir



Residuos al aire libre

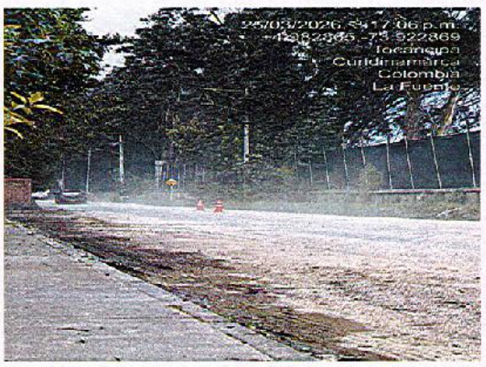

Emision de Material particulado

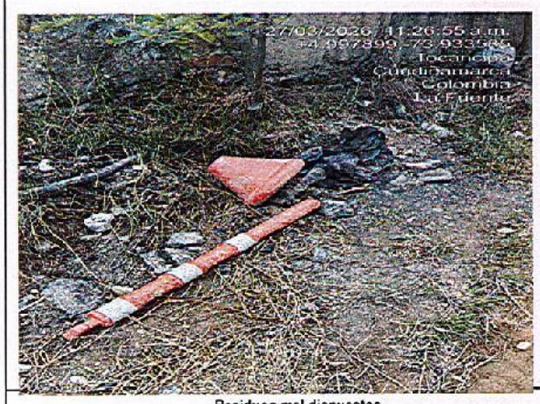

Residuos mal dispuestos



Residuos mal dispuestos



Señalización caida




Plásticos para retiro

DETERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:


OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPA- ZIPAQUIRA DESDE EL PUENTE RIO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LA FUENTE
		INTERVENTOR:	CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO: PLAN DE MANEJO SOCIAL

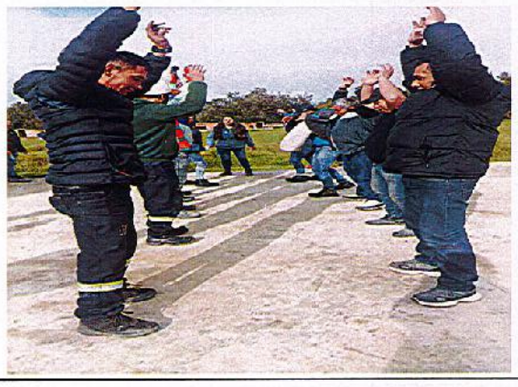

INTEGRACION PERSONAL

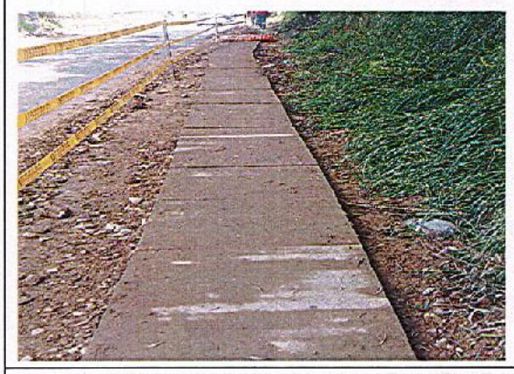

MEJORAMIENTO PASOS PEATONALES EN PRO DE LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD




REUNION FLORES LA MANA



SOCIALIZACION VIAS ALTERNAS



REUNION FLORES PRISMA

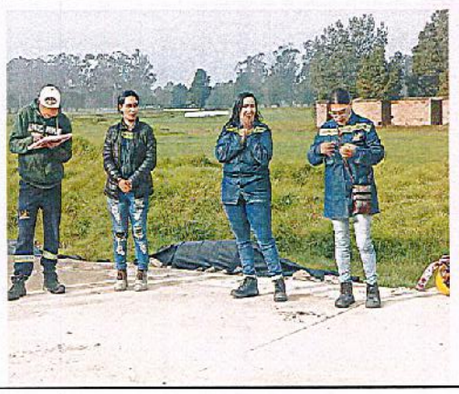


CAPACITACION PERSONAL

DETERCONSA	INFORME DE INTERVENTORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CONSORCIO DEL ABRA	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA: INTERVENTOR:	CONSORCIO VIA LA FUENTE CONSORCIO DEL ABRA

INFORME No.	1	MES N°	1	DEL:	16/03/2026	AL:	31/03/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO AMBITO SST Y AMBIENTAL - INTERVENTORIA

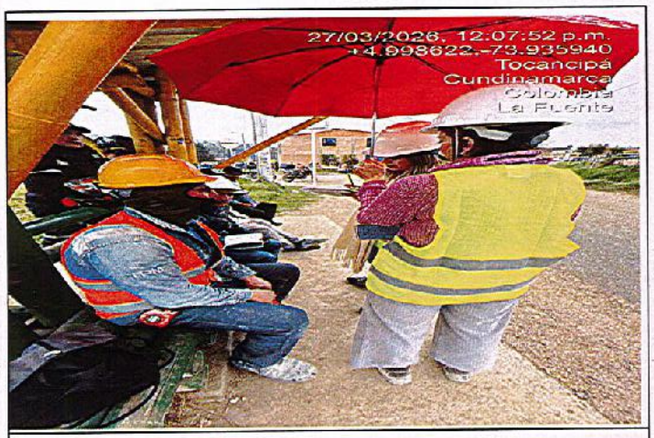

Uso adecuado de elementos de protección personal



Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo - Interventoria




Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y ambientales - Interventoria



Uso adecuado de elementos para señalización



Revisión señalización

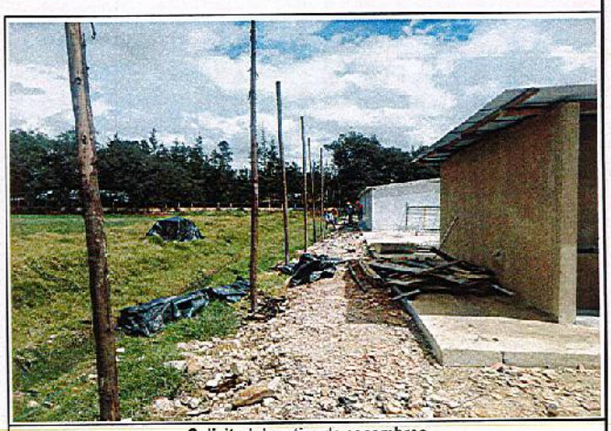

Solicitud de retiro de escombros

CONSORCIO DEL ABRA
INTERVENTORIA VIAL
NIT 902.026.889-5

ANEXO No. 4

SEGUIMIENTO DEL CLIMA

DETERCONSA
TOCANCIPÁ

SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CLIMA

CODIGO:	
VERSION:	
FECHA:	

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO MARCO No.:	CTOINT 017 MT 2025	PROYECTO No.:	1	PERIODO	
CONTRATO DE OBRA No.:	DTC-IA-14- 2026	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	DTC-IP-18- 2026	DESDE	16/03/2026
NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO VIA LA FUENTE	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO DEL ABRA	HASTA	31/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		

HORAS/DÍA DEL MES MARZO


ESTADO DEL TIEMPO	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		TOTAL HORAS
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
SECO	4,0	4,0	4,0	4,0	-		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				-		4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,5		2,0	1,0			4,0	4,0	4,0	4,0	80,50
NUBLADO	-		-		-						-					-		1,0						5,0									6,00
LLUVIOSO		-	-	-	4,0	4,0		-							-	-	-	1,0		-			1,5		2,0			-		-		12,50
		8,0		8,0		8,0		8,0		8,0		4,0		-		-		9,0		8,0		8,0		9,0		5,0		-		8,0		8,0	99,00

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		TOTAL HORAS
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
																															-
																															-
																															-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

	TOTAL	
	MAÑANA	TARDE
SECO	44,5	36,0
NUBLADO	-	6,0
LLUVIOSO	7,5	5,0
	52,0	47,0

GUILLERMO CAICEDO NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-111203 CND

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EN EL MES DE MARZODE 2026

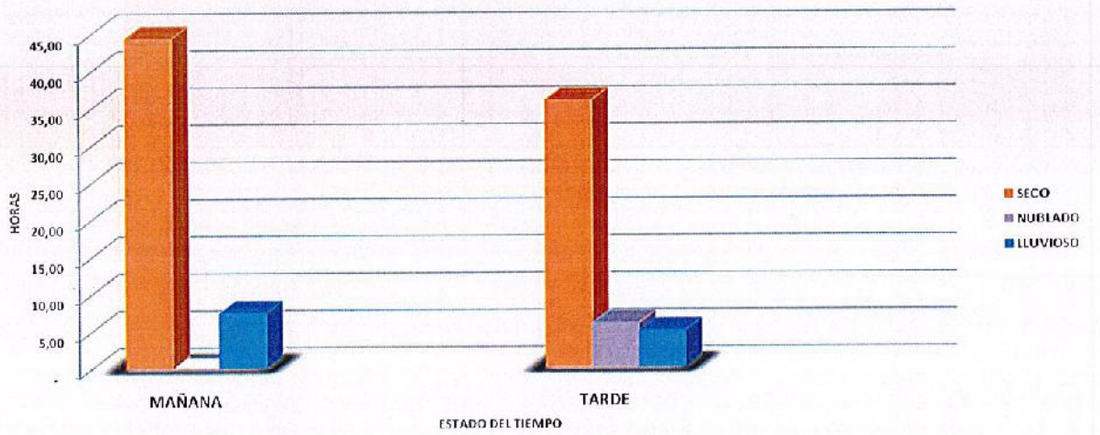

* EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

CONSORCIO DEL ABRA
INTERVENTORIA VIAL
NIT 902.026.889-5

ANEXO No. 5

RESULTADOS DE LABORATORIO

DETERCONSA TOCANCIPA	CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO	MUNICIPIO DE TOCANCIPA TRADICIÓN Y PROGRESO	CODIGO: VERSION: FECHA:

CONTRATO MARCO No. CTOINT 017 MT 2025	PROYECTO No.	1

CONTRATO DE OBRA No. DTC-IA-14- 2026 OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. DTC-IP-18- 2026 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PERIODO: 16 al 31 de Marzo 2026

Fecha	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados	Análisis de Resultados	
						C/I*		Cumple S/N	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple la especificación
26/03/2026	RAJON	DEGRADACION DE AGREGADOS POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES	ACOPIO	INGEOTEC N&L S.A.S.	INV E 2-219-13	I	77,7%	N	SITIO DE PRESTAMO: CANTERA CUCHARO - SUTATAUSA. ✓ De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados por la Interventoría, el material utilizado como rajón proveniente de las canteras Argatrans y el Chucaro no puede ser instalado en el proyecto, razón por la cuál la Interventoría le solicitó al Contratista no continuar con la colocación de este material mediante comunicado CDA-043-2026 de fecha 31/03/2026, hasta tanto no llegara un material rajón que cumpliera con las Especificaciones Generales de Construcción INVIAS 2022.
26/03/2026	RAJON	DEGRADACION DE AGREGADOS POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES	ACOPIO	INGEOTEC N&L S.A.S.	INV E 2-219-13	I	65,2%	N	SITIO DE PRESTAMO: CANTERA ARGATRANS - TOCANCIPA. De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados por la Interventoría, el material utilizado como rajón proveniente de las canteras Argatrans y el Chucaro no puede ser instalado en el proyecto, razón por la cuál la Interventoría le solicitó al Contratista no continuar con la colocación de este material mediante comunicado CDA-043-2026 de fecha 31/03/2026, hasta tanto no llegara un material rajón que cumpliera con las Especificaciones Generales de Construcción INVIAS 2022.
30/03/2026	RAJON	DEGRADACION DE AGREGADOS POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES	ACOPIO	SANCHEZ FISCHER INGENIERIA S.A.S.	INV E 2-219-13	I	85,6%	N	SITIO DE PRESTAMO: CANTERA CUCHARO - SUTATAUSA. De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados por la Interventoría, el material utilizado como rajón proveniente de las canteras Argatrans y el Chucaro no puede ser instalado en el proyecto, razón por la cuál la Interventoría le solicitó al Contratista no continuar con la colocación de este material mediante comunicado CDA-043-2026 de fecha 31/03/2026, hasta tanto no llegara un material rajón que cumpliera con las Especificaciones Generales de Construcción INVIAS 2022.

DETERCONSA TOCANCIPA	CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO	MUNICIPIO DE TOCANCIPA TRADICIÓN Y PROGRESO	CODIGO: VERSION: FECHA:

CONTRATO MARCO No. CTOINT 017 MT 2025	PROYECTO No.	1

CONTRATO DE OBRA No. DTC-IA-14- 2026 OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. DTC-IP-18- 2026 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PERIODO: 16 al 31 de Marzo 2026

30/03/2026	RAJON	DEGRADACION DE AGREGADOS POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES	ACOPIO	SANCHEZ FISCHER INGENIERIA S.A.S.	INV E 2-219-13	I	87,5%	N	SITIO DE PRESTAMO: CANTERA ARGATRANS - TOCANCIPA. De acuerdo a los resultados de labcratorio realizados por la Interventoría, el material utilizado como rajón proveniente de las canteras Argatrans y el Chucaro no puede ser instalado en el proyecto,razón por la cuál la Interventoría le solicitó al Contratista no continuar con la colocación de este material mediante comunicado CDA-043-2026 de fecha 31/03/2026, hasta tanto no llegara un material rajón que cumpliera con las Especificaciones Generales de Construcción INVIAS 2022.

Se anexan resultados ensayos

NOMBRE: EDGAR RICARDO NIVIA NIVIA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: GUILLERMO CAICEDO NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LABORATORIO

ENTREGA DE RESULTADOS

kiwa >CQR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

30 de marzo de 2026 Chia Cundinamarca

Ingeniero.(a)
Ing. Sr consorcio del abra

Codigo de Obra 2806
Paginas. 1 de 3
Informe de obra S-01

CONSORCIO DEL ABRA CONTRATO DTC-IP-18-2026
Obra: Rehabilitación de la via tocancipa a zipaquira desde puente rio bogota hasta el municipio de tocancipa.
Dirección: Via zipaquira a tocancipa.
Estimado(a) Ingeniero(a):

Reciba un cordial saludo, en nombre de Sanchez Fischer Ingenieria S.A.S

Anexo encontrará el Informe de resultados correspondiente a las muestras traidas al laboratorio por el contratante. con nombre de obra. Rehabilitación de la via tocancipa a zipaquira desde puente rio bogota hasta el municipio de to

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

La identificación de las muestras fue suministrada por el cliente

Muestra N° :	M-01
Descripción:	Rehabilitación de la via tocancipa a zipaquira desde puente rio bogota hasta el municipio de tocancipa.
Fuente:	Material Rajon de color Rojiso
Fecha de recepción:	Cantera EL CUCHARO - SUTATAUSA.
Orden de compra/trabajo:	28-03-2026
	1825

A continuacion Realizamos una descripción de los ensayos solicitados por el cliente.

NOMBRE DEL ENSAYO	NORMA
DEGRADACIÓN DE AGREGADOS POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.	INV E 219-13

NOTAS ACLARATORIAS

Este informe se refiere exclusivamente a los resultados obtenidos del análisis realizado a las muestras relacionadas anteriormente; por tanto estos resultados no pueden ser asociados a otras muestras así sean de la misma fuente.

Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación por escrito de SANCHEZ FISCHER INGENIERIA S.A.S.

El Laboratorio no es responsable del muestreo de los materiales suministrados para su evaluación.

Ing. Wilmar ~~Fredy Sierra~~ Gil
Director Técnico

Km 2 vía Chía-Cota vereda Cerca de Piedra Casa Lucena del Cid. Tel. 8856523-8633845-cel 317 657 4824
e-mail: gestiontecnica.sfb@gmail.com

110

SANCHEZ FISCHER INGENIERÍA S.A.S

kiwa >CQR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No CERTIFICADO SG-2024001110

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES. I.N.V-E 218-219-13.

Fecha versión: 13/02/20
Versión: 3
FO-OPE -08
Página 2 de 3
2806

COMPAÑIA:	**CONSORCIO DEL ABRA CONTRATO DTC-IP-18-2026**		
CIUDAD OFIC:	**Villavicencio.**	ORDEN DE TRABAJO	**1825**
DIRECCIÓN OFIC:	**Calle 46 # 29A-15**	FECHA RECEPCIÓN	**28/03/2026**
CONTACTO OBRA:	**Ing. Sr consorcio del abra**	FECHA DE ENSAYO	**30/03/2026**
NOMBRE OBRA:	**Rehabilitación de la via tocancipa a zipaquira desde puente ri**	INFORME DE OBRA	**S-01**
DIRECCIÓN OBRA:	**Via zipaquira a tocancipa.**		

DATOS	1
MUESTRA	**Granular**
DESCRIPCIÓN	**Piedra natural**
PROCEDENCIA	----
Gradación Usada	E-1
N° de Esferas	12
N° de Revoluciones	1000
Pa=Masa muestra seca antes del ensayo (g)	10010,7
Pb=Masa muestra seca después del ensayo y lavada sobre Tamiz 1,70 mm (g)	1443,5
% Desgaste	**85,6**

DESCRIPCIÓN Y MUESTRA : SUELO DE CANTERA, GRAVAS ANGULARES

-	-	**Masa utilizada en cada tamiz retenido.**				
---	---	---	3" - 75 mm	2½" - 63 mm		**2504,2**
---	---	---	2½" - 63 mm	2" - 50 mm		**2501,3**
---	---	---	2" - 50 mm	1½" - 37,5 mm		**5005,2**
---	---	---				
---	---	**Masa Total utilizada en el ensayo.**				**10010,7**

TAMAÑOS				MASA Y GRANULOMETRÍA DE LA MUESTRA						
				TABLA-218,1				TABLA-219,2		
PASA		RETENIDO		A	B	C	D	E-1	F-2	G-3
(mm)	Pulg(#)	(mm)	Pulg(#)							
76,1	3"	64,0	2-2½"							
64,0	2-2½"	50,8	2"					2500 ± 50		
50,8	2"	38,1	1-1½"					2500 ± 50		
38,1	1-1½"	25,4	1"	1250 ± 25				5000 ± 50	5000 ± 50	
25,4	1"	19,0	3/4"	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25
19,0	3/4"	12,7	1/2"	1250 ± 10	2500 ± 10					5000 ± 25
12,7	1/2"	9,5	3/8"	1250 ± 10	2500 ± 10					
9,5	3/8"	6,4	1/4"			2500 ± 10				
6,4	1/4"	4,8	(#4)			2500 ± 10				
4,8	(#4)	2,4	(#8)				5000 ± 10			
No. de esferas				12	11	8	6	12	12	12
No. de revoluciones				500	500	500	500	1000	1000	1000

OBSERVACIONES: **NINGUNA.**

Elaboró: _____
René Guarnizo Quintero
Coordinador Técnico

Aprobó: _____
Ing. Wilmar Fredy Sierra
Director Técnico

SÁNCHEZ FISCHER INGENIERÍA S.A.S

kiwa COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No CERTIFICADO SG-2024001110

Fecha versión: 2014-02-15	
REVISIÓN: VERSIÓN 2	
FO-OPE -23	
Hoja 3 de 3	
COD DE OBRA:	2806

REPORTE DE RESULTADOS FINALES

COMPAÑIA:	CONSORCIO DEL ABRA CONTRATO DTC-IP-18-2026		
CIUDAD OFIC:	---	ORDEN DE TRABAJO	1825
DIRECCIÓN OFIC:	---	FECHA RECEPCIÓN	28/03/2026
CONTACTO OBRA:	Ing. Sr consorcio del abra	INFORME DE OBRA	S-01
NOMBRE DE OBRA:	Rehabilitación de la via tocancipa a zipaquira desde puente rio b	FECHA DE ENTREGA	30/03/2026
DIRECCIÓN DE OBRA:	Via zipaquira a tocancipa.		

NOMBRE DEL ENSAYO EVALUADO	Norma Técnica Aplicada	Especificación	Resultado del Ensayo	Aceptación (Cumple/ No cumple)
ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN.		**suelos seleccionados**		
RELACIONES HUMEDAD PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS ENSAYO MODIFICADO				
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO.				
Tabla 311 — 2. Franjas granulométricas del material de suelo seleccionado				
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS				
PERDIDA EN % SOBRE LAVADO TAMIZ 75 mm # 200				
LIMPIEZA (F)				
Límite líquido, máximo (%).				
Índice de Plasticidad (%).				
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%).				
Contracción lineal.	E-127 / E-129	tabla 311-3	---	---
DUREZA (O)				
Desgaste en la máquina de Los Ángeles a quinientas (500) revoluciones (Granulometría A), máximo (%):	E-218	---	---	---
- NT1 Clase - C		50%	85,6%	No Cumple
- NT2 Clase - B		30%	----	----
- NT3 Clase - A		30%	----	----
DURABILIDAD (O)				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) (Nota):	E-220	----	----	----
- Sulfato de sodio			----	----
- Sulfato de magnesio			----	----
RESISTENCIA DEL MATERIAL (F)				
CBR (%): porcentaje asociado al grado de compactación mínimo especificado (numeral 311.5.2.2.2); el CBR se debe medir sobre muestras sometidas previamente a cuatro días (4 d) de inmersión.	E-148		----	----

OBSERVACIONES:

Elaboró: René Guarnizo Quintero
Coordinador Técnico

Aprobó: Ing. Wilmar Fredy Sierra
Director Técnico

Km 2 vía Chía-Cota vereda Cerca de Piedra Casa Lucena del Cid. Tel. 8856523-8633845-cel 317 657 4824
e-mail: gestiontecnica.sfb@gmail.com

**** FIN DEL INFORME ****

2023

LABORATORIO

ENTREGA DE RESULTADOS

kiwa >CQR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

30 de marzo de 2026 Chia Cundinamarca

Ingeniero.(a)
Ing. Sr consorcio del abra

Codigo de Obra 2806
Paginas. 1 de 3
Informe de obra S-02

CONSORCIO DEL ABRA CONTRATO DTC-IP-18-2026
Obra: Rehabilitación de la via tocancipa a zipaquira desde puente rio bogota hasta el municipio de tocancipa.
Dirección: Via zipaquira a tocancipa.
Estimado(a) Ingeniero(a):

Reciba un cordial saludo, en nombre de Sanchez Fischer Ingenieria S.A.S

Anexo encontrará el Informe de resultados correspondiente a las muestras traidas al laboratorio por el contratante. con nombre de obra. Rehabilitación de la via tocancipa a zipaquira desde puente rio bogota hasta el municipio de to

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

La identificación de las muestras fue suministrada por el cliente

Muestra N° :	M-02 Rehabilitación de la via tocancipa a zipaquira desde puente rio bogota hasta el municipio de tocancipa.
Descripción:	Material Rajon de color amarillo
Fuente:	Cantera ARGATRANS - TOCANCIPA.
Fecha de recepción:	28-03-2026
Orden de compra/trabajo:	1825

A continuacion Realizamos una descripción de los ensayos solicitados por el cliente.

NOMBRE DEL ENSAYO	NORMA
DEGRADACIÓN DE AGREGADOS POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.	INV E 219-13

NOTAS ACLARATORIAS

Este informe se refiere exclusivamente a los resultados obtenidos del análisis realizado a las muestras relacionadas anteriormente; por tanto estos resultados no pueden ser asociados a otras muestras así sean de la misma fuente.

Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación por escrito de SANCHEZ FISCHER INGENIERIA S.A.S.

El Laboratorio no es responsable del muestreo de los materiales suministrados para su evaluación.

Ing. Wilmar Fredy Sierra Gil
Director Técnico

Km 2 vía Chía-Cota vereda Cerca de Piedra Casa Lucena del Cid. Tel. 8856523-8633845-cel 317 657 4824
e-mail: gestiontecnica.sfb@gmail.com

103

SÁNCHEZ FISCHER INGENIERÍA S.A.S

kiwa >CQR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No CERTIFICADO SG-2024001110

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES. I.N.V-E 218-219-13.

Fecha versión: 13/02/20	
Versión: 3	
FO-OPE -08	
Página 2 de 3	
2806	

COMPAÑIA:	CONSORCIO DEL ABRA CONTRATO DTC-IP-18-2026		
CIUDAD OFIC:	Villavicencio.		
DIRECCIÓN OFIC:	Calle 46 # 29A-15	ORDEN DE TRABAJO	1825
CONTACTO OBRA:	Ing. Sr consorcio del abra	FECHA RECEPCIÓN	28/03/2026
NOMBRE OBRA:	Rehabilitación de la via tocancipa a zipaquira desde puente ri	FECHA DE ENSAYO	30/03/2026
DIRECCIÓN OBRA:	Via zipaquira a tocancipa.	INFORME DE OBRA	S-02

DATOS	1
MUESTRA	Granular
DESCRIPCIÓN	Piedra natural
PROCEDENCIA	ARGA TRANS - TOCANCIPA.
Gradación Usada	E-1
N° de Esferas	12
N° de Revoluciones	1000
Pa=Masa muestra seca antes del ensayo (g)	10005,6
Pb=Masa muestra seca después del ensayo y lavada sobre Tamiz 1,70 mm (g)	1255,6
% Desgaste	87,5

DESCRIPCIÓN Y MUESTRA : SUELO DE CANTERA, GRAVAS ANGULARES

-	-	**Masa utilizada en cada tamiz retenido.**				
---	---	---	3" - 75 mm	2½" - 63 mm	2½" - 63 mm	**2501,3**
---	---	---	2½" - 63 mm	2" - 50 mm	2" - 50 mm	**2503,1**
---	---	---	2" - 50 mm	1½" - 37,5 mm	1½" - 37,5 mm	**5001,2**
---	---	---				
---	---	**Masa Total utilizada en el ensayo.**				**10005,6**

TAMAÑOS PASA (mm)	TAMAÑOS PASA (Pulg(#))	TAMAÑOS RETENIDO (mm)	TAMAÑOS RETENIDO (Pulg(#))	A	B	C	D	E-1	F-2	G-3
76,1	3"	64,0	2-2½"							
64,0	2-2½"	50,8	2"					2500 ± 50		
50,8	2"	38,1	1-1½"					2500 ± 50		
38,1	1-1½"	25,4	1"	1250 ± 25				5000 ± 50	5000 ± 50	
25,4	1"	19,0	3/4"	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25
19,0	3/4"	12,7	1/2"	1250 ± 10	2500 ± 10					5000 ± 25
12,7	1/2"	9,5	3/8"	1250 ± 10	2500 ± 10					
9,5	3/8"	6,4	1/4"			2500 ± 10				
6,4	1/4"	4,8	(#4)			2500 ± 10				
4,8	(#4)	2,4	(#8)				5000 ± 10			
No. de esferas				12	11	8	6	12	12	12
No. de revoluciones				500	500	500	500	1000	1000	1000

MASA Y GRANULOMETRÍA DE LA MUESTRA
TABLA-218,1 | **TABLA-219,2**

OBSERVACIONES: **NINGUNA.**

Elaboró: _____
René Guarnizo Quintero
Coordinador Técnico

Aprobó: _____
Ing. Wilmar Fredy Sierra
Director Técnico

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma original de quien reviso y aprobó.

SÁNCHEZ FISCHER INGENIERÍA S.A.S

kiwa >CQR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No CERTIFICADO SC-2024001110

REPORTE DE RESULTADOS FINALES

Fecha versión: 2014-02-15	
REVISIÓN: VERSIÓN 2	
FO-OPE -23	
Hoja 3 de 3	
COD DE OBRA:	2806

COMPAÑIA:	CONSORCIO DEL ABRA CONTRATO DTC-IP-18-2026		
CIUDAD OFIC:	---		
DIRECCIÓN OFIC:	---	ORDEN DE TRABAJO	1825
CONTACTO OBRA:	Ing. Sr consorcio del abra	FECHA RECEPCIÓN	28/03/2026
NOMBRE DE OBRA:	Rehabilitación de la via tocancipa a zipaquira desde puente rio B	INFORME DE OBRA	S-02
DIRECCIÓN DE OBRA:	Via zipaquira a tocancipa.	FECHA DE ENTREGA	30/03/2026

NOMBRE DEL ENSAYO EVALUADO	Norma Técnica Aplicada	Especificación	Resultado del Ensayo	Aceptación (Cumple/ No cumple)
ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN.				
RELACIONES HUMEDAD PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS ENSAYO MODIFICADO		suelos seleccionados		
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO.				
Tabla 311 — 2. Franjas granulométricas del material de suelo seleccionado				
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS				
PERDIDA EN % SOBRE LAVADO TAMIZ 75 mm # 200				
LIMPIEZA (F)				
Límite líquido, máximo (%).				
Índice de Plasticidad (%).				
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%).				
Contracción lineal.			---	---
	E-127 / E-129	tabla 311-3	---	---
DUREZA (O)				
Desgaste en la máquina de Los Ángeles a quinientas (500) revoluciones (Granulometría A), máximo (%):	E-218	---	---	---
- NT1 Clase - C		50%	87,5%	No Cumple
- NT2 Clase - B		30%	---	---
- NT3 Clase - A		30%	---	---
DURABILIDAD (O)				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) (Nota):	E-220	---	---	---
- Sulfato de sodio			---	---
- Sulfato de magnesio			---	---
RESISTENCIA DEL MATERIAL (F)				
CBR (%): porcentaje asociado al grado de compactación mínimo especificado (numeral 311.5.2.2.2); el CBR se debe medir sobre muestras sometidas previamente a cuatro días (4 d) de inmersión.	E-148		---	---
OBSERVACIONES:				

Elaboró: _____
René Guarnizo Quintero
Coordinador Técnico

Aprobó: _____
Ing. Wilmar Fredy Sierra
Director Técnico

Km 2 vía Chía-Cota vereda Cerca de Piedra Casa Lucena del Cid. Tel. 8856523-8633845-cel 317 657 4824
e-mail: gestiontecnica.sfb@gmail.com

**** FIN DEL INFORME ****

2026

INGE@TEC N&L SAS

INGENIERÍA, GEOTECNIA Y CONTROL TÉCNICO

CONSTRUCCIÓN
CONSULTORÍA
GEOTECNIA
INTERVENTORIA
LABORATORIO DE SUELOS
CONCRETOS Y PAVIMENTOS

FECHA INFORME:	*06/03/2026*
FECHA ENSAYO:	*06/03/2026*
PROYECTO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ – ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*
DIRIGIDO:	*CONSORCIO DEL ABRA*
PROCEDENCIA:	*CANTERA ARGATRANS (TOCANCIPA)*
MUESTRA	*MATERIAL TIPO RAJÓN*

DESCRIPCION DEL MATERIAL: *Rocas de forma angular, color amarillo, con visos color gris,*

RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (3 /4") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES NORMA INV E- 219-13

Pasa tamiz		Retenido en tamiz		Pesos y granulometrías de la muestra para ensayo (gramos)			
mm	(alt.)	mm	(alt.)	1	2	3	
75	(3")	63	(2½")				
63.00	(21/2")	50	(2")	2500 ± 50			
50.00	(2")	37.5	(1½")	2500 ± 50	5000 ± 50		
37.50	(1½")	25	(1")	5000 ± 50	5000 ± 25	5000 ± 25	
25.00	(1")	19	(3/4")			5000 ± 25	
TOTALES				10000± 100	10000± 75	10000 ± 50	

COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ANGELES

Gradación utilizada: 1
Numero de esferas: 12
N° Revoluciones 10000

$$\%Desgaste = \frac{[P1 - P2]}{P1} x100$$

P1	*P2*	*DESGASTE %*
10072	*3508*	*65.2*

ESPECIFICACION INVIAS:	*TIPO DE MATERIAL*	*RANGO DE CUMPLIMIENTO*	OBSERVACIONES
ARTICULO 330-13	*BASE GRANULAR*	*40% MAX*	
ARTICULO 320-13	*SUBBASE GRANULAR*	*50% MAX*	
ARTICULO 311-13	*AFIRMADO*	*50% MAX*	
ARTICULO 221 13	*PEDRAPLENES (RAJÓN)*	*50% MAX*	NO CUMPLE

INGEOTEC N&L S.A.S.
NIT 901.012.954-1

ING. FABIAN ANDRES PIRACOCA
TP 15202-376146 BYC

ING. GERMAN ANDRES GARCIA
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Calle 17 N° 4 – 65, Tocancipa Cundinamarca
cel: 3142232920-3208895533
Email: ingeotec.nlsas@gmail.com

INGEOTEC N&L SAS.
INGENIERÍA, GEOTECNIA Y CONTROL TÉCNICO

CONSTRUCCIÓN
CONSULTORÍA
GEOTECNIA
INTERVENTORIA
LABORATORIO DE SUELOS
CONCRETOS Y PAVIMENTOS

FECHA INFORME:	*06/03/2026*
FECHA ENSAYO:	*06/03/2026*
PROYECTO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ – ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*
DIRIGIDO:	*CONSORCIO DEL ABRA*
PROCEDENCIA:	*CANTERA EL CUCHARO (VEREDA CONCUBITA - SUTATAUSA)*
MUESTRA	*MATERIAL TIPO RAJÓN*

DESCRIPCION DEL MATERIAL: *Rocas arenosas de forma angular, color rojizo, con visos habanos y gris,*

RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (3 /4") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES NORMA INV E- 219-13

Pasa tamiz		Retenido en tamiz		Pesos y granulometrías de la muestra para ensayo (gramos)			
mm	(alt.)	mm	(alt.)	1	2	3	
75	(3")	63	(2½")				
63.00	(21/2")	50	(2")	2500 ± 50			
50.00	(2")	37.5	(1½")	2500 ± 50	*5000 ± 50*		
37.50	(1½")	25	(1")	5000 ± 50	*5000 ± 25*	5000 ± 25	
25.00	(1")	19	(3/4")			5000 ± 25	
TOTALES				10000± 100	10000± 75	10000 ± 50	

COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ANGELES

Gradación utilizada: 1
Numero de esferas: 12
N° Revoluciones 10000

$$\%Desgaste = \frac{[P1 - P2]}{P1} x100$$

P1	*P2*	*DESGASTE %*
10072	*2245*	*77.7*

ESPECIFICACION INVIAS:	*TIPO DE MATERIAL*	*RANGO DE CUMPLIMIENTO*	OBSERVACIONES
ARTICULO 330-13	*BASE GRANULAR*	*40% MAX*	
ARTICULO 320-13	*SUBBASE GRANULAR*	*50% MAX*	
ARTICULO 311-13	*AFIRMADO*	*50% MAX*	
ARTICULO 221 13	*PEDRAPLENES (RAJÓN)*	*50% MAX*	NO CUMPLE

INGEOTEC N&L S.A.S.
NIT 901.012.954-1

ING. FABIAN ANDRES PIRACOCA
TP 15202-376146 BYC

ING. GERMAN ANDRES GARCIA
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Calle 17 N° 4 – 65, Tocancipa Cundinamarca
cel: 3142232920-3208895533
Email: ingeotec.nlsas@gmail.com

CONSORCIO DEL ABRA
INTERVENTORIA VIAL
NIT 902.026.889-5

ANEXO No. 6

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

DETERCONSA	INFORME SEMANAL DE AVANCE	CODIGO: VERSION: FECHA

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	1	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	22/03/2026	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRA DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,65%
DESDE	16/03/2026		% AVANCE SEMANA
HASTA	22/03/2026		1,65%

CONTRATO MARCO No.	CTOINT 017 MT 2025		PROYECTO No.	1		% DE AVANCE TENIENDO EN CUENTA EL AIU			
CONTRATO DE OBRA No.	DTC-IA-14- 2026	VALOR	$ 55.340.429.151,00	PLAZO	21 MESES	FECHA DE INICIO	16/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/12/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	DTC-IP-13- 2026	VALOR	$ 4.352.942.995,00	PLAZO	22 MESES	FECHA DE INICIO	16/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/01/2028

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	%
	AJUSTE A DISEÑOS	GI	1,00	$ 317.440.000,00		0,00%	-	0,00%
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PARA 21 MESES	GI	1,00	$ 541.614.375,00		0,00%	-	0,00%
1,1	TRAZADO LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	Km	6,08	$ 4.493.736,00	0,870	14,31%	1,720	28,29%
1,2	CAMPAMENTOS TEMPORALES DEL CONTRATISTA	GI	5,00	$ 2.892.267,00	0,620	12,40%	0,500	10,00%
1,6	DESCAPOTE MECANICO Y LIMPIEZA HASTA E=20 CM (INCLUYE TRANSP)	M3	42071,35	$ 2.058,00	-	0,00%	69.120	0,16%
1,7	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM	M2	34987,18	$ 7.811,00	744,410	2,13%	4.200.000	12,00%
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M3	41310,95	$ 25.703,00			2.413.260	5,84%
2,4	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION, CANALES, PRESTAMOS	M3/KM	1021248,21	$ 1.735,00			28.955,890	2,84%
3,1	RAJÓN SELECCIONADO	M3	13804.00	$ 170.200,00			1.580,000	12,17%
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T2400 (ESTABILIZACION, FILTRO,	M2	55793.95	$ 12.900,00			4.200,000	7,50%
4,1	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	10551.18	$ 189.042,00			1.050.00	9,95%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)

TECNICAS: - Levantamiento topografico, geo referenciando, estableciendo cotas, con el fin de realizar trazado vial y perfiles longitudinal y transversal, y la posible afectacion de predios.
- Implementacion de PMT autorizado, instalance señales verticales y pasacalles informativos, junto con su socializacion a la cual asistieron representantes de empresas y colegios y demas ciudadania.
- Se inicio con el fresado del pavimento existente, disponiendo el material en sitio autorizado, además de la construcción del campamento en inmediaciones de la obra.

ADMINISTRATIVAS: - Trámite de certificados de caracterización de agregados pétreos, permisos ambientales de explotación y documentación de maquinaria y volquetas a emplear en el proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA***
(CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO)

TECNICAS: • Verificación del levantamiento topografico, chequeando la materializacion de los puntos de referencia como placas, abscisado y cotas.
• Acompañamiento en las socializaciones de PMT y acercamiento con los propietarios de predios localizados a lo largo del corredor vial.
• Solicitud de documentación referente a la calidad de los agregados pétreos según las especificaciones técnicas, documentación del personal que laborara en el proyecto, junto con la maquinaria a emplear.

JURIDICO: • Verificación de la actualización de pólizas según acta de inicio.

FINANCIERO: • Chequeo del presupuesto, analisis de precios unitarios, cronograma de actividades y plan de inversiones semanal.

SOCIAL: Oficios y Revisión del Plan de Gestión Social(PGSO): • Revisión y Ajuste al Plan de Gestion Social (PGSO) y a los formatos de calidad, segun sugerencias previas.
• Elaboracion de oficios al consorcio Vía la fuente con copia a Deterconsa, segun hallazgos Revisión y aprobación de Actas de Inicio, Actas de Reunión y Formatos de recepción de firmas.

Participacion en Comités y Reuniones: • Reunión de socialización de diseños y PMT en la empresa Flores La Maria (17 y 20 de marzo)
• Reunión en la empresa Falcon Farms "La Niña de Mis Ojos" (19 de marzo)


Socialización y Prevención: • Digitalización de Circular N°1 para socialización en instituciones educativas aledañas a la obra(Se entrega a la gestora social del contratista).
• Orientación y acompañamiento a la comunidad en general sobre restricciones y operaciones de obra.

Recorridos y reconocimientos: • Recorridos diarios en los frentes habilitados en pro de evidenciar hallazgos y sugerir los ajustes respectivos y/o pertinentes.
• Reconocimiento de predios y socialización de avances con representantes de predios intervendos-Socialización en las vías alternas con los propietarios de los predios, en el cual se les informa los cierres viales dados por la ejecución de la obra con acompañamiento de la gestora social del contratista.

AMBIENTAL: • Participación en comites tecnicos de seguimiento de proyecto.
• Revisión detallada del Plan de Manejo Ambiental (PMA), con la formulación de observaciones técnicas para su ajuste.
• Realización de visitas de inspección a obra en los frentes uno y dos.
• Identificación de hallazgos ambientales durante las visitas de campo y notificación formal al contratista para su respectiva subsanación.
• Ejecución de reconocimiento predial con el fin de identificar posibles impactos ambientales asociados al proyecto.
• Elaboración y remisión de oficios y/o comunicados dirigidos al contratista.
• Solicitud formal al contratista de la documentación requerida, necesaria para el seguimiento ambiental, la cual debe ser presentada de manera progresiva conforme al avance de la obra.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST): • Se realiza recorrido en campo para la inspeccion y verificacion de los dos frentes de trabajo.
• Se brindan recomendaciones al contratista sobre las actividades que se están ejecutando en obra, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Se verifica en campo la necesidad de contar con un punto móvil de emergencia e hidratación, con el fin de garantizar el bienestar y la integridad laboral del personal.
• Elaboración y remisión de oficios y/o comunicados dirigidos al contratista.
• Acompañamiento en campo para la identificación de riesgos y peligros, así como la emisión de recomendaciones a los colaboradores sobre sus condiciones laborales.
• Revision de documentación enviada del personal operativo.

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

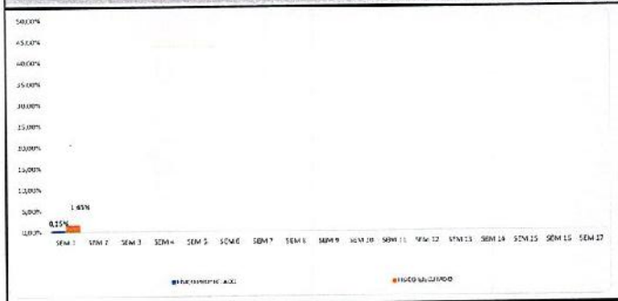

PERIODO	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO		
	FÍSICO PROYECTADO	FÍSICO EJECUTADO	DIFERENCIA	FINANCIERO PROYECTADO	FINANCIERO EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0,15%	1,65%	1,50%	$ 83.010.643,73	$ 913.312.080,99	$ 830.,06.437,27
SEM 2			0,00%			0,00%
SEM 3			0,00%			0,00%
SEM 4			0,00%			0,00%
SEM 5			0,00%			0,00%
SEM 6			0,00%			0,00%
SEM 7			0,00%			0,00%
SEM 8			0,00%			0,00%
SEM 9			0,00%			0,00%
SEM 10			0,00%			0,00%
SEM 11			0,00%			0,00%
SEM 12			0,00%			0,00%
SEM 13			0,00%			0,00%
SEM 14			0,00%			0,00%
SEM 15			0,00%			0,00%
SEM 16			0,00%			0,00%
SEM 17			0,00%			0,00%

DETERCONSA TOCANCIPA	INFORME SEMANAL DE AVANCE	CODIGO: VERSION: FECHA:

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	1	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	22/03/2026	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPA- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RIO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,65%
DESDE	15/03/2026		% AVANCE SEMANA
HASTA	22/03/2026		1,65%

CONTRATO MARCO No.	DTOINT 017 MT 2025		PROYECTO No.	1		% DE AVANCE TENIENDO EN CUENTA EL AIU			
CONTRATO DE OBRA No.	DTC-IA-14- 2026	VALOR	$ 55.340.429.151,00	PLAZO	21 MESES	FECHA DE INICIO	15/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/12/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	DTC-P-18- 2026	VALOR	$ 4.352.942.995,00	PLAZO	22 MESES	FECHA DE INICIO	15/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/01/2028


REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Socialización del proyecto y PMT



Implementación PMT



Construccion campamento



Fresado de asfalto existente




Implementacion PMT



Fresado de asfalto existente



Humectación sectores intervenidos



Socialización PMT

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR	1	RETRO LLANTA	2
RESIDENTE	1	VOLQUETA	10
INSPECTOR	1	EXCAVADORA	2
ASESOR SST	1	VIBROCOMPACTADOR	2
MAESTRO	0	FRESADORA	1
OFICIALES - TOPOGRAFOS	4	MEZCLADOR	0
AYUDANTES	4	BOMBA CONCRETO	0
OTROS	15	OTROS (MOVIL)	1

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
15/03/2026	-	8,00	NO
17/03/2026	-	8,00	NO
18/03/2026	4,00	4,00	SI
19/03/2026	-	8,00	NO
20/03/2026	-	8,00	NO
21/03/2026	-	4,00	NO
22/03/2026	-	-	(NO) DOMINGO
	4,00	40,00	

GRAFICO DE TIEMPO



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

TRAZADO LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
CAMPAMENTOS TEMPORALES DEL CONTRATISTA
DESCAPOTE MECANICO Y LIMPIEZA HASTA E=20 CM (INCLUYE TRANSP)
FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV DE EXPLANACION, CANALES PRESTAMOS
RAJON SELECCIONADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO,
SUBBASE GRANULAR CLASE A

DETERCONSA TOCANCIPA	INFORME SEMANAL DE AVANCE	CODIGO: VERSION: FECHA:

INFORMACION GENERAL

SEMANA No.	1	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	22/03/2026	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,65%
DESDE	16/03/2026		% AVANCE SEMANA
HASTA	22/03/2026		1,65%

CONTRATO MARCO No.	CTOINT 017 MT 2025		PROYECTO No.	1		% DE AVANCE TENIENDO EN CUENTA EL AIU			
CONTRATO DE OBRA No.	DTC-IA-14- 2026	VALOR	$ 55.340.429.151,00	PLAZO	21 MESES	FECHA DE INICIO	16/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/12/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	DTC-IP-18- 2026	VALOR	$ 4.352.842.995,00	PLAZO	22 MESES	FECHA DE INICIO	16/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/01/2028

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

-SE SOLICITA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (SEGÚN PLANO DE LOCALIZACION).
-TENER ESPECIAL CUIDADO CON LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LOS CULTIVOS DE FLORES Y RUTAS ESCOLARES QUE AFECTAN LA MOVILIDAD A DETERMINADAS HORAS.
-SE REQUIEREN LOS DOCUMENTOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE MATERIALES QUE SE VAN A INSTALAR PARA CONFORMAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
-PERMISOS DE LA CAR DE SANTERAS APROBADAS Y ESCOMBRERAS.
-REITERACION SOLICITUD DEL CERTIFICADO DEL SITIO QUE RECIBE EL FRESADO.
-IMPLEMENTACION DEL PMA, SG-SST, ADECUADAMENTE SE REQUIERE DEL PERSONAL PROPUESTO EN LA OBRA.
-SE REQUIERE RESIDENTES DE OBRA DE ACUERDO AL PERFIL PROPUESTO.
-APLICAR PLAN DE CALIDAD PROPUESTO Y QUE ESTA EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA, UNA VEZ APROBADO SE REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS.

ING. GUILLERMO CACEDO NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

No. MAT: 25202-11203

ING. MARIA ESPERANZA AMORTEGUI M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

No. MAT: 25202-82110

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

DETERCONSA TOCANCIPÁ	INFORME SEMANAL DE AVANCE	CODIGO VERSION FECHA:

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	2	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	22/03/2026	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	4,49%
DESDE	23/03/2026		% AVANCE SEMANA
HASTA	29/03/2026		2,84%

CONTRATO MARCO No.	CTOINT 017 MT 2025	PROYECTO No.	1		% DE AVANCE TENIENDO EN CUENTA EL AIU				
CONTRATO DE OBRA No.	DTC-A-14- 2026	VALOR	$ 55.340.429.151,00	PLAZO	21 MESES	FECHA DE INICIO	16/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/12/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	DTC-IP-18- 2026	VALOR	$ 4.352.942.995,00	PLAZO	22 MESES	FECHA DE INICIO	16/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/01/2028

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	%
	AJUSTE A DISEÑOS	Gl	1,00					
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PARA 21 MESES	Gl	1,00	$ 25.791.160,71	0,500	50,00%	0,500	50,00%
1,1	TRAZADO LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	Km	6,08	$ 4.493.736,00	0,870	14,31%	2,580	42,43%
1,2	CAMPAMENTOS TEMPORALES DEL CONTRATISTA	Gl	5,00	$ 2.892.287,00	0,620	12,40%	0,500	10,00%
1,6	DESCAPOTE MECANICO Y LIMPIEZA HASTA E=20 CM (INCLUYE TRANSP)	M3	42071,35	$ 2.038,00	-	0,00%	103,680	0,25%
1,7	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM	M2	34937,16	$ 7.811,00	744,410	2,13%	6.300,00	18,01%
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M3	41310,95	$ 25.703,00	1.059,260	2,56%	3.619,90	8,76%
2,4	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION, CANALES, PRESTAMOS	M3/KM	1021248,21	$ 1.735,00	-	0,00%	43.433,64	4,25%
3,1	RAJON SELECCIONADO	M3	13824,00	$ 170.200,00	-	0,00%	2.520,00	18,26%
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T2400 (ESTABILIZACION, FILTRO,	M2	55753,95	$ 12.900,00	0,141	0,00%	6.300,00	11,29%
4,1	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	10551,18	$ 159.042,00	0,141	0,00%	1.575,00	14,93%


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)

TECNICAS: • Levantamiento topográfico, geo referenciando, estableciendo cotas, con el fin de realizar trazado vial y perfiles longitudinal y transversal, y la posible afectacion de predios.
• Ajuste a los diseños teniendo en cuenta las variables geotecnicas, estudio de transito, topografia del corredor vial, hidraulica e hidrologia local para el manejo de aguas de escorrentia y niveles freaticos.
• Implementacion del PMT autorizado, instalando señales verticales y pasacalles informativos, junto con su socialización a la cual asistieron representantes de empresas y colegios y demas ciudadania, adecuando vias alternas para la circulacion de vehiculos sin contratiempos, teniendo en cuenta que son corredores un poco estrechos que dificultan el doble sentido en varios sectores.
• Continua el fresado del pavimento existente, disponiendo el material en sitio autorizado.
• Construcción del campamento en inmediaciones de la obra, adecuando baños y estructuras para el manejo de aguas residuales.
• Inicio de excavación mecanica de caja para estructura del pavimento según localización y niveles establecidos por la comision topográfica.
• Conformación de capa de mejoramiento en rajón con un espesor de 0.40 m.
• Instalacion de sello sobre capa de rajón con un espesor de 0.10 m.
• Suministro e instalación de geotextil T2400 (estabilización, filtro y separación).
• Suministro, extendida y compactación de SBG.
ADMINISTRATIVAS: • Trámite de certificados de caracterización de agregados pétreos, permisos ambientales de explotación y documentación de maquinaria y volquetas a emplear en el proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA***
(CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO)

TECNICAS: • Verificación del levantamiento topográfico, chequeando la materialización de los puntos de referencia como pilotas, abscisado y cotas.
• Acompañamiento en las socializaciones del PMT y acercamiento con los propietarios de predios localizados a lo largo del corredor vial.
• Solicitud de documentación referente a la calidad de los agregados pétreos según las especificaciones técnicas, documentación del personal que laborara en el proyecto, junto con la maquinaria a emplear.
• Revison a los ajustes de los diseños propuestos por el Consorcio Vía La Fuente, teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente y las implicaciones con propietarios de predios y usuarios de la v.a.
• Chequeo por parte de corrosión topográfica, con respecto al abscisado, anchos de vía, profundidad de las excavaciones con base en las secciones transversales y longitudinales propuestas, verificación de espesores conformados.
• Inspección visual de material peguete en acopio y toma de muestras para ser analizadas por laboratorio de suelos certificado y poder corroborar la caracterizacion de materiales con la documentación entregada por el contratista.
JURIDICO: • Verificación de la actualización de pólizas según acta de inicio.
FINANCIERO: • Chequeo del presupuesto, analisis de precios unitarios, cronograma de actividades y plan de inversiones semanal.
SOCIAL: Oficios y Revision del Plan de Gestión Social (PGSO) • Revision y ajuste al Plan de Gestion Social (PGSO) y a los formatos de calidad, segun sugerencias previas.
• Elaboracion de oficios al consorcio Vía La Fuente con copia a Deterconsa, segun hallazgos Revisión y aprobación de Actas de Inicio, Actas de Reunión y Formatos de recepción de firmas.
Participacion en Comités y Reuniones: • Reunión de socialización de diseños y PMT en la empresa Flores La Mana (17 y 20 de marzo)
• Reunion en la empresa Falcon Farms "La Niña de Mis Ojos" (19 de marzo)
Socializacion y Prevención: • Digitalización de Circular N°1 para socialización en instituciones educativas aledañas a la obra(Se entrega a la gestora social del contratista).
• Orientacion y acompañamiento a la comunidad en general sobre restricciones y operaciones de obra.
Recorridos y reconocimientos: • Recorridos diarios en los frentes habilitados en pro de evidenciar hallazgos y sugerir los ajustes respectivos y/o pertinentes.
• Reconocimiento de predios y socialización de avances con representantes de predios intervenidos-Socializacion en las vias alternas con los propietarios de los predios, en el cual se les informa los cierres viales dados por la ejecución de la obra con acompañamiento de la gestora social del contratista.
AMBIENTAL: • Participación en comites técnicos de seguimiento del proyecto.
• Revision detallada del Plan de Manejo Ambiental (PMA), con la formulacion de observaciones tecnicas para su ajuste.
• Realizacion de visitas de inspección a obra en los frentes uno y dos.
• Identificación de hallazgos ambientales durante las visitas de campo y notificación formal al contratista para su respectiva subsanacion.
• Ejecucion de reconocimiento predial con el fin de identificar posibles impactos ambientales asociados al proyecto.
• Elaboracion y remisión de oficios y/o comunicados dirigidos al contratista.
• Solicitud formal al contratista de la documentacion requerida, necesaria para el seguimiento ambiental, la cual debe ser presentada de manera progresiva conforme al avance de la obra.
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO(SST): • Se realiza recorrido en campo para la inspección y verificacion de los dos frentes de trabajo.
• Se brindan recomendaciones al contratista sobre las actividades que se están ejecutando en obra, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Se verifica en campo la necesidad de contar con un punto movil de emergencia e hidratación, con el fin de garantizar el bienestar y la integridad laboral del personal.
• Elaboración y remisión de oficios y/o comunicados dirigidos al contratista.
• Acompañamiento en campo para la identificación de riesgos y peligros, así como la emisión de recomendaciones a los colaboradores sobre sus condiciones laborales.
• Revision de documentacion enviada del personal operativo.

GRAFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

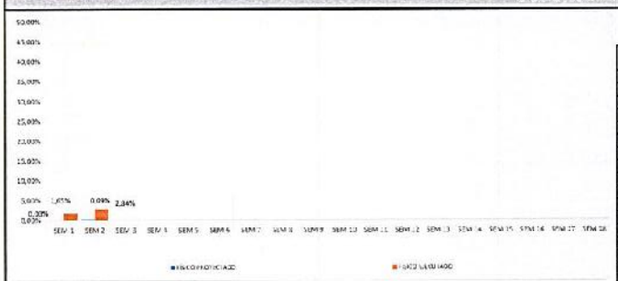

PERIODO	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO		
	FISICO PROYECTADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA	FINANCIERO PROYECTADO	FINANCIERO EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0,09%	1,65%	1,62%	$ 16.602.128,75	$ 313.317.280,99	$ 896.534.992,23
SEM 2	0,09%	2,84%	2,75%	$ 99.806.386,24	$ 1.571.668.187,89	$ 1.521.861.801,65
SEM 3			0,00%			$ -
SEM 4			0,00%			$ -
SEM 5			0,00%			$ -
SEM 6			0,00%			$ -
SEM 7			0,00%			$ -
SEM 8			0,00%			$ -
SEM 9			0,00%			$ -
SEM 10			0,00%			$ -
SEM 11			0,00%			$ -
SEM 12			0,00%			$ -
SEM 13			0,00%			$ -
SEM 14			0,00%			$ -
SEM 15			0,00%			$ -
SEM 16			0,00%			$ -
SEM 17			0,00%			$ -
SEM 18			0,00%			$ -


DETERCONSA TOCANCIPA	INFORME SEMANAL DE AVANCE	CODIGO VERSION FECHA

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	2	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	22/03/2026	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DE TOCANCIPA- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RIO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	4,49%
DESDE	23/03/2026		% AVANCE SEMANA
HASTA	29/03/2026		2,84%

CONTRATO MARCO No.	CTO INT 017 MT 2025		PROYECTO No.	1		% DE AVANCE TENIENDO EN CUENTA EL AIU			
CONTRATO DE OBRA No.	DTC-IA-14- 2026	VALOR	$ 55.340.429.151 ,00	PLAZO	21 MESES	FECHA DE INICIO	16/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/12/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	DTC-IP-18- 2026	VALOR	$ 4.352.942.395,00	PLAZO	22 MESES	FECHA DE INICIO	16/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/01/2028

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





CONSTRUCCION CAMPAMENTO



EXCAVACION CAJA PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO BAJO EL CONTROL DE TOPOGRAFIA EN TRAMO 2



EXCAVACION CAJA PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO BAJO EL CONTROL DE TOPOGRAFIA EN TRAMO 1




CONFORMACION DE MEJORAMIENTO EN RAJON e=0.40 m TRAMO 2



CONFORMACION DE MEJORAMIENTO EN RAJON e=0.40 m TRAMO 1





EXTENDIDA Y COMPACTADA DE SELLO SOBRE MEJORAMIENTO EN RAJON e=0.10 m TRAMO 2





INSTALACION DE GEOTEXTIL DE SEPARACION T2400 TRAMO 1 Y 2

INSTALACION DE SBG TRAMO 1 Y 2 e=0.25 m

RESAGO DE PAVIMENTO EXISTENTE TRAMO 1 Y 2

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR	1	RETRO LLANTA	2
RESIDENTE	1	VOLQUETA	10
INSPECTOR	1	EXCAVADORA	2
ASESOR SST	1	VIBROCOMPACTADOR	2
MAESTRO	0	FRESADORA	1
OFICIALES	0	MEZCLADOR	0
AYUDANTES	4	BOMBA CONCRETO	0
OTROS	20	OTROS (MOVIL)	1

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
22/03/2026	-	-	(NO) FESTIVO
24/03/2026	1,00	8,00	SI
25/03/2026	-	8,00	NO
26/03/2026	-	8,00	NO
27/03/2026	1,50	7,50	SI
28/03/2026	2,00	3,00	SI
29/03/2026	-	-	(NO) DOMINGO
	4,50	34,50	

GRAFICO DE TIEMPO



DETERCONSA TOCANCIPÁ	INFORME SEMANAL DE AVANCE	CODIGO VERSION FECHA

INFORMACIÓN GENERAL

		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
SEMANA No.	2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRA DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	4,49%
FECHA INFORME	22/03/2026		% AVANCE SEMANA
DESDE	23/03/2026		2,84%
HASTA	29/03/2026		

CONTRATO MARCO No.	CTOINT 017 MT 2025		PROYECTO No.	1		% DE AVANCE TENIENDO EN CUENTA EL AIU			
CONTRATO DE OBRA No.	DTC-IA-14- 2026	VALOR	$ 55.340.429.151,00	PLAZO	21 MESES	FECHA DE INICIO	16/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/12/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	DTC-IP-18- 2026	VALOR	$ 4.352.942.995,00	PLAZO	22 MESES	FECHA DE INICIO	16/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	15/01/2028

ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUENTE SEMANA

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PARA 21 MESES
TRAZADO LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
CAMPAMENTOS TEMPORALES DEL CONTRATISTA
DESCAPOTE MECANICO Y LIMPEZA HASTA E=20 CM (INCLUYE TRANSP)
FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS
RAJON SELECCIONADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO,
SUBBASE GRANULAR CLASE A

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

-SE SOLICITA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (SEGUN PLANO DE LOCALIZACION)
-TENER ESPECIAL CUIDADO CON LA MOVILIZACION DE PERSONAL DE LOS CULTIVOS DE FLORES Y RUTAS ESCOLARES QUE AFECTAN LA MOVILIDAD A DETERMINADAS HORAS
-SE REQUIEREN LOS DOCUMENTOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE MATERIALES QUE SE VAN A INSTALAR PARA CONFORMAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
-PERMISOS DE LA CAR DE CANTERAS APROBADAS Y ESCOMBRERAS
-REITERACION SOLICITUD DEL CERTIFICADO DEL SITIO QUE RECIBE EL FRESADO
-IMPLEMENTACION DEL PMA, SG-SST, ADECUADAMENTE. SE REQUIERE DEL PERSONAL PROPUESTO EN LA OBRA.
-SE REQUIERE RESIDENTES DE OBRA DE ACUERDO AL PERFIL PROPUESTO
-APLICAR PLAN DE CALIDAD PROPUESTO Y QUE ESTA EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA, UNA VEZ APROBADO SE REALIZARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS
-LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA HAN PROVOCADO SATURACIÓN EN LOS MATERIALES EXISTENTES O LOS RECIEN INSTALADOS AFECTANDO LA MOVILIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VIA.
-PROYECTAR LA ADECUACION DE DESCOLES QUE PERMITAN DRENAR EL AGUA LLUVIA HACIALOS VALLADOS EN TRAMO 1 Y MIRAR LA POSIBILIDAD DE CONFORMAR ALGUNOS CANALES TEMPORALES EN TRAMO 2 PARA RECOGER EL PRODUCTO DE LAS PRECIPITACIONES Y QUE NO SE AFECTE EL MATERIAL DISPUESTO AL ACUMULARSE EN EXCESO.

ING. GUILLERMO CAICEDO NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No. MAT: 25202-11203

ING. MARIA ESPERANZA AMÓRTEGUI M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
No. MAT: 25202-02110

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

CONSORCIO DEL ABRA
INTERVENTORIA VIAL
NIT 902.026.889-5

ANEXO No. 7

CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

DETERCONSA TOCANCIPÁ	CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN		CODIGO:
			VERSION:
			FECHA:

CONTRATO MARCO No.	CTOINT 017 MT 2025	PROYECTO No.	1

CONTRATO DE OBRA No. DTC-IA-14 - 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. DTC-IP-18- 2026

PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Equipo Utilizado por el Contratista							Equipo Utilizado por la Interventoría				
Nombre del Equipo	Actividad en la que se usa	N° Serie / ID	Precisión	N° Certificado de Calibración y/o verificación	Fecha Certificado	Certificado Vigente hasta	N° Serie / ID	Precisión	N° Certificado de Calibración y/o verificación	Fecha Certificado	Certificado Vigente hasta
NIVEL AUTOMATICO RUIDE RL-C32	NIVELACION INICIAL DE LA VIA - CONTROL EXCAVACIONES Y ESPESORES DE CAPAS GRANULARES INSTALADAS TRAMO 1	X246369	1 mm	2k1654	25/12/2025	25/06/2026	NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-B4A	2 mm	1121	30/04/2026	30/10/2026
NIVEL AUTOMATICOsokkia B40	NIVELACION INICIAL DE LA VIA - CONTROL EXCAVACIONES Y ESPESORES DE CAPAS GRANULARES INSTALADAS TRAMO 2	SD5809	1 mm	5809	10/01/2026	10/07/2026	ESTACION TOTAL TOPCON GM-52	2"	1120	30/04/2026	30/10/2026
ESTACION TOTAL TOPCON GOWIN	LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO VIA	TKS202	1"	8E2083	27/12/2025	27/06/2026					
ANTENAS HI TARGET V60	LEVANTAMIENTO Y	V60	2.5mm	N/A	N/A	N/A					

Se anexan certificados de calibración

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: MARIA ESPERANZA AMORTEGUI M.
CC: 52.054.897

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: GUILLERMO CAICEDO NIETO
C.C. 11.345.741

ARFOR Ingeniería
Carrera 76 # 65ª – 68 Bogotá D.C
Teléfono: (601) 438 1646
Celular/ Whatsapp: +57 3104960434
E-mail: info@arforingenieria.com
www.arforingenieria.com

Bogotá D.C., abril 30 de 2026

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 1121

Datos de Contacto:

CIUDAD	Tocancipá (Cund.)
SEÑOR (ES)	CONSORCIO DEL ABRA
N° IDENTIFICACIÓN	NIT N° 902.026.889-5
TELÉFONO	312 319 3090

Datos del Equipo:

EQUIPO	NIVEL AUTOMÁTICO
FABRICANTE	TOPCON
MODELO	AT-B4A
N° DE SERIE	WP011470

Por medio del presente certificamos que el equipo descrito fue revisado en nuestro laboratorio, cumple con las especificaciones del fabricante y sus características técnicas se encuentran dentro de los rangos tolerables. Asimismo certificamos que el equipo se encuentra en perfectas condiciones óptico-mecánicas.

VERIFICACIÓN REALIZADA CON COLIMADOR DE ALTA PRECISIÓN
MARCA: SANWEI F550/D3
S/N: 18675120022
RESOLUCIÓN: 3"
PROCEDIMIENTO BAJO NORMA DIN 18723

PARAMETROS TÉCNICOS	
Precisión por km doble de nivelación	+/- 2mm
Aumento	24x
Distancia de enfoque mínima	0.20m
Sistema compensador	Rango +/- 15 ft precisión de ajuste +/- 0.5'
Poder de resolución	4'
Apertura del objetivo	32 mm
Campo de visión	1°25'
Limbo graduado	360°
Precisión del nonio	1°
Temperatura de trabajo	-20°C ~+50°C

ARFOR Ingeniería NIT: 901.156.871-5 EQUIPO TÉCNICO www.arforingenieria.com

Carrera 76 # 65ª – 68 Bogotá D.C
Teléfono: (601) 438 1646
Celular/ Whatsapp: +57 3104960434
E-mail: info@arforingenieria.com
www.arforingenieria.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 1121

Periodos:

FECHA DE CALIBRACIÓN	30/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	30/10/2026

ARFOR Ingeniería NIT. 901.155.879-5 DEPARTAMENTO TÉCNICO

Se realizaron los procesos de prueba y ajuste teniendo en cuenta los parámetros técnicos de niveles automáticos de precisión de topografía. Por tanto, se emite el presente certificado de calibración con vigencia de seis (6) meses, en donde al final del periodo se recomienda realizar un nuevo control.

Para cualquier comentario, favor comunicarse con nuestro laboratorio al (601) 438 1646 o visítenos en la Carrera 76 # 65A – 68 en Bogotá D.C

Cordialmente,

Departamento Técnico
ARFOR Ingeniería SAS

Nota Aclaratoria:

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario antes de dar salida al instrumento de nuestro laboratorio, si así lo amerita, por lo anterior ARFOR Ingeniería SAS, no asume ninguna responsabilidad del trabajo realizado por efecto de mal manejo, transporte inadecuado o no verificación del instrumento por parte del usuario.

ELABORÓ: MAURICIO FORERO (Director Técnico)

Mauricio Forero

Firmado digitalmente por Mauricio Forero
Fecha: 2026.04.30 09:16:13 -05'00'

ARFOR Ingeniería
Carrera 76 # 65A – 68 Bogotá D.C
Teléfono: (601)438 1646
Celular/ Whatsapp: +57 3104960434
E-mail: info@arforingenieria.com
www.arforingenieria.com

Bogotá D.C., abril 30 de 2026

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 1120

Datos de Contacto:

CIUDAD	Tocancipá (Cund.)
SEÑOR (ES)	CONSORCIO DEL ABRA
N° IDENTIFICACIÓN	NIT N° 902.026.889-5
TELÉFONO	312 319 3090

Datos del Equipo:

EQUIPO	ESTACIÓN TOTAL
FABRICANTE	TOPCON
MODELO	GM-52
N° DE SERIE	1Y018103

Por medio del presente certificamos que el equipo descrito fue revisado en nuestro laboratorio, cumple con las especificaciones del fabricante y sus características técnicas se encuentran dentro de los rangos tolerables. Asimismo certificamos que el equipo se encuentra en perfectas condiciones óptico-mecánicas.

VERIFICACIÓN REALIZADA CON COLIMADOR DE ALTA PRECISIÓN
MARCA: SANWEI F550/D3
S/N: 18675120022
RESOLUCIÓN: 3"
PROCEDIMIENTO BAJO NORMA DIN 18723

PARAMETROS TÉCNICOS	
Resolución angular	1", 5"
Precisión angular directa	2"
Aumento	30x
Medición máxima con un prisma	4000 m
Medición máxima sin prisma	500m
Medición máxima con diana reflectiva	500 m
Campo de visión	1°30'
Sistema compensador	Dos Ejes
Sensibilidad del compensador	+/-6"
Precisión del compensador	1"
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +60°C
Distancia de enfoque mínima	1.3 m
Torque movimiento fino	Verificado
Aumentos y campo visual a 100 m	Verificado

ARFOR Ingeniería NIT: 902.026.889-5 SERVICIO TÉCNICO www.arforingenieria.com

Carrera 76 # 65A – 68 Bogotá D.C
Teléfono: (601)438 1646
Celular/ Whatsapp: +57 3104960434
E-mail: info@arforingenieria.com
www.arforingenieria.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 1120

Periodos:

FECHA DE CALIBRACIÓN	30/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	30/10/2026

ARFOR Ingeniería Nit. 901.159.675-5 SERVICIO TÉCNICO www.arforingenieria.com

Se realizaron los procesos de prueba y ajuste teniendo en cuenta los parámetros técnicos de estaciones de topografía. Por tanto, se emite el presente certificado de calibración con vigencia de seis (6) meses, en donde al final del periodo se recomienda realizar un nuevo control.

Para cualquier comentario, favor comunicarse con nuestro laboratorio al (601) 438 1646 o visítenos en la Carrera 76 # 65ª – 68 en Bogotá D.C

Cordialmente,

Departamento Técnico
ARFOR Ingeniería SAS

Nota Aclaratoria:

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario antes de dar salida al instrumento de nuestro laboratorio, si así lo amerita, por lo anterior ARFOR Ingeniería SAS, no asume ninguna responsabilidad del trabajo realizado por efecto de mal manejo, transporte inadecuado o no verificación del instrumento por parte del usuario.

ELABORÓ: MAURICIO FORERO (Director Técnico)

Mauricio Forero

Firmado digitalmente por Mauricio Forero
Fecha: 2026.04.30 09:14:57 -05'00'

CONSORCIO DEL ABRA
INTERVENTORIA VIAL
NIT 902.026.889-5

ANEXO No. 8

PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL ESCOMBRERA Y PERMISOS MINEROS Y DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LAS CANTERAS

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia

CAR 03/07/2024 09:39
Al Contestar cite este No.: 20242051963
Origen: Dirección de Evaluación, Seguimi
Destino:JOSE MAURICIO CONTRERAS SANCHEZ
Anexos: Fol: 3

Bogotá,

Señor
JOSE MAURICIO CONTRERAS SANCHEZ
CAS 12 URBANIZACIÓN BALU SOPO Vereda Centro
mauriciobritalia@hotmail.com
Sopó (Cundinamarca)

ASUNTO: Incripción Sitio Disposición Final de RCD Registro No. 19

Cordial Saludo,

En atención al radicado No. **20231088296 del 07 de septiembre de 2023**, por medio del cual, **JOSE MAURICIO CONTRERAS SANCHEZ** identificado con cedula No. 422.340 solicita a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la inscripción como gestor de RCD en modalidad de sitio de disposición final, en el polígono ubicado dentro del predio LA ARBOLEDA II, identificado con Cedula Catastral No. 25295000000000020538000000000 y matricula inmobiliaria No. 176-150297, que pertenece a la vereda San Martin del Municipio de Gachancipá; la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental – DESCA, a través del grupo de Residuos de Construcción y Demolición- RCD, en cumplimento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021, se permite informar lo siguiente.

En consideración a la documentación técnica allegada en la solicitud de inscripción de gestor en la modalidad de sitio de disposición final de RCD, se generó Informe Técnico DESCA No.0299 de 27 de junio de 2024, Evaluación solicitud de inscripción gestor en la modalidad de sitio de disposición final de RCD Predio la Arboleda 2.

Teniendo en cuenta la evaluación de la documentación técnica en el numeral V y el concepto técnico del numeral VI del informe citado anteriormente, se recomienda informar a la persona natural **JOSE MAURICIO CONTRERAS SANCHEZ** identificado con cedula de ciudadanía No, 422.340,en consideración a la evaluación del a solicitud de inscripción como gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, en la modalidad de Sitio de Disposición Final adelantado con Radicado No. 20231088296 y derivados de estos, que pretende operar en dicha actividad en el polígono ubicado dentro del predio LA ARBOLEDA II, identificado con Cedula Catastral No. 25295000000000020538000000000 y matricula inmobiliaria No. 176-150297, que pertenece a la vereda San Martin del Municipio de Gachancipá, informar lo siguiente:

1. Generar registro e inscripción como gestor en la modalidad sitio de disposición final de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, a favor de **JOSE MAURICIO CONTRERAS**

SANCHEZ identificado con cedula No. 422.340, quien actúa como titular de la solicitud de inscripción ante la Corporación para el polígono establecido en el predio La Arboleda II localizado en la vereda San Martin del Municipio de Gachancipá, Cundinamarca.

2. Que la operación del sitio de disposición final se debe realizar dentro de los límites establecidos por las coordenadas listadas en el plano denominado "*TOPOGRAFIA-RESERVORIO-GLOBO GENERAL*", allegado mediante radicado No. 20241055021 con fecha de 31 de mayo de 2024, de igual forma el polígono de operación está delimitado en este informe técnico, como se muestra sus coordenadas en la tabla No.2 e imagen No.2, que abarcan todo el perímetro de la zona denominada como *RESERVORIO,* como se hace constar en la documentación que integra las medias mínimas de manejo ambiental y sus anexos

3. Con el avance y cierre del frente de operación del sitio de disposición final y la entrada de la implementación de las actividades de clausura y posclausura, **JOSE MAURICIO CONTRERAS SANCHEZ** identificado con cedula No. 422.340 actuando como titular del registro, deberán entregar los análisis definitivos y obras de estabilidad geotécnica, estudios hidrológicos y diseños de las obras definitivas de drenaje y control de sedimentos, registros con la cantidad real de RCD dispuestos, donde se evidencia la estabilidad del sitio para soportar sobre cargas de usos industrial para parques de operación o conexas a esta actividades.

4. **JOSE MAURICIO CONTRERAS SANCHEZ** identificado con cedula No. 422.340 actuando como titular del registro, deberá informar mediante comunicación escrita a la Corporación, la fecha proyectada para el inicio de la actividad de disposición final de RCD en el polígono de operación delimitado que se encuentra dentro del predio denominado LA ARBOLEDA II.

5. Se recomienda allegar Plano con la localización de todas las infraestructuras de la planta y los elementos (vías internas, señalización, áreas de bascula, patios de acopio, patio de almacenamiento, área de la planta y/o área de disposición final, área de oficinas, instalaciones sanitarias, frentes de trabajo, patio de maniobras, área de verificación de RCD, área de manejo de residuos, sobrantes, área para el mantenimiento de maquinaria, etc.)

6. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de gestion integral de Residuos de Construccion y Demolicion – RCD, asi mismo con la implementación y ejecución de las medidas mínimas de manejo ambiental formuladas en la documentación técnica allegada a la corporación y los reportes trimestrales de los RCD gestionados en cada periodo.

7. Se recomienda Implementar la señalización necesaria, con el fin de identificar en el predio las áreas mínimas de operación y actividades asociadas a la gestión de RCD contenidas en el diagrama de flujo formulado en la documentación técnica.

8. Limitar el desarrollo de actividades asociadas a la gestión de Residuos de Construcción y Demolición - RCD en la modalidad de sitio de disposición final de RCD, conforme al polígono y definido en la documentación técnica.

9. Se recomienda unificar las diferentes versiones del documento de medidas de manejo ambiental de acuerdo a los documentos y los anexos presentados en los radicados No.20231112075, No.20241043019 y 20241055021, toda vez que estos no deben ser modificados, meramente se debe estructurar de tal forma de tener un documento de medidas de manejo ambiental consolidado con sus respectivos anexos, con el fin de facilitar a la Corporación la actividad de seguimiento y control al sitio de disposición final.

Por último informar que, conforme a lo conceptuado en el Informe Técnico DESCA No.0299 de 27 de junio de 2024, viabilizar para la respectiva actualización del listado de gestores de RCD de la Corporación, la inscripción del **Registro No. 19** en la modalidad sitio de disposición final de RCD a favor del señor JOSE MAURICIO CONTRERAS SANCHEZ identificado con cedula No. 422.340, para el polígono ubicado dentro del predio LA ARBOLEDA II, identificado con Cedula Catastral No. 25295000000000020538000000000 y matricula inmobiliaria No. 176-150297, localizado en la vereda San Martin del Municipio de Gachancipá.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director DESCA

Elaboró: Oscar Ivan Vargas Padilla / DESCA
Julian Dario Fajardo Nuñez / DESCA
Revisó: Jaime Vera Rodriguez / DESCA
Alberto Acero Aguirre / DESCA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Certificado Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM

Registro

RUCOM-201403173059

En cumplimiento del Capítulo 6° del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que Q Y M SAS con NIT número 900058021 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 19-06-2025 hasta el 31-07-2026. Durante el mes de mayo de 2026 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Dado en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de junio del año 2025.

FERNANDO JOSÉ ARÉVALO OROZCO
Gerente (E) - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

erika juliana peña bohorquez
19-06-2025 10:28

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202410090753-636205 Fecha de Reporte: 09/oct/2024 07:53

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

CÓDIGO DE EXPEDIENTE:	22150	**MODALIDAD:**	CONTRATO DE CONCESIÓN (L 685)	**FECHA Y HORA DE REGISTRO:**	05/oct/2001 00:00
VIGENCIA HASTA:	07/may/2050	**ESTADO:**	Activo	**AUTORIDAD MINERA COMPETENTE:**	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TITULARES

NOMBRES	TIPO	IDENTIFICACIÓN	USUARIO AnnA
LUIS ALBERTO PRIETO PRIETO	Cédula de Ciudadanía	19246757	10439

ÁREA TOTAL (ha):	22.371
MUNICIPIOS:	TOCANCIPÁ-Cundinamarca

MINERALES:	ARENAS

ANOTACIONES

ANOTACIÓN:	1
FECHA DE ANOTACIÓN:	05/oct/2001
TIPO DE ANOTACIÓN:	LICENCIA EXPLORACION
FECHA EJECUTORIA:	22/mar/2001
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	1080-073
ESPECIFICACIÓN:	OTORGA LICENCIA PARA EXPLORACION.

ANOTACIÓN:	2
FECHA DE ANOTACIÓN:	20/dic/2001
TIPO DE ANOTACIÓN:	SIN DEFINIR
FECHA EJECUTORIA:	10/dic/2001
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	45
ESPECIFICACIÓN:	SE ADOPTA EL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO MINERO NACIONAL, EL CODIGO: 01-00108-22150-01-00000-00 CAMBIA A: GIIE-02

ANOTACIÓN:	3

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202410090753-636205 Fecha de Reporte: 09/oct/2024 07:53

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

FECHA DE ANOTACIÓN:	26/dic/2007
TIPO DE ANOTACIÓN:	LICENCIA EXPLOTACION
FECHA EJECUTORIA:	10/dic/2007
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	DSM-862
ESPECIFICACIÓN:	OTORGA POR 10 A?OS LICENCIA DE EXPLOTACION NRO 22150 A ERNESTO LEAL OSUNA Y GUSTAVO RODRIGUEZ MEJIA - CAMBIO DE MODALIDAD

ANOTACIÓN:	4
FECHA DE ANOTACIÓN:	18/mar/2013
TIPO DE ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS
FECHA EJECUTORIA:	12/mar/2013
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	RES.SFOM-289
ESPECIFICACIÓN:	ART.PRIMERO: Declarar PERFECCIONADA la CESION TOTAL del 100% de los derechos y obligaciones que equivalen al 50% que posee el Sr. ERNESTO LEAL OSUNA a favor del Sr. MIGUEL DE JESUS ZULETA CARDONA. PARAGRAFO: Por consiguiente quedaran como titulares beneficiarios y responsables de esta obligacion a los Srs. GUSTAVO RODRIGUEZ MEJIA Y MIGUEL DE JESUS ZULETA CARDONA. segun Resolucion SFOM-289 del 15/09/2009 y confirmada conla Resolucion VSC-109 del 28/12/2012

ANOTACIÓN:	5
FECHA DE ANOTACIÓN:	08/may/2020
TIPO DE ANOTACIÓN:	ACOGIMIENTO A LA LEY 685
FECHA EJECUTORIA:	07/may/2020
TIPO DE DOCUMENTO:	CONTRATO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	22150
ESPECIFICACIÓN:	INSCRIPCION EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL DEL CONTRATO DE CONCESION No. 22150 celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM y los señores GUSTAVO RODRIGUEZ MEJIA, identificado con C.C. 4.251.121 y MIGUEL ZULETA CARDONA identificado con C.C. No. 16.208.846, mediante el cual las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Objeto. El presente contrato tiene por objeto la realización por parte de EL CONCESIONARIO de un proyecto de explotación económica y sostenible, de un yacimiento de ARENA (...) CLAUSULA SEGUNDA. Área del Contrato. El área objeto del presente contrato corresponde a la alinderación que se define por las coordenadas que se mencionan a continuación: LATITUD LONGITUD 4,95108 -73,91373 4,9536 -73,91182 4,95219 -73,90834 4,95113 -73,90721 4,9503 -73,90817 4,94976 -73,91142 4,95108 -73,91187 4,95108 -73,91373 4,95113 -73,90721 4,94979 -73,9054 4,94885 -73,9043 4,94736 -73,90454 4,94736 -73,90482 4,94917 -73,90689 4,95113 -73,90721 El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del municipio de TOCANCIPA, Departamento del CUNDINAMARCA y comprende una extensión superficiaria total de 22 HECTAREAS Y 4014 METROS CUADRADOS DISTRIBUIDAS EN UNA (1) ZONA (...) CLAUSULA CUARTA. Duración del Contrato y Etapas. El presente contrato tendrá una duración máxima, de acuerdo al PTO aprobado de TREINTA (30) AÑOS, es decir hasta el 07/05/2050, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional según lo señalado en el Artículo 70 del Código de Minas y para cada etapa así: a) Plazo para Explotación. Corresponde a TREINTA (30) AÑOS (...) (Acogimiento a la Ley 685).

ANOTACIÓN:	6

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202410090753-636205 Fecha de Reporte: 09/oct/2024 07:53

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

FECHA DE ANOTACIÓN:	25/nov/2021
TIPO DE ANOTACIÓN:	CESION DE DERECHOS
FECHA EJECUTORIA:	03/jun/2022
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	Resolución acepta cesión de derechos
NÚMERO DE DOCUMENTO:	RES-210-4826
ESPECIFICACIÓN:	CESION DE DERECHOS

ANOTACIÓN:	7
FECHA DE ANOTACIÓN:	09/ago/2022
TIPO DE ANOTACIÓN:	CESION DE DERECHOS
FECHA EJECUTORIA:	19/may/2022
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	Resolución acepta cesión de derechos
NÚMERO DE DOCUMENTO:	VCT-210-4826
ESPECIFICACIÓN:	Inscripción en el Registro Minero Nacional de la CESION TOTAL DE DERECHOS de GUSTAVO RODRIGUEZ MEJIA a favor de LUIS ALBERTO PRIETO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.246.757

ANOTACIÓN:	8
FECHA DE ANOTACIÓN:	20/ene/2023
TIPO DE ANOTACIÓN:	ACLARACION/MODIFICACION DE TITULO
FECHA EJECUTORIA:	19/ene/2023
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	Circular
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 2023
ESPECIFICACIÓN:	INSCRIPCIÓN en el Registro Minero Nacional de la entrada en producción en la información gráfica de los títulos mineros que se visualiza en el Sistema Integral de Gestión Minera –AnnA Minería-, de conformidad con lo comunicado a través de la Circular Externa No. 001 del 19 de enero de 2023, expedida por la Agencia Nacional de Minería en aplicación de lo dispuesto en la Resolución 370 del 16 de junio de 2021, proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, por medio de la cual se establece "el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia, específicamente, la determinación de distancias y áreas para todos los títulos mineros, se hará a partir del 20 de enero de 2023 con respecto la proyección cartográfica "Transverse Mercator" como sistema oficial de coordenadas planas para Colombia, con un único origen denominado "Origen Nacional", referido al Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, también denominado MAGNA-SIRGAS"; es decir, el valor del área concedida para algunos títulos mineros, puede visualizarse mayor o menor, sin que esto signifique modificación del polígono otorgado.

ANOTACIÓN:	9
FECHA DE ANOTACIÓN:	01/oct/2024
TIPO DE ANOTACIÓN:	CESION DE DERECHOS
FECHA EJECUTORIA:	05/sep/2024
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	Resolución acepta cesión de derechos
NÚMERO DE DOCUMENTO:	VCT 969
ESPECIFICACIÓN:	INSCRIPCIÓN en el Registro Minero Nacional de la CESIÓN TOTAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES presentada por el señor MIGUEL ZULETA CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.208.846, titular del contrato de concesión No. 22150, a favor del señor LUIS ALBERTO PRIETO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.246.757.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202410090753-636205 Fecha de Reporte: 09/oct/2024 07:53

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

CELDAS DEL TÍTULO
18N06I01H23H, 18N06I01H23I, 18N06I01H23J, 18N06I01H23L, 18N06I01H23M, 18N06I01H23N, 18N06I01H23P, 18N06I01H23R, 18N06I01H23S, 18N06I01H23T, 18N06I01H23U, 18N06I01H23Y, 18N06I01H23Z, 18N06I01H24K, 18N06I01H24L, 18N06I01H24Q, 18N06I01H24R, 18N06I01H24S, 18N06I01H24V, 18N06I01H24W, 18N06I01H24X, 18N06I01H24Y, 18N06I01H24Z, 18N06I01L03D, 18N06I01L03E, 18N06I01L04A, 18N06I01L04C, 18N06I01L04D, 18N06I01L04E, 18N06I01L04I, 18N06I01L04J, 18N06I01L04P, 18N06I01L05A, 18N06I01L05F, 18N06I01L05K
Nota: Las celdas reportadas en el listado se suporponen total o parcialmente con el título

COORDENADAS DEL TÍTULO
Coordenadas en WKT*
MULTIPOLYGON (((-73.9137306 4.951077661, -73.911871124 4.951077180000027, -73.911421 4.94976058899999, -73.908174829 4.950302312000019, -73.907205064 4.951132378000011, -73.90833906 4.952193419000025, -73.911819529 4.953596355, -73.9137306 4.951077661)),((-73.907205064 4.951132378000011, -73.906885139 4.949171417, -73.904821753 4.947362270999974, -73.904537734 4.947362193, -73.904298305 4.948854215999972, -73.905395538 4.949794890000021, -73.907205064 4.951132378000011)))
* WKT: Well Known Text. Codificación o sintaxis en formato ASCII estandarizada diseñada para describir objetos espaciales expresados de forma vectorial. Para visualizar las coordenadas puede cargar el texto en el sitio https://arthur-e.github.io/Wicket/sandbox-gmaps3.html

WILLIAM ALBERTO MARTINEZ DIAZ

GERENTE DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202410090753-636205 Fecha de Reporte: 09/oct/2024 07:53

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

NOTAS ACLARATORIAS

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería - ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras).

Las coordenadas de los vértices están referidas al sistema MAGNA-SIRGAS

Las áreas han sido calculadas con respecto al Origen Nacional de la proyección Gauss-Krüeger, Transverse Mercator Colombia.

Este certificado electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que la complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar su autenticidad escanee el código QR que se encuentra en el encabezado del documento. Este código lo direccionará a una URL que le permitirá descargar el documento original y compararlo con el presente documento electrónico.

Recuerde que la URL válida debe empezar con https://annamineria.anm.gov.co, en caso contrario abstenerse de realizar cualquier acción en el navegador.

El estado del título descrito en este certificado corresponde al día y hora en la que fue expedido.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

********* FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Certificado Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM

Registro

RUCOM-2018050311990

En cumplimiento del Capítulo 6° del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que SOCIEDAD AGREGADOS, GANADERIA Y TRANSPORTE S.A.S con NIT número 900343684 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 04-06-2025 hasta el 31-07-2026. Durante el mes de mayo de 2026 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS ELABORADAS (TRITURADAS, MOLIDAS O PULVERIZADAS), ROCAS O PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN NCP, GRAVAS NATURALES

Dado en Bogotá D.C., a los 4 dias del mes de junio del año 2025.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

LAURA VANESSA LEON MONTANO
04-06-2025 09:26

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

CONSORCIO DEL ABRA

NIT 902.026.889-5

ANEXO No. 9

VALES DE FRESADO Y EXCAVACION

CONSORCIO DEL ABRA
NIT 902.026.889-5

MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y/O RCD GENERADOS

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ – ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO: DTC-IA-14 DE 2026

MES DE REPORTE: MARZO

ACOPIO O ESCOMBRERA: ACOPIO

Fecha	Volumen (m3)	Placa Volqueta	No. de Recibo
16/03/2026	15	SRM 566	01051
16/03/2026	18	JUB 640	01052
16/03/2026	08	SRX 191	01053
16/03/2026	15	SRM 566	01054
16/03/2026	18	SRX 191	01055
16/03/2026	08	OCK 561	01056
17/03/2026	08	SRX 191	01057
17/03/2026	08	SMY 066	01058
17/03/2026	08	OCK 561	01059
17/03/2026	15	SRM 566	01060
17/03/2026	18	TLN 147	01061
17/03/2026	18	OCK 561	01062
17/03/2026	15	SD0 150	01063
17/03/2026	18	SRX 191	01064
18/03/2026	18	SRM 566	01065
18/03/2026	18	TLN 147	01066
18/03/2026	18	JVB 640	01067
18/03/2026	15	SRM 566	01068
18/03/2026	18	TLN 147	01069
18/03/2026	18	JVB 640	01070
18/03/2026	15	SRM 566	01071
18/03/2026	18	TLN 147	01072
18/03/2026	18	JVB 640	01073
18/03/2026	15	SRM 566	01074
18/03/2026	08	JVB 640	01075
19/03/2026	15	SDO 150	01076

19/03/2026	08	SMY 066	01077
19/03/2026	08	JVB 640	01078
19/03/2026	15	SDO 150	01079
19/03/2026	08	SMY 066	01080
19/03/2026	08	JVB 640	01081
19/03/2026	15	SDO 150	01082
19/03/2026	08	SMY 066	01083
19/03/2026	08	OCK 561	01084
20/03/2026	15	SDO 150	01085
20/03/2026	18	TLN 147	01086
20/03/2026	15	SRM 566	01087
20/03/2026	08	JVB 640	01088
20/03/2026	08	SMY 066	01089
20/03/2026	15	SDO 150	01090
20/03/2026	18	TLN 147	01091
20/03/2026	15	SRM 566	01092
20/03/2026	08	JVB 640	01093
20/03/2026	15	SDO 150	01094
20/03/2026	08	JVB 640	01095
27/03/2026	08	QOP 988	00338
27/03/2026	08	SRX 191	00048
27/03/2026	15	SRM 566	00743
27/03/2026	15	TSM 103	00554
27/03/2026	15	TSM 103	00551
27/03/2026	15	RIN 566	00741
27/03/2026	08	SRX 191	00046
27/03/2026	08	QOP 088	00336
27/03/2026	08	SRX 191	00045
27/03/2026	08	QOP 988	00335
26/03/2026	08	QOP 988	00334
26/03/2026	08	SRX 191	00044
27/03/2026	08	QOP 988	00332
27/03/2026	15	WNN728	01157
26/03/2026	15	SDO 150	00879
26/03/2026	08	SRX 191	00043
26/03/2026	08	QOP 988	00333
26/03/2026	15	SDO 150	00880
26/03/2026	15	WNN 727	01108
26/03/2026	15	WNN 727	01158
27/03/2026	15	ISM 103	01303
27/03/2026	15	TLN 147	01302
27/03/2026	15	SRM 566	01301
25/03/2026	08	SRX 191	00041
25/03/2026	08	QOP 988	00331
25/03/2026	15	SDO 150	00877
26/03/2026	15	SDO 150	00878

26/03/2026	08	SRX 191	00042
27/03/2026	15	SKM 566	01307
27/03/2026	15	ISN 103	01306
27/03/2026	15	ILN 147	01305
27/03/2026	15	SRM 566	01304
27/03/2026	08	QOP 988	00339
27/03/2026	08	SRX 191	00049
27/03/2026	15	SRN 566	00744
27/03/2026	15	TSM 103	00555
27/03/2026	08	QOP 988	00340
27/03/2026	08	SRX 191	00050
27/03/2026	15	TSM 103	00553
27/03/2026	15	SRM 566	00745

ELABORÓ:

RESIDENTE AMBIENTAL

REVISÓ:

RESIDENTE AMBIENTAL

APROBÓ:

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO DEL ABRA
NIT 902.026.889-5

MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y/O RCD GENERADOS

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ – ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO: DTC-IA-14 DE 2026

MES DE REPORTE: MARZO

ACOPIO O ESCOMBRERA: ESCOMBRERA

Fecha	Volumen (m3)	Placa Volqueta	No. de Recibo
16/03/2026	08	SRX 191	10001
16/03/2026	15	SDO 150	10002
16/03/2026	15	WOU 272	10003
16/03/2026	08	OCK 551	10004
16/03/2026	15	TSM 103	10005
16/03/2026	08	SMY 066	10006
16/03/2026	08	SMY 066	10007
16/03/2026	08	SMY 066	10008
16/03/2026	08	SMX 063	10009
16/03/2026	08	SMX 063	10010
16/03/2026	15	SRM 566	10011
16/03/2026	15	SRM 566	10012
16/03/2026	15	SRM 566	10013
16/03/2026	08	OCK 551	10014
16/03/2026	15	SRM 566	10015
16/03/2026	15	TLN 147	10016
16/03/2026	15	SRM 566	10017
16/03/2026	08	SRX 191	10018
16/03/2026	15	TLN 147	10019
16/03/2026	08	SRX 191	10020
16/03/2026	15	SDD 150	10021
16/03/2026	15	SRM 566	10022
17/03/2026	15	TLN 147	10023
17/03/2026	15	SRM 566	10024
17/03/2026	15	SDO 150	10025
17/03/2026	15	WOU 272	10026
17/03/2026	08	QOP 988	10027

17/03/2026	15	SRM 566	10028
17/03/2026	15	TLN 147	10029
17/03/2026	15	SDO 150	10030
17/03/2026	15	WOU 272	10031
17/03/2026	15	TLN 147	10032
17/03/2026	15	SRM 566	10033
17/03/2026	15	SRM 566	10034
17/03/2026	08	QOD 988	10035
17/03/2026	15	WOU 272	10036
17/03/2026	15	SDO 150	10037
17/03/2026	15	SRM 566	10038
17/03/2026	08	QOP 988	10039
17/03/2026	08	OCK 561	10040
17/03/2026	08	SDO 150	10041
17/03/2026	15	WOU 272	10042
17/03/2026	08	SMY 066	10043
17/03/2026	15	SMY 063	10044
17/03/2026	08	SMY 063	10045
17/03/2026	08	SRM 566	10046
17/03/2026	15	SMY 063	10047
17/03/2026	15	SRM 566	10048
17/03/2026	15	SRM 566	10049
17/03/2026	08	OCK 551	10050
24/03/2026	15	WOU 272	10201
24/03/2026	15	SRM 566	10202
20/03/2026	08	QOP 988	10151
20/03/2026	15	WOU 272	10152
20/03/2026	15	SDO 150	10153
20/03/2026	15	SRM 566	10154
20/03/2026	08	QOP 988	10155
24/03/2026	15	SRM 566	10156
24/03/2026	15	TLN 147	10157
24/03/2026	15	SDO 150	10158
24/03/2026	15	WOU 272	10159
24/03/2026	15	TLN 147	10160
24/03/2026	15	SRM 566	10161
24/03/2026	15	SRM 566	10162
24/03/2026	08	QOP 988	10163
24/03/2026	08	QOP 988	10164
24/03/2026	08	OCK 561	10165
24/03/2026	15	SDO 150	10166
24/03/2026	15	WOU 272	10167
24/03/2026	08	SMY 066	10168
24/03/2026	15	SRX 191	10169
24/03/2026	08	TLN 147	10170
24/03/2026	08	SRX 191	10171
24/03/2026	15	SDO 150	10172
24/03/2026	15	SRM 566	10173

24/03/2026	15	TLN 147	10174
24/03/2026	15	SRM 566	10175
24/03/2026	15	SDO 150	10176
24/03/2026	15	WOU 272	10177
24/03/2026	15	WOU 272	10178
24/03/2026	08	QOP 988	10179
24/03/2026	08	OCK 561	10180
24/03/2026	15	SDO 150	10181
24/03/2026	15	WOU 272	10182
26/03/2026	15	SDO 150	10279
26/03/2026	15	WOU 272	10280
26/03/2026	15	SRM 566	10281
26/03/2026	15	SRM 566	10282
26/03/2026	15	SRM 566	10271
26/03/2026	15	WOU	10272
26/03/2026	15	SDO 150	10273
26/03/2026	15	SRM 566	10274
26/03/2026	15	SDO 150	10275
26/03/2026	15	WOU 272	10276
26/03/2026	15	SRH 566	10277
26/03/2026	15	SRH 566	10278
25/03/2026	15	SRH 566	10251
25/03/2026	15	SDO 150	10252
25/03/2026	15	WOU 272	10253
25/03/2026	15	SRM 566	10254
25/03/2026	15	SDO 150	10255
25/03/2026	15	WOU 272	10256
25/03/2026	15	SRM 566	10257
25/03/2026	15	SDO 150	10258
25/03/2026	15	WOU 272	10259
25/03/2026	15	SRM 566	10260
25/03/2026	15	SDO 150	10261
26/03/2026	15	SDO 150	10262
26/03/2026	15	SRM 566	10263
26/03/2026	15	SRM 566	10264
26/03/2026	15	SDO 150	10265
26/03/2026	15	WOU 272	10266
20/03/2026	15	SRM 566	10130
20/03/2026	15	TLN 147	10131
20/03/2026	15	SDO 150	10132
20/03/2026	15	WOU 272	10133
20/03/2026	15	TLN 147	10134
20/03/2026	15	SRM 566	10135
20/03/2026	15	SRM 566	10136
20/03/2026	08	QOP 988	10137
20/03/2026	08	QOP 988	10138
20/03/2026	08	OCK 561	10139
20/03/2026	15	SDO 150	10140
20/03/2026	15	WOU 272	10141

20/03/2026	08	SRX 191	10143
20/03/2026	15	TLN 147	10144
20/03/2026	08	SRX 191	10145
20/03/2026	15	SDO 150	10146
20/03/2026	15	SRM 566	10147
20/03/2026	15	TLN 147	10148
20/03/2026	15	SRM 566	10149
20/03/2026	15	SRM 566	10150
19/03/2026	15	TLN 147	10101
20/03/2026	08	SMY 066	10142
26/03/2026	15	WOU 272	10301
26/03/2026	08	SMY 063	10302
26/03/2026	15	SMY 063	10303
26/03/2026	15	OCK 551	10304
26/03/2026	08	QOP 988	10305
26/03/2026	08	QOP 988	10306
26/03/2026	08	OCK 561	10307
26/03/2026	08	SMY 066	10308
26/03/2026	08	SMY 063	10309
26/03/2026	08	SMY 063	10310
26/03/2026	08	SMY 063	10311
27/03/2026	15	SDO 150	10312
27/03/2026	15	WOU 272	10313
27/03/2026	15	SRM 566	10314
27/03/2026	15	SRM 566	10315
27/03/2026	15	SDO 150	10316
27/03/2026	15	WOU 272	10317
27/03/2026	15	SRM 566	10318
27/03/2026	15	SDO 150	10319
27/03/2026	15	WOU 272	10320
27/03/2026	15	SRM 566	10321
27/03/2026	15	SRM 566	10322
27/03/2026	15	WOU 272	10323
27/03/2026	15	SDO 150	10324
27/03/2026	15	SRN 566	10325
27/03/2026	15	SDO 150	10326
27/03/2026	15	WOU 272	10327
27/03/2026	08	SMY 063	10328
27/03/2026	08	SRX 191	10329
27/03/2026	08	OCK 551	10330
27/03/2026	08	SMY 066	10331
27/03/2026	08	SMY 066	10332
27/03/2026	08	SMY 063	10333
27/03/2026	15	SDO 150	10334
27/03/2026	15	SDO 150	10335
27/03/2026	15	WOU 272	10336
27/03/2026	15	SRM 566	10337
27/03/2026	15	SRM 566	10338
27/03/2026	15	SOO 150	10339

27/03/2026	15	WOU 272	10340
27/03/2026	15	SRM 566	10341
27/03/2026	15	SDO 150	10342
27/03/2026	15	WOU 272	10343
27/03/2026	15	SRM 566	10344
27/03/2026	15	SRM 566	10345
27/03/2026	15	WOU 272	10346
27/03/2026	15	SDO 150	10347
27/03/2026	15	SRM 166	10348
27/03/2026	15	SDO 150	10349
27/03/2026	15	SDO 150	10350
27/03/2026	08	SMY 066	10366
27/03/2026	08	SMY 063	10367
27/03/2026	15	SDO 150	10368
27/03/2026	08	SRX 191	10369
28/03/2026	15	SRM 566	10370
28/03/2026	15	WOU 272	10371
28/03/2026	15	SDO 150	10372
27/03/2026	08	SMY 066	10365
28/03/2026	08	OCK 551	10364
28/03/2026	08	SRX 191	10363
28/03/2026	08	SMY 063	10362
27/03/2026	15	WOU 272	10361
27/03/2026	15	SRM 566	10357
27/03/2026	15	SDO 150	10358
27/03/2026	15	SRM 566	10359
27/03/2026	15	SDO 150	10360
27/03/2026	15	WOU 272	10356
27/03/2026	15	SRM 566	10355
27/03/2026	15	WOU 272	10354
27/03/2026	15	SDO 150	10353
27/03/2026	15	SRN 566	10352
27/03/2026	15	WOU 272	10351
26/03/2026	15	SDO 150	10300
26/03/2026	15	SRM 566	10299
26/03/2026	15	WOU 272	10298
26/03/2026	15	SDO 150	10297
26/03/2026	15	SRM 566	10296
26/03/2026	15	WOU 272	10295
26/03/2026	08	SMY 066	10291
26/03/2026	08	SMY 066	10292
26/03/2026	08	SMY 063	10293
26/03/2026	15	SDO 150	10294
26/03/2026	15	WOU 272	10293
26/03/2026	08	SMY 063	10292
26/03/2026	08	SRX 191	10291
26/03/2026	08	OCK 551	10290
26/03/2026	15	WOU 272	10283
26/03/2026	15	SDO 150	10284

26/03/2026	15	SRM 566	10285
26/03/2026	15	SDO 150	10286
17/03/2026	15	SRM 566	10051
17/03/2026	15	TLN 147	10052
17/03/2026	15	SRM 566	10053
17/03/2026	08	SRX 197	10054
17/03/2026	15	TLN 147	10055
17/03/2026	08	SRX 191	10056
18/03/2026	15	SDO 150	10057
18/03/2026	15	SRM 566	10058
18/03/2026	15	TLN 147	10059
18/03/2026	15	SRM 566	10060
18/03/2026	15	SDO 150	10061
18/03/2026	15	WOU 272	10062
18/03/2026	08	QOP 988	10063
18/03/2026	15	SRM 566	10064
18/03/2026	15	TLN 147	10065
18/03/2026	15	SRM 566	10066
18/03/2026	15	SRM 566	10067
18/03/2026	08	QOP 988	10068
18/03/2026	15	WOU 272	10069
18/03/2026	15	SDO 150	10070
18/03/2026	15	SRM 566	10071
18/03/2026	08	QOP 988	10072
18/03/2026	08	OCK 561	10073
18/03/2026	15	SDO 150	10074
18/03/2026	15	WOU 272	10075
18/03/2026	08	SMY 066	10076
18/03/2026	08	SMY 063	10077
18/03/2026	08	SMY 063	10078
18/03/2026	08	SMY 063	10079
18/03/2026	15	SRM 566	10080
18/03/2026	08	SRX 191	10081
18/03/2026	15	SDO 150	10082
18/03/2026	15	WOU 272	10083
18/03/2026	08	OCK 551	10084
18/03/2026	15	TSM 103	10085
18/03/20267	08	SMY 066	10086
18/03/2026	08	SMY 066	10087
18/03/2026	08	SMY 063	10088
18/03/2026	08	SMY 063	10089
18/03/2026	08	SMY 063	10090
18/03/2026	15	SRM 566	10091
18/03/2026	15	SRM 566	10092
18/03/2026	15	SRM 566	10093
19/03/2026	08	OCK 551	10094
19/03/2026	15	TLN 147	10095
19/03/2026	15	SRM 566	10096
19/03/2026	15	SDO 150	10097

19/03/2026	15	WOU 272	10098
19/03/2026	08	QOP 988	10099
19/03/2026	15	SRM 566	10100
19/03/2026	15	SDO 150	10102
19/03/2026	15	WOU 272	10103
19/03/2026	15	TLN 147	10104
19/03/2026	15	SRM 566	10105
19/03/2026	15	SRM 566	10106
19/03/2026	08	QOP 988	10107
19/03/2026	08	QOP 988	10108
19/03/2026	08	OCK 561	10109
19/03/2026	15	SDO 150	10110
19/03/2026	15	WOU 272	10111
19/03/2026	08	SMY 066	10112
19/03/2026	08	SMY 063	10113
19/03/2026	08	SMY 063	10114
19/03/2026	15	SMY 063	10115
19/03/2026	15	SRM 566	10116
19/03/2026	08	SRX 191	10117
19/03/2026	15	SDO 150	10118
19/03/2026	08	WOU 272	10119
19/03/2026	15	OCK 551	10120
19/03/2026	15	TSM 103	10121
19/03/2026	08	SMY 066	10122
19/03/2026	08	SMY 066	10123
19/03/2026	08	SMY 063	10124
19/03/2026	08	SMY 063	10125
19/03/2026	15	SRM 566	10126
19/03/2026	15	SDO 150	10127
19/03/2026	15	WOU 272	10128
19/03/2026	08	QOP 988	10129

24/03/2026	08	SMY 066	10183
24/03/2026	08	SRX 191	10184
24/03/2026	15	TLN 147	10185
24/03/2026	08	SRX 191	10186
24/03/2026	15	SDO 150	10187
24/03/2026	15	SRM 566	10188
24/03/2026	15	SRM 566	10189
24/03/2026	15	SRM 566	10190
24/03/2026	15	SRM 566	10191
24/03/2026	15	SRM 566	10192
24/03/2026	15	SDO 150	10193
24/03/2026	15	SRM 566	10194
24/03/2026	15	SRM 566	10195
24/03/2026	15	SRM 566	10196
24/03/2026	15	SDO 150	10197
24/03/2026	15	WOU 271	10198
24/03/2026	15	SRM 566	10199

24/03/2026	15	SDO 150	10200
24/03/2026	15	SRM 566	10202
24/03/2026	15	WOU 272	10203
24/03/2026	15	SDO 150	10204
24/03/2026	15	SRM 566	10205
24/03/2026	15	SDO 150	10207
24/03/2026	15	WOU 272	10208
24/03/2026	15	SRM 566	10209
24/03/2026	15	SRM 566	10210
24/03/2026	15	SRM 566	10219
24/03/2026	15	SRM 566	10220
24/03/2026	15	SRM 566	10221
24/03/2026	15	WOU 272	10222
24/03/2026	15	SRM 566	10211
24/03/2026	15	SRM 566	10212
24/03/2026	15	SRM 566	10213
24/03/2026	15	SDO 150	10214
24/03/2026	15	SRM 566	10215
24/03/2026	15	SRM 566	10216
24/03/2026	15	SDO 150	10217
24/03/2026	15	WOU 272	10218
25/03/2026	15	SDO 150	10223
25/03/2026	15	WOU 272	10224
25/03/2026	15	SRM 566	10225
25/03/2026	15	SDO 150	10226
25/03/2026	15	WOU 272	10227
25/03/2026	15	SRM 566	10228
25/03/2026	15	SRM 566	10229
25/03/2026	15	SDO 150	10230
25/03/2026	15	WOU 272	10231
25/03/2026	15	SRM 566	10232
25/03/2026	15	SDO 150	10233
25/03/2026	15	WOU 272	10234
25/03/2026	15	SRM 566	10235
25/03/2026	15	SDO 150	10236
25/03/2026	15	WOU 272	10237
25/03/2026	15	SRM 566	10238
25/03/2026	15	SDO 150	10239
25/03/2026	15	WOU 272	10240
25/03/2026	15	SRM 566	10241
25/03/2026	15	SRM 566	10242
25/03/2026	15	SDO 150	10243
25/03/2026	15	WOU 272	10244
25/03/2026	15	SDO 150	10245
25/03/2026	15	WOU 272	10246
25/03/2026	15	SRM 566	10247
25/03/2026	15	SDO 150	10248
25/03/2026	15	WOU 272	10249

25/03/2026	15	SRM 566	10250
25/03/2026	08	SMY 066	10397
25/03/2026	08	SMY 066	10398
25/03/2026	15	SDO 150	10399
25/03/2026	15	SDO 150	10400
28/03/2026	15	SDO 150	10393
28/03/2026	08	SRX 191	10394
28/03/2026	08	OCK 551	10395
28/03/2026	08	SMY 066	10396
28/03/2026	15	SDO 150	10392
28/03/2026	08	SMY 063	10391
28/03/2026	08	SMY 063	10390
28/03/2026	15	WOU 272	10389
28/03/2026	15	SDO 150	10385
28/03/2026	15	WOU 272	10386
28/03/2026	08	SMY 063	10387
28/03/2026	15	SDO 150	10388
28/03/2026	15	SRM 566	10381
28/03/2026	15	SDO 150	10382
28/03/2026	15	WOU 272	10383
28/03/2026	15	SRM 566	10384
28/03/2026	15	SDO 150	10377
28/03/2026	15	SDO 150	10378
28/03/2026	15	WOU 272	10379
28/03/2026	15	SRM 566	10380
28/03/2026	15	SDO 150	10374
28/03/2026	15	WOU 272	10375
28/03/2026	08	SMY 063	10376
28/03/2026	15	SRM 566	10373
30/03/2026	15	SDO 150	10603
30/03/2026	15	WOU 272	10604
30/03/2026	15	SRM 566	10605
30/03/2026	15	SRM 566	10606
28/03/2026	15	SRM 566	10552
28/03/2026	15	WOY 272	10551
30/03/2026	15	SRM 566	10601
30/03/2026	15	SDO 150	10602
29/03/2026	15	SRM 566	10556
29/03/2026	15	WOY 272	10555
28/03/2026	15	SDO 150	10554
28/03/2026	15	SRM 566	10553
29/03/2026	15	SRM 566	10560
29/03/2026	15	WOU 272	10559
29/03/2026	15	SDO 150	10558
29/03/2026	15	SRM 566	10557
29/03/2026	08	SRX 191	10564
29/03/2026	08	SMY 063	10563
29/03/2026	15	WOU 272	10562
29/03/2026	15	SDO 150	10561
29/03/2026	08	SMY 063	10568

29/03/2026	08	SMY 066	10567
29/03/2026	08	SMY 066	10566
29/03/2026	08	OCK 551	10565
29/03/2026	15	SRM 566	10572
29/03/2026	15	WOU 272	10571
29/03/2026	15	SDO 150	10570
29/03/2026	15	SDO 150	10569
29/03/2026	15	WOU 272	10576
29/03/2026	15	SDO 150	10575
29/03/2026	15	SDO 150	10574
29/03/2026	15	SRM 566	10573
29/03/2026	15	WOU 272	10580
29/03/2026	15	SDO 150	10579
29/03/2026	15	SRM 566	10578
29/03/2026	15	SRM 566	10577
29/03/2026	15	SRM 566	10584
29/03/2026	15	WOU 272	10583
29/03/2026	15	SDO 150	10582
29/03/2026	15	SRM 566	10581
29/03/2026	15	SRM 566	10588
29/03/2026	15	SDO 150	10587
29/03/2026	15	WOU 272	10586
29/03/2026	15	SRM 566	10585
30/03/2026	15	SDO 150	10592
30/03/2026	15	SRM 566	10591
29/03/2026	08	SMY 066	10590
29/03/2026	06	SMY 066	10589
30/03/2026	15	WOU 272	10596
30/03/2026	15	SDO 150	10595
30/03/2026	15	SRM 566	10594
30/03/2026	15	WOU 272	10593
30/03/2026	15	SDO 150	10600
30/03/2026	15	WOU 272	10599
30/03/2026	15	SRM 566	10598
30/03/2026	15	SRM 566	10597
30/03/2026	15	WOU 272	10607
30/03/2026	15	SDO 150	10608

24/03/2026	15	SRM 566	10206
26/03/2026	15	SRM 566	10270
26/03/2026	15	WOU 272	10269
26/03/2026	15	SDO 150	10268
26/03/2026	15	SRM 566	10267
26/03/2026	15	WOU 272	10287
26/03/2026	08	SMY 063	10288
26/03/2026	08	SRX 191	10289
28/03/2026	15	SDO 150	10554
28/03/2026	15	SRM- 566	10553

ELABORÓ:
RESIDENTE AMBIENTAL

REVISÓ:
RESIDENTE AMBIENTAL

APROBÓ:
DIRECTOR DE OBRA

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10001

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Via La fuente
Placa: SEX 191	
Conductor: CF – Camilo Fernandez	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10002

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Viala fuente
Placa: SDO150	
Conductor: Luis Meroz	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10003

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la fuente
Placa: WOU 272	
Conductor: Luis Vicente Garzon Zaque	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10004

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Via la fuente
Placa: OCK 551	
Conductor: Luis Mecan	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10005

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: TSM 103	
Conductor: Orando Neira	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10006

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SMY 066	
Conductor: Luis Muñoz	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10007

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
aterial: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Vía la Fuente
ca: SMY 066	
onductor: Luis Muñoz	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10008

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SMY 066	
Conductor: Raul Acosta	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10009

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Vía la fuente
Placa: SMX 063	
Conductor: Raul Acosta	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10010

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Vía la fuente
Placa: SMX 063	
Conductor: Raul Acosta	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10011

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la fuente
Placa: SRM 566	
Conductor: Libardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10012

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la fuente
Placa: SRM 566	
Conductor: Libardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10013

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SRM566	
Conductor: Libardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10014

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: OCK 551	
Conductor: Luis Mican	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10015

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SRM566	
Conductor: Libardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10016

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: TLN 147	
Conductor: Elias Olaya	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10017

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SRM 566	
Conductor: Libardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10018

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SRX 191	
Conductor: Luis Prieto	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10019

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: TLN 147	
Conductor: Elias Ologa	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10020

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SRX 191	
Conductor: Luis Prieto	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10021

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SDO 150	
Conductor: William Javier Vaquero	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10022

Fecha: 16/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SRM566	
Conductor: Lobardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10023

Fecha: 17/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: TLN 147	
Conductor: Elias Olaya	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10024

Fecha: 17/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SRM566	
Conductor: Lobardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10025

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SDO 150
Conductor: William Javier Yaguero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10026

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: WOO 272
Conductor: Luis Vicente Garzon Zaque
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10027

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: Vía la Fuente
Placa: QOP 928
Conductor: Israel Paria
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10028

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10029

Fecha: 17/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: TLN 147	
Conductor: Elias Olaya	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10030

Fecha: 17/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la fuente
Placa: SDO 150	
Conductor: William Javier Vaquero	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10031

Fecha: 17/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: WOU 272	
Conductor: Luis Vicente Garzon Zaque	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10032

Fecha: 17/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la fuente
Placa: TLN 147	
Conductor: Elias Olaya	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10033

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SRM566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10034

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SRM566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10035

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: Vía la fuente
Placa: QOP988
Conductor: Israel Parra
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10036

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: WOO272
Conductor: Luis Vicente Garzon Zaque
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10037

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SDO 150
Conductor: William Javier Bagüero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10038

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SQM 566
Conductor: Libardo Lanso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10039

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: Vía la Fuente
Placa: QOP 9XX
Conductor: Israel Parra
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10040

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: Vía la Fuente
Placa: OCK 561
Conductor: Miguel Parra
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10041

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SDO 150
Conductor: William Javier Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10042

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: WOO 272
Conductor: Luis Vicente Garzon Zaque
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10043

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: Vía la Fuente
Placa: SMY 066
Conductor: Luis Muñoz
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10044

Fecha: 17/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: Vía la Fuente
Placa: SMY 063
Conductor: Raul Acosta
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10045

Fecha: 4/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SMY 063	
Conductor: Raul Acosta	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10047

Fecha: 4/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SRM 566	
Conductor: Libardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10046

Fecha: 4/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SMY 063	
Conductor: Raul Acosta	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10048

Fecha: 4/03/2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** Vía la Fuente
Placa: SRM 566	
Conductor: Libardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10049

Fecha: 24/03/2026 **Hora:**

Material: Excavación

M³: 15 **Obra:** Vía la Fuente

Placa: SRM 566

Conductor: Libardo Lasso

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10050

Fecha: 24/03/2026 **Hora:**

Material: Excavación

M³: 8 **Obra:** Vía la Fuente

Placa: OCK 551

Conductor: Luis Mican

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10201

Fecha: 24.03.2026 **Hora:**

Material: Excavación

M³: 15 **Obra:** via la fuente

Placa: WOO-272

Conductor: Luis Vicente Garzón

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10202

Fecha: 24.03.2026 **Hora:**

Material: Excavación

M³: 15 **Obra:** Via la fuente

Placa: SRM-566

Conductor: Libardo Lasso

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10151

Fecha: 20.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: Consorcio via la fuente
Placa: QOP-988
Conductor: Israel Parra
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10152

Fecha: 20.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Consorcio via la fuente
Placa: WOU-272
Conductor: Luis Vicente Garzon
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10153

Fecha: 20.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SDO-150
Conductor: William Vaqcero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10154

Fecha: 20.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRU566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10155

Fecha: 20.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 8 Obra:

Placa: QOP-988

Conductor: Israel parra

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10156

Fecha: 24.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 15 Obra: via la fuente

Placa: SRH-566

Conductor: Libardo Lasso

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10157

Fecha: 24-03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 15 Obra: via la fuente

Placa: TLN-747

Conductor: Elias Olaya

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10158

Fecha: 24.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 15 Obra: via la fuente

Placa: SDO-150

Conductor: William Vaquero

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10159

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la Fuente
Placa: WOO-232
Conductor: Luis Vicente Garzón
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10160

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la Fuente
Placa: TLN-147
Conductor: Elias olaya
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10161

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SLH-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10162

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SLH-506
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10163

Fecha: 24.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 8 Obra: via la fuente

Placa: QOP-988

Conductor: Israel Parra

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10164

Fecha: 24.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 8 Obra: via la fuente

Placa: QOP-988

Conductor: Israel Parra.

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10165

Fecha: 24.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 8 Obra: via la fuente

Placa: OCK-561

Conductor: Miguel Parra

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10166

Fecha: 24.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 15 Obra: via la fuente

Placa: SDO-150

Conductor: William Vaquero

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10167

Fecha: 24.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 15 Obra: via la fuente

Placa: WOU-272

Conductor: Luis Vicente Garzon

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10168

Fecha: 24.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 8 Obra: via la fuente

Placa: SMY-068

Conductor: Raul Acosta.

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10169

Fecha: 24.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 8 Obra: via la fuente

Placa: SRX-191

Conductor: Luis Prieto

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10170

Fecha: 24.03.2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 15 Obra: Via la fuente

Placa: TLN-147

Conductor: Elias Olaya

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10171

Fecha: 24.03.2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 8	**Obra:** via la fuente
Placa: SRX-191	
Conductor: Luis Prieto	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10172

Fecha: 24.03.2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** via la fuente
Placa: SDO-150	
Conductor: William Vaquero	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10173

Fecha: 24.03.2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** via la fuente
Placa: SRM-566	
Conductor: Libardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10174

Fecha: 24.03.2026	**Hora:**
Material: Excavación	
M³: 15	**Obra:** via la fuente
Placa: TLN-147	
Conductor: Elias Olaya	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10175

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-586
Conductor: Eduardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10176

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SDO-150
Conductor: William Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10177

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: WOO-272
Conductor: Luis Vicente Garzón
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10178

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: WOO-272
Conductor: Luis Vicente Garzón
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10179

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: via la fuente
Placa: QOP-988
Conductor: Israel Parra
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10180

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: via la fuente
Placa: OCK-561
Conductor: Miguel Parra
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10181

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SDO-150
Conductor: William Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10182

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: WOU-272
Conductor: Luis Vicente Garzón
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10279

Fecha: 26 - 03 - 2026
Hora:
Material: Excavación
M³: 15
Obra: Vía la fuente
Placa: SDO 150
Conductor: William Javier Vaquez
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10280

Fecha: 26 - 03 - 2026
Hora:
Material: Excavación
M³: 15
Obra: Vía la fuente
Placa: WOU 972
Conductor: Luis Vicente Garzon
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10281

Fecha: 26 - 03 - 2026
Hora:
Material: Excavación
M³: 15
Obra: Vía la fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10282

Fecha: 26 - 03 - 2026
Hora:
Material: Excavación
M³: 15
Obra: Vía la fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10271

Fecha: 26-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Jasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalla@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10272

Fecha: 26-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la fuente
Placa: WOU 272
Conductor: Luis Vicente Corzon
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalla@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10273

Fecha: 26-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 16 Obra: Vía la fuente
Placa: SQO 160
Conductor: William Javier Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalla@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10274

Fecha: 26-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Jasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalla@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10270

Fecha: 26-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10269

Fecha: 26-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la fuente
Placa: WOU 272
Conductor: Luis Vicente Garzon
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10268

Fecha: 26-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la fuente
aca: SDO 150
Conductor: William Javier Vaqueio
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10267

Fecha: 26-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10251

Fecha: 26-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10252

Fecha: 25-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SOO 150
Conductor: William Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10253

Fecha: 25-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
a: WOU 272
Conductor: Luis Vicente Garzón
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10254

Fecha: 25-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10255

Fecha: 25-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la fuente
Placa: SDO 150
Conductor: William Javier Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10256

Fecha: 25-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la fuente
Placa: WOV 272
Conductor: Luis Vicente Garzon
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10257

Fecha: 26-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10258

Fecha: 25-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la fuente
Placa: SDO 150
Conductor: William Javier Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10259

Fecha: 25-03-2026
Hora:
Material: Excavación
M³: 15
Obra: Vía la fuente
Placa: WOU 272
Conductor: Luis Vicente Garzon
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10260

Fecha: 25-03-2026
Hora:
Material: Excavación
M³: 15
Obra: Vía la fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lopez
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10261

Fecha: 25-03-2026
Hora:
Material: Excavación
M³: 15
Obra: Vía la fuente
Placa: SDO 150
Conductor: William Javier Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10262

Fecha: 26-03-2026
Hora:
Material: Excavación
M³: 15
Obra: Vía la fuente
Placa: SDO 150
Conductor: William Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10263

Fecha: 26-03-2026	Hora:
Material: Excavación	
M³: 15	Obra: Vía La fuente
Placa: SRM 566	
Conductor: Libardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10264

Fecha: 26-03-2026	Hora:
Material: Excavación	
M³: 15	Obra: Vía La fuente
Placa: SRM 566	
Conductor: Libardo Lasso	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10265

Fecha: 26-03-2026	Hora:
Material: Excavación	
M³: 15	Obra:
Placa: SDO 150	
Conductor: William Vaquero	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10266

Fecha: 26-03-2026	Hora:
Material: Excavación	
M³: 15	Obra: Vía La fuente
Placa: WOU 272	
Conductor: Luis Vicente Garzon	
Recibido:	

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10130

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10131

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la Fuente
Placa: TLN 147
Conductor: Eliaa Olaya
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10132

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: SOO 150
Conductor: Luis Muñoz
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10133

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Vía la Fuente
Placa: WOO 272
Conductor: Luo Vicente Garzon
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

vales escombro 2-0411202610190 Abrir con Documentos de G... Compartir

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10134

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la Fuente
Placa: TLN 147
Conductor: Elias Olaya
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPO FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MAI
Predio la Arboleda 2 Vereda san M
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 1

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la Fu
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10136

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la Fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICI FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 M/
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 101

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: Via la Fuente
Placa: QOP 988
Conductor: Israel Parra
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

Fecha:

PROYECTO DE SITIO DE DISPO FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MAI
Predio la Arboleda 2 Vereda san M
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 1

Fecha:

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10134

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la Fuente
Placa: TLN 147
Conductor: Elias Olaya
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPO
FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MAI
Predio la Arboleda 2 Vereda san M
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 1

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la Fu
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10136

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la Fuente
Placa: SRM 566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICI
FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 M
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 101

Fecha: 20-03-2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: Via la Fuente
Placa: QOP 988
Conductor: Israel Parra
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

Página da 27

Fecha:

PROYECTO DE SITIO DE DISPO
FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MAL
Predio la Arboleda 2 Vereda san M
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 1

Fecha:

vales escombro 3-041120261025 Abrir con Documentos de G... Compartir

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10063
Fecha: 18/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 8 Obra: Via La Fuente
Placa: QOP988
Conductor: Israel Parra
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10065
Fecha: 18/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via La Fuente
Placa: TLN147
Conductor: Elias Olaya
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10067
Fecha: Hora:
Material:

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10066
Fecha: 18/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via La Fuente
Placa: SRM566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10064
Fecha: 18/03/2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via La Fuente
Placa: SRM566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10063

Fecha: 18/03/2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 8 Obra: Via La Fuente

Placa: QOP988

Conductor: Israel Parra

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10065

Fecha: 18/03/2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 15 Obra: Via La Fuente

Placa: TLN147

Conductor: Elias Olaya

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10067

Fecha: Hora:

Mater...

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10064

Fecha: 18/03/2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 15 Obra: Via La Fuente

Placa: SRM566

Conductor: Libardo Lasso

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 93
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda s... a
Gachancipá Registro CAR N°

No. 10

Fecha: 18/03/2026 Hora:

Material: Excavación

M³: 15 Obra: Via La Fu

Placa: SRM566

Conductor: Libardo Lasso

Recibido:

319 590 5632 • 313 810 935.
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Mar...
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10(

Fecha: 18/03/2026 Hora:

Material:

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10211

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISP FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MA
Predio la Arboleda 2 Vereda san
Gachancipá Registro CAR N° 19

No.

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fu
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 93
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10213

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSI FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS
Predio la Arboleda 2 Vereda san Mar
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. J

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuen
Placa: SDD-150
Conductor: William Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 935
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10223

Fecha: Hora:
M

PROYECTO DE SITIO DE DISP FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 M
Predio la Arboleda 2 Vereda san
Gachancipá Registro CAR N° 19

No.

Fecha: 25-03-2026 Hora:
Material:

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10211

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISP... FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MA...
Predio la Arboleda 2 Vereda san
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 1

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fu...
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 93...
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10213

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSI... FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS
Predio la Arboleda 2 Vereda san Mar...
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. J

Fecha: 24.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la fuen...
Placa: SDD-150
Conductor: William Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 935...
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10223


Fecha: Hora:

PROYECTO DE SITIO DE DISP... FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 M...
Predio la Arboleda 2 Vereda san
Gachancipá Registro CAR N° 19

No.

Fecha: 25-03.2026 Hora:
Material:

vales escombro-04132026114352 Abrir con Documentos de G... Compartir

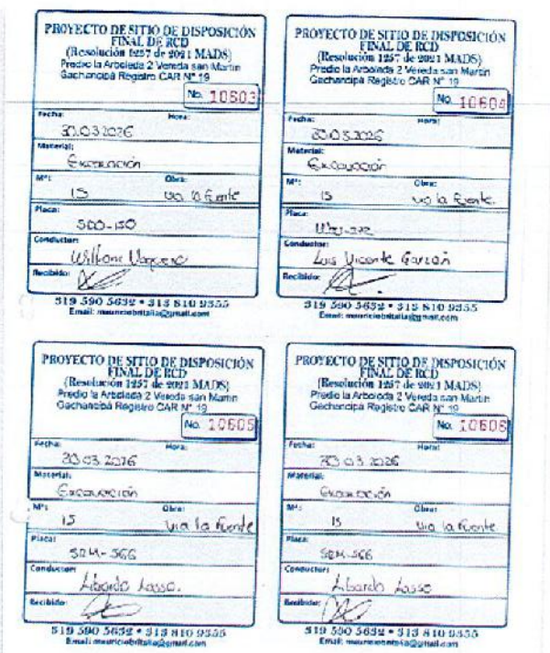


PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10603
Fecha: 30.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-150
Conductor: Wilbone Vargas
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10604
Fecha: 30.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: W00-272
Conductor: Luis Vicente Garzón
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10605
Fecha: 30.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso.
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10606
Fecha: 30.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

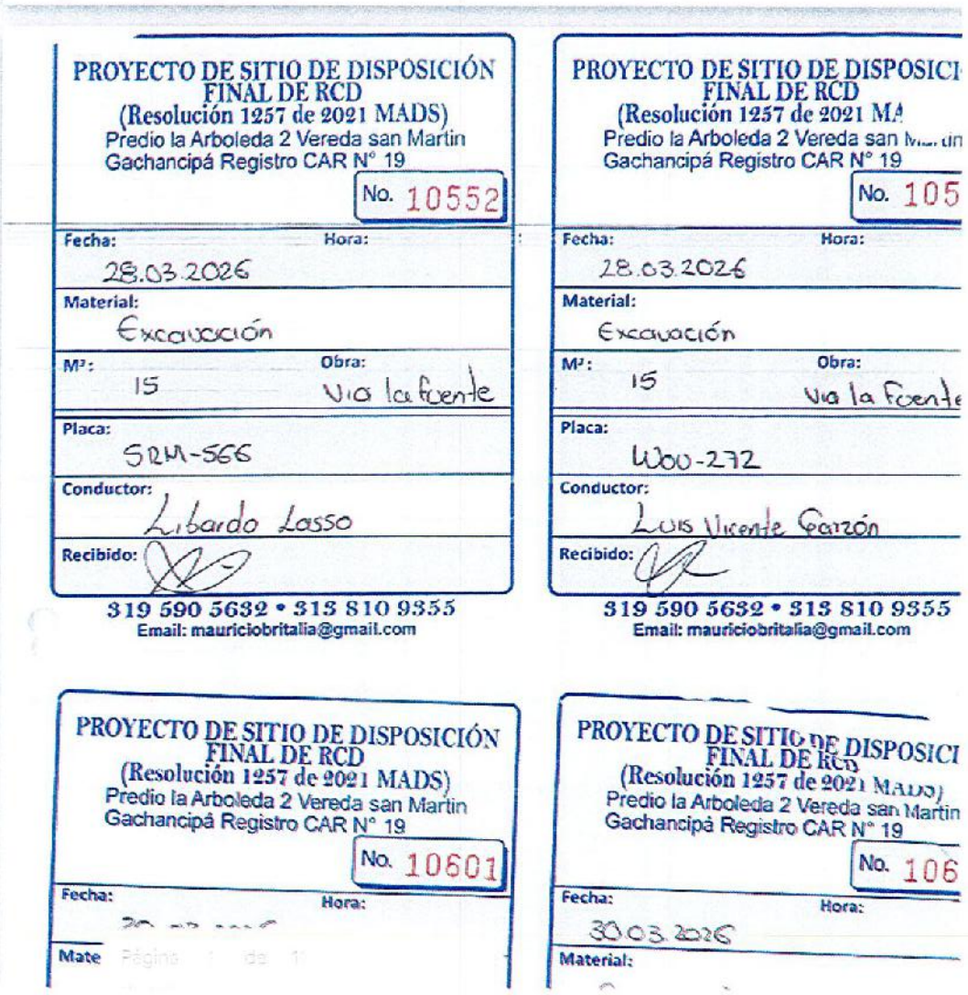


PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10552
Fecha: 28.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la fuente
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICI
FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MA
Predio la Arboleda 2 Vereda san M
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 105
Fecha: 28.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la Fuente
Placa: W00-272
Conductor: Luis Vicente Garzón
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10601
Fecha: Hora:
Mate Página 1 de 1

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICI
FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 106
Fecha: 30.03.2026 Hora:
Material:

vales escombro-04132026114352 Abrir con Documentos de G... Compartir

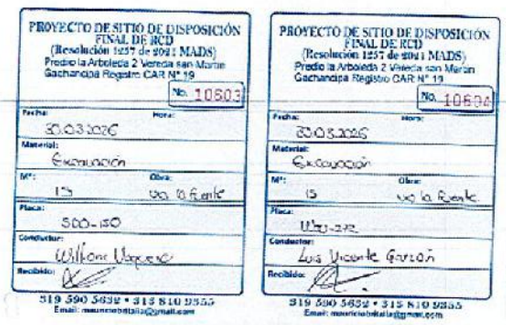


PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10603
Fecha: 30.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-150
Conductor: Wilson Vargas
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10604
Fecha: 30.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: WOU-272
Conductor: Luis Vicente Garzón
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10605
Fecha: 30.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10605
Fecha: 30.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

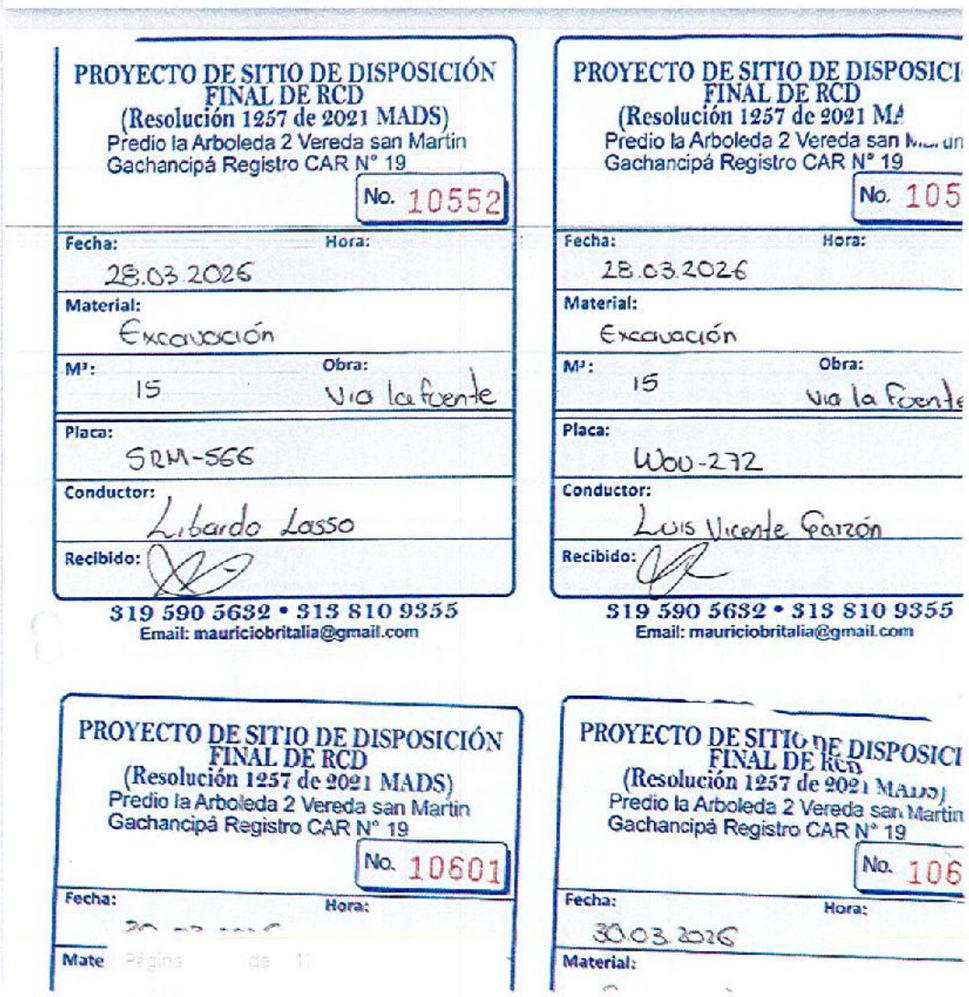

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10552
Fecha: 28.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: Via la fuente
Placa: SRM-566
Conductor: Libardo Lasso
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICI
FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MA
Predio la Arboleda 2 Vereda san M un
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 105
Fecha: 28.03.2026 Hora:
Material: Excavación
M³: 15 Obra: via la fuente
Placa: WOU-272
Conductor: Luis Vicente Garzón
Recibido:
319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 10601
Fecha: Hora:
Mate Página de 11

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICI
FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19
No. 106
Fecha: 30.03.2026 Hora:
Material:

CONSORCIO VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652

CONTROL DE MATERIALES No 00877

FECHA: 25 de marzo 2026
VOLQUETA PLACA: SDO 13 | M3: 15
MATERIAL: Fresado | No. DE VIAJES: 1
CLIENTE: Consorcio la fuente fase 2
ORIGEN: | DESTINO:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: | FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:

CONSORCIO VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652

CONTROL DE MATERIALES No 0004

FECHA: 26/03/2026
VOLQUETA PLACA: SRX191 | M3: 8
MATERIAL: Fresado | No. DE VIAJES: 1
CLIENTE: Consorcio Vía la Fuente
ORIGEN: Fase 2 | DESTINO: Convita
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: | FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:

CONSORCIO VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652

CONTROL DE MATERIALES No 00331

FECHA: 25/03/2026
VOLQUETA PLACA: SDO 906 | M3: 8
MATERIAL: Fresado | No. DE VIAJES: 1
CLIENTE: Consorcio Vía la fuente fase 2
ORIGEN: | DESTINO: Convita
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: | FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:

CONSORCIO VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652

CONTROL D MATERIALE No 0087

FECHA: 26 Marzo 2026
VOLQUETA PLACA: SDO 150 | M3: 15
MATERIAL: Fresado | No. DE VIAJES: 1
CLIENTE: Consorcio la fuente fase 2
ORIGEN: | DESTINO:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: | FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MADS)
Predio la Arboleda 2 Vereda san Martin
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 10275

Fecha: 26 -03 -2026 | Hora:
Material: Excavación
M³: 15 | Obra: Vía la fuente
Placa: SDO 150
Conductor: William Javier Vaquero
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9355
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPO FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MAI
Predio la Arboleda 2 Vereda san M
Gachancipá Registro CAR N° 19

No. 1

Fecha: 26 -03 -2026 | Hora:
Material: Excavación
M³: 15 | Obra: Vía la fu
Placa: WOU 272
Conductor: Luis Vicente Garzon
Recibido:

319 590 5632 • 313 810 9
Email: mauriciobritalia@gmail.com

PROYECTO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

PROYECTO DE SITIO DE DISPO FINAL DE RCD
(Resolución 1257 de 2021 MA
Predio la Arboleda 2 Vereda san
Gachancipá Registro CAR N° 19



Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652
No 01052
FECHA: 16/03/2026
VOLQUETA PLACA: JUB 690
M3: 18
MATERIAL: Fresado
No. DE VIAJES: 1
CLIENTE:
ORIGEN: Frente 1
DESTINO: Acopio Carretera
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Daniel Sanchez
FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:
IMPRESO POR: solo Gráficas

Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652
No 01054
FECHA: 16/03/2026
VOLQUETA PLACA: SRM 566
M3: 15
MATERIAL: fresado
No. DE VIAJES: 1
CLIENTE:
ORIGEN: Frente 1
DESTINO: Acopio Carretera
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Daniel Sanchez
FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:
IMPRESO POR: solo Gráficas

CONSORCIO
VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652
CONTROL DE MATERIALES
No 01051
FECHA: 16/03/2026
VOLQUETA PLACA: SRM566
M3: 15
MATERIAL: Fresado
No. DE VIAJES: 1
CLIENTE:
ORIGEN: Frente 1
DESTINO: Acopio Carretera
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Daniel Sanchez
FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:
IMPRESO POR: solo Gráficas

CONSORCIO
VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652
CONTROL DE MATERIALES
No 01053
FECHA: 16/3/2026
VOLQUETA PLACA: SRX 111
M3: 8
MATERIAL: Fresado
No. DE VIAJES: 1
CLIENTE:
ORIGEN: Frente 1
DESTINO: Acopio Carretera
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Daniel Sanchez
FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:
IMPRESO POR: solo Gráficas

FECHA: 16/03/2026
VOLQUETA PLACA:
MATERIAL: Fresado
CLIENTE: Frente 1
ORIGEN: Frente 1
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Daniel San
C.C.:

FECHA: 16/03/2026
VOLQUETA PLACA:
MATERIAL:
CLIENTE:
ORIGEN: Frente 1
NOMBRE DE QUIEN REC: Daniel Sand
C.C.:

Compartir
Abrir con Documentos de G...
vales fresado-04132026113917.pc

Vales fresado.pdf

Abrir con Documentos de G...

Compartir



CONSORCIO VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652


CONTROL DE MATERIALES
No 01306

FECHA:
VOLQUETA PLACA:
M3:
MATERIAL:
No. DE VIAJES:
CLIENTE:
ORIGEN:
DESTINO:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:

CONSORCIO VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652

CONTROL DE MATERIALES
No 01307

FECHA:
VOLQUETA PLACA:
M3:
MATERIAL:
No. DE VIAJES:
CLIENTE:
ORIGEN:
DESTINO:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:

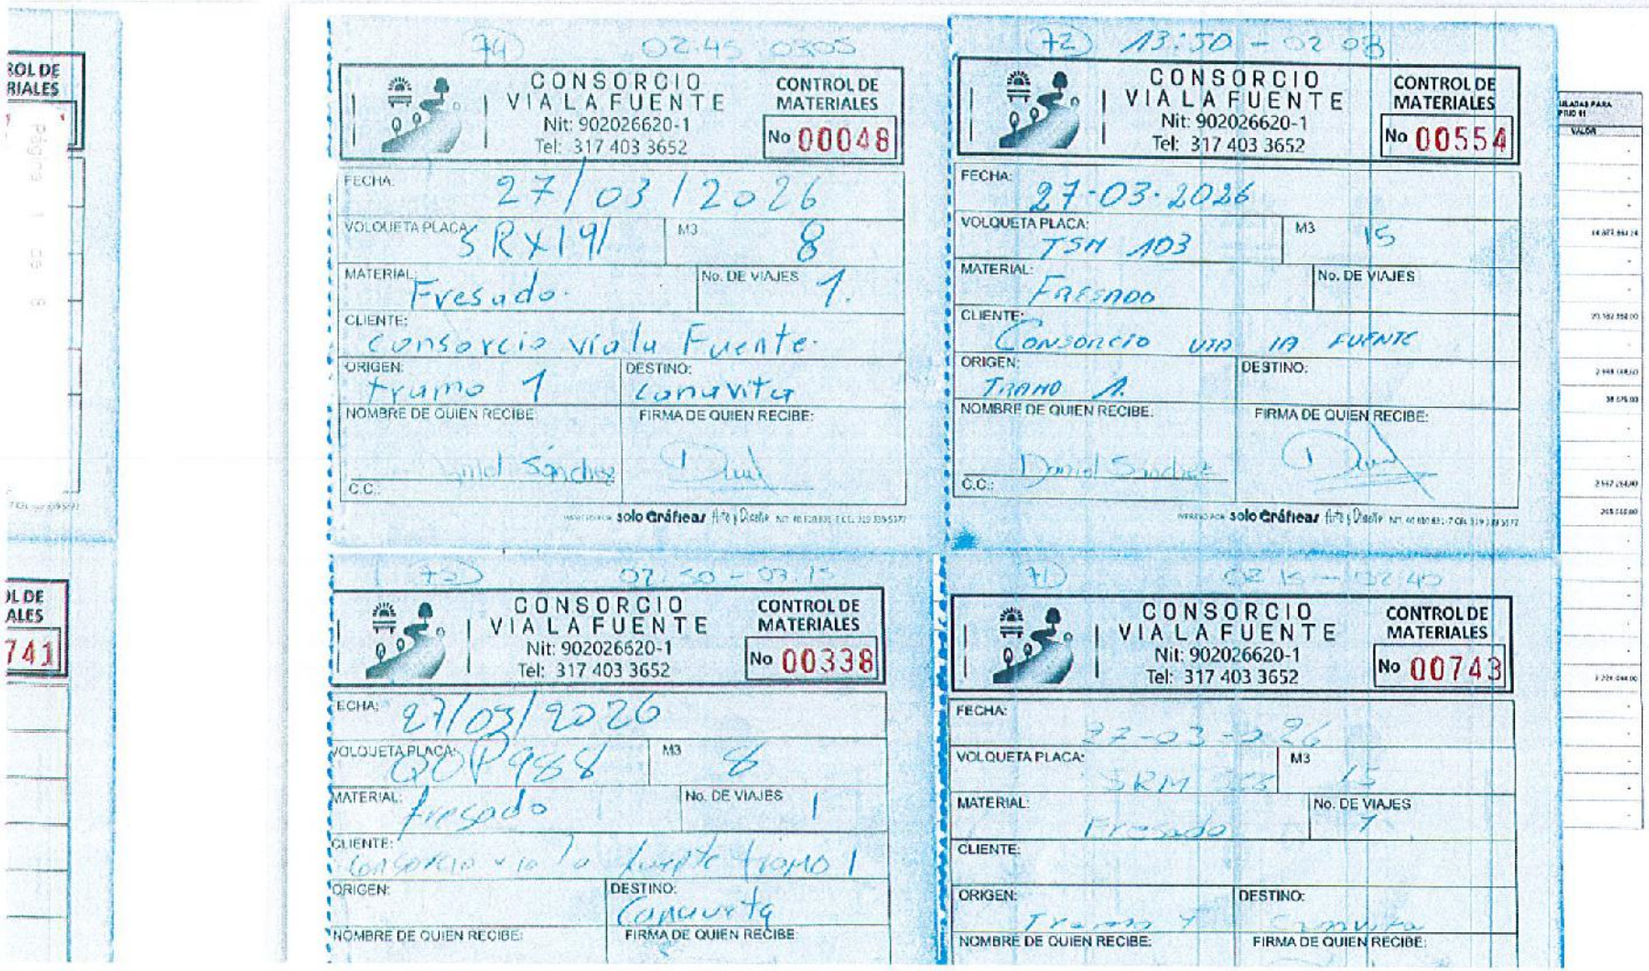

CONSORCIO VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652
CONTROL DE MATERIALES
No 00048

FECHA: 27/03/2026
VOLQUETA PLACA: SRX191 | M3: 8
MATERIAL: Fresado | No. DE VIAJES: 1.
CLIENTE: Consorcio Via la Fuente
ORIGEN: Tramo 1 | DESTINO: Canavita
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Daniel Sánchez | FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:

CONSORCIO VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652
CONTROL DE MATERIALES
No 00554

FECHA: 27-03-2026
VOLQUETA PLACA: TSH 103 | M3: 15
MATERIAL: FRESADO | No. DE VIAJES:
CLIENTE: Consorcio via la fuente
ORIGEN: Tramo 1 | DESTINO:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Daniel Sanchez | FIRMA DE QUIEN RECIBE:
C.C.:

CONSORCIO VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652
CONTROL DE MATERIALES
No 00338

FECHA: 27/03/2026
VOLQUETA PLACA: SOP968 | M3: 8
MATERIAL: fresado | No. DE VIAJES: 1
CLIENTE: Consorcio via la fuente tramo 1
ORIGEN: | DESTINO: Canavita
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: | FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CONSORCIO VIA LA FUENTE
Nit: 902026620-1
Tel: 317 403 3652
CONTROL DE MATERIALES
No 00743

FECHA: 27-03-26
VOLQUETA PLACA: SRM [illegible] | M3: 15
MATERIAL: fresado | No. DE VIAJES: 1
CLIENTE:
ORIGEN: Tramo 1 | DESTINO: Canavita
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: | FIRMA DE QUIEN RECIBE:

vales fresado-04112026102857.p
Abrir con Documentos de G...
Compartir

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141230907095

(415)7707212489984(8020) 000014123090709 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 2 6 8 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO DEL ABRA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Gachetá 2 9 7

41. Dirección principal: CL 6 # 7 - 05

42. Correo electrónico: inconarq.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 6 1 4 6 5 4 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 6 0 1 0 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 1 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros		Exportadores					
54. Código		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
				57. Modo			
				58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TRIANA TRISTANCHO VALERIA ALEJANDRA

985. Cargo: Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-01-2026 02:50:21PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141230907095

(415)7707212489884(8020) 3000141230907095

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 2 6 8 8 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
Fecha	2 0 2 6 0 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 6 0 1 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141230907095

(415)7707212489984(8020) 000014123090709 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 2 6 8 8 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 0 9 7 2 7 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TRIANA	TRISTANCHO	VALERIA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 8 3 2 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TRISTANCHO	CLEVES	NATALIE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha presentación documento: PDF: 09-01-2026 03:50:21PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141230907095

(415)7707212489984(8020) 000014123090709 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 2 6 8 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 3 4 4 0 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INCONARQ SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		8 0 2 0 2 6 0 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 1 8 9 1 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTERVENTORIA Y OBRAS ER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 2 6 0 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO TU DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO DEL ABRA identificado(a) con NITPJ 9020268895 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH Superdía Jurídica No. 632478939 desde el 22 de abril de 2026, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de abril de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DETERCONSA
TOCANCIPÁ

SEGUIMIENTO A INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL EN OBRA

CODIGO:	FO-SPO
VERSION:	002
FECHA:	16 / 03 / 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No DTC-IP-18-2026

CONTRATO MARCO No. CTOINT 017 MT 2025 | **Proyecto No. 1** | **Contrato Derivado No. DTC-IP-18-2026**

NOMBRE / RAZON SOCIAL CONTRATO MARCO:	DETERCONSA	NIT / C.C.:	902.005.834 - 6
OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DE TOCANCIPA-ZIPAQUIRA DESDE EL PUENTE RIO BOGOTA HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO DEL ABRA	NIT / C.C.:	902.026.889-5

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	% DE DEDICACION	CEDULA	FECHA EXPEDICIÓN	ING	RET	ASISTENCIA EN EL MES DE: MARZO DE 2026																													
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSONAL OPERTADO	GUILLERMO	NIETO CAICEDO	DIRECTOR DE OBRA	25%	11.345.741	14/03/1981	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	EDGAR RICARDO	NIVIA NIVIA	RESIDENTE DE OBRA	100%	79.248.910	11/08/1989	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	MARIA ESPERANZA	AMORTEGUI MONTANEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%	52.054.897	18/01/1991	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	JOHAN STIVEN	VALERO	TOPOGRAFO	100%	35.416.507	2/08/1980	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	JOHANNA	GOMEZ VANEGAS	ESPECIALISTA EN VIAS	25%	53.451.241	12/03/2001	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	JUAN CARLOS	RUGE CARDENAS	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	25%	91.487.980	20/06/1994	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	CARLOS ANTONIO	MENDOZA FORERO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	25%	80.491.503	2/08/1991	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	LISANDRO	NUÑEZ GALEANO	ESPECIALISTA HIDRAULICO	25%	5.471.618	11/07/2000	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	NUBIA CAROLINA	AREVALO ARBOLEDA	PROFESIONAL AMBIENTAL	25%	1.017.193.053	7/07/2009	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	SULAY YAMILE	BARON MENDEZ	PROFESIONAL SOCIAL	100%	52.727.771	17/11/1999	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	EDGAR ANTONIO	CARDENAS VALDERRAMA	PROFESIONAL SST	100%	74.377.935	25/05/2007	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
PERSONAL	MARCELA VIVIAN	ROJAS HERNANDEZ	ASESOR JURIDICO	20%	46.455.565	2/08/2001	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	PAULA JIMENA	CORTES OLAYA	ING AMBIENTAL APOYO	100%	1.033.908.748	17/01/2019	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X
	IVON VIVIANA	DELGADO RAMIREZ	ING SST APOYO	100%	1.075.669.675	9/05/2011	16/03/2026	VIGENTE																X	X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X

EDGAR RICARDO NIVIA NIVIA RESIDENTE INTERVENTORIA
Lic No 25202113012 CND

EDGAR ANTONIO CARDENAS VALDERRAMA PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia No 25-2366 de 2025

DETERCONSA
TOCANCIPA

CONTROL A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

CODIGO: FO-SPO
VERSION: 002
FECHA: 16/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No DTC-IP-18-2026

CONTRATO MARCO No. CTOINT 017 MT 2025 | **Proyecto No. 1** | **Contrato Derivado No. DTC-IP-18-2026**

NOMBRE / RAZON SOCIAL CONTRATO MARCO:	DETERCONSA	NIT / C.C.:	900.035.834-6	NOMBRE / RAZON SOCIAL CONTRATO DERIVADO:	CONSORCIO DEL ABRA	NIT / C.C.:	902.026.889-5
OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DE TOCANCIPA ZIPAQUIRA DESDE EL PUENTE RIO BOGOTA HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	RIESGO ARL	PLANILLA No.	DEDICACIÓN	IBC OFERTA ECONOMICA	IBC PAGO PLANILLA	IBC PAGO PLANILLA DEFINITIVO	ING	RET	IND	COTIZACION PENSION 16%	FONDO PENSIONAL DE SOLIDARIDAD	FONDO PENSIONAL DE SUBSISTENCIA	COTIZACION SALUD 4% / 12,5%	COTIZACION ARL	APORTE CCF 4% / 2%	APORTE SENA 2%	APORTE ICBF 3%	VALOR DEL APORTE TOTAL	PERIODO DE PAGO SALUD	PERIODO DE PAGO PENSION	DIAS DE MORA
PERSONAL OPERADO	GUILLERMO	NIETO CAICEDO	DIRECTOR DE OBRA	V	9502495418	25%	$ 9.500.000	$ 950.000	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/03	2026/03	
	EDGAR RICARDO	NIVIA NIVIA	RESIDENTE DE OBRA	V	1080152608	100%	$ 7.000.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	X			$ 448.000	$ -	$ -	$ 112.000	$ 194.900	$ 112.000	$ -	$ -	$ 866.900	2026/03	2026/03	
	MARIA ESPERANZA	AMORTEGUI MONTAÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	V	56212961	100%	$ 7.000.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	X			$ 448.000	$ -	$ -	$ 112.000	$ 194.900	$ 112.000	$ -	$ -	$ 866.900	2026/03	2026/03	
	JOHAN STIVEN	VALERO	TOPOGRAFO	V	9503391394	100%	$ 1.800.000	$ 720.000	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/03	2026/03	
	JOHANNA	GOMEZ VANEGAS	ESPECIALISTA EN VIAS	V	77109624	25%	$ 8.500.000	$ 850.000	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/03	2026/03	
	ARL			V	78044390	25%	$ 1.750.905	$ 175.091	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/03	2026/03	
	JUAN CARLOS	RUGE CARDENAS	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	V	9502740457	25%	$ 8.500.000	$ 850.000	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/03	2026/03	
	CARLOS ANTONIO	MENDOZA FORERO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	V	71570703	25%	$ 8.500.000	$ 850.000	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/03	2026/03	
	LISANDRO	NUÑEZ GALEANO	ESPECIALISTA HIDRAULICO	V	6010436821	25%	$ 8.500.000	$ 850.000	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/04	2026/03	
	NUBIA CAROLINA	AREVALO ARBOLEDA	PROFESIONAL AMBIENTAL	V	71735456	25%	$ 8.500.000	$ 850.000	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/03	2026/03	
	SULAY YAMILE	BARON MENDEZ	PROFESIONAL SOCIAL	V	5013089736	100%	$ 8.500.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	X			$ 416.000	$ -	$ -	$ 104.000	$ 181.000	$ 104.000	$ -	$ -	$ 805.000	2026/03	2026/03	
PERSONAL	EDGAR ANTONIO	CARDENAS VALDERRAMA	PROFESIONAL SST	V	79035466	100%	$ 8.500.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	X			$ 416.000	$ -	$ -	$ 104.000	$ 181.000	$ 104.000	$ -	$ -	$ 805.000	2026/03	2026/03	
	MARCELA VIVIAN	ROJAS HERNANDEZ	ASESOR JURIDICO	V	75462996	20%	$ 7.000.000	$ 560.000	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/03	2026/03	
	PAULA JIMENA	CORTES OLAYA	ING AMBIENTAL APOYO	V	72978978	100%	$ 1.750.905	$ 700.362	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/03	2026/03	
	IVON VIVIANA	DELGADO RAMIREZ	ING SST APOYO	V	73981736	100%	$ 1.750.905	$ 700.362	$ 1.750.905	X			$ 280.200	$ -	$ -	$ 70.000	$ 121.900	$ 70.000	$ -	$ -	$ 542.100	2026/03	2026/03	
	ARL PROFESIONALES			V	77097854	100%	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	X			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2026/03	2026/03	

GUILLERMO NIETO CAICEDO
DIRECTOR INTERVENTORIA
No Mat. 25202111203 CND

EDGAR RICARDO NIVIA NIVIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Mat No. 25202113512 CND

EDGAR ANTONIO CARDENAS VALDERRAMA
RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA
Lic No 25202113012 CND

MARIA ESPERANZA AMORTEGUI MONTAÑEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Licencia No. 2520262110 CND

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74377935	EDGAR ANTONIO CARDENAS VALDERRAMA	TRANSVERSAL 7 # 7-17	8575231	seguridad21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76638160	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$502.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	11	1.700	0	220.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	11	2.100	0	282.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	11	0	0	0
ICBF				
0	11	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	220.600
Pensión	1	280.200	282.300
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	502.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

202

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74377935	EDGAR ANTONIO CARDENAS VALDERRAMA	TRANSVERSAL 7 # 7-17	8575231	segurisocial21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76638460	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$502.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Extranjero en Colombia	Cotizante Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 74377935	CARDENAS VALDERRAMA EDGAR ANTONIO	X				X														25-14	1.750.595	30	280.200	0	0	0	0	EPS038	1.750.595	30	419.900		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	46455565	MARCELA VIVIAN ROJAS HERNANDEZ	calle 11a # 79a - 60 interior 17 apartamento	4122365	vivis136@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75462996	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$582.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	4	700	0	250.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	4	900	0	320.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	4	100	10.600			105	10.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.700
Pensión	1	320.000	320.900
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	582.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	46455565	MARCELA VIVIAN ROJAS HERNANDEZ	calle 11a # 79a - 60 interior 17 apartamento	4122365	vivis136@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75462996	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$582.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colsanio	Sucursal	Extranjero	Cotiz. adicional	Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 46455565	ROJAS HERNANDEZ MARCELA VIVIAN	57	0			1																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS305	2.000.000	30	259.000	14-23	2.000.000	30	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

205

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1003908748	PAULA JIMENA CORTES OLAYA		Cra 7#7 87	8575101	jime.13101@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72978978	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$499,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1003908748	PAULA JIMENA CORTES OLAYA		Cra 7#7-87	8575101	jime.13101@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72978978	08/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$499,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS/COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1003908748	CORTES OLAYA PAULA JIMENA	3	0			N																250301	1.750.905	30	210.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	218.900		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900205881-8	CONSTRUCTORA SAKARAH SAS	CALLE 7B No 4C-48	8697066	cmariano226@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	CENTRO / 013	CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73981706	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$1,750,906	$542,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23030I	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	121.900				121.900	0	0	121.900			1.219	121.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.900	121.900
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	542.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

212

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900205881-8	CONSTRUCTORA SAKARAH SAS	CALLE 7B No 4C-18	5697065	cmariano226@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	CENTRO CULTURAL / 013	CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73981706	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$1,750,905	$542,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Estudios	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Clasificación	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1075689675	DELGADO RAMIREZ IVON VIVIANA	1	0			SI																23C3C1	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS038	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	5	121,600	CCF21	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

213

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOL[illegible]DACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	902026889-5	CONSORCIO DEL ABRA	CALLE 6 # 7-05	8697524	consorciodelabra@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 [illegible]		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77097851	22/04/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$2.092.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.092.700				2.092.700	0	0	2.092.700			20.927	2.092.700	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	2.092.700	2.092.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	2.092.700	2.092.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOL[illegible]DACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	902026889-5	CONSORCIO DEL ABRA	CALLE 6 # 7-05	8697524	consorciodelabra@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77097854	22/01/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$2.092.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1033308748	CORTES CLAVIJA PAULA JIMENA	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 1013524703	VALERO CETINA JOHAN STEVEN	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 1017193053	AREVALO ARGUELLO NUBIA CAROLINA	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 1075658837	COLMENARES CARDENAS OSCAR MAURICIO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 11345741	CAICEDO NIETO GUILLERMO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 46455565	ROJAS HERNANDEZ MARCELA VIVIAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 52054997	AMORTEGUI MONTAÑEZ MARIA ESPERANZA	59	0			N								X										0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	2.800.000	30	5	194.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 52146913	DIAZ PINZON JASMIN FABIOLA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 52727771	BARON MENDEZ SULAY YAMILE	59	0			N	X							X										0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 5471618	NUÑEZ GALEANO LISANDRO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	2.600.000	30	5	181.000		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 74372915	CARDENAS VALDERRAMA EDGAR ANTONIO	59	0			N	X							X										0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 7391665	AVILA JARAMILLO WILFRED ALEXIS	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	2.600.000	30	5	181.000		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 79248910	NIVIA NIVIA EDGAR RICARDO	59	0			N								X										0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 80491593	MENDOZA FORERO CARLOS ANTONIO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	2.800.000	30	5	194.900		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 91457560	RUGE CARDENAS JUAN CARLOS	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0

COPIA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO DEL ABRA
NIT 902.026.889-5

Tocancipá, 16 de abril de 2026

Señores
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL DETERCONSA
Tocancipá, Cundinamarca

REF: No. INP.DTC-002-2026 cuyo objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DE TOCANCIPA – ZIPAQUIRA DESDE EL PUENTE RIO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

El suscrito Contador **ADRIANA VICTORIA MALDONADO PULIDO**, hace saber que el **CONSORCIO DEL ABRA** identificado con Nit No. 902.026.889 - 5, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la ejecución del contrato.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento a los Artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la ley 1150 de 2009.

Atentamente,

ADRIANA VICTORIA MALDONADO PULIDO
TP 278192 – T
Contador

Calle 6 No. 07 – 05, Gachetá
Celular: 3008497267
Email: Consorciodelabra@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 3 6 6 4 6 7 2 6 7 8 1 1 5 9 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA VICTORIA MALDONADO PULIDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075661583 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 278192-T **SI** tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.075.661.583
MALDONADO PULIDO
APELLIDOS
ADRIANA VICTORIA
NOMBRES
Adriana Maldonado
FIRMA

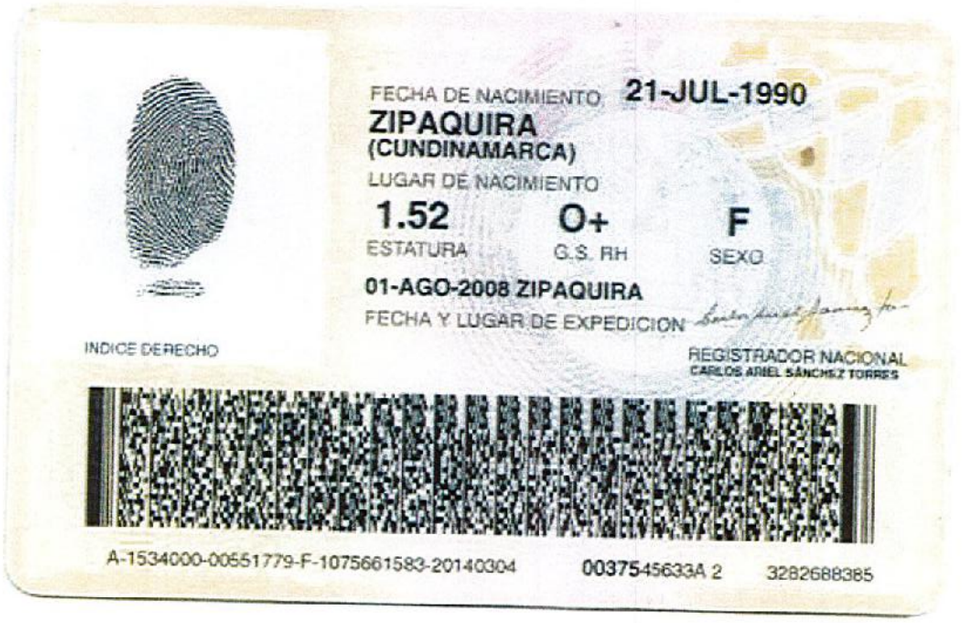
FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1990
ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
01-AGO-2008 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1534000-00551779-F-1075661583-20140304
0037545633A 2
3282688385

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

278192-T



ADRIANA VICTORIA
MALDONADO PULIDO
C.C. 1075661583
RES. INSCRIPCION 173 DEL 23/02/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

300305 313764

Identificación Plastica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11345741		CAICEDO NIETO GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16 n 14 26	Z:PAQUIRA-CUNDINAMARCA	8511028	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	182440085	9502498118	I	2026/04/13	2026/03/31	BANCO DE BOGOTA	0	$1,891,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$812,500			$6,500,000	$39,000			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$812,500			$6,500,000	$39,000			$0	$0		$0	$0
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$812,500			$6,500,000	$39,000			$0	$0		$0	$0
1	CC	11345741	CAICEDO GUILLERMO	25-14	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS008	30	$6,500,000	$812,500	CCF24	30	$6,500,000	$39,000		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$812,500			$6,500,000	$39,000			$0	$0		$0	$0

190

2026/03/31 08:45 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11345741		CAICEDO NIETO GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16 n 14 25	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	8511028	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	182440085	95072493418	I	2026/04/13	2026/03/31	BANCO DE BOGOTA	0	$1,891,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$812,500	$0	$0	$812,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$812,500	$0	$0	$812,500
TOTAL				1	$1,891,500	$0	$0	$1,891,500

191

2026/03/31 08:45 AM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-08, 10:16:09 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Numéro Planilla: 1080152608

Periodo Cotización: marzo de 2026 | Periodo Servicio: marzo de 2026 | Referencia pago (PIN): 8823855373

PAGADO 08/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDGAR RICARDO NIVIA NIVIA		
Documento	CC79248910	**Dirección**	CR 111A #152 C - 15 CASA 98
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6860095
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	CAS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79248910	EDGAR RICARDO NIVIA NIVIA	03	00																	0	30	30	0	30 (25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 216.900	0,000	$ 0	$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 634.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 216.900	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 634.200	$ 500	$ 634.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

192

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **MARIA ESPERANZA AMORTEGUI MONTAÑEZ**, identificada con **CC** número **52054897**, aportó por **MARIA ESPERANZA AMORTEGUI MONTAÑEZ** identificado(a) con **CC** número **52054897** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2026-3 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	INCT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	3									0	30	$4.500.000	0.12500	$562.500	$0	$0	Marzo - 2026	70417289	22/04/2026	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3									0	30	$4.500.000	0.16000	$720.000	$0	$0	Marzo - 2026	70417289	22/04/2026	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los 22 días del mes April de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

icontec ISO 9001 CO-SC5652-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013624703		VALERO CETINA JOHAN STEVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 74b 17m 29 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7904238	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	245716959	9503391384	I	2026/04/06	2026/04/22	NEQUI	16	$651,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tde	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,160,000	$23,200			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$644,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,160,000	$23,200			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$644,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,160,000	$23,200			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$644,200
1	CC	1013624703	VALERO JOHAN																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,750,905	6.950%	$121,900	30	$0	$0	No	$644,200
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,160,000	$23,200			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$644,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$3,100	$0	$283,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$3,100	$0	$283,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$1,400	$0	$123,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$1,400	$0	$123,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$300	$0	$23,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$23,200	$300	$0	$23,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,400	$0	$221,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$2,400	$0	$221,300
TOTAL				1	$644,200	$7,200	$0	$651,400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	
CC	63451241	JOHANNA GOMEZ VANEGAS		Avenida Bicentenario Isla 2 casa 12 Natura	3103343679	ing.johannagomez@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77109624	22/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$502.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	9	1.400	0	220.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-11	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	9	1.800	0	282.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	220.300
Pensión	1	280.200	282.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	502.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	63451241	JOHANNA GOMEZ VANEGAS	Avenida Bicentenario lote 2 casa 12 Natura	3103343579	ing.johannagomez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77109624	22/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$502.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ZOR DEDICACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporta SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 63451241	GOMEZ VANEGAS JOHANNA	3	0			N																	25-14	1.750.905	30	230.230	0	0	0	0	EPS095	1.750.905	30	218.500		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	802026889-5	CONSORCIO DEL ABRA		CALLE 6 # 7-05	8697524	consorciodelabra@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78044330	27/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$122.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	121.900				121.900	4	300	122.300			1.219	122.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	121.900	122.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	121.900	122.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	902026839-5	CONSORCIO DEL ABRA		CALLE 6 # 7-05	8897524	consorciodelabra@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 200			CUNDINAMARCA	TOCANCIPA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78044390	27/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$122.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Juvenil	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDECO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Días de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1151241	GOMEZ VANEGAS JOHANNA	59	0			N	X															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1511	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91487950		RUGE CARDENAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 62 No.4A-88 ap 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3003131786	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	199981596	95027404S7	I	2026/04/16	2026/04/06	DAVIbank S.A.	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	91487950	RUGE CARDENAS JUAN CARLOS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			$0	$0			**$1,750,905**	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901018163-1	CARLOS MENDOZA INGENIERIA SAS	CARRERA 8A No. 153-51 int 3 a-1001	3203494592	carlos.mendoza.l@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71370703	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$10.000.000	$2.552.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.600.000	0	0	50.000	50.000	0	0		1.700.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	52.200				52.200	0	0	52.200			522	52.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	400.000	0	0	400.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
Pensión	1	1.700.000	1.700.000
Riesgos Laborales	1	52.200	52.200
CCF	1	400.000	400.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.552.200	2.552.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901018163-1	CARLOS MENDOZA INGENIERIA SAS	CARRERA 8A No. 153-51 int 3 a-1004	3203494592	carlos.mendoza.f@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71370703	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$10,000,000	$2,552,200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sub-tipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80491503	MENDOZA FORERO CARLOS ARTURO	1	0			S																	25-14	10,000,000	30	1,600,000	0	0	50,000	50,000	EPS094	10,000,000	30	400,000	14-01	10,000,000	30	1	52,200	CCF24	10,000,000	30	400,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

194

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	5471618
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			LISANDRO NUNEZ GALEANO
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	CALLE 169 72-51 ES APTO 904	TELÉFONO	2156557
TIPO APORTANTE	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	6010436621		TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/m/dd)	2026/04/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN		108476440

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23101	23101-COLFONDOS	1	$ 2.976.000	$ 0	$ 0	$ 93.000	$ 93.000	$ 0	$ 0	$ 3.162.000	$ 0	$ 3.162.000
SUBTOTALES:										**$ 3.162.000**	**$ 0**	**$ 3.162.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS047	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.325.000	$ 0	$ 0	$ 2.325.000
SUBTOTALES:													**$ 2.325.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.325.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-93	14-93-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.100	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 97.100
SUBTOTALES:									**$ 97.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 97.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1017193053	NUBIA CAROLINA AREVALO ARBOLEDA		CALLE 4 N 16 10	3136971895	carol.naa91@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71735436	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$1,750,905	$521,200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	218.900	0		0		0	6	900	0	219.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	280.200	0	0	0	0	6	1.200	0	281.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	6	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860006942-7	10.600	6	100	10.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.800
Pensión	1	280.200	281.400
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	1	10.600	10.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	518.900	521.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1017193053	NUBIA CAROLINA AREVALO ARBOLEDA	CALLE 1 N 16 10	3196971895	carolinaa91@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	ZIPACUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71735436	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$1,750,905	$521,200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sustitutiva	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1017193053	AREVALO ARBOLEDA NUBIA CAROLINA	SS	0		N																	250901	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS010	1,750,905	30	218,900	14-03	1,750,905	30	1	6,200	CCF24	1,750,905	30	10,600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	52727771
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SULAY YAMILE BANCHI MENDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 SUR 52-55	TELÉFONO:	6575051
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipos per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		60130837736	TIPO DE PLANILLA:		I INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 2026
DIAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/21	NUMERO AUTORIZACIÓN:		241584211

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230901	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 280.200	$ 200	$ 280.400
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 200**	**$ 280.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 218.900	$ 200	$ 0	$ 219.100
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 219.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA

CONSORCIO DEL ABRA

Contrato - Proceso

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº DTC-IP-18- 2026

Proyecto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

CUNDINAMARCA

2026.

Calle 6 No. 07 – 05, Gachetá
Celular: 3008497267
Email: Consorciodelabra@hotmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA POLITICA DE CALIDAD. 3
2. DATOS DEL PROYECTO 3
3. DESCRIPCION DE LA CALIDAD SGC 4
   - 3.1 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 4
   - 3.2 CALIDAD DE LA OBRA Y COMO SE IMPLEMENTA – CONTROL DE CALIDAD 6
   - 3.3 PROPÓSITO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 6
   - 3.4 NORMAS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 6
4. GENERALIDADES Y ALCANCE 7
5. RESPONSABILIDAD DEL MANEJO 9
6. METODOS DE CONSTRUCCION 11

ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA POLITICA DE CALIDAD.

El Plan de calidad juega un papel importante dentro de la ejecución de los procesos, productos o proyectos, utilizado como una estrategia de trabajo que guía la práctica de las diferentes actividades dentro de la tarea en la fase de planificación y se convierte en un instrumento de evaluación que se basa en los criterios de calidad, seguridad y medio ambiente para la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos contractuales.

Además, el plan de calidad genera una herramienta técnica y eficaz que facilita la identificación de las necesidades, tiene en cuenta las exigencias y requisitos de los clientes, controla y monitorea las actividades a desarrollar del proyecto, supervisa e inspecciona el manejo de los recursos, para la optimización de los mismos; con el fin de tomar acciones correctivas y/o preventivas que brinden la posibilidad de retroalimentar el desarrollo del proyecto y así mejorar continuamente.

Por consecuente se adopta el plan de calidad para el proyecto, *CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº DTC-IP-18- 2026 – "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA";* en el cual se busca una conexión de procesos, procedimientos, y manuales de control para aplicar la calidad de forma directa en el desarrollo de la obra.

2. DATOS DEL PROYECTO

CONTRATO O PROCESO DE OBRA Nº	DTC-IA-14- 2026
OBJETO DEL CONTRATO PROCESO	*MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ- ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*
LOCALIZACION DEL PROYECTO	VIA LA FUENTE - TOCANCIPA
MUNICIPIO	TOCANCIPA - CUNDINAMARCA

3. DESCRIPCION DE LA CALIDAD SGC

Para el logro de la calidad, **Consorcio del Abra**, planifica el desarrollo de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la organización, el cual es presentado a continuación.

3.1 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

La planificación de los procesos necesarios para la prestación de servicios se realiza con la evaluación de la capacidad técnica, administrativa y financiera necesaria para dar respuesta a la demanda del servicio y a las necesidades y expectativas del cliente.

La planificación se evidencia en el plan de calidad de cada una de las obras que se desarrollan, el cual incluye: las actividades, responsables, parámetros controlados, ambiente de trabajo, recursos, equipos, documentos o registros resultantes, entre otros.

La descripción de cada uno de los procesos, los puntos de control necesarios y los criterios de aceptación de los mismos, están definidos en el pliego de condiciones.

Dentro del correcto proceso de calidad se debe determinar todas las actividades contratadas siguiendo el correcto proceso constructivo, siendo de vital importancia el cumplimiento de las especificaciones técnicas adoptadas para el proyecto, como también las que apliquen en el orden nacional, y que buscan que los resultados obtenidos sean los mejores con el fin de garantizar su estabilidad general para cuando sean puestas en servicio, cumpliendo con los tiempos solicitados por la entidad contratante – Deterconsa y los periodos de diseño estimados por parte de la consultoría cuando concibió el proyecto.


Dentro de las especificaciones generales se puedan enumerar las siguientes, las cuales dan las pautas necesarias para una buena ejecución del proyecto, así:

- Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, especificaciones particulares del proyecto y demás documentos técnicos contractuales aprobados.
- Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y construcción del IDU (ET – IC).
- Manual de Interventoría de obras, pliegos, contrato, estudios, diseños, actas, aclaraciones y demás documentos que rijan la ejecución y el control del proyecto.
- Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico de Colombia – RAS 2000.

- Normas y Especificaciones Técnicas del Sistema de Normalización Técnica – Normas SISTEC, adoptadas en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
- Manual de señalización vial vigente, PMT aprobado y demás lineamientos de tránsito temporal o definitivo que apliquen al proyecto.
- Normatividad ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, y requisitos de fabricantes o prestadores de servicios cuando sean aplicables a materiales, equipos o procedimientos.

Y cualquier otra normatividad que se ajuste a las necesidades del proyecto

PLANIFICACION DE LA CALIDAD

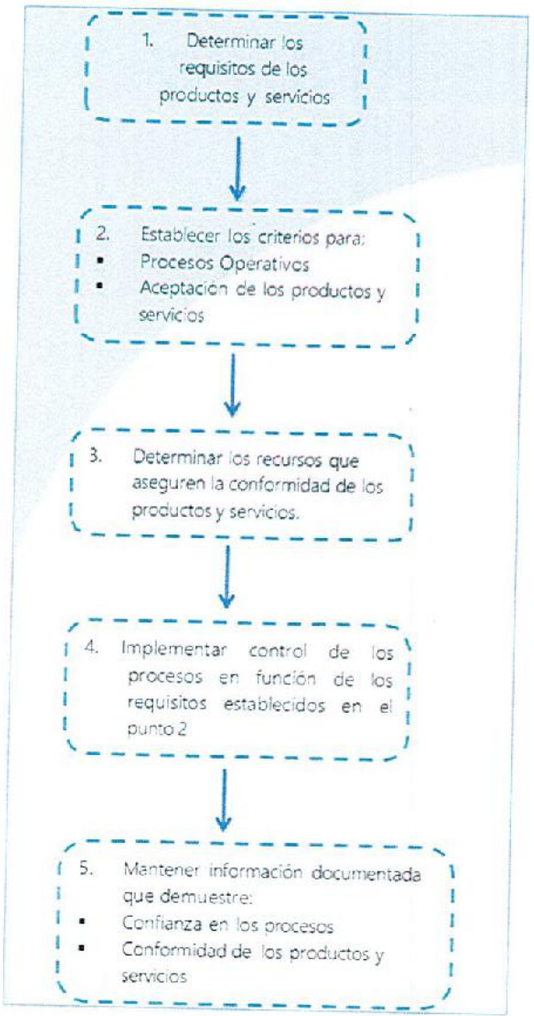

3.2 CALIDAD DE LA OBRA Y COMO SE IMPLEMENTA – CONTROL DE CALIDAD

Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicación de los mismos.

Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí indicados. La aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en este plan de calidad:

- Direccionamiento Gerencial
- Licitaciones y Presupuestos
- Ejecución de Obras
- Compras
- Gestión Humana Disponibilidad de recursos para el SGC

Los recursos empleados por el SGC, bien físicos o bien de información, están definidos en cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras.

El Coordinador es quien aprueba tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad.

3.3 PROPÓSITO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El propósito del plan de control y aseguramiento de calidad es minimizar los riesgos, mejorar y controlar el rendimiento de los procesos constructivos ejecutados para así garantizar la entrega de obras con calidad que respondan a los ideales de las partes interesadas.

3.4 NORMAS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Las normas modelo para el desarrollo del Plan de Gestión Integral de Obra son:

- NTC ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y vocabulario. NTC ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.
- NTC ISO 10005:2005. Sistemas de Gestión de la calidad. Directrices para los planes de la Calidad.
- Decreto 1072 de 2015. Norma Reglamentaria Sector Trabajo.
- Guía ambiental para el Sector de la Construcción – Secretaria Distrital de Ambiente.

4. GENERALIDADES Y ALCANCE

4.1 POLÍTICA DE CALIDAD

Las acciones de CONSORCIO DEL ABRA, están encaminadas a brindar servicios de interventoría, diseño y construcción, mediante la dirección y ejecución de obras de Ingeniería Civil, la construcción, conservación, mantenimiento y remodelación de vías, parques, edificios y en general todas las obras de interés público y privado, así mismo ofrece consultorías y asesorías en gestión de proyectos, con el firme compromiso de dar cumplimiento a los requerimientos legales y/o reglamentarios y a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, promoviendo una mejora continua y evaluación en los procesos de la organización.

4.2 OBJETIVO DE LA POLITICA

Garantizar y cumplir con los requisitos de calidad que el cliente requiere según a sus requerimientos, cumpliendo con las especificaciones, normas, materiales de construcción, fabricación, montaje protección de superficie e inspección, aplicable a todos los materiales, elementos, y equipos solicitados por el cliente.

Desarrollar un alto nivel de competencia del personal de la organización con el propósito de mejorar continuamente la calidad en los procesos de gestión y producción aprovechando y optimizando al máximo los recursos disponibles en el proyecto.

4.3 ALCANCE Y DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LAS OBRAS

En este plan de control y aseguramiento de la calidad se expone las acciones que desarrollará el CONSORCIO DEL ABRA, como contratista para cumplir los requisitos de calidad de las obras, cubre todos y cada uno de los procesos administrativos, productivos y técnicos que se requieren para el desarrollo de la obra.

4.3.1. PRODUCTO

- Cumplir con el objeto contractual de conformidad con los el estudio y documentos previos, la minuta del contrato, las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones junto con sus anexos, documentos adjuntos y adendas.
- Suscribir y radicar oportunamente el acta de inicio las actas de avance, las actas de pagos parciales, el acta de finalización, el acta de liquidación del contrato y demás documentos a que haya lugar.
- Presentar un programa detallado de trabajo que incluya todas las actividades previas y durante toda la ejecución del contrato, dentro de los ocho (8) días

siguientes a la suscripción del contrato, el cual debe ser sometido a la aprobación de la interventoría.

- Atender de manera diligente las observaciones, recomendaciones e instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por la interventoría.
- Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, animales, plantas, cosas o medio ambiente y garantizar que el personal a su cargo también lo haga.
- Prevenir los accidentes y tomar todas las precauciones necesarias para reaccionar de manera oportuna a las situaciones de emergencia que se puedan presentar por hechos atribuibles a la naturaleza, a terceros o a la ejecución de los trabajos.
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
- Ser responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de la contratación, cuando con ellos cause perjuicio a La Entidad o a terceros.
- Contratar a su cargo el personal que requiera para ejecutar el contrato, sin limitarse a los requeridos en el presente pliego de condiciones y sus respectivos anexos. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones -si resultaren- son como mínimo los previstos en la Legislación Colombiana.
- Instalar frentes de trabajo para garantizar rendimientos y adelantar la ejecución del proyecto de manera adecuada según las necesidades de la Entidad.
- Garantizar mejores rendimientos en la ejecución de las actividades y poder reducir los cierres de los tramos en la zona operativa.
- Contar con el visto bueno de la interventoría para la verificación de los requisitos exigidos en el pliego para el personal mínimo solicitado y en general toda persona que vaya a laborar en la ejecución del contrato.
- Relacionar mensualmente los conceptos básicos mínimos de carga prestacional pagados a cada trabajador.
- Cumplir con las afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y con los pagos de aportes Parafiscales en los términos de la legislación vigente.
- Garantizar la disponibilidad solicitada respecto de los miembros del equipo mínimo requerido en los pliegos; garantizar su suplencia inmediata en caso de ausencia o retiro e informar de este hecho al interventor del contrato, quien verificará que el personal de reemplazo cumple con los mismos requisitos exigidos para el cargo.
- Suministrar la información completa y oportuna de los gastos e inversiones necesarios para la ejecución de la obra, para que la Entidad lleve sus registros, comprobantes y documentos en los términos previstos en el Decreto 2649 de 1993, el Plan Único de Cuentas contenido en el Decreto 2650 de 1993 y demás normas modificatorias y complementarias.

- Responder por los documentos físicos o magnéticos producidos, elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato, los cuales acepta son de propiedad de la Entidad.
- Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Plan de Manejo Ambiental.
- Efectuar el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
- Poner a disposición de la interventoría y de la Entidad todos los comprobantes, registros, libros, recibos de cotizaciones, órdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier documentación de soporte relacionada con las cuentas del contrato, en materia técnica o laboral, durante el plazo del mismo y un (1) año más, sin oponer reglas de reserva documental.
- Participar en las reuniones que sean convocadas por el interventor o por la Entidad. para revisar el estado de ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico que sea de interés.
- Reparar por los daños e indemnizar a la Entidad. por el incumplimiento del contrato. Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores.
- Proveer el transporte adecuado para el cumplimiento de sus compromisos contractuales.
- Colocar y mantener la señalización de la obra de acuerdo a las disposiciones de la operación la Entidad.
- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

5. RESPONSABILIDAD DEL MANEJO

Son responsables los líderes de la empresa que deben apuntar a la creación y al mantenimiento de un ambiente interno en el cual los empleados puedan alcanzar plenamente los objetivos de la calidad de la organización, teniendo en cuenta de:

- Asegurar las actividades (planificación, implementación y control), requeridas para el Sistema de Gestión de Calidad y su seguimiento.
- Determinar la secuencia e interacción de los procesos.
- Comunicar los requisitos y funciones a los departamentos,
- subcontratistas y clientes y resolver los problemas que surjan de la interacción de dichos grupos.
- Revisar los resultados de las auditorías realizadas.
- Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del Plan de Calidad.
- Controlar acciones correctivas y preventivas.
- Revisar y autorizar cambios o desviaciones al Plan de Calidad.

- CONSORCIO DEL ABRA integra personal competente con los requisitos establecidos para cumplir el plan de la calidad el proyecto y asegura que su personal entienda la importancia e impacto que tienen sus funciones en la organización.
- Será responsabilidad de todo el personal del proyecto el cumplimiento del presente plan.

5.1 Representante Legal

- Cumplir y velar por el cumplimiento de las obligaciones pactadas mediante el contrato con el contratante.
- Colaborar con el contratante para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad y ofrezca las mejores condiciones.
- Obrar con lealtad y buena fe en las etapas contractuales.
- Acatar las órdenes del contratante durante la ejecución de la obra.
- Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.

5.2 Director y Residentes de Obra

- Conocer el plan de aseguramiento y gestión de la calidad de la obra.
- Poner en práctica los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte del plan de aseguramiento de la calidad.
- Liderar la planificación de la calidad de los trabajos a ejecutar en la obra.
- Cumplir los procedimientos y procesos de control de calidad.
- Revisar los resultados del programa para disponer medidas orientadas a que se logren los niveles de calidad esperados.

5.3 Asesor SISO

- Elaborar el plan de calidad de la obra de acuerdo a los estándares y obtener la aprobación del contratante de ser necesario.
- Responsable del mantenimiento e implementación del plan de calidad y documentos referentes.
- Establecer los planes de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad al inicio, analizando los riesgos específicos y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.
- Conducir inspecciones planificadas, utilizando formatos estandarizados para medir y registral el desempeño en seguridad, salud, calidad y medio ambiente.
- Establecer mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la ejecución de la obra se lleve a cabo de acuerdo a la norma establecida de acuerdo a responsabilidades de cada cargo.

5.4 Topógrafo e inspector de obra

- La construcción mediante el montaje de componentes y/o conjuntos según las instrucciones de trabajo facilitadas, y vigilar que las piezas se adapten a las características de calidad exigidas.

6. METODOS DE CONSTRUCCION

6.1. REVISIÓN DE PROYECTO

a) Coherencia documental: Se comprueba la coherencia documental entre planos, memoria, pliego de condiciones técnicas, unidades y presupuesto.
b) Definición: Se comprueba que el pliego de condiciones técnicas describe y define todos los materiales y unidades de obra del proyecto, así como el sistema de ejecución.
c) Normativa: Se comprueba la aplicación de toda la normativa del proyecto.

6.2. CONTROL DE MATERIALES

a) Control documental de materiales y equipos: mediante los certificados de calidad de origen industrial los cuales justifiquen el cumplimiento en base a los reglamentos y normas que aplique.

6.3 RECEPCIÓN Y CONTROL

Se comprueban las características físicas y dimensionales, así como la ausencia de daños, roturas, etc. de los materiales que forman parte del proyecto.

a) Recepción:
Supervisión de las posibles modificaciones o adaptaciones que tengan que realizarse.
Supervisión de las pruebas de garantía.
Comprobación de las modificaciones recomendadas durante la ejecución, y del correcto funcionamiento de equipos e instalaciones, así como la funcionalidad de la obra realizada.

b) Control de ejecución: Se verifica que la obra se ha construido de acuerdo a lo previsto en el proyecto, con la calidad requerida y especificaciones técnicas funcionales de la entidad contratante, siguiendo los criterios indicados como planos y reglamentación vigente aplicable. Control documental de materiales y equipos: mediante los certificados de calidad de origen industrial los cuales justifiquen el cumplimiento en base a los reglamentos y normas que aplique.

ANEXOS

MATERIALES DEL PROYECTO A CONTROLAR (PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS)							
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	MATERIALES O EQUIPOS	PRUEBA O ENSAYO A APLICAR	ENSAYO			RESPONSABLE	REGISTRO
			CRITERIO DE ACEPTACION	NORMA DE ENSAYO	FRECUENCIA		
TRAZADO LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	ESTACION TOTAL	CALIBRACION	Precisión lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), precisión angular ≤ 3 . Alcance: con un prisma hasta 2000 metros en buenas condiciones. (Accesorios: Trípodes , bastones , prismas, cintas metálicas, baterías, entre otros).	La Norma Técnica Colombiana NTC 6271 de 2018 ESPECIFICACIONES IDU	1 CADA 6 MESES	TOPOGRAFO RESIDENTE INTERVENTOR	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
	NIVEL DE PRECISION	CALIBRACION	Los diámetros mínimos de los objetivos en centímetros (cm) serán 2.5 a 4.5, sensibilidad del nivel 60" a 30 , aumento ≥ 28x, precisión instrumental (mm/km)	La Norma Técnica Colombiana NTC 6271 de 2018 ESPECIFICACIONES IDU	1 CADA 6 MESES	TOPOGRAFO RESIDENTE INTERVENTOR	CERTIFICADO DE CALIBRACION

MATERIALES DEL PROYECTO A CONTROLAR (PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS)							
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	MATERIALES O EQUIPOS	PRUEBA O ENSAYO A APLICAR	ENSAYO			RESPONSABLE	REGISTRO
			CRITERIO DE ACEPTACION	NORMA DE ENSAYO	FRECUENCIA		
			≤ 1.5. (Accesorios: Trípode y mira patronada en buen estado).				
DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO	RCD	DISPOSICION EN ESCOMBRERA	PERMISO AMBIENTAL VIGENTE	PMA	MENSUAL POR DESARROLLO DE LA OBRA	RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTOR	FORMATO RCD
DESCAPOTE MECANICO Y LIMPIEZA HASTA E=20CM (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES	MATERIA ORGANICA	DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	PERMISO AMBIENTAL VIGENTE	PMA	MENSUAL POR DESARROLLO DE LA OBRA	RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTOR	FORMATO RCD
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	RCD	DISPOSICION EN RELLENOS	PERMISO AMBIENTAL VIGENTE	PMA	MENSUAL POR DESARROLLO DE LA OBRA	RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTOR	FORMATO RCD
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	RECEBO COMUN	GRANULOMETRÍA	Granulometria por tamizado hasta el	ESPECIFICACIONES IDU	UN (1) ENSAYO CADA 1000 M2	RESIDENTE DE OBRA Y PERSON	RESULTADOS DEL ENSAYO EXPEDIDO POR

MATERIALES DEL PROYECTO A CONTROLAR (PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS)							
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	MATERIALES O EQUIPOS	PRUEBA O ENSAYO A APLICAR	ENSAYO			RESPONSABLE	REGISTRO
			CRITERIO DE ACEPTACION	NORMA DE ENSAYO	FRECUENCIA		
MECÁNICAMENTE			tamiz No. 200; una prueba por cada 1000 m2; métodos: MOP – E9 – 59T o ASTM D422 – 63 o AASHO T – 88 – 57.			AL DE OBRA INTERVENTOR	EL LABORATORIO
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	RAJON SELECCIONADO	ABRASION POR MAQUINA DE LOS ANGELES	DESGATE ≤ 50%	ESPECIFICACIONES IDU	UN (1) ENSAYO CADA 1000 M2	RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL DE OBRA INTERVENTOR	RESULTADOS DEL ENSAYO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO
	BASE GRANULAR CLASE A	ABRASION POR MAQUINA DE LOS ANGELES	DUREZA: • DESGATE: 500 rev. ≤ 35% 100 rev. ≤ 7%	ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS 2022 - INVIAS		RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL DE OBRA INTERVENTOR	RESULTADOS DEL ENSAYO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO
		CONTENIDO DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES	LIMPIEZA: • Máximo 2%				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y						CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR EL PROVEEDOR

MATERIALES DEL PROYECTO A CONTROLAR (PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS)							
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	MATERIALES O EQUIPOS	PRUEBA O ENSAYO A APLICAR	ENSAYO			RESPONSABLE	REGISTRO
			CRITERIO DE ACEPTACION	NORMA DE ENSAYO	FRECUENCIA		
	SEPARACIÓN						
	RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFLATO						CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR EL PROVEEDOR
	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25/MDC-19						CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR EL PROVEEDOR
	ESTABILIZADO BASE GRANULAR BGA AL 3%			ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS 2022 - INVIAS			RESULTADOS DEL ENSAYO EXPEDIDO POR EL LABORATORIO
