UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
DEL: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ". BPIN 20243218000007

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
CORPOGUAJIRA

CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF

DICIEMBRE DEL 2025

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL. 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 4
DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 5
INFORMACION ADMINISTRATIVA 6
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 6
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 7
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 7
PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 7
PERSONAL DEL CONTRATISTA 8
CORRESPNDENCIA 8
PROGRAMACIÒN Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO 9
ACTIVIDADES EJECUTADAS 9
VERIFICACIÓN DE PREDIOS A INTERVENIR 10
INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA 15
INFORMACIÓN LEGAL. 15
INFORMACIÓN FINANCIERA. 17
ACTIVIDADES FINANCIERAS 18
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 20
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental del proyecto denominado “construcción de estufas ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático en zona rural del departamento de la guajira”.

La interventoría tiene como propósito verificar el cumplimiento integral del objeto contractual, asegurando que las obras se ejecuten conforme a los diseños, especificaciones técnicas, normativas ambientales vigentes y condiciones establecidas en el contrato. Así mismo, se realiza seguimiento al manejo administrativo y financiero del proyecto, garantizando una gestión eficiente, transparente y alineada con los objetivos institucionales.

Este informe presenta el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 hasta 31 de diciembre de 2025, incluyendo los anexos pertenecientes al presente contrato; de igual forma presenta la información general del contrato y una descripción del avance de las obras adelantadas en los diferentes frentes de obra, actividades administrativas, como el estado financiero del contrato, así como las observaciones y recomendaciones necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVO GENERAL.

Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", con el fin de garantizar que su ejecución se realice conforme a los términos contractuales, especificaciones técnicas, normativas vigentes y principios de eficiencia, transparencia, calidad y sostenibilidad ambiental, velando por el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto y la correcta inversión de los recursos públicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Realizar el seguimiento de las diferentes actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato.
- Mostrar el avance que presenta la obra.
- Informar la gestión de la Interventoría.
- Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra.

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

El contrato de obra 0051 DE 2025 el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA la construcción de 1200 estufas ecoeficientes, ubicados en zonas rurales de 9 municipios, distribuidos de la siguiente manera:


1. 266 estufas ecoeficientes en Riohacha
2. 225 estufas ecoeficientes en el municipio de Barrancas
3. 252 estufas ecoeficientes en el municipio de Distracción
4. 223 estufas ecoeficientes en el municipio de la jagua del Pilar
5. 66 estufas ecoeficientes en el municipio de Hatonuevo
6. 61 estufas ecoeficientes en el municipio de Maicao
7. 51 estufas ecoeficientes en el municipio de Villa nueva
8. 29 estufas ecoeficientes en el municipio de Uribia
9. 27 estufas ecoeficientes en el municipio de Manaure

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto a intervenir se encuentra localizado en la Zona rural de 9 municipios del departamento de la Guajira, A continuación, se relaciona la localización de los sitios donde se ejecutará el proyecto.

Uribia, Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Manaure, Villanueva y La Jagua del Pilar

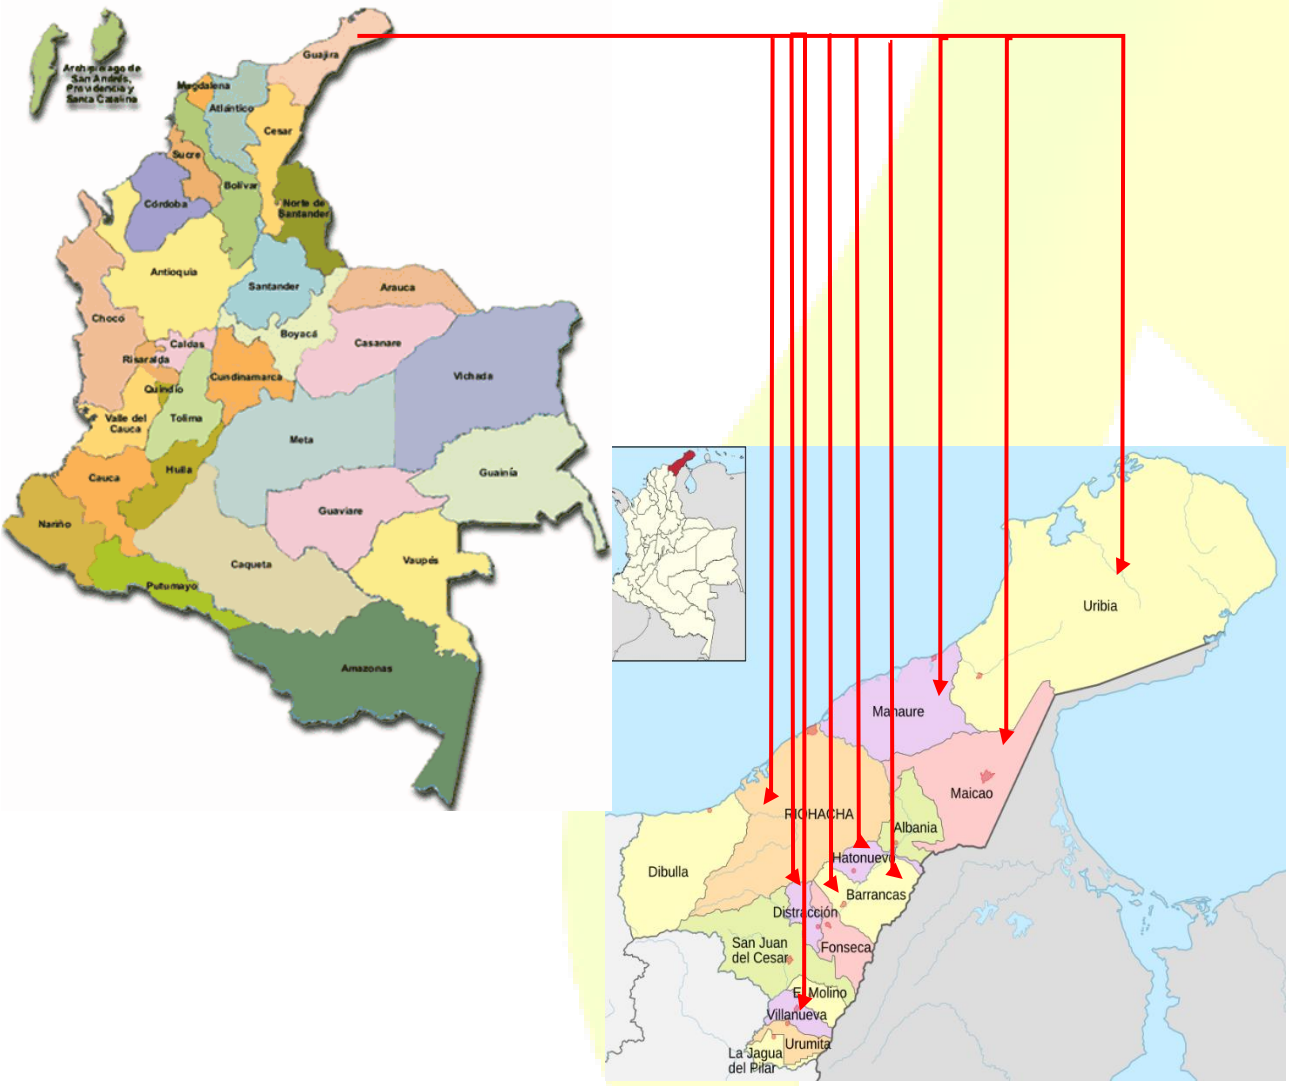

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

INFORMACION ADMINISTRATIVA
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 0051 DE 2025.	
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF
SUPERVISOR:	KIANA VALBUENA MEJÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20243218000007
CONTRATO NO:	0051 - 2025
CONTRATISTA DE LA OBRA:	FUNDACIÓN AGUA LUNA Nit. 900345569-4
REPRESENTANTE LEGAL:	GERALD BRISSON MENDOZA CC. 19.486.085 de Bogotá D.C
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 5.656.614.670.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 MARZO DE 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-0060-2025	
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF NIT: 901941657-4
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR CONTRATO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($409.937.150,00) M/L
SUPERVISOR	KIANA VALBUENA MEJÍA
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13 MARZO DE 2026

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Relación del personal técnico y administrativo afiliado a la seguridad social del contratista e interventoría asignado al proyecto.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Samir Jose Cardozo Solano	1118806268	DIRECTOR
Bielca Silena Pimienta Padilla	40.928.933	RESIDENTE
Zunilda Amaya Uriana	40951297	PROFESIONAL SOCIAL
Carlos Antonio Brito Avila	84090164	CONTADOR
Loranis Maxiel Diaz Mercado	1118838660	TECNICO DE CAMPO
Yenifer Soto Vargas	1124409653	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Marianne Mejia Cardozo	1118800355	AUXILIAR DE OFICINA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE	CEDULA	PERFIL	CARGO
Daniel Quintero Manotas	1122818210	ING. CIVIL	Director
Luisa Fernanda Guerra	1062401355	ING. AMBIENTAL	Residente de obra
María Fernanda Vargas	56078712	TRABAJADORA SOCIAL	Trabajadora social

CORRESPNDENCIA

Se realizaron las siguientes solicitudes:

- ✓ Solicitud de cronograma de obra – enviado el 20 de mayo de 2025
- ✓ solicitud de aprobación del plan de inversión de anticipo – recibido el 26 de mayo de 2025
- ✓ Aprobación de plan de inversión de anticipo por interventoría – enviado el 27 de mayo de 2025
- ✓ Informe Nº1 contrato de obra 0051 de 2025- enviado a supervisión el 31 de mayo de 2025
- ✓ Informe Nº1 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 05 de junio de 2025
- ✓ Solicitud de anticipo del contrato de interventoría CI-0060-2025- enviado a la supervisión el 06 de junio del 2025
- ✓ Modificaciones salariales de planilla de seguridad social del contrato de interventoría CI-0060-2025 - enviado a supervisión el 10 de junio de 2025
- ✓ Programación de obra – recibida el 10 de junio de 2025
- ✓ Solicitud de programación semanal de actividades – enviada el 17 de junio de 2025
- ✓ INFORME Nº2 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 01 de junio de 2025
- ✓ Informe Nº2 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 02 de julio de 2025
- ✓ INFORME Nº3 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 31 de julio de 2025
- ✓ Informe Nº3 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 01 de agosto de 2025
- ✓ INFORME Nº4 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 29 de agosto de 2025
- ✓ Documentos acta parcial Nº1 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 02 de septiembre
- ✓ Informe Nº4 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 02 de septiembre de 2025
- ✓ INFORME Nº5 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 30 de septiembre de 2025
- ✓ Solicitud de rendimientos financieros – enviado el 02 de octubre de 2025
- ✓ Informe Nº5 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 08 de octubre de 2025

- ✓ Documentos acta parcial Nº1 CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 14 de octubre de 2025
- ✓ INFORME Nº6 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 27 de octubre de 2025
- ✓ Documentos acta parcial Nº2 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 28 de octubre
- ✓ INFORME Nº6 contrato de obra 0060-2025 - enviado a supervisión el 06 de noviembre de 2025

PROGRAMACIÒN Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO

Detalle Actividad	Unidad	tidad T	2025 / 05	2025 / 06	2025 / 07	2025 / 08	2025 / 09	2025 / 10	2025 / 11	2025 / 12	2026 / 01	2026 / 02	2026 / 03
REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	und	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	und	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR MONITOREO A LOS IMPACTOS DEL USO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES	und	1										1	
CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (0.73 M X 1.05 M) H0.83 M.	und	1156		70	150	150	165	165	156	150	150		
CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (1.00 M X 3.00 M) H0.40 M.	und	44					22	22					
REALIZAR LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO	und	1		0,2			0,4					0,4	
REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COCCIÓNEFICIENTE.	und	34				5	10		10			9	
REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LACOMUNIDAD Y FAMILIAS BENEFICIADAS.	und	28	7	7									14

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó acompañamiento TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO del proyecto mediante el seguimiento permanente a las actividades realizadas por el contratista.

En el mes de diciembre el contratista en su informe presenta un avance en su ejecución del 11,57% detallado de la siguiente manera:

- ✓ Verificación de predios a intervenir
- ✓ Distribución de material
- ✓ Construcción de estufas

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN DE PREDIOS A INTERVENIR

En el periodo de corte se dio inicio al proceso de verificación de los predios correspondientes a los nuevos beneficiarios, en atención a que algunos de los beneficiarios incluidos en el listado anterior no cumplían con los requisitos técnicos y administrativos exigidos o se encontraban duplicados. Esta verificación tuvo como objetivo validar la información, corroborando las condiciones mínimas necesarias para la instalación de las estufas ecoeficiente. Se revisaron aspectos como:

- ✓ Que el predio este habitado.
- ✓ Que cuente con una pared de soporte para la construcción de la estufa
- ✓ Que cuente con techo de cubierta para la estufa
- ✓ Disponibilidad y aceptación del beneficiario para participar en el proceso constructivo

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL

Paralelamente, se realizó durante el presente periodo la entrega de materiales a las comunidades beneficiarias, garantizando que los insumos suministrados fueran acordes con las especificaciones requeridas para la correcta ejecución de la actividad. La interventoría realizó seguimiento a estas entregas, verificando cantidades, calidad y oportunidad.

Relación de material en el periodo	
Entregado/ beneficiario	Acumulado
150	1050

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

Se llevó a cabo la construcción de 150 estufas ecoeficientes de 0,73 m x 1,05 m durante el corte, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y en cumplimiento de los cronogramas establecidos. Estas actividades fueron verificadas en campo mediante visitas, en las que se constató la correcta ejecución de los trabajos, así como la calidad de los materiales empleados.

ESTUFAS CONSTRUIDAS DICIEMBRE 0,73 m x 1,05 m	
MUNICIPIO	**CANT.**
Distracción	37
Barrancas	63
La Jagua del Pilar	27
Riohacha	6
Maicao	14
Hatonuevo	2
Villanueva	1
TOTAL	**150**








CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS


Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

En general, se evidencia un avance positivo en el desarrollo del proyecto, con cumplimiento de metas y buena articulación entre el contratista y la comunidad. presentando los siguientes avances: Programado: 11,57% - Ejecutado: 11,57%

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO	
% PROGRAMADO MAYO	0,34%
% EJECUTADO MAYO	0,34%
% PROGRAMADO JUNIO	5,80%
% EJECUTADO JUNIO	5,80%
% PROGRAMADO JULIO	11,57%
% EJECUTADO JULIO	11,57%
% PROGRAMADO AGOSTO	11,91%
% EJECUTADO AGOSTO	11,91%
% PROGRAMADO SEPTIEMBRE	15,14%
% EJECUTADO SEPTIEMBRE	15,14%
% PROGRAMADO OCTUBRE	14,34%
% EJECUTADO OCTUBRE	14,27%
% PROGRAMADO NOVIEMBRE	12,71%
% EJECUTADO NOVIEMBRE	12,78%
% PROGRAMADO DICIEMBRE	11,57%
% EJECUTADO DICIEMBRE	11,57%
AVANCE TOTAL EJECUTADO	**83,38%**

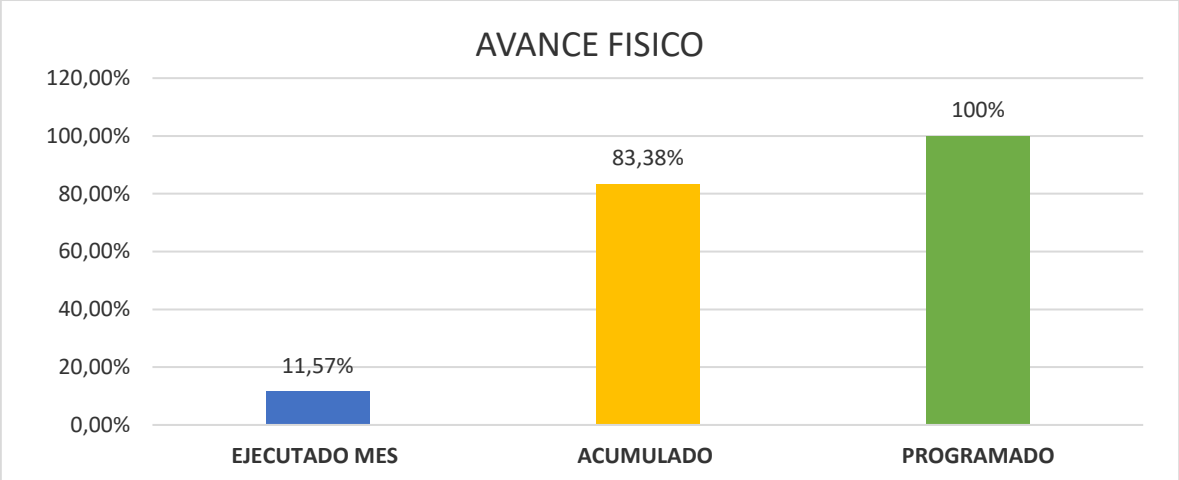

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

INFORMACIÓN LEGAL.

Pólizas contrato de Obra.

Se aprueban las garantías únicas establecida en la póliza de cumplimiento No. 47-44-101030695 y responsabilidad civil extracontractual No. 47-40-101009486, expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, para garantizar las obligaciones adquiridas en virtud del contrato electrónico de obra pública Nº 0051 del 2025 14 de mayo del 2025, celebrado entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA y FUNDACION AGUA LUNA, cuyas características se describen a continuación:

Póliza según contrato

PÓLIZAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
AMPAROS	Nº DE POLIZA	VIGENCIAS		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	47-44-101030695	14/03/2025	20/05/2026	$565,661,467
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	47-44-101030695	14/03/2025	20/05/2026	$2,828,307,335
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47-44-101030695	14/03/2025	20/01/2029	$282,830,733.50
CALIDAD DEL SERVICIO	47-44-101030695	16/01/2026	14/01/2031	$282,830,733.50

RSPONSABILIDAD CIVIL	47-40-101009486	14/03/2025	20/01/2026	$569,400,000

Actualización de póliza según acta de inicio

PÓLIZAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
AMPAROS	**Nº DE POLIZA**	**VIGENCIAS**		**VALOR**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026	$565,661,467
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026	$2,828,307,335
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47-44-101030695	14/05/2025	22/03/2029	$282,830,733.50
CALIDAD DEL SERVICIO	47-44-101030695	16/03/2026	16/03/2031	$282,830,733.50
RSPONSABILIDAD CIVIL	47-40-101009486	14/05/2025	22/03/2026	$569,400,000

Pólizas contrato de Interventoría.

Se presenta en su orden: Aprobación de garantías de cumplimiento del contrato, buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y calidad del servicio de la obra del Contrato de interventoría No. CI-0060-2025, amparados según pólizas de garantía de cumplimiento No. 46-44-101013376 y responsabilidad civil extracontractual, expedidas por la Compañía de Seguros SEGUROS DEL ESTADO, como se detalla a continuación:

Póliza según contrato

PÓLIZAS: SEGUROS DELESTADO S.A				
AMPAROS	**Nº DE POLIZA**	**VIGENCIAS**		**VALOR**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101013376	30/04/2025	30/08/2026	$81,987,430
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	46-44-101013376	30/04/2025	30/08/2026	$204,968,575
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46-44-101013376	30/04/2025	28/02/2029	$20,496,857.50
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101013376	28/02/2026	28/02/2031	$81,987,430.00
RSPONSABILIDAD CIVIL	46-40-101006756	30/04/2025	28/02/2026	$284,700,000

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

Actualización de póliza según acta de inicio

PÓLIZAS: SEGUROS DELESTADO S.A				
AMPAROS	Nº DE POLIZA	VIGENCIAS		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101013376	14/05/2025	13/09/2026	$81,987,430
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	46-44-101013376	14/05/2025	13/09/2026	$204,968,575
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46-44-101013376	14/05/2025	14/03/2029	$20,496,857.50
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101013376	14/03/2026	14/03/2031	$81,987,430.00
RSPONSABILIDAD CIVIL	46-40-101006756	14/05/2025	14/03/2026	$284,700,000

INFORMACIÓN FINANCIERA.

Contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL
1	CONSTRUIR ESTUFAS FIJAS ECOEFICIENTES				
1,1	Construir estufa fija ecoeficiente (0.73 m x 1.05 m) h=0.83 m	Un	1.156,0	3.332.598,00	3.852.483.288,00
1,2	Construir estufa fija ecoeficiente (1.00 m x 3.00 m) h=0.40 m.	Un	44,0	3.171.628,00	139.551.632,00
				Subtotal costos directos	3.992.034.920,00
				Administraciòn 24%	958.088.381,00
				Imprevistos 1%	39.920.349,00
				Utilidades 5%	199.601.746,00
				Iva sobre Utilidad 19%	37.924.332,00
				SUBBTOTAL 1	5.227.569.728,00
2	REALIZAR TALLERES Y CAPACITACIÓN PARA FAMILIAS BENEFICIADAS				
2,1	Realizar talleres de socializacion del proyecto a la comunidad y familias beneficiadas.	Un	28,0	2.202.285,00	61.663.980,00
2,2	Realizar talleres de capacitación a los beneficiarios sobre la operación y mantenimiento del sistema de cocción eficiente.	Un	34,0	3.077.285,00	104.627.690,00
2,3	Realizar la divulgacion del proyecto	Un	1,0	13.350.000,00	13.350.000,00
				Subtotal costos directos	179.641.670,00
				Administraciòn 24%	43.114.001,00
				SUBBTOTAL 2	222.755.671,00
3	MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
3,1	Realizar monitoreo a los impactos del uso de las estufas ecoeficientes	Und	1,0	166.362.315,00	166.362.315,00
				Subtotal costos directos	166.362.315,00
				Administraciòn 24%	39.926.956,00
				SUBBTOTAL 3	206.289.271,00
	TOTAL COSTO DE OBRA				5.656.614.670,00

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com


Riohacha – La Guajira.

Contrato de Interventoría:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.								
Nº	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES	Nº DE MESES	TOTAL PARCIAL (A*B*C*D*E * F)
1	PERSONAL							
1.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN							
1.1.1	Director de Interventoría	$ 5.500.000,00	1	50%	210,00%	$ 5.775.000	10,0	$ 57.750.000
1.1.2	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00	1	100%	210,00%	$ 8.400.000	10,0	$ 84.000.000
1.1.3	Tecnico de campo	$ 2.800.000,00	1	100%	210,00%	$ 5.880.000	10,0	$ 58.800.000
1.1.4	Profesional social	$ 3.500.000,00	1	50%	210,00%	$ 3.675.000	10,0	$ 36.750.000
1.3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Contador	$ 4.500.000,00	1	15%	210,00%	$ 1.417.500	10,0	$ 14.175.000
1.3.2	Auxiliar administrativo	$ 2.700.000,00	2	15%	210,00%	$ 1.701.000	10,0	$ 17.010.000
	SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL							$268.485.000
	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO		Nº DE MESES	TOTAL PARCIAL
2.1	Papelería y copias	glb	1	100%	$ 100.000,00		10,0	$ 1.000.000
2.2	Transporte (Alquiler de vehiculo)	un	1	100%	$ 7.500.000,00		10,0	$ 75.000.000
	SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							$76.000.000
	RESUMEN GENERAL							
	COSTO TOTAL (1 + 2)							$344.485.000
	IVA (19%)							$65.452.150
								$409.937.150

ACTIVIDADES FINANCIERAS

La interventoría durante el periodo del presente informe realizó un avance físico del 10%. Por su parte, el contrato de obras presenta un avance físico acumulado del 76,25%

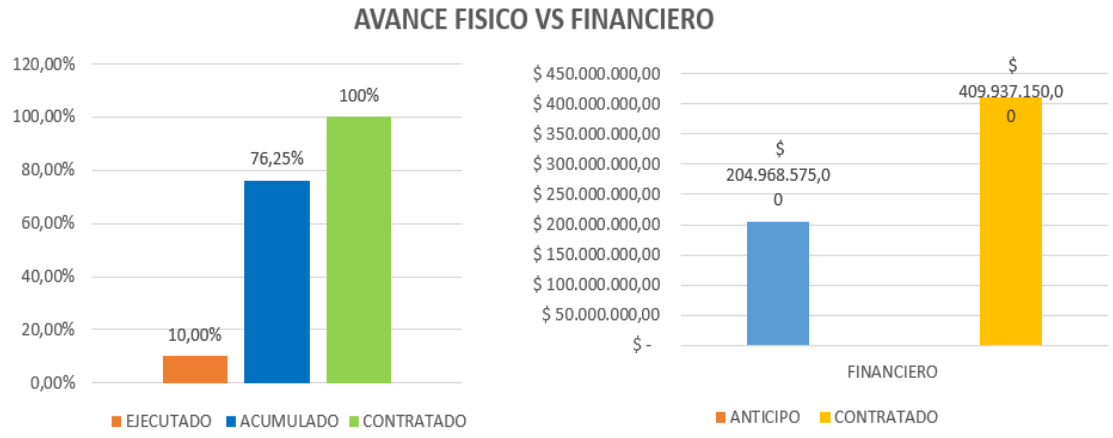

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

Control Financiero Inversión Anticipo de obra

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0051 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5.656.614.670,00
VALOR DEL ANTICIPO 50%:	$ 2.828.307.335,00
CONTRATISTA:	FUNDACION AGUA LUNA
NIT:	900.345.569-5
INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF
NIT:	901.941.657-4

Nota: Es de aclarar que CORPOGUAJIRA realizo un descuento del 5% por un valor de $ 141.415.367,00 al valor correspondiente del anticipo quedando un valor neto de $ 2.686.891.968,00. esto soportado por la liquidacion de cuenta con numero de registro interno N° 531 con fecha 30 de mayo de 2025.

En la siguiente tabla lista de ítems en los cuales se programa invertir el anticipo de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%
1	**MANO DE OBRA**				**$ 227.266.000**	**8,46%**
1,1	Mano de obra de instalacion KIT de Herrajes (0.73 m x 1.05 m)	UND	250	466.187	$ 116.546.750	*20,83%*
1,2	Mano de obra de instalacion KIT de Herrajes (1.00 m x 3.00 m)	UND	250	442.877	$ 110.719.250	*20,83%*
2	**TRANSPORTE**				**$ 225.065.750**	**8,38%**
2,1	Transporte al sitio de la obra de KIT de Herrajes (0.73 m x 1.05 m)	UND	250	558.018	$ 139.504.500	20,83%
2,2	Transporte al sitio de la obra de KIT de Herrajes (1.00 m x 3.00 m)	UND	250	342.245	$ 85.561.250	20,83%
3	**MATERIALES**				**$ 2.223.855.469**	**82,77%**
3,1	Ladrillo tipo bocadillo 5X10X20	UND	160.000	3.200	$ 256.000.000	35,09%
3,2	Ladrillo Macizo de 10*20*30 cm	UND	32.487	2.800	$ 45.482.245	43,90%
3,3	kit de herraje (0.73 m x 1.05 m)	UND	1.156	1.617.354	$ 1.869.661.224	100,00%
3,4	kit de herraje (1.00 m x 3.00 m)	UND	44	1.198.000	$ 52.712.000	100,00%
4	**GMF (4X1000)**				**$ 10.704.749**	
	TOTAL		-	-	**2.686.891.968,00**	**100%**

Control Financiero Inversión Anticipo interventoría

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO No	**CI-0060-2025**	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF	NIT. 901941657-4
VALOR CONTRATADO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS	
	$	**409.937.150,00**
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES	
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA	
SUPERVISOR	ING. KIANA RAFAELA VALBUENA MEJIA	
ANTICIPO (50%) :	**$**	**204.968.575,00**

PROGRAMACION INICIAL

ITEM	DESCRIPCION / DETALLE	CANTIDAD A EJECUTAR CON ANTICIPO	VALOR A EJECUJAR CON ANTICIPO	VALOR NETO A GIRAR
1	**HONORARIOS PROFESIONALES**	65%	$ 133.229.573,75	$ 133.229.573,75
2	**TRANSPORTE**	35%	$ 71.739.001,25	$ 71.739.001,25
	TOTAL	100%	$ 204.968.575,00	**$ 204.968.575,00**

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com


Riohacha – La Guajira.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo del mes de diciembre, el contratista presentó ante la entidad contratante la solicitud de cuenta de cobro correspondiente al Acta de Pago Parcial No. 3, acompañada de la documentación soporte exigida para su trámite.

Posteriormente, se efectuó la revisión técnica, administrativa y financiera de los documentos presentados, encontrando que la información aportada cumple con los requisitos establecidos en el contrato y sus anexos.

CONCEPTO PAGO	Valor Total	Amortizado	Valor del Pago	Saldo pendiente
ANTICIPO	$ 2.828.307.335,00			
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº1	$ 1.675.315.354,57	$ 837.657.677,29	$ 837.657.677,29	$3.981.299.314,43
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº2	$1.663.501.785,97	$ 831.750.892,98	831.750.892,98	$ 2.317.797.529.46
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº3	$ 1.377.706.927,65	$ 688.853.463,83	$ 688.853.463,83	$ 940.090.601,81

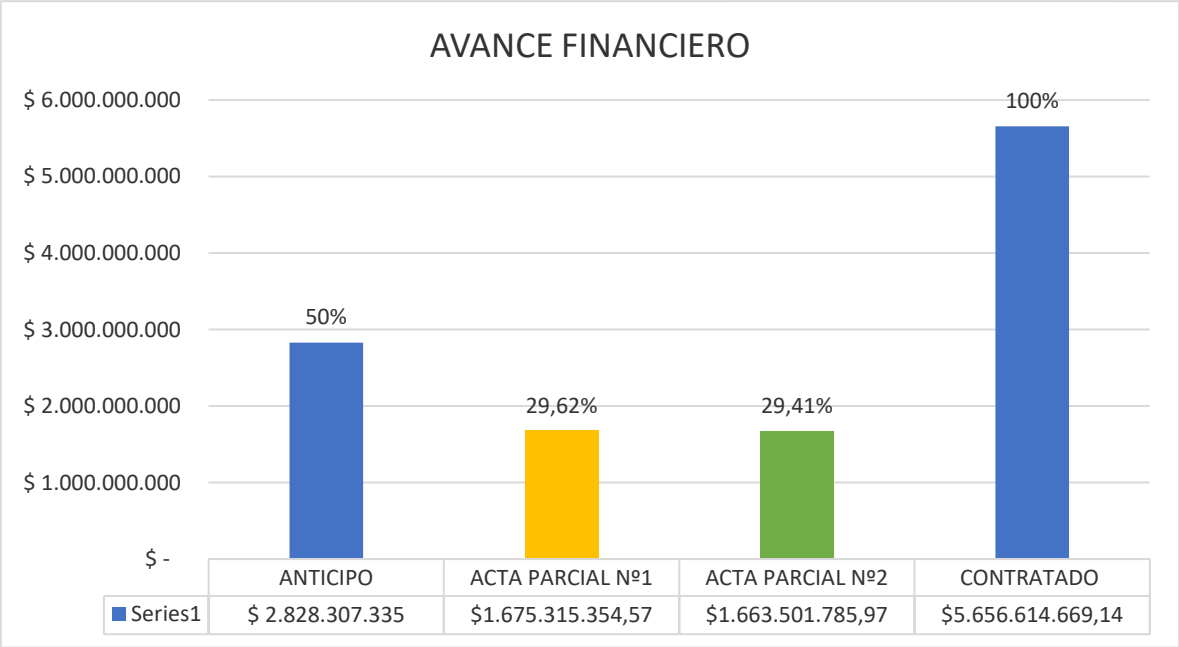


UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

AVANCE FISICO Y FINANCIERO													
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL	COSTO UNI.+ AIU+ IVA UTL	DICIEMBRE			ACUMULADO			
							CANT.	VALOR	PORC.	CANT.	VALOR	PORC.	
1	CONSTRUIR ESTUFAS FIJAS ECOEFICIENTES												
1	Construir estufa fija ecoeficiente (0.73 m x1.05 m) h=0.83 m	Un	1.156,0	3.332.598,00	$ 3.852.483.288,00	$ 4.364.037,08	150	$ 654.605.562,15	12%	1006	$ 4.390.221.303,49	78%	
1	Construir estufa fija ecoeficiente (1.00 m x2.00 m) h=0.40 m	Un	44,0	3.171628,00	$ 139.551.632,00	$ 4.153.246,87				44	$ 182.742.862,10	3%	
	Subtotal costos directos				$ 3.992.034.920								
	Administración			24%	$ 958.088.380,80								
	Imprevistos			1%	$ 39.920.349,20								
	Utilidades			5%	$ 199.601746,00								
	Iva sobre Utilidad			19%	$ 37.924.331,74								
	SUBBTOTAL 1				$ 5.227.569.728								
2	REALIZAR TALLERES Y CAPACITACIÓN PARA FAMILIAS BENEFICIADAS												
2	Realizar talleres de socializacion del proyecto a la comunidad y familias beneficiadas	Un	28,0	2.202.285,00	$ 61663.980,00	$ 2.730.833,40				14	$ 38.231.667,60	0,68%	
2	Realizar talleres de capacitación a los beneficiarios sobre la operación y mantenimiento	Un	34,0	3.077.285,00	$ 104.627.690,00	$ 3.815.833,40				25	$ 95.395.835,00	1,69%	
2	Realizar la divulgacion del proyecto	Un	1,0	13.350.000,00	$ 13.350.000,00	$ 16.554.000				0,6	$ 9.932.400,00	0,18%	
	Subtotal costos directos				$ 179.641.670								
	Administración			24%	$ 43.114.000,80								
	SUBBTOTAL 2				$ 222.755.671								
3	MONITOREO Y SEGUIMIENTO												
3	Realizar monitoreo a los impactos del	Und	1,0	166.362.315,00	$ 166.362.315,00								
	Subtotal costos directos				$ 166.362.315								
	Administración			24%	$ 39.926.955,60								
	SUBBTOTAL 3				$ 206.289.271								
	TOTAL COSTO DE OBRA				$ 5.656.614.669								
	AVANCE FISICO Y FINANCIERO							$ 654.605.562,15	11,57%		$ 4.716.524.068,19	83,38%	

PAGOS REALIZADOS A LA INTERVENTORIA

CONCEPTO PAGO	Valor Total	Amortizado	Valor del Pago	Saldo pendiente
ANTICIPO	$ 204.968.575			
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº1	$ 183.461.207,35	$ 91.730.603,50	$ 91.730.603,50	$ 226.475.942,65

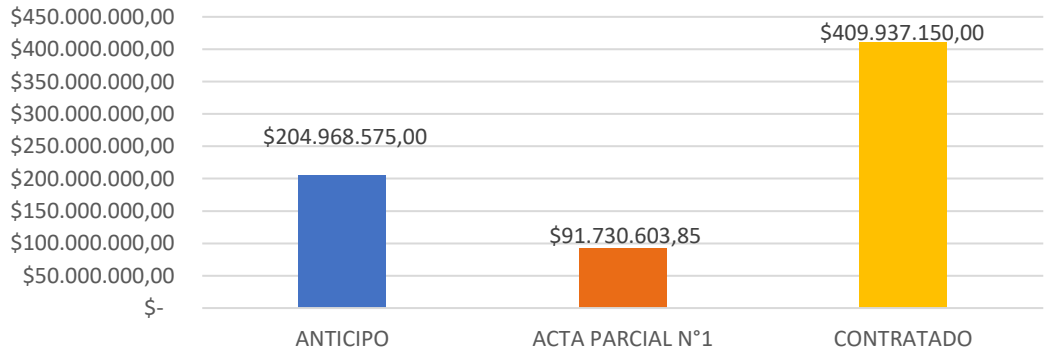

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com

Riohacha – La Guajira.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


CONCLUSIÓN

A la fecha del corte se desarrollaron con éxito las actividades programadas para la construcción de las estufas, Con esta actividad se alcanzó un avance físico acumulado programado de 83,38%, el cual coincide con el avance físico ejecutado de 83,38%, evidenciando que el contrato avanza conforme a la programación técnica establecida y dentro de las condiciones previstas para su desarrollo.

De igual manera, durante el período se avanzó en el monitoreo a los impactos derivados del uso de las estufas ecoeficientes instaladas, actividad que permite evaluar su funcionamiento, aceptación por parte de los beneficiarios y los beneficios ambientales y sociales asociados, fortaleciendo el seguimiento integral del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos.

A la fecha, el avance acumulado de ejecución del proyecto es del 83,38%, mientras que el avance general, que incluye las actividades de obra, interventoría y supervisión, alcanza un 82,38%

En términos generales, las actividades desarrolladas se ejecutan conforme a las especificaciones técnicas y a los lineamientos del contrato, garantizando el control de calidad, el seguimiento permanente y la correcta gestión técnica y administrativa. Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar la verificación de predios y recuperar el pequeño desfase presentado, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de las metas establecidas para el proyecto en los próximos cortes



LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY
Interventor
UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	5-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	VILLANUEVA		
BENEFICIARIO:	Armando Peña contreras – CC: 5170158		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – MONGUI.		
BENEFICIARIO:	ROSA MILENA EPIAYU– CC: 11192813277		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – MONGUI.		
BENEFICIARIO:	ANILSA IPUANA – CC: 1006582722		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – MONGUI.		
BENEFICIARIO:	YOLADIS EPIAYU – CC: 1006582720		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – MONGUI.		
BENEFICIARIO:	OLEIDA EPINAYU – CC: 1006582764		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – MONGUI		
BENEFICIARIO:	YASMARY EPIAYU EPINAYU – CC: 40939208		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	8-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – MONGUI		
BENEFICIARIO:	SINDY IPUANA EPINAYU – CC: 1118804055		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	5-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO		
BENEFICIARIO:	Esmelbis Maria Epiayu Guariyu – CC: 1121298902		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en "V" para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½" x 1/8" de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	4-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	HATONUEVO		
BENEFICIARIO:	Maira Guariyu Epiayu – CC: 1121299354		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION - CAIMITO		
BENEFICIARIO:	DULCELINA MENDOZA GAMEZ – CC: 26994213		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	9-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Maria Claudia Mendoza – CC: 1121040707		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Sindy Karina Brito Lopez– CC: 26996841		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Jorge Eliecer Ipuana Pushaina – CC: 1121042821		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	7-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Elizabeth Pushaina Rios – CC: 56057169		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	6-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Magola Beatriz Pushaina – CC: 1118804055		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	5-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Abrahan Jose Ramirez – CC: 1121045851		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Santa Isabel Fernandez Epinayu – CC: 27000545		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Albertina Daza Rodriguez – CC: 26993784		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Jesus Enrique Vega Fragozo – CC: 1765492		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Edith Ortiz Gonzalez – CC: 56057026		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Bolivar Bonilla Gutierrez – CC: 17841047		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Damian Caicedo – CC: 17950471		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Luz marina Brito – CC: 26998642		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA





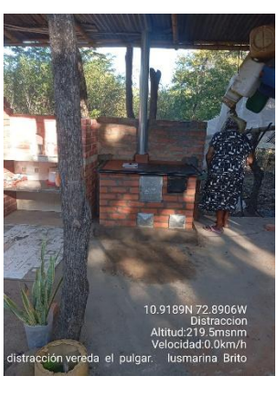

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Miriam Bonilla Gutierrez – CC: 26993748		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION -		
BENEFICIARIO:	Keila Brito Oñate – CC: 1121041607		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	9-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Noraima Torres Rosado – CC: 56057326 (VERIFICAR CC)		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Rut Maria Gamez Salinas – CC: 56054448		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Jaidenis Gamez Brito – CC: 1010058979		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Aisliana Brito Salinas – CC: 1121043276		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Yoledis Montero Levete – CC: 40943257		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Miladis Solipaz – CC: 36722671		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Vilma Rosa Molina – CC: 1121040935		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Esperanza Corena Vega – CC: 56076554		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Ana Beatriz Ramirez Lopez – CC: 26944709		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Edilsa Gonzalez – CC: 26998646		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Keveida Luz Ipuana Puzaina – CC: 56058384		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Luis Armando Martinez – CC: 17952049		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Blanca Brito Pushaina – CC: 26998654		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Estivenson Peralta Araos – CC: 5161895		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Crispin Campo Gonzales – CC: 1121040139		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	8-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Elisa Isabel Brito Cantillo – CC: 56056024		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Dilia Daza Caicedo – CC: 40926429		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Hilde Mendoza Tovar – CC: 72341512		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	2-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Yeneris Rosado Lopez – CC: 56057783		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION		
BENEFICIARIO:	Andres Alvarez Ariño – CC: 1006713623 (VERIFICAR)		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	DISTRACCION -		
BENEFICIARIO:	Adriela Joaquina Gonzalez Mendoza – CC: 56056401		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	JOSE ANDRES PEREZ GONZALEZ – CC: 1098613011		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



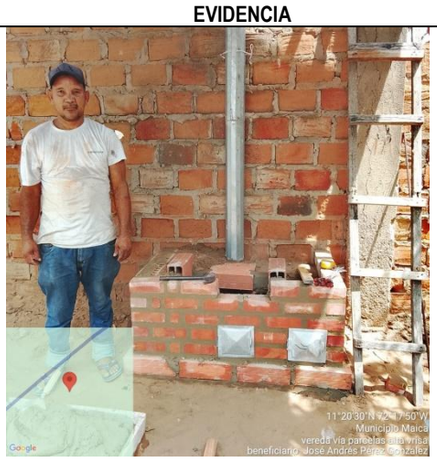



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	DANUBIS FERNANDEZ – CC: 1124011245		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	LUIS ALBERTO VILLADIEGO – CC: 15725067		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	SEGUNDO EPIEYU EPIEYU – CC: 1123992075		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	FRANKLIN EPIEYU EPIEYU – CC: 1123991121		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	YOLANDA EPIAYU EPIAYU – CC: 1123990831		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	JOSE ENRIQUE EPIEYU EPIEYU– CC: 1124054651		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	VIRGINIA EPIEYU EPIEYU – CC: 40977880		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA
BENEFICIARIO:	JOSE MANUEL EPIEYU RAMIREZ– CC: 84105936

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	NORGEN FLORIAN TORRES – CC: 18937933		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



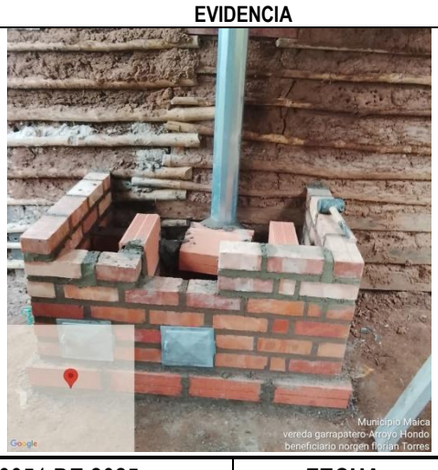



N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA
BENEFICIARIO:	MAIRETH FLORIAN FERNANDEZ – CC: 1148150589

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA
BENEFICIARIO:	JUANA JAYARIYU EPIAYU – CC: 56088315

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA		
BENEFICIARIO:	NATHALI RAMIREZ EPIEYU – CC: 1123997442		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - CARRAIPIA
BENEFICIARIO:	MAURICIO RAMIREZ EPIEYU – CC: 1123997449

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA





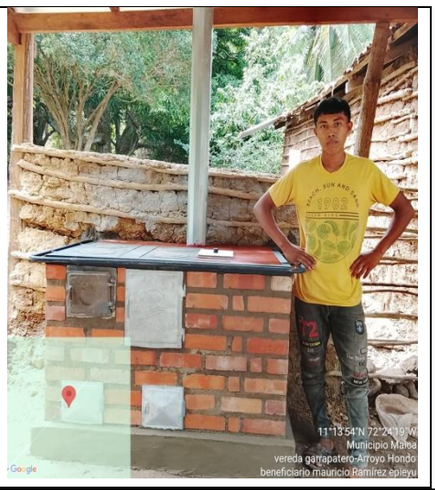

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	JADERSON JACOB BRITO USTATE C. C 84007651		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	LEONEL ISAC BRAVO ARGUELLES C. C 84005273		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	4-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS – CUEVA HONDA		
BENEFICIARIO:	HILDEGAR DUARTE SUAREZ C. C 619717		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	ERNESTO JOSE CERCHARIO CORDOBA C. C 84006841		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	7-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	RAMIRO ANGEL GAMEZ GONZALEZ C. C 17952559		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RU DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	REINALDO RAFAEL RAMOS CONTRERAS C. C 5153461		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/N
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respe borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con material (Sí/
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS – SIERRA AZUL		
BENEFICIARIO:	JOSE TOMAS GAMEZ RAMIREZ C. C 5152606		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS – SIERRA AZUL		
BENEFICIARIO:	JOSE NORBERTO CARVAJAL CORDOBA C. C 4005427		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS – SIERRA AZUL		
BENEFICIARIO:	LUIS ENRIQUE PENARANDA LLAGUNA C. C 84062912		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	ELMIS ESTHELLA EPIAYU C. C 8400683		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS
BENEFICIARIO:	ERICA PATRICIA URECHE C. C 1122816808

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en "V" para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½" x 1/8" de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	3-12-2025

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS
BENEFICIARIO:	CLAUDIA BEATRIZ PUSHAINA GUAIRIYU C. C 26987759

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en "V" para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½" x 1/8" de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	5-12-2025

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas
BENEFICIARIO:	CARMEN DEL PILAR MARTINES EPIAYU C. C 26985978

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en "V" para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½" x 1/8" de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	6-12-2025

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas
BENEFICIARIO:	EVELCI MARIA BELTRAN ARRIETA C. C 1010104232

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	4-12-2025

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas
BENEFICIARIO:	LILIANA MARIA MONTERROSA GOMEZ C. C 26987559

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en "V" para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½" x 1/8" de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	2-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	ESMERALDA URECHE PUSHAINA C. C 1193469544		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	5-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	FLORALBA EPIAYU PUSHAINA C.C 26987532		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	2-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	ESTRELLA BEATRIZ URECHE PUSHAINA C.C 1122817973		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	4-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	MONICA PATRICIA IPUANA GOURIYUC. C 1044390500 (VERIFICAR CC)		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA



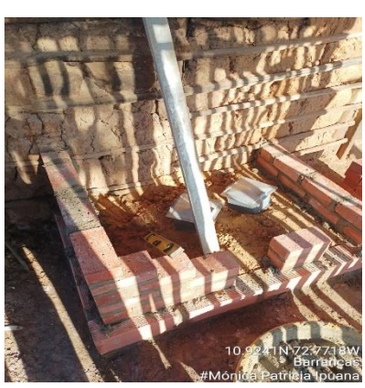



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	6-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	RUBEN EVERTO PEREZ PUCHE C. C 1122820727		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	1-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	EVELIN GIZEK MOLINA ROMERO C. C 1118818993		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	LEONCIO FONSECA C. C 84009145		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA

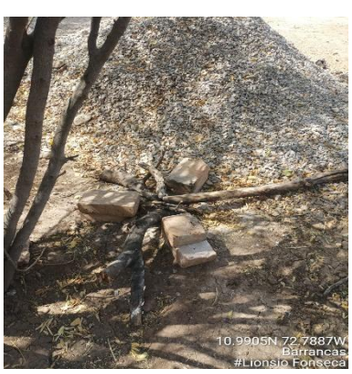





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	1-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	DANIEL ACOSTA SALAS C. C 84007807		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Papayal		
BENEFICIARIO:	VIANNE CUJIA FONSECA C. C 1065585807		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas – Pozo Hondo		
BENEFICIARIO:	SADIS ESTHER PEREZ C. C 26987241		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - PozoHondo		
BENEFICIARIO:	ADRIANA GOMEZ C. C 1193239163		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS – VEREDA CASTILLA		
BENEFICIARIO:	GABRIEL PEREZ PINTO C. C 1122814548		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	6-12-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas – Vereda Castilla		
BENEFICIARIO:	PAULA ROSA SARMIENTO C. C 26983804		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	PEDRO VIDAL SOTO	C.C 5153303	


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA

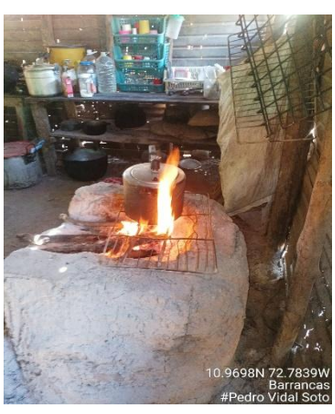





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	6-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS - CHANCLETA		
BENEFICIARIO:	ARMANDO MARTINEZ RAMIREZ C. C 84005345		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS - PAPAYAL		
BENEFICIARIO:	FRANCISCO SOLANO PEREZ C. C 5152562		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	4-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Shareo		
BENEFICIARIO:	JOSE ALBERTO BRITO EPIAYU C. C 84006601		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	6-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Barrancon		
BENEFICIARIO:	Lulbis Ballestero Perez C. C 26982955		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	2-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Yeraldin Brito	C. C 1122819822	

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	2-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Rosa Epinayu	C. C 26982581	

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Shareo		
BENEFICIARIO:	Elvis Clara Epiayu	C. C 1192893790	

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	9-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Castillete		
BENEFICIARIO:	Rafael Enrique Bolivar Epinayu C. C 84008303		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA





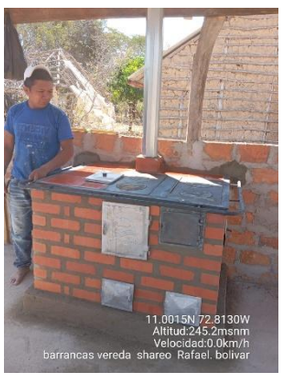

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas – Sierra Azul - Shareo		
BENEFICIARIO:	Claudia Urariyu C. C 1010046953		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas – Shareo		
BENEFICIARIO:	Felicita Uriana	C. C 26982541	


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA

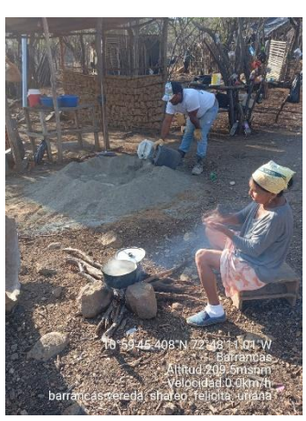





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas – Shareo		
BENEFICIARIO:	Abraham Enrique Lopez Uriana C. C 1121041413		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Shareo		
BENEFICIARIO:	Doris Adriana Gonzalez C. C 1124012226		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Shareo		
BENEFICIARIO:	Angie Melisa Jimenez Ipuana C. C 1118814213		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	8-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Castillete		
BENEFICIARIO:	Jaider Duarte Iguaran C. C 84009687		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	7-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Meseta		
BENEFICIARIO:	Victor Epiayu Molero	C. C 84006669	

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Ballena		
BENEFICIARIO:	Cecilia Urrariyu C. C 1118807621		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas - Palmita		
BENEFICIARIO:	Jose Sapuana	C. C 84006489	

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Sunilda Pushaina Epiayu C. C 26988754		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Joel Antonio Gomez C. C 84006401		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Yulis Patricia Toncel C. C 1120753292		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Nuris Beatriz Epiayu Epiayu C. C 26985691		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Maria Luisa Epiayu Epiayu C. C 26987104		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Argenis Jose Pusahina Epiayu C. C 84062648		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Elena Bouriyu	C. C 26983114	

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Leyda Pushaina Epiayu C. C 26987524		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Deysi Gonzalez	C. C 6173312	

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Francisco Jose Uriana Epiayu C. C 84005197		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Briscila Guauriyu Uriana C. C 26988269		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Edilma Iguaran Epiayu C. C 26987845		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Kelly Johana Epiayu C. C 40960366		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Jose Rafael Epiayu Epiayu C. C 1122814288		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en "V" para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½" x 1/8" de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Antonia Ipuana C. C 27022327		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Maria de los angeles Epiayu Uriana C. C 1010129656		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	Barrancas		
BENEFICIARIO:	Deyaneth Ipuana	C. C 26985733	

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	PAULA SALAS CAMELO – CC: 39475050		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	2-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	ESTEBAN DE JESÚS CANALES – CC: 77036142		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	ESPERANZA RAMIREZ - CC: 41532494		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	AURIS ESTHER BERMUDEZ – CC: 1065627078		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	3-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	JUAN JOSE AÑEZ MARTINEZ – CC: 5091808		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

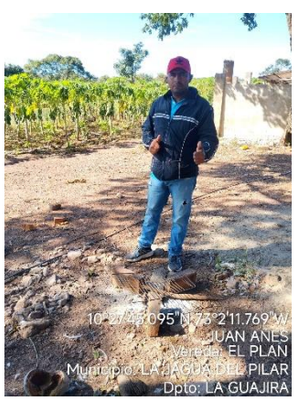





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	4-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	EDILMA RAUDALES GONZALES – CC: 40800645		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



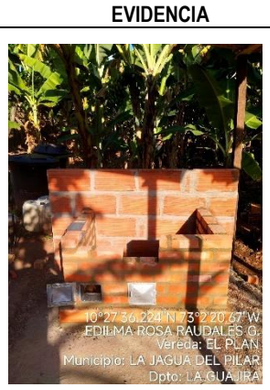



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	5-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	NELLY MARIA CONTRERAS GUEVARRA – CC: 37160657		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	6-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	YEISON PEÑA – CC: 1064724414		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	7-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	ERLINDA DEL CARMEN PEDROZO RICO – CC: 36676066		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	4-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	MARQUEZA ACOSTA RAMOS – CC: 36712221		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

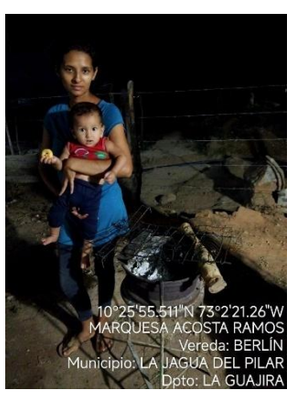





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	INGRIS PATRICIA PEREZ ACOSTA – CC: 1192906999		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	6-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	CESAR ALFONSO PEREZ TOVAR – CC: 5046581		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	MAXIMILIANO RAFAEL PINTO – CC: 1786270		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	ALEXANDER REYES SOTO – CC: 5072233		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	EULICES MARTINEZ GARCIA – CC: 77081803		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	GENITO ANTONIO MERCADO SALCEDO – CC: 77026834		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

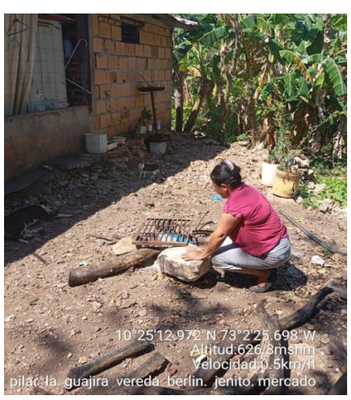





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	RAMON ATANACIO MARTINEZ SOTO – CC: 84102074		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



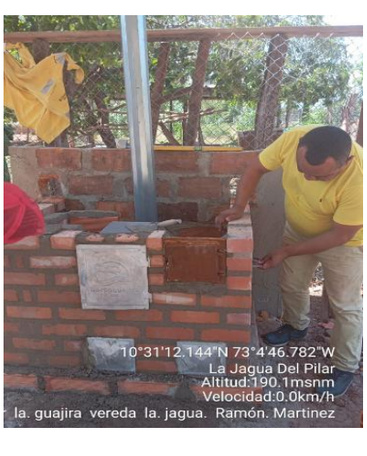

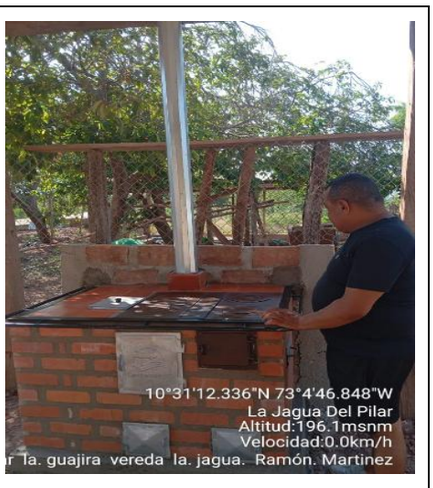

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	EFRAIN ARMENTA LOPEZ – CC: 1702245		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	RUBY SALTARÍN DE NOGUERA – CC: 5174896		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en "V" para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½" x 1/8" de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	GERLAN ANTONIO YAGUNA PITRE – CC: 1119816184		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	NELSON RUBÉN PITRE PÉREZ – CC: 1065204056		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	ALEXIS CONTRERAS QUINTERO – CC: 5092414		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	ELIO CONTRERAS QUINTERO – CC: 5092000		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	LUIS CONTRERAS – CC: 54060992		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	YOLANDA OVALLOS – CC: 26876331		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09-12-25
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	FRANKLIN SALCEDO GONZÁLEZ – CC: 1003202332		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	3-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	El PLAN		
BENEFICIARIO:	AMANDIS MUEGUE CC: 1119816310		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA





