UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9
DEL: 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ". BPIN 20243218000007

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
CORPOGUAJIRA

CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF

ENERO DEL 2026

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL. 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 4
DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 5
INFORMACION ADMINISTRATIVA 6
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 6
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 6
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 7
PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 7
PERSONAL DEL CONTRATISTA 8
CORRESPNDENCIA 8
PROGRAMACIÒN Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO 9
ACTIVIDADES EJECUTADAS 9
VERIFICACIÓN DE PREDIOS A INTERVENIR 10
INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA 15
INFORMACIÓN LEGAL. 15
INFORMACIÓN FINANCIERA. 17
ACTIVIDADES FINANCIERAS 18
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 19
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental del proyecto denominado “construcción de estufas ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático en zona rural del departamento de la guajira”.

La interventoría tiene como propósito verificar el cumplimiento integral del objeto contractual, asegurando que las obras se ejecuten conforme a los diseños, especificaciones técnicas, normativas ambientales vigentes y condiciones establecidas en el contrato. Así mismo, se realiza seguimiento al manejo administrativo y financiero del proyecto, garantizando una gestión eficiente, transparente y alineada con los objetivos institucionales.

Este informe presenta el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 hasta 31 de enero de 2026, incluyendo los anexos pertenecientes al presente contrato; de igual forma presenta la información general del contrato y una descripción del avance de las obras adelantadas en los diferentes frentes de obra, actividades administrativas, como el estado financiero del contrato, así como las observaciones y recomendaciones necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVO GENERAL.

Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", con el fin de garantizar que su ejecución se realice conforme a los términos contractuales, especificaciones técnicas, normativas vigentes y principios de eficiencia, transparencia, calidad y sostenibilidad ambiental, velando por el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto y la correcta inversión de los recursos públicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Realizar el seguimiento de las diferentes actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato.
- Mostrar el avance que presenta la obra.
- Informar la gestión de la Interventoría.
- Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra.

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

El contrato de obra 0051 DE 2025 el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA la construcción de 1200 estufas ecoeficientes, ubicados en zonas rurales de 9 municipios, distribuidos de la siguiente manera:


1. 266 estufas ecoeficientes en Riohacha
2. 225 estufas ecoeficientes en el municipio de Barrancas
3. 252 estufas ecoeficientes en el municipio de Distracción
4. 223 estufas ecoeficientes en el municipio de la jagua del Pilar
5. 66 estufas ecoeficientes en el municipio de Hatonuevo
6. 61 estufas ecoeficientes en el municipio de Maicao
7. 51 estufas ecoeficientes en el municipio de Villa nueva
8. 29 estufas ecoeficientes en el municipio de Uribia
9. 27 estufas ecoeficientes en el municipio de Manaure

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto a intervenir se encuentra localizado en la Zona rural de 9 municipios del departamento de la Guajira, A continuación, se relaciona la localización de los sitios donde se ejecutará el proyecto.

Uribia, Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Manaure, Villanueva y La Jagua del Pilar

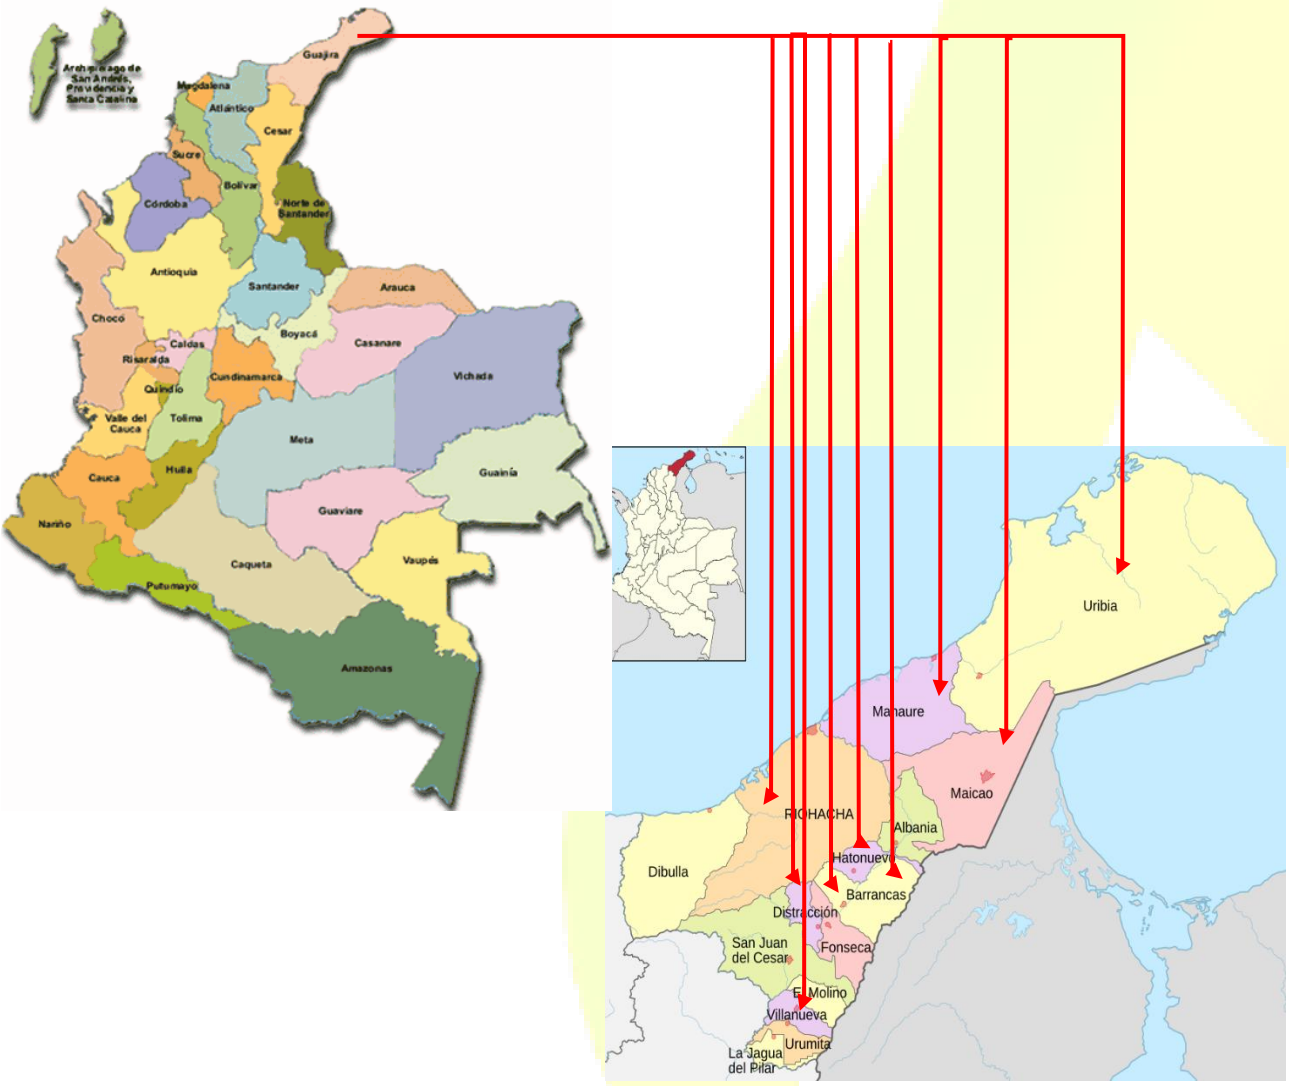

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

INFORMACION ADMINISTRATIVA
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 0051 DE 2025.	
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF
SUPERVISOR:	KIANA VALBUENA MEJÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20243218000007
CONTRATO NO:	0051 - 2025
CONTRATISTA DE LA OBRA:	FUNDACIÓN AGUA LUNA Nit. 900345569-4
REPRESENTANTE LEGAL:	GERALD BRISSON MENDOZA CC. 19.486.085 de Bogotá D.C
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 5.656.614.670.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 MARZO DE 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-0060-2025	
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF NIT: 901941657-4
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR CONTRATO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($409.937.150,00) M/L
SUPERVISOR	KIANA VALBUENA MEJÍA
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13 MARZO DE 2026

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Relación del personal técnico y administrativo afiliado a la seguridad social del contratista e interventoría asignado al proyecto.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Samir Jose Cardozo Solano	1118806268	DIRECTOR
Bielca Silena Pimienta Padilla	40.928.933	RESIDENTE
Zunilda Amaya Uriana	40951297	PROFESIONAL SOCIAL
Carlos Antonio Brito Avila	84090164	CONTADOR
Loranis Maxiel Diaz Mercado	1118838660	TECNICO DE CAMPO
Yenifer Soto Vargas	1124409653	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Marianne Mejia Cardozo	1118800355	AUXILIAR DE OFICINA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE	CEDULA	PERFIL	CARGO
Daniel Quintero Manotas	1122818210	ING. CIVIL	Director
Luisa Fernanda Guerra	1062401355	ING. AMBIENTAL	Residente de obra
María Fernanda Vargas	56078712	TRABAJADORA SOCIAL	Trabajadora social

CORRESPNDENCIA

Se realizaron las siguientes solicitudes:

- ✓ Solicitud de cronograma de obra – enviado el 20 de mayo de 2025
- ✓ solicitud de aprobación del plan de inversión de anticipo – recibido el 26 de mayo de 2025
- ✓ Aprobación de plan de inversión de anticipo por interventoría – enviado el 27 de mayo de 2025
- ✓ Informe Nº1 contrato de obra 0051 de 2025- enviado a supervisión el 31 de mayo de 2025
- ✓ Informe Nº1 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 05 de junio de 2025
- ✓ Solicitud de anticipo del contrato de interventoría CI-0060-2025- enviado a la supervisión el 06 de junio del 2025
- ✓ Modificaciones salariales de planilla de seguridad social del contrato de interventoría CI-0060-2025 - enviado a supervisión el 10 de junio de 2025
- ✓ Programación de obra – recibida el 10 de junio de 2025
- ✓ Solicitud de programación semanal de actividades – enviada el 17 de junio de 2025
- ✓ INFORME Nº2 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 01 de junio de 2025
- ✓ Informe Nº2 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 02 de julio de 2025
- ✓ INFORME Nº3 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 31 de julio de 2025
- ✓ Informe Nº3 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 01 de agosto de 2025
- ✓ INFORME Nº4 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 29 de agosto de 2025
- ✓ Documentos acta parcial Nº1 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 02 de septiembre
- ✓ Informe Nº4 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 02 de septiembre de 2025
- ✓ INFORME Nº5 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 30 de septiembre de 2025
- ✓ Solicitud de rendimientos financieros – enviado el 02 de octubre de 2025
- ✓ Informe Nº5 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 08 de octubre de 2025

- ✓ Documentos acta parcial Nº1 CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 14 de octubre de 2025
- ✓ INFORME Nº6 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 27 de octubre de 2025
- ✓ Documentos acta parcial Nº2 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 28 de octubre
- ✓ INFORME Nº6 contrato de obra 0060-2025 - enviado a supervisión el 06 de noviembre de 2025

PROGRAMACIÒN Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO

Detalle Actividad	Unidad	tidad T	2025 / 05	2025 / 06	2025 / 07	2025 / 08	2025 / 09	2025 / 10	2025 / 11	2025 / 12	2026 / 01	2026 / 02	2026 / 03
REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	und	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	und	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR MONITOREO A LOS IMPACTOS DEL USO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES	und	1										1	
CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (0.73 M X 1.05 M) H0.83 M.	und	1156		70	150	150	165	165	156	150	150		
CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (1.00 M X 3.00 M) H0.40 M.	und	44					22	22					
REALIZAR LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO	und	1		0,2			0,4					0,4	
REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COCCIÓNEFICIENTE.	und	34				5	10		10			9	
REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LACOMUNIDAD Y FAMILIAS BENEFICIADAS.	und	28	7	7									14

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó acompañamiento TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO del proyecto mediante el seguimiento permanente a las actividades realizadas por el contratista.

En el mes de enero el contratista en su informe presenta un avance en su ejecución del 4,01% detallado de la siguiente manera:

- ✓ Verificación de predios a intervenir
- ✓ Distribución de material
- ✓ Construcción de estufas

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN DE PREDIOS A INTERVENIR

En el periodo de corte se continuo con el proceso de verificación de los predios correspondientes a los nuevos beneficiarios, en atención a que algunos de los beneficiarios incluidos en el listado anterior no cumplían con los requisitos técnicos y administrativos exigidos o se encontraban duplicados. Esta verificación tuvo como objetivo validar la información, corroborando las condiciones mínimas necesarias para la instalación de las estufas ecoeficiente. Se revisaron aspectos como:

- ✓ Que el predio este habitado.
- ✓ Que cuente con una pared de soporte para la construcción de la estufa
- ✓ Que cuente con techo de cubierta para la estufa
- ✓ Disponibilidad y aceptación del beneficiario para participar en el proceso constructivo

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL

Paralelamente, se realizó durante el presente periodo la entrega de materiales a las comunidades beneficiarias, garantizando que los insumos suministrados fueran acordes con las especificaciones requeridas para la correcta ejecución de la actividad. La interventoría realizó seguimiento a estas entregas, verificando cantidades, calidad y oportunidad.

Relación de material en el periodo	
Entregado/ beneficiario	Acumulado
52	1102

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

Se llevó a cabo la construcción de 52 estufas ecoeficientes de 0,73 m x 1,05 m durante el corte, de un total de 150 estufas programadas para el mes de enero, evidenciándose un atraso frente a la meta establecida en la programación contractual.

El incumplimiento parcial de la meta mensual se debe, en gran medida, a problemas logísticos que han dificultado el acceso a los terrenos en áreas de difícil acceso. Esto ha limitado el transporte a tiempo de los materiales e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades. Además, se ha observado una falta de compromiso por parte de algunos beneficiarios en cuanto a la preparación previa de los espacios y su disponibilidad para recibir al personal encargado de la instalación, lo que ha generado reprocesos y tiempos muertos en la programación establecida.

ESTUFAS CONSTRUIDAS ENERO 0,73 m x 1,05 m	
MUNICIPIO	**CANT.**
Riohacha	22
Maicao	12
La Jagua del Pilar	4

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

Distraccion	1
Barrancas	13
TOTAL	**52**












CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

Durante el período evaluado, el proyecto alcanzó un avance físico del 4,01%, frente a un 11,57% programado, lo que evidencia un cumplimiento parcial de las metas establecidas en la programación vigente.

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO	
% PROGRAMADO MAYO	0,34%
% EJECUTADO MAYO	0,34%
% PROGRAMADO JUNIO	5,80%
% EJECUTADO JUNIO	5,80%
% PROGRAMADO JULIO	11,57%
% EJECUTADO JULIO	11,57%
% PROGRAMADO AGOSTO	11,91%
% EJECUTADO AGOSTO	11,91%
% PROGRAMADO SEPTIEMBRE	15,14%
% EJECUTADO SEPTIEMBRE	15,14%
% PROGRAMADO OCTUBRE	14,34%
% EJECUTADO OCTUBRE	14,27%
% PROGRAMADO NOVIEMBRE	12,71%
% EJECUTADO NOVIEMBRE	12,78%
% PROGRAMADO DICIEMBRE	11,57%
% EJECUTADO DICIEMBRE	11,57%
% PROGRAMADO ENERO	11,57%
% EJECUTADO ENERO	4,01%
AVANCE TOTAL EJECUTADO	**87,39%**

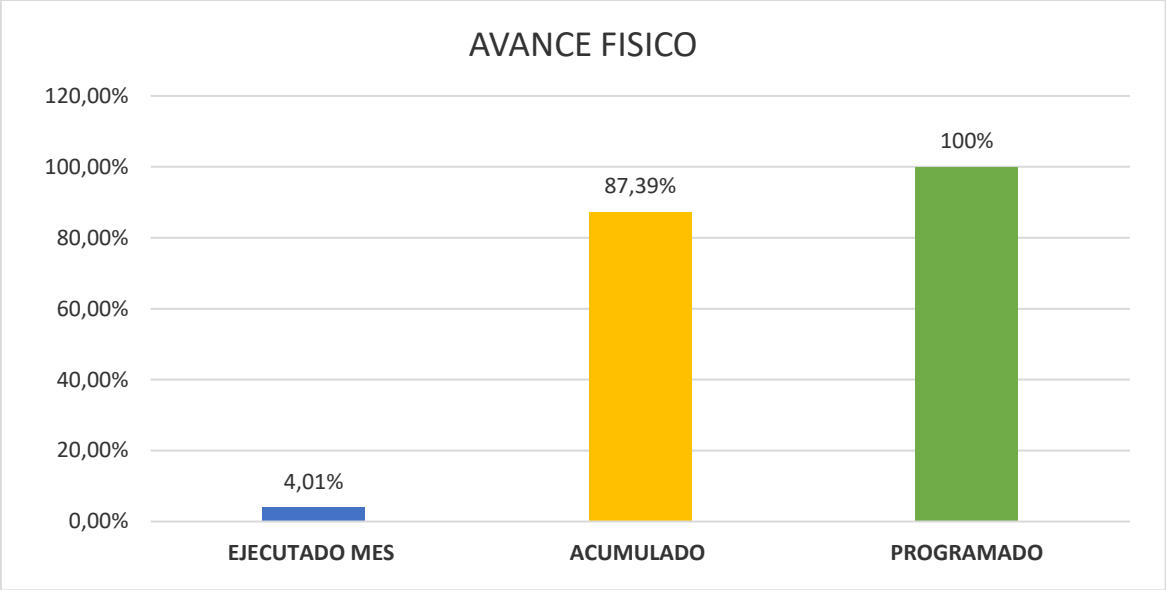

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

INFORMACIÓN LEGAL.

Pólizas contrato de Obra.

Se aprueban las garantías únicas establecida en la póliza de cumplimiento No. 47-44-101030695 y responsabilidad civil extracontractual No. 47-40-101009486, expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, para garantizar las obligaciones adquiridas en virtud del contrato electrónico de obra pública Nº 0051 del 2025 14 de mayo del 2025, celebrado entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA y FUNDACION AGUA LUNA, cuyas características se describen a continuación:

Póliza según contrato

PÓLIZAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
AMPAROS	Nº DE POLIZA	VIGENCIAS		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	47-44-101030695	14/03/2025	20/05/2026	$565,661,467
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	47-44-101030695	14/03/2025	20/05/2026	$2,828,307,335

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47-44-101030695	14/03/2025	20/01/2029	$282,830,733.50
CALIDAD DEL SERVICIO	47-44-101030695	16/01/2026	14/01/2031	$282,830,733.50
RSPONSABILIDAD CIVIL	47-40-101009486	14/03/2025	20/01/2026	$569,400,000

Actualización de póliza según acta de inicio

PÓLIZAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
AMPAROS	**Nº DE POLIZA**	**VIGENCIAS**		**VALOR**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026	$565,661,467
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026	$2,828,307,335
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47-44-101030695	14/05/2025	22/03/2029	$282,830,733.50
CALIDAD DEL SERVICIO	47-44-101030695	16/03/2026	16/03/2031	$282,830,733.50
RSPONSABILIDAD CIVIL	47-40-101009486	14/05/2025	22/03/2026	$569,400,000

Pólizas contrato de Interventoría.

Se presenta en su orden: Aprobación de garantías de cumplimiento del contrato, buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y calidad del servicio de la obra del Contrato de interventoría No. CI-0060-2025, amparados según pólizas de garantía de cumplimiento No. 46-44-101013376 y responsabilidad civil extracontractual, expedidas por la Compañía de Seguros SEGUROS DEL ESTADO, como se detalla a continuación:

Póliza según contrato

PÓLIZAS: SEGUROS DELESTADO S.A				
AMPAROS	**Nº DE POLIZA**	**VIGENCIAS**		**VALOR**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101013376	30/04/2025	30/08/2026	$81,987,430
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	46-44-101013376	30/04/2025	30/08/2026	$204,968,575
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46-44-101013376	30/04/2025	28/02/2029	$20,496,857.50
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101013376	28/02/2026	28/02/2031	$81,987,430.00

RSPONSABILIDAD CIVIL	46-40-101006756	30/04/2025	28/02/2026	$284,700,000

Actualización de póliza según acta de inicio

PÓLIZAS: SEGUROS DELESTADO S.A				
AMPAROS	Nº DE POLIZA	VIGENCIAS		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101013376	14/05/2025	13/09/2026	$81,987,430
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	46-44-101013376	14/05/2025	13/09/2026	$204,968,575
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46-44-101013376	14/05/2025	14/03/2029	$20,496,857.50
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101013376	14/03/2026	14/03/2031	$81,987,430.00
RSPONSABILIDAD CIVIL	46-40-101006756	14/05/2025	14/03/2026	$284,700,000

INFORMACIÓN FINANCIERA.
Contrato de Obra:


CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL
1	CONSTRUIR ESTUFAS FIJAS ECOEFICIENTES				
1,1	Construir estufa fija ecoeficiente (0.73 m x 1.05 m) h=0.83 m	Un	1.156,0	3.332.598,00	3.852.483.288,00
1,2	Construir estufa fija ecoeficiente (1.00 m x 3.00 m) h=0.40 m.	Un	44,0	3.171.628,00	139.551.632,00
			Subtotal costos directos		3.992.034.920,00
				Administraciòn 24%	958.088.381,00
				Imprevistos 1%	39.920.349,00
				Utilidades 5%	199.601.746,00
				Iva sobre Utilidad 19%	37.924.332,00
				SUBBTOTAL 1	5.227.569.728,00
2	REALIZAR TALLERES Y CAPACITACIÓN PARA FAMILIAS BENEFICIADAS				
2,1	Realizar talleres de socializacion del proyecto a la comunidad y familias beneficiadas.	Un	28,0	2.202.285,00	61.663.980,00
2,2	Realizar talleres de capacitación a los beneficiarios sobre la operación y mantenimiento del sistema de cocción eficiente.	Un	34,0	3.077.285,00	104.627.690,00
2,3	Realizar la divulgacion del proyecto	Un	1,0	13.350.000,00	13.350.000,00
			Subtotal costos directos		179.641.670,00
				Administraciòn 24%	43.114.001,00
				SUBBTOTAL 2	222.755.671,00
3	MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
3,1	Realizar monitoreo a los impactos del uso de las estufas ecoeficientes	Und	1,0	166.362.315,00	166.362.315,00
			Subtotal costos directos		166.362.315,00
				Administraciòn 24%	39.926.956,00
				SUBBTOTAL 3	206.289.271,00
	TOTAL COSTO DE OBRA				5.656.614.670,00

Contrato de Interventoría:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.								
		A	B	C	D	E	F	G
N°	CONCEPTO	SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	%DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (A*B*C*D*E * F)
1	PERSONAL							
1.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN							
1.1.1	Director de Interventoría	$ 5.500.000,00	1	50%	210,00%	$ 5.775.000	10,0	$ 57.750.000
1.1.2	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00	1	100%	210,00%	$ 8.400.000	10,0	$ 84.000.000
1.1.3	Tecnico de campo	$ 2.800.000,00	1	100%	210,00%	$ 5.880.000	10,0	$ 58.800.000
1.1.4	Profesional social	$ 3.500.000,00	1	50%	210,00%	$ 3.675.000	10,0	$ 36.750.000
1.3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Contador	$ 4.500.000,00	1	15%	210,00%	$ 1.417.500	10,0	$ 14.175.000
1.3.2	Auxiliar administrativo	$ 2.700.000,00	2	15%	210,00%	$ 1.701.000	10,0	$ 17.010.000
						SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$268.485.000
	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	%DE DEDICACIÓN		VALOR UNITARIO	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL
2.1	Papelería y copias	glb	1	100%		$ 100.000,00	10,0	$ 1.000.000
2.2	Transporte (Alquiler de vehiculo)	un	1	100%		$ 7.500.000,00	10,0	$ 75.000.000
						SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		$76.000.000
	RESUMEN GENERAL							
						COSTO TOTAL (1 + 2)		$344.485.000
						IVA (19%)		$65.452.150
								$409.937.150

ACTIVIDADES FINANCIERAS

La interventoría durante el periodo del presente informe realizó un avance físico del 10%. Por su parte, el contrato de obras presenta un avance físico acumulado del 86,25%

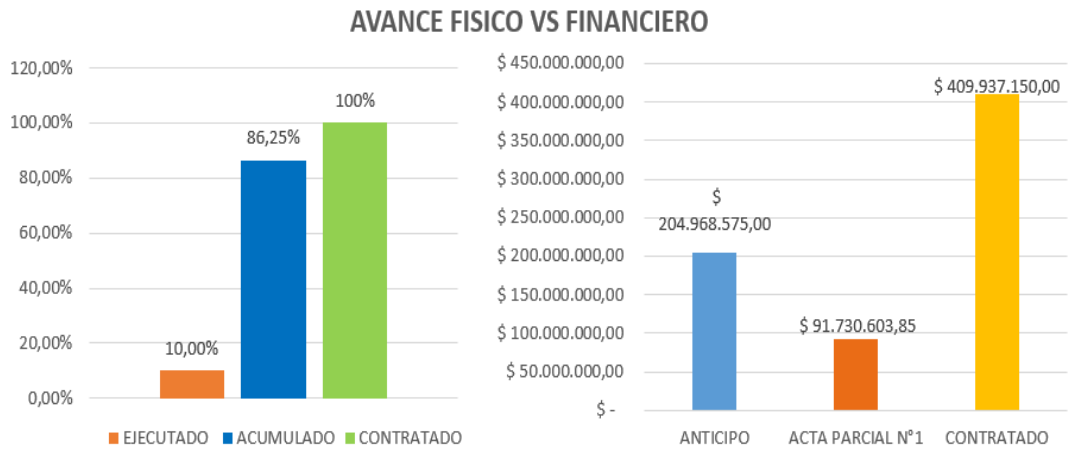

Control Financiero Inversión Anticipo de obra

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0051 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5.656.614.670,00
VALOR DEL ANTICIPO 50%:	$ 2.828.307.335,00
CONTRATISTA:	FUNDACION AGUA LUNA
NIT:	900.345.569-5
INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF
NIT:	901.941.657-4

Nota: Es de aclarar que CORPOGUAJIRA realizo un descuento del 5% por un valor de $ 141.415.367,00 al valor correspondiente del anticipo quedando un valor neto de $ 2.686.891.968,00. esto soportado por la liquidacion de cuenta con numero de registro interno N° 531 con fecha 30 de mayo de 2025.

En la siguiente tabla lista de ítems en los cuales se programa invertir el anticipo de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%
1	**MANO DE OBRA**				**$ 227.266.000**	**8,46%**
1,1	Mano de obra de instalacion KIT de Herrajes (0.73 m x 1.05 m)	UND	250	466.187	$ 116.546.750	*20,83%*
1,2	Mano de obra de instalacion KIT de Herrajes (1.00 m x 3.00 m)	UND	250	442.877	$ 110.719.250	*20,83%*
2	**TRANSPORTE**				**$ 225.065.750**	**8,38%**
2,1	Transporte al sitio de la obra de KIT de Herrajes (0.73 m x 1.05 m)	UND	250	558.018	$ 139.504.500	20,83%
2,2	Transporte al sitio de la obra de KIT de Herrajes (1.00 m x 3.00 m)	UND	250	342.245	$ 85.561.250	20,83%
3	**MATERIALES**				**$ 2.223.855.469**	**82,77%**
3,1	Ladrillo tipo bocadillo 5X10X20	UND	160.000	3.200	$ 256.000.000	35,09%
3,2	Ladrillo Macizo de 10*20*30 cm	UND	32.487	2.800	$ 45.482.245	43,90%
3,3	kit de herraje (0.73 m x 1.05 m)	UND	1.156	1.617.354	$ 1.869.661.224	100,00%
3,4	kit de herraje (1.00 m x 3.00 m)	UND	44	1.198.000	$ 52.712.000	100,00%
4	**GMF (4X1000)**				**$ 10.704.749**	
	TOTAL		-	-	**2.686.891.968,00**	**100%**

Control Financiero Inversión Anticipo interventoría

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO		
CONTRATO No	**CI-0060-2025**	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF	NIT. 901941657-4
VALOR CONTRATADO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS	
	$	**409.937.150,00**
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES	
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA	
SUPERVISOR	ING. KIANA RAFAELA VALBUENA MEJIA	
ANTICIPO (50%) :	**$**	**204.968.575,00**


PROGRAMACION INICIAL

ITEM	DESCRIPCION / DETALLE	CANTIDAD A EJECUTAR CON ANTICIPO	VALOR A EJECUJAR CON ANTICIPO	VALOR NETO A GIRAR
1	**HONORARIOS PROFESIONALES**	65%	$ 133.229.573,75	$ 133.229.573,75
2	**TRANSPORTE**	35%	$ 71.739.001,25	$ 71.739.001,25
	TOTAL	100%	$ 204.968.575,00	**$ 204.968.575,00**

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA


El desembolso del acta parcial N°3 fue tramitado una vez cumplidos los requisitos contractuales y documentales exigidos, encontrándose al día el pago a la fecha del presente informe.

CONCEPTO PAGO	Valor Total	Amortizado	Valor del Pago	Saldo pendiente
ANTICIPO	$ 2.828.307.335,00			
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº1	$ 1.675.315.354,57	$ 837.657.677,29	$ 837.657.677,29	$3.981.299.314,43
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº2	$1.663.501.785,97	831.750.892,98	831.750.892,98	2.317.797.529.46
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº3	$ 1.377.706.927,65	$ 688.853.463,83	$ 688.853.463,83	$ 940.090.601,81

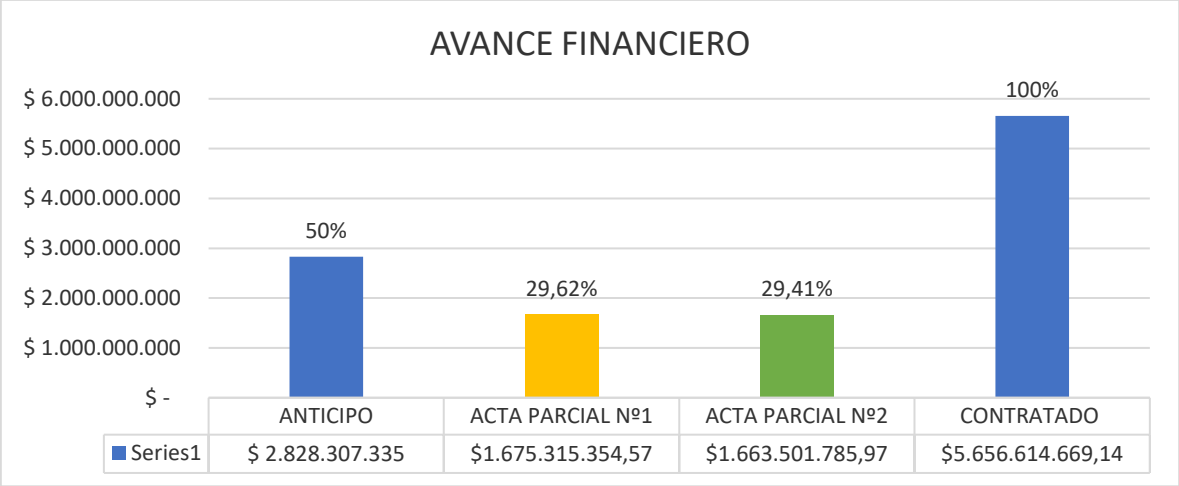

AGOS REALIZADOS A LA INTERVENTORIA

CONCEPTO PAGO	Valor Total	Amortizado	Valor del Pago	Saldo pendiente
ANTICIPO	$ $204.968.575,00			
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº1	$ 183.461.207,35	$ 91.730.603,50	$ 91.730.603,50	$ 226.475.942,65

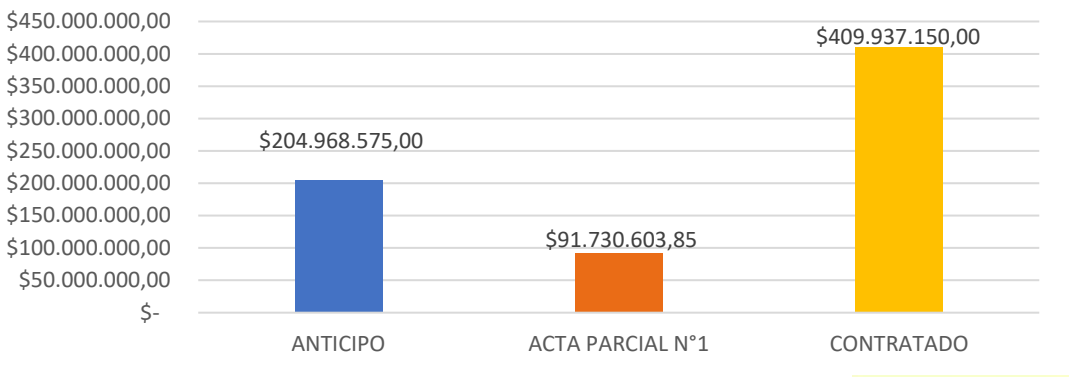

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN

A la fecha de corte, el proyecto registra un avance físico ejecutado del 4,01% frente a un 11,57% programado para el período, evidenciando un desfase en el cumplimiento de la meta mensual de 7,56%. el retraso presentado obedece principalmente a las limitaciones identificadas en las vías de acceso a las comunidades beneficiarias, las cuales dificultaron el traslado oportuno de materiales, insumos y personal técnico requeridos para la ejecución de las actividades. Adicionalmente, se evidenció un bajo nivel de compromiso por parte de algunos beneficiarios, quienes no realizaron oportunamente la adecuación de los espacios necesarios para la instalación de las estufas ni atendieron adecuadamente las orientaciones técnicas impartidas, situación que generó retrasos y la imposibilidad de ejecutar la totalidad de las construcciones previstas durante el período evaluado.

El acumulado general del proyecto, que incluye las actividades de obra, interventoría y supervisión, alcanza un 86,86% de ejecución, lo cual evidencia la necesidad de adoptar medidas correctivas que permitan encaminar el proyecto hacia el cumplimiento de las metas contractuales.

En ese sentido, la Interventoría recomienda fortalecer la estrategia operativa y social del proyecto, con el fin de establecer un plan de recuperación que permita mitigar el atraso presentado y garantizar la culminación adecuada del proyecto dentro de los parámetros técnicos y contractuales establecidos.

LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY
Interventor
UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	23 -01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Ernesto Esteban Freyle CC. 17804126		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA





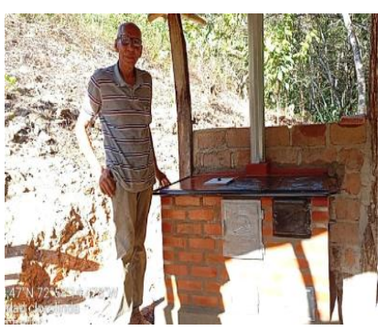

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	22 -01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Jhon Carlos Camargo Cobo CC. 84087239		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	21-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	WILMER IGUARAN (JUANA IGUARAN) CC. 515103		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Luis Carlos Camargo Cobo CC. 84089844		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Lexi Carmeliona Perez CC. 40794939		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Licelys Pérez amaya CC. 40977352		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Venilda Urariyu Jusayu CC 1006574782		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Marlenis Epieyu CC. 56100535		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Ender Jose Epieyu CC. 1124043617		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Ligia Pushaina Pushaina CC. 1118839111		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Marilin Deluque CC. 1006578999		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Saidi Uriana CC. 1006574778		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Olga Ipuana CC. 40912086		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	David Epiayu Freyle CC. 84107830		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Digna Emerita Meza Carranza CC. 40916847		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Maricela Epieyu CC. 56105653		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	ILIDES MAGDANIEL RODRIGUEZ CC. 17848156		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	JACINTO ORTIZ AMAYA CC. 17807662		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Carmen Elisa Rojas Quintero CC. 40914547		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Ruben Dario Fuentes CC. 17805301		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Elis Samuel Bertis CC. 17803260		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA		
BENEFICIARIO:	Angel Quintero CC. 91490665		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20 -01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Angela Maria Gonzales CC. 40880895		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	21 -01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Marilen Fernandez Fernandez CC. 1124509621		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	22-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Naudith Maria Gonzalez CC. 1122810885		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	23-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Yasneiris Gonzalez Jayariyu CC. 1124053668		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	24-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Aracelia Gonzalez Uriana CC. 11206600713		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	31-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Luis Angel Uriana CC. 17870503		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Damelis Diaz Jimenes CC 26984576		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	25-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	FRANCISCO EFRAIN IGUARAN EPIAYU CC. 84008992		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	27-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Magalis Uriana CC. 40850471		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	29-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Ana Delia Gonzalez CC. 1124542017		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	30-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Wilmer William Gonzalez CC. 1124542003		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	28-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	Yenifer Uriana CC. 40850466		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	24-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCAS		
BENEFICIARIO:	JOSE LUIS IPUANA EPIAYU CC. 84007529		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12 -01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Leiner Jose Marulanda Movil CC. 17815564		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18 -01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	LUIS DANIEL MORON CC. 19411117		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17 -01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	BREINER ARMENTA RAMIREZ CC. 1119816852		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15 -01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	MARIBEL SAURITH MENDOZA C.C 49733733		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15 -01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	RAFAEL CARRILLO MEJIA C.C 17150721		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09 -01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Alfredo uriana Epinayu CC. 17828749		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10 -01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Aura elena Pushaina CC. 1149184495		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12 -01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Yeyu uriana Epinayu C.C 84077151		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14 -01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Ramon segundo Bernal C.C 5990425		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Carmen Uriana Epinayu C.C 40975079		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Enrique Epinayu C.C 17828732		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15 -01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Marilyn uriana pushaina C.C 1124378363		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16 -01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Juan uriana Epinayu C.C 84077525		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17 -01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Carla Felicia uriana Arpushana C.C 1149184449		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	José uriana C.C 1124378363		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19-01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Vicente uriana C.C 5141871		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20-01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO		
BENEFICIARIO:	Vicente uriana urina C.C 84107097		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	si
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	Si
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	si
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	si
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	si
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	si
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	si
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	si
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	si
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	si
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	si
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	si

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	si
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	si
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	si
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	si
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	si
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	si
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	si
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	si
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	si
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	si
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	si
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	si
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	si
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	si
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	si
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	si

EVIDENCIA





