13.4 MS-GP-FR-034 INFORMES SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	12/03/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	11/08/2025	**SEMANA No.**	**19**	DEL	**4-ago-25**	AL	**10-ago-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	131 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	131 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LUZ ÁNGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizan actividades de procesamiento de información topográfica.
* Se entrego información de del componente de caracterización vial (Jerusalén, El colegio, Anapoima, Nariño, Viotá, Anolaima, Pandi Nilo)

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	7,60%	6,11%	-1,49%
Durante el periodo	3,51%	0,11%	-3,39%
Acumulado Actual	11,10%	6,22%	4,88%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

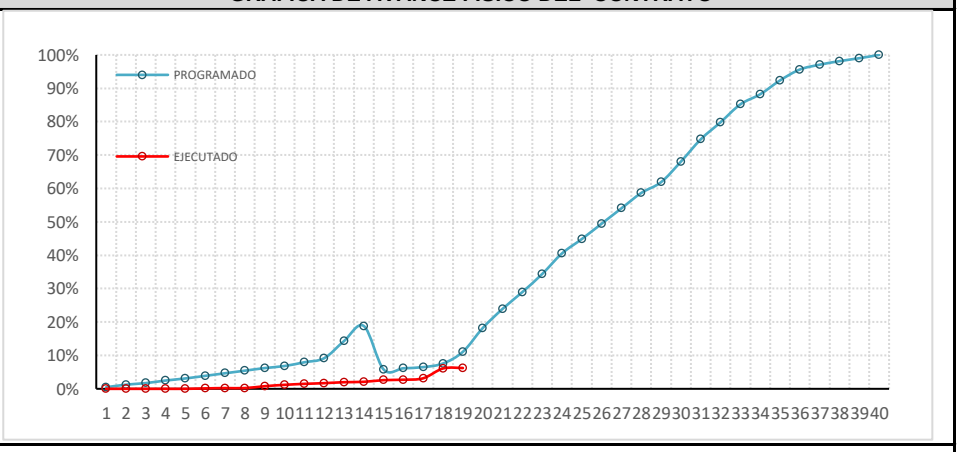

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	131,00	143,00	13,38

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2.449.324.487	$ 1.990.992.973	81,29%
Durante el periodo	$ 1.130.804.224	$ 36.649.667	3,24%
Acumulado Actual	$ 3.580.128.711,00	$ 2.027.642.639,69	56,64%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

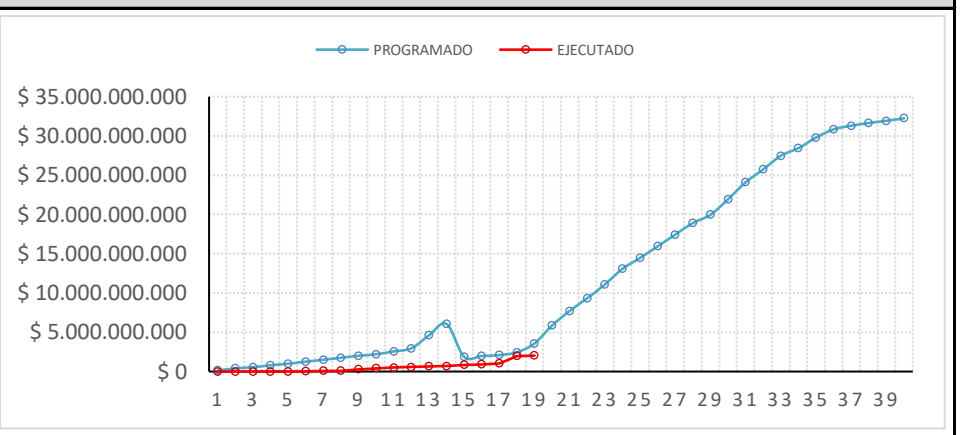


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	1.552.486.071

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

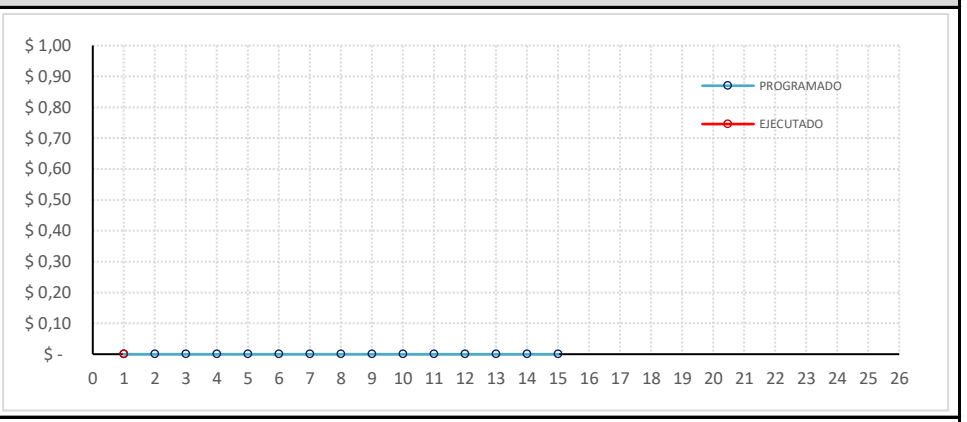

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana evaluada, desde el componente ambiental se realizaron las siguientes actividades:

1. Teniendo en cuenta que la aprobación del PAGA V5 se realizó el pasado 15 de julio de 2025 por medio del comunicado 25C02_DTO_031, se realizará el seguimiento correspondiente una vez inicien las actividades de obra.
2. Durante el periodo evaluado se realizó el Informe mensual del mes de julio de 2025 y fue presentado a la Interventoría el 04 de agosto de 2025 para su remisión.
3. El 06 de agosto de 2025 se realiza acompañamiento al Comité de Socialización desde las 11 am a la 1 pm de manera virtual, donde se menciona el seguimiento de todos los componentes. Desde el área ambiental se precisan algunas consideraciones para la aprobación de la hoja de vida de la espcialista ambiental del Contratista. Además, se menciona que se realizará visita desde el componente ambiental a los frentes de obra, una vez se concreten algunos temas técnicos, con el fin de verificar si se requiere o no permisos ambientales de acuerdo a las actividades de obra.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

La interventoría se permite informar que, durante el periodo comprendido del 04 de agosto de 2025 al 10 de agosto de 2025, el equipo social del contratista de obra y la interventoría realizaron un despliegue en campo a la provincia del Sumapaz con el objetivo de elaborar el inventario de predios existente en el área de influencia del proyecto y notificar a los propietarios de la visita que se agendará para el levantamiento de actas de vecindad. Esta actividad contó con el acompañamiento de las áreas técnicas.
La ejecución de la actividad permitió evidenciar que, en el municipio de Cabrera, tramo 2, barrio Simón Bolívar, se encuentran varios predios ubicados en el costado izquierdo de la vía. La interventoría recomienda prestar especial atención durante el levantamiento de las actas de vecindad, ya que, según información suministrada por la comunidad, en actividades realizadas previamente por el acueducto municipal, el uso del vibrocompactador ocasionó fisuras en algunas viviendas.
Asimismo, se observó que el tubo del acueducto, ubicado a un costado de la carretera, se encuentra expuesto y sin protección. La interventoría también recomendó y reiteró al contratista de obra la elaboración de un registro fílmico y fotográfico del estado de las cercas, así como de los cultivos perennes y transitorios ubicados en el área de influencia. Lo anterior, con el fin de prever y gestionar los cierres viales que puedan presentarse, evitando afectar el transporte de dichos productos y constatar el estado en el que se encuentran los predios y corrales antes del inicio de las obras. En cuanto al municipio de Tibacuy, la interventoría reporta que en la abscisa K20+000 se encuentra expuesta la red de gas y pasa sobre la alcantarilla.
La próxima semana se revisará la programación para el levantamiento de actas de vecindad.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En la semana en mencion se ejecuta las siguientes actividades:
1.Se recibe por parte del contratista respuesta a la solicitud de entrega de seguridad social del mes de junio, del cual se emite nuevas observaciones ya que no se encuentran todas las planillas de pago del personal relacionado en el formato de calculo de aportes.
2. Se participa en comite de obra dando a conocer al contratista la continuidad de la anomalia por la entrega de la seguridad social del mes de junio y se solicita fecha de compromiso de entrega de la seguridad social del mes de julio a lo cual manifuesta realizar entrega de la documentacion del 12-13 de agosto.
3. Se realiza informe semanal.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
* Para la semana 19 el contratista presenta un acumulado ejecutado del 6.22% vs un acumulado programado del 11.10%.
* Para la presente semana el contratista según programación debió entregar informes finales de la fase de caracterización vial y se debió comenzar con actividades de la fase de ejecución de obra, principalmente con el apartado de alcantarillas por la provincia de Sumapaz

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

* Se ha evidenciado que el contratista tiene disponibilidad y aplicación de recursos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que se han realizado las actividades de apiques, se han entregado resultados de ensayos de laboratorio, cuneta con personal profesional y de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 19 el contratista presenta un acumulado ejecutado de $2,027,642,640 vs un acumulado programado de $3,580,128,711 por lo que el avance financiero presenta un atraso de $1.552.486.071

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se han realizado actividades en campo correspondientes a la toma de muestra de suelo " apiques" los cuales el contratista a dado cumplimiento en la calidad de la ejecución de las actividades dando cumplimiento a las especificaciones técnicas componentes SST y componente ambiental.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Realizar entrega de procesamiento de información correspondiente a la caracterización vial " informes finales "	CONSORCIO VICGER 2021	16/08/2025
Realizar entrega de procesamiento de información correspondiente a laboratorio (informe final).	CONSORCIO VICGER 2021	16/08/2025

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

*Se presentan mayores cantidades en las actividades correspondientes al Ítem Apiques (incluye por unidad: elaboración, transporte, CBR in situ, CBR laboratorio), esto debido a que se dio cumplimiento a las especificaciones Invias las cuales indican que se deben realizar apiques cada 250m.


* Tras la reunión virtual sostenida el día 16 de julio de 2025, realizada en conjunto entre el contratista, la interventoría y los especialistas de cada grupo técnico en el área de geotecnia del proyecto, en donde se revisaron detalladamente los resultados de los apiques y la caracterización de materiales presentados para los tramos de Cabrera (Tramo 1 y Tramo 2), Pandi y Tibacuy, analizando punto por punto los datos entregados por el contratista.

Como resultado de esta revisión conjunta, y teniendo en cuenta las condiciones geotécnicas identificadas y los criterios técnicos establecidos en el proyecto, se toma como propuesta y como punto de partida para la formulación de una alternativa técnica de estabilización, mediante el uso de productos químicos y porcentajes variables de cemento, en búsqueda de establecer una fórmula de trabajo representativa por tramo homogéneo.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



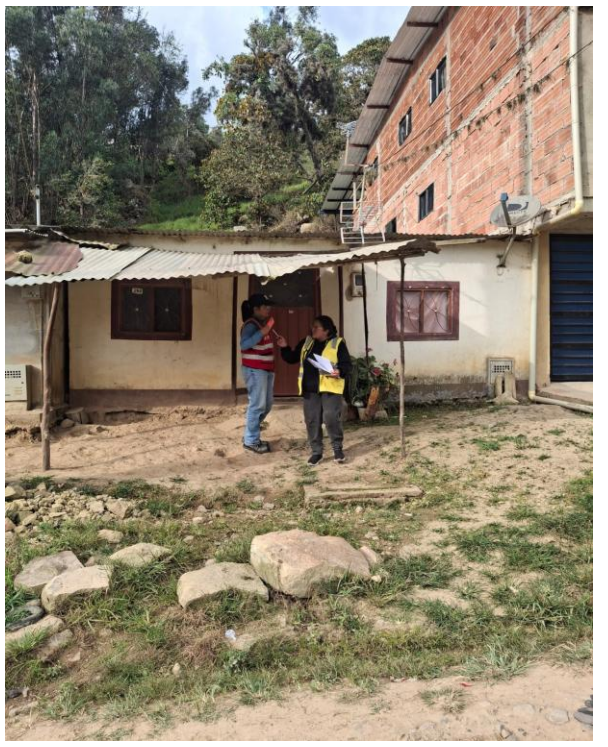




INSPECCION VISUAL OBRAS DE DRENAJE CABRERA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	12/03/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 18 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**20**	DEL	**11-ago-25**	AL	**17-ago-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	138 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	138 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No se realizan actividades de obra por parte del contratista durante la semana 20

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	11,10%	6,22%	-4,88%
Durante el periodo	7,10%	0,11%	-6,99%
Acumulado Actual	18,21%	6,33%	11,87%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

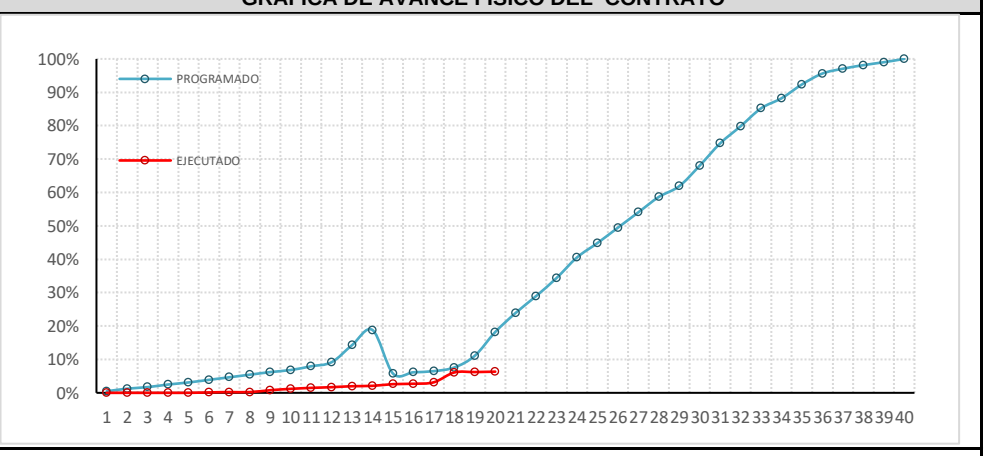

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	138,00	136,00	32,53

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.580.128.711	$ 2.027.642.640	56,64%
Durante el periodo	$ 2.290.921.948	$ 36.649.667	1,60%
Acumulado Actual	$ 5.871.050.659,00	$ 2.064.292.306,35	35,16%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

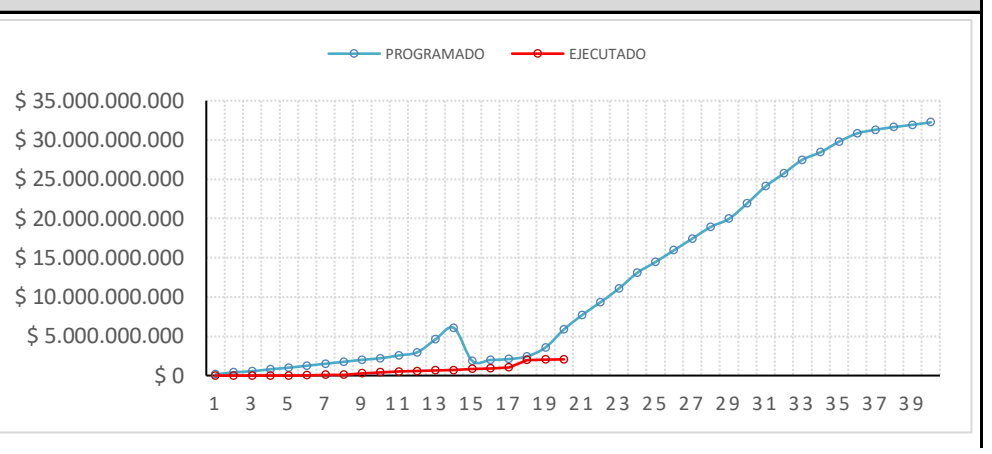


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 3.806.758.353

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

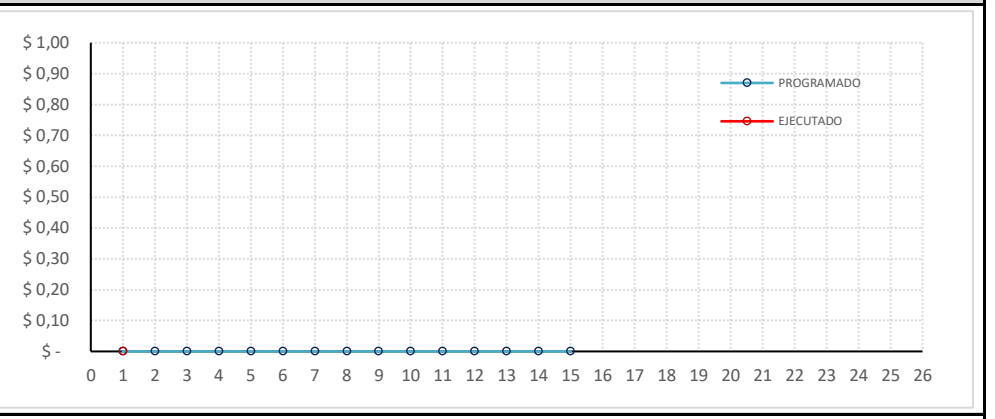

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana evaluada, desde el componente ambiental se realizaron las siguientes actividades:

1. Teniendo en cuenta que la aprobación del PAGA V5 se realizó el pasado 15 de julio de 2025 por medio del comunicado 25C02_DTO_031, se realizará el seguimiento correspondiente una vez inicien las actividades de obra.
2. Se presenta el informe semanal No. 19
3. Se realiza acompañamiento al Comité de Seguimiento de manera virtual a partir de las 10:30 am en compañía del ICCU, la Interventoría y el Contratista. Desde el componente ambiental de la Interventoría, se solicita nuevamente la presentación de la hoja de vida de la especialista ambiental, previo al inicio de las actividades de obra.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado en el presente informe, la interventoría comunica que se llevó a cabo un comité de seguimiento social con la participación de las profesionales responsables del componente social, tanto por parte de la interventoría como del contratista de obra. En dicha sesión se realizó un barrido del estado actual de las gestiones sociales, se acordó notificar a las alcaldías municipales de San Bernardo y Venecia sobre el inicio de obra y los posibles cierres viales que puedan presentarse.
Así mismo, se estableció que el contratista compartirá la programación para el levantamiento de actas de vecindad en la provincia del Sumapaz, así como la logística correspondiente para la actividad de inventario predial y la notificación de visitas para la suscripción de actas de vecindad en la provincia del Alto Magdalena.
Como actividad pendiente, se encuentra la reunión de inicio en la provincia del Tequendama, la cual está sujeta a la definición de algunos aspectos técnicos.

Como actividad pendiente, se encuentra la reunión de inicio en la provincia del Tequendama, la cual está sujeta a la definición de algunos aspectos técnic

En la semana en mencion se ejecuta las siguientes actividades:
1.Se participa en comite interno
2. Se participa en comite de obra dando a conocer al contratista la continuidad de la anomalia por la entrega de la seguridad social del mes de junio y julio.
3. Se realiza informe semanal.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
* Para la semana 20 el contratista presenta un acumulado ejecutado del 6.33% vs un acumulado programado del 18,21%.
* Para la presente semana el contratista según programación debió entregar informes finales de la fase de caracterización vial y se debió comenzar con actividades de la fase de ejecución de obra, principalmente con el apartado de alcantarillas por la provincia de Sumapaz

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

* Se ha evidenciado que el contratista tiene disponibilidad y aplicación de recursos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que se han realizado las actividades de apiques, se han entregado resultados de ensayos de laboratorio, cuenta con personal profesional y de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 20 el contratista presenta un acumulado ejecutado de $2,064,292,306 vs un acumulado programado de $5,871,050,659 por lo que el avance financiero presenta un atraso de $3,806,758,353

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se han iniciado actividades de ejecucion de obra por parte del contratista

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de informes finales fase de caracterizacion vial y ensayos.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato
Iniciar actividades de obra correspondientes a la fase 2	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se ha realizado entrega de presupuestos, planos y diseños finales


11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Interventoria realiza actividades correspondientes a revision del estado actual de las obras de arte " alcantarillas de los municipios de Cabrera, Pandy, Tibacuy, Nariño, Nilo y Jerusalen. Tambien se realizan actividades de toma de muestra de sulo " apiques" en el Municipio de Cabrera Cundinamarca.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





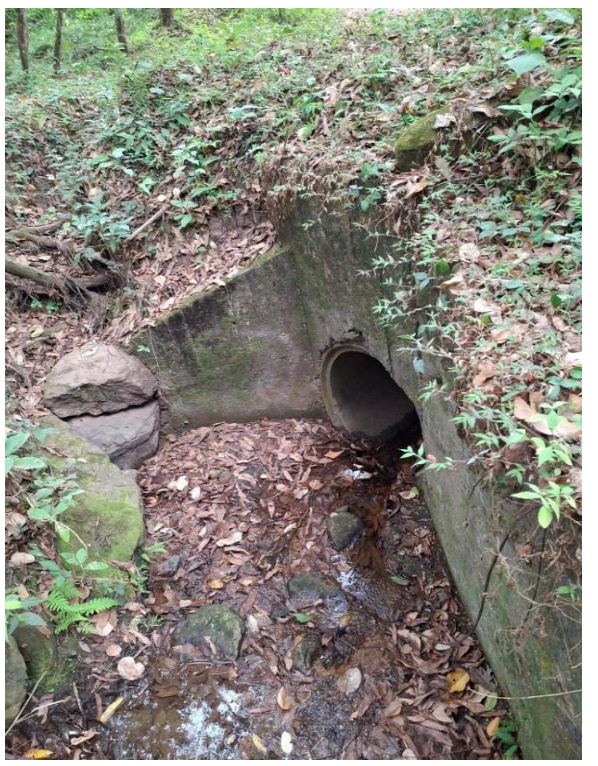













INSPECCION VISUAL OBRAS DE DRENAJE Y TOMA DE MUESTRAS DE SUELO

INSPECCION VISUAL OBRAS DE DRENAJE Y TOMA DE MUESTRAS DE SUELO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	12/03/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 25 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**21**	DEL	**18-ago-25**	AL	**24-ago-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	145 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	145 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LUZ ÁNGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No se realizan actividades de obra por parte del contratista durante la semana 21

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	18,21%	6,33%	-11,87%
Durante el periodo	5,74%	0,11%	-5,63%
Acumulado Actual	23,95%	6,45%	17,50%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

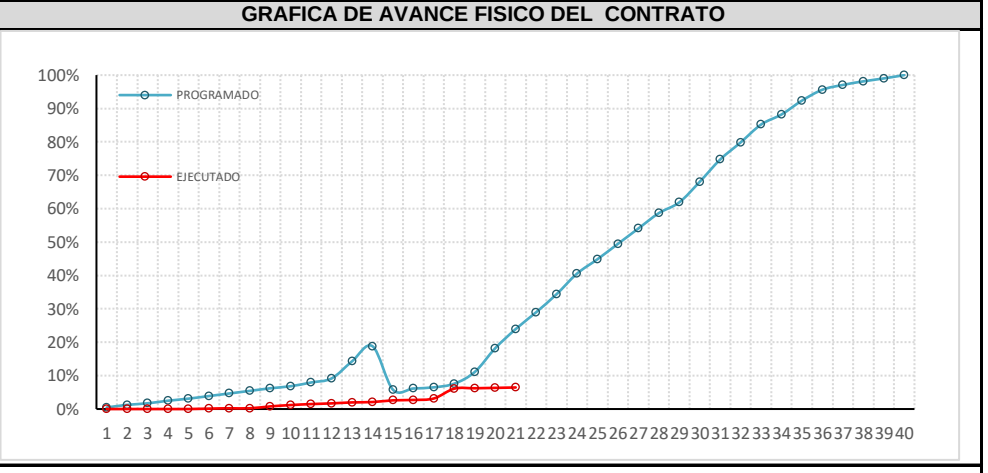

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	145,00	129,00	47,95

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 5.871.050.659	$ 2.064.292.306	35,16%
Durante el periodo	$ 1.850.958.825	$ 36.649.667	1,98%
Acumulado Actual	$ 7.722.009.484,00	$ 2.100.941.973,02	27,21%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

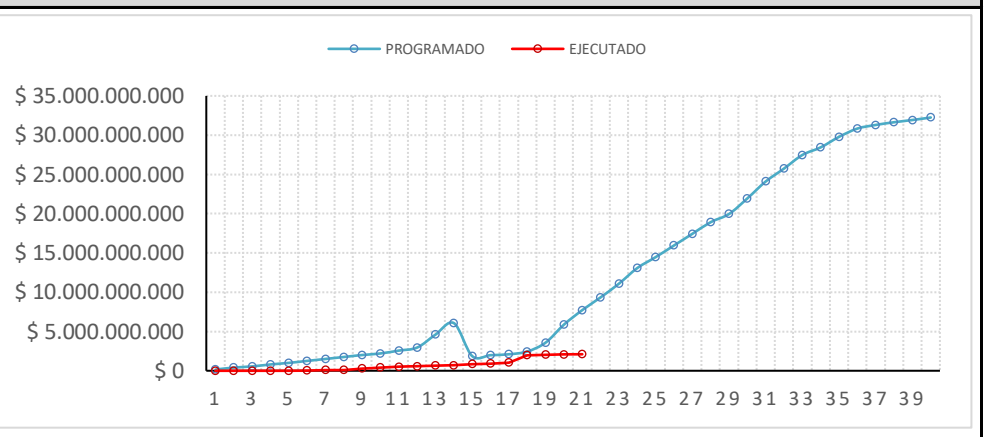


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 5.621.067.511

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

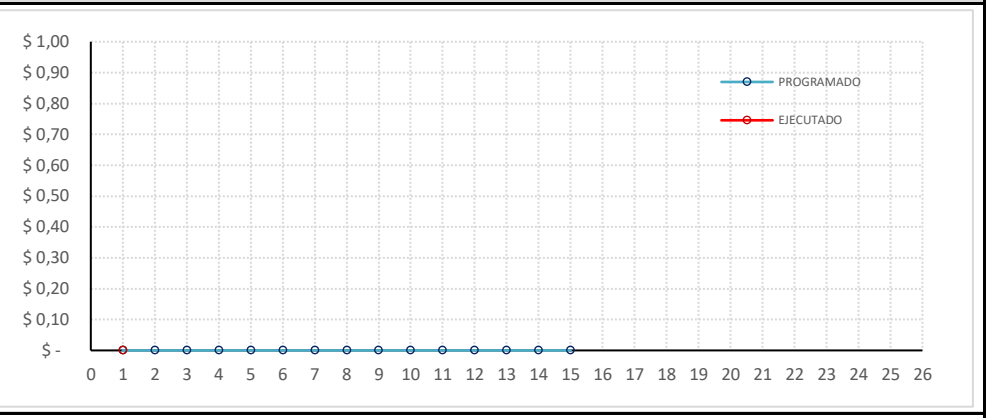

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana evaluada, desde el componente ambiental se realizaron las siguientes actividades:

1. Teniendo en cuenta que la aprobación del PAGA V5 se realizó el pasado 15 de julio de 2025 por medio del comunicado 25C02_DTO_031, se realizará el seguimiento correspondiente una vez inicien las actividades de obra.
2. Se realiza el informe semanal
3. El 20 de agosto de 2025 se realiza acompañamiento al Comité de Seguimiento a partir de las 11:00 am de manera virtual, en compañía del ICCU, la Interventoría y el Contratista. Desde el área ambiental de Interventoría se informa, que teniendo en cuenta lo contemplado en el presupuesto PAGA y de acuerdo a lo mencionado por el Supervisor ICCU, la Especialista ambiental del Contratista será paga una vez inicien actividades de obra y se cuente con la hoja de vida aprobada por Interventoría y el ICCU.
4. Se remite comunicado No. 25C02_DTO_057 el 22 de agosto de 2025, solicitando la presentación de la hoja de vida de la especialista ambiental del Contratista, teniendo en cuenta los tiempos para su revisión.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

La interventoría se permite informar que el contratista de obra compartió la programación de actividades de levantamiento de actas de vecindad correspondientes a la provincia de Sumapaz (municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy), las cuales se desarrollarán entre el 25 y el 30 de agosto de 2025. Cabe resaltar que la programación remitida contempla la ejecución del 20% de las actas, y que, posteriormente, de acuerdo con el avance de la obra, deberán realizarse las restantes hasta completar el 100% de los predios registrados.

En el marco del comité de seguimiento técnico de la semana 21, las profesionales sociales de la interventoría y del contratista participaron activamente. Durante este espacio, la interventoría expuso el estado de las gestiones sociales adelantadas y los pendientes a la fecha. Por su parte, el contratista de obra informó que la entidad había remitido la aprobación de cuatro (4) artes de las vallas informativas; frente a ello, la interventoría solicitó dar continuidad al trámite, notificando la ubicación y la fecha de instalación de las mismas, con el fin de realizar el respectivo seguimiento.

De igual manera, el contratista programó actividades de levantamiento de inventario predial en la provincia del Alto Magdalena, a desarrollarse entre el 1 y el 5 de septiembre de 2025. Paralelamente, se efectuará la notificación de primera visita para las actas de vecindad. La interventoría, por su parte, se encuentra en proceso de revisión y aprobación de la pieza informativa compartida, la cual será remitida a la supervisión social del ICCU para su aval correspondiente. El resultado de estas actividades será reportado en el siguiente informe semanal.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En la semana en mencion se ejecuta las siguientes actividades:
1.Se recibe por parte del contratista las planillas de seguridad del mes de junio y julio dando por aprobada la informacion del mes de junio. Se verifica que faltan planillas de personal de personal del mes de julio por lo cual se solicita al contratista el envio de la informacion de manera inmediata.
2. Se remite al contratista el documento de aprobacion correspondiente al sistema de gestion de segurida y salud en el trabajo. SG_SST
3. Se realiza informe semanal.
4. Se participa en comite interno de obra.
5. Se participa en comite de obra con contratista y entidad.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
* Para la semana 21 el contratista presenta un acumulado ejecutado del 6.45% vs un acumulado programado del 23,95%.
* Para la presente semana el contratista según programación debió entregar informes finales de la fase de caracterización vial y se debió comenzar con actividades de la fase de ejecución de obra, principalmente con el apartado de alcantarillas por la provincia de Sumapaz

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

* Se ha evidenciado que el contratista tiene disponibilidad y aplicación de recursos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que se han realizado las actividades de apiques, se han entregado resultados de ensayos de laboratorio, cuenta con personal profesional y de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 21 el contratista presenta un acumulado ejecutado de $2,100,941,973 vs un acumulado programado de $7,722,009,484 por lo que el avance financiero presenta un atraso de $5,621,067,511

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se han iniciado actividades de ejecucion de obra por parte del contratista

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Entrega de informes finales fase de caracterizacion vial y ensayos.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato
Iniciar actividades de obra correspondientes a la fase 2	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se ha realizado entrega de presupuestos, planos y diseños finales

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Interventoria realiza actividades correspondientes a revision del estado actual de las obras de arte " alcantarillas" de el municipios de Viota. Tambien se realizan actividades de toma de muestra de sulo " apiques" en los Municipio de Pandy y Tibacuy


12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









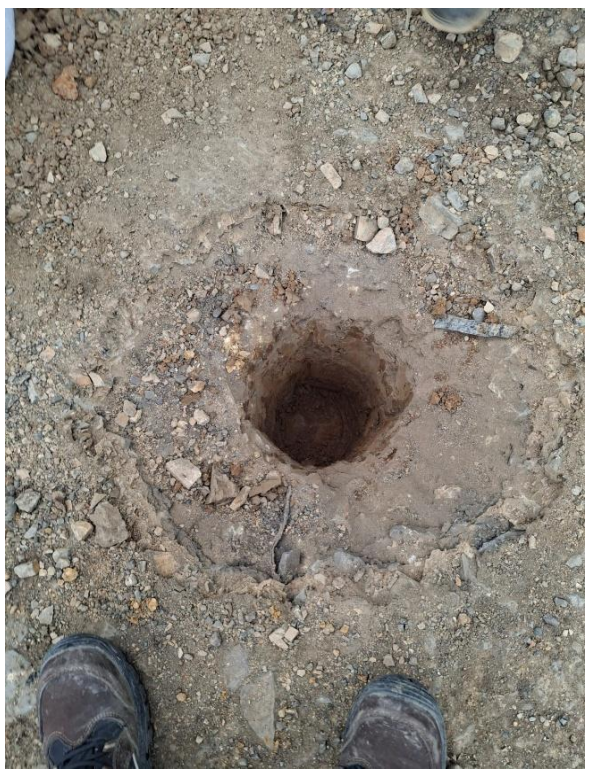





TOMA DE MUESTRA DE SUELO MUNICIPIOS DE PANDY Y TIBACUY

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	12/03/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	1/09/2025	**SEMANA No.**	**22**	DEL	**25-ago-25**	AL	**31-ago-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	152 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	152 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LUZ ÁNGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No se realizan actividades de obra por parte del contratista durante la semana 22

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	23,95%	6,45%	-17,50%
Durante el periodo	5,03%	0,11%	-4,92%
Acumulado Actual	28,98%	6,56%	22,42%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

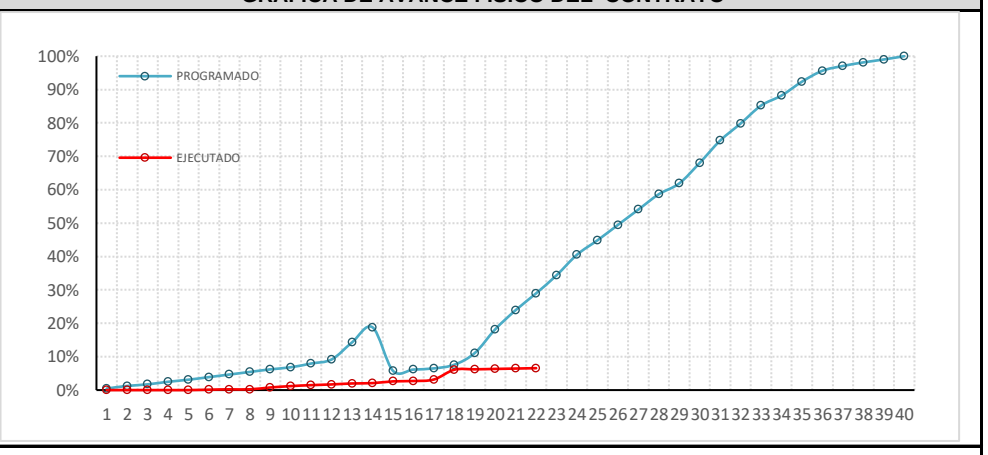

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	152,00	122,00	61,42

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 7.722.009.484	$ 2.100.941.973	27,21%
Durante el periodo	$ 1.622.716.368	$ 36.649.667	2,26%
Acumulado Actual	$ 9.344.725.852,00	$ 2.137.591.639,69	22,87%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

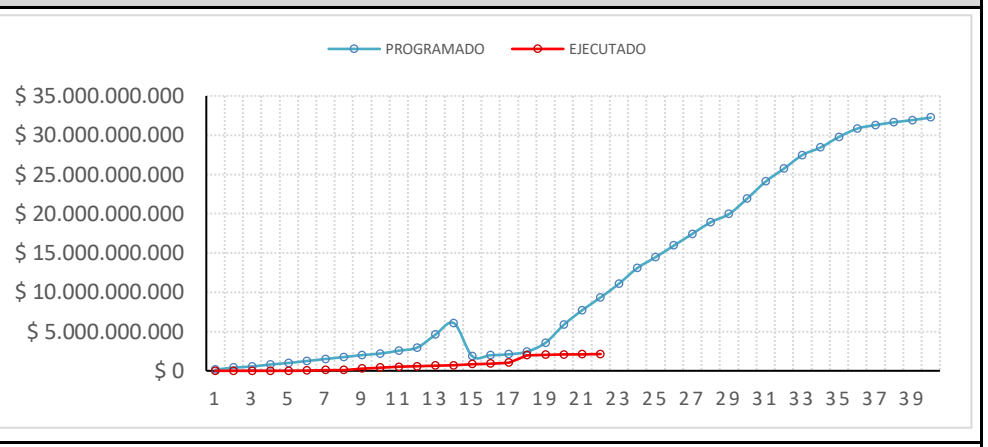


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	7.207.134.212

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

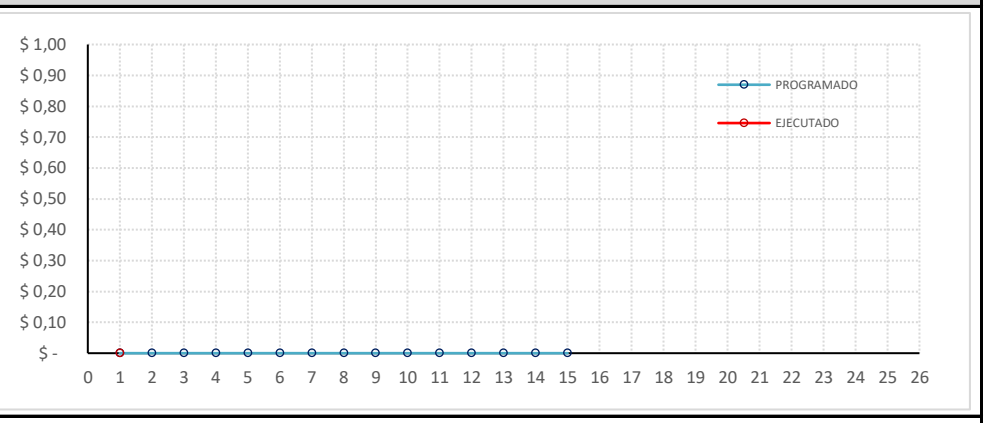

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana evaluada, desde el componente ambiental se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realiza el informe semanal
3. El 27 de agosto de 2025 se realiza acompañamiento al Comité de Seguimiento a partir de las 11:00 am de manera virtual, en compañía del ICCU, la Interventoría y el Contratista. Desde el área ambiental de Interventoría se menciona que se aprobó la hoja de vida de la especilista ambiental del Contratista para la etapa de ejecución y se solicita presentar el Paga ajustado de acuerdo con las observaciones realizadas por el ICCU.
4. Se remite al Contratista con copia al ICCU, el comunicado No. 25C02_DTO_069 el 27 de agosto de 2025, brindando un concepto aprobatorio a la hoja de vida de la especialista ambiental del Contratista para la etapa de ejecución del proyecto.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana del 25 al 31 de agosto de 2025, el contratista de obra realizó con el acompañamiento de la interventoría el levantamiento de actas de vecindad correspondientes a la provincia de Sumapaz (municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy), dando cumplimiento a la programación pactada. A continuación, se detalla el consolidado de los predios visitados:
A continuación, se presenta el consolidado de los predios visitados:
•Cabrera: Se programaron 32 predios, de los cuales se levantaron 24 actas de vecindad. Se requiere efectuar segunda visita en 8 predios.
•Pandi: Se programaron 16 predios, de los cuales se levantaron 8 actas de vecindad. Se requiere efectuar segunda visita en 8 predios.
•Tibacuy: Se programaron 25 predios, de los cuales se levantaron 12 actas de vecindad. Se requiere efectuar segunda visita en 13 predios.
Es importante mencionar que, la programación compartida por el contratista de obra corresponde al 20% de las actas, y que, de acuerdo con el avance de la obra, deberán realizarse las restantes hasta completar el 100% de los predios.
Durante el desarrollo del comité de seguimiento técnico de la semana 22, las profesionales sociales de la interventoría participaron activamente informando el estado actual del componente, las gestiones realizadas y los pendientes a la fecha, también se informó que el contratista de obra y la interventoría se encontraban realizando trabajo de campo, por otro lado, el contratista de obra remitió el informe mensual correspondiente al mes de julio de 2025. También, la interventoría tramitó la aprobación de la hoja de vida de la profesional social del contratista de obra, como también se efectuó el trámite correspondiente para la aprobación a la pieza informativa del volante de notificación de primera visita de las actas de vecindad de Alto Magdalena y para la gestión del aval desde la supervisión social de la entidad.
Por otro lado, el componente social de la interventoría radicó para aval de la supervisión social el documento correspondiente a lista de chequeo mensual ante la entidad.
El área social de la interventoría, en conjunto con el contratista de obra, realizó una mesa de trabajo de revisión general del estado actual del componente social, en la cual se abordaron principalmente los siguientes temas: lineamientos para la atención de observaciones a informes mensuales y recomendaciones para la logística en campo y notificación de segunda visita a predios que así lo requieran.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En la semana en mencion se ejecuta las siguientes actividades:
1.Se recibe por parte del contratista las planillas de seguridad social de personal faltante del mes de julio la cual es revisada y enviada para radicacion en informe mensual.
2. Se realiza envio de oficio 250825_25C02_DTO_056_SolicitudEntregaPMT a contratista de obra, reiterando la entrega del documento del plan de manejo de transito del proyecto.
3. Se realiza informe semanal.
4. Se participa en comite virtual de obra con participacion del contratista y la entidad.
5. Realizacion de ajuste de formato de calculo de seguridad social interventoria mes de abril y mayo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
* Para la semana 22 el contratista presenta un acumulado ejecutado del 6.56% vs un acumulado programado del 22,42%.
* Para la presente semana el contratista según programación debió entregar informes finales de la fase de caracterización vial y se debió comenzar con actividades de la fase de ejecución de obra, principalmente con el apartado de alcantarillas por la provincia de Sumapaz

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

* Según programación de obra el contratista para la semana 22 debio haber iniciado actividades de obra del capítulo de alcantarillas en la provincia del Sumapaz municipio de Cabrera Cundinamarca, por tal razón el contratista no cuenta con disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo de objeto contractual .

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 22 el contratista presenta un acumulado ejecutado de $2,137,591,639,69 vs un acumulado programado de $9,344,725,852 por lo que el avance financiero presenta un atraso de $7,207,134,212

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se han iniciado actividades de ejecucion de obra por parte del contratista

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de informes finales fase de caracterizacion vial y ensayos.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato
Iniciar actividades de obra correspondientes a la fase 2	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se ha realizado entrega de presupuestos, planos y diseños finales

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Interventoria realiza actividades de acompañamiento para levantalmiento de actas de vecindad en los municipio de Cabrera, Pandi y Tibacuy al 20% de las viviendas aprobadas en la fase de reconocimiento predial

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

















ACOMPAÑAMIENTO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD CABRERA, PANDI Y TIBACUY

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS
