**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA**

**ICCU**

**CONSORCIO CAMINOS IP**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. ICCU – CTO 258 DE 2025**

**OBJETO**

# CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU – CTO 287 DE 2025**

## INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA No. 6

**PERIODO**

**20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025**

**BOGOTÁ D.C, DICIEMBRE DE 2025**

**Contrato de Consultoría No.** ICCU – CTO 258 DE 2025 **Contratista:** **CONSORCIO CAMINOS IP**

**Contrato de Interventoría No.** **Interventoría:** **Consorcio Litoral MC -Interventoría**

**Objeto Contrato de Obra:**
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS

**INFORME MENSUAL No. 6** **MES O PERIODO:** 8

ICCU_493_CX_F3_TR_VI_NAP_INM_05


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Índice Informe Mensual | | 2 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | | |
| 1 | Introducción | | 4 |
| 2 | Descripción del proyecto | | 5 |
| 2.1 | Localización | | 5 |
| 3 | Información Contrato de Consultoría. | | 9 |
| 3.1 | Actividades ejecutadas en el mes | | 10 |
| 3.2 | Informe semanal | MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | 19 |
| 3.3 | Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL | 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato Consultoría | | 22 |
| 3.5 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS | 24 |
| 3.6 | Seguimiento al Plan de Calidad | | 24 |
| 3.6.1 | Seguimiento Programa | | 25 |
| 4 | Información contrato de interventoría | | 26 |
| 5 | Conclusiones y recomendaciones | | 28 |
| 6 | Anexos | | 29 |
| 6.1 | Correspondencia | | 29 |


Firma:

Nombre: **Santiago Páez Talero**

**DIRECTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA**

Tarjeta Profesional: 2520240972CND

Original: Informe mensual de Consultoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

# 1 Introducción

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) llevó a cabo el proceso de contratación No. ICCU–CM-044 de 2024 para la realización de estudios y diseños de corredores viales en el departamento de Cundinamarca. Como resultado de la evaluación de las ofertas, el ICCU adjudicó el contrato de Consultoría por medio de la resolución No. 125 de 2025, correspondiente a los corredores contemplados al Lote 2 al Consorcio CAMINOS IP.

El objeto del contrato es la ejecución de estudios y diseños para la vía desde el casco urbano de Madrid hasta la inspección Puente Piedra, la vía desde la inspección La Magdalena hasta el casco urbano del municipio de Quebradanegra y la vía desde el casco urbano de Cáqueza al sector Placitas. La duración del contrato será de ocho meses.

El Consorcio CAMINOS IP está conformado por Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A. (60%) y Pavimentos y Geotecnia S.A.S. (40%), quienes asumirán la responsabilidad de desarrollar los estudios en los términos y condiciones definidos por el ICCU. Esta adjudicación garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos y económicos exigidos, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura vial en Cundinamarca.

En este contexto, los Estudios y Diseños a desarrollar a nivel de Fase III, se adelantarán de conformidad con lo estipulado en los Términos de Referencia, en el Anexo Técnico, así como en todos los demás documentos que forman parte del proceso licitatorio y de los escritos que hacen parte integral del Contrato, así como en los manuales y guías de diseño elaborados y/o adoptados por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

El presente documento corresponde al Informe Mensual No. 6 del periodo del 20 de Octubre al 19 de Noviembre de 2025, documento que presenta el seguimiento a las actividades ejecutadas por la Consultoría en el periodo indicado.

## 2 Descripción del proyecto

El 20 de mayo de 2025 se formalizó el acta de inicio del presente contrato. Según el cronograma de trabajo y el contrato de Consultoría, con un plazo de ocho (8) meses y/o al 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Con el fin de dar la respectiva ejecución del contrato de Consultoría, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) celebró el contrato ICCU - 258 de 2025 (CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS) – lote 2 con la firma CONSORCIO CAMINOS IP.

### 2.1 Localización

#### 2.1.1 Corredor Vial Madrid – Puente Piedra.


El corredor vial entre el municipio de Madrid y la inspección de Puente Piedra es una ruta clave en el departamento de Cundinamarca, que conecta el municipio de Madrid con la zona rural de Puente Piedra, facilitando el transporte tanto de pasajeros como de carga. Esta vía, de aproximadamente 13.0 kilómetros de longitud, atraviesa un paisaje predominantemente agrícola, con cultivos de flores, papa y hortalizas, que son la base económica de la región. Su importancia radica en su rol como enlace entre la Sabana de Occidente y Bogotá, permitiendo el flujo de productos locales hacia los mercados urbanos.

La vía presenta una mezcla de tramos pavimentados y en afirmado. En épocas de lluvia, algunos sectores pueden deteriorarse, afectando la movilidad, especialmente en zonas rurales donde el tránsito de maquinaria agrícola es frecuente. A pesar de esto, el corredor es fundamental para el transporte público, con servicios de busetas y colectivos que cubren la ruta, así como para el tráfico de camiones que transportan mercancías desde las fincas y empresas floricultoras de la zona.

En los últimos años, se han llevado a cabo proyectos de mantenimiento y mejoramiento por parte de la Gobernación de Cundinamarca y las administraciones locales, buscando optimizar la conectividad y seguridad vial. Sin embargo, el desarrollo de esta vía es crucial para impulsar la

economía regional y garantizar una movilidad eficiente para los habitantes y comerciantes de la zona.

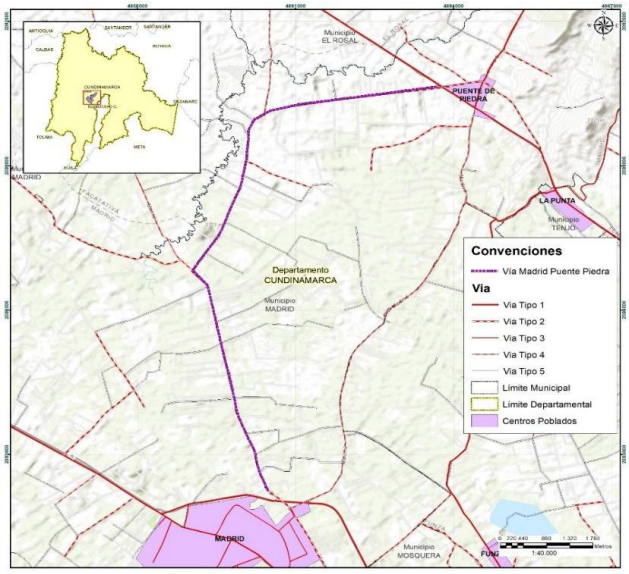Ilustración 1. Localización General – Corredor vial Madrid hacia Puente Piedra




Fuente: Elaboración Propia.


## 2.1.2 Corredor Vial Magdalena – Quebradanegra.

El corredor vial entre la Inspección de La Magdalena y el municipio de Quebradanegra constituye una importante ruta de conexión en el occidente de Cundinamarca, atravesando un territorio de topografía quebrada característico de la región del Tequendama. Esta vía, de aproximadamente 5.2 kilómetros de longitud, facilita el transporte de pasajeros y productos agrícolas entre zonas rurales y urbanas. Su trazado serpenteante discurre por paisajes de bosque andino y áreas de cultivo, donde predominan actividades como la caficultura, la producción de plátano y la ganadería de pequeña escala.

La infraestructura vial presenta condiciones variables a lo largo de su recorrido, la geomorfología montañosa del área exige mantenimiento constante para prevenir derrumbes y garantizar la transitabilidad, particularmente en zonas de pendientes pronunciadas. El corredor es vital para las comunidades aledañas, siendo utilizado principalmente por transporte público informal (jeeps y camperos) que movilizan a los habitantes de veredas dispersas hacia el centro municipal de Quebradanegra.

Desde la perspectiva socioeconómica, esta vía reviste gran importancia para el desarrollo local al constituir el principal eje de conexión para el comercio de productos agropecuarios y el acceso a servicios básicos. No obstante, presenta desafíos significativos en materia de seguridad vial e infraestructura, especialmente durante épocas de lluvias cuando aumentan los riesgos de deslizamientos. Su mejoramiento representaría un avance crucial para dinamizar la economía rural y potencializar el turismo ecológico en la región, aprovechando los atractivos naturales como cascadas y senderos que caracterizan este territorio montañoso de Cundinamarca.

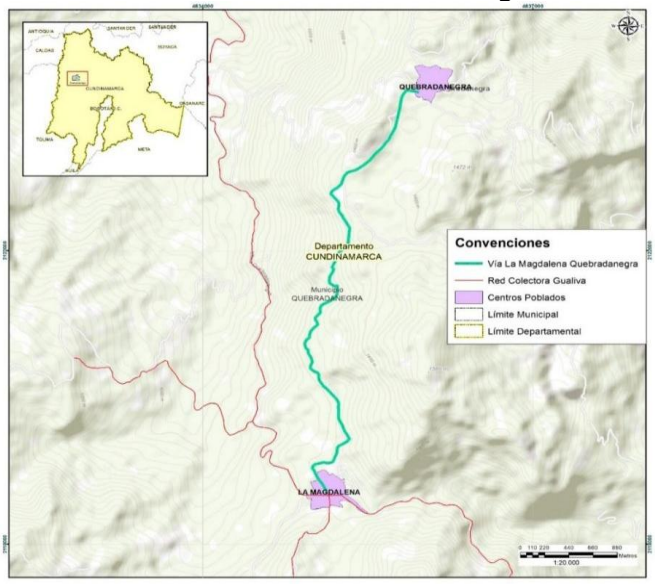Ilustración 2. Localización General – Corredor vial La Magdalena hacia Quebradanegra




Fuente: Elaboración Propia.

### 2.1.3 Corredor Vial Cáqueza – Placitas.


El corredor vial de 2 kilómetros que conecta el casco urbano de Cáqueza con la vía principal nacional constituye un enlace estratégico para la movilidad y desarrollo del municipio. Aunque de corta extensión, esta ruta cumple una función vital al integrar la zona urbana con la red nacional de carreteras, facilitando el flujo de pasajeros, mercancías y el acceso a servicios esenciales. El trayecto atraviesa un entorno periurbano caracterizado por la transición entre áreas residenciales, pequeños comercios y zonas de cultivo, reflejando la dinámica socioeconómica propia de municipios intermedios en la región.

La vía presenta características adecuadas para su función, una topografía con pendientes fuertes. El tráfico vehicular es moderado, con predominio de transporte público (busetas y

camperos), vehículos particulares y motocicletas que utilizan este corredor como principal conexión con la red vial nacional.

La importancia socioeconómica de este corredor desproporcionada a su corta longitud, ya que funciona como eje articulador del comercio local, permitiendo el transporte eficiente de productos agrícolas y manufacturados hacia los mercados regionales. Además, facilita el acceso de la población a servicios fundamentales como salud y educación. Las intervenciones para proponer garantizarán la funcionalidad permanente de este enlace vial estratégico que, pese a sus solo 2 kilómetros de extensión, representa la principal conexión de Cáqueza con el sistema vial nacional y el desarrollo regional.

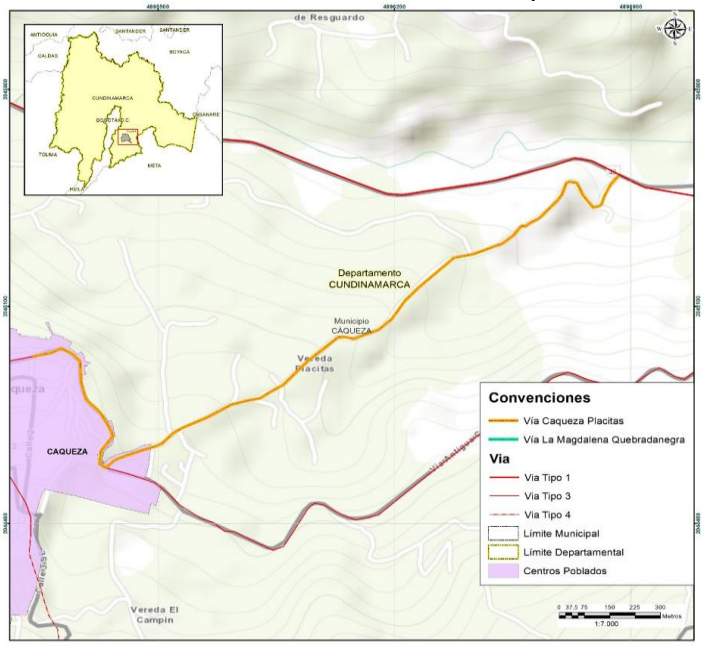Ilustración 3. Localización General – Corredor vial Cáqueza hacia sector Placitas




Fuente: Elaboración Propia.

## 3 Información Contrato de Consultoría.

A continuación, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría.

Tabla 1. Información Contrato Consultoría

| | |
|---|---|
| **Tipo de Contrato:** | Consultoría |
| **Contrato:** | ICCU – CTO 258 DE 2025 |
| **Objeto:** | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS |
| **Contratista** | CONSORCIO CAMINOS IP |
| **NIT** | 901.917.475-1 |
| **Supervisor** | LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ |
| **Apoyo a Supervisión** | JHON WILLIAM ARDILA BACCA |
| **Plazo de ejecución:** | 8 meses y/o 31 de diciembre de 2025 |
| **Fecha de inicio:** | 20 de mayo de 2025 |
| **Fecha de terminación:** | 31 de diciembre de 2025 |
| **Valor del contrato:** | DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 2.430.458.478,00) |

Fuente: Elaboración Propia.

## 3.1 Actividades ejecutadas en el mes

- A continuación, se relacionan las actividades de campo de todos los volúmenes que se han realizado hasta el momento en los tres frentes de estudio.

Tabla 2. Seguimiento trabajos de campo

| Volumen | OBJETO: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre del volumen | Trabajo de campo | CAQUEZA | 100.00 % | MADRID | 100.00 % | QUEBRADANEGRA | 100.00 % |
| | | | Porcentaje trabajo de campo Ejecutado | SI /NO/NA | Porcentaje trabajo de campo Ejecutado | SI /NO/NA | Porcentaje trabajo de campo Ejecutado | SI /NO/NA |
| I | **Estudio de Transporte** | Planeación y definición de puntos de aforo junto con la interventoría. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |
| II | **Topografía, Trazado y Diseño Geométrico, Señalización, Seguridad Vial y PMT** | Georreferenciación con mojones GPS y establecimiento de poligonales de control. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |
| III | **Geología para Ingeniería y Análisis de Hidrogeología** | Reconocimiento geológico de campo a escala apropiada del corredor. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |
| IV | **Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | Ejecución de apiques y calicatas en sitios representativos. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |
| V | **Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | Reconocimiento detallado de taludes en corte y laderas naturales. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |


| Volumen | OBJETO: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre del volumen | Trabajo de campo | CAQUEZA | 100.00 % | MADRID | 100.00 % | QUEBRADANEGRA | 100.00 % |
| | | | Porcentaje trabajo de campo Ejecutado | SI /NO/NA | Porcentaje trabajo de campo Ejecutado | SI /NO/NA | Porcentaje trabajo de campo Ejecutado | SI /NO/NA |
| VI | **Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento** | Calicatas y apiques estructurales para identificar la estructura del pavimento existente. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |
| VII | **Estudio de Fuentes de Materiales** | Reconocimiento de bancos y canteras potenciales en la zona de influencia. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |
| VIII | **Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | Inspección de cauces, quebradas y ríos relacionados con la vía. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |
| IX | **Estudios y Diseños de Estructuras** | Inspección visual detallada de puentes, pontones y estructuras de contención existentes. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |
| X | **Gestión Ambiental y Social del Proyecto** | Recorridos de campo para identificación de componentes ambientales sensibles. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |
| XI | **Gestión Predial** | Visitas a predios para verificación de linderos, ocupaciones y construcciones afectables. | 100% | SI | 100% | SI | 100% | SI |
| XII | **Cantidades de Obra, Análisis de Precios** | Verificación en campo de tipologías constructivas y longitudes reales | 100% | NO | 100% | NO | 100% | NO |

| Volumen | OBJETO: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Nombre del volumen** | **Trabajo de campo** | **CAQUEZA** | **100.00 %** | **MADRID** | **100.00 %** | **QUEBRADANEGRA** | **100.00 %** |
| | | | **Porcentaje trabajo de campo Ejecutado** | **SI /NO/NA** | **Porcentaje trabajo de campo Ejecutado** | **SI /NO/NA** | **Porcentaje trabajo de campo Ejecutado** | **SI /NO/NA** |
| | **Unitarios y Presupuesto** | de obras proyectadas. | | | | | | |
| XIII | **Informe Final Ejecutivo** | No requiere trabajos de campo adicionales: compila, integra y consolida la información de los demás volúmenes. | NA | NO APLICA | NA | NO APLICA | NA | NO APLICA |
| | | **TOTAL** | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | |

De acuerdo con lo presentado en la tabla 2, el corredor Cáqueza registra un avance del 100%, lo que evidencia la culminación total de las actividades programadas. En el caso del corredor Madrid, se reporta un avance del 100%, indicando que su ejecución a finalizado. Así mismo, el corredor Quebrada Negra se completan todos los trabajos de campo reflejando que se ha completado las actividades previstas

Durante el periodo se realizaron trabajos de apiques, barrenos y sondeos en el sector de Quebradanegra.

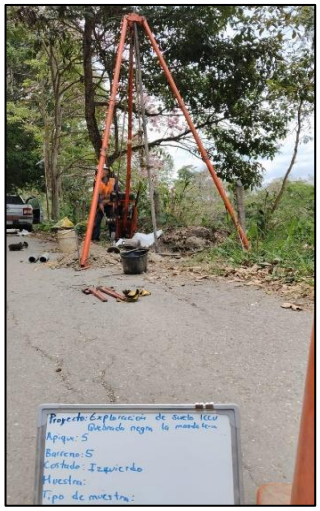Fotografía 1. Ejecución Apiques – barrenos 5 y 11 Quebradanegra






Fuente: Pavimentos y Geotecnia S.A.S

Fotografía 2. Ejecución Apiques – barreno 11 y 6 Quebradanegra






Fuente: Pavimentos y Geotecnia S.A.S


Fotografía 3. Ejecución Barreno 10 Quebradanegra




Fuente: Pavimentos y Geotecnia S.A.S

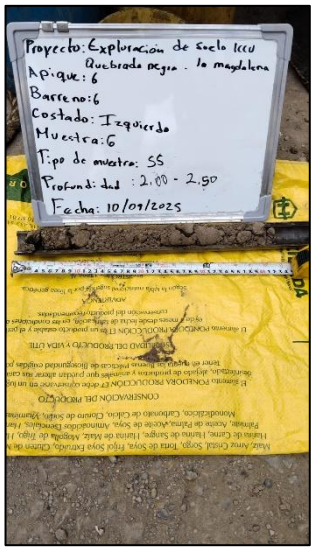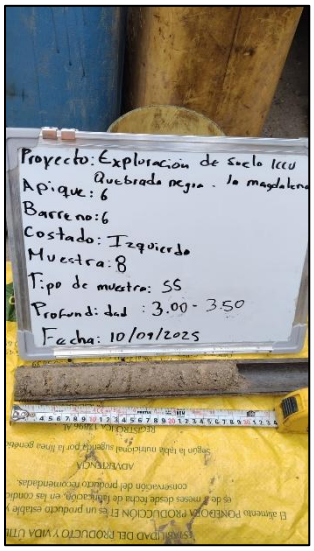Fotografía 4. Muestras extraídas Apique – barreno 6 Quebradanegra




- Con las muestras recuperadas en los trabajos de campo de geotecnia ya se comenzaron a realizar los ensayos de laboratorios correspondientes. A continuación, se muestra el avance para cada corredor, para un avance del 100.00% para los 3 tramos.

Tabla 3. Cantidad de perforación realizados.

| DESCRIPCION | MADRID (UND/ML) | Q NEGRA (UND/ML) | CÁQUEZA (UND/ML) |
|---|---|---|---|
| **Apiques** (incluye por unidad: elaboración, transporte) | **48**/NA | **21**/NA | **14**/NA |
| **Ensayos para pavimento Existente** (incluye por unidad: elaboración, transporte, 1 Extracción de núcleos pavimentos. | **40**/NA | **19**/NA | **7**/NA |
| Ensayo para la determinación de la condición del pavimento **PCI** | NA/**11.930 ML** | NA/**5.300 ML** | NA/**2000 ML** |
| Perforación Manual (incluye por unidad elaboración de **5m por punto**) | **48**/107,30 ML | **5**/22,30 ML | **11**/46,05 ML |
| Perforación Mecánica (incluye por unidad elaboración de **10m por punto**) | **0** | **19**/136,40 ML | **3**/16,90 ML |
| Perforación Mecánica (incluye por unidad elaboración de **30m por punto**) | **0** | **15**/307,50 ML | **0** |
| Línea de Refracción Sísmica | **4** | **11** | **3** |
| **AVANCE (%)** | **100** | **100** | **100** |

Tabla 4. Cantidad de ensayos realizados

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDADES EJECUTADAS | CANTIDADES EJECUTADAS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|---|
| | | MADRID | CÁQUEZA | QUEBRADA NEGRA |
| **Humedades** | UN | 150 | 84 | 285 |
| **Límites** | UN | 134 | 84 | 285 |
| **Granulometrías** | UN | 134 | 84 | 285 |
| **Materia Orgánica** | UN | 45 | 27 | 28 |
| **PDC** | UN | 43 | 14 | 11 |
| **CBR** | UN | 43 | 13 | 21 |
| **Compresión inconfinada en muestras de suelo. INV E-152-13.** | UN | 52 | 9 | 7 |
| **Peso unitario.** | UN | 0 | 10 | 49 |
| **Ensayo Proctor modificado INV E-142-13** | UN | 5 | - | 4 |
| **Compresión simple** | UN | - | - | 3 |
| **Carga puntual** | UN | - | - | 30 |
| **Corte directo** | UN | - | - | 27 |
| **Consolidación** | UN | - | - | 6 |
| | **TOTALES** | **606** | **325** | **1041** |
| | **AVANCE (%)** | **100** | **100** | **100** |

- Se terminan los trabajos de topografía en la vía desde el casco urbano de Cáqueza al sector Placitas, realizando las siguientes actividades instalación de mojones con su

georreferenciación correspondiente, nivelación geométrica y levantamiento topográfico a detalle, en este momento se están terminando las labores de oficina con la elaboración de los respectivos documentos.

Fotografía 5. Nivelación y contranivelación geométrica Cáqueza



Fuente: Consultoría.

Fotografía 6. Levantamiento topográfico Cáqueza




Fuente: Consultoría.

- Se terminan los trabajos de topografía en la vía desde el casco urbano de Madrid hasta la inspección Puente Piedra, realizando las siguientes actividades instalación de mojones con su georreferenciación correspondiente, nivelación geométrica y levantamiento topográfico a detalle.

Fotografía 7. Levantamiento topográfico Madrid comisión 1




Fuente: Consultoría.

Fotografía 8. Levantamiento topográfico Madrid comisión 2




Fuente: Consultoría.

- Se terminan los trabajos de topografía en la vía desde la inspección La Magdalena hasta el casco urbano del municipio de Quebradanegra, realizando las siguientes actividades instalación de mojones con su georreferenciación correspondiente, nivelación geométrica y levantamiento topográfico a detalle.

Fotografía 9. Levantamiento topográfico Quebradanegra



Fuente: Consultoría.

Fotografía 10. Levantamiento topográfico Quebradanegra



Fuente: Consultoría.

- La Consultoría continuará con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.

- Se efectuaron aforos vehiculares sobre el corredor Cáqueza, durante cinco (5) días consecutivos —del viernes 22 al martes 26 de agosto— con coberturas de 24 horas diarias.

- Se efectuaron aforos vehiculares en tres puntos de control sobre el corredor Madrid: Punto 1 (del 12 al 18 de agosto); Punto 2 (del 21 al 27 de agosto); y finalmente, Punto 3 (del 1 al 7 de septiembre), todos con coberturas de 24 horas diarias.

- Se efectuaron aforos vehiculares en dos puntos de control sobre el corredor de Quebradanegra del 21 al 26 de agosto y del 28 al 3 de septiembre, ambos con coberturas de 24 horas diarias.

- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se realizó el procesamiento de la información.

- En cuanto a las fuentes de materiales, se ejecutó la totalidad de los trabajos de campo previstos. Se recopila y consolida la información correspondiente a las fuentes de materiales localizadas en proximidad a los diferentes tramos del proyecto. Como resultado de estas actividades, se obtuvo información relevante relacionada con la ubicación, características y potencial de aprovechamiento de dichas fuentes de materiales.

- En relación con los reconocimientos efectuados, se realizaron actividades de inspección y verificación correspondientes a taludes y canteras; inspección visual de puentes, pontones y estructuras de contención; reconocimiento geológico de campo; recorridos para la identificación de construcciones potencialmente afectables, ocupaciones y edificaciones colindantes; así como la inspección de cauces, quebradas y ríos.

  Dichas actividades se desarrollaron en cada uno de los tramos del proyecto, con la participación de los profesionales y especialistas de las distintas disciplinas, y cuentan con el respectivo soporte técnico y documental, el cual se anexa al presente informe.

### 3.2 Informe semanal

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se anexan a este informe mensual de consultoría los informes semanales de interventoría correspondientes al período evaluado. Estos documentos reflejan el seguimiento periódico realizado al desarrollo y cumplimiento de las actividades propias del contrato de consultoría, de acuerdo con el alcance, cronograma y obligaciones establecidos. En ellos se consigna la verificación del avance de los productos, la revisión de los entregables, así como las observaciones técnicas y recomendaciones orientadas a garantizar la adecuada ejecución del contrato.

### 3.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

En el presente informe mensual de consultoría se presenta la relación del personal vinculado durante el periodo objeto de reporte, como parte del seguimiento administrativo del contrato y del control de las obligaciones asociadas a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. En informes mensuales anteriores se remitieron a la Interventoría las hojas de vida de los profesionales vinculados, mediante los comunicados No. 2025-493-ICU-1402, 2025-493-ICU-1661, 2025-493-ICU-1706 y 2025-493-ICU-2000. Considerando la dinámica propia de la ejecución contractual y la incorporación de personal adicional durante el periodo, se actualiza la información correspondiente e incorpora la tabla del Formato MS-GC-FR-013 "Herramienta Base Revisión Cálculo de Seguridad Social", debidamente diligenciada, como soporte del control realizado.

Tabla 5. Personal de Consultoría

| CARGO | PROFESIONAL |
|---|---|
| Director del proyecto | Santiago Páez |
| Especialista en pavimentos | Miguel Alfredo García Fajardo |
| Especialista en tránsito y transporte | Fabian Tafur Sánchez |
| Especialista en seguridad vial | Dayana Alexander Betancourt |
| Especialista en geotecnia | Luis Francisco Montes Buriticá |
| Especialista en diseño geométrico | Fabio Ernesto Villamil Páez |
| Especialista en BIM 1 | José Joaquín Cortes |
| Especialista en BIM 2 | Andrés Villamil |
| Especialista en estructuras 1 | Raúl Enrique Lozano Mora |
| Especialista en estructuras 2 | Jorge Iván Arias |
| Especialista ambiental | Milena García Pastor |
| Geólogo 1 | Justo Pastor Padilla Acosta |
| Geólogo 2 | Pedro Joaquín Perilla |
| Profesional gestor social 1 | Diana Milena Hurtado |
| Profesional gestor social 2 | Carolina Gómez |

| CARGO | PROFESIONAL |
|---|---|
| Profesional de costos y presupuestos | Jorge Iván Arias |
| Profesional de costos y presupuestos | Katherin Urrego Espejo |
| Ingeniero residente - apoyo consultoría | Daniel Steven León |
| Ingeniero residente - apoyo consultoría | Daniela Sofia Montes Rivera |
| Ingeniero residente - apoyo consultoría | José Emerson parra |
| Ingeniero residente - apoyo consultoría | Valentina Hoyos Soto |
| Ingeniero residente - apoyo consultoría | Manuela Pardo Miranda |
| Abogado | Leidy Morales |
| Dibujante | José Fernando Penagos Ángel |
| Dibujante | Juan Carlos Castilla Méndez |
| Dibujante | Carolina Guarín |
| Dibujante | Camila Serrano |
| Aforadores | Danilo Campo |
| Secretaria | Gloria Muñoz |
| Secretaria | Janeth Casallas |

Fuente: Elaboración Propia.

## 3.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato Consultoría

La forma de pago establecida contemplaba un anticipo, en donde el CONSORCIO CAMINOS IP tomó la decisión de desistir del mismo, A continuación, se relaciona la forma de pago.

Tabla 6. Distribución Actas de Pago Consultoría

| No. De Pago | Valor (IVA Incluido) | %Avance Contrato | Producto entregado y aprobado |
|---|---|---|---|
| Primer pago | $ 364.568.772,00 | 15% | PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO |
| Segundo pago | $ 364.568.772,00 | 15% | Ejecución del 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo |
| Tercer pago | **$ 486.091.695,00** | **20%** | Ejecución del restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo |
| Cuarto pago | $ 972.183.391,00 | 40% | El 40% de cada volumen se pagará en pagos parciales por volúmenes independientes una vez, entregado y aprobado cada volumen por la interventoría y la supervisión. |
| Quinto pago | $ 243.045.848,00 | 10% | Una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría |
| **Total** | **$ 2.430.458.478,00** | **100%** | |

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 7. Detalle Financiero Consultoría

| Descripción | Valor ($) | % |
|---|---|---|
| Valor del Contrato (IVA incluido): | $ 2.430.458.478,00 | 100,00% |
| Valor facturado: | $ 486.091.695,00 | 20,00% |
| Valor facturado pagado: | $ 0,00 | 0,00% |
| Saldo por facturar: | $ 1.215.229.239,00 | 50,00% |

| No. Pago | Concepto | Valor Facturado | Valor Acumulado | % Ejec. Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primer pago. | $ 364.568.772,00 | $ 364.568.772,00 | 15,00% |
| 2 | Segundo pago | $ 364.568.772,00 | $ 729.137.544,00 | 30,00% |
| | **Total** | **$ 0** | | |

Fuente: Elaboración Propia.

A la fecha del periodo de reporte se realiza el proceso de radicación del tercer pago correspondiente al Acta de Costos Consultoría No. 1_CAMINOS_IP por un valor de cuatrocientos ochenta y seis millones noventa un mil seiscientos noventa y cinco pesos ($ 486.091.695,00),

## 3.5 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se presentan las pólizas contractuales y las garantías asociadas al contrato de consultoría, las cuales respaldan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aseguran la vigencia y cobertura exigidas por la Entidad.

Tabla 8. Información Pólizas Consultoría

| **Póliza** | | **Amparo** | **Vigencia** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** | **Valor Asegurado** |
| Cumplimiento | 310 47 994000015 204 | Cumplimiento del contrato | 25/03/2025 | 30/06/2026 | $ 243.045.847.8 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 25/03/2025 | 31/12/2028 | $ 486.091.695,6 |
| | | Calidad del Servicio | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $ 729.137.543,4 |

Fuente: Elaboración Propia.

## 3.6 Seguimiento al Plan de Calidad

A continuación, se relacionan los indicadores de gestión del contrato.

Tabla 9. Indicadores de Calidad

| **Indicador** | **Fórmula** | **Periodicidad de medición** | **Resultado** | **Detalle** |
|---|---|---|---|---|
| Nivel de cumplimiento de obligaciones pactadas | (50 Obligaciones Cubiertas / Total 50 Obligaciones) x 100 | Mensual | 100% | Se considera en total 50 obligaciones teniendo en cuenta las 20 generales detalladas en clausula 9 del contrato y las 30 especificas detalladas en la cláusula 10. Con corte al 19 de septiembre de 2025 no se han presentado desviaciones en las |

| Indicador | Fórmula | Periodicidad de medición | Resultado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| | | | | obligaciones contractuales |
| Nivel de cumplimiento de los doce volúmenes pactados | (3 Volúmenes aprobados / Total Volúmenes al corte) x 100 | Incremental (Avance según cronograma) | 12.82% | En este sexto mes del contrato se avanza con el desarrollo de los volúmenes de cada una de las vías del lote 2. Se culminan los trabajos de campo de los diferentes volúmenes. |
| Valoración de la supervisión del contrato | Resultado encuesta de satisfacción | Trimestral | 0% | Esta medición se realiza de manera trimestral, se está a la espera de la valoración correspondiente. |
| Cumplimiento de ejecución presupuestal | Valor pagado / Valor programado | Mensual | 50% | En este sexto mes del contrato se realizaron los trámites para el Acta de Costos Consultoría No. 1_CAMINOS_IP por un valor de $1,215,229,239.00, en este momento se está proyectando el Acta de Costos Consultoría No.3 para presentación a la interventoría y entidad contratante. |
| Nivel de Cubrimiento del cronograma de actividades | (Actividades finalizadas al corte / Actividades vencidas al corte) x 1000 | Mensual | 100% | En este sexto mes del contrato se terminaron las actividades de campo para los componentes de estudio correspondientes y el procesamiento de la información. |

Fuente: Elaboración Propia.

### 3.6.1 Seguimiento Programa

Como parte del seguimiento a la programación del proyecto, se anexa al presente informe el cronograma general de ejecución, elaborado en Project. Dicho cronograma constituye la programación base del contrato e integra la secuencia y duración de las actividades previstas, sirviendo como referencia para el control y seguimiento del avance durante el desarrollo del proyecto. El cronograma de trabajo (pdf y mpp), corresponde a una tercera versión, toda vez

que, se recibieron observaciones por parte de la Interventoría por medio del comunicado CLM.287.25-007 del 16 de junio de 2025 y recomendaciones mediante el oficio No. CLM.287.25-012 del 15 de julio de 2025, con respuesta por parte del Consorcio Caminos IP mediante el comunicado 2025-493-ICU-2086 del 17 de julio en donde se entregaron los cronogramas actualizados para cada tramo de estudio, en este momento teniendo en cuenta las fechas de los trabajos de campo y las próximas entrega de los diferentes volúmenes de estudio y por solicitud de la interventoría en el comité del pasado 18 de septiembre se está proyectando una reprogramación de las fechas de entrega, el cual será enviado a la interventoría para su correspondiente revisión y aprobación.

# 4 Información contrato de interventoría

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 287 de 2025

Datos generales del Contrato

Tabla 10. Información Contrato Interventoría

| | |
|---|---|
| Tipo de Contrato: | Interventoría |
| Contrato: | ICCU – CTO 287 DE 2025 |
| Objeto: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CORREDORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1 INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA), LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS. |
| Contratista | Consorcio Litoral MC |
| NIT | 901.935.455-9 |
| Supervisor | LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ |

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución: | 8 meses y/o 31 de diciembre de 2025 |
| Fecha de inicio: | 21 de mayo de 2025 |
| Fecha de terminación: | 31 de diciembre de 2025 |
| Valor del contrato: | MIL VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 1.027.469.324,00) |

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 11. Personal de Interventoría

| CARGO | PROFESIONAL |
|---|---|
| DIRECTOR DE PROYECTO | Roberto Jurado |
| ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | Fredy Poveda |
| ESPECIALISTA DE TRÁNSITO | Giovanny Melo |
| ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL | Paola Ortiz |
| ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | José Rondón |
| ESPECIALISTA EN BIM | Milton Carabuena |
| ESPECIALISTA FORESTAL | Juan Mora |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | Alejandra Ramírez |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICA | Gherses León |
| ESPECIALISTA SOCIAL | Luisa Palma |
| INGENIERO DE APOYO 1 | Andrea Galeano |
| INGENIERO DE APOYO 2 | Juan León |
| PROFESIONAL CATASTRAL | Rolando Reyes |
| TOPOGRÁFICO | Jorge Rodríguez |
| SECRETARIA | María Paula Romero |

## 5 Conclusiones y recomendaciones

- Se terminaron los trabajos de campo relacionados con topografía, tránsito, geotecnia, pavimentos, ambiental y social, estructuras, hidráulica, gestión predial en los tres sectores de estudio
- El Consorcio Caminos IP ha realizado las actividades correspondientes, definidas en el cronograma, para realizar la consultoría de los sectores viales priorizados, se realizará una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se entregaron los volúmenes de componentes de tránsito, topografía, geología, geotecnia, taludes pavimentos, fuentes de materiales, gestión predial, ambiental y social.
- Se han entregado los estudios preliminares de topografía, trazado y diseño geométrico de los tres sectores.
- Se encuentra en proceso de elaboración el estudio de estructuras e hidráulica.

# 6 Anexos

## 6.1 Correspondencia

A continuación, se relacionan los comunicados recibidos por parte de la Interventoría.

Tabla 12. Comunicados Enviados

| FECHA | CONSECUTIVO | REMITENTE | DIRIGIDO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 2025-493-ICU-3397 | CONSORCIO CAMINOS IP | Alcaldía municipal de Cáqueza | Invitación Socialización estudios y diseños vía CAQUEZA - SECTOR PLACITAS |
| 22/10/2025 | 2025-493-ICU-3398 | CONSORCIO CAMINOS IP | Oficina Asesora de Planeación | Invitación Socialización estudios y diseños vía CAQUEZA - SECTOR PLACITAS |
| 22/10/2025 | 2025-493-ICU-3399 | CONSORCIO CAMINOS IP | Secretaría de Gobierno | Invitación Socialización estudios y diseños vía CAQUEZA - SECTOR PLACITAS |
| 22/10/2025 | 2025-493-ICU-3400 | CONSORCIO CAMINOS IP | Secretaría de Desarrollo Social y Económico | Invitación Socialización estudios y diseños vía CAQUEZA - SECTOR PLACITAS |
| 22/10/2025 | 2025-493-ICU-3401 | CONSORCIO CAMINOS IP | Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura | Invitación Socialización estudios y diseños vía CAQUEZA - SECTOR PLACITAS |
| 22/10/2025 | 2025-493-ICU-3407 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Entrega del Volumen I. Transporte Versión 2 - Cáqueza |
| 7/11/2025 | 2025-493-ICU-3593 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Entrega Volumen VI Estudio geotécnico y diseño de pavimento sector Madrid |
| 10/11/2025 | 2025-493-ICU-3689 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Entrega diseño geométrico preliminar de Quebrada Negra |
| 10/11/2025 | 2025-493-ICU-3688 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Entrega diseño geométrico preliminar de Madrid |
| 11/11/2025 | 2025-493-ICU-3603 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Solicitud de prórroga del plazo contractual – Contrato de Consultoría ICCU – CTO 258 de 2025 |

| FECHA | CONSECUTIVO | REMITENTE | DIRIGIDO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 2025-493-ICU-3728 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Entrega del Plan de Cargas – Contrato de Consultoría ICCU N° 258 de 2025. |
| 12/11/2025 | 2025-493-ICU-3736 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Entrega Volumen IV Fundaciones y Volumen V Taludes Madrid V1 |
| 13/11/2025 | 2025-493-ICU-3757 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Entrega del Volumen I. Transporte Versión 2 - Madrid y Quebradanegra |
| 14/11/2025 | 2025-493-ICU-3781 | CONSORCIO CAMINOS IP | Secretaría de Planeación | Invitación Socialización estudios y diseños vía MADRID- PUENTE PIEDRA |
| 14/11/2025 | 2025-493-ICU-3780 | CONSORCIO CAMINOS IP | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Invitación Socialización estudios y diseños vía MADRID- PUENTE PIEDRA |
| 14/11/2025 | 2025-493-ICU-3779 | CONSORCIO CAMINOS IP | Secretaría de Gobierno y Seguridad | Invitación Socialización estudios y diseños vía MADRID- PUENTE PIEDRA |
| 14/11/2025 | 2025-493-ICU-3778 | CONSORCIO CAMINOS IP | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Invitación Socialización estudios y diseños vía MADRID- PUENTE PIEDRA |
| 14/11/2025 | 2025-493-ICU-3777 | CONSORCIO CAMINOS IP | Secretaría de Hacienda | Invitación Socialización estudios y diseños vía MADRID- PUENTE PIEDRA |
| 14/11/2025 | 2025-493-ICU-3776 | CONSORCIO CAMINOS IP | Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente | Invitación Socialización estudios y diseños vía MADRID- PUENTE PIEDRA |
| 14/11/2025 | 2025-493-ICU-3775 | CONSORCIO CAMINOS IP | Alcalde Municipal | Invitación Socialización estudios y diseños vía MADRID- PUENTE PIEDRA |
| 14/11/2025 | 2025-493-ICU-3787 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Remisión de planillas de pago y ajuste de formato de parafiscales – Alcance a Oficio N.° 58 (2025-493-ICU-3782) y Acta N.° 2 |
| 14/11/2025 | 2025-493-ICU-3792 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Entrega del volumen VI - Estudio geotécnico y diseño de pavimentos- |

| FECHA | CONSECUTIVO | REMITENTE | DIRIGIDO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Versión 3 para la vía desde el Casco urbano de Cáqueza hasta el sector Placitas |
| 18/11/2025 | 2025-493-ICU-3795 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Entrega del Volumen III – Estudio de Geología Madrid |
| 18/11/2025 | 2025-493-ICU-3806 | CONSORCIO CAMINOS IP | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Entrega de documentos acta parcial No. 03 |

Tabla 13. Comunicados Recibidos

| FECHA | CONSECUTIVO | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Correo electrónico | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Envío formato y aprobación pagos al Sistema de Seguridad Social y Parafiscal |
| 28/09/2025 | Correo electrónico | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Alcance Tramite de Pago No. 1 - CC-258-2025 - Lote 2 |
| 28/10/2025 | Correo electrónico | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Solicitud aval diseño geométrico Cáqueza |
| 30/11/2025 | CLM.287.25-057 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Aval Volumen VII Estudio de fuentes de materiales Cáqueza |
| 30/11/2025 | CLM.287.25-058 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Observaciones Volumen IV Estudios de suelos para el diseño de fundaciones y otras estructuras de contención y Volumen V Estudio de estabilidad y estabilización de taludes Versión 1 Tramo: vía desde el casco urbano de Cáqueza al sector Placitas – Lote 2. |
| 31/11/2025 | CLM.287.25-059 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Solicitud Información del Proyecto de Plan Maestro de Alcantarillado en desarrollo para el municipio de Cáqueza |

| FECHA | CONSECUTIVO | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | CLM.287.25-060 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Respuesta entrega Informe Volumen III – Geología - Tramo La Magdalena – Quebradanegra. |
| 06/11/2025 | CLM.287.25-061 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Traslado documentos para el trámite de la cuenta No. 2 del Consultor Consorcio Caminos IP |
| 07/11/2025 | CLM.287.25-064 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Solicitud de las observaciones o la no objeción por parte de la entidad del diseño geométrico para el tramo de Cáqueza – Placitas, así como la selección de la Alternativa 1 o 2 por parte del ICCU. |
| 07/11/2025 | CLM.287.25-062 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Aval Volumen I – Estudio de Tránsito y Transporte Tramo Cáqueza – Placitas; Observaciones Volumen I – Estudios de Tránsito y Transporte Tramos Madrid-Puente Piedra y Quebradanegra-La Magdalena |
| 13/11/2025 | CLM.287.25-066 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Aval Volumen VII-Fuentes de Materiales del Tramo Madrid – Puente de Piedra del contrato de la referencia |
| 13/11/2025 | CLM.287.25-067 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | R Observaciones a la entrega preliminar del Componente Diseño Geométrico del Tramo Quebradanegra – La Magdalena. |
| 13/11/2025 | CLM.287.25-068 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Aval Metodología Gestión Predial |
| 14/11/2025 | CLM.287.25-070 | Consorcio Litoral MC - Interventoría | Consorcio Caminos IP | Observaciones al IV Estudios de suelos para el diseño de fundaciones y otras estructuras de contención y Volumen V Estudio de estabilidad y estabilización de taludes versión 1 vía desde el casco urbano de Madrid<br><br>hasta la inspección Puente Piedra. |

Fuente: Elaboración Propia.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante legal SANTIAGO PÁEZ TALERO, identificado con C.C. 79.339.188 de Bogotá del **CONSORCIO CAMINOS IP** identificado con NIT No. 901.661.497-0, certifico que la mencionada sociedad no ha tenido obligaciones laborales por concepto de pago de salarios y/o nómina de todos sus empleados, hasta la fecha.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los 18 días del mes de noviembre de 2025, con destino al Instituto de Concesiones de Cundinamarca, Contrato No. ICCU-CTO-258 DE 2025, cuyo objeto es ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CORREDORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **LOTE 2.** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CAQUEZA AL SECTOR PLACITAS.

Dado en Bogotá, a los 18 días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

**SANTIAGO PÁEZ TALERO**
Cc 79.339.188 de Bogotá
Representante legal
Consorcio CAMINOS IP

**DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS**

Yo, SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con el documento de identidad No. 79339188 expedida en Bogotá, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica CONSORCIO CAMINOS IP y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad Colombiana.
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.
3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
4. Autorizo a INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los dieciocho (18) días del mes de Noviembre, del año 2025, en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,



**SANTIAGO PAEZ TALERO**
C.C 79339188 de Bogotá
Representante legal
Nit. 901.917.475-5

Bogotá D.C., Noviembre 18 de 2025

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

**(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **SANTIAGO PÁEZ TALERO**, identificado con C.C. No. 79.339.188 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A.**, identificada con Nit **800.097.991 - 2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **MONICA PATRICIA BULLA MILA**, identificado con C.C. No. 52.736.283 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 122106-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, de **INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A.**, identificada con Nit **800.097.991 - 2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá,** me permito auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**SANTIAGO PÁEZ TALERO**
Representante Legal
**INCOPLAN S.A.**
C.C. No. 79.339.188 de Bogotá

**MONICA PATRICIA BULLA**
C.C. 52.736.283 de Bogotá
T.P. 122106 – T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B262E01E63286E04

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA PATRICIA BULLA MILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52736283 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122106-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**122106-T**



MONICA PATRICIA
BULLA MILA
C.C. 52736283
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132054

FIRMA DEL TITULAR 42363

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52736283
BULLA MILA
APELLIDOS
MONICA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 08-SEP-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
28-SEP-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-1500115-47096661-F-0052736283-20020302
05582 02060B 02 101504745

**DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS**

Yo, SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con el documento de identidad No. 79339188 expedida en Bogotá, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION SA – INCOPLAN SA y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad Colombiana.
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.
3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
4. Autorizo a INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los dicieocho (18) días del mes de Noviembre, del año 2025, en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,



**SANTIAGO PAEZ TALERO**
C.C 79339188 de Bogotá
Representante legal
Nit. 800.097.991-7

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

**(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **LUIS FRANCISCO MONTES**, identificado con C.C. No. 17.416.594 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS**., identificada con **NIT 900.135.636-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789
de 2002.

Yo **MAGDALENA MOLINA GÓMEZ**, identificado con C.C. No 37.245.305 de CUCUTA y con Tarjeta Profesional No. 66223-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Publica de **PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS**., identificada con **NIT 900.135.636-9**, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Pavimentos y Geotecnia S.AS , no está obligada a tener **REVISOR FISCAL**

Se expide en Bogotá, a los 18 días del mes de noviembre 2025

**LUIS FRANCISCO MONTES B**
Representante Legal
**PAVIMENTOS Y GEOTECNIA S.A.S**
900.135.636-9

## DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

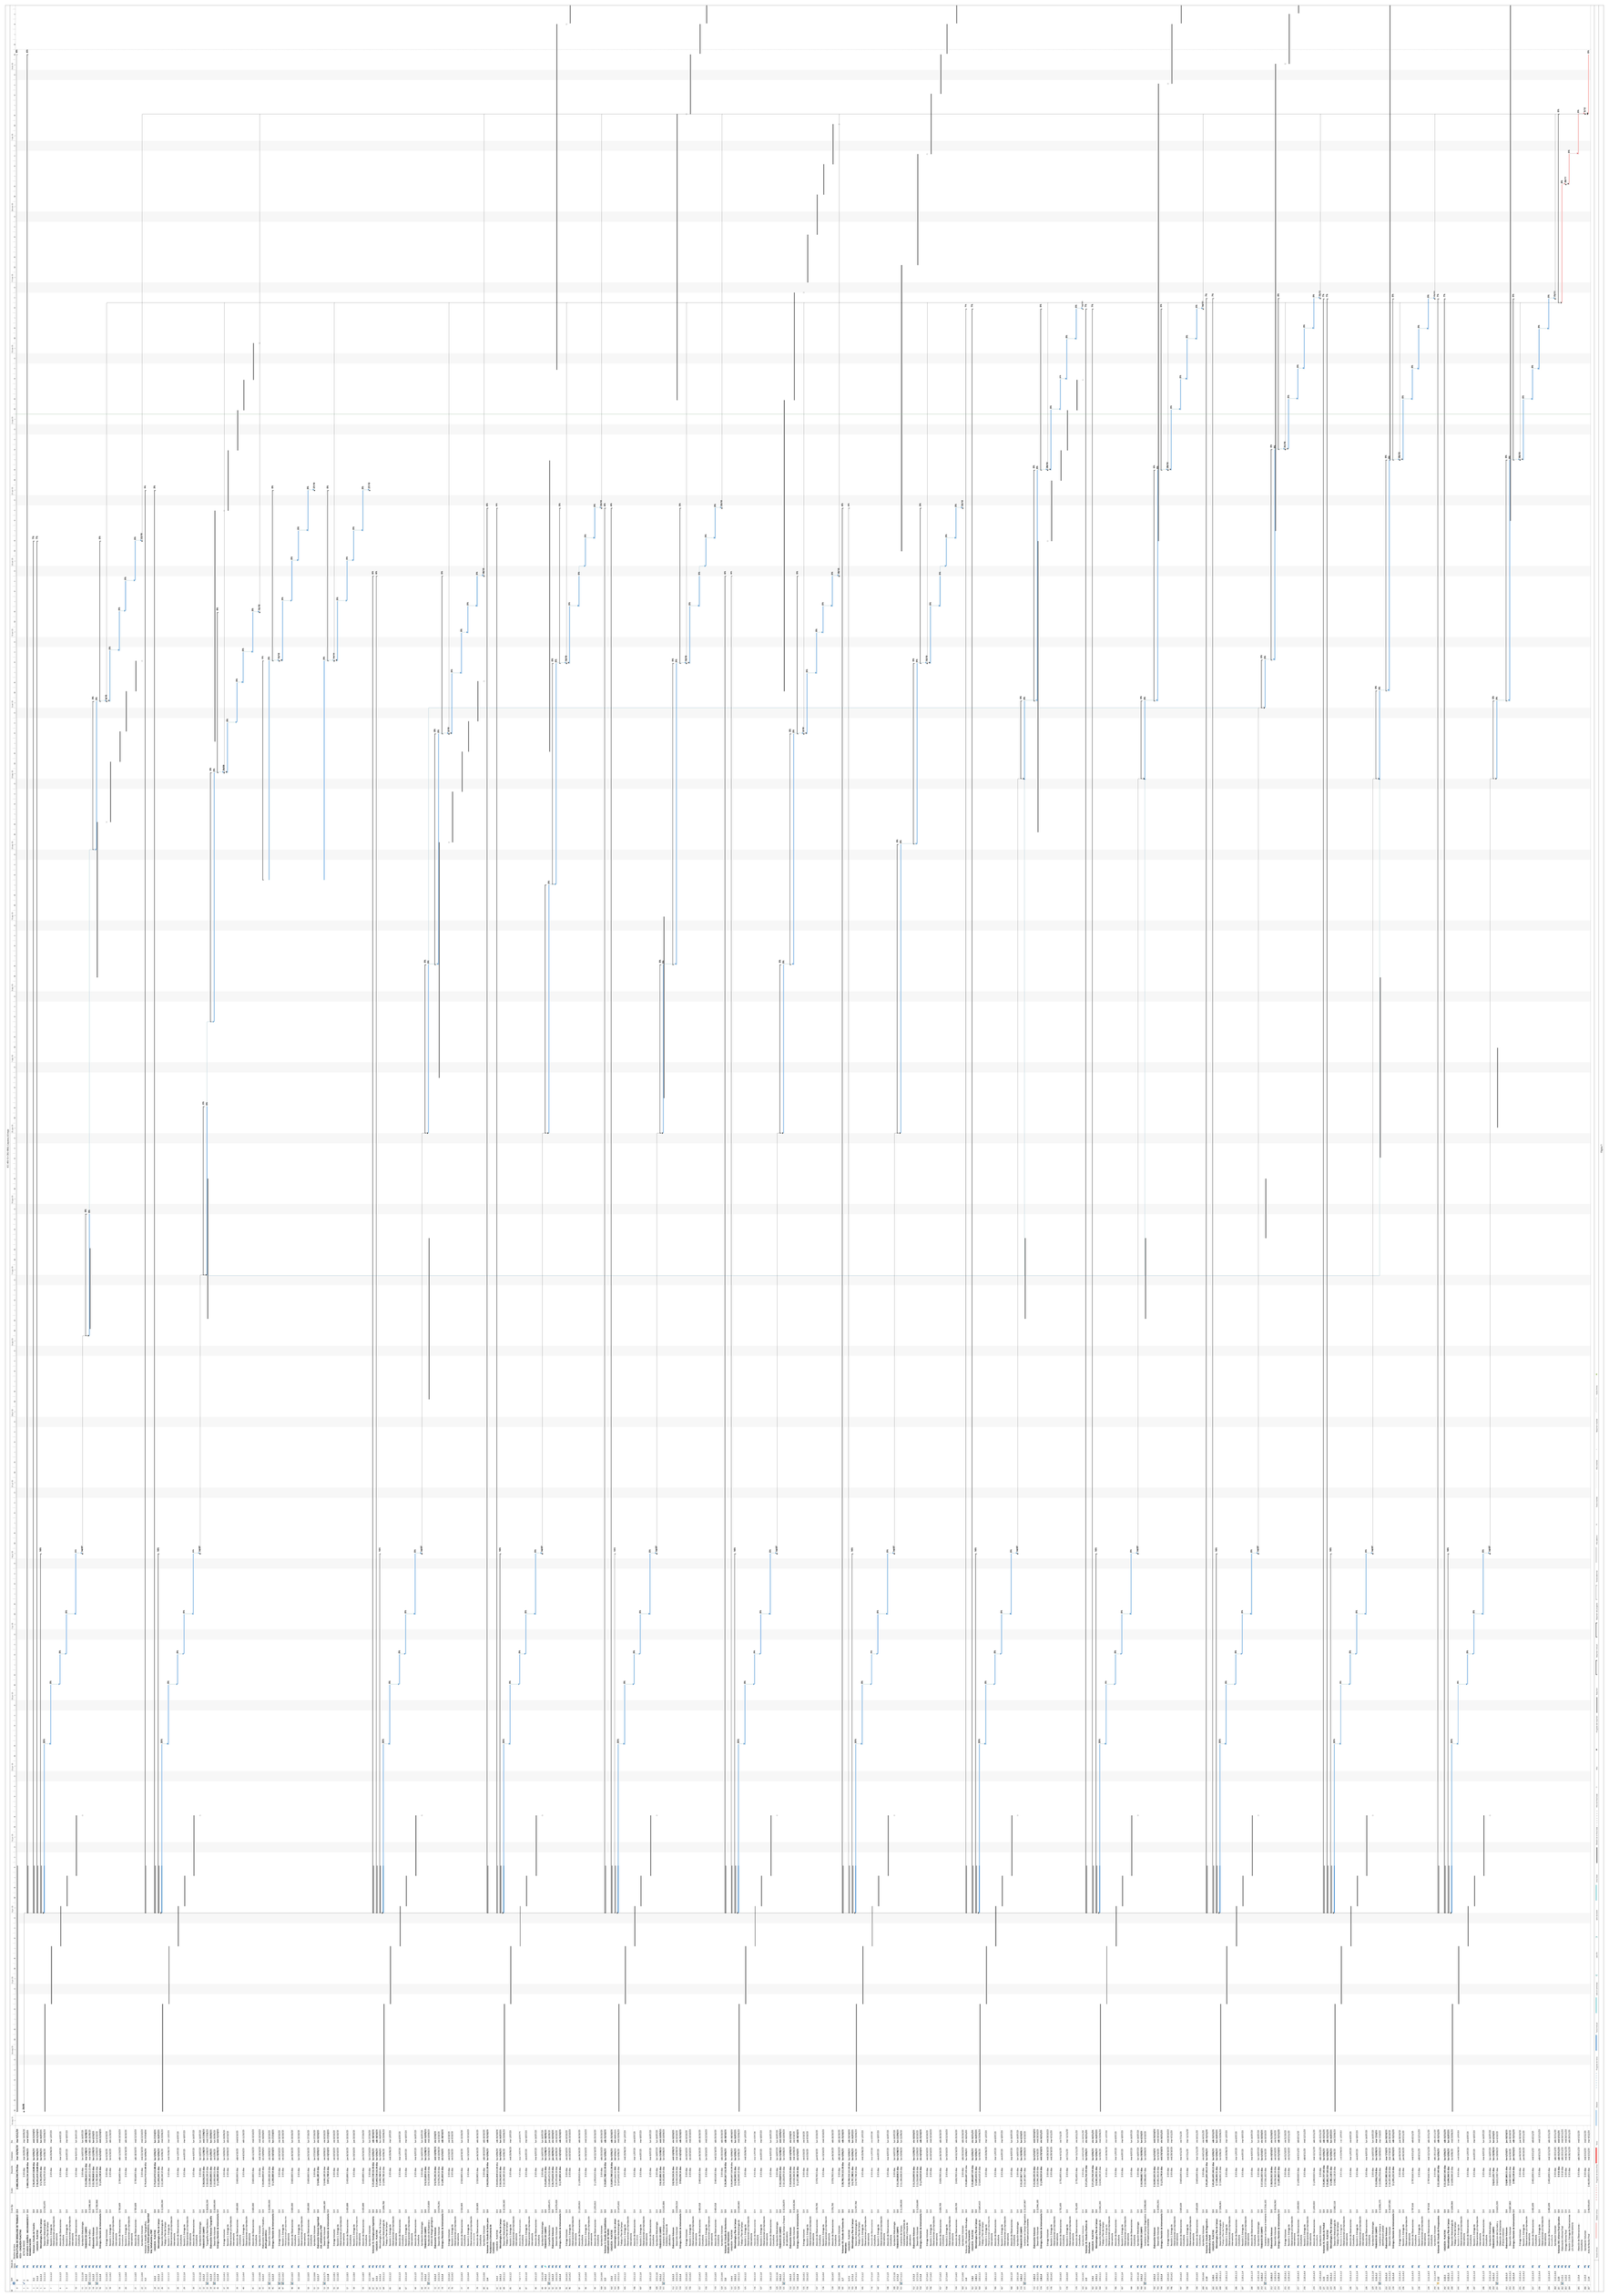
Yo, **LUIS FRANCISCO MONTES**, identificado con C.C. No. 17.416.594 de Bogotá, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica **PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS** y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

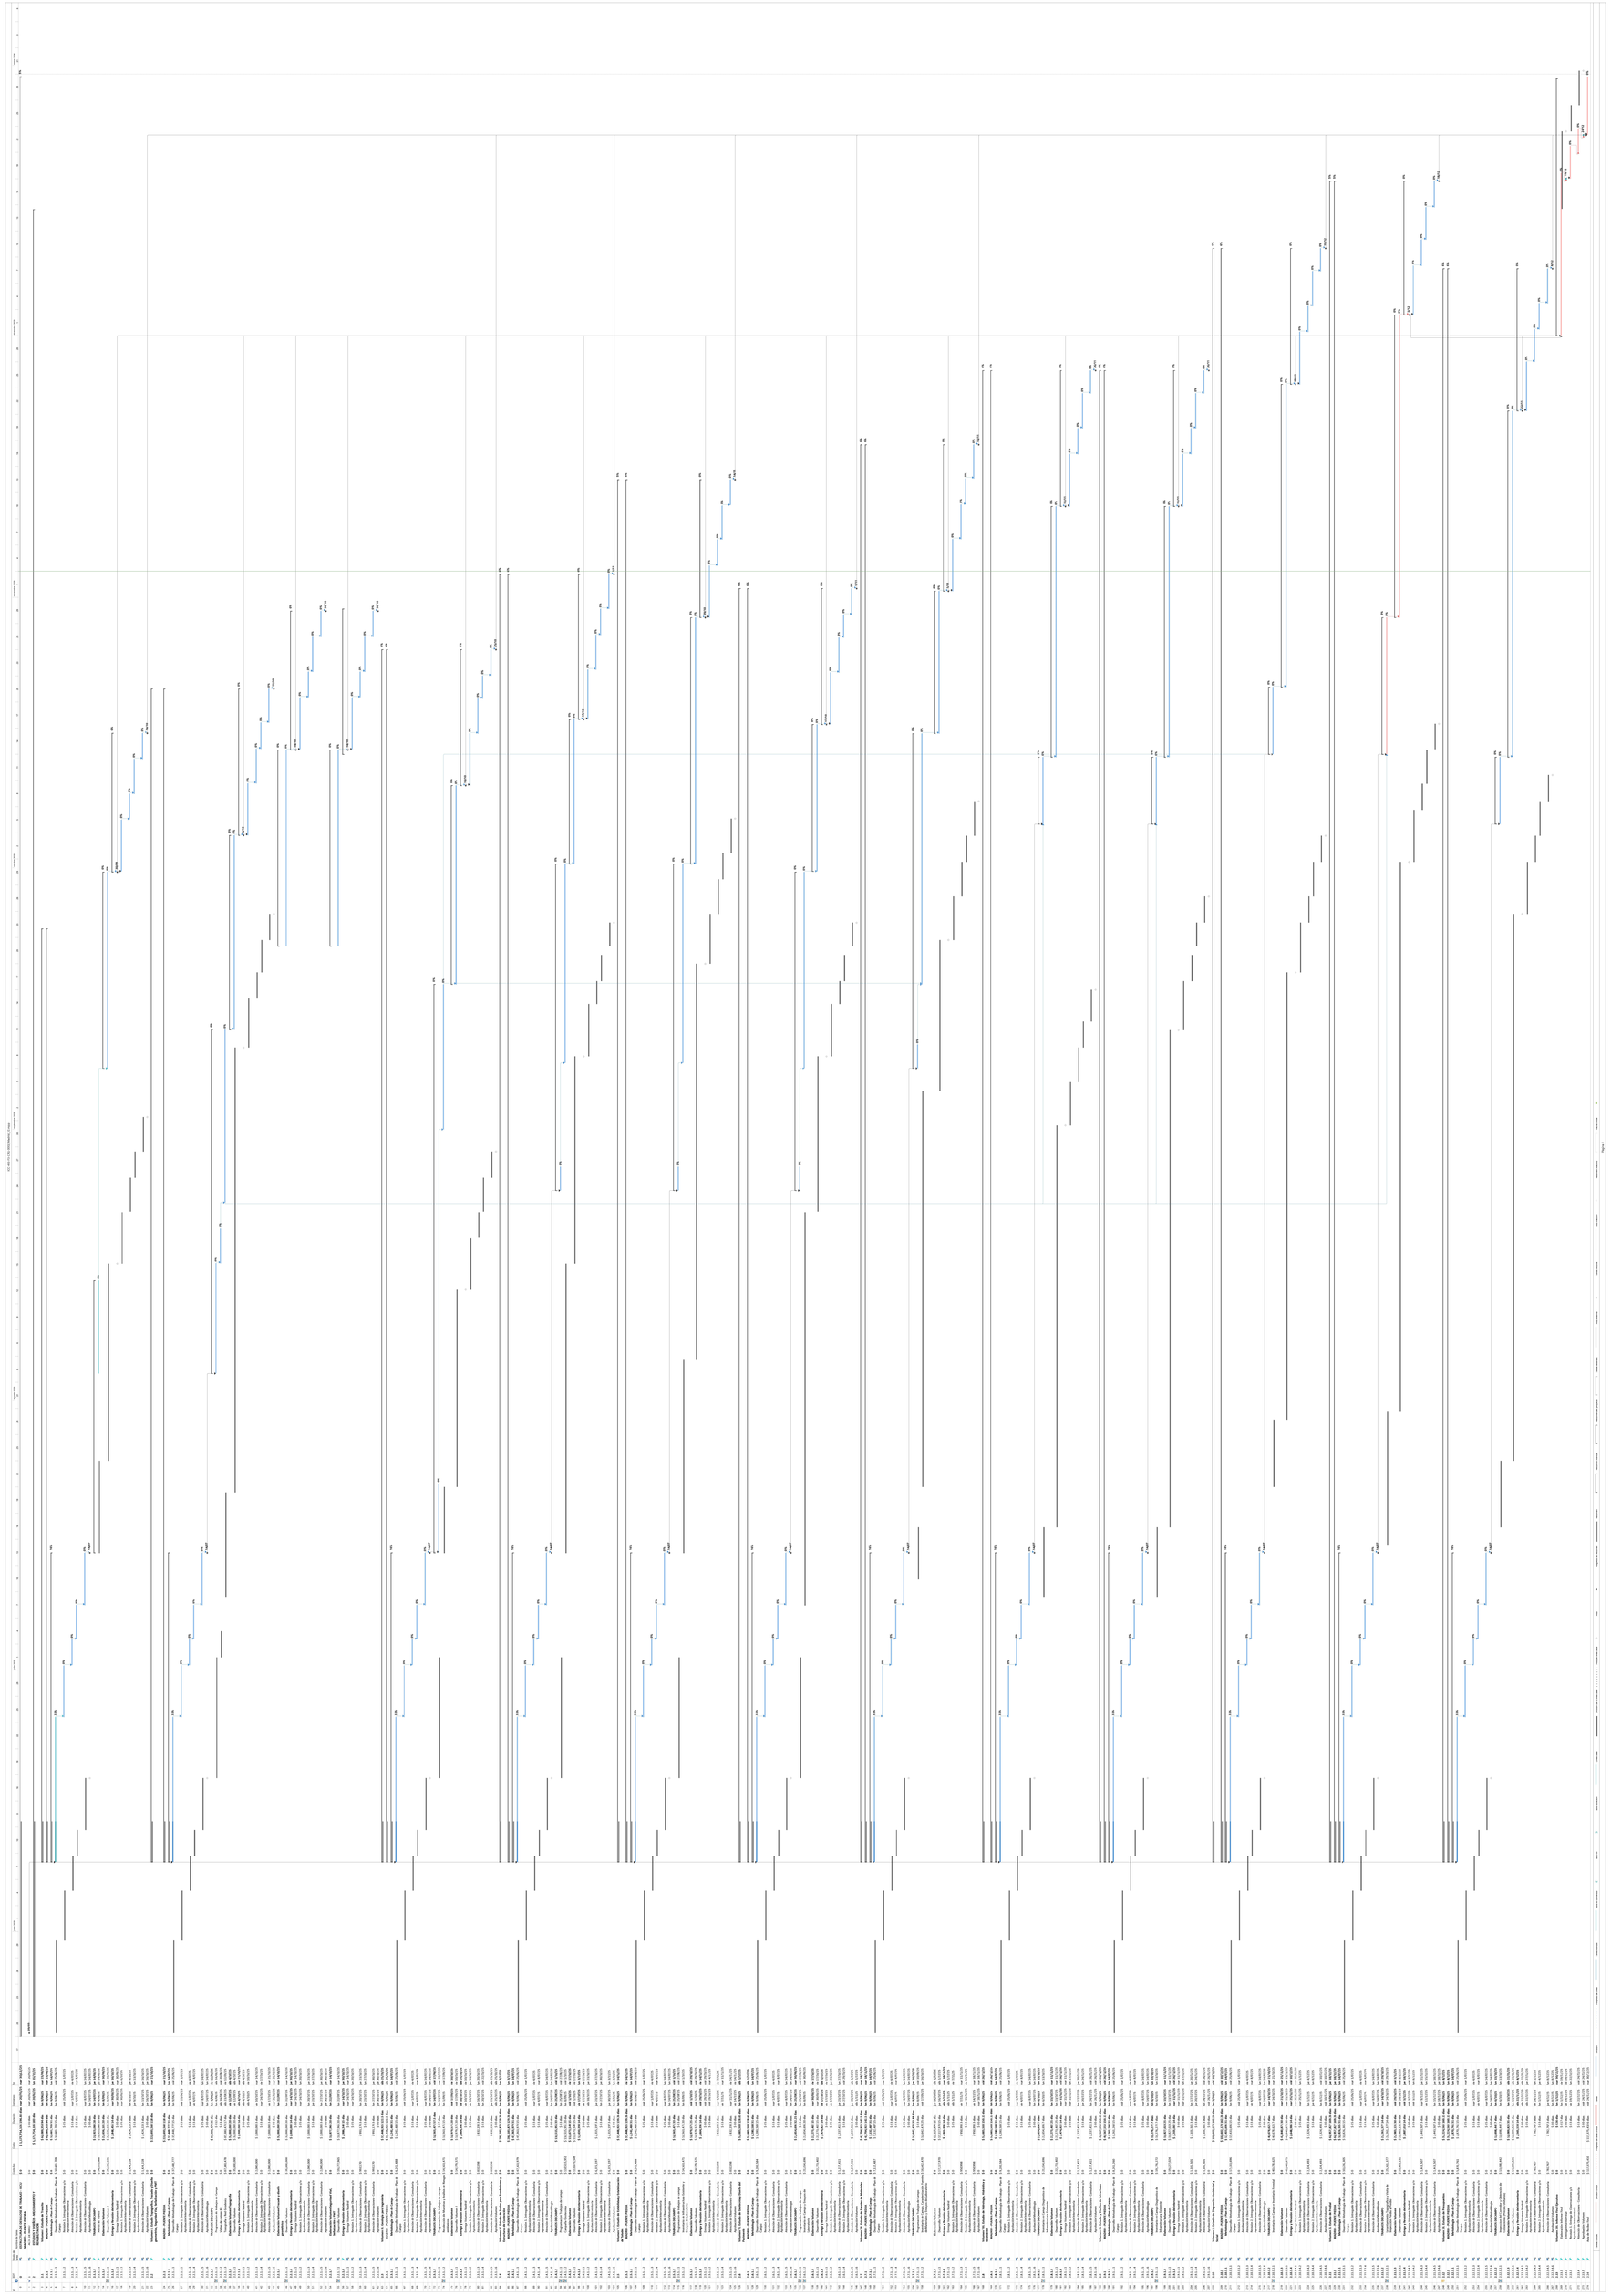
1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana.
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.
3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
4. Autorizo a INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que
declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los Dieciocho (18 ) días del mes de noviembre, del año 2025, en la ciudad de Bogotá.
Atentamente,

**LUIS FRANCISCO MONTES B**
Representante Legal
**PAVIMENTOS Y GEOTECNIA S.A.S**
900.135.636-9





| # | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | **ETAPA 1 - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA TERRACE VIEWS - MAGDALENA - QUETZALTENANGO** | **$ 0** | **1 día** | **mar 30/09/25** | **mar 30/09/25** | | |
| 1 | 1 | | **ESTUDIOS Y DISEÑOS - MAGDALENA - QUETZALTENANGO** | **$ 779,347,837.19** | **1,585.5 días** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 2 | 2.1 | | **Volumen 1: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **1,585.5 días** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 3 | 2.1.1 | | **Metodología y Plan de Campo - MAGDALENA - QUETZALTENANGO** | **$ 0** | **1,585.5 días** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 4 | 2.1.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | $ 0 | $ 6,096,574 | $ 6,096,574 días | lun 9/06/25 | mié 25/06/25 | |
| 5 | 2.1.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 25/06/25 | mié 25/06/25 | 4 | |
| 6 | 2.1.1.3 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | mar 1/07/25 | mar 1/07/25 | 5 | |
| 7 | 2.1.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | vie 4/07/25 | vie 4/07/25 | 6 | |
| 8 | 2.1.1.5 | | Atención de Observaciones - Consultor | $ 0 | $ 0 días | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 7 | |
| 9 | 2.1.1.6 | | Aprobación Metodología | $ 0 | $ 0 días | lun 14/07/25 | lun 14/07/25 | 8 | |
| 10 | 2.1.2 | | **TRABAJOS DE CAMPO** | **$ 0** | **$ 2,214,474** | **lun 15/09/25** | **lun 15/09/25** | 9 | |
| 11 | 2.1.2.1 | | **Ejecución Volumen 1** | **$ 1,621,238** | **$ 1,621,238** | **lun 15/09/25** | **mar 16/09/25** | | |
| 12 | 2.1.2.2 | | **Entrega y Revisión de Información** | **$ 0** | **$ 0** | **mié 17/09/25** | **mié 17/09/25** | 11 | |
| 13 | 2.1.3 | | **Volumen 2: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 0** | **mié 17/09/25** | **mié 17/09/25** | 12 | |
| 14 | 2.1.3.1 | | Entrega Volumen | $ 0 | $ 0 días | vie 3/10/25 | vie 3/10/25 | 13 | |
| 15 | 2.1.3.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | vie 10/10/25 | vie 10/10/25 | 14 | |
| 16 | 2.2 | | **Volumen 3: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 0** | **lun 20/10/25** | **lun 20/10/25** | 15 | |
| 17 | 2.2.1 | | **Metodología y Plan de Campo - MAGDALENA - QUETZALTENANGO** | **$ 0** | **$ 312,850** | **lun 20/10/25** | **lun 20/10/25** | 16 | |
| 18 | 2.2.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | $ 0 | $ 312,850 días | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 | 17 | |
| 19 | 2.2.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 18 | |
| 20 | 2.2.1.3 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 312,850 días | mar 4/11/25 | jue 20/11/25 | 19 | |
| 21 | 2.2.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | jue 20/11/25 | jue 20/11/25 | 20 | |
| 22 | 2.2.1.5 | | Aprobación Volumen | $ 0 | $ 0 días | sáb 29/11/25 | sáb 29/11/25 | 21 | |
| 23 | 2.2.2 | | **TRABAJOS DE CAMPO - MAGDALENA - QUETZALTENANGO** | **$ 0** | **$ 132,134,717.13** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 24 | 2.2.2.1 | | **Metodología y Plan de Campo - MAGDALENA - QUETZALTENANGO** | **$ 0** | **$ 132,134,717.13** | **$ 0 días** | **lun 9/06/25** | | |
| 25 | 2.2.2.2 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | $ 20,206,413 | $ 20,206,413 días | lun 9/06/25 | mié 2/07/25 | | |
| 26 | 2.2.2.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 2/07/25 | mié 2/07/25 | 25 | |
| 27 | 2.2.2.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 26 | |
| 28 | 2.2.2.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mar 15/07/25 | mar 15/07/25 | 27 | |
| 29 | 2.2.2.6 | | Aprobación Metodología | $ 0 | $ 0 días | mar 22/07/25 | mar 22/07/25 | 28 | |
| 30 | 2.2.2.7 | | **TRABAJOS DE CAMPO** | **$ 0** | **$ 47,148,280.17** | **lun 1/09/25** | **lun 1/09/25** | 29 | |
| 31 | 2.2.2.8 | | **Ejecución Volumen Topografía** | **$ 47,148,280** | **$ 47,148,280.17** | **lun 1/09/25** | **vie 12/09/25** | 30 | |
| 32 | 2.2.3 | | **Volumen 4: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 20,000,000.17** | **mié 17/09/25** | **mié 17/09/25** | 31 | |
| 33 | 2.2.3.1 | | Desarrollo Volumen | $ 20,000,000 | $ 20,000,000.17 días | vie 19/09/25 | vie 19/09/25 | 32 | |
| 34 | 2.2.3.2 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 0** | **$ 0 días** | **vie 19/09/25** | **vie 19/09/25** | 33 | |
| 35 | 2.2.3.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | lun 22/09/25 | lun 22/09/25 | 34 | |
| 36 | 2.2.3.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | mar 23/09/25 | mar 23/09/25 | 35 | |
| 37 | 2.2.3.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 24/09/25 | mié 24/09/25 | 36 | |
| 38 | 2.2.3.6 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | $ 0 | $ 0 días | jue 25/09/25 | jue 25/09/25 | 37 | |
| 39 | 2.2.4 | | **Volumen 5: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 1,000,000** | **mié 24/09/25** | **mié 24/09/25** | 38 | |
| 40 | 2.2.4.1 | | Desarrollo Volumen | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 días | mié 24/09/25 | sáb 18/10/25 | 39 | |
| 41 | 2.2.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 22/10/25 | mié 22/10/25 | 40 | |
| 42 | 2.2.4.3 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | jue 23/10/25 | jue 23/10/25 | 41 | |
| 43 | 2.2.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 | 42 | |
| 44 | 2.2.4.5 | | Aprobación Volumen | $ 0 | $ 0 días | sáb 25/10/25 | sáb 25/10/25 | 43 | |
| 45 | 2.2.5 | | **Volumen 6: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 20,000,000** | **mié 24/09/25** | **mié 24/09/25** | 44 | |
| 46 | 2.2.5.1 | | Desarrollo Volumen | $ 20,000,000 | $ 20,000,000 días | mié 24/09/25 | sáb 18/10/25 | 45 | |
| 47 | 2.2.5.2 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 0** | **$ 0 días** | **mié 22/10/25** | **mié 22/10/25** | 46 | |
| 48 | 2.2.5.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | jue 23/10/25 | jue 23/10/25 | 47 | |
| 49 | 2.2.5.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 | 48 | |
| 50 | 2.2.5.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | sáb 25/10/25 | sáb 25/10/25 | 49 | |
| 51 | 2.2.5.6 | | Aprobación Volumen | $ 0 | $ 0 días | dom 26/10/25 | dom 26/10/25 | 50 | |
| 52 | 2.2.6 | | **Volumen 7: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 8,000,000** | **mié 24/09/25** | **mié 24/09/25** | 51 | |
| 53 | 2.2.6.1 | | Desarrollo Volumen | $ 8,000,000 | $ 8,000,000 días | mié 24/09/25 | lun 13/10/25 | 52 | |
| 54 | 2.2.6.2 | | **Ejecución Volumen Soporteó de Vol. Subsidiario y Pdf** | **$ 0** | **$ 0 días** | **mié 15/10/25** | **mié 15/10/25** | 53 | |
| 55 | 2.2.7 | | **Entrega y Revisión de Información** | **$ 691,486** | **$ 691,486** | **lun 29/09/25** | **mar 21/10/25** | | |
| 56 | 2.2.8 | | **Volumen 8: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 1,588,384.14** | **mié 17/09/25** | **mié 17/09/25** | 54 | |
| 57 | 2.2.8.1 | | Desarrollo Volumen | $ 0 | $ 0 días | mié 17/09/25 | mié 17/09/25 | 55 | |
| 58 | 2.2.8.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 17/09/25 | mié 17/09/25 | 57 | |
| 59 | 2.2.8.3 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 694,194 | $ 694,194 días | jue 18/09/25 | jue 2/10/25 | 58 | |
| 60 | 2.2.8.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 694,194 | $ 694,194 días | vie 3/10/25 | vie 17/10/25 | 59 | |
| 61 | 2.2.8.5 | | Atención de Observaciones - Consultor | $ 694,194 | $ 694,194 días | sáb 18/10/25 | sáb 1/11/25 | 60 | |
| 62 | 2.2.8.6 | | Aprobación Volumen | $ 0 | $ 0 días | dom 2/11/25 | dom 2/11/25 | 61 | |
| 63 | 2.3 | | **Volumen 9: Ensayos para Ingeniería** | **$ 0** | **$ 27,303,182.26** | **$ 0 días** | **lun 9/06/25** | | |
| 64 | 2.3.1 | | **MAGDALENA - QUETZALTENANGO** | **$ 0** | **$ 27,303,182.26** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 65 | 2.3.1.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | **$ 4,560,533** | **$ 4,560,533.31** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 66 | 2.3.1.2 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | $ 4,560,533 | $ 4,560,533 días | lun 9/06/25 | mié 25/06/25 | 4 | |
| 67 | 2.3.1.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 25/06/25 | mié 25/06/25 | 66 | |
| 68 | 2.3.1.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | mar 1/07/25 | mar 1/07/25 | 67 | |
| 69 | 2.3.1.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 2/07/25 | mié 2/07/25 | 68 | |
| 70 | 2.3.1.6 | | Aprobación Metodología | $ 0 | $ 0 días | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 69 | |
| 71 | 2.3.1.7 | | **Ejecución Volumen** | **$ 0** | **$ 0 días** | **lun 14/07/25** | **lun 14/07/25** | 70 | |
| 72 | 2.3.2 | | **Volumen 1: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 22,742,649.95** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 73 | 2.3.2.1 | | Desarrollo Volumen | $ 22,742,649 | $ 22,742,649.95 días | lun 9/06/25 | mié 3/09/25 | | |
| 74 | 2.3.2.2 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 0** | **$ 0 días** | **mié 3/09/25** | **mié 3/09/25** | 73 | |
| 75 | 2.3.2.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 3/09/25 | mié 3/09/25 | 74 | |
| 76 | 2.3.2.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | jue 4/09/25 | jue 4/09/25 | 75 | |
| 77 | 2.3.2.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | vie 5/09/25 | vie 5/09/25 | 76 | |
| 78 | 2.3.2.6 | | Aprobación Metodología | $ 0 | $ 0 días | sáb 6/09/25 | sáb 6/09/25 | 77 | |
| 79 | 2.3.2.7 | | **TRABAJOS DE CAMPO** | **$ 0** | **$ 22,742,649.95** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 80 | 2.3.2.8 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 22,742,650** | **$ 22,742,649.95** | **lun 9/06/25** | **mié 3/09/25** | | |
| 81 | 2.4 | | **Volumen 2: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 331,865,594.46** | **$ 0 días** | **lun 9/06/25** | | |
| 82 | 2.4.1 | | **MAGDALENA - QUETZALTENANGO** | **$ 0** | **$ 331,865,594.46** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 83 | 2.4.1.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | **$ 58,164,225** | **$ 58,164,225.51** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 84 | 2.4.1.2 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | $ 58,164,225 | $ 58,164,225.51 días | lun 9/06/25 | mié 25/06/25 | 4 | |
| 85 | 2.4.1.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 25/06/25 | mié 25/06/25 | 84 | |
| 86 | 2.4.1.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | mar 1/07/25 | mar 1/07/25 | 85 | |
| 87 | 2.4.1.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 2/07/25 | mié 2/07/25 | 86 | |
| 88 | 2.4.1.6 | | Aprobación Metodología | $ 0 | $ 0 días | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 87 | |
| 89 | 2.4.1.7 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 0** | **$ 0 días** | **mar 8/07/25** | **mar 8/07/25** | 88 | |
| 90 | 2.4.2 | | **TRABAJOS DE CAMPO** | **$ 0** | **$ 58,164,119.49** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 91 | 2.4.2.1 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 58,164,119** | **$ 58,164,119.49** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 92 | 2.4.3 | | **Volumen 3: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 67,722,134** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 93 | 2.4.3.1 | | Desarrollo Volumen | $ 67,722,134 | $ 67,722,134 días | lun 9/06/25 | mié 25/06/25 | | |
| 94 | 2.4.3.2 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 0** | **$ 0 días** | **mié 25/06/25** | **mié 25/06/25** | 93 | |
| 95 | 2.4.3.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 25/06/25 | mié 25/06/25 | 94 | |
| 96 | 2.4.3.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | jue 26/06/25 | jue 26/06/25 | 95 | |
| 97 | 2.4.3.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | vie 27/06/25 | vie 27/06/25 | 96 | |
| 98 | 2.4.3.6 | | Aprobación Volumen | $ 0 | $ 0 días | sáb 28/06/25 | sáb 28/06/25 | 97 | |
| 99 | 2.4.4 | | **Volumen 4: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 67,722,134** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 100 | 2.4.4.1 | | Desarrollo Volumen | $ 67,722,134 | $ 67,722,134 días | lun 9/06/25 | mié 25/06/25 | | |
| 101 | 2.4.4.2 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 0** | **$ 0 días** | **mié 25/06/25** | **mié 25/06/25** | 100 | |
| 102 | 2.4.4.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 25/06/25 | mié 25/06/25 | 101 | |
| 103 | 2.4.4.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | jue 26/06/25 | jue 26/06/25 | 102 | |
| 104 | 2.4.4.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | vie 27/06/25 | vie 27/06/25 | 103 | |
| 105 | 2.4.4.6 | | Aprobación Volumen | $ 0 | $ 0 días | sáb 28/06/25 | sáb 28/06/25 | 104 | |
| 106 | 2.5 | | **Volumen 5: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 67,722,134** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 107 | 2.5.1 | | **MAGDALENA - QUETZALTENANGO** | **$ 0** | **$ 67,722,134** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 108 | 2.5.1.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | **$ 11,286,598** | **$ 11,286,598.91** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 109 | 2.5.1.2 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | $ 11,286,598 | $ 11,286,598.91 días | lun 9/06/25 | lun 23/06/25 | 4 | |
| 110 | 2.5.1.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | lun 23/06/25 | lun 23/06/25 | 109 | |
| 111 | 2.5.1.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | mar 24/06/25 | mar 24/06/25 | 110 | |
| 112 | 2.5.1.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 25/06/25 | mié 25/06/25 | 111 | |
| 113 | 2.5.1.6 | | Aprobación Metodología | $ 0 | $ 0 días | jue 26/06/25 | jue 26/06/25 | 112 | |
| 114 | 2.5.1.7 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 0** | **$ 0 días** | **jue 26/06/25** | **jue 26/06/25** | 113 | |
| 115 | 2.5.2 | | **TRABAJOS DE CAMPO** | **$ 0** | **$ 56,436,535.19** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 116 | 2.5.2.1 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 56,436,535** | **$ 56,436,535.19** | **lun 9/06/25** | **mié 3/09/25** | | |
| 117 | 2.5.3 | | **Volumen 6: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 67,722,134** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 118 | 2.5.3.1 | | Desarrollo Volumen | $ 67,722,134 | $ 67,722,134 días | lun 9/06/25 | mié 25/06/25 | | |
| 119 | 2.5.3.2 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 0** | **$ 0 días** | **mié 25/06/25** | **mié 25/06/25** | 118 | |
| 120 | 2.5.3.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 25/06/25 | mié 25/06/25 | 119 | |
| 121 | 2.5.3.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | jue 26/06/25 | jue 26/06/25 | 120 | |
| 122 | 2.5.3.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | vie 27/06/25 | vie 27/06/25 | 121 | |
| 123 | 2.5.3.6 | | Aprobación Volumen | $ 0 | $ 0 días | sáb 28/06/25 | sáb 28/06/25 | 122 | |
| 124 | 2.6 | | **Volumen 7: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 67,722,134** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 125 | 2.6.1 | | **MAGDALENA - QUETZALTENANGO** | **$ 0** | **$ 67,722,134** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 126 | 2.6.1.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | **$ 5,539,406** | **$ 5,539,406.51** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 127 | 2.6.1.2 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | $ 5,539,406 | $ 5,539,406 días | lun 9/06/25 | mié 25/06/25 | 4 | |
| 128 | 2.6.1.3 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 25/06/25 | mié 25/06/25 | 127 | |
| 129 | 2.6.1.4 | | Atención de Observaciones - Inventario | $ 0 | $ 0 días | mar 1/07/25 | mar 1/07/25 | 128 | |
| 130 | 2.6.1.5 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación | $ 0 | $ 0 días | mié 2/07/25 | mié 2/07/25 | 129 | |
| 131 | 2.6.1.6 | | Aprobación Metodología | $ 0 | $ 0 días | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 130 | |
| 132 | 2.6.1.7 | | **TRABAJOS DE CAMPO** | **$ 11,084,613** | **$ 11,084,613.33** | **lun 15/09/25** | **lun 15/09/25** | | |
| 133 | 2.6.1.8 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 11,084,613** | **$ 11,084,613.33** | **lun 15/09/25** | **mié 17/09/25** | | |
| 134 | 2.6.2 | | **Volumen 8: Estudio de Suelos para Cimentación - Quetzaltenango** | **$ 0** | **$ 67,722,134** | **lun 9/06/25** | **lun 9/06/25** | | |
| 135 | 2.6.2.1 | | Desarrollo Volumen | $ 67,722,134 | $ 67,722,134 días | lun 9/06/25 | mié 25/06/25 | | |
| 136 | 2.6.2.2 | | **Ejecución Volumen Intermedio** | **$ 0** | **$ 0 días** | **mié 25/06/25** | **mié 25/06/25** | 135 | |

| | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Costo fijo | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2.6.1.4.2 | | Observaciones de Aprobación | | | 5 días | mié 15/10/25 | mié 22/10/25 | | |
| 137 | 2.6.1.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Interventoría | | $ 480,821 | | | | | |
| 138 | 2.6.1.4.4 | | Revisión 3 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 139 | 2.6.1.4.5 | | Aprobación Observaciones - Consultor | | $ 480,821 | | | | | |
| 140 | 2.6.1.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 141 | 2.7 | | **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | | $ 0 | | | | | |
| 142 | 2.7.1 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 143 | 2.7.1.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 144 | 2.7.1.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 145 | 2.7.1.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 146 | 2.7.1.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 147 | 2.7.1.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 148 | 2.7.1.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 149 | 2.7.1.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 150 | 2.7.1.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 151 | 2.7.1.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 152 | 2.7.1.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 153 | 2.7.1.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 154 | 2.7.1.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 155 | 2.7.1.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 156 | 2.7.1.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 157 | 2.7.1.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 158 | 2.7.1.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 159 | 2.7.1.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 160 | 2.7.1.4.7 | | **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | | $ 0 | | | | | |
| 161 | 2.8 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 162 | 2.8.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 163 | 2.8.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 164 | 2.8.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 165 | 2.8.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 166 | 2.8.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 167 | 2.8.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 168 | 2.8.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 169 | 2.8.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 170 | 2.8.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 171 | 2.8.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 172 | 2.8.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 173 | 2.8.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 174 | 2.8.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 175 | 2.8.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 176 | 2.8.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 177 | 2.8.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 178 | 2.8.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 179 | 2.8.4.7 | | **Volumen IX. Estudio y Diseños de Fuentes de Materiales** | | $ 0 | | | | | |
| 180 | 2.8.5 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 181 | 2.8.5.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 182 | 2.8.5.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 183 | 2.8.5.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 184 | 2.8.5.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 185 | 2.8.5.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 186 | 2.8.5.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 187 | 2.8.5.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 188 | 2.8.5.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 189 | 2.8.5.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 190 | 2.8.5.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 191 | 2.8.5.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 192 | 2.8.5.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 193 | 2.8.5.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 194 | 2.8.5.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 195 | 2.8.5.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 196 | 2.8.5.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 197 | 2.8.5.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 198 | 2.8.5.4.7 | | **Volumen X. Estudio y Diseños de Fuentes de Agua** | | $ 0 | | | | | |
| 199 | 2.8.5.5 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 200 | 2.8.5.5.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 201 | 2.8.5.5.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 202 | 2.8.5.5.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 203 | 2.8.5.5.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 204 | 2.8.5.5.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 205 | 2.8.5.5.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 206 | 2.8.5.5.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 207 | 2.8.5.5.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 208 | 2.8.5.5.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 209 | 2.8.5.5.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 210 | 2.8.5.5.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 211 | 2.8.5.5.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 212 | 2.8.5.5.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 213 | 2.8.5.5.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 214 | 2.8.5.5.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 215 | 2.8.5.5.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 216 | 2.8.5.5.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 217 | 2.8.5.5.5 | | **Volumen XI. Estudio de Fuentes de Materiales** | | $ 0 | | | | | |
| 218 | 2.8.5.5.6 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 219 | 2.8.5.5.6.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 220 | 2.8.5.5.6.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 221 | 2.8.5.5.6.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 222 | 2.8.5.5.6.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 223 | 2.8.5.5.6.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 224 | 2.8.5.5.6.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 225 | 2.8.5.5.6.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 226 | 2.8.5.5.6.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 227 | 2.8.5.5.6.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 228 | 2.8.5.5.6.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 229 | 2.8.5.5.6.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 230 | 2.8.5.5.6.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 231 | 2.8.5.5.6.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 232 | 2.8.5.5.6.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 233 | 2.8.5.5.6.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 234 | 2.8.5.5.6.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 235 | 2.8.5.5.6.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 236 | 2.8.5.5.6.5 | | **Volumen XII. Estudio de Fuentes de Agua** | | $ 0 | | | | | |
| 237 | 2.8.5.5.6.6 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 238 | 2.8.5.5.6.6.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 239 | 2.8.5.5.6.6.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 240 | 2.8.5.5.6.6.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 241 | 2.8.5.5.6.6.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 242 | 2.8.5.5.6.6.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 243 | 2.8.5.5.6.6.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 726,537 | | | | | |
| 244 | 2.8.5.5.6.6.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 245 | 2.8.5.5.6.6.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 246 | 2.8.5.5.6.6.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 247 | 2.8.5.5.6.6.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 248 | 2.8.5.5.6.6.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 249 | 2.8.5.5.6.6.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 250 | 2.8.5.5.6.6.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 251 | 2.8.5.5.6.6.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 252 | 2.8.5.5.6.6.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 253 | 2.8.5.5.6.6.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 254 | 2.8.5.5.6.6.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 255 | 2.8.5.5.6.6.5 | | **Volumen XIII. Estudio de Fuentes de Materiales** | | $ 0 | | | | | |
| 256 | 2.8.5.5.6.6.6 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 257 | 2.8.5.5.6.6.6.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 258 | 2.8.5.5.6.6.6.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 259 | 2.8.5.5.6.6.6.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 260 | 2.8.5.5.6.6.6.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 261 | 2.8.5.5.6.6.6.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 262 | 2.8.5.5.6.6.6.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 263 | 2.8.5.5.6.6.6.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 264 | 2.8.5.5.6.6.6.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 265 | 2.8.5.5.6.6.6.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 266 | 2.8.5.5.6.6.6.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 267 | 2.8.5.5.6.6.6.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 268 | 2.8.5.5.6.6.6.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 269 | 2.8.5.5.6.6.6.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 270 | 2.8.5.5.6.6.6.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 271 | 2.8.5.5.6.6.6.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 272 | 2.8.5.5.6.6.6.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 273 | 2.8.5.5.6.6.6.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 274 | 2.8.5.5.6.6.6.5 | | **Volumen XIV. Estudio de Fuentes de Agua** | | $ 0 | | | | | |
| 275 | 2.8.5.5.6.6.6.6 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 276 | 2.8.5.5.6.6.6.6.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 277 | 2.8.5.5.6.6.6.6.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 278 | 2.8.5.5.6.6.6.6.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 279 | 2.8.5.5.6.6.6.6.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 280 | 2.8.5.5.6.6.6.6.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 281 | 2.8.5.5.6.6.6.6.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 282 | 2.8.5.5.6.6.6.6.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 283 | 2.8.5.5.6.6.6.6.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 284 | 2.8.5.5.6.6.6.6.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 285 | 2.8.5.5.6.6.6.6.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 286 | 2.8.5.5.6.6.6.6.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 287 | 2.8.5.5.6.6.6.6.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 288 | 2.8.5.5.6.6.6.6.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 289 | 2.8.5.5.6.6.6.6.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 290 | 2.8.5.5.6.6.6.6.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 291 | 2.8.5.5.6.6.6.6.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 292 | 2.8.5.5.6.6.6.6.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 293 | 2.8.5.5.6.6.6.6.5 | | **Volumen XV. Estudio de Fuentes de Materiales** | | $ 0 | | | | | |
| 294 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 295 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 296 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 297 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 298 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 299 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 300 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 301 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 302 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 303 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 304 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 305 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 306 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 307 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 308 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 309 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 310 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 311 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 312 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.5 | | **Volumen XVI. Estudio de Fuentes de Agua** | | $ 0 | | | | | |
| 313 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 314 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 315 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 316 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 317 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 318 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 319 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 320 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 321 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 322 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 323 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 324 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 325 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 326 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 327 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 328 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 329 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 330 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 331 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.5 | | **Volumen XVII. Estudio de Fuentes de Materiales** | | $ 0 | | | | | |
| 332 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6 | | **MAGDALENA - QUINDAMAYANA** | | $ 0 | | | | | |
| 333 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.1 | | **Metodología y Plan de Campo** | | $ 0 | | | | | |
| 334 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.1.1 | | Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | | $ 4,545,130 | | | | | |
| 335 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.1.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 336 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.1.3 | | Observaciones de Aprobación - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 337 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.1.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 338 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.1.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 0 | | | | | |
| 339 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.1.6 | | Aprobación Metodología | | $ 0 | | | | | |
| 340 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.2 | | **Ejecución de Campo, Inventario de Canteras y Ensayos de Laboratorio** | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 341 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.2.1 | | Movilización y Ensayos de Laboratorio | | $ 2,606,903 | | | | | |
| 342 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.3 | | **Elaboración Volumen** | | $ 0 | | | | | |
| 343 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.4 | | **Entrega y Revisión de Observaciones** | | $ 0 | | | | | |
| 344 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.4.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 345 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.4.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 346 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.4.3 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 347 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.4.4 | | Revisión 2 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 348 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.4.5 | | Aprobación de Observaciones - Consultor | | $ 573,784 | | | | | |
| 349 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.4.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 350 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.5 | | **Volumen XVIII. Estudio de Fuentes de Agua** | | $ 0 | | | | | |
| 351 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.6 | | **TRABAJOS DE CAMPO** | | $ 10,041,218 | | | | | |
| 352 | 2.8.5.5.6.6.6.6.6.6.6.6.1 | | Ejecución de Campo y Ensayos de Laboratorio | | $ 10,041,218 | | | | | |
| 353 | 2.8.6 | | **Elaboración Informe Final** | | $ 0 | | | | | |
| 354 | 2.8.6.1 | | Desarrollo Volumen | | $ 10,128,109 | | | | | |
| 355 | 2.8.6.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 356 | 2.8.6.3 | | Aprobación Volumen | | $ 2,654,783 | | | | | |
| 357 | 2.8.7 | | **Entrega Informe Final** | | $ 0 | | | | | |
| 358 | 2.8.7.1 | | Entrega Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 359 | 2.8.7.2 | | Revisión 1 Entrega de Observaciones de Aprobación - Interventoría | | $ 0 | | | | | |
| 360 | 2.8.7.3 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 361 | 2.8.8 | | **Socialización Informe Final** | | $ 0 | | | | | |
| 362 | 2.8.8.1 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 363 | 2.8.8.2 | | Socialización Informe Final | | $ 0 | | | | | |
| 364 | 2.8.8.3 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 365 | 2.8.8.4 | | Socialización Observaciones - Alcalde Mayor | | $ 0 | | | | | |
| 366 | 2.8.8.5 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |
| 367 | 2.8.8.6 | | Aprobación Volumen | | $ 0 | | | | | |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 21/10/2025 | **Contrato:** | ICCU - 258 DE 2025 | **Reporte N°:** | 22 |
| **Semana:** | del martes, 14 de octubre de 2025 | al | martes, 21 de octubre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | CONSORCIO CAMINOS IP | | | | |
| **Objeto:** | CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2.430.458.478 | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2.430.458.478 | **Avance Programado:** | 62,33% |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | **Avance Ejecutado:** | 51,50% |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2.430.458.478 | **Vigencia futura:** | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | **Días Transcurridos:** | 154 / 68,44% — **Días Faltantes:** 71 |
| **Facturación Acumulada:** | $ - / 0% | **N° de Facturas:** | 0 — **% Facturado:** 0,0% |

**Actividades ejecutadas:**

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **62%** | **51%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **68%** | **58%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aforos de Trafico | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/8/2025 | 12/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 12/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 18/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 40% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 29/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 21/8/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 21/8/2025 | 27/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 6/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **94%** | **73%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 15/9/2025 | 100% | 50% | |
| Entrega de volumen | 15/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 50% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **71%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de volumen | 28/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 10/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Aprobacion de volumen | 13/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **81%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **77%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 40% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **85%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **100%** | **79%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 5/9/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **89%** | **74%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 30/7/2025 | 4/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 4/8/2025 | 19/9/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 80% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **89%** | **88%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 19/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 20/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 60% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 0% | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **98%** | **62%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

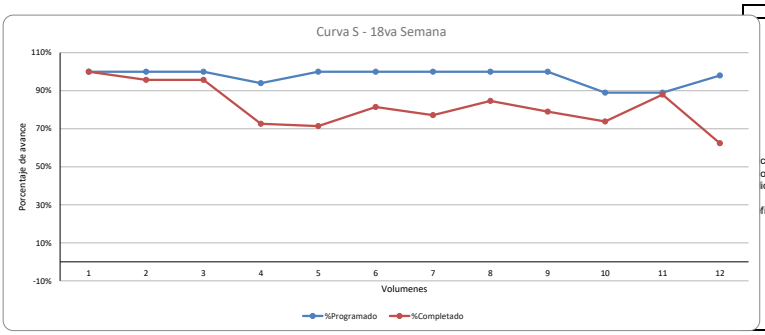
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Se entregó el avance del volumen de tránsito para el sector de Cáqueza

**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo, desaroolo del volumen, entrega de volumen, atencion a observaciones
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención:campaña de geotecnia, desarrollo de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Inventario de campo de cada una de las areas de estudio.

**GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO**




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

cionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de osibles observaciones a los documentos presentados, icionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo finidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

| CONTROL DE CAMBIOS | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

**LECCIONES APRENDIDAS**

| Interventoría | Supervisor ICCU | Control de proyectos |
|---|---|---|
| Nombre: CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: Jhon Ardila | Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP |
| Fecha: 21/10/2025 | Fecha: 21/10/2025 | Fecha: SANTIAGO PAEZ TALERO 21/10/2025 |

PAGINA 1 DE 1

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 21/10/2025 | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 22 |
| **Semana:** | del martes, 14 de octubre de 2025 | al | martes, 21 de octubre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2.430.458.478 | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2.430.458.478 | | **Avance Programado:** | **62,33%** | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | | **Avance Ejecutado:** | **51,50%** | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | **Vigencia futura:** | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2.430.458.478 | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 9-jun-25 | | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | |
| **Duración Contrato (Días):** | 205 | | **Días Transcurridos:** | 134 (65,37%) | **Días Faltantes:** 71 |
| **Facturación Acumulada:** | $ - (0%) | | **N° de Facturas:** | 0 | **% Facturado:** 0,0% |

**Actividades ejecutadas:**

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **9/6/2025** | **31/12/2025** | **62%** | **51%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **52%** | **44%** | Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **68%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: aforo de trafico | 4/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo del volumen I | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **79%** | **73%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica | 4/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 40% | |
| Desarrollo del volumen I | 14/8/2025 | 4/10/2025 | 78% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 50% | 50% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **69%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos | 4/8/2025 | 14/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **79%** | **69%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 70% | |
| Campaña geotecnica | 7/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 25% | |
| Desarrollo Volumen I | 11/9/2025 | 3/10/2025 | 55% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **72%** | **60%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programacion de trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 7/8/2025 | 30/9/2025 | 100% | 45% | |
| Desarrollo Volumen I | 30/8/2025 | 15/10/2025 | 53% | 0% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **75%** | **64%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programación trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio | 2/8/2025 | 17/9/2025 | 100% | 50% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 41% | 0% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **67%** | **67%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programa de trabajo de campo | 5/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 15/8/2025 | 30/9/2025 | 85% | 85% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 0% | 0% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **83%** | **81%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 25/9/2025 | 95% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **75%** | **76%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 7/10/2025 | 76% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **67%** | **54%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo e Inventario Forestal | 15/8/2025 | 23/8/2025 | 100% | 20% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 23/8/2025 | 14/10/2025 | 60% | 15% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **62%** | **56%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio | 8/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |
| Desarrollo del volumen I | 25/8/2025 | 27/10/2025 | 47% | 60% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **64%** | **68%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 11/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 19/8/2025 | 21/10/2025 | 56% | 90% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

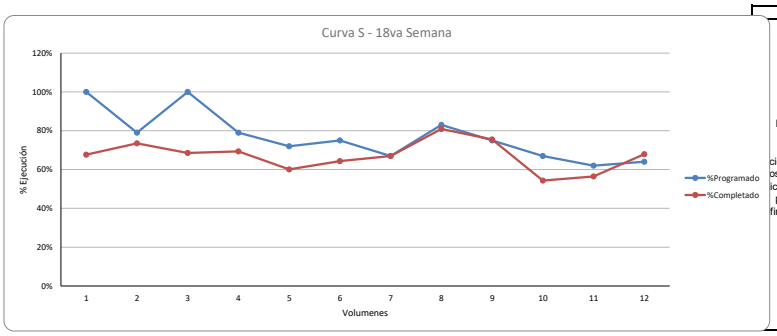
- Se dio Respuesta a solicitud de redes Madrid - 2025 018346-E /
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito se continua con el trabajo de campo
- Por parte del estudio de Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: se continua con trabajos de campo, visita de campo y Topografia y Red Geodesica
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención: trabajo de campo y campaña geoctenica
- Por parte de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: programa de trabajo y Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio
- Por parte de estudio de Diagnostico Ambiental y Social Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente
- Por parde de Estudio de Predial: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio
- Se da comienzo al desarrollo del volumen en la mayoria de las area de estudio

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

cionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de osibles observaciones a los documentos presentados, icionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo finidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

| CONTROL DE CAMBIOS | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| Interventoría | | Supervisor ICCU | | Control de proyectos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PAEZ TALERO |
| Fecha: | 21/10/2025 | Fecha: | 21/10/2025 | Fecha: | 21/10/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 21/10/2025 | **Contrato:** | ICCU - 258 DE 2025 | **Reporte N°:** | 22 |
| **Semana:** | del martes, 14 de octubre de 2025 | al | martes, 21 de octubre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | CONSORCIO CAMINOS IP | | | | |
| **Objeto:** | CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2.430.458.478 | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2.430.458.478 | **Avance Programado:** | 62,33% |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | **Avance Ejecutado:** | 51,50% |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2.430.458.478 | **Vigencia futura:** | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | **Días Transcurridos:** | 154 (68,44%) — **Días Faltantes:** 71 |
| **Facturación Acumulada:** | $ - (0%) | **N° de Facturas:** | 0 — **% Facturado:** 0,0% |

**Actividades ejecutadas:**

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **62%** | **51%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **68%** | **54%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Aforo de campo | 14/7/2025 | 25/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 25/7/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **90%** | **63%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 20/9/2025 | 100% | 30% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 60% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **62%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 40% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 30% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **76%** | **75%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 90% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 10/10/2025 | 61% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 0% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 0% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **90%** | **76%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 28/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 60% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **97%** | **71%** | |
| Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **97%** | **70%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 40% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **71%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 60% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 80% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **97%** | **67%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **78%** | **74%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 6/10/2025 | 82% | 55% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **74%** | **63%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal | 19/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 13/10/2025 | 69% | 55% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **88%** | **70%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 22/9/2025 | 100% | 30% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

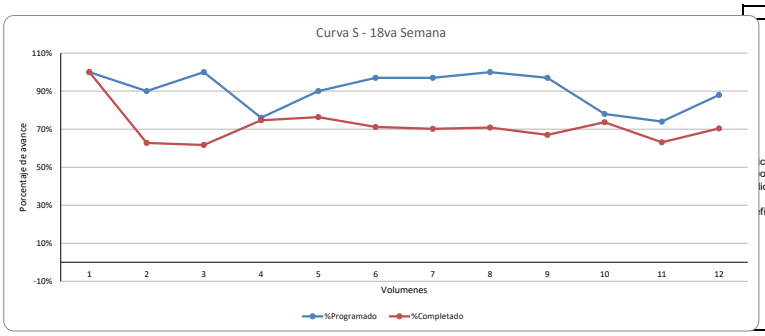
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Adicionalmente, se continuaron las actividades de geotecnia y pavimentos en el sector de Quebradanegra

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 dee septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo y desarrollo de volumen
- Por part del Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: desarrollo del volumen
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Invnetario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

icionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de osibles observaciones a los documentos presentados, licionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo finidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

| CONTROL DE CAMBIOS | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| Interventoría | Supervisor ICCU | Control de proyectos |
|---|---|---|
| Nombre: CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: Jhon Ardila | Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO |
| Fecha: 21/10/2025 | Fecha: 21/10/2025 | Fecha: 21/10/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 28/10/2025 | | | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 23 |
| **Semana:** | del | miércoles, 22 de octubre de 2025 | al | martes, 28 de octubre de 2025 | | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | | | | **Avance Programado:** | **64.39%** | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | | | | **Avance Ejecutado:** | **53.46%** | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | | | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | | **Vigencia futura:** | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | | | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | | | **Días Transcurridos:** | 161 | 71.56% | **Días Faltantes:** 64 |
| **Facturación Acumulada:** | **$** - | **0%** | | **N° de Facturas:** | 0 | | **% Facturado:** 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **64%** | **53%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **72%** | **61%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aforos de Trafico | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/8/2025 | 12/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 12/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 18/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 45% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 29/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 21/8/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 21/8/2025 | 27/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 6/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **94%** | **77%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 15/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 50% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **71%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de volumen | 28/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 10/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Aprobacion de volumen | 13/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **81%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **86%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **85%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **100%** | **79%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 5/9/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **89%** | **74%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 30/7/2025 | 4/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 4/8/2025 | 19/9/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 80% | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **89%** | **88%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 19/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 20/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 60% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **98%** | **62%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

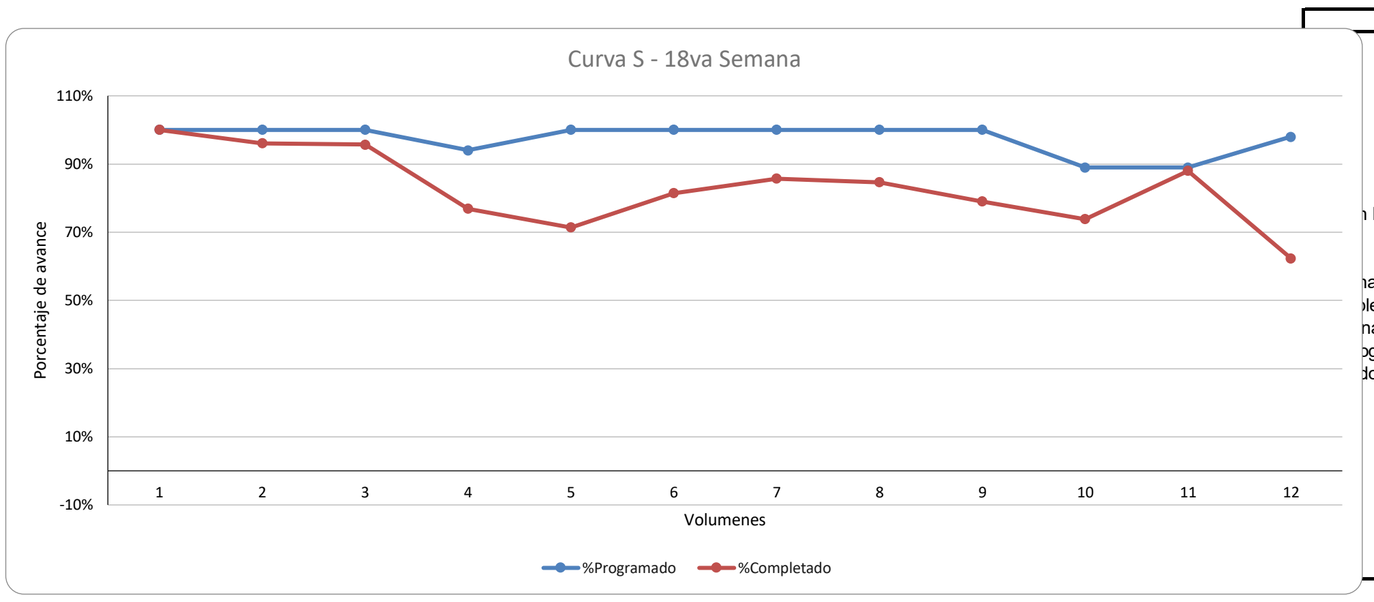
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Se entregó el avance del volumen de tránsito para el sector de Cáqueza

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo, desaroolo del volumen, entrega de volumen, atencion a observaciones
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención:campaña de geotecnia, desarrollo de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Inventario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

…n la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

…nalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de …les observaciones a los documentos presentados, …nalmente, se inician con los respectivos trabajos de …ogramación y logística de los trabajos de campo …dos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

## RIESGOS

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| |
|---|
| |

| Interventoría | | Supervisor ICCU | | Control de proyectos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: | 28/10/2025 | Fecha: | 28/10/2025 | Fecha: | 28/10/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 21/10/2025 | | | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 23 |
| **Semana:** | del | miércoles, 22 de octubre de 2025 | al | martes, 28 de octubre de 2025 | | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | | | **Avance Programado:** | **64.39%** | | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | | | **Avance Ejecutado:** | **53.46%** | | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | | | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | | **Vigencia futura:** | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 9-jun-25 | | | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 205 | | | **Días Transcurridos:** | 134 | 65.37% | **Días Faltantes:** 71 |
| **Facturación Acumulada:** | **$** - | **0%** | | **N° de Facturas:** | 0 | | **% Facturado:** 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **9/6/2025** | **31/12/2025** | **64%** | **53%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **52%** | **44%** | Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **68%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: aforo de trafico | 4/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo del volumen l | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **79%** | **73%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica | 4/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 40% | |
| Desarrollo del volumen l | 14/8/2025 | 4/10/2025 | 78% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 50% | 50% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **69%** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos | 4/8/2025 | 14/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **79%** | **69%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 70% | |
| Campaña geotecnica | 7/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 25% | |
| Desarrollo Volumen I | 11/9/2025 | 3/10/2025 | 55% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **72%** | **60%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programacion de trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 7/8/2025 | 30/9/2025 | 100% | 45% | |
| Desarrollo Volumen I | 30/8/2025 | 15/10/2025 | 53% | 0% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **75%** | **64%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programación trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio | 2/8/2025 | 17/9/2025 | 100% | 50% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 41% | 0% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **67%** | **67%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programa de trabajo de campo | 5/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 15/8/2025 | 30/9/2025 | 85% | 85% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 0% | 0% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **83%** | **81%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 25/9/2025 | 95% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **75%** | **76%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 7/10/2025 | 76% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **67%** | **54%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo e Inventario Forestal | 15/8/2025 | 23/8/2025 | 100% | 20% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 23/8/2025 | 14/10/2025 | 60% | 15% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **62%** | **56%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio | 8/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |
| Desarrollo del volumen l | 25/8/2025 | 27/10/2025 | 47% | 60% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **64%** | **68%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 11/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 19/8/2025 | 21/10/2025 | 56% | 90% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

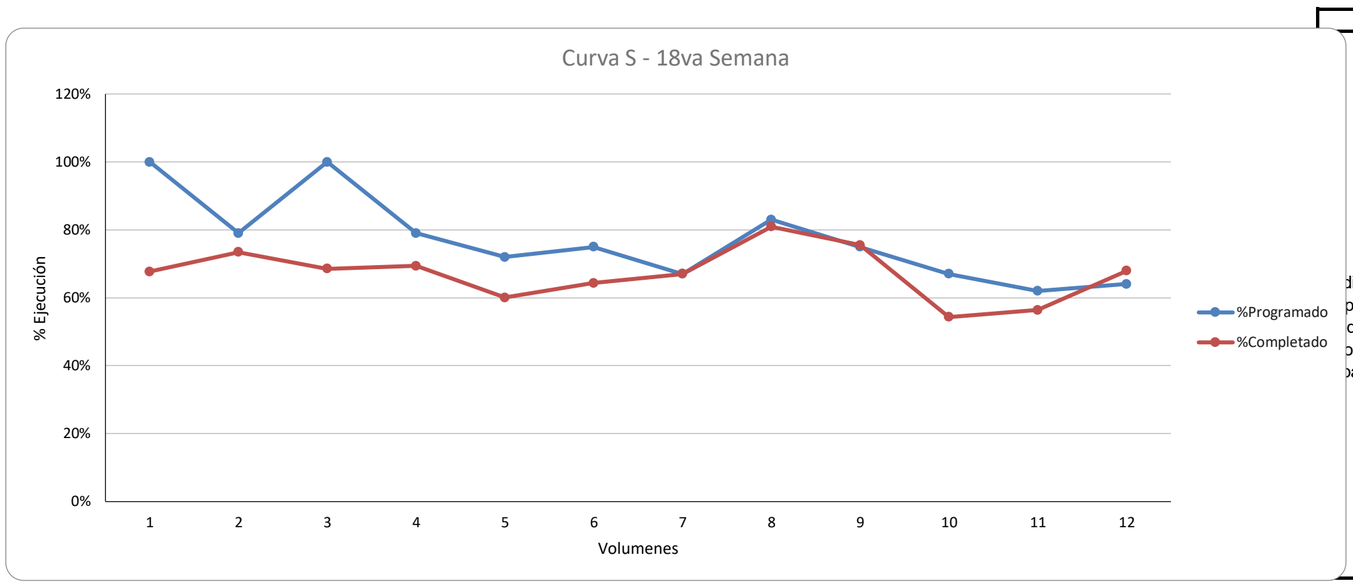
- Se dio Respuesta a solicitud de redes Madrid - 2025 018346-E /
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito se continua con el trabajo de campo
- Por parte del estudio de Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: se continua con trabajos de campo, visita de campo y Topografia y Red Geodesica
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención: trabajo de campo y campaña geoctenica
- Por parte de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: programa de trabajo y Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio
- Por parte de estudio de Diagnostico Ambiental y Social Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente
- Por parde de Estudio de Predial: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio
- Se da comienzo al desarrollo del volumen  en la mayoria  de las area de estudio

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

dicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, dicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de ogramación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

## RIESGOS

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| |
|---|
| |

| Interventoría | Supervisor ICCU | Control de proyectos |
|---|---|---|
| Nombre: CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: Jhon Ardila | Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: 21/10/2025 | Fecha: 21/10/2025 | Fecha: 21/10/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 28/10/2025 | | | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 23 |
| **Semana:** | del | miércoles, 22 de octubre de 2025 | al | martes, 28 de octubre de 2025 | | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | | | | **Avance Programado:** | **64.39%** | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | | | | **Avance Ejecutado:** | **53.46%** | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | | **Vigencia futura:** | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | | | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | | | **Días Transcurridos:** | 161 | 71.56% | **Días Faltantes:** 64 |
| **Facturación Acumulada:** | **$** - | **0%** | | **N° de Facturas:** | 0 | | **% Facturado:** 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **64%** | **53%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **72%** | **57%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Aforo de campo | 14/7/2025 | 25/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 25/7/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **90%** | **63%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 20/9/2025 | 100% | 30% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 60% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **62%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 40% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **76%** | **75%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 95% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 10/10/2025 | 61% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 0% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 0% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **90%** | **76%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 28/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 60% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **97%** | **71%** | |
| Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **97%** | **70%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 40% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **71%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 60% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 80% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **97%** | **67%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **78%** | **74%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 6/10/2025 | 82% | 55% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **74%** | **63%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal | 19/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 13/10/2025 | 69% | 55% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **88%** | **70%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 22/9/2025 | 100% | 30% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

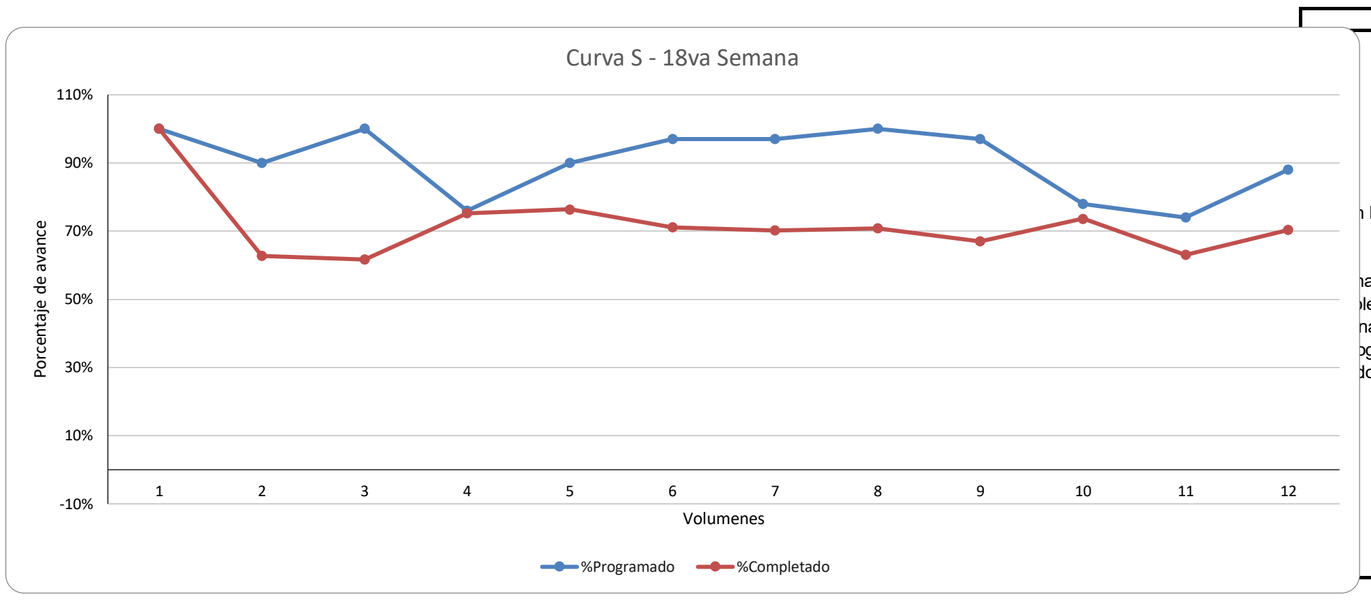
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Adicionalmente, se continuaron las actividades de geotecnia y pavimentos en el sector de Quebradanegra

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 dee septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo y desarrollo de volumen
- Por part del Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: desarrollo del volumen
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Invnetario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

n la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

nalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de les observaciones a los documentos presentados, nalmente, se inician con los respectivos trabajos de ogramación y logística de los trabajos de campo dos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

## RIESGOS

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| |
|---|
| |

| Interventoría | | Supervisor ICCU | | Control de proyectos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PAEZ TALERO |
| Fecha: | 28/10/2025 | Fecha: | 28/10/2025 | Fecha: | 28/10/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 4/11/2025 | | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** 24 |
| **Semana:** | del miércoles, 29 de octubre de 2025 | al | martes, 4 de noviembre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | | **Avance Programado:** | **66.44%** | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | | **Avance Ejecutado:** | **55.88%** | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | **Vigencia futura:** | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | | **Días Transcurridos:** | 168 (74.67%) | **Días Faltantes:** 57 |
| **Facturación Acumulada:** | $ - | 0% | **N° de Facturas:** | 0 | **% Facturado:** 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **66%** | **56%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **75%** | **67%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aforos de Trafico | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/8/2025 | 12/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 12/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 18/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 45% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 29/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 21/8/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 21/8/2025 | 27/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 6/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **94%** | **94%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 15/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **89%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 28/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 10/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Aprobacion de volumen | 13/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **81%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **94%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **85%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **100%** | **79%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 5/9/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **89%** | **74%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 30/7/2025 | 4/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 4/8/2025 | 19/9/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 80% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **89%** | **88%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 19/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 20/9/2025 | 100% | 50% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 60% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **98%** | **62%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 0% | 0% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

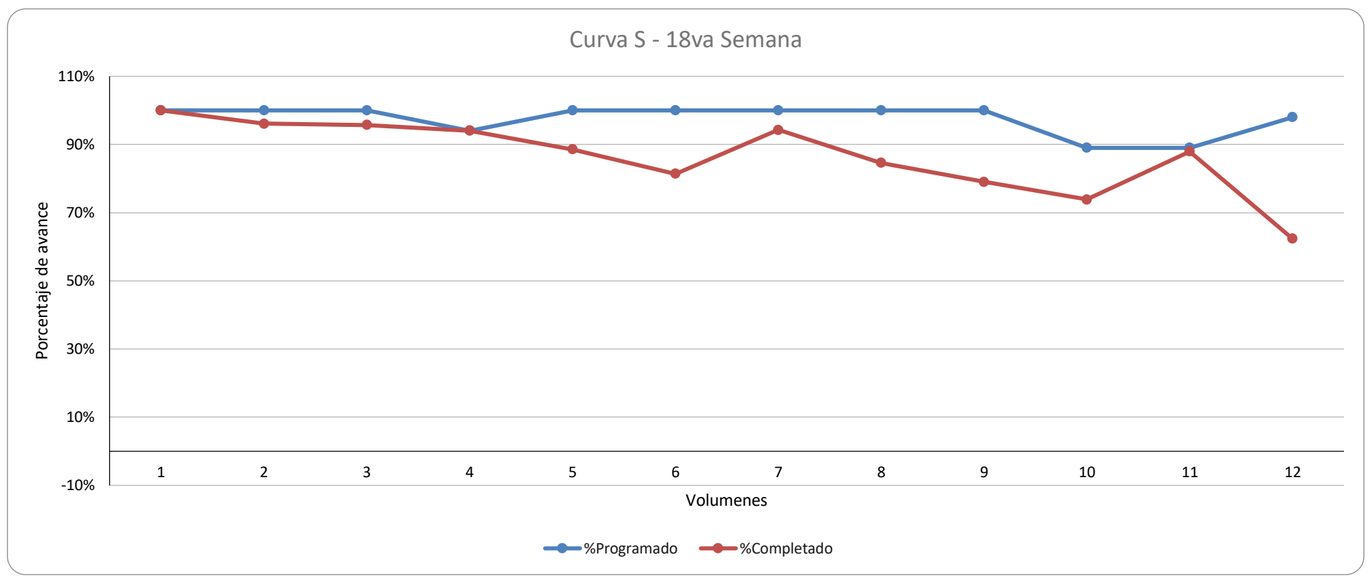
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Se entregó el avance del volumen de tránsito para el sector de Cáqueza

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo, desaroolo del volumen, entrega de volumen, atencion a observaciones
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención:campaña de geotecnia, desarrollo de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Inventario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

| CONTROL DE CAMBIOS | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| Interventoría | | Supervisor ICCU | | Control de proyectos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: | 4/11/2025 | Fecha: | 4/11/2025 | Fecha: | 4/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 4/11/2025 | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 24 |
| **Semana:** | del miércoles, 29 de octubre de 2025 | al | martes, 4 de noviembre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | **Avance Programado:** | **66.44%** | | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | **Avance Ejecutado:** | **55.88%** | | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | **Vigencia futura:** | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 9-jun-25 | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 205 | **Días Transcurridos:** | 148 — 72.20% | **Días Faltantes:** | 57 |
| **Facturación Acumulada:** | $ - — 0% | **N° de Facturas:** | 0 | **% Facturado:** | 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **9/6/2025** | **31/12/2025** | **66%** | **56%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **52%** | **42%** | Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **68%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: aforo de trafico | 4/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo del volumen l | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **79%** | **73%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica | 4/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 40% | |
| Desarrollo del volumen l | 14/8/2025 | 4/10/2025 | 78% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 50% | 50% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **69%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos | 4/8/2025 | 14/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **79%** | **69%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 70% | |
| Campaña geotecnica | 7/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 25% | |
| Desarrollo Volumen I | 11/9/2025 | 3/10/2025 | 55% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **72%** | **60%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programacion de trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 7/8/2025 | 30/9/2025 | 100% | 45% | |
| Desarrollo Volumen I | 30/8/2025 | 15/10/2025 | 53% | 0% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **75%** | **64%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programación trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio | 2/8/2025 | 17/9/2025 | 100% | 50% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 41% | 0% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **67%** | **41%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programa de trabajo de campo | 5/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 15/8/2025 | 30/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **83%** | **81%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 25/9/2025 | 95% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **75%** | **76%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 7/10/2025 | 76% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **67%** | **54%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo e Inventario Forestal | 15/8/2025 | 23/8/2025 | 100% | 20% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 23/8/2025 | 14/10/2025 | 60% | 15% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **62%** | **56%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio | 8/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del volumen l | 25/8/2025 | 27/10/2025 | 47% | 60% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **64%** | **68%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 11/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 19/8/2025 | 21/10/2025 | 56% | 90% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

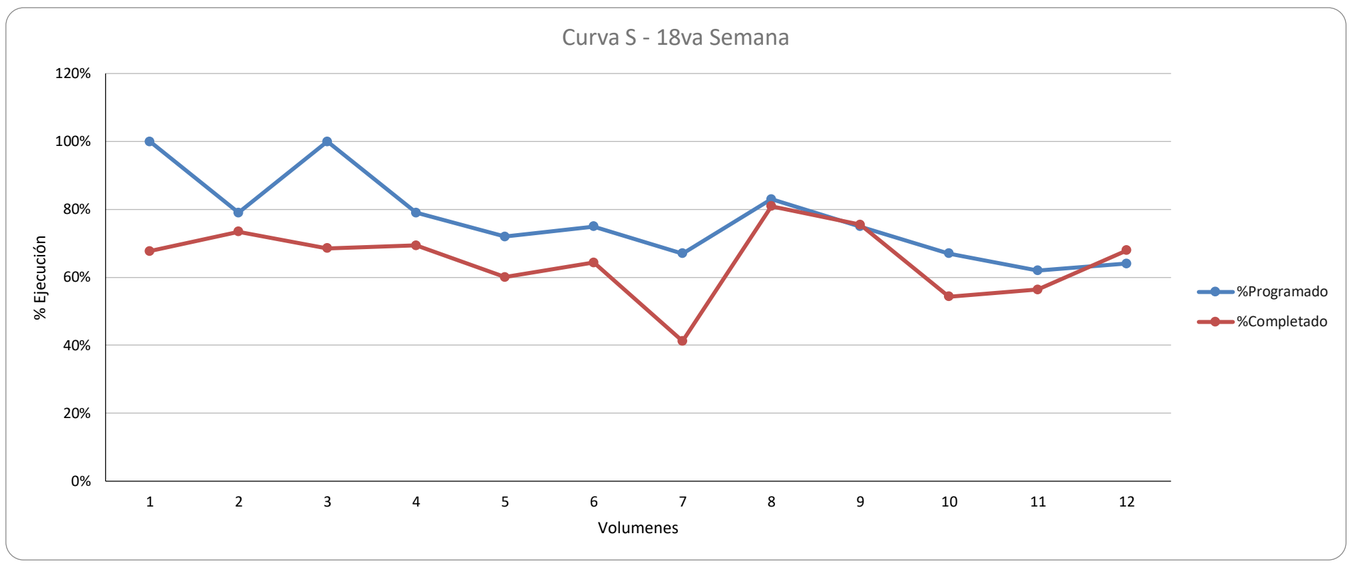
- Se dio Respuesta a solicitud de redes Madrid - 2025 018346-E /
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito se continua con el trabajo de campo
- Por parte del estudio de Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: se continua con trabajos de campo, visita de campo y Topografia y Red Geodesica
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención: trabajo de campo y campaña geoctenica
- Por parte de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: programa de trabajo y Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio
- Por parte de estudio de Diagnostico Ambiental y Social Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente
- Por parde de Estudio de Predial: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio
- Se da comienzo al desarrollo del volumen  en la mayoria  de las area de estudio

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




| ANALISIS |
|---|
| En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.<br><br>Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología. |

## RIESGOS

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| |
|---|
| |

| Interventoría | | Supervisor ICCU | | Control de proyectos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: | 4/11/2025 | Fecha: | 4/11/2025 | Fecha: | 4/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 4/11/2025 | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 24 |
| **Semana:** | del miércoles, 29 de octubre de 2025 | al | martes, 4 de noviembre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | **Avance Programado:** | **66.44%** |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | **Avance Ejecutado:** | **55.88%** |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | **Vigencia futura:** | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | **Días Transcurridos:** | 168 (74.67%) — **Días Faltantes:** 57 |
| **Facturación Acumulada:** | **$ - 0%** | **N° de Facturas:** | 0 — **% Facturado:** 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **66%** | **56%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **75%** | **60%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Aforo de campo | 14/7/2025 | 25/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 25/7/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **90%** | **63%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 20/9/2025 | 100% | 30% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 60% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **78%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **76%** | **75%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 95% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 10/10/2025 | 61% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 0% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 0% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **90%** | **76%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 28/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 60% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **97%** | **71%** | |
| Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **97%** | **70%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 40% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **71%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 60% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 80% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **97%** | **67%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **78%** | **74%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 6/10/2025 | 82% | 55% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **74%** | **63%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal | 19/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 13/10/2025 | 69% | 55% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **88%** | **70%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 22/9/2025 | 100% | 30% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

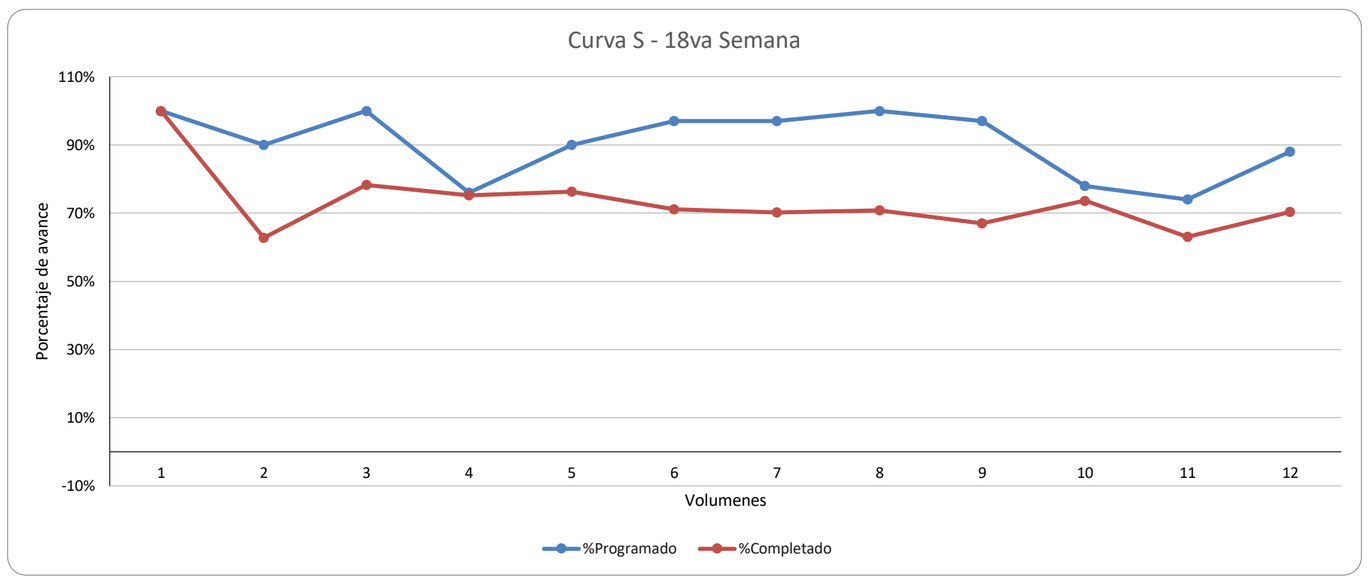
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Adicionalmente, se continuaron las actividades de geotecnia y pavimentos en el sector de Quebradanegra

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 dee septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo y desarrollo de volumen
- Por part del Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: desarrollo del volumen
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Invnetario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

## RIESGOS

## SEGUIMIENTO

**SEMAFORO**

| | | |
|---|---|---|
| **No se han presentadno riesgos al contrato** | **N.A** | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | **APROBACION** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **No se han solicitado modificaciones al contrato** | **N.A** | **N.A** |

## LECCIONES APRENDIDAS

| **Interventoría** | | **Supervisor ICCU** | | **Control de proyectos** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: | 4/11/2025 | Fecha: | 4/11/2025 | Fecha: | 4/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 11/11/2025 | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 25 |
| **Semana:** | del miércoles, 5 de noviembre de 2025 | al | martes, 11 de noviembre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | **Avance Programado:** | **68.49%** | | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | **Avance Ejecutado:** | **52.25%** | | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | **Vigencia futura:** | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | **Días Transcurridos:** | 175 | 77.78% | **Días Faltantes:** 50 |
| **Facturación Acumulada:** | **$ -** **0%** | **N° de Facturas:** | 0 | | **% Facturado:** 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **68%** | **52%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **78%** | **64%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aforos de Trafico | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/8/2025 | 12/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 12/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 18/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 45% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 29/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 21/8/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 21/8/2025 | 27/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 6/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **85%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 15/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **89%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 28/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 10/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Aprobacion de volumen | 13/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **81%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **94%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **85%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **100%** | **79%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 5/9/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **100%** | **58%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 30/7/2025 | 4/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 4/8/2025 | 19/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **100%** | **65%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 19/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 20/9/2025 | 100% | 50% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **100%** | **54%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

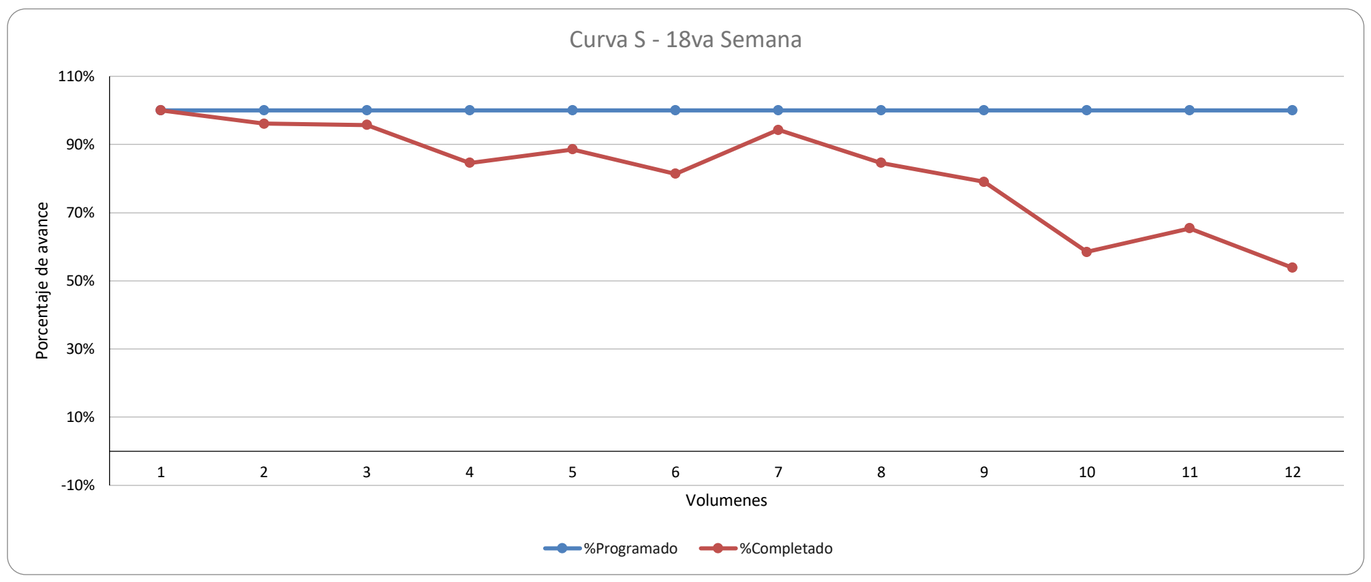
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Se entregó el avance del volumen de tránsito para el sector de Cáqueza

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo, desaroolo del volumen, entrega de volumen, atencion a observaciones
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención:campaña de geotecnia, desarrollo de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Inventario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

| CONTROL DE CAMBIOS | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| Interventoría | | Supervisor ICCU | | Control de proyectos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: | 11/11/2025 | Fecha: | 11/11/2025 | Fecha: | 11/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 11/11/2025 | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 25 |
| **Semana:** | del miércoles, 5 de noviembre de 2025 | al | martes, 11 de noviembre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | **Avance Programado:** | **68.49%** | | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | **Avance Ejecutado:** | **52.25%** | | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | **Vigencia futura:** | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 9-jun-25 | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 205 | **Días Transcurridos:** | 155 — 75.61% | **Días Faltantes:** | 50 |
| **Facturación Acumulada:** | $ - — 0% | **N° de Facturas:** | 0 | **% Facturado:** | 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **9/6/2025** | **31/12/2025** | **68%** | **52%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **52%** | **37%** | Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **75%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: aforo de trafico | 4/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo del volumen l | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **60%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica | 4/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo del volumen l | 14/8/2025 | 4/10/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **69%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos | 4/8/2025 | 14/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **44%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 70% | |
| Campaña geotecnica | 7/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 25% | |
| Desarrollo Volumen I | 11/9/2025 | 3/10/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **67%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programacion de trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 7/8/2025 | 30/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 30/8/2025 | 15/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **62%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programación trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio | 2/8/2025 | 17/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **62%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programa de trabajo de campo | 5/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 15/8/2025 | 30/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **83%** | **81%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 25/9/2025 | 95% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **75%** | **76%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 7/10/2025 | 76% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **67%** | **54%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo e Inventario Forestal | 15/8/2025 | 23/8/2025 | 100% | 20% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 23/8/2025 | 14/10/2025 | 60% | 15% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **62%** | **56%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio | 8/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del volumen l | 25/8/2025 | 27/10/2025 | 47% | 60% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **64%** | **68%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 11/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 19/8/2025 | 21/10/2025 | 56% | 90% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 0% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

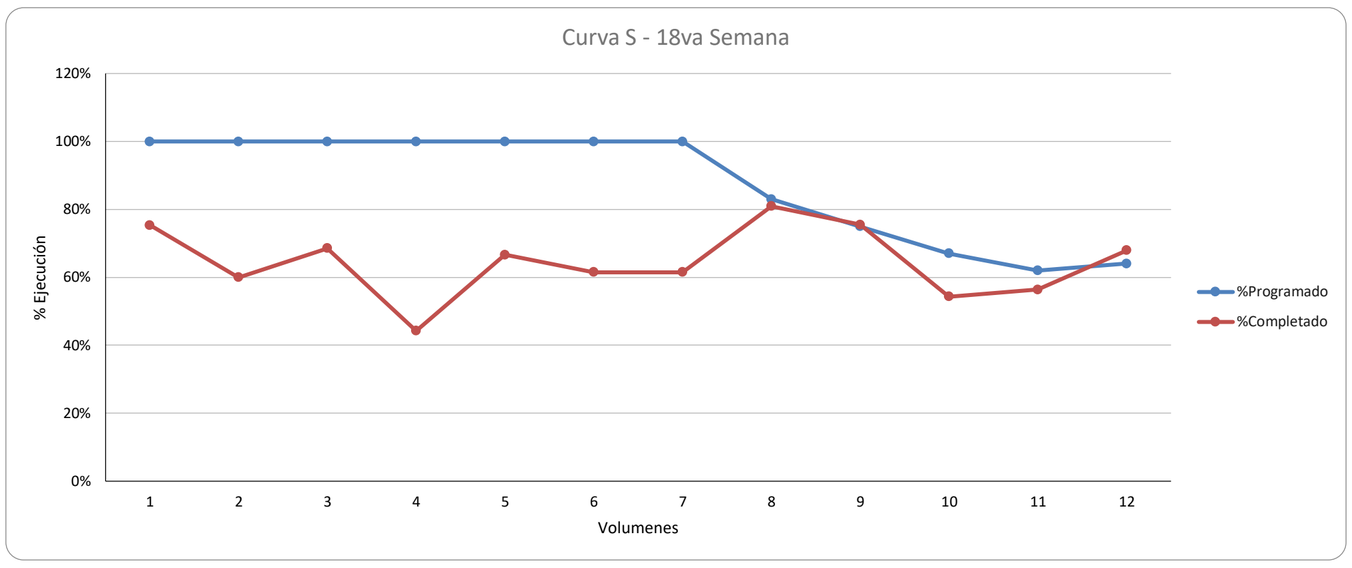
- Se dio Respuesta a solicitud de redes Madrid - 2025 018346-E /
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito se continua con el trabajo de campo
- Por parte del estudio de Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: se continua con trabajos de campo, visita de campo y Topografia y Red Geodesica
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención: trabajo de campo y campaña geoctenica
- Por parte de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: programa de trabajo y Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio
- Por parte de estudio de Diagnostico Ambiental y Social Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente
- Por parde de Estudio de Predial: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio
- Se da comienzo al desarrollo del volumen  en la mayoria  de las area de estudio

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




| ANALISIS |
|---|
| En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.<br><br>Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología. |

## RIESGOS

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| |
|---|
| |

| Interventoría | Supervisor ICCU | Control de proyectos |
|---|---|---|
| Nombre: CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: Jhon Ardila | Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: 11/11/2025 | Fecha: 11/11/2025 | Fecha: 11/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 11/11/2025 | | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | | **Reporte N°:** | 25 |
| **Semana:** | del miércoles, 5 de noviembre de 2025 | al | martes, 11 de noviembre de 2025 | | | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | | | **Avance Programado:** | **68.49%** | | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | | | **Avance Ejecutado:** | **52.25%** | | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | | | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | **Vigencia futura:** | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | | **Días Transcurridos:** | 175 | 77.78% | **Días Faltantes:** | 50 |
| **Facturación Acumulada:** | **$ - 0%** | | **N° de Facturas:** | 0 | | **% Facturado:** | 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **68%** | **52%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **78%** | **57%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Aforo de campo | 14/7/2025 | 25/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 25/7/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **54%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 20/9/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **78%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **58%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 95% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 10/10/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **90%** | **63%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 28/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 0% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **73%** | |
| Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **97%** | **66%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **71%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 60% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 80% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **97%** | **67%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **80%** | **76%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 6/10/2025 | 82% | 55% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **74%** | **63%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal | 19/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 13/10/2025 | 69% | 55% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **88%** | **70%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 22/9/2025 | 100% | 30% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

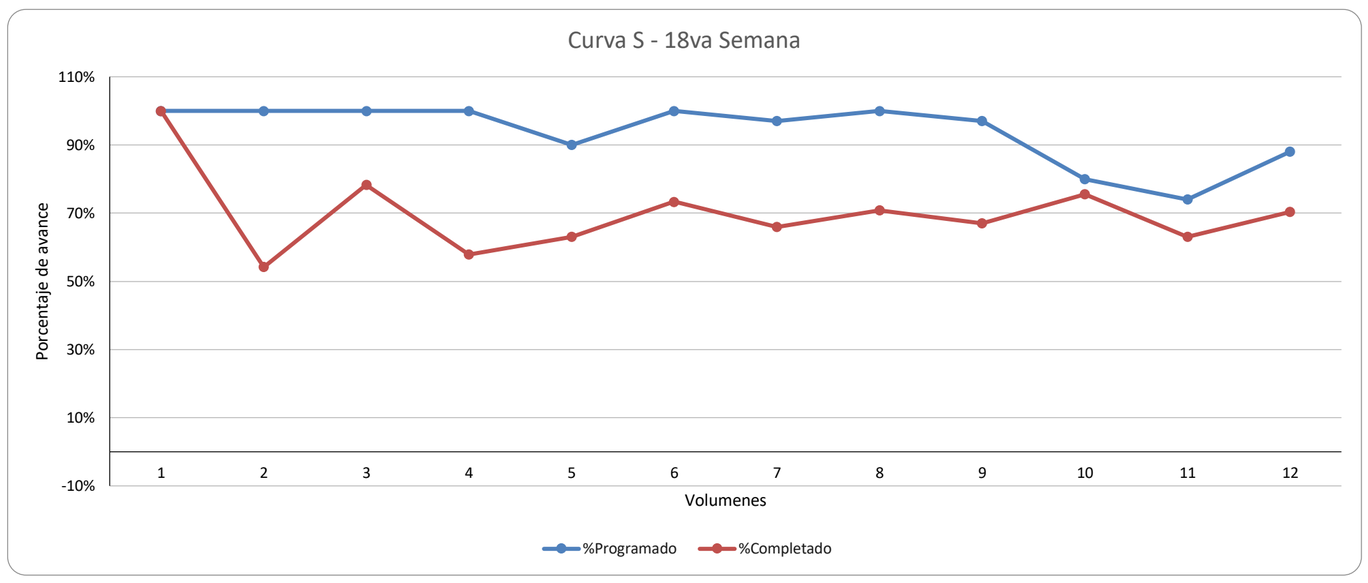
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Adicionalmente, se continuaron las actividades de geotecnia y pavimentos en el sector de Quebradanegra

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 dee septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo y desarrollo de volumen
- Por part del Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: desarrollo del volumen
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Invnetario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

## RIESGOS

## SEGUIMIENTO

**SEMAFORO**

| | | |
|---|---|---|
| **No se han presentadno riesgos al contrato** | **N.A** | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | **APROBACION** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **No se han solicitado modificaciones al contrato** | **N.A** | **N.A** |

## LECCIONES APRENDIDAS

| **Interventoría** | | **Supervisor ICCU** | | **Control de proyectos** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: | 11/11/2025 | Fecha: | 11/11/2025 | Fecha: | 11/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 19/11/2025 | | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** 26 |
| **Semana:** | del martes, 11 de noviembre de 2025 | al | miércoles, 19 de noviembre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | **Avance Programado:** | **70.84%** |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | | **Avance Ejecutado:** | **53.61%** |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | | | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | **Vigencia futura:** | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | | **Días Transcurridos:** 183 | 81.33% **Días Faltantes:** 42 |
| **Facturación Acumulada:** | **$ -** | **0%** | **N° de Facturas:** 0 | **% Facturado:** 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **71%** | **54%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **81%** | **69%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aforos de Trafico | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/8/2025 | 12/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 12/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 18/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 45% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 29/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 21/8/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 21/8/2025 | 27/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 6/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **85%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 15/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **89%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 28/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 10/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Aprobacion de volumen | 13/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **90%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **85%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **100%** | **79%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 5/9/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **100%** | **62%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 30/7/2025 | 4/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 4/8/2025 | 19/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **100%** | **75%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 19/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 20/9/2025 | 100% | 70% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **100%** | **54%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

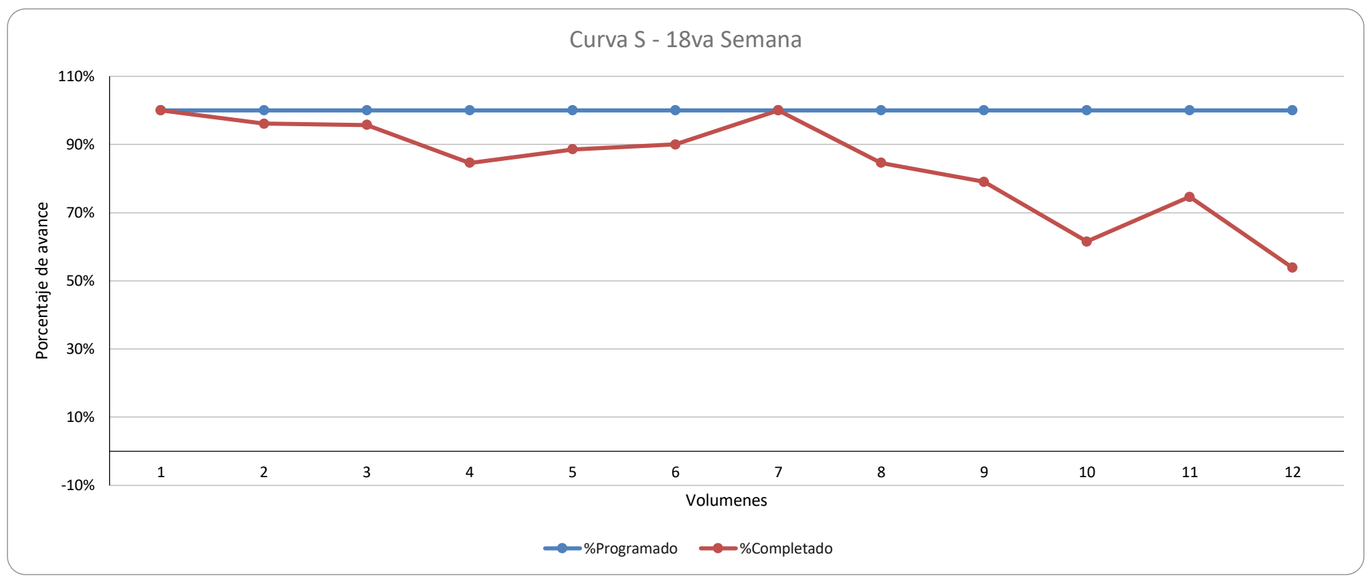
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Se entregó el avance del volumen de tránsito para el sector de Cáqueza

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo, desaroolo del volumen, entrega de volumen, atencion a observaciones
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención:campaña de geotecnia, desarrollo de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Inventario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

## RIESGOS

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| Interventoría | | Supervisor ICCU | | Control de proyectos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: | 19/11/2025 | Fecha: | 19/11/2025 | Fecha: | 19/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 19/11/2025 | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 26 |
| **Semana:** | del martes, 11 de noviembre de 2025 | al | martes, 11 de noviembre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | **Avance Programado:** | **70.84%** | | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | **Avance Ejecutado:** | **53.61%** | | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | **Vigencia futura:** | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 9-jun-25 | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 205 | **Días Transcurridos:** | 163 — 79.51% | **Días Faltantes:** | 42 |
| **Facturación Acumulada:** | $ - — 0% | **N° de Facturas:** | 0 | **% Facturado:** | 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **9/6/2025** | **31/12/2025** | **71%** | **54%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **52%** | **35%** | Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: aforo de trafico | 4/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo del volumen l | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **60%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica | 4/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo del volumen l | 14/8/2025 | 4/10/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **73%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos | 4/8/2025 | 14/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **73%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña geotecnica | 7/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 11/9/2025 | 3/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **79%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programacion de trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 7/8/2025 | 30/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 30/8/2025 | 15/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **62%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programación trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio | 2/8/2025 | 17/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programa de trabajo de campo | 5/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 15/8/2025 | 30/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **48%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 25/9/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **100%** | **48%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 7/10/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **100%** | **45%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo e Inventario Forestal | 15/8/2025 | 23/8/2025 | 100% | 20% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 23/8/2025 | 14/10/2025 | 100% | 15% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **100%** | **49%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio | 8/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del volumen l | 25/8/2025 | 27/10/2025 | 100% | 60% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **90%** | **54%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 11/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 19/8/2025 | 21/10/2025 | 100% | 95% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

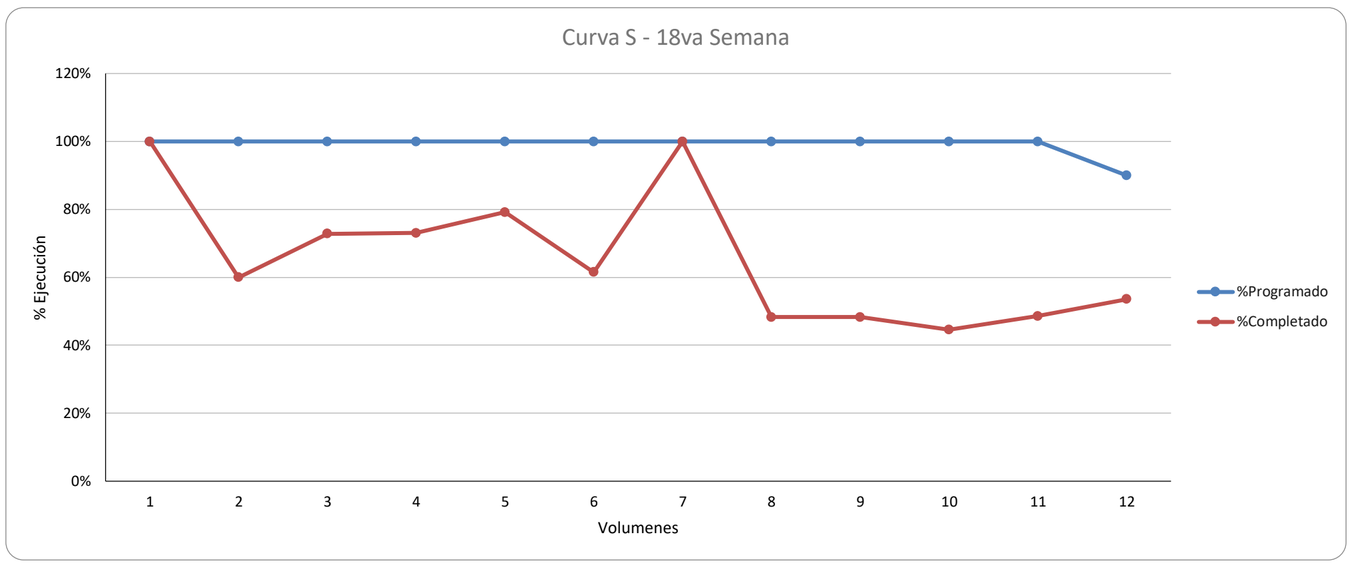
- Se dio Respuesta a solicitud de redes Madrid - 2025 018346-E /
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito se continua con el trabajo de campo
- Por parte del estudio de Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: se continua con trabajos de campo, visita de campo y Topografia y Red Geodesica
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención: trabajo de campo y campaña geoctenica
- Por parte de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: programa de trabajo y Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio
- Por parte de estudio de Diagnostico Ambiental y Social Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente
- Por parde de Estudio de Predial: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio
- Se da comienzo al desarrollo del volumen  en la mayoria  de las area de estudio

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




| ANALISIS |
|---|
| En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.<br><br>Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología. |

## RIESGOS

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| |
|---|
| |

| Interventoría | Supervisor ICCU | Control de proyectos |
|---|---|---|
| Nombre: CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: Jhon Ardila | Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: 19/11/2025 | Fecha: 19/11/2025 | Fecha: 19/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 19/11/2025 | | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | | **Reporte N°:** | 26 |
| **Semana:** | del martes, 11 de noviembre de 2025 | al | martes, 11 de noviembre de 2025 | | | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | | | **Avance Programado:** | **70.84%** | | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | | | **Avance Ejecutado:** | **53.61%** | | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | | | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | **Vigencia futura:** | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | | **Días Transcurridos:** | 183 | 81.33% | **Días Faltantes:** | 42 |
| **Facturación Acumulada:** | **$ - 0%** | | **N° de Facturas:** | 0 | | **% Facturado:** | 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **71%** | **54%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **81%** | **59%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Aforo de campo | 14/7/2025 | 25/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 25/7/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **60%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 20/9/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 80% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **78%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **58%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 95% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 10/10/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **51%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 28/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **73%** | |
| Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **97%** | **66%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **71%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 60% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 80% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **97%** | **67%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **80%** | **76%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 6/10/2025 | 82% | 55% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **74%** | **63%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal | 19/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 13/10/2025 | 69% | 55% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **88%** | **70%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 22/9/2025 | 100% | 30% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

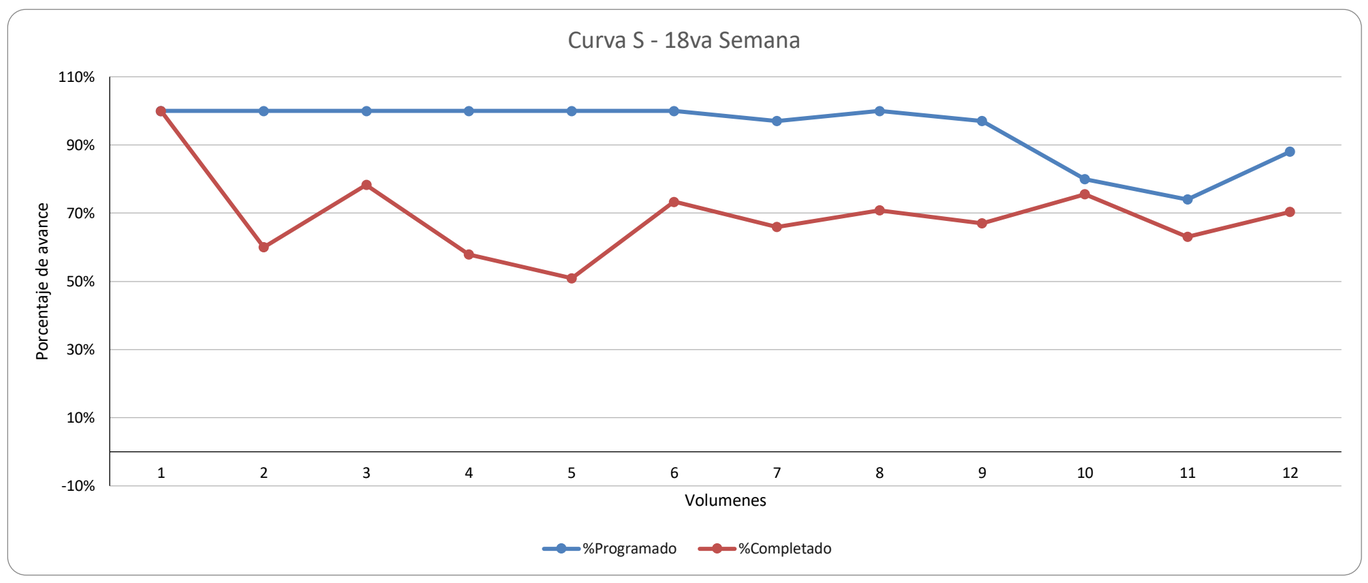
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Adicionalmente, se continuaron las actividades de geotecnia y pavimentos en el sector de Quebradanegra

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 dee septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo y desarrollo de volumen
- Por part del Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: desarrollo del volumen
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Invnetario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

## RIESGOS

## SEGUIMIENTO

**SEMAFORO**

| | | |
|---|---|---|
| **No se han presentadno riesgos al contrato** | **N.A** | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | **APROBACION** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **No se han solicitado modificaciones al contrato** | **N.A** | **N.A** |

## LECCIONES APRENDIDAS

| **Interventoría** | | **Supervisor ICCU** | | **Control de proyectos** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: | 19/11/2025 | Fecha: | 19/11/2025 | Fecha: | 19/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 26/11/2025 | | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 27 |
| **Semana:** | del jueves, 20 de noviembre de 2025 | al | miércoles, 26 de noviembre de 2025 | | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | | | **Avance Programado:** | **71.87%** | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | | | **Avance Ejecutado:** | **55.76%** | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | **Vigencia futura:** | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | | **Días Transcurridos:** | 190 | 84.44% | **Días Faltantes:** 35 |
| **Facturación Acumulada:** | $ - | 0% | **N° de Facturas:** | 0 | | **% Facturado:** 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **72%** | **56%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **84%** | **73%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aforos de Trafico | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/7/2025 | 6/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/8/2025 | 12/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 12/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 18/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **95%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 90% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 90% | |
| Aprobación Volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 50% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **97%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 29/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 21/8/2025 | 21/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 21/8/2025 | 27/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 90% | |
| Aprobacion de volumen | 6/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **94%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 15/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 15/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 27/8/2025 | 3/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **94%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 28/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 10/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| Aprobacion de volumen | 13/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **96%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 70% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 22/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 22/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobacion de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **85%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de volumen | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 19/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 25/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 60% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **100%** | **79%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 5/9/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **100%** | **62%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 30/7/2025 | 4/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 4/8/2025 | 19/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **100%** | **75%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo y Conteo Forestal | 19/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 20/9/2025 | 100% | 70% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **100%** | **54%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 5/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 15/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 28/8/2025 | 1/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |
| aprobación del volumen | 4/9/2025 | 4/9/2025 | 100% | 0% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

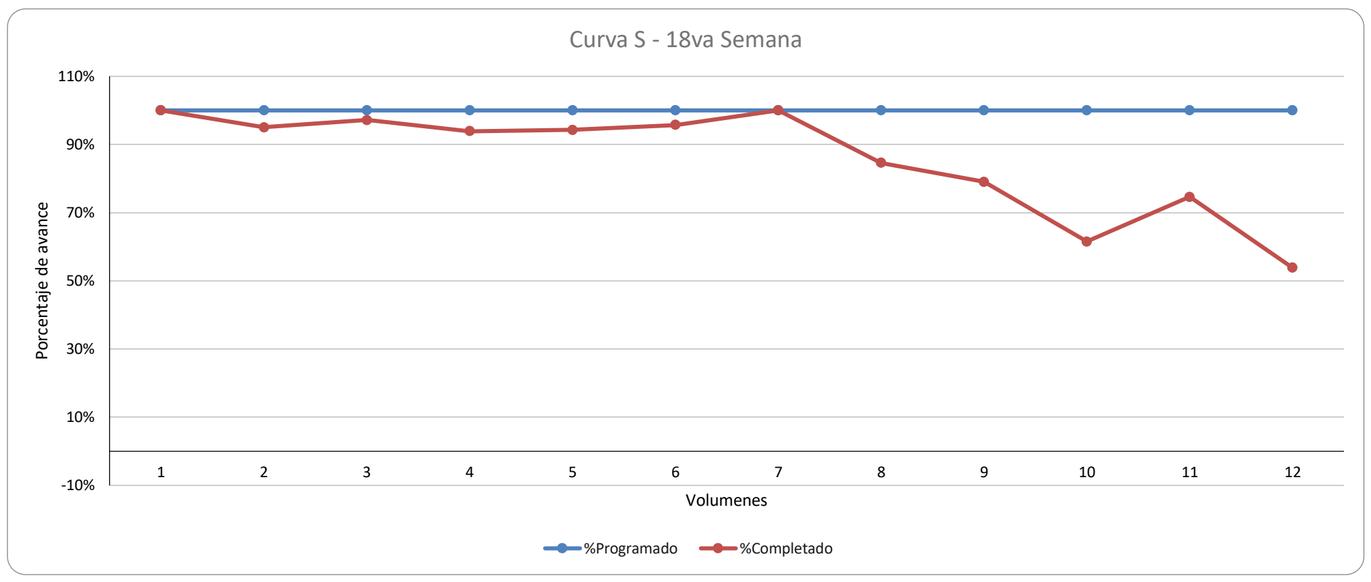
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Se entregó el avance del volumen de tránsito para el sector de Cáqueza

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo, desaroolo del volumen, entrega de volumen, atencion a observaciones
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención:campaña de geotecnia, desarrollo de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Inventario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

| CONTROL DE CAMBIOS | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| Interventoría | | Supervisor ICCU | | Control de proyectos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: | 26/11/2025 | Fecha: | 26/11/2025 | Fecha: | 26/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 19/11/2025 | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | **Reporte N°:** | 27 |
| **Semana:** | del jueves, 20 de noviembre de 2025 | al | martes, 11 de noviembre de 2025 | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | **Avance Programado:** | **71.87%** | | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | **Avance Ejecutado:** | **55.76%** | | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | **Vigencia futura:** | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 9-jun-25 | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 205 | **Días Transcurridos:** | 163 — 79.51% | **Días Faltantes:** | 42 |
| **Facturación Acumulada:** | $ - — 0% | **N° de Facturas:** | 0 | **% Facturado:** | 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **9/6/2025** | **31/12/2025** | **72%** | **56%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **52%** | **36%** | Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: aforo de trafico | 4/8/2025 | 15/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo del volumen l | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **82%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica | 4/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo del volumen l | 14/8/2025 | 4/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 16/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 19/9/2025 | 100% | 50% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **74%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Visitas de campo K0 | 28/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos | 4/8/2025 | 14/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 15/8/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 70% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **73%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña geotecnica | 7/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 11/9/2025 | 3/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **79%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programacion de trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 7/8/2025 | 30/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 30/8/2025 | 15/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **69%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programación trabajos de campo | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio | 2/8/2025 | 17/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 50% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Programa de trabajo de campo | 5/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 15/8/2025 | 30/9/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen I | 17/09/25 | 3/10/2025 | 100% | 100% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **48%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 25/9/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **100%** | **48%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 7/10/2025 | 100% | 80% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **100%** | **45%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 4/8/2025 | 11/8/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo e Inventario Forestal | 15/8/2025 | 23/8/2025 | 100% | 20% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 23/8/2025 | 14/10/2025 | 100% | 15% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **100%** | **49%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio | 8/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 20% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del volumen l | 25/8/2025 | 27/10/2025 | 100% | 60% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **90%** | **54%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 11/8/2025 | 19/8/2025 | 100% | 100% | |
| Desarrollo Volumen | 19/8/2025 | 21/10/2025 | 100% | 95% | |
| entrega de volumen | 8/9/2025 | 8/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 8/9/2025 | 13/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 13/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 17/9/2025 | 20/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 20/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobación Volumen | 23/9/2025 | 23/9/2025 | 0% | 0% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

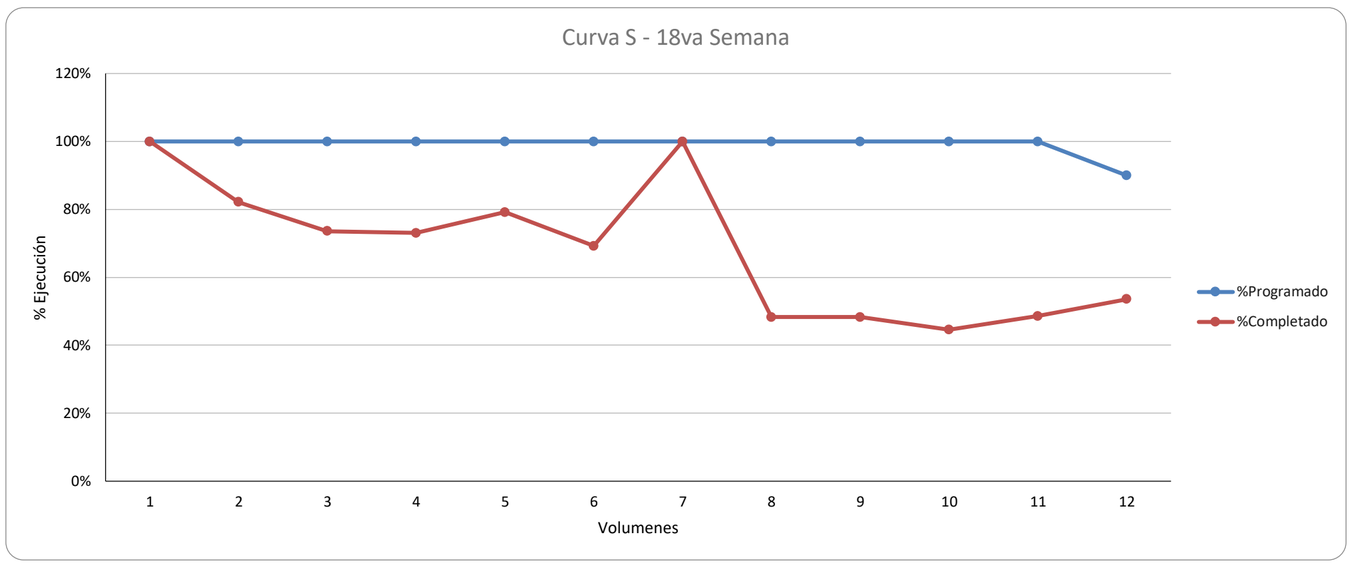
- Se dio Respuesta a solicitud de redes Madrid - 2025 018346-E /
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 de septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito se continua con el trabajo de campo
- Por parte del estudio de Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: se continua con trabajos de campo, visita de campo y Topografia y Red Geodesica
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención: trabajo de campo y campaña geoctenica
- Por parte de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: programa de trabajo y Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio
- Por parte de estudio de Diagnostico Ambiental y Social Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente
- Por parde de Estudio de Predial: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio
- Se da comienzo al desarrollo del volumen  en la mayoria  de las area de estudio

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




| ANALISIS |
|---|
| En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.<br><br>Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología. |

## RIESGOS

| RIESGOS | SEGUIMIENTO | SEMAFORO |
|---|---|---|
| No se han presentadno riesgos al contrato | N.A | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | APROBACION | FECHA |
|---|---|---|
| No se han solicitado modificaciones al contrato | N.A | N.A |

## LECCIONES APRENDIDAS

| |
|---|
| |

| Interventoría | Supervisor ICCU | Control de proyectos |
|---|---|---|
| Nombre: CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: Jhon Ardila | Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: 19/11/2025 | Fecha: 19/11/2025 | Fecha: 19/11/2025 |

# REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de reporte:** | 19/11/2025 | | **Contrato:** | **ICCU - 258 DE 2025** | | **Reporte N°:** | 27 |
| **Semana:** | del jueves, 20 de noviembre de 2025 | al | martes, 11 de noviembre de 2025 | | | | |
| **Consultoría:** | **CONSORCIO CAMINOS IP** | | | | | | |
| **Objeto:** | **CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2** | | | | | | |
| **Presupuesto Asignado con IVA:** | $ 2,430,458,478 | | | | | | |
| **Presupuesto Programado:** | $ 2,430,458,478 | | | **Avance Programado:** | **71.87%** | | |
| **Presupuesto Real Ejecutado:** | $ 0 | | | **Avance Ejecutado:** | **55.76%** | | |
| **Vigencia fiscal 2024:** | N/A | | | | | | |
| **Vigencia fiscal 2025:** | $ 2,430,458,478 | | **Vigencia futura:** | | | | |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 20-may-25 | | **Fecha de Terminación:** | 31-dic-25 | | | |
| **Duración Contrato (Días):** | 225 | | **Días Transcurridos:** | 183 | 81.33% | **Días Faltantes:** | 42 |
| **Facturación Acumulada:** | **$ - 0%** | | **N° de Facturas:** | 0 | | **% Facturado:** | 0.0% |

## Actividades ejecutadas:

| ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % Avance Programado | % Avance Ejecutado | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de Consultoría No. 258** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **72%** | **56%** | |
| Acta de Inicio | 20/5/2025 | 20/5/2025 | 100% | 100% | |
| **Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra** | **20/5/2025** | **31/12/2025** | **81%** | **60%** | |
| **Volumen I. Estudio de Tránsito** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **100%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: Aforo de campo | 14/7/2025 | 25/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 25/7/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 100% | 100% | |
| **Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT** | **9/6/2025** | **21/10/2025** | **100%** | **72%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Topografia y Red Geodesica | 14/7/2025 | 30/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 31/7/2025 | 20/9/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega Volumen | 16/8/2025 | 16/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 16/8/2025 | 22/8/2025 | 100% | 40% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 22/8/2025 | 26/8/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 100% | 40% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 29/8/2025 | 2/9/2025 | 100% | 40% | |
| Aprobación Volumen | 2/9/2025 | 2/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen III. Geología para Ingenieria** | **9/6/2025** | **23/9/2025** | **100%** | **78%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 100% | 50% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | **9/6/2025** | **20/10/2025** | **100%** | **58%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 8/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Campaña Geotecnica | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 95% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 10/10/2025 | 100% | 40% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 100% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | **9/6/2025** | **31/10/2025** | **100%** | **51%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 5/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 5/8/2025 | 28/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| **Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **100%** | **73%** | |
| Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/8/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales** | **9/6/2025** | **3/11/2025** | **97%** | **66%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio | 14/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 28/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | **9/6/2025** | **11/10/2025** | **100%** | **71%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Entrega de Volumen | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 60% | 30% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 60% | 30% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 30/8/2025 | 3/9/2025 | 80% | 30% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 100% | 30% | |
| **Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras** | **9/6/2025** | **23/10/2025** | **97%** | **67%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 11/9/2025 | 100% | 40% | |
| Entrega de Volumen | 11/9/2025 | 11/9/2025 | 100% | 60% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/8/2025 | 30/8/2025 | 100% | 60% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 11/9/2025 | 17/9/2025 | 100% | 0% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 3/9/2025 | 6/9/2025 | 100% | 0% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 6/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| Aprobacion del volumen | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0% | 0% | |
| **Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social** | **9/6/2025** | **30/10/2025** | **80%** | **76%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 30/7/2025 | 6/10/2025 | 82% | 55% | |
| **Volumen XI. Estudio de Predial** | **9/6/2025** | **12/11/2025** | **74%** | **63%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal | 19/7/2025 | 11/8/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 11/8/2025 | 13/10/2025 | 69% | 55% | |
| **Volumen XII. Estudio de Presupuestos** | **9/6/2025** | **6/11/2025** | **88%** | **70%** | |
| Metodología de Trabajo y Plan de Campo | 9/6/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 25/6/2025 | 1/7/2025 | 100% | 100% | |
| Atención de Observaciones - Consultoría | 1/7/2025 | 4/7/2025 | 100% | 100% | |
| Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría | 4/7/2025 | 8/7/2025 | 100% | 100% | |
| Aprobación Metodologia | 14/7/2025 | 14/7/2025 | 100% | 100% | |
| Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios) | 14/7/2025 | 22/7/2025 | 100% | 30% | |
| Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen | 22/7/2025 | 22/9/2025 | 100% | 30% | |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

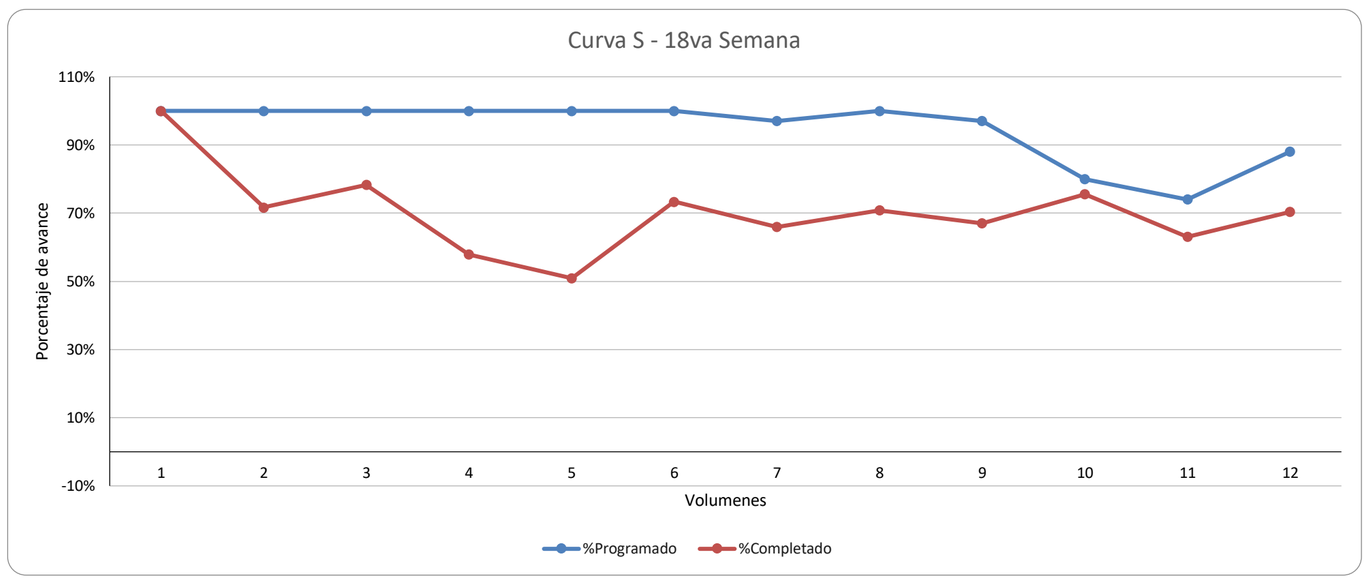
- Realizar Actas de comité 1, 5 y 6
- entrega de Actas de comité 1, 4,5,6,7,8 y 9 (no se adjunta el acta 9)
- En el área de tránsito se realizó la desinstalación de las cámaras en los tres tramos y se comenzó el procesamiento de la información.
- Se continua con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.
- se realiza una reprogramación de la entrega de los volúmenes correspondientes con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se continua con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.
-Se está realizando el procesamiento de la información de la topografía levantada en campo para proceder con la entrega de los productos para los tres sectores de estudio.
- Se entregó el avance de trabajos de campo para los componentes de geología, geotecnia, taludes y pavimentos
- Se han entregado avances del Volumen de geotecnia y pavimentos para los tres sectores priorizados.
- Adicionalmente, se continuaron las actividades de geotecnia y pavimentos en el sector de Quebradanegra

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 10 al 16 dee septiembre se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo y desarrollo de volumen
- Por part del Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: desarrollo del volumen
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Aprobacion de metodologias de estudio
- Invnetario de campo de cada una de las areas de estudio.

## GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO




**ANALISIS**

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

## RIESGOS

## SEGUIMIENTO

**SEMAFORO**

| | | |
|---|---|---|
| **No se han presentadno riesgos al contrato** | **N.A** | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DE CAMBIOS

| | **APROBACION** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **No se han solicitado modificaciones al contrato** | **N.A** | **N.A** |

## LECCIONES APRENDIDAS

| **Interventoría** | | **Supervisor ICCU** | | **Control de proyectos** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CONSORCIO LITORAL MC | Nombre: | Jhon Ardila | Nombre: | CONSORCIO CAMINOS IP<br>SANTIAGO PÁEZ TALERO |
| Fecha: | 19/11/2025 | Fecha: | 19/11/2025 | Fecha: | 19/11/2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | | **CÓDIGO:** | | | | |
| | **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | | **VERSIÓN:** | | | | |
| | **FORMATO ACTA DE COSTOS DE CONSULTORÍA** | | **FECHA:** | | | | |
| | **ACTA FINAL** | **ACTA Nº** 3 | **FECHA:** | 17 (Día) | DE | dic (Mes) | 2025 (Año) |
| | NO x (INDICAR CON UNA "X") | **VALOR ACTA:** $ - | | **PERIODO:** | **20 de Octubre a 19 de Noviembre de 2025** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No :** ICCU 258 DE 2025 | **PLAZO INICIAL:** 8 MESES | **PLAZO ACTUAL:** | 8 MESES |
| **OBJETO :** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS | **FECHA DE INICIO:** 20/5/2025 | **FECHA DE FIN:** | 31/12/2025 |
| | **FECHA DE SUSPENSIÓN:** NA | **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | NA |
| **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO LITORAL MC **CONTRATISTA:** CONSORCIO CAMINOS IP | **VALOR INICIAL:** $ 2,430,458,478.00 | **VALOR CON ADICIONES:** | $2,430,458,478.00 |

| Volumen | Nombre del volumen | Trabajo de campo | Página Anexo Técnico (número) | Numeral Anexo Técnico (número) | CAQUEZA Presupuesto Total = $ 480.356.534 | | | 100.00% | MADRID Presupuesto Total = 1.173.754.106 | | | 100.00% | QUEBRADANEGRA Presupuesto Total = $ 776.347.837 | | | 100.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pto Total Trabajos de Campo | Pto Ejecutado Trabajos de Campo | Porcentaje trabajo de campo Ejecutado | SI /NO/NA | Pto Total Trabajos de Campo | Pto Ejecutado Trabajos de Campo | Porcentaje trabajo de campo Ejecutado | SI /NO/NA | Pto Total Trabajos de Campo | Pto Ejecutado Trabajos de Campo | Porcentaje trabajo de campo Ejecutado | SI /NO/NA |
| I | **Estudio de Transporte** | Planeación y definición de puntos de aforo junto con la interventoría. | 14 | 4.3 | $ 13,398,163 | $ 13,398,163 | 100% | SI | $ 24,923,088 | $ 24,923,088 | 100% | SI | $ 14,224,874 | $ 14,224,874 | 100% | SI |
| II | **Topografía, Trazado y Diseño Geométrico, Señalización, Seguridad Vial y PMT** | Georreferenciación con mojones GPS y establecimiento de poligonales de control. | 16 | 4.4 | $ 28,628,239 | $ 28,628,239 | 100% | SI | $ 87,380,478 | $ 87,380,478 | 100% | SI | $ 47,148,390 | $ 47,148,390 | 100% | SI |
| III | **Geología para Ingeniería y Análisis de Hidrogeología** | Reconocimiento geológico de campo a escala apropiada del corredor. | 28 | 4.5 | $ 9,115,839 | $ 9,115,839 | 100% | SI | $ 14,563,471 | $ 14,563,471 | 100% | SI | $ 10,617,904 | $ 10,617,904 | 100% | SI |
| IV | **Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención** | Ejecución de apiques y calicatas en sitios representativos. | 30 | 4.6 | $ 23,693,471 | $ 23,693,471 | 100% | SI | $ 110,515,951 | $ 110,515,951 | 100% | SI | $ 90,146,519 | $ 90,146,519 | 100% | SI |
| V | **Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes** | Reconocimiento detallado de taludes en corte y laderas naturales. | 32 | 4.7 | $ 8,102,806 | $ 8,102,806 | 100% | SI | $ 14,563,471 | $ 14,563,471 | 100% | SI | $ 10,955,581 | $ 10,955,581 | 100% | SI |
| VI | **Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento** | Calicatas y apiques estructurales para identificar la estructura del pavimento existente. | 36 | 4.8 | $ 10,128,870 | $ 10,128,870 | 100% | SI | $ 21,654,696 | $ 21,654,696 | 100% | SI | $ 11,968,613 | $ 11,968,613 | 100% | SI |
| VII | **Estudio de Fuentes de Materiales** | Reconocimiento de bancos y canteras potenciales en la zona de influencia. | 46 | 4.9 | $ 4,797,788 | $ 4,797,788 | 100% | SI | $ 16,642,470 | $ 16,642,470 | 100% | SI | $ 12,696,903 | $ 12,696,903 | 100% | SI |
| VIII | **Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación** | Inspección de cauces, quebradas y ríos relacionados con la vía. | 48 | 4.10 | $ 13,167,967 | $ 13,167,967 | 100% | SI | $ 21,654,696 | $ 21,654,696 | 100% | SI | $ 15,345,387 | $ 15,345,387 | 100% | SI |
| IX | **Estudios y Diseños de Estructuras** | Inspección visual detallada de puentes, pontones y estructuras de contención existentes. | 55 | 4.11 | $ 10,598,682 | $ 10,598,682 | 100% | SI | $ 19,276,272 | $ 19,276,272 | 100% | SI | $ 13,373,155 | $ 13,373,155 | 100% | SI |
| X | **Gestión Ambiental y Social del Proyecto** | Recorridos de campo para identificación de componentes ambientales sensibles. | 60 | 4.12 | $ 17,516,102 | $ 17,516,102 | 100% | SI | $ 40,678,325 | $ 40,678,325 | 100% | SI | $ 20,418,211 | $ 20,418,211 | 100% | SI |
| XI | **Gestión Predial** | Visitas a predios para verificación de linderos, ocupaciones y construcciones afectables. | 123 | 4.14 | $ 13,958,275 | $ 13,958,275 | 100% | SI | $ 25,261,377 | $ 25,261,377 | 100% | SI | $ 14,784,986 | $ 14,784,986 | 100% | SI |
| XII | **Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto** | Verificación en campo de tipologías constructivas y longitudes reales de obras proyectadas. | 134 | 4.15 | $ 8,621,535 | $ 8,621,535 | 100% | NO | $ 13,698,442 | $ 13,698,442 | 100% | NO | $ 10,041,218 | $ 10,041,218 | 100% | NO |
| XIII | **Informe Final Ejecutivo** | No requiere trabajos de campo adicionales: compila, integra y consolida la información de los demás volúmenes. | 147 | 4.16 | $ - | $ - | NA | NO APLICA | $ - | $ - | NA | NO APLICA | $ - | $ - | NA | NO APLICA |
| | | | | **TOTAL** | $ 161,727,737 | $ 161,727,737 | 100.00% | | $ 410,812,737 | $ 410,812,737 | 100.00% | | $ 271,721,741 | $ 271,721,741 | 100.00% | |

**ING. SANTIAGO PÁEZ TALERO**
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORÍA
CONSORCIO CAMINOS IP

**ING. JORGE HERNANDO BELTRÁN CATUMBA**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO LITORAL MC

**ING. JHON WILLIAM ARDILA BACCA**
INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

**ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ**
SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
