INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA No. 02.
PARA TRÁMITE DE CUENTA No. 02

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7912853 NI. 1618/2025	30/05/2025
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EMR-APP BELLEZA**	
Nit o C.C. No.	901.949.762-6	
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**	

VALOR INICIAL:	$3.945.863.857	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$3.945.863.857	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	64.31%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	41.23%	
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES	
PLAZO TOTAL:	NUEVE (09) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7924460 NI. 1710/2025	13/06/2025
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL SOLASEC	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	901.953.373	
SUPERVISOR:	MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 18/09/2025	

FECHA DE INICIACIÓN:	25/07/2025

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	01	Fecha:	30/12/2025
No.		Fecha:	DD/MM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	01	Fecha:	29/01/2026
No.		Fecha:	DD/MM/AAAA

FECHA DE TERMINACIÓN:	24/05/2026

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	**SI**	**X**	**NO**	

VALOR A PAGAR:	$910.539.243,00

Periodo de Pago:	**Desde:**	15/12/2025	**Hasta:**	30/12/2025
	Desde:	29/01/2026	**Hasta:**	28/02/2026

No. del RP:	25003931
Fuente del RP:	ADICIONAL No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 CO1.PCCNTR-2616641 DEL 26/06/2021
No. del RP:	25003932
Fuente del RP:	ICLD – INVERSION (REORIENTADA POR LA LEY 2342-2023 DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION) REC. BCE

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	**MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
No. SSEPI	**20210680000302**
No. BPIN	**2021004680337**
Valor total del Proyecto	**$4.243.954.990**
Alcance	**EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 640 METROS LINEALES DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.7912853 DE 30/05/A2025

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7912853 NI. 1618/2025	30/05/2025
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EMR-APP BELLEZA**	
Nit o C.C. No.	901.949.762-6	
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**	

VALOR INICIAL:	$3.945.863.857	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$3.945.863.857	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:

INICIAL:	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA: $00.000.00	ACUMULADO $00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	64.31%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	41.23%	
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES	
PLAZO TOTAL:	NUEVE (09) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7924460 NI. 1710/2025	13/06/2025
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL SOLASEC	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	901.953.373	
SUPERVISOR:	MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 18/09/2025	

FECHA DE INICIACIÓN:	25/07/2025

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	01	Fecha:	30/12/2025
No.		Fecha:	DD/MM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	01	Fecha:	29/01/2026
No.		Fecha:	DD/MM/AAAA

FECHA DE TERMINACIÓN:	24/05/2026

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	25/07/2025	SE FIRMO EL ACTA DE INICIO DE OBRA DEL PRESENTE CONTRATO
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	14/11/2025	SE ACTUALIZAN LAS POLIZAS CON LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
MODIFICACION 01	19/12/2025	ACTA DE MODIFICACION SIN REALIZAR VARIACION EN EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	22/12/2025	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01
ACTA DE SUSPENSION No. 01	30/12/2025	SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ACTA DE REINICIO No. 01	29/01/2026	SE REINICIAN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	19/03/2026	SE ACTUALIZAN LAS POLIZAS CON LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE REINICIO
PRORROGA N° 01	24/03/2026	SE ADICIONAN 60 DIAS SIN ADICION PRESUPUESTAL
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	EN TRAMITE	ACTA PARCIAL N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DESDE EL 29 DE ENERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, POR UN VALOR DE $ 910.539.243,00 Y UN AVANCE DE 64.31%.

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Relación en orden cronológico de las actas de modificación de cantidades y precios no previstos y/o adicionales.

ACTO ADMINISTRTIVO	FECHA
Acta de modificación de cantidades y precios no previstos No. 01	19/12/2025
JUSTIFICACIÓN: Una vez el contratista realiza el balance de cantidades mayores, menores e items no previstos de tal manera que dé cumplimiento con el valor original del contrato, por parte de la interventoria se aprueba el día nueve (09) de noviembre de 2025 y da visto bueno para continuar con la ejecución del contrato y se deja acta modificatoria No. 1 con fecha del diecinueve (19) de diciembre de 2025	

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	
1.	Preliminares de obra	Se realizó del desmonte en la zona no boscosa, excavaciones varias y en roca, la conformación de la calzada existente, los terraplenes entre la abscisa k0+040 al k0+115 del tramo 1. De igual manera, se realizó también la remoción de la cerca de alambre.	1	$27.019.581,00	Anexo No, A Memorias de Cantidades Anexo No, B Registro Fotográfico Anexo No, C Bitácora de Obra
2.	Filtros	Se realizaron las actividades contempladas en el proceso constructivo del filtro. Una vez alcanzado los niveles de acuerdo a los planos y emitido el aval de la interventoría, se realizó la instalación del geotextil, posterior a esto, se realizó el vaciado del material filtrante y la instalación de la tubería ranurada en el tramo 1 del alcance del objeto contractual. Previo a esto, se realizó la instalación e los materiales de relleno.	1	$30.984.263,00	
3.	Tratamiento de Taludes	Se realizaron las actividades excavaciones en material común y en material en roca, realizando la conformación de la zona para la instalación del canal en suelo cemento. De igual manera, una vez aprobada los niveles de excavación, se realizó la construcción de la canaleta en suelo cemento sección trapezoidal (1.00x0.40x0.40) m.	1	$12.010.061,00	

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	
4.	Estructura del pavimento rígido	Se ejecutaron las actividades de suministro, extendido y compactación de la subbase granular, así como la construcción del pedraplén, en el tramo 1 comprendido entre las abscisas K0+040 y K0+115. Se realizó la instalación del geotextil, con el fin de separar los agregados y evitar el material agregado se mezclen con el pedraplén. De igual manera, se llevó a cabo la conformación del pedraplén mediante la fracturación y adecuación de las rocas. La instalación y geometria de los agregados mencionados fue verificada mediante control topográfico y posteriormente avalada por la interventoría. Por otro lado, se realizó la instalación del acero, de acuerdo a los planos estructurales, una vez la interventoría aprobara el acero, se realizó la construcción del Pavimento en el tramo 2 entre la abscisa k0+000 al k0+180 y del k0+230 al k0+300, además, en el tramo 1, en un carril desde la abscisa k0+230 al k0+340.	1	$619.992.798,00	
5.	Cunetas	Se realizó la instalación del acero de acuerdo a los detalles estructurales, una vez la interventoría realizo la aprobación, se realizó el vaciado del concreto de las cunetas en el tramo 2 entre la abscisa k0+000 al k0+180 y del k0+230 al k0+300. De igual manera, se realizó el relleno con material común.	1	$161.264.468,00	
6.	Obras Hidráulicas	Se realizaron los movimientos de tierra, con el fin de nivelar el terreno para la construcción de los disipadores. Una vez la interventoría aprobara los niveles, se realizo el vaciado del solado. Posterior a esto, se realizó el amare del acero de acuerdo a los detalles estructurales. Una vez la interventoría aprobada el acero, se realizó el vaciado del concreto de las vigas, el piso y los muros de los disipadores en la alcantarilla 3 del tramo 2 y en la alcantarilla 1 en el tramo 1.	1	$23.448.129,00	
7.	Varios	Se realizó el transporte del material producto de los preliminares de obra	1	$20.500.753,00	
8.	Implementación del Plan de Manejo Ambiental	Se realizó la implementación del plan de manejo ambiental, de acuerdo al avance que se puede evidenciar en el informe y presupuesto del seguimiento del PMA	1	$10.171.200,00	
9.	Implementación del Plan de Manejo Transito	Se realizó la implementación del plan de manejo de tránsito, de acuerdo al avance que se puede evidenciar en el informe y el presupuesto del seguimiento del PMT	1	$5.147.990,00	

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO
PARCIAL No. 01	25/07/2025	14/12/2025	$1.627.033.190.00	41,23%	59,25%
ACTUAL	15/12/2025	28/02/2026	$910.539.243,00	23,08%	28,38%
TOTAL ACUMULADO			$2.537.572.433,00	64,31%	87,63%

OBSERVACIONES:	
El análisis del cronograma de ejecución de la obra evidencia un avance físico del 64,31%, mientras que, de acuerdo con la programación general establecida, el avance esperado corresponde al 87,63%. Esta diferencia permite identificar un desfase del 23,32% en el desarrollo de las actividades programadas. Dicho retraso se manifiesta en desviaciones entre los avances planificados y los avances realmente ejecutados, lo cual incide directamente en el cumplimiento de los hitos de obra y en los plazos contractuales inicialmente establecidos. La principal causa de esta situación se asocia a las condiciones climáticas adversas, particularmente a las fuertes precipitaciones registradas durante la ejecución del contrato, las cuales han generado la suspensión temporal de actividades durante la jornada laboral y la necesidad de realizar reprocesos constructivos en algunas frentes de trabajo. Adicionalmente, estas condiciones climáticas han provocado derrumbes en la única vía de acceso al proyecto, situación que ha dificultado la movilidad y el abastecimiento oportuno de materiales, equipos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades contractuales, generando retrasos en la logística de transporte y, en consecuencia, afectando el ritmo de ejecución de la obra.	Anexo No, D Programación de obra.

9.4.3. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo evaluado se registraron condiciones climáticas adversas caracterizadas por precipitaciones continuas y de alta intensidad durante los meses de enero y febrero de 2026, las cuales incidieron directamente en el desarrollo normal de las actividades contractuales programadas en el proyecto.

De acuerdo con reportes emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), durante el inicio del año 2026 se presentó un comportamiento pluviométrico superior a los promedios históricos en amplias zonas del territorio nacional, particularmente en el departamento de Santander. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el volumen de precipitaciones registró incrementos cercanos al 50 %, evidenciando un escenario climático atípico para esta época del año.

Adicionalmente, el IDEAM reportó que más de 552 municipios del país se encontraban en estado de alerta por riesgo de deslizamientos, de los cuales 15 municipios pertenecen al departamento de Santander, debido a la saturación de suelos y al incremento en los niveles de escorrentía superficial generados por las lluvias persistentes.

Desde el punto de vista climatológico regional, el departamento de Santander presenta durante el primer trimestre del año niveles promedio de precipitación entre 180 mm y 195 mm

mensuales, con aproximadamente 16 a 19 días de lluvia por mes, condiciones que favorecen altos niveles de humedad relativa cercanos al 86-87 % y suelos con tendencia a la saturación.

En este contexto, la provincia de Vélez, en el departamento de Santander, ha enfrentado una temporada invernal particularmente intensa, caracterizada por lluvias persistentes que han generado múltiples afectaciones en zonas rurales y corredores viales secundarios. Las precipitaciones continuas han ocasionado saturación de suelos, incremento del caudal de quebradas y drenajes naturales, así como un aumento significativo del riesgo de movimientos en masa, especialmente en municipios con topografía montañosa y alta susceptibilidad geológica.

Uno de los sectores más afectados durante el periodo analizado ha sido el corredor vial que comunica los municipios de La Belleza y Jesús María, el cual constituye una vía secundaria estratégica para la movilidad de las comunidades rurales y la comercialización de productos agrícolas de la región. Las lluvias prolongadas han generado derrumbes recurrentes, caída de material rocoso y procesos de inestabilidad en taludes naturales, ocasionando la obstrucción parcial y en algunos casos total del tránsito vehicular en varios tramos del corredor. Adicionalmente, se han evidenciado procesos de pérdida parcial de banca y debilitamiento estructural de la plataforma vial, incrementando el riesgo de colapso en sectores geotécnicamente inestables. La saturación del terreno ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de esta vía, la cual en gran parte carece de pavimentación definitiva y de sistemas de drenaje longitudinal y transversal adecuados para la evacuación eficiente de aguas superficiales.

Cada evento de precipitación intensa genera nuevos deslizamientos de material y acumulación de sedimentos sobre la calzada, situación que ha obligado a realizar cierres preventivos de la vía y trabajos constantes de remoción de derrumbes mediante maquinaria amarilla, labores que han sido apoyadas por las administraciones municipales y organismos locales de gestión del riesgo.

En el marco de la ejecución del contrato objeto del presente informe, y considerando los reprocesos constructivos derivados de las condiciones climáticas adversas, el contratista ha implementado un plan de contingencia orientado a mitigar el atraso acumulado y optimizar los rendimientos de obra. Sin embargo, la efectividad de dichas medidas se ha visto limitada debido a la persistencia de precipitaciones pluviales intensas y recurrentes en el área de intervención, lo cual ha restringido la operatividad normal de las actividades programadas.

Estas condiciones han impactado directamente en la productividad de los frentes de trabajo, afectando especialmente actividades relacionadas con movimientos de tierra, conformación de

estructuras, estabilización de taludes, transporte de materiales y ejecución de obras civiles que requieren condiciones climáticas favorables para su adecuada implementación.

De igual manera, la limitada capacidad operativa y el estado de la vía de acceso entre los municipios de Jesús María y La Belleza genera frecuentes congestiones vehiculares durante los eventos de derrumbe o labores de limpieza de la vía. En múltiples ocasiones se han registrado filas de vehículos que se extienden por varios kilómetros, mientras se realizan maniobras para remover material o rescatar vehículos atrapados en sectores con suelos altamente saturados.

En algunos casos, el tránsito debe habilitarse de manera intermitente y en un solo carril, lo que incrementa considerablemente los tiempos de desplazamiento y genera retrasos en el transporte de materiales, equipos, maquinaria y personal hacia el frente de obra.

En consecuencia, el cronograma de ejecución del proyecto ha presentado afectaciones relevantes, generando desviaciones respecto a los plazos originalmente establecidos. Cabe resaltar que el comportamiento de las precipitaciones durante el periodo evaluado no ha seguido un patrón predecible que permita optimizar la planificación de las jornadas laborales para maximizar los rendimientos de obra.

No obstante, con el propósito de mitigar los efectos del atraso acumulado, el contratista, con la respectiva autorización de la interventoría, ha programado jornadas extraordinarias de trabajo durante días dominicales y festivos. Sin embargo, debido a la persistencia de las lluvias y a las condiciones de humedad y saturación del terreno, continúan presentándose limitaciones operativas que impiden desarrollar las actividades con los rendimientos técnicos inicialmente previstos, generando impactos directos en el avance físico del proyecto.
Ver Anexo No. B – Registro fotográfico y Anexo M - Registro Estado del Tiempo

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Diligenciamiento de la bitácora de obra	Anexo No, A Memorias de Cantidades Anexo No, C Bitácora de Obra Anexo No, D Programación de obra. Anexo No, E Planilla de Seguridad Social Anexo No. F Pólizas Actualizadas
Seguimiento a la programación	
Mantener comunicación permanente con la administración municipal, la veeduría, la comunidad, la interventoría y la supervisión del contrato	
Afiliación del personal al sistema de seguridad social.	
Pago de planillas de seguridad social del periodo.	
Actualización de las pólizas del contrato	
Entrega de dotación al personal de obra	

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Realización de charlas de capacitación al personal sobre Seguridad y salud en el trabajo	Anexo No. G Informe HSEQ
Elaboración de memorias de cantidades	

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	25%	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	1.098.717.479	25/07/2025	INDEFINIDA
RESIDENTE DE OBRA	100%	OSCAR DAVID VERA ROJAS	1.098.672.955	25/07/2025	INDEFINIDA
INGENIERO AUXILIAR	100%	CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN	1.101.178.503	25/07/2025	INDEFINIDA
PROFESIONAL HSEQ	90%	MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO	1.098.755.645	25/07/2025	INDEFINIDA
ESPECIALISTA EN VÍAS O PAVIMENTO	20%	JOSE RAFAEL MOLINA ZAMBRANO	1.095.817.584	01/08/2025	30/11/2025
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20%	JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENAS	1.095.924.967	01/08/2025	30/11/2025
PROFESIONAL SOCIAL	10%	FRANCISCA BOLIVAR CAMPUZANO	26.996.881	01/08/2025	30/11/2025
COMISIÓN TOPOGRÁFICA	90%	YADIRA DURAN GARCIA	37.893.183	25/07/2025	INDEFINIDA
PROFESIONAL PMP	90%	SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS	53.081.449	01/08/2025	INDEFINIDA
INGENIERO AMBIENTAL	50%	RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES	91.488.767	01/08/2025	INDEFINIDA

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control

pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Nombre: LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	02-02-2026
	Nº de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 100.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	02-02-2026
	Nº de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 400.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	02-02-2026
	Nº de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 174.000
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 120.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 480.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 125.300
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	Nº de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 120.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	Nº de Planilla	36737266

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 480.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	Nº de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 120.000
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

Nombre: OSCAR DAVID VERA ROJAS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	Nº de Planilla	85035821
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 402.500
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	14-04-2026
	Nº de Planilla	85035821
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 515.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	14-04-2026
	Nº de Planilla	85035821
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 224.200
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	$64.400
	I.C.B.F.	$96.600
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	Nº de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 402.500
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	Nº de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 515.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	Nº de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 224.200
	A.R.L.	COLMENA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
PARAFISCALES	SENA	$64.400
	I.C.B.F.	$96.600
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	Nº de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 402.500
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	Nº de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 515.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	Nº de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 224.200
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	$64.400
	I.C.B.F.	$96.600
	Caja de Compensación	COMFENALCO

Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN

Cargo: INGENIERO AUXILIAR

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	02-02-2026
	Nº de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.300.000
	Valor cotizado	$ 92.000
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	02-02-2026
	Nº de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.300.000
	Valor cotizado	$ 368.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	02-02-2026
	Nº de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.300.000
	Valor cotizado	$ 160.100
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	36426892

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 104.300
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 417.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 181.500
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	Nº de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 104.300
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	Nº de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 417.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	Nº de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 181.500
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

Nombre: MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO

Cargo: PROFESIONAL HSEQ

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	13-01-2026
	Nº de Planilla	2753497
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.560.000
	Valor cotizado	$ 195.000
	EPS	SALUD MIA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	13-01-2026
	Nº de Planilla	2753497
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.560.000
	Valor cotizado	$ 249.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	13-01-2026
	N° de Planilla	2753497
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.560.000
	Valor cotizado	$ 16.300
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	06-02-2026
	N° de Planilla	46836850
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SALUD MIA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	06-02-2026
	N° de Planilla	46836850
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	06-02-2026
	N° de Planilla	46836850
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 18.300
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	03-03-2026
	N° de Planilla	62419101
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SALUD MIA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	03-03-2026
	N° de Planilla	62419101
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	03-03-2026
	N° de Planilla	62419101
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 18.300
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Nombre: YADIRA DURAN GARCIA

Cargo: TOPOGRAFA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	29-12-2025
	N° de Planilla	82582941
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	29-12-2025
	N° de Planilla	82582941
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	29-12-2025
	N° de Planilla	82582941
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865750
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865750
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865750
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865767
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865767
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Nº de Planilla	83865767
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Nombre: SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS

Cargo: PROFESIONAL PMP

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83865971
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83865971
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83865971
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83866003
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83866003
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83866003
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
SALUD	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83866008
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83866008
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83866008
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Nombre: RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES

Cargo: INGENIERO AMBIENTAL

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	25-02-2025
	Nº de Planilla	83917730
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	25-02-2025
	Nº de Planilla	83917730
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	25-02-2025
	Nº de Planilla	83917730
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	Nº de Planilla	83917732
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	Nº de Planilla	83917732
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Fecha de pago	25-02-2026
	Nº de Planilla	83917732
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	Nº de Planilla	83917737
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	Nº de Planilla	83917737
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	Nº de Planilla	83917737
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 465-47-994000013420 anexo 03			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 19/03/2026			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO	$789.172.771,40	30/05/2025	24/09/2026
SALARIOS	$394.586.385,70	30/05/2025	24/03/2029
ESTABILIDAD	$1.183.759.157,10	5 años	
OTRAS			

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 465-74-994000003979 anexo 04			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 19/03/2026			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$700.362.000,00	31/12/2025	24/03/2026
OTRAS			

Ver Anexo No. F, Pólizas Actualizadas

2.5.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

Ver Anexo No. J, Certificado ICA .

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Trámite de acta de recibo No. 02 – En tramite	Anexo No. A. Memorias de Cantidades

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	$3.945.863.857,00
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR TOTAL:	$3.945.863.857,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	41.23%

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
25000 983	29/03/2025	$2.500.000.000,00	25003 931	05/06/2025	$2.500.000.000.00	$1.627.033.190,00	$872.966.810.00
25000 984	29/03/2025	$1.701.907.367,00	25003 932	05/06/2025	$1.445.863.857.00	$00,00	$1.445.863.857.00

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	DD/MMM/AAAA	$00.000.00	NO APLICA
ACTA PARCIAL No. 01	22/12/2025	$1.627.033.190.00	$00.000.00
PRESENTE ACTA	EN TRAMITE	$910.539.243,00	$00.000.00
TOTAL		**$2.537.572.433,00**	**$00.000.00**

2.7 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Punto de atención a la comunidad	Anexo No, H Informe Seguimiento Plan de Manejo de Transito Anexo No, I Informe Seguimiento Plan de Manejo Ambiental
Dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores	
Señalización de obra y Plan de Manejo de Tráfico	
Seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	
Revisión de la documentación de los permisos otorgados a la cantera	
Seguimiento al programa de ahorro eficiente del agua	

2.8 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
Revisión de los resultados de laboratorio que se realizan a las pruebas y ensayos, control a los materiales, maquinaria y equipo, calidad del personal, calidad y cantidad de la señalización preventiva, cumplimiento de la seguridad industrial y social, control de pólizas, cumplimiento del programa de trabajo.	Anexo No, K Ensayos de Laboratorio del contratista de obra.

2.8.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas el contratista de obra realizó los siguientes ensayos:

LABORATORIO: FWF GEOINGENIERIA S.A.S		EVIDENCIAS	Anexo No, K Ensayo de Laboratorio	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO
Ensayo de Densidades del material granular instalado	3	I.N.V. E - 161	% Compactación del Terreno	Cumplimiento del porcentaje promedio de compactación
Ensayo de comprensión en cilindros de concreto del pavimento	2	I.N.V. E – 410 ASTM C39	Resistencia a compresión	Resistencia a los 28 días cumplida
Ensayo de comprensión en cilindros de concreto del pavimento	3	I.N.V. E – 410 ASTM C39	Resistencia a compresión	Resistencia a los 28 días cumplida
Ensayo de comprensión en cilindros de concreto del pavimento	2	I.N.V. E – 410 ASTM C39	Resistencia a compresión	Resistencia a los 14 días cumplida
OBSERVACIONES:				

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Volqueta	2	7 m3
Retroexcavadora	1	-
Vibro compactador	1	-
Saltarin	1	-
Mezcladora de concreto	1	1 Bulto
Tronzadora	1	2300W 4200RPM
Carmix	1	2.5 m3

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
ACTA DE COMITÉ No. 07	11/03/2026 8:30 A.M.	CUMPLIMIENTO A LA PROGAMACION DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	Anexo No, N Actas de Comité

3. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A. **Durante el desarrollo del contrato se han presentado condiciones climáticas atípicas, caracterizadas por precipitaciones intensas y persistentes durante varios periodos de ejecución, situación que ha incidido directamente en el desarrollo normal de las actividades programadas dentro del cronograma contractual. Estas condiciones han limitado la operatividad de los frentes de trabajo, particularmente en actividades que requieren condiciones mínimas de estabilidad del terreno y adecuada transitabilidad para su ejecución.**

B. **Como consecuencia de las lluvias registradas, se han generado eventos recurrentes de remoción en masa y deslizamientos de material sobre la única vía de acceso al proyecto, ocasionando obstrucciones parciales y totales que han restringido el ingreso oportuno de personal, maquinaria, equipos y materiales de construcción. Esta situación ha afectado la continuidad operativa de las labores constructivas y ha generado disminuciones significativas en los rendimientos de obra inicialmente previstos.**

C. **Las afectaciones descritas corresponden a factores externos asociados a condiciones climáticas adversas y fenómenos naturales, los cuales se consideran eventos ajenos al control operativo del contratista y, por tanto, no imputables a su gestión técnica o administrativa. Particularmente, el corredor vial que comunica los municipios de La Belleza y Jesús María ha presentado condiciones críticas de transitabilidad durante el presente periodo, debido a derrumbes constantes, caída de material rocoso y procesos de pérdida parcial de banca en diversos tramos, lo cual compromete la estabilidad de la vía y aumenta el riesgo de colapso en sectores geotécnicamente inestables.**

D. **La incidencia de estas condiciones sobre el desarrollo del proyecto se encuentra debidamente documentada mediante, registros fotográficos, bitácoras de campo y reportes meteorológicos, los cuales evidencian la intensidad y recurrencia de las precipitaciones, así como los eventos de inestabilidad del terreno que han afectado la transitabilidad del corredor vial utilizado como acceso principal al frente de obra.**

E. **De acuerdo con reportes emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el departamento de Santander ha registrado niveles elevados de precipitación y saturación de suelos, lo que ha llevado a las autoridades a declarar alerta roja en varios municipios por riesgo de deslizamientos, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas. Dentro de los municipios con mayor nivel de alerta se encuentran La Belleza, Sucre y Jesús María, donde las condiciones topográficas y geológicas incrementan la susceptibilidad a eventos de remoción en masa, particularmente en zonas de ladera y corredores viales rurales.**

F. **En consideración de los factores anteriormente expuestos y bajo el principio de equilibrio económico y técnico del contrato, se concluye que las afectaciones al cronograma de ejecución obedecen a circunstancias externas debidamente sustentadas. En consecuencia, desde el punto de vista técnico y administrativo se considera procedente la evaluación y otorgamiento de una prórroga al plazo contractual, equivalente al tiempo efectivamente impactado por las condiciones climáticas adversas, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades pendientes y el cumplimiento integral del objeto contractual.**

4. ANEXOS

A. Memoria de cantidades.
B. Registro fotográfico.
C. Bitácora de obra.
D. Programación de obra.
E. Planillas de seguridad social del contratista de obra.
F. Pólizas Actualizadas.
G. Informe HSEQ.
H. Informe Seguimiento Plan de Manejo de Tránsito.
I. Informe Seguimiento Plan de Manejo Ambiental.
J. Certificación ICA.
K. Ensayos de Laboratorio del contratista de obra.
L. Informe de Topografía
M. Relación Estado del tiempo
N. Acta de Comité

WILMER ANDRES GARCIA RUIZ
C.C. No 1.114.119.732 de Bolívar, Valle del Cauca
R.L. CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

ANEXO AL ACTA Nº 02 DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.7912853

CODIGO	AP-CCP-RG-45
VERSION	0
FECHA DE APROBACION	22/03/2023
PAGINA	1 DE 1

GOBERNACION DE SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.7912853 DE 30 DE MAYO 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR: $3.945.863.857 **PORCENTAJE DE EJECUCION: 64,31%**

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS, Nº 01)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1		PRELIMINARES DE OBRA											
1,01	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	HA	0,26	$ 6.099.800,00	$ 1.585.948,00	0,24	$ 6.099.800,00	$ 1.463.952,00	0,02	$ 121.996,00	0,24	$ 1.463.952,00
1,02	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	297,58	$ 184.057,00	$ 54.771.882,00	393,65	$ 184.057,00	$ 72.454.038,00	44,98	$ 8.278.884,00	367,54	$ 67.648.310,00
1,03	210.1.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	2678,18	$ 41.834,00	$ 112.038.982,00	4163,14	$ 41.834,00	$ 174.160.799,00	404,82	$ 16.935.240,00	3928,07	$ 164.326.881,00
1,04	310.1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	4992,00	$ 3.165,00	$ 15.799.680,00	5101,72	$ 3.165,00	$ 16.146.944,00	351,58	$ 1.112.751,00	4751,56	$ 15.038.688,00
1,05	201.16	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	M	1110,00	$ 3.981,00	$ 4.418.910,00	932,00	$ 3.981,00	$ 3.710.292,00	142,00	$ 565.302,00	932,00	$ 3.710.292,00
1,06	220.1	TERRAPLENES	M3	305,53	$ 49.167,00	$ 15.021.994,00	37,71	$ 49.167,00	$ 1.854.088,00	0,11	$ 5.408,00	37,05	$ 1.821.637,00
1,07	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	35,60	$ 229.192,00	$ 8.159.235,00	0,00	$ 229.192,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL PRELIMINARES DE OBRA				**$ 211.796.431,00**			**$ 269.790.113,00**		**$ 27.019.581,00**		**$ 254.009.760,00**
2		FILTROS											
2,01	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	40,80	$ 211.065,00	$ 8.611.452,00	45,71	$ 211.065,00	$ 9.647.781,00	5,68	$ 1.198.849,00	42,57	$ 8.985.037,00
2,02	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA FILTRO	M3	367,20	$ 78.908,00	$ 28.975.018,00	411,31	$ 78.908,00	$ 32.455.649,00	51,10	$ 4.032.199,00	383,04	$ 30.224.921,00
2,03	231.1.2	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	2475,44	$ 13.479,00	$ 33.366.456,00	7352,61	$ 13.479,00	$ 99.105.630,00	628,58	$ 8.472.630,00	6866,93	$ 92.559.350,00
2,04	610.8	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	306,00	$ 318.673,00	$ 97.513.938,00	244,83	$ 318.673,00	$ 78.020.711,00	30,42	$ 9.694.033,00	228,01	$ 72.660.631,00
2,05	1P	DREN EN TUBERÍA PERFORADA 4"	ML	850,00	$ 51.068,00	$ 43.407.800,00	680,08	$ 51.068,00	$ 34.730.325,00	84,50	$ 4.315.246,00	633,35	$ 32.343.918,00
2,06	610.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	119,00	$ 322.614,00	$ 38.391.066,00	81,61	$ 322.614,00	$ 26.328.529,00	10,14	$ 3.271.306,00	76,00	$ 24.518.664,00
		SUBTOTAL FILTROS				**$ 250.265.730,00**			**$ 280.288.825,00**		**$ 30.984.263,00**		**$ 261.292.521,00**
3		ALCANTARILLAS											
3,01	201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	7,56	$ 174.785,00	$ 1.324.870,00	0,00	$ 174.785,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,02	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	21,00	$ 211.065,00	$ 4.432.365,00	31,05	$ 211.065,00	$ 6.553.568,00	0,00	$ 0,00	31,05	$ 6.553.568,00
3,03	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS	M3	189,00	$ 78.908,00	$ 14.913.612,00	279,48	$ 78.908,00	$ 22.053.208,00	0,00	$ 0,00	278,48	$ 22.053.208,00
3,04	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	1736,78	$ 11.838,00	$ 20.560.002,00	1586,03	$ 11.838,00	$ 18.775.423,00	0,00	$ 0,00	1586,03	$ 18.775.423,00
3,05	661.1.2	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 (MM) DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	21,00	$ 790.052,00	$ 16.591.092,00	28,00	$ 790.052,00	$ 22.121.456,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 22.121.456,00
3,06	630.1.6	SUMINISTRO CONCRETO CLASE F, PARA ESTRUCTURAS. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN.	M3	2,40	$ 1.209.807,00	$ 2.903.537,00	3,87	$ 1.209.807,00	$ 4.681.953,00	0,00	$ 0,00	3,87	$ 4.681.953,00
3,07	630.1.4.1	SUMINISTRO CONCRETO CLASE D, PARA ESTRUCTURAS. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN.	M3	28,08	$ 1.754.521,00	$ 49.266.950,00	22,49	$ 1.754.521,00	$ 39.459.177,00	0,00	$ 0,00	22,49	$ 39.459.177,00
3,08	610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	7,56	$ 60.625,00	$ 458.325,00	24,48	$ 60.625,00	$ 1.484.100,00	0,00	$ 0,00	24,48	$ 1.484.100,00

3,09	630.1.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) (CICLOPEO)	M3	11,70	$ 1.028.343,00	$ 12.031.613,00	12,00	$ 1.028.343,00	$ 12.340.116,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 12.340.116,00
3,10	610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	68,04	$ 272.778,00	$ 18.559.815,00	63,54	$ 272.778,00	$ 17.332.314,00	0,00	$ 0,00	63,54	$ 17.332.314,00
		SUBTOTAL ALCANTARILLAS				**$ 141.042.181,00**			**$ 144.801.315,00**		**$ 0,00**		**$ 144.801.315,00**
4		**TRATAMIENTO DE TALUDES**											
4,01	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	M2	83,85	$ 10.765,00	$ 902.645,00	300,00	$ 10.765,00	$ 3.229.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,02	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS	M3	75,47	$ 78.908,00	$ 5.955.187,00	138,35	$ 78.908,00	$ 10.916.922,00	24,95	$ 1.968.755,00	24,95	$ 1.968.755,00
4,03	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	8,39	$ 211.065,00	$ 1.770.835,00	15,37	$ 211.065,00	$ 3.244.069,00	2,77	$ 584.650,00	2,77	$ 584.650,00
4,04	630.1.6	SUMINISTRO CONCRETO CLASE F, PARA ESTRUCTURAS. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN.	M3	2,00	$ 1.209.807,00	$ 2.419.614,00	0,00	$ 1.209.807,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,05	231.1.2	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	40,00	$ 13.479,00	$ 539.160,00	0,00	$ 13.479,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,06	681.1	GAVIÓN EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	60,00	$ 644.305,00	$ 38.658.300,00	0,00	$ 644.305,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,07	610.8	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	30,40	$ 318.673,00	$ 9.687.659,00	0,00	$ 318.673,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,08	610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	20,00	$ 272.778,00	$ 5.455.560,00	0,00	$ 272.778,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,09	2P	DREN EN TUBERIA PVC 3"	ML	20,00	$ 41.131,00	$ 822.620,00	0,00	$ 41.131,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,10	810,1	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	83,85	$ 65.348,00	$ 5.479.430,00	300,00	$ 65.348,00	$ 19.604.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,11	3P	CANALETA EN SUELO CEMENTO SECCIÓN TRAPEZOIDAL (1X0,4X0,4) m	ML	26,00	$ 214.924,00	$ 5.588.024,00	44,00	$ 214.924,00	$ 9.456.656,00	44,00	$ 9.456.656,00	44,00	$ 9.456.656,00
4,12	674.1	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	ML	135,00	$ 501.270,00	$ 67.671.450,00	0,00	$ 501.270,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL TRATAMIENTO DE TALUDES				**$ 144.950.484,00**			**$ 46.451.547,00**		**$ 12.010.061,00**		**$ 12.010.061,00**
5		**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO**											
5,01	320.3.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-38	M3	1614,48	$ 322.614,00	$ 585.376.651,00	1530,52	$ 322.614,00	$ 493.767.179,00	105,47	$ 34.026.099,00	1425,46	$ 459.873.353,00
5,02	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES CBR > 10%	M3	708,64	$ 237.927,00	$ 168.604.589,00	0,00	$ 237.927,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,03	221.1	PEDRAPLEN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO	M3	1020,38	$ 214.865,00	$ 219.243.949,00	1801,07	$ 214.865,00	$ 386.986.906,00	74,96	$ 16.106.280,00	1715,63	$ 368.628.195,00
5,04	4P	CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLÉN COMPACTO (Incluye fracturamiento de rocas a tamaño según especificación No incluye la piedra rajón)	M3	356,38	$ 49.561,00	$ 17.662.549,00	137,84	$ 49.561,00	$ 6.831.488,00	15,30	$ 758.283,00	126,63	$ 6.275.909,00
5,05	500.1.2	PAVIMENTO HIDRÁULICO (CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR40 (kg/cm2))	M3	729,60	$ 1.353.734,00	$ 987.684.326,00	793,58	$ 1.353.734,00	$ 1.074.296.228,00	379,62	$ 513.904.501,00	379,62	$ 513.904.501,00
5,06	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	7373,88	$ 11.838,00	$ 87.291.991,00	9780,17	$ 11.838,00	$ 115.777.652,00	4662,75	$ 55.197.635,00	4662,75	$ 55.197.635,00
5,07	5P	SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	1756,00	$ 46.061,00	$ 80.883.116,00	2390,03	$ 46.061,00	$ 110.087.172,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO				**$ 2.146.747.171,00**			**$ 2.187.746.625,00**		**$ 619.992.798,00**		**$ 1.403.879.593,00**
6		**CUNETAS**											
6,01	671.1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	170,23	$ 1.614.091,00	$ 274.766.711,00	172,51	$ 1.614.091,00	$ 278.446.838,00	70,00	$ 112.986.370,00	70,00	$ 112.986.370,00
6,02	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	9135,94	$ 11.838,00	$ 108.151.258,00	9362,03	$ 11.838,00	$ 110.827.711,00	3822,17	$ 45.246.848,00	3822,17	$ 45.246.848,00
6,03	610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	287,31	$ 60.625,00	$ 17.418.169,00	119,20	$ 60.625,00	$ 7.228.500,00	50,00	$ 3.031.250,00	50,00	$ 3.031.250,00
		SUBTOTAL CUNETAS				**$ 400.336.138,00**			**$ 396.501.049,00**		**$ 161.264.468,00**		**$ 161.264.468,00**
7		**OBRAS HIDRAULICAS (DESCOLES, DISIPADORES DE ENERGIA, ZANJAS DE CORONACION)**											
7,01	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	26,21	$ 211.065,00	$ 5.954.144,00	2,76	$ 211.065,00	$ 582.539,00	2,72	$ 574.097,00	2,72	$ 574.097,00
7,02	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS	M3	253,89	$ 78.908,00	$ 20.033.952,00	24,89	$ 78.908,00	$ 1.964.020,00	24,47	$ 1.930.879,00	24,47	$ 1.930.879,00
7,03	630.1.6	SUMINISTRO CONCRETO CLASE F, PARA ESTRUCTURAS. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN.	M3	11,38	$ 1.209.807,00	$ 13.767.604,00	2,55	$ 1.209.807,00	$ 3.085.008,00	2,55	$ 3.085.008,00	2,55	$ 3.085.008,00
7,04	630.1.4.1	SUMINISTRO CONCRETO CLASE D. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN	M3	29,40	$ 1.682.317,00	$ 49.460.120,00	6,22	$ 1.682.317,00	$ 10.464.012,00	6,22	$ 10.464.012,00	6,22	$ 10.464.012,00
7,05	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2817,92	$ 11.838,00	$ 33.358.537,00	624,61	$ 11.838,00	$ 7.394.133,00	624,61	$ 7.394.133,00	624,61	$ 7.394.133,00
7,06	3P	CANALETA EN SUELO CEMENTO SECCIÓN TRAPEZOIDAL (1X0,4X0,4) m	ML	70,00	$ 214.924,00	$ 15.044.680,00	0,00	$ 214.924,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL OBRAS HIDRAULICAS (DESCOLES, DISIPADORES DE ENERGÍA, ZANJAS DE CORONACION)				**$ 137.619.037,00**			**$ 23.489.712,00**		**$ 23.448.129,00**		**$ 23.448.129,00**

8		SEÑALIZACION											
8.01	6P	PINTURA IMPRIMANTE BASE PARA DEMARCACIÓN	ML	1280.00	$ 3,641.00	$ 4,660,480.00	1788.00	$ 3,641.00	$ 6,510,108.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.02	700.1	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	1280.00	$ 4,139.00	$ 5,297,920.00	1788.00	$ 4,139.00	$ 7,400,532.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.03	710.1.1	SEÑAL SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA DE 75X75 CM. CALIBRE 16, RETRORREFLECTIVA TIPO IV.	UND	27.00	$ 1,084,597.00	$ 29,284,119.00	33.00	$ 1,084,597.00	$ 35,791,701.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.04	710.1.5	SEÑAL VERTICAL TIPO IV (DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL)	UND	22.00	$ 1,157,122.00	$ 25,456,684.00	24.00	$ 1,157,122.00	$ 27,770,928.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.05	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	280.00	$ 555,562.00	$ 155,557,360.00	185.00	$ 555,562.00	$ 102,778,970.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.06	730.1	TERMINAL DE ABATIMIENTO	UND	12.00	$ 3,412,742.00	$ 40,952,904.00	14.00	$ 3,412,742.00	$ 47,778,388.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07	740.1	INSTALACIÓN DE CATPAFAROS PARA BARRERAS	UND	89.00	$ 22,094.00	$ 1,966,366.00	54.00	$ 22,094.00	$ 1,193,076.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.08	701.1.1	TACHA REFLECTIVAS PARA DEMARCACIÓN	UND	240.00	$ 17,717.00	$ 4,252,080.00	225.00	$ 17,717.00	$ 3,986,325.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.09	710.1.3	POSTES DE REFERENCIA	UND	2.00	$ 793,039.00	$ 1,586,078.00	2.00	$ 793,039.00	$ 1,586,078.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
		SUBTOTAL SENALIZACION				$ 268,013,891.00			$ 234,796,106.00		$ 0.00		$ 0.00
9		VARIOS											
9.01	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, ALCANTARILLAS, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIA MAYORES A 1000 METROS.	M3/KM	24933.36	$ 2,781.00	$ 69,339,674.00	74377.44	$ 2,781.00	$ 206,843,661.00	/ 7371.72	$ 20,500,753.00	68648.28	$ 190,910,866.00
9.02	800.2	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO (CUATRO FILAS)	ML	1280.00	$ 52,324.00	$ 66,974,720.00	932.00	$ 52,324.00	$ 48,766,968.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.03	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBRES	M3	24.00	$ 24,553.00	$ 589,272.00	0.00	$ 24,553.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.04	900.3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)	M3/KM	288.00	$ 2,781.00	$ 800,928.00	0.00	$ 2,781.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
		SUBTOTAL VARIOS				$ 137,704,594.00			$ 255,609,629.00		$ 20,500,753.00		$ 190,910,866.00
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU						$ 3,839,476,767.00			$ 3,839,474,921.00		$ 895,220,053.00		$ 2,451,616,713.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT						$ 56,191,700.00			$ 56,191,700.00		$ 5,147,990.00		$ 45,895,720.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA						$ 50,196,400.00			$ 50,196,400.00		$ 10,171,200.00		$ 40,060,000.00
COSTO TOTAL						$ 3,945,863,867.00			$ 3,945,863,021.00		$ 910,539,243.00		$ 2,537,672,433.00
AJUSTE PRESUPUESTO						$ 0.00			$ 836.00		$ 0.00		$ 0.00
VALOR TOTAL OBRA						$ 3,945,863,867.00			$ 3,945,863,857.00		$ 910,539,243.00		$ 2,537,672,433.00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO (0,0%)						$ 0.00			$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
TOTAL A PAGAR						$ 0.00			$ 0.00		$ 910,539,243.00		$ 2,537,672,433.00

INTERVENTOR
CARLOS ALBERTO GALVIS RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL SOLASEC

CONTRATISTA
WILMER ANDRES GARCIA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EMR - APP BELLEZA

SUPERVISOR
ING. MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA

Memoria de cantidades.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUCRE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

CERTIFICADO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION Y DEMOLICIÓN

El suscrito FREDY ALEXANDER FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.772.068 en calidad de SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS del Municipio de Sucre – Santander, en uso de sus facultades legales y en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,

CERTIFIQUE QUE:

El Contratista CONSORCIO EMR-APP BELLEZA, ejecutor del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.7912853 DE 30 DE MAYO 2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", durante el periodo comprendido entre el 15 de Diciembre de 2025 al 28 de Febrero del 2026, ha dispuesto de manera adecuada y controlada 614.31 m3 de material producto de excavaciones y demoliciones generados durante la ejecución de las actividades en el periodo en mención, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los materiales fueron transportados y depositados en los diferentes puntos autorizados por la Administración Municipal, conforme a lo establecido en los reportes técnicos y registros de control de transporte de residuos (RCD) suministrados por el contratista, con el fin, de poder reutilizar dicho material, para el mejoramiento y mantenimiento de las diferentes vías terciarias del Municipio en mención.

En constancia, se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines pertinentes en Sucre Santander, a los (02) días del mes de (marzo) de (2026)

Atentamente,

ING. FREDY ALEXANDER FRANCO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
Alcaldía Municipal de Sucre Santander
Teléfono: 3204740090 – Correo: s.planeacion@sucre-santander.gov.co

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026


CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912863 - NL 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NL 1710/2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	PRELIMINARES		SUBCAPITULO	1	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2026
ITEM	1.01	DESCRIPCIÓN: DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE			UNIDAD: HA

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 1							
	DERECHA	71,0	2		142		1	0,01
	IZQUIERDA	71	2		142		1	0,01
							TOTAL ACTIVIDAD	0,02
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,22
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	0,24

OBSERVACIONES: Estas cantidades del desmonte y limpieza, corresponde al TRAMO 1 entre la Abscisa K0+046 a K0+117. La unidad de medida se por HA, por tl motivo se realiza la conversion de M2 a HA

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A.		

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

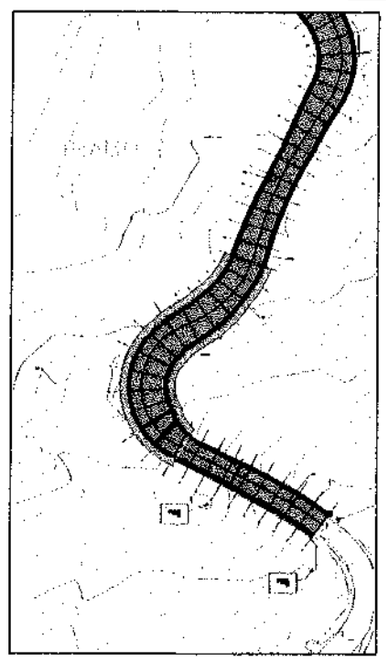





Gobernación de Santander

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.7912863 - NL 1818/2025			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCONTR.7924460 - NL 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLABEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	PRELIMINARES		SUBCAPITULO	1	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2026
ÍTEM	1.02	DESCRIPCIÓN: EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES			UNIDAD M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN DISEÑO GEOMETRICO		
	TRAMO 1							
	K0+080					42,80	10%	4,28
	K0+085					60,97	10%	6,10
	K0+090					73,94	10%	7,39
	K0+095					72,92	10%	7,29
	K0+100					70,62	10%	7,06
	K0+105					67,07	10%	6,71
	K0+110					61,48	10%	6,15
							TOTAL ACTIVIDAD	44,98
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	322,56
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	367,54

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

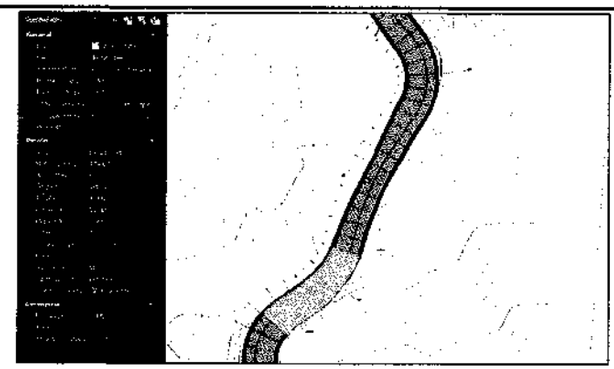





OBSERVACIONES: Estas cantidades de la excavación en roca, corresponde al TRAMO 1 entre la Abscisa k0+060 a k0+116. Los volumenes obtenidos, se puede evidenciar en el informe de Topografia.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MARA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

Gobernación de Santander

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-634
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025


CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912883 - NL 1618/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NL 1710/2025


CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	PRELIMINARES		SUBCAPITULO	1	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2025
ÍTEM	1,03	DESCRIPCIÓN: EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES			UNIDAD M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN DISEÑO GEOMETRICO		
	TRAMO 1							
	K0+080					42,80	90%	38,52
	K0+085					60,97	90%	54,87
	K0+090					73,94	90%	66,55
	K0+095					72,92	90%	65,63
	K0+100					70,62	90%	63,56
	K0+105					67,07	90%	60,36
	K0+110					61,48	90%	55,33
							TOTAL ACTIVIDAD	404,92
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	3523,25
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	3928,07

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

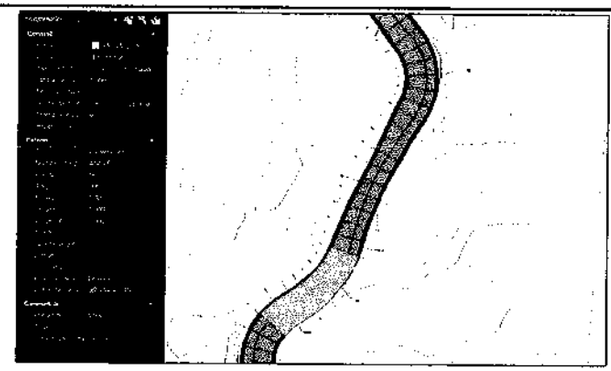





OBSERVACIONES: Estas cantidades de la excavacion en material comun, corresponde al TRAMO 1 entre la Abscisa k0+080 a k0+110. Los volumenes obtenidos, se puede evidenciar en el informe de Topografia.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MARA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

Departamento de Santander
Gobernación del Estado

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-034
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025


CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912583 - NL 1610/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NL 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLAGEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDEN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	PRELIMINARES		SUBCAPITULO	1	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2025
ÍTEM	1,04	DESCRIPCIÓN: CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE			UNIDAD M2

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO DISEÑO GEOMETRICO	ALTO	AREA	VOLUMEN DISEÑO GEOMETRICO		
	TRAMO 1	35	VARIABLE		351,58			351,58
							TOTAL ACTIVIDAD	351,58
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	4389,99
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	4761,65

OBSERVACIONES: Estas cantidades de la conformacion de la calzada, corresponde al TRAMO 1 entre la Abscisa k0+080 a k0+115. El area intervenida presenta un ancho variable, debido a los sobreanchos de acuerdo al diseño. Por lo anterior, en el esquema se puede evidenciar el area, de acuerdo a la topografia realizada.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

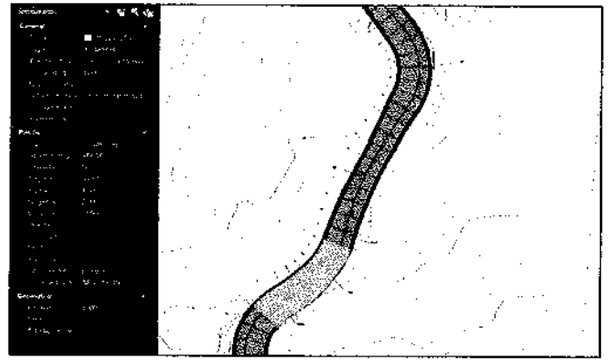





MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025


CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.7912883 - NL 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCONTR.7924460 - NL 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO ENR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	PRELIMINARES		SUBCAPITULO	I	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2026
ITEM	1.05	DESCRIPCIÓN: REMOCION DE CERCA DE ALAMBRE			UNIDAD: M

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 1							
	DERECHO	71,00					1,00	71,00
	IZQUIERDO	71,00					1,00	71,00
							TOTAL ACTIVIDAD	142,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	790,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	932,00


OBSERVACIONES: Estas cantidades de la remocion de cerca, corresponde al TRAMO 1 entre la Abscisa k0+046 a k0+117.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

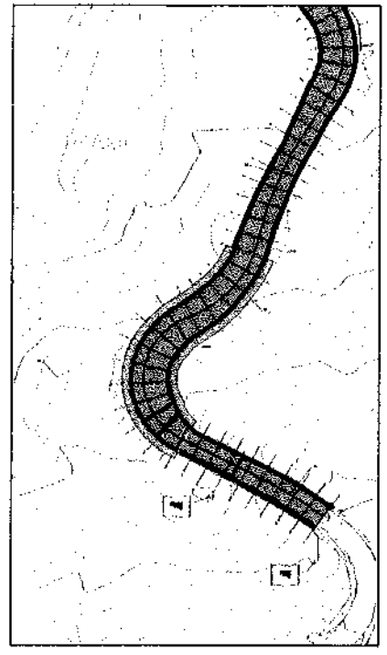





	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
		VERSIÓN:	0
		FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026


CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912883 - NI. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NI. 1710/2026			
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA		
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA		
CAPITULO:	PRELIMINARES		SUBCAPITULO	I	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2026
ÍTEM	1,05	DESCRIPCIÓN: TERRAPLENES			UNIDAD	M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN DISEÑO GEOMETRICO		
	TRAMO 1							
	K0+080					0,07	100%	0,07
	K0+085					0,00	100%	0,00
	K0+090					0,02	100%	0,02
	K0+095					0,02	100%	0,02
	K0+100					0,00	100%	0,00
	K0+105					0,00	100%	0,00
	K0+110					0,00	100%	0,00
							TOTAL ACTIVIDAD	0,11
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	36,84
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	37,06

OBSERVACIONES: Estas cantidades de Terraplen, corresponde al TRAMO 1 entre la Abscisa k0+080 a k0+115. Los volumnes instalados, se pueden evidenciar en el informe de Topografia.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

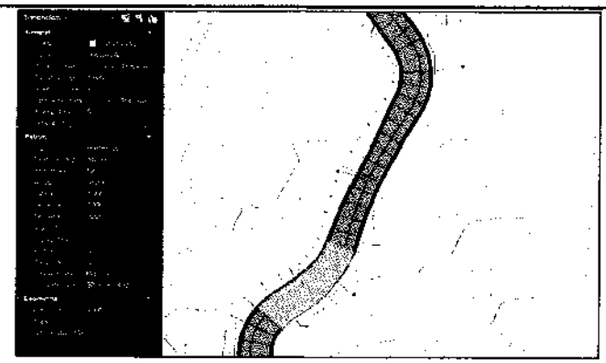





Gobernación de Santander

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-OS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912863 - NI. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924480 - NI. 1710/2025			
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA		
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA		
CAPITULO:	FILTROS		SUBCAPITULO	2	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2025
ÍTEM	2,01	DESCRIPCIÓN: EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO			UNIDAD	M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 1							
	DERECHA	35,60	0,60	0,80	21,36	17,09	10,00%	1,71
	IZQUIERDA	48,90	0,60	0,80	29,34	23,47	10,00%	2,35
	% DE EXPANSION							1,62
							TOTAL ACTIVIDAD	5,68
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	36,89
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	42,57

OBSERVACIONES: Las cantidades de Excavacion en Roca, pertenecen al fatro del Tramo 1. En el cual, en el sendero izquiero se esta cobrando desde la Abscisa k0+066,10 a k0+115. En el sendero derecho, se esta cobrando desde la Abscisa k0+126,50 a k0+110 y de la Abscisa k0+085 a k0+065,90

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

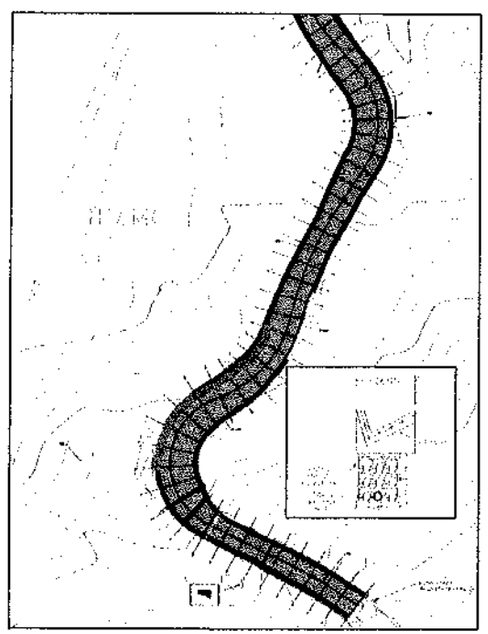





ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2		PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912853 - NI. 1616/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924490 - NI. 1710/2025				
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA			
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA			
CAPITULO:	FILTROS		SUBCAPITULO	2	FECHA:	26 DE FEBRERO DEL 2026	
ITEM	2,02	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA FILTRO		UNIDAD	M3	

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN DISEÑO GEOMETRICO		
	TRAMO 1							
	DERECHA	35,60	0,60	0,80	21,36	17,09	90,00%	15,38
	IZQUIERDA	48,90	0,60	0,80	29,34	23,47	90,00%	21,12
	% DE EXPANSION							14,60
							TOTAL ACTIVIDAD	51,10
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	331,94
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	383,04

OBSERVACIONES: Las cantidades de Excavacioes Varias, pertenecen al filtro del Tramo 1. En el cual, en el sendero izquiero se esta cobrando desde la Abscisa k0+068,10 a k0+115. En el sendero derecho, se esta cobrando desde la Abscisa k0+126,50 a k0+110 y de la Abscisa k0+085 a k0+056,90

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

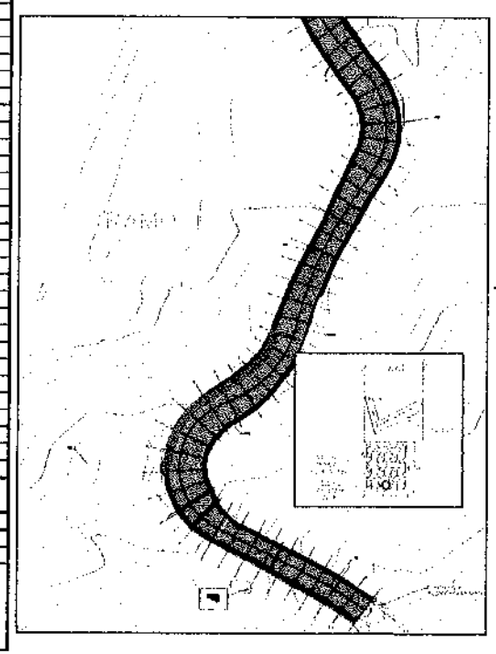





ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912863 - NI. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NI. 1710/2025			
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA		
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA		
CAPITULO:	FILTROS		SUBCAPITULO	2	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2026
ÍTEM	2,03	DESCRIPCIÓN: GEOTEXTIL TIPO NT - 2600 O SIMILAR NO TEJIDO			UNIDAD	M2


No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 1 - FILTRO							
	DERECHA	35,60	2,90		103,24		1,00	103,24
	IZQUIERDA	48,90	2,90		141,81		1,00	141,81
	TRAMO 1				351,58			351,58
	TRASLADO	71,00	0,45		31,95		1,00	31,95

TOTAL ACTIVIDAD	528,86
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	9238,35
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	9767,93

OBSERVACIONES: Las cantidades de Geotextil, pertenecen al filtro del Tramo 1. En el cual, en el sendero izquierdo se esta cobrando desde la Abscisa k0+068,10 a k0+116. En el sendero derecho, se esta cobrando desde la Abscisa k0+126,50 a k0+110 y de la Abscisa k0+085 a k0+065,90. Ademas, se esta cobrando el geotextil instalado en el area de la calzada intervenida, la cual, debido a su ancho variable, se mide de acuerdo con la topografia y el esquema que se puede evidenciar en la memoria de calculo.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

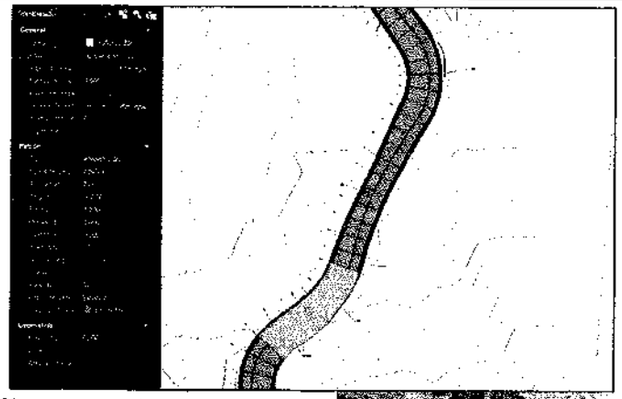





MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-934
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2		PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912853 - NI. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NI. 1710/2025				
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA			
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA			
CAPITULO:	FILTROS		SUBCAPITULO	2	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2026	
ITEM	2,04	DESCRIPCIÓN: RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE			UNIDAD	M3	

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 1							
	DERECHA	35,60	0,60	0,60	21,36	12,82	1,00	12,82
	IZQUIERDA	48,90	0,60	0,60	29,34	17,60	1,00	17,60
							TOTAL ACTIVIDAD:	30,42
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR:	197,59
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS:	228,01

OBSERVACIONES: Las cantidades de Piedra filtro, pertenecen al filtro del Tramo 1. En el cual, en el sendero izquierdo se esta cobrando desde la Abscisa k0+126,60 a k0+110 y de la Abscisa k0+086 a k0+066,90. En el sendero derecho, se esta cobrando desde la Abscisa k0+066,10 a k0+115.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

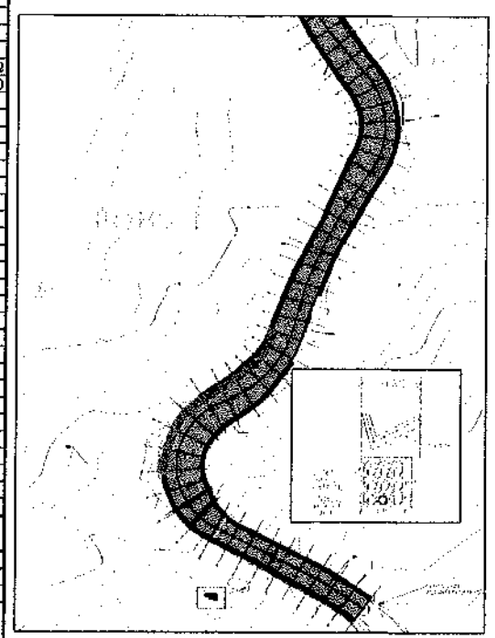





MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	M-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2		PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912853 - NI. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924480 - NI. 1710/2025				
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA			
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA			
CAPITULO:	FILTROS		SUBCAPITULO	2	FECHA:	26 DE FEBRERO DEL 2026	
ITEM	2,05	DESCRIPCIÓN: DREN EN TUBERIA PERFORADA 4"			UNIDAD	M	

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 1							
	DERECHO	35,60					1,00	35,60
	IZQUIERDO	48,90					1,00	48,90
							TOTAL ACTIVIDAD	84,50
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	548,85
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	633,35

OBSERVACIONES: Las cantidades de Tuberí, pertenecen al filtro del Tramo 1. En el cual, en el sendero izquierdo se esta cobrando desde la Abscisa k0+068,10 a k0+115. En el sendero derecho, se esta cobrando desde la Abscisa k0+126,50 a k0+110 y de la Abscisa k0+085 a k0+065,90.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

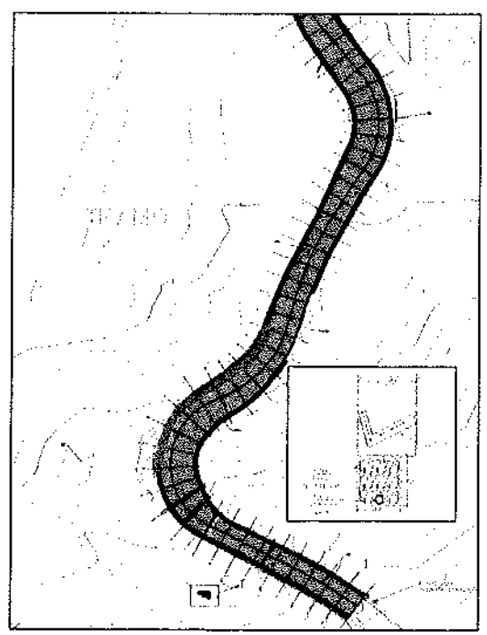





MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	M-GS-RG-934
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2		PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025			
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.7912853 - Nt. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCONTR.7924460 - Nt. 1710/2025				
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA			
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA			
CAPITULO:	FILTROS		SUBCAPITULO	2	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2025	
ÍTEM	2.06	DESCRIPCIÓN	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG		UNIDAD	M3	

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 1							
	DERECHO	35,60	0,60	0,20	21,36	4,27	1,00	4,27
	IZQUIERDO	48,90	0,60	0,20	29,34	5,87	1,00	5,87
							TOTAL ACTIVIDAD	10,14
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	66,86
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	76,00

OBSERVACIONES: Las cantidades de Relleno, pertenecen al filtro del Tramo 1. En el cual, en el sendero izquiero se esta cobrando desde la Abscisa k0+126,50 a k0+110 y de la Abscisa k0+095 a k0+085,90. En el sendero derecho, se esta cobrando desde la Abscisa k0+056,10 a k0+115.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

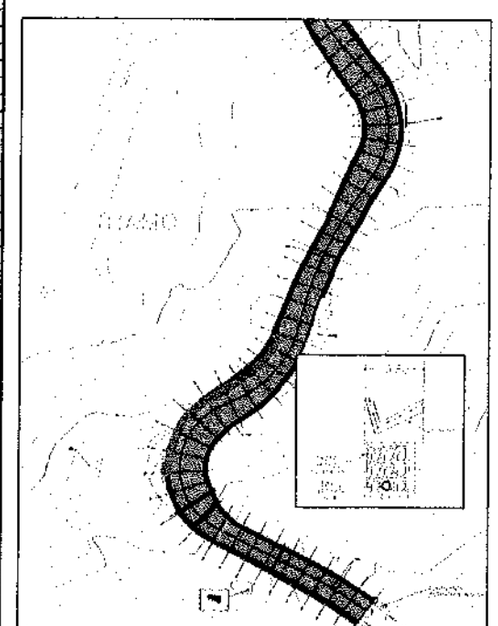



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-634
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2		PERÍODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912863 - Nl. 1618/2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924480 - Nl. 1710/2025			
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ			DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA		
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS			RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA		
CAPITULO:	TRATAMIENTO DE TALUDES			SUBCAPITULO	4	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2026
ÍTEM	4.02	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS			UNIDAD	M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 2 - CANALETA	44,00			0,45	19,80	90,00%	17,82
	% DE EXPANSION							7,13
							TOTAL ACTIVIDAD	24,95
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	24,95


OBSERVACIONES: Las cantidades de Excavacion en Roca, pertenecen a la construccion de todo el canal trapezoidal en suelo cemento, localizado en el Tramo 2, en el talud entre la abscisa k0+185 a k0+220. El canal, tiene un area de 0,46 m2

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

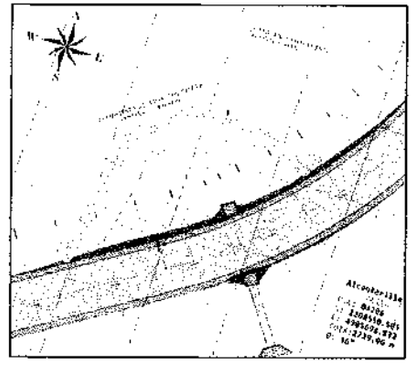



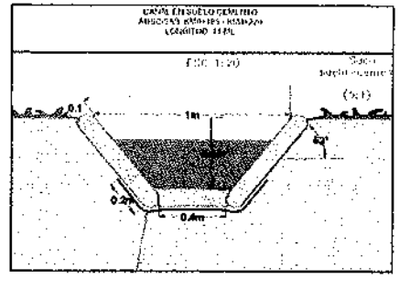



Gobernación de Santander

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912853 - NI. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NI. 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL GOLASEO	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	TRATAMIENTO DE TALUDES		SUBCAPITULO	4	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2025
ITEM	4,03	DESCRIPCIÓN: EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO			UNIDAD: M3


No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 2 - CANALETA	44,00			0,45	19,80	10,00%	1,98
	% DE EXPANSION							0,79
							TOTAL ACTIVIDAD	2,77
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	2,77


OBSERVACIONES: Las cantidades de Excavaciones Varias, pertenecen a la construccion de todo el canal trapezoidal en suelo cemento, localizado en el Tramo 2, en el talud entre la abscisa k0+185 a k0+220. El canal, tiene un area de 0,45 m2

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

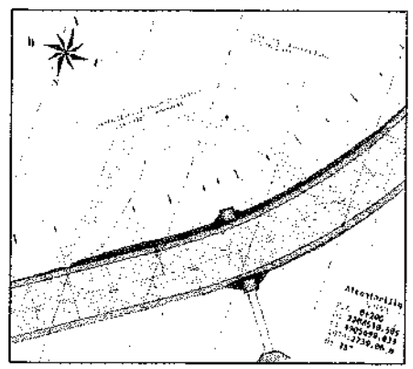



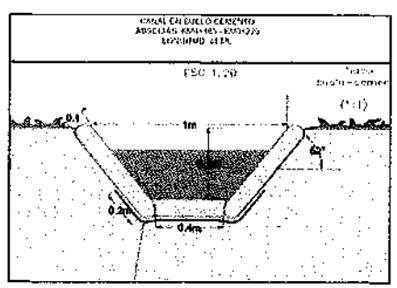

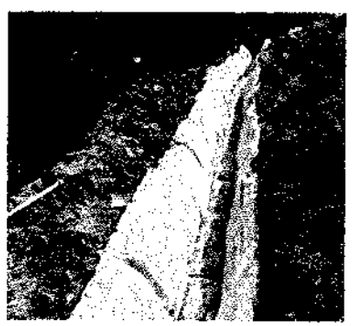

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

Gobernación de Santander	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
		VERSIÓN:	0
		FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
		PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912853 - NI. 1618/2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** CO1.PCCNTR.7924460 - NI. 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	TRATAMIENTO DE TALUDES		**SUBCAPITULO**	4	**FECHA:** 28 DE FEBRERO DEL 2026
ÍTEM	4,11	**DESCRIPCIÓN**	CANELETA EN SUELO CEMENTO SECCION TRAPEZOIDAL (1X0,40X0,40) M		**UNIDAD** M

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 2 - CANALETA	44,00						44,00
							TOTAL ACTIVIDAD	44,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	44,00


OBSERVACIONES: Las cantidades de Canaleta en suelo cemento, pertenecen a la construccion de todo el canal trapezoidal, localizado en el Tramo 2, en el talud entre la abscisa k0+165 a k0+220. El canal, tiene un area de 0,46 m2 y 44 metros lineales distruibuido como se puede observar en el esquema de la memoria

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

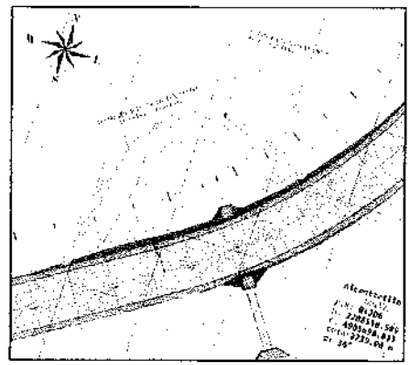



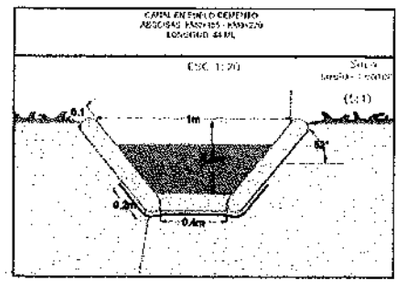



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-034
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912653 - NL 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924480 - NL 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO		SUBCAPITULO	5	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2025
ITEM	5,01	DESCRIPCIÓN: SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG - 38			UNIDAD M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA SEGÚN GEOMETRICO	VOLUMEN		
	TRAMO 1	35,00	VARIABLE	0,30	351,58	105,47		105,47
							TOTAL ACTIVIDAD:	105,47
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR:	1319,99
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS:	1425,46

OBSERVACIONES: Estas cantidades de Subbase, corresponde al TRAMO 1 entre la Abscisa k0+080 a k0+116. Los volumenes obtenidos, se puede evidenciar en el informe de Topografia.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Lozano A		

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

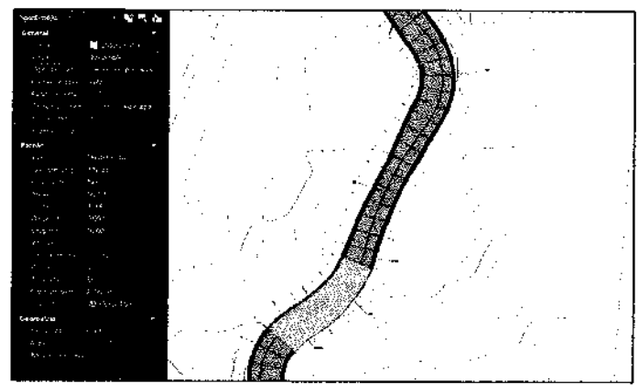





Gobernación de Santander

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	M-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2		PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025			
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912853 - Nl. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924480 - Nl. 1710/2025				
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEO	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA			
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA			
CAPITULO:	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO		SUBCAPITULO	5	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2026	
ÍTEM	5.03	DESCRIPCIÓN: PEDRAPLEN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO			UNIDAD	M3	

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 1	35,00	VARIABLE	0,30	351,56	105,47		105,47
	DESCUENTO PEDRAPLEN FRACTURADO EN CAMPO							-15,30
	DESCUENTO DE ZONA DE FILTRO							-15,21
							TOTAL ACTIVIDAD	74,96
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	1640,67
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1715,63

OBSERVACIONES: Estas cantidades de Padraplen, corresponde al TRAMO 1 entre la Abscisa k0+080 a k0+115. Los volumenes obtenidos, se puede evidenciar en el informe de Topografia. Al volumne obtenido, se le descuenta el material fracturado en campo y el instalado en lo filtros

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

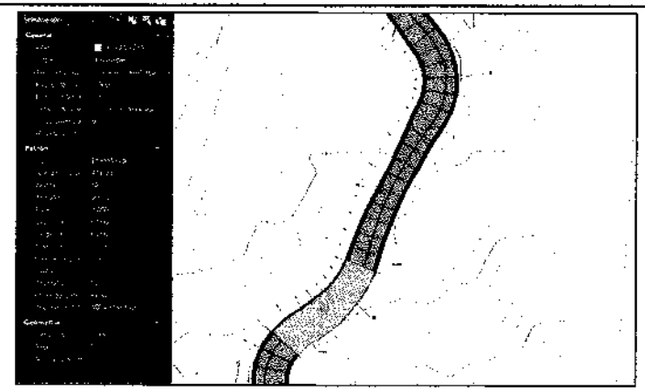

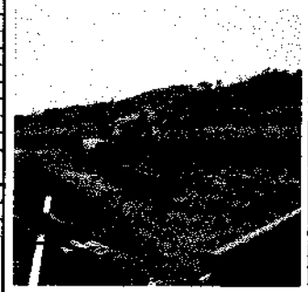





ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

Gobernación de Santander

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	M-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2		PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912883 - NL 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NL 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO ENR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEO	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO		SUBCAPITULO	5	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2026
ÍTEM	5,04	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLÉN COMPACTO (Incluye fracturamiento de rocas a tamaño según especificación No incluye la piedra rajón)			UNIDAD: M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES Ø	LONGITUD	CANTIDAD	FACTOR	CANTIDAD	PORCENTAJE	TOTAL
1,02	EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES					44,98	30,00%	13,49
2,01	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO					4,06	30,00%	1,22
4,03	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO					1,98	30,00%	0,59
							TOTAL ACTIVIDAD	15,30
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	111,33
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	126,63

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

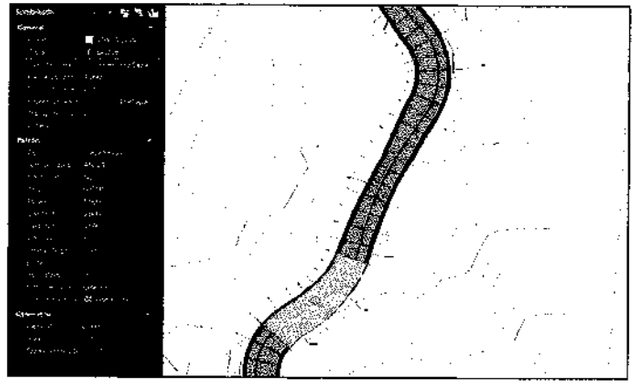





ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	26/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2		PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025			
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7812653 - NL 1618/2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NL 1710/2025			
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ			DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA		
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS			RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA		
CAPITULO:	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO			SUBCAPITULO	5	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2025
ITEM	5,05	DESCRIPCIÓN	PAVIMENTO HIDRAULICO (CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO MR40 (KG/CM2))			UNIDAD	M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 1	100	VARIABLE	0,19	333,94	63,45		63,45
	DENTELLON	3,00	0,30	0,40	0,90	0,36		0,36
	TRAMO 2	250,00	VARIABLE	0,19	1654,59	314,37		314,37
	DENTELLON	6,00	0,30	0,40	1,80	0,72	2,00	1,44

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

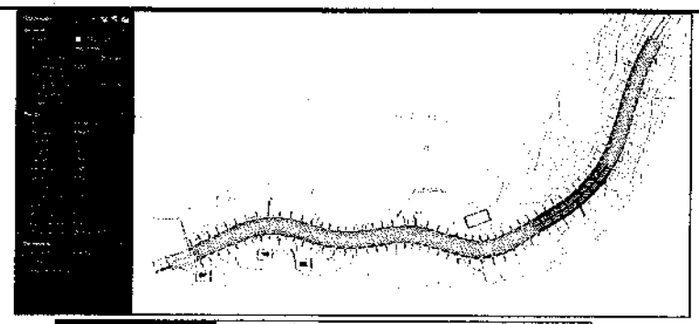

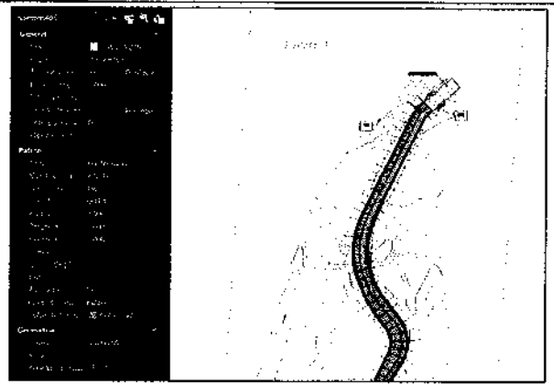

Gobernación de Santander


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	M-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912663 - NI. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NI. 1710/2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO		SUBCAPITULO	6	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2026
ITEM	6,06	DESCRIPCIÓN: ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA			UNIDAD: KG

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	SEPARACION	CANTIDAD POR SECCION	DENSIDAD	CANTIDAD TOTAL DE LOSAS		
	TRAMO 2	**250**						
	LONGITUDINAL	0,85	1,2	3	0,99	72,00	1,00	181,76
	ACERO LISO #8 TRANSVERSAL	0,35	0,3	10	4,08	72,00	2,00	2056,32
	ACERO CORRUGADO #2 CANASTILLA LONG	6		4	0,25	72,00	1,00	432,00
	ACERO CORRUGADO #2 CANASTILLA TRANS	0,3	0,3	21	0,25	72,00	2,00	226,80
	TRAMO 2 - SOBRE ANCHO	**229,11**						
	ACERO CORRUGADO #4 LONGITUDINAL	0,85	1,2	191	0,99	1,00	1,00	160,73
	ACERO LISO #8 TRANSVERSAL (1,00)	0,35	0,3	4	4,08	50,00	1,00	285,60
	ACERO LISO #8 TRANSVERSAL (1,20)	0,35	0,3	4	4,08	16,00	1,00	91,39
	ACERO CORRUGADO #2 CANASTILLA LONG	1,09		4	0,25	50,00	1,00	50,00
	ACERO CORRUGADO #2 CANASTILLA LONG	1,2		4	0,25	16,00	1,00	19,20
	ACERO CORRUGADO #2 CANASTILLA TRANS	0,3	0,3	5	0,25	50,00	2,00	37,50
	ACERO CORRUGADO #2 CANASTILLA LONG	0,3	0,3	5	0,25	16,00	2,00	12,00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

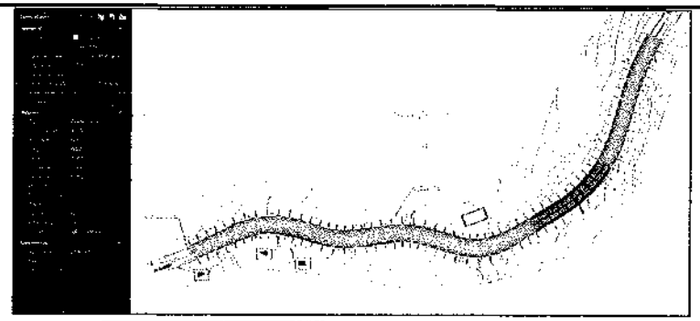


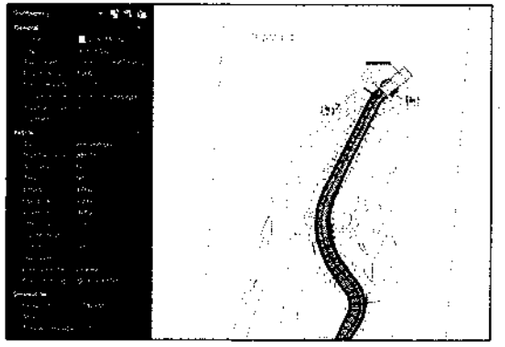

	DENTELLON							
	ACERO CORRUGADO #6 LONGITUDINAL	6,5		6	2,24	1,00	2,00	174,72
	ACERO CORRUGADO #3 TRANSVERSAL	1,6		50	0,56	1,00	2,00	89,60
	ACERO PAVIMENTO - CUNETA							
	TRAMO 2	0,60	0,90	279,00	0,56	1,00	2,00	187,49
	TRAMO 1	**100**						
	LONGITUDINAL	0,85	1,2	3	0,99	29,00	1,00	73,21
	ACERO LISO #8 TRANSVERSAL	0,35	0,3	10	4,08	29,00	1,00	414,12
	ACERO CORRUGADO #2 CANASTILLA LONG	6		4	0,25	29,00	0,50	87,00
	ACERO CORRUGADO #2 CANASTILLA TRANS	0,3	0,3	21	0,25	29,00	1,00	45,68
	ACERO PAVIMENTO - CUNETA							
	TRAMO 1	0,60	0,90	112,00	0,56	1,00	1,00	37,63
							TOTAL ACTIVIDAD	4682,75
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	4682,75

OBSERVACIONES: Estas cantidades de Acero, corresponde al TRAMO 2 entre la Abscisa k0+000 a k0+180 y de la Abscisa k0+230 a k0+300. De igual manera, un sarril en el Tramo 1, entre la Abscisa k0+230 a k0+340.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	NAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

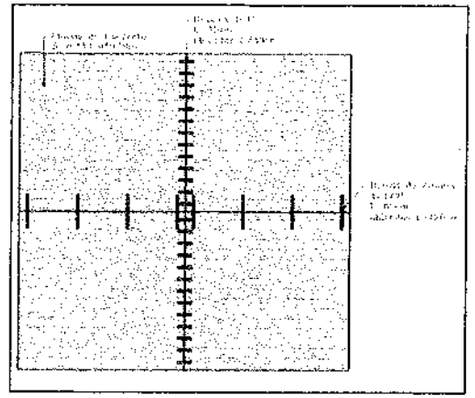







MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912883 - NI. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NI. 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLAGEO	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	CUNETAS, SARDINELES Y ANDENES		SUBCAPITULO	6	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2026
ÍTEM	6.01	DESCRIPCIÓN: CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO			UNIDAD M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	CUNETAS							
	TRAMO 2							
	SECCION 1	160,00			0,14	25,20	2,00	50,40
	SECCION 2	70,00			0,14	9,80	2,00	19,60
							TOTAL ACTIVIDAD	70,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	70,00

OBSERVACIONES: Estas cantidades de Cuneta, corresponde al TRAMO 2 entre la Abscisa k0+000 a k0+180 y de la Abscisa k0+230 a k0+300.

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

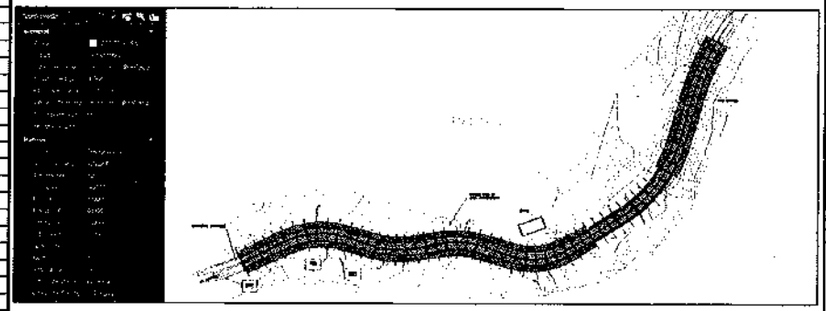





República de Colombia Gobernación de Santander	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
		VERSIÓN:	0
		FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
		PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026


CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912853 - NL 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NL 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	CUNETAS, SARDINELES Y ANDENES		SUBCAPITULO	6	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2025
ITEM	6,02	DESCRIPCIÓN: ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA			UNIDAD: KG


No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	SEPARACION	CANTIDAD POR SECCION	DENSIDAD	CANTIDAD TOTAL DE LOSAS		
	CUNETAS							
	TRAMO 2	**250,00**						
	ACERO CORRUGADO #3 LONGITUDINAL	6,00	0,15	7	0,56	47,00	2,00	2210,88
	ACERO CORRUGADO #3 TRANSVERSAL	1,15	0,2	1251	0,56	1,00	2,00	1611,29
							TOTAL ACTIVIDAD	3822,17
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	3822,17

OBSERVACIONES: Estas cantidades de Acero, corresponde a la cuneta del TRAMO 2 entre la Abscisa k0+000 a k0+180 y de la Abscisa k0+230 a k0+300.

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

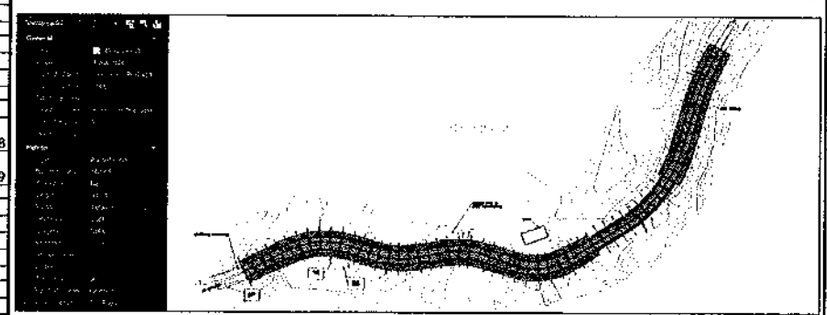

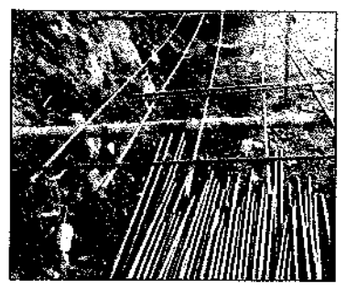

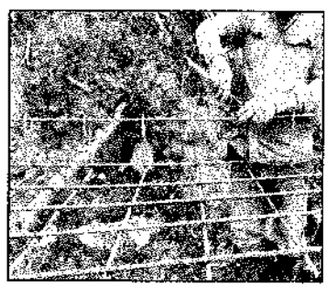

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		


Gobernación de Santander	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
		VERSIÓN:	0
		FECHA DE APROBACIÓN	26/12/2023
		PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7012653 - NI. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7024460 - NI. 1710/2025				
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA			
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA			
CAPITULO:	CUNETAS, SARDINELES Y ANDENES		SUBCAPITULO	6	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2026	
ITEM	6.03	DESCRIPCIÓN: RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO			UNIDAD	ML	


No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TRAMO 2							
	SECCION 1	180,00	0,2	0,5	36,00	18,00	2,00	36,00
	SECCION 2	70,00	0,2	0,5	14,00	7,00	2,00	14,00
							TOTAL ACTIVIDAD	50,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	50,00

OBSERVACIONES: Estas cantidades de Relleno, corresponde a la cuneta del TRAMO 2 entre la Abscisa k0+000 a k0+180 y de la Abscisa k0+230 a k0+300.

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



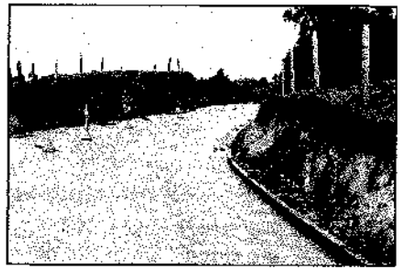

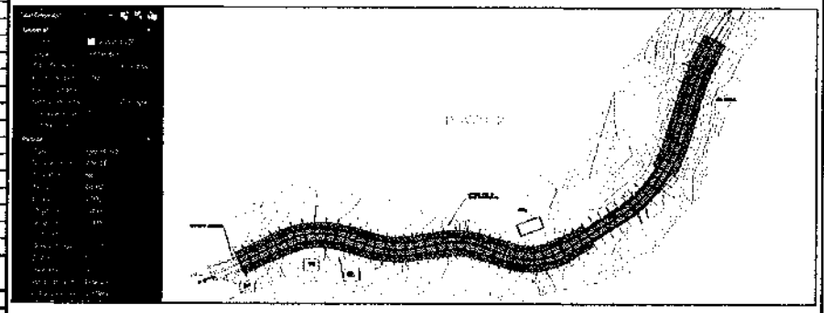

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		


Gobernación de Santander	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
		VERSIÓN:	0
		FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
		PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025


CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912853 - NL 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NL 1710/2025			
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA		
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA		
CAPITULO:	DISIPADORES DE ENERGIA, DESCOLES Y ZANJAS DE CORONACION		SUBCAPITULO	7	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2025
ITEM	7.01	DESCRIPCIÓN: EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO			UNIDAD	M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	DISIPADOR 2	12,00	1,20	0,80	14,4	11,52	10,00%	1,15
	DISIPADOR 3	8,00	1,20	0,80	9,6	7,68	10,00%	0,77
	DENTELLON 2	1,2	0,25	0,35	0,3	0,11	10,00%	0,01
	DENTELLON 3	1,2	0,25	0,35	0,3	0,11	10,00%	0,01
	% DE EXPANSION							0,79
							TOTAL ACTIVIDAD	2,72
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	2,72

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

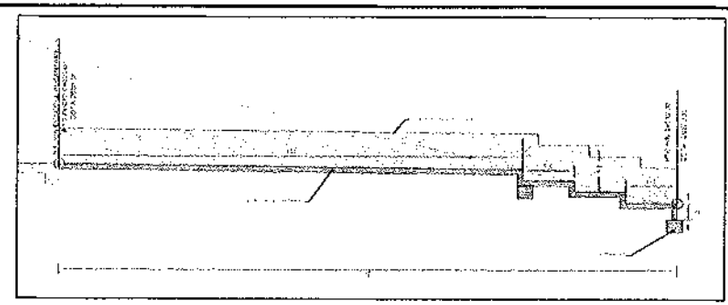

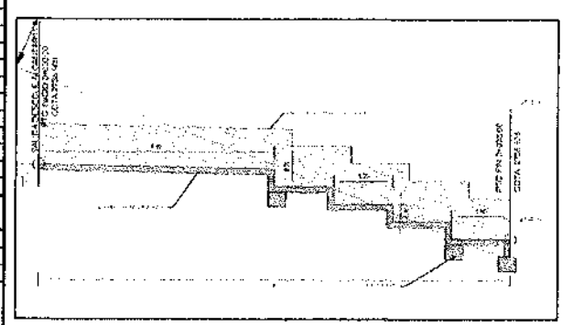



OBSERVACIONES

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	M-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912853 - NL 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924480 - NL 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	DISIPADORES DE ENERGIA, DESCOLES Y ZANJAS DE CORONACION		SUBCAPITULO	7	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2025
ITEM	7.02	DESCRIPCIÓN: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS			UNIDAD: M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	DISIPADOR 2	12,00	1,20	0,80	14,4	11,52	90,00%	10,37
	DISIPADOR 3	8,00	1,20	0,80	9,6	7,68	90,00%	6,91
	DENTELLON 2	1,20	0,25	0,35	0,3	0,11	90,00%	0,10
	DENTELLON 3	1,20	0,25	0,35	0,3	0,11	90,00%	0,10
	% DE EXPANSION							6,99
							TOTAL ACTIVIDAD:	24,47
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	24,47

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

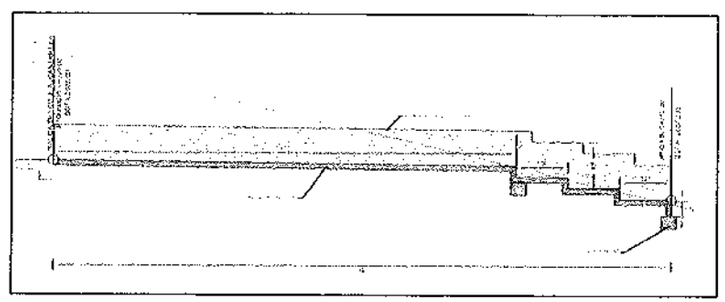

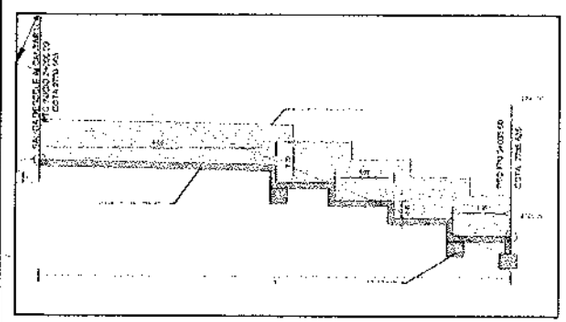



OBSERVACIONES

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7012853 - Nº. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7024460 - Nº. 1710/2025			
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA		
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA		
CAPITULO:	DISIPADORES DE ENERGIA, DESCOLES Y ZANJAS DE CORONACION		SUBCAPITULO	7	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2026
ITEM	7.03	DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO CONCRETO CLASE F, PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN.			UNIDAD	M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	DISIPADOR 2							
	ZONA 1			0,10	2,75	0,28	1,00	0,28
	ZONA 2	11,20	1,20	0,10	13,44	1,34	1,00	1,34
	DISIPADOR 3							
	ZONA 1			0,10	8,74	0,87	1,00	0,87
	ZONA 2	4,80	1,20	0,10	5,76	0,58	1,00	0,58
	DENTELLONES	1,20	0,25	0,10	0,30	0,03	2,00	0,06
	DESCUENTO CANTIDAD CONTRACTUAL							-0,58
							TOTAL ACTIVIDAD	2,55
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	2,55

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

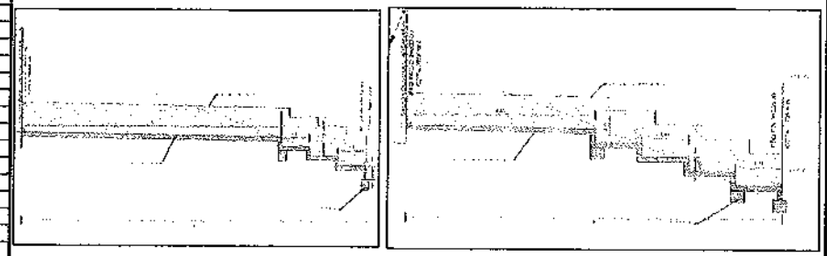

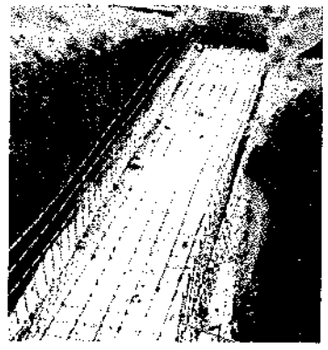



OBSERVACIONES

ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

Departamento de Santander
Gobernación de Santander

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912853 - NI. 1618/2025

CONTRATISTA	CONSORCIO ENR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924480 - NI. 1710/2025

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA				
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA				
CAPITULO:	DISIPADORES DE ENERGIA, DESCOLES Y ZANJAS DE CORONACION	SUBCAPITULO	7	FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2026
ITEM	7.04	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO CONCRETO CLASE D, INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN	UNIDAD	M3

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	DISIPADOR 2							
	PISO ZONA 1			0,10	2,75	0,28	1,00	0,28
	PISO ZONA 2	11,20	1,00	0,10	11,20	1,12	1,00	1,12
	MURO POSTERIOR	1,00	0,10	0,30	0,10	0,03	3,00	0,09
	MURO LATERAL 1	12,49	0,10	0,71	1,25	0,89	1,00	0,89
	MURO LATERAL 2	13,98	0,10	0,71	1,40	0,99	1,00	0,99
	DENTELLON	1,20	0,30	0,25	0,36	0,09	1,00	0,09
	DISIPADOR 3							
	PISO ZONA 1			0,10	8,74	0,87	1,00	0,87
	PISO ZONA 2	4,80	1,00	0,10	4,80	0,48	1,00	0,48
	MURO POSTERIOR	1,00	0,10	0,40	0,10	0,04	5,00	0,20
	MURO LATERAL 1	8,96	0,10	0,71	0,90	0,64	1,00	0,64
	MURO LATERAL 2	8,20	0,10	0,71	0,82	0,58	1,00	0,58
	DENTELLON	1,20	0,30	0,25	0,36	0,09	1,00	0,09
	DESCUENTO CANTIDAD CONTRACTUAL							-0,10
							TOTAL ACTIVIDAD	5,22
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	5,22

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

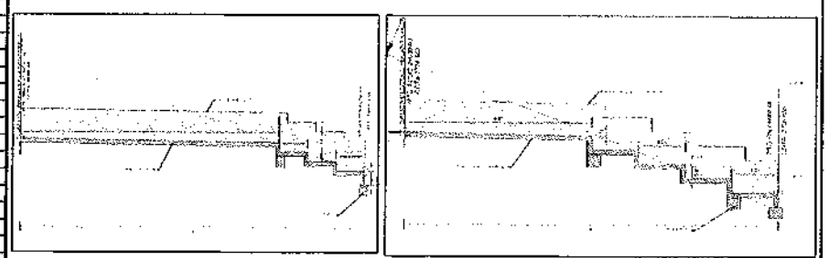





ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

Gobernación de Santander

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	M-GS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912653 - NÚ. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924460 - NÚ. 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	DISIPADORES DE ENERGIA, DESCOLES Y ZANJAS DE CORONACION		SUBCAPITULO	7	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2026
ITEM	7,05 DESCRIPCIÓN	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA			UNIDAD KG


No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	SEPARACION	CANTIDAD POR SECCION	DENSIDAD	CANTIDAD TOTAL DE LOSAS		
	DISIPADOR 2							
	TRAMO 9 M							
	ACERO TRANSVERSAL TIPO 1	2,95	0,15	64,00	0,56	1,00	1,00	105,73
	ACERO LONGITUDINAL TIPO 1	6,00	0,15	17,00	0,56	1,76	1,00	100,53
	TRAMO 1M							
	ACERO TRANSVERSAL TIPO 2	2,95	0,15	10,00	0,56	3,00	1,00	49,56
	ACERO LONGITUDINAL TIPO 2	6,00	0,15	17,00	0,56	0,24	3,00	41,13
	ACERO DENTELLON TRANSVERSAL	0,85	0,12	11,00	0,56	3,00	1,00	15,71
	ACERO DENTELLON LONGITUDINAL	1,50		4,00	0,99	3,00	1,00	17,82
	REFUERZO ADICIONAL	0,40	0,20	7,00	0,99	3,00	1,00	8,32
	DISIPADOR 3							
	TRAMO 4 M							
	ACERO TRANSVERSAL TIPO 1	2,95	0,15	31,00	0,56	1,00	1,00	51,21
	ACERO LONGITUDINAL TIPO 1	6,00	0,15	17,00	0,56	0,83	1,00	47,41
	TRAMO 1M							
	ACERO TRANSVERSAL TIPO 2	2,95	0,15	10,00	0,56	4,00	1,00	66,08
	ACERO LONGITUDINAL TIPO 2	6,00	0,15	17,00	0,56	0,24	4,00	54,84
	ACERO DENTELLON TRANSVERSAL	0,85	0,12	11,00	0,56	3,00	1,00	15,71
	ACERO DENTELLON LONGITUDINAL	1,50		4,00	0,99	3,00	1,00	17,82
	REFUERZO ADICIONAL	0,40	0,20	7,00	0,99	3,00	1,00	8,32
	MUROS							
	POSTERIOR LONG.	1,30	0,15	8,00	0,56	1,00	2,00	11,65
	POSTERIOR TRANS.	1,90	0,15	6,00	0,56	1,00	2,00	12,77
							TOTAL ACTIVIDAD	624,61
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	624,61

OBSERVACIONES


LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



DISIPADOR DE ENERGÍA
SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO 1
H=0.80m



DISIPADOR DE ENERGÍA
SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO 2
H=1.10m

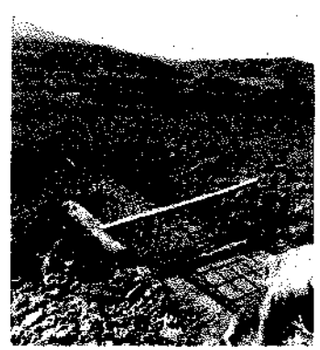



ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	MI-OS-RG-834
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	28/12/2023
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	2	PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025


CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7912553 - Nl. 1618/2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.7924480 - Nl. 1710/2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLASEC	OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA	
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR DAVID VERA ROJAS		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	
CAPITULO:	VARIOS		SUBCAPITULO	9	FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2025
ÍTEM	9,01	DESCRIPCIÓN: TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, ALCANTARILLAS, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIA MAYORES A 1000 METROS.			UNIDAD M3/KM

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					PORCENTAJE	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	EXCAVACIONES PRELIMINARES							449,80
	% EXPANSION							170,92
	RELLENO TERRAPLENES							-0,11
	CONSTRUCCION PEDRAPLEN							-15,30
	VOLUMEN TOTAL							614,31
	TOTAL KILOMETROS							12,00
							TOTAL ACTIVIDAD	7371,72
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	61276,56
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	68648,28

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

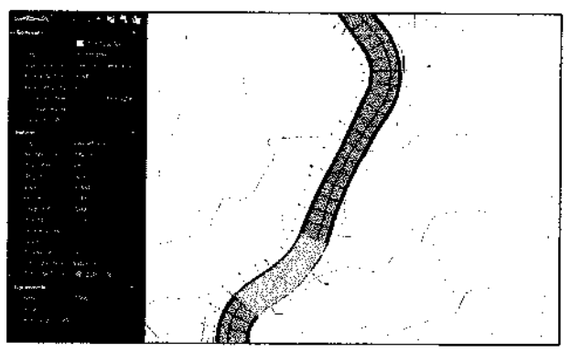

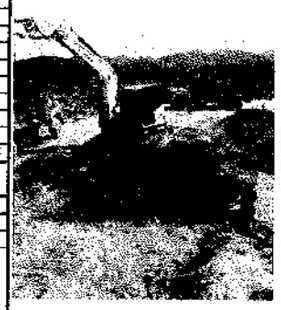





ELABORÓ		APROBÓ	
OSCAR DAVID VERA ROJAS	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
	Luis Carlos Lozano A		


Registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRAFICO – AFECTACION POR FUERTES LLUVIAS







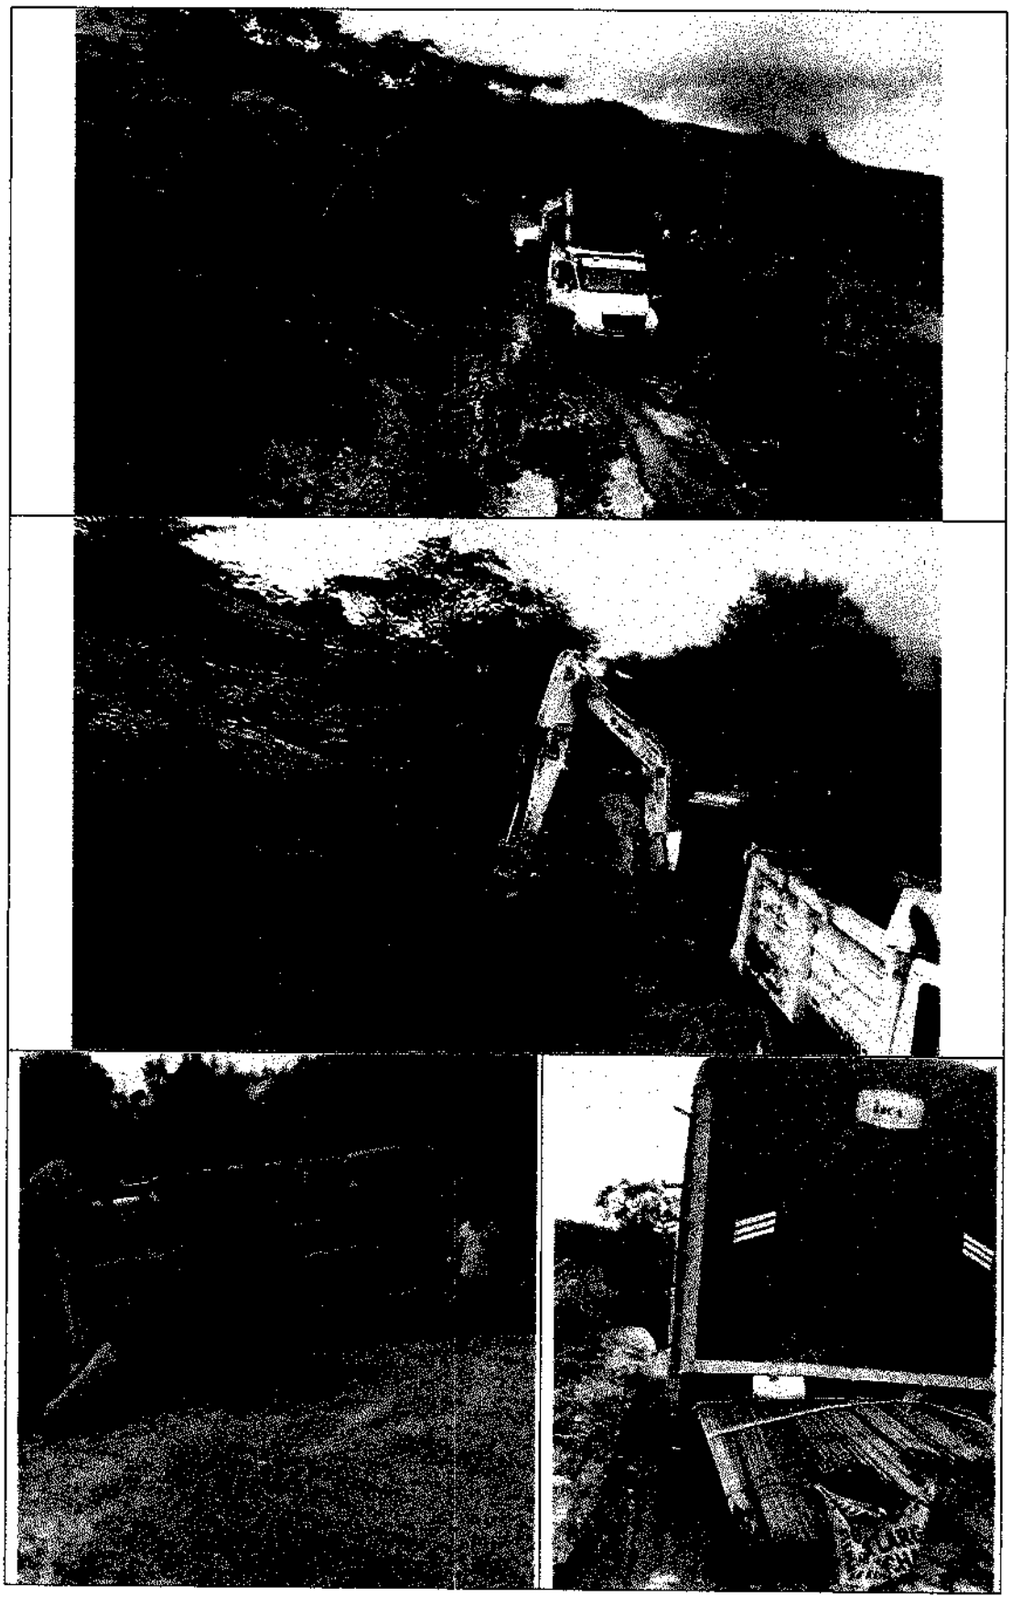
















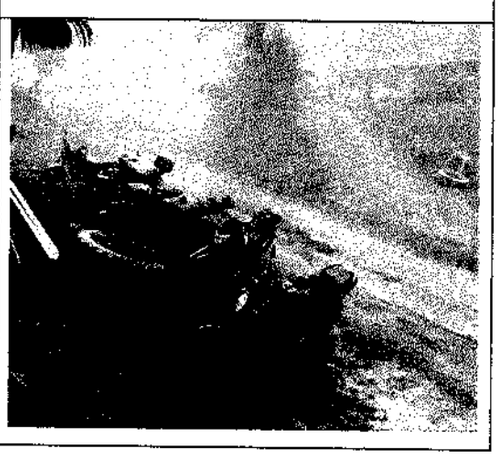

PRELIMINARES DE OBRA	
1.01	**DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA**
	

1.02	**EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES**
	
	





1.03	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES










1.04	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE







1.05	REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE

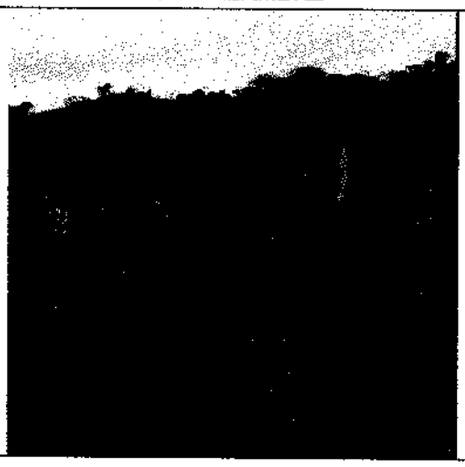
1.06	TERRAPLENES

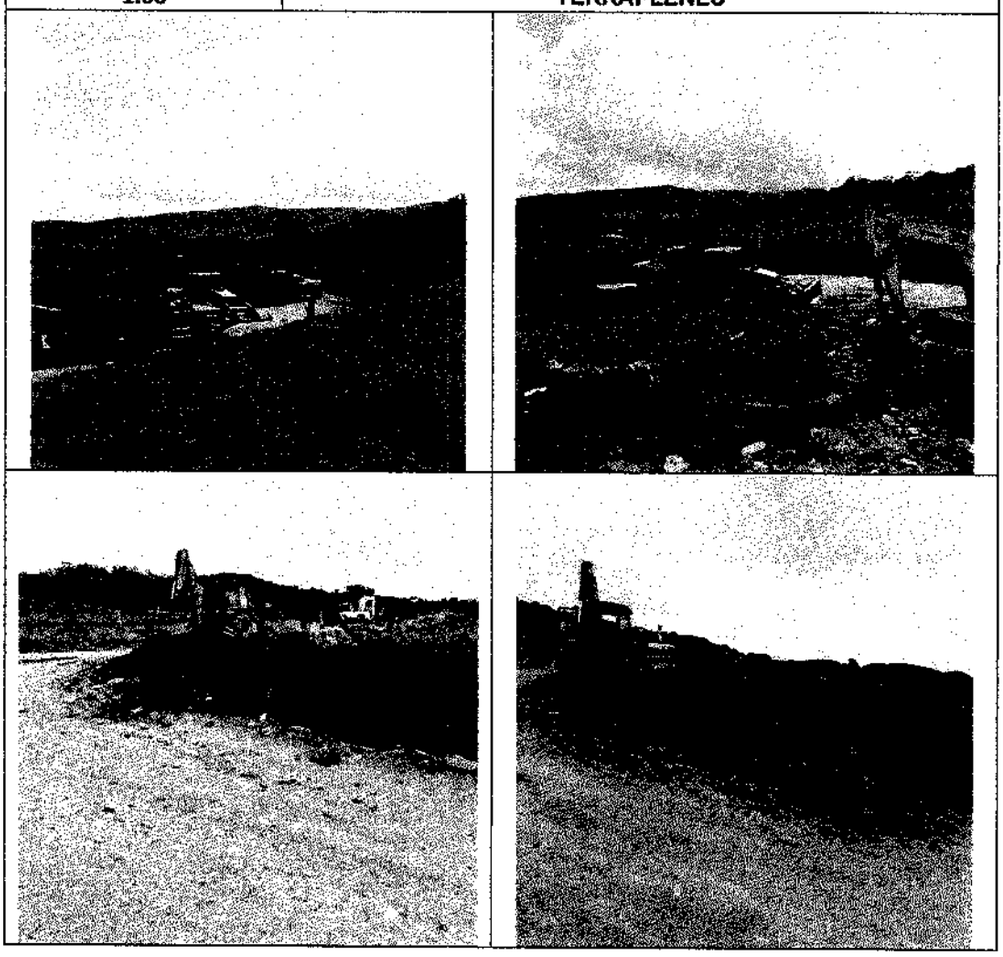

2	FILTROS
2.01	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO



2.02	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA FILTRO

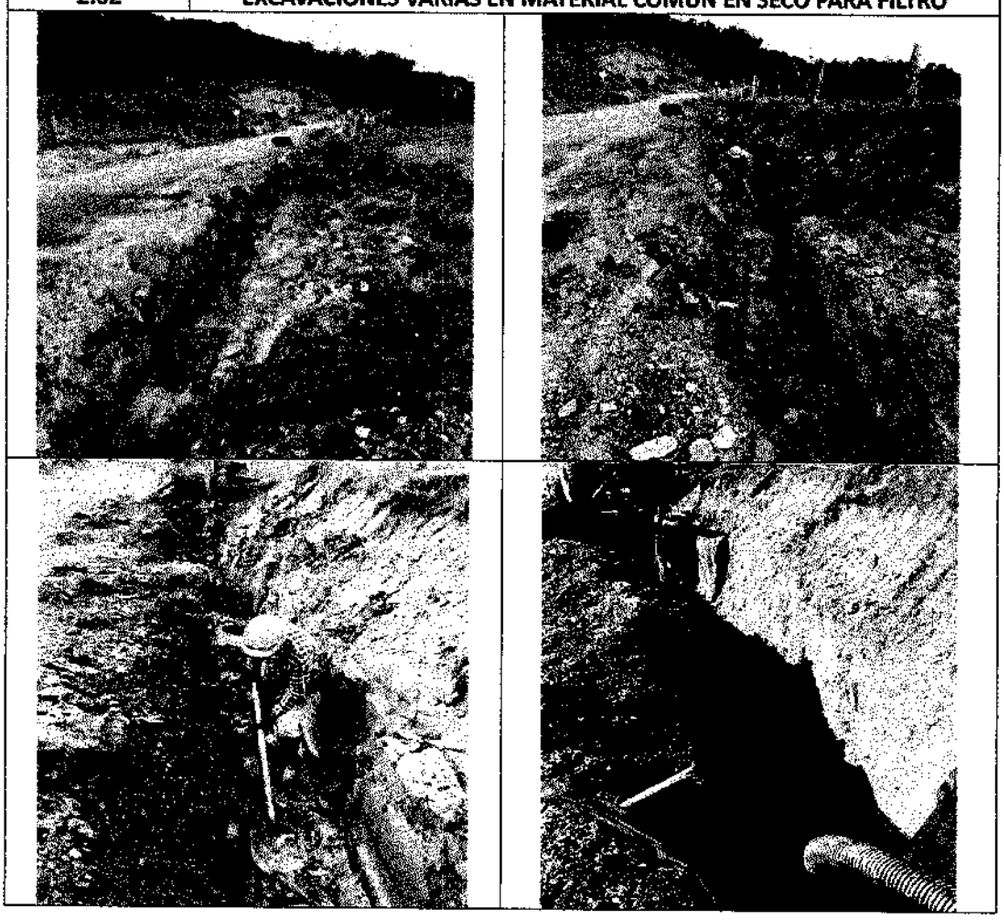


2.03	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO









2.04	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE

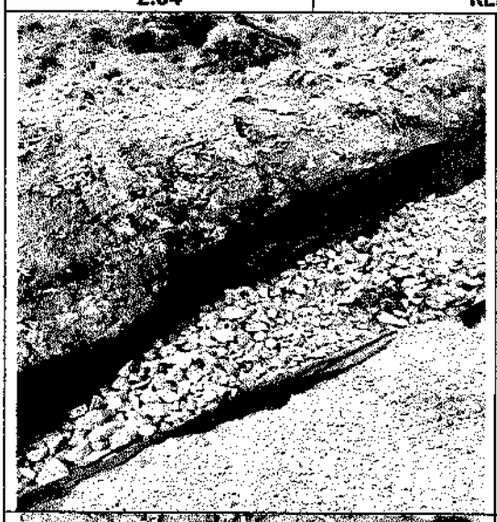




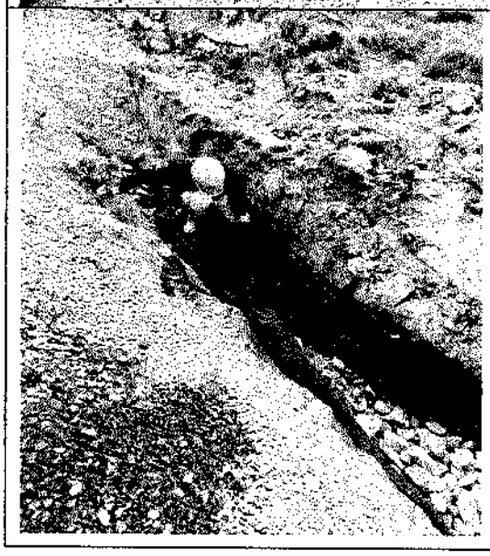

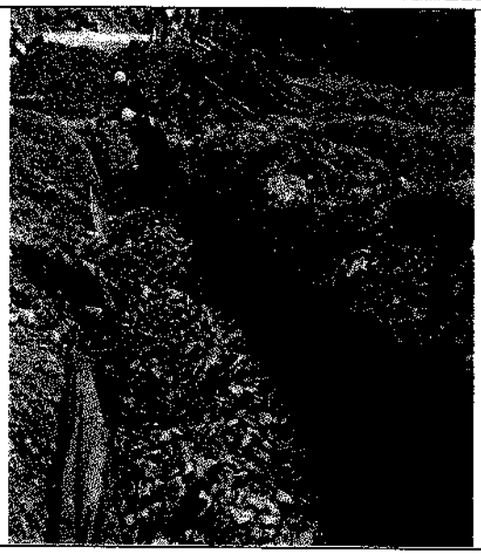

2.05	DREN EN TUBERÍA PERFORADA 4"

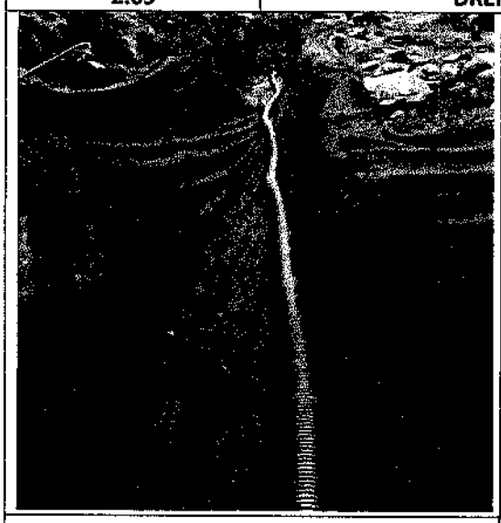








2.06	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG



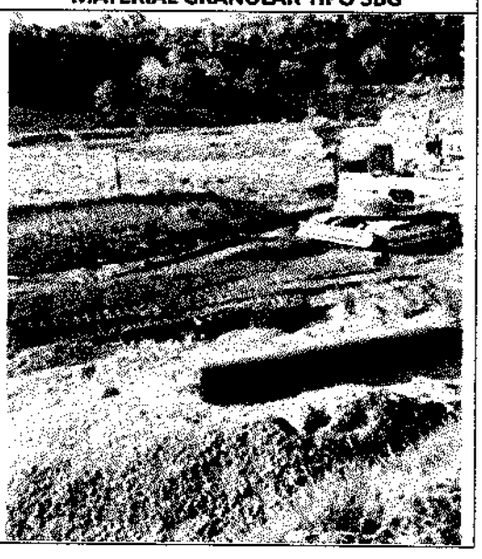

TRATAMIENTO DE TALUDES	
4.02	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS





4.03	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO





4.11	CANALETA EN SUELO CEMENTO SECCIÓN TRAPEZOIDAL (1X0,4X0,4) m











ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO	
5.01	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-38

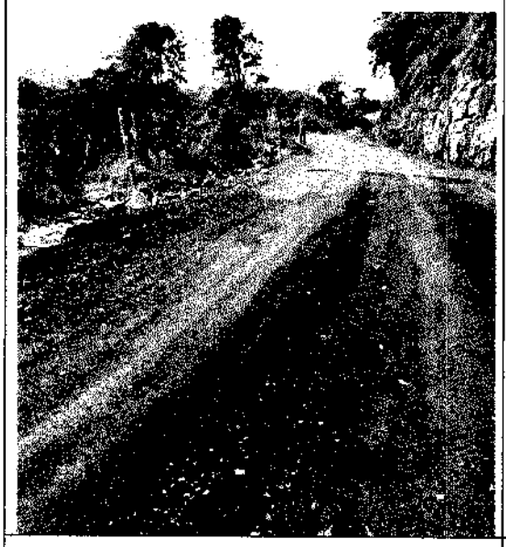

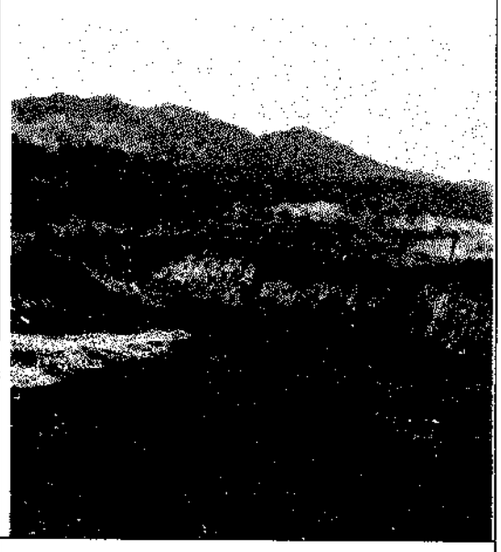







5.03	PEDRAPLEN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO






5.04	CONSTRUCCION DE PEDRAPLEN COMPACTO








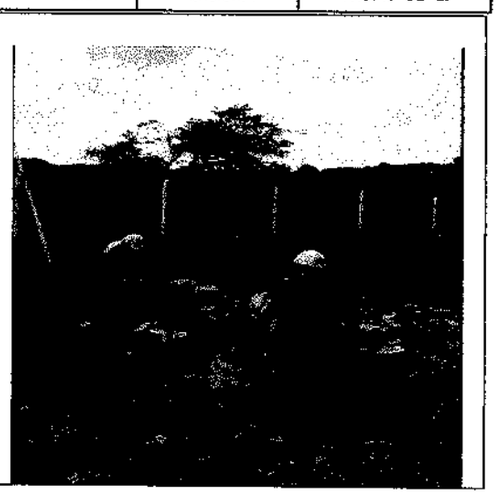

5,05	PAVIMENTO HIDRÁULICO (CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR40 (kg/cm2))



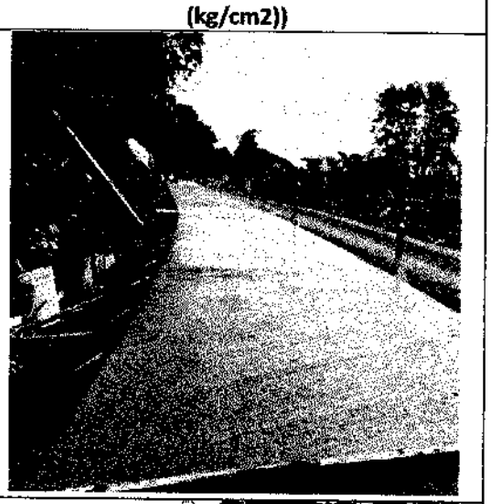








5,06	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA







CUNETAS	
6,01	CUNETA EN CONCRETO VACIADA IN SITU

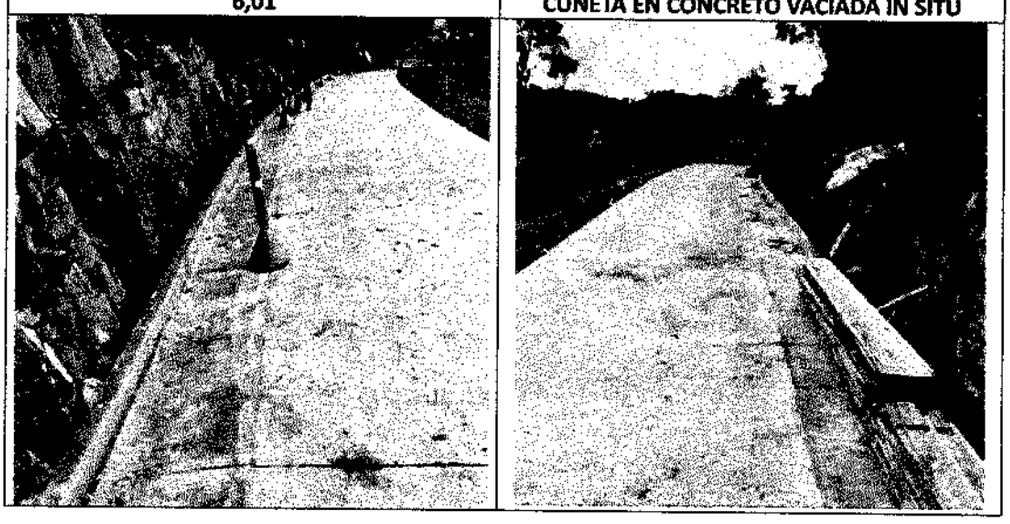



6,02	ACERO DE REFUERZO

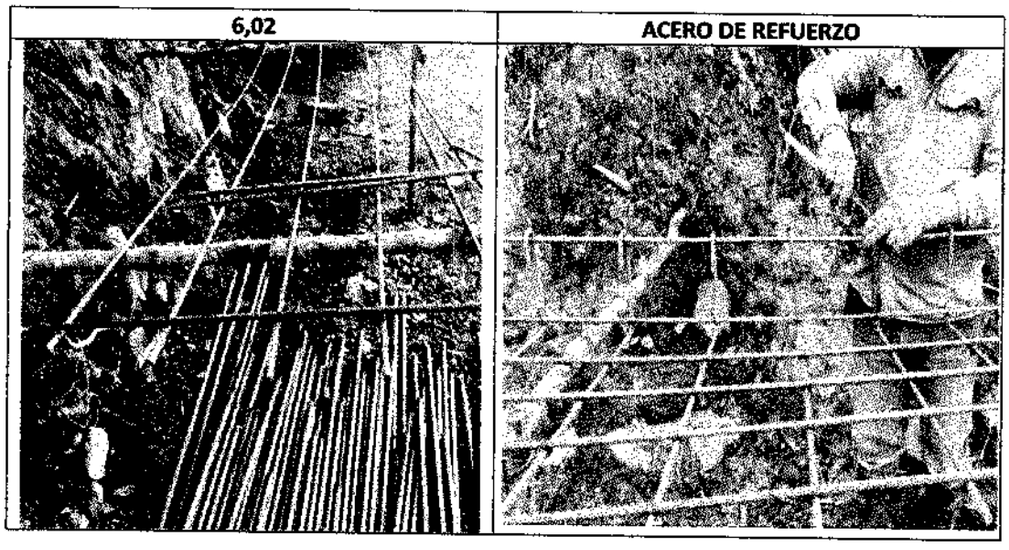

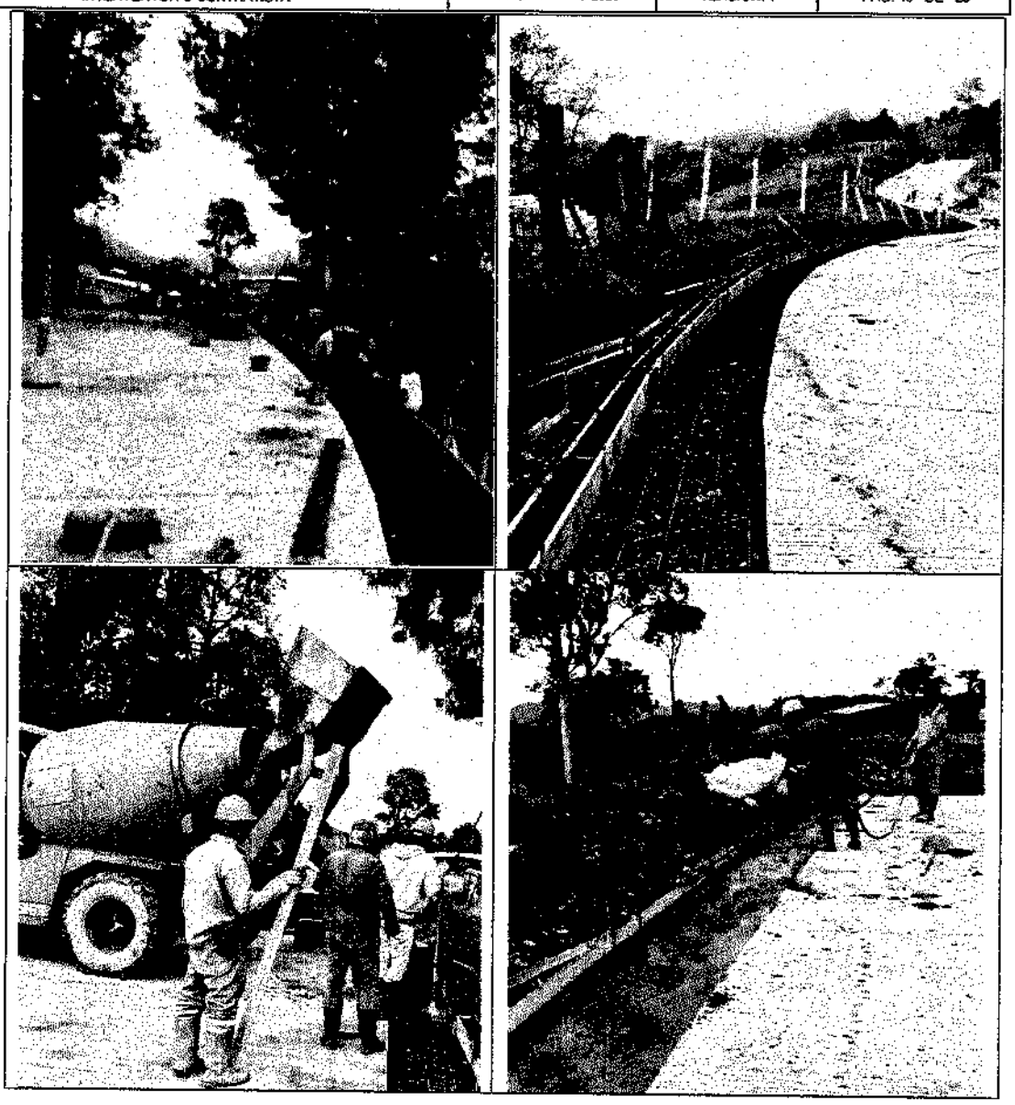


6,03	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO







OBRAS HIDRAULICAS (DESCOLES, DISIPADORES DE ENERGÍA, ZANJAS DE CORONACION)	
7.00	CONSTRUCCION DE DISIPADORES

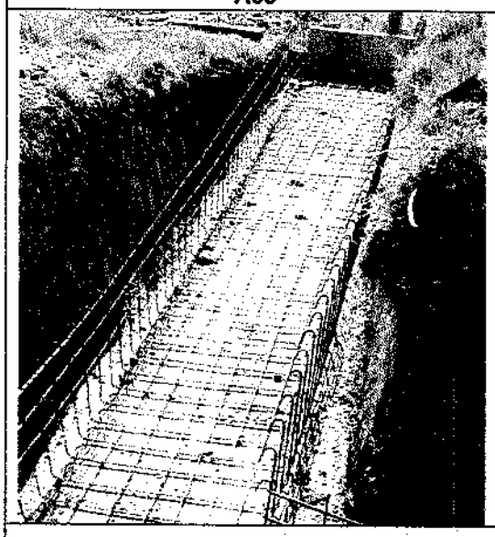




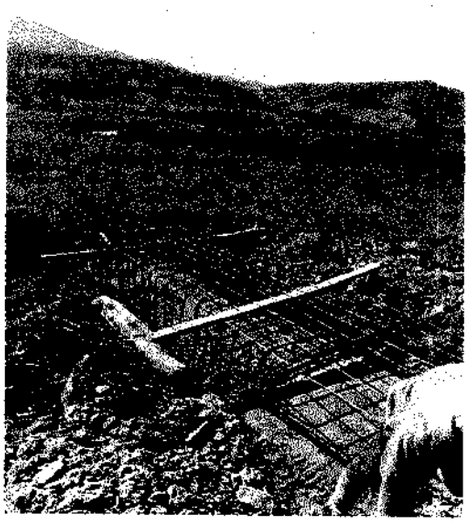



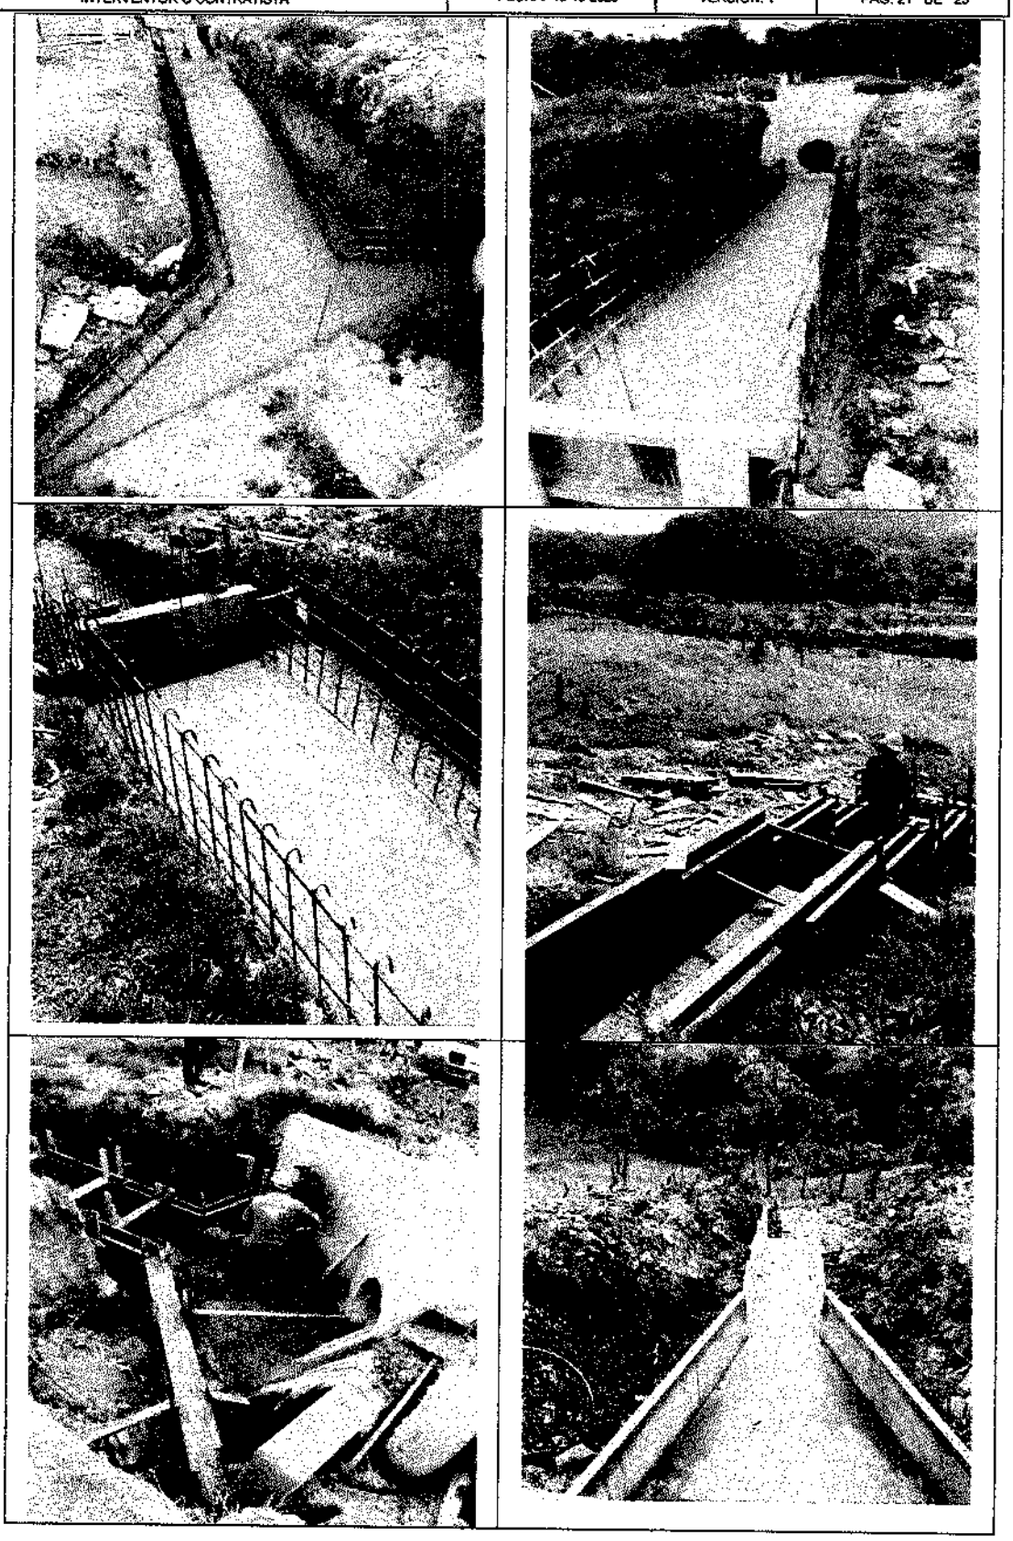

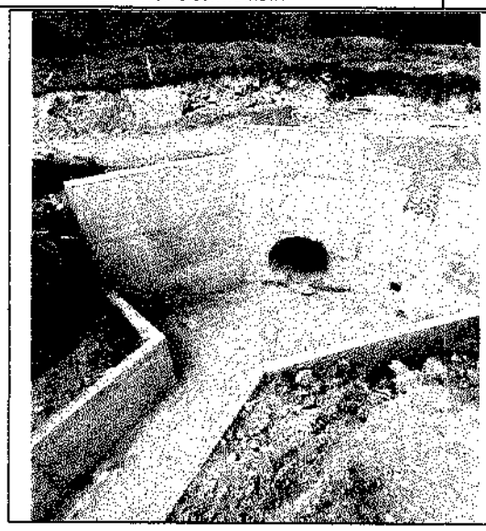




VARIOS	
9.01	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, ALCANTARILLAS, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIA MAYORES A 1000 METROS.







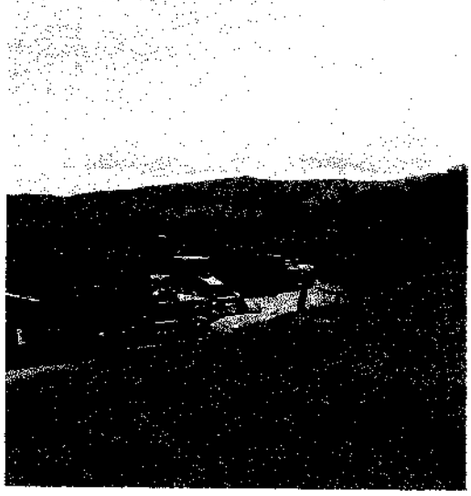





Bitácora de obra.

LAS ACTIVIDADES A LAS 3:30 PM.

DOMINGO 14 DICIEMBRE 2025

✓ MAÑANA = LLUVIA

✓ OBSERVACIONES = POR LOS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA OBRA, NO FUE POSIBLE DAR LUGAR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

LUNES 15 DICIEMBRE 2025

✓ ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA = LLUVIA TARDE = SECO

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. AUXILIAR

HSEQ

TOPOGRAFO

PROFESIONAL AMBIENTAL

2 AUXILIARES TRABAJO

5 AYUDANTES

MAESTRO DE OBRA

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS.

SE CONTINUO CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE GRANULAR Y EL GEOTEXTIL. SE CONTINUO CON LAS EXCAVACIONES VARIAS DE LOS TUBOS. SE TERMINO DE APROBAR LOS PUNTOS DE EXCAVACIONES DEL TRAMO DE CONTINUO CON EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE

✓ OBSERVACIONES

DURANTE LA JORNADA DE HOY, SE SUSPENDIERON LAS ACTIVIDADES DESDE LAS 9:00 AM HASTA LAS 1:00 PM POR FUERTES LLUVIAS. EL DIFERENCIAL PUNTA SE PUSIERON DERRUMBES EN LA VIA DE ACCESO A LA OBRA.

MARTES 16 DICIEMBRE 2025

✓ ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA - SECO TARDE - LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
1 AUXILIAR
TOPOGRAFO
PROFESIONAL AMBIENTAL
MAESTRO DE OBRA
2 AUXILIARES TRABAJO
6 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES EN LA CALZADA, INFORMACION BASICA PREVIA Y APERTURA DE ESTADOS DE LA PERFORACION. SE CONTINUA CON EL RETIRO DEL MATERIAL EN LOS PATIOS. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE GRANULAR Y EL MATERIAL FILTRANTE. SE REALIZA LAS EXCAVACIONES VARIAS EN LA PARTE SUR DISPARAR DE LA ALCANTARILLA 2. SE CONTINUA CON EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES:

-

-

MIERCOLES 17 DICIEMBRE 2025

✓ ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA> LLUVIA TARDE> SECO.

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1>6 AUXILIAR

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUXILIARES ALBAÑIL

6 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRAPLÉN. SE CONTINUA CON EL RECUPERADO DEL MATERIAL DE LOS PATIOS EXCAVADOS. SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL, TUBERÍA RANURADA Y EL MATERIAL FILTRANTE DE LOS FILTROS. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES DE LA ZONA DE DESPACHO 2 DE LA MARQUESINA 2. INTERCEPTADO LLUVIA MIXTA Y AUSENCIA EL VACIADO DEL SUELO Y LA COLOCACIÓN DE LA SUBBASE EN LA CALZADA.

✓ OBSERVACIONES

-

-

JUEVES 18 DICIEMBRE 2025

✓ ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA: SECO TARDE: SECO

✓ PERSONAL EN OBRA

RESPONSABLE DE OBRA

1 Ud. AUXILIAR

1 SECO

TOPÓGRAFO

MAESTRO OBRA

2 AUXILIARES ALBAÑIL

6 ALBAÑILES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA EL VACIADO DEL SUELO DEL DISCURSO DE LA MAÑANA Y SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DEL GEOTEXTIL Y LA CAPA DE LA VIA. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA SUBBASE Y SU COMPACTACIÓN. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACIÓN DE LA LOSETA PARTIDA Y LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE. SE HACE USO DE EL FIJADOR DEL ACERO DEL DISCURSO. SE CONTINUA CON EL MONTAJE DE LOS TUBOS EN ESPERA DE EL PAÑO 2. SE CONTINUA CON EL RESTO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES:

DURANTE LOS ULTIMOS DIAS, SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS MECÁNICOS EN LOS DISPOSITIVOS ENCARGADOS DE TRITURACIÓN, POR LO CUAL EL RENDIMIENTO DE LOS SUMINISTROS DE LA PLANTA SE HAN DISMINUIDO.

VIERNES 19 DICIEMBRE 2025

✓ ESTADO DEL TIEMPO.

MAÑANA= SECO TARDE= LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1/6. AUXILIAR

HSEQ

TOPOGRAFO

MAESTRO OBRAS

2 AUXILIARES TRANSITO

7 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE INICIA CON EL ARMADO DEL ACERO DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 2. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEX EN LA CANADA DE LA VIA. SE CONTINUA CON LA INSTALACION LA COMPACTACION DE LA SUBBASE. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA VOLTEO RASPADA Y EL VACIADO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LOS FALLOS EN EL TRAMO 2. SE CONTINUA CON EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES:

SABADO 20 DICIEMBRE 2025

✓ ESTADO DE TIEMPO:

MAÑANA: SECO TARDE= SECO

✓ PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE EN OBRA

1 AUX. AUXILIAR
1 ASEQ
1 TOPOGRAFO
1 MAESTRO DE OBRA
2 AUX. RASTRILLO
7 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS:
SE CONTINUA CON EL AMARRE DEL ACERO DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 2. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL EN LA CANCHA. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE SE CONTINUA CON EL FRACTURADO DEL MATERIAL ROCOSO. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, EN EL CUAL SE REALIZO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA RANURADA Y EL RELLENO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LOS TALUDES EN EL TRAMO 1.

✓ OBSERVACIONES:
SE PRESENTAN PROBLEMAS MECANICOS EN LAS CARRETAS DE SUMINISTRO LOS AGREGADOS

DOMINGO 21 DICIEMBRE 2025

✓ ESTADO DE TIEMPO
MAÑANA: SECO
TARDE: LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA
RESIDENTE DE OBRA
1 AUX. AUXILIAR
1 ASEQ
1 TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA
2 AUX. TRANSITO
7 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL ACERO DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 2. LA INTERVENTORIA REVISA EL ACERO Y APROBÓ EL VACIADO DEL CONCRETO DEL PISO DEL DISIPADOR. SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DEL MATERIAL DE ROCA. SE CONTINUA CON LAS GAVIONES PREFABRICADOS, EL TERRAPLEN Y LA CONFORMACION DE LA CALZADA. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA MADERA PLANTADA Y LA INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE

✓ OBSERVACIONES

WPES 22 DICIEMBRE 2025

✓ ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA: SECO TARDE: LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
ING. AUXILIAR
PROFESIONAL AMBIENTAL
HSEQ
TOPOGRAFO
MAESTRO DE OBRA
2 AUX TRANSITO
7 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA EL VACIADO DEL CONCRETO DEL PISO DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 2. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES PRELIMINARES, SE CONTINUA CON LOS TERRAPLENES Y LA CONFORMACION DE LA CALZADA, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZADO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA UBICACION DE LA ROCERA RAMPADA Y EL VACIADO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. SE CONTINUA CON LA FABRICACION DEL MATERIAL DE ROCA. INTERVENTORIA REVISA PLANOS Y APRUEBA LA INSTALACIÓN DEL REFUERZO

✓ OBSERVACIONES.

SE CONTINUA PRESENTANDO PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE LOS AGREGADOS, DEBIDO A PROBLEMAS MECANICOS EN LAS CANTERAS.

MARTES 23 DICIEMBRE 2025.

✓ ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA = LLUVIA TARDE SECO

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
ING. AUXILIAR
PROFESIONAL AMBIENTAL
HSEQ
TOPOGRAFO
MAESTRO DE OBRA
2 AUX. TRANSITO
2 AYUDANTES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUO CON LA INSTALACION DEL REGISTRO. SE CONTINUO CON EL HABILITADO DEL ACERO DE LOS MUROS DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 2. SE CONTINUO CON LAS EXCAVACIONES DEL FILTRO. SE INICIO CON LA EXCAVACION DEL MATERIAL COMUN Y ROCA EN EL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 3. SE CONTINUO CON LAS EXCAVACIONES PRELIMINARES, TERRAPLENES Y LA CONFORMACION DE LA CARRETERA. SE CONTINUO CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. SE CONTINUO CON LA REPARACION DEL AGUA LLUVIA.

✓OBSERVACIONES

SE CONTINUA PRESENTANDO FALLAS MECANICAS EN LAS MAQUINAS DE LAS CAMERAS. DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS SE INICIAN LABORES A LAS 9:00 AM.

MIERCOLES 24 DICIEMBRE 2025

✓ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA = SECO TARDE = LLUVIA

✓PERSONAL EN OBRA.

RESIDENTE DE OBRA

ASEO

1 AUXILIAR

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRANSITO

7 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LOS MUROS DEL DISIPADOR. INTERVENTORIA REVISA Y APRUEBA EL ENCOFRADO DE LOS

MUROS DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 2. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES VARIAS Y EN POCO DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 3. SE CONTINUA CON LA NIVELACION Y COMPACTACION DEL PEDRAPLEN. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓OBSERVACIONES=

x x

VIERNES 26 DICIEMBRE 2025

✓ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA= LLUVIA TARDE= LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1A6. AUXILIAR

ASEO

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX TRASITO

7 AYUDANTES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORIA REVISA NIVELES Y APROBO VACIADO DEL SOLADO DE LA ALCANTARILLA 3. SE REALIZO EL VACIADO DEL SOLADO. SE CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE LOS MUROS DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 2 SE CONTINUA CON LA NIVELACION Y COMPACTACION DEL PEDRAPLEN. SE CONTINUO CON EL CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓OBSERVACIONES

SE INICIA LABORES A LAS 8:30 AM POR LA PRESENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS.

SABADO 27 DICIEMBRE 2025

✓ ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA = SECO TARDE = SECO

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1,56. AUXILIAR

HSEQ

TOPOGRAFA

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRANSITO

7 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS.

SE FINALIZA CON EL ESCOTIADO DEL DISPARO 2. INTERVENTORIA REVISA Y APRUEBA EL VACIADO DEL CONCRETO DE LOS MUROS. SE REALIZA EL VACIADO DE LOS MUROS DEL DISPARO 2 DE LA ALCANTARILLA 2, SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES DEL FILTRO. INTERVENTORIA REVISA NIVELES Y APRUEBA CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO. SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LOS PAÑOS DEL TRAMO 1. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACIÓN DEL PEDRAPEN. INTERVENTORIA REVISA Y APRUEBA LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL EN LA CAIZADA. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES.

EL CONTRATISTA POR MEDIO DE UN OFICIO, SOLICITA AL CONTRATISTA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR LOS

NOTAS QUE SE PUEDEN SUBRAYAR EN EL DOCUMENTO

DOMINGO 28 DICIEMBRE 2025

✓ESTADO DEL TIEMPO

NUBLADO = LLUVIA TODOS LLUVIA

✓PROFESIONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. AUXILIAR

ASEO

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRASITO

7 AYUDANTES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, L REALIZADO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TOBERA RANURADA Y LA INSTALACION DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL DE LA CALZADA. SE INSTALACION EL ANCLAJE DEL ACERO DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 3, SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORIA POR MEDIO DE UN OFICIO PRESENTADO A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO, PRESENTA EL INICIO DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO.

LUNES 29 DICIEMBRE 2025

✓ ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA= LLUVIA TARDE= LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1 AUX. AUXILIAR

PROFESIONAL AMBIENTAL

HSEQ

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRASITO

7 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL EN LA CAMA. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE. SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL ACERO DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 3. INTERVENTORIA REVISA Y APRUEBA EL VACIADO DEL CONCRETO DEL PISO. SE REALIZA EL VACIADO DEL CONCRETO DEL PISO DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 3. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL PINCHO REALIZANDO LA INSTALACIÓN DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA RANURADA Y EL VACIADO E INSTALACION DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES.

MARTES 30 DICIEMBRE 2025

✓ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA= SECO TARDE= LLUVIA

✓OBSERVACIONES.

POR MEDIO DE UN ACTA, SE SUSCRIBE EL ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO, ESTABLECIENDO COMO FECHA DE REINICIO A LOS 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2026.

JUEVES 29 ENERO 2026

✓ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA= SECO TARDE=SECO

✓PERSONAL EN OBRA

DIRECTO DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. AUXILIAR

PROFESIONAL AMBIENTAL

HSEQ

TOPOGRAFIA

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRANSITO

8 AYUDANTES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL EN LA CALZADA. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y LA COMPACTACION DE LA SUBBASE. SE REALIZA UNA LIMPIEZA EN LA ZONA DEL PISO DEL DISIPADOR. SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL ACERO DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA [redacted] SE REALIZA LIMPIEZA EN LAS EXCAVACIONES DE LOS

FILTROS. LA INSPECTORA REVISA LAS EXCAVACIONES Y APRUEBA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. SE INICIA CON LA CONSTRUCCION DE LAS CAMASTRAS PARA EL PAVIMENTO Y EL CORTE DEL ACERO.

✓OBSERVACIONES.

SE PRESENTAN CONSTANTES AGUACEROS SOBRE LA VIA DE ACCESO, LO CUAL IMPIDE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES.

VIERNES 30 DE ENERO 2025

✓ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA = SECO TARDE = LLUVIA

✓PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1 INGE. AUXILIAR

PROFESIONAL AMBIENTAL

HSEQ

TOPOGRAFO

2 AUX. TRANSITO

MAESTRO DE OBRA

8 AYUDANTES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL EN LA CAJUELA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE. SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL ACERO DEL DISIPADOR. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE LOS FILTROS, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA RANURADA Y LA INSTALACION DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LAS

[illegible] DEL CONCRETO Y EL CORTE DEL ACERO. SE [illegible] CON EL CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL [illegible].

OBSERVACIONES.

DEBIDO A LA PRESENCIA DE FUERTES LLUVIAS, SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES A LAS 3:00 P.M.

SABADO 31 DE ENERO DE 2025

ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA: SECO TARDE: LLUVIA.

PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ASEO

1X6 AUXILIAR

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX TRASITO

8 AYUDANTES

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA PERFORADA Y EL VACIADO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL EN LA CAMARA, SE CONTINUA CON LA NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE, SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL ACERO DE LOS MUROS DE CONTENCION, INTERVENTORIA REVISA EL ACERO Y APRUEBA EL COLOCADO DE LOS MUROS. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES:

SE SUSPENDEN ACTIVIDADES A LAS 2:30 P.M, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS.

DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2026

✓ SE PROGRAMAN ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, SIN EMBARGO, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS SE SUSPENDEN ACT...

LUNES 02 DE FEBRERO 2026

✓ ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA: SECO TARDE: SECO

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ASEO

TOPOGRAFO

1/2 AUXILIAR

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. ALBAÑIL

8 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL AMARRE Y CONSTRUCCION DE LAS CANASTILLAS DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL CORTE DEL ACERO DEL PAVIMENTO. SE INICIA CON EL ENCOFRADO DE LOS MUROS DEL DISIPADOR DE LA ALCANTARILLA 3. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES PRELIMINARES EN LA CALZADA, LOS TERRAPLENES Y LA CONFORMACION DE LA CALZADA. SE CONTINUA CON LAS

EXCAVACIONES PRELIMINARES Y EMPACO DE LOS FILTROS. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE

✓OBSERVACIONES

MARTES 03 DE FEBRERO DE 2026

✓ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA= SECO TARDE= LLUVIA

✓PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. AUXILIAR

HSEQ

TOPOGRAFA

PROFESIONAL AMBIENTAL

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRASTO

8 AYUDANTES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

SE FINALIZA CON EL ENCOFRADO DE LOS MUROS DE DISIPACION DE LA ALCANTARILLA 3. INTERVENTORIA REVISO ESPESORES Y APROBÓ EL VACIADO DE CONCRETO. SE REALIZA EL VACIADO DEL CONCRETO DE LOS MUROS DEL DISIPADOR, SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LAS CABEZAS Y EL CORTE DEL ACERO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES PRELIMINARES, LOS TERRAPLENES Y CONFORMACION DE LA CALZADA. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES VARIAS Y EMPACO DE LOS FILTROS SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES

MIERCOLES 04 DE FEBRERO, 2026

✓ ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA: SECO TARDE: LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. AUXILIAR

HSEQ

TOPOGRAFIA

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRANSITO

8 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES PRELIMINARES, LOS TERRAPLENES Y LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES VARIAS Y ROCA DE LOS FILTROS. SE INICIA CON LAS EXCAVACIONES VARIAS Y EN ROCA DEL CANAL EN EL TALUD DEL TRAMO 2. [illegible] REVISA NIVELES DE LA CALZADA Y APRUEBA LA INSTALACIÓN DEL PEDRAPIEN. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL PEDRAPIEN. SE CONTINUA CON EL AMARRE DE LAS CANASTILLAS Y EL CORTE DEL ACERO DEL PAVIMENTO. SE [illegible] CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL [illegible].

[illegible] CIONES

[illegible] LA PRESENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS,

SE SUSPENDEN ACTIVIDADES A LAS 3:00 PM. DE IGUAL MANERA, SE PRESENTAN DERRUMBES EN LA VIA DE ACCESO A LA OBRA Y SE PRESENTAN MULTIPLES CONGESTIONES VEHICULARES.

JUEVES 05 DE FEBRERO, 2026.

✓ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA= SECO TARDE= LLUVIA.

✓PERSONAL EN OBRA

✓RESIDENTE DE OBRA

✓ 1PE AUXILIAR

ASEO

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRASITO

8 ALBAÑILES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y LA COMPACTACION DEL PEDRAPEN. LA INTERVENTORIA REVISA AVANCES DE LAS EXCAVACIONES DE LAS FUNDAS Y [illegible] DE CONSTRUCCION DEL MISMO. SE CONTINUA CON LA INSTALACION [illegible] DEL GEOTEXTIL, DEL MATERIAL [illegible] TRITURADA Y EL VACIADO COMO [illegible] SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES EN ARE[illegible] DEL TALUD. SE CONTINUA CON LOS [illegible] MUROS Y EL CORTE DEL ACERO DEL [illegible] CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL [illegible] SE CONTINUA CON LA FRACTURACION [illegible] CA.

✓OBSERVACIONES.

DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS, SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES A LAS 3.00 PM.

VIERNES 06 DE FEBRERO, 2026

✓ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA= SECO TARDE= LLUVIA.

✓PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. AUXILIAR

HSEQ

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRASTERO

8 AYUDANTES:

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL CORTE DEL ACERO Y EL ARMADO DE LAS CANASTILLAS DEL PAVIMENTO, SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DEL PEDRAPLEN. SE EVIDENCIA FALLAS LOCALES Y CON LA AUTORIZACION DE LA INTERVENTORIA SE EXTRAE EL MATERIAL, Y SE REALIZA LA INSTALACION DEL PEDRAPLEN. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA PERFORADA Y EL VACIADO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES EN LA CONFORMACION DEL CANAL DEL TALUD, SE CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE

CIONES

SABADO 07 DE FEBRERO, 2026

✓ ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA = LLUVIA TARDE = SECO

✓ PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1,ES AUXILIAR

HSEQ

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRASITO

8 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA TUBERIA RANURADA Y EL VACIADO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LOS PAILOS EN EL TRAMO 1. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DEL RECEBADO. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES DEL CANAL EN EL TALUD DEL TRAMO 2. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE LAS CUNETILLAS Y EL ACERO DEL PAVIMENTO.

✓ OBSERVACIONES

DEBIDO A LAS FUERTES [illegible] NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES A LAS [illegible]

✓ DOMI[illegible] FEBRERO, 2026

TARDE = SECO

✓ PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1/6. AUXILIO

1 SECO

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRASTO

8 ALBAÑILES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DEL PLASTICO. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA TUBERIA RANURADA Y EL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES DEL CANAL DEL TRAMO 2. SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LOS FALLOS ENCONTRADOS EN EL TRAMO 1. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE LAS CANASTILLAS Y EL ACERO DEL PAVIMENTO.

✓ OBSERVACIONES

✓ LUNES 09 DE FEBRERO, 2026

✓ ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA SECO TARDE LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

[redacted]

✓ REGISTRO DE CAMPO

✓ AUX. TRANSITO

✓ ANDAMIOS

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES Y LA CONFORMACION DE CAPA EN EL TALUD. SE CONTINUO CON LA INSTALACION Y LA CONFORMACION DE GEOCELDA. INTERFERENCIA REDES ELECTRICAS Y APROBADA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE LA SUBBASE EN LA CALZADA. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA TUBERIA RANURADA Y EL VACIADO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LAS CANASTILLAS Y EL ACERO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES

SE SUSPENDEN ACTIVIDADES A LAS 3:30 PM DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO

MARCES 10 DE FEBRERO, 2026.

✓ ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA = SECO TARDE = SECO

✓ RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTOR DE OBRA

AUXILIAR

RESIDENTE AMBIENTAL

SISO

MAESTRO DE OBRA
2 AUX. TRANSITO
8 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION EN EL MEJORAMIENTO DE LOS FALLOS DEL TRAMO 3. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL EN LA CALZADA. SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA, REALIZANDO LA INSTALACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE. SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL ACERO EN LAS CANASTILLAS DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA RANURADA Y EL VACIADO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES VARIAS Y EN ROCA EN LA CONSTRUCCION DEL CANAL EN EL TALUD DEL TRAMO 2.

✓ OBSERVACIONES

MIERCOLES 11 DE FEBRERO, 2026

✓ ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA: SECO TARDE: SECO

✓ PERSONAL EN OBRA

[redacted] DE OBRA
[redacted] DE OBRA
[redacted] NAR
[redacted] AMBIENTAL

...ción de obra

... Transitorio

Movimientos

Actividades Realizadas

Se continua con las excavaciones manuales y en roca en la nivelación del terreno para la construcción del canal en el talud. Interventoría revisa los niveles de las excavaciones y aprueba con la construcción del canal se inicia con el relleno de los sacos con suelo cemento y la instalación de la geomembrana en las excavaciones. Se continua con la instalación del geotextil de la calzada. Se continua con la instalación y compactación de la subbase. Se continua con el corte y amarre del acero, se continua con el armado de las canastillas del pavimento. Se continua con la instalación del geotextil, la instalación de la tubería ranurada y el relleno del material filtrante. Se continua con el corte y el retiro del material sobrante.

✓ Observaciones

Jueves 12 de febrero, 2026

✓ Estado del tiempo

Mañana: Lluvia Tarde: Seco

✓ Personal en obra

Director de obra

Residente de obra

1 op. Auxiliar

1 SISO

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRABAJO

7 ALBAÑILES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL RELLENO DEL SUELO CEMENTO EN LOS SACOS. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA GEOMEMBRANA. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA FILTRANTE Y EL RELLENO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE. SE CONTINUA CON EL CORTE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LAS CANASTILLAS, Y EL CORTE DEL ACERO DEL PAVIMENTO Y LAS CUNETAS.

✓ OBSERVACIONES

DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS, SE INICIAN LABORES A LAS 8:30 A.M.

VIERNES 13 DE FEBRERO, 2026

✓ ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA= SECO TARDE= LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

AUXILIAR

TOPOGRAFO

[illegible] DE OBRA

[illegible]

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL RELLENO Y LA COMPACTACION DE LOS SACOS DE SUELO CEMENTO. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA GEOMEMBRANA. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y LA COMPACTACION DE LA SUBBASE. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA RANURADA Y EL VACIADO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE LAS CUNETILLAS DE PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL ARMADO Y EL COLADO DEL ACERO DEL PAVIMENTO Y LAS CUNETAS.

✓ OBSERVACIONES

A LO LARGO DEL TRAMO 2, SE REALIZAN LOS ENSAYOS DE DENSIDADES Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS, LA INGENIERIA REVISA Y APRUEBA LA CUAL CON LA INSTALACION Y EL VACIADO DEL CONCRETO DEL PAVIMENTO.

SABADO 14 DE FEBRERO, 2026

✓ ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA: SECO TARDE: SECO

✓ PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1.26. AUXILIAR

TOPOGRAFO

HSEQ

MAESTRO DE OBRA

2 [illegible]

[illegible]

[illegible] Y COMPACTACION DE LA

SUBBASE. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA GEOMEMBRANA. SE CONTINUA CON EL RELLENO Y LA INSTALACION DE LOS SACOS DE SUELO CEMENTO. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA TUBERIA PERFORADA Y EL RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LAS CAPACITINAS. SE CONTINUA CON EL CORTE Y EL TIGERADO DEL ACERO DEL PAVIMENTO Y LAS CUNETAS. SE INICIA CON EL ENCOFRADO DEL PAVIMENTO.

/OBSERVACIONES

DOMINGO 15 DE FEBRERO, 2026

/SE PROGRAMAN ACTIVIDADES, SIN EMBARGO, DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS, NO ES POSIBLE INICIAR CON LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

LUNES 16 DE FEBRERO, 2026

/ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA= SECO TARDE= LLUVIA

/PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1 AUXILIAR

PROFESIONAL AMBIENTAL

TOPOGRAFO

ASEO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRASITO

8 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA GEOMEMBRANA. SE CONTINUA CON LA IMPERMEABILIZACION Y EL RELLENO DE LOS SACOS CON MATERIAL SUELO CEMENTO. SE CONTINUA CON EL EXCAVADO DEL PAVIMENTO Y LA INSTALACION DEL ACERO. SE REALIZAN PRUEBAS DE CONCRETO Y APLICACION DEL CURADOR DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE, SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LOS TALUDES PRESENTADOS EN EL TRAMO 2. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA PERFORADA Y EL VACIADO DEL MATERIAL FILTRANTE.

✓ OBSERVACIONES

MARTES 17 DE FEBRERO, 2026

✓ ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA= SECO TARDE= LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

[illegible]

PROFESIONAL AMBIENTAL

[illegible]

[illegible]

2 AYUDANTES

MAESTRO DE OBRA

8 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE INICIA CON EL VACIADO DEL CONCRETO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL ESPARCIDO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LAS CANASTILLAS DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL ACERO DEL PAVIMENTO Y LAS CUÑAS. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LOS SUELOS EN MATERIAL SUELO CEMENTO. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES PRELIMINARES, LOS TERRAPLENES Y LA CONFORMACIÓN DE LA CAMA. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO, LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL, LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA RANURADA Y EL VACIADO DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES

MIERCOLES 18 DE FEBRERO, 2026

✓ ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA = SECO TARDE LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

2 DG AUXILIAR

PROFESIONAL AMBIENTAL

ASEO

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRASTO

8 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL VACIADO DEL PAVIMENTO RIGIDO. SE

... CON EL EXCAVADO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON
... AMARRE Y FIGURADO DEL ACERO DEL PAVIMENTO Y LO
... SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES PRELIMINARES,
... TRANSPORTES Y LA CONFORMACION DE LA CALZADA. SE
... CON LAS EXCAVACIONES DEL FILTRO. SE FINALIZA
... LA CONSTRUCCION DEL CANAL EN EL TRAMO DEL TRAMO 2.
... CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL
... TE

✓OBSERVACIONES

SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES DEBIDO A LA PRESENCIA
DE FUERTES LLUVIAS A LAS 3:00 P.M.

JUEVES 19 DE FEBRERO, 2026

✓ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA = SECO TARDE = LLUVIA

✓PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

INS. AUXILIAR

TOPOGRAFO

[illegible]

MAESTRO DE OBRA

2 [illegible]

[illegible]

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL EXCAVADO DEL PAVIMENTO. SE
CONTINUA CON EL [illegible] DE [illegible] DEL
ACERO DEL PAVIMENTO SE CONTINUA CON EL AMARRE Y EL
CORTE DEL ACERO DEL PAVIMENTO Y LAS CUNETAS. SE
CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES PRELIMINARES, LOS

TERRAPLENES Y LA CONFORMACION DE LA CALZADA. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES DEL FILTRO SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓OBSERVACIONES.

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, SE SUSPENDEN ACTIVIDADES A LAS 3.20 P.M.

✓VIERNES 20 DE FEBRERO, 2026

✓ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA= LLUVIA TARDE= SECO

✓PERSONAL DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. AUXILIAR

TOPOGRAFO

HSEQ

MAESTRO DE OBRA

2 AUX TRANSITO

8 AYUDANTES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES PRELIMINARES, LOS TERRAPLENES Y LA CONFORMACION DE LA CALZADA. INTERVENTORIA REVISA LOS PLANOS DE LAS EXCAVACIONES DE LOS FILTROS Y APRUEBA EL COMIENZO DEL FILTRO. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, INSTALACION DE LA TUBERIA RANURADA Y EL VACIADO DE LA INSTALACION DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL VACIADO, EL VIBRADO Y LA INSTALACION DEL ACERO DEL [illegible]. SE CONTINUA CON EL CORTE DEL ACERO

104

Y LA CUNETA Y DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

OBSERVACIONES

SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS DURANTE LA JORNADA LABORAL Y POR ENDE, SE INICIA TRABAJOS A LAS 9:00 A.M.

SABADO 21 DE FEBRERO, 2026

✓ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA: SECO TARDE: LLUVIA

✓PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1A6. AUXILIAR

TOPOGRAFA

HSEQ

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRANSITO

5 AYUDANTES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ATAPE DE LAS CAMASTILLAS DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL VACIADO DEL CONCRETO, EL [illegible] Y LA INSTALACION DEL ACERO DEL PAVIMENTO. SE [illegible] CON EL ENCOFRADO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA [illegible] CONSTRUCCION DEL MURO, REALIZANDO LA INSTALACION [illegible], LA INSTALACION DE LA TUBERIA Y LA INSTALACION DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES PRELIMINARES, LOS TERRAPLENES Y LA CONFORMACION DE LA CALZADA. LA INTERVENTORIA REVISA NIVELES DE LA CALZADA Y APRUEBA LA INSTALACION DEL PEDRAPLEN. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓OBSERVACIONES.

SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES A LAS 3:00 P.M, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS.

DOMINGO 22 DE FEBRERO, 2026

✓ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA= LLUVIA TARDE= LLUVIA

✓PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1P6. AUXILIAR

ASEO

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRASITO

8 AYUDANTES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORIA REVISA PLANOS Y APRUEBA EL ENCOFRADO DE LAS CUNETAS, SE INICIA CON EL ENCOFRADO DE LAS CUNETAS Y SE REALIZA EL AMARRE E INSTALACION DEL ACERO DE LA CUNETA. SE CONTINUA CON EL ENCOFRADO DEL PAVIMENTO, SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y LA COMPACTACION DEL RECEBO.

✓OBSERVACIONES

POR LAS CONSTANTES LLUVIAS SE PRESENTAN DERRUMBES EN DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO A LA OBRA. DE IGUAL MANERA, SE SUSPENDEN ACTIVIDADES A LAS 3:30 P.M.

(13)

23 DE FEBRERO, 2026.

- ESTADO DE TIEMPO
  MAÑANA: SECO TARDE: SECO

- PERSONAL EN OBRA
  INSPECTOR DE OBRA
  RESIDENTE DE OBRA
  LAB. AUXILIAR
  HSEQ
  PROFESIONAL AMBIENTAL
  TOPOGRAFO
  MAESTRO DE OBRA
  2 AUX. TRANSITO
  8 AYUDANTES

- ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL EXCAVADO, EL ARMADO E INSTALACION DEL ACERO DE LAS CUNETAS. INTERVENTORIA REVISA Y APRUEBA EL VACIADO DEL CONCRETO. SE REALIZA EL VACIADO Y EL VIBRADO DEL CONCRETO DE LAS CUNETAS. INTERVENTORIA REVISA Y APRUEBA EL VACIADO DEL CONCRETO DEL PAVIMENTO SE REALIZA EL VACIADO DEL CONCRETO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LAS CANASTILLAS DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON CON LA INSTALACION Y LA COMPACTACION DEL PEDRAPLEN. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZADO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA RANURADA Y LA [illegible] DEL MATERIAL FILTRANTE.

- OBSERVACIONES

A LO LARGO DE LA JORNADA, CONTINUAS LOS DERRUMBES EN LOS DIFERENTES PUNTOS, PRESENTANDO AFECTACIONES Y CIERRES TOTALES EN LA UNICA VIA DE ACCESO A LA OBRA

LUNES 25 DE FEBRERO, 2026

CLIMA DE TIEMPO
MAÑANA - SECO
TARDE= LLUVIA

✓ RESIDENTE DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
INSP. AUXILIAR
PROFESIONAL AMBIENTAL
HSEQ
TOPOGRAFA
MAESTRO DE OBRA
2 AUX. TOPOGRAFO
8 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS
SE CONTINUA CON EL VACIADO Y EL VIBRADO DEL CONCRETO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO DE LA CUNETA. SE CONTINUO CON EL ESCOPLADO Y EL AMARRE DEL ACERO DEL PAVIMENTO Y LA CUNETA. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DEL PEDRAPIEN. INTERVENTORIA REVISA Y APRUEBA LA INSTALACION DE LA SUBBASE. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, SE REALIZA LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA TUBERIA RANURADA Y LA INSTALACION DEL MATERIAL FILTRANTE.

✓ [illegible]

LUNES 26 DE FEBRERO, 2026

✓ ESTADO DEL TIEMPO
TARDE= LLUVIA

✓ PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. AUXILIAR

ASEO

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX. TRANSITO

8 MONTADORES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL EN LA CALZADA. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y COMPACTACION DE LA SUBBASE. SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL ACERO Y EL ENCOFRADO DE LA CUNETA. SE CONTINUA CON EL ENCOFRADO DEL PAVIMENTO Y LA INSTALACION DEL ACERO. INTERVENTORIA REVISA Y APRUEBA EL VACIADO DEL CONCRETO DE LA CUNETA Y DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL VACIADO Y EL VIBRADO DEL CONCRETO DE LA CUNETA. SE CONTINUA CON EL VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES VARIAS Y EN ROCA DEL FILTRO. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES

SE SUSPENDEN ACTIVIDADES A LAS 3:30 PM DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS.

VILLAPINZON 17 DE FEBRERO, 2026

✓ ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA: SECO TARDE: SECO

✓PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. AUXILIAR

LISEO

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

3 AUX. ALBAÑIL

7 AYUDANTES

✓ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL EN LA CALZADA. SE CONTINUA CON LA INSTALACION Y LA COMPACTACION DE LA SUBBASE. SE CONTINUA CON EL ESCARIFICADO Y LA INSTALACION DE LA CUNETA. SE CONTINUA CON EL ESCARIFICADO DEL PAVIMENTO. INTERVENTORIA REVISA Y APRUEBA EL VACIADO DEL CONCRETO DE LA CUNETA Y DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON EL VACIADO DEL CONCRETO DE LA CUNETA. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LAS CAMASTRAS Y EL VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES VARIAS Y EN BOCA DEL FILTRO. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE

✓OBSERVACIONES

SABADO 28 DE FEBRERO, 2026

✓ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA: LLUVIA TARDE: LLUVIA

✓PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. AUXILIAR

TOPOGRAFO

ASEO

MAESTRO DE OBRA

2 AUX TRASTO

8 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES REALIZADAS

SE CONTINUA CON EL VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO DE LA CUNETA. SE CONTINUA CON EL VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO DEL PAVIMENTO. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL DE LA CALZADA. SE CONTINUA CON ~~LA~~ INSTALACION Y LA COMPACTACION DE LA SUBBASE. INTERVENTORIA REVISA PLANOS Y APRUEBA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL FILTRO, REALIZANDO LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL, LA INSTALACION DE LA MADERA RANURADA. Y LA INSTALACION DEL MATERIAL FILTRANTE. SE CONTINUA CON EL CARGUE Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

✓ OBSERVACIONES

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS, SE INICIAN LABORES A LAS 8:00 AM. DE IGUALMANERA, POR LAS FRECUENTES LLUVIAS SE SUSPENDEN ACTIVIDADES A LAS 3:00 P.M.

Planillas de seguridad social del contratista de obra.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

OBJETO: CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. CO1.PCCNTR.7912853 DEL 30 DE MAYO DE 2025, "MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Yo, **CHAROL MICHELLE CONCHA CORDOBA**, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.095.833.559 de Floridablanca y con tarjeta profesional **295076-T** de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador público de SAFI Construcciones SAS NIT 901.385.053 Empresa que se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al instituto colombiano de bienestar familiar, al servicio nacional de aprendizaje y al fondo nacional de formación profesional para la industria de construcción (Articulo 65 ley 1819 de 2016 y articulo 3 decreto 1047 de 1983), correspondientes al periodo desde día 15 de diciembre del año 2025 al 30 de diciembre del año 2025 y del 29 de enero del año 2026 al 29 de febrero del año 2025, y las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, razón por la cual, se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales. Bajo la gravedad de juramento certifico que el CONSORCIO EMR-APP BELLEZA, no tiene nomina bajo su razón social, ésta es pagada por el consorciado mayoritario SAFI Construcciones SAS NIT 901.385.053

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En Constancia se firma en Floridablanca a los cinco (05) días del mes de marzo de 2026.

CHAROL MICHELLE CONCHA CORDOBA
CC. 1.095.833.559
CONTADOR PÚBLICO
TP. 295076-T

WILMER ANDRES GARCIA RUIZ
CC. 1.114.119.732
R/L CONSORCIO EMR-APP BELLEZA



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES


295076-T

CHAROL MICHELLE
CONCHA CORDOBA
C.C. 1065833559
RES. INSCRIPCION 757 DEL 28/03/2022
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

318067

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

320624

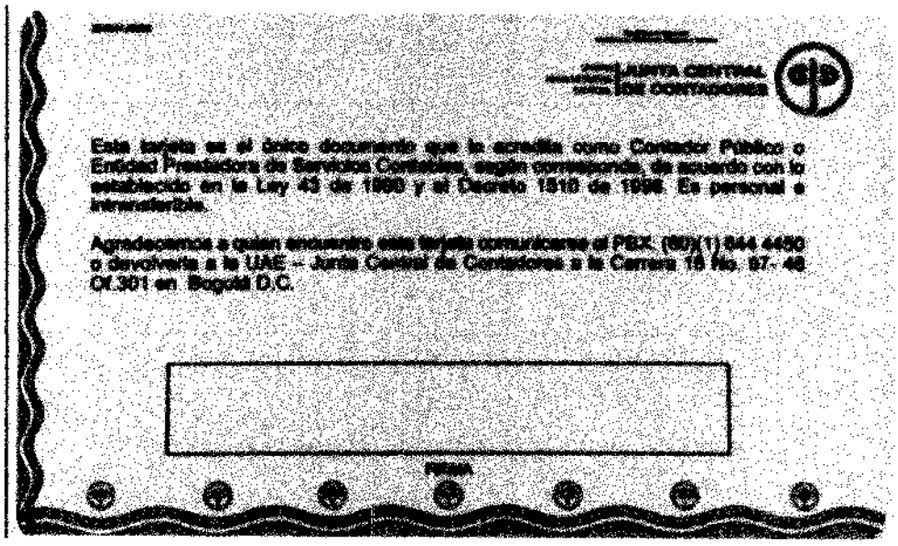

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 15 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.095.833.559
CONCHA CORDOBA

CHAROL MICHELLE





31-MAY-1997
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

1.60 A+ F

DE JUN-2015 FLORIDABLANCA

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

8 B E 2 7 1 3 6 B F C 5 8 4 9 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CHAROL MICHELLE CONCHA CORDOBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1095833559 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 295076-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición

SANDRA MILENA RAMIREZ OTALORA
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

152511-T



LYDA PAOLA
SIERRA GOMEZ
C.C. 37652814
RESOLUCION INSCRIPCION 252 FECHA 12/08/2010
UNIVERSIDAD DE CAMPUONA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

77672





16-SEP-1932
SAN VICENTE DE CHUCURI
(SANTANDER)

1.60 A+ F

22-DIC-2003 SAN VICENTE DE CHUCURI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 3 A Z D 7 0 B 4 E 3 0 3 7 6 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LYDA PAOLA SIERRA GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37652414 de SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 152511-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA	CODIGO	AP-CCP-RG-74
		VERSION	0
		FECHA DE APROBACION	2/06/2023
		PAGINA	3 DE 3

CONTRATISTA: CONSORCIO EMR-APP BELLEZA
NIT: 901.949.762-5
CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7812853 30 DE MAYO DE 2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2026

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DESVINCULACION	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	1.098.717.479	DIRECTOR	CONTRATO INDEFINIDO	$ 4.000.000,00	25%	25/07/2025		30	feb-26	36737266	$ 3.000.000,00	$ 120.000,00	$ 480.000,00	$ 208.800,00	$ 928.800,00
OSCAR DAVID VERA ROJAS	1.098.672.956	RESIDENTE	CONTRATO INDEFINIDO	$ 3.220.000,00	100%	25/07/2025		30	feb-26	85036071	$ 3.220.000,00	$ 402.500,00	$ 515.200,00	$ 224.200,00	$ 1.146.000,00
CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN	1.101.178.503	INGENIERO AUXILIAR	CONTRATO INDEFINIDO	$ 2.000.000,00	100%	25/07/2025		30	feb-26	36737266	$ 3.008.400,00	$ 120.400,00	$ 481.400,00	$ 209.400,00	$ 931.600,00
MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO	1.098.755.645	PROFESIONAL HSEQ	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 2.500.000,00	90%	25/07/2025		30	feb-26	62419101	$ 1.750.905,00	$ 218.900,00	$ 280.200,00	$ 121.900,00	$ 517.400,00
YADIRA DURAN GARCIA	37.993.183	COMISION TOPOGRAFICA	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 3.000.000,00	90%	25/07/2025		30	feb-26	83865767	$ 1.750.905,00	$ 218.900,00	$ 280.200,00	$ 121.900,00	$ 621.000,00
SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS	63.051.449	PROFESIONAL PMP	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 2.000.000,00	90%	1/08/2025		30	feb-26	83866008	$ 1.750.905,00	$ 218.900,00	$ 280.200,00	$ 121.900,00	$ 621.000,00
RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES	91.488.767	INGENIERO AMBIENTAL	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 3.200.000,00	50%	1/08/2025		30	feb-26	83917737	$ 1.750.905,00	$ 218.900,00	$ 280.200,00	$ 121.900,00	$ 621.000,00
MARCO ANTONIO BUITRAGO BOHORQUEZ	8.390.036	MAESTRO DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	6/10/2025		30	feb-26	36737266	$ 1.850.389,00	$ 74.100,00	$ 266.100,00	$ 128.800,00	$ 573.100,00
LENIS ADRIANA RUIZ QUIROGA	63.371.051	AUXILIAR DE TRANSITO	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	18/01/2026		30	feb-26	36737266	$ 1.910.079,00	$ 76.500,00	$ 305.700,00	$ 133.000,00	$ 591.700,00
WILLIAM ROMERO ARIZA	1.101.018.635	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	27/01/2026		30	feb-26	36737266	$ 1.880.234,00	$ 75.300,00	$ 300.900,00	$ 130.900,00	$ 582.400,00
JESUS EMILIO ARIZA SANTAMARIA	5.601.920	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	4/10/2025		30	feb-26	36737266	$ 1.880.234,00	$ 75.300,00	$ 300.900,00	$ 130.900,00	$ 582.400,00
LUIS ALBERTO PUENTES QUIROGA	5.770.883	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	12/11/2025		30	feb-26	36737266	$ 1.989.666,00	$ 79.600,00	$ 318.400,00	$ 138.500,00	$ 616.100,00
JOSE ISIDRO ARANGO YARA	83.228.569	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	12/11/2025		30	feb-26	36737266	$ 1.800.647,00	$ 72.100,00	$ 288.200,00	$ 125.400,00	$ 557.800,00
ALVEIRO GARCIA VARGAS	79.769.044	OFICIAL DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	16/02/2026		14	feb-26	36737266	$ 838.987,00	$ 26.500,00	$ 134.100,00	$ 46.100,00	$ 233.200,00
DAYRON DAVID SANCHEZ QUIROGA	1.101.018.486	OFICIAL DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	26/01/2026		30	feb-26	36737266	$ 1.929.976,00	$ 77.200,00	$ 308.800,00	$ 134.400,00	$ 597.600,00
JUAN CAMILO PEÑA PINEDA	1.101.018.705	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	1/12/2025		30	feb-26	36737266	$ 1.880.234,00	$ 75.300,00	$ 300.900,00	$ 130.900,00	$ 582.400,00
NELLY YOMAIRA RUIZ QUIROGA	1.101.018.669	AUXILIAR DE TRANSITO	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	18/01/2026		30	feb-26	36737266	$ 1.910.079,00	$ 76.500,00	$ 305.700,00	$ 133.000,00	$ 591.700,00
CRISTIAN MAURICIO SANCHEZ TELLEZ	1.030.583.343	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	4/10/2025		30	feb-26	36737266	$ 1.920.027,00	$ 76.900,00	$ 307.300,00	$ 133.700,00	$ 594.800,00

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
WILMER ANDRÉS GARCIA RUIZ
CONSORCIO EMR APP BELLEZA
CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA DE LA INTERVENTORIA
CARLOS ALBERTO GALVIS RUEDA
UNION TEMPORAL SOLASEC
INTERVENTOR

Gobernación de Santander	**CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA**	CODIGO	AP-CCP-RG-74
		VERSION	0
		FECHA DE APROBACION	2/06/2023
		PAGINA	2 DE 3

CONTRATISTA: CONSORCIO EMR-APP BELLEZA
NIT: 901.949.762-6
CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7912883 30 DE MAYO DE 2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERIODO FACTURADO: ENERO 2026

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DESVINCULACION	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	1.098.717.479	DIRECTOR	CONTRATO INDEFINIDO	$ 4.000.000,00	25%	25/07/2025		30	ene-26	36426892	$ 3.000.000,00	$ 120.000,00	$ 480.000,00	$ 125.300,00	$ 845.300,00
OSCAR DAVID VERA ROJAS	1.098.672.955	RESIDENTE	CONTRATO INDEFINIDO	$ 3.220.000,00	100%	25/07/2025		30	ene-26	85035972	$ 3.220.000,00	$ 402.500,00	$ 515.200,00	$ 224.200,00	$ 1.452.400,00
CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN	1.101.178.503	INGENIERO AUXILIAR	CONTRATO INDEFINIDO	$ 2.000.000,00	100%	25/07/2025		30	ene-26	36426892	$ 3.008.400,00	$ 120.500,00	$ 481.400,00	$ 181.500,00	$ 903.800,00
MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO	1.098.766.645	PROFESIONAL HSEQ	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 2.500.000,00	90%	25/07/2026		30	ene-26	46836850	$ 1.750.905,00	$ 218.900,00	$ 280.200,00	$ 18.300,00	$ 517.400,00
YADIRA DURAN GARCIA	37.893.183	COMISION TOPOGRAFICA	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 3.000.000,00	90%	25/07/2025		30	ene-26	83865750	$ 1.750.905,00	$ 218.900,00	$ 280.200,00	$ 121.900,00	$ 621.000,00
SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS	63.081.449	PROFESIONAL PMP	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 2.000.000,00	90%	1/08/2025		30	ene-26	83866008	$ 1.750.905,00	$ 218.900,00	$ 280.200,00	$ 121.900,00	$ 621.000,00
RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES	91.486.787	INGENIERO AMBIENTAL	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 3.600.000,00	50%	1/08/2025		30	ene-26	83917732	$ 1.750.905,00	$ 218.900,00	$ 280.200,00	$ 121.900,00	$ 621.000,00
MARCO ANTONIO BUITRAGO BOHORQUEZ	9.390.036	MAESTRO DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	6/10/2025		30	ene-26	36426892	$ 1.820.544,00	$ 40.200,00	$ 291.400,00	$ 69.900,00	$ 441.700,00
NELLY YOMAIRA RUIZ QUIROGA	1.101.019.669	AUXILIAR DE TRANSITO	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	16/01/2026		12	ene-26	36426892	$ 809.764,00	$ 32.400,00	$ 129.600,00	$ 56.400,00	$ 250.600,00
WILLIAM ROMERO ARIZA	1.101.018.635	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	27/01/2026		4	ene-26	36426892	$ 313.041,00	$ 12.600,00	$ 50.100,00	$ 21.800,00	$ 97.100,00
JESUS EMILIO ARIZA SANTAMARIA	5.601.920	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	4/10/2025		30	ene-26	36426892	$ 1.800.131,00	$ 52.700,00	$ 304.200,00	$ 59.200,00	$ 488.800,00
LUIS ALBERTO PUENTES QUIROGA	5.770.883	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	12/11/2025		30	ene-26	36426892	$ 1.800.132,00	$ 50.400,00	$ 304.200,00	$ 59.200,00	$ 464.200,00
DAYRON DAVID SANCHEZ QUIROGA	1.101.018.488	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	28/01/2026		3	ene-26	36426892	$ 175.091,00	$ 7.100,00	$ 28.100,00	$ 12.200,00	$ 54.500,00
JOSE ISIDRO ARANGO YARA	63.228.559	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	12/11/2025		30	ene-26	36426892	$ 1.800.132,00	$ 50.400,00	$ 304.200,00	$ 59.200,00	$ 464.200,00
MICHAEL ANDRES ROJAS GALINDO	1.095.834.081	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 2.400.000,00	100%	16/12/2025		30	ene-26	36426892	$ 2.659.092,00	$ 55.200,00	$ 425.500,00	$ 96.000,00	$ 631.800,00
JUAN CAMILO PEÑA PINEDA	1.101.018.705	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	1/12/2025		30	ene-26	36426892	$ 1.800.131,00	$ 35.400,00	$ 304.200,00	$ 59.200,00	$ 446.900,00
LENIS ADRIANA RUIZ QUIROGA	63.371.051	AUXILIAR DE TRANSITO	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905,00	100%	16/01/2026		12	ene-26	36426892	$ 669.381,00	$ 35.800,00	$ 142.400,00	$ 62.000,00	$ 275.600,00
CRISTIAN MAURICIO SANCHEZ TELLEZ	1.030.593.343	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.750.906,00	100%	4/10/2025		30	ene-26	36426892	$ 1.939.924,00	$ 64.300,00	$ 310.600,00	$ 62.000,00	$ 461.200,00

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
WILMER ANDRÉS GARCIA RUIZ
CONSORCIO EMR APP BELLEZA
CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL INTERVENTORIA
CARLOS ROBERTO GALVIS RUEDA
UNION TEMPORAL SOLASEC
INTERVENTOR

República de Colombia Gobernación de Santander	CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA	CODIGO	AP-COP-RG-74
		VERSION	0
		FECHA DE APROBACION	2/05/2023
		PAGINA	1 DE 3

CONTRATISTA: CONSORCIO EMR-APP BELLEZA
NIT: 901.949.767-9
CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7912853 30 DE MAYO DE 2025
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2025

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	SALARIO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DESVINCULACION	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	1.098.717.479	DIRECTOR	CONTRATO INDEFINIDO	$ 4.000.000,00	25%	25/07/2025		30	dic-25	36000868	$ 2.600.000,00	$ 100.000,00	$ 400.000,00	$ 174.000,00	$ 774.000
OSCAR DAVID VERA ROJAS	1.098.872.955	RESIDENTE	CONTRATO INDEFINIDO	$ 3.220.000,00	100%	25/07/2025		30	dic-25	85035821	$ 3.220.000,00	$ 402.500,00	$ 515.200,00	$ 224.200,00	$ 1.452.400
CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN	1.101.176.503	INGENIERO AUXILIAR	CONTRATO INDEFINIDO	$ 2.000.000,00	100%	25/07/2025		30	dic-25	36000868	$ 2.300.000,00	$ 92.000,00	$ 368.000,00	$ 160.100,00	$ 712.100
MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO	1.098.765.645	PROFESIONAL HSEQ	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 2.500.000,00	80%	25/07/2025		30	dic-25	2753497	$ 1.560.000,00	$ 195.000,00	$ 249.600,00	$ 16.300,00	$ 460.900
YADIRA DURAN GARCIA	37.893.183	COMISION TOPOGRAFICA	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 3.000.000,00	80%	25/07/2025		30	dic-25	82582941	$ 3.220.000,00	$ 178.000,00	$ 227.800,00	$ 99.100,00	$ 504.900
SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS	53.061.449	PROFESIONAL PMP	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 2.000.000,00	90%	1/08/2025		30	dic-25	83865971	$ 3.220.000,00	$ 178.000,00	$ 227.800,00	$ 99.100,00	$ 504.900
RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES	91.486.767	INGENIERO AMBIENTAL	Contrato CPS SAFI CONSTRUCCIONES	$ 3.600.000,00	50%	1/08/2025		30	dic-25	83917730	$ 3.220.000,00	$ 178.000,00	$ 227.800,00	$ 99.100,00	$ 504.900
MARCO ANTONIO BUITRAGO BOHORQUEZ	9.390.036	MAESTRO DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500,00	100%	6/10/2025		30	dic-25	36000868	$ 1.496.293,00	$ 59.900,00	$ 239.500,00	$ 104.200,00	$ 463.500
SHARON MICHELL LOTERO CASTILLO	1.101.019.138	AUXILIAR DE TRANSITO	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500,00	100%	11/11/2025		30	dic-25	36000868	$ 1.472.029,00	$ 55.100,00	$ 235.600,00	$ 95.900,00	$ 441.700
MICHAEL ANDRES ROJAS GALINDO	1.095.834.081	AUXILIAR DE TRANSITO	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 2.100.000,00	100%	16/12/2025		14	dic-25	36000868	$ 1.127.956,00	$ 45.200,00	$ 180.500,00	$ 78.800,00	$ 349.500
ELKIN MAURICIO SANABRIA OLARTE	1.101.018.932	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500,00	100%	6/10/2025		14	dic-25	36000868	$ 664.300,00	$ 26.600,00	$ 106.300,00	$ 46.300,00	$ 211.100
JESUS EMILIO ARIZA SANTAMARIA	5.601.920	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500,00	100%	4/10/2025		30	dic-25	36000868	$ 1.580.409,00	$ 63.300,00	$ 252.900,00	$ 110.090,00	$ 469.500
JUAN CAMILO PEÑA QUIROGA	1.101.018.705	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500,00	100%	1/12/2025		29	dic-25	36000868	$ 1.448.843,00	$ 50.400,00	$ 231.900,00	$ 87.700,00	$ 420.400
LUIS ALBERTO PUENTES QUIROGA	5.770.883	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500,00	100%	12/11/2025		30	dic-25	36000868	$ 1.496.293,00	$ 59.900,00	$ 239.500,00	$ 104.200,00	$ 463.500
JOSE ISIDRO ARANGO YARA	83.226.658	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500,00	100%	12/11/2025		30	dic-25	36000868	$ 1.512.469,00	$ 60.500,00	$ 242.200,00	$ 105.300,00	$ 468.300
DIANA VALENTINA MARIN QUITIAN	1.101.018.646	AUXILIAR DE TRANSITO	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500,00	100%	10/10/2025		30	dic-25	36000868	$ 1.472.029,00	$ 58.900,00	$ 235.600,00	$ 102.500,00	$ 462.300
CRISTIAN MAURICIO SANCHEZ TELLEZ	1.030.583.343	AYUDANTE DE OBRA	Contrato Obra Labor SAFI CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500,00	100%	4/10/2025		30	dic-25	36000868	$ 1.531.881,00	$ 61.300,00	$ 245.200,00	$ 106.700,00	$ 474.500

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
WILMER ANDRÉS GARCIA RUIZ
CONSORCIO EMR APP BELLEZA
CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL INTERVENTORIA
CARLOS ALBERTO SALVIS RUEDA
UNION TEMPORAL SOTASEC
INTERVENTOR

SEGURIDAD

1. DIRECTOR

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901365053	0	SAFICONSTRUCCIONES	0	0	COLMENA - 14-26	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35704505	E	2025-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.030.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	35704505	2025-12-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EBPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Sub.	Tipo Cot.				
1	CC 63226559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.423.500	F	X								X							0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.013.700	162.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.013.700	40.600	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.013.700	70.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	314.000	S	5429001
2	CC 83226559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.423.500	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	47.450	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	47.450	0	47.450	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.600	S	5429001
3	CC 28438152	ARIZA CASTILLO ISLAYNE AURORA	825.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1712001
4	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.727.613	276.500	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.727.613	69.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.727.613	120.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	535.200	S	5429001
5	CC 9390036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.908.787	305.500	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.908.787	76.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.908.787	132.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	591.200	S	5429001
6	CC 1114119732	GARCIA RUIZ WILMER ANDRES	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	2.500.000	100.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.500.000	175.100	0,00532	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	1711001
7	CC 1101019138	LOTERO CASTILLO SHARON MICHELL	1.423.500	F	X								X							0			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	737.093	118.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	737.093	29.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	737.093	51.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	228.400	S	5429001
8	CC 1101019138	LOTERO CASTILLO SHARON MICHELL	1.423.500	F										X						0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	237.250	38.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	237.250	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	237.250	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	38.000	S	5429001
9	CC 1096717479	LOZANO ALVAREZ LUIS CARLOS	2.500.000	V																0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	2.250.000	360.000	0	0	COOSALUD-EPS042	2.250.000	90.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.250.000	156.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	696.600	S	5429001
10	CC 1096717479	LOZANO ALVAREZ LUIS CARLOS	2.500.000	V													X			0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	250.000	40.000	0	0	COOSALUD-EPS042	250.000	10.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	250.000	10.000	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	60.000	S	5429001
11	CC 1101178503	MARIN QUITIAN CRISTIAN IVAN	2.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.300.000	368.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.300.000	92.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.300.000	169.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	712.100	S	5429001
12	CC 1101018646	MARIN RODRIGUEZ DIANA VALENTINA	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.703.348	272.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.703.348	68.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.703.348	118.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	527.600	S	5429001
13	CC 5270583	PUENTES QUIROGA LUIS ALBERTO	1.423.500	F	X								X							0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	982.432	157.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	982.432	39.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	982.432	68.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	364.200	S	5429001
14	CC 5270583	PUENTES QUIROGA LUIS ALBERTO	1.423.500	F									X							0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	94.900	15.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	94.900	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	94.900	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.200	S	5429001
15	CC 1101018932	SAMABRIA OLARTE ELKIN MAURICIO	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.630.555	260.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.630.555	65.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.630.555	113.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	505.000	S	5429001
16	CC 1030583343	SANCHEZ TELLEZ CRISTIAN MAURICIO	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.721.142	275.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.721.142	68.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.721.142	119.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	533.000	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N1901385053	0	SAFI CONSTRUCCIONES	B	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913			SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	35704505	E	2026-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.030.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	35704505	2026-12-12	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.527.776	20.527.776	20.527.776	20.527.776	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E. INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	3.284.900	0	0	0	3.284.900
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.613.200	0	0	0	1.613.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	601.000	0	0	0	601.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	1.070.700	0	0	0	1.070.700
EPS(Administradoras: 6)				12	806.400	0	0	0	806.400
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	1	100.000	0	0	0	100.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	86.500	0	0	0	86.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	160.900	0	0	0	160.900
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	100.000	0	0	0	100.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	5	282.600	0	0	0	282.600
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	76.400	0	0	0	76.400
ARP(Administradoras: 1)				12	1.132.800	0	0	0	1.132.800
COLMENA	14-25	800226175	3	12	1.132.800	0	0	0	1.132.800
CCF(Administradoras: 1)				12	806.400	0	0	0	806.400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	12	806.400	0	0	0	806.400
Gran Total					6.030.500	0	0	0	6.030.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901385053	0	SAFICONSTRUCCIONES	B	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-276	CRA 21A 35 - 40 CARAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36000868	E	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.774.000	282.400	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PRI)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
65	36000868	2026-01-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Col.	Col.	Col.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1101760110	ACOSTA DIAZ ROMARIO	2.000.000	F		X							X						0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	1.398.335	223.800	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.398.335	56.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.966.667	78.700	1.398.335	97.400	0,69960	0	0	0	0	0	01	0	455.900	S	5429001
2	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.423.500	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.512.469	242.000	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.512.469	60.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.512.469	60.500	1.512.469	105.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	468.300	S	5429001
3	CC 1042000894	ARIAS PEREZ LUIS ALBERTO	2.600.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.600.000	416.000	0		SALUD TOTAL-EPS092	2.600.000	104.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5429001
4	CC 38438152	ARIZA CASTILLO FISLAYNE AURORA	825.000	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
5	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.423.500	F									X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.580.409	252.900	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.580.409	63.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.580.409	63.300	1.580.409	110.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	489.500	S	5429001
6	CC 1096907279	BARBOSA CADENA YEUDIL LORENA	1.423.500	F	X														0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	521.950	83.600	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	521.950	20.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	521.950	20.900	521.950	36.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	161.800	S	5429001
7	CC 79461496	BAYONA CERON HENRY	1.423.500	F	X								X						0			6	6	6	6	COLPENSION-ES-25-14	341.317	54.700	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	341.317	13.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	341.317	13.700	341.317	23.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	105.900	S	5429001
8	CC 79461496	BAYONA CERON HENRY	1.423.500	F									X						0			9	9	9	9	COLPENSION-ES-25-14	427.050	68.400	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	427.050	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	427.050	0	427.050	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	68.400	S	5429001
9	CC 9390036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.423.500	F									X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.496.293	239.500	0		EPS CAJACOPI-CCFC55	1.496.293	59.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.496.293	59.900	1.496.293	104.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	463.500	S	5429001
10	CC 1095787016	DELGADO PEREZ VICTOR YESID	1.423.500	F	X														0			22	22	22	22	COLPENSION-ES-25-14	1.043.900	167.100	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.043.900	41.800	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.174.388	47.000	1.043.900	72.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	328.600	S	5429001
11	CC 1073696463	FONTECHA VELASCO FABIAN ALEXIS	1.423.500	F									X						0			24	24	24	24	COLPENSION-ES-25-14	1.195.417	191.300	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.195.417	47.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.195.417	47.900	1.195.417	83.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	376.400	S	5429001
12	CC 1073696463	FONTECHA VELASCO FABIAN ALEXIS	1.423.500	F									X						0			6	6	6	6	COLPENSION-ES-25-14	284.700	45.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	284.700	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	284.700	0	284.700	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	45.600	S	5429001
13	CC 1101018455	GALLEGOS SANTANA JOHAN SAMIR	1.423.500	F	X	X													0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	1.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	49.345	2.000	47.450	3.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	14.900	S	5429001
14	CC 91518676	GALVIS LEON PEDRO PABLO	2.840.000	F						X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.840.000	454.400	0		EPS SURA-EPS010	2.840.000	113.600	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.840.000	113.600	2.840.000	197.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	879.300	S	5429001
15	CC 1098604994	GALVIS RODRIGUEZ JUAN PABLO	2.630.000	F	X					X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.630.000	420.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.630.000	105.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.903.333	116.200	2.630.000	186.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	828.800	S	5429001
16	CC 1154119732	GARCIA RUIZ WILMER ANDRES	2.500.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0		SALUD MIA EPS-EPS046	2.500.000	100.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	1711001
17	CC 1024542799	GARZON MURCIA CRISTIAN IVAN	1.423.500	F	X								X						0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	862.188	138.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	862.188	34.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	862.188	34.500	862.188	60.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	267.100	S	5429001
18	CC 1024542799	GARZON MURCIA CRISTIAN IVAN	1.423.500	F									X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	94.900	0	94.900	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.200	S	5429001

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901385053	0	SAFI CONSTRUCCIONES	6	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36000868	E	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.774.000	282.400	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
55	36000868	2026-01-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
82.497.398	85.097.398	85.097.398	87.704.516	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				54	13.201.900	0	146.000	0	13.347.900
PROTECCION	230201	800229739	0	10	3.001.700	0	33.200	0	3.034.900
PORVENIR	230301	800224808	8	24	5.690.600	0	62.900	0	5.753.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	6	1.485.900	0	16.500	0	1.502.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	14	3.023.700	0	33.400	0	3.057.100
EPS(Administradoras: 10)				55	3.361.900	0	37.700	0	3.399.600
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	59.900	0	700	0	60.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	174.900	0	2.000	0	176.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	204.300	0	2.300	0	206.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	201.600	0	2.300	0	203.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	4	288.100	0	3.200	0	291.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	639.200	0	7.100	0	646.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	13	657.400	0	7.300	0	664.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	100.000	0	1.200	0	101.200
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	2	192.000	0	2.200	0	194.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	14	844.500	0	9.400	0	853.900
ARP(Administradoras: 1)				55	5.466.800	0	60.400	0	5.527.200
COLMENA	14-25	800226175	3	55	5.466.800	0	60.400	0	5.527.200
CCF(Administradoras: 1)				55	3.461.000	0	38.300	0	3.499.300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	55	3.461.000	0	38.300	0	3.499.300
Gran Total					25.491.600	0	282.400	0	25.774.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901385053	0	SAFI CONSTRUCCIONES	0	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36426892	E	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.644.000	120.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
54	36426892	2026-02-12	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1055361442	ALVARADO GIL SERGIO IHIVAN	2.500.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	83.334	13.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	83.334	3.400	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	83.334	3.400	83.334	5.916	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	26.100	S	5429001
2	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F						X		X								0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	849.588	136.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	849.588	34.000	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	849.588	34.000	849.588	59.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	263.200	S	5429001
3	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F									X							0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	641.999	102.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	641.999	0	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	641.999	0	641.999	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	102.800	S	5429001
4	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F												X				0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	65.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	408.545	16.400	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	408.545	16.400	408.545	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	98.200	S	5429001
5	CC 1042000894	ARIAS PEREZ LUIS ALBERTO	1.750.905	F							X									0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	1.225.634	196.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.225.634	49.100	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	1.225.634	49.100	1.225.634	85.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	379.809	S	5429001
6	CC 1042000894	ARIAS PEREZ LUIS ALBERTO	1.750.905	F										X						0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	525.272	84.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	525.272	0	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	525.272	0	525.272	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	84.100	S	5429001
7	CC 28438152	ARIZA CASTILLO FISLAYNE AURORA	875.500	F							X									0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	1.750.905	9.200	1.750.905	0	0,00322	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	5429001
8	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.750.905	F							X		X							0			12	12	12	12	COLFONDOS-231001	849.588	136.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	849.588	34.000	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	849.588	34.000	849.588	59.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	263.200	S	5429001
9	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.750.905	F										X						0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	583.635	93.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	583.635	0	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	583.635	0	583.635	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	93.400	S	5429001
10	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.750.905	F												X				0			8	8	8	8	COLFONDOS-231001	466.908	74.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	466.908	18.700	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	466.908	18.700	466.908	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	112.200	S	5429001
11	CC 1096907299	BARBOSA CADENA YEUDDI LORENA	1.750.905	F	X					X										0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	700.362	112.100	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A. MOV-EPS041	700.362	28.100	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	754.016	30.200	700.362	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	219.200	S	5429001
12	CC 79461496	BAYONA CERON HENRY	1.750.905	F						X										0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	1.517.451	242.800	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A. MOV-EPS041	1.517.451	60.700	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	1.517.451	60.700	1.517.451	105.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	469.900	S	5429001
13	CC 79461496	BAYONA CERON HENRY	1.750.905	F												X				0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	233.454	37.400	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A. MOV-EPS041	233.454	9.400	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	233.454	9.400	233.454	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	56.200	S	5429001
14	CC 9350036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.750.905	F						X		X								0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	1.003.455	160.600	0	0	EPS O CAJACOPI-CCFC55	1.003.455	40.200	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	1.003.455	40.200	1.003.455	69.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	310.900	S	5429001
15	CC 9350036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.750.905	F									X							0			14	14	14	14	COLFONDOS-231001	817.089	130.800	0	0	EPS O CAJACOPI-CCFC55	817.089	0	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	817.089	0	817.089	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	130.800	S	5429001
16	CC 91429270	BUSTOS ROBLES ELADIO	2.020.000	F	X															0			10	10	10	10	COLPENSION ES-25-14	673.334	107.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	673.334	27.000	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	673.334	27.000	673.334	46.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	208.700	S	5429001
17	CC 1012408603	CARRANZA RAMIREZ RICHARD EDUARDO	1.750.905	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230501	175.091	28.100	0	0	EPS SURA-EPS010	175.091	7.100	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	175.091	7.100	175.091	12.200	0,06960	0	0	44	6	0	01	0	54.500	S	5429001
18	CC 1073696463	FONTECHA VELASCO FABIAN ALEXIS	1.750.905	F						X										0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	1.459.088	233.500	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	1.459.088	58.400	COMFENALC O SANTANDER-CCF40	1.459.088	58.400	1.459.088	101.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	431.900	S	5429001

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 901385053	0	SAFI CONSTRUCCIONES	6	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	38426892	E	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.644.000	120.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
54	38426892	2026-02-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
84.691.394	84.691.394	84.691.394	85.123.867	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				54	13.554.200	0	69.000	0	13.623.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	1.165.500	0	6.000	0	1.171.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	3.340.800	0	17.000	0	3.357.800
PROTECCIÓN	230201	800229739	0	8	1.964.400	0	10.000	0	1.974.400
PORVENIR	230301	800224808	8	29	7.083.500	0	36.000	0	7.119.500
EPS(Administradoras: 12)				54	2.926.200	0	15.500	0	2.941.700
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	40.200	0	300	0	40.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	8	471.200	0	2.400	0	473.600
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	120.000	0	700	0	120.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	72.500	0	400	0	72.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	297.900	0	1.600	0	299.500
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	27.300	0	200	0	27.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	207.200	0	1.100	0	208.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	5	275.300	0	1.400	0	276.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	514.300	0	2.700	0	517.000
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	2	232.000	0	1.200	0	233.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	15	635.900	0	3.300	0	639.200
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	32.400	0	200	0	32.600
ARP(Administradoras: 1)				54	4.089.700	0	20.900	0	4.120.600
COLMENA	14-25	800226175	3	54	4.089.700	0	20.900	0	4.120.600
CCF(Administradoras: 1)				54	2.943.500	0	15.000	0	2.958.500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	54	2.943.500	0	15.000	0	2.958.500
Gran Total					23.523.600	0	120.400	0	23.644.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI901385053	0	SAFICONSTRUCCIONES	B	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213093913			SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36737266	E	2026-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.495.900	27.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
18	36737266	2026-03-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AUS	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	AFL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1056081442	ALVARADO GIL SERGIO DUVAN	2.500.000	F									X										30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.255.683	441.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.255.683	110.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.255.683	110.300	2.255.683	191.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	853.400	S	5429001
2	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F									X										30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.647	288.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.800.647	72.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.800.647	72.100	1.800.647	125.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.800	S	5429001
3	CC 5401930	ARIZA SANTAMARIA ULSUS EMILIO	1.750.905	F									X										30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.880.234	300.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.880.234	75.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.880.234	75.300	1.880.234	130.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	582.400	S	5429001
4	CC 9390036	BUITRAGO DOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.750.905	F									X										30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.850.389	296.100	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.850.389	74.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.850.389	74.100	1.850.389	128.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	573.100	S	5429001
5	CC 1097666055	FLOREZ RUIZ WILMER	1.750.905	F	X								X										10	10	10	10	PORVENIR-230301	633.377	101.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	633.377	25.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	633.377	25.400	633.377	44.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	196.300	S	5429001
6	CC 1097666055	FLOREZ RUIZ WILMER	1.750.905	F										X									5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	291.818	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	291.818	0	291.818	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	46.700	S	5429001
7	CC 1101018767	FRANCO MATEUS CRISTIAN JULIAN	1.750.905	F	X																		1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	55.364	9.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	58.364	2.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	58.364	2.400	58.364	4.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	18.300	S	5429001
8	CC 1101018767	FRANCO MATEUS CRISTIAN JULIAN	1.750.905	F										X									12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	700.362	112.100	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	700.362	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	700.362	0	700.362	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	112.100	S	5429001
9	CC 1114119232	GARCIA RUIZ WILMER ANDRES	3.000.000	F																			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	3.000.000	120.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	1711001
10	CC 1024542799	GARZON MURCIA CRISTIAN IVAN	1.750.905	F																			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
11	CC 1098717479	LOZANO ALVAREZ LUIS CARLOS	3.000.000	V																			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	COOSALUD-EPS042	3.000.000	120.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5429001
12	CC 1101178508	MARIN QUITIAN CRISTIAN IVAN	3.008.400	F																			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.008.400	481.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.008.400	120.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.008.400	120.400	3.008.400	209.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	931.600	S	5429001
13	CC 1101018705	PEÑA QUIROGA JUAN CAMILO	1.750.905	F									X										30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.880.234	300.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.880.234	75.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.880.234	75.300	1.880.234	130.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	582.400	S	5429001
14	CC 5770883	PUENTES QUIROGA LUIS ALBERTO	1.750.905	F									X										30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.989.666	318.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.989.666	79.600	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.989.666	79.600	1.989.666	138.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	616.100	S	5429001
15	CC 1101018635	ROMERO ARIZA WILLIAN	1.750.905	F									X										30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.880.234	300.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.880.234	75.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.880.234	75.300	1.880.234	130.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	582.400	S	5429001
16	CC 63371051	RUIZ QUIROGA LENIS ADRIANA	1.750.905	F									X										30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.910.079	305.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.910.079	76.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.910.079	76.500	1.910.079	133.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	591.700	S	5429001
17	CC 1101019669	RUIZ QUIROGA NELLY YOMAIRA	1.750.905	F									X										30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.910.079	305.700	0	0	MUTUAL SER-EPS002 - MADRES-MUS002	1.910.079	76.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.910.079	76.500	1.910.079	133.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	591.700	S	5429001
18	CC 1101018486	SANCHEZ QUIROGA DAYRON DAVID	1.750.905	F									X										30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.929.976	308.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.929.976	77.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.929.976	77.200	1.929.976	134.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	597.600	S	5429001

| | | |

2. RESIDENTE

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 02:35:27 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 85035821

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2026-04-14 14:31:41.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO EMR APP BELLEZA				
Documento	NI 901949762	**Dirección**	CL 34 #10 - 29		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3108853248		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GARCIA RUIZ WILMER ANDRES	**Identificación**	CC 1114119732		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098672955		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					VERA ROJAS OSCAR DAVID	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																									Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPN	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF									Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30																																			
															0	30	30	30	30			6	$ 3.220.000	250301		16 %	$ 3.220.000	$ 515.200	$ 0	$ 0	EPS047		12.5 %	$ 3.220.000	$ 402.500	$ 0	14-25	5	0,960 %	$ 3.220.000	$ 224.200	CCF40	4 %	$ 3.220.000	$ 128.800	2 %	$ 64.400	3 %	$ 96.600

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 515.200	$ 0	$ 0	$ 402.500	$ 224.200	$ 128.800	$ 64.400	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 1.452.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 386 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | CERTIFICADO INDIV AL

Fecha creación: 2026-04-14, 02:35:33 p. m. Tipo Planilla: E Número Planilla: 95035821

Periodo Cotización: 202512 Periodo Servicio: 202601

PAGADA 2026-04-14 14:31:41.0

Se certifica que en la fecha 14/04/2026, la empresa CONSORCIO EMR APP BELLEZA, con documento de identificación NI901949762, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VERA ROJAS OSCAR DAVID, con CC 1098672955, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS
CCF	N890201578	CCF40	COMFENALCO SANTANDER
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo – Líneas Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (606) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 89 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3184416952

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativos

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 02:59:27 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 85035972

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

PAGADA 2026-04-14 14:32:50.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO EMR APP BELLEZA				
Documento	NI 901949762	**Dirección**	CL 34 #10 - 29		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3108853248		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GARCIA RUIZ WILMER ANDRES	**Identificación**	CC 1114119732		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				N	VERA ROJAS OSCAR DAVID	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días ERP	Días APP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 3.220.000	23C001		16 %	$ 3.220.000	$ 515.200	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 3.220.000	$ 402.500	$ 0	14-25	5	0,000 %	$ 3.220.000	$ 224.200	CCF40	4 %	$ 3.220.000	$ 128.800	2 %	$ 64.400	3 %	$ 96.600

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 515.200	$ 0	$ 0	$ 402.500	$ 224.200	$ 128.800	$ 64.400	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 1.452.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 486 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2026-04-14, 03:01:35 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 85035972

Periodo Cotización: 202601 **Periodo Servicio:** 202602

PAGADA 2026-04-14 14:32:50.0

Se certifica que en la fecha 14/04/2026, la empresa CONSORCIO EMR APP BELLEZA, con documento de identificación NI901949762, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VERA ROJAS OSCAR DAVID, con CC 1098672955, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS
CCF	N890201578	CCF40	COMFENALCO SANTANDER
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo – Líneas Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuA[illegible]rte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 03:20:15 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 85036071

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202603

PAGADA 2026-04-14 14:33:58.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO EMR APP BELLEZA				
Documento	NI 901949762	**Dirección**	CL 34 #10 - 29		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3108853248		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GARCIA RUIZ WILMER ANDRES	**Identificación**	CC 1114119732		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				N	VERA ROJAS OSCAR DAVID	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 3.220.000	230001		16 %	$ 3.220.000	$ 515.200	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 3.220.000	$ 402.500	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.220.000	$ 224.200	CCF40	4 %	$ 3.220.000	$ 128.800	2 %	$ 64.400	3 %	$ 96.600

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 515.200	$ 0	$ 0	$ 402.500	$ 224.200	$ 128.800	$ 64.400	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 1.445.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2026-04-14, 03:20:35 p. m. Tipo Planilla: E Número Planilla: 85036071

Periodo Cotización: 202602 Periodo Servicio: 202603

PAGADA 2026-04-14 14:33:58.0

Se certifica que en la fecha 14/04/2026, la empresa CONSORCIO EMR APP BELLEZA, con documento de identificación NI901949762, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VERA ROJAS OSCAR DAVID, con CC 1098672955, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS
CCF	N890201578	CCF40	COMFENALCO SANTANDER
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enface Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (606) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDU

Fecha creación reporte 2026-01-22, 01:22:36 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83176835

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2026-01-22 13:21:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR DAVID VERA ROJAS				
Documento	CC 1098672955	**Dirección**	CR 21 #35 - 40 CAÑAVERAL		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3104722754		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098672955		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					VERA ROJAS OSCAR DAVID	68276000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
SLN	INT	LMA	VSP	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	1425	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	111-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

PAGADA 2026-01-22 13:21:16.0

Se certifica que en la fecha 22/01/2026, la empresa OSCAR DAVID VERA ROJAS, con documento de identificación CC1098672955, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VERA ROJAS OSCAR DAVID, con CC 1098672955, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.06960	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-01-22, 01:26:46 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83175886

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2026-01-22 13:22:26.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR DAVID VERA ROJAS				
Documento	CC 1098672955	**Dirección**	CR 21 #35 - 40 CAÑAVERAL		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3104722754		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098672955		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					VERA ROJAS OSCAR DAVID	68276000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	0			$ 1.750.905	23001		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	Niti-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

3. ING AUXILIAR

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901385053	0	SAFI CONSTRUCCIONES	B	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35704505	E	2025-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.030.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
12	35704505	2025-12-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	ARPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FRSAP	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	APL	IBC	Col.	Cot.	ESAP	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 83228559	ARANGO VARA JOSE ISIDRO	1.423.500	F	X							X							0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.013.705	162.200	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.013.705	40.600	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.013.705	40.600	1.013.705	70.864	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	314.000	S	5429001
2	CC 83228559	ARANGO VARA JOSE ISIDRO	1.423.500	F									X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	47.450	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	47.450	0	47.450	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	7.600	S	5429001
3	CC 28438152	ARIZA CASTILLO FISLAYNE AURORA	825.000	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,000522	0	0	0	0	0	01	0	349.500	S	1711001
4	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.423.500	F								X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.727.613	276.500	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.727.613	69.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.727.613	69.200	1.727.613	120.300	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	535.200	S	5429001
5	CC 9399036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.423.500	F								X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.908.787	305.500	0		EPS CAMACOPI-CCFC55	1.908.787	76.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.908.787	76.400	1.908.787	132.900	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	591.200	S	5429001
6	CC 1114119732	GARCIA RUIZ WILMER ANDRES	2.500.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0		SALUD MIA EPS-EPS046	2.500.000	100.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	1711001
7	CC 1101019138	LOTERO CASTILLO SHARON MICHELL	1.423.500	F	X							X							0			14	14	14	14	COLPENSION-ES-25-14	737.093	118.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	737.093	29.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	737.093	29.500	737.093	52.400	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	228.400	S	5429001
8	CC 1101019138	LOTERO CASTILLO SHARON MICHELL	1.423.500	F									X						0			5	5	5	5	COLPENSION-ES-25-14	237.250	38.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	237.250	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	237.250	0	237.250	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	38.000	S	5429001
9	CC 1098717479	LOZANO ALVAREZ LUIS CARLOS	2.500.000	V															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	2.250.000	360.000	0		COOSALUD-EPS042	2.250.000	90.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.250.000	90.000	2.250.000	156.600	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	696.600	S	5429001
10	CC 1098717479	LOZANO ALVAREZ LUIS CARLOS	2.500.000	V												X			0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	250.000	40.000	0		COOSALUD-EPS042	250.000	10.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	250.000	10.000	250.000	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	60.000	S	5429001
11	CC 1101178503	MARIN QUITIAN CRISTIAN IVAN	2.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.300.000	368.000	0		FAMISANAR-EPS017	2.300.000	92.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.300.000	92.000	2.300.000	160.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	712.100	S	5429001
12	CC 1101018646	MARIN RODRIGUEZ DIANA VALENTINA	1.423.500	F								X							0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.703.348	272.600	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.703.348	68.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.703.348	68.200	1.703.348	118.600	0,006960	0	0	0	0	0	03	0	527.600	S	5429001
13	CC 5770883	FUENTES QUIROGA LUIS ALBERTO	1.423.500	F	X							X							0			16	16	16	16	COLPENSION-ES-25-14	982.432	157.200	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	982.432	39.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	982.432	39.300	982.432	68.400	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	304.200	S	5429001
14	CC 5770883	FUENTES QUIROGA LUIS ALBERTO	1.423.500	F									X						0			2	2	2	2	COLPENSION-ES-25-14	94.900	15.200	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	94.900	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	94.900	0	94.900	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	15.200	S	5429001
15	CC 1101018932	SANABRIA OLARTE ELKIN MAURICIO	1.423.500	F								X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.630.555	260.900	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.630.555	65.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.630.555	65.300	1.630.555	113.500	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	505.000	S	5429001
16	CC 1030583343	SANCHEZ TELLEZ CRISTIAN MAURICIO	1.423.500	F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.721.142	275.400	0		FAMISANAR-EPS017	1.721.142	68.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.721.142	68.900	1.721.142	119.800	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	533.000	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901365053	0	SAFICONSTRUCCIONES	0	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			6

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35704505	E	2025-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.030.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	35704505	2025-12-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.527.775	20.527.775	20.527.775	20.527.775	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	3.284.900	0	0	0	3.284.900
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.613.200	0	0	0	1.613.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	601.000	0	0	0	601.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	1.070.700	0	0	0	1.070.700
EPS(Administradoras: 6)				12	806.400	0	0	0	806.400
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	1	100.000	0	0	0	100.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	86.500	0	0	0	86.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	160.900	0	0	0	160.900
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	100.000	0	0	0	100.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	5	282.600	0	0	0	282.600
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	76.400	0	0	0	76.400
ARP(Administradoras: 1)				12	1.132.800	0	0	0	1.132.800
COLMENA	14-25	800226175	3	12	1.132.800	0	0	0	1.132.800
CCF(Administradoras: 1)				12	806.400	0	0	0	806.400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	12	806.400	0	0	0	806.400
Gran Total					6.030.500	0	0	0	6.030.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901385053	0	SAFI CONSTRUCCIONES	B	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 36 - 40 CARAVERAL	3213939913	SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36000868	E	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.774.000	282.400	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
55	36000868	2026-01-15	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	AFIL	IBC	Col.	Col.	Col.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonio de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1101760110	ACOSTA DIAZ ROMARIO	2.200.000	F	X								X							0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	1.398.335	223.800	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.398.335	56.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.966.667	78.700	1.398.335	97.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	455.000	S	5429001
2	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.423.500	F								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.512.469	242.000	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.512.469	60.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.512.469	60.500	1.512.469	105.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	468.300	S	5429001
3	CC 1042000594	ARIAS PEREZ LUIS ALBERTO	2.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.600.000	416.000	0		SALUD TOTAL-EPS093	2.600.000	104.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.600.000	104.000	2.600.000	182.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5429001
4	CC 28438152	ARIZA CASTILLO FISLAYNE AURORA	825.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
5	CC 3601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.580.409	252.900	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.580.409	63.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.580.409	63.300	1.580.409	110.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	489.500	S	5429001
6	CC 1096907239	BARBOSA CADENA YEUDDI LORENA	1.423.500	F	X															0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	521.950	83.600	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	521.950	20.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	521.950	20.900	521.950	36.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	161.800	S	5429001
7	CC 79461496	BAYONA CERON HENRY	1.423.500	F	X								X							0			6	6	6	6	COLPENSION-ES-25-14	341.317	54.900	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	341.317	13.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	341.317	13.700	341.317	23.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	105.900	S	5429001
8	CC 79461496	BAYONA CERON HENRY	1.423.500	F										X						0			9	9	9	9	COLPENSION-ES-25-14	427.050	68.400	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	427.050	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	427.050	0	427.050	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	68.400	S	5429001
9	CC 9390036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	2.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.496.293	239.500	0		EPS CAFACOPI-ECFC55	1.496.293	59.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.496.293	59.900	1.496.293	104.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	463.500	S	5429001
10	CC 1095787016	DELGADO JEREZ VICTOR YESID	1.423.500	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSION-ES-25-14	1.043.900	167.100	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.043.900	41.800	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.174.388	47.000	1.043.900	72.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	328.600	S	5429001
11	CC 1073695463	FONTECHA VELASCO FABIAN ALEXIS	1.423.500	F									X							0			24	24	24	24	COLPENSION-ES-25-14	1.195.417	191.300	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.195.417	47.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.195.417	47.900	1.195.417	83.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	370.400	S	5429001
12	CC 1073695463	FONTECHA VELASCO FABIAN ALEXIS	1.423.500	F										X						0			6	6	6	6	COLPENSION-ES-25-14	284.700	45.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	284.700	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	284.700	0	284.700	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	45.600	S	5429001
13	CC 1101018453	GALLEGOS SANTANA JOHAN SAMIR	1.423.500	F	X	X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	1.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	49.348	2.000	47.450	3.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	14.900	S	5429001
14	CC 91518676	GALVIS LEON PEDRO PABLO	2.840.000	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.840.000	454.400	0		EPS SURA-EPS010	2.840.000	113.600	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.840.000	113.600	2.840.000	197.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	879.300	S	5429001
15	CC 1098604994	GALVIS RODRIGUEZ JUAN PABLO	2.680.000	F	X					X										11			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.680.000	428.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.680.000	107.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.903.333	116.200	2.680.000	186.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	830.800	S	5429001
16	CC 1114119732	GARCIA RUIZ WILMER ANDRES	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0		SALUD MIA EPS-EPS046	2.500.000	100.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00512	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	1711001
17	CC 1024542399	GARZON MURCIA CRISTIAN IVAN	1.423.500	F	X								X							0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	862.188	138.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	862.188	34.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	862.188	34.500	862.188	60.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	267.100	S	5429001
18	CC 1024542799	GARZON MURCIA CRISTIAN IVAN	1.423.500	F									X							0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	94.900	0	94.900	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.200	S	5429001

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901385053	0	SAFICONSTRUCCIONES	B	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36000868	E	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.774.000	282.400	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
55	36000868	2026-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
82.497.396	85.097.396	85.097.396	87.704.516	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				54	13.201.900	0	146.000	0	13.347.900
PROTECCION	230201	800229739	0	10	3.001.700	0	33.200	0	3.034.900
PORVENIR	230301	800224808	8	24	5.690.600	0	62.900	0	5.753.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	6	1.485.900	0	16.500	0	1.502.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	14	3.023.700	0	33.400	0	3.057.100
EPS(Administradoras: 10)				55	3.361.900	0	37.700	0	3.399.600
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	59.900	0	700	0	60.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	174.900	0	2.000	0	176.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	204.300	0	2.300	0	206.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	201.600	0	2.300	0	203.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	4	286.100	0	3.200	0	291.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	639.200	0	7.100	0	646.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	13	657.400	0	7.300	0	664.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	100.000	0	1.200	0	101.200
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	2	192.000	0	2.200	0	194.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	14	844.500	0	9.400	0	853.900
ARP(Administradoras: 1)				55	5.466.800	0	60.400	0	5.527.200
COLMENA	14-25	800226175	3	55	5.466.800	0	60.400	0	5.527.200
CCF(Administradoras: 1)				55	3.461.000	0	38.300	0	3.499.300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	55	3.461.000	0	38.300	0	3.499.300
Gran Total					25.491.600	0	282.400	0	25.774.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901385053	0	SAFICONSTRUCCIONES	B	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36426892	E	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.644.000	120.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
54	36426892	2026-02-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 1065601442	ALVARADO GIL SERGIO DUVAN	2.500.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	83.334	13.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	83.334	3.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	83.334	5.960	83.334	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	26.100	S	5429001
2	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F							X		X							0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	849.588	136.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	849.588	34.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	849.588	59.200	849.588	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	263.200	S	5429001
3	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F									X							0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	641.999	102.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	641.999	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	641.999	0	641.999	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	102.800	S	5429001
4	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F													X			0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	65.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	408.545	16.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	408.545	0	408.545	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	98.200	S	5429001
5	CC 1042000894	ARIAS PEREZ LUIS ALBERTO	1.750.905	F							X									0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	1.225.634	196.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.225.634	49.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.225.634	85.400	1.225.634	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	379.800	S	5429001
6	CC 1042000894	ARIAS PEREZ LUIS ALBERTO	1.750.905	F										X						0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	525.272	84.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	525.272	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	525.272	0	525.272	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	84.100	S	5429001
7	CC 28438152	ARIZA CASTILLO FISLAYNE AURORA	875.300	F							X									0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	9.200	1.750.905	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	5429001
8	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.750.905	F							X		X							0			12	12	12	12	COLFONDOS-231001	849.588	136.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	849.588	34.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	849.588	59.200	849.588	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	263.200	S	5429001
9	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.750.905	F										X						0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	583.635	93.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	583.635	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	583.635	0	583.635	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	93.400	S	5429001
10	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.750.905	F													X			0			8	8	8	8	COLFONDOS-231001	466.908	74.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	466.908	18.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	466.908	18.700	466.908	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	112.200	S	5429001
11	CC 1096607279	BARBOSA CADENA YEUDDI LORENA	1.750.905	F	X						X									0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	700.362	112.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	700.362	28.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	754.056	30.200	700.362	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	219.200	S	5429001
12	CC 79461496	BAYONA CERON HENRY	1.750.905	F									X							0			26	26	26	26	COLPENSION ES-23-14	1.517.451	242.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.517.451	60.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.517.451	105.700	1.517.451	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	469.900	S	5429001
13	CC 79461496	BAYONA CERON HENRY	1.750.905	F													X			0			4	4	4	4	COLPENSION ES-23-14	233.454	37.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	233.454	9.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	233.454	9.400	233.454	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	56.200	S	5429001
14	CC 9390036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.750.905	F							X		X							0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	1.003.455	160.600	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.003.455	40.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.003.455	69.900	1.003.455	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	340.900	S	5429001
15	CC 9390036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.750.905	F									X							0			14	14	14	14	COLFONDOS-231001	817.089	130.800	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	817.089	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	817.089	0	817.089	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	130.800	S	5429001
16	CC 91429270	BUSTOS ROBLES ELADIO	2.020.000	F	X															0			10	10	10	10	COLPENSION ES-25-14	673.334	107.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	673.334	27.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	673.334	46.900	673.334	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	268.700	S	5429001
17	CC 1012408663	CARRANZA RAMIREZ RICHARD EDUARDO	1.750.905	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	175.091	28.100	0	0	EPS SURA-EPS010	175.091	7.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	175.091	12.200	175.091	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	54.500	S	5429001
18	CC 1073696463	FONTECHA VELASCO FABIAN ALEXIS	1.750.905	F							X									0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	1.459.088	233.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.459.088	58.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.459.088	101.600	1.459.088	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	451.900	S	5429001

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901365053	0	SAFICONSTRUCCIONES	6	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36426892	E	2026-02-20	TODOS LOS CIENTROS	TODOS	TODOS	23.644.000	120.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
54	36426892	2026-02-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
84.691.394	84.691.394	84.691.394	85.123.867	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				54	13.554.200	0	69.000	0	13.623.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	1.165.500	0	6.000	0	1.171.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	3.340.800	0	17.000	0	3.357.800
PROTECCION	230201	800229739	0	8	1.964.400	0	10.000	0	1.974.400
PORVENIR	230301	800224808	8	29	7.083.500	0	36.000	0	7.119.500
EPS(Administradoras: 12)				54	2.926.200	0	15.500	0	2.941.700
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	40.200	0	300	0	40.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	8	471.200	0	2.400	0	473.600
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	120.000	0	700	0	120.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	72.500	0	400	0	72.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	297.900	0	1.600	0	299.500
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	27.300	0	200	0	27.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	207.200	0	1.100	0	208.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	5	275.300	0	1.400	0	276.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	514.300	0	2.700	0	517.000
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	2	232.000	0	1.200	0	233.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	15	635.900	0	3.300	0	639.200
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	32.400	0	200	0	32.600
ARP(Administradoras: 1)				54	4.099.700	0	20.900	0	4.120.600
COLMENA	14-25	800226175	3	54	4.099.700	0	20.900	0	4.120.600
CCF(Administradoras: 1)				54	2.943.500	0	15.000	0	2.958.500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	54	2.943.500	0	15.000	0	2.958.500
Gran Total					23.523.600	0	120.400	0	23.644.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901385053	0	SAFI CONSTRUCCIONES	B	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36737266	E	2026-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.495.900	27.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	36737266	2026-03-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1065604442	ALVARADO GIL SERGIO DUVAN	2.900.000	F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.755.683	441.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.755.683	110.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.755.683	110.300	2.755.683	191.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	853.300	S	5429001
2	CC 83228559	ARANDO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.647	288.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.800.647	72.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.800.647	72.100	1.800.647	125.400	0,06900	0	0	0	0	0	01	0	557.800	S	5429001
3	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.750.905	F								X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.880.234	369.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.880.234	75.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.880.234	75.300	1.880.234	130.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	582.400	S	5429001
4	CC 9390036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.750.905	F								X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.850.389	296.100	0	0	EPS COMFAORIENTE-CCF55	1.850.389	74.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.850.389	74.100	1.850.389	128.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	573.100	S	5429001
5	CC 1097666055	FLOREZ RUIZ WILMER	1.750.905	F	X							X							0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	633.377	101.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	633.377	25.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	633.377	25.400	633.377	44.100	0,06900	0	0	0	0	0	01	0	196.300	S	5429001
6	CC 1097666055	FLOREZ RUIZ WILMER	1.750.905	F									X						0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	291.818	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	291.818	0	291.818	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	46.700	S	5429001
7	CC 1101018767	FRANCO MATEUS CRISTIAN JULIAN	1.750.905	F	X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	58.364	9.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	58.364	2.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	58.364	2.400	58.364	4.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	18.300	S	5429001
8	CC 1101018767	FRANCO MATEUS CRISTIAN JULIAN	1.750.905	F									X						0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	700.362	112.100	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	700.362	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	700.362	0	700.362	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	112.100	S	5429001
9	CC 1114119732	GARCIA RUIZ WILMER ANDRES	3.000.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	3.000.000	120.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	1711001
10	CC 1023542799	GARZON MURCIA CRISTIAN IVAN	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
11	CC 1095717479	LOZANO ALVAREZ LUIS CARLOS	3.000.000	V															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	COOSALUD-EPS042	3.000.000	120.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5429001
12	CC 1101378503	MARIN QUIHAN CRISTIAN IVAN	3.008.400	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.008.400	481.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.008.400	120.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.008.400	120.400	3.008.400	209.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	931.600	S	5429001
13	CC 1101018705	PEÑA QUIROGA JUAN CAMILO	1.750.905	F								X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.880.234	300.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.880.234	75.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.880.234	75.300	1.880.234	130.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	582.400	S	5429001
14	CC 3770683	PUENTES QUIROGA LUIS ALBERTO	1.750.905	F									X						0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.989.666	318.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.989.666	79.600	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.989.666	79.600	1.989.666	138.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	616.100	S	5429001
15	CC 1101018635	ROMERO ARIZA WILLIAN	1.750.905	F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.880.234	300.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.880.234	75.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.880.234	75.300	1.880.234	130.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	582.400	S	5429001
16	CC 63321051	RUIZ QUIROGA LENIS ADRIANA	1.750.905	F								X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.910.079	305.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.910.079	76.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.910.079	76.500	1.910.079	133.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	591.700	S	5429001
17	CC 1101019669	RUIZ QUIROGA NELLY YOMAIRA	1.750.905	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.910.079	305.700	0	0	MIN002 - MADRES-MIN002	1.910.079	76.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.910.079	76.500	1.910.079	133.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	591.700	S	5429001
18	CC 1101018486	SANCHEZ QUIROGA DAYRON DAVID	1.750.905	F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.929.976	308.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.929.976	77.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.929.976	77.200	1.929.976	134.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	597.600	S	5429001

| | | |

4. HSEQ

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098755645	MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO	CALLE 45#23-127	3173798	asesoresig23@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	13/01/2026	2763497	$460.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS046	SALUD MIA EPS	900914264-1	195.000	0		0		0	0	0	0	195.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	249.600	0	0	0	0	0	0		249.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	16.300				16.300	0	0	16.300			163	16.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	195.000	195.000
Pensión	1	249.600	249.600
Riesgos Laborales	1	16.300	16.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	460.900	460.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1095755645	MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO		CALLE 45#23-127	3173798	asesorasig23@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	13/01/2026	2763497	$460.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Categoría	Subtipo	Extranjero	Cotiza Exterior	Depto.	Mun.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
I	CC	1095755645	ESTEBAN CLAVIJO MARIA FERNANDA	67	0																				N	230201	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS048	1.560.000	195.000	14-15	1.560.000	2	16.380		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1098765645	MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO		CALLE 45#23-127	3173798	asesorasig23@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	06/02/2026	46836850	$517.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228738-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	517.400	517.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098755645	MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO	CALLE 45#23-127	3173786	asesoraslg23@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	06/02/2026	46936850	$517.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Asistencia	Suspensión	Cotiza Voluntario	Ingreso	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Corrección	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1098755645	ESTEBAN CLAVIJO MARIA FERNANDA	67	0			N																230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS048	1.750.905	218.000	14-11	1.750.905	2	16.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098755845	MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO	CALLE 45#23-127	3173708	asesorasig23@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82419101	03/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$517.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS048	SALUD MIA EPS	900914254-1	216.900	0		0		0	0	0	0	216.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	216.900	216.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	517.400	517.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098765645	MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO		CALLE 45#23-127	3173798	asesorasig23@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82419101	03/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$517.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Dirección Cotizante Exterior	Exonerado	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1098765645	ESTEBAN CLAVIJO MARIA FERNANDA	57	0		N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS046	1.750.905	30	219.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

TOPOGRAFO

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-21, 09:52:25 a. m. Tipo Planilla I Número Planilla 82582941

Periodo Cotización 202512 Periodo Servicio 202512

PAGADA 2025-12-29 14:58:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YADIRA DURAN GARCIA				
Documento	CC 37893183	**Dirección**	CL 4 #06 - 15		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 37893183		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					DURAN GARCIA YADIRA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | |

enlace operativo

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2026-02-21, 09:58:49 a. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 82582941

Periodo Cotización: 202512 **Periodo Servicio:** 202512

PAGADA 2025-12-29 14:58:16.0

Se certifica que en la fecha 29/12/2025, la empresa YADIRA DURAN GARCIA, con documento de identificación CC37893183, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado DURAN GARCIA YADIRA , con CC 37893183, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4486 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 486 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-21, 10:01:25 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83865750

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2026-02-20 18:55:26.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YADIRA DURAN GARCIA				
Documento	CC 37893183	**Dirección**	CL 4 #06 - 15		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 37893183		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					DURAN GARCIA YADIRA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión								Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días IRP	Días AFP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte SaMd	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.750.905	231001		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	1125	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	NINGU	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$280.200	$0	$0	$216.900	$ 121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$ 621.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | CERTIFICADO INDIVI( )L

Fecha creación: 2026-02-21, 10:04:49 a. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 83865750

Periodo Cotización: 202601 **Periodo Servicio:** 202601

PAGADA 2026-02-20 18:57:06.0

Se certifica que en la fecha 21/02/2026, la empresa YADIRA DURAN GARCIA, con documento de identificación CC37893183, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado DURAN GARCIA YADIRA , con CC 37893183, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-21, 10:06:25 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83865767

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202602

PAGADA 2026-02-20 18:59:28.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YADIRA DURAN GARCIA				
Documento	CC 37893183	**Dirección**	CL 4 #06 - 15		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DELAFILIADO

Documento	CC 37893183		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**CódigoCiudad - Departamento**	**Centrode Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					DURAN GARCIA YADIRA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Retiro	Tipo Salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			230901		16 %	$ 1.760.900	$ 200.200	$ 0	$ 0	EPS037		12.8 %	$ 1.760.900	$ 218.900	$ 0	14	5	6.900 %	$ 1.760.900	$ 121.900	46-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSPSOLIDARIDAD	FSPSUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENAVIDAY RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$280.200	$0	$0	$218.900	$ 121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$ 621.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

enlace operativo

SuAporte | CERTIFICADO INDIVID'

Fecha creación: 2026-02-21, 10:06:49 a. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 83865767

Periodo Cotización: 202602 **Periodo Servicio:** 202602

PAGADA 2026-02-20 18:59:28.0

Se certifica que en la fecha 21/02/2026, la empresa YADIRA DURAN GARCIA, con documento de identificación CC37893183, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado DURAN GARCIA YADIRA , con CC 37893183, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4486 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 486 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PMP

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-21, 09:15:51 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83865971

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2026-02-20 19:30:49.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS				
Documento	CC 53081449	**Dirección**	CL 0 #0 - 0		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213939913		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 53081449		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					SALAS CALLEJAS SANDRA XIMENA	68276000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																												Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0				25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	1425	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	FSH-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

PAGADA 2026-02-20 19:30:49.0

Se certifica que en la fecha 21/02/2026, la empresa SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS, con documento de identificación CC53081449, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SALAS CALLEJAS SANDRA XIMENA, con CC 53081449, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.06960	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4486 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-21, 09:27:51 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83866003

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2026-02-20 19:33:13.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS				
Documento	CC 53081449	**Dirección**	CL 0 #0 - 0		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213939913		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 53081449		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					SALAS CALLEJAS SANDRA XIMENA	68276000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																			Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			2514		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	1425	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

PAGADA 2026-02-20 19:33:13.0

Se certifica que en la fecha 21/02/2026, la empresa SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS, con documento de identificación CC53081449, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SALAS CALLEJAS SANDRA XIMENA, con CC 53081449, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.06960	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 486 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-21, 09:31:51 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83866008

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202602

PAGADA 2026-02-20 19:35:49.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS				
Documento	CC 53081449	**Dirección**	CL 0 #0 - 0		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213939913		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 53081449		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					SALAS CALLEJAS SANDRA XIMENA	68276000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	TRP	Días AFP	Días IPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.750.905	2544		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	1425	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 386 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

PAGADA 2026-02-20 19:35:49.0

Se certifica que en la fecha 21/02/2026, la empresa SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS, con documento de identificación CC53081449, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SALAS CALLEJAS SANDRA XIMENA, con CC 53081449, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.06960	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AMBIENTAL

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-25, 01:08:59 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83917732

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2026-02-25 00:23:41.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES				
Documento	CC 91488767	**Dirección**	CR 21 #35 - 40 CAÑAVERAL		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3104722754		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91488767		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**CódigoCiudad-Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					ALVARADO JAIMES RAFAEL WALDO	68276000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días IBPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.750.905	23		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

enlace operativo

Fecha creación: 2026-02-25, 01:08:34 a. m.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVID

Tipo Planilla: I Número Planilla: 83917732

Periodo Cotización: 202601 Periodo Servicio: 202601

PAGADA 2026-02-25 00:23:41.0

Se certifica que en la fecha 25/02/2026, la empresa RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES, con documento de identificación CC91488767, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ALVARADO JAIMES RAFAEL WALDO, con CC 91488767, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 61 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-25, 01:09:59 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83917737

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202602

PAGADA 2026-02-25 00:26:03.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES				
Documento	CC 91488767	**Dirección**	CR 21 #35 - 40 CAÑAVERAL		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3104722754		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91488767		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	CódigoCiudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					ALVARADO JAIMES RAFAEL WALDO	68276000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo cotiz.	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CORI	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	0			$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		12,6 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	1425	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	Ninguna CCF	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

enlace operativo

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDI

Fecha creación: 2026-02-25, 01:10:34 a. m.

Tipo Planilla: I **Número Planilla:** 83917737

Periodo Cotización: 202602 **Periodo Servicio:** 202602

PAGADA 2026-02-25 00:26:03.0

Se certifica que en la fecha 25/02/2026, la empresa RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES, con documento de identificación CC91488767, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ALVARADO JAIMES RAFAEL WALDO, con CC 91488767, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-25, 12:35:59 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83917730

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2026-02-25 00:21:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES				
Documento	CC 91488767	**Dirección**	CR 21 #35 - 40 CAÑAVERAL		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3104722754		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91488767		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**CódigoCiudad - Departamento**	**Centrode Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					ALVARADO JAIMES RAFAEL WALDO	68276000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CON	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trás. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trás. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	0		$ 1.423.500	230201		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	3125	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	NINCC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENAVIDAY RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

PAGADA 2026-02-25 00:21:16.0

Se certifica que en la fecha 25/02/2026, la empresa RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES, con documento de identificación CC91488767, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ALVARADO JAIMES RAFAEL WALDO, con CC 91488767, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5


Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Programación de obra.


Id	ITEM	Nombre de tarea	Und	Cantidad	Costo	Duración	Predecesor	Comienzo
1		**"MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**		**0**	**$ 3.545.963.021,00**	**272,5 días**		**vie 25/07/25**
2	**0**	**REVISION DE DISEÑOS**		**0**	**$ 0,00**	**40 días**		**vie 25/07/25**
3	**1**	**PRELIMINARES**		**0**	**$ 268.798.113,00**	**45 días**		**vie 29/08/25**
4	1,01	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	0,24	$ 1.463.952,00	4 días	2	vie 29/08/25
5	1,02	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y	M3	350,65	$ 72.454.038,00	35 días	4	mar 2/09/25
6	1,03	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4183,14	$ 174.160.799,00	35 días	5CC	mar 2/09/25
7	1,04	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	5101,72	$ 16.146.944,00	3 días	9	mié 8/10/25
8	1,05	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	M	932	$ 3.710.292,00	7 días	5CC	mar 2/09/25
9	1,06	TERRAPLENES	M3	37,71	$ 1.854.088,00	6 días	6	vie 3/10/25
10	1,07	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	0	$ 0,00	0 días	7	vie 29/08/25
11	**2**	**FILTROS**		**0**	**$ 280.288.825,00**	**29 días**		**vie 3/10/25**
12	2,01	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	45,71	$ 9.647.761,00	15 días	6	vie 3/10/25
13	2,02	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA FILTRO	M3	411,34	$ 32.456.649,00	15 días	12CC	vie 3/10/25
14	2,03	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	7352,61	$ 99.105.830,00	5 días	13	jue 16/10/25
15	2,04	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	244,83	$ 78.020.711,00	8 días	14CC	jue 16/10/25
16	2,05	OREN EN TUBERÍA PERFORADA 4"	ML	680,08	$ 34.730.325,00	8 días	14CC	jue 16/10/25
17	2,06	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO	M3	81,61	$ 26.328.529,00	6 días	15	vie 23/10/25
18	**3**	**ALCANTARILLAS**		**0**	**$ 144.801.315,00**	**85 días**		**vie 3/10/25**
19	3,01	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	0	$ 0,00	0 días	12CC	vie 3/10/25
20	3,02	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	31,05	$ 6.553.568,00	6 días	19	jue 16/10/25
21	3,03	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS	M3	279,48	$ 22.053.208,00	6 días	20CC	jue 16/10/25
22	3,04	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	1586,03	$ 18.778.423,00	8 días	24CC	mié 5/11/25
23	3,05	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 [MM] DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	28	$ 22.121.456,00	6 días	27	sáb 25/10/25
24	3,06	SUMINISTRO CONCRETO CLASE F, PARA ESTRUCTURAS. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA	M3	3,87	$ 4.681.953,00	3 días	28	mié 5/11/25
25	3,07	SUMINISTRO CONCRETO CLASE D, PARA ESTRUCTURAS. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA	M3	22,49	$ 33.459.177,00	10 días	22	mié 12/11/25
26	3,08	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	24,48	$ 1.464.100,00	1 día	23	vie 31/10/25
27	3,09	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) (CICLOPEO)	M3	12	$ 12.340.116,00	4 días	21	mié 22/10/25
28	3,10	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	63,54	$ 17.332.314,00	6 días	26CC	vie 31/10/25
29	**4**	**TRATAMIENTO DE TALUDES**		**0**	**$ 48.613.547,00**	**72,5 días**		**dom 14/12/25**

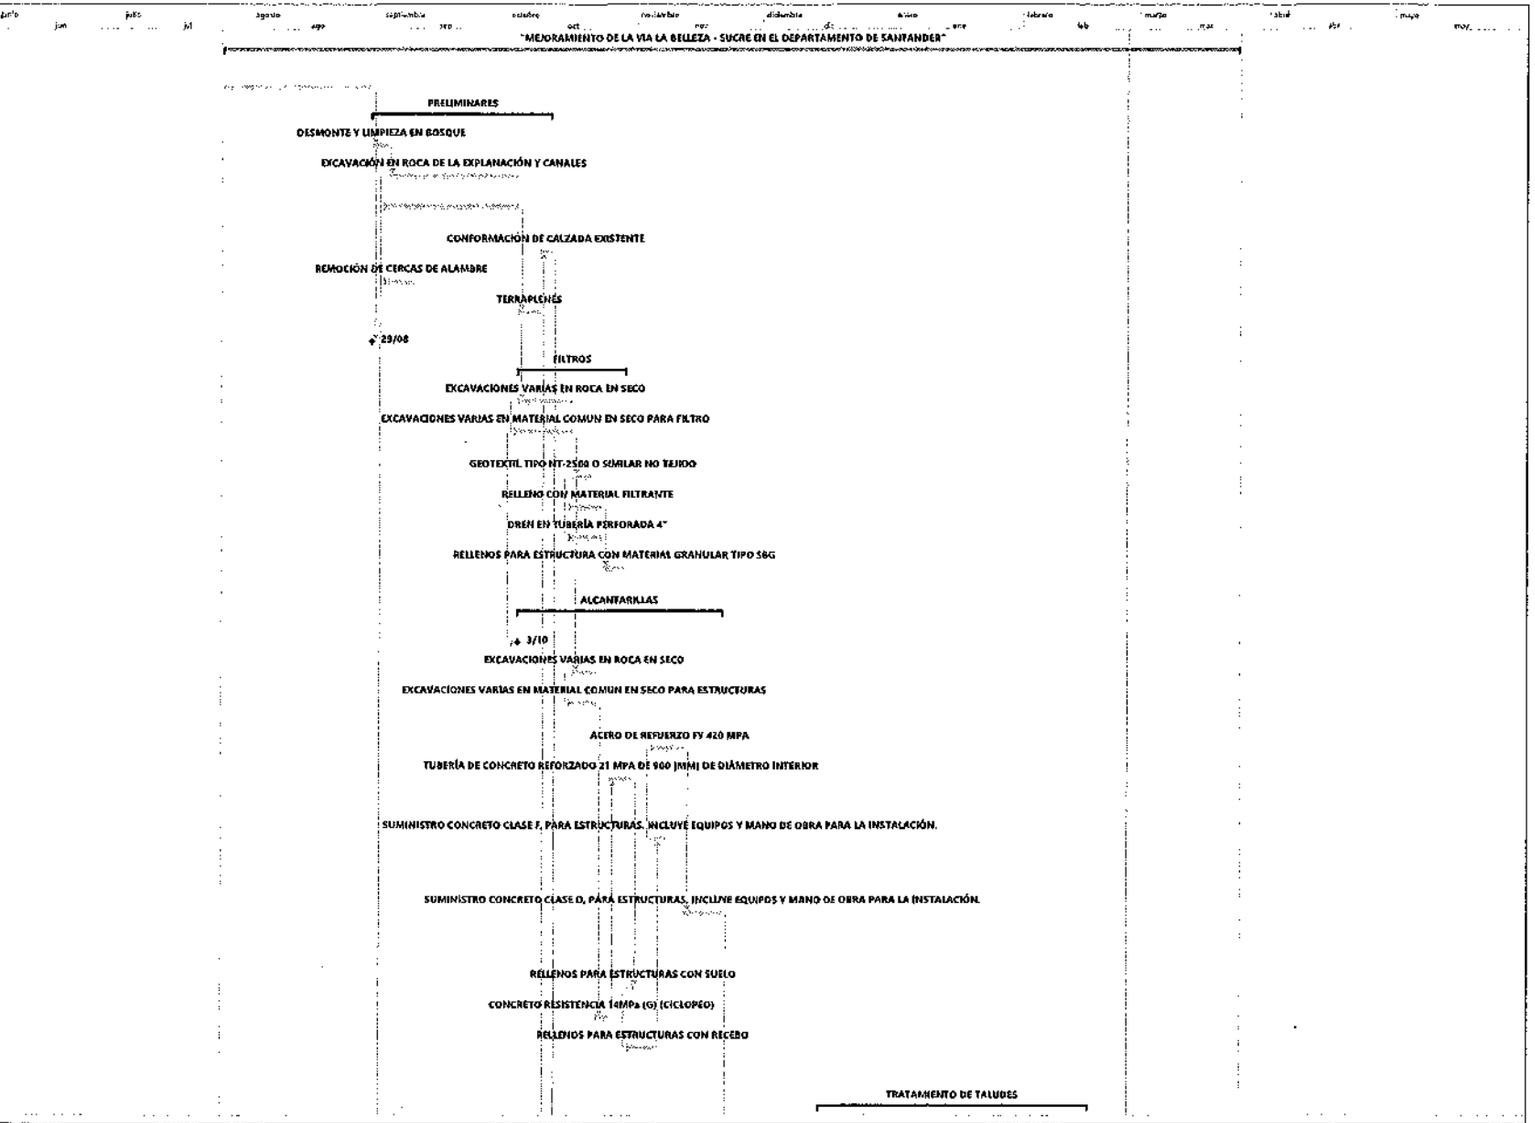


Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN
Realizo: LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas criticas · División crítica · Progreso · Progreso manual · Atraso


	ITEM	Nombre de tarea	UN	Cantidad	Costo	Duración	Predecesor	Comienzo
30	4,01	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	M2	300	$ 3 229 500,00	1 día	28	dom 16/12/25
31	4,02	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS	M3	138,35	$ 10 918 922,00	53,5 días	33	lun 15/12/25
32	4,03	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	15,37	$ 3 244 069,00	53,5 días	31CC	lun 15/12/25
33	4,04	SUMINISTRO CONCRETO CLASE F, PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA	M3	0	$ 0,00	0 días	32	vie 30/01/26
34	4,05	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	0	$ 0,00	0 días	33	vie 30/01/26
35	4,06	GAVIÓN EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	0	$ 0,00	0 días	34	vie 30/01/26
36	4,07	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	0	$ 0,00	0 días	38	vie 30/01/26
37	4,08	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON	M3	0	$ 0,00	0 días	36	vie 30/01/26
38	4,09	DREN EN TUBERIA PVC 3"	ML	0	$ 0,00	0 días	31	vie 30/01/26
39	4,10	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED	MZ	300	$ 19 804.400,00	10 días	40	dom 8/02/26
40	4,11	CANALETA EN SUELO CEMENTO SECCIÓN TRAPEZOIDAL (1X0,4X0,4)	ML	44	$ 9.458 650,00	10 días	32	vie 30/01/26
41	4,12	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS	ML	0	$ 0,00	0 días	39	lun 16/02/26
42	5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO		0	$ 2.187.748.825,00	153,5 días		sáb 11/10/25
43	5,01	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-3B	M3	1630,52	$ 493.787.179,00	35 días	45CC+15 días	vie 24/10/25
44	5,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES CBR > 10%	M3	0	$ 0,00	0 días	43CC	vie 24/10/25
45	5,03	PEDRAPLEN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO	M3	1601,07	$ 388.980.906,00	35 días	7	sáb 11/10/25
46	5,04	CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLÉN COMPACTO (incluye fracturamiento de rocas a tamaño según especificación No incluye la	M3	137,84	$ 8.631.485,00	35 días	7	sáb 11/10/25
47	5,05	PAVIMENTO HIDRÁULICO (CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR40	M3	709,58	$ 1 074.295 228,00	102,5 días	43	lun 24/11/25
48	5,06	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	9780,17	$ 115.777 652,00	35 días	47CC	lun 24/11/25
49	5,07	SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	2380,93	$ 110.037.172,00	21 días	47CC	lun 24/11/25
50	6	CUNETAS		0	$ 356.991.469,00	68 días		mar 27/01/26
51	6,01	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	172,51	$ 278.449 638,00	55 días	47CC+40 días	mar 27/01/26
52	6,02	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	9362,63	$ 110.827.711,00	35 días	51CC	mar 27/01/26
53	6,03	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	119,2	$ 7 226 500,00	15 días	51CC+45 días	dom 8/03/26
54	7	OBRAS HIDRAULICAS (DESCOLES, DISIPADORES DE ENRGIA, ZANJAS DE CORONACION)		0	$ 23.489.712,00	26 días		vie 21/11/25
55	7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	2,76	$ 582 839,00	6 días	25	vie 28/11/25
56	7,02	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS	M3	24,89	$ 1.654.020,00	6 días	55CC	vie 21/11/25
57	7,03	SUMINISTRO CONCRETO CLASE F, PARA ESTRUCTURAS INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN.	M3	2,55	$ 3.035 003,00	1 días	55	mié 26/11/25

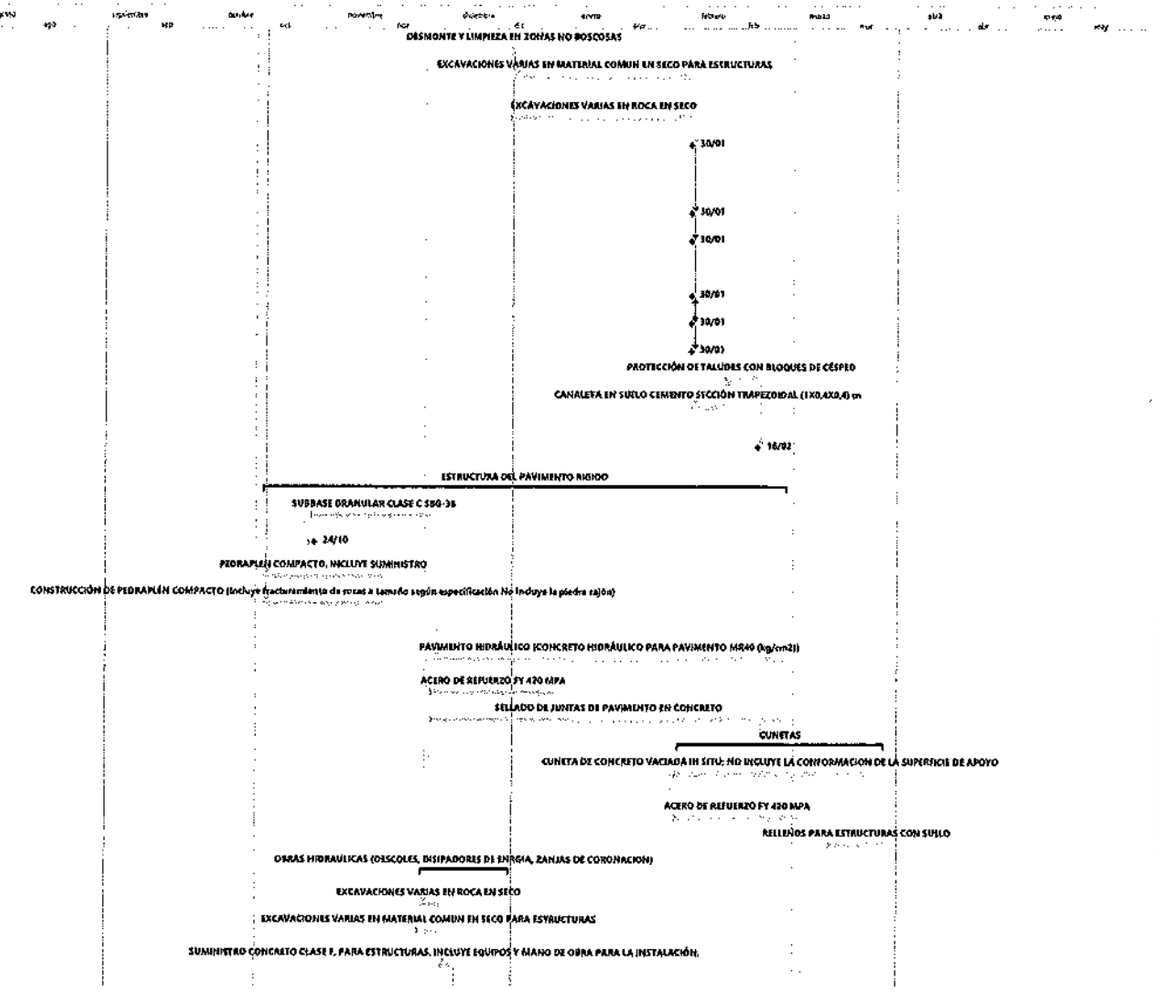

N°	ITEM	Nombre de tarea	Und	Cantidades	Costo	Duración	Predecesor	Comienzo
58	7,04	SUMINISTRO CONCRETO CLASE D INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN	M3	6,22	$ 10.464.012,00	17 días	57	sáb 23/11/25
59	7,05	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	624,61	$ 7.384.133,09	15 días	57	sáb 22/11/25
60	7,06	CANALETA EN SUELO CEMENTO SECCIÓN TRAPEZOIDAL (1X0,4X0,4) m	ML	0	$ 0,00	0 días	53	dom 14/12/25
61	8	**SEÑALIZACION**		0	$ 234.736.905,00	36 días		lun 16/02/26
62	8,01	PINTURA IMPRIMANTE BASE PARA DEMARCACIÓN	ML	1788	$ 6.510.108,00	6 días	39	lun 16/02/26
63	8,02	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	1788	$ 7.400.532,00	6 días	62	dom 22/02/26
64	8,03	SEÑAL SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA GALVANIZADA DE 75X75 CM, CALIBRE 16, RETRORREFLECTIVA TIPO IV.	UNO	33	$ 35.791.701,00	5 días	66	sáb 14/03/26
65	8,04	SEÑAL VERTICAL TIPO IV (DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL)	UND	24	$ 27.770.928,00	5 días	6400	sáb 14/03/26
66	8,05	DEFENSA METÁLICA	ML	186	$ 102.778.970,00	12 días	69	mié 4/03/26
67	8,06	TERMINAL DE ABATIMIENTO	UND	14	$ 47.778.388,00	12 días	6600	mié 4/03/26
68	8,07	INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS PARA BARRERAS	UND	54	$ 1.193.078,00	12 días	6600	mié 4/03/26
69	8,08	TACHA REFLECTIVAS PARA DEMARCACIÓN	UND	225	$ 3.888.325,00	5 días	63	vie 27/02/26
70	8,09	POSTES DE REFERENCIA	UND	2	$ 1.566.078,00	2 días	65	jue 19/03/26
71	9	**VARIOS**		0	$ 295.869.828,00	215 días		mié 2/09/25
72	9,01	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, ALCANTARILLAS, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIA MAYORES A 1000 METROS.	M3/KM	74377,44	$ 206.843.651,00	35 días	600	mar 20/01/26
73	9,02	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO (CUATRO FILAS)	M	932	$ 48.765.968,00	15 días	52	vie 27/02/26
74	9,03	REMOCION DE DERRUMBRES	M3	0	$ 0,00	1 día	9	mié 8/10/25
75	9,04	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)	M3/KM	0	$ 0,00	1 día	74	jue 9/10/25
76		**PLAN GENERAL DE MANEJO DE TRANSITO**		0	$ 56.191.700,00	272,5 días		vie 25/07/25
77		**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**		0	$ 50.196.400,00	272,5 días		vie 25/07/25

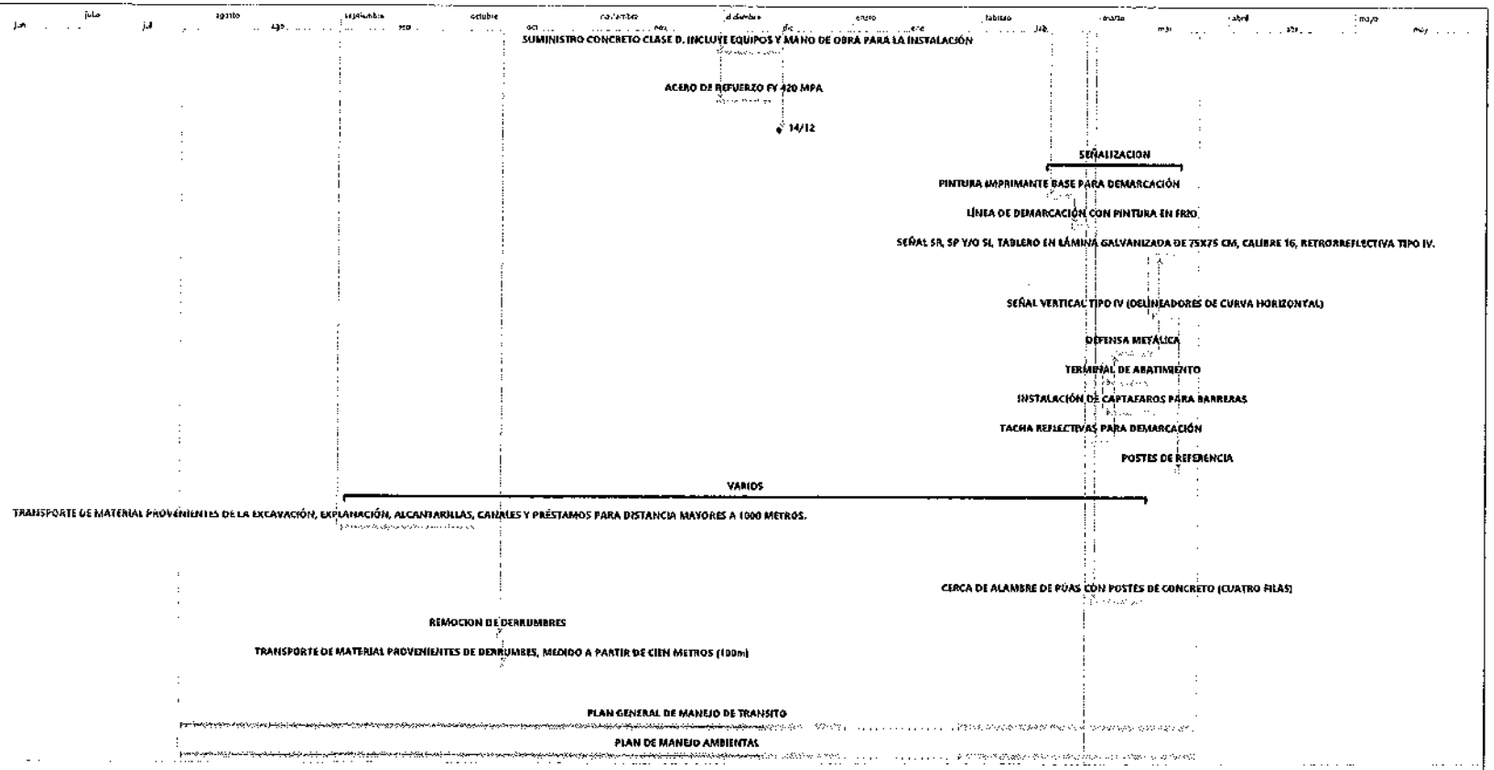

EJECUTADO VS PROGRAMADO

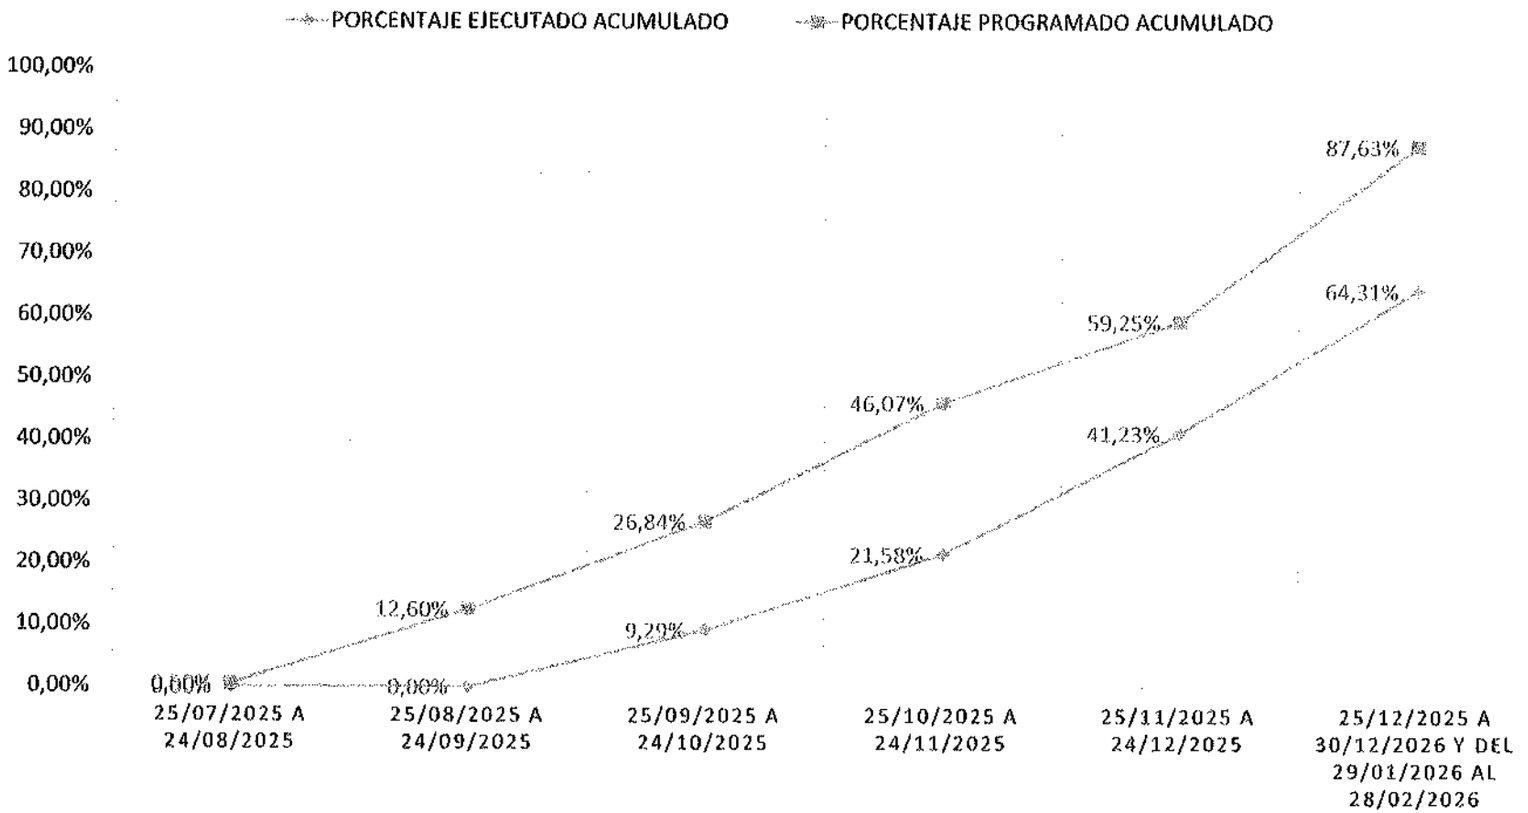

Pólizas Actualizadas.

	ACTA APROBACION DE POLIZA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-09
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	03/04/2025
		PÁGINA	1 de 2

Bucaramanga, 19 de marzo de 2026.

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA

De conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública, en la fecha se procede a realizar la aprobación de la garantía única presentada por **CONSORCIO EMR-APP BELLEZA** con NIT **901.949.762-6**, para amparar el Contrato de obra **CO1.PCCNTR.7912853 de 2025** cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"

Para el efecto, se recibe la Póliza de Garantía de cumplimiento de entidad estatal **No. 465 47 994000013420 anexo 3 expedido** con fecha 27 de febrero de 2025, por la Aseguradora Solidaria de Colombia, la cual presenta los siguientes amparos:

NÚMERO DE POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE (DD-MM-AA)	DESDE (DD-MM-AA)	
465 47 94000013420	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	30/05/2025	24/09/2026	$789.172.771.40
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	30/05/2025	24/03/2029	$394.586.385.70
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	5 años		$1.183.759.157.10

Nota: Se deja constancia que se aprueban las pólizas de conformidad, según adicional No. 01 de fecha 30 de diciembre de 2025 y acta de reinicio No. 01 de fecha 29 de enero de 2026, el amparo estabilidad y calidad de la obra tiene vigencia de cinco (5) años a partir del acta de recibo final.

Para el efecto, se recibe la Póliza de Responsabilidad civil extracontractual **No. 465 74 994000003979 anexo 4 expedido** con fecha 27 de febrero de 2026, por la Aseguradora Solidaria de Colombia, la cual presenta los siguientes amparos:

NÚMERO DE POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE (DD-MM-AA)	DESDE (DD-MM-AA)	
465 74 994000003979	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.	29/01/2026	24/03/2026	$700.362.000.00

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en las pólizas, la misma se ajusta a lo requerido por la Administración Departamental a través del Contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.7912853 de 2025** y en consecuencia se imparte la aprobación la aprobación de la Garantía de cumplimiento No. **465 47 994000013420 anexo 3** expedido con fecha 27 de febrero de 2025, y Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **465 74 994000003979 anexo 4** expedido con fecha 27 de febrero de 2026, por la Aseguradora Solidaria de Colombia

Constancia de verificación de la garantía en línea: que, una vez consultada la página de la Aseguradora Solidaria de Colombia, la referida póliza se encuentra vigente.

Ing. JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: Liliana Rueda Triana- cps
Reviso: Ing. María Camila Chinchilla - Supervisora del contrato

Aseguradora Solidaria de Colombia

[redacted]

Consultar Póliza

[redacted]

Número de póliza: 994000013420

Agencia: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO

Asegurado / Beneficiario: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Tomador / Garantizado: CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

Número de anexo: 3

Ramo: CUMP. ENT. ESTATALES

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	martes, 24 de marzo de 2026	lunes, 24 de marzo de 2031	$1,182,788,187.18
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y INDEMNIZACIONES LABORALES	viernes, 24 de marzo de 2028	sábado, 24 de marzo de 2029	$394,929,395.73
CUMPLIMIENTO	viernes, 24 de marzo de 2028	jueves, 24 de septiembre de 2026	$788,172,771.43

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Aseguradora Solidaria de Colombia

[redacted]

Consultar Póliza

[redacted]

Número de póliza: 994000003979

Agencia: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO

Asegurado / Beneficiario: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Tomador / Garantizado: CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

Número de anexo: 4

Ramo: RESP CIVIL EXT PATRI

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4650865621

PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000013420 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	02	2026	27	02	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSORCIO EMR-APP BELLEZA IDENTIFICACIÓN: NIT 901.949.762-6

DIRECCIÓN: CR 21 A 35 40 CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER TELÉFONO: 3108853248

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER IDENTIFICACIÓN: NIT 890.201.235-6

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER IDENTIFICACIÓN: NIT 890.201.235-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	30/05/2025	24/09/2026	789,172,771.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	30/05/2025	24/03/2029	394,586,385.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		1,183,759,157.10

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901661653 - EMR S.A.S. ZOMAC - PART: 10.00%
NIT 901385053 - SAPI CONSTRUCCIONES S A S - PART: 90.00%

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901661653 - EMR S.A.S. ZOMAC - PART: 90.00%
NIT 900446925 - APP CONTROL INGENIERIA SAS - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 890201235 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *2,367,518,314.20	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AMER CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA	11141	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIEN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PAGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004650865621

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25790F0EF87B5D

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000013420 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EMR-APP BELLEZA** IDENTIFICACIÓN: NIT 901.949.762-6

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** IDENTIFICACIÓN: NIT 890.201.235-6

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** IDENTIFICACIÓN: NIT 890.201.235-6

TEXTO ITEM 1

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.7912853 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

NOTA ACLARATORIA
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS:
-DEPARTAMENTO DE SANTANDER - NIT 890.201.235-6
-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - NIT 800.215.807-2

NOTA: SEGÚN MODIFICATORIO NO. 01 SE MODIFICAN INTEGRANTES DEL CONSORCIO EMR-APP BELLEZA.
- SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S - 901385053 - % PARTICIPACIÓN 90%
- EMR S.A.S. ZOMAC - 901661653 - % PARTICIPACIÓN 10%.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE EFECTUA MODIFICACION DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE EFECTUA MODIFICACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SEGUN :

ACTA DE SUSPENSION NRO. 01 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO NRO. 01 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2026

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4650865654

PÓLIZA No: 465 -74 - 994000003979 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
27	02	2026		29	01	2026	23:59		24	03	2026	23:59		54	20	03	2026

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL
TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
	29	01	2026	23:59		24	03	2026	23:59		54

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO EMR-APP BELLEZA
IDENTIFICACIÓN: NIT 901.949.762-6
DIRECCIÓN: CR 21 A 35 40
CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER
TELÉFONO: 3108853248

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
IDENTIFICACIÓN: NIT 890.201.235-6
DIRECCIÓN: CARRERA 37 NO. 10-36
CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER
TELÉFONO: 3158864778
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS
IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT : 890201235

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SANTANDER CIUDAD: LA BELLEZA

DIRECCION: CALLE 0 No. -

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: -1-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 700,362,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	700,362,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 890201235 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.7912853 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

COBERTURA BÁSICA SEGÚN DECRETO 1082 DE 2015.
1.1 AMPARO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
1.2 AMPARO CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
1.3 AMPARO VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.
1.4 AMPARO PATRONAL.
1.5 AMPARO GASTOS MÉDICOS.
1.6 AMPARO GASTOS DE DEFENSA.
1.7 AMPARO PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
1.8 AMPARO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***130,962,000.00	$ **********38,750	$*********0.00	$ ********7,363	$ **********46,113

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
AMER CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA	11141	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/estamos-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004650865 65

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25790F0EF87B58 CLIENTE CARBERMUDEZ 0

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Asegu... ...ora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del ... Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2609 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000003979 ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EMR-APP BELLEZA** IDENTIFICACIÓN: NIT 901.949.762-6

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** IDENTIFICACIÓN: NIT 890.201.235-6

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CUENTA CON UN AMPARO BÁSICO.

TODAS LAS COBERTURAS QUE SE INDICAN ESTÁN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA DEL AMPARO BÁSICO, CUYO VALOR SERÁ EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA.

ASEGURADOS:
-DEPARTAMENTO DE SANTANDER - NIT 890.201.235-6
-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - NIT 800.215.807-2

BENEFICIARIOS:
TERCEROS AFECTADOS,
- DEPARTAMENTO DE SANTANDER - 890.201.235-6
- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - 800.215.807-2

NOTA: SEGÚN MODIFICATORIO NO. 01 SE MODIFICAN INTEGRANTES DEL CONSORCIO EMR-APP BELLEZA.
- SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S - 901385053 - % PARTICIPACIÓN 90%
- EMR S.A.S. ZOMAC - 901661653 - % PARTICIPACIÓN 10%.

BENEFICIARIOS:
TERCEROS AFECTADOS,
- DEPARTAMENTO DE SANTANDER - 890.201.235-6
- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - 800.215.807-2

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE EFECTUA MODIFICACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE EFECTUA MODIFICACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SEGUN;

ACTA DE SUSPENSION NRO. 01 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO NRO. 01 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2026

NOTA; CON EL PRESENTE ANEXO SE EFECTUA MODIFICACION DEL VALOR ASEGURADO SEGUN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE DE 2026

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000003979 ANEXO: 4 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSORCIO EMR-APP BELLEZA IDENTIFICACION: 901.949.762-6

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890201235-6	CALLE 0 No. -	LA BELLEZA	130,962,000.00	38,750	46,113

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
38,750	46,113

Informe HSEQ.

INFORME DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02

PERIODO:

DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y DEL 29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.7912853 DEL 30 DE MAYO DEL 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA
NIT. 901.949.762-6

ELABORO:
MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO
CARGO: PROFESIONAL HSEQ

SUCRE - SANTANDER

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
3. AREA DE INTERVENCION 5
4. INFORMACION DEL CONTRATO 6
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
5.1 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
5.1.1 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS PROFESIONALES MÍNIMOS REQUERIDOS 7
5.1.2 VINCLULACION DEL PERSONAL 17
5.1.3 ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 17
5.1.4 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 19
5.1.5 REPORTE SOBRE LA DIVULGACION DE SG-SST 19
6. SEGUIMIENTO A INDICADORES 22
7. CONCLUSIONES 23
8. ANEXOS 24

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. LOCALIZACIÓN GENERAL TRAMO A INTERVENIR. 5
Ilustración 2. LOCALIZACIÓN TRAMOS 5
Ilustración 3. CAPACITACIONES REALIZADAS 18
Ilustración 4. DIVULGACION SG-SST 20
Ilustración 5. EJECUCION ORDENADA DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 21
Ilustración 6. SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO 22

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. PROFESIONALES UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA 7
Tabla 2. RELACION PERSONAL OPERATIVO 8
Tabla 3. CONTROL DE PAGOS PLANILLAS DE SEGURIDAD 16
Tabla 4. RELACION EXAMENES OCUPACIONALES 17
Tabla 5. RELACION DE CAPACITACIONES REALIZADAS 19

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre del 2025 al 30 de diciembre del 2025 y del 29 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026, durante el desarrollo de actividades del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER enfocado en la gestión realizada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por el contratista CONSORCIO EMR-APP BELLEZA.

La Gobernación de Santander en cumplimiento con los principios de descentralización definidos en la ley 105 de 1993, en la cual el gobierno Nacional de Colombia transfirió la red vial a su cargo a los Entes Territoriales, de manera que la Administración y gestión de la red vial Urbana estén a cargo de los departamentos y municipios, hizo revisión y dio aval del proyecto por medio de la Oficina Para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En el periodo, se desarrollaron actividades como: exámenes de ingreso, inducción HSEQ, verificación documentación para ingreso de personal, capacitaciones SST, inspecciones áreas de trabajo, entrega de elementos de protección personal y dotación, delimitación de áreas de trabajo con cinta peligro y adecuación de campamento de obra.

La implementación del plan de Seguridad y Salud en el trabajo se enmarca en el ciclo del Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA); como también dentro de los cuatro elementos fundamentales de un sistema gerencial: Organización, Planificación, Implementación y Control y Seguimiento. A continuación, se presenta lo relacionado con el componente SST para el reporte del periodo.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades desarrolladas por el área de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa CONSORCIO EMR-APP BELLEZA del contrato que tiene como objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ejecutar las actividades de construcción relacionadas en el contrato de acuerdo con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.
- Desarrollar cada una de las actividades de obra, teniendo especial atención y cuidado en la ejecución de estas con el fin de prevenir y disminuir cualquier riesgo de afectación al entorno, al medio ambiente y/o al trabajador.
- Garantizar acciones de mejora a partir de las recomendaciones dadas por los supervisores y residentes de obra, para priorizar el bienestar de los trabajadores y el personal que interviene en la construcción de la obra.
- Llevar a cabo el seguimiento de los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 del 2019.

3. AREA DE INTERVENCION

El corredor vial objeto de este proyecto conecta los municipios de Sucre y La Belleza en el departamento de Santander, abarcando el sector Altamira. Este tramo estratégico no solo beneficia directamente a los municipios mencionados, sino que también mejora la conectividad de Puente Nacional, Jesús María, Bolívar, Florián y Albania, facilitando el acceso y la movilidad en esta región. La intervención prevista se extiende a lo largo del corredor vial, optimizando la infraestructura y fortaleciendo el desarrollo vial del área.

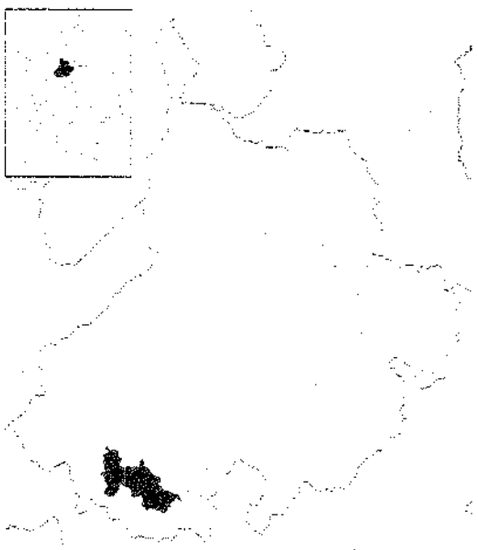


Ilustración 1. LOCALIZACIÓN GENERAL TRAMO A INTERVENIR.

El tramo vial para intervenir es de 0,64 kilómetros divididos en 2 tramos, un tramo de 340 metros y otro de 300 metros; actualmente la vía presenta una adecuada infraestructura vial por lo cual se plantea el diseño sobre la superficie a actual teniendo en cuenta una carretera doble carril para mejorar los tiempos de recorrido y accesibilidad de los predios adyacentes al mismo.

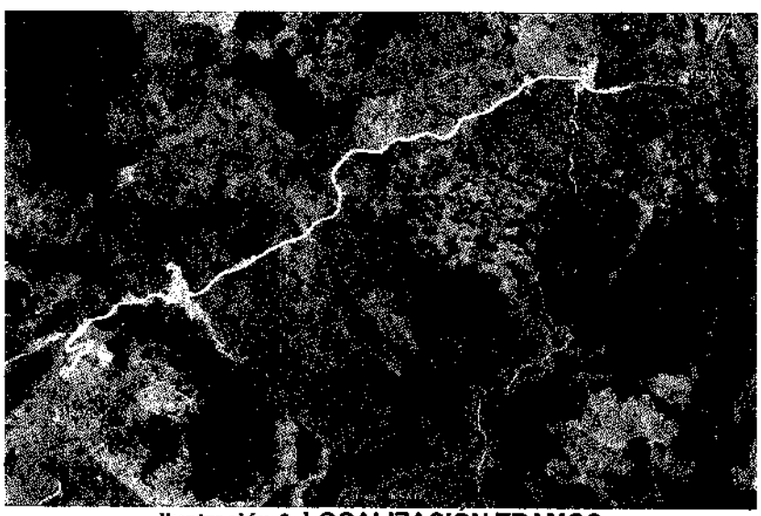


Ilustración 2. LOCALIZACIÓN TRAMOS

4. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7912853 NI. 1618/2025	30/05/2025
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EMR-APP BELLEZA**	
Nit o C.C. No.	901.949.762-6	
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**	

VALOR INICIAL:	$3.945.863.857	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$3.945.863.857	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	64.31%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	41.23%	
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA	
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7924460 NI. 1710/2025	13/06/2025
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL SOLASEC	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	901.953.373	
SUPERVISOR:	MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 18/09/2025	

FECHA DE INICIACIÓN:	25/07/2025

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	01	Fecha:	30/12/2025
No.		Fecha:	

ACTAS DE REINICIO			
No.	01	Fecha:	29/01/2026
No.		Fecha:	

FECHA DE TERMINACIÓN:	24/03/2026

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se describen las actividades ejecutadas durante el periodo del 15 de diciembre del 2025 al 30 de diciembre del 2025 y del 29 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026, mencionado con el fin de dar cumplimiento a los programas establecidos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables para la empresa CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

5.1GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo, se ha realizado las siguientes actividades dando cumplimiento del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

5.1.1 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS PROFESIONALES MÍNIMOS REQUERIDOS

Se realizan las afiliaciones (ARL, EPS, AFP, CCF) correspondientes al personal vinculado, a continuación, se relaciona el personal vinculado al proyecto, hasta la fecha:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	25%	LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ	1.098.717.479	25/07/2025	INDEFINIDA
RESIDENTE DE OBRA	100%	OSCAR DAVID VERA ROJAS	1.098.672.955	01/08/2025	INDEFINIDA
INGENIERO AUXILIAR	100%	CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN	1.101.178.503	25/07/2025	INDEFINIDA
PROFESIONAL HSEQ	90%	MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO	1.098.755.645	01/08/2025	INDEFINIDA
ESPECIALISTA EN VÍAS O PAVIMENTO	20%	JOSE RAFAEL MOLINA ZAMBRANO	1.095.817.584	01/08/2025	30/11/2025
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20%	JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENAS	1.095.924.967	01/08/2025	30/11/2025
PROFESIONAL SOCIAL	10%	FRANCISCA BOLIVAR CAMPUZANO	26.996.881	01/08/2025	30/11/2025
COMISIÓN TOPOGRÁFICA	90%	YADIRA DURAN GARCIA	37.893.183	01/08/2025	INDEFINIDA
PROFESIONAL PMP	90%	SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS	53.081.449	01/08/2025	INDEFINIDA
INGENIERO AMBIENTAL	50%	RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES	91.488.767	01/08/2025	INDEFINIDA

Tabla 1. PROFESIONALES UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

RELACIÓN PERSONAL ÁREA OPERATIVA			
NOMBRE TRABAJADOR	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
MARCO ANTONIO BUITRAGO BOHORQUEZ	MAESTRO DE OBRA	06/10/2025	--
CRISTIAN MAURICIO SANCHEZ TELLEZ	AUXLIIAR DE CONSTRUCCIÓN	04/10/2025	--
ELKIN MAURICIO SANABRIA OLARTE	AUXLIIAR DE CONSTRUCCIÓN	06/10/2025	--
JESUS EMILIO ARIZA SANTAMARIA	AUXLIIAR DE CONSTRUCCIÓN	04/10/2025	--
NELLY YOMAIRA RUIZ QUIROGA	AUXILIAR DE CONTROL DE TRANSITO	1801/2026	--
MICHAEL ANDRES ROJAS GALINDO	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	16/12/2025	--
WILLIAM ROMERO ARIZA	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	27/01/2026	--
JUAN CAMILO PEÑA PINEDA	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	01/12/2025	--
DAYRON DAVID SANCHEZ QUIROGA	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	28/01/2026	--
JOSE ISIDRIO ARANGO YARA	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	13/11/2025	--
LUIS ALBERTO PUENTES QUIROGA	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	13/11/2025	--
LENIS ADRIANA RUIZ QUIROGA	AUXILIAR DE CONTROL DE TRANSITO	18/01/2026	--

Tabla 2. RELACION PERSONAL OPERATIVO

Desde el área contratista se garantiza el pago de la seguridad social de todos los profesionales y trabajadores del área operativa vinculados en la ejecución de las actividades en el frente de obra activo. A continuación, se evidencia el control del pago de las planillas de seguridad:

Nombre: LUIS CARLOS LOZANO ALVAREZ

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	02-02-2026
	N° de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 100.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
PENSIÓN	Fecha de pago	02-02-2026
	N° de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 400.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	02-02-2026
	N° de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 174.000
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 120.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 480.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 125.300
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	N° de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 120.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	N° de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 480.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	N° de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.000.000
	Valor cotizado	$ 120.000
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

Nombre: OSCAR DAVID VERA ROJAS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	N° de Planilla	85035821
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 402.500
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	14-04-2026
	N° de Planilla	85035821
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 515.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	14-04-2026
	N° de Planilla	85035821
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 224.200
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	$64.400
	I.C.B.F.	$96.600
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	N° de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 402.500
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	N° de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 515.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	N° de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 224.200
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	$64.400
	I.C.B.F.	$96.600
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	N° de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 402.500
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	N° de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 515.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	14-04-2026
	N° de Planilla	85035972
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.220.000
	Valor cotizado	$ 224.200
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	$64.400
	I.C.B.F.	$96.600

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Caja de Compensación	COMFENALCO

Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN

Cargo: INGENIERO AUXILIAR

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	02-02-2026
	Nº de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.300.000
	Valor cotizado	$ 92.000
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	02-02-2026
	Nº de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.300.000
	Valor cotizado	$ 368.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	02-02-2026
	Nº de Planilla	36000868
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.300.000
	Valor cotizado	$ 160.100
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 104.300
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 417.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	36426892
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 181.500
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	Nº de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 104.300
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	Nº de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 417.200

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	16-03-2026
	Nº de Planilla	36737266
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.008.400
	Valor cotizado	$ 181.500
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	COMFENALCO

Nombre: MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO

Cargo: PROFESIONAL HSEQ

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	13-01-2026
	Nº de Planilla	2753497
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.560.000
	Valor cotizado	$ 195.000
	EPS	SALUD MIA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	13-01-2026
	Nº de Planilla	2753497
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.560.000
	Valor cotizado	$ 249.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	13-01-2026
	Nº de Planilla	2753497
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.560.000
	Valor cotizado	$ 16.300
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	06-02-2026
	Nº de Planilla	46836850
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SALUD MIA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	06-02-2026
	Nº de Planilla	46836850
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	06-02-2026
	Nº de Planilla	46836850
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 18.300
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	03-03-2026
	Nº de Planilla	62419101

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SALUD MIA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	03-03-2026
	N° de Planilla	62419101
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	03-03-2026
	N° de Planilla	62419101
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 18.300
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Nombre: YADIRA DURAN GARCIA

Cargo: TOPOGRAFA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	29-12-2025
	N° de Planilla	82582941
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	29-12-2025
	N° de Planilla	82582941
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	29-12-2025
	N° de Planilla	82582941
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865750
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865750
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865750
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865767
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865767
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865767
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Nombre: SANDRA XIMENA SALAS CALLEJAS

Cargo: PROFESIONAL PMP

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865971
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865971
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83865971
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83866003
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83866003
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	N° de Planilla	83866003
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83866008
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83866008
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	20-02-2026
	Nº de Planilla	83866008
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Nombre: RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES

Cargo: INGENIERO AMBIENTAL

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	25-02-2025
	Nº de Planilla	83917730
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	25-02-2025
	Nº de Planilla	83917730
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	25-02-2025
	Nº de Planilla	83917730
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	Nº de Planilla	83917732
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	Nº de Planilla	83917732

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	N° de Planilla	83917732
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	N° de Planilla	83917737
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	N° de Planilla	83917737
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2026
	Fecha de pago	25-02-2026
	N° de Planilla	83917737
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

RAZÓN SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA – SAFI CONSTRUCCIONES SAS	ENERO	36000868	20/02/2026
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA – SAFI CONSTRUCCIONES SAS	FEBRERO	36426892	20/02/2026
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA – SAFI CONSTRUCCIONES SAS	MARZO	36737266	16/03/2026

Tabla 3. CONTROL DE PAGOS PLANILLAS DE SEGURIDAD

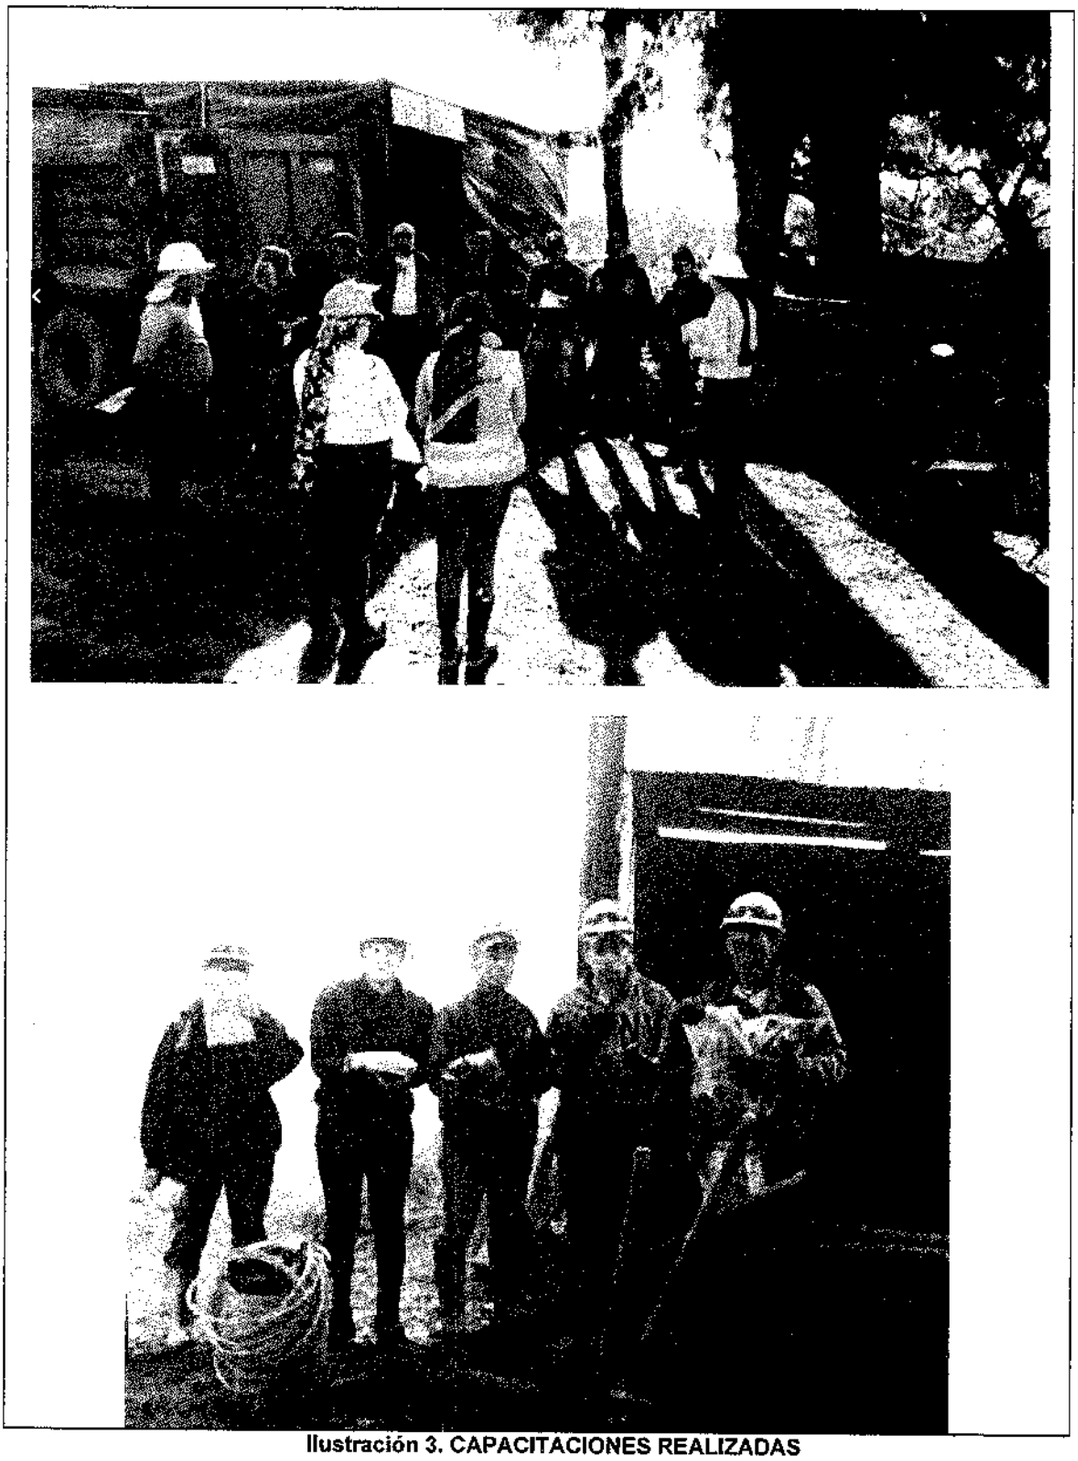


Ilustración 3. CAPACITACIONES REALIZADAS

Así mismo, se realiza la reposición oportuna de los elementos de protección personal, hasta la fecha se ha realizado entrega de Guantes de Vaqueta, gafas de seguridad y protección auditiva en el área operativa.

5.1.4 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Previo al inicio de actividades en obra, se realizan charlas con énfasis en la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, al personal con el fin de reiterar las pautas en la ejecución de actividades en el proyecto, se realiza la socialización de políticas del SG- SST de la empresa contratista.

Se realizaron charlas, campañas de sensibilización en la adecuada disposición de los residuos sólidos, reiterando diariamente la importancia del uso de elementos de protección personal y orden y aseo en los lugares de trabajo.

CAPACITACIONES PROGRAMADAS				
DESCRIPCIÓN	FECHA	FORMACIÓN		INTENSIDAD
		AMB	SST	
CAPACITACION CORRECTA INSPECCIONES A EQUIPOS	26/12/2025		X	15 MIN
CAPACITACION ORDEN Y ASEO EN SUS PUESTOS DE TRABAJO	29/12/2025		X	15 MIN

Tabla 5. RELACION DE CAPACITACIONES REALIZADAS

5.1.5 REPORTE SOBRE LA DIVULGACION DE SG-SST

Dentro del contenido de la inducción general de ingreso a la empresa, se encuentra establecida la divulgación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, se realiza capacitación al personal operativo y administrativo.

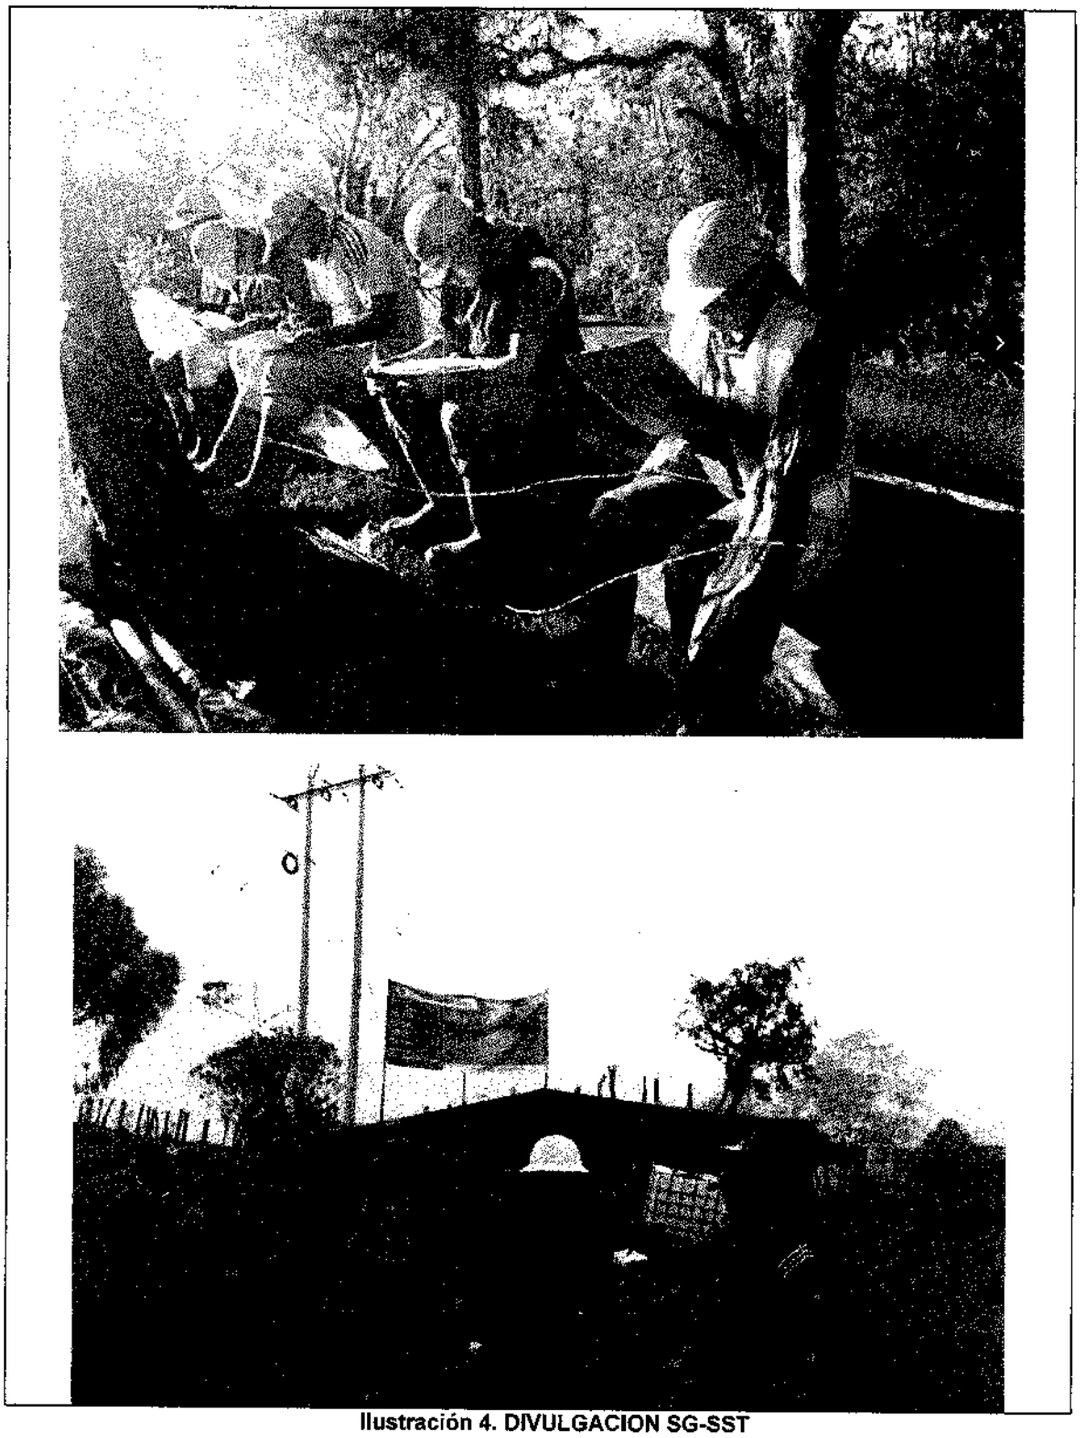


Ilustración 4. DIVULGACION SG-SST

5.1.6 REPORTE DE RIESGOS Y PELIGROS

Durante el periodo se realiza la identificación de los peligros, valoración de riesgos y definición de controles, mediante matriz, siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía técnica Colombia GTC45, se realiza la definición del PROCEDIMIENTO DE

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS (ASO-PR-036-S).


Los peligros identificados y riesgos fueron socializados a los trabajadores, dando a conocer los controles que se llevarían a cabo, siendo consientes, que el área de trabajo donde se realizan actividades en obra, representa un riesgo alto, en el periodo se realiza protección de taludes.



Ilustración 5. EJECUCION ORDENADA DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

5.1.7 SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

A continuación, se relaciona la señalización instalada hasta la fecha, para la ejecución de actividades en el sitio de obra activo.

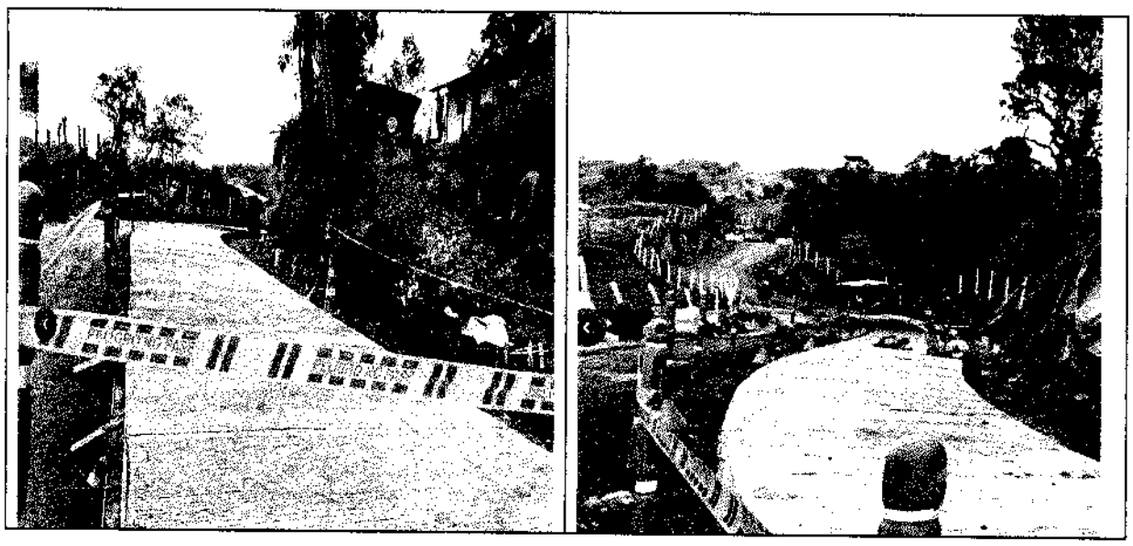

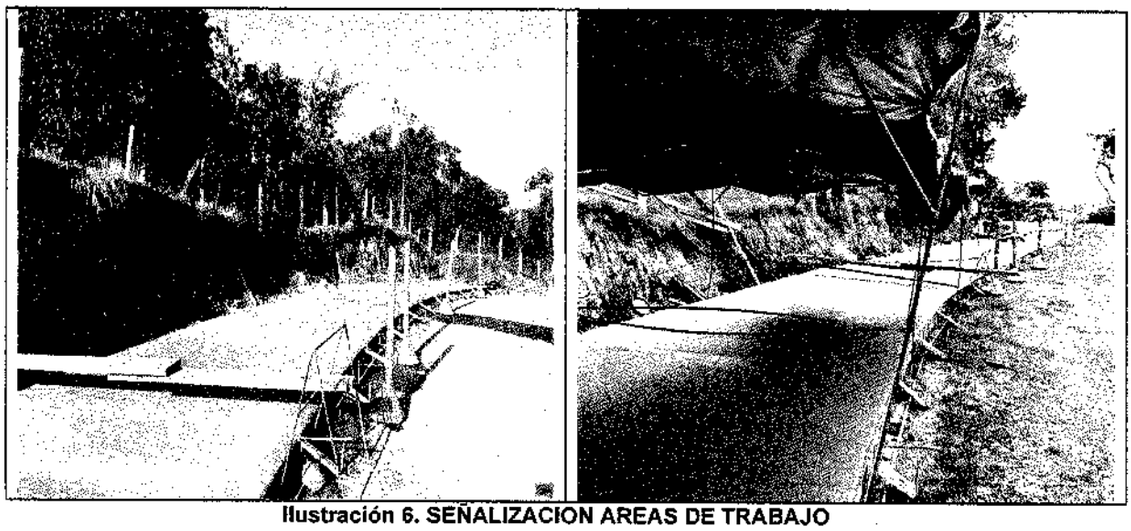


Ilustración 6. SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO

6. SEGUIMIENTO A INDICADORES

La normatividad existente en Colombia regula los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo que todo empleador o contratante debe llevar en sus registros, el contratista realiza el seguimiento mensual de los indicadores mínimos establecidos en la Resolución 0312 del 2019.

Frecuencia de accidente de trabajo: Durante este periodo la tasa de accidentalidad fue del 0%, no se presentó ausentismo por causa médica por origen laboral.

DESCRIPCIÓN	PERIODO	CANTIDAD
NO. ACCIDENTES LABORALES	15 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	0
NO INCIDENTES REPORTADOS	15 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	0
DÍAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTES LABORALES	15 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	0
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	15 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	0

7. CONCLUSIONES

- Se llevó a cabo el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) conforme a la normatividad vigente (Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015 y otras aplicables), garantizando el cumplimiento de requisitos legales y evitando inconvenientes por omisión.

- Se ejecutaron algunas inspecciones regulares en frentes de trabajo, con el fin de evaluar el cumplimiento de protocolos de seguridad, detectando condiciones subestándares para aplicar planes de acción correctiva en aras de mejora.

- Se realizaron capacitaciones periódicas sobre el uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP), manejo seguro de herramientas y equipos y procedimientos de emergencia, fortaleciendo la cultura de seguridad en la obra.

- Se identificaron, evaluaron y gestionaron los principales riesgos asociados a la obra, implementando medidas preventivas y correctivas que han contribuido a minimizar incidentes laborales y mejorar la seguridad de los trabajadores.

- Se documentaron y analizaron posibles causales de incidentes y condiciones de riesgo reportadas durante la obra con el propósito de poder efectuar medidas correctivas y preventivas para evitar su recurrencia.

- Se optimizaron las condiciones generales en la obra mediante la adecuada señalización, control de factores ergonómicos, manejo de residuos y acceso zonas de descanso e hidratación, lo que contribuyó al bienestar y desempeño de los trabajadores.

- Se identificaron oportunidades de mejora en la planificación y ejecución de las actividades de SST, destacando la importancia de reforzar la supervisión, optimizar el uso de EPP y fortalecer la comunicación sobre riesgos en la obra.

- Se promovió la participación de los trabajadores en los programas de seguridad a través de comités paritarios (COPASST), reportes de condiciones inseguras y sugerencias para la mejora continua.

Elaboro:

MARIA FERNANDA ESTABAN CALVIJO
PROFESIONAL HSEQ

ANEXOS

1. **CAPACITACIONES REALIZADAS**
2. **ENTREGA DE EPPS**
3. **DOCUMENTOS Y EXAMENES DE INGRESO**

8. ANEXOS

	FORMATO DE ASISTENCIA	Código:	GAS-FT-17
		Versión:	0
		Fecha:	19/11/2025
		Páginas:	1 DE 1

DE YA A EVALUAR LA FORMACIÓN: NO ____ SI ____ FUE EFICAZ: SI 08/02/2026.

PROYECTO: Contrato EMR- APP- la Palma

TEMA: Los Casi accidentes son una alerta.

OBJETIVO: Crear conciencia y analizar en que estamos fallando como trabajadores para corregir actos y condiciones inseguras

Clasificación de la Inducción

X	CHARLA		BRIGADA DE EMERGENCIA		REUNION INFORMATIVA
	CAPACITACIÓN		COMITÉ INVESTIGADOR		OTROS:
	CURSO-TALLER		COMITÉ DE CONVIVENCIA		LEY 50 ART. 21 SI NO
	COMITÉ GERENCIAL		COMITÉ COPASST		DURACIÓN: 15 min

Conferencista

EMPRESA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
SAFI	Karen Alejandra Clavijo	1095795645	Karen Alejandra Clavijo

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	León Mariana Ruiz Quiroga	63331051	Contratadora	Dariana Ruiz
2	Jonas Emilio A S	5601920	Ayudante	
3	Jose Isidro Arango	93228559	Ayudante	
4	Juan Camilo Ruiz Acosta	[illegible]	Ayudante	
5	Antonio Buitrago	95990056	Maestro	
6	Luis Alberto Puentes	5770102	Ayudante	
7	Mauricio Sanchez Tellez	1070583313	Ayudante	
8	Karen Mateus Rueda	1005795639	Inspector HSEQ	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

NOTA DE CIERRE:

	FORMATO DE ASISTENCIA	Código	GAS-FT-17
		Versión	0
		Fecha	19/03/2020
		Páginas:	1 DE 1

SE VA A EVALUAR LA FORMACIÓN: NO X SI ____ FUE EFICAZ: SI 20/02/2026

PROYECTO: Contrato LMK-AIC la Hilera

TEMA: Inyección de Herramientas.

OBJETIVO: Socializar con el personal la importancia de Inspeccionar la herramienta antes de Iniciar las labores

Clasificación de la formación

X	CHARLA		BRIGADA DE EMERGENCIA		REUNION INFORMATIVA
	CAPACITACIÓN		COMITÉ INVESTIGADOR		OTROS:
	CURSO-TALLER		COMITÉ DE CONVIVENCIA		LEY 50 ART. 21 SI NO
	COMITÉ GERENCIAL		COMITÉ COPASST		DURACIÓN: 15 min

Conferencista

EMPRESA SAP:	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
	Monica P. Rincon C	1094272604	Mona Alejandra Cano C.

Item	NOMBRE Y APELLIDO (LEGIBLE)	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Carlos Pico Cano	1094[illegible]5	ayudante	Carlos
2	Antonio Quintero	93900[illegible]6	Maestro	
3	Luis Alberto Puentes	3706[illegible]63	Ayudante	
4	Ronal David Sanchez O	1094[illegible]40	Ayudante	
5	José Isidro Arango	8328557	Ayudante	
6	Jesus Emilio A.S	5-6-1990	Ayudante	
7	William Romero Ariza	1101018635	Ayudante	
8	Luis Alfonso Ruiz Quiroga	6337[illegible]91	Contratista	
9	Hermes Sanchez Tellez	1090583745	Ayudante	Hermes ST
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

NOTA DE CIERRE:

	FORMATO DE ASISTENCIA	Código	GAS-FT-17
		Versión	0
		Fecha	10/12/2020
		Páginas	1 DE 1

SE VA A EVALUAR LA FORMACIÓN	NO. X	ID ____	FIRMA EN: SI	23/02/2025
PROYECTO	Consorcio FHR - APP - 10 Palletas			
TEMA	Comité levanta 12:05			
OBJETIVO	explicar la importancia que tiene la higiene postural para el levantamiento de cargas e indicar cuales son las correctas.			

X	CHARLA		BRIGADA DE EMERGENCIA		REUNION INFORMATIVA
	CAPACITACIÓN		COMITÉ INVESTIGADOR	OTROS:	
	CURSO-TALLER		COMITÉ DE CONVIVENCIA	LEY 50 ART. 21	SI / NO
	COMITÉ GERENCIAL		COMITÉ COPASST	DURACIÓN: 15 min	

EMPRESA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
SST	Maria Alejandra Arenas	1098775845	Maria Alejandra Arenas

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Wilmer Flórez Ruiz	1098660035	obrero	
2	Sofia Ruiz - vecina	5041450	ama de casa	
3	Jesus Lopez G	91607980	ayudante	
4	William Gomez Arenas	1102018635	Ayudante	
5	Yeimmy Sanchez Tellez	1030583343	Ayudante	
6	Yeimmy Lizeth Cortes Rueda	1004367799	Soldador	
7	Jose Candelario Arenas	91070[illegible]5	Ayudante	
8	Luis Alberto Pardo	5[illegible]883	Ayudante	
9	[illegible]	[illegible]	Topografo	
10	[illegible]	[illegible]	Ing Residente	
11	Leonardo Ruiz Quintero	1[illegible]1965	Contratista	
12	Luis Eduardo Ruiz Quintero	63931051	Contratista	
13	Oscar David Sarabia G	1102[illegible]	Ayudante	
14	Alexander Vargas Garcia	1098690[illegible]	OFICIAL	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

NOTA DE CIERRE:	

	FORMATO DE ASISTENCIA	Código:	GAS-FT-17
		Versión:	0
		Fecha:	19/03/2020
		Páginas:	1 DE 1

SE VA A EVALUAR LA FORMACIÓN:	NO X	SI	FUE EFICAZ SÍ	28/02/2026.


PROYECTO:	Consorcio ETR-PPP- La Belleza
TEMA:	Mantenimiento Vial
OBJETIVO:	Definir y controlar las condiciones de riesgo en un lugar de trabajo.


X	CHARLA		BRIGADA DE EMERGENCIA		REUNION INFORMATIVA
	CAPACITACIÓN		COMITE INVESTIGADOR		OTROS:
	CURSO-TALLER		COMITE DE CONVIVENCIA		LEY 50 ART. 23 SI NO
	COMITE GERENCIAL		COMITE COPASST		DURACIÓN: 15 min


EMPRESA SAYI	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
	Nora Alejandra Cleg	1077453205	Nora Alejandra Clavijo.


ITEM	NOMBRE Y APELLIDO (LEGIBLE)	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yomaira Ruth Quintero	1101699669	contratista	Yomaira
2	Jose Isidro Arango	83228554	Ayudante	
3	Juan Camilo Pena Pareja	1100918705	Ayudante	Camilo
4	Antonio Quintero	9390036	Maestro	
5	Luis Alberto Pinzon	97702103	Ayudante	
6	Yasmin Sanchez Tellez	1030772343	Ayudante	Yasmin S T.
7	Jesus Emilio A3	5601912	Ayudante	
8	Karen Mateus Rueda	1005795639	Ingeniera HSEQ	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

NOTA DE CIERRE:	

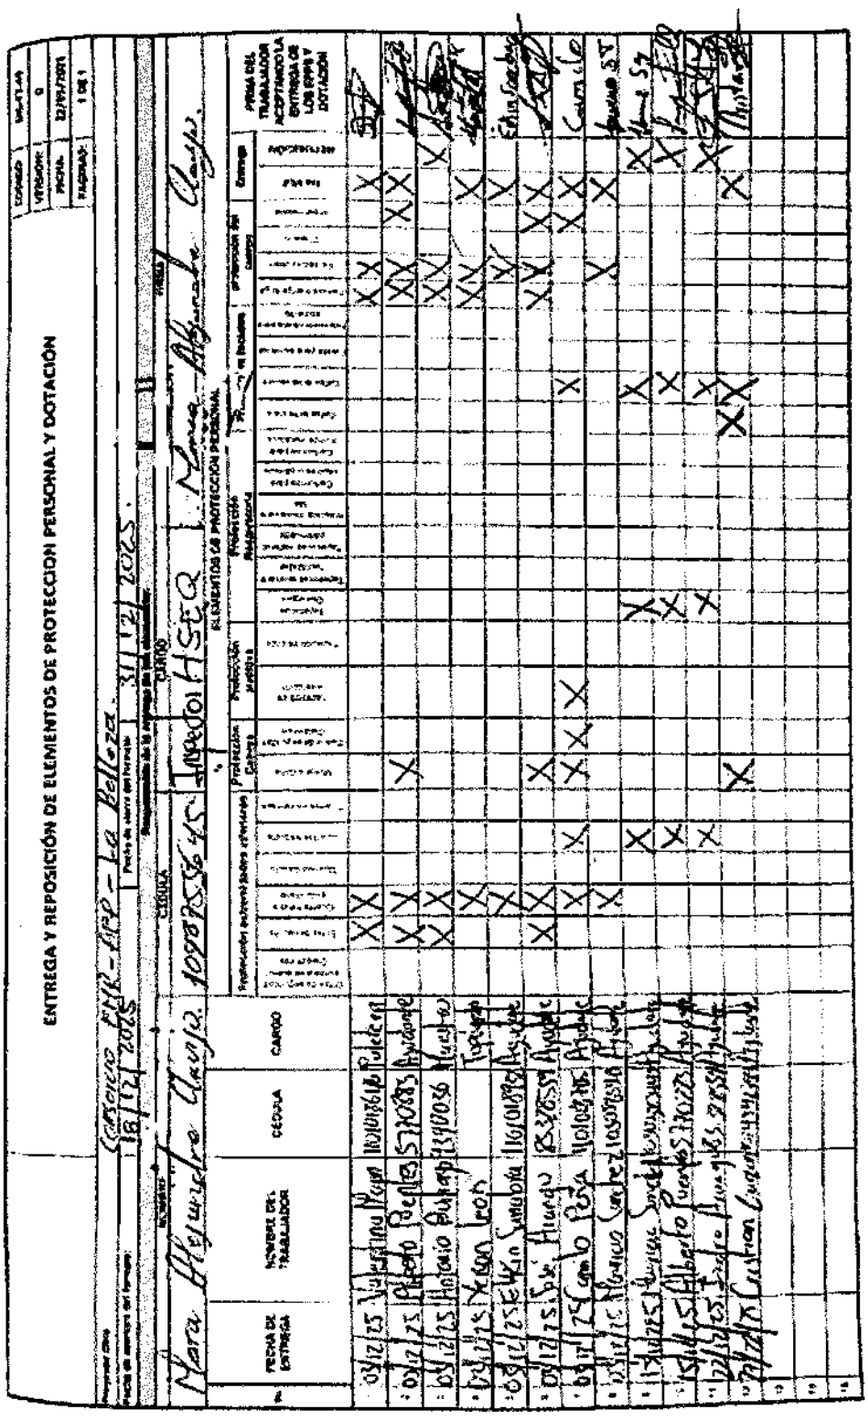
ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
FECHA DE ENTREGA
NOMBRE DEL TRABAJADOR
CEDULA
CARGO
FIRMA DEL TRABAJADOR ACEPTANDO LA ENTREGA DE LOS EPPS Y DOTACION

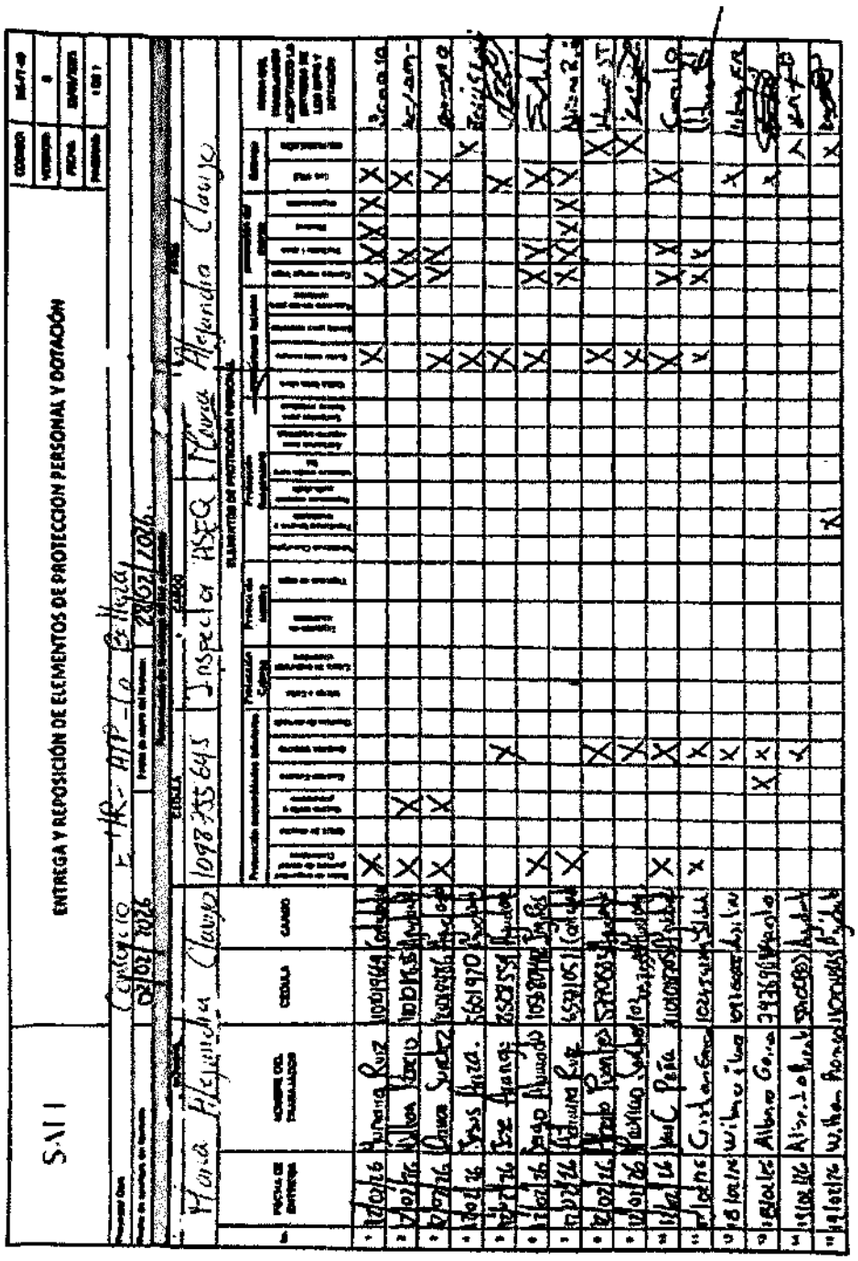
ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN
SAU
CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA
PAGINA
CONTRATO
CEDULA
CARGO
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Inspector HSEQ
Alejandra Clavijo

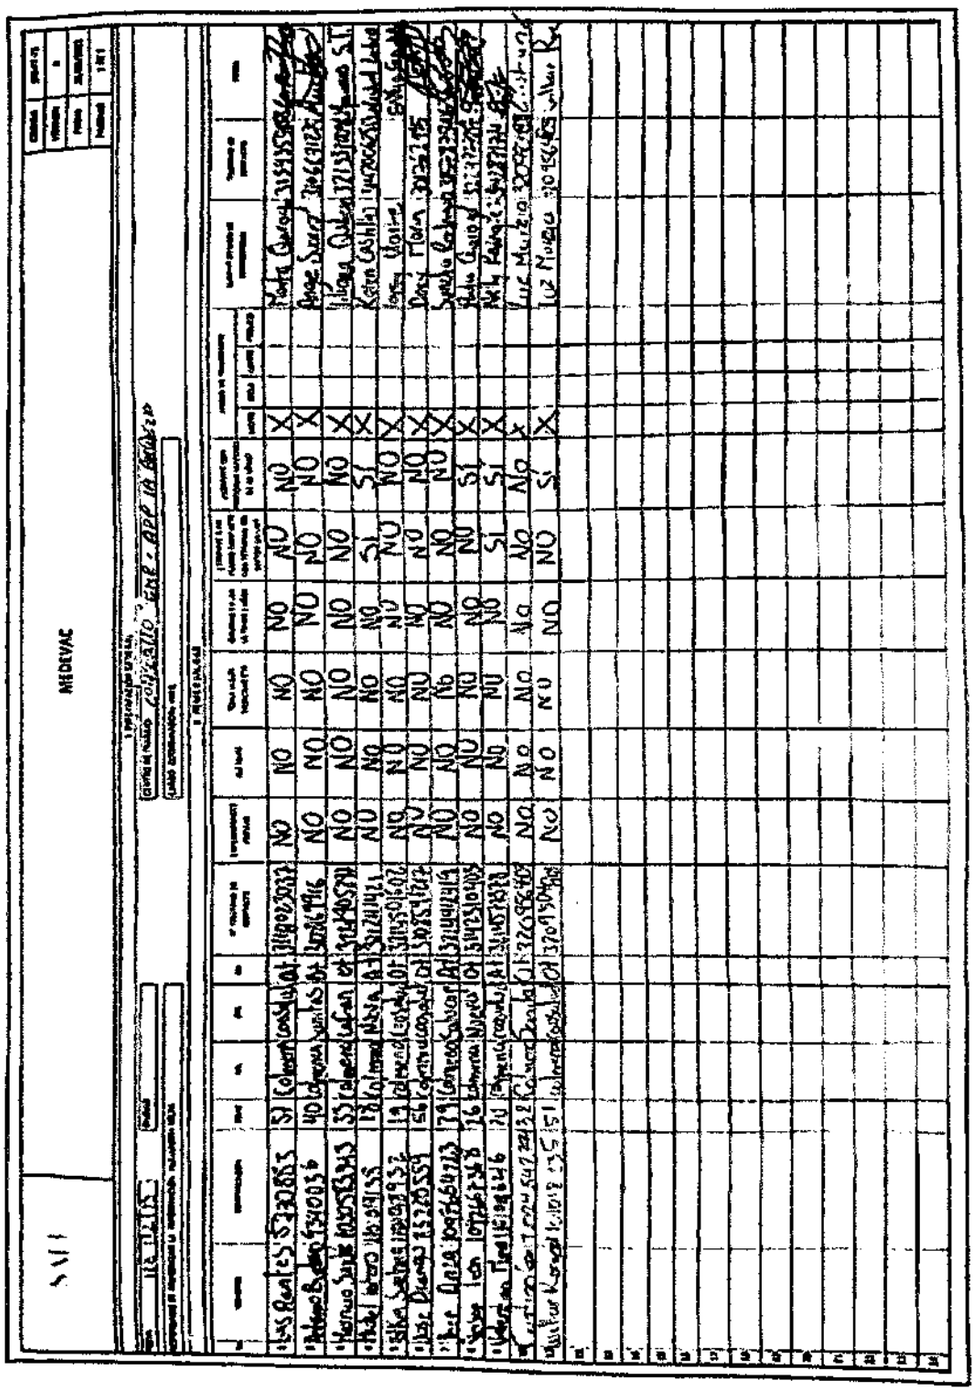

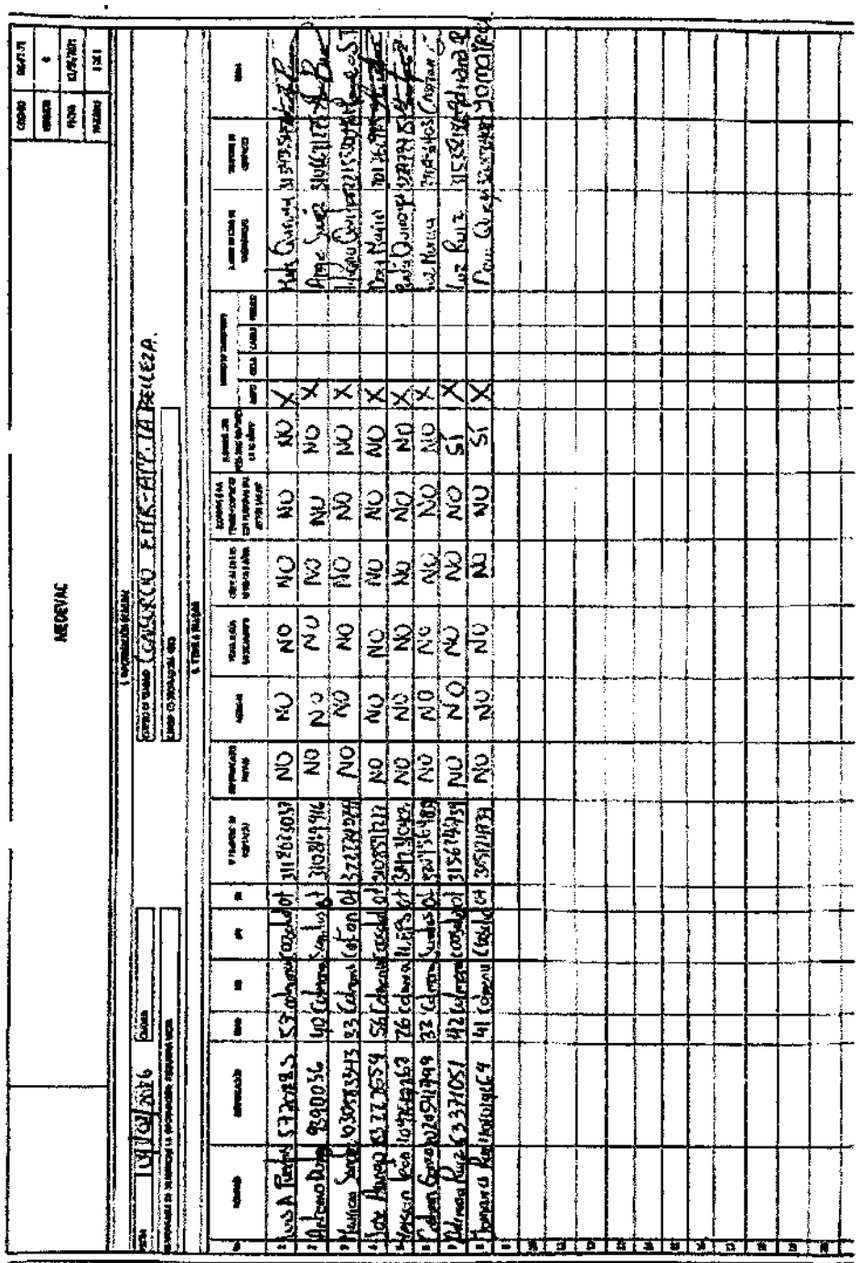

AMBIENTSALUD S.A.S

AMBIENTSALUD SAS
Resolución de Licencia SST 07542 del 22 de abril de 2022
NIT. 901379431-7
Calle 9 No. 8-25, Piso 1 - Cel. 3203173766 - 3118596855
E-mail. ambientsalud@gmail.com; citasambientsalud@gmail.com
www.ambientsalud.com



N° 25.882

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
17 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BARBOSA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S

CIIU (Actividad Económica) del empleador:
SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
MICHAEL ANDRES ROJAS GALINDO	MASCULINO	28 AÑOS 5 MESES 11 DIAS	CC (Tipo)	1095834081 (Número)

Cargo
IGENIERO RESIDENTE DE OBRA

EPS	AFP	ARL
NUEVA EPS	COLPENSIONES	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	VISIOMETRÍA AMB ✓
AUDIOMETRÍA AMB ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SEGUIR TODAS LA POLITICAS Y NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Fernando Abril Médico Especialista G.S.O. 15933/0309/2016

Nombre: CC: 91018823 - WILSON FERNANDO ABRIL

R. M.: 15933 L.S.O.: 0309

Código de Seguridad V1222B1H25882

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MICHAEL ANDRES ROJAS GALINDO

CC: 1095834081

Colmena Seguros

HISTÓRICO DE NOVEDADES DEL TRABAJADOR

CONTRATO	1193503
RAZÓN SOCIAL	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NI 901385053

Información del trabajador

Identificación	CC 1095834081	Nombre	ROJAS GALINDO MICHAEL ANDRES
Código Sede	752580	Nombre Sede	PRINCIPAL
Código Centro de trabajo	752581	Nombre Centro de Trabajo	operativos
Cargo	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Salario	$2.400.000
Eps	Nueva EPS	Afp	SIN AFP

Listado de novedades

Radicado	Fecha	Tipo de novedad	Dato anterior	Dato actual	
104616467	18/12/2025	INGRESO DE TRABAJADOR			
105642484	24/02/2026	CAMBIO SALARIO	2100000	2400000	

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de Colmena Seguros, el día 16/03/2026 9:07:00. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 07/01/2026, el empleador SAFI CONSTRUCCIONES SAS identificado con NIT número 901385053 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9742960	07/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1095834081	MICHAELANDRES ROJAS GALINDO	2100000		2025-12-18

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 7 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Comfenalco SANTANDER
Se preocupa por ti.
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 23/12/2025 04:21:36 PM
Fecha de radicación : 23/12/2025 04:21:00 PM
TD_202512231621_1095834081

DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación	Razón social
NIT 901385053 0	SAFI CONSTRUCCIONES

Sucursal	Agencia
PRI - SAFI CONSTRUCCIONES	PRINCIPAL

DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
CC 1.095.834.081	2015/07/08	SANTANDER	FLORIDABLANCA	1997/07/06

Nombres y apellidos			
MICHAEL	ANDRES	ROJAS	GALINDO

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	SOLTERO(A)	AV 59A 134 67	EL CARMEN

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
FLORIDABLANCA	SANTANDER	URBANA		3183219212

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
MICHAELROJAS606@GMAIL.COM	TÉCNICO/TÉCNOLÓGICO

INFORMACIÓN LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2025/12/18	INGENIEROS CIVILES

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	VARIABLE	2,100,000	0	2,100,000

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
SUCRE	SANTANDER	RURAL

DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos

Sexo	Municipio y departamento de residencia	Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cuál Caja de Compensación Familiar?

GRUPO FAMILIAR

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo M, F o NB	Parentesco	Estudiante Solo si aplica	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributaria
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijastro(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera infancia
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida González Valencia No. 52-69 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6577000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, aun conociendo que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS; y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

FO-SAFI-1-003 Versión: 02 V38 Fecha de revisión: 24/04/2024 Subproceso: Afiliación y Recaudo

SAFI CONSTRUCCIONES
Firma del empleador
Número documento empleador 901385053

MICHAEL ANDRES ROJAS GALINDO
Firma del trabajador
Número documento trabajador 1.095.834.081

AMBIENTSALUD S.A.S

AMBIENTSALUD SAS
Resolución de Licencia SST 07542 del 22 de abril de 2022
NIT. 901379431-7
Calle 9 No. 8-25, Piso 1 - Cel. 3203173766 - 3118596855
E-mail. ambientsalud@gmail.com; citasambientsalud@gmail.com
www.ambientsalud.com



N° 25.667

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
01 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BARBOSA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S

CIIU (Actividad Económica) del empleador:
SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadania, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
PEÑA QUIROGA JUAN CAMILO	MASCULINO	20 AÑOS 0 MESES 19 DÍAS	CC (Tipo)	1101018705 (Número)

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

EPS	AFP	ARL
COOSALUD	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	VISIOMETRÍA AMB ✓
AUDIOMETRÍA AMB ✓	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SEGUIR TODAS LA POLITICAS Y NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA

onsentimiento Informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Fernando Abril
Médico Especialista G.S.O.
15933/0309/2016

Nombre: CC: 91018823 - WILSON FERNANDO ABRIL

R. M.: 15933 L.S.O.: 0309

Código de Seguridad
C1222I1025667

Aspirante o Trabajador

Firma: CAMILO

Nombre: PEÑA QUIROGA JUAN CAMILO

CC: 1101018705

Colmena Seguros

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1193503
RAZON SOCIAL	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACION:	NI 901385053

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
104391265	2025-12-2	CC 1101018705
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
PEÑA QUIROGA	JUAN CAMILO	2005-11-12
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
VDA LA GRANJA	VDA LA GRANJA	Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
SUCRE - Santander	notiene@gmail.com	6666666
Celular	**Sexo**	
3133325601	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$1,423,500.00	COOSALUD E.S.S.
AFP	**Centro de Trabajo**	
NO SUMINISTRADO	operativos	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2025-12-2	NO DEFINIDA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados Colmena Seguros ® - 2009

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD
En Clave de Bienestar

No. De Radicación	Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRAMITE (Para diligenciar cada casilla marque con una X dentro del cuadro de color rojo)

2. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliado	3. Régimen
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒	B. Cotizante ☐ C. Pensionado ☐ D. Desplaz. ☐	A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	

II. AFILIACIÓN

III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

9. Apellidos y nombres			
PEÑA (Primer apellido)	QUIROGA (Segundo apellido)	JUAN (Primer nombre)	CAMILO (Segundo nombre)

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1101018705	Femenino ☐ Masculino ☒	12 11 2005

IV. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
	Tipo ☐ Condición ☐		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
COLMENA	COLPENSIONES	1423.500

18. Residencia			
VEREDA LA GRANJA (Dirección)		3133325601 (Teléfono fijo)	(Correo electrónico)
SUCRE (Municipio de Vivienda)	Zona: Urbana ☐ Rural ☒	VDA LA GRANJA (Localidad / Comuna)	SIDER (Departamento)

V. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante

20. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

21. Tipo de documento de identidad	22. Número de identificación del cónyuge	23. Sexo	24. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

25. Apellidos y nombres

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	26. Tipo de documento de identidad	27. Número de documento de identidad	28. Sexo		29. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	30. Parentesco	31. Etnia	32. Discapacidad			33. Condición	
			Tipo				
			I	M	AI	T	P
01							
02							
03							
04							
05							

	34. Datos de residencia				35. Nacionalidad
	Municipio/Localidad	Zona: Urbana	Zona: Rural	Dirección	Teléfono fijo/Celular	
01						
02						
03						
04						
05						

36. Nombre de la Administradora Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (si se conoce)
C	
P	
01	
02	

VI. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

37. Razón social o nombre	38. Tipo de documento de identificación	39. Número de documento de identificación	40. Código de la actividad económica - CIIU
SAFI CONSTRUCCIONES SAS	NIT	901385053	

41. Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CALLE 34 10-29	3213939913	PIMANGA	SIDER

Powered by CamScanner

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	Sexo Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento	42. Fecha 02122025

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar a pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no interrupción del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

JUAN C. PEÑA Q.

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institución Educativa o de Chip

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
  Cantidad: [ ] Total: [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción los padres o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

CARGO - AYUDANTE DE CONSTRUCCION

Recuerda que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Powered by CamScanner

Comfenalco SANTANDER
Se preocupa por ti.
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 12/12/2025 04:22:29 PM
Fecha de radicación : 12/12/2025 04:22:00 PM
ITD_202512121622_1101018705

DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación	Razón social
NIT 901385053 0	SAFI CONSTRUCCIONES

Sucursal	Agencia
PRI - SAFI CONSTRUCCIONES	PRINCIPAL

DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
CC 1.101.018.705	2024/01/17	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	2005/11/12

Nombres y apellidos			
JUAN	CAMILO	PEÑA	QUIROGA

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	SOLTERO(A)	VRD LA GRANJA	GRANJAS

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
SUCRE	SANTANDER	RURAL		3133325601

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
AFILIACIONESSAFI@GMAIL.COM	MEDÍA ADULTOS (10° A 11°)

DATOS DE LA VINCULACIÓN LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2025/12/02	OBREROS Y PEONES DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	VARIABLE	01,423,500	0	1,423,500

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
SUCRE	SANTANDER	RURAL

DATOS DEL PENSIONADO O CONDICIÓN ESPECIAL

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos

Sexo	Municipio y departamento de residencia	Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cuál Caja de Compensación Familiar?

GRUPO FAMILIAR

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo M, F o NB	Parentesco	Estudiante Solo si aplica	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributaria
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijastro(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera infancia
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida González Valencia No. 52-69 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6577000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, aun conociendo que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS; y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

SAFI CONSTRUCCIONES
Firma del empleador
Número documento empleador 901385053

JUAN CAMILO PEÑA QUIROGA
Firma del trabajador
Número documento trabajador 1.101.018.705

AMBIENTSALUD S.A.S

AMBIENTSALUD SAS
Resolución de Licencia SST 07542 del 22 de abril de 2022
NIT. 901379431-7
Calle 9 No. 8-25, Piso 1 - Cel. 3203173766 - 3118596855
E-mail. ambientsalud@gmail.com; citasambientsalud@gmail.com
www.ambientsalud.com



N° 26,524

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
16 DÍA	01 MES	2026 AÑO	BARBOSA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S

CIIU (Actividad Económica) del empleador: **SIN REGISTRAR**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
RUIZ QUIROGA LENIS ADRIANA	FEMENINO	43 AÑOS 3 MESES 8 DÍAS	CC (Tipo)	63371051 (Número)

Cargo: **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**

EPS	AFP	ARL
COOSALUD	PROTECCION	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO*

N/A | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	VISIOMETRÍA AMB ✓
AUDIOMETRÍA AMB ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL : OCASIONAL	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SEGUIR TODAS LA POLITICAS Y NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Fernando Abril — Médico Especialista G.S.O. 15933/0309/2016

Nombre: CC: 91018823 - WILSON FERNANDO ABRIL

R. M.: 15933 L.S.O.: 0309

Código de Seguridad: M122S1Y26524

Aspirante o Trabajador

Firma: Adriana Ruiz

Nombre: RUIZ QUIROGA LENIS ADRIANA

CC: 63371051

Colmena Seguros

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1193503
RAZON SOCIAL	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACION:	NI 901385053

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
104981767	2026-1-19	CC 63371051
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
RUIZ QUIROGA	LENIS ADRIANA	1982-10-8
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
VDA OJO DE AGUA	VDA OJO DE AGUA	Rural
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
SUCRE - Santander	LENIS.ADR.63@HOTMAIL.COM	6666666
Celular	**Sexo**	
3156246734	Femenino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$1,750,905.00	COOSALUD E.S.S.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Proteccion	operativos	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2026-1-19	NO DEFINIDA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD E.S.S. Entidad Cooperativa

No. De Radicado

Fecha de Radicación

1. DATOS DEL TRÁMITE

2. Tipo de Afiliado: A. Afiliado X B. Solicitud de Novedades

3. Tipo de Solicitud: A. Cotizante X B. Cónyuge o compañero(a) permanente C. Padre o madre

4. Parentesco: A. Titular X B. Adicional

5. Tipo de Afiliado: A. Cotizante X B. Beneficiario C. Adicional

6. Ocupación

7. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

8. Primer Apellido	9. Segundo Apellido	10. Primer Nombre	11. Segundo Nombre
RUIZ	QUIROGA	LENIS	ADRIANA

12. Tipo de Documento de Identidad	13. Número de Identificación	14. Sexo	15. Fecha de Nacimiento
CC	63'371.051	X	08 10 1982

16. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos opcionales

17. Edad	18. Ocupación	19. Nivel Educativo	20. Grupo Poblacional
	Tipo: Descripción:		

21. Departamento de Nacimiento	22. País de Nacimiento	23. Fecha de Ingreso al País
COMEMA	PROTECCION	1750.905

24. Dirección de Residencia	25. Teléfono	26. Departamento de Residencia
VEREDA OJO DE AGUA	3156246734	

27. Municipio de Residencia	28. Zona	29. Área de Residencia
SUCRE	Urbana ☐ Rural X	SANTANDER

30. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

31. Primer Apellido	32. Segundo Apellido	33. Primer Nombre	34. Segundo Nombre

35. Tipo de Documento de Identidad	36. Número de Identificación	37. Sexo	38. Fecha de Nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios que hacen parte del núcleo familiar del cotizante

	39. Primer Apellido	40. Segundo Apellido	41. Primer Nombre	42. Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	43. Tipo de Documento de Identidad	44. Número de Identificación	45. Sexo	46. Fecha de Nacimiento
			Femenino / Masculino	
01				
02				
03				
04				
05				

Datos complementarios

	47. Parentesco	48. Ocupación	49. Discapacidad: Tipo			50. Edad
01						
02						
03						
04						
05						

	51. Nombre de Otro Régimen	52. Régimen: Régimen		53. Número de Afiliación	54. Fecha de Ingreso al Régimen	55. Fecha de Retiro del Régimen
01						
02						
03						
04						
05						

	56. Nombre de la Entidad Promotora de Salud (EPS)
01	
02	
03	
04	

57. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y ESTOS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

58. Razón Social	59. Tipo de Identificación	60. Número de Identificación	61. Dígito de Verificación
SAFI CONSTRUCCIONES	NIT	901 385 053	

62. Dirección	63. Teléfono	64. Departamento	65. Municipio	66. Zona
CII 34 # 10-29 OFI 201	3108853248	B/MANGA	SUCRE	

Powered by CamScanner

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Ampliación y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad administradora del régimen del subsidio familiar
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad administradora del régimen subsidiado
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Novedad Ordinaria [ ] C. O. forzosa Adjudicación
- [ ] 15. Reporte de Fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del Trámite de Reconocimiento del cesante.
- [ ] 17. Reporte de la cesación de Prestaciones pagadas.
- [ ] 18. Reporte de la cesación de subsidios.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos del cotizante

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento (día mes año)	Número de celular
		Femenino [ ] Masculino [ ]		19012026

42. EPS anterior	44. Motivo de retiro	45. Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentra afiliado actualmente
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de independencia y compromiso de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la calidad de beneficiario.
- [ ] 49. Declaración de no interrupción del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica con terceros y vecindad de familiares de sus cotizantes o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados y/o a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico de notificación como medio de prueba.

VIII. FIRMAS

ADRIANA RUIZ

54. El cotizante, cabeza de familia o pensionado

55. El representante legal o persona responsable de la afiliación de entes territoriales o de CTeI

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
Cantidad [ ] Total [ ]

- [ ] 57. Copia del certificado de los ascensos permanentes emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil, sentencia judicial o escritura pública, acta de conciliación o auto judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia del registro civil, sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos o escritura pública legalizada de conciliación o auto judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del acta de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia del registro civil o del acta administrativa de custodia.
- [ ] 62. Documento emitido por el Juez de paz o personas o entidades delegadas mediante resolución del Defensor de Familia, donde se declara la unión marital de hecho y/o la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
- [ ] 63. Copia de la Autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de afiliación a la entidad administradora para el pago de licencias de maternidad.
- [ ] 65. Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la empresa, con la cual se firma el convenio de pago de aportes y/o recaudo.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Nombre del Ente Territorial
Código de la Entidad

67. Datos del Cotizante
Departamento [ ] Distrito [ ] Municipio [ ]

68. Fecha de radicación

69. Fecha de validación

70. Observaciones

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ] Número del documento de identidad [ ]

71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES

CARGO = AYUDANTE CONSTRUCCION

Powered by CamScanner

Comfenalco SANTANDER
Se preocupa por ti.
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 11/02/2026 04:22:28 PM
Fecha de radicación : 11/02/2026 04:22:00 PM
TD_202602111622_63371051

DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación	Razón social
NIT 901385053 0	SAFI CONSTRUCCIONES

Sucursal	Agencia
PRI - SAFI CONSTRUCCIONES	PRINCIPAL

DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
CC 63.371.051	2001/04/24	SANTANDER	LA BELLEZA	1982/10/08

Nombres y apellidos			
LENIS	ADRIANA	RUIZ	QUIROGA

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	SOLTERO(A)	VRD OJO DE AGUA FINCA LA CASCADA	NO CODIFICADO

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
SUCRE	SANTANDER	RURAL		3156246734

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
LENIS.ADR.63@HOTMAIL.COM	MEDÍA ADULTOS (10° A 11°)

DATOS DEL CONTRATO DEL TRABAJADOR

Fecha de inicio	Cargo actual
2026/01/19	OBREROS Y PEONES DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	VARIABLE	01,750,905	0	1,750,905

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
SUCRE	SANTANDER	RURAL

DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos

Sexo	Municipio y departamento de residencia	Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cuál Caja de Compensación Familiar?

GRUPO FAMILIAR

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo M, F o NB	Parentesco	Estudiante Solo si aplica	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributaria
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijastro(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera infancia
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida González Valencia No. 52-69 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6577000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, aun conociendo que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS; y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

SAFI CONSTRUCCIONES
Firma del empleador
Número documento empleador 901385053

LENIS ADRIANA RUIZ QUIROGA
Firma del trabajador
Número documento trabajador 63.371.051

AMBIENTSALUD S.A.S

AMBIENTSALUD SAS
Resolución de Licencia SST 07542 del 22 de abril de 2022
NIT. 901379431-7
Calle 9 No. 8-25, Piso 1 - Cel. 3203173766 - 3118596855
E-mail. ambientsalud@gmail.com; citasambientsalud@gmail.com
www.ambientsalud.com



N° 26.521

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
16 DÍA	01 MES	2026 AÑO	BARBOSA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S

CIIU (Actividad Económica) del empleador: SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadania, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
RUIZ QUIROGA NELLY YOMARA	FEMENINO	34 AÑOS 2 MESES 1 DÍAS	CC (Tipo)	1101019669 (Número)

Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCION

EPS	AFP	ARL
SANIDAD MILITAR	PORVENIR	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO*

N/A | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	VISIOMETRÍA AMB ✓
AUDIOMETRÍA AMB ✓	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL : PERMANENTES	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL : PAUSAS ACTIVAS CADA 2 HORAS	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SEGUIR TODAS LA POLITICAS Y NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Fernando Abril — Médico Especialista G.S.O. 15933/0309/2016

Nombre: CC: 91018823 - WILSON FERNANDO ABRIL

R. M.: 15933 L.S.O.: 0309

Código de Seguridad K1222O1W26521

Aspirante o Trabajador

Firma: Yomaira R

Nombre: RUIZ QUIROGA NELLY YOMARA

CC: 1101019669

Colmena Seguros

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1193503
RAZON SOCIAL	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACION:	NI 901385053

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
104981728	2026-1-19	CC 1101019669
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
RUIZ QUIROGA	NELLY YOMAIRA	1991-11-15
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
VDA LA PRADERA	LA PRADERA	Rural
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
SUCRE - Santander	YOMISRUIZ1719@GMAIL.COM	6666666
Celular	**Sexo**	
3143029843	Femenino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$1,750,905.00	Nueva EPS
AFP	**Centro de Trabajo**	
Porvenir	operativos	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2026-1-19	NO DEFINIDA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados Colmena Seguros ® - 2009

Comfenalco SANTANDER
Se preocupa por ti.
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 11/02/2026 04:27:10 PM
Fecha de radicación : 11/02/2026 04:27:00 PM
ITD_202602111627_1101019669

1. DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación	Razón social
NIT 901385053 0	SAFI CONSTRUCCIONES

Sucursal	Agencia
PRI - SAFI CONSTRUCCIONES	PRINCIPAL

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
CC 1.101.019.669	2010/01/27	SANTANDER	SUCRE	1991/11/15

Nombres y apellidos			
NELLY	YOMAIRA	RUIZ	QUIROGA

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
FEMENINO	SOLTERO(A)	VRD LA PRADERA FINCA LAS TRUCHAS	NO CODIFICADO

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
SUCRE	SANTANDER	RURAL		3143029843

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
YOMISRUIZ1719@GMAIL.COM	MEDÍA ADULTOS (10° A 11°)

3. INFORMACIÓN LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2026/01/19	OBREROS Y PEONES DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	VARIABLE	1,750,905	0	1,750,905

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
SUCRE	SANTANDER	RURAL

4. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos

Sexo	Municipio y departamento de residencia	Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cuál Caja de Compensación Familiar?

5. DATOS DE LOS HIJOS Y OTROS

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo M, F o NB	Parentesco	Estudiante Solo si aplica	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributaria
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijastro(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera infancia
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida González Valencia No. 52-69 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6577000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, aun conociendo que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS; y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

SAFI CONSTRUCCIONES
Firma del empleador
Número documento empleador 901385053

NELLY YOMAIRA RUIZ QUIROGA
Firma del trabajador
Número documento trabajador 1.101.019.669

AMBIENTSALUD S.A.S

AMBIENTSALUD SAS
Resolución de Licencia SST 07542 del 22 de abril de 2022
NIT. 901379431-7
Calle 9 No. 8-25, Piso 1 - Cel. 3203173766 - 3118596855
E-mail. ambientsalud@gmail.com; citasambientsalud@gmail.com
www.ambientsalud.com



N° 26.759

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
26 DÍA	01 MES	2026 AÑO	BARBOSA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadania, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
WILLIAN ROMERO ARIZA	MASCULINO	38 AÑOS 10 MESES 12 DÍAS	CC (Tipo)	1101018635 (Número)

Cargo

YUDANTE DE CONSTRUCCION

EPS	AFP	ARL
COOSALUD	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓	VISIOMETRÍA AMB	✓
AUDIOMETRÍA AMB	✓		

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Fernando Abril Médico Especialista G.S.O. 15933/0309/2016

Nombre: CC: 91018823 - WILSON FERNANDO ABRIL

R. M.: 15933 L.S.O.: 0309

Código de Seguridad R1222X1D26759

Aspirante o Trabajador

Firma: William Romero A

Nombre: WILLIAN ROMERO ARIZA

CC: 1101018635

Colmena Seguros

SOPORTE DE NOVEDADES

CONTRATO:	1193503
RAZON SOCIAL	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACION:	NI 901385053

RETIRO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
105109822	2025-12-11	CC 1101018635
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
ROMERO ARIZA	WILLIAN	1987-3-16
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
VDA CAMPO HERMOSO	VDA CAMPO HERMOSO	Rural
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
SUCRE - Santander	notiene@gmail.com	6666666
Celular	**Sexo**	
3209504803	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$1,423,500.00	COOSALUD E.S.S.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Porvenir	operativos	
Clase de riesgo	**Tasa de riesgo**	**Grado**
5	6.96	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Fecha final de vigencia**	**Tipo jornada**
2025-12-18	2025-12-18	NO DEFINIDA

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados Colmena Seguros ® - 2009

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

ROMERO	ARIZA	WILLIAN	
CC	1101018635		16031987

COLMENA	PORVENIR	1750.905
VEREDA ALTAMIRA	3209504803	
SUCRE	X	SIDER

SAFI CONSTRUCCIONES SAS	NIT	901385053	
CL 34 # 10-29	3108853248	B/manga	SIDER

Powered by CamScanner

6. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación por la Institución prestadora de salud (IPS)
  Código [ ]
- [ ] 6. Retiro por la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios de afiliados cotizantes
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios de afiliados cotizantes
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de vínculo con empleador o con cotizante
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de vínculo con empleador o con cotizante por cualquier causa.
- [ ] 11. Traslado de una unidad familiar cotizante a otra EPS
- [ ] 12. Retiro de cotizante que tiene afiliados beneficiarios
- [ ] 13. Movilidad
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado
  - [ ] A. Viene de otra EPS
  - [ ] B. Va para otra EPS
- [ ] 15. Reactivación
- [ ] 16. Reporte de Terminación anticipada de contrato
- [ ] 17. Reporte de la Unidad de Pensiones Locales
- [ ] 18. Reporte de novedades de traslados

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ] Número del documento de identidad [ ] Sexo [ ] Fecha de nacimiento (AAAA MM DD) 27012026

42. Lugar de atención [ ] 43. Número de orden [ ] 44. Consecutivo [ ] 45. Código del diagnóstico principal [ ]

Cuota [ ]

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios menores de edad
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de aportar al Régimen Contributivo
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden el traslado oportuno de la información
- [ ] 49. Declaración de la información del cotizante, cabeza de familia beneficiaria de programas sociales
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga de otras EPS o entidades públicas o privadas la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones
- [ ] 51. Autorización para que la EPS consulte la información que de forma directa o indirecta se genere en el Sistema de Información de la Protección Social y demás sistemas de información de entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos suministrados del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico suministrado

VIII. FIRMAS

William Romero Ariza

52. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. Firma del funcionario de la entidad responsable de la afiliación

IX. ANEXOS

57. Anexo los siguientes documentos: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
Cantidad [ ] Total [ ]

- [ ] 58. Copia del acta de inicio de vínculo laboral o relación legal y reglamentaria
- [ ] 59. Copia de la(s) planilla(s) de aportes correspondiente(s) a los dos (2) meses anteriores a la novedad
- [ ] 60. Copia del documento que acredite la terminación de la relación laboral o legal y reglamentaria
- [ ] 61. Copia de la(s) planilla(s) de aportes correspondiente(s) a los dos (2) meses anteriores a la novedad
- [ ] 62. Copia del documento de identidad del cotizante
- [ ] 63. Copia de la(s) planilla(s) de aportes correspondiente(s) a los dos (2) meses anteriores a la novedad
- [ ] 64. Copia de la Declaración emitida por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 65. Certificado de defunción emitido por la entidad autorizada para tal fin
- [ ] 66. Copia del documento que acredite la calidad de cabeza de familia o beneficiario de programas sociales

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

67. Identificación de la Entidad Territorial
Código de Habilitación o Código presupuestario

68. Datos del Servicio
Número de Nota [ ] Sección [ ] Visita [ ]

69. Fecha de Radicación [ ] 69. Fecha de Validación [ ]

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ] Número del documento de identidad [ ] 71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES

CARGO = AYUDANTE DE CONSTRUCCION

Nota: Este formulario no tiene costo para el usuario y debe ser diligenciado en forma clara y completa. Cualquier enmendadura o tachón invalida el documento.

Powered by CamScanner

Comfenalco SANTANDER
Se preocupa por ti.
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 18/02/2026 05:09:09 PM
Fecha de radicación : 18/02/2026 05:09:00 PM
ITD_202602181709_1101018635

EMPRESA DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Razón social
NIT 901385053 0	SAFI CONSTRUCCIONES

Sucursal	Agencia
PRI - SAFI CONSTRUCCIONES	PRINCIPAL

DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
CC 1.101.018.635	2005/10/07	SANTANDER	SUCRE	1987/03/16

Nombres y apellidos		
WILLIAN	ROMERO	ARIZA

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	SOLTERO(A)	VRD ALTAMIRA FINCA GUAYABAL	NO CODIFICADO

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
SUCRE	SANTANDER	RURAL		3209504803

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
AFILIACIONESSAFI@GMAIL.COM	MEDÍA ADULTOS (10° A 11°)

INFORMACIÓN LABORAL DEL TRABAJADOR

Fecha de inicio	Cargo actual
2026/01/27	OBREROS Y PEONES DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	VARIABLE	1,750,905		1,750,905

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
SUCRE	SANTANDER	RURAL

DATOS DEL PENSIONADO (SOLO APLICA PARA PENSIONADOS)

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos

Sexo	Municipio y departamento de residencia	Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cuál Caja de Compensación Familiar?

GRUPO FAMILIAR

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo M, F o NB	Parentesco	Estudiante Solo si aplica	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributario
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijastro(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera infancia
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida González Valencia No. 52-69 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6577000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, aun conociendo que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS; y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

SAFI CONSTRUCCIONES
Firma del empleador
Número documento empleador 901385053

WILLIAN ROMERO ARIZA
Firma del trabajador
Número documento trabajador 1.101.018.635

AMBIENTSALUD S.A.S

AMBIENTSALUD SAS
Resolución de Licencia SST 07542 del 22 de abril de 2022
NIT. 901379431-7
Calle 9 No. 8-25, Piso 1 - Cel. 3203173766 - 3118596855
E-mail. ambientsalud@gmail.com; citasambientsalud@gmail.com
www.ambientsalud.com



N° 26.786

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
27 DÍA	01 MES	2026 AÑO	BARBOSA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadania, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
DAYRON DAVID SANCHEZ QUIROGA	MASCULINO	20 AÑOS 10 MESES 17 DÍAS	CC (Tipo)	1101018486 (Número)

Cargo

AYUDANTE DE CONSTRUCCION

EPS	AFP	ARL
NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓	VISIOMETRÍA AMB	✓
AUDIOMETRÍA AMB	✓		

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL : PAUSAS ACTIVAS CADA 2 HORAS	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SEGUIR TODAS LA POLITICAS Y NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Fernando Abril Médico Especialista G.S.O. 15933/0309/2016

Nombre: CC: 91018823 - WILSON FERNANDO ABRIL

R. M.: 15933 L.S.O.: 0309

Código de Seguridad W1222C1126785

Aspirante o Trabajador

Firma: Dayron

Nombre: DAYRON DAVID SANCHEZ QUIROGA

CC: 1101018486

Colmena Seguros

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1193503
RAZON SOCIAL	SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACION:	NI 901385053

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
105135219	2026-1-28	CC 1101018486
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
SANCHEZ QUIROGA	DAYRON DAVID	2005-3-11
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
VDA ORGANOS	VDA ORGANOS	Rural
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
SUCRE - Santander	notiene@gmail.com	6666666
Celular	**Sexo**	
3114710642	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$1,750,905.00	COOSALUD E.S.S.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Porvenir	operativos	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2026-1-28	NO DEFINIDA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** © - 2009

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

SANCHEZ	QUIROGA	DAYRON	DAVID
CC	1101018486		11032005

COMFENALCO	PORVENIR	1750905
VEREDA ORGANOS	3114770642	
SUCRE		SINCELEJO

SAFI CONSTRUCCIONES SAS	NIT	901385053	
CL 34 #10-29 OFI 201	3108853248	B/MANGA	SINCELEJO

Powered by CamScanner

8. REPORTE DE NOVEDADES

28012025

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

DAVID SANCHEZ

IX. ANEXOS

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

OBSERVACIONES

CARGO - AYUDANTE DE CONSTRUCCION

Powered by CamScanner

Comfenalco SANTANDER
Se preocupa por ti.
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 09/02/2026 03:44:57 PM
Fecha de radicación : 09/02/2026 03:44:00 PM
ITD_202602091544_1101018486

1. DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación	Razón social
NIT 901385053 0	SAFI CONSTRUCCIONES

Sucursal	Agencia
PRI - SAFI CONSTRUCCIONES	PRINCIPAL

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento
CC 1.101.018.486	2023/04/12	SANTANDER SUCRE	2005/03/11

Nombres y apellidos			
DAYRON	DAVID	SANCHEZ	QUIROGA

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	SOLTERO(A)	VRD ORGANOS CASA 15	NO CODIFICADO

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
SUCRE	SANTANDER	RURAL		3114710642

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
AFILIACIONESSAFI@GMAIL.COM	MEDÍA ADULTOS (10° A 11°)

3. INFORMACIÓN LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2026/01/28	OBREROS Y PEONES DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	VARIABLE	01,750,000	0	1,750,000

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
SUCRE	SANTANDER	RURAL

4. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos

Sexo	Municipio y departamento de residencia	Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cuál Caja de Compensación Familiar?

5. DATOS DE LOS HIJOS Y OTROS

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo M, F o NB	Parentesco	Estudiante Solo si aplica	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad

Medio de pago	¿Cuenta con certificado bancario?	Tipo de cuenta	Número de cuenta

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributaria
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijastro(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera infancia
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida González Valencia No. 52-69 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6577000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, aun conociendo que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS; y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, veridicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

SAFI CONSTRUCCIONES
Firma del empleador
Número documento empleador 901385053

DAYRON DAVID SANCHEZ QUIROGA
Firma del trabajador
Número documento trabajador 1.101.018.486

Informe Seguimiento Plan de Manejo de Tránsito.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO No. 02

PERIODO:

DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y DEL 29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.7912853 DEL 30 DE MAYO DEL 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA
NIT. 901.949.762-6

ELABORO:
OSCAR DAVID VERA ROJAS
CARGO: INGENIERO CIVIL
MATRICULA PROFESIONAL: 68202-252870 STD

SUCRE - SANTANDER

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
3. AREA DE INTERVENCION 5
4. INFORMACION DEL CONTRATO 6
5. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PLAN DE TRANSITO 7
6. DIVULGACION E INFORMACION DE LOS CIERRES DE VIAS 8
   6.1 RESOLUCION CIERRE DE VIA 10
7. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 14
8. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 20
9. CONCLUSIONES 22

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. LOCALIZACIÓN GENERAL TRAMO A INTERVENIR. 5
Ilustración 2. LOCALIZACIÓN TRAMOS 6
Ilustración 3. INFORMACION CIERRES VIALES 9
Ilustración 4. RESOLUCION CIERRE DE VIA 13
Ilustración 5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO 14

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre del 2025 al 30 de diciembre del 2025 y del 29 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026, durante el desarrollo de actividades del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", enfocado en la gestión realizada en materia cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito por el contratista CONSORCIO EMR-APP BELLEZA.

Actualmente, el corredor presentaba en algunos tramos un ancho de vía que no alcanza los 5 m, lo que ocasiona que esporádicamente ocurrieran congestiones por vehículos pesados y de transporte. De igual manera, la vía presenta características topográficas diferentes, predominando el terreno montañoso y escarpado, impidiendo la facilidad del acceso entre los mismos, limitando el transporte y la interrupción ocasional. El ingreso económico de la población depende principalmente de la agricultura, la ganadería, fábrica de bocadillos, comercio, café, caña de azúcar, y en menor medida industria, servicios y comercio.

Dado que la obra implicará diversas etapas que afectarán el flujo vehicular, es fundamental contar con una planificación detallada que permita mitigar los inconvenientes y garantizar la seguridad de los peatones, conductores y trabajadores en el área de influencia. El plan de manejo de tránsito aquí presentado se enfoca en identificar los puntos críticos, diseñar desvíos temporales, proponer señalización adecuada, y establecer controles para reducir al mínimo las interrupciones en el tráfico.

A través de este documento, se describen las características de la zona de intervención, el análisis de la situación actual del tránsito, y las estrategias de mitigación que fueron implementadas en cada fase del proyecto. Con estas medidas, se garantizaron la disminución del impacto de la obra en el flujo vehicular y en la calidad de vida de los usuarios de esta importante infraestructura.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Garantizar a circulación segura, eficiente y continua de vehículos y peatones en la vía terciaria durante las actividades de construcción o mantenimiento, minimizando el impacto negativo en las comunidades locales, el medio ambiente y el desarrollo de las actividades económicas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mantener la seguridad vial: Implementar medidas de seguridad en las zonas de trabajo y áreas circundantes para prevenir accidentes de tránsito, tanto para los trabajadores como para los usuarios de la vía.

- Minimizar interrupciones del tráfico: Desarrollar estrategias para reducir al mínimo los cierres temporales de la vía o desvíos, asegurando que el tránsito fluya de manera eficiente y con el menor impacto posible sobre los tiempos de viaje.

- Señalización y comunicación efectiva: Colocar señalización adecuada y garantizar la comunicación clara y oportuna a los usuarios de la vía sobre las restricciones de tránsito, desvíos y tiempos estimados de interrupción.

- Gestión de flujos vehiculares: Regular el tránsito vehicular en los tramos en construcción mediante señalización temporal, controladores de tráfico o semáforos temporales, para evitar congestiones o conflictos entre vehículos.

- Coordinar con las comunidades locales: Establecer canales de comunicación con las comunidades afectadas por la obra para informar sobre el avance de los trabajos y las posibles restricciones, minimizando el impacto social.

3. AREA DE INTERVENCION

El corredor vial objeto de este proyecto conecta los municipios de Sucre y La Belleza en el departamento de Santander, abarcando el sector Altamira. Este tramo estratégico no solo beneficia directamente a los municipios mencionados, sino que también mejora la conectividad de Puente Nacional, Jesús María, Bolívar, Florián y Albania, facilitando el acceso y la movilidad en esta región. La intervención prevista se extiende a lo largo del corredor vial, optimizando la infraestructura y fortaleciendo el desarrollo vial del área.



Ilustración 1. LOCALIZACIÓN GENERAL TRAMO A INTERVENIR.

El tramo vial para intervenir es de 0,64 kilómetros divididos en 2 tramos, un tramo de 340 metros y otro de 300 metros; actualmente la vía presenta una adecuada infraestructura vial por lo cual se plantea el diseño sobre la superficie a actual teniendo en cuenta una carretera doble carril para mejorar los tiempos de recorrido y accesibilidad de los predios adyacentes al mismo.

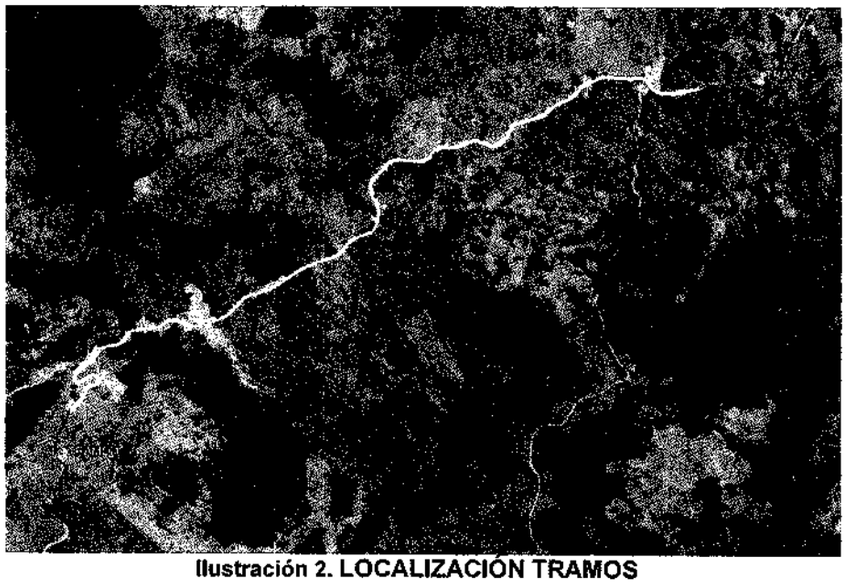


Ilustración 2. LOCALIZACIÓN TRAMOS

4. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7912853 NI. 1618/2025	30/05/2025
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EMR-APP BELLEZA**	
Nit o C.C. No.	901.949.762-6	
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**	

VALOR INICIAL:	$3.945.863.857	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$3.945.863.857	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	64.31%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	41.23%	
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA	
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7924460 NI. 1710/2025	13/06/2025
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL SOLASEC	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	901.953.373	
SUPERVISOR:	MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA	

ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 18/09/2025

FECHA DE INICIACIÓN:	25/07/2025

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	01	Fecha:	30/12/2025
No.		Fecha:	

ACTAS DE REINICIO			
No.	01	Fecha:	29/01/2026
No.		Fecha:	

FECHA DE TERMINACIÓN:	24/03/2026

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

5. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PLAN DE TRANSITO

El plan de Manejo de Trafico está basado en los principios básicos de la operación de vías nacionales, en donde se resalta que se debe garantizar la disponibilidad de la vía al tránsito en forma permanente. Aunque en nuestro caso no son vías nacionales solo utilizaremos algunos apartes de los capítulos y normas anteriormente mencionadas.

El contratista podrá limitar la disponibilidad de las vías únicamente cuando se presenten situaciones que revistan especial gravedad, siempre que sean impredecibles e irresistibles para el contratista, tales como:

- Condiciones climáticas muy adversas, que recomienden la interrupción del tránsito para garantizar la seguridad de las personas.

- Accidentes o incidentes de gran proporción, fuera del control del contratista y que impliquen un alto riesgo para el usuario al momento de transitar por la vía.

Igualmente podrá limitarse parcialmente la disponibilidad de las vías para la ejecución de obras programadas con anticipación. El contratista deberá garantizar que en estos casos no se presentará una suspensión total del flujo vehicular.

En caso de no ser posible el cierre parcial, requiriéndose inevitablemente un cierre total temporal de las vías, el constructor deberá presentar a la Interventoría y al INVIAS el plan de desvíos programado, el dispositivo de señalización temporal de obra a implementar y el plan por medio del cual el contratista informará a la comunidad y las autoridades competentes, a los terminales de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre.

6. DIVULGACION E INFORMACION DE LOS CIERRES DE VIAS

A lo largo de la ejecución de las actividades contractuales, se ha informado a los usuarios del área de influencia a través de medios masivos o de elementos de comunicación entregados en la vía, sobre los cierres de tramo a intervenir y los horarios en los que se habilita el paso vehicular.

Esta divulgación fue distribuida, de acuerdo con el impacto del cierre que se tenga programado, de la siguiente manera:

- Empresas de transporte de pasajeros
- A los usuarios de la vía, en transporte público, particular y peatones.
- Distribución de boletines informativos.

El documento que se divulgó por los diferentes medios de comunicación, fue el siguiente

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

INVIAS

EL CONTRATISTA DE OBRA DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Se permite informar a la comunidad en general que, con motivo de la ejecución del contrato cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", se realizarán cierres temporales en el sector La Altamira, entre PEÑA BLANCA Y LA HACIENDA.

A PARTIR DEL SEIS (06) DE OCTUBRE Y DE LUNES A SABADO EL PASO VEHICULAR SE HABILITARA ÚNICAMENTE EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

De 6:00 p.m. a 6:00 a.m
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

SE HABILITARA EL PASO PARA VEHICULOS EN ESPERA EN LOS SIGUIENTES HORARIOS

7:00 a.m.
9:00 a.m.
3:00 p.m.
5:00 p.m.

SE DARA PRIORIDAD A VEHICULOS DE EMERGENCIA

Es importante resaltar que estos horarios podrán ser modificados durante la ejecución de las actividades contractuales, debido a imprevistos o ajustes en la programación de obra. Se recomienda a la comunidad programar sus desplazamientos con anticipación o, de ser posible, utilizar vías alternas por FLORIÁN – JESÚS MARÍA.

Mas información:

Teléfono: 314 4171577
Correo electrónico: Consorcioemrbelleza@gmail.com

ALCALDÍA DE SUCRE SANTANDER

ALCALDÍA DE LA BELLEZA

Ilustración 3. INFORMACION CIERRES VIALES

6.1RESOLUCION CIERRE DE VIA

Durante el periodo en mención, el contratista y la interventoría, presentan un oficio en el cual, se solicita que, para el cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito, es fundamental emitir un comunicado de cierre de vía. Por lo anterior, el Departamento de Santander, emite la siguiente resolución:

	RESOLUCIÓN	CÓDIGO	AP-GJ-RG-36
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	29/05/2024
		PÁGINA	1 de 4

RESOLUCIÓN No. 22961

POR LA CUAL SE RESTRINGE PARCIALMENTE EL TRÁNSITO EN LA VÍA DEPARTAMENTAL LA BELLEZA -JESÚS MARÍA, EN EL SECTOR LA BELLEZA-CASINO-JESÚS MARÍA (CÓDIGO 45A-ST12-2) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

La secretaria de infraestructura del Departamento de Santander, en ejercicio de sus facultades legales.

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de Colombia impone obligaciones y deberes en relación con el interés general, los derechos y necesidades de los administrados y el cumplimiento cabal y efectivo de los fines del Estado, sobre los cuales se debe dar cumplimiento a través de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte y a los preceptos consagrados en los siguientes artículos:

2. Que el artículo 1° de la Constitución Política establece:

   "Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general".

3. Que el artículo 2° de la Constitución Política dispone:

   "Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

   Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

4. Que el artículo 209 de la Constitución Política reza:

   "Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

   Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley".

5. Que la ley 105 de 1993 dentro de sus principios fundamentales, establece en el art. 2 literal b, que: ***"De la intervención del Estado:** Corresponde al estado la planeación, control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas",*


28 OCT 2025

y a su vez, en su literal e, dispone: *"**De la Seguridad:** La seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector Transporte"*

6. Que, se está ejecutando por parte del CONSORCIO EMR-APP BELLEZA el Contrato de Obra Pública No.CO1.PCCNTR.7912853 cuyo objeto *"MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"* que abarca la construcción de pavimento rígido y alcantarillado en el municipio de Sucre en el Departamento de Santander.

7. Que, mediante oficio fechado del veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025), el señor Wilmer Andrés García Ruiz en calidad de representante legal del Consorcio EMR-APP BELLEZA, identificado con NIT 901.949.762-6, contratista de obra del *"MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"* solicita a esta dependencia permiso para realizar cierres parciales en el sector La Altamira, de la vía departamental la Belleza - Jesús María, cierres necesarios para dar continuidad a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de la referencia y en el Plan de Manejo de Tránsito del proyecto, de la siguiente manera:

> Yo, WILMER ANDRÉS GARCÍA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.114.119.732 de Bolívar, Valle del Cauca, en calidad de representante legal del CONSORCIO EMR-APP BELLEZA, identificado con NIT 901.949.762-6, me permito solicitar, de manera respetuosa, la expedición de la resolución de cierre de vía, necesaria para dar continuidad a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de la referencia. De acuerdo con la información divulgada a través de diferentes medios de comunicación, los cierres viales programados se llevarán a cabo conforme a lo evidenciado en la siguiente imagen:

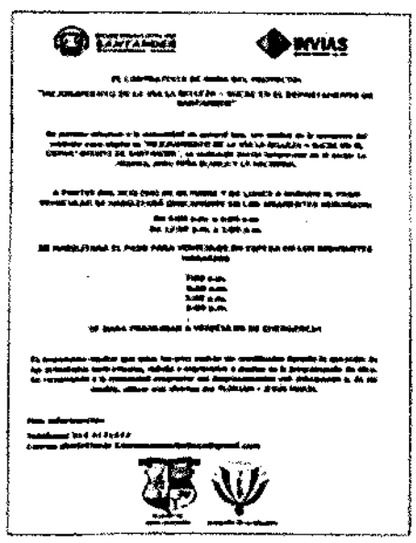

28 OCT 2025

RESOLUCIÓN 22961

8. Que, acorde con la ley 105 de 1993, las vías secundarias se encuentran a cargo de los Departamentos (Art. 16), así mismo, consagra algunas otras potestades estatales en los Artículos 19 y 20 y el art 1 de la ley 1228 de 2008.

9. Que el tramo a intervenir se localiza en la vía La Belleza - Jesús María, en el sector La Belleza-Casino-Jesús María (Código **45A-ST-12-2**) en el Departamento de Santander, vía que es de carácter secundario y se encuentra bajo la responsabilidad y administración del Departamento de Santander.

10. Que, para preservar la vida y seguridad de las personas, semovientes y vehículos, que se desplacen por esta vía, se hace necesario restringir parcialmente el tránsito en la vía La Belleza - Jesús María, en el sector La Belleza-Casino-Jesús María (Código **45A-ST-12-2**), tramo Altamira, durante los días **de lunes a sábado en el horario comprendido desde las 6:00am a 12:00m y de 1:00pm a 6:00pm**, medida que estará vigente **hasta la finalización de las actividades contempladas en el contrato** denominado **"Mejoramiento de la vía La Belleza – Sucre en el departamento de Santander"**, cuyo plazo de ejecución está previsto **hasta el día 24 de febrero de 2026**. De igual forma se debe dar cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito del proyecto y a su socialización.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Restringir totalmente el tránsito sobre la vía La Belleza - Jesús María, en el sector La Belleza-Casino-Jesús María (Código **45A-ST-12-2**), tramo Altamira, durante los días : **de lunes a sábado en el horario comprendido desde las 6:00am a 12:00m y de 1:00pm a 6:00pm**, medida que estará vigente **hasta la finalización de las actividades contempladas en el contrato** denominado ***"Mejoramiento de la vía La Belleza – Sucre en el departamento de Santander"***, cuyo plazo de ejecución está previsto **hasta el día 24 de febrero de 2026**, dadas las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARAGRAFO 1. Se habilitará el paso provisional para vehículos en espera en los horarios de: 7:00am, 9:00am, 3:00pm y 5:00pm.

PARAGRAFO 2. Se tendrá como vía alterna la vía que comunica al casco urbano de La Belleza con el caso urbano del municipio de Florián y con el casco urbano de Jesús María.

ARTICULO SEGUNDO: El Consorcio EMR-APP BELLEZA, contratista de la obra, deberá implementar y socializar la instalación de vallas, señales y controladores necesarios para garantizar la seguridad de los conductores, peatones y de los trabajadores de la obra, cumpliendo con la normatividad y la reglamentación para señalización temporal estipulada en el Manual de Señalización vial "Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia", así como el cumplimiento a lo establecido en el plan de manejo de tráfico del proyecto.

ARTICULO TERCERO: Envíese copia de este proveído a los municipios de La Belleza, Jesús María, Florián, Sucre, Consorcio EMR-APP BELLEZA, Policía Nacional de Tránsito y Transporte, inspección de policía, quienes serán las autoridades encargadas de vigilar, controlar y velar por el cumplimiento del presente Acto Administrativo.

28 OCT 2025.

	RESOLUCIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-76
		VERSIÓN	7
		FECHA DE APROBACIÓN	26/11/2024
		PÁGINA	6 de 8

ARTICULO CUARTO: RECURSOS Contra la presente Resolución procede los recursos de ley.

ARTICULO QUINTO: La decisión aquí adoptada rige a partir de la fecha.

Expedida en Bucaramanga, a los

28 OCT 2025

JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ
Secretaria de Infraestructura Departamento de Santander.

Proyectó Aspectos Jurídicos: Abg. Diana Paola Restrepo Cardenas
CPS Secretaría de Infraestructura Departamental

Revisó Aspectos Jurídicos: Abg. Alvaro Daniel Leon Herrera
Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura Departamental

Proyectó Aspectos Técnicos: Ing. Fabiola Fajardo Hurtado
Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura Departamental

Revisó Aspectos Técnicos: Ing. Lucia Katherine Pena Landazabal
Directora de Gestión de Infraestructura

Ilustración 4. RESOLUCION CIERRE DE VIA

7. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

A lo largo de la ejecución del contracto que tiene como objeto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", durante el periodo en mención, se realizó la implementación del PMT (Plan de Manejo de Transito) con el fin de mitigar al máximo el impacto que se generó por el cierre de la vía parcial, durante el proceso constructivo de las diferentes actividades contractuales.


Inicialmente, se llevó a cabo la socialización del proyecto, en el cual, se realizó un recorrido por los tramos a intervenir, de igual manera, con el fin de mitigar los impactos por los cierres totales de vía, se analizaron las opciones de acuerdo al alcance contractual y por ende, se procedió a realizar los cierres parciales de acuerdo a lo evidenciado en al resolución mencionada en el numeral anterior.

A continuación, se pueden observar las imágenes de la reunión realizada:




Ilustración 5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

Durante la ejecución del contrato, el contratista realizo la instalación de la señalización y los insumos de acuerdo a lo evidenciado en el rubro presupuestal para el cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito. Lo anterior, se puede evidenciar en las siguientes imágenes:

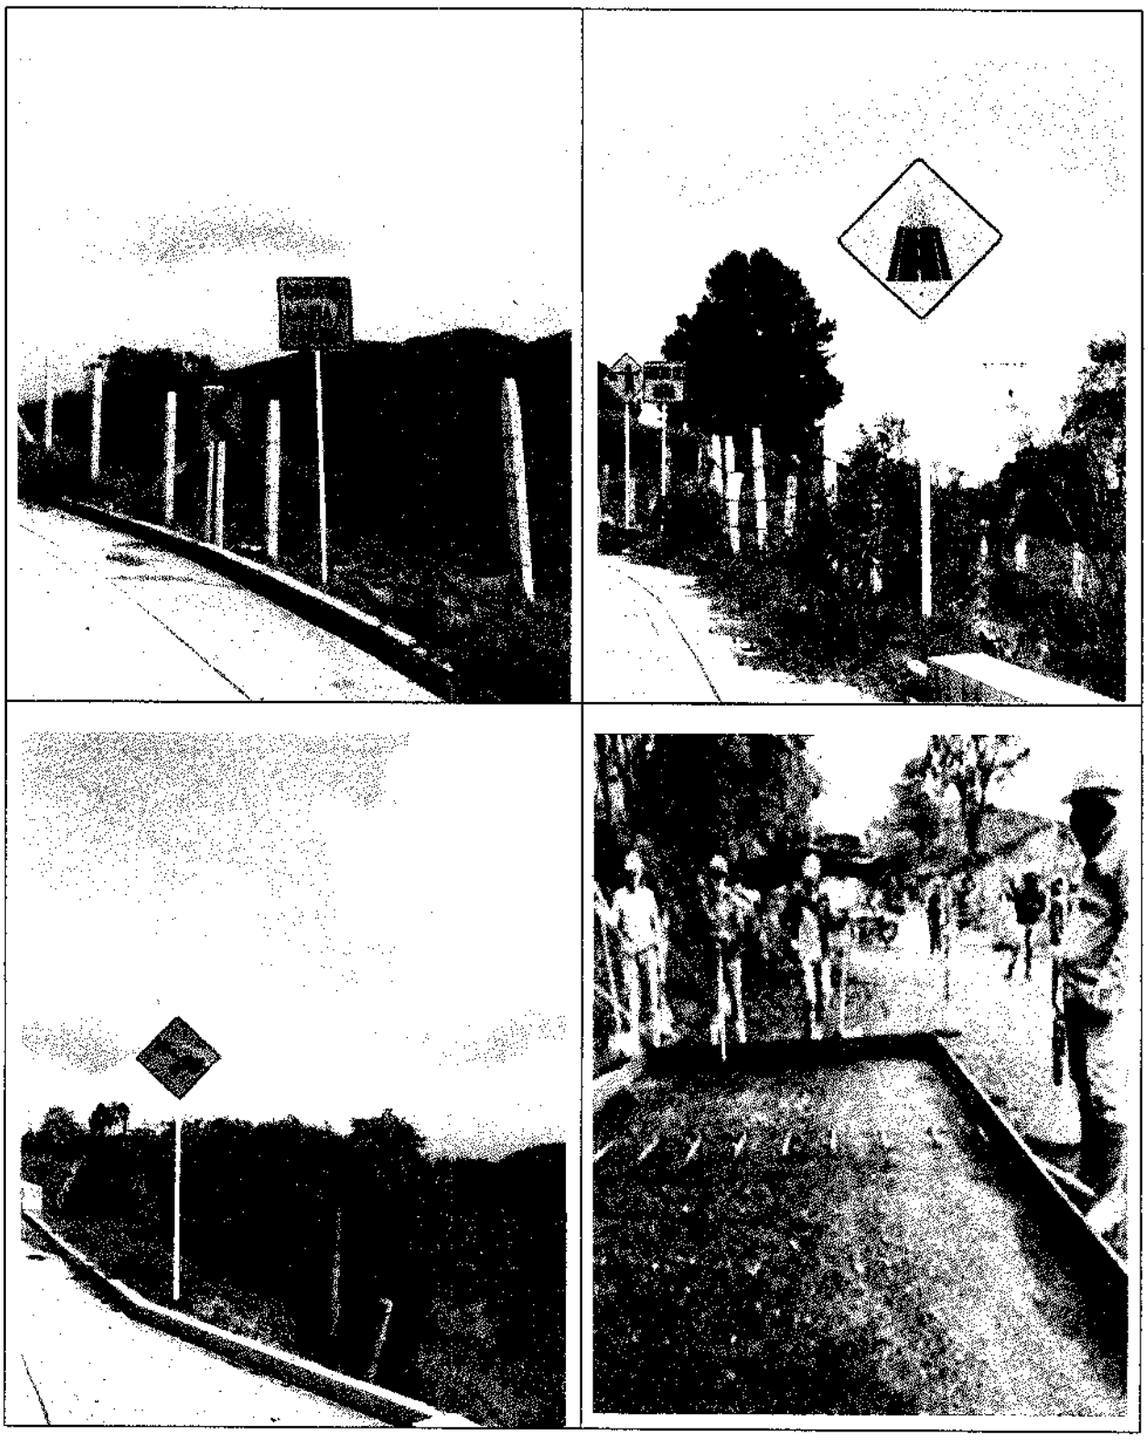




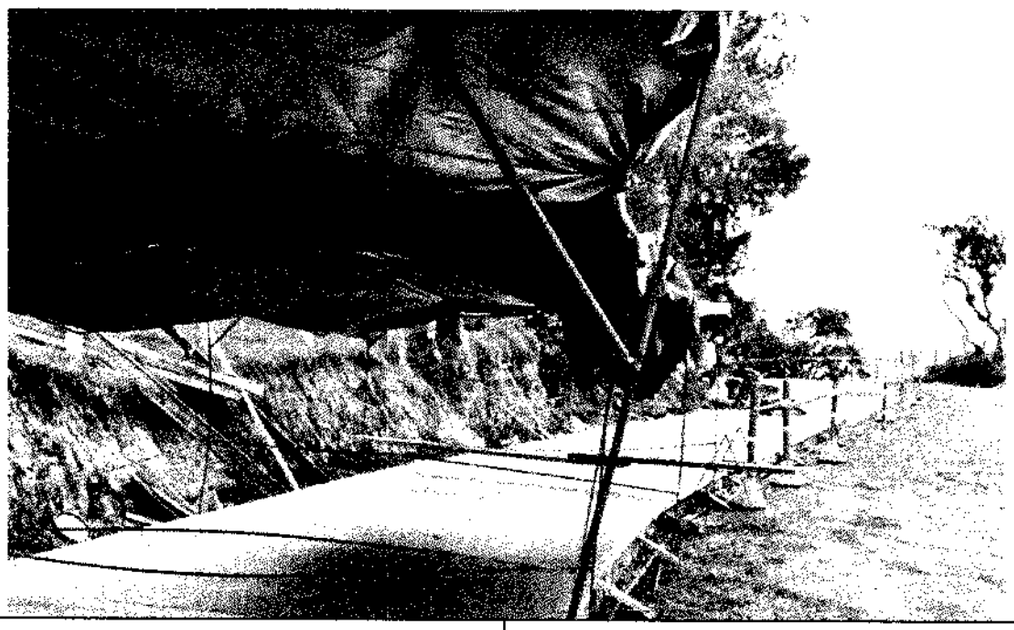





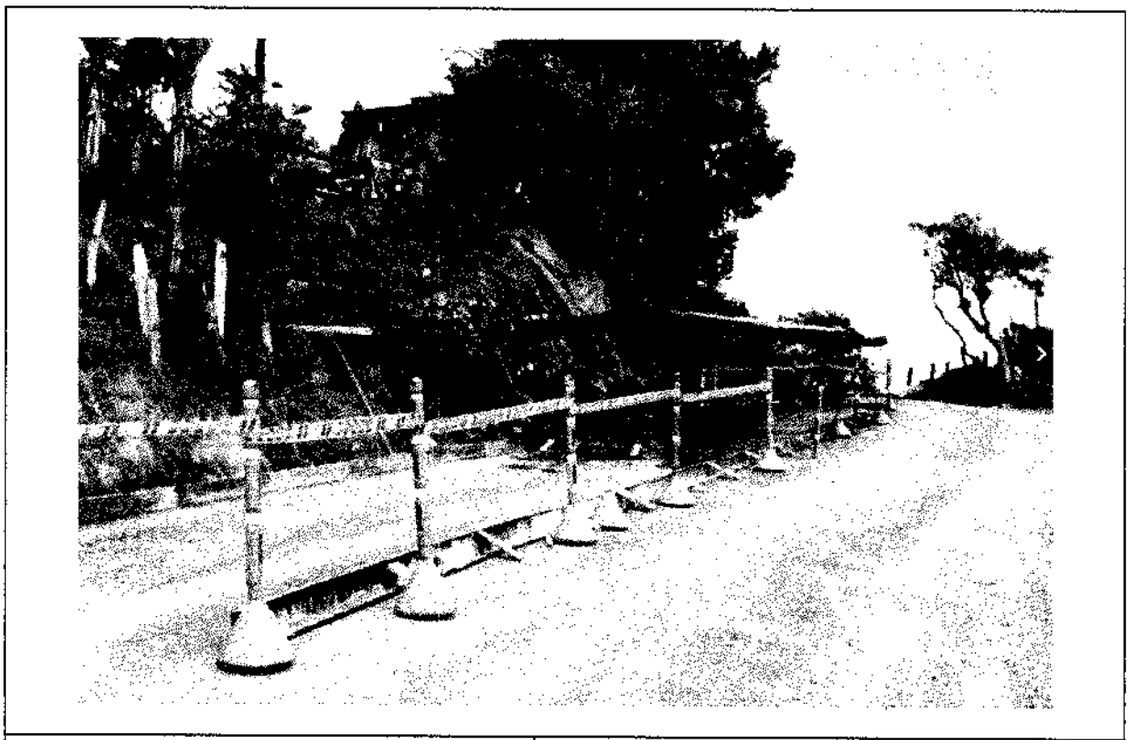





RELACION DE AUXILIARES DE TRANSITO

RELACIÓN PERSONAL ÁREA OPERATIVA			
NOMBRE TRABAJADOR	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
NELLY YOMAIRA RUIZ QUIROGA	AUXILIAR DE CONTROL DE TRANSITO	18/01/2026	–
LENIS ADRIANA RUIZ QUIROGA	AUXILIAR DE CONTROL DE TRANSITO	18/01/2026	–
SHARON MICHELL LOTERO CASTILLO	AUXILIAR DE CONTROL DE TRANSITO	01/11/2025	30/12/2025
DIANA VALENTINA MARIN QUITIAN	AUXILIAR DE CONTROL DE TRANSITO	01/11/2025	30/12/2025

RAZÓN SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA – SAFI CONSTRUCCIONES SAS	FEBRERO	36426892	20/02/2026
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA – SAFI CONSTRUCCIONES SAS	MARZO	36737266	16/03/2026

8. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

A continuación, se relaciona el presupuesto ejecutado en el Plan de Manejo de Tránsito en el periodo comprendido en el presente informe:

PRESUPUESTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSTO (P.M.T.)					
OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"			FECHA:	28/02/2026
				MUNICIPIO:	SUCRE - LA BELLEZA
SEÑALIZACIÓN Y INSUMOS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
PT.1	BALIZA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN PVC H = 140 [m] RANURA PARA CINTA DE PREVENCIÓN	UND	0	$ 90.000,00	$ 0,00
PT.2	PALETA DE CONTROL PARE - SIGA h=0.45	UND	0	$ 79.000,00	$ 0,00
PT.3	SEÑAL PREVENTIVA TIPO ROMBO MOVILES (0.60 X 0.60 m)	UND	0	$ 420.000,00	$ 0,00
PT.4	SEÑAL INFORMATIVA CIRCULAR MOVILES (h=0.60)	UND	0	$ 200.000,00	$ 0,00
PT.5	SEÑAL INFORMATIVA DE OBRA MOVILES (1.20 X 60)	UND	0	$ 320.000,00	$ 0,00
PT.6	RADIO TELÉFONO	UND	0	$ 416.590,00	$ 0,00
PT.7	BARRICADAS DE LISTONES (h=1,50 m)	UND	0	$ 500.000,00	$ 0,00
PT.8	CINTA DE DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE (500 MTS)	ROLLO	0	$ 27.000,00	$ 0,00
SUB-TOTAL:					$ 0,00

PRESUPUESTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSTO (P.M.T.)

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	FECHA:	28/02/2026
		MUNICIPIO:	SUCRE - LA BELLEZA

PERSONAL

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	REND.	JORNAL TOTAL	VLR PARCIAL
PT.1	TIEMPO	MES	1			
	MENSUALIDAD JORNADA AYUDANTE SIN PRESTACIONES	$ 1.430.000,00				
	FACTOR PRESTACIONAL	80%				
1	AYUDANTE	2			$ 2.573.995,00	$ 5.147.990,00
SUB-TOTAL:						**$ 5.147.990,00**

TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	**$ 5.147.990,00**

9. CONCLUSIONES

- ✓ En cumplimiento con la resolución de cierre de vía parcial, se ha garantizado las aperturas de vía en los diferentes horarios establecidos.
- ✓ Se logró mantener una tasa de accidentalidad nula dentro del área de influencia directa de la obra, lo cual evidencia la efectividad de la señalización vertical y horizontal temporal, la demarcación de desvíos y el control manual del tráfico por parte de los auxiliares de tránsito.
- ✓ El PMT se ejecutó en estricto cumplimiento con lo establecido por la normatividad de tránsito vigente y las directrices de la autoridad local competente, lo que asegura la legalidad y validez de todas las intervenciones realizadas en la vía pública

ELABORO:

OSCAR DAVID VERA ROJAS
INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

ANEXOS

1. SEGURIDAD SOCIAL AUXILIARES DE CONTROL DE TRANSITO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901388093	0	SAFI CONSTRUCCIONES	0	0	COLMENA - 14-26	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36000886	E	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.774.000	282.400	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
55	36000886	2026-01-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Aportes Parafiscales	Aportes Ecopetrol
N.	Id	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS?	AFP?	APS	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Col	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Col	NOMBRE	IBC	Col	IBC	Col.	ARL	IBC	Col.	Ccf.	Col.	Col.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 1101760110	ACOSTA DIAZ ROMARIO	2.200.000	F	X								X						0			16	16	16	16	PORVENIR-230101	1.395.335	223.800	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.398.335	56.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.966.668	78.700	1.398.335	97.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	453.900	S	5429001
2	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.423.500	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230101	1.512.469	242.000	0		EPS-S 01COOSALUD-ESSCN	1.512.469	60.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.512.469	60.500	1.512.469	105.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	458.300	S	5429001
3	CC 1042606891	ARIAS PEREZ LUIS ALBERTO	2.600.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.600.000	416.000	0		SALUD TOTAL-EPS002	2.600.000	104.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	845.000	S	5429001
4	CC 28438152	ARIZA CASTILLO FISLAYNE AURORA	525.000	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-230101	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	7.500	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
5	CC 5601930	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.423.500	F									X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.580.409	252.900	0		EPS-S 01COOSALUD-ESSCN	1.580.409	63.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.580.409	110.000	1.580.409	110.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	459.500	S	5429001
6	CC 1036907239	BARBOSA CADENA YEUDDI LORENA	1.423.500	F	X														0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	521.950	83.600	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	521.950	20.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	521.950	26.400	521.950	26.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	161.800	S	5429001
7	CC 79561496	BAYONA CERON HENRY	1.423.500	F	X								X						0			6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	341.317	54.700	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	341.317	13.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	341.317	13.700	341.317	23.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	105.900	S	5429001
8	CC 79561496	BAYONA CERON HENRY	1.423.500	F									X						0			9	9	9	9	COLPENSION ES-25-14	427.050	68.400	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	427.050	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	427.050	0	427.050	0	0,00950	0	0	0	0	0	01	0	68.400	S	5429001
9	CC 9390036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.423.500	F									X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.496.293	239.500	0		EPS 01AMCOPI-CCPC55	1.496.293	59.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.496.293	101.200	1.496.293	101.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	453.500	S	5429001
10	CC 1093787016	DELGADO JEREZ VICTOR YESID	1.423.500	F	X														0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	1.043.900	167.100	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.474.389	41.800	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.474.389	47.000	1.043.900	72.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	328.600	S	5429001
11	CC 1073696463	FONTECHA VELASCO FABIAN ALEXIS	1.423.500	F									X						0			24	24	24	24	COLPENSION ES-25-14	1.195.417	191.300	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.195.417	47.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.195.417	47.900	1.195.417	83.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	370.400	S	5429001
12	CC 1073696463	FONTECHA VELASCO FABIAN ALEXIS	1.423.500	F										X					0			6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	284.700	45.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	284.700	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	284.700	0	284.700	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	45.600	S	5429001
13	CC 1101018455	GALLEGOS SANTANA JOHAN SAMIR	1.423.500	F	X	X													0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	1.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	49.248	2.000	47.450	3.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	14.900	S	5429001
14	CC 91518676	GALVIS LEON PEDRO PABLO	2.840.000	F							X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.840.000	454.400	0		EPS SURA-EPS010	2.840.000	113.600	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.840.000	197.700	2.840.000	197.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	879.300	S	5429001
15	CC 1098604994	GALVIS RODRIGUEZ JUAN PABLO	2.680.000	F	X						X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.680.000	428.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.903.333	107.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.903.333	116.200	2.680.000	186.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	830.800	S	5429001
16	CC 1134119722	GARCIA RUIZ WILMER ANDRES	2.500.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0		SALUD MIA EPS-EPS046	2.500.000	100.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.500.000	13.100	2.500.000	13.100	0,00523	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	1711001
17	CC 1024542799	GARZON MURCIA CRISTIAN IVAN	1.423.500	F	X								X						0			18	18	18	18	PORVENIR-230101	862.188	138.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	862.188	34.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	862.188	60.100	862.188	60.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	267.100	S	5429001
18	CC 1024542799	GARZON MURCIA CRISTIAN IVAN	1.423.500	F									X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	94.900	0	94.900	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.200	S	5429001

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901386053	0	SAFI CONSTRUCCIONES	D	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213339913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35000868	E	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.774.000	282.400	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
55	35000868	2026-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
82.497.398	85.097.398	85.097.398	87.704.516	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				54	13.201.900	0	146.000	0	13.347.900
PROTECCION	230201	800229739	0	10	3.001.700	0	33.200	0	3.034.900
PORVENIR	230301	800224808	8	24	5.690.600	0	62.900	0	5.753.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	6	1.485.900	0	16.500	0	1.502.400
COLPENSIONES	26-14	900336004	7	14	3.023.700	0	33.400	0	3.057.100
EPS(Administradoras: 10)				55	3.361.900	0	37.700	0	3.399.600
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	69.900	0	700	0	60.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	174.900	0	2.000	0	176.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	204.300	0	2.300	0	206.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	201.600	0	2.300	0	203.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	4	288.100	0	3.200	0	291.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	639.200	0	7.100	0	646.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	13	657.400	0	7.300	0	664.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	100.000	0	1.200	0	101.200
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	2	192.000	0	2.200	0	194.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	14	844.600	0	9.400	0	853.900
ARP(Administradoras: 1)				55	5.466.800	0	60.400	0	5.527.200
COLMENA	14-25	800226175	3	55	5.466.800	0	60.400	0	5.527.200
CCF(Administradoras: 1)				55	3.461.000	0	38.300	0	3.499.300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	55	3.461.000	0	38.300	0	3.499.300
Gran Total					25.491.600	0	282.400	0	25.774.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901385053	0	SAFI CONSTRUCCIONES	6	0	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-276	CRA 21A 35 – 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	35426892	E	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.644.000	120.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
54	38426892	2026-02-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																						DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1056804442	ALVARADO GIL SERGIO DUVAN	2.500.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	83.334	13.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	83.334	3.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	83.334	3.400	83.334	5.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	26.100	S	5429001
2	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F							X		X							0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	849.588	136.000	0	0	EPS-S 0COOSALUD-ESSC24	849.588	34.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	849.588	34.000	849.588	59.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	263.200	S	5429001
3	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F										X						0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	641.999	102.800	0	0	EPS-S 0COOSALUD-ESSC24	641.999	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	641.999	0	641.999	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	102.800	S	5429001
4	CC 83228559	ARANGO YARA JOSE ISIDRO	1.750.905	F													X			0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	65.400	0	0	EPS-S 0COOSALUD-ESSC24	408.545	16.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	408.545	16.400	408.545	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	98.200	S	5429001
5	CC 1042000894	ARIAS PEREZ LUIS ALBERTO	1.750.905	F							X									0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	1.225.634	196.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.225.634	49.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.225.634	49.100	1.225.634	85.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	379.800	S	5429001
6	CC 1042000894	ARIAS PEREZ LUIS ALBERTO	1.750.905	F										X						0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	525.272	84.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	525.272	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	525.272	0	525.272	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	84.100	S	5429001
7	CC 28438152	ARIZA CASTILLO ESLAYNE AURORA	875.300	F							X									0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	5429001
8	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.750.905	F							X		X							0			12	12	12	12	COLFONDOS-231001	849.588	136.000	0	0	EPS-S 0COOSALUD-ESSC24	849.588	34.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	849.588	34.000	849.588	59.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	263.200	S	5429001
9	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.750.905	F										X						0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	583.635	93.400	0	0	EPS-S 0COOSALUD-ESSC24	583.635	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	583.635	0	583.635	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	93.400	S	5429001
10	CC 5601920	ARIZA SANTAMARIA JESUS EMILIO	1.750.905	F													X			0			8	8	8	8	COLFONDOS-231001	466.908	74.800	0	0	EPS-S 0COOSALUD-ESSC24	466.908	18.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	466.908	18.700	466.908	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	112.200	S	5429001
11	CC 1096093279	BARROSA CADENA YEUDDI LORENA	1.750.905	F	X				X											0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	700.362	112.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	700.362	28.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	754.056	30.200	700.362	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	219.200	S	5429001
12	CC 79461496	BAYONA CERON HENRY	1.750.905	F					X											0			26	26	26	26	COLPENSION-ES-25-14	1.517.451	242.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.517.451	69.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.517.451	60.700	1.517.451	105.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	469.900	S	5429001
13	CC 79461496	BAYONA CERON HENRY	1.750.905	F													X			0			4	4	4	4	COLPENSION-ES-25-14	233.454	37.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	233.454	9.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	233.454	9.400	233.454	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	56.200	S	5429001
14	CC 9390036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.750.905	F					X		X									0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	1.003.453	160.600	0	0	EPS 0CAJACOPI-CCFC55	1.003.455	40.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.003.455	40.200	1.003.455	69.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	310.900	S	5429001
15	CC 9390036	BUITRAGO BOHORQUEZ MARCO ANTONIO	1.750.905	F									X							0			14	14	14	14	COLFONDOS-231001	817.089	130.800	0	0	EPS 0CAJACOPI-CCFC55	817.089	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	817.089	0	817.089	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	130.900	S	5429001
16	CC 91429270	BUSTOS ROBLES ELADIO	2.020.000	F	X															0			10	10	10	10	COLPENSION-ES-25-14	673.334	107.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	673.334	27.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	673.334	27.000	673.334	46.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	208.700	S	5429001
17	CC 1012408663	CARRANZA RAMIREZ RICHARD EDUARDO	1.750.905	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	175.091	28.100	0	0	EPS SURA-EPS010	175.091	7.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	175.091	7.100	175.091	12.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	54.300	S	5429001
18	CC 1073696463	FONTECHA VELASCO FABIAN ALEXIS	1.750.905	F							X									0			25	25	25	25	COLPENSION-ES-25-14	1.459.088	233.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.459.088	58.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.459.088	58.400	1.459.088	101.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	452.900	S	5429001

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901385953	0	SAFI CONSTRUCCIONES	B	D	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 21A 35 - 40 CAÑAVERAL		3213939913		SAFICONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36426892	E	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.644.000	120.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
54	36426892	2026-02-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
84.691.394	84.691.394	84.691.394	85.123.867	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				54	13.554.200	0	69.000	0	13.623.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	1.165.500	0	6.000	0	1.171.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	3.340.800	0	17.000	0	3.357.800
PROTECCION	230201	800229739	0	8	1.964.400	0	10.000	0	1.974.400
PORVENIR	230301	800224808	8	29	7.083.500	0	36.000	0	7.119.500
EPS(Administradoras: 12)				54	2.926.200	0	15.500	0	2.941.700
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	40.200	0	300	0	40.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	8	471.200	0	2.400	0	473.600
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	120.000	0	700	0	120.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	72.500	0	400	0	72.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	297.900	0	1.600	0	299.500
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	27.300	0	200	0	27.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	207.200	0	1.100	0	208.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	5	275.300	0	1.400	0	276.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	514.300	0	2.700	0	517.000
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	2	232.000	0	1.200	0	233.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	15	635.900	0	3.300	0	639.200
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	32.400	0	200	0	32.600
ARP(Administradoras: 1)				54	4.099.700	0	20.900	0	4.120.600
COLMENA	14-25	800226175	3	54	4.099.700	0	20.900	0	4.120.600
CCF(Administradoras: 1)				54	2.943.500	0	15.000	0	2.958.500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	54	2.943.500	0	15.000	0	2.958.500
Gran Total					23.523.600	0	120.400	0	23.644.000

Informe Seguimiento Plan de Manejo Ambiental.

INFORME DE GESTION AMBIENTAL No. 02

PERIODO:

DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y DEL 29 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.7912853 DEL 30 DE MAYO DEL 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA
NIT. 901.949.762-6

ELABORO:
RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES
CARGO: ING AMBIENTAL
MATRICULA PROFESIONAL: 68202-095260 STD

SUCRE - SANTANDER

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
3. AREA DE INTERVENCION 5
4. INFORMACION DEL CONTRATO 6
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
   5.1 DESARROLLO Y APLICACION GESTION AMBIENTAL 7
      5.1.1 PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN E LA GESTION AMBIENTAL 7
      5.1.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 9
      5.1.3 PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES 10
6. ACTIVIDADES AMBIENTALES ADICIONALES 15
7. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 17
8. CONCLUSIONES 20
9. ANEXOS 21

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. LOCALIZACIÓN GENERAL TRAMO A INTERVENIR. 5
Ilustración 2. LOCALIZACIÓN TRAMOS 5
Ilustración 3. CAPACITACIONES REALIZADAS 8
Ilustración 4. CUBRIMIENTO CON TELA VERDE Y PLASTICO NEGRO 10
Ilustración 5. INSTALACIONES TEMPORALES 10
Ilustración 6. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 12
Ilustración 7. PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD 12
Ilustración 8. SEÑALES INFORMATIVAS 14

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. RELACION DEL PERSONAL 7
Tabla 2. RELACION DE CAPACITACIONES 8
Tabla 3. RELACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 11

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre del 2025 al 30 de diciembre del 2025 y del 29 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026, durante el desarrollo de actividades del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", enfocado en la gestión realizada en materia del manejo ambiental por el contratista CONSORCIO EMR-APP BELLEZA.

El mejoramiento de la infraestructura vial, materializado en el contrato de pavimentación de la vía secundaria, es un factor determinante para el desarrollo económico y la integración social de las comunidades aledañas. No obstante, la etapa de ejecución de estos proyectos de ingeniería civil que involucra actividades de movimiento de tierras, gestión de préstamos y disposición de sobrantes, manejo de materiales bituminosos y operación de maquinaria pesada, genera inevitablemente presiones significativas sobre el entorno natural y social, incluyendo riesgos de erosión, afectación de cuerpos hídricos, ruido y contaminación atmosférica. Ante esta dualidad entre desarrollo necesario e impacto potencial, la gestión ambiental se convierte en un pilar insoslayable.

La gestión ambiental durante el periodo reportado se concretó mediante la aplicación de varios programas. Estos programas abordaron la definición de la política ambiental de la organización, la formación del personal en temas ambientales, la mejora de las instalaciones (campamentos), medidas para proteger la vegetación y la fauna, el control y disposición de residuos, la señalización de seguridad en las áreas de trabajo, el manejo adecuado de equipos y maquinaria, y la organización y limpieza de los espacios de trabajo. Las pruebas de la ejecución de estos programas ambientales relevantes para el periodo se detallan dentro del presente documento.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Describir las medidas de prevención, control, mitigación y contingencia para el manejo de posibles impactos ambientales que se puedan derivar de la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reportar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales en la ejecución del proyecto por cada uno de los programas contemplados en aras de mitigar impactos ambientales.
- Describir las actividades ejecutadas en materia ambiental durante el periodo evaluado, descritas dentro de los programas de manejo ambiental.
- Presentar las conclusiones y/o recomendaciones generadas en el periodo.
- Presentar los indicadores de cumplimiento en el periodo

3. AREA DE INTERVENCION

El corredor vial objeto de este proyecto conecta los municipios de Sucre y La Belleza en el departamento de Santander, abarcando el sector Altamira. Este tramo estratégico no solo beneficia directamente a los municipios mencionados, sino que también mejora la conectividad de Puente Nacional, Jesús María, Bolívar, Florián y Albania, facilitando el acceso y la movilidad en esta región. La intervención prevista se extiende a lo largo del corredor vial, optimizando la infraestructura y fortaleciendo el desarrollo vial del área.

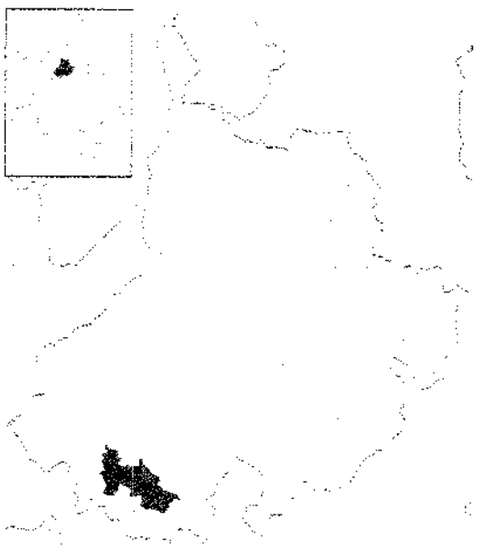


Ilustración 1. LOCALIZACIÓN GENERAL TRAMO A INTERVENIR.

El tramo vial para intervenir es de 0,64 kilómetros divididos en 2 tramos, un tramo de 340 metros y otro de 300 metros; actualmente la vía presenta una adecuada infraestructura vial por lo cual se plantea el diseño sobre la superficie a actual teniendo en cuenta una carretera doble carril para mejorar los tiempos de recorrido y accesibilidad de los predios adyacentes al mismo.

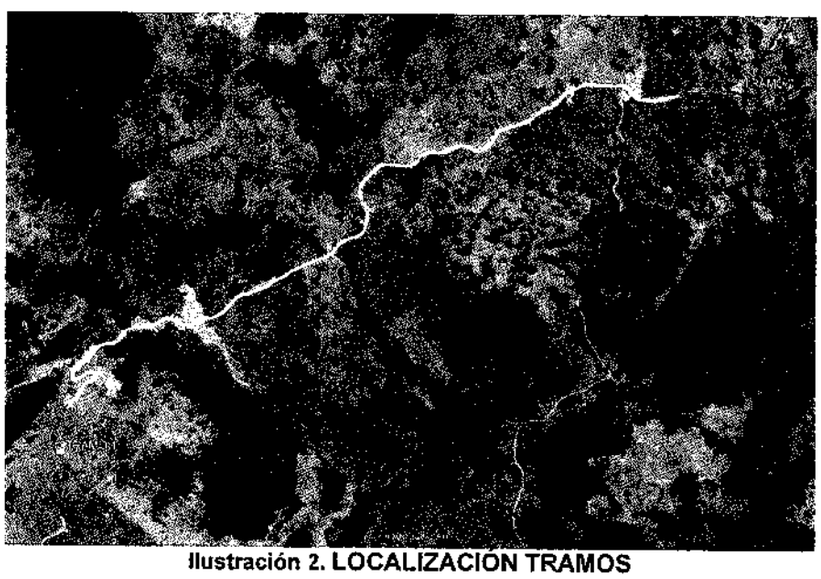


Ilustración 2. LOCALIZACIÓN TRAMOS

4. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7912853 NI. 1618/2025	30/05/2025
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EMR-APP BELLEZA**	
Nit o C.C. No.	901.949.762-6	
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**	

VALOR INICIAL:	$3.945.863.857	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$3.945.863.857	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	64.31%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	41.23%	
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA	
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7924460 NI. 1710/2025	13/06/2025
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL SOLASEC	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	901.953.373	
SUPERVISOR:	MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 18/09/2025	

FECHA DE INICIACIÓN:	25/07/2025

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	01	Fecha:	30/12/2025
No.		Fecha:	

ACTAS DE REINICIO			
No.	01	Fecha:	29/01/2026
No.		Fecha:	

FECHA DE TERMINACIÓN:	24/03/2026

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dando cumplimiento a la necesidad de minimizar las afectaciones socioambientales derivadas de las actividades constructivas en el sector de intervención del municipio de Sucre, Santander, el presente documento lista los programas de gestión ambiental que fueron aplicados en el proyecto a lo largo del periodo del 15 de diciembre del 2025 al 30 de diciembre del 2025 y del 29 de enero del 2026 al 28 de febrero del 2026.

5.1 DESARROLLO Y APLICACION GESTION AMBIENTAL

Este programa fue orientado a planificar todas las actividades de manejo ambiental y social necesarias para la ejecución del proyecto. Bajo la dirección del profesional ambiental, se convocó al Grupo de Gestión Ambiental con el propósito de definir e implementar las estrategias fundamentales dentro de cada programa. Esta iniciativa busca asegurar una respuesta efectiva a las necesidades que se presenten durante la ejecución del proyecto y formular soluciones eficientes para mitigar los impactos derivados de las actividades. La relación de los integrantes del Grupo de Gestión Ambiental se presenta seguidamente.

REUNION GRUPO GESTION AMBIENTAL	
ASISTENTES	**CARGO**
OSCAR DAVID VERA ROJAS	ING RESIDENTE DE OBRA
MARIA FERNANDA ESTEBAN CLAVIJO	PROFESIONAL HSEQ
RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES	INGENIERO AMBIENTAL

Tabla 1. RELACION DEL PERSONAL

5.1.1 PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN E LA GESTION AMBIENTAL

Antes de iniciar la obra, se impartió una capacitación de inducción liderado por el Ingeniero Ambiental Rafael Waldo Alvarado enfocada en la gestión ambiental. En ella se comunicaron los programas ambientales a implementar durante el proyecto y se subrayaron las obligaciones del personal, particularmente en cuanto a la conservación del orden y la limpieza de sus puestos de trabajo y el apoyo al cumplimiento de las metas ambientales. Las capacitaciones y charlas impartidas en el periodo se relacionan a continuación:

REGISTRO CHARLAS Y CAPACITACIONES		
FECHA	**TEMA**	**EMPRESA**
18/12/2025	IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR Y SOCIALIZAR CON LOS TRABAJADORES Y PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA Y SALUD DE LOS EMPLEADOS	CONSORCIO EMR-APP BELLEZA
23/12/2025	IDENTIFICAR Y MITIGAR POSIBLES RIESGOS ENCONTRADOS EN LOS PUNTOS CIEGOS	CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

Tabla 2. RELACION DE CAPACITACIONES

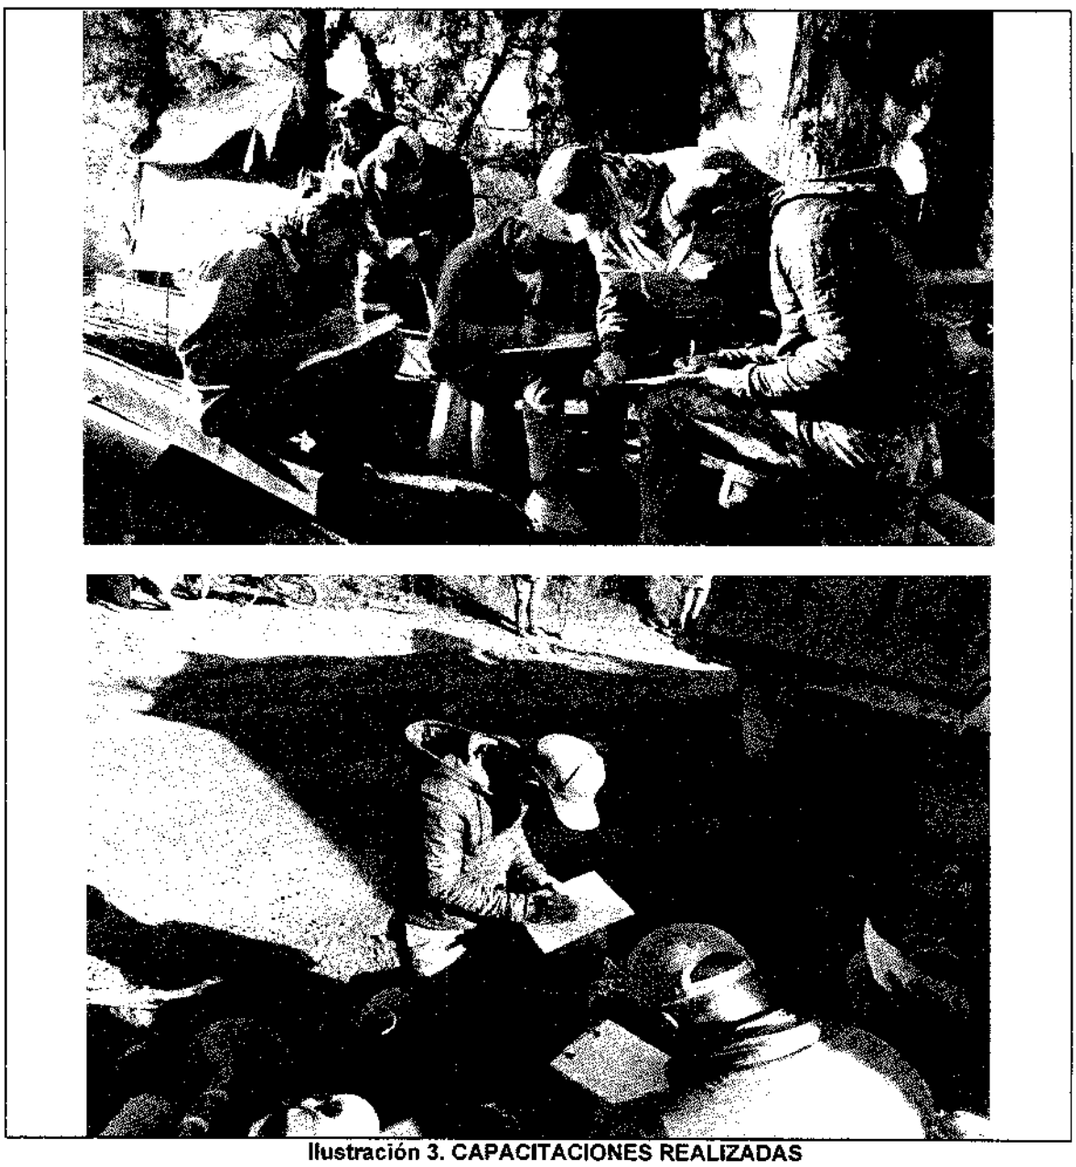


Ilustración 3. CAPACITACIONES REALIZADAS

5.1.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Durante este periodo se utilizó la instalación de la señalización frentes de obra y sitios temporales adecuados para acopios de materiales. De igual manera, se realizó la instalación de conos, con el fin, de delimitar las zonas de trabajo. Además, se realizó el cubrimiento de materiales granulares y el cubrimiento del material sobrante producto de las excavaciones realizadas



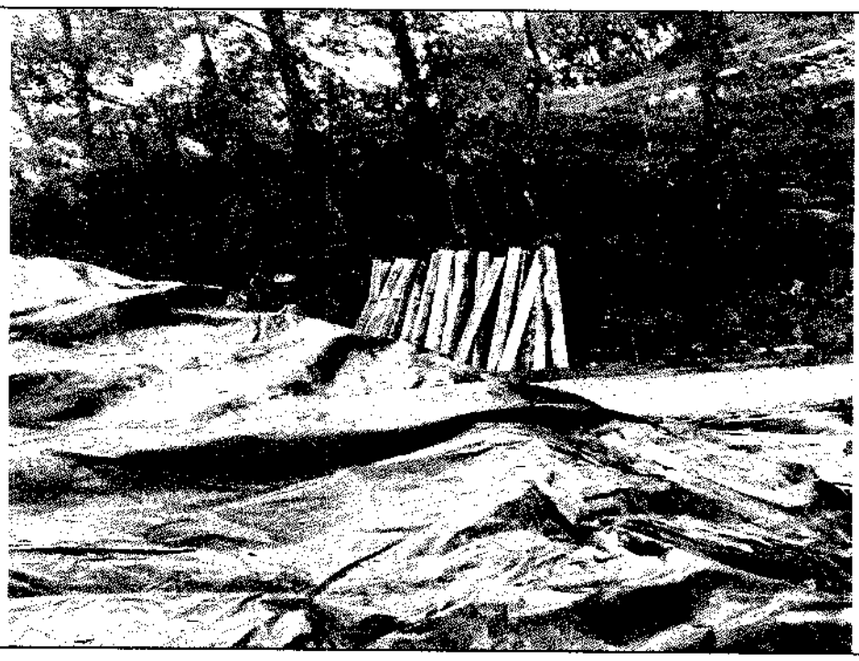




Ilustración 4. CUBRIMIENTO CON TELA VERDE Y PLASTICO NEGRO

5.1.3 PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Durante este periodo, se realizó la construcción del campamento provisional, de igual manera, se realizó la compra de una pala, carretilla y balde plástico

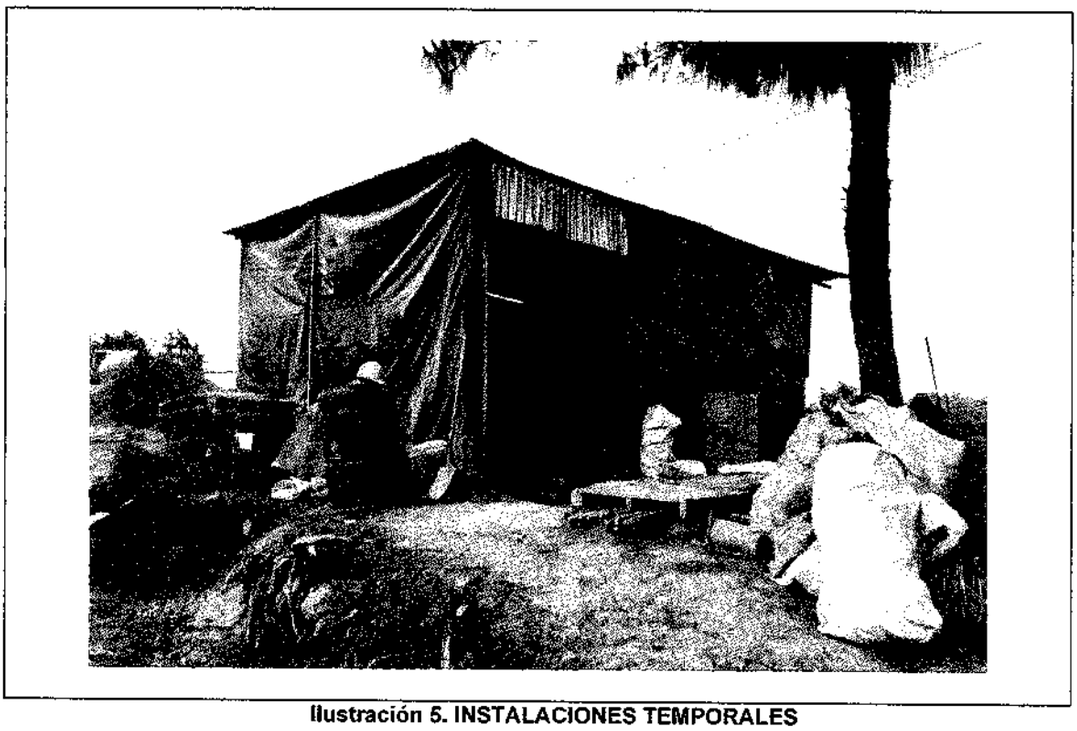


Ilustración 5. INSTALACIONES TEMPORALES

Los vehículos utilizados para el transporte de materiales en el proyecto se encuentran en buenas condiciones además de contar con el SOAT y la revisión tecnomecánica vigente.

Las actividades de abastecimiento de combustible y cambios de aceite se realizan teniendo en cuenta las medidas de protección con el medio ambiente, evitando riegos o derrames en el suelo.

En la ejecución de actividades el contratista de obra requirió la utilización de los equipos relacionados a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	CAPACIDAD
Volqueta	2	7 m^3
Retroexcavadora	1	-
Vibro compactador	1	-
Saltarín	1	-
Mezcladora de concreto	1	1 Bulto
Tronzadora	1	2300W 4200RPM
Carmix	1	2.5 m3

Tabla 3. RELACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA





Ilustración 6. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

5.1.4 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

El campamento, construido con madera, plástico negro y láminas de zinc, fue designado como el área de almacenamiento temporal para los materiales de construcción. Debido a la dificultad de acceso a la zona de intervención, los materiales se transportaron en cargas manuales, siendo depositados sobre lona verde para prevenir su dispersión y la contaminación del suelo. Adicionalmente, los materiales granulares se cubrieron con plástico para controlar la emisión de polvo y evitar el arrastre por lluvia o viento. Además, este campamento fue designado para el punto de atención a la comunidad.



Ilustración 7. PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD

5.1.5 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Con el propósito de garantizar el abastecimiento de agua necesario para la ejecución de las actividades constructivas, inicialmente se implementó un sistema de almacenamiento mediante caneca, cuya recarga se efectuaba a través del transporte del recurso desde el municipio de La Belleza hasta la zona de intervención. Sin embargo, este mecanismo evidenció limitaciones operativas y logísticas, afectando la eficiencia en el suministro y generando mayores tiempos de desplazamiento.

En cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y bajo el principio de uso racional y eficiente del recurso hídrico, se adoptó como acción de mejora la instalación y distribución estratégica de tanques de almacenamiento en los frentes de trabajo, destinados a la captación de aguas lluvias.

Esta medida permite el aprovechamiento de una fuente hídrica alternativa, reduciendo la dependencia del transporte externo de agua, minimizando la huella ambiental asociada al traslado del recurso y promoviendo prácticas sostenibles en la ejecución del proyecto. Asimismo, contribuye a optimizar los procesos constructivos al garantizar mayor disponibilidad del recurso para actividades que no requieren calidad potable, tales como control de polvo, curado de concretos y limpieza de herramientas.

Con la implementación de esta acción se fortalece el cumplimiento de los compromisos ambientales del contrato y se mejora la eficiencia operativa en obra, asegurando una gestión más responsable y sostenible del recurso hídrico.
Actualmente, acorde a lineamientos internos de la empresa y teniendo en cuenta la dificultad para el acceso a los sitios de obra, se acordó con una de las viviendas cercanas el alquiler de un baño para uso de los trabajadores. De igual manera, se llevaron a cabo campañas periódicas de orden y aseo en el frente de obra activo, que incluyeron la limpieza de áreas, la correcta separación de residuos sólidos generados y la organización de herramientas. Adicionalmente, el consumo de agua potable por parte de los trabajadores se asegura mediante el traslado desde el municipio al sitio de obra, garantizando así que no se afecten los cuerpos de agua naturales cercanos.

Adicionalmente, se verifico que las señales informativas, estuvieran en buen estado, lo anterior se puede evidenciar en la siguiente imagen:



Ilustración 8. SEÑALES INFORMATIVAS

6. ACTIVIDADES AMBIENTALES ADICIONALES

6.1 Manejo de Flora

En el componente de manejo de flora, se continúan realizando visitas periódicas en campo con el apoyo de la comisión de topografía, con el fin de delimitar y verificar los sitios de intervención conforme al avance de obra. Estas actividades se desarrollan en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.1.1.4.5., en lo referente al aprovechamiento forestal.

A la fecha del presente informe, no ha surgido la necesidad de realizar tala de árboles, toda vez que las actividades ejecutadas no han requerido intervenciones que impliquen aprovechamiento forestal.

Durante el periodo reportado, se ejecutaron labores de desmonte y limpieza en el área previamente definida para intervención. El material vegetal producto de estas actividades fue almacenado temporalmente en el sitio, clasificándolo como residuo orgánico susceptible de aprovechamiento. Parte de este material fue reutilizado en actividades asociadas a la adecuación del campamento. Asimismo, los residuos de rocería fueron recolectados y confinados fuera de la zona activa de trabajo, facilitando su descomposición natural y su potencial uso posterior como abono orgánico.

6.2 Manejo de Fauna

Previo al inicio de cada actividad contractual, se realizó la verificación del área de intervención, incluyendo la zona boscosa de influencia directa e indirecta, con el objetivo de identificar y documentar la posible presencia de nidos, madrigueras o especies de fauna silvestre que pudieran verse afectadas por las labores constructivas.

Durante el periodo evaluado no se evidenció presencia de fauna en proximidad a las zonas activas de trabajo. Se infiere que el ruido generado por equipos, maquinaria y actividades propias de la obra ha propiciado el desplazamiento temporal de especies hacia áreas alejadas del frente de intervención.

6.3 Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua

En el marco de la ejecución contractual, se ha fortalecido el componente de gestión del recurso hídrico mediante la implementación de un sistema de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir el consumo de agua potable o proveniente de fuentes externas, en concordancia con el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua.

Para tal fin, se dispusieron canecas plásticas y metálicas en diferentes puntos estratégicos de la obra, conformando un sistema temporal de almacenamiento compuesto por tanques y reservorios cubiertos. Estos elementos están diseñados para preservar la calidad del agua recolectada, evitando la acumulación excesiva de sedimentos o su contaminación con residuos propios de la construcción.

El agua lluvia recolectada es destinada a usos no potables dentro del proyecto, sustituyendo el consumo de agua dulce en actividades tales como:

- Humedecimiento de capas granulares.
- Lavado de maquinaria y equipos.
- Supresión y control de polvo en áreas de trabajo.

La implementación de esta medida contribuye a la optimización del recurso hídrico, disminuye la presión sobre fuentes externas y fortalece el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos para el proyecto. Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes imágenes

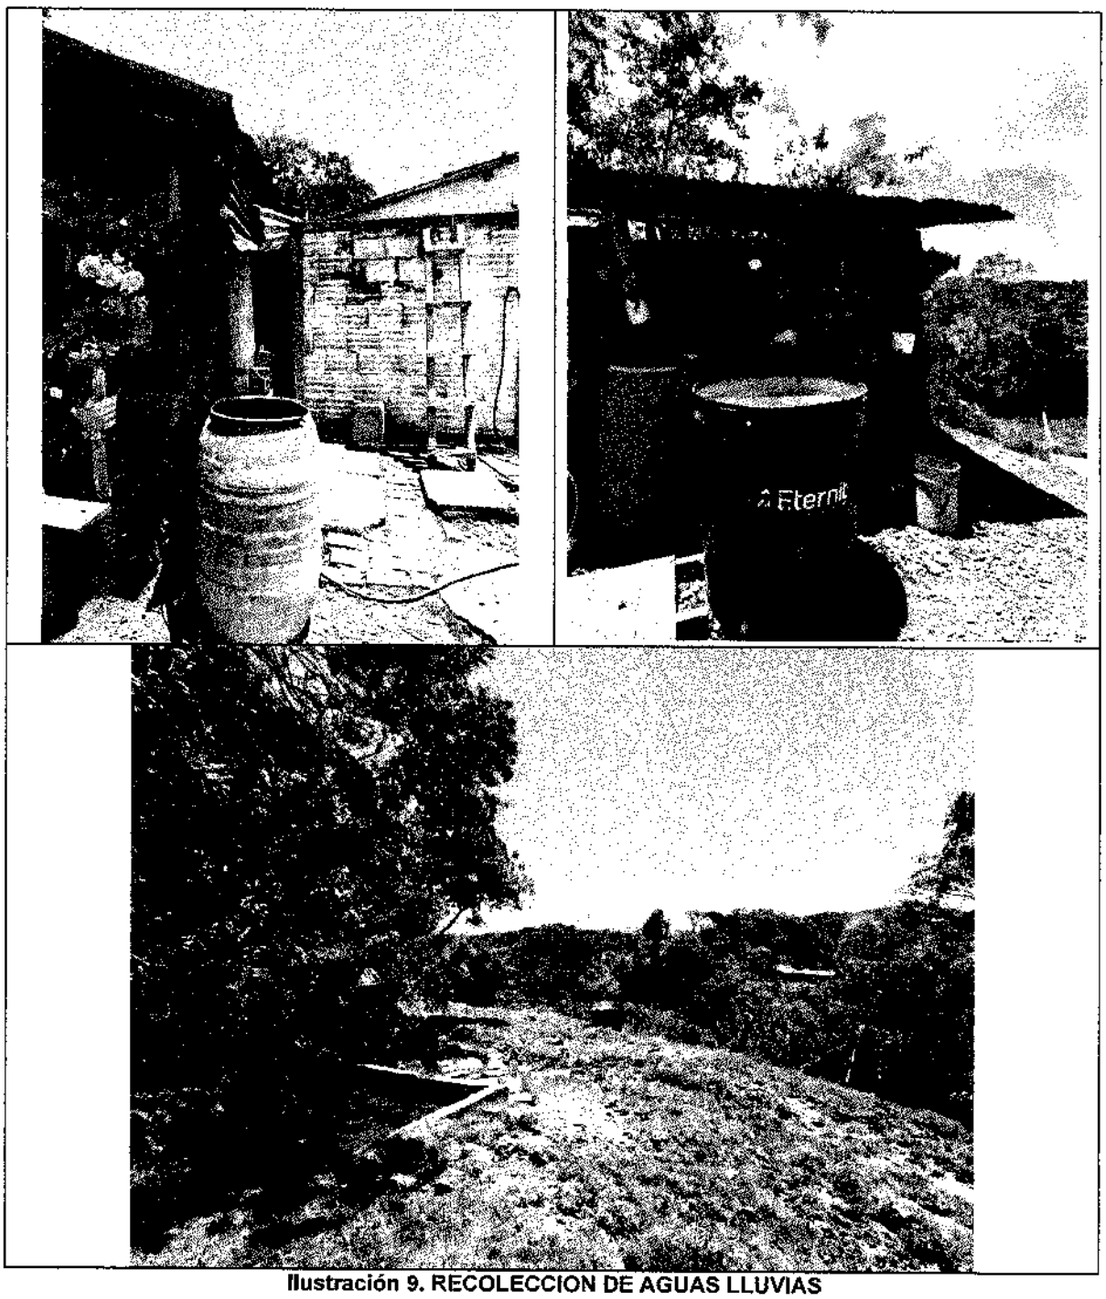


Ilustración 9. RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS

7. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se relaciona el presupuesto ejecutado en el plan de manejo ambiental en el periodo comprendido en el presente informe:

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "P.M.A"

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "P.M.A"

Nº	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	Capacitación y concienciación para el personal de obra.	Capacitaciones	UNIDAD	2	$ 180.000,00	$ 360.000,00
2	PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo integral de materiales de construcción	Cubrimiento de materiales granulares como bases, sub bases, arena, Plástico Negro Cal 6, 4 Metros De Alto X 10 Metros De Largo 30 m2 por frente de obra	M2	20	$ 3.000,00	$ 60.000,00
		Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señal de uso de elementos de protección personal EPP	UNIDAD	0	$ 25.000,00	$ 0,00
			Señal de extintor	UNIDAD	0	$ 25.000,00	$ 0,00
			Señal de sustancia peligrosa	UNIDAD	0	$ 25.000,00	$ 0,00
			Señal de ruta de evacuación	UNIDAD	0	$ 25.000,00	$ 0,00
			Cono Reflectivo Plegable 45 Cm	UNIDAD	0	$ 40.000,00	$ 0,00
			Señal de puntos de encuentros	UNIDAD	0	$ 25.000,00	$ 0,00
			Señal residuos reciclables	UNIDAD	0	$ 25.000,00	$ 0,00
			Señal residuos ordinarios	UNIDAD	0	$ 25.000,00	$ 0,00
			Señal residuos Peligrosos	UNIDAD	0	$ 25.000,00	$ 0,00
			Señal de baños	UNIDAD	0	$ 25.000,00	$ 0,00
		Manejo integral de residuos de construcción y demolición - RCD	Cubrimiento de escombros con tela verde para cerramiento de 2 m de ancho x 15	M2	50	$ 4.200,00	$ 210.000,00

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "P.M.A"

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "P.M.A"

		Manejo integral de residuos sólidos	Adecuación punto ecológico	UNIDAD	0	$ 140.000,00	$ 0,00
			Caneca para lavado de herramientas con capacidad de 55 galones, de acero o similar	UNIDAD	0	$ 180.000,00	$ 0,00
			Bolsa color negro calibré 2" de 65 cm x 85 cm	UNIDAD	96	$ 900,00	$ 86.400,00
			Bolsa color blanca calibré 2" de 65 cm x 85 cm	UNIDAD	96	$ 900,00	$ 86.400,00
			Bolsa color verde calibré 2" de 65 cm x 85 cm	UNIDAD	96	$ 900,00	$ 86.400,00
3	PROGRAMA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	Trampa de grasa	UNIDAD	0	$ 380.000,00	$ 0,00
4	PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Manejo del descapote y la cobertura vegetal	Se incluye en las actividades de obra				$ 0,00
5	PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	Pala con mango	UNIDAD	0	$ 30.000,00	$ 0,00
			Carretilla (tipo boggy con llanta neumática)	UNIDAD	0	$ 280.000,00	$ 0,00
			Balde plástico de 25 Lt	UNIDAD	0	$ 24.000,00	$ 0,00
		Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Revisión del estado de los equipos, maquinaria pesada y vehículos	UND	2	$ 120.000,00	$ 240.000,00
6	PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL	Atención a la comunidad	Punto de atención a comunidad	MES	0	$ 850.000,00	$ 0,00
		Información y divulgación	Capacitaciones	UNIDAD	2	$ 180.000,00	$ 360.000,00
7	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	Equipos	Extintor Abc Multiproposito 10lb + Señal + Gancho	UNIDAD	0	$ 60.000,00	$ 0,00
			Camilla Fel + Gancho + Ames + Señal Indumasas	UNIDAD	0	$ 195.000,00	$ 0,00
			Inmovilizador de cabeza para camilla	UNIDAD	0	$ 60.000,00	$ 0,00
			Botiquín Morral De Primeros Auxilios dotado	UNIDAD	0	$ 150.000,00	$ 0,00

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "P.M.A"							
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"							
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "P.M.A"							
			Alquiler de baño portátil incluido mantenimiento, recolección de residuos y transportes.	7 MES	2	$ 1.281.000,00	$ 2.652.000,00
Sub-Total							$ 4.051.200,00
III.MANO DE OBRA PARA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL P.M.A							
	PRODESIONAL Y DESCRIPCIÓN		UNIDAD	DEDICACIÓN	DURACIÓN	JORNAL+FM	VALOR TOTAL
1	INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL (Elaboración de informes de implementación del P.M.A (Actas, formatos y registros)		MES	50%	2	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA							$ 3.600.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR							$ 1,70
TOTAL MANO DE OBRA P.M.A							$ 6.120.000,00
TOTAL COSTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL							$ 10.171.200,00

8. CONCLUSIONES

- ✓ En cumplimiento de sus responsabilidades, el CONSORCIO EMR-APP BELLEZA completó al 100% la entrega del punto ecológico. El objetivo de esta entrega fue instruir a los colaboradores en la clasificación correcta de los residuos sólidos, conforme a las disposiciones del nuevo código de colores.

- ✓ Se da cumplimiento al cronograma de capacitación ambiental en un 100%, realizando las capacitaciones programadas en materia ambiental.

- ✓ La tasa de accidentalidad se mantuvo en 0%. No se registraron casos de ausentismo laboral originados por accidentes relacionados con el mal manejo de materiales o residuos sólidos, deficiencias en el orden y aseo, ni por cualquier otra causa vinculada a una implementación inadecuada de los programas de manejo ambiental.

- ✓ En el periodo no se presentaron emergencias ambientales (0%) como consecuencia de las actividades constructivas, como derrames de sustancias químicas, contaminación de fuentes hídricas, entre otras.

- ✓ Se da cumplimiento de los programas de manejo ambiental propuestos para la ejecución del proyecto

ELABORO:

RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES
INGENIERO AMBIENTAL

ANEXOS
1. CAPACITACIONES
2. SOPORTES COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES
3. SOPORTES ALQUILER DE BAÑOS
4. REVISION DE MAQUINARIAS
5. VIGENCIA DE SOAT Y TECNOMECANICA VOLQUETAS

9. ANEXOS

9.1 CAPACITACIONES

	FORMATO DE ASISTENCIA	Código	GAS-FT-17
		Versión	0
		Fecha	19/05/2020
		Páginas	1 DE 1

SE VA A EVALUAR LA FORMACIÓN: NO X SI FUE EFICAZ 16/12/202

PROYECTO	CONSORCIO EHR-APP LA BELLEZA
TEMA	Riesgos Quimicos y Sustancias Peligrosas.
OBJETIVO	La Importancia de identificar y Socializar con los trabajadores y proteger la Integridad fisica y Salud de los trabajadores

X	CHARLA		BRIGADA DE EMERGENCIA		REUNION INFORMATIVA
	CAPACITACIÓN		COMITE INVESTIGADOR		OTROS
	CURSO-TALLER		COMITE DE CONVIVENCIA		LEY 50 ART. 21 SI NO
	COMITE GERENCIAL		COMITE COPASST		DURACIÓN: 15 min

EMPRESA SAFI	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
	RAFAEL WALDO ALVARADO	91453967	RAFAEL WALDO ALVARADO

Item	NOMBRE Y APELLIDO (LEGIBLE)	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diana Valentina Mann Rodriguez	1101018646	Coordinadora vial	
2	Yuren Mateus Rueda	1052736539	Ingeniero HSEQ	
3	Ingrid Dahiana Latorre Castillo	1101019038	Coordinadora vial	
4	Latorre Quintero	91390036	Maestro	
5	Hernando Sanchez Tellez	1010383343	Ay. de obra	
6	Jose Isidro Arenas	8322R559	Ayudante	
7	Luis M. Pacheco	5272883	Ayudante	
8	Juan Carlos Cano Arenas	1101019301	Ayudante	
9	Jesus Emilio A S	91691920	ayudante	
10	RAFAEL WALDO ALVARADO	91488767	Ing. Res	RAFAEL ALVA.
11	Oscar Vera Rojas	1098692455	Ing Residente	Oscar Vera.
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

NOTA DE CIERRE:

	FORMATO DE ASISTENCIA	Código:	GAS-FT-17
		Versión:	0
		Fecha:	19/03/2020
		Páginas:	1 DE 1

SE VA A EVALUAR LA FORMACIÓN:	NO X	SI ____	FUE EFICAZ: ____	23/12/2025.
PROYECTO	CONSORCIO EYR-APP-LA BELLEZA.			
TEMA	PUNTOS CIEGOS.			
OBJETIVO.	Identificar y mitigar posibles riesgos encontrados en los puntos ciegos.			

Características de la formación				Riesgos SST			
X	CHARLA		BRIGADA DE EMERGENCIA		REUNIÓN INFORMATIVA		
	CAPACITACIÓN		COMITÉ INVESTIGADOR		OTROS:		
	CURSO-TALLER		COMITÉ DE CONVIVENCIA		LEY 50 ART. 21	SI	NO
	COMITÉ GERENCIAL		COMITÉ COPASST		DURACIÓN: 15 min		

Capacitador			
EMPRESA SASI	NOMBRE: [illegible] HUMBERTO	CEDULA: [illegible]	FIRMA: [illegible] HUMBERTO.

Item	NOMBRE Y APELLIDO (LEGIBLE)	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	José Isidro Arango	8322455	Ayudante	
2	Jesus Emilio n s	6.607920	Ayudante	
3	Antonio Buitrago	93900556	Maestro	
4	[illegible] Sanchez Tellez	1010583243	Ayudante	
5	Luis A. Puentes	9772207	Residente	
6	Michel Latino Castillo	1101019708	Coordinador vial	
7	Kolen Rafael Rueda L	1005725639	Inspector HSEQ	
8	Juan Camilo Perez Quiroga	1101019326	Ayudante	
9	Edwin Mauricio Santana dorta	1101019432	Ayudante	
10	Diana Valentina Mora Rodriguez	1101019146	[illegible]	
11	Oscar Vera Rojas	1098672255	Ing Residente	Oscar Vera.
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

NOTA DE CIERRE:	

9.2 SOPORTE COMPRA DE INSUMOS

BARBOSA, 27 DE FEBRERO DEL 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO EMR – APP BELLEZA
NIT. 901.949.762-6

DEBE A:

PAOLA ANDREA SANABRIA GARCIA
NIT: 1098765770-3

La suma de SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($670.000,00); por concepto de SUMINISTROS DE LOS SIGUIENTES INSUMOS

1. SUMINISTRO DE 40 METROS CUADRADOS DE PLASTICO NEGRO
2. SUMINISTRO DE 60 METROS CUADRADOS DE TELA VERDE DE 2 M DE ANCHO
3. SUMINISTRO DE 300 BOLSAS DE BASURA

POR FAVOR, REALIZAR LA TRANSFERENCIA AL NUMERO DE CUENTA BANCARIA 780-696790-63 AHORROS BANCOLOMBIA, LA CUAL ESTA A MI NOMBRE

Cordialmente,

PAOLA ANDREA SANABRIA GARCIA
CC. 1.098.765.770

9.3 SOPORTE COBRO BAÑOS

BARBOSA, 02 DE MARZO DEL 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO EMR – APP BELLEZA
NIT. 901.949.762-6

DEBE A:

PAOLA ANDREA SANABRIA GARCIA
NIT: 1098765770-3

La suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($2.652.000,00); por concepto de ALQUILER DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO.


POR FAVOR, REALIZAR LA TRANSFERENCIA AL NUMERO DE CUENTA BANCARIA 780-696790-63 AHORROS BANCOLOMBIA, LA CUAL ESTA A MI NOMBRE


Cordialmente,


Paola Sanabria.

PAOLA ANDREA SANABRIA GARCIA
CC. 1.098.765.770

9.4 REVISION MAQUINARIA

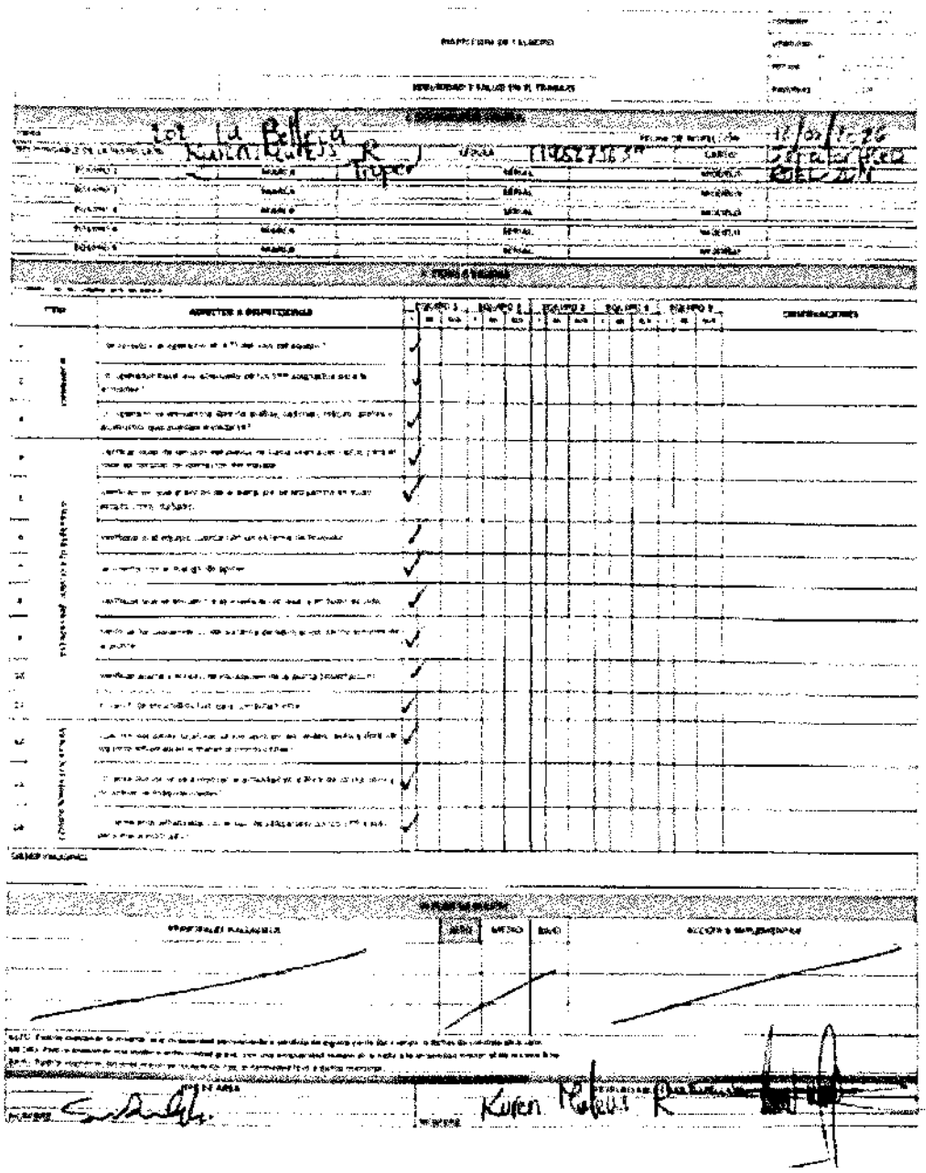

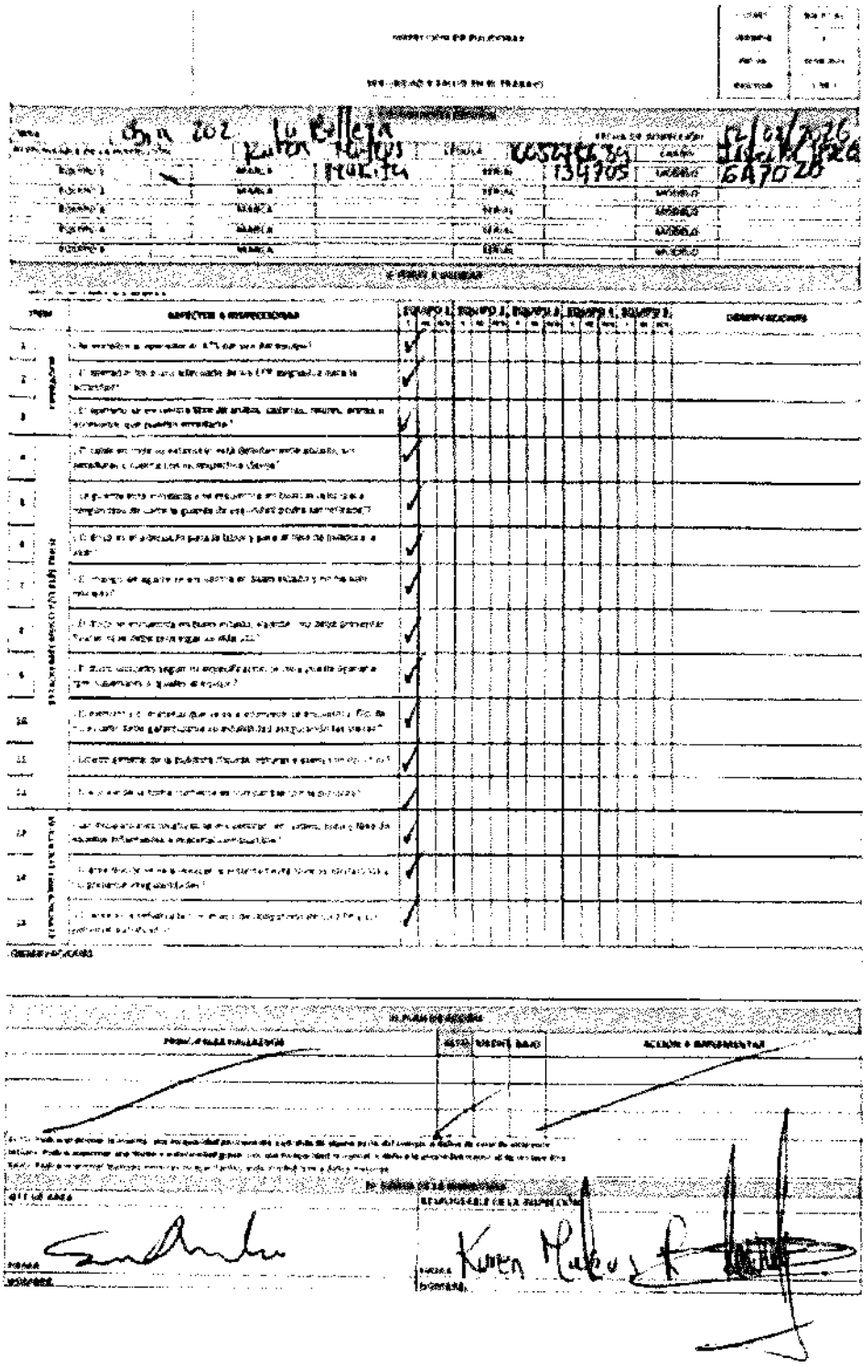

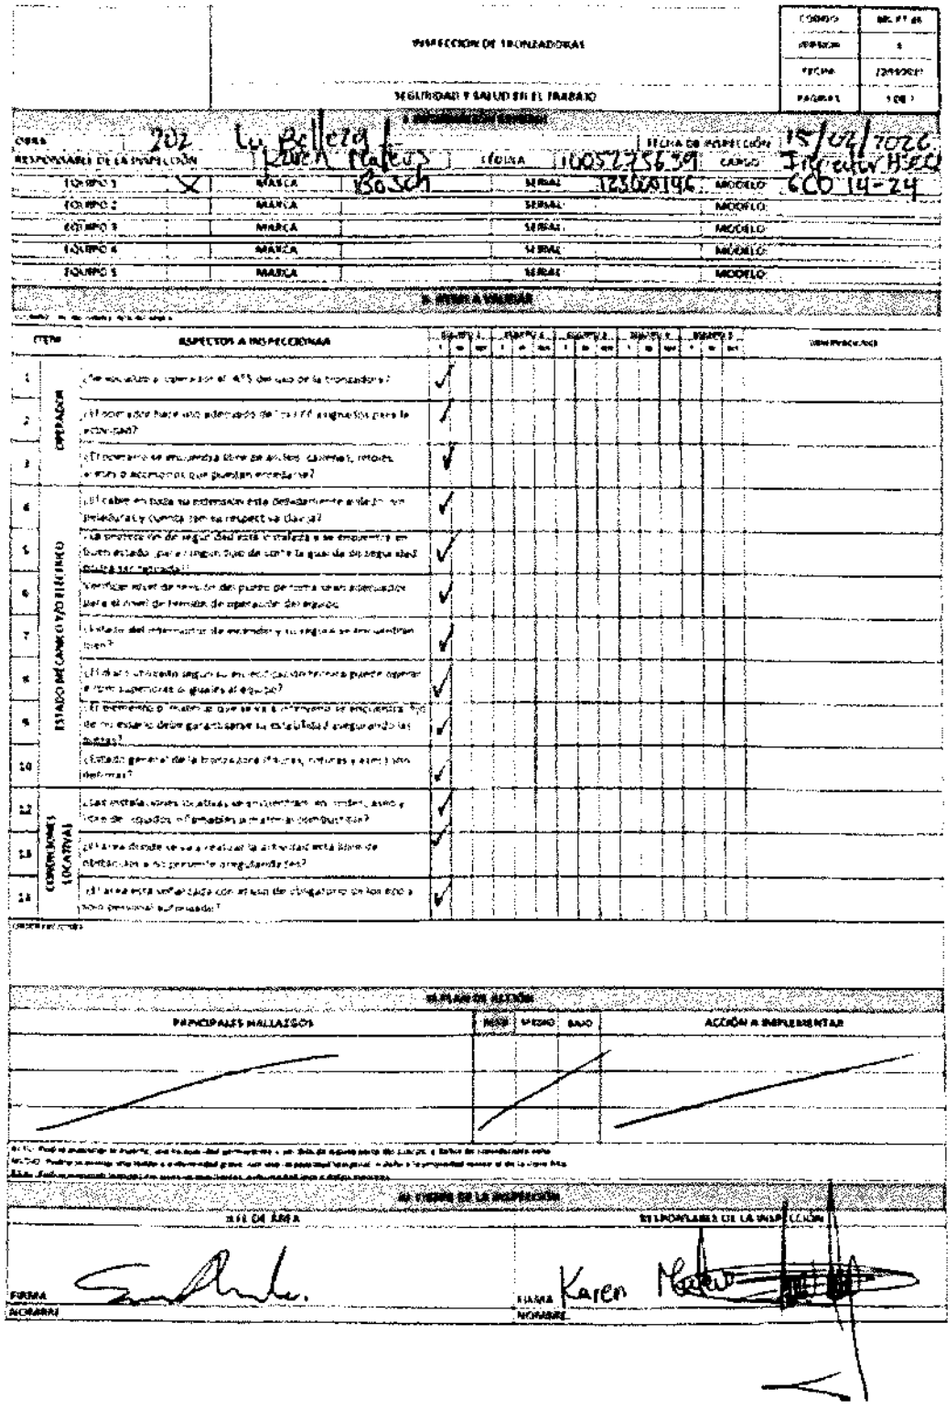

INSPECCION DE TRONCADORAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-CCP-RG-76
VERSIÓN: 1
FECHA: 26/11/2024
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: 202
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Laura Mateus
CÉDULA: 1005275539
FECHA DE INSPECCIÓN: 15/04/2026
CARGO: Ingeniero HSEQ

EQUIPO 1	X	MARCA: Bosch	SERIAL: 123008196	MODELO: GCO 14-24
EQUIPO 2		MARCA:	SERIAL:	MODELO:
EQUIPO 3		MARCA:	SERIAL:	MODELO:
EQUIPO 4		MARCA:	SERIAL:	MODELO:
EQUIPO 5		MARCA:	SERIAL:	MODELO:

1. ITEMS A VALORAR

ITEM		ASPECTOS A INSPECCIONAR	Equipo 1 B	Equipo 1 M	Equipo 1 A	Equipo 2 B	Equipo 2 M	Equipo 2 A	Equipo 3 B	Equipo 3 M	Equipo 3 A	Observaciones
1	OPERACIÓN	¿Se encuentra operando el 40% de uso de la troncadora?	✓									
2		¿El operario hace uso adecuado de las EPP asignados para la actividad?	✓									
3		¿El operario se encuentra libre de anillos, cadenas, relojes, o ropa holgada que puedan enredarse?	✓									
4	ESTADO MECÁNICO/ELÉCTRICO	¿El cable eléctrico se encuentra en buen estado sin peladuras y cuenta con su respectiva clavija?	✓									
5		La protección de seguridad está instalada y se encuentra en buen estado, para evitar el contacto de la mano del operario con la hoja de sierra?	✓									
6		Verificar nivel de aceite en el puesto de corte con el indicador para el nivel de aceite de operación del equipo.	✓									
7		¿El estado del interruptor de encendido y su seguro se encuentran bien?	✓									
8		¿El área cuenta con espacio suficiente para poder operar el ítem suspendido o guiado al equipo?	✓									
9		El operario de manera segura se encuentra en una posición fija de tal manera que no exista riesgo de caída?	✓									
10		¿Estado general de la troncadora (fisuras, roturas y ajustes) son adecuados?	✓									
11	CONDICIONES LOCATIVAS	¿Las instalaciones locativas cuentan con orden, aseo y zona de equipos e información para el desplazamiento?	✓									
12		¿El área donde se va a realizar la actividad está libre de obstrucción o no permite aglomeración?	✓									
13		¿El área está señalizada con el uso de elementos de los EPP a todo personal autorizado?	✓									

OBSERVACIONES

2. PLAN DE ACCIÓN


PRINCIPALES HALLAZGOS	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR


NOTA: Puede presentar la queja, sea la que sea del procedimiento o en caso de requerirlo de manera [illegible]


NOTA: Puede presentar una queja o reclamación para con una de nuestras empresas o sobre la propiedad horizontal de la obra [illegible]

3. CIERRE DE LA INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE: Karen

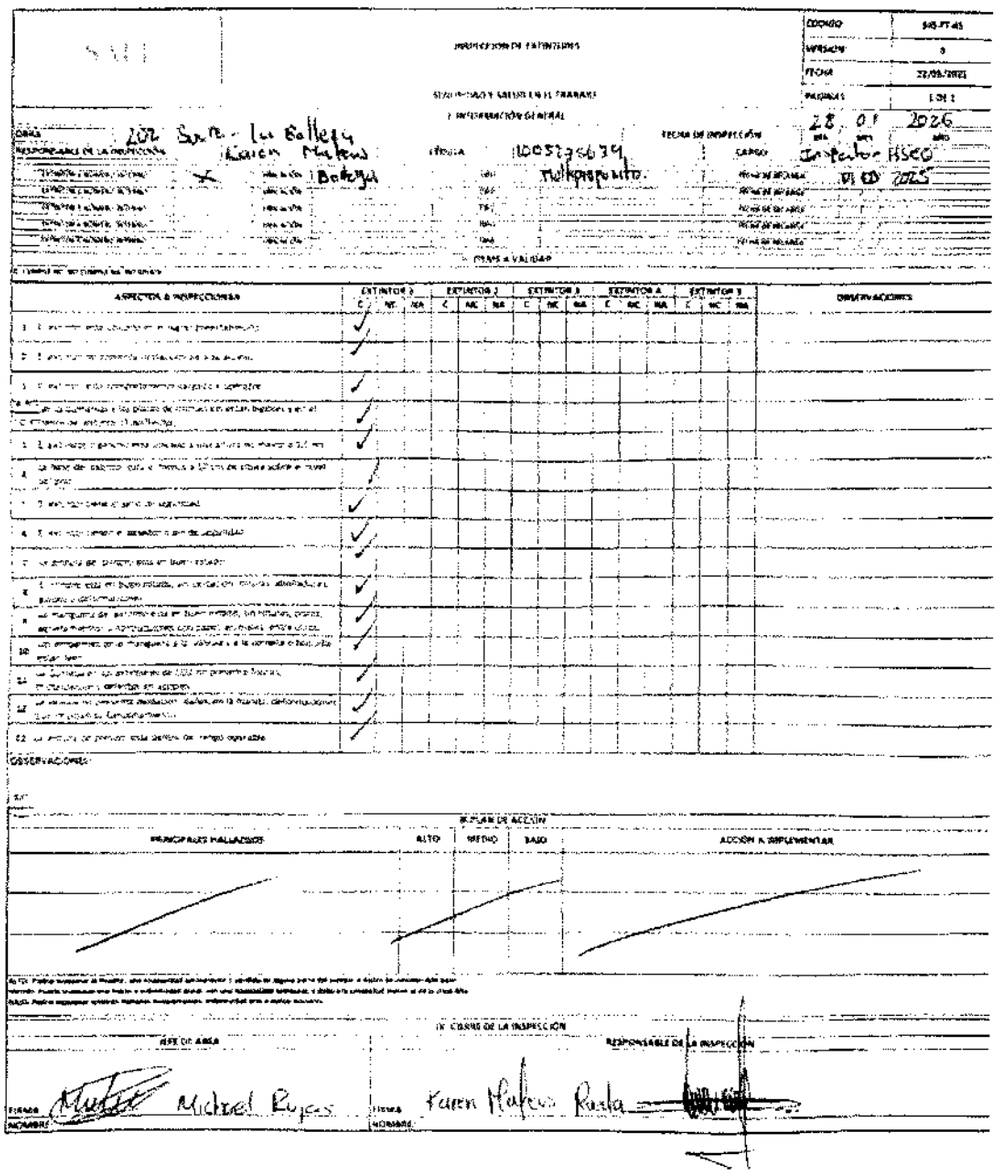

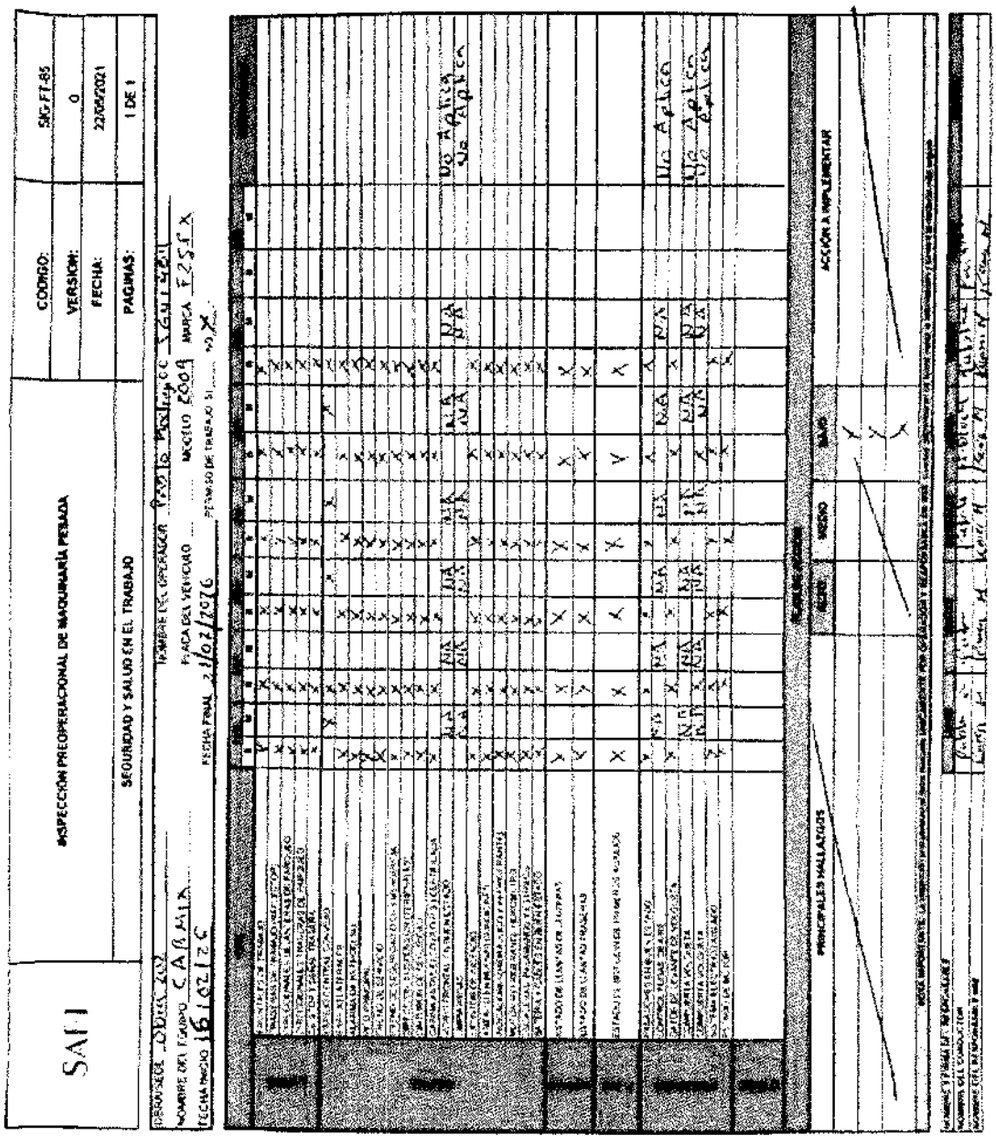

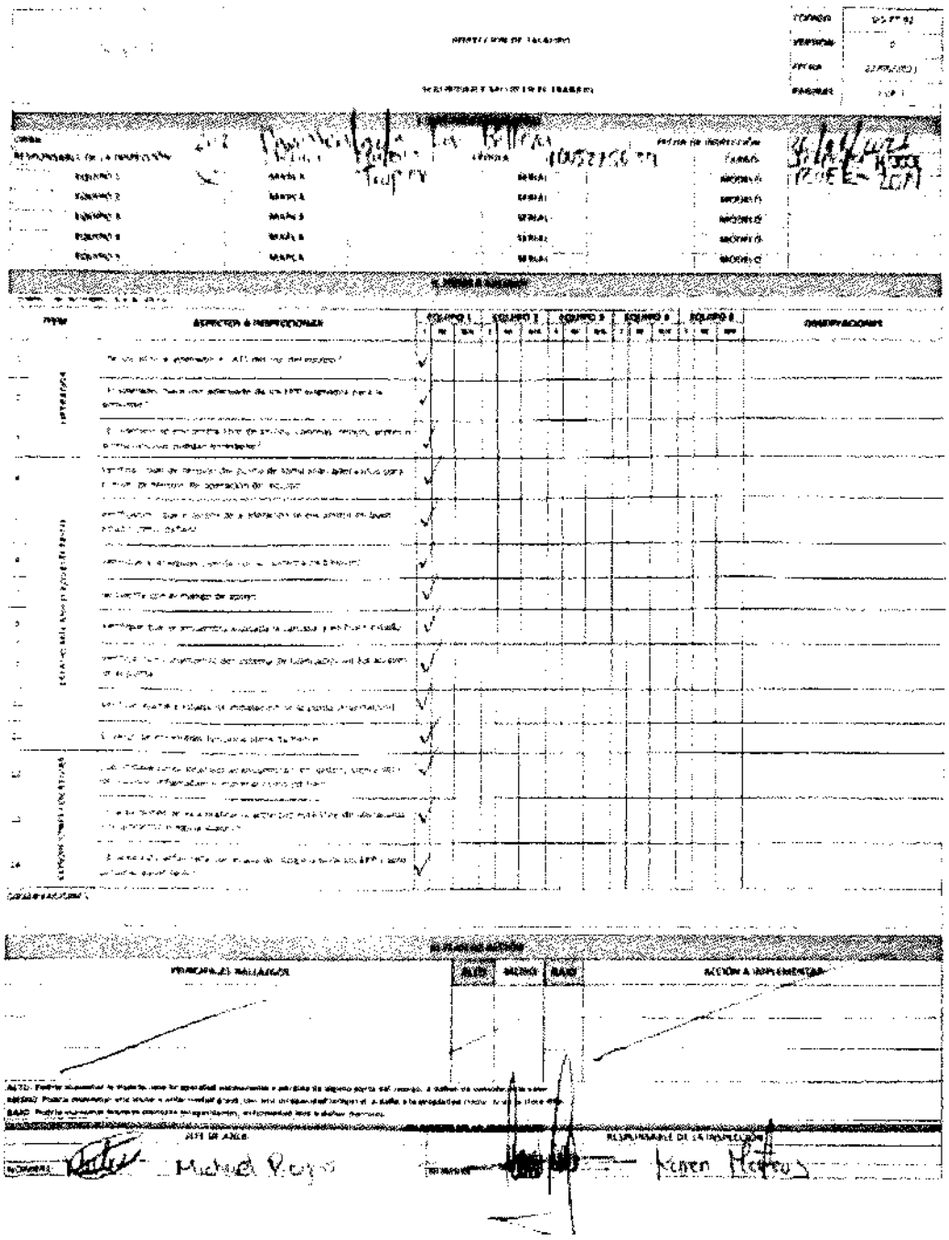

9.5 VIGENCIA SOAT Y TECNOMECANICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

DATOS CENTRO DIAGNOSTICO

Entidad que expide el certificado:

NIT:

No. de Certificado de Acreditación:

Fecha de expedición:

Fecha de vencimiento:

DATOS VEHÍCULO

PLACA:

CLASE:

MARCA:

MODELO:

SERVICIO:

COMBUSTIBLE:

CILINDRAJE:

NRO. MOTOR:

NRO. CHASIS:

VIN:

LÍNEA:

COLOR:

NOMBRE PROPIETARIO:

FIRMA DEL RESPONSABLE

10/25, 10:46 a. m. SimitPatrulla

Señor usuario la información suministrada no constituye un concepto jurídico frente a dichos resultados por favor tomar ajustes con la autoridad de tránsito ante la cual solicita su tramite.

	XHB800		
	10031636078		ACTIVO
	Público		VOLQUETA

Información general del vehículo

	CHEVROLET		KODIAK190
	2007		BLANCO ARCO BICAPA
	9GDV7H4C47B006755		35205083
	9GDV7H4C47B006755		
	7200		PLATON
	DIESEL		07/07/2008
	STRIA MCPAL TTOyTTE		NO

©Copyright 2026 RUNT

10/25, 10:46 a. m. SimitPatrulla

	NO		
	NO		
	NO		
	NO		2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

35L-0000002	25 02 2026	24/02/2026	25/02/2027	[illegible] SEGUROS SA	733	VIGENTE
140 99 M1002490	27 12 2025	28/12/2026	31 12 2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	350	NO VIGENTE

©Copyright 2026 RUNT

[illegible]	WOV260		
[illegible]	1002575937	[illegible]	ACTIVO
[illegible]	Público	[illegible]	VOLQUETA

[illegible]

[illegible]	CHEVROLET	[illegible]	FVR
[illegible]	2023	[illegible]	BLANCO
[illegible]	9GDFVR346PB001003	[illegible]	6HK1-256473
[illegible]	9GDFVR346PB001003	[illegible]	9GDFVR346PB001003
[illegible]	7790	[illegible]	PLATON
[illegible]	DIESEL	[illegible]	14/06/2022
[illegible]	INSP MCPAL TTO Y TTE SAN GIL	[illegible]	SI
[illegible]	NO	[illegible]	NO
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	1

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Codigo tarifa	Estado
4000080255	12/12/2025	13/12/2025	12/12/2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	321	VIGENTE
4000055524	30/10/2024	31/10/2024	30/10/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	321	NO VIGENTE
156515007417S0	17/07/2023	18/07/2023	17/07/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	320	NO VIGENTE
83529605	07/06/2022	08/06/2022	07/06/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	320	NO VIGENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÈCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 186935878

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CHICAMOCHA

NIT: 900222796 **No. de Certificado de Acreditación:** 10-CIN-006-001

Fecha de expedición: 2026/01/15 **Fecha de vencimiento:** 2027/01/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WDV260 **CLASE:** VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET **MODELO:** 2023

SERVICIO: Público **COMBUSTIBLE:** DIESEL

CILINDRAJE: 7790 **NRO. MOTOR:** 6HK1-256473

NRO. CHASIS: 9GDFVR346PB001003 **VIN:** 9GDFVR346PB001003

LÍNEA: FVR

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: CORPORACION INGESEM "IDEAS QUE CONSTRUYEN FUTURO"

FIRMA DEL RESPONSABLE

REYNEL SOSA VARGAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141193637971

(415)7707212489984(8020) 000014119363797 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 6 5 7 7 0	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1098765770	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANABRIA	GARCIA	PAOLA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CR 17 A 58 95 AP 1601

42. Correo electrónico: paolasanabriag@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 2 5 0 2 6 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 1 4 0 2 0 3	4 9 2 3	2 0 2 0 0 4 0 1	4 6 6 3	4 7 5 3	5 1 3 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SANABRIA GARCIA PAOLA ANDREA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-07-2025 05:11:17PM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PAOLA ANDREA SANABRIA GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098765770
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36644585
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36644585
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.406.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 176.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.406.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.300	$ 225.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.406.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.300	$ 34.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.600	$ 435.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2026

Certificación ICA.

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

CERTIFICACION TRIBUTARIA

Los suscritos **WILMER ANDRÉS GARCÍA RUIZ** identificado con Cédula de ciudadanía No. 1.114.119.732 de Bolívar, Valle del Cauca, actuando en representación legal del **CONSORCIO EMR-APP BELLEZA**" con Nit. 901.949.762-6, **LYDA PAOLA SIERRA GOMEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.652.414 de San Vicente de Chucurí, tarjeta profesional 152511-T, actuando en calidad de **REVISOR FISCAL** y **CHAROL MICHELLE CONCHA CORDOBA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.095.833.559 de Floridablanca y con tarjeta profesional 295076-T, actuando en calidad de **CONTADOR PUBLICO** del **CONSORCIO EMR-APP BELLEZA**.

CERTIFICAN QUE,

La empresa **CONSORCIO EMR-APP BELLEZA,** es responsable del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Sucre – Santander

MUNICIPIO	CODIGO	ACTIVIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL EJECUTADO
SUCRE	7110	Actividades profesionales, científicas y técnicas	4*1000	$ 910.539.243,00

Se expide a solicitud de la Gobernación de Santander, a los tres (03) días del mes de marzo de 2026.

WILMER ANDRES GARCIA RUIZ
CC. 1.114.119.732
R/L UNION TEMPORAL PUENTE VEHICULAR VELEZ

CHAROL MICHELLE CONCHA CORDOBA
CC. 1.095.833.559
Contador Publico
TP. 295076-T



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES


295076-T

CHAROL MICHELLE
CONCHA CORDOBA
C.C. 1065833559
RES. INSCRIPCION 757 DEL 28/03/2022
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

318067

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

320624

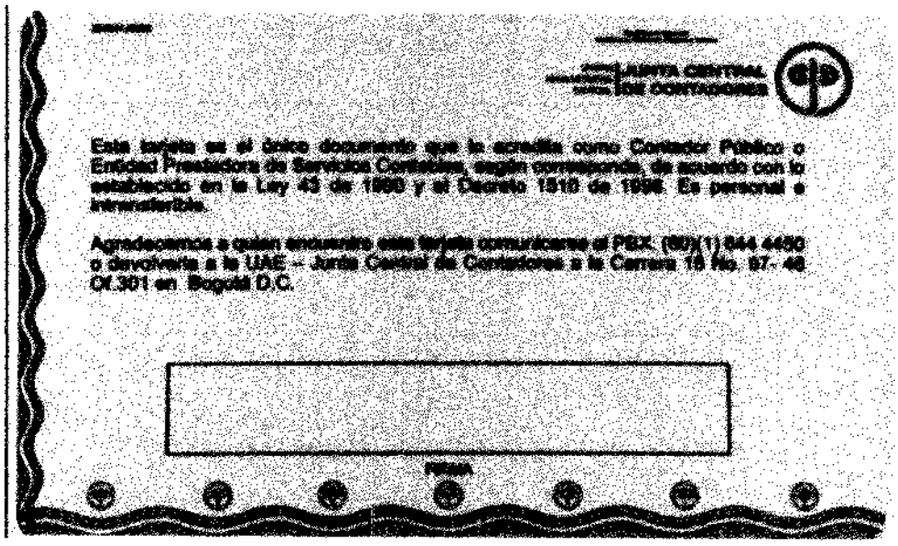

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 15 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.095.833.559
CONCHA CORDOBA

CHAROL MICHELLE





31-MAY-1997
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

1.60 A+ F

DE JUN-2015 FLORIDABLANCA

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

8 B E 2 7 1 3 6 B F C 5 8 4 9 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CHAROL MICHELLE CONCHA CORDOBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1095833559 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 295076-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición

SANDRA MILENA RAMIREZ OTALORA
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

Ensayos de Laboratorio.

FWF GEOINGENIERIA S.A.S.
NIT: 900780113-4

PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO
METODO DEL CONO DE ARENA
NORMA INVIAS E-161

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRIGIDO:	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA
MUNICIPIO:	LA BELLEZA - SANTANDER

IDENTIFICACION DEL MATERIAL:

Descripción:	SUB BASE UNICA CAPA				
Procedencia:	CANTERA - MONIQUIRÁ				
Localización:	VÍA LA BELLEZA - SUCRE				
Densidad Máx. Laboratorio [kN/m3]:	21,075	2,149	g/cm^3	**Fecha del ensayo:**	13-feb.-26
Humedad Optima de Laboratorio [%]:	6,40	Fecha	13/02/2026	**%Compactación Especificado:**	98,0

DENSIDAD EN EL TERRENO

ENSAYO NUMERO	1	2	3			
Abscisa toma de Muestra [Km]:	INDICADO	INDICADO	INDICADO			
Margen toma de Muestra:	DERECHO	IZQUIERDO	IZQUIERDO			
Profundidad [cm]:	12	12	12			
Tipo de Capa:	SUB BASE	SUB BASE	SUB BASE			
Peso Frasco y Arena Inicial [gr]:	5734	5738	5704			
Peso Frasco y Arena Restante [gr]:	2290	2402	1999			
Peso Arena Total Usada [gr]:	3444	3336	3705			
Constante del Cono:	1688	1688	1688			
Peso Arena en el Hueco [gr]:	1756	1648	2017			
Densidad de la Arena [gr/cm^3]:	1,40	1,40	1,40			
Volumen del Hueco [cm^3]:	1254	1177	1441			
Peso Material Extraído Humedo [gr]:	2926	2776	3340			
Peso Humedo Material Retenido 3/4" [gr]:	438	278	396			
Peso Especifico Material Retenido 3/4" [gr/cm3]:	2,730	2,730	2,730			
Volumen Material Retenido 3/4" [cm3]:	160,4	101,8	145,1			
Porcentaje Particulas Gruesas >3/4"	15,0	10,0	11,9			
Volumen Material Pasa 3/4" [cm3]:	1094	1075	1296			
Peso Material Humedo Pasa 3/4" [gr]:	2488	2498	2944			
Humedad [%]:	6,3	6,5	6,0			
Peso Material Extraido Seco [gr]:	2341	2346	2777			
Peso unitario seco Material Extraido kN/m3	22,3	22,8	22,3			
Densidad del Material [gr/cm^3]:	2,275	2,323	2,272			
Densidad Seca del Material [kN/m^3]:	20,98	21,39	21,02			
% Compactación Terreno:	**99,6**	**101,5**	**99,7**			
% Humedad en el Terreno:	6,3	6,5	6,0			

OBSERVACIONES

La humedad del terreno se calcula por medio de equipo Humedometro

Compactación promedio de lote: **100,27%** **Conforme, se puede liberar lote.**

	ELABORÓ		APROBO	
FIRMA			FIRMA	
NOMBRE	MIGUEL ARENAS		NOMBRE	ING. LUIS FERNANDO RANGEL V
CARGO	LABORATORISTA		CARGO	DIRECTOR DEL LABORATORIO

PESO UNITARIO SECO EN EL SITIO kN/m3

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 901730122-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y SUPERVISION

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO	LA BELLEZA - SANTANDER
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA
RESISTENCIA DE DISEÑO:	f´c = 4000 Psi. CONCRETO CLASE C (280 Kg/cm2)

FECHA INFORME:	11/03/26
LUGAR	PLACA EN CONCRETO

No. Cilindro	Tipo Estructura	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Edad Días	Diámetro (Cm)	Altura (Cm)	Peso (g)	Área (Cm^2)	Densidad (kg/cm^3)	Carga (kG)	R: L/d	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/Cm^2)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Psi)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (%)	PROYECCIÓN 28 Días	Tipo de Falla
1	MR - 40	25/02/26	11/03/26	14	15,20	30,20	12950	181,46	2363	46960	1,99	**258,79**	**3680,89**	**92,02**	**4278,01**	T3
					15,20	30,20										
2	MR - 40	25/02/26	11/03/26	14	15,15	30,20	15888	180,86	2909	49300	1,99	**272,58**	**3877,05**	**96,93**	**4505,99**	T2
					15,20	30,20										

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	4185	MODELO	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	No. DE SERIE EQ.	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. LUIS FERNANDO RANGEL V
M.P 25202-322135 CND

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 6-02 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3144615974 - 3007438812 -3115399142

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730193-6
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, DISEÑO Y OBRAS CIVILES

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO	LA BELLEZA - SANTANDER
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA
RESISTENCIA DE DISEÑO:	f´c = 4000 Psi. CONCRETO CLASE C (280 Kg/cm2)
FECHA INFORME:	14/03/26
LUGAR	

No. Cilindro	Tipo Estructura	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Edad Días	Diámetro (Cm)	Altura (Cm)	Peso (g)	Área (Cm^2)	Densidad (kg/cm^3)	Carga (kG)	R: L/d	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	PROYECCIÓN 28 Días	Tipo de Falla
1	MR 40	21/02/26	02/03/26	9	15,10	30,00	12899	179,08	2397	39110	1,99	**218.40**	**3106,32**	**77.66**		T4
					15,10	30,10										
2	MR 40	21/02/26	07/03/26	14	15,10	30,00	12877	179,08	2393	43900	1,99	**245.14**	**3486,76**	**87.17**		T4
					15,10	30,10										
3	MR 40	21/02/26	14/03/26	21	15,00	30,00	12856	177,89	2405	49600	2,00	**278.82**	**3965,71**	**99.14**		T4
					15,10	30,10										

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	4185	MODELO	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	No. DE SERIE EQ.	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. LUIS FERNANDO RANGEL V
M.P 25202-322135 CND

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 6-02 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3144615974 - 3007438812 -3115399142

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900756128-6
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO	LA BELLEZA - SANTANDER
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA
RESISTENCIA DE DISEÑO:	f´c = 4000 Psi. CONCRETO CLASE C (280 Kg/cm2)
FECHA INFORME:	18/03/26
LUGAR	CILINDROS DE PRUEBA

No. Cilindro	Tipo Estructura	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Edad Dias	Diámetro (Cm)	Altura (Cm)	Peso (g)	Área (Cm^2)	Densidad (kg/cm^3)	Carga (kG)	R: L/d	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	PROYECCIÓN 28 Dias	Tipo de Falla
1	MR 40	18/02/26	18/03/26	28	14,70	29,00	13145	180,27	2411	59760	2,00	**331.51**	**4715.17**	**117,86**		
					14,80	30,00										
2	MR 40	18/02/26	18/03/26	28	15,00	30,00	12199	174,37	2332	55410	2,01	**317.78**	**4519.89**	**113.00**		
					14,80	30,00										

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	4185	MODELO	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	No. DE SERIE EQ.	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. LUIS FERNANDO RANGEL V
M.P 25202-322135 CND

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 6-02 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3144615974 - 3007438812 -3115399142

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900430129-6
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO	LA BELLEZA - SANTANDER
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EMR - APP BELLEZA
RESISTENCIA DE DISEÑO:	f´c = 4000 Psi. CONCRETO CLASE C (280 Kg/cm2)

FECHA INFORME:	02/02/26
LUGAR	DISIPADOR

No. Cilindro	Tipo Estructura	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Edad Días	Diámetro (Cm)	Altura (Cm)	Peso (g)	Área (Cm^2)	Densidad (kg/cm^3)	Carga (kG)	R: L/d	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/Cm^2)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Psi)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (%)	PROYECCIÓN 28 Días	Tipo de Falla
1	**DISIPADOR**	02/02/26	02/03/26	28	15,20	30,20	12800	181,46	2336	57400	1,99	**320,53**	**4559,00**	**113,98**		T3
					15,20	30,20										
2	**DISIPADOR**	02/02/26	02/03/26	28	15,15	30,20	12880	180,86	2399	59600	1,99	**322,81**	**4733,74**	**118,34**		T2
					15,20	30,20										

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	4185	MODELO	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	No. DE SERIE EQ.	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. LUIS FERNANDO RANGEL V
M.P 25202-322135 CND


LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 6-02 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3144615974 - 3007438812 -3115399142

Informe de topografía.

INFORME DE TOPOGRAFIA

CONTRATISTA: CONSORCIO EMR-APP LA BELLEZA

"MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

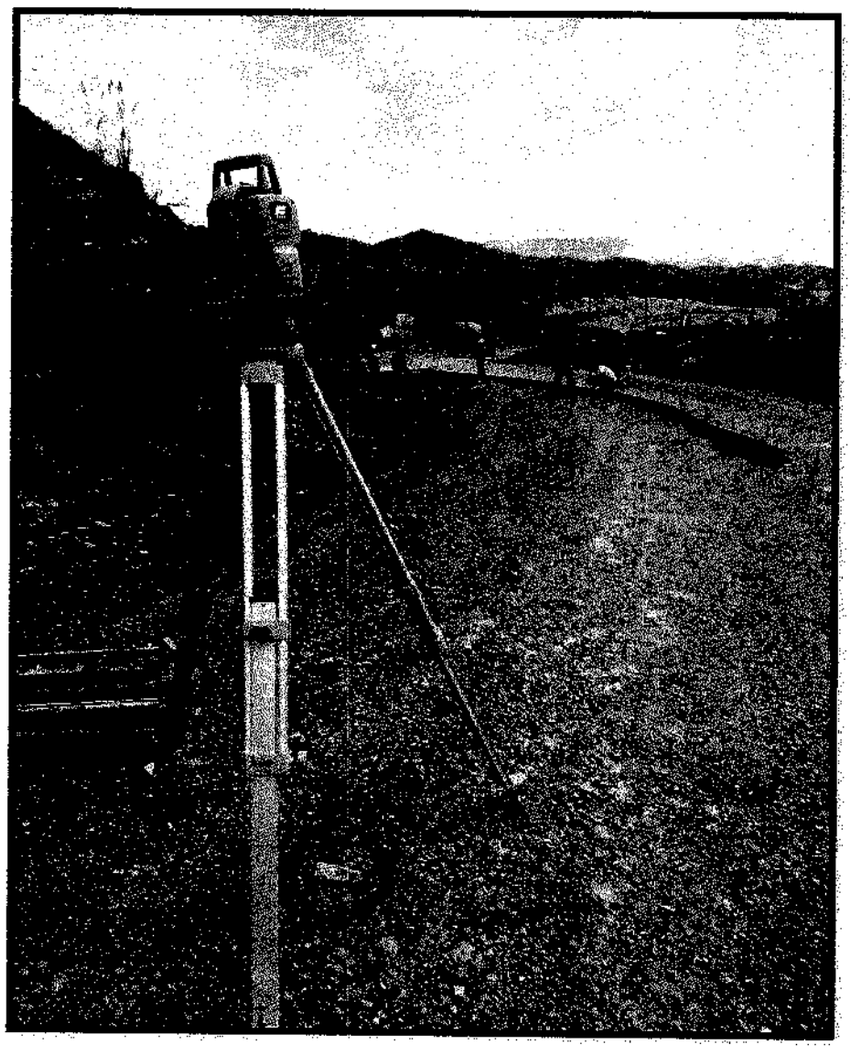

MUNICIPIOS DE SUCRE Y LA BELLEZA

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
2.1. General 4
2.2. Específicos 4
3. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO 5
4. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS 6
5. PERSONAL Y EQUIPOS 7
5.1. CALIBRACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS 7
6. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA 8
6.1. PUNTOS DE AMARRE 8
7. ACTIVIDADES GENERALES 9
8. VOLUMENES TOTALES DE CONCRETO 11
2. VOLUMENES DE MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN 27
3. VOLUMENES DE MEJORAMIENTO CON SUBBASE 27
4. VOLUMENES TOTALES DE MEJORAMIENTO SUBBASE Y PEDRAPLEN 27
6. VOLUMENES DE EXCAVACION Y RELLENO 30
ANEXOS 32

LISTADO DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN *TRAMO 1* 5
ILUSTRACIÓN 2. *LOCALIZACION TRAMO 2* 5

1. INTRODUCCION

Este informe presenta las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA-SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".** Los trabajos realizados según los estándares técnicos establecidos abarcaron tanto tanto las actividades constructivas como el levantamiento de información necesaria para el cálculo de las cantidades ejecutadas.

Entre las actividades ejecutadas se encuentran:

- Excavaciones y rellenos Tramo 1 entre abscisas km 0+080 y km 0+110.

- Volumen de concreto Tramo 1 entre abscisas km0+230 y km0+340 (carril derecho sin sobreanchos).

- Volumen de concreto Tramo 2 entre abscisas km0+00 - km0+180 y entre km0+230 – km0+340.

2. OBJETIVOS

2.1. General

Ejecutar los trabajos topográficos requeridos para el correcto desarrollo del proyecto de mejoramiento de la vía La Belleza – Sucre, en el departamento de Santander, incluyendo la realización de levantamientos topográficos de detalle, control planimétrico y altimétrico, verificación, materialización y replanteo del eje y secciones transversales, identificación y control de puntos críticos, así como la localización, control y seguimiento de las obras de drenaje y demás estructuras asociadas al corredor vial, garantizando que las actividades de mejoramiento de la subrasante y conformación de la estructura del pavimento se ejecuten conforme a los diseños aprobados, asegurando la estabilidad, capacidad portante y seguridad de la vía.

2.2. Específicos

- Realizar levantamientos topográficos de detalle a lo largo del tramo vial, con el fin de establecer el control planimétrico y altimétrico del proyecto, identificar y verificar puntos críticos, y garantizar la correcta ejecución de las obras conforme a los planos, diseños y especificaciones técnicas aprobadas.

- Replantear y verificar permanentemente las cotas, alineaciones y secciones transversales de la vía durante el desarrollo de las diferentes fases constructivas, asegurando la correcta conformación, nivelación y disposición de las capas estructurales del pavimento.

3. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto de mejoramiento vial se encuentra localizado en el departamento de Santander, y tiene como objetivo el mejoramiento de la via La Belleza – Sucre, comprendido en dos tramos:

- **TRAMO 1:**

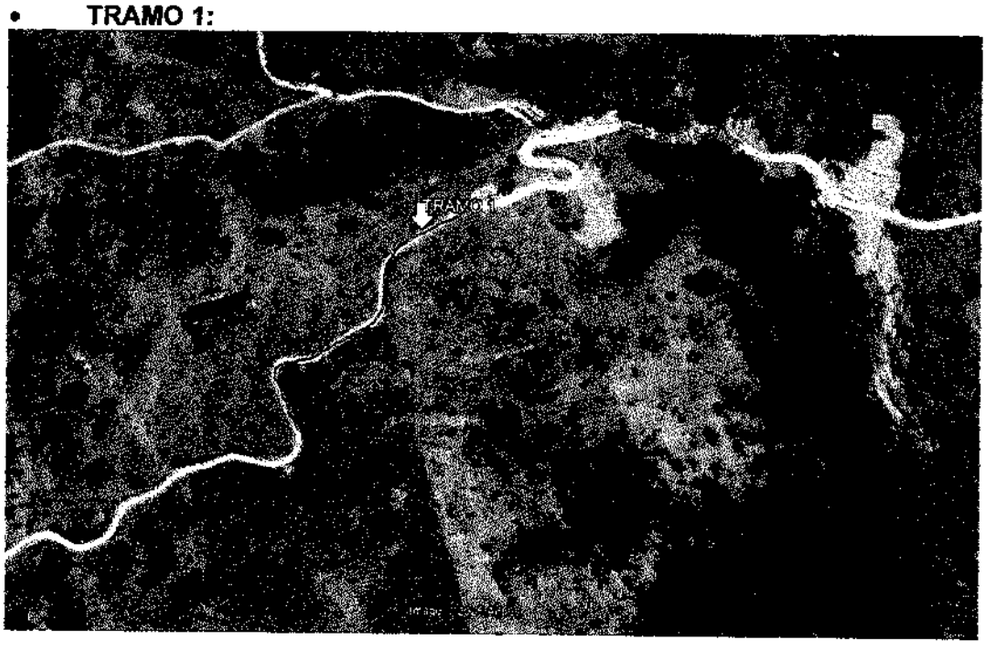


ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN *TRAMO 1*

Fuente: Google maps

- **TRAMO 2:**


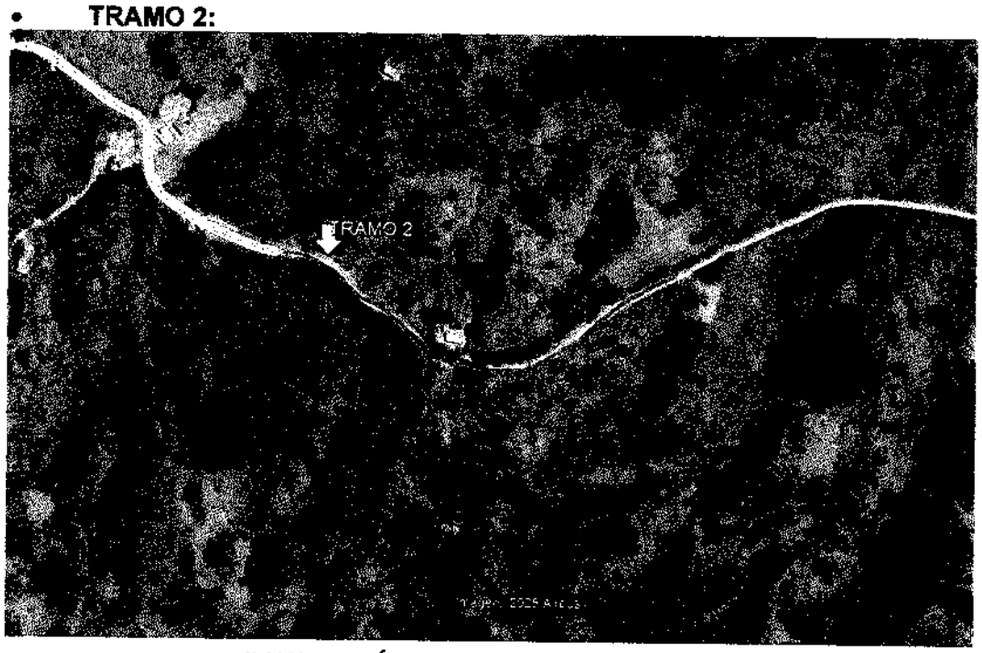


ILUSTRACIÓN 2. *LOCALIZACION TRAMO 2*

Fuente: Google maps

4. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS

La metodología utilizada en los trabajos realizados se presenta en el siguiente esquema:

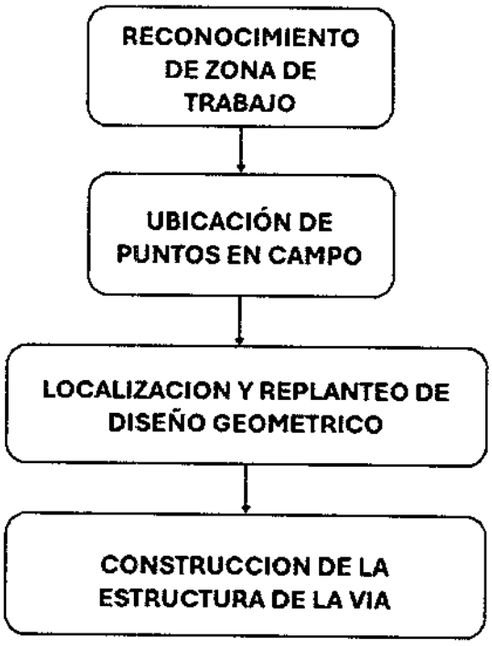

5. PERSONAL Y EQUIPOS

- 1 topógrafo profesional
- 1 auxiliar de topografía
- 1 estación total
- Herramienta menor y accesorios de equipos topográficos
- 1 computador con software y hardware requeridos

5.1. CALIBRACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

- ESTACION TOTAL TOPCON

ISA MEGATECH SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN # IS 1924

OTORGADO A: CONSORCIO EMR- APP BELLEZA

NIT: 901.949.762-6 Fecha: 04 de octubre de 2025

TIPO DE INSTRUMENTO:	**ESTACION**	**NUMERO DE SERIE:**	**U80287**
MARCA:	**TOPCON**	**PRECISION:**	**5"**
REFERENCIA:	**GPT-3205NW**	**OTROS:**	

Servido el día cuatro (04) de Octubre del año 2025, se recibe en nuestro laboratorio el equipo anteriormente descrito para proceder a su patrona miento y calibración

- **Chequeo del sistema óptico mecanico y electronico**

Sistema optico movil de enfoque	Buen estado	**Nivel Tubular (Nivel de Alidada)**	Centrado
Lente optico y lente ocular	Buen estado	**Plomada óptica (Laser)**	Centrada
Reticulo estadimétrico (Cruz filar)	Almacado	**Verticalidad en su recorrido**	Buen estado
Sistema de nivelación (base/tornillos)	Buen estado	**Movimiento eje Hz (Lectura angular)**	Buen estado
Tornillos movimiento Hz y V (Frenos)	Buen estado	**Movimiento eje V (Lectura angular)**	Buen estado
Nivel esférico (ojo de pollo)	Centrado	**Colimador guia a objetivo**	Almacado

- **Chequeo del sistema electrónico de medida (EDM)**

Sistema de nivelacion (Compensadores)	Calibrados	**Contactos porta bateria**	Buen estado
Haz de luz, guia y/o puntero laser	Almacado	**Cargador y Bateria**	Buen estado
Parametros generales de Configuración	Correctos	**Constantes de medicion**	correctas
Pantallas y teclados	Buen funcionamiento	**Control de distancia**	Controladas y estables
Puerto RS232 (USB, SD y/o Bluetooth)	Buen funcionamiento	**Transferencia de datos**	Buen estado
Sensores de lectura	Buen estado	**Lectura angular**	Controladas y estables

- **Lectura de chequeo de ángulo vertical a la llegada con un error promedio de: 00°22"**
  Lectura frontal de chequeo: **90°00'00"** y opuesta promedio de: **270°00'22"**
  Calibrado y corregido a. Lectura frontal: 90°00'00" y opuesta 270°00'00"

- **Lectura de chequeo de ángulo Horizontal a la llegada con un error promedio de: 07"**
  Lectura frontal de chequeo: **0°00'00"** y opuesta promedio de: **180°00'07"**
  Calibrado y corregido a. Lectura frontal 0°00'00" y opuesta: 180°00'00"

ISA MEGATECH, certifica que el equipo se entrega funcionando en optimas condiciones de operatividad segun parametros de fabricacion y recomienda a su operario chequeos constantes en su lugar de trabajo, correcto transporte y almacenamiento. "Vigencia del certificado de seis (6) meses a partir de la fecha"

Nota: Estos puede llamar a nuestras instalaciones y verificar la validez del presente certificado

Firma y Sello

Cr 24 No. 103-08 Provenza - Bucaramanga
3004182550- 3158302271 isamegatech.sas@gmail.com

6. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA

Previo al inicio de las actividades del mejoramiento de vial, se realizo un reconocimiento de las áreas involucradas en el proyecto. Esta actividad permitió identificar las condiciones generales del corredor vial La Belleza – Sucre, durante este reconocimiento se verificaron los puntos de referencia existentes, con el fin de asegurar que el terreno estuviera adecuado para las actividades de replanteo y construcción que seguirán conforme al diseño.

6.1. PUNTOS DE AMARRE

Los puntos de amarre para el replanteo del proyecto fueron tomados a partir de los diseños entregados por la consultoría. Se utilizaron los puntos GPS1, GPS2, GPS3 y GPS4 para el replanteo y control de obra en el tramo 1.

Estos puntos fueron fundamentales para asegurar la precisión de coordenadas y alineamiento del trazado, a partir de los cuales se han realizado las actividades mencionadas en campo, garantizando que las obras se desarrollen conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

7. ACTIVIDADES GENERALES

7.1. Desmonte y Limpieza

- **Limpieza del terreno:** Se ejecutaron las labores de desmonte y limpieza, retirando la capa vegetal, rastrojo, desechos y materiales orgánicos. Esta actividad se realizó con el fin de garantizar la estabilidad de la subrasante y evitar la contaminación de las capas estructurales.

7.2. Excavación para Explanaciones

- **Excavación hasta cota de subrasante:** Se realizaron excavaciones en material común para alcanzar los niveles de diseño en los sectores de filtros y mejoramiento con pedraplén. El proceso se realizó conforme a los alineamientos y perfiles indicados en los planos de diseño.

- **Control de taludes y pendientes:** Durante el movimiento de tierras, se verificó mediante topografía que las pendientes longitudinales y transversales cumplieran con las secciones típicas del proyecto, garantizando el correcto drenaje superficial.

7.3. Conformación de la Subrasante

- **Nivelación y perfilado:** Se llevó a cabo la conformación y perfilado de la zona de la subrasante. Se ajustaron las superficies mediante equipo mecánico para asegurar que las cotas finales coincidan con las tolerancias permitidas en los diseños geométricos.

- **Excavación adicional por detección de suelos inestables:** Se realizó la inspección del suelo natural, eliminando materiales inadecuados, para proceder con la homogenización del terreno antes del cereo y compactación del pedraplén.

7.4. Ajuste y Verificación Final

- **Acabado de la superficie:** Se realizó el perfilado final de la subrasante para obtener una superficie uniforme, libre de irregularidades o zonas de encharcamiento, cumpliendo con las pendientes de bombeo requeridas.

- **Verificación:** Mediante estación total y nivel de precisión, se verificó que la subrasante se encuentre dentro de las tolerancias de nivelación (± 1 cm respecto a la cota de diseño). Se inspeccionó visualmente la ausencia de materiales sueltos o zonas con resiliencia excesiva (blandones).

7.5. Instalación y conformación de la capa de pedraplén


- Se llevó a cabo la extensión y acomodo de material para la formación del pedraplén, siguiendo estrictamente los alineamientos, pendientes y cotas establecidos en los diseños geométricos del proyecto. El material fue dispuesto en capas uniformes, garantizando una distribución granulométrica que permita el correcto entrelazamiento de las partículas y la estabilidad mecánica de la estructura. Durante el proceso, se realizó el control de niveles mediante equipo topográfico para asegurar que la superficie final se ajuste a la rasante proyectada, permitiendo una transición óptima hacia las capas superiores de la estructura de pavimento y garantizando el flujo de drenaje interno de acuerdo con las especificaciones técnicas vigentes.

7.6. Instalación y control del concreto

- Se llevó a cabo la colocación de la capa de concreto con un espesor de 19 cm, garantizando su correcta distribución y nivelación conforme a las cotas y pendientes definidas en el diseño geométrico. Durante el proceso, se realizó control topográfico mediante nivelación y verificación con equipos de precisión, asegurando que la superficie terminada cumpliera con los alineamientos horizontales y verticales del proyecto. Asimismo, se verificó la uniformidad del espesor a lo largo del tramo, controlando posibles variaciones que pudieran afectar el comportamiento estructural y el drenaje superficial, cumpliendo con las tolerancias establecidas en las especificaciones técnicas.

8. VOLUMENES TOTALES DE CONCRETO


8.1. TRAMO 1 (CARRIL DERECHO SIN SOBRE ANCHOS)

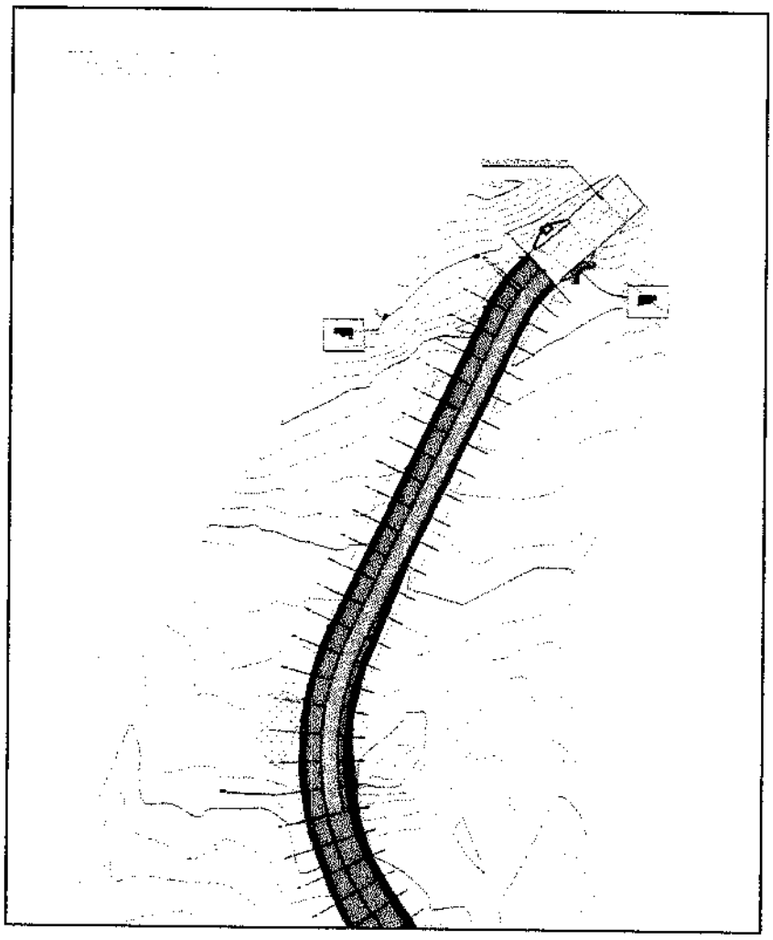

VOLUMEN DE CONCRETO TRAMO 1			
Abscisa	Área acumulada (m^2)	Espesor de concreto (m)	Volumen acumulado (m^3)
230	0	0.19	0
235	15.217	0.19	2.891
240	30.434	0.19	5.782
245	45.651	0.19	8.674
250	60.868	0.19	11.565
255	76.085	0.19	14.456
260	91.302	0.19	17.347
265	106.519	0.19	20.239
270	121.736	0.19	23.13
275	136.953	0.19	26.021
280	152.17	0.19	28.912
285	167.387	0.19	31.804
290	182.604	0.19	34.695
295	197.821	0.19	37.586
300	213.038	0.19	40.477


305	228.255	0.19	43.369
310	243.472	0.19	46.26
315	258.689	0.19	49.151
320	273.906	0.19	52.042
325	289.123	0.19	54.934
330	304.34	0.19	57.825
335	319.557	0.19	60.716
339.727	**333.94**	0.19	**63.449**

8.1.1. SECCIONES TRANSVERSALES (CARRIL DERECHO SIN SOBREANCHOS)

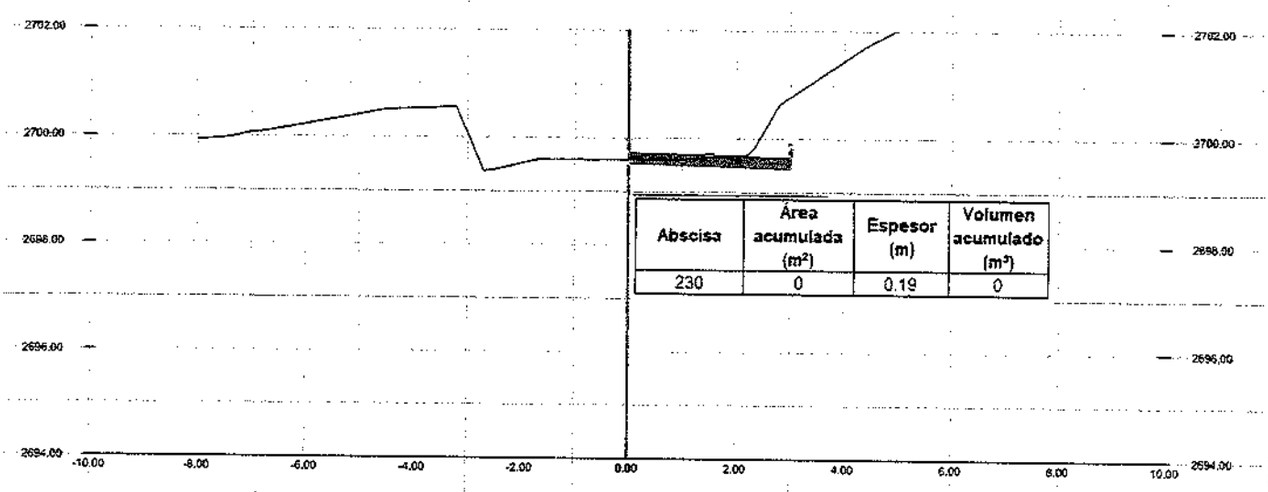

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
230	0	0.19	0


ABS = K0+230.000

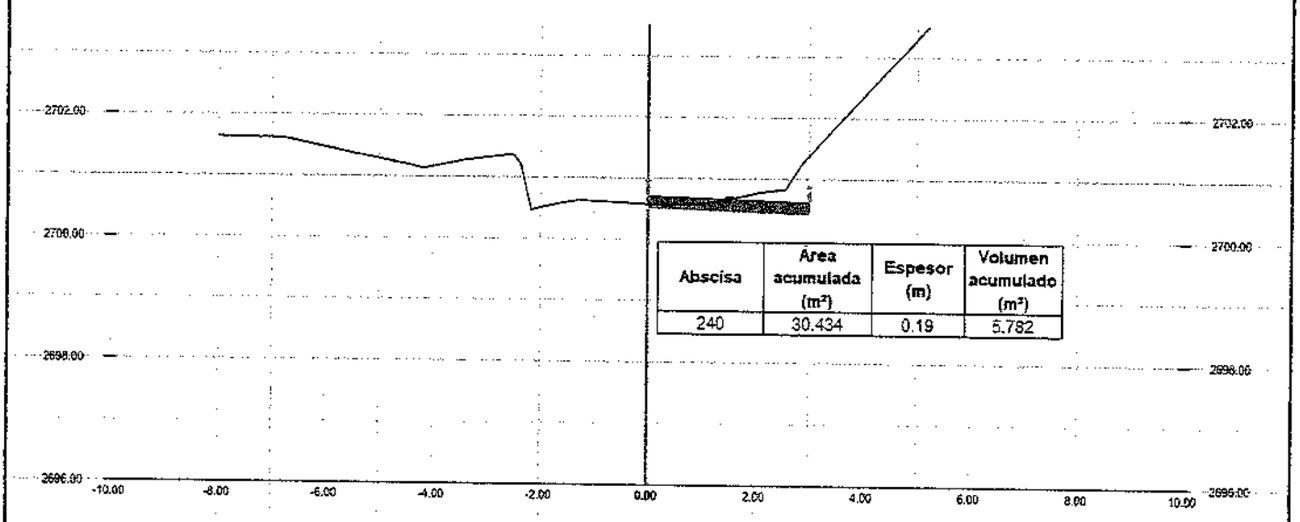

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
240	30.434	0.19	5.782


ABS = K0+240.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

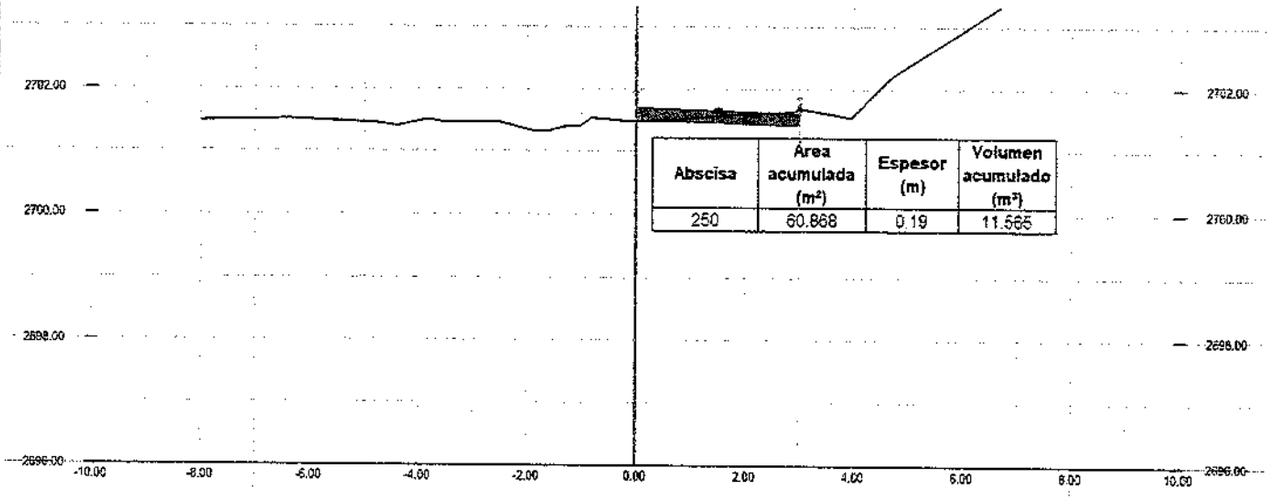


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
250	60.868	0.19	11.565

ABS = K0+250.000

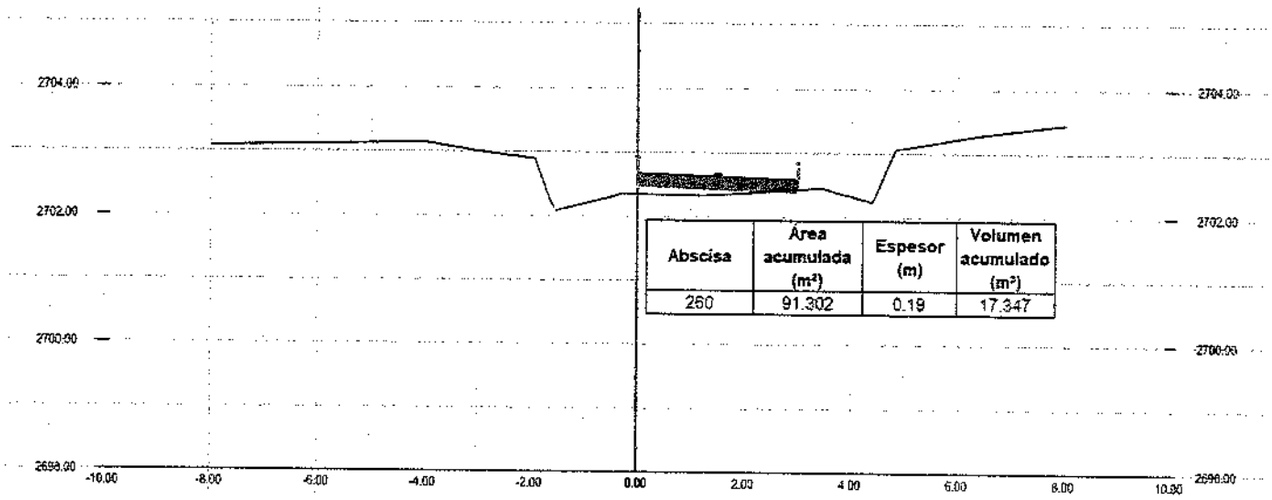


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
260	91.302	0.19	17.347

ABS = K0+260.000

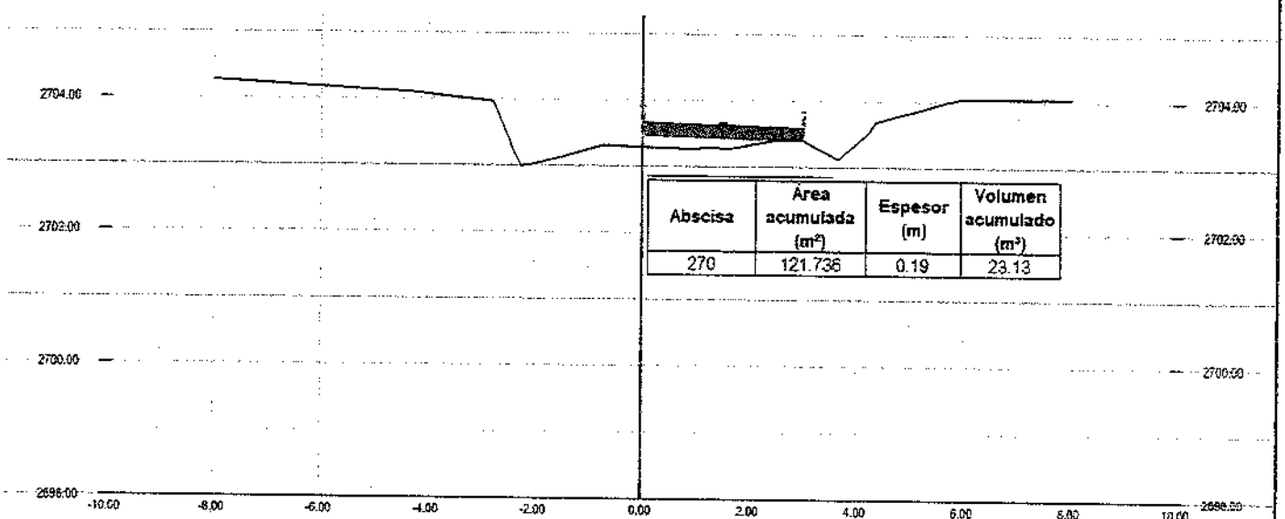


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
270	121.736	0.19	23.13

ABS = K0+270.000

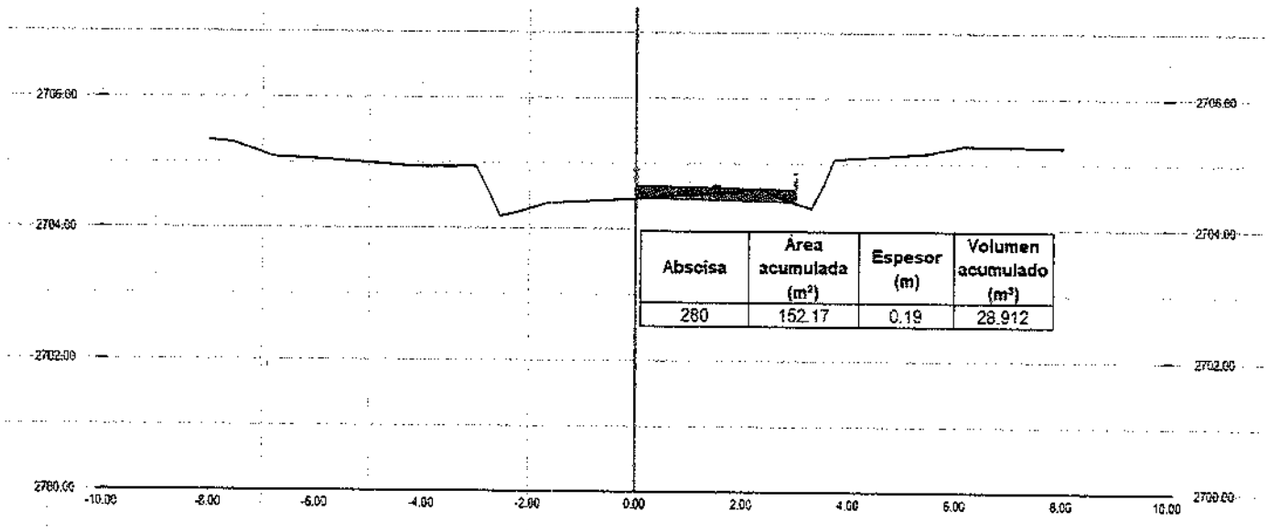


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
280	152.17	0.19	28.912

ABS = K0+280.000

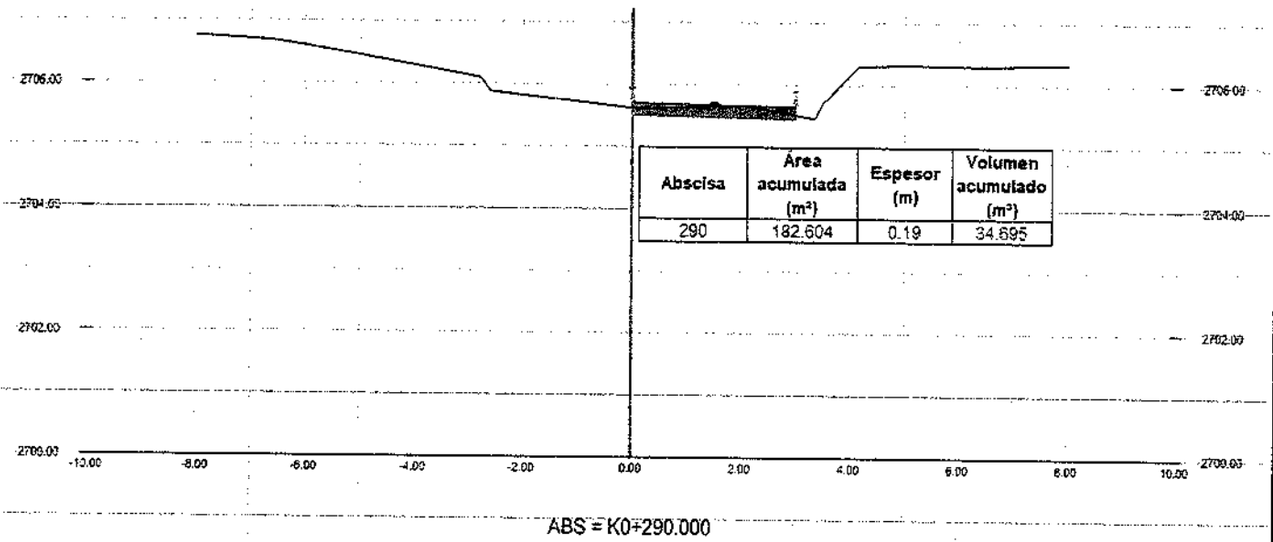

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
290	182.604	0.19	34.695


ABS = K0+290.000

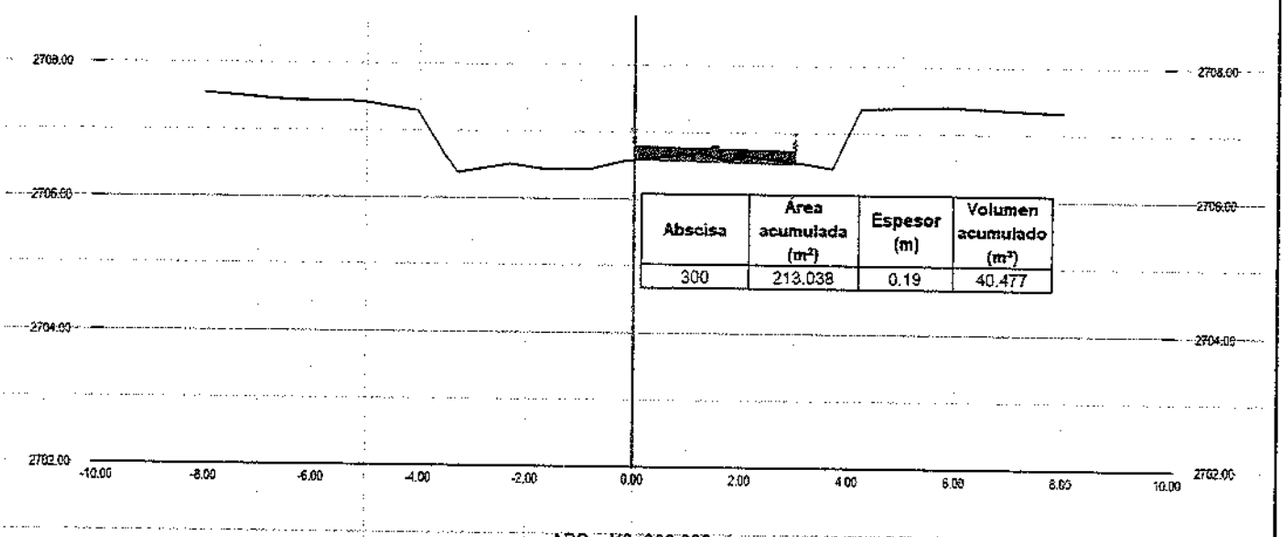

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
300	213.038	0.19	40.477


ABS = K0+300.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

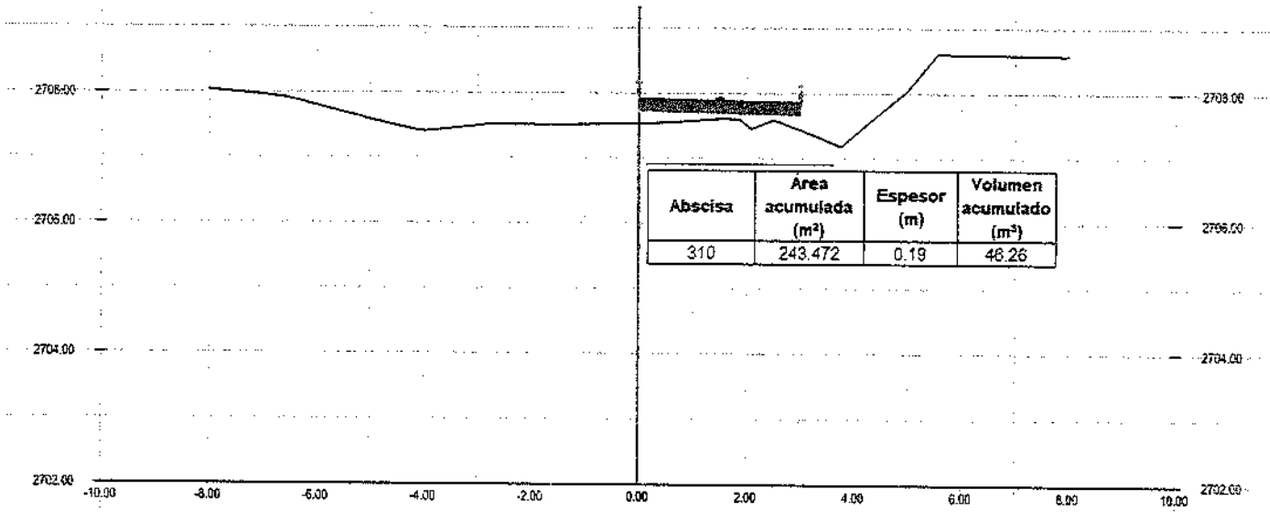


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
310	243.472	0.19	46.26

ABS = K0+310.000

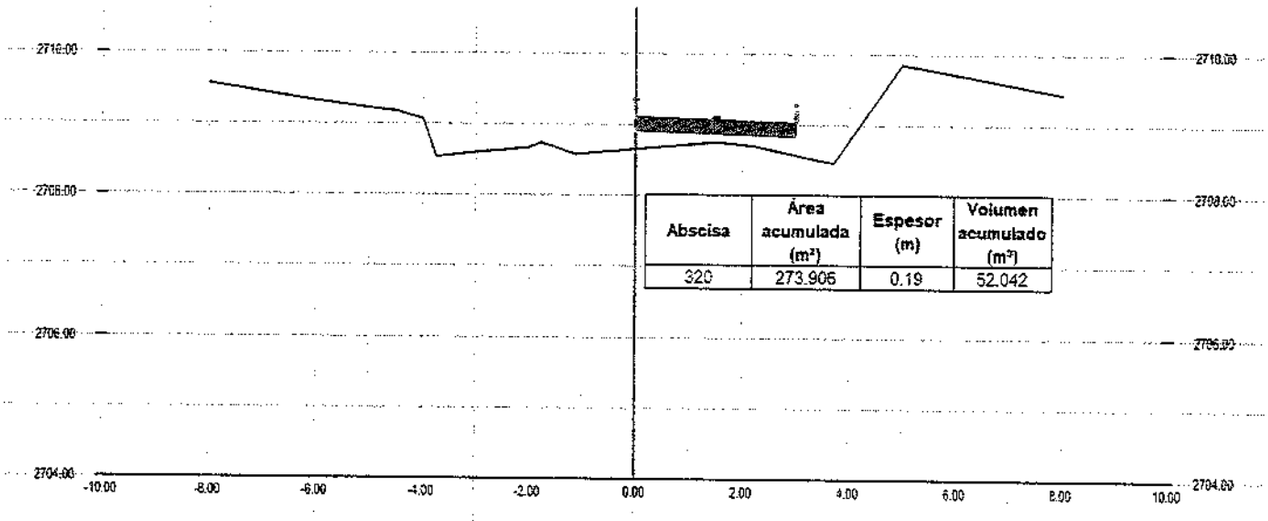


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
320	273.906	0.19	52.042

ABS = K0+320.000

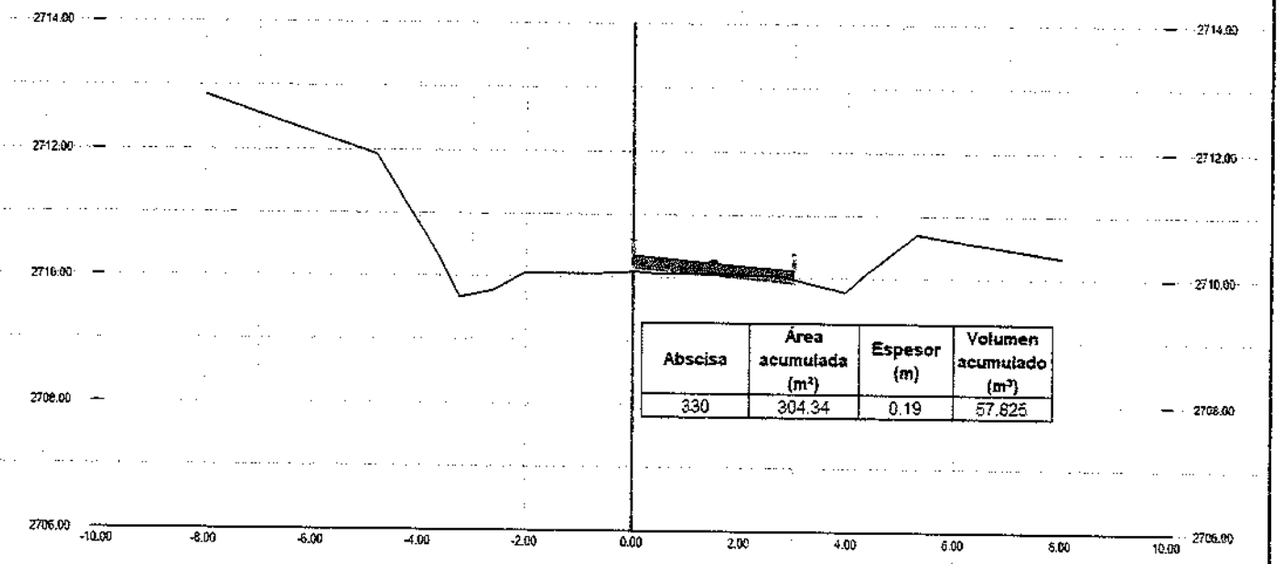

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
330	304.34	0.19	57.825


ABS = K0+330.000

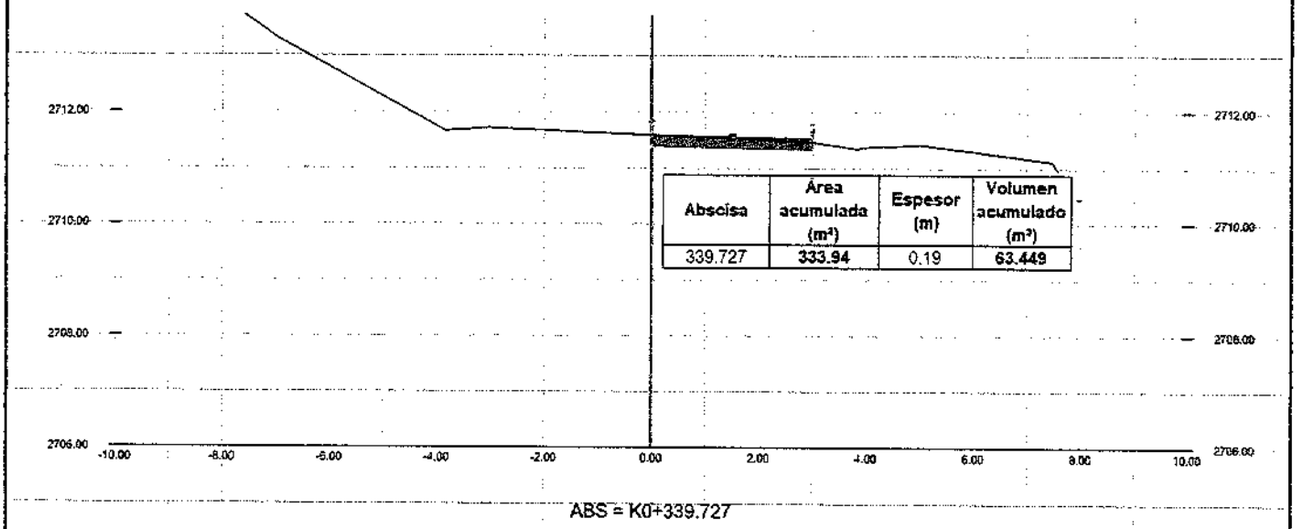

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
339.727	333.94	0.19	63.449

ABS = K0+339.727

1.1. TRAMO 2

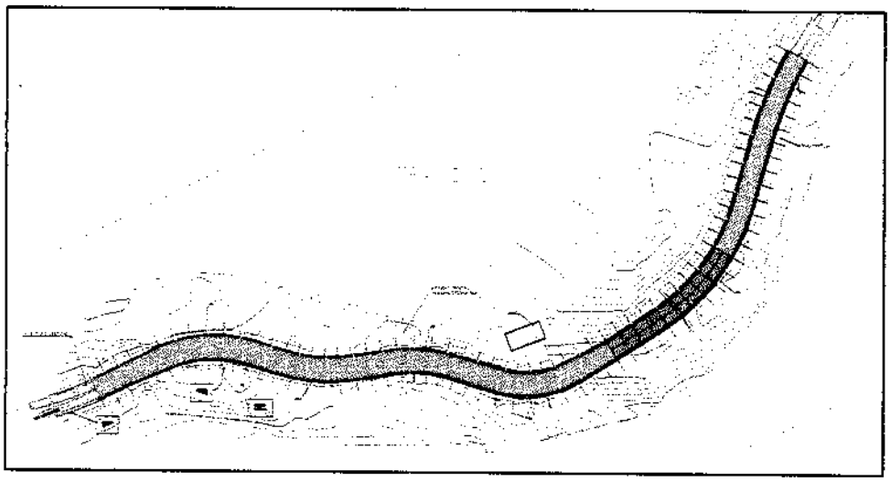


1.1.1. SECTOR 1 KM 0+000-KM 0+180

Abscisa	Área (m²)	Espesor de concreto (m)	Volumen (m³)
0	0	0.19	0
5	29.91	0.19	5.68
10	60.12	0.19	11.42
15	91.17	0.19	17.32
20	123.65	0.19	23.49
25	157.22	0.19	29.87
30	191.56	0.19	36.4
35	226.28	0.19	43
40	261	0.19	49.6
45	295.72	0.19	56.18
50	330.44	0.19	62.78
55	365.2	0.19	69.39
60	400.07	0.19	76.02


65	434.93	0.19	82.63
70	469.69	0.19	89.25
75	504.38	0.19	95.83
80	539.05	0.19	102.42
85	573.84	0.19	109.03
90	608.77	0.19	115.67
95	643.75	0.19	122.31
100	678.82	0.19	128.98
105	713.87	0.19	135.64
110	748.81	0.19	142.26
115	783.57	0.19	148.87
120	818.27	0.19	155.47
125	853.31	0.19	162.13
130	888.74	0.19	168.87
135	924.27	0.19	175.64
140	959.86	0.19	182.43
145	995.47	0.19	189.21
150	1031.08	0.19	196
155	1066.69	0.19	202.79
160	1102.3	0.19	209.58
165	1137.35	0.19	216.24
170	1171.2	0.19	222.65
175	1203.99	0.19	228.76
180	1234.6	0.19	**234.57**

- **SECCIONES TRANSVERSALES SECTOR 1**

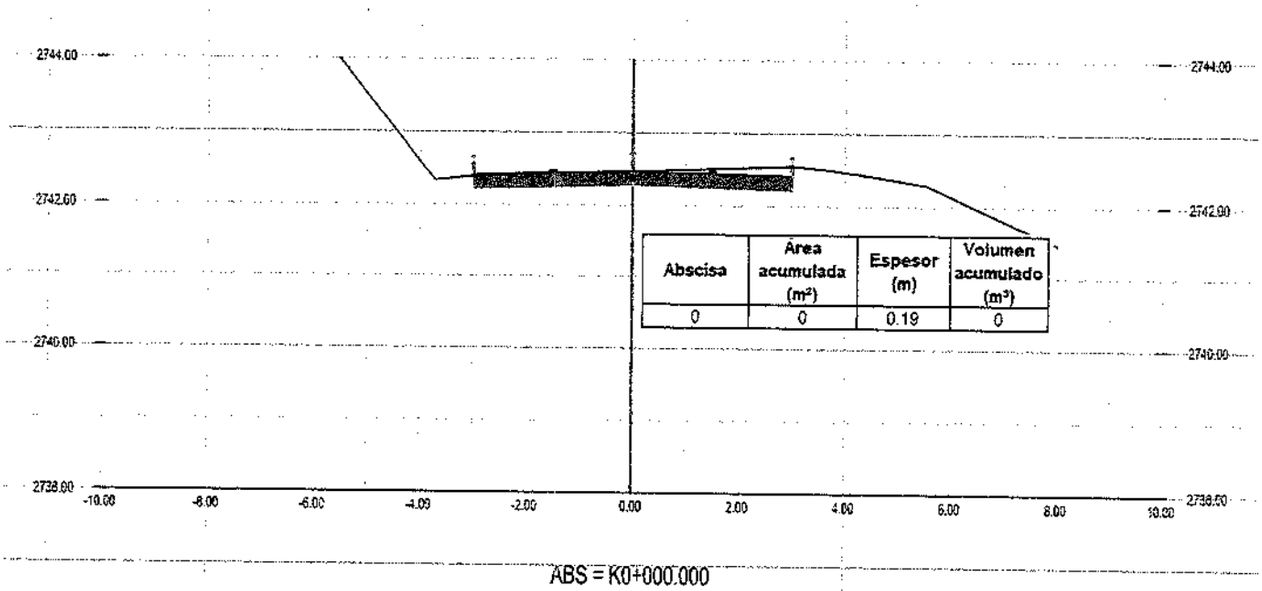


ABS = K0+000.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

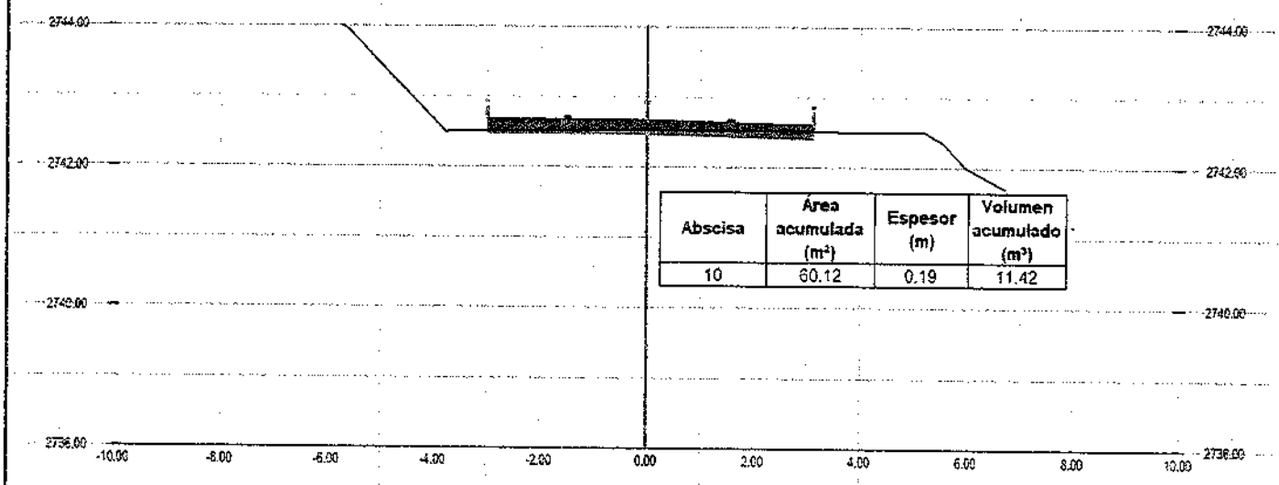


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
10	60.12	0.19	11.42

ABS = K0+010.000

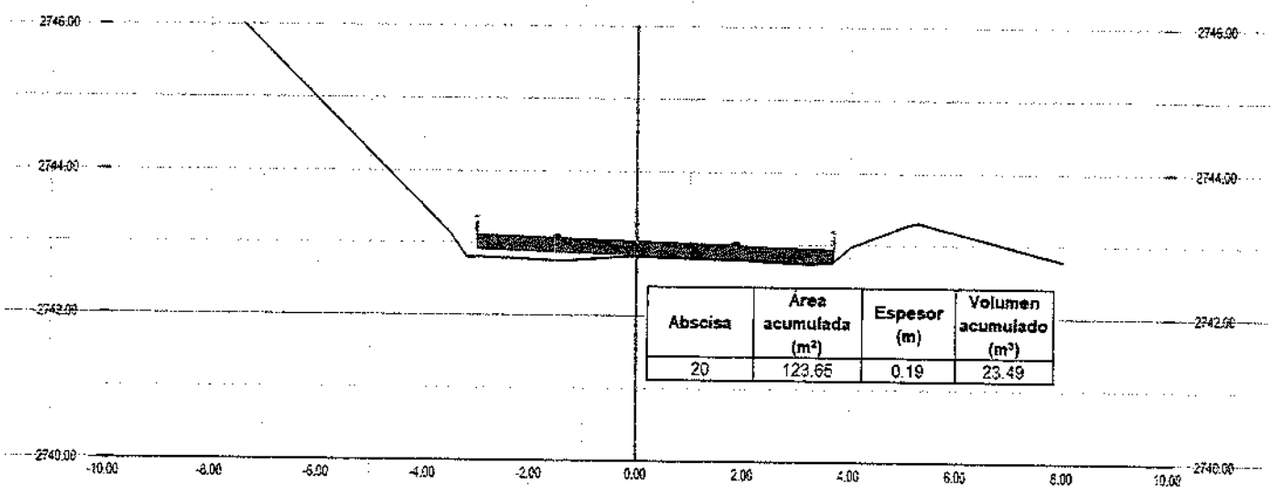


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
20	123.65	0.19	23.49

ABS = K0+020.000

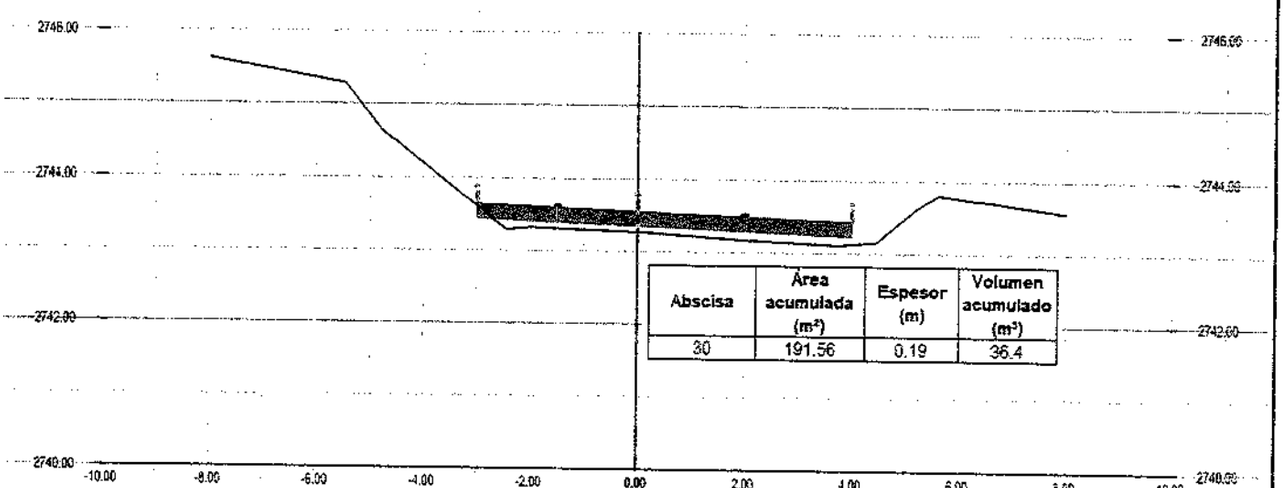


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
30	191.56	0.19	36.4

ABS = K0+030.000

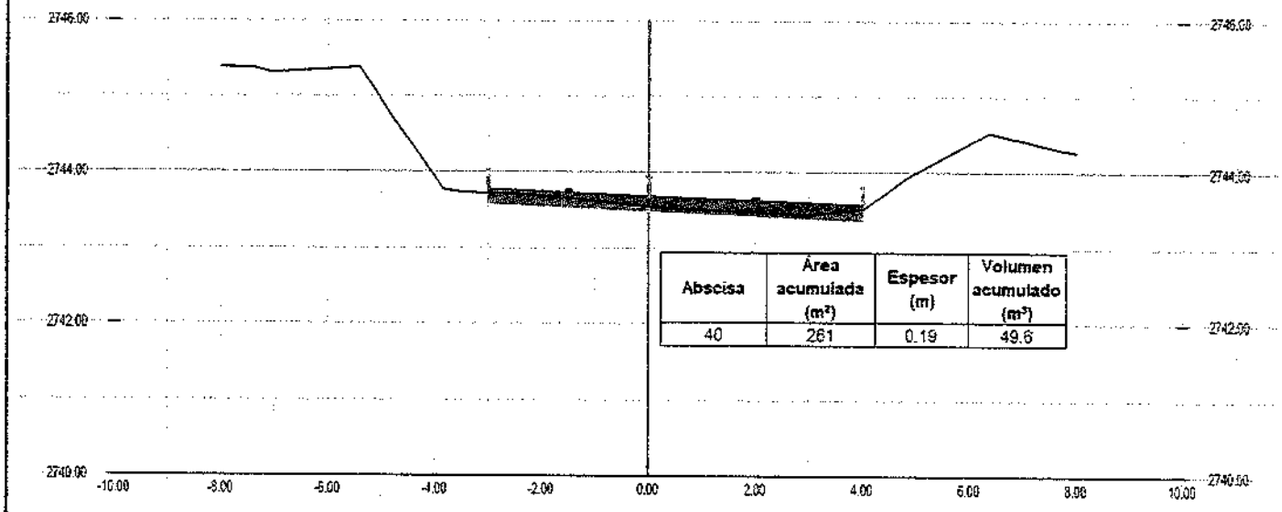


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
40	261	0.19	49.6

ABS = K0+040.000

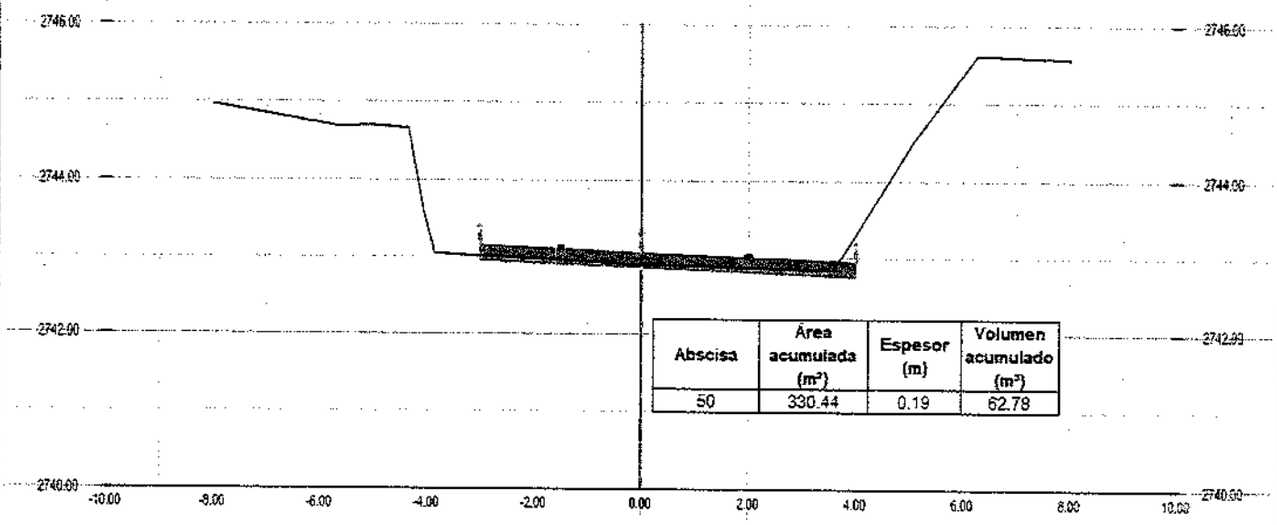

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
50	330.44	0.19	62.78


ABS = K0+050.000

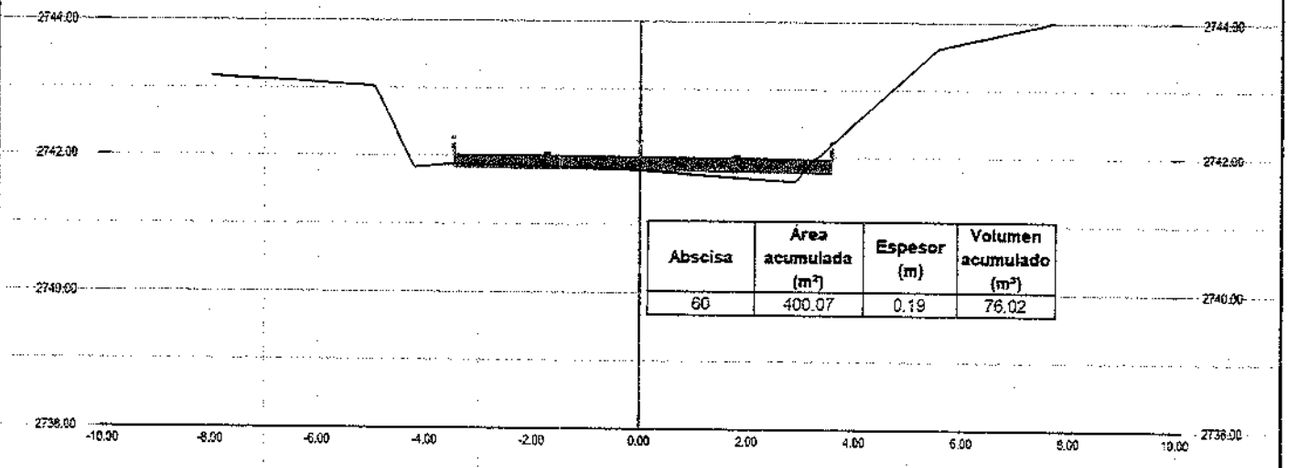

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
60	400.07	0.19	76.02


ABS = K0+060.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

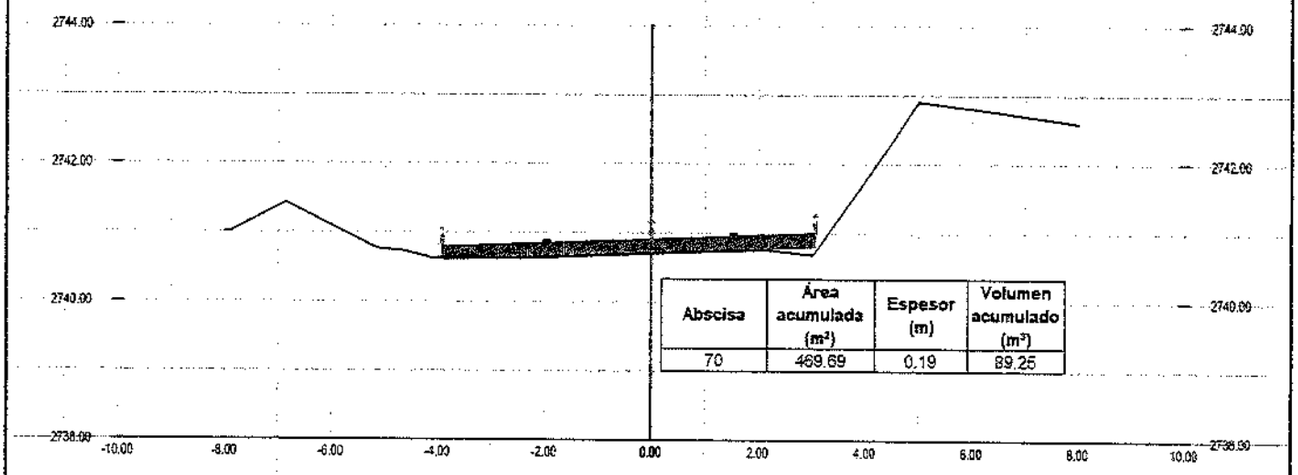


Abscisa	Área acumulada (m^2)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m^3)
70	469.69	0.19	89.25

ABS = K0+070.000

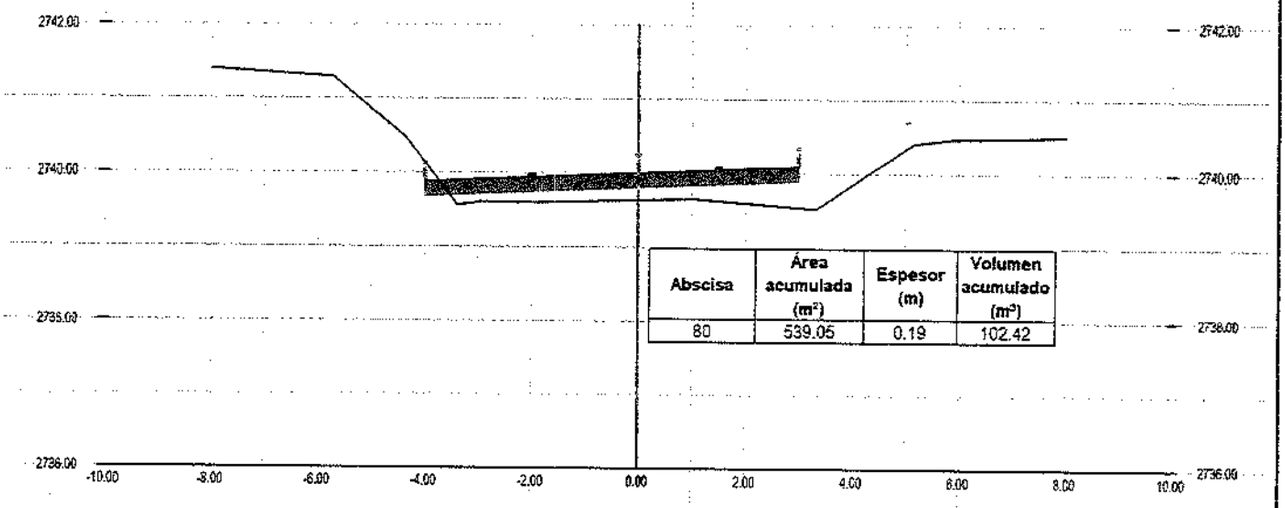

Abscisa	Área acumulada (m^2)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m^3)
80	539.05	0.19	102.42


ABS = K0+080.000

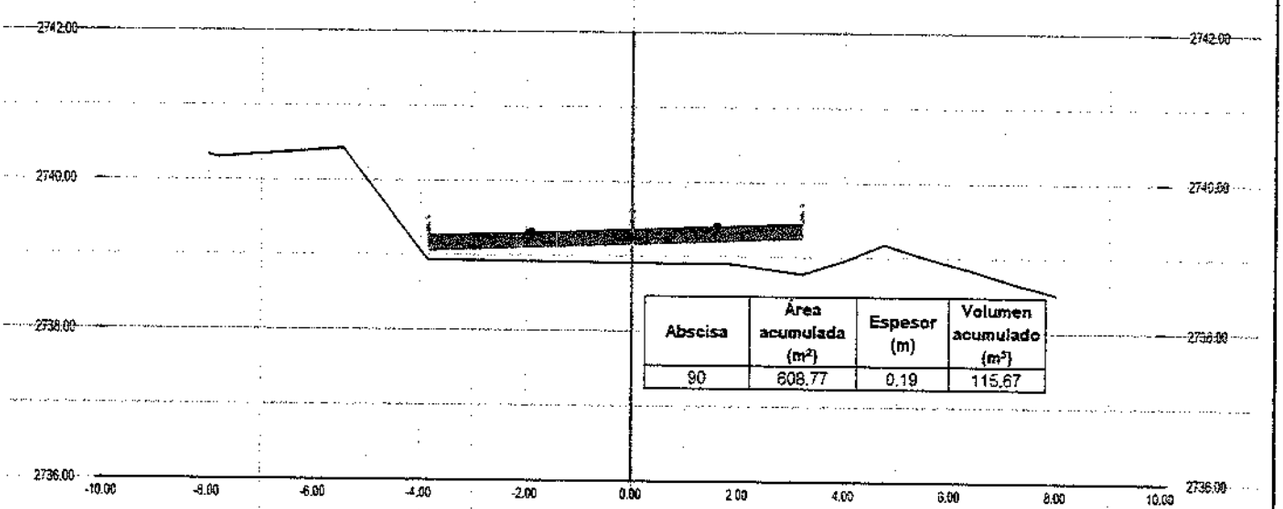

Abscisa	Área acumulada (m^2)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m^3)
90	608.77	0.19	115.67


ABS = K0+090.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

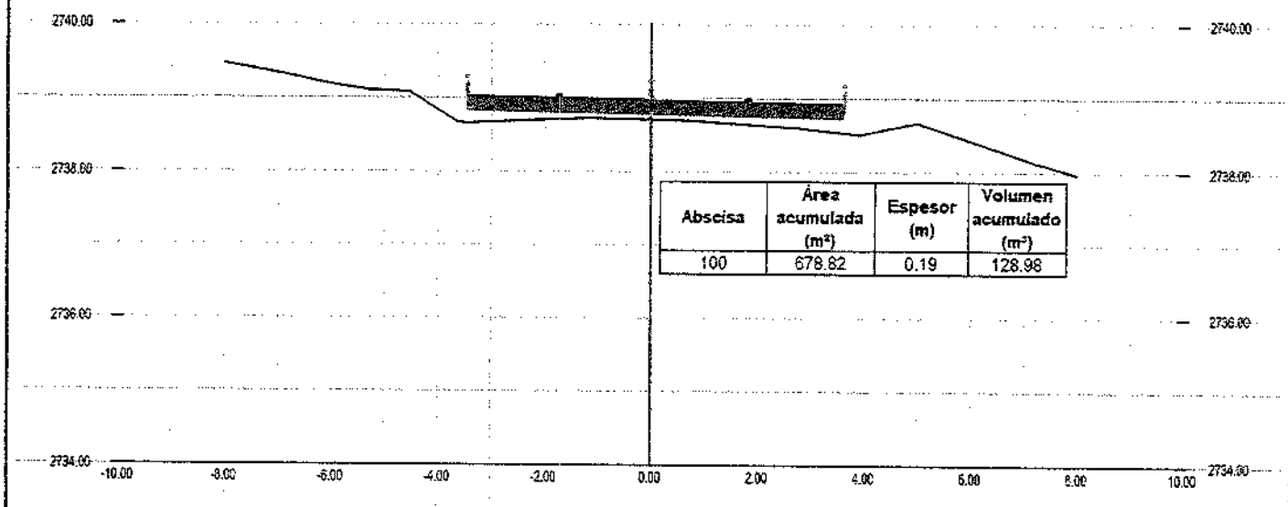


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
100	678.82	0.19	128.98

ABS = K0+100.000

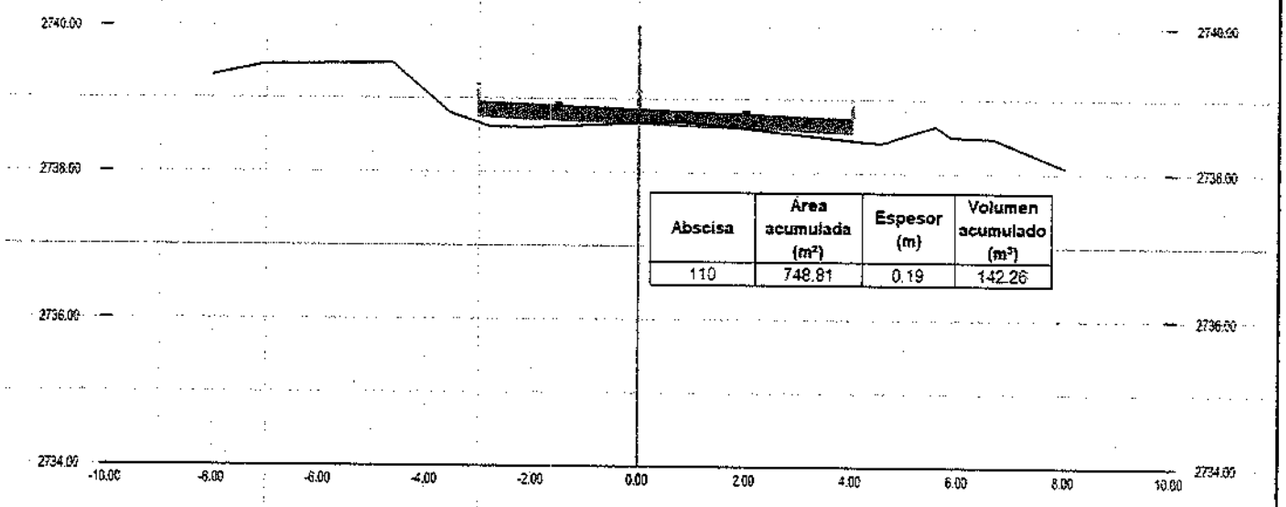

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
110	748.81	0.19	142.26


ABS = K0+110.000

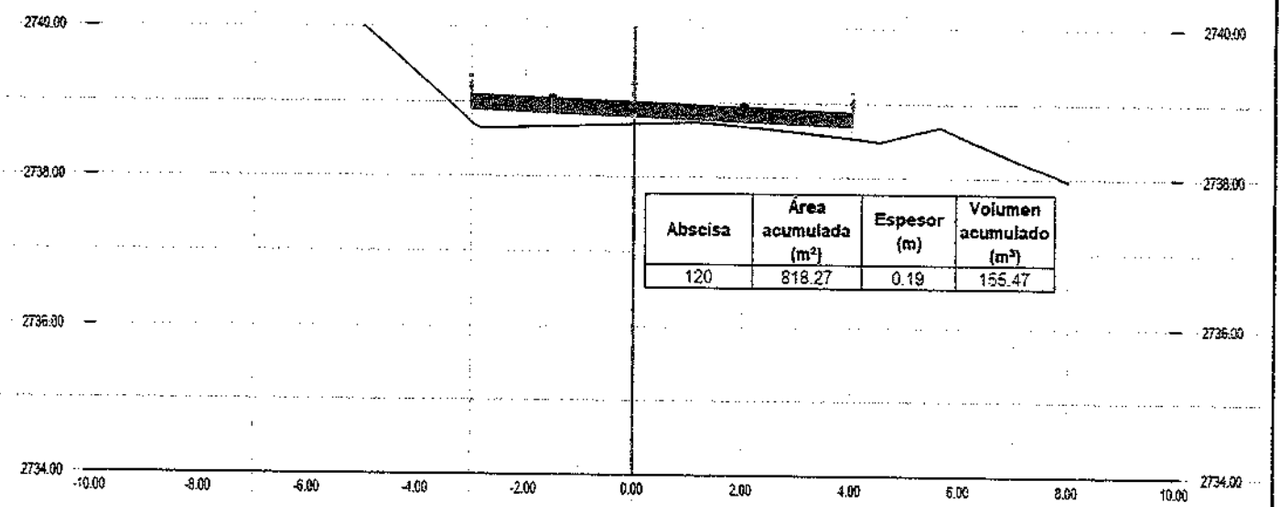

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
120	818.27	0.19	155.47


ABS = K0+120.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

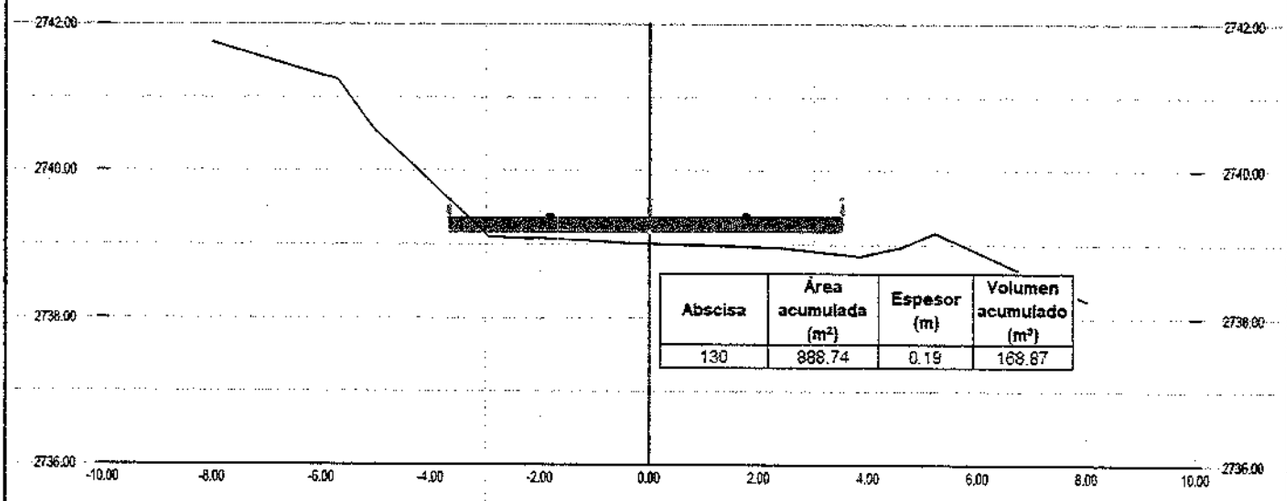


Abscisa	Área acumulada (m^2)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m^3)
130	888.74	0.19	168.87

ABS = K0+130.000

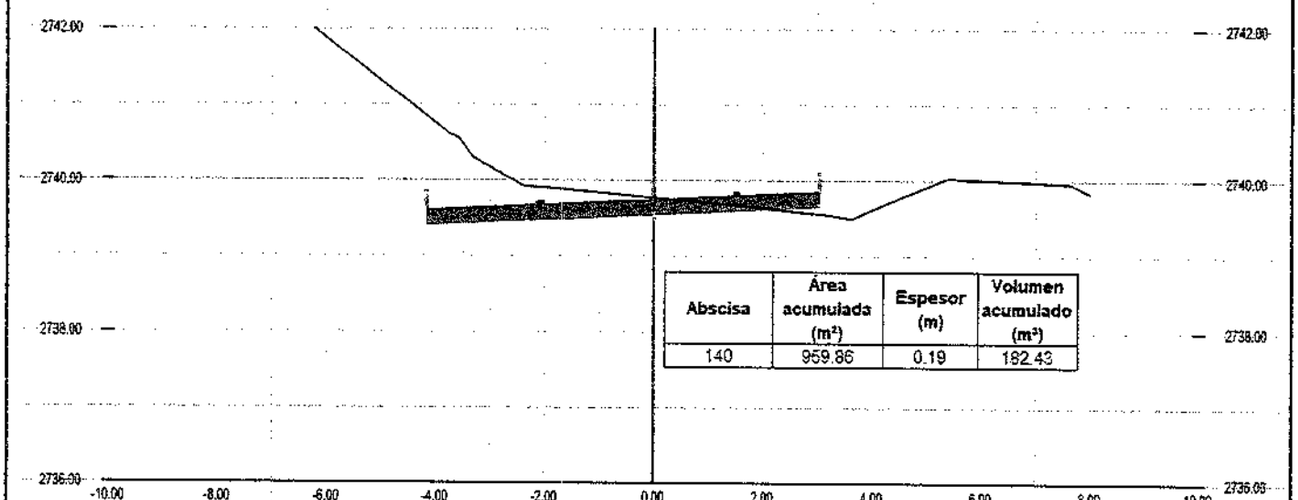

Abscisa	Área acumulada (m^2)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m^3)
140	959.86	0.19	182.43


ABS = K0+140.000

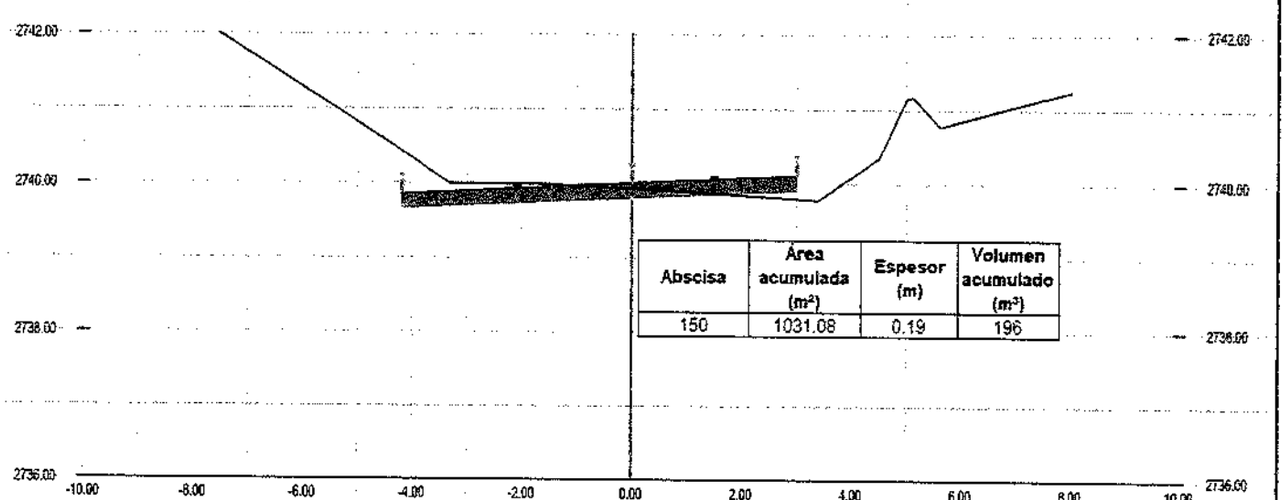

Abscisa	Área acumulada (m^2)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m^3)
150	1031.08	0.19	196


ABS = K0+150.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

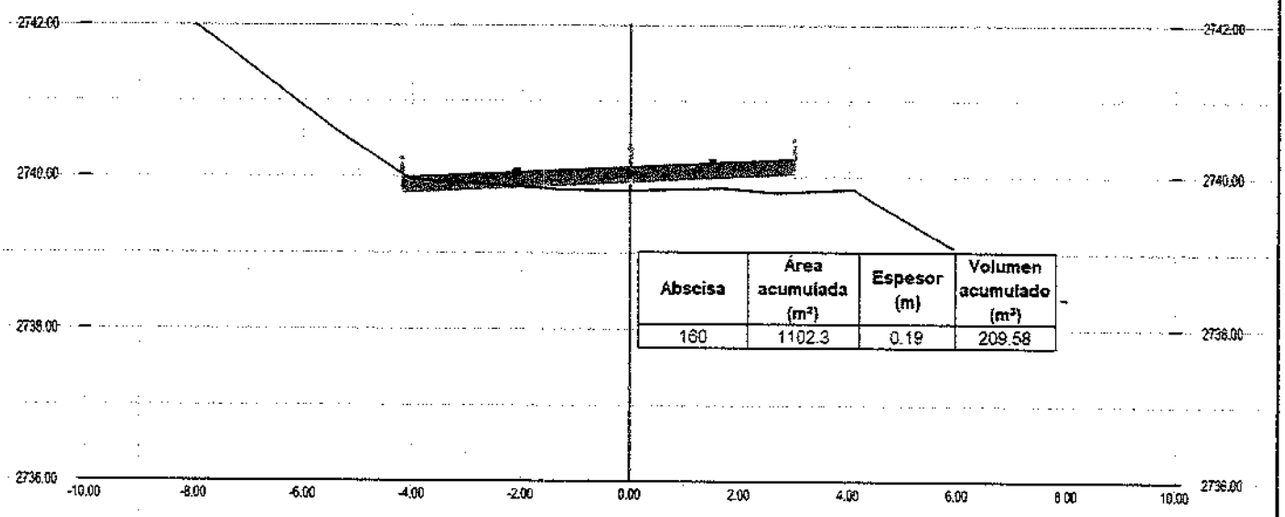


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
160	1102.3	0.19	209.58

ABS = K0+160.000

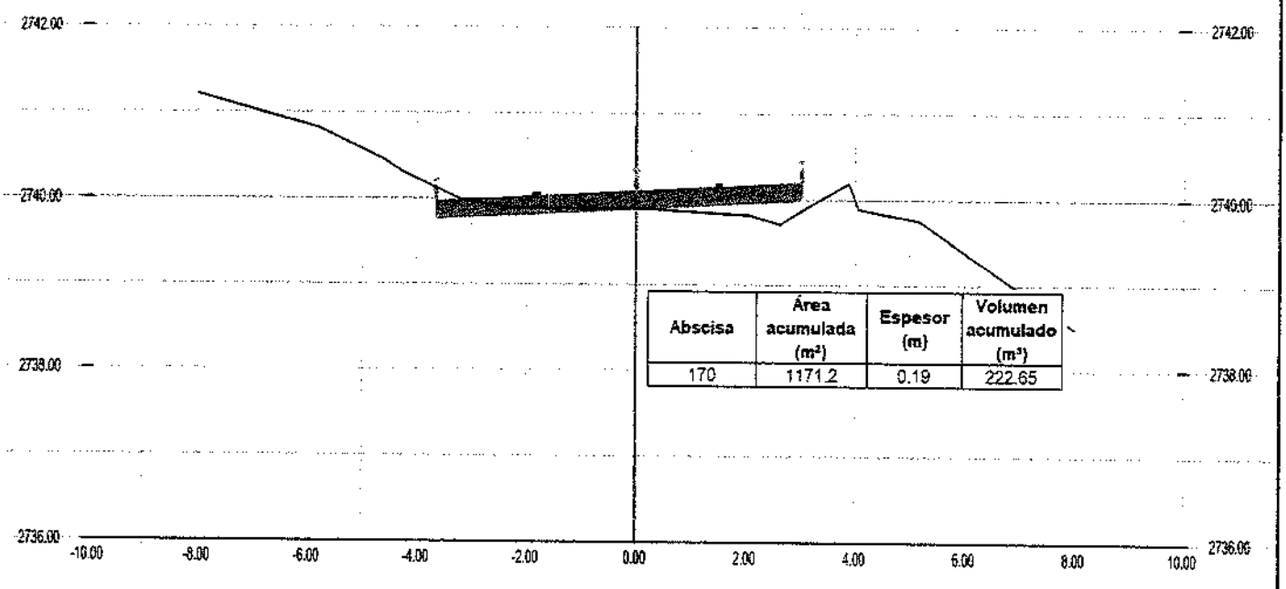

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
170	1171.2	0.19	222.65

ABS = K0+170.000

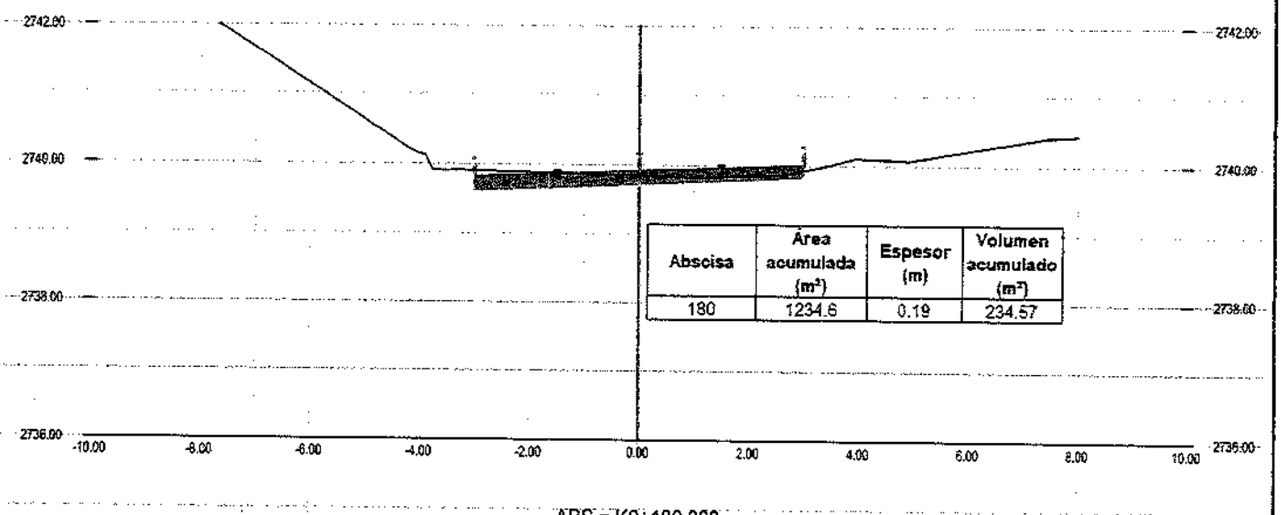


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
180	1234.6	0.19	234.57

ABS = K0+180.000

1.1.2. SECTOR 2 KM 0+230-KM 0+300


Abscisa	Área (m²)	Espesor (m)	Volumen (m³)
230	0	0.19	0
235	30	0.19	5.7
240	60	0.19	11.4
245	90	0.19	17.1
250	120	0.19	22.8
255	150	0.19	28.5
260	180	0.19	34.2
265	210	0.19	39.9
270	240	0.19	45.6
275	270	0.19	51.3
280	300	0.19	57
285	330	0.19	62.7
290	360	0.19	68.4
295	390	0.19	74.1
300	420	0.19	**79.8**

- **SECCIONES TRANSVERSALES SECTOR 2**

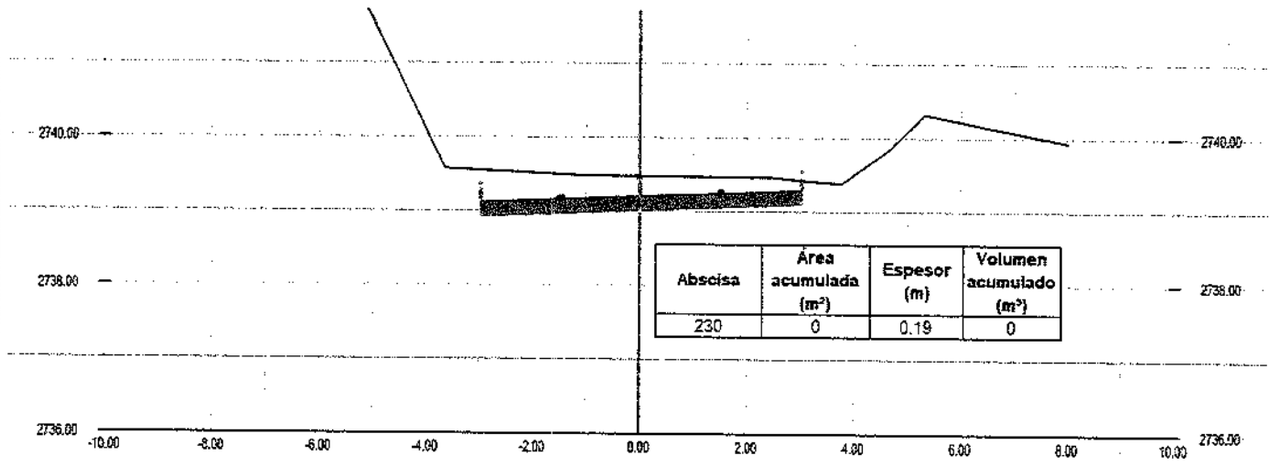

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
230	0	0.19	0


ABS = K0+230.000

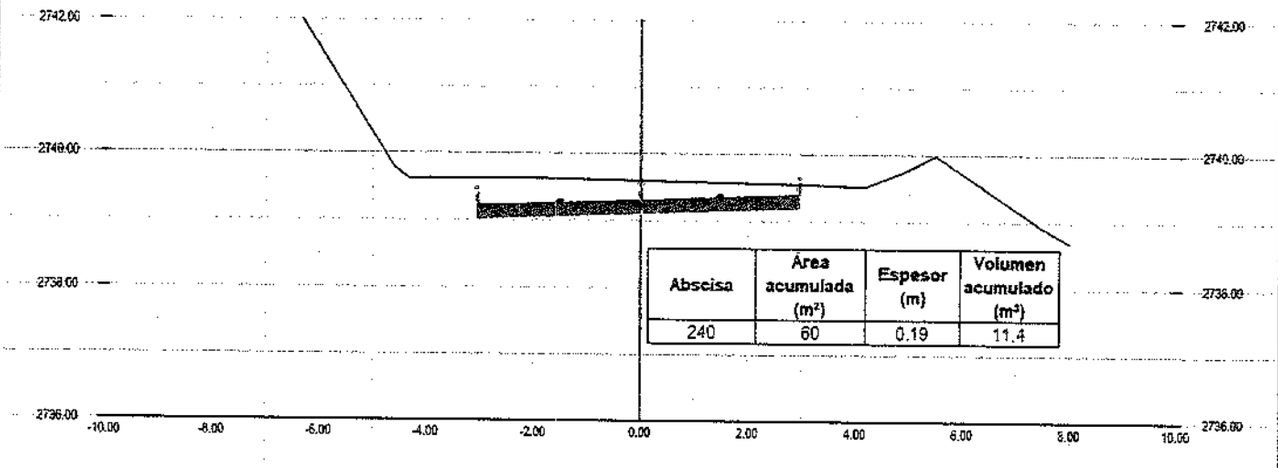

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
240	60	0.19	11.4


ABS = K0+240.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

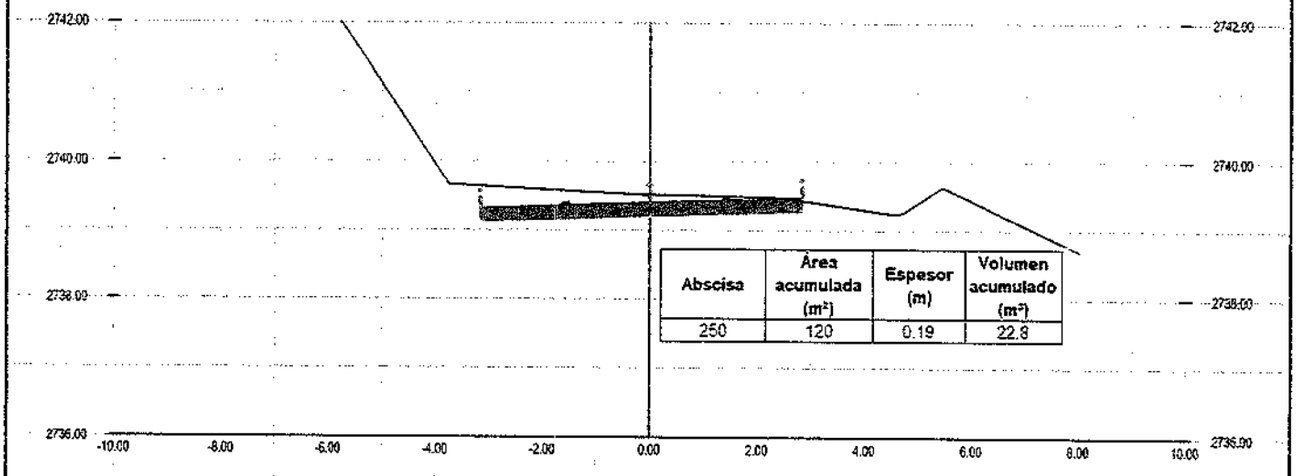


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
250	120	0.19	22.8

ABS = K0+250.000

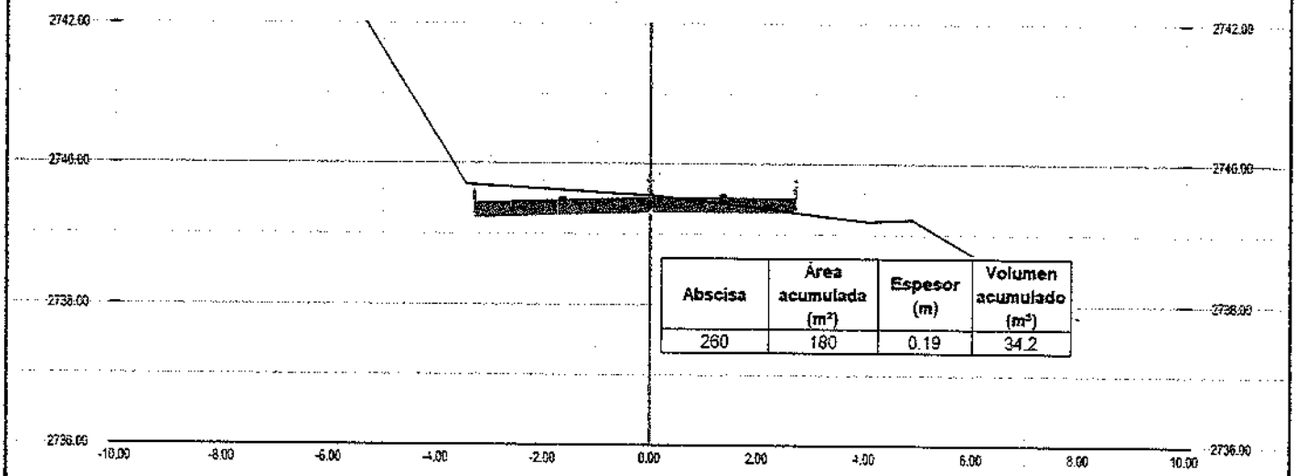

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
260	180	0.19	34.2


ABS = K0+260.000

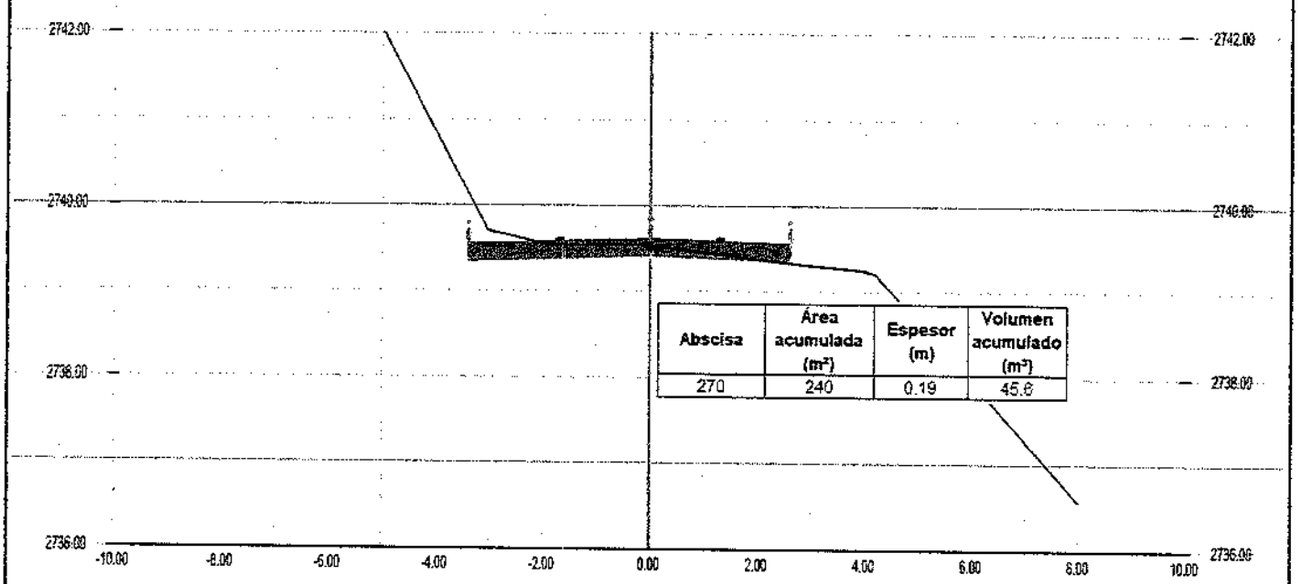

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
270	240	0.19	45.6


ABS = K0+270.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

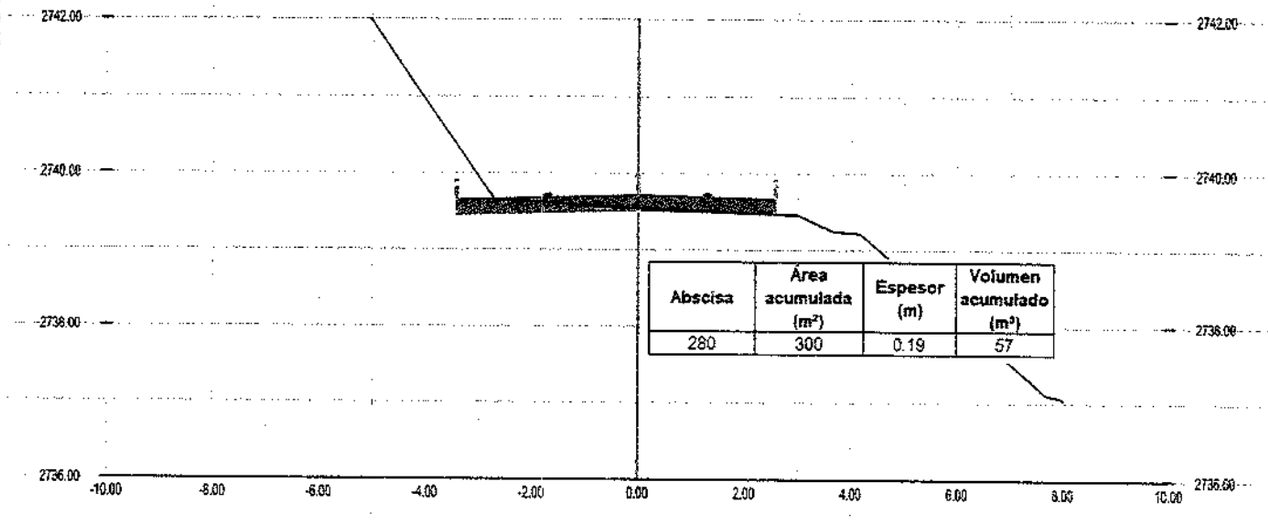


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
280	300	0.19	57

ABS = K0+280.000

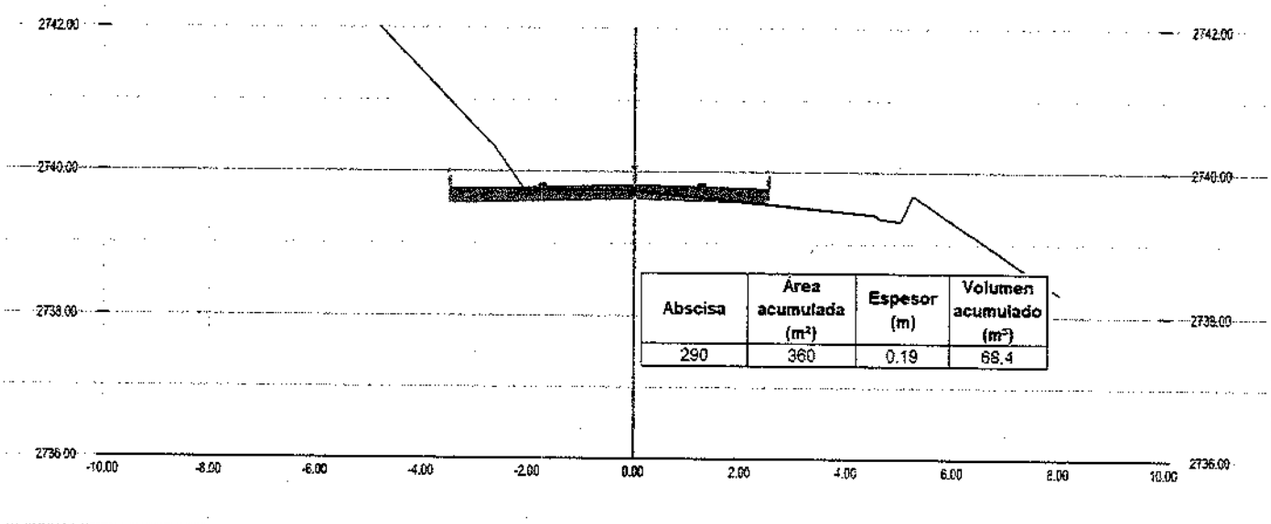

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
290	360	0.19	68.4

ABS = K0+290.000

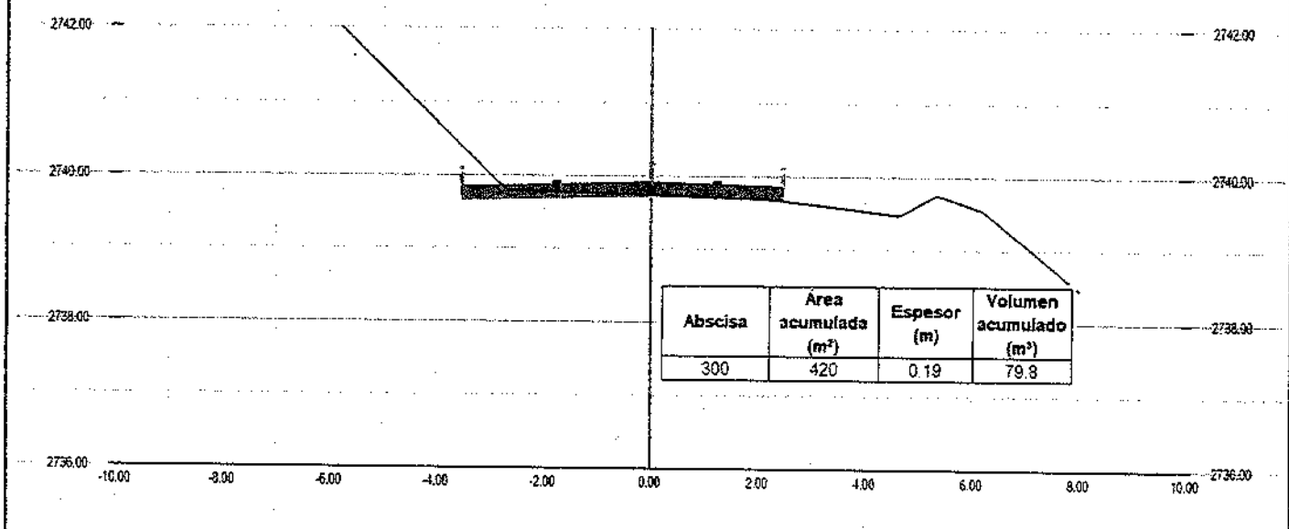

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor (m)	Volumen acumulado (m³)
300	420	0.19	79.8

ABS = K0+300.000

2. VOLUMENES DE MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN

2.1. TRAMO 1 (KM0+080-KM0+110)

PEDRAPLEN TRAMO 1			
Abscisa	**Área (m^2)**	**Volumen (m^3)**	**Volumen acumulado (m^3)**
0+075	0	0	0
0+080	49.56	14.93	14.93
0+085	49.51	14.85	29.78
0+090	52.34	15.7	45.48
0+095	53.66	16.1	61.58
0+100	51.71	15.51	77.09
0+105	47.97	14.39	91.48
0+110	46.93	13.99	**105.47**

3. VOLUMENES DE MEJORAMIENTO CON SUBBASE

3.1. TRAMO 1 (KM0+080-KM0+110)


SUBBASE TRAMO 1			
Abscisa	**Área (m^2)**	**Volumen (m^3)**	**Volumen acumulado (m^3)**
0+075	0	0	0
0+080	49.56	14.93	14.93
0+085	49.51	14.85	29.78
0+090	52.34	15.7	45.48
0+095	53.66	16.1	61.58
0+100	51.71	15.51	77.09
0+105	47.97	14.39	91.48
0+110	46.93	13.99	**105.47**

4. VOLUMENES TOTALES DE MEJORAMIENTO SUBBASE Y PEDRAPLEN

VOLUMEN TOTAL MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN ENTRE ABSCISAS K0+080-K0+110				
TRAMO	ESPESOR (m)	AREA TOTAL (m2)	VOLUMEN DE PEDRAPLEN (m3)	VOLUMEN TOTAL (m3)
TRAMO 1	0,3	351.58	105.47	105.47


VOLUMEN TOTAL ADECUACION CON SUBBASE			
TRAMO	ESPESOR (m)	AREA TOTAL (m2)	VOLUMEN TOTAL DE ADECUACION CON SUBBASE (m3)
TRAMO 1	0,3	351.58	105.47

5. SECCIONES TRANSVERSALES MEJORAMIENTO CON SUBBASE Y PEDRAPLEN TRAMO 1 (KM0+080-KM0+110)

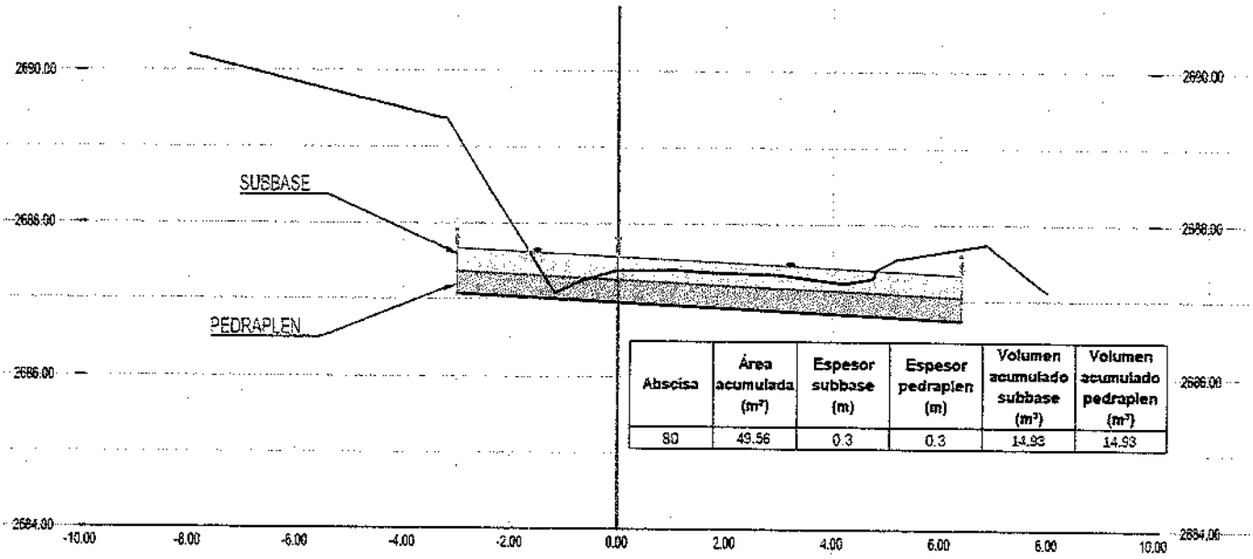

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor subbase (m)	Espesor pedraplen (m)	Volumen acumulado subbase (m³)	Volumen acumulado pedraplen (m³)
80	49.56	0.3	0.3	14.93	14.93


ABS = K0+080.000

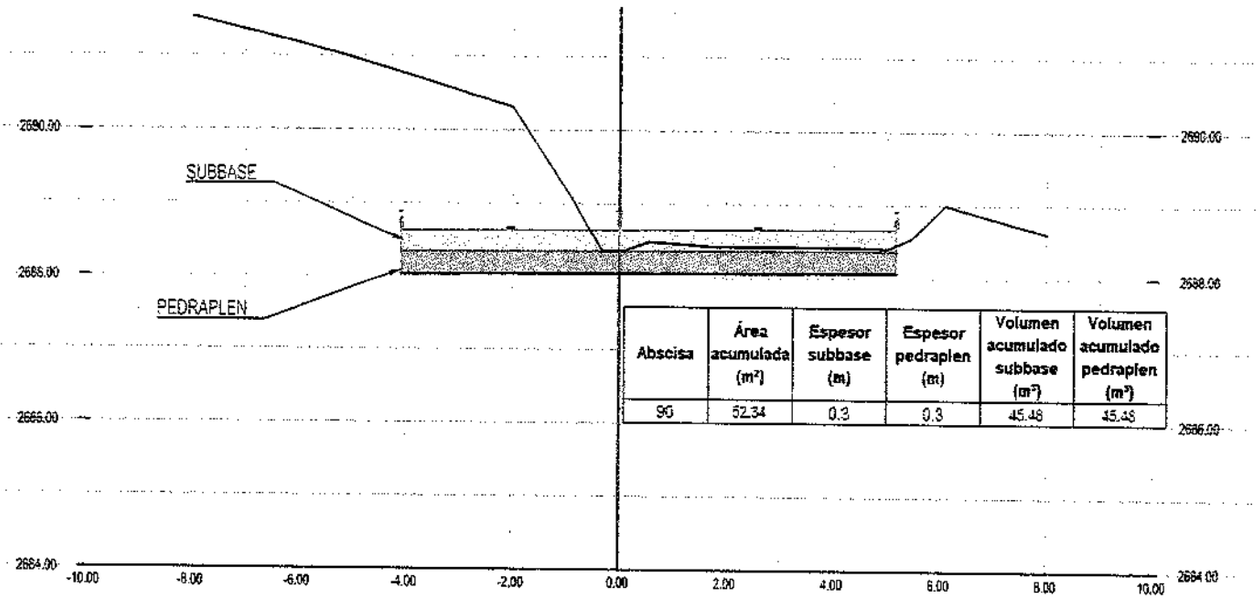

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor subbase (m)	Espesor pedraplen (m)	Volumen acumulado subbase (m³)	Volumen acumulado pedraplen (m³)
90	52.34	0.3	0.3	45.48	45.48


ABS = K0+090.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

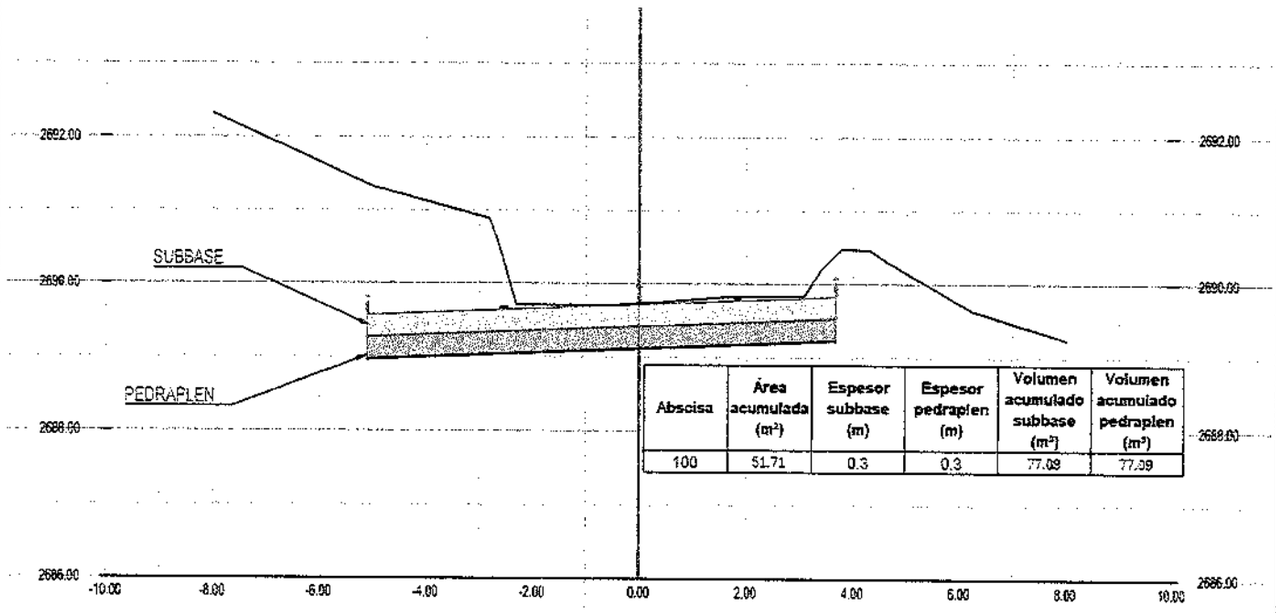

Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor subbase (m)	Espesor pedraplen (m)	Volumen acumulado subbase (m³)	Volumen acumulado pedraplen (m³)
100	51.71	0.3	0.3	77.09	77.09

ABS = K0+100.000

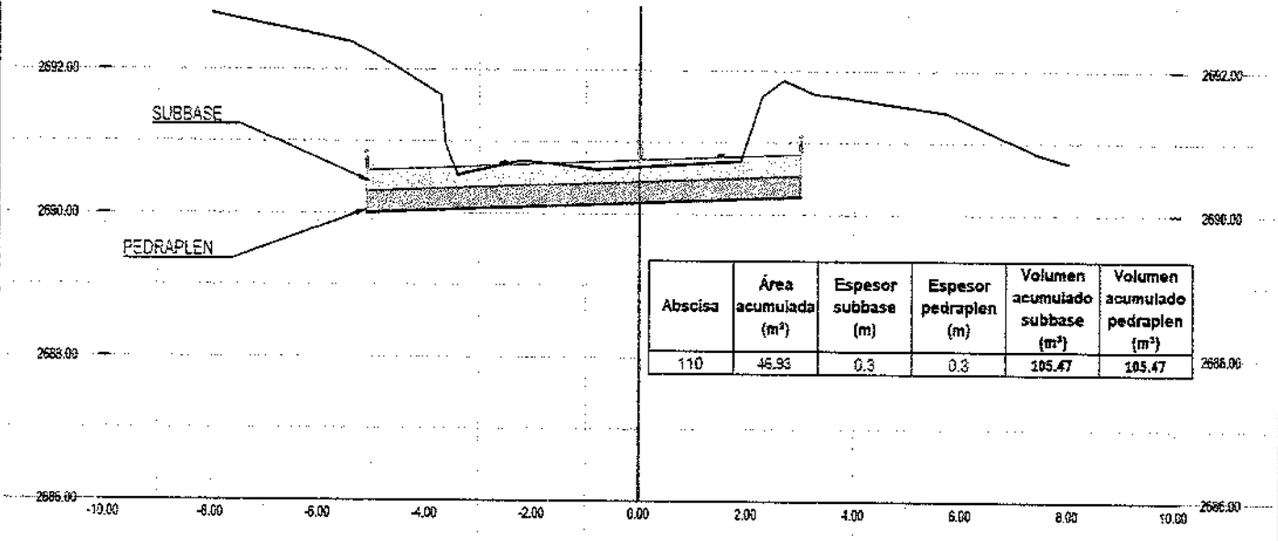


Abscisa	Área acumulada (m²)	Espesor subbase (m)	Espesor pedraplen (m)	Volumen acumulado subbase (m³)	Volumen acumulado pedraplen (m³)
110	46.93	0.3	0.3	185.47	185.47

ABS = K0+110.000


6. VOLUMENES DE EXCAVACION Y RELLENO

- **Tramo 1 KM0+080-KM0+110**

TABLA DE VOLUMEN DE EXCAVACION / RELLENO TRAMO 1 (K0+080 - KM0+110)							
ABSCISA	AREA DE EXCAVACION (m2)	AREA DE RELLENO (m2)	VOLUMEN DE EXCAVACION (m3)	AREA DE RELLENO (m2)	VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION (m3)	VOLUMEN TOTAL DE RELLENO (m3)	VOLUMEN FINAL (m3)
0+080,00	10,65	0,00	42.80	0	48.80	0,00	48.80
0+085,00	13,33	0,00	60,97	0	103.77	0,00	103.77
0+090,00	15,15	0,01	73,94	2	177.71	0,02	177.69
0+095,00	15,54	0,00	72,92	2	250.63	0,04	250.57
0+100,00	15,16	0,00	70,62	0	321.25	0,04	321.15
0+105,00	13,99	0,00	67,07	0	388.32	0,04	388.18
0+110,00	12,60	0,00	61,48	0	449.80	0,04	449.62

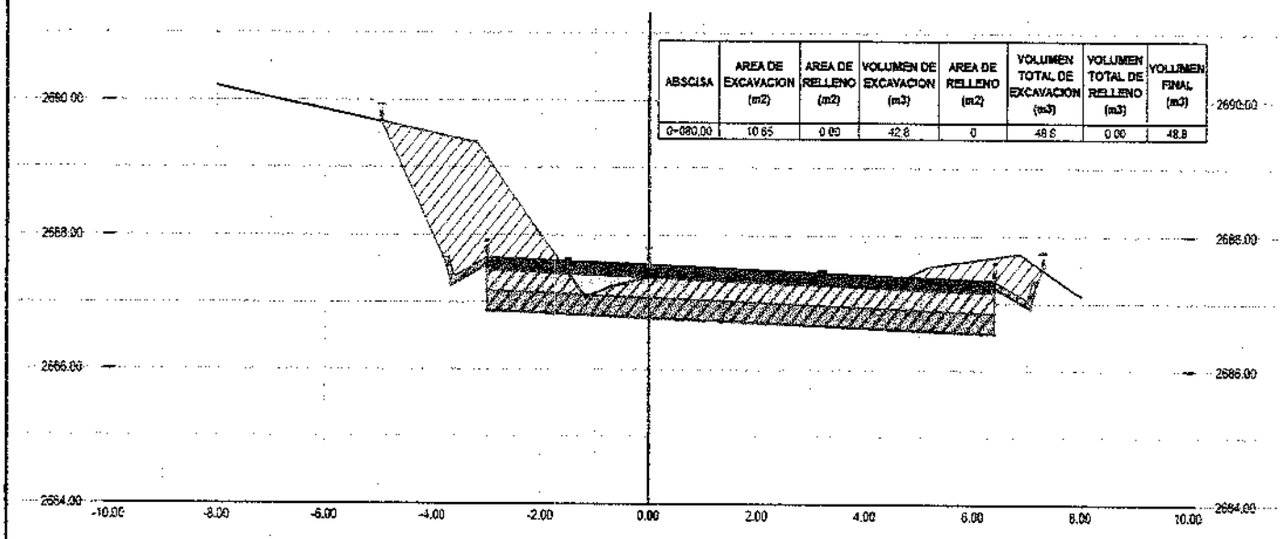


ABS = K0+080.000

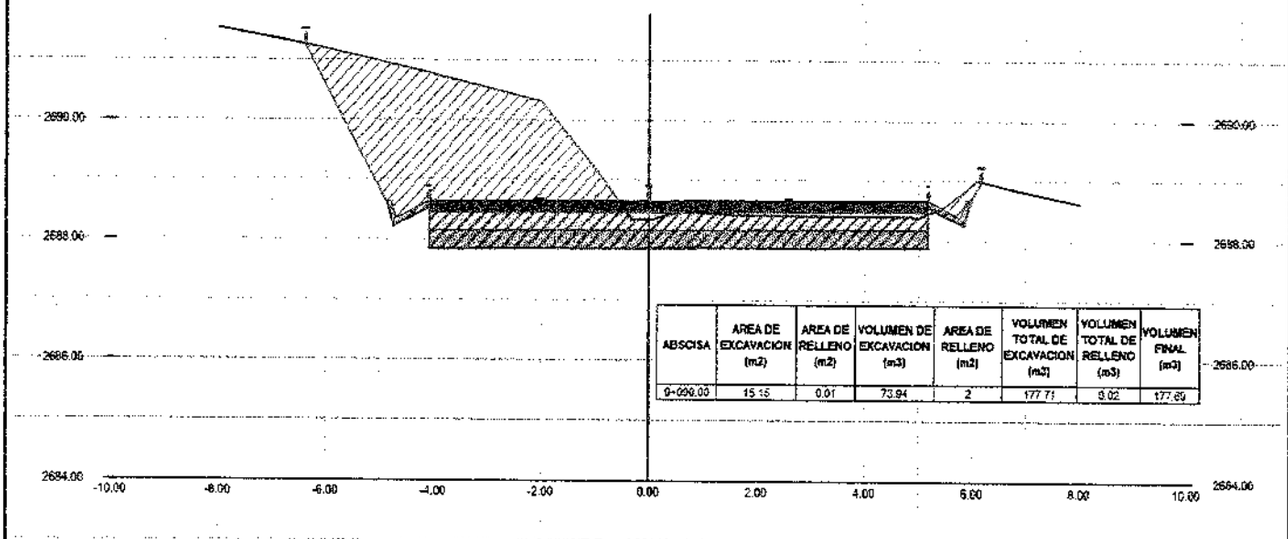


ABS = K0+090.000

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

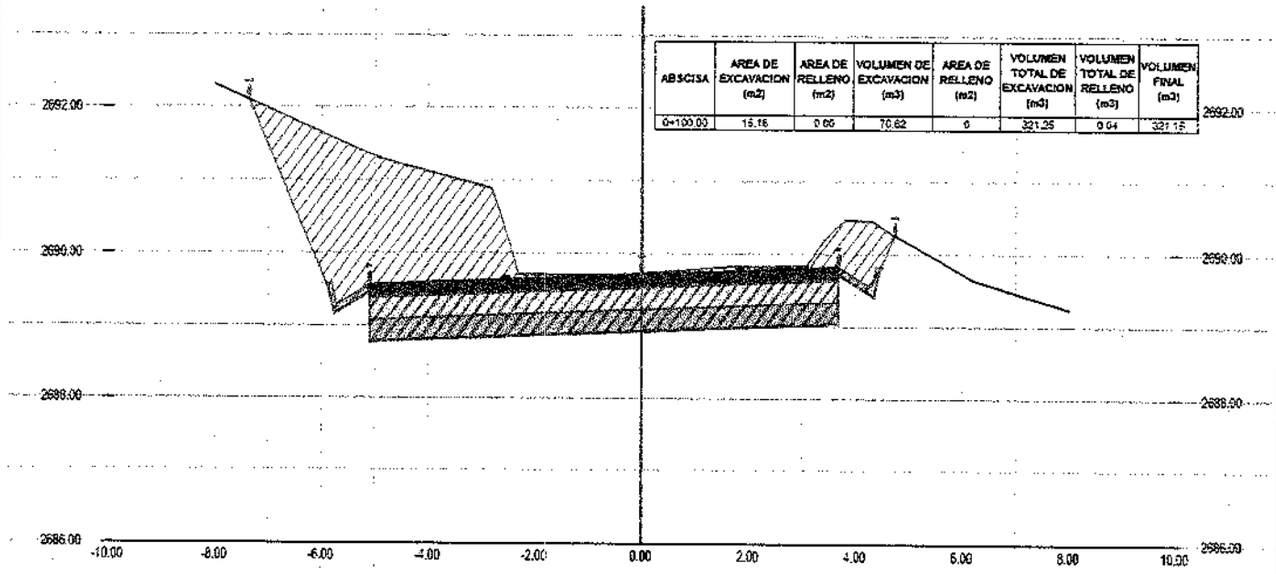

ABSCISA	AREA DE EXCAVACION (m2)	AREA DE RELLENO (m2)	VOLUMEN DE EXCAVACION (m3)	AREA DE RELLENO (m2)	VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION (m3)	VOLUMEN TOTAL DE RELLENO (m3)	VOLUMEN FINAL (m3)
0+100.00	15.16	0.00	70.62	0	321.25	0.04	321.15

ABS = K0+100.000

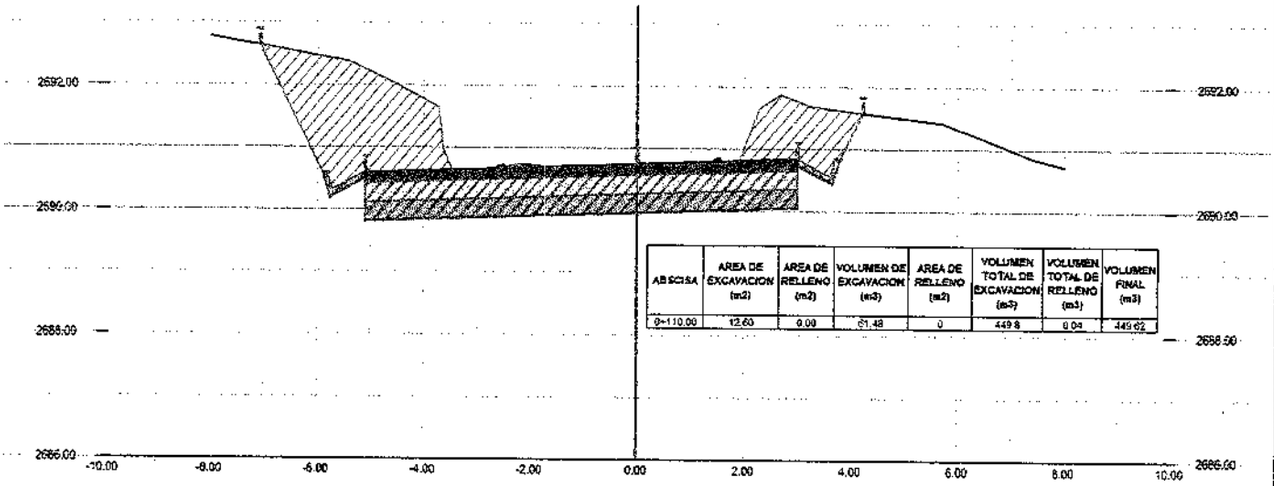

ABSCISA	AREA DE EXCAVACION (m2)	AREA DE RELLENO (m2)	VOLUMEN DE EXCAVACION (m3)	AREA DE RELLENO (m2)	VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION (m3)	VOLUMEN TOTAL DE RELLENO (m3)	VOLUMEN FINAL (m3)
0+110.00	12.60	0.00	61.48	0	449.8	0.04	449.62


ABS = K0+110.000

REALIZÓ:


YADIRA DURAN GARCIA
Tecnólogo en topografia
MP. 01-3400

ANEXOS


REGISTRO FOTOGRAFICO

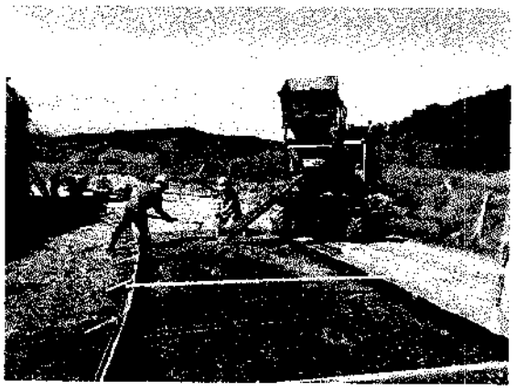




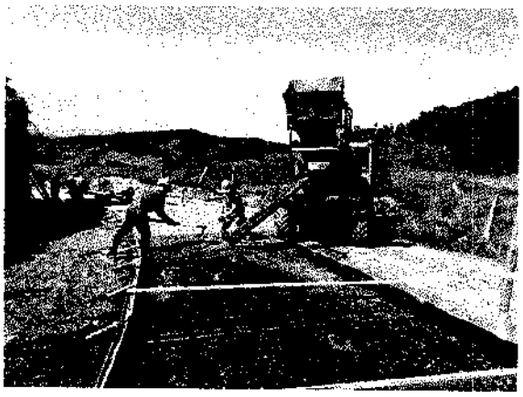




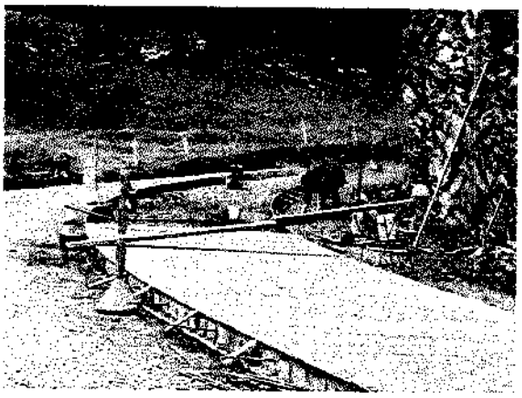

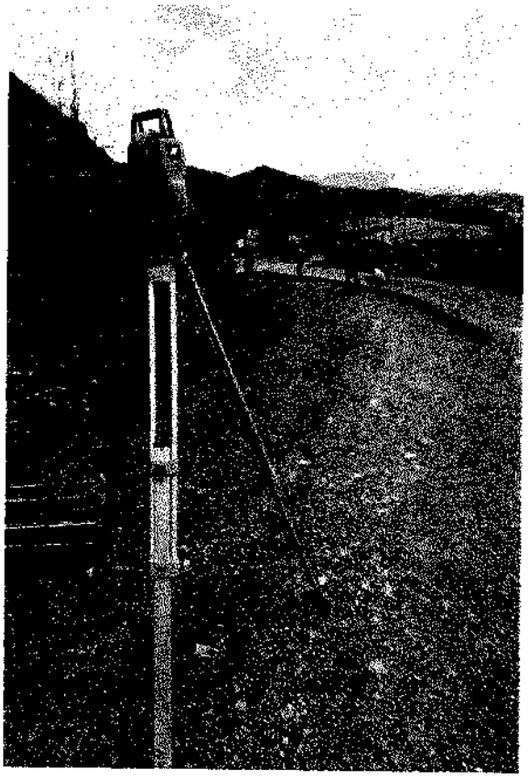





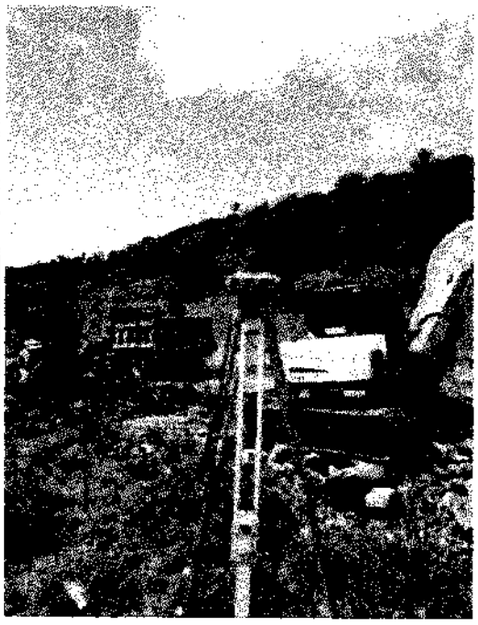











CARTERAS TOPOGRAFICAS

- **PEDRAPLEN TRAMO 1**

CARTERA TOPOGRAFICA DE REPLANTEO TRAMO 1						
ABSCISA	NORTE	ESTE	COTA SUBRASANTE PEDRAPLEN	COTA RASANTE PEDRAPLEN	COTA RASANTE CONCRETO	DESCRIPCION
BM1	2207724.543	4903943.060	2715.199	2715.199	2715.199	BM1
BM2	2207733.389	4903977.775	2712.735	2712.735	2712.735	BM2
BM4	2207442.258	4903949.567	2680.077	2680.077	2680.077	BM4
BM3	2207460.771	4903920.674	2685.238	2685.238	2685.238	BM3
BD 0+040	2207478.456	4903919.109	2682.200	2682.500	2683.000	BD 0+040
BD 0+045	2207481.512	4903915.060	2682.693	2682.993	2683.493	BD 0+045
BD 0+050	2207484.622	4903912.764	2683.209	2683.509	2684.009	BD 0+050
BD 0+055	2207487.866	4903911.525	2683.732	2684.032	2684.532	BD 0+055
BD 0+060	2207490.689	4903910.232	2684.294	2684.594	2685.094	BD 0+060
BD 0+065	2207493.732	4903909.664	2684.858	2685.158	2685.658	BD 0+065
BD 0+070	2207496.819	4903909.907	2685.422	2685.722	2686.222	BD 0+070
BD 0+075	2207499.736	4903910.945	2685.983	2686.283	2686.783	BD 0+075
BD 0+080	2207502.283	4903912.706	2686.537	2686.837	2687.337	BD 0+080
BD 0+085	2207504.682	4903914.813	2687.099	2687.399	2687.899	BD 0+085
BD 0+090	2207507.214	4903918.183	2687.865	2688.165	2688.665	BD 0+090
BD 0+095	2207510.511	4903922.775	2688.511	2688.811	2689.311	BD 0+095
BD 0+100	2207514.512	4903927.029	2689.025	2689.325	2689.825	BD 0+100
BD 0+105	2207519.072	4903930.490	2689.535	2689.835	2690.335	BD 0+105
BD 0+110	2207523.709	4903933.676	2690.042	2690.342	2690.842	BD 0+110
BD 0+115	2207528.812	4903936.049	2690.522	2690.822	2691.322	BD 0+115
BI 0+040	2207471.704	4903915.621	2682.323	2682.623	2683.123	BI 0+040
BI 0+045	2207473.999	4903911.179	2682.929	2683.229	2683.729	BI 0+045
BI 0+050	2207477.342	4903906.270	2683.495	2683.795	2684.295	BI 0+050
BI 0+055	2207481.876	4903902.367	2684.059	2684.359	2684.859	BI 0+055

BI 0+060	2207487.269	4903899.777	2684.623	2684.923	2685.423	BI 0+060
BI 0+065	2207493.150	4903898.679	2685.187	2685.487	2685.987	BI 0+065
BI 0+070	2207499.114	4903899.149	2685.751	2686.051	2686.551	BI 0+070
BI 0+075	2207504.751	4903901.154	2686.312	2686.612	2687.112	BI 0+075
BI 0+080	2207509.672	4903904.557	2686.866	2687.166	2687.666	BI 0+080
BI 0+085	2207513.830	4903908.935	2687.424	2687.724	2688.224	BI 0+085
BI 0+090	2207517.037	4903913.531	2687.828	2688.128	2688.628	BI 0+090
BI 0+095	2207519.697	4903917.115	2688.235	2688.535	2689.035	BI 0+095
BI 0+100	2207522.326	4903920.191	2688.761	2689.061	2689.561	BI 0+100
BI 0+105	2207525.211	4903922.980	2689.292	2689.592	2690.092	BI 0+105
BI 0+110	2207528.517	4903925.252	2689.799	2690.099	2690.599	BI 0+110
BI 0+115	2207532.155	4903926.944	2690.279	2690.579	2691.079	BI 0+115
EJE 0+040	2207475.080	4903917.365	2682.261	2682.561	2683.061	EJE 0+040
EJE 0+045	2207477.375	4903912.923	2682.825	2683.125	2683.625	EJE 0+045
EJE 0+050	2207480.178	4903908.800	2683.390	2683.690	2684.190	EJE 0+050
EJE 0+055	2207483.956	4903905.547	2683.954	2684.254	2684.754	EJE 0+055
EJE 0+060	2207488.450	4903903.389	2684.518	2684.818	2685.318	EJE 0+060
EJE 0+065	2207493.351	4903902.474	2685.082	2685.382	2685.882	EJE 0+065
EJE 0+070	2207498.322	4903902.866	2685.646	2685.946	2686.446	EJE 0+070
EJE 0+075	2207503.019	4903904.537	2686.207	2686.507	2687.007	EJE 0+075
EJE 0+080	2207507.120	4903907.372	2686.761	2687.061	2687.561	EJE 0+080
EJE 0+085	2207510.342	4903911.177	2687.306	2687.606	2688.106	EJE 0+085
EJE 0+090	2207512.621	4903915.622	2687.845	2688.145	2688.645	EJE 0+090
EJE 0+095	2207514.922	4903920.057	2688.380	2688.680	2689.180	EJE 0+095
EJE 0+100	2207517.886	4903924.077	2688.914	2689.214	2689.714	EJE 0+100
EJE 0+105	2207521.477	4903927.548	2689.445	2689.745	2690.245	EJE 0+105
EJE 0+110	2207525.593	4903930.376	2689.952	2690.252	2690.752	EJE 0+110
EJE 0+115	2207530.122	4903932.482	2690.432	2690.732	2691.232	EJE 0+115

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

- **SUBBASE TRAMO 1**

CARTERA TOPOGRAFICA DE REPLANTEO TRAMO 1						
ABSCISA	NORTE	ESTE	COTA SUBBRASANTE SUBBASE	COTA RASANTE SUBBASE	COTA RASANTE CONCRETO	DESCRIPCION
BM1	2.207.724.543	4.903.943.060	2.715.199	2715,199	2715,199	BM1
BM2	2.207.733.389	4.903.977.775	2.712.735	2712,735	2712,735	BM2
BM4	2.207.442.258	4.903.949.567	2.680.077	2680,077	2680,077	BM4
BM3	2.207.460.771	4.903.920.674	2.685.238	2685,238	2685,238	BM3
BD 0+040	2.207.478.456	4.903.919.109	2682,510	2682,810	2683,000	BD 0+040
BD 0+045	2.207.481.512	4.903.915.060	2683,003	2683,303	2683,493	BD 0+045
BD 0+050	2.207.484.622	4.903.912.764	2683,519	2683,819	2684,009	BD 0+050
BD 0+055	2.207.487.866	4.903.911.525	2684,042	2684,342	2684,532	BD 0+055
BD 0+060	2.207.490.689	4.903.910.232	2684,604	2684,904	2685,094	BD 0+060
BD 0+065	2.207.493.732	4.903.909.664	2685,168	2685,468	2685,658	BD 0+065
BD 0+070	2.207.496.819	4.903.909.907	2685,732	2686,032	2686,222	BD 0+070
BD 0+075	2.207.499.736	4.903.910.945	2686,293	2686,593	2686,783	BD 0+075
BD 0+080	2.207.502.283	4.903.912.706	2686,847	2687,147	2687,337	BD 0+080
BD 0+085	2.207.504.682	4.903.914.813	2687,409	2687,709	2687,899	BD 0+085
BD 0+090	2.207.507.214	4.903.918.183	2688,175	2688,475	2688,665	BD 0+090
BD 0+095	2.207.510.511	4.903.922.775	2688,821	2689,121	2689,311	BD 0+095
BD 0+100	2.207.514.512	4.903.927.029	2689,335	2689,635	2689,825	BD 0+100
BD 0+105	2.207.519.072	4.903.930.490	2689,845	2690,145	2690,335	BD 0+105
BD 0+110	2.207.523.709	4.903.933.676	2690,352	2690,652	2690,842	BD 0+110
BD 0+115	2.207.528.812	4.903.936.049	2690,832	2691,132	2691,322	BD 0+115
BI 0+040	2.207.471.704	4.903.915.621	2682,633	2682,933	2683,123	BI 0+040
BI 0+045	2.207.473.999	4.903.911.179	2683,239	2683,539	2683,729	BI 0+045
BI 0+050	2.207.477.342	4.903.906.270	2683,805	2684,105	2684,295	BI 0+050
BI 0+055	2.207.481.876	4.903.902.367	2684,369	2684,669	2684,859	BI 0+055
BI 0+060	2.207.487.269	4.903.899.777	2684,933	2685,233	2685,423	BI 0+060
BI 0+065	2.207.493.150	4.903.898.679	2685,497	2685,797	2685,987	BI 0+065
BI 0+070	2.207.499.114	4.903.899.149	2686,061	2686,361	2686,551	BI 0+070
BI 0+075	2.207.504.751	4.903.901.154	2686,622	2686,922	2687,112	BI 0+075
BI 0+080	2.207.509.672	4.903.904.557	2687,176	2687,476	2687,666	BI 0+080
BI 0+085	2.207.513.830	4.903.908.935	2687,734	2688,034	2688,224	BI 0+085
BI 0+090	2.207.517.037	4.903.913.531	2688,138	2688,438	2688,628	BI 0+090
BI 0+095	2.207.519.697	4.903.917.115	2688,545	2688,845	2689,035	BI 0+095
BI 0+100	2.207.522.326	4.903.920.191	2689,071	2689,371	2689,561	BI 0+100
BI 0+105	2.207.525.211	4.903.922.980	2689,602	2689,902	2690,092	BI 0+105
BI 0+110	2.207.528.517	4.903.925.252	2690,109	2690,409	2690,599	BI 0+110

BI 0+115	2.207.532.155	4.903.926.944	2690,589	2690,889	2691,079	BI 0+115
EJE 0+040	2.207.475.080	4.903.917.365	2682,571	2682,871	2683,061	EJE 0+040
EJE 0+045	2.207.477.375	4.903.912.923	2683,135	2683,435	2683,625	EJE 0+045
EJE 0+050	2.207.480.178	4.903.908.800	2683,700	2684,000	2684,190	EJE 0+050
EJE 0+055	2.207.483.956	4.903.905.547	2684,264	2684,564	2684,754	EJE 0+055
EJE 0+060	2.207.488.450	4.903.903.389	2684,828	2685,128	2685,318	EJE 0+060
EJE 0+065	2.207.493.351	4.903.902.474	2685,392	2685,692	2685,882	EJE 0+065
EJE 0+070	2.207.498.322	4.903.902.866	2685,956	2686,256	2686,446	EJE 0+070
EJE 0+075	2.207.503.019	4.903.904.537	2686,517	2686,817	2687,007	EJE 0+075
EJE 0+080	2.207.507.120	4.903.907.372	2687,071	2687,371	2687,561	EJE 0+080
EJE 0+085	2.207.510.342	4.903.911.177	2687,616	2687,916	2688,106	EJE 0+085
EJE 0+090	2.207.512.621	4.903.915.622	2688,155	2688,455	2688,645	EJE 0+090
EJE 0+095	2.207.514.922	4.903.920.057	2688,690	2688,990	2689,180	EJE 0+095
EJE 0+100	2.207.517.886	4.903.924.077	2689,224	2689,524	2689,714	EJE 0+100
EJE 0+105	2.207.521.477	4.903.927.548	2689,755	2690,055	2690,245	EJE 0+105
EJE 0+110	2.207.525.593	4.903.930.376	2690,262	2690,562	2690,752	EJE 0+110
EJE 0+115	2.207.530.122	4.903.932.482	2690,742	2691,042	2691,232	EJE 0+115

FICHA TECNICA DEL EQUIPO TOPOGRAFICO

ESTACION TOTAL TOPCON GPT-3205N

TOPCON

New Reflectorless distance measurement technology "Multi Pulse"

Reflectorless distance measurement up to 350M



Significant saving of power consumption



It's time.

TOPCON CORPORATION

TOPCON CORPORATION

Specifications subject to change without notice

Specifications

	GPT-3205N	GPT-3207N
TELESCOPE		
Length	150mm	
Objective Lens Dia.	45mm (1.8")	
Magnification	30×	
Image	Erect	
Field of View	1°30'	
Resolving Power	3"	
Min. Focus Distance	1.0m (3.3ft)	
DISTANCE MEASUREMENT		
Prism Mode		
Measuring Range		
Min. Zoom	1.6m	
1 prism	3,000m* 4,800m**	
3 prisms	4,000m* 5,600m**	
5 prisms	5,000m* 6,000m**	
* Distance : Sunny weather, visibility 20km or more, observing condition is not strong sunlight and heat haze is weak.		
** Distance : Sunny weather, visibility about 10km or more, observing condition is not strong sunlight and heat haze is weak.		
Measurement Accuracy*	Hi-mode: 2mm+2ppm, Standard: 3mm+2ppm, Tracking: 3mm+2ppm	
Measuring Time	Fine mode: 1time: Approx.2.5 sec. (Initial 5.5 sec.)	
	10time: Approx. 13 sec. (Initial 14 sec.)	
	Coarse mode: 1time: 2time: Approx. 0.6 sec. / Initial 3 sec.	
Non-Prism Mode (Without Sheet)		
Measuring Range	1.5m to 350m	
Measuring Accuracy	3+2ppm (1.5m to 500m)	
	Long: 5+2ppm (500m to 1,000m)	
Measuring time	Fine mode: 1time: Approx. 1.0 sec. / Initial 5 sec.	
	10time: Approx. 3.5 sec. / Initial 8.0 sec.	
	Coarse mode: 1time: 10time: Approx. 1.0 sec. / Initial 3.0 sec.	
ANGLE MEASUREMENT		
Method	Absolute reading	
Detecting System	Hi-Speed Dual Axis	
Minimum Reading	1" / 0.2" (1mgon)	5" / 1" (1mgon)
Accuracy*	3" (1mgon)	7" (2mgon)
* Standard deviation (ISO 17123-3)		
Diameter of Circle	71mm	
DISPLAY		
Display Unit	Quarter VGA (160 × 160 dots) with backlight	
	8 rows	
Keyboard	Soft-key function	
TILT CORRECTION (AUTOMATIC INDEX)		
Tilt Sensor	Dual axis	Single axis
Method	Absolute type	
Compensation Range	±3'	
Correction Unit	1" (0.2mgon)	
OTHERS		
Max. Number of Measuring Points	Approx. 24,000 points	
Instrument Height	178mm, 6.93 in.	
Laser Class	Class 1 for distance measurement / Class 2 (laser pointer)	
LEVEL SENSITIVITY		
Circular Level	10' / 2mm	
Plate Level	30" / 2mm	40" / 2mm
DIMENSION	155 (W) × 160 (D) × 320 (H) mm / 6.1 (W) × 6.3 (D) × 12.6 (H) in.	
WEIGHT		
Instrument with battery	5.2kg / 11.4 lbs.	
Master battery type	3.4kg / 7.5 lbs. (Approx. 1,000 shots)	
DURABILITY		
Protection against water and dust	IP66 (with BT-32Q) / Equivalent to the standard specification	
Ambient Temperature Range	-20°C to +50°C (-4°F to +122°F)	
BATTERY BT-32QA		
Maximum operating time (when fully recharged at +20°C / +68°F)		
Basic measurements only (without digital measurement)	45 hours, 2 hours	

*1 : 0.3 Measuring Distance *2 : Manufacturer's declaration based on ISO 17123-3

Your local Authorized Topcon Dealer is:

CERTIFICADO DE CALIBRACION

ISA MEGATECH S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN # IS 1924

ISA MEGATECH

OTORGADO A: CONSORCIO EMR- APP BELLEZA

NIT: 901.949.762-6 Fecha: 04 de octubre de 2025

TIPO DE INSTRUMENTO:	**ESTACION**	**NUMERO DE SERIE:**	**U80287**
MARCA:	**TOPCON**	**PRECISION:**	**5"**
REFERENCIA:	**GPT-3205NW**	**OTROS:**	

Siendo el día cuatro (04) de Octubre del año 2025, se recibe en nuestro laboratorio el equipo anteriormente descrito para proceder a su patrone miento y calibracion

- **Chequeo del sistema óptico mecánico y electrónico:**

Sistema óptico móvil de enfoque	Buen estado	**Nivel Tubular (Nivel de Alidada)**	Centrado
Lente óptico y lente ocular	Buen estado	**Plomada óptica (Laser)**	Centrada
Reticulo estadimétrico (Cruz filar)	Alineado	**Verticalidad en su recorrido**	Buen estado
Sistema de nivelación (base/tornillos)	Buen estado	**Movimiento eje Hz (Lectura angular)**	Buen estado
Tornillos movimiento Hz y V (Frenos)	Buen estado	**Movimiento eje V (Lectura angular)**	Buen estado
Nivel esférico (ojo de pollo)	Centrado	**Colimador guia a objetivo**	Alineado

- **Chequeo del sistema electrónico de medida (EDM)**

Sistema de nivelación (Compensadores)	Calibrados	**Contactos porta bateria**	Buen estado
Haz de Luz, guia y/o puntero laser	Alineado	**Cargador y Bateria**	Buen estado
Parámetros generales de Configuración	Correctos	**Constantes de medicion**	correctas
Pantallas y teclados	Buen funcionamiento	**Control de distancia**	Controladas y estables
Puerto RS232 (USB, SD y/o Bluetooth)	Buen funcionamiento	**Transferencia de datos**	Buen estado
Sensores de lectura	Buen estado	**Lectura angular**	Controlados y estables

- **Lectura de chequeo de ángulo vertical a la llegada con un error promedio de: 00'22"**
  Lectura frontal de chequeo: **90°00'00"** y opuesta promedio de: **270°00'22"**
  Calibrado y corregido a, Lectura frontal: 90°00'00" y opuesta: 270°00'00"

- **Lectura de chequeo de ángulo Horizontal a la llegada con un error promedio de: 07"**
  Lectura frontal de chequeo: **0°00'00"** y opuesta promedio de: **180°00'07"**
  Calibrado y corregido a, Lectura frontal, 0°00'00" y opuesta: 180°00'00"

ISA MEGATECH, certifica que el equipo se entrega funcionando en optimas condiciones de operatividad segun parametros de fabricación y recomienda a su personal chequeos constantes en su lugar de trabajo, como su transporte y almacenamiento. "Vigencia del certificado de seis (6) meses a partir de la fecha"

Nota: Usted puede llamar a nuestras instalaciones y verificar la validez del presente certificado

Firma y Sello

Cr 24 No 103-08 Provenza - Bucaramanga
3004182550 - 3158302271 isamegatechsas@gmail.com

Relación Estado del tiempo


PERIODO	DICIEMBRE	AÑO	2025

SECO	1	1	LLUVIA MODERADA	2	2	LLUVIA INTENSA	3	3	NUBOSIDAD	4	4

HORAS	FECHA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
6:00 - 7:00										3	3		3																		
7:00 - 8:00		3		3										3																	
8:00 - 9:00				3	3		3		3																						
9:00 - 10:00							3		3																						
10:00 - 11:00														3														3			
11:00 - 12:00	3											3								3								3			
12:00 - 13:00	3			3	3			3												3								3			
13:00 - 14:00	3				3				3		3									3								3			
14:00 - 15:00									3		3													3					3		
15:00 - 16:00													3										3		3				3		
16:00 - 17:00										3		3	3	3								3			3				3		

RESUMEN MES	
1	23,03%
2	29,09%
3	13,64%
4	34,24%

ESTADO DEL TIEMPO

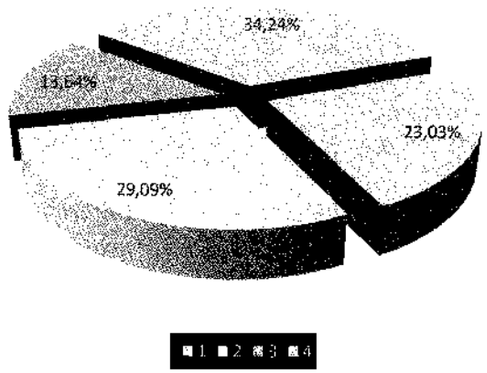


PERIODO	ENERO	AÑO	2026

SECO	1	1	LLUVIA MODERADA	2	2	LLUVIA INTENSA	3	3	NUBOSIDAD	4	4

HORAS	FECHA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
6:00 - 7:00																															
7:00 - 8:00																															
8:00 - 9:00																															
9:00 - 10:00																															
10:00 - 11:00																															
11:00 - 12:00																															
12:00 - 13:00																															
13:00 - 14:00																															
14:00 - 15:00																															
15:00 - 16:00																															
16:00 - 17:00																															

RESUMEN MES	
1	39,39%
2	27,27%
3	6,06%
4	27,27%

ESTADO DEL TIEMPO

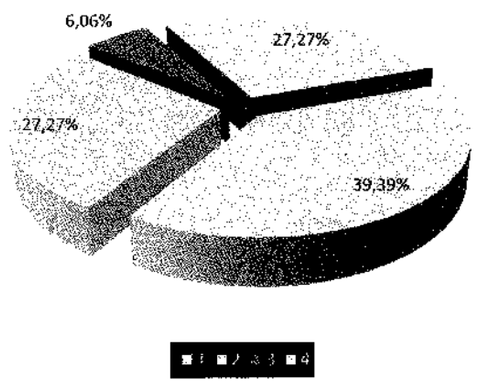


PERIODO	FEBRERO	AÑO	2026

SECO	1	1	LLUVIA MODERADA	2	2	LLUVIA INTENSA	3	3	NUBOSIDAD	4	4

HORAS	FECHA																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6:00 - 7:00												3							3					3				3
7:00 - 8:00												3												3				3
8:00 - 9:00								3																3				
9:00 - 10:00								3																				
10:00 - 11:00																												
11:00 - 12:00						3																						
12:00 - 13:00						3																						
13:00 - 14:00						3																						
14:00 - 15:00						3							3													3		
15:00 - 16:00					3				3				3						3			3				3		
16:00 - 17:00					3				3				3						3			3						

RESUMEN MES	
1	38,64%
2	19,81%
3	8,44%
4	33,12%

ESTADO DEL TIEMPO

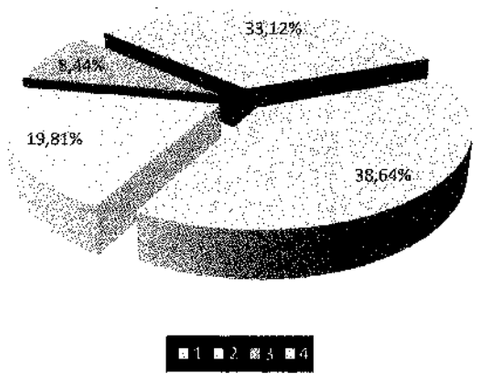

Acta de comité.

ACTA DE COMITE No. 07

Fecha: 11 MAR/26 **Hora:** 8:30am **Lugar:** Campamento contratista

Orden del día

1. Saludo e instalación de comité.
2. Verificación del avance de obra.
3. Análisis de las condiciones actuales de ejecución del proyecto.
4. Evaluación de factores que afectan el cronograma de obra.
5. Análisis de necesidad de ampliación del plazo contractual.
6. Conclusiones y compromisos.

Desarrollo de la Reunión

Durante el desarrollo del comité, la interventoría, en conjunto con el equipo técnico del contratista, realizó la verificación técnica del estado actual del proyecto, evaluando el avance físico de las actividades ejecutadas, el cumplimiento del cronograma contractual y las condiciones operativas existentes en los frentes de trabajo.

Como resultado de esta revisión se evidenció que el proyecto ha presentado disminución en los rendimientos de ejecución de las actividades constructivas, situación derivada principalmente de factores externos que han alterado las condiciones inicialmente previstas para el desarrollo del contrato.

En este sentido, el contratista expone que durante las últimas semanas se ha presentado en la zona de influencia del proyecto una temporada invernal de alta intensidad, caracterizada por precipitaciones persistentes y de considerable magnitud, las cuales han generado condiciones geotécnicas desfavorables en el corredor vial objeto de intervención.

Desde el punto de vista técnico, estas condiciones han ocasionado:

- ✓ Saturación del suelo natural producto del incremento en los niveles de humedad.
- ✓ Reducción de la capacidad portante de la subrasante, afectando las condiciones de soporte para la estructura del pavimento.
- ✓ Inestabilidad local en taludes naturales y cortes existentes, generando procesos de remoción en masa y deslizamientos de material.
- ✓ Deterioro progresivo de los accesos al frente de obra, dificultando la transitabilidad de vehículos de carga y maquinaria pesada.
- ✓ Limitaciones operativas para el desplazamiento y maniobra de equipos dentro de los frentes de trabajo.

Estas condiciones han incidido directamente en la ejecución de actividades críticas del proceso constructivo, tales como:

- ✓ Ejecución de excavaciones y movimientos de tierra.
- ✓ Conformación y mejoramiento de la subrasante.
- ✓ Transporte y disposición de materiales provenientes de corte o préstamo.
- ✓ Preparación de la estructura de pavimento y actividades preliminares de base y subbase.

La presencia de suelos saturados ha generado pérdida temporal de estabilidad en la plataforma de trabajo, lo que reduce significativamente los rendimientos de maquinaria, incrementa los tiempos de ejecución de las actividades y, en algunos casos, ha obligado a suspender temporalmente los trabajos con el fin de evitar afectaciones técnicas en las capas ya intervenidas.

Adicionalmente, se informa que durante el periodo reciente se han presentado derrumbes y deslizamientos de material sobre la única vía de acceso al frente de obra, lo cual ha generado restricciones totales en el tránsito vehicular durante determinados periodos de tiempo.

Esta situación ha ocasionado interrupciones en la logística del proyecto, ya que el transporte de maquinaria, equipos y materiales depende exclusivamente de este corredor vial. La habilitación del paso ha sido posible únicamente mediante la intervención de maquinaria dispuesta por las administraciones municipales, la cual ha realizado labores de remoción del material depositado sobre la vía.

Por otra parte, el contratista deja constancia durante el desarrollo del comité que, en la etapa inicial de ejecución del contrato, fue necesario realizar una serie de estudios técnicos fundamentales para la correcta estructuración y ejecución del proyecto, dentro de los cuales se destacan:

- ✓ Levantamiento topográfico detallado del corredor vial intervenido.
- ✓ Estudios geotécnicos orientados a la caracterización del suelo y análisis de capacidad portante.
- ✓ Elaboración del diseño geométrico de la vía conforme a las condiciones reales del terreno.

Estos estudios permitieron definir técnicamente las condiciones de intervención del proyecto, establecer los parámetros de diseño de la estructura del pavimento y garantizar la adecuada planificación de las actividades constructivas. No obstante, dichas actividades requirieron la destinación de un periodo inicial dentro del cronograma contractual.

De igual manera, durante el desarrollo del comité se analizó la problemática presentada en la estación eléctrica del municipio de Barbosa, situación que ha generado interrupciones recurrentes en el suministro de energía eléctrica en diferentes municipios de la provincia de Vélez.

Esta circunstancia ha tenido un impacto directo en la ejecución del proyecto, debido a que:

- ✓ Las plantas de trituración utilizadas para la producción de agregados pétreos dependen del suministro continuo de energía eléctrica para su operación.
- ✓ Las interrupciones en el servicio eléctrico generan paradas en los procesos de producción de materiales.
- ✓ Se presentan retrasos en el abastecimiento de agregados necesarios para la estructura del pavimento.
- ✓ Se afecta la operación de maquinaria y equipos eléctricos utilizados en obra.

Como consecuencia, se han generado interrupciones en la cadena de suministro de materiales pétreos, lo cual impacta directamente la programación de actividades relacionadas con la construcción de la estructura del pavimento.

Teniendo en cuenta los factores anteriormente descritos, desde el punto de vista técnico se concluye que:

- ✓ Las condiciones climáticas adversas han generado disminución significativa en los rendimientos de las actividades constructivas.
- ✓ Las afectaciones en las vías de acceso han ocasionado interrupciones logísticas en el transporte de materiales y maquinaria.
- ✓ Las fallas en el suministro de energía eléctrica han impactado la producción y suministro de agregados necesarios para la obra.

En consecuencia, estas situaciones han generado una alteración sustancial en las condiciones inicialmente previstas para la ejecución del contrato, afectando el desarrollo del cronograma de obra y el ritmo normal de ejecución de las actividades.

Finalmente, se deja constancia de que, durante la ejecución del proyecto, el contratista ha intentado implementar las medidas establecidas en el plan de contingencia presentado para mitigar los retrasos en obra, incluyendo la programación de jornadas adicionales de trabajo durante fines de semana y días festivos. No obstante, las cuadrillas designadas para dichas actividades no han podido desarrollar las labores programadas debido a la

persistencia de las fuertes precipitaciones en la zona, lo cual ha limitado la posibilidad de recuperar los tiempos de ejecución inicialmente previstos.

En virtud de lo anterior, y considerando el análisis técnico realizado durante el comité, se evidencia la necesidad de evaluar la ampliación del plazo contractual, con el fin de restablecer las condiciones necesarias para la adecuada culminación del proyecto y garantizar el cumplimiento del objeto contractual bajo los estándares técnicos establecidos.

COMPROMISOS

Actividad	Fecha de Cumplimiento	Responsable
1. Continuar con la implementación del plan de contingencia.	Durante la ejecución del contrato	Contratista
2. Elaborar la solicitud de prorroga al plazo contractual	13/03/2026	Contratista

El contratista de obra informó que ha venido implementando las recomendaciones de la

Siendo las 10:30 pm, se levanta la reunión y en constancia se anexa el registro de reunión del 11 de marzo del 2026, con la firma de los asistentes.

FIRMA

NOMBRE: Maira Alejandra Picón García
Cargo: Residente de interventoría

NOMBRE: Oscar David Vera
Cargo: Residente de obra

NOMBRE: Reinaldo Frederich Mantilla
Cargo: Director de Interventoría

Luis Carlos Lozano A

NOMBRE: Luis Carlos Lozano
Cargo: Director de Obra

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

Sucre, 15 de marzo de 2026

Señores
UNION TEMPORAL SOLASEC
Ing. Carlos Alberto Galvis Rueda

Referencia: Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.7912853 DEL 30 DE MAYO DE 2025, OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Asunto: SOLICITUD DE AVAL DE INTERVENTORÍA PARA EL PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 02 CO1.PCCNTR.7912853 DEL 30 DE MAYO DE 2025

Yo Wilmer Andrés García Ruiz identificado con C.C. No 1.114.119.732 de Bolívar, Valle del Cauca, actuando en representación legal del CONSORCIO EMR-APP BELLEZA con NIT. 901.949.762-6, por medio de la presente solicito amablemente a la INTERVENTORIA (UNION TEMPORAL SOLASEC) el aval requerido para solicitar a la supervisión el cobro del acta de pago parcial No. 02 del contrato No. CO1.PCCNTR.7912853 del 30 de mayo de 2025, OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", como se describe a continuación:

ACTA No. /PERIODO	VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	% DE AVANCE ACUMULADO
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 (15/12/2025 al 30/12/2025) y (29/01/2026 al 28/02/2026)	$ 910.953.373,00	64.31%

Atentamente,

WILMER ANDRES GARCÍA RUIZ
C.C. No 1.114.119.732 de Bolívar, Valle del Cauca
R.L. CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO EMR-APP BELLEZA identificado(a) con NITPJ 9019497626 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH SuperdÃ-a JurÃ-dica No. 203922109 desde el 10 de noviembre de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 11 de noviembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

	CUENTAS POR PAGAR	CODIGO	AR-GF-FR-019
		VERSIÓN	02
		FECHA DE ARMONIZACIÓN	17/05/2018
		PÁGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26000930
Expedido en : Enero 26 de 2026
Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DEC 023 DEL 19 DE ENERO 2026
Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario : CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00901949762 - 6
Neto a Pagar : $ 1,251,187,868.00
(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.005.24.2402.2402000 Código Rápido: 261498
Detalle Rubro : OC25013228 - CONSORCIO EMR-APP BELLEZA - DESEMBOLSO 01 del periodo 2025-07-25 a 2025-12-14 del contrato No 202500001618 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 202500001618 - co1.pccntr.7912853, MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CG - CG-077-6818-BBVA
Fuente de Financiación : ADICIONAL NO 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1223 CO1.PCCNTR-2616641 DEL 26 DE JUNIO DE 2021 RADICADO DEPARTAMENTO DE SANTANDER NO. 1701/2021

Concepto : OC25013228 - CONSORCIO EMR-APP BELLEZA - DESEMBOLSO 01 del periodo 2025-07-25 a 2025-12-14 del contrato No 202500001618 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 202500001618 - co1.pccntr.7912853, MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Programas de inversion	1,627,033,190.00	0.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
24362601	Retencion Contratos de Obra Pública	0.00	32,541,000.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	32,540,700.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	32,540,700.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
	PASAN $	**1,627,033,190.00**	**97,622,400.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26000930
Expedido en : Enero 26 de 2026
Orden de pago Nro. :

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	1,627,033,190.00	97,622,400.00		
24072204	Estampilla Pro Desarrollo	0.00	32,540,700.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	32,540,700.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	32,540,700.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	32,540,700.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
24072208	Tasa Pro Deporte	0.00	32,540,700.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	22,778,490.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
24070307	Contribución Obra púbica Seguridad Ciudadana Departamento	0.00	81,351,700.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
2436270221	Retencion ICA Municipio Sucre	0.00	11,389,232.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
111005070788	BBVA CTA.736-00681-8 TGD-SOL SRT CE CIAP 05052021 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA.SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,251,187,868.00	00901949762	CONSORCIO EMR-APP BELL
	SUMAS IGUALES $	1,627,033,190.00	1,627,033,190.00		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ
Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería (E)

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764098401676

(415)7707212489984(8020) 0018764098401676

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901949762	6				

11. Razón social
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga — Cód. 4

24. Dirección
CR 21 A 35 40

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-09-09 / 04:18:14 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GARCIA RUIZ WILMER ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1114119732 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

997. Fecha formalización 2025-09-09/16:18:14

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764098401676

(415)7707212489984(8020) 001876409840167 6

5. Número de identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901949762	6				

11. Razón social

CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO EMR-APP BELLEZA CR 21 A 35 40	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVEL	1	50	24	AUTORIZACIÓN	1
2	CONSORCIO EMR-APP BELLEZA CR 21 A 35 40	DOCUMENTO SOPORTE	6	DSE	1	500	24	AUTORIZACIÓN	1
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141203866872

(415)7707212489984(8020) 000014120386687 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 9 7 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CR 21 A 35 40

42. Correo electrónico consorcioemrbelleza@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 8 5 3 2 4 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 5 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA RUIZ WILMER ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-09-2025 11:44:41AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141203866872

(415)7707212489984(8020) 000014120386687 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 9 7 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 5 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	8 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 5 0 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141203866872

(415)7707212489984(8020) 000014120386687 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 9 7 6 2	6	Impuestos y Aduanes de Bucaramanga 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 5 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 4 1 1 9 7 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	RUIZ	WILMER	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141203866872

(415)7707212489984(8020) 000014120386687 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 9 7 6 2	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 8 5 0 5 3	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SAFI CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 5 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 6 1 6 5 3	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EMR S.A.S. ZOMAC

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 5 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DESGLOSE DE A.I.U.

OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

DISCRIMINACION ADMINISTRACION

		COSTO TOTAL	$ 3.945.863.857,00
ADMINISTRACION	29,00%	COSTO DIRECTO	$ 2.922.862.116,00
IMPREVISTOS	1,00%	VALOR DE LA ADMINISTRACION	$ 847.630.014,00
UTILIDADES	5,00%	VALOR DE IMPREVISTOS	$ 29.228.621,00
TOTAL AIU	35,00%	VALOR DE UTILIDADES	$ 146.143.106,00

ANALISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION

A	EJECUCION FISICA DEL CONTRATO						2,99%
	ADMINISTRACIÓN						
A1*	GASTOS PERSONAL DE OBRA						
1	DIRECTOR DE OBRA		$ 4.000.000,00	7	25%	$ 7.000.000,00	0,240%
1	RESIDENTE DE OBRA		$ 3.220.000,00	7	100%	$ 22.540.000,00	0,770%
1	INGENIERO AUXILIAR		$ 2.000.000,00	7	100%	$ 14.000.000,00	0,480%
1	PROFESIONAL HSQ		$ 2.500.000,00	7	90%	$ 15.750.000,00	0,540%
1	ESPECIALISTA EN VIAS O PAVIMENTOS		$ 4.000.000,00	3	20%	$ 2.400.000,00	0,080%
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA		$ 4.000.000,00	3	20%	$ 2.400.000,00	0,080%
1	PROFESIONAL SOCIAL		$ 3.000.000,00	3	10%	$ 900.000,00	0,030%
1	COMISION TOPOGRAFICA		$ 3.000.000,00	7	90%	$ 18.900.000,00	0,650%
A2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	Campamento		$ 1.590.034,00	1		$ 1.590.034,00	0,050%
	Ensayos de laboratorio (ver desglose ensayos laboratorio)						
6	Densidades	Subase	$ 82.350,00	1		$ 494.100,00	0,020%
10	Concreto Hidraulico	Ensayo de Asentamiento	$ 28.800,00	1		$ 288.000,00	0,010%
10		Cilindros	$ 16.900,00	1		$ 169.000,00	0,010%
10		Viguetas	$ 16.900,00	1		$ 169.000,00	0,010%
10	Resistencia a la compresión	Resistencia del concreto	$ 44.270,00	1		$ 442.700,00	0,020%

DESGLOSE DE A.I.U.

OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

DISCRIMINACION ADMINISTRACION

ADMINISTRACION	29,00%	COSTO TOTAL	$	3.945.863.857,00
IMPREVISTOS	1,00%	COSTO DIRECTO	$	2.922.862.116,00
UTILIDADES	5,00%	VALOR DE LA ADMINISTRACION	$	847.630.014,00
TOTAL AIU	35,00%	VALOR DE IMPREVISTOS	$	29.228.621,00
		VALOR DE UTILIDADES	$	146.143.106,00

ANALISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION

B	Gastos de Legalización			26,02%
1	Estampilla Pro Cultura	$	68.979.545,94	2,36%
1	Estampilla Pro Electrificación	$	68.979.545,94	2,36%
1	Estampilla Pro Desarrollo	$	68.979.545,94	2,36%
1	Estampilla Pro UIS	$	68.979.545,94	2,36%
1	Estampilla Pro Hospitales	$	68.979.545,94	2,36%
1	Estampilla Pro Adultos Mayor	$	68.979.545,94	2,36%
1	Tasa Pro Deporte	$	68.979.545,94	2,36%
1	Retencion Municipio 11*1000	$	32.151.463,28	1,10%
1	Retefuente	$	-	0,00%
1	Contrubución a obra pública	$	197.293.192,83	6,75%
1	Ordenanza 012-10% sobre el valor total de las estampillas	$	48.286.682,16	1,65%
			TOTAL ADMINISTRACION	29,00%
			TOTAL IMPREVISTOS	1,00%
			TOTAL UTILIDAD	5,00%
			GRAN TOTAL A.I.U.	35,00%
