Bogotá D.C. 6 de Febrero de 2026

Señores
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA
***Atn.:* RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ**
direccionproyectos@ug21.com
Representante Legal Interventoría
Bogotá D.C
Atn.: Alejandro Pulido
alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co
Apoyo técnico a la Supervisión

CCH001-SDHT1269-2025-034

Referencia: Contrato SDHT 1269-2025 "**REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT." (Grupo 5)."**

Asunto: Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 1.

Cordial Saludo,

En atención a lo establecido en el contrato y a las solicitudes realizadas por la Interventoría, nos permitimos remitir el Plan de Trabajo o Cronograma correspondiente a la Etapa 1, elaborado de conformidad con los lineamientos técnicos y contractuales vigentes.

El documento entregado contiene la programación de actividades, tiempos de ejecución y secuencia constructiva prevista para el desarrollo de la Etapa 1, conforme a los alcances definidos en el contrato.


En consecuencia, se remite el Plan de Trabajo para su revisión, análisis y aprobación por parte de la Interventoría y la Entidad.

Agradecemos la atención prestada a la presente y quedamos atentos a cualquier comunicación adicional.

Cordialmente.

JOSE MANUEL BALLEN BUITRAGO
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001
Anexo: Ocho (08) Folios, Cronograma CTO 12692025
CC: Alejandro Pulido- Apoyo Supervisión- alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co
Elaborado: DOV


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.**	**180 días**	**mié 4/02/26**	**mar 13/10/26**
2					
3		**ETAPA 1**	**180 días**	**mié 4/02/26**	**mar 13/10/26**
4		**Acta de inicio**	0 días	mié 4/02/26	mié 4/02/26
5		**Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo**	0 días	vie 6/02/26	vie 6/02/26
6		*Revision de documentos de ingreso por Interventoria*	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26
7		Ajuste de observaciones	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26
8		**Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1**	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26
9		*Revisión de cronograma por Interventoria*	2 días	jue 12/02/26	vie 13/02/26
10		Ajuste de observaciones	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26
11		**Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto**	0 días	vie 13/02/26	vie 13/02/26
12		*Revisión de radicados por Interventoria*	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26
13		Ajuste de observaciones	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26
14					
15		**FASE 1 - FACTIBILIDAD**	**44 días**	**mié 4/02/26**	**lun 6/04/26**
16		**Verificación Normativa**	**41 días**	**jue 5/02/26**	**jue 2/04/26**
17		Consulta a Entidades (translapos o interferencias)SDHT-IDU-EAAB-RENOBO-IDRD-CVP	7 días	jue 5/02/26	vie 13/02/26
18		Metodología - Estudio de Titulos	3 días	jue 5/02/26	lun 9/02/26
19		Revisión documentacion Caperta "00.INFORMACIÓN TÉCNICA DE SOPORTE"	7 días	jue 5/02/26	vie 13/02/26
20		Entrega de metodologia - Estudio de titulos	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26
21		Informe - Matriz Consulta a Entidades	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
22		Revisión por parte de interventoria	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
23		Subsanación de observaciones	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
24		**Topografía**	**42 días**	**jue 5/02/26**	**vie 3/04/26**
25		Localización General / Georeferenciación con sistema IGAC	2 días	jue 5/02/26	vie 6/02/26
26		Poligonal de amarre	7 días	lun 9/02/26	mar 17/02/26
27		Nivelación	8 días	mié 18/02/26	vie 27/02/26
28		Levantamiento de detalles	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26
29		Procesamiento de información y Digitalización	11 días	lun 16/03/26	lun 30/03/26
30		*Entrega de cartografia preliminar informe del estudio topográfico*	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
31		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
32		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
33		Entrega final topografía	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26
34		**Arquitectonico - Urbano**	**42 días**	**mié 4/02/26**	**jue 2/04/26**
35		Recopilacion y análisis de informacion (RAI)	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
36		Entrega Recopilación y análisis de información (RAI)	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
37		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
38		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
39		Diagnostico Urbanistíco	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
40		Metodologia del diseño	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
41		Entrega Metodologia y diagnostico del diseño	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
42		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
43		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
44		**Vías, transporte y movilidad**	**43 días**	**mié 4/02/26**	**vie 3/04/26**
45		Recopilación y análisis de información	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
46		Entrega Recopilación y análisis de información	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
47		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
48		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
49		Metodología para la elaboración de estudios de transito	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26

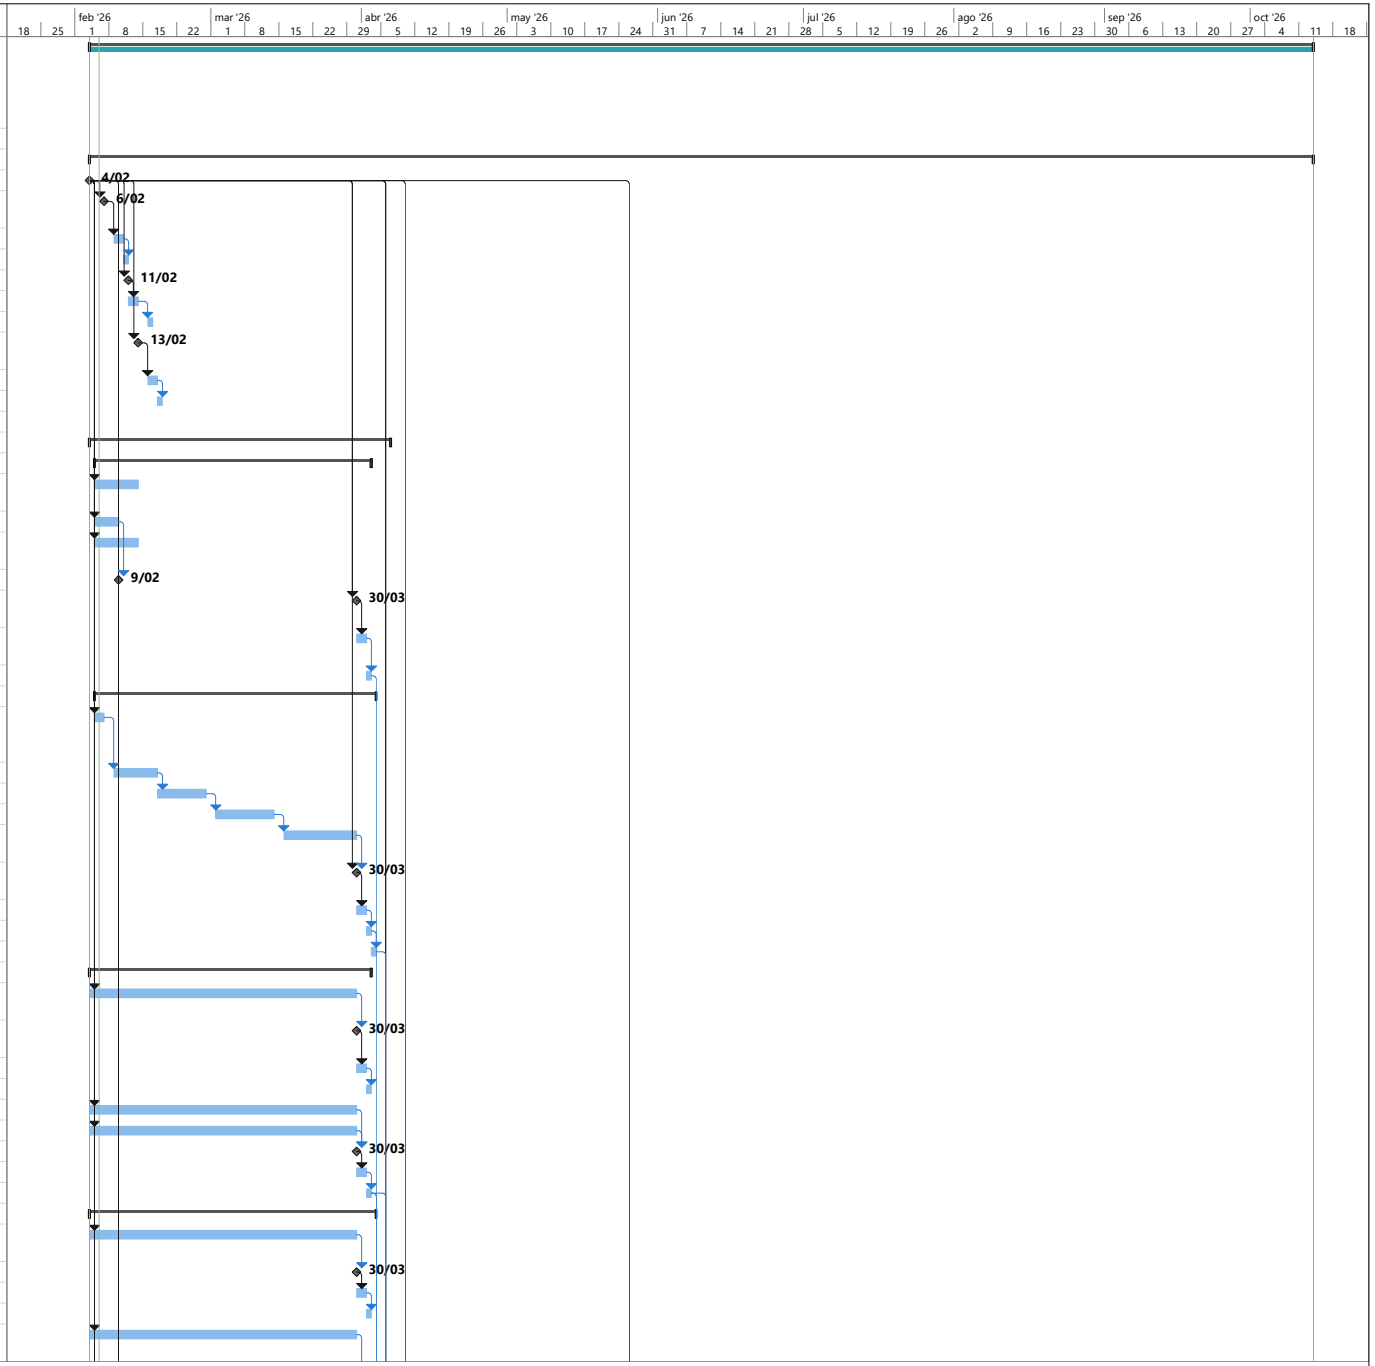

Proyecto: IDRD-3775
Fecha: vie 6/02/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
50		Entrega metodología para la elaboración de estudios de transito	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
51		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
52		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
53		Socialización ante SDHT y Radicación ante SDM	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26
54		**Geometria vial**	**42 días**	**mié 4/02/26**	**jue 2/04/26**
55		Bases catastrales	20 días	mié 4/02/26	mar 3/03/26
56		Recomendaciones de diseño estructural	19 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26
57		Recopilación y análisis de información	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
58		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
59		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
60		**Redes hidrosanitarias**	**42 días**	**mié 4/02/26**	**jue 2/04/26**
61		Datos tècnicos emitidos por la EAAB ESP	16 días	mié 4/02/26	mié 25/02/26
62		Planos con informacion secundaria	23 días	jue 26/02/26	lun 30/03/26
63		Recopilaciòn y anàlisis de inormacion - Informe preliminar	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
64		Entrega de Recopilación y análisis de información - Informe preliminar	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
65		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
66		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
67		Informe de inspeccion de redes hidraulicas	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
68		Entrega Informe de inspección de redes hdiraulicas	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
69		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
70		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
71		**Redes secas**	**42 días**	**mié 4/02/26**	**jue 2/04/26**
72		Inventario de la infraestructura	19 días	mié 4/02/26	lun 2/03/26
73		Recopilacion del marco normativo	15 días	mar 10/02/26	lun 2/03/26
74		Datos tecnicos	25 días	mié 4/02/26	mar 10/03/26
75		Planos de redes	20 días	mar 3/03/26	lun 30/03/26
76		Recopilación y análisis de información Redes de energia	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
77		Entrega de recopilación y análisis de información redes de energia	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
78		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
79		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
80		Planos redes existentes, iluminacion, telecomunicaciones, Gas	12 días	mar 3/03/26	mié 18/03/26
81		Cantidades existentes	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26
82		Informe Factibilidad - redes de energìa	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
83		Entrega Informe Factibilidad - redes de energía	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
84		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
85		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
86		**Redes Telecomunicaciones**	**42 días**	**mié 4/02/26**	**jue 2/04/26**
87		Recopilación y análisis de información Telecomunicaciones	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
88		Entrega de recopilacion y análisis de informacion redes Telecomunicaciones	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
89		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
90		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
91		Informe de Factibilidad - redes de telecomuniaciones	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
92		Entrega informe Factibilidad - redes de telecomunicaciones	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
93		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
94		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
95		**Red Gas - Vanti**	**42 días**	**mié 4/02/26**	**jue 2/04/26**
96		Recopilación y análisis de información Vanti	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
97		Entrega de recopilación y análisis de información redes Vanti	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
98		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
99		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26

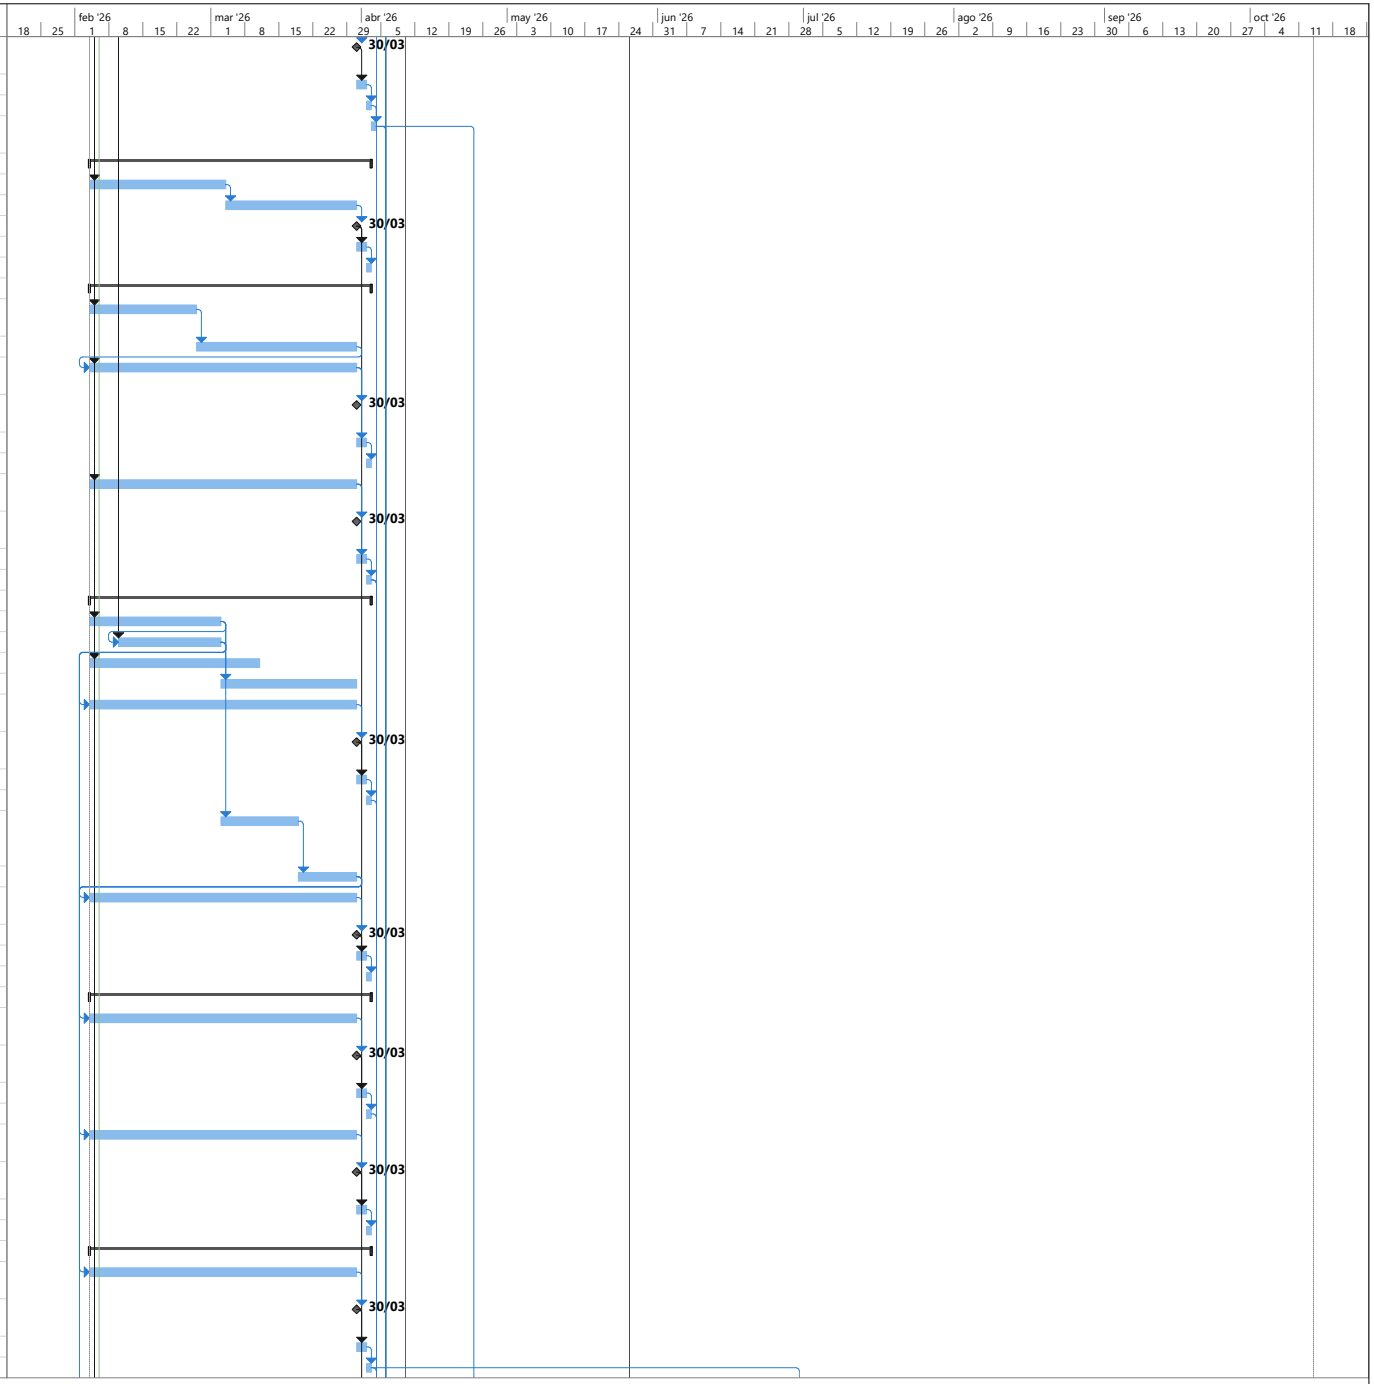

Proyecto: IDRD-3775
Fecha: vie 6/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
100		Informe de Factibilidad - Red de gas	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
101		Entrega de informe de factilibilidad - Red de gas	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
102		Revisión de Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
103		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
104		**Componente BIM**	**44 días**	**mié 4/02/26**	**lun 6/04/26**
105		Entrega plan BEP	5 días	mié 4/02/26	mar 10/02/26
106		Revisión de interventoría	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26
107		Ajustes consultoría	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26
108		Cargue de información de datos al CDE	36 días	lun 16/02/26	lun 6/04/26
109		**Arqueología**	**43 días**	**mié 4/02/26**	**vie 3/04/26**
110		Recopilación de información del proyecto según definiciones de solución	12 días	mié 4/02/26	jue 19/02/26
111		Registro arqueológico	15 días	vie 20/02/26	jue 12/03/26
112		Diagnóstico arqueológico	12 días	vie 13/03/26	lun 30/03/26
113		Entrega de diagnóstico Arqueológico	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
114		Revisión de la interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
115		Ajustes de Consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
116		Entrega definitiva Diagnóstico Arqueólogico	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26
117		**Presupuesto y programación**	**43 días**	**mié 4/02/26**	**vie 3/04/26**
118		Estimación de cantidades	12 días	mié 4/02/26	jue 19/02/26
119		Lista precios referencia	14 días	vie 20/02/26	mié 11/03/26
120		Presupuesto estimado Etapa Factibilidad	13 días	jue 12/03/26	lun 30/03/26
121		*Entrega a Interventoría Presupuesto Factibilidad*	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
122		Revisión Interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
123		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
124		Entrega final presupuesto Factibilidad	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26
125		**Geotecnia**	**43 días**	**mié 4/02/26**	**vie 3/04/26**
126		Recopilación de información existente	10 días	mié 4/02/26	mar 17/02/26
127		Análisis de información recopilada	15 días	mié 18/02/26	mar 10/03/26
128		Entrega Plan de exploración para fundaciones	14 días	mié 11/03/26	lun 30/03/26
129		Localización de amenza sísmica	9 días	mié 11/03/26	lun 23/03/26
130		Localización geotécnica	5 días	mar 24/03/26	lun 30/03/26
131		Localización geologíca	14 días	mié 11/03/26	lun 30/03/26
132		*Entrega de RAI Geotecnia y Metodología*	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
133		Revisión de la interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
134		Ajustes de Consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
135		Entrega definitiva RAI y Metodología Geotecnia	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26
136		**Pavimentos**	**42 días**	**mié 4/02/26**	**jue 2/04/26**
137		Análisis interdiciplinario previo	13 días	mié 4/02/26	vie 20/02/26
138		Inventario y diagnostico preliminar de infraestructura existente	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26
139		Plan de exploracion geotécnica	14 días	mié 11/03/26	lun 30/03/26
140		Plan de inventario y diagnóstico de vías	16 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26
141		Entrega RAI y Metodologia de diseño	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
142		Revisión de la interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
143		Ajustes de Consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
144		**Estructuras**	**42 días**	**mié 4/02/26**	**jue 2/04/26**
145		Localización del proyecto	5 días	mié 4/02/26	mar 10/02/26
146		Recopilación de información	6 días	mié 11/02/26	mié 18/02/26
147		Inventario de estructuras existentes	4 días	jue 19/02/26	mar 24/02/26
148		Identificación de estructuras a proyectar en fase de estudios y diseños	5 días	mié 25/02/26	mar 3/03/26
149		Analisis de estructuras	4 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26
150		Planos generales de las estructuras	5 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26
151		Informe técnico	10 días	mar 17/03/26	lun 30/03/26
152		Entrega de informe técnico	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
153		Revisión de la interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
154		Ajustes de consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
155		**Ambiental y SST**	**42 días**	**mié 4/02/26**	**jue 2/04/26**
156		Recopilación de información existente - lineamiento ambientales	21 días	mié 4/02/26	mié 4/03/26

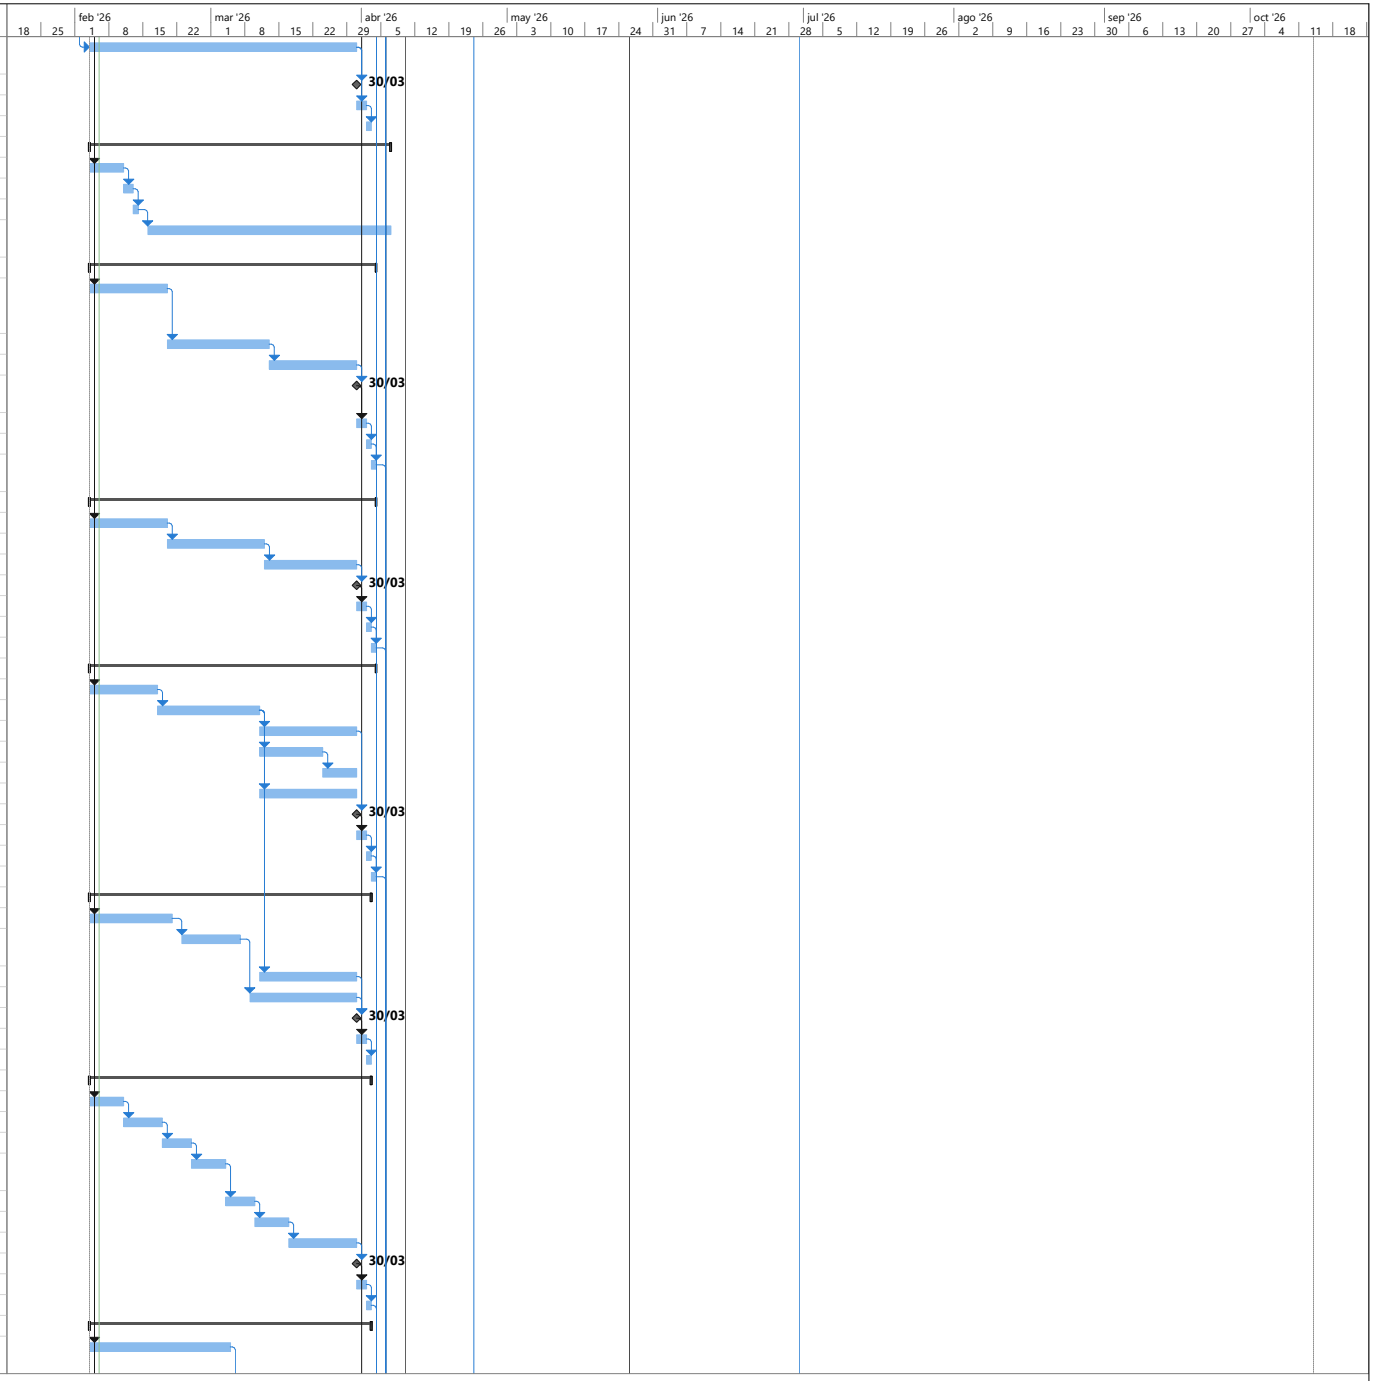

Proyecto: IDRD-3775
Fecha: vie 6/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
157		Visita de reconocimiento - 1° Comité ambiental - SST	6 días	mié 4/02/26	mié 11/02/26
158		Inventario forestal	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
159		Inventario de fauna	39 días	mié 4/02/26	lun 30/03/26
160		Diagnóstico - Linea Base	18 días	jue 5/03/26	lun 30/03/26
161		*Entrega Diagnóstico - Linea Base*	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
162		Revisión de la interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
163		Ajustes de consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
164		**Social**	**41 días**	**jue 5/02/26**	**jue 2/04/26**
165		Avance de caracterización	20 días	jue 5/02/26	mié 4/03/26
166		Revisión por parte de interventoría	2 días	jue 5/03/26	vie 6/03/26
167		Ajustes de consultoría	1 día	lun 9/03/26	lun 9/03/26
168		Localización del punto de atención	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26
169		Reunion de inicio	15 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26
170		Comité mi Habitát	22 días	jue 5/02/26	vie 6/03/26
171		Diagnostico Social	38 días	jue 5/02/26	lun 30/03/26
172		Entrega Diagnostico social	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26
173		Revisión de la interventoría	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26
174		Ajustes de consultoría	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
175					
176		**FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**71 días**	**mar 31/03/26**	**mar 7/07/26**
177		**Verificación Normativa**	**66 días**	**vie 3/04/26**	**vie 3/07/26**
178		Informe - gestion con entidades	63 días	vie 3/04/26	mar 30/06/26
179		Entrega de informe - gestión con entidades	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
180		Revisión por parte de interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
181		Subsanación de observaciones	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
182		**Topografía**	**66 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/07/26**
183		Cartografia	15 días	lun 6/04/26	vie 24/04/26
184		Informe estudio topográfico	47 días	lun 27/04/26	mar 30/06/26
185		*Entrega informe del estudio topográfico*	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
186		Revisión de Interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
187		Ajustes consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
188		Entrega final topografía	1 día	lun 6/07/26	lun 6/07/26
189		**Arquitectonico - Urbano - Paisajismo**	**66 días**	**vie 3/04/26**	**vie 3/07/26**
190		Memoria de diseños	14 días	vie 3/04/26	mié 22/04/26
191		Planos georeferenciados	7 días	mar 14/04/26	mié 22/04/26
192		Trazado general del diseño	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26
193		Plano de implantación urbana	5 días	jue 30/04/26	mié 6/05/26
194		Esquema general del proyecto	23 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26
195		Entrega esquema general del proyecto	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26
196		Revisión de Interventoría	2 días	jue 7/05/26	vie 8/05/26
197		Ajustes consultoría	1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26
198		Memoria de diseños paisajístico	18 días	mar 12/05/26	jue 4/06/26
199		Planta de diseño urbano paisajístico	9 días	lun 25/05/26	jue 4/06/26
200		Planta de detalles	5 días	vie 5/06/26	jue 11/06/26
201		Perfiles transversales y longitudinales	5 días	vie 12/06/26	jue 18/06/26
202		Detalles constructivos	5 días	vie 19/06/26	jue 25/06/26
203		Cantidades de obra de urbanismo y espacio público	3 días	vie 26/06/26	mar 30/06/26
204		Documento técnico estudios y diseños	36 días	mar 12/05/26	mar 30/06/26
205		Entrega de documento técnico estudios y diseños	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
206		Revisión de Interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
207		Ajustes consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
208		**Vias, Transporte y movilidad**	**69 días**	**mar 31/03/26**	**vie 3/07/26**
209		Aprobacion metodologia SDM	0 días	vie 24/04/26	vie 24/04/26
210		Entrega del cálculo tránsito promerio diario (TPD)	0 días	mar 5/05/26	mar 5/05/26
211		Revisión de Interventoría	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26
212		Ajustes consultoría	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26
213		Diseños de señalización	37 días	lun 6/04/26	mar 26/05/26
214		Diseños de semaforización (En caso de que aplique)	25 días	mié 27/05/26	mar 30/06/26

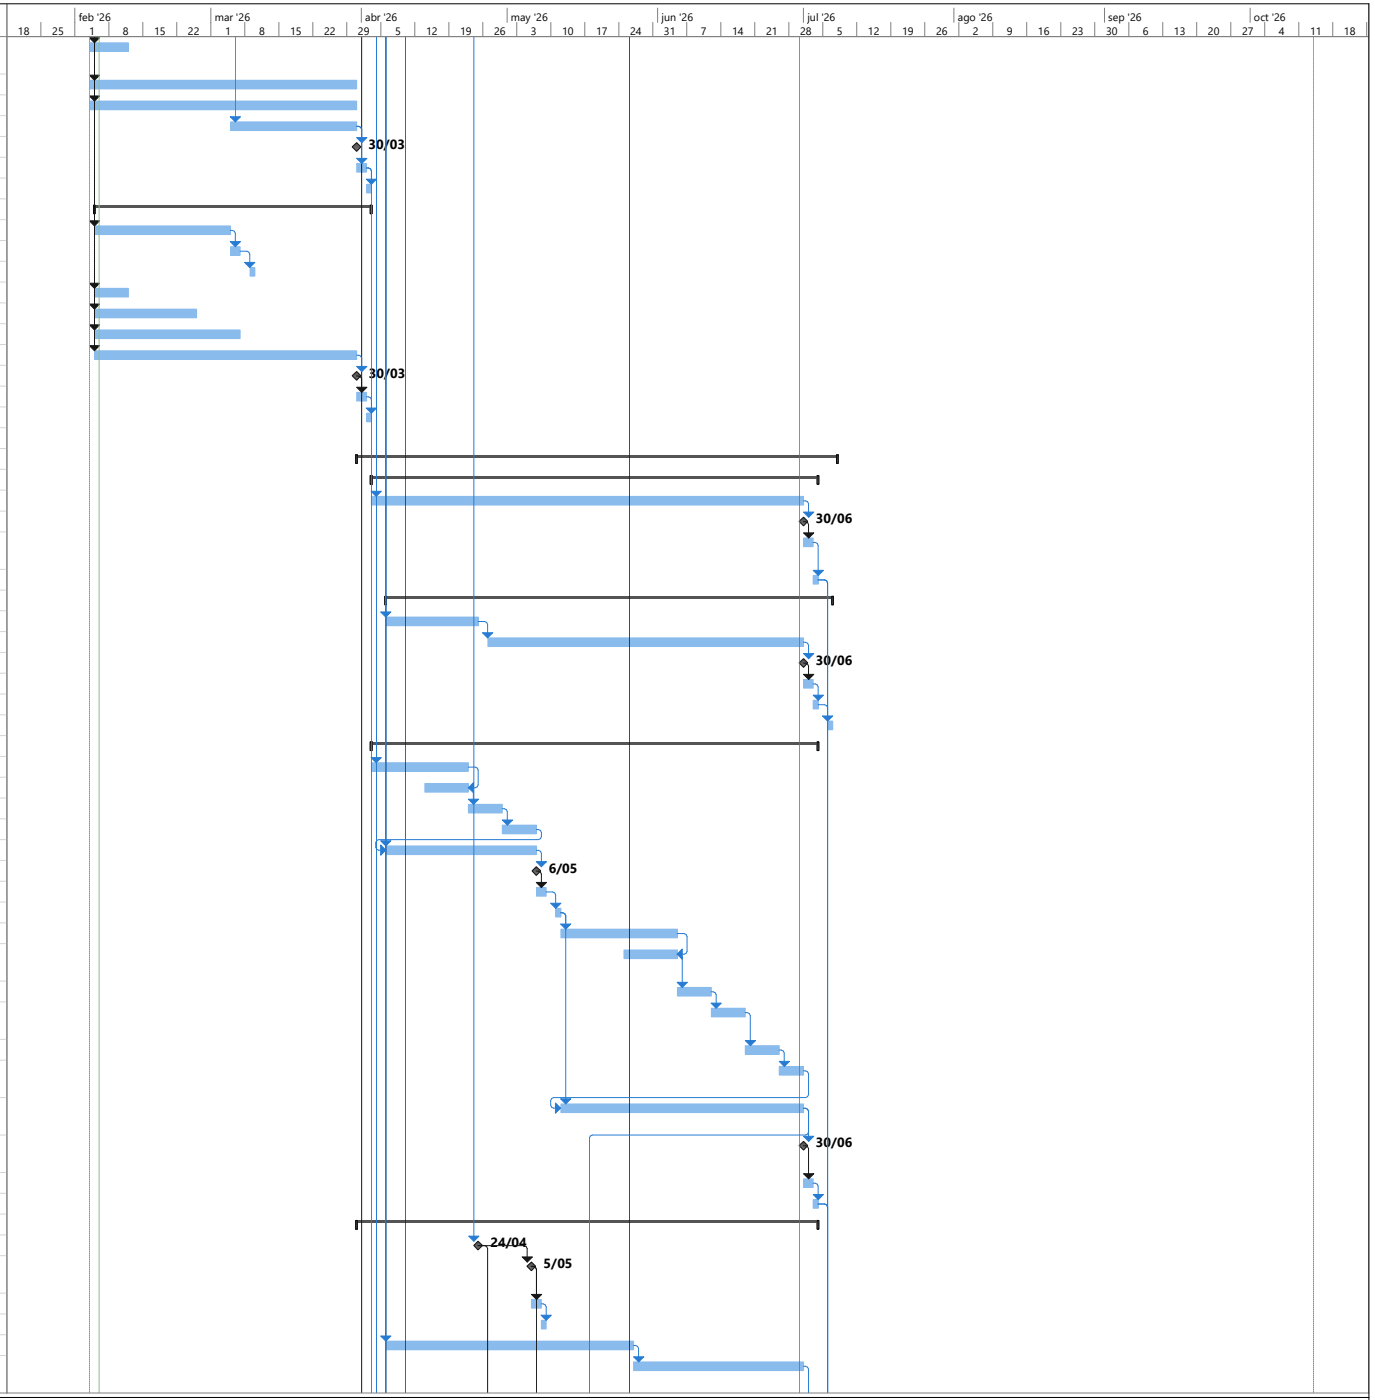

Proyecto: IDRD-3775
Fecha: vie 6/02/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
215		Entrega de diseño de señalización y semaforiazación	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
216		Revisión de Interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
217		Ajustes consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
218		Estudio de transito	7 días	lun 27/04/26	mar 5/05/26
219		Entrega estudio de transito	0 días	mar 5/05/26	mar 5/05/26
220		Revisión de Interventoría	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26
221		Ajustes consultoría	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26
222		**Geometria vial**	**68 días**	**mar 31/03/26**	**jue 2/07/26**
223		Análisis intersecciones y bocacalles	15 días	mar 31/03/26	lun 20/04/26
224		Planos georreferenciados	15 días	mar 21/04/26	lun 11/05/26
225		Diseño de secciones transversales	15 días	mar 12/05/26	lun 1/06/26
226		Memoria de diseños	10 días	mar 2/06/26	lun 15/06/26
227		Secciones transversales	10 días	mar 16/06/26	lun 29/06/26
228		Entrega informe tecnico definitivo	0 días	lun 29/06/26	lun 29/06/26
229		Revisión de Interventoría	2 días	mar 30/06/26	mié 1/07/26
230		Ajustes consultoría	1 día	jue 2/07/26	jue 2/07/26
231		**Redes Hidrosanitarias**	**66 días**	**vie 3/04/26**	**vie 3/07/26**
232		Planos alcantarillado y pluvial	38 días	vie 3/04/26	mar 26/05/26
233		Planos redes acueducto	38 días	vie 3/04/26	mar 26/05/26
234		Planos redes matrices (si aplica)	25 días	mié 27/05/26	mar 30/06/26
235		Planos de estructuras especiales (si aplica)	25 días	mié 27/05/26	mar 30/06/26
236		Informe tecnico de diseños	62 días	lun 6/04/26	mar 30/06/26
237		Entrega ingorme tecnico de diseños	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
238		Revisión de Interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
239		Ajustes consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
240		Informe tecnico implementación de SUDS	62 días	lun 6/04/26	mar 30/06/26
241		Entrega informe técnico implementación de SUDS	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
242		Revisión de Interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
243		Ajustes consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
244		**Redes Secas**	**68 días**	**vie 3/04/26**	**mar 7/07/26**
245		Investigacion de redes	15 días	vie 3/04/26	jue 23/04/26
246		Planos digitalizados redes existenes	17 días	vie 24/04/26	lun 18/05/26
247		Diseño fotometrico - UAESP	15 días	mar 19/05/26	lun 8/06/26
248		Diseño de redes eléctricas - Series Enel	16 días	mar 9/06/26	mar 30/06/26
249		Entrega Diseño de redes eléctricas de alumbrado público (costos y cantidades)	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
250		Revisión de Interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
251		Ajustes consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
252		Presupuesto preliminar con cantidades	2 días	lun 6/07/26	mar 7/07/26
253		Radicacion ENEL/UAESP	0 días	vie 3/07/26	vie 3/07/26
254		**Redes de Telecomunicaciones**	**68 días**	**vie 3/04/26**	**mar 7/07/26**
255		Investigacion de redes telecomunicaciones	15 días	vie 3/04/26	jue 23/04/26
256		Planos digitalizados redes telecomunicaciones existenes	17 días	vie 24/04/26	lun 18/05/26
257		Diseño de redes Telecomunicaciones	31 días	mar 19/05/26	mar 30/06/26
258		Entrega Diseño Final de telecomunicaciones	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
259		Revisión de Interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
260		Ajustes consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
261		Presupuesto preliminar con cantidades	2 días	lun 6/07/26	mar 7/07/26
262		Radicacion ESP Telecomunicaciones	0 días	vie 3/07/26	vie 3/07/26
263		**Redes de Gas**	**68 días**	**vie 3/04/26**	**mar 7/07/26**
264		Investigacion de redes Gas	15 días	vie 3/04/26	jue 23/04/26
265		Planos digitalizados redes Vanti existenes	17 días	vie 24/04/26	lun 18/05/26
266		Diseño final de redes vanti	31 días	mar 19/05/26	mar 30/06/26
267		Entrega Diseño final de redes Vanti	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26

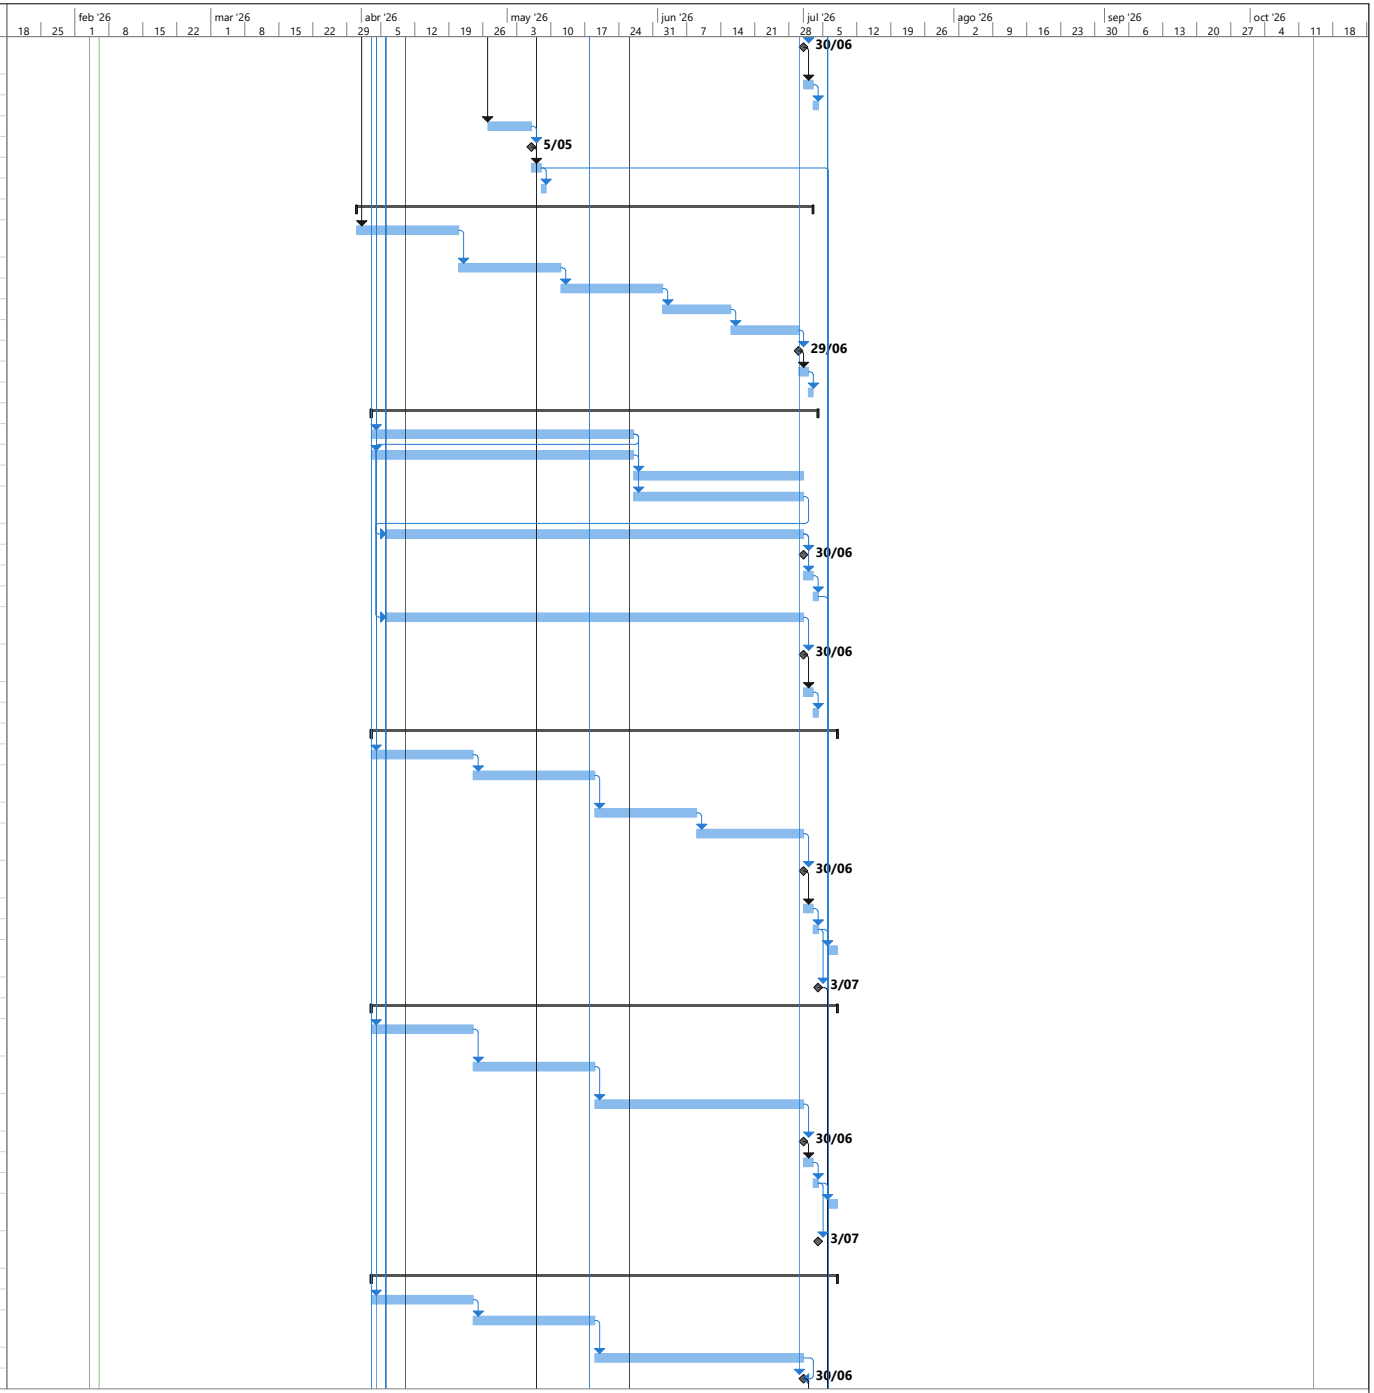

Proyecto: IDRD-3775
Fecha: vie 6/02/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
268		Revisión de Interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
269		Ajustes consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
270		Presupuesto preliminar con cantidades	2 días	lun 6/07/26	mar 7/07/26
271		Radicacion Vanti	0 días	vie 3/07/26	vie 3/07/26
272		**Arqueología**	**66 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/07/26**
273		Identificación de interferencias con proyecto	30 días	lun 6/04/26	vie 15/05/26
274		Prospección Arqueologíca	32 días	lun 18/05/26	mar 30/06/26
275		*Entrega Prospección Arqueologíca*	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
276		Revisión de interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
277		Ajustes de consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
278		Entrega final Prospección Arqueologíca	1 día	lun 6/07/26	lun 6/07/26
279		**Presupuesto y programación**	**66 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/07/26**
280		Recopilación de información de cara área	20 días	lun 6/04/26	vie 1/05/26
281		Cantidades de obra	15 días	lun 4/05/26	vie 22/05/26
282		Análisis de precios unitarios -APUS-	15 días	lun 25/05/26	vie 12/06/26
283		Presupuesto de obra	12 días	lun 15/06/26	mar 30/06/26
284		*Entrega cantidades presupuesto y cronograma de obra*	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
285		Revisión de interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
286		Ajustes de consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
287		Entrega final Presupuesto	1 día	lun 6/07/26	lun 6/07/26
288		**Geotecnia**	**66 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/07/26**
289		Ajustes a plan de exploración	8 días	lun 6/04/26	mié 15/04/26
290		Trabajos de campo	10 días	jue 16/04/26	mié 29/04/26
291		Informe de avance 1	0 días	mié 29/04/26	mié 29/04/26
292		Ensayos de laboratorio	21 días	jue 30/04/26	jue 28/05/26
293		Evaluación del suelo de cumetnacion para la estructura de paviemento	10 días	vie 15/05/26	jue 28/05/26
294		Análisis de ingeniería	23 días	vie 29/05/26	mar 30/06/26
295		*Entrega informe de geotecnia estudios y diseños*	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
296		Revisión de interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
297		Ajustes de consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
298		Entrega final geotecnia estudios y diseños	1 día	lun 6/07/26	lun 6/07/26
299		**Pavimentos**	**58 días**	**jue 16/04/26**	**lun 6/07/26**
300		Exploración geotecnica para pavimentos	10 días	jue 16/04/26	mié 29/04/26
301		Ensayos de laboratorio	21 días	jue 30/04/26	jue 28/05/26
302		Análisis TPD -Factor Daño	16 días	mié 6/05/26	mié 27/05/26
303		Informe diseño de pavimentos	23 días	vie 29/05/26	mar 30/06/26
304		*Entrega diseño de Pavimentos*	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
305		Revisión de interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
306		Ajustes de consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
307		Entrega final Informe Diseño de Pavimentos	1 día	lun 6/07/26	lun 6/07/26
308		**Estructuras**	**67 días**	**vie 3/04/26**	**lun 6/07/26**
309		Definición de necesidades de urbanismo, redes	32 días	vie 3/04/26	lun 18/05/26
310		Diseño estructuras requeridas	10 días	mar 19/05/26	lun 1/06/26
311		Planos de diseños	5 días	mar 2/06/26	lun 8/06/26
312		Memorias de cálculo	16 días	mar 9/06/26	mar 30/06/26
313		*Entrega diseño Estructuras*	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
314		Revisión de interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
315		Ajustes de consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
316		Entrega final Informe Diseño de Estructuras	1 día	lun 6/07/26	lun 6/07/26
317		**Ambiental, SST y Riesgos**	**68 días**	**jue 2/04/26**	**lun 6/07/26**
318		Sistema de gestión SST	15 días	jue 2/04/26	mié 22/04/26
319		Protocolo de bioseguridad	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26
320		Entrega de productos ambiental - SST	0 días	mié 29/04/26	mié 29/04/26
321		Revisión de interventoría	2 días	jue 30/04/26	vie 1/05/26
322		Ajustes de consultoría	1 día	lun 4/05/26	lun 4/05/26
323		Identificación de determinantes ambientales, trámites y permisos requeridos por la AAC	15 días	lun 4/05/26	vie 22/05/26
324		Diagnóstico - Línea Base Ambiental FINAL.	12 días	lun 25/05/26	mar 9/06/26
325		Matriz de identificación de riesgos	15 días	mié 10/06/26	mar 30/06/26
326		Manual Ambiental de Obra -MAO-	15 días	mié 10/06/26	mar 30/06/26
327		PG-RCD	15 días	mié 10/06/26	mar 30/06/26

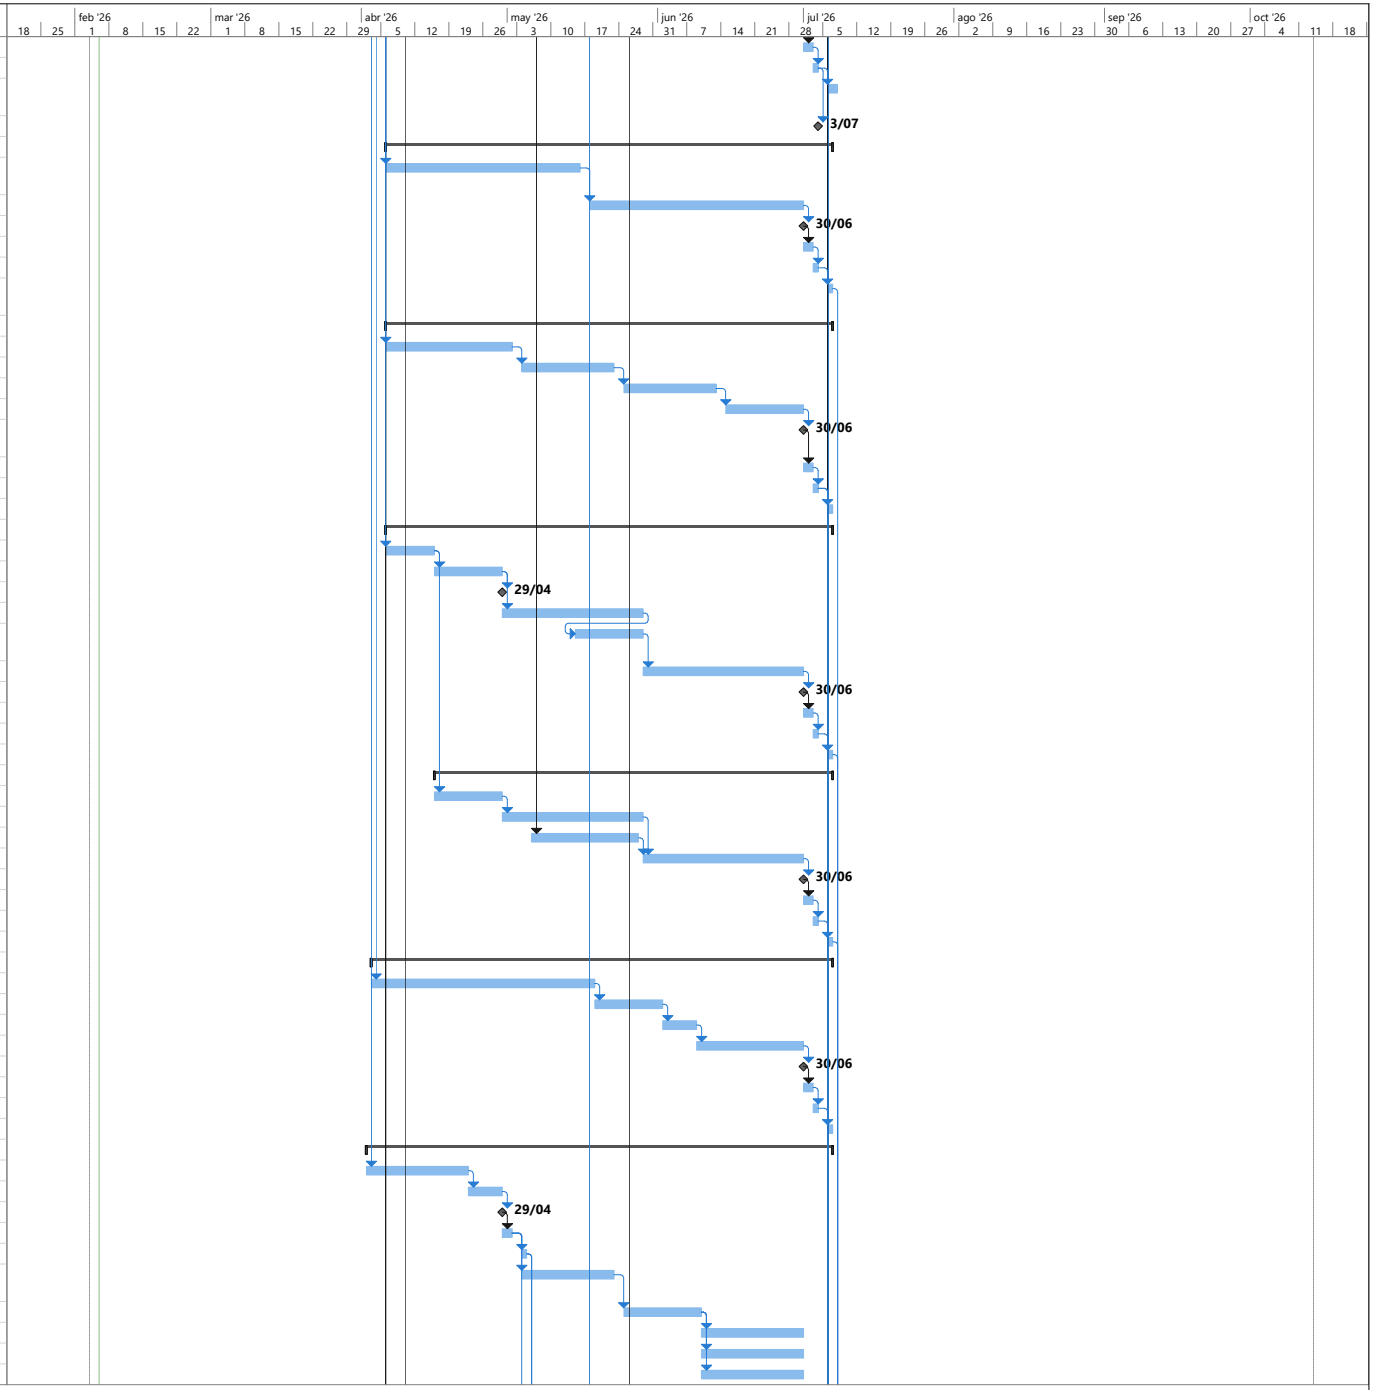

Proyecto: IDRD-3775
Fecha: vie 6/02/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
328		Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST	30 días	lun 4/05/26	vie 12/06/26
329		Entrega Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST	0 días	vie 12/06/26	vie 12/06/26
330		Revisión de interventoría	2 días	lun 15/06/26	mar 16/06/26
331		Ajustes de consultoría	1 día	mié 17/06/26	mié 17/06/26
332		Protocolo de Bioseguridad y PAPSO	41 días	mar 5/05/26	mar 30/06/26
333		Entrega protocolo de Bioseguridad y PAPSO	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
334		Revisión de interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
335		Ajustes de consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
336		Diseño Paisajistico y SUDS	41 días	mar 5/05/26	mar 30/06/26
337		Insumos para trámite de Aprovechamiento forestal ante SDA	29 días	mié 20/05/26	lun 29/06/26
338		*Entrega final Estudio Ambiental y SST*	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
339		Revisión de interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
340		Ajustes de consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
341		Entrega final Estudio Ambiental y SST	1 día	lun 6/07/26	lun 6/07/26
342		**Mitigación de riesgos**	**61 días**	**vie 10/04/26**	**vie 3/07/26**
343		Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)	58 días	vie 10/04/26	mar 30/06/26
344		Entrega Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26
345		Revisión de interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
346		Ajustes de consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
347		**Social**	**65 días**	**lun 6/04/26**	**vie 3/07/26**
348		Reunion con comunidad	15 días	lun 6/04/26	vie 24/04/26
349		Reunion de avance 50%	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26
350		Programa identifiación y evaluación de impactos	62 días	lun 6/04/26	mar 30/06/26
351		Revisión de interventoría	2 días	mié 1/07/26	jue 2/07/26
352		Ajustes de consultoría	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
353					
354		**Fase 3 - Aprobaciones**	**72 días**	**lun 6/07/26**	**mar 13/10/26**
355		**Verificaciòn Normativa**	**66 días**	**lun 6/07/26**	**lun 5/10/26**
356		Cargue de documentacion VUC (si aplica)	63 días	lun 6/07/26	mié 30/09/26
357		Informe - gestion con entidades	63 días	lun 6/07/26	mié 30/09/26
358		Entrega Informe - gestion con entidades	0 días	mié 30/09/26	mié 30/09/26
359		Revisión por parte de interventoría	2 días	jue 1/10/26	vie 2/10/26
360		Subsanación de observaciones	1 día	lun 5/10/26	lun 5/10/26
361		**Arquitectonico - Urbano - Paisajismo**	**66 días**	**lun 6/07/26**	**lun 5/10/26**
362		Informe general urbanismo	31 días	lun 6/07/26	lun 17/08/26
363		Informe general Paisajísmo	31 días	mar 18/08/26	mar 29/09/26
364		Documento técnico Final	63 días	lun 6/07/26	mié 30/09/26
365		Entrega documento técnico final	0 días	mié 30/09/26	mié 30/09/26
366		Revisión de Interventoría	2 días	jue 1/10/26	vie 2/10/26
367		Ajustes consultoría	1 día	lun 5/10/26	lun 5/10/26
368		Aprobación acta WR - Jardín Botánico Bogotá	30 días	lun 6/07/26	vie 14/08/26
369		Aprobación aprovechamiento forestas ante secretaría de ambiente - SDA	30 días	lun 17/08/26	vie 25/09/26
370		Ajustes de cantidades	15 días	lun 17/08/26	vie 4/09/26
371		**Tránsito y transporte**	**62 días**	**lun 6/07/26**	**mié 30/09/26**
372		Radicacion ante movilidad	0 días	lun 6/07/26	lun 6/07/26
373		Revisión por parte de movilidad	15 días	mar 7/07/26	lun 27/07/26
374		Ajuste consultoría	10 días	mar 28/07/26	lun 10/08/26
375		Revisión por parte de interventoría	2 días	mar 11/08/26	mié 12/08/26
376		subsanacion de observaciones	1 día	jue 13/08/26	jue 13/08/26
377		Aprobacion SDM	15 días	vie 14/08/26	jue 3/09/26
378		Informe con aprobaciones	19 días	vie 4/09/26	mié 30/09/26
379		Entrega informe con aprobaciones	0 días	mié 30/09/26	mié 30/09/26
380		**Redes Hidraulicas**	**63 días**	**lun 6/07/26**	**mié 30/09/26**
381		Tramites ante EAAB	30 días	lun 6/07/26	vie 14/08/26
382		Atención de observaciones	30 días	lun 17/08/26	vie 25/09/26
383		Entrega observaciones	1 día	lun 28/09/26	lun 28/09/26

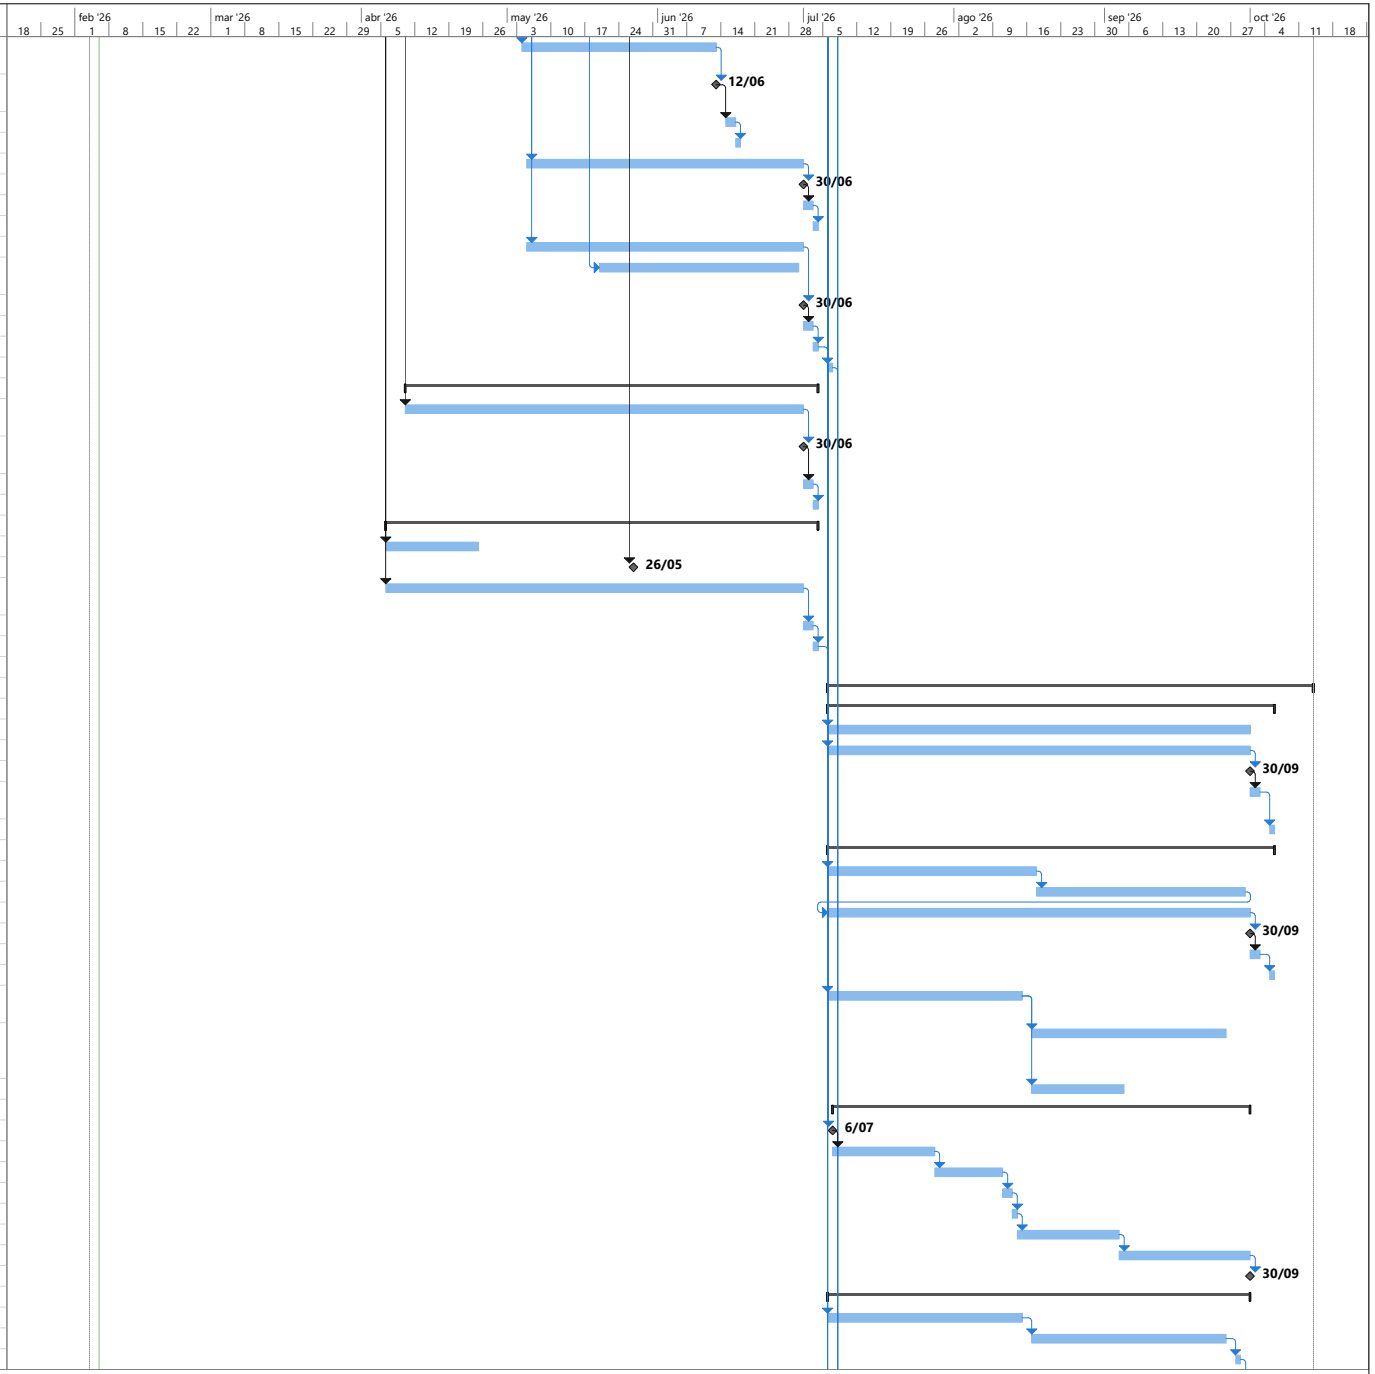

Proyecto: IDRD-3775
Fecha: vie 6/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
384		Aprobación Final No objeción EAAB	2 días	mar 29/09/26	mié 30/09/26
385		**Redes Secas**	**63 días**	**lun 6/07/26**	**mié 30/09/26**
386		Tramites Ante ENEL/UAESP	31 días	lun 6/07/26	lun 17/08/26
387		Ajustes a diseños	32 días	mar 18/08/26	mié 30/09/26
388		Aprobación Fotometría UAESP	0 días	mié 30/09/26	mié 30/09/26
389		Aprobación Factibilidad ENEL	0 días	mié 30/09/26	mié 30/09/26
390		**Arqueología**	**62 días**	**mar 7/07/26**	**mié 30/09/26**
391		Trámite ante ICANH PMA	28 días	mar 7/07/26	jue 13/08/26
392		Ajustes requeridos	28 días	vie 14/08/26	mar 22/09/26
393		Entrega atención observaciones	6 días	mié 23/09/26	mié 30/09/26
394		Aprobación final PMA - ICANH	0 días	mié 30/09/26	mié 30/09/26
395		**Presupuesto y programación**	**65 días**	**lun 6/07/26**	**vie 2/10/26**
396		Ajustes por cambios en otras áreas	31 días	lun 6/07/26	lun 17/08/26
397		Entrega ajustes APUs	32 días	mar 18/08/26	mié 30/09/26
398		Enterga plan de trabajo o cronograma de obra	0 días	mié 30/09/26	mié 30/09/26
399		Revisión por parte de interventoría	2 días	jue 1/10/26	vie 2/10/26
400		Aprobación final Presupuesto	1 día	jue 1/10/26	jue 1/10/26
401		**Geotécnia**	**63 días**	**mar 7/07/26**	**jue 1/10/26**
402		Ajustes por cambios de otras áreas	31 días	mar 7/07/26	mar 18/08/26
403		Trámite ante EAAB de estudios requeridos	15 días	mié 19/08/26	mar 8/09/26
404		Ajustes requeridos	10 días	mié 9/09/26	mar 22/09/26
405		Atención de observaciones	6 días	mié 23/09/26	mié 30/09/26
406		Entrega atención observaciones	0 días	mié 30/09/26	mié 30/09/26
407		Aprobación Final geotecnia	1 día	jue 1/10/26	jue 1/10/26
408		**Pavimentos**	**62 días**	**mar 7/07/26**	**mié 30/09/26**
409		Ajustes por cambios en otras áreas	36 días	mar 7/07/26	mar 25/08/26
410		Entrega ajustes	26 días	mié 26/08/26	mié 30/09/26
411		Aprobación final urbanismo	0 días	mié 30/09/26	mié 30/09/26
412		**Ambiental, SST y Riesgos**	**62 días**	**mar 7/07/26**	**mié 30/09/26**
413		Ajustes por cambios de otras áreas	29 días	mar 7/07/26	vie 14/08/26
414		Trámite ante SDA - JBB	15 días	lun 17/08/26	vie 4/09/26
415		Atención observaciones	17 días	lun 7/09/26	mar 29/09/26
416		Entrega atención observaciones	0 días	mar 29/09/26	mar 29/09/26
417		Aprobación final Ambiental - SST	1 día	mié 30/09/26	mié 30/09/26
418		**social**	**72 días**	**lun 6/07/26**	**mar 13/10/26**
419		Reunion de finalización	45 días	lun 6/07/26	vie 4/09/26
420		Informe Final de ejecución del pg social	22 días	lun 14/09/26	mar 13/10/26

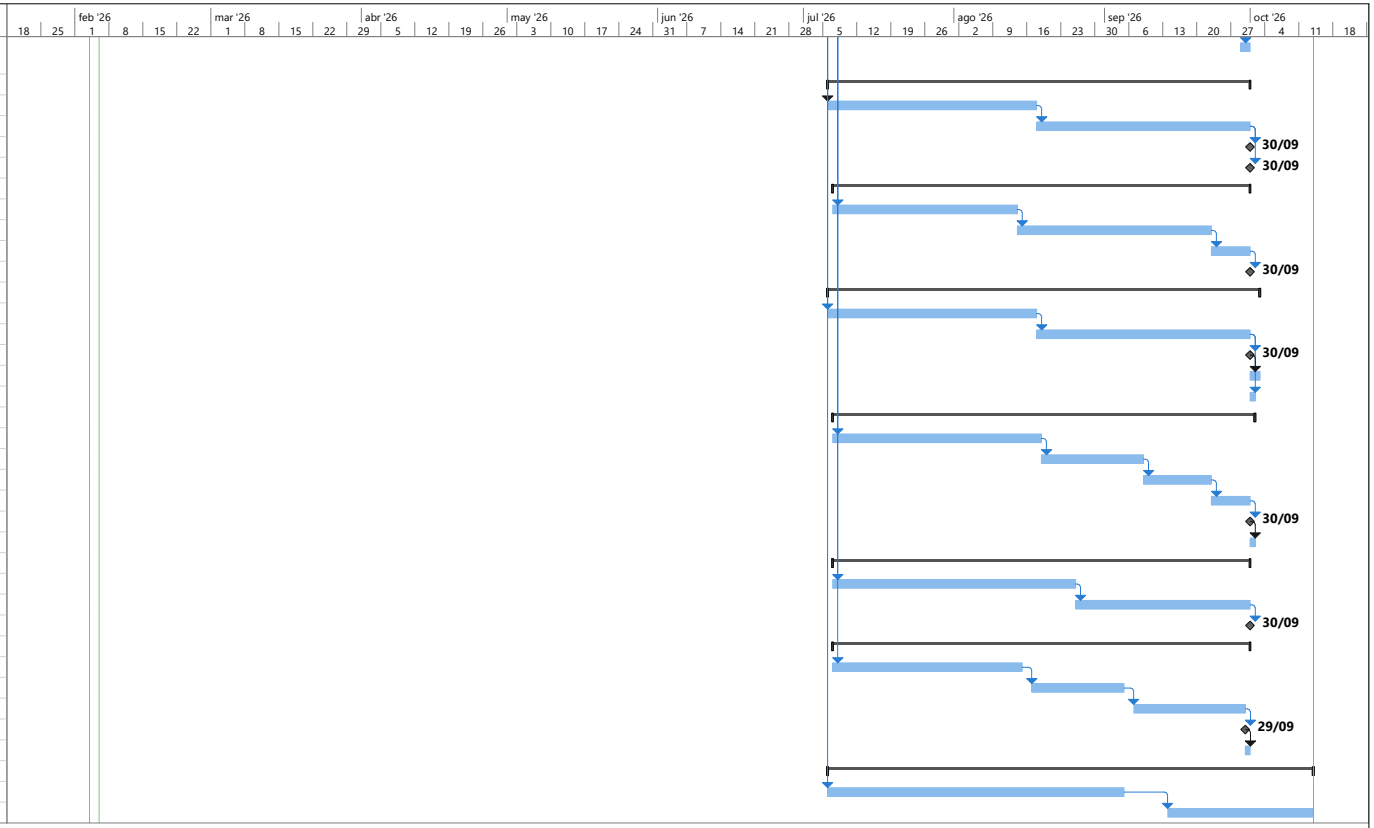

Proyecto: IDRD-3775
Fecha: vie 6/02/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso
