OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"



INFORME MENSUAL N°07 DE INTERVENTORIA

PERIODO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO N.º 1007 DE 2025

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CARTA DE PRESENTACIÓN

BARRANCABERMEJA, DICIEMBRE 28 de 2025

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Diagonal 60 KM 1 Vía al Llanito
Barrancabermeja

REFERENCIA: CONTRATO No. 1007 de 2025, OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

Respetados señores.

De manera atenta me dirijo a Ustedes con el fin de realizar la entrega del Informe mensual N.º 07 de Interventoría, del contrato de la referencia, correspondiente al periodo de ejecución del 28 de noviembre de 2025 al 27 de diciembre de 2025, con el fin de presentar el informe mensual de interventoría en la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".
Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contractuales

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L UT INTER DEPORTES 2025
NIT: 901.926.678-6

1. INTRODUCCIÓN

El Distrito de Barrancabermeja enfrenta el reto de seguir fortaleciendo su infraestructura urbana y social, especialmente en lo relacionado con el acceso a espacios públicos que fomenten la recreación, el deporte y la sana convivencia. En este contexto, surge el proyecto “Construcción de Áreas de Deportes Extremos y Alternativos – Distrito Urbano”, como una iniciativa que busca atender la creciente demanda de la población, en particular de los jóvenes, por espacios modernos, seguros y adecuados para la práctica de disciplinas deportivas no convencionales.

Esta propuesta tiene como objetivo principal crear un entorno integral donde se promuevan valores como la inclusión, la participación ciudadana, el aprovechamiento del tiempo libre y el fortalecimiento del tejido social, a través de la construcción de instalaciones para deportes como skateboarding, BMX, parkour, entre otros. Además, se plantea como un motor de transformación urbana, revitalización de zonas subutilizadas y dinamización de la economía local mediante el impulso del turismo deportivo y la cultura urbana.

El “Distrito Urbano” se perfila, así como una apuesta estratégica para el desarrollo social y urbano de Barrancabermeja, en línea con las políticas públicas de bienestar, juventud, seguridad y sostenibilidad.

2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Necesidad

El proyecto nace debido al auge de los deportes extremos y alternativos contrastando con las disciplinas tradicionales en los cuales entregan una experiencia de adrenalina, libertad y creatividad y por la falta de espacios acordes para la práctica de los mismos en donde los diferentes deportistas puedan desarrollar sus habilidades físicas aumentando el rendimiento competitivo.

Se plantea por parte del distrito de Barrancabermeja la construcción de un parque de deportes extremos generando inclusiones de diversos grupos como jóvenes deportistas, jóvenes en situación de riesgo, adultos y población con interés en practicar deportes alternativos.

Asimismo, este proyecto abre nuevas posibilidades para el desarrollo turístico, educativo y económico, posicionando a la comunidad como un referente en actividades recreativas no convencionales y sostenibles.

2.2. OBJETIVO

Promover la práctica de deportes extremos y alternativos como una herramienta de desarrollo físico, mental y social, fomentando hábitos saludables entre la comunidad.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se desarrolla en un área de 5970 m2 en el sector de la villa olímpica del distrito de Barrancabermeja distribuidos entre pistas, rampas y estructuras para la práctica de deportes extremos y alternativos como lo son el Skate, el BMX, parkour, entre otros, adicionalmente contara con contenedores que podrán ser utilizados como zonas de alquileres de equipos, restaurantes y zonas de hidratación y descanso. Se contará con bahías de parqueo e iluminación exterior con el fin de que se pueda ser utilizado en horas de la noche y pueda ser aprovechado al máximo su utilización.

3.1. Localización.

Barrancabermeja es un municipio colombiano ubicado a orillas del Río Magdalena, en la parte occidental del departamento de Santander. Es sede de la refinería de petróleo más grande del país y recientemente nombrado Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso en la región de Santander. Dista 114 Km de Bucaramanga hacia el este siendo esta la ciudad más grande en la región del Magdalena Medio.

Limita al Norte con el Municipio de Puerto Wilches, al Sur con los Municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el Municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al Occidente con el Río Magdalena.

El proyecto se encuentra ubicado en la villa olímpico colindando con el Coliseo Luis F. Castellanos y el estadio Municipal de Futbol Daniel Villa Zapata.

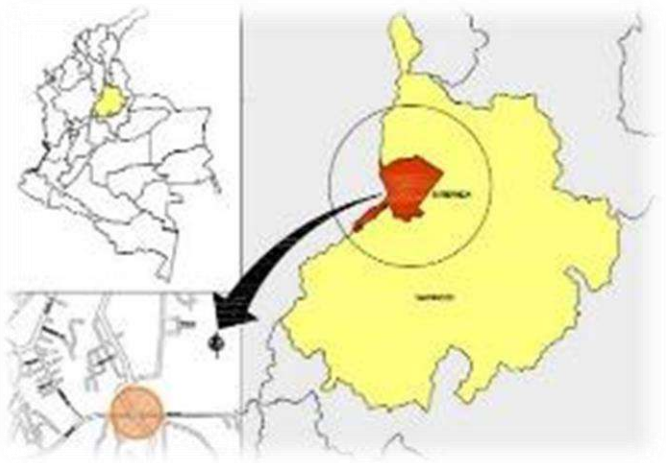


Figura 2. Localización General del Proyecto



Figura 3. Planta de zona de proyecto.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1007 – 25
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	UT INTER DEPORTES 2025
NIT.	901.926.678-6
REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.095.816.909 de Floridablanca (SANTANDER)
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS “DISTRITO URBANO” EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($431.256.000) INCLUIDO IVA
RÉGIMEN TRIBUTARIO	COMÚN
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES.
PRORROGA No 1	UN (01) MES
PRORROGA No 2	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	OCHO (08) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-01012 del 13 de febrero del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-02201 del 01 de abril del 2025
APROBACIÓN DE GARANTIAS	CO1.WRT.16808641 del 16 de abril de 2025
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 de enero del 2026

4.1. RELACIÓN DE ACTAS DE LA INTERVENTORÍA:

DESCRIPCION	FECHA
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
ACTA PARCIAL No 1	05 de agosto de 2025
ACTA PARCIAL No 2	23 de septiembre de 2025
ADICIONAL EN PLAZO No 1	21 de octubre de 2025
ACTA PARCIAL No 3	13 de noviembre de 2025
ACTA PARCIAL No 4	12 de diciembre de 2025
ADICIONAL EN PLAZO No 2	05 de diciembre de 2025

4.2. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA:

Nombre de la Aseguradora: **Seguros mundial.**

PÓLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE ADICION EN PLAZO No 2		
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**

		DESDE	HASTA
B-100060103	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2025	28/11/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/12/2025	28/01/2029
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	28/01/2026	28/01/2031

5. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	0889-25
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS “DISTRITO URBANO” EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA:	CUATRO MIL CIENTO DIESCISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	901.922.463-1
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRES SERANO GOMEZ
CEDULA	13.870.690 DE BUCARAMANGA
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES
PRORROGA No 1	UN (01) MES
PRORROGA No 2	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	OCHO (08) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-01011 del 13 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-02162 del 31 de marzo de 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.16683589 del 29 de abril de 2025
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 de enero del 2026

5.1. RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA:

DESCRIPCION	FECHA
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
OTRO SI ACLARATORIO No 1	29 de julio de 2025
ACTA PARCIAL No 1	01 de agosto de 2025
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No 1	20 de agosto de 2025
ACTA PARCIAL No 2	19 de septiembre de 2025
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No 2	17 de octubre de 2025
ADICIONAL EN PLAZO No 1	21 de octubre de 2025
ACTA PARCIAL No 3	13 de noviembre de 2025

ACTA PARCIAL No 4	12 de diciembre de 2025
ADICIONAL EN PLAZO No 2	05 de diciembre de 2025

5.2. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA:

Nombre de la Aseguradora: Seguros mundial.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE ADICIONAL EN PLAZO No 2			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
B-100016184	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	7/03/2025	27/01/2026
B-100016184	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	5/12/2025	27/07/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5/12/2025	27/01/2029
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/01/2026	27/01/2031

6. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRAS EJECUTADAS

Con el fin de representar los trabajos y dejar constancia de las actividades, y desarrollo de los mismos en el presente capitulo se mostrará la cuantificación de cada uno de los ítems desarrollados, los cuales han sido revisados por parte de interventoría con el fin de tener una cuantificación acertada a las cantidades ejecutadas hasta la fecha teniendo en cuenta que si bien el periodo es mensual es deber de la interventoría mantener informada la supervisión de la ejecución que se tiene de la obra hasta la fecha.


CAPITULO I PRELIMINARES

1.1. LOCALIZACIÓN, REPLANTEO DEL AREA DEL PROYECTO.

DESCRIPCIÓN

Para esta actividad se realizó un levantamiento topográfico del área del proyecto en el cual se corroboran medidas del terreno, se localizan los diferentes elementos como cimentación, y diferentes zonas que requiere el proyecto de acuerdo a los planos presentados.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Localización y replanteo del área del proyecto	M2	5.970,70	$ 5.264,00	$31.429.765,00	5.970,70	$31.429.765,00	0,00	$ 0,00

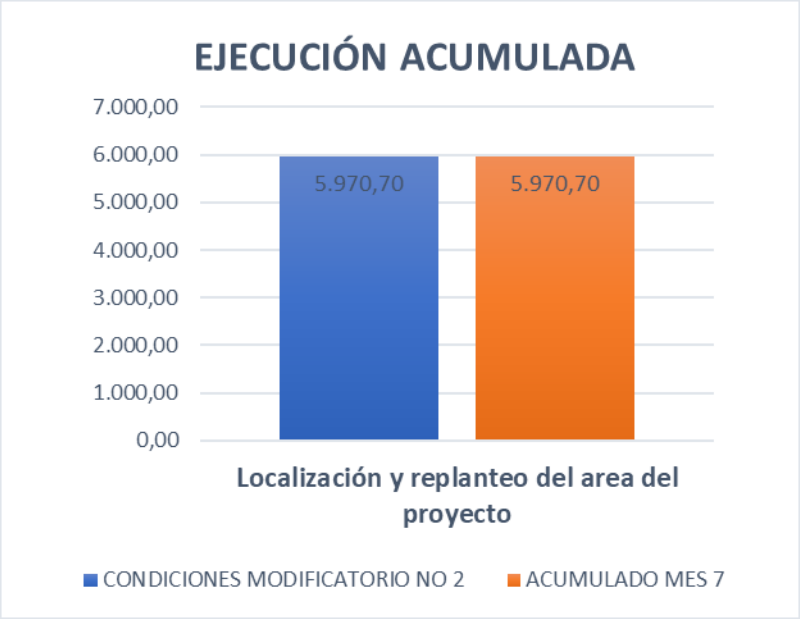

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




2.1. EXCAVACIÓN MANUAL DE 0 A 2 METROS DE PROFUNDIDAD (MATERIAL COMÚN). DESCRIPCIÓN

La presente actividad se realiza con el fin de instalar la tubería de desagüe de aguas lluvias de los diferentes sectores de acuerdo a las pendientes mínimas necesarias y siguiendo los desniveles marcados por parte de la topografía. Esta actividad requiere realizarse de

manera manual ya que, si se ejecuta de manera mecánica, esta podría generar sobre anchos y verse afectadas las pendientes.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común).	M3	161,83	$ 79.208,00	$ 12.818.231,00	161,83	$ 12.818.231,00	0,00	$ 0,00

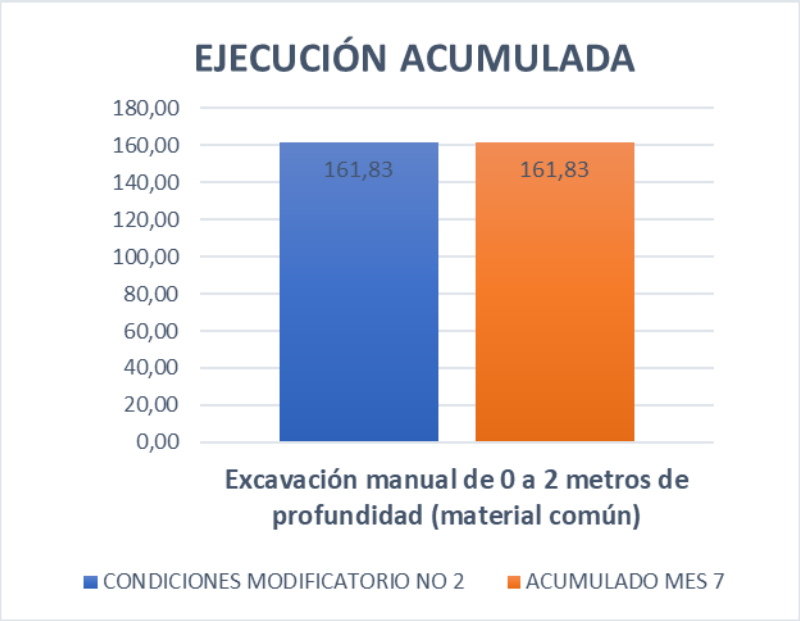


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



2.2. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CORTE).

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde a las excavaciones con maquinaria realizadas por parte del contratista de obra para los trabajos de cimentación de las diferentes zonas de intervención de acuerdo a lo marcado en la localización inicial con equipos de topografía en las cuales se respetaron los anchos de zanja y las diferentes alturas requeridas para los niveles. Adicionalmente se realizaron trabajos de excavación mecánica con el fin de realizar la conformación del terreno para ejecución de los diferentes elementos como escaleras, estructuras de piso y demás.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Excavación mecánica en material común (incluye corte).	M3	1399,44	$33.410,00	$ 46.755.290,00	1399,44	$ 46.755.290,00	0,00	$ 0,00

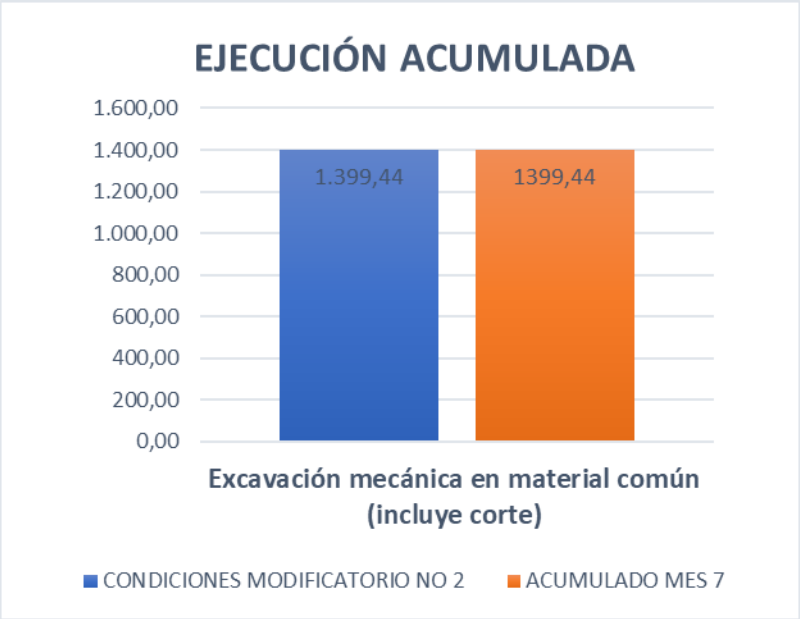


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



2.3. RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO.

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde al relleno y excavación de material de sitio, luego de las excavaciones correspondientes a la instalación de tuberías de drenaje de los diferentes sectores. Esta actividad se realizó afirmando capas con el fin de dar una mayor estabilidad del suelo.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Relleno y compactación con material de sitio.	M3	217,80	$ 22.184,00	$ 4.831.675,00	217,80	$ 4.831.675,00	0,00	$ 0,00

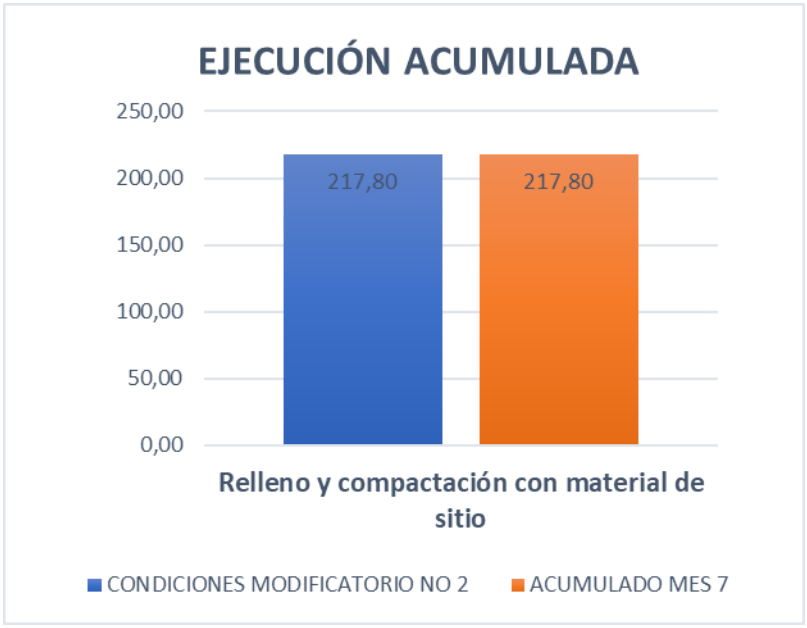

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




2.4. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL TIPO 2 (MATERIAL GRAVO ARCILLOSO)

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a el relleno y compactación de material de relleno seleccionado, con el fin de conformar la rasante del terreno en los diferentes sectores como son plazoleta, y zonas de excavaciones de cimentación, así como zonas de parqueaderos y rampas, con el fin de lograr los niveles requeridos según diseños. Esta compactación se realizó por medios mecánicos con el fin de garantizar la estabilidad de la misma.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	M3	2105,07	$ 96.630,00	$ 203.412.914,00	2105,07	$ 203.412.914,00	0,00	$ 0,00

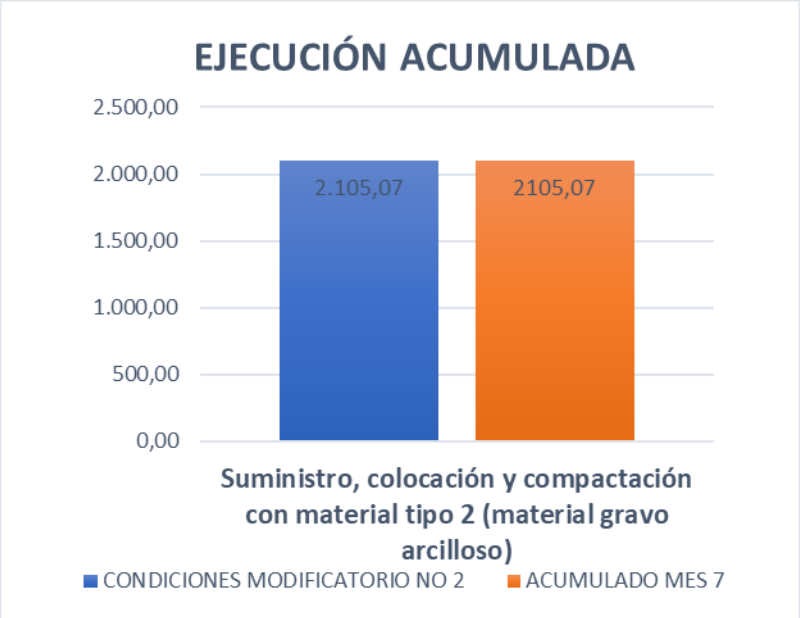


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



2.5. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL BASE GRANULAR DESCRIPCIÓN

Para la presente actividad se realiza la colocación y compactación de base granular utilizada para resistir las cargas vehiculares de la carpeta asfáltica en las zonas requeridas como parqueaderos y vía, siguiendo los parámetros de uso de material y compactaciones del manual INVIAS, además de las especificaciones técnicas. Esta compactación se realizó por medios mecánicos con el fin de garantizar la estabilidad de la misma.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	353,00	$ 251.212,00	$ 88.677.836,00	353,00	$ 88.677.836,00	0,00	$ 0,00

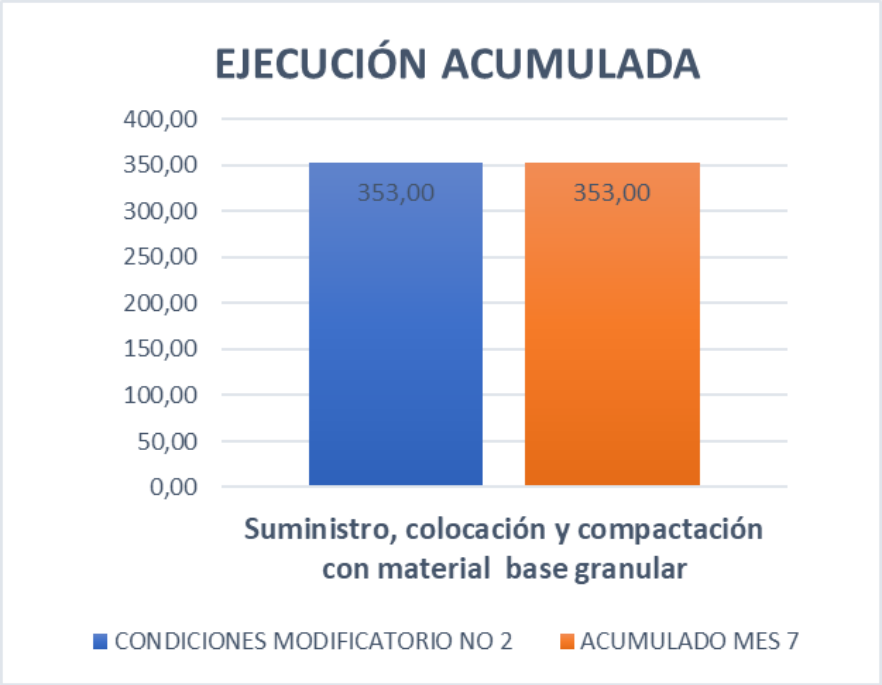

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



2.6. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EXISTENTE.

DESCRIPCIÓN

Luego de acopiar los escombros y material sobrante producto de los trabajos de demolición y desmontes en el sitio destinado para ello, se procede a realizar el cargue a las volquetas y su posterior retiro y disposición en el sitio autorizado, cada una de las volquetas partía carpada con el fin de evitar caída de material en las vías o lanzamiento de material particulado en su recorrido.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Retiro de material sobrante existente	M3-KM	13826,47	$14.698,00	$203.221.456,00	13826,47	$ 203.221.456,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.1. CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACIÓN DE 2000 PSI 50% CONCRETO 3000 PSI 50% AGREGADO BOLO.

DESCRIPCIÓN Luego de las actividades de excavaciones mecánicas y perfilado de zanjas se procede a realizar el vertimiento de concreto ciclópeo para las estructuras de cimentación de los diferentes elementos con el fin de mejorar las condiciones del terreno. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	M3	91,43	$581.923,00	$ 53.205.220,00	91,43	$ 53.205.220,00	0,00	$ 0,00

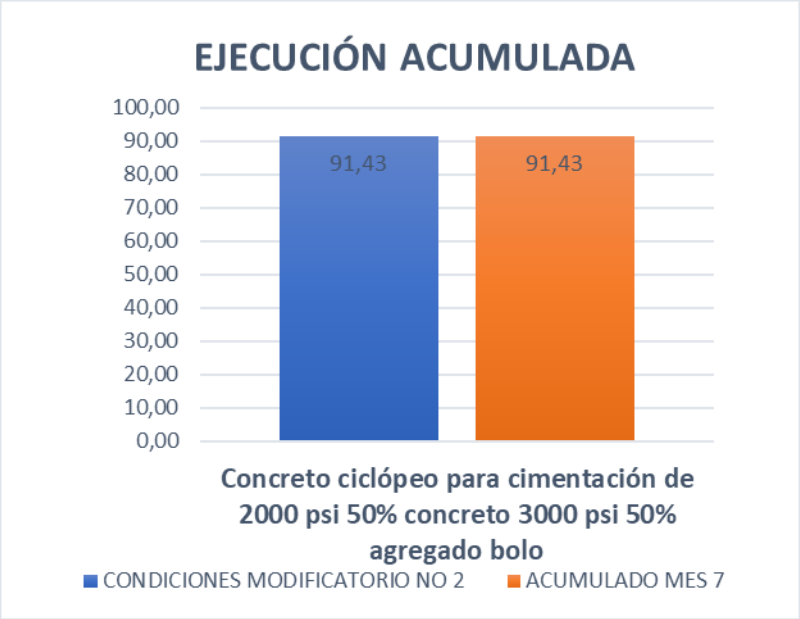


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.2. CONCRETO DE 2000 PSI, CLASE F, PARA SOLADO PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN Para el armado del acero de la estructura de escaleras, se realiza la aplicación de concreto solado con el fin de que estos elementos estructurales no tengan contacto directo con el terreno natural y así mismo esta proteja sus propiedades.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	1,44	$ 897.552,00	$ 1.292.475,00	1,44	$ 1.292.475,00	0,00	$ 0,00

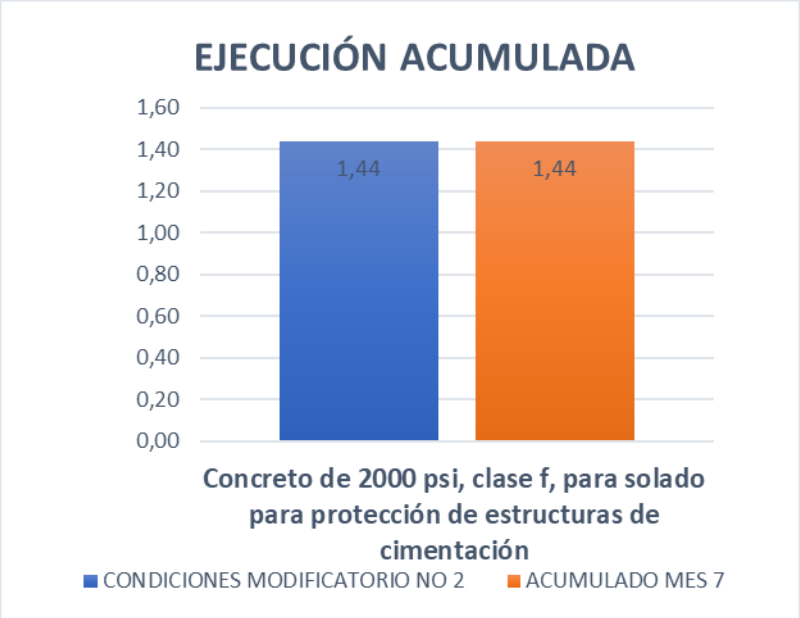


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.3. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y GRADERÍAS.

DESCRIPCIÓN Luego de las actividades de excavaciones mecánicas y perfilado de zanjas se procede a realizar el vertimiento de concreto ciclópeo para las estructuras de cimentación de los diferentes elementos con el fin de mejorar las condiciones del terreno. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías.	M3	144,57	$818.631,00	$ 118.349.484,00	144,57	$ 118.349.484,00	0,00	$ 0,00

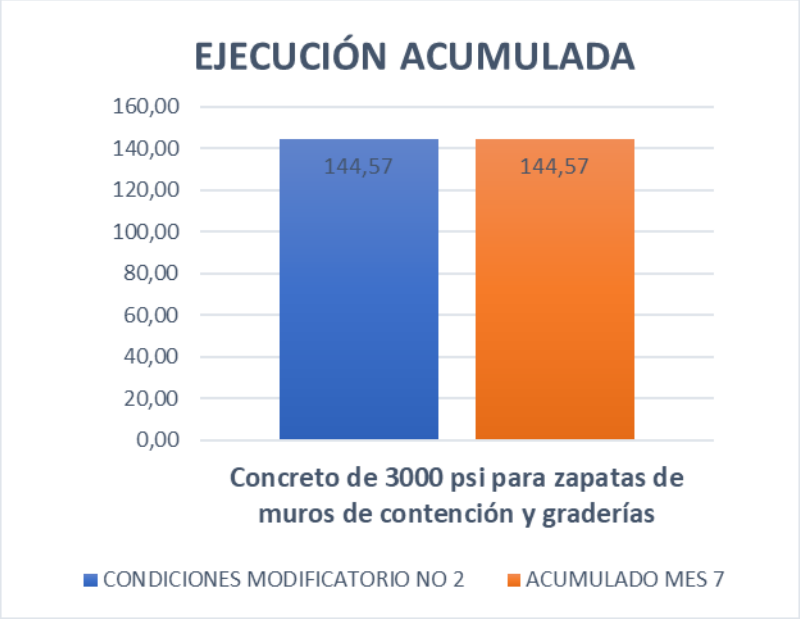


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.4. PLACA DE CONTRAPISO DE CONCRETO DE 3000PSI CON FIBRA SINTÉTICA ESP. 0.12M

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde a la conformación de placas de concreto para las zonas de circulación ubicadas de acuerdo a los diseños, esta placa es reforzada con malla electrosoldada y fibra sintética que ayuda a evitar fisuras, con el fin de dar un mejor acabado.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	M3	2352,79	$ 153.095,00	$ 360.200.385,00	2352,79	$ 360.200.385,00	0,00	$ 0,00

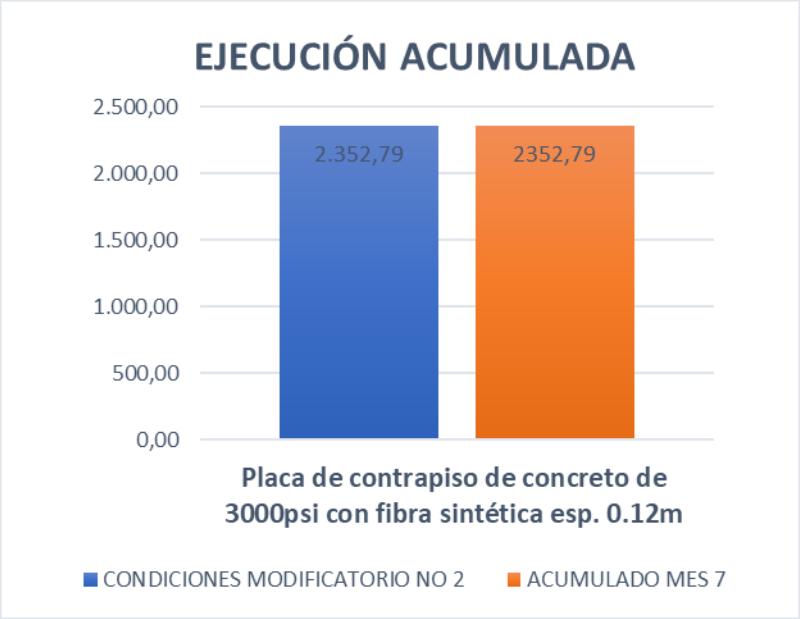

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.5. PLACA DE CONTRAPISO DE CONCRETO DE 3000 PSI ESP 0.06M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM, 15CM*15CM.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la conformación de placas de concreto para las zonas de rampas ubicadas de acuerdo a los diseños, esta placa es reforzada con malla electrosoldada y fibra sintética que ayuda a evitar fisuras, con el fin de dar un mejor acabado.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	M3	810,49	$ 158.916,00	$128.799.829,00	810,49	$128.799.829,00	0,00	$ 0,00

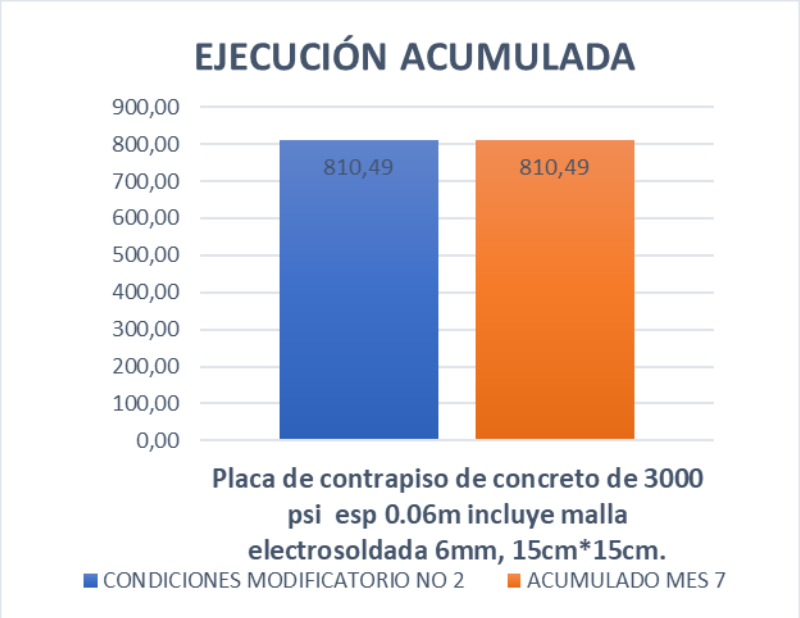

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.6. PLACA DE CONTRAPISO DE CONCRETO DE 3000 PSI CON FIBRA SINTÉTICA ESP .0.06M

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la conformación de placas de concreto para las zonas de rampas ubicadas de acuerdo a los diseños, esta placa es reforzada con malla

electrosoldada y fibra sintética que ayuda a evitar fisuras, con el fin de dar un mejor acabado.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	M3	810,49	$ 158.916,00	$128.799.829,00	810,49	$128.799.829,00	0,00	$ 0,00

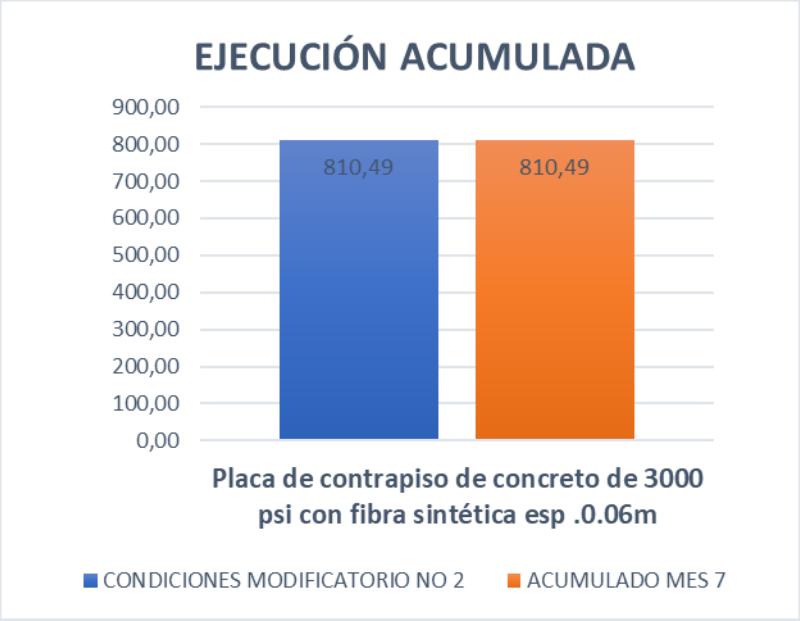

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.7. CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN Y GRADERÍAS.

DESCRIPCIÓN

Siguiendo la instalación del acero de refuerzo proveniente de la cimentación y complementando el refuerzo transversal de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos, se procede a realizar la fundida de los muros de contención de los diferentes sectores, teniendo en cuenta la variación de alturas. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	M3	109,07	$ 946.551,00	$ 103.240.318,00	109,07	$ 103.240.318,00	0,00	$ 0,00

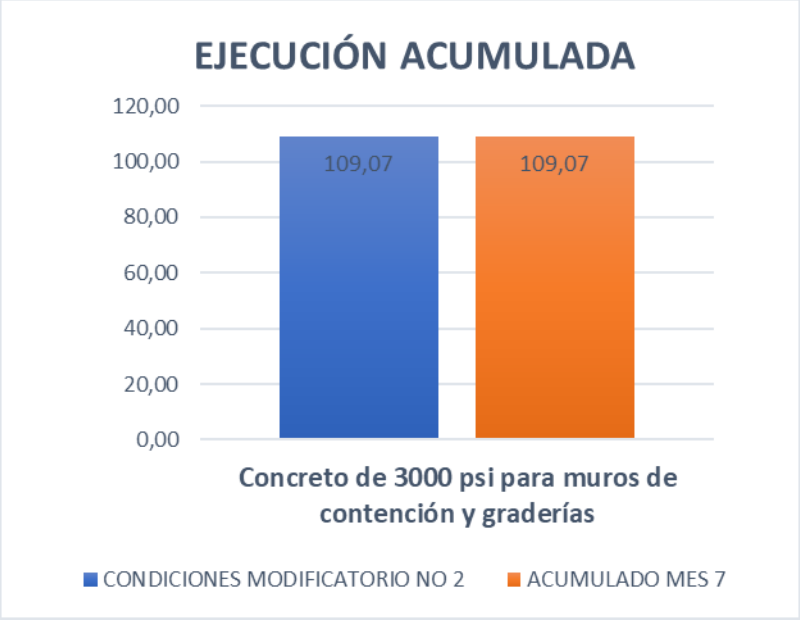

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.8. CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACAS DE GRADERÍAS Y CUBIERTA CUARTO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

Luego de fundida la cimentación y muros de estructura para la escalera en la zona de plazoleta, el armado del acero de refuerzo correspondiente, se realiza la fundida de concreto de 3000 psi para las placas a diferentes alturas, las cuales funcionara con asientos de graderías de espectadores. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativa vigente corroborando el correcto vaciado de concreto. El contratista de obra tomo muestras de concreto para corroborar su resistencia.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	M3	7,95	$ 741.478,00	$ 5.894.750,00	7,95	$ 5.894.750,00	0,00	$ 0,00

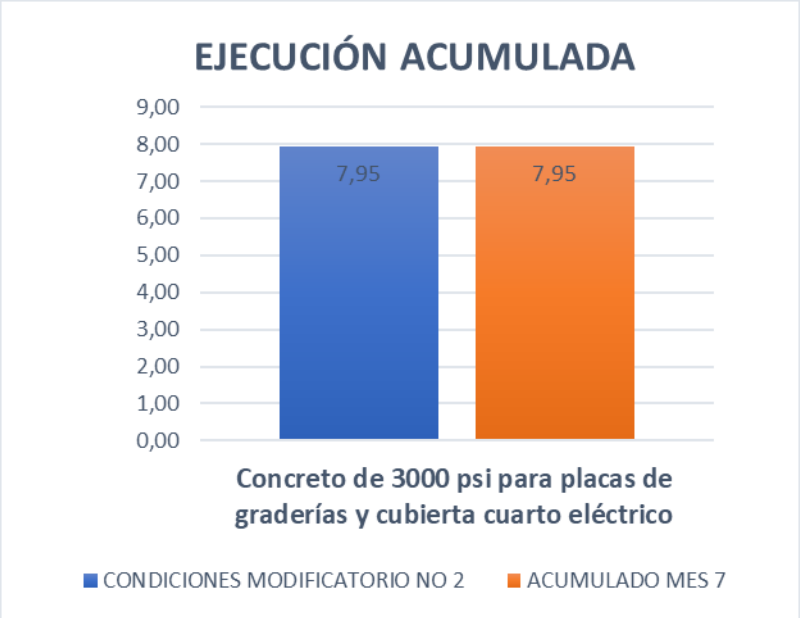

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.11. ACERO DE REFUERZO.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a los trabajos de armado de estructuras en acero para refuerzo de zapatas de cimentación, muros de contención y diferentes elementos requeridos. El acero se figuró, armo e instaló de acuerdo a los planos entregados, respetando traslapos, espesores y longitudes de los diferentes elementos estructurales de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Acero de refuerzo	KG	16755,42	$14.316,00	$ 239.870.593,00	16755,42	$ 239.870.593,00	0,00	$ 0,00

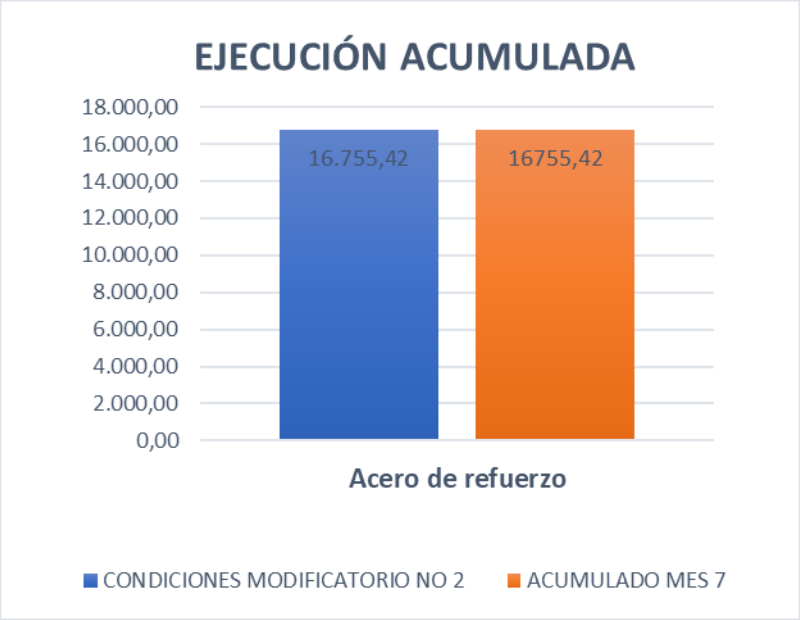

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.14. SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE 0 A 6MM

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a los trabajos de sellado de juntas de dilatación con productos especializados, los cuales funcionan con el fin de que el concreto tenga un mejor comportamiento a los cambios de temperatura y/o a elementos externos.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	KG	1541,21	$ 24.614,00	$ 37.935.343,00	1541,21	$ 37.935.343,00	0,00	$ 0,00

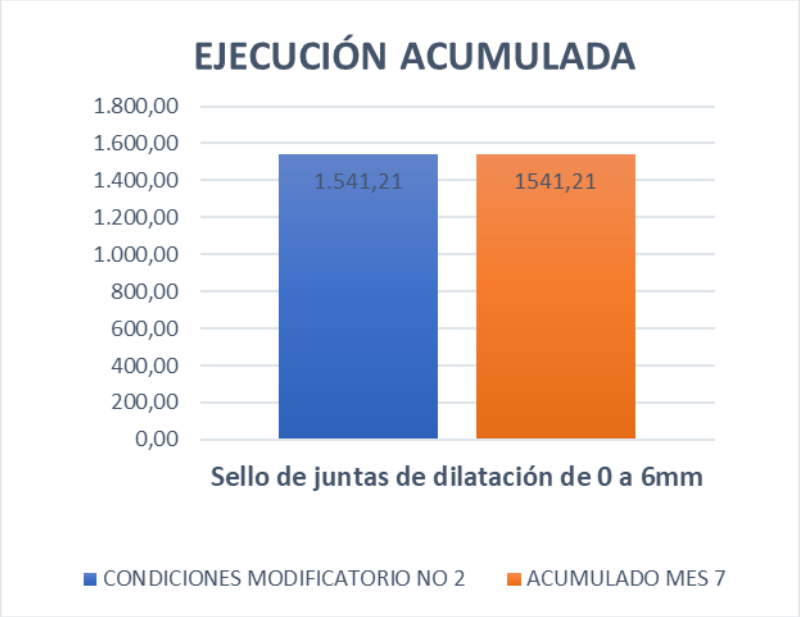

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.15. CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACIÓN GRADERÍAS Y CUARTO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la fundida de elementos de cimentación para la estructura de graderías, los cuales cumplen la función de vigas de amarre para de esta manera garantizar la resistencia y correcto comportamiento de los mismos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativa vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	M3	2,99	$ 206.849,00	$ 618.479,00	2,99	$ 618.479,00	0,00	$ 0,00

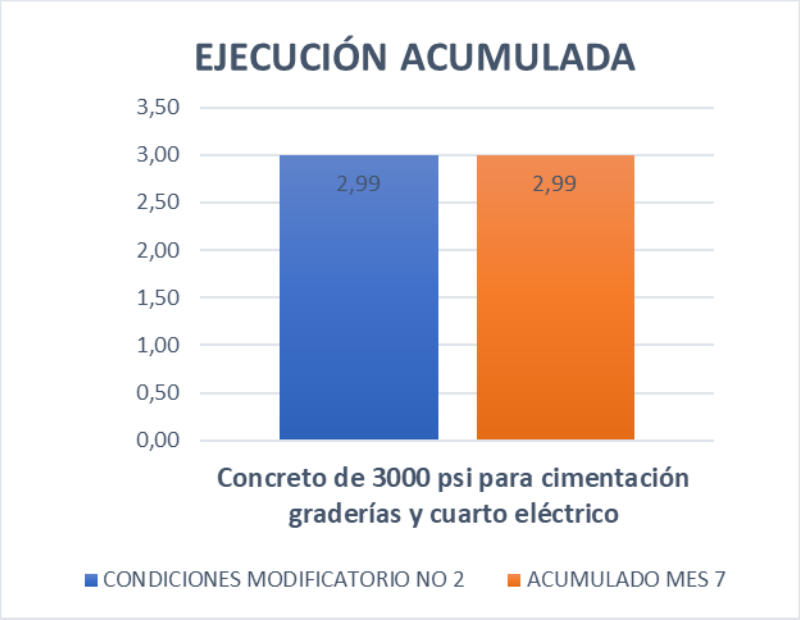

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.16. CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y COLUMNAS CUARTO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la fundida de elementos de la estructura de cuarto electrico, los cuales cumplen la función de soportar la misma y el correcto comportamiento de los mismos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativa vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico	M3	0,57	$ 903.490,00	$ 516.345,00	0,57	$ 516.345,00	0,00	$ 0,00

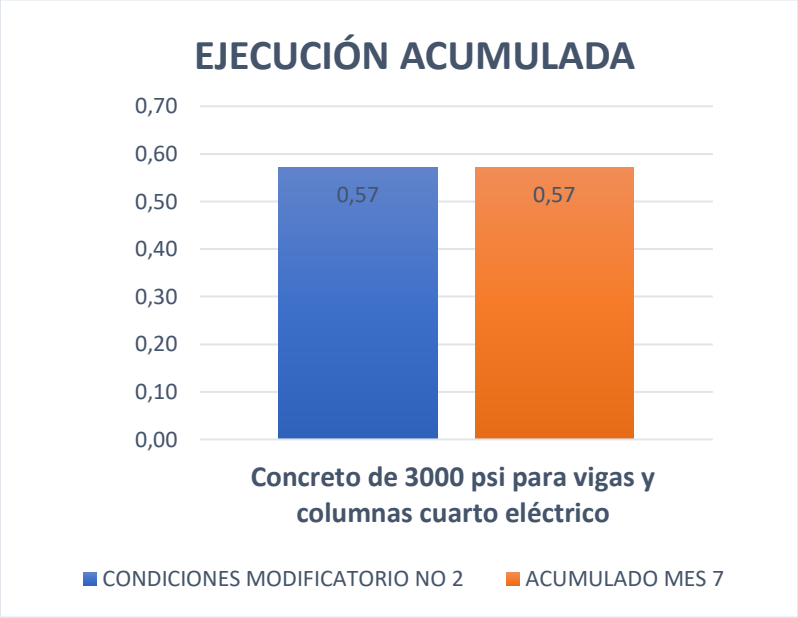

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO PARA CUBIERTAS DE CONTAINER

DESCRIPCIÓN

Se suministró e instaló la estructura metálica en las zonas frontal y posterior de los contenedores adaptados para uso comercial, anclada sobre el nivel de cubierta mediante soldadura, garantizando rapidez, seguridad y modularidad en su montaje. Estas estructuras sirven como soporte para las cubiertas en volado, sobre las cuales se colocarán láminas de policarbonato, proporcionando protección solar y contra la lluvia. El cumplimiento de los requisitos de calidad se verificó mediante los certificados emitidos por el proveedor.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación acero para cubiertas de container	KG	606,50	$ 105.787,00	$ 64.159.932,00	606,50	$ 64.159.932,00	0,00	$ 0,00

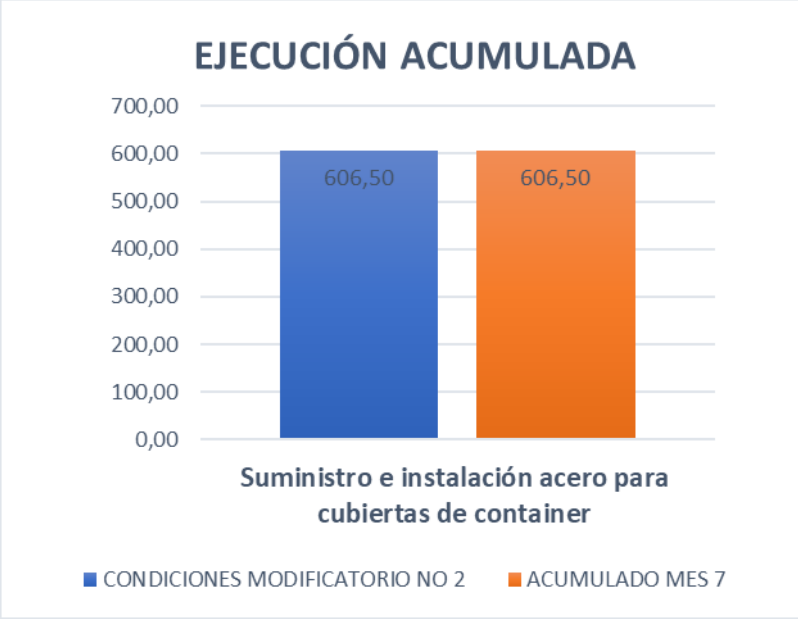


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

3.18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA 0.40 X 0.40 COLOR GRIS

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la instalación de loseta prefabricada de 0.4 x 0.4 sobre mezcla de mortero de pega, en los sectores determinados de acuerdo a los diseños presentados, así como el urbanismo planteado para el proyecto. Se realizó revisión de la correcta instalación de las losetas, respetando brechas que se cumplan de acuerdo a las especificaciones técnicas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	M2	703,80	$ 228.942,00	$ 161.129.380,00	537,80	$ 123.125.008,00	166,00	$ 38.004.372,00

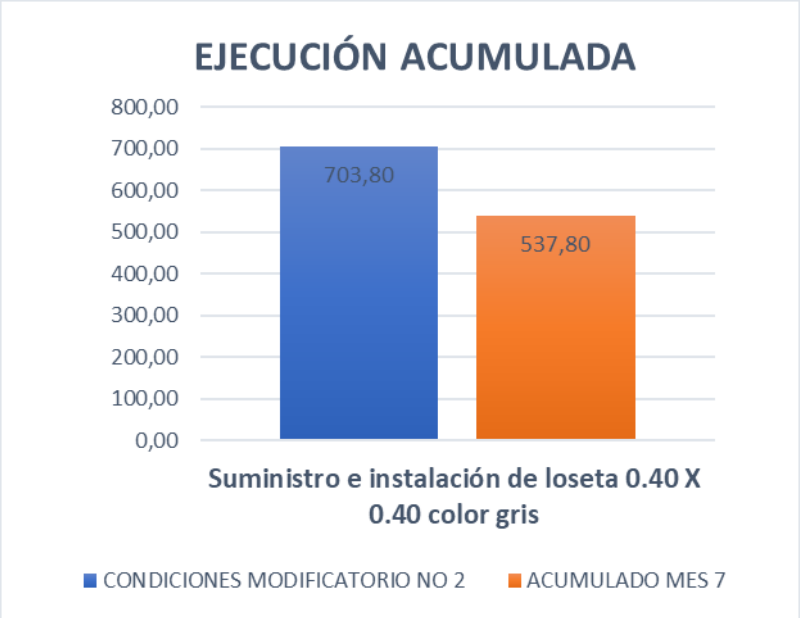

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 76%




3.19. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PODOTÁCTIL 0.40 X 0.40 COLOR GRIS

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la instalación de loseta prefabricada de 0.4 x 0.4 sobre mezcla de mortero de pega, en los sectores determinados de acuerdo a los diseños presentados, así como el urbanismo planteado para el proyecto. Se realizó revisión de la correcta instalación de las losetas, respetando brechas que se cumplan de acuerdo a las especificaciones técnicas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	ML	147,75	$ 247.777,00	$ 36.609.052,00	127,53	$ 31.599.001,00	20,22	$ 5.010.051,00

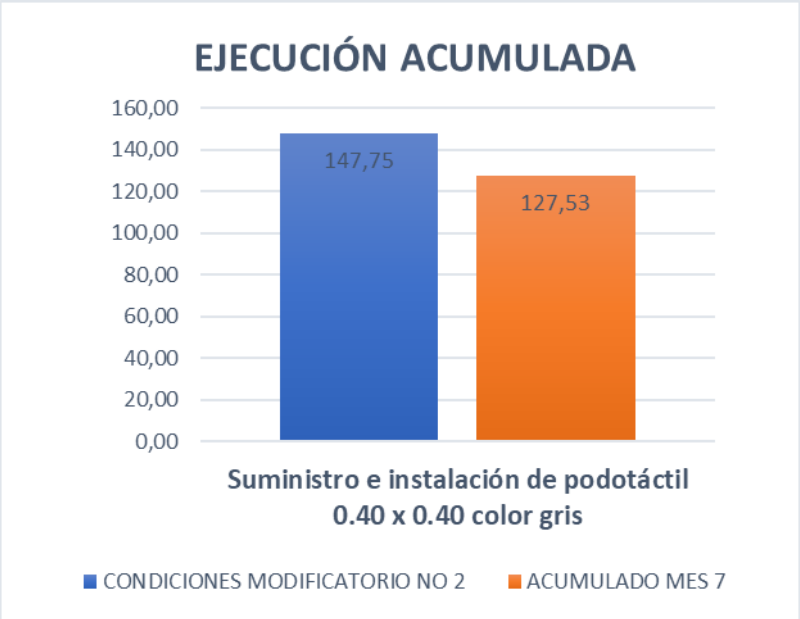

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 76%




3.20. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS Y PEDESTALES CIMENTACIÓN PÓRTICO, MÁSTILES DE ILUMINACIÓN Y SOPORTES CONTENEDOR

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la fundida de elementos de cimentación para la estructura donde descansaran los contenedores en la zona de entrada principal del proyecto. Esta actividad se realizó siguiendo las especificaciones técnicas y detalles presentados en los diseños.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	M3	4,91	$ 876.731,00	$ 4.304.749,00	4,91	$ 4.304.749,00	0,00	$ 0,00

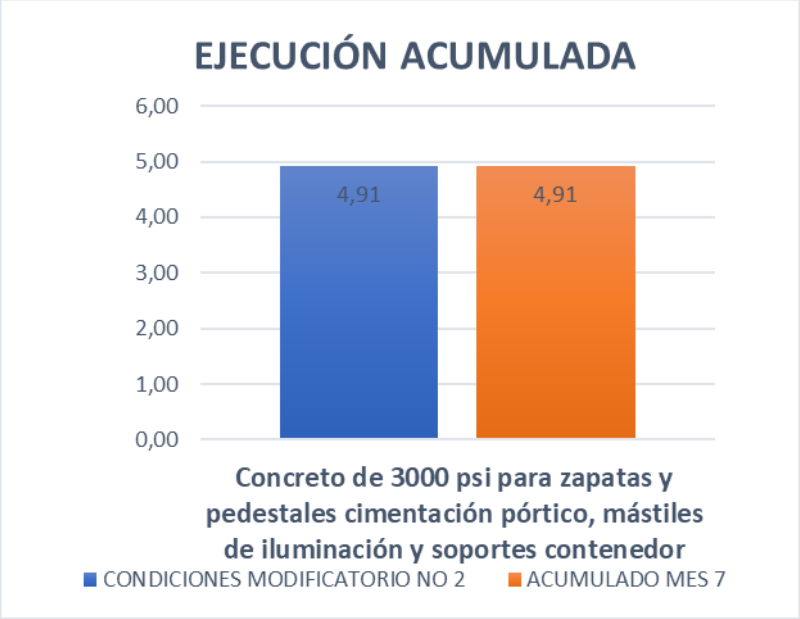

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




4.1. MAMPOSTERIA EN LADRILLO DE ARCILLA A LA VISTA (INSTALACIÓN HORIZONTAL)

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se contempla la instalación de mampostería en ladrillo para el cuarto eléctrico, siguiendo los diseños presentados inicialmente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Mampostería en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)	M2	28,70	$ 136.357,00	$ 3.913.446,00	28,70	$ 3.913.446,00	0,00	$ 0,00

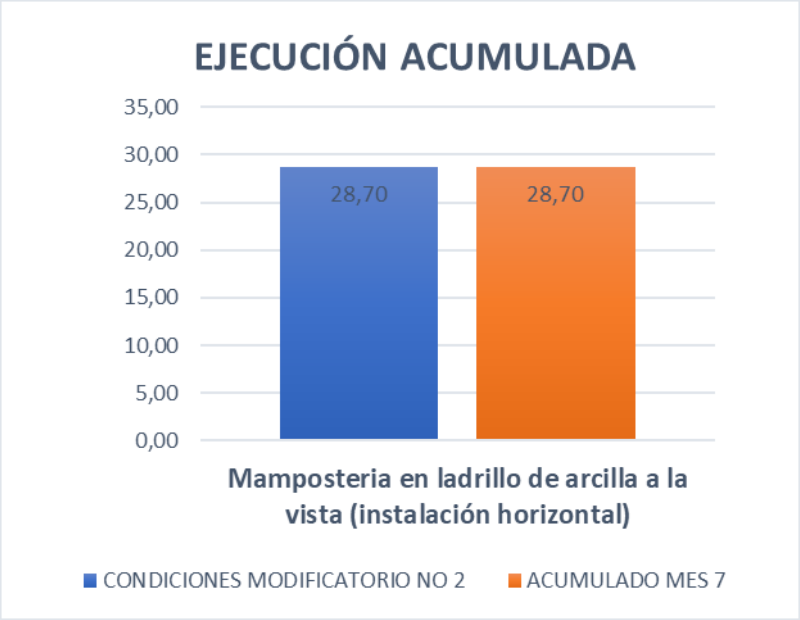

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




4.2. FRISO PARA MUROS IMPERMEABILIZADO INCLUYE DILATACIONES Y FILOS

DESCRIPCIÓN

Se realizó la ejecución del friso para muros impermeabilizado, cuidando la correcta aplicación de la mezcla para garantizar una superficie uniforme y resistente a la humedad. La actividad incluyó la formación de dilataciones y filos, asegurando una adecuada continuidad en los encuentros y esquinas, con el fin de evitar fisuras y permitir el correcto comportamiento estructural del recubrimiento. Se verificó la correcta adherencia del material y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos	M3	62,62	$ 35.979,00	$ 2.253.005,00	38,46	$ 1.383.752,00	24,16	$ 869.253,00

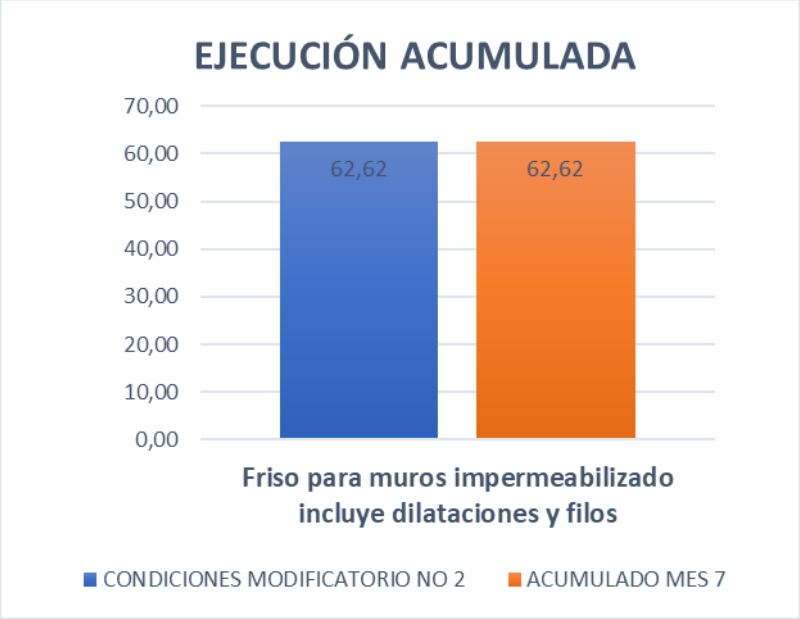

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




4.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3

DESCRIPCIÓN

Se realizó el suministro e instalación de mampostería estructural, utilizando unidades de bloque conforme a las especificaciones del proyecto. La ejecución incluyó el refuerzo vertical garantizando la correcta alineación y nivelación de los muros. Se cuidó la adecuada colocación del mortero, el relleno de juntas y el cumplimiento de las tolerancias constructivas, asegurando la resistencia y estabilidad estructural del sistema de mampostería.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de mamposteria estructural con refuerzo vertical cada ,20cm con refuerzo numero 3 y horizontal cada ,40 con refuerzo n3	M3	38,46	$ 144.234,00	$ 5.547.240,00	38,46	$ 5.547.240,00	0,00	$ 0,00

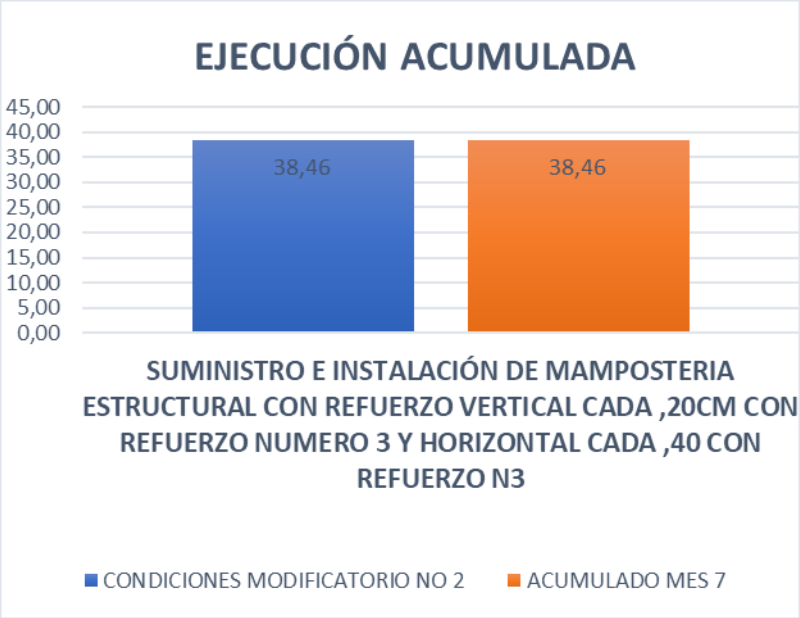

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO 12 M 1050 KGF.

DESCRIPCIÓN

Para garantizar el suministro eléctrico del proyecto, se instaló un transformador de 15 kVA conectado a la red de media tensión existente. Como parte de esta intervención, se retiró la red ACSR, su estructura terminal y el poste actual en el área de conexión, con el fin de liberar espacio para la instalación de un nuevo poste de concreto de 12 m destinado a

soportar el transformador y los sistemas eléctricos, cumpliendo con la normativa técnica vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.	UND	1,00	$ 5.229.244	$ 5.229.244,00	1,00	$ 5.229.244,00	0,00	$ 0,00

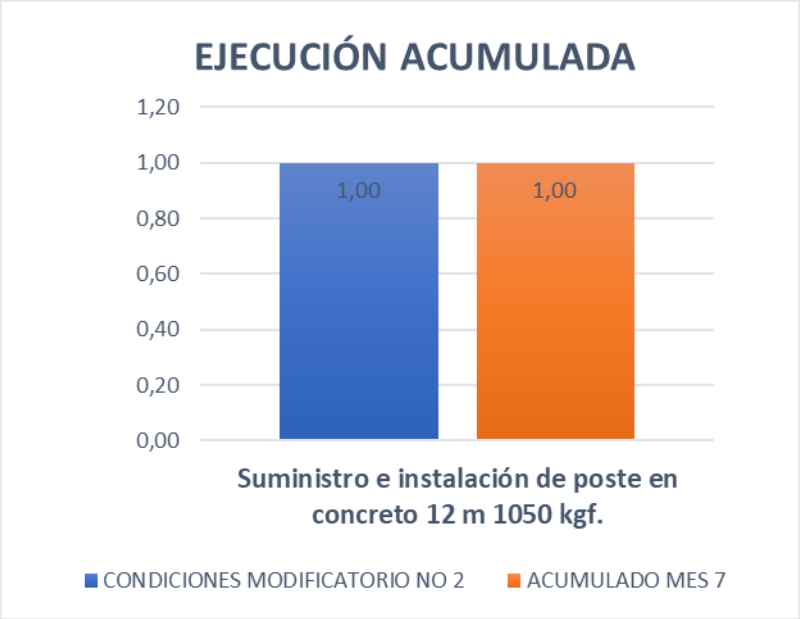

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.1.3. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE, INCLUYE CAJAS CORTACIRCUITOS, DPS, HERRAJES, AISLADORES, GRAPAS, CRUCETAS Y TUBERÍA).

DESCRIPCIÓN

Tras la instalación del poste de concreto, se ejecutó la estructura de arranque, punto inicial del sistema eléctrico aéreo del skatepark, asegurando la transición segura entre la red de media tensión y la instalación interna del proyecto. Como parte de esta etapa, se instalaron cajas cortacircuitos (para protección contra sobrecargas y fallas), herrajes aisladores, grapas y crucetas (para soporte y fijación mecánica de conductores), y la tubería de protección correspondiente, garantizando el aislamiento, la seguridad y la integridad del tendido eléctrico conforme al diseño y normativa vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería).	UND	1,00	$ 13.469.378	$ 13.469.378,00	1,00	$ 13.469.378,00	0,00	$ 0,00

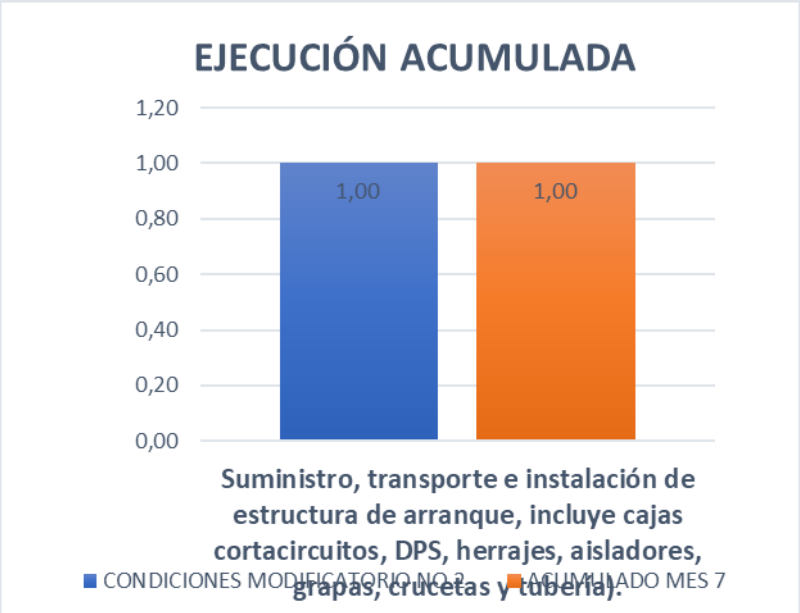

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.1.5. BAJANTE IMC DE 3"

DESCRIPCIÓN

Con el poste izado y el transformador instalado en su corona, se procedió a la colocación del bajante en tubería IMC de 3”, destinado a proteger exteriormente el cableado que conectará el transformador con la red subterránea del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Bajante imc de 3"	UND	1,00	$ 13.469.378	$ 13.469.378,00	1,00	$ 13.469.378,00	0,00	$ 0,00

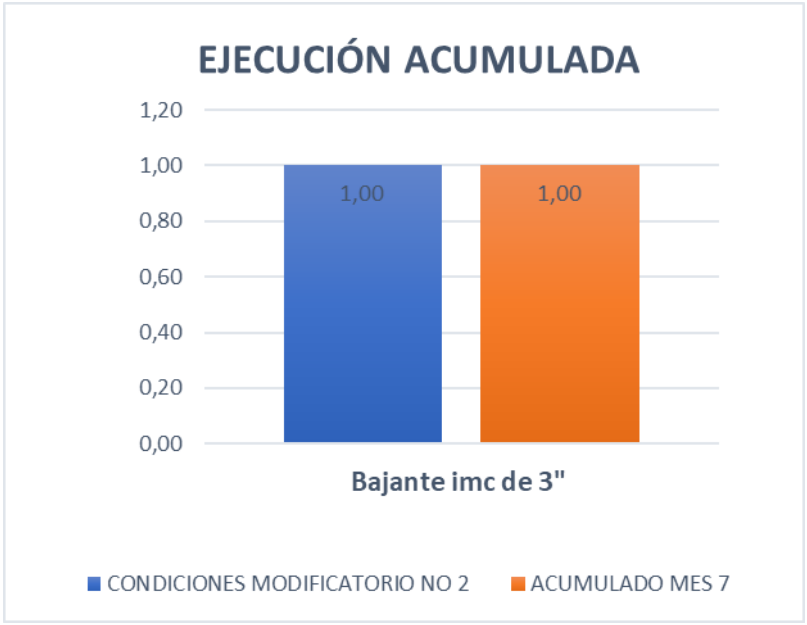

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.1.6. CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 M; EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN MARCO METALICO FUNDIDA EN CONCRETO (INCLUYE HIERRO)

DESCRIPCIÓN

Tras la instalación de la estructura de arranque, se construyó una caja de registro en mampostería, destinada al acceso, inspección, conexión y mantenimiento de la red eléctrica subterránea. Está equipada con una tapa metálica embebida en concreto reforzado con acero, asegurando resistencia al tránsito peatonal, durabilidad, funcionalidad y acabado estético acorde con el entorno del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mampostería con tapa en marco metálico fundida en concreto (incluye hierro)	UND	1,00	$ 2.484.532	$ 2.484.532,00	1,00	$ 2.484.532,00	0,00	$ 0,00

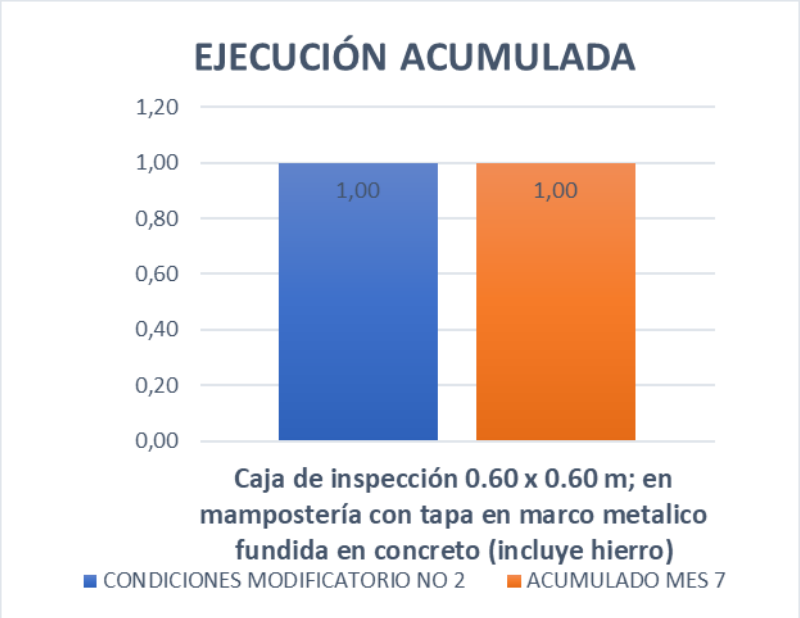

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.1.8. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA 3 DUCTOS PVC 3" . INCLUYE ACCESORIOS, TERMINALES, CURVAS, SOLDADURA PVC, EXCAVACIÓN, BOTADA DE ESCOMBROS, ARENILLA Y COMPACTACIÓN.

DESCRIPCIÓN

Se ejecutó el suministro y colocación del banco de ductos para la red eléctrica principal, compuesto por tres tubos PVC de 3”, destinados a la protección y conducción de los conductores subterráneos. La actividad incluyó excavación de zanja, instalación de accesorios (curvas, terminales), soldadura de uniones, retiro de escombros y compactación

final del terreno, asegurando alineación, nivelación, pendiente y protección mecánica conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.	ML	30,00	$ 142.430,00	$ 4.272.900,00	30,00	$ 4.272.900,00	0,00	$ 0,00

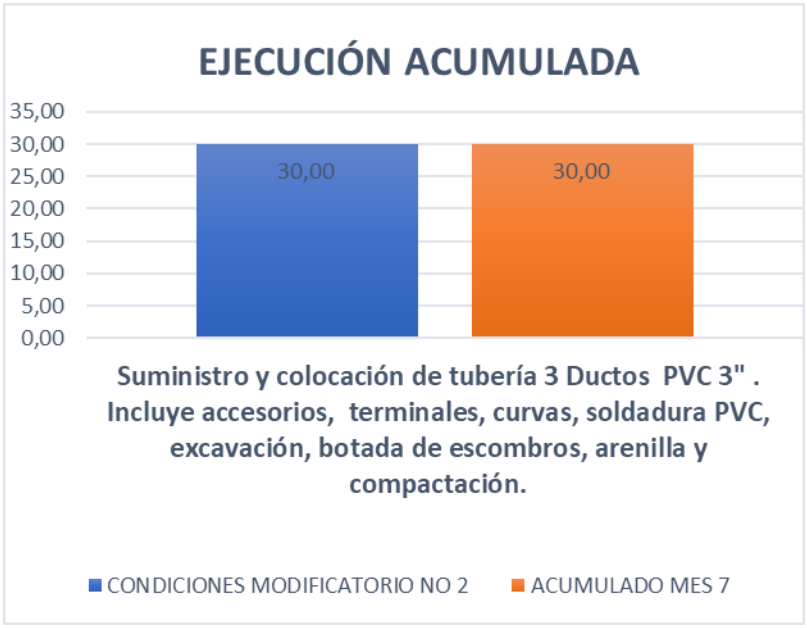


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



5.3.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" DB

Se instaló la tubería PVC de 2” para conformar los ductos subterráneos de interconexión entre cajas eléctricas, destinados a la protección y conducción del cableado hacia los puntos de derivación (luminarias, contenedores, etc.). La actividad comprendió suministro, excavación, tendido, uniones soldadas, colocación de accesorios (curvas, terminales), sellado y verificación de alineación y pendiente, cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normativa RETIE vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubería PVC de 2" DB	ML	70,00	$ 81.870,00	$ 4.272.900,00	70,00	$ 4.272.900,00	0,00	$ 0,00

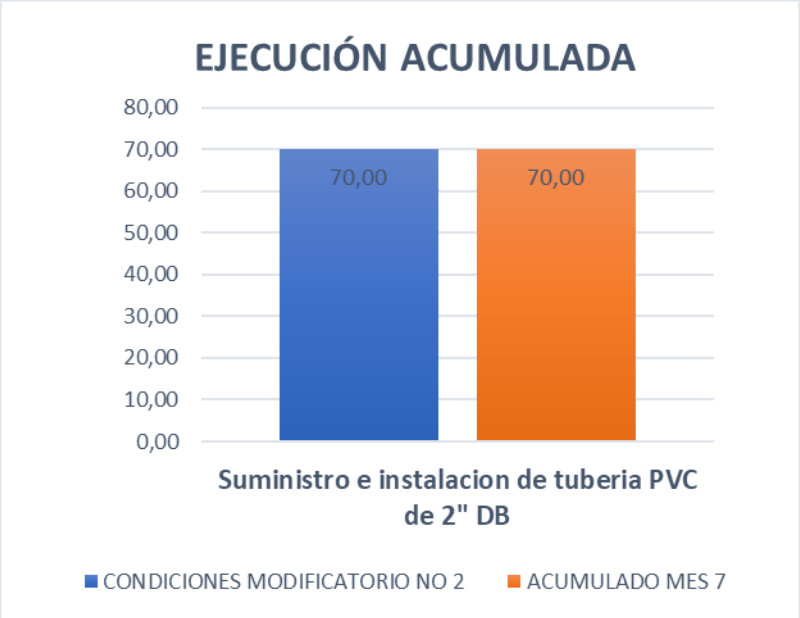


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

5.3.2. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA BAJA TENSIÓN, MEDIDAS 0,6*0,6*0,82 MARCO METÁLICO Y TAPA EN CONCRETO.

Posterior a las excavaciones, se construyó una caja de inspección para redes de baja tensión (0.60 × 0.60 × 0.82 m), ejecutada en mampostería, con marco metálico y tapa en concreto reforzado. Su función es facilitar el registro, empalme y mantenimiento de las redes subterráneas, asegurando resistencia mecánica, durabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa RETIE.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	UND	5,00	$ 2.484.532	$ 12.422.660,00	5,00	$ 12.422.660,00	0,00	$ 0,00

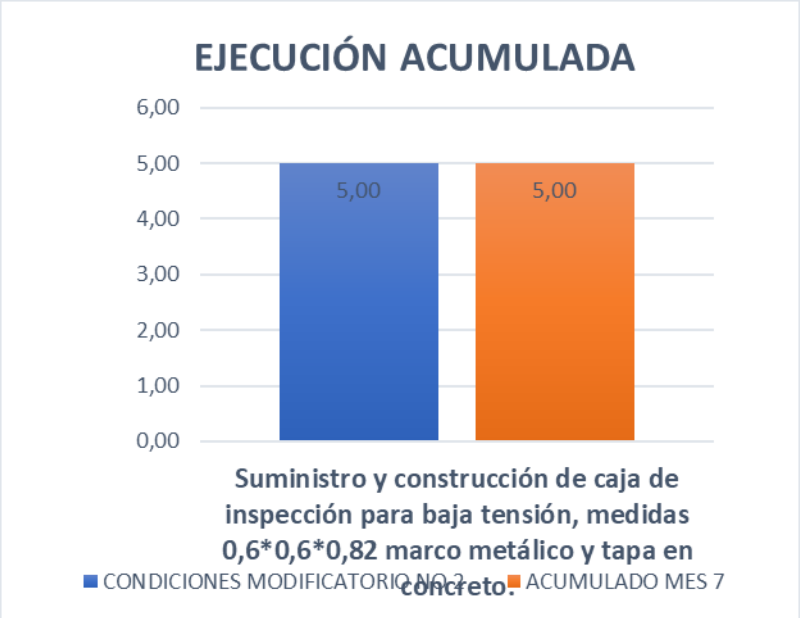

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.1. ESTRUCTURA METÁLICA PARA ACCESO EN TUBERÍA CIRCULAR 4" Y 2" TIPO ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el armado de la estructura metálica principal para el acceso al parque, el cual consta de tubería de 4” y 2” de refuerzos. Por parte de la interventoría se revisaron los diferentes cordones de soldadura, así como de espesores de tubería que cumplan de acuerdo a las especificaciones técnicas y diseños.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Estructura metálica para acceso en tubería circular 4" y 2" tipo estructural	kg	1640,88	$ 28.999,00	$ 47.583.879,00	1640,88	$ 47.583.879,00	0,00	$ 0,00

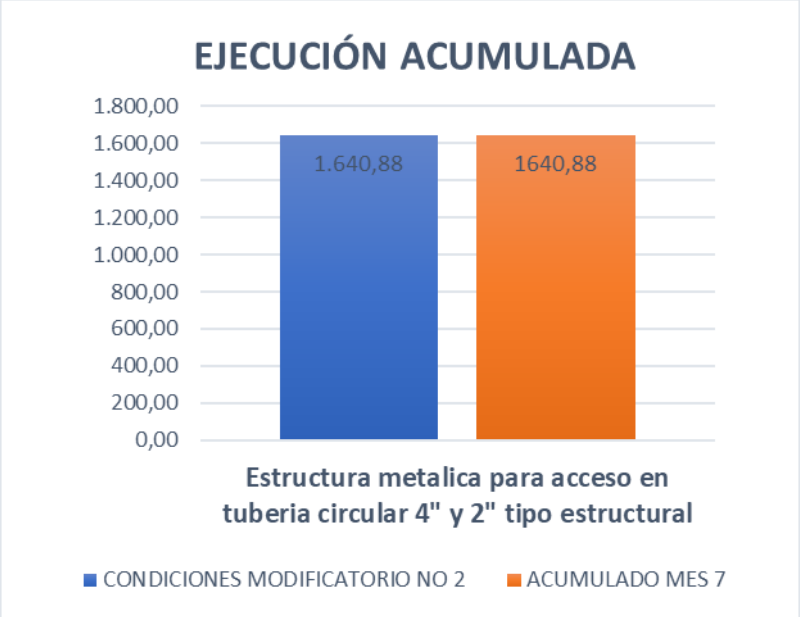

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø2" E= 2.5MM EN SENTIDO VERTICAL Y Ø1 1/2" E= 2.5MM EN SENTIDO HORIZONTAL. (INCLUYE FIJACIONES, PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS)

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende la instalación de pasamanos en tubería de 2” de acuerdo a las especificaciones técnicas, instalándose de acuerdo a los planos y diseños presentados.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de Pasamanos en tubería de acero galvanizado Ø2" E= 2.5mm en sentido vertical y Ø1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)	ML	187,65	$ 466.581,00	$ 87.553.925,00	187,65	$ 87.553.925,00	0,00	$ 0,00

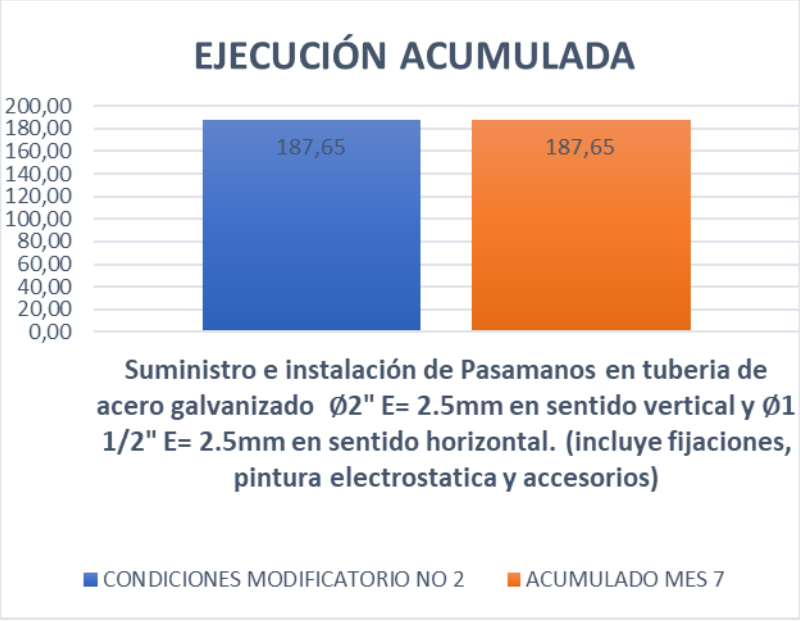

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2" PARA RIELES INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTADO COLOR AMARILLO.

DESCRIPCIÓN

Se efectuó el suministro e instalación de tubo estructural de 2” destinado a la conformación de rieles, conforme a los planos y especificaciones del proyecto. El proceso incluyó el tratamiento de la superficie con recubrimiento anticorrosivo para garantizar la durabilidad del material, seguido del pintado en color amarillo como acabado final. Se verificó la correcta alineación, nivelación y sujeción del tubo, asegurando su estabilidad y cumplimiento con las normas de seguridad y calidad establecidas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo.	M3	130,27	$ 201.632,00	$ 26.266.601,00	130,27	$ 26.266.601,00	0,00	$ 0,00

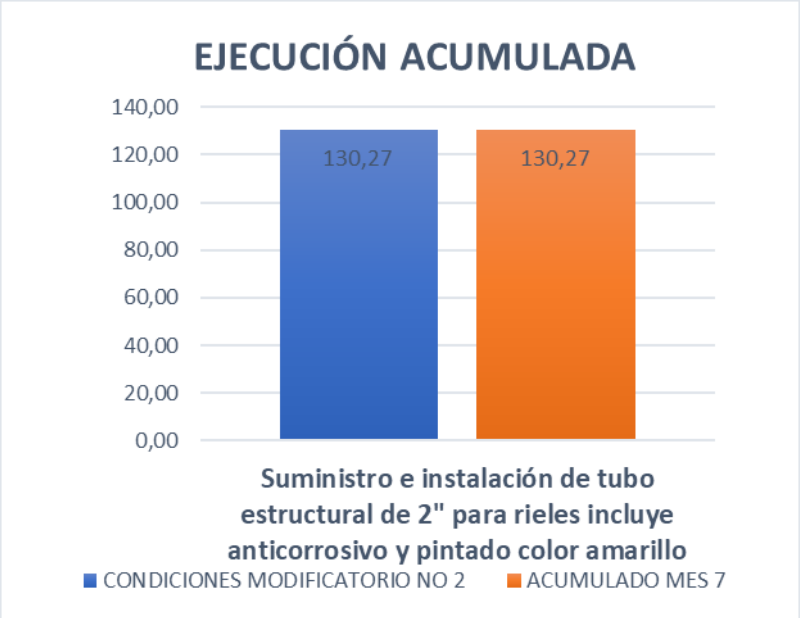

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CUADRADO DE 2" PARA RIELES DE FUN BOX INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTADO EN COLOR AMARILLO

DESCRIPCIÓN

Se efectuó el suministro e instalación de tubo cuadrado de 2” destinado a la conformación de rieles, conforme a los planos y especificaciones del proyecto. El proceso incluyó el tratamiento de la superficie con recubrimiento anticorrosivo para garantizar la durabilidad

del material, seguido del pintado en color amarillo como acabado final. Se verificó la correcta alineación, nivelación y sujeción del tubo, asegurando su estabilidad y cumplimiento con las normas de seguridad y calidad establecidas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo	M3	92,46	$ 202.901,00	$ 18.760.226,00	92,46	$ 18.760.226,00	0,00	$ 0,00

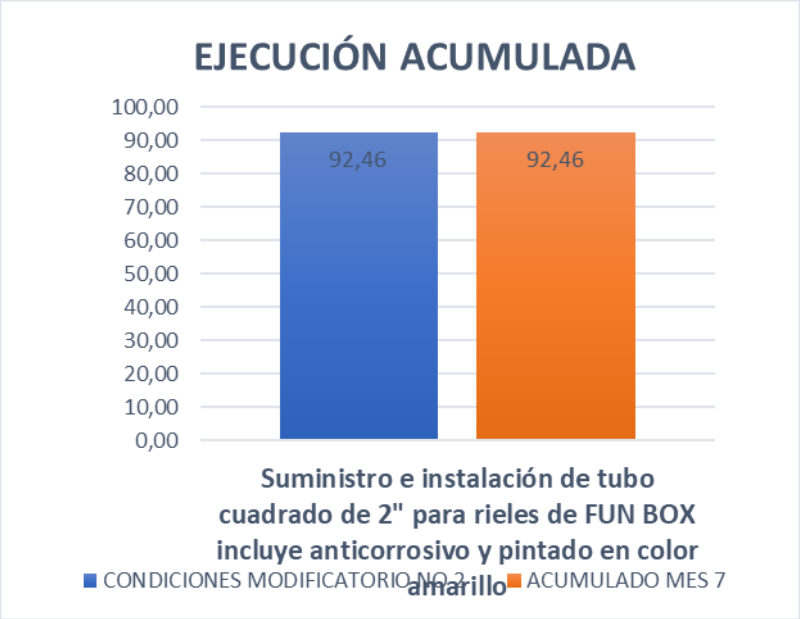

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.5. SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE CALISTENIA MODULO MASTER PARA 8 USUARIOS

DESCRIPCIÓN

En presente periodo de ejecución, se realizó la instalación del kit de calistenia tipo modular con capacidad para ocho (8) usuarios, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los planos del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios	UND	2,00	$ 49.522.297,00	$ 99.044.594,00	2,00	$ 99.044.594,00	0,00	$ 0,00

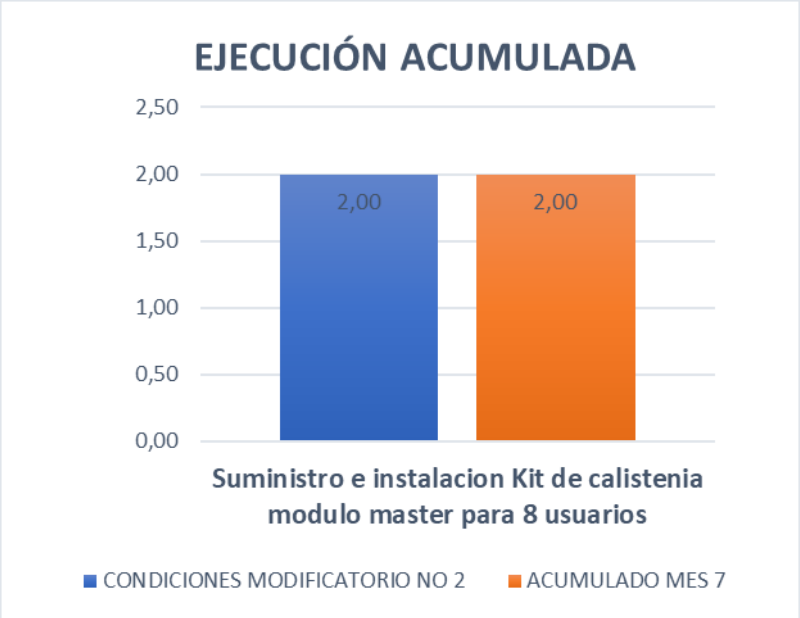

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTAINER MODIFICADO PARA LOCALES.

DESCRIPCIÓN

Se instaló la unidad de contenedores metálicos modificados para uso comercial, según diseños arquitectónicos aprobados, incluyendo cortes, refuerzos estructurales, acabados interiores y exteriores, instalación de puertas (baño, bodega y local principal) y mesón en

acero inoxidable. Gracias a su prefabricación, se logró una ejecución ágil y eficiente, optimizando tiempo y recursos, mientras su estructura en acero corrugado garantiza durabilidad frente a condiciones climáticas, impactos y cargas

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de container modificado para locales.	UND	2,00	$ 237.101.858,00	$ 474.203.716,00	2,00	$ 474.203.716,00	0,00	$ 0,00

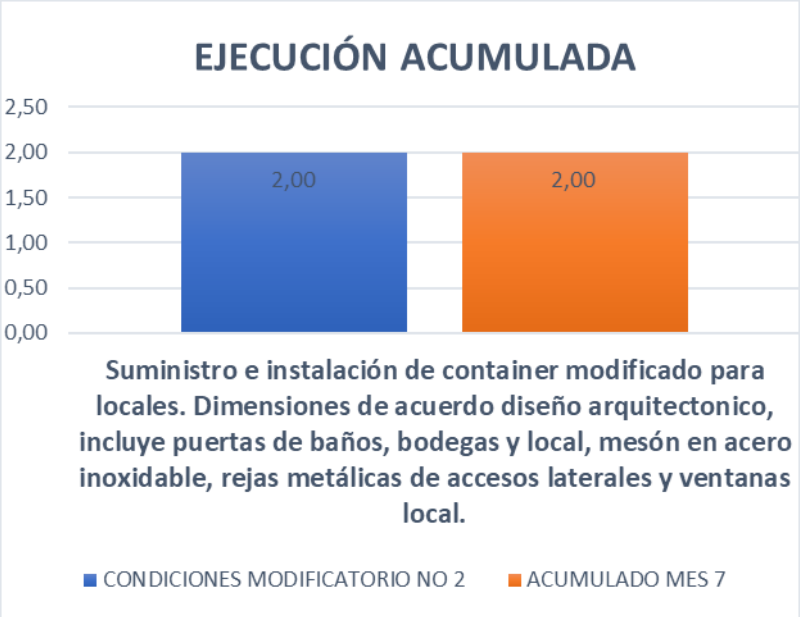

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.7. LETRERO DE ACCESO "DISTRITO URBANO" EN LAMINA METALICA CAL 20.

DESCRIPCIÓN

En presente periodo de ejecución, se realizó la fabricación e instalación de letrero de acceso “DISTRITO URBANO”, elaborado en lámina metálica calibre 20 e instalado sobre la estructura metálica del pórtico al ingreso principal.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.	UND	1,00	$ 13.841.213,00	$ 13.841.213,00	1,00	$ 13.841.213,00	0,00	$ 0,00

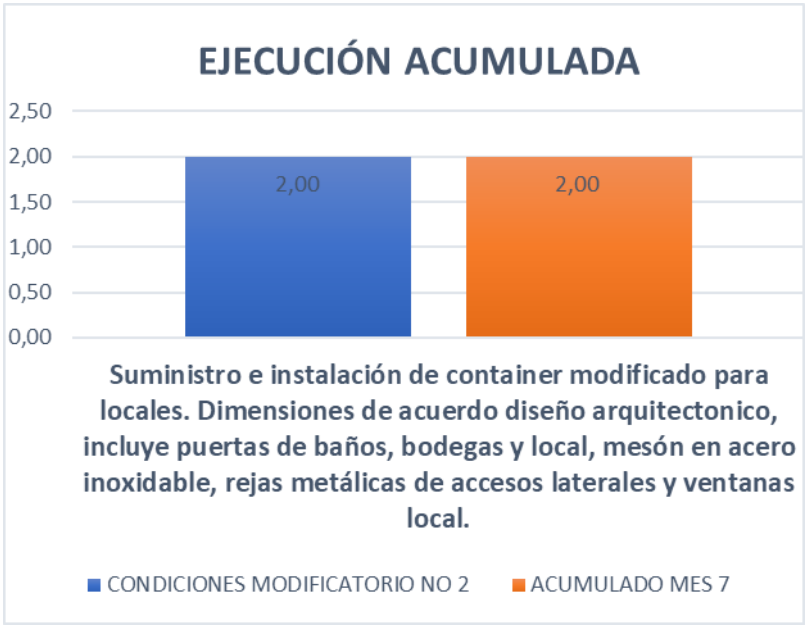

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CALIBRE 22 CON MARCO EN CALIBRE 16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL TIPO ESMALTE DOS MAMOS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, VISAGRAS Y CERROJO EXTERNO

DESCRIPCIÓN

Para la presente actividad se presenta la instalación de puertas en calibre 22 para los contenedores, así como de las zonas de baños, esto con el fin de brindar seguridad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CALIBRE 22 CON MARCO EN CALIBRE 16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL TIPO ESMALTE DOS MAMOS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, VISAGRAS Y CERROJO EXTERNO	UND	7,00	$ 2.718.329,00	$ 19.028.303,00	7,00	$ 19.028.303,00	0,00	$ 0,00

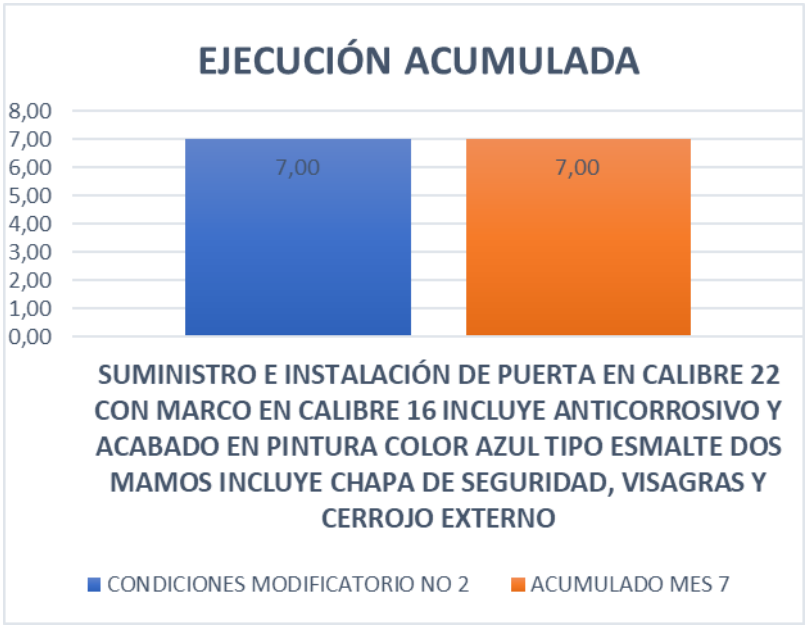

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 160 MM (6") NOVAFORT (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTE).

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de tubería de 6” proveniente del bowl, hasta la caja de inspección y de esta manera evitar empozamientos en este sector y garantizar el drenaje de las aguas

lluvias. Esta tubería se asienta sobre una capa de arena con el fin de prolongar su durabilidad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ML	44,82	$ 80.171,00	$ 3.593.264,00	44,82	$ 3.593.264,00	0,00	$ 0,00

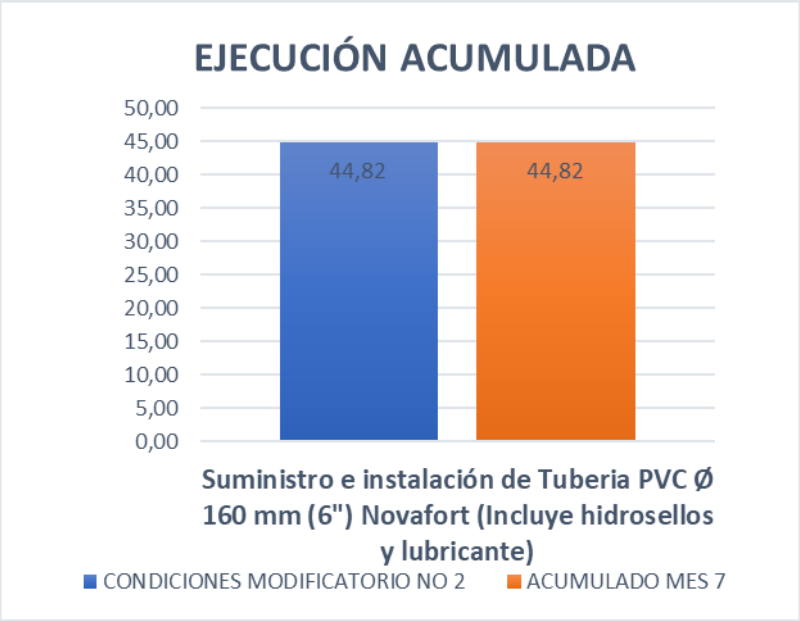

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 4" PVC SANIARIA

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de tubería de 4” proveniente de las instalaciones hidrosanitarias de los contenedores, hasta la caja de inspección y hasta el sistema séptico y al disipador de entrega. Esta tubería se asienta sobre una capa de arena con el fin de prolongar su durabilidad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubería 4" pvc Sanitaria	ML	111,53	$ 93.419,00	$ 10.419.021,00	111,53	$ 10.419.021,00	0,00	$ 0,00

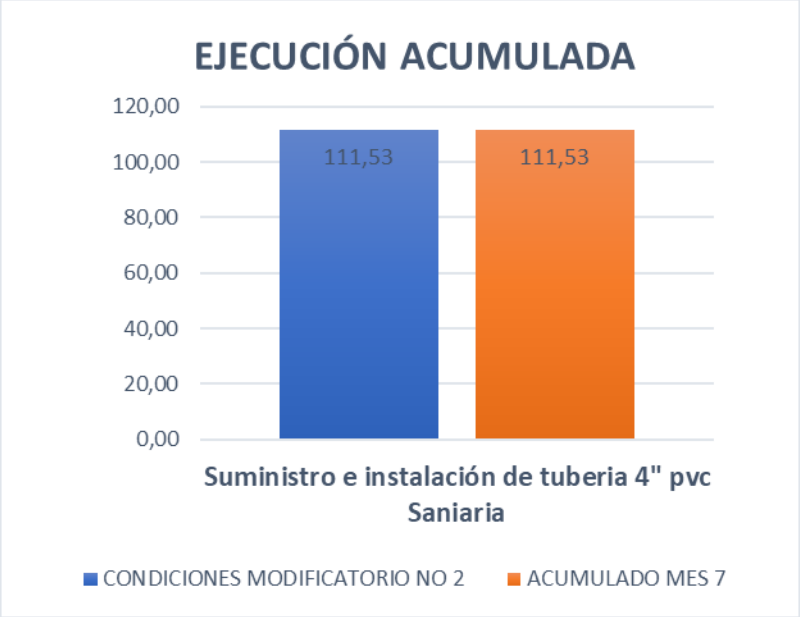

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.3. PUNTO 4" SANITARIO

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de punto sanitario de 4” ubicada en las instalaciones hidrosanitarias de los contenedores, correspondientes a los sanitarios de baterías de baño de damas, de caballeros y de discapacitados.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Punto 4" sanitario	UND	3,00	$ 105.726,00	$ 317.178,00	3,00	$ 317.178,00	0,00	$ 0,00

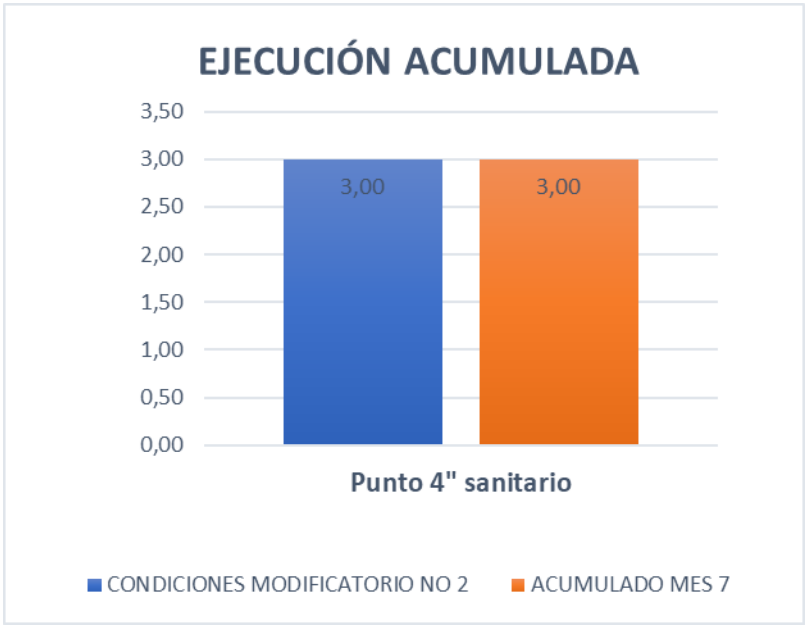


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

7.4. PUNTO 2" SANITARIO

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de punto sanitario de 2” ubicada en las instalaciones hidrosanitarias de los contenedores, correspondientes a los lavamanos y sifones de piso de las baterías de baño de damas, de caballeros y de discapacitados.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Punto 2" sanitario	UND	6,00	$ 75.076,00	$ 450.456,00	6,00	$ 450.456,00	0,00	$ 0,00

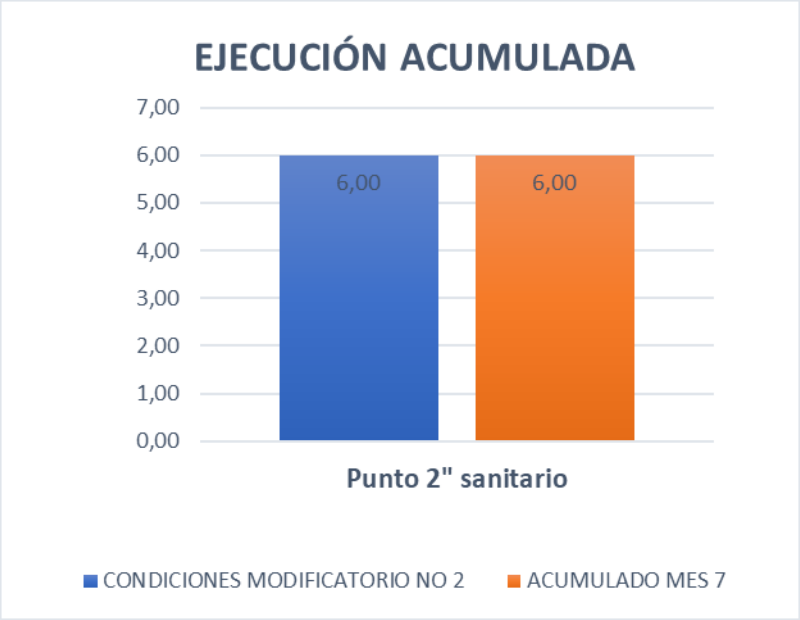


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

7.8. TUBERIA 1" PVC PRESIÓN

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de tubería de 1” de acuerdo al trazado según los planos hidrosanitarios en donde se derivan a los contenedores y poder conectar los diferentes aparatos hidrosanitarios como son sanitarios y lavamanos de las baterías de baños.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Tuberia 1" pvc presión	ML	70,87	$ 38.009,00	$ 2.693.698,00	70,87	$ 2.693.698,00	0,00	$ 0,00

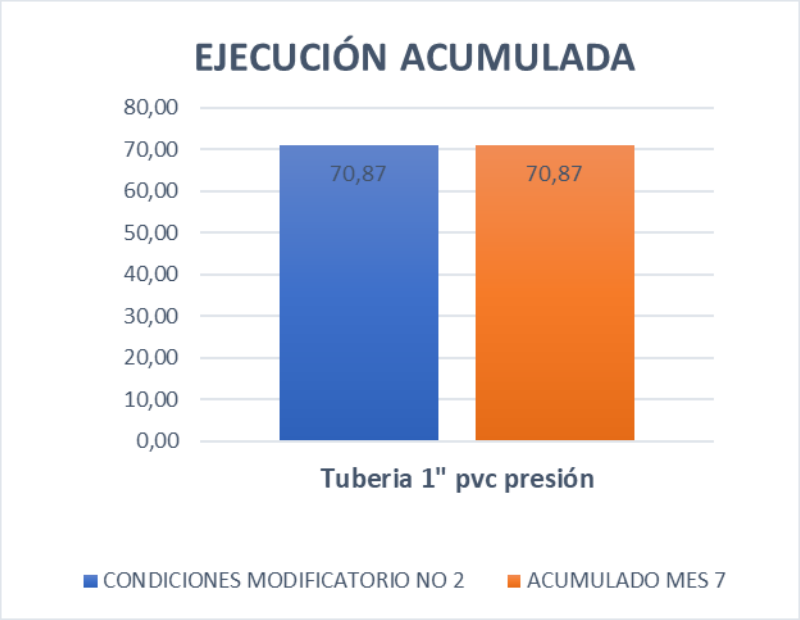


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

7.11. CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO (INCLUYE HIERRO)

DESCRIPCIÓN

Se realizó la construcción de cajas de inspección para la red sanitaria, de acuerdo a las ubicaciones y profundidades entregados en los planos iniciales para que de esta manera la red tenga un correcto funcionamiento.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	UND	4,00	$ 752.481,00	$ 3.009.924,00	4,00	$ 3.009.924,00	0,00	$ 0,00

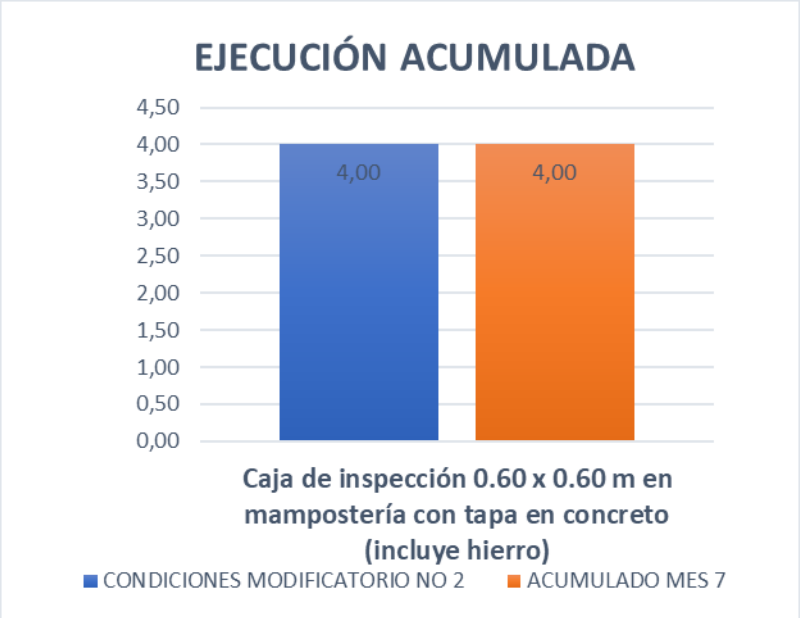

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.12. SISTEMA SEPTICO INTEGRADO SEPTILISTICO 5000 LTS.

DESCRIPCIÓN

Durante el presente periodo constructivo se realizó la instalación del sistema séptico integrado, en el espacio definido en los planos hidrosanitarios para el tratamiento del flujo transportado en la red sanitaria, previo a su entrega en el disipador hacia la ciénaga Miramar.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Sistema séptico integrado septilistico 5000 lts.	UND	1,00	$24.112.760,0	$24.112.760,0	1,00	$ 24.112.760,00	0,00	$ 0,00

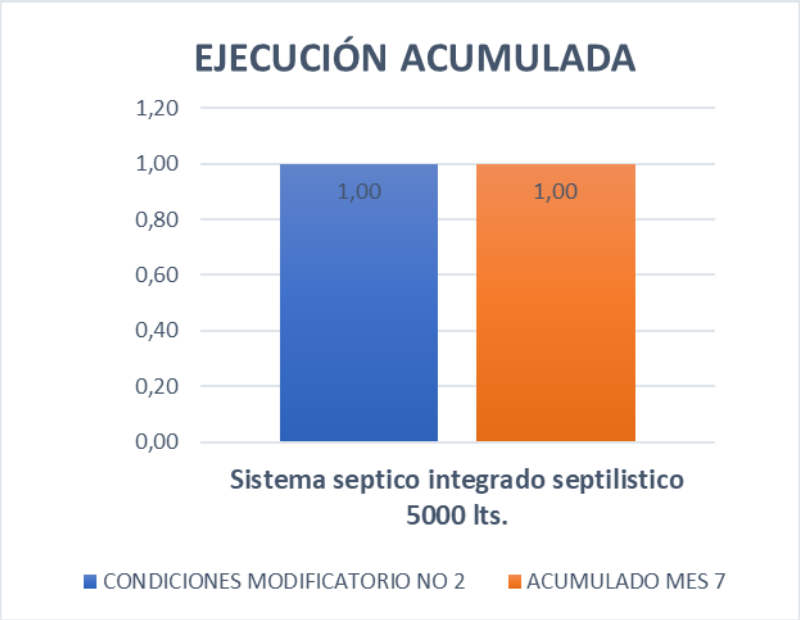

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.14. CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE ENERGIA PARA AGUAS DE LLUVIAS DE 0.60ANCHO X 0.50 ALTURA Y HUELLA DE 0,60M. ESPESOR=10CM

DESCRIPCIÓN

Se realizó la construcción de los dos disipadores de energía para las redes sanitaria y de aguas lluvia, en la zona de la franja de aislamiento de la ciénaga Miramar, de acuerdo con

las dimensiones y ubicaciones establecidas en los planos del diseño hidrosanitario y las recomendaciones de los profesionales de la autoridad ambiental en visita de inspección.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Construcción de disipador de energía para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	UND	19,00	$ 327.395,00	$ 6.220.505,00	19,00	$ 6.220.505,00	0,00	$ 0,00

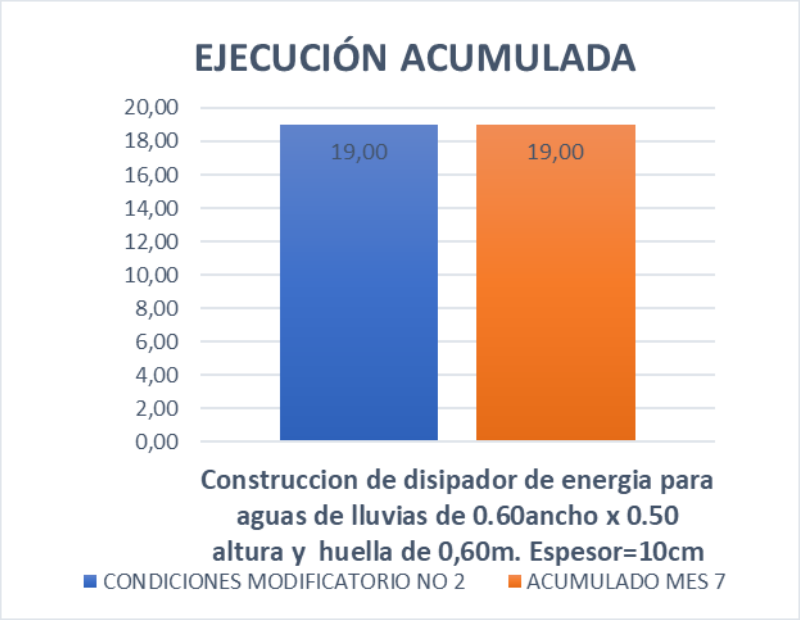

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 200 MM (8") NOVAFORT (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTE).

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de tubería de 8” proveniente desde la caja de inspección que recoge las aguas del bowl, hasta el disipador, con el fin de transportar las aguas hacia el sector determinado en el proyecto. Esta tubería se asienta sobre una capa de arena con el fin de prolongar su durabilidad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ML	24,39	$ 306.501,00	$ 7.475.559,00	24,39	$ 7.475.559,00	0,00	$ 0,00

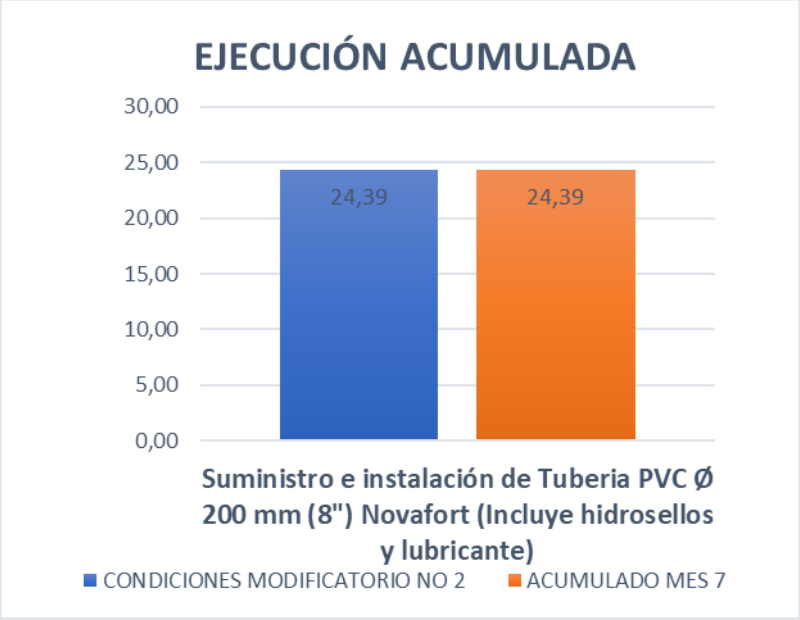

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.16. CAJA DE INSPECCIÓN 1 X 1 M EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO (INCLUYE HIERRO)

DESCRIPCIÓN

Se realizó la construcción de cajas de inspección para la red pluvial, con el fin de transportar las aguas lluvias del bowl principal, esto de acuerdo a las ubicaciones y profundidades entregados en los planos iniciales para que de esta manera la red tenga un correcto funcionamiento.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	UND	1,00	$1.046.882	$ 1.046.882,00	1,00	$ 1.046.882,00	0,00	$ 0,00

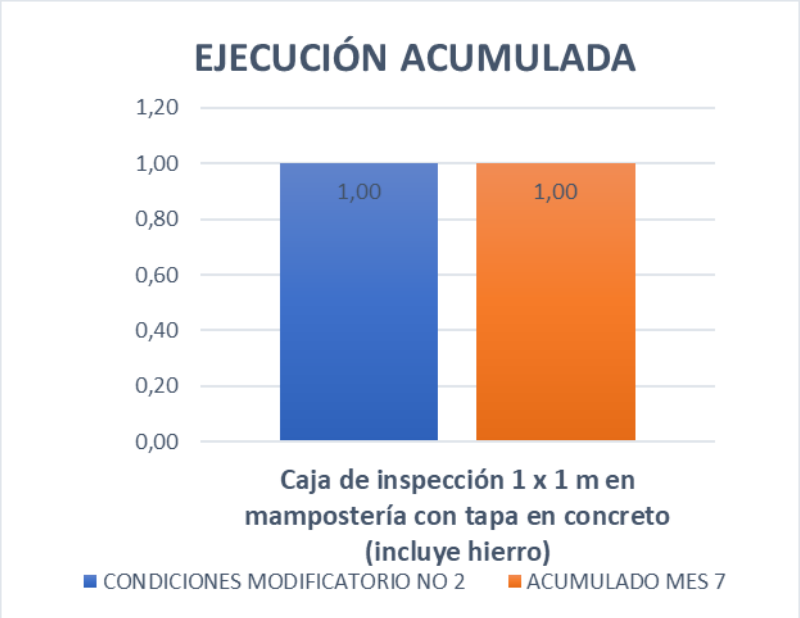

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.17. CUNETA PERIMETRAL DE 0.25 X 0.30 CM INTERNO

DESCRIPCIÓN

La cuneta perimetral de 0.25 m × 0.30 m se construye como elemento de drenaje perimetral en las zonas requeridas, con el fin de interceptar y canalizar las aguas lluvias hacia puntos de descarga controlados generados de acuerdo a los planos hidrosanitarios.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno	ML	63,20	$ 182.072,00	$ 11.506.950,00	63,20	$ 11.506.950,00	0,00	$ 0,00

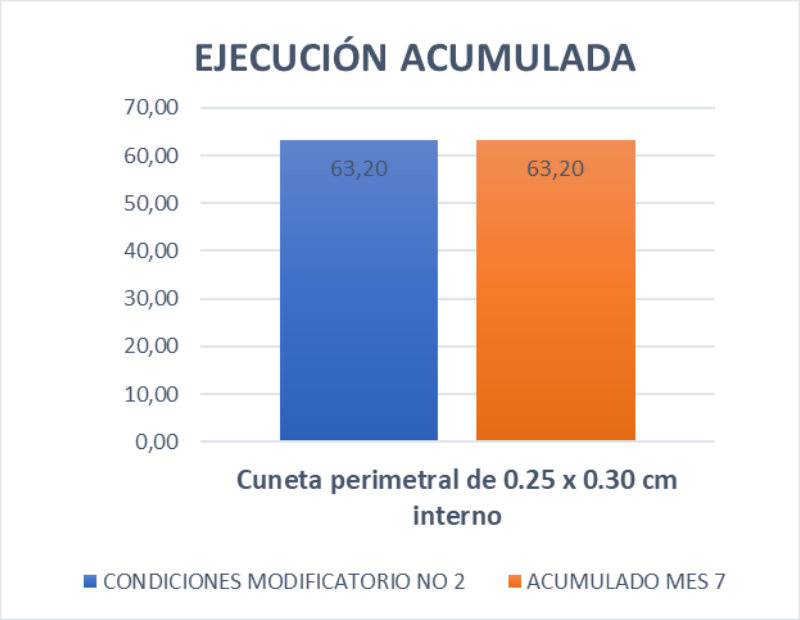

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




8.3. MODULO CIRCULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES RADIO=20CM, ALTURA=10CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

DESCRIPCIÓN

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y

coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 538.173,00	$ 538.173,00	1,00	$ 538.173,00	0,00	$ 0,00

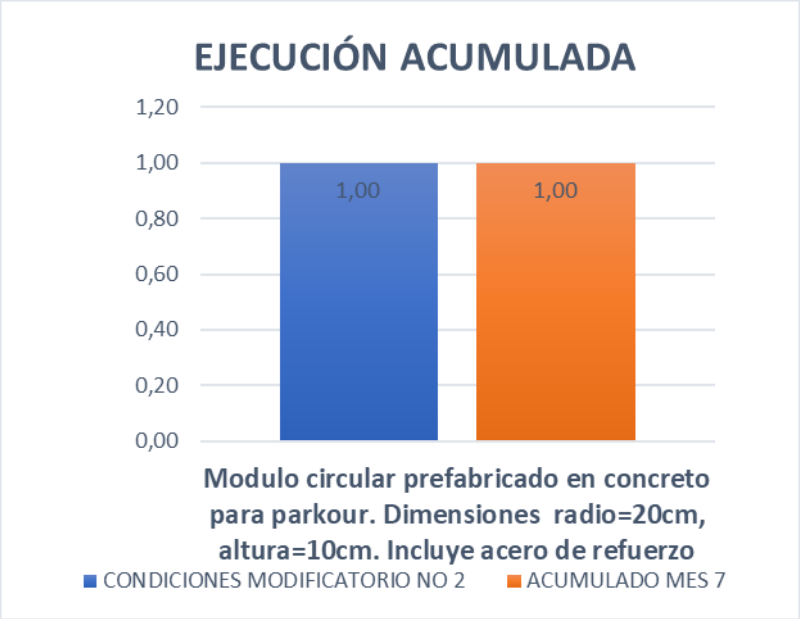

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%


8.4. MODULO CIRCULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES RADIO=20CM, ALTURA=20CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

DESCRIPCIÓN

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR

Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 604.748,00	$ 604.748,00	1,00	$ 604.748,00	0,00	$ 0,00

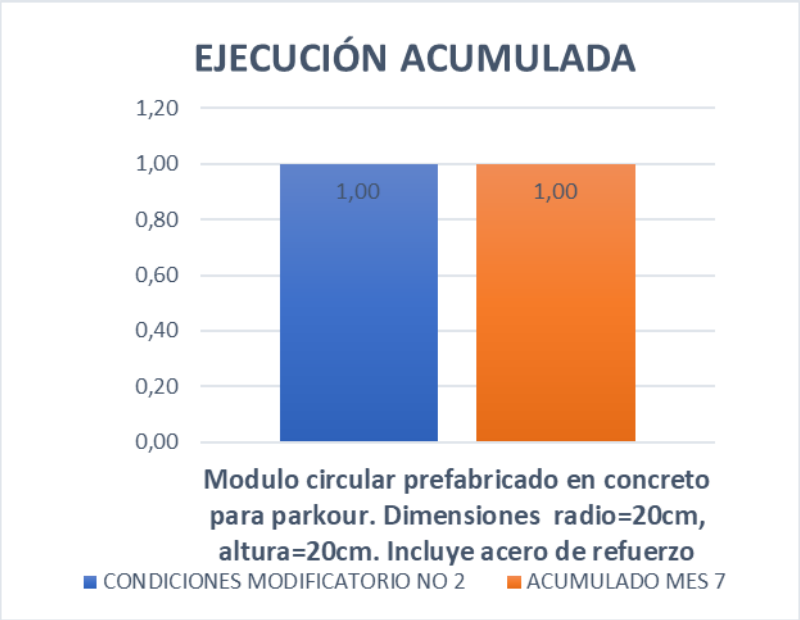


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.5. MODULO CIRCULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES RADIO=20CM, ALTURA=30CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

DESCRIPCIÓN

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 727.307,00	$ 727.307,00	1,00	$ 727.307,00	0,00	$ 0,00

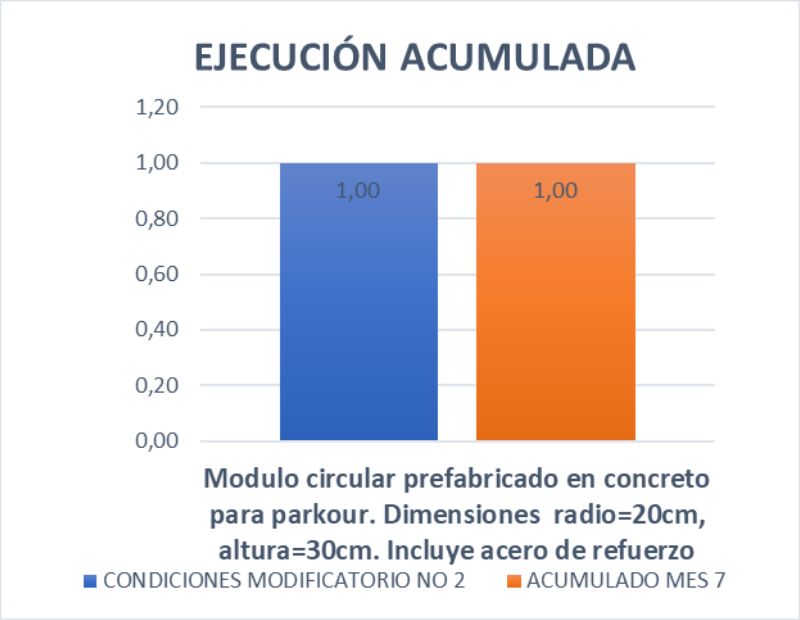


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.6. MODULO CIRCULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES RADIO=20CM, ALTURA=40CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 747.536,00	$ 747.536,00	1,00	$ 747.536,00	0,00	$ 0,00

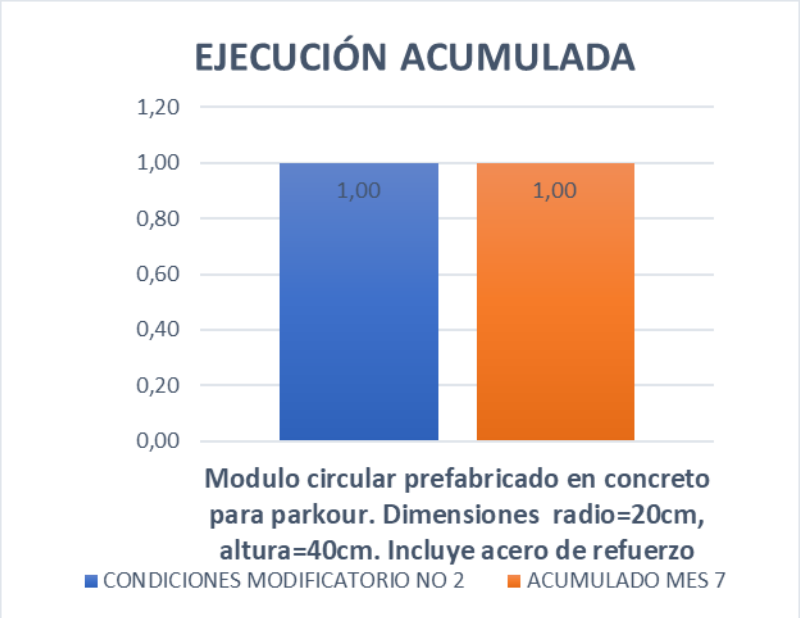


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.7. MODULO CIRCULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES RADIO=20CM, ALTURA=50CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 766.609,00	$ 766.609,00	1,00	$ 766.609,00	0,00	$ 0,00

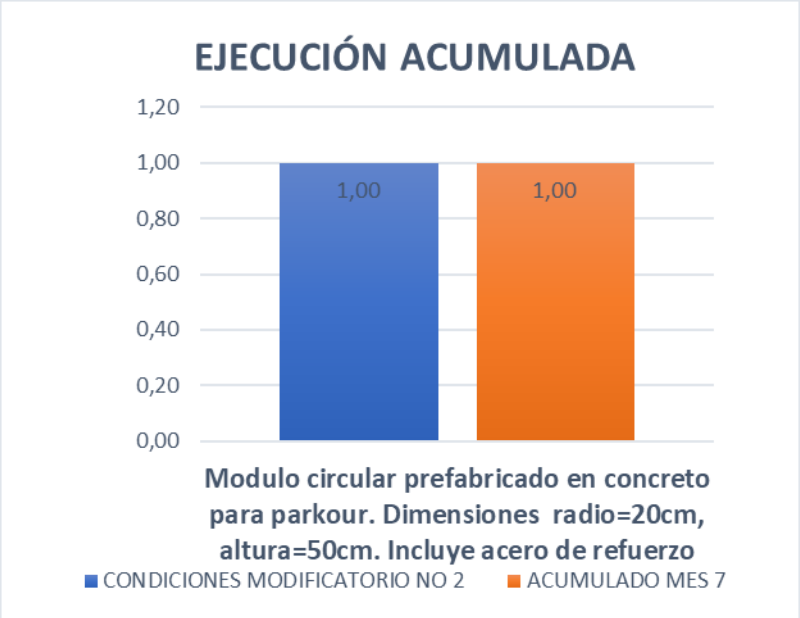


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.8. MODULO RECTANGULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES ANCHO=0,75CM, LARGO=1,25CM Y ALTURA=0,50CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 789.343,00	$ 789.343,00	1,00	$ 789.343,00	0,00	$ 0,00

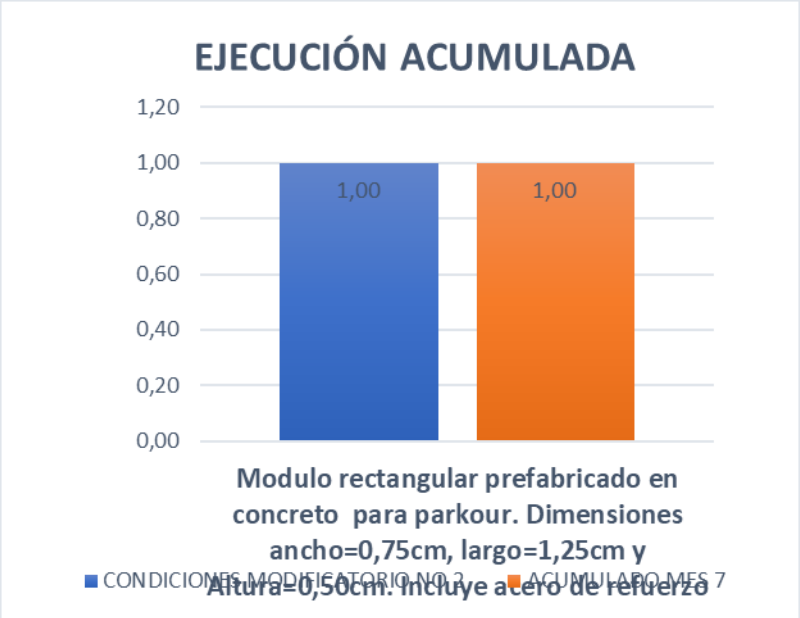


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.9. MODULO RECTANGULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES ANCHO=0,75CM, LARGO=1,25CM Y ALTURA=0,80CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 3.531.034	$ 3.531.034,00	1,00	$ 3.531.034,00	0,00	$ 0,00

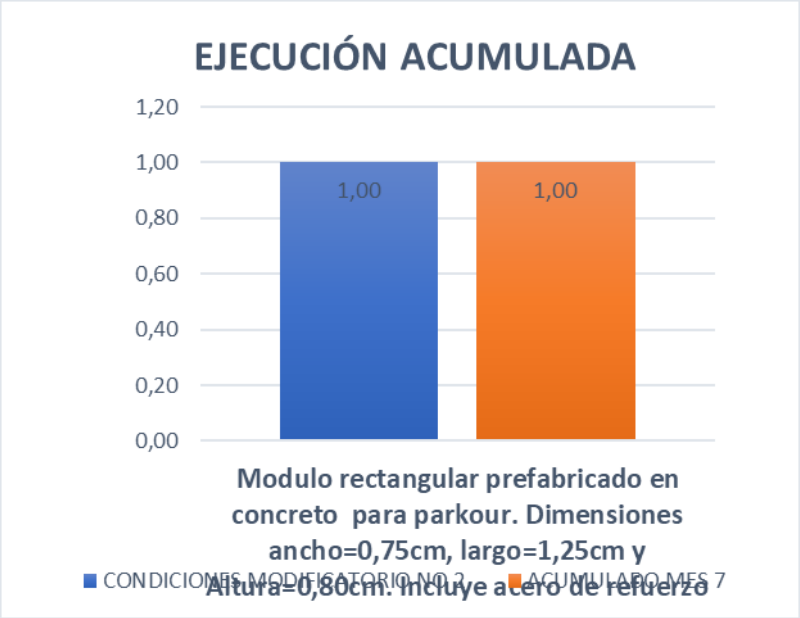


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.10. MODULO RECTANGULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES ANCHO=0,75CM, LARGO=1,25CM Y ALTURA=1M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 4.210.405	$ 4.210.405,00	1,00	$ 4.210.405,00	0,00	$ 0,00

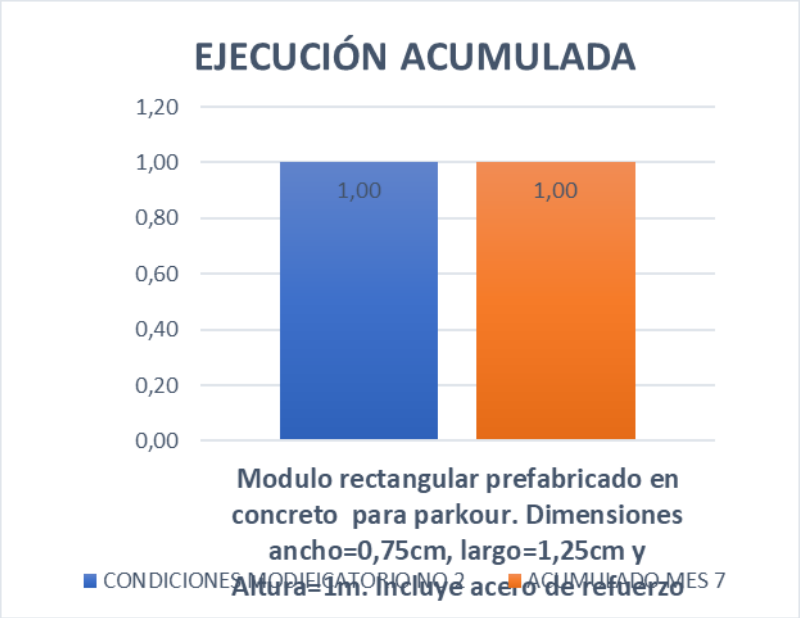


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

9.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALES VERTICALES EN FONDO REFLECTIVO TIPO ALTA INTENSIDAD CON TABLERO EN LÁMINA CAL 16, TERMINADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA
DE REFUERZO

Esta actividad contempla la instalación de señales verticales sobre la vía principal y en los accesos de parqueadero, estas señales cumplen con las especificaciones técnicas, así como con la normativa INVIAS.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca	UND	10,00	$ 648.530,00	$ 6.485.300,00	3,00	$ 1.945.590,00	7,00	$ 4.539.710,00

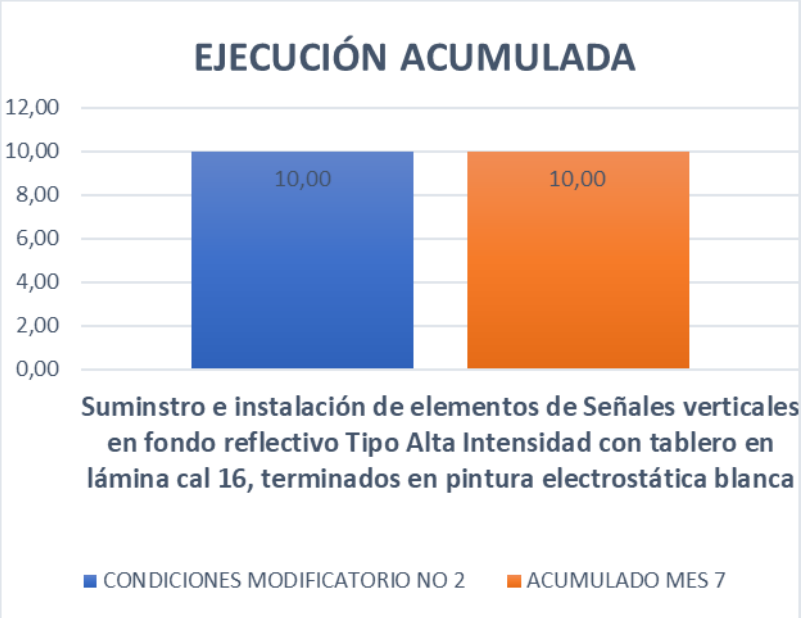

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A-10 (0,80M*0,50M*0,20M)

DESCRIPCIÓN

Se instaló sardinel prefabricados para delimitar las circulaciones peatonales y contener las estructuras de piso en diversas áreas del proyecto, incluyendo el andén perimetral al

parqueadero, la zona de parkour y calistenia, y las bahías de parqueo paralelas a la vía de acceso vehicular.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20 m)	ML	403,34	$ 139.007,00	$ 56.067.083,00	403,34	$ 56.067.083,00	0,00	$ 0,00

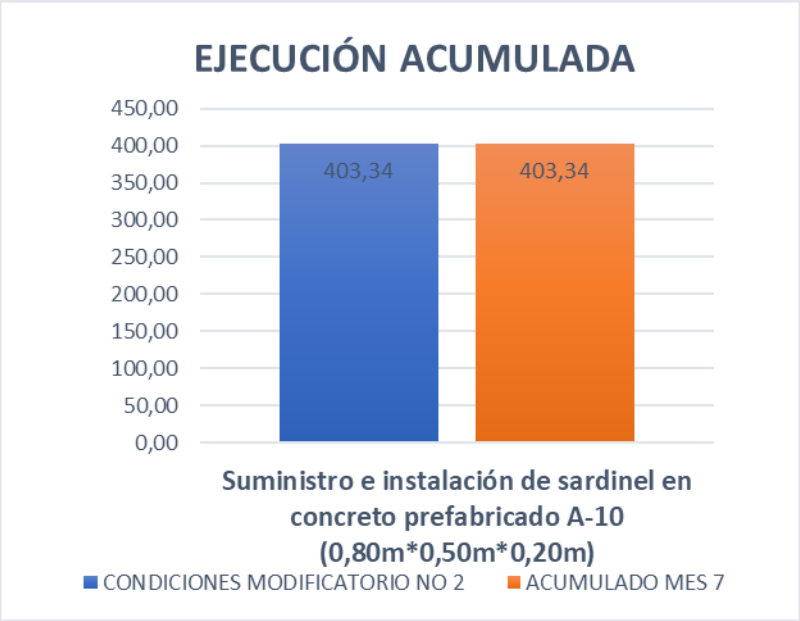

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO (0,80M*0,30M*0,20M)

DESCRIPCIÓN

Se instaló bordillo prefabricados para delimitar las circulaciones peatonales y contener las estructuras de piso en diversas áreas del proyecto, incluyendo el andén perimetral al parqueadero, la zona de parkour y calistenia, y las bahías de parqueo paralelas a la vía de acceso vehicular.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro E Instalación De Bordillo En Concreto Prefabricado (0,80m*0,30m*0,20 m)	ML	289,51	$ 128.533,00	$ 37.211.589,00	289,51	$ 37.211.589,00	0,00	$ 0,00

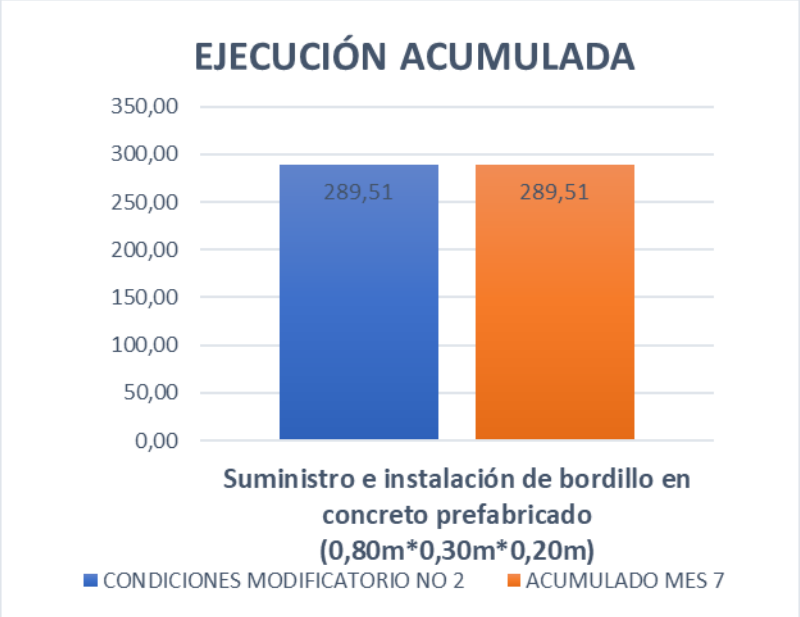

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN CONCRETO PARA CÁRCAMOS

DESCRIPCIÓN

Esta actividad contempla la instalación de rejillas en concreto para tapas de los cárcamos laterales. Estos elementos tienen la finalidad de evitar caídas hacia los mismos, así como evitar arrojar elementos de gran tamaño al sistema de desague.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	ML	63,20	$ 252.799,00	$ 15.976.897,00	63,20	$ 15.976.897,00	0,00	$ 0,00

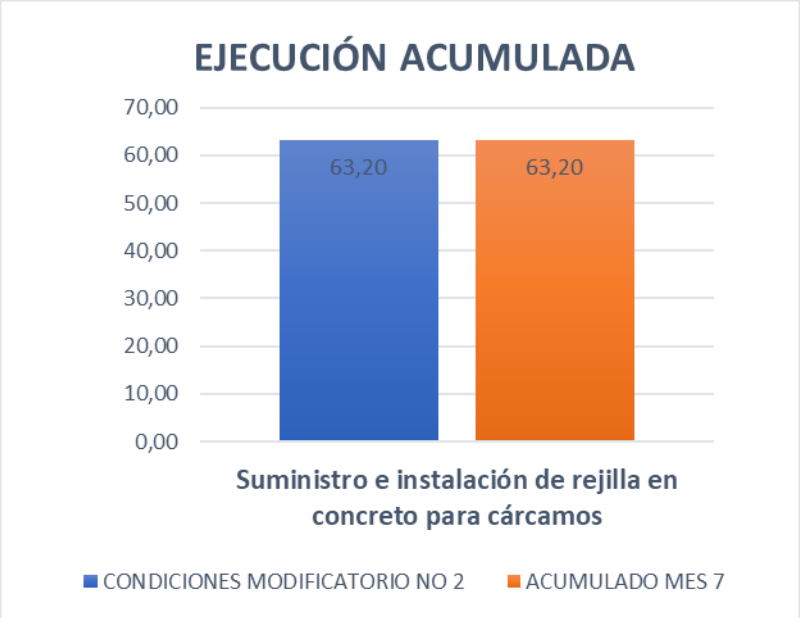

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.4. CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.00M X 1.00M X 1.00M) INCLUYE CINTA DE REMATE

DESCRIPCIÓN

El proyecto contempla la siembra de árboles en diferentes sectores, para lo cual se realiza la construcción de contenedores de raíces, los cuales actúan evitando que las raíces de los

árboles sobresalgan a la superficie afectando los diferentes elementos como placas y bordillos a su alrededor.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	UND	13,00	$1.122.872	$ 14.597.336,00	13,00	$ 14.597.336,00	0,00	$ 0,00

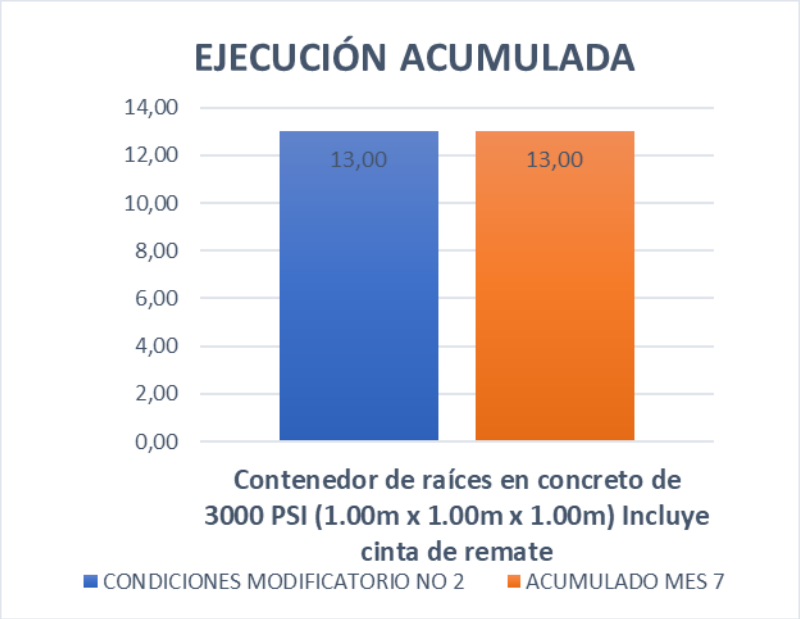

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA XX-257

DESCRIPCIÓN

Durante el proceso constructivo, se procedió a la instalación de malla electrosoldada en las áreas específicas del proyecto, con el fin de reforzar las placas en concreto. Esta instalación garantiza una mayor resistencia a las cargas, evitando fisuras y comportamientos no deseados de los elementos.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	10054,64	$ 16.345,00	$ 164.343.091,00	10054,64	$ 164.343.091,00	0,00	$ 0,00

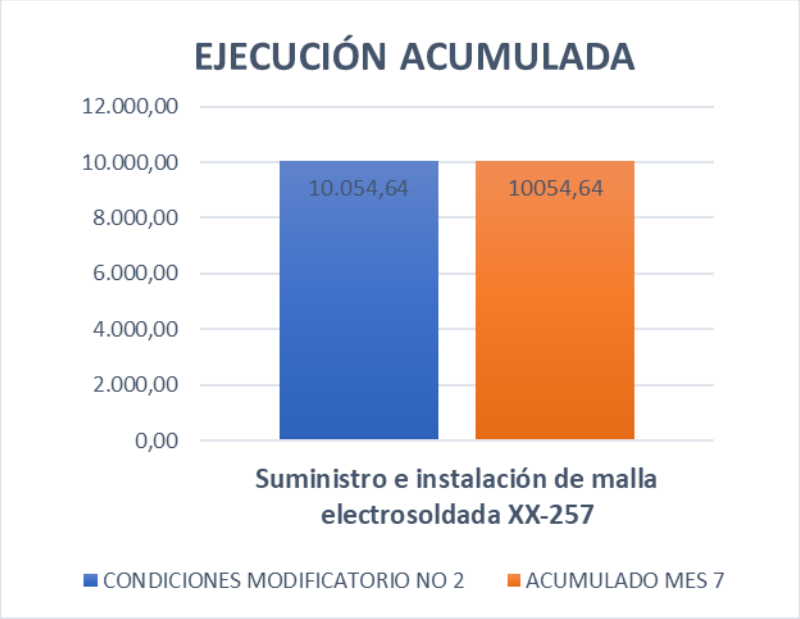

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.6. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SUB BASE GRANULAR

DESCRIPCIÓN

Para la presente actividad se realiza la colocación y compactación de sub base granular utilizada para resistir las cargas en las zonas requeridas son senderos peatonales, zona de parkour y demás, siguiendo los parámetros de uso de material y compactaciones del manual INVIAS, además de las especificaciones técnicas. Esta compactación se realizó por medios mecánicos con el fin de garantizar la estabilidad de la misma.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	430,73	$ 249.748,00	$ 107.573.956,00	430,73	$ 107.573.956,00	0,00	$ 0,00

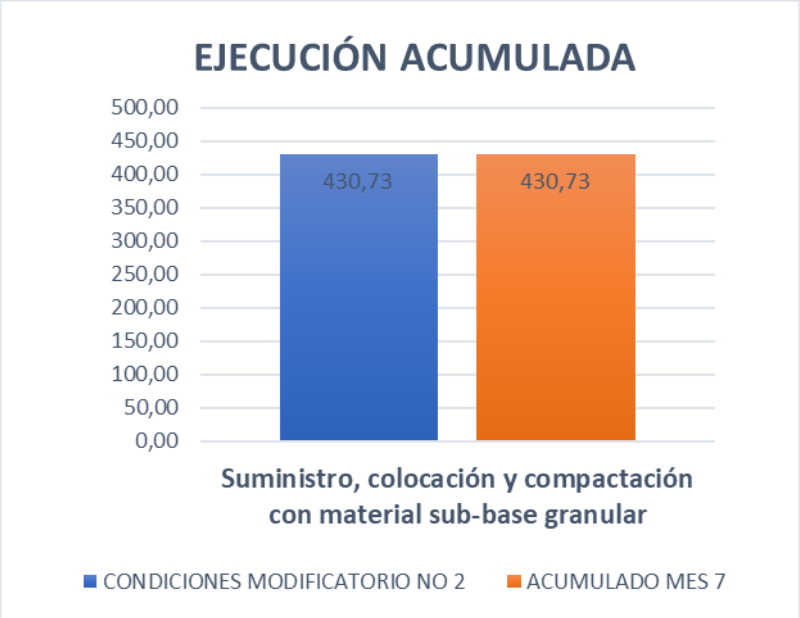

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



11.7. PUNTO HIDRÁULICO 1" PRESIÓN

DESCRIPCIÓN

Se instaló la tubería hidráulica en PVC (diámetros de 1” y ½”) para la red de agua potable, incluyendo los puntos de conexión destinados a sanitarios y lavamanos de los contenedores.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Punto hidráulico 1" presión	UND	3,00	$ 75.103,00	$ 225.309,00	3,00	$ 225.309,00	0,00	$ 0,00



Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.8. PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PRESIÓN

DESCRIPCIÓN

Se instaló la tubería hidráulica en PVC (diámetros de 1” y ½”) para la red de agua potable, incluyendo los puntos de conexión destinados a sanitarios y lavamanos de los contenedores.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Punto hidráulico 1/2" presión	UND	3,00	$ 48.257,00	$ 225.309,00	3,00	$ 144.771,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO AÉREO CONVENCIONAL DE 15 KVA 13200/208-120 V

DESCRIPCIÓN

Para garantizar el suministro eléctrico del proyecto, se instaló un transformador de 15 kVA conectado a la red de media tensión existente. Como parte de esta intervención, se retiró la red ACSR, su estructura terminal y el poste actual en el área de conexión, con el fin de liberar espacio para la instalación de un nuevo poste de concreto de 12 m destinado a soportar el transformador y los sistemas eléctricos, cumpliendo con la normativa técnica vigente

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V	UND	1,00	$ 26.573.019	$ 26.573.019,00	1,00	$ 26.573.019,00	0,00	$ 0,00

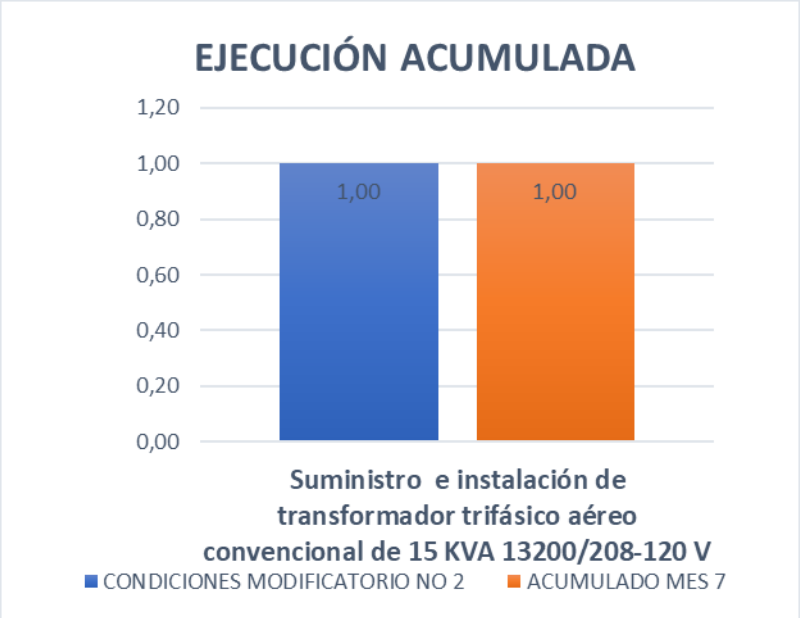

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.14. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" DB

DESCRIPCIÓN

Se instaló tubería eléctrica en PVC de 1” para el tendido de conductores de las balas eléctricas de piso, conforme a los planos aprobados, cumpliendo con las pendientes, alineación y profundidad requeridas. Las acometidas se identificaron, sellaron y protegieron

adecuadamente, garantizando la integridad del cableado y facilitando futuras labores de mantenimiento

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubería PVC de 1" DB	UND	170,00	$ 36.022,00	$ 6.123.740,00	170,00	$ 6.123.740,00	0,00	$ 0,00

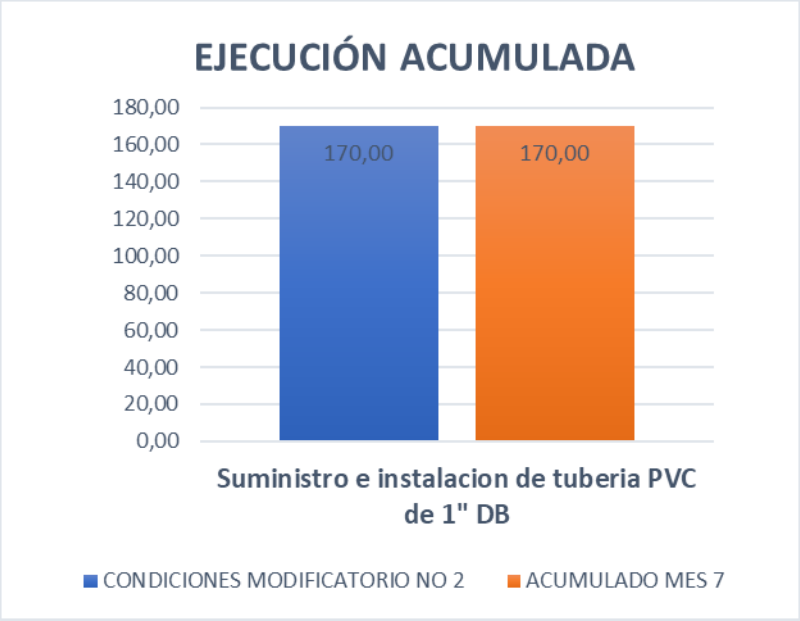

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.19. RETIRO DE RED ACSR, ESTRUCTURA TERMINAL Y POSTE 12 MTS EXISTENTE

DESCRIPCIÓN

Para garantizar el suministro eléctrico del proyecto, se instaló un transformador de 15 kVA conectado a la red de media tensión existente. Como parte de esta intervención, se retiró la red ACSR, su estructura terminal y el poste actual en el área de conexión, con el fin de liberar espacio para la instalación de un nuevo poste de concreto de 12 m destinado a soportar el transformador y los sistemas eléctricos, cumpliendo con la normativa técnica vigente

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Retiro de red ACSR, estructura terminal y poste 12 mts existente	UND	1,00	$ 821.425,00	$ 821.425,00	10,00	$ 821.425,00	0,00	$ 0,00

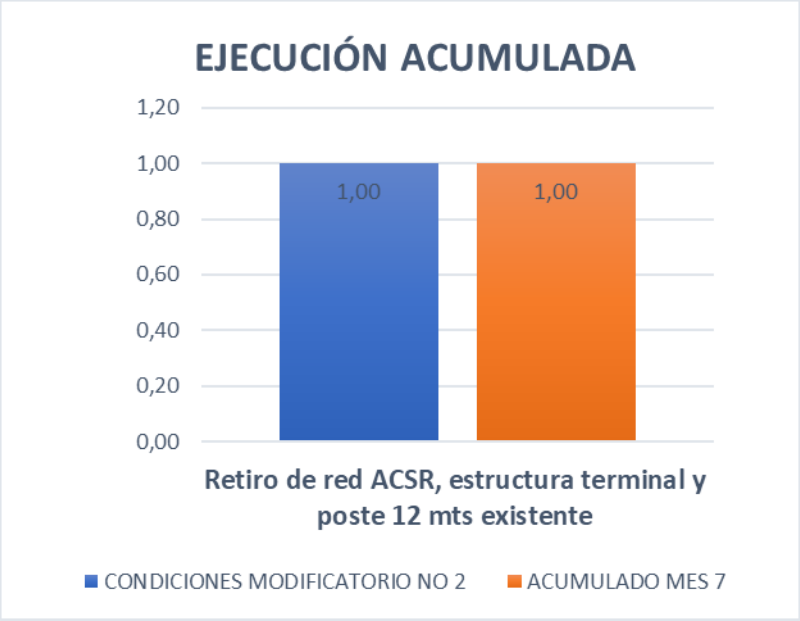

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

- Entrega de dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores y la socialización de la vinculación a los sistemas generales de seguridad social.

- En cada una de las áreas intervenidas se dispone el material en zonas indicadas por la interventoría con su respectiva señalización y se despejan áreas de circulación. Se colocó cerramiento en poli sombra para aislar las zonas de trabajos.
- Se responderá a las quejas y reclamos de la comunidad dando la solución pertinente.
- Entrega de elementos de protección personal al personal de obra.
- Almacenamiento de residuos peligrosos.
- Señalización de obra.
- Socialización previa a iniciar proyecto con la comunidad.

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos y dando cabalidad a los requerimientos establecidos, el informe de Plan de Manejo ambiental se presentará como anexo a este informe.

Esta actividad tiene un avance por tiempo del 92%.

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

- La interventoría mediante presencia en obra ha realizado un seguimiento permanente al desarrollo de la obra ejecutada. Es así, como ha informado y conceptuado de forma continua y periódica, sobre el avance, problemas presentados, sugerencias y soluciones en el desarrollo de las obras contratadas.
- Revisión de especificaciones técnicas.
- Solicitud de hojas de vida del personal profesional.
- Revisión de afiliación al sistema de seguridad social del personal vinculado a la obra. Ver Anexo: “Planillas de Dotación y Afiliaciones de obra”
- Realización de memorias de cálculo correspondientes a cada ítem del contrato de obra.
- Revisión de entrega de EPPS a personal de obra Ver Anexo: “Planillas de dotación y afiliaciones de obra”.

8.1. INFORME DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

Para el proyecto, la gestión socio ambiental realizara las siguientes actividades:

- Establecer de manera coordinada convenios de trabajo en temas sociales con los representantes de la comunidad.
- Evaluar las matrices con las comunidades trimestralmente, en caso que se encuentren expuestas algún riesgo ambiental.
- Revisión de información y documentación eficaz para el intercambio de información entre los usuarios y los organismos interesados en la solución de los problemas socio-ambientales de la comunidad del sector.
- Capacitaciones de componente ambiental al personal de obra.
- Revisión de actividades y acciones dirigidas a perfeccionar el desempeño social de la comunidad del sector.

8.2. GESTIÓN SOCIAL

La labor de Gestión Social se orienta a:

- Afiliación del personal contratado por parte de CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA al Sistema General de Seguridad Social.
- Verificación de la entrega de Dotación al personal de obra no calificada por parte del contratista CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA.
- Verificación de seguridad social por parte de la interventoría CONSORCIO INTER DEPORTES del personal contratado para la obra.
- Se realizó socialización del proyecto antes de dar inicio con las actividades.
- Se realiza atención a la comunidad cada vez que ellos lo soliciten.
- Reuniones permanentes con el personal obrero para resolver inquietudes.

9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

9.1. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR LA INTERVENTORÍA

El personal presente para la ejecución del contrato se relaciona en los siguientes cuadros, desagregando el personal por cargos y presentando el listado de personal con sus novedades:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Director de Interventoría	1	Si
Residente de interventoría	1	Si
Topógrafo	1	Si
Cadenera	1	Si
PERSONAL TOTAL	**4**	**TODOS**

9.2. RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato:

EQUIPO	CANTIDAD
Equipo de topografía	1
Mezcladora de concreto	1
Benitin compactador	1
Retrocargador	1
Volquetas	4
Planta de energía	1
Tronzadora	1
Vibrador de concreto	1



Minicargador.



Retrocargador.


	
Mezcladora de concreto.	***Benitin compactador.***
	
Planta eléctrica.	***Compactador neumático.***

9.3. ALMACENAMIENTO DE MATERIAL.

	
Loseta prefabricada.	***Ladrillo.***
	
Almacenamiento de material.	***Acopio de acero de bordillos y sardineles.***

9.4. RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO.

El valor ejecutado en dinero hasta el momento por el contratista corresponde a $ 3.704.713.733,00 vs el valor contractual corresponde a $4.116.550.974,00 para un total ejecutado de aproximadamente de 90,00% frente a un programado 89,63%, evidenciando un avance positivo de un 0,36% de acuerdo a la re programación No 2 presentada por parte del contratista de obra.

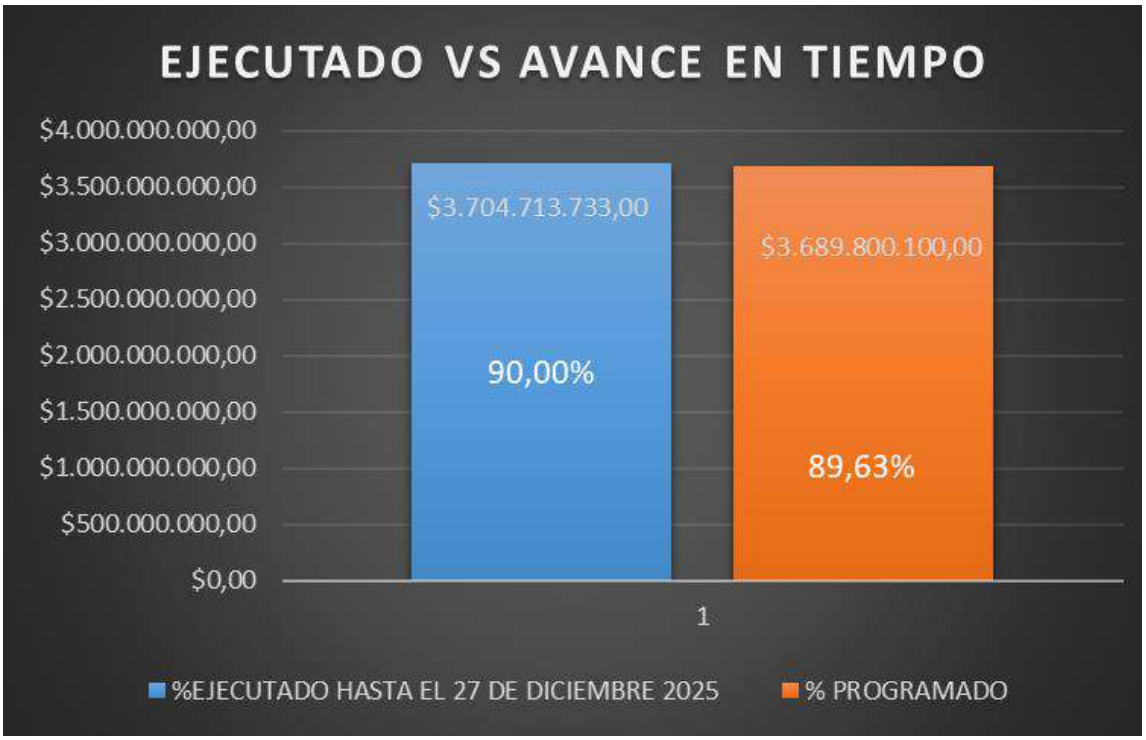
EJECUTADO VS AVANCE EN TIEMPO
$4.000.000.000,00
$3.500.000.000,00
$3.000.000.000,00
$2.500.000.000,00
$2.000.000.000,00
$1.500.000.000,00
$1.000.000.000,00
$500.000.000,00
$0,00
$3.704.713.733,00
$3.689.800.100,00
90,00%
89,63%
1
%EJECUTADO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
% PROGRAMADO


EJECUTADO VS VALOR CONTRACTUAL
$4.500.000.000,00
$4.000.000.000,00
$3.500.000.000,00
$3.000.000.000,00
$2.500.000.000,00
$2.000.000.000,00
$1.500.000.000,00
$1.000.000.000,00
$500.000.000,00
$0,00
$3.704.713.733,00
$ 4.116.550.974,00
90,90%
100%
$1,000
%EJECUTADO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
VALOR CONTRACTUAL

9.5. RELACIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA VS EL AVANCE EN TIEMPO DE LA OBRA.

RESUMEN EJECUCIÓN 28 DE MAYO 2025 – 27 DE DICIEMBRE 2025		
	DÍAS	**PORCENTAJE %**
PLAZO TOTAL	**244**	**100,00%**
TIEMPO TRANSCURRIDO	**213**	**87%**
PLAZO DISPONIBLE	**31**	**13%**
EJECUTADO A LA FECHA	**$3.704.713.733,00**	**90,00%**
SALDO POR EJECUTAR	**$411.837.241,00**	**10,00%**



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance de las obras presenta un avance de acuerdo a la programación del 0,36%, atribuible principalmente a las fechas decembrinas.
- A pesar del retraso en el presente periodo con respecto a los anteriores periodos, el proyecto se mantiene dentro de los márgenes de recuperación, siempre que se conserve el ritmo actual de trabajo y se implementen oportunamente las correcciones señaladas por la interventoría.
- La solicitud de prórroga planteada por el contratista deberá evaluarse con base en evidencia técnica y justificación documental, considerando tanto los impactos reales de la temporada decembrina como el compromiso del contratista con la programación ajustada.
- Se verifica el cumplimiento de los aspectos sociales y laborales fundamentales: dotación adecuada de EPP, afiliación vigente al sistema de seguridad social y desarrollo de acciones de socialización con la comunidad, lo cual contribuye positivamente a la sostenibilidad del proyecto.
- Las actividades constructivas ejecutadas hasta la fecha —incluyendo trabajos preliminares, excavaciones, mampostería, frisos y colocación de concreto en zonas duras— se encuentran alineadas con las especificaciones técnicas del contrato.
- La interventoría reitera su compromiso de seguimiento riguroso, tanto en lo técnico como en lo administrativo, y recomienda a la Entidad Contratante mantener una supervisión activa para garantizar la culminación oportuna y conforme del proyecto.
- La interventoría mediante este informe pone en total conocimiento a la entidad contratante.



NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L UT INTER DEPORTES 2025
INTERVENTORIA

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"



INFORME ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE ENERO DE 2026

CONTRATO N.º 1007 DE 2025

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CARTA DE PRESENTACIÓN

BARRANCABERMEJA, ENERO 28 de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Diagonal 60 KM 1 Vía al Llanito
Barrancabermeja

REFERENCIA: CONTRATO No. 1007 de 2025, OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

Respetados señores.

De manera atenta me dirijo a Ustedes con el fin de realizar la entrega del Informe mensual N.º 08 de Interventoría, del contrato de la referencia, correspondiente al periodo de ejecución del 28 de diciembre de 2025 al 27 de enero de 2026, con el fin de presentar el informe mensual de interventoría en la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".
Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contractuales



ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L UT INTER DEPORTES 2025
NIT: 901.926.678-6

1. INTRODUCCIÓN

El Distrito de Barrancabermeja enfrenta el reto de seguir fortaleciendo su infraestructura urbana y social, especialmente en lo relacionado con el acceso a espacios públicos que fomenten la recreación, el deporte y la sana convivencia. En este contexto, surge el proyecto “Construcción de Áreas de Deportes Extremos y Alternativos – Distrito Urbano”, como una iniciativa que busca atender la creciente demanda de la población, en particular de los jóvenes, por espacios modernos, seguros y adecuados para la práctica de disciplinas deportivas no convencionales.

Esta propuesta tiene como objetivo principal crear un entorno integral donde se promuevan valores como la inclusión, la participación ciudadana, el aprovechamiento del tiempo libre y el fortalecimiento del tejido social, a través de la construcción de instalaciones para deportes como skateboarding, BMX, parkour, entre otros. Además, se plantea como un motor de transformación urbana, revitalización de zonas subutilizadas y dinamización de la economía local mediante el impulso del turismo deportivo y la cultura urbana.

El “Distrito Urbano” se perfila, así como una apuesta estratégica para el desarrollo social y urbano de Barrancabermeja, en línea con las políticas públicas de bienestar, juventud, seguridad y sostenibilidad.

2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Necesidad

El proyecto nace debido al auge de los deportes extremos y alternativos contrastando con las disciplinas tradicionales en los cuales entregan una experiencia de adrenalina, libertad y creatividad y por la falta de espacios acordes para la práctica de los mismos en donde los diferentes deportistas puedan desarrollar sus habilidades físicas aumentando el rendimiento competitivo.

Se plantea por parte del distrito de Barrancabermeja la construcción de un parque de deportes extremos generando inclusiones de diversos grupos como jóvenes deportistas, jóvenes en situación de riesgo, adultos y población con interés en practicar deportes alternativos.

Asimismo, este proyecto abre nuevas posibilidades para el desarrollo turístico, educativo y económico, posicionando a la comunidad como un referente en actividades recreativas no convencionales y sostenibles.

2.2. OBJETIVO

Promover la práctica de deportes extremos y alternativos como una herramienta de desarrollo físico, mental y social, fomentando hábitos saludables entre la comunidad.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se desarrolla en un área de 5970 m2 en el sector de la villa olímpica del distrito de Barrancabermeja distribuidos entre pistas, rampas y estructuras para la práctica de deportes extremos y alternativos como lo son el Skate, el BMX, parkour, entre otros, adicionalmente contara con contenedores que podrán ser utilizados como zonas de alquileres de equipos, restaurantes y zonas de hidratación y descanso. Se contará con bahías de parqueo e iluminación exterior con el fin de que se pueda ser utilizado en horas de la noche y pueda ser aprovechado al máximo su utilización.

3.1. Localización.

Barrancabermeja es un municipio colombiano ubicado a orillas del Río Magdalena, en la parte occidental del departamento de Santander. Es sede de la refinería de petróleo más grande del país y recientemente nombrado Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso en la región de Santander. Dista 114 Km de Bucaramanga hacia el este siendo esta la ciudad más grande en la región del Magdalena Medio.

Limita al Norte con el Municipio de Puerto Wilches, al Sur con los Municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el Municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al Occidente con el Río Magdalena.

El proyecto se encuentra ubicado en la villa olímpico colindando con el Coliseo Luis F. Castellanos y el estadio Municipal de Futbol Daniel Villa Zapata.

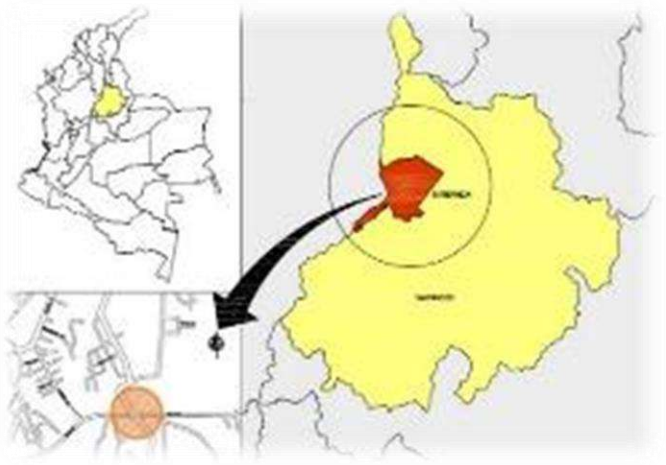


Figura 2. Localización General del Proyecto



Figura 3. Planta de zona de proyecto.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1007 – 25
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	UT INTER DEPORTES 2025
NIT.	901.926.678-6
REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.095.816.909 de Floridablanca (SANTANDER)
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS “DISTRITO URBANO” EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($431.256.000) INCLUIDO IVA
RÉGIMEN TRIBUTARIO	COMÚN
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES.
PRORROGA No 1	UN (01) MES
PRORROGA No 2	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	OCHO (08) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-01012 del 13 de febrero del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-02201 del 01 de abril del 2025
APROBACIÓN DE GARANTIAS	CO1.WRT.16808641 del 16 de abril de 2025
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 de enero del 2026

4.1. RELACIÓN DE ACTAS DE LA INTERVENTORÍA:

DESCRIPCION	FECHA
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
ACTA PARCIAL No 1	05 de agosto de 2025
ACTA PARCIAL No 2	23 de septiembre de 2025
ADICIONAL EN PLAZO No 1	21 de octubre de 2025
ACTA PARCIAL No 3	13 de noviembre de 2025
ACTA PARCIAL No 4	12 de diciembre de 2025
ADICIONAL EN PLAZO No 2	05 de diciembre de 2025

4.2. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA:

Nombre de la Aseguradora: **Seguros mundial.**

PÓLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE ADICION EN PLAZO No 2		
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**

		DESDE	HASTA
B-100060103	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2025	28/11/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/12/2025	28/01/2029
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	28/01/2026	28/01/2031

5. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	0889-25
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS “DISTRITO URBANO” EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA:	CUATRO MIL CIENTO DIESCISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	901.922.463-1
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRES SERANO GOMEZ
CEDULA	13.870.690 DE BUCARAMANGA
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES
PRORROGA No 1	UN (01) MES
PRORROGA No 2	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	OCHO (08) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-01011 del 13 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-02162 del 31 de marzo de 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.16683589 del 29 de abril de 2025
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 de enero del 2026

5.1. RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA:

DESCRIPCION	FECHA
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
OTRO SI ACLARATORIO No 1	29 de julio de 2025
ACTA PARCIAL No 1	01 de agosto de 2025
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No 1	20 de agosto de 2025
ACTA PARCIAL No 2	19 de septiembre de 2025
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No 2	17 de octubre de 2025
ADICIONAL EN PLAZO No 1	21 de octubre de 2025
ACTA PARCIAL No 3	13 de noviembre de 2025

ACTA PARCIAL No 4	12 de diciembre de 2025
ADICIONAL EN PLAZO No 2	05 de diciembre de 2025

5.2. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA:

Nombre de la Aseguradora: Seguros mundial.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE ADICIONAL EN PLAZO No 2			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
B-100016184	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	7/03/2025	27/01/2026
B-100016184	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	5/12/2025	27/07/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5/12/2025	27/01/2029
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/01/2026	27/01/2031

6. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRAS EJECUTADAS

Con el fin de representar los trabajos y dejar constancia de las actividades, y desarrollo de los mismos en el presente capitulo se mostrará la cuantificación de cada uno de los ítems desarrollados, los cuales han sido revisados por parte de interventoría con el fin de tener una cuantificación acertada a las cantidades ejecutadas hasta la fecha teniendo en cuenta que si bien el periodo es mensual es deber de la interventoría mantener informada la supervisión de la ejecución que se tiene de la obra hasta la fecha.


CAPITULO I PRELIMINARES

1.1. LOCALIZACIÓN, REPLANTEO DEL AREA DEL PROYECTO.

DESCRIPCIÓN

Para esta actividad se realizó un levantamiento topográfico del área del proyecto en el cual se corroboran medidas del terreno, se localizan los diferentes elementos como cimentación, y diferentes zonas que requiere el proyecto de acuerdo a los planos presentados.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Localización y replanteo del área del proyecto	M2	5.970,70	$ 5.264,00	$31.429.765,00	5.970,70	$31.429.765,00	0,00	$ 0,00

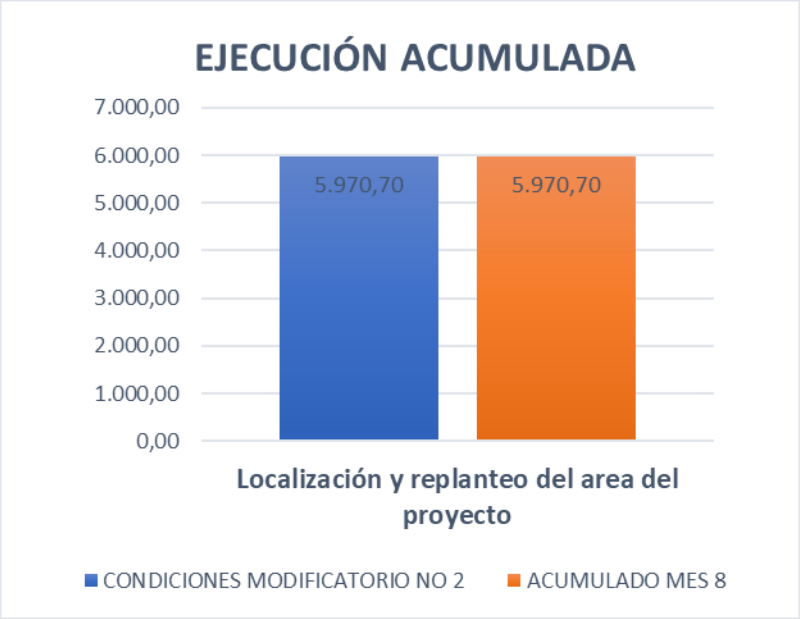

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




2.1. EXCAVACIÓN MANUAL DE 0 A 2 METROS DE PROFUNDIDAD (MATERIAL COMÚN). DESCRIPCIÓN

La presente actividad se realiza con el fin de instalar la tubería de desagüe de aguas lluvias de los diferentes sectores de acuerdo a las pendientes mínimas necesarias y siguiendo los desniveles marcados por parte de la topografía. Esta actividad requiere realizarse de

manera manual ya que, si se ejecuta de manera mecánica, esta podría generar sobre anchos y verse afectadas las pendientes.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común).	M3	161,83	$ 79.208,00	$ 12.818.231,00	161,83	$ 12.818.231,00	0,00	$ 0,00

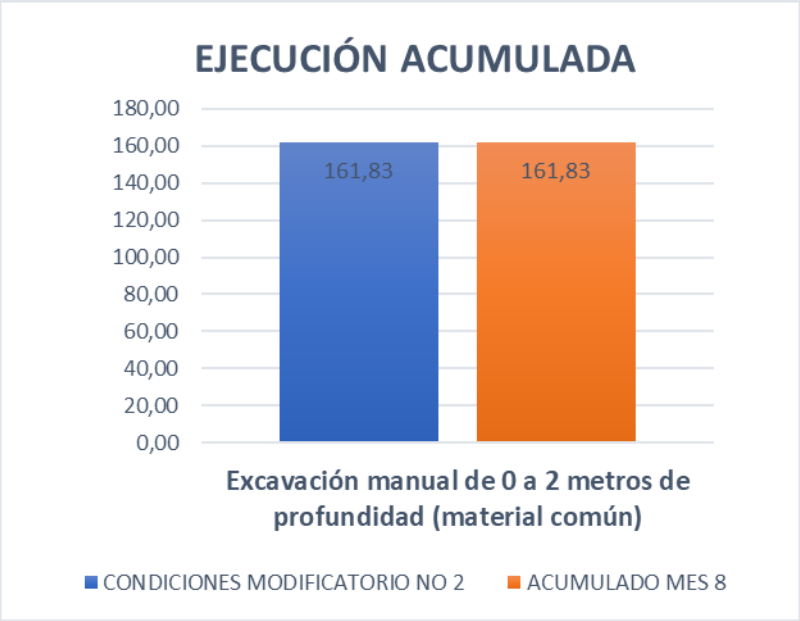


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



2.2. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CORTE).

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde a las excavaciones con maquinaria realizadas por parte del contratista de obra para los trabajos de cimentación de las diferentes zonas de intervención de acuerdo a lo marcado en la localización inicial con equipos de topografía en las cuales se respetaron los anchos de zanja y las diferentes alturas requeridas para los niveles. Adicionalmente se realizaron trabajos de excavación mecánica con el fin de realizar la conformación del terreno para ejecución de los diferentes elementos como escaleras, estructuras de piso y demás.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Excavación mecánica en material común (incluye corte).	M3	1399,44	$33.410,00	$ 46.755.290,00	1399,44	$ 46.755.290,00	0,00	$ 0,00

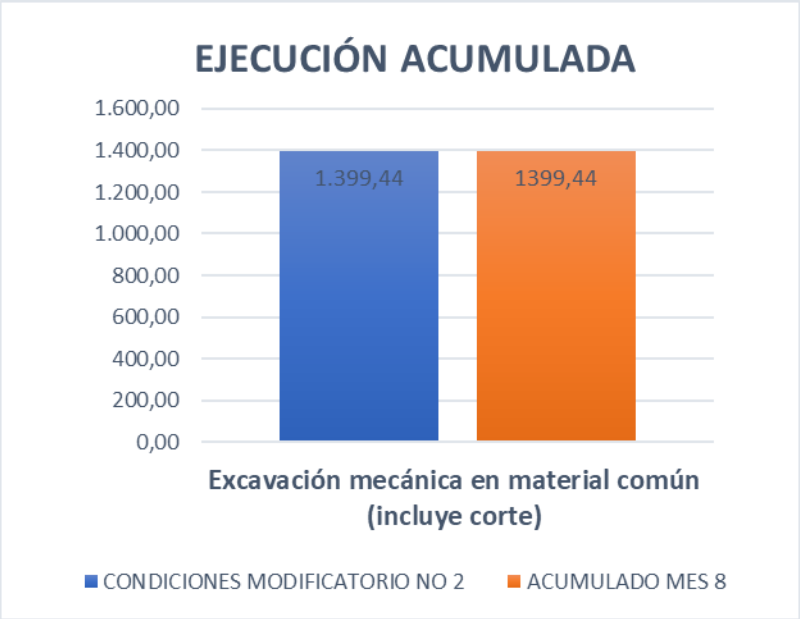

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



2.3. RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO.

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde al relleno y excavación de material de sitio, luego de las excavaciones correspondientes a la instalación de tuberías de drenaje de los diferentes sectores. Esta actividad se realizó afirmando capas con el fin de dar una mayor estabilidad del suelo.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Relleno y compactación con material de sitio.	M3	217,80	$ 22.184,00	$ 4.831.675,00	217,80	$ 4.831.675,00	0,00	$ 0,00



Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




2.4. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL TIPO 2 (MATERIAL GRAVO ARCILLOSO)

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a el relleno y compactación de material de relleno seleccionado, con el fin de conformar la rasante del terreno en los diferentes sectores como son plazoleta, y zonas de excavaciones de cimentación, así como zonas de parqueaderos y rampas, con el fin de lograr los niveles requeridos según diseños. Esta compactación se realizó por medios mecánicos con el fin de garantizar la estabilidad de la misma.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	M3	2105,07	$ 96.630,00	$ 203.412.914,00	2105,07	$ 203.412.914,00	0,00	$ 0,00

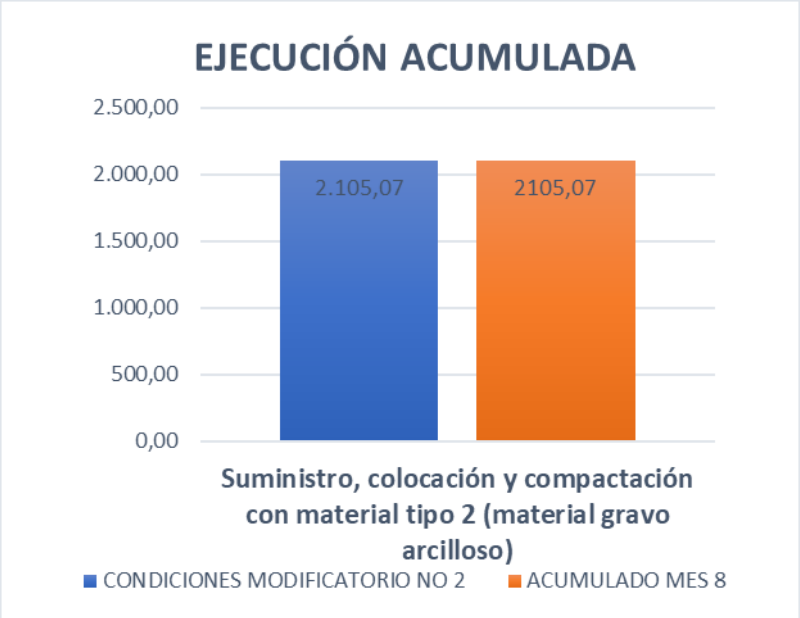

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




2.5. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL BASE GRANULAR.

DESCRIPCIÓN

Para la presente actividad se realiza la colocación y compactación de base granular utilizada para resistir las cargas vehiculares de la carpeta asfáltica en las zonas requeridas como parqueaderos y vía, siguiendo los parámetros de uso de material y compactaciones del manual INVIAS, además de las especificaciones técnicas. Esta compactación se realizó por medios mecánicos con el fin de garantizar la estabilidad de la misma.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	353,00	$ 251.212,00	$ 88.677.836,00	353,00	$ 88.677.836,00	0,00	$ 0,00

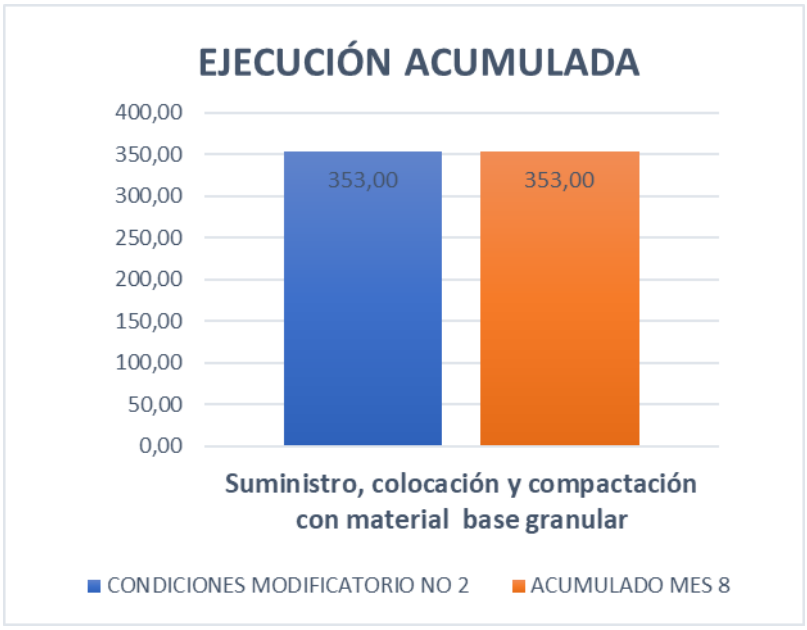

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




2.6. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EXISTENTE.

DESCRIPCIÓN

Luego de acopiar los escombros y material sobrante producto de los trabajos de demolición y desmontes en el sitio destinado para ello, se procede a realizar el cargue a las volquetas y su posterior retiro y disposición en el sitio autorizado, cada una de las volquetas partía carpada con el fin de evitar caída de material en las vías o lanzamiento de material particulado en su recorrido.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Retiro de material sobrante existente	M3-KM	13826,47	$14.698,00	$203.221.456,00	13826,47	$ 203.221.456,00	0,00	$ 0,00

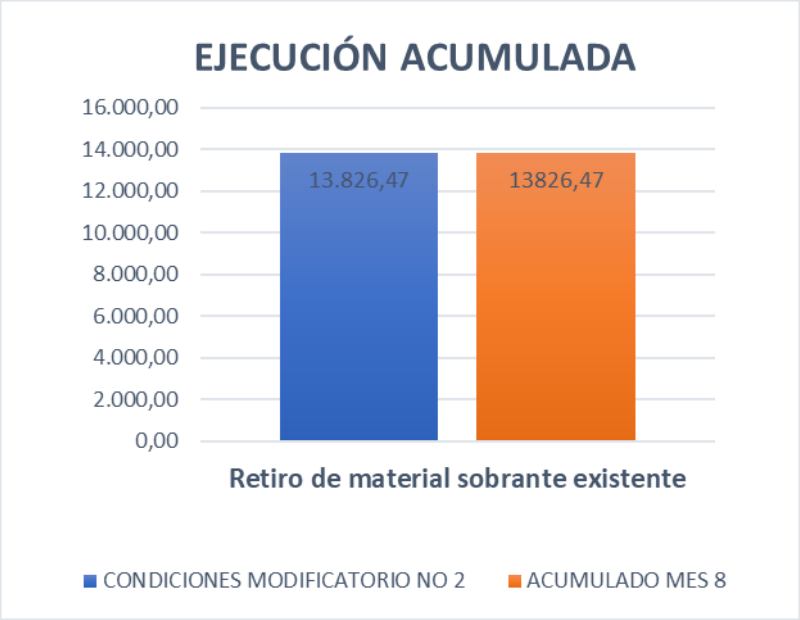


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.1. CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACIÓN DE 2000 PSI 50% CONCRETO 3000 PSI 50% AGREGADO BOLO.

DESCRIPCIÓN Luego de las actividades de excavaciones mecánicas y perfilado de zanjas se procede a realizar el vertimiento de concreto ciclópeo para las estructuras de cimentación de los diferentes elementos con el fin de mejorar las condiciones del terreno. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	M3	91,43	$581.923,00	$ 53.205.220,00	91,43	$ 53.205.220,00	0,00	$ 0,00

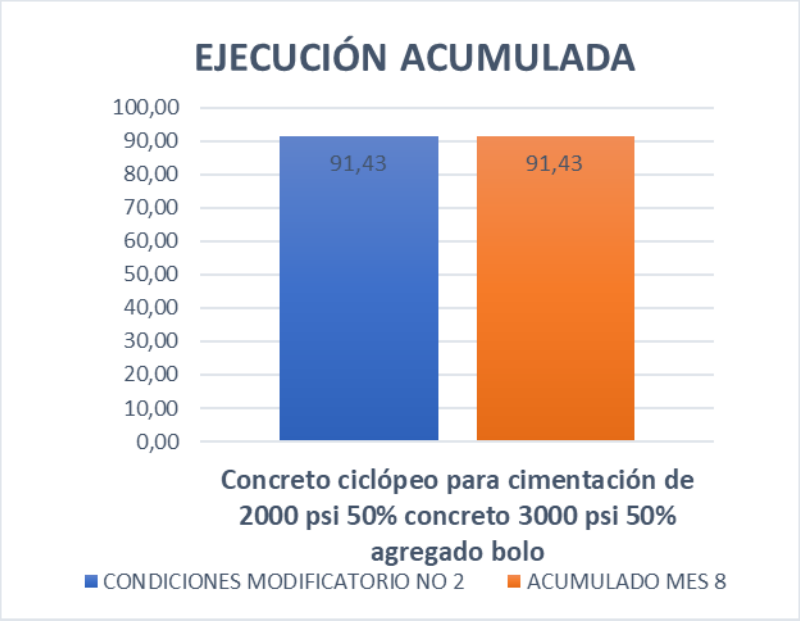


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.2. CONCRETO DE 2000 PSI, CLASE F, PARA SOLADO PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN Para el armado del acero de la estructura de escaleras, se realiza la aplicación de concreto solado con el fin de que estos elementos estructurales no tengan contacto directo con el terreno natural y así mismo esta proteja sus propiedades.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	1,44	$ 897.552,00	$ 1.292.475,00	1,44	$ 1.292.475,00	0,00	$ 0,00

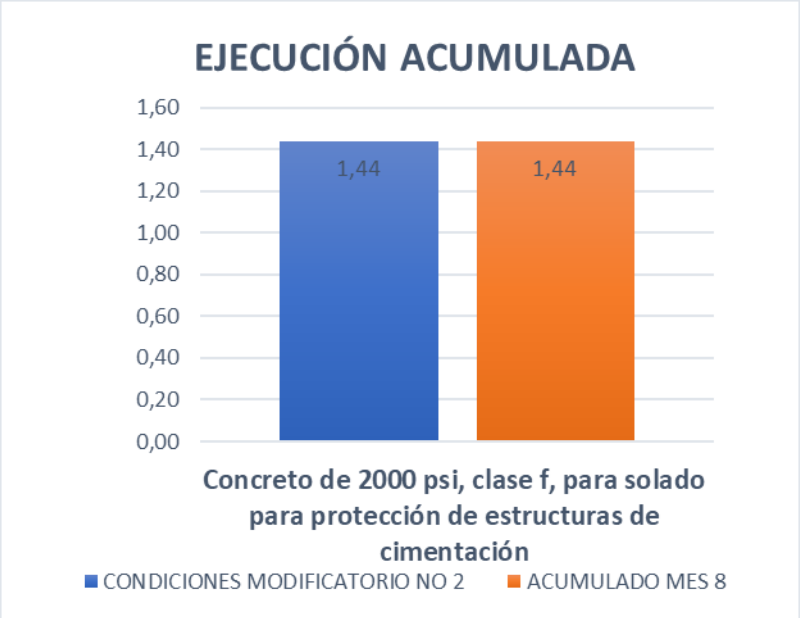


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.3. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y GRADERÍAS.

DESCRIPCIÓN Luego de las actividades de excavaciones mecánicas y perfilado de zanjas se procede a realizar el vertimiento de concreto ciclópeo para las estructuras de cimentación de los diferentes elementos con el fin de mejorar las condiciones del terreno. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías.	M3	144,57	$818.631,00	$ 118.349.484,00	144,57	$ 118.349.484,00	0,00	$ 0,00

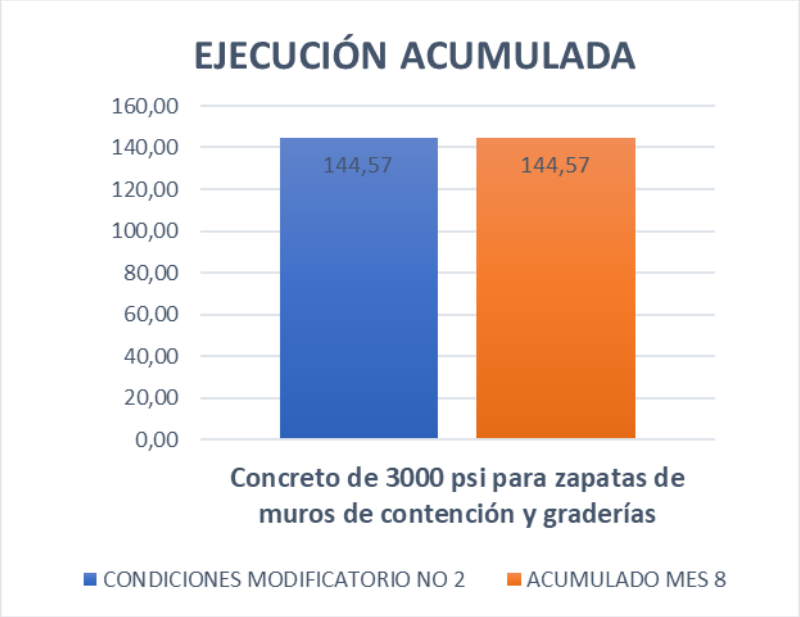


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.4. PLACA DE CONTRAPISO DE CONCRETO DE 3000PSI CON FIBRA SINTÉTICA ESP. 0.12M

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde a la conformación de placas de concreto para las zonas de circulación ubicadas de acuerdo a los diseños, esta placa es reforzada con malla electrosoldada y fibra sintética que ayuda a evitar fisuras, con el fin de dar un mejor acabado.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	M3	2352,79	$ 153.095,00	$ 360.200.385,00	2352,79	$ 360.200.385,00	0,00	$ 0,00

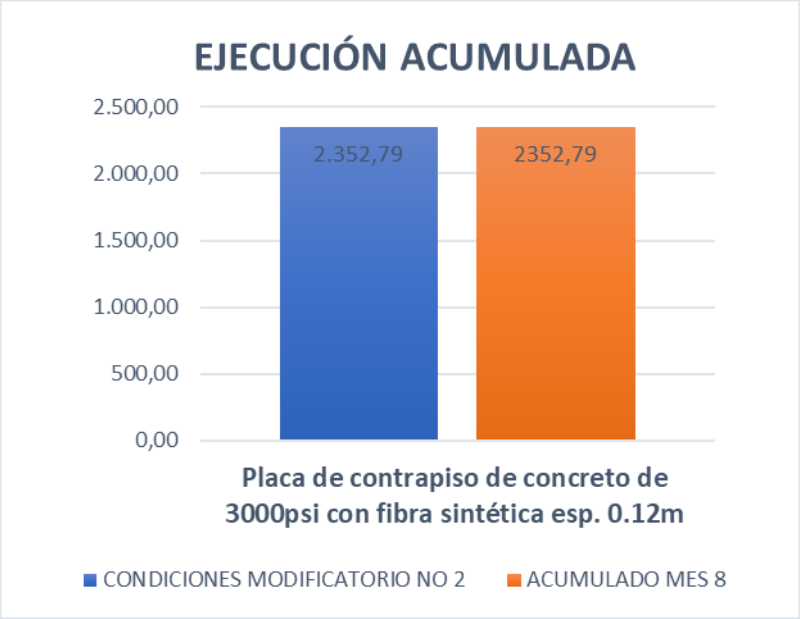

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.5. PLACA DE CONTRAPISO DE CONCRETO DE 3000 PSI ESP 0.06M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM, 15CM*15CM.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la conformación de placas de concreto para las zonas de rampas ubicadas de acuerdo a los diseños, esta placa es reforzada con malla electrosoldada y fibra sintética que ayuda a evitar fisuras, con el fin de dar un mejor acabado.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	M3	810,49	$ 158.916,00	$128.799.829,00	810,49	$128.799.829,00	0,00	$ 0,00

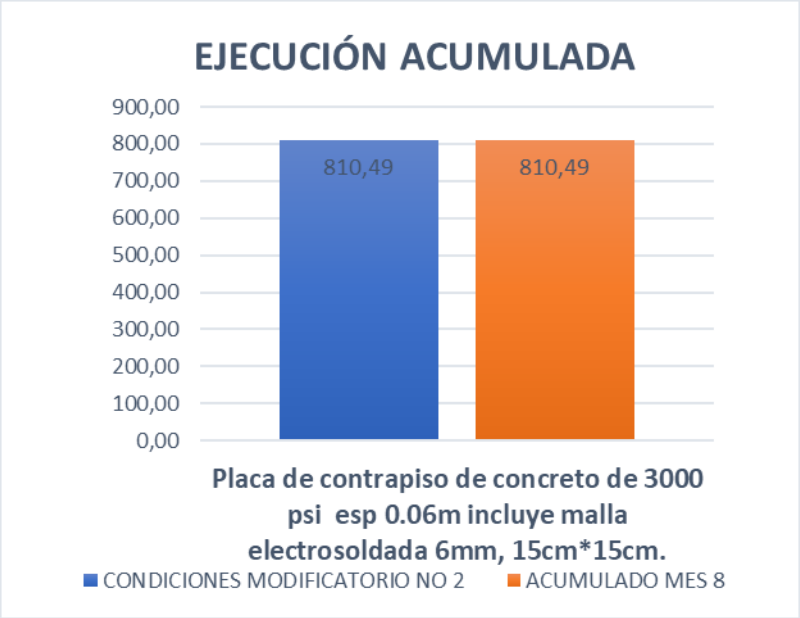

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.6. PLACA DE CONTRAPISO DE CONCRETO DE 3000 PSI CON FIBRA SINTÉTICA ESP .0.06M

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la conformación de placas de concreto para las zonas de rampas ubicadas de acuerdo a los diseños, esta placa es reforzada con malla

electrosoldada y fibra sintética que ayuda a evitar fisuras, con el fin de dar un mejor acabado.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	M3	810,49	$ 158.916,00	$128.799.829,00	810,49	$128.799.829,00	0,00	$ 0,00

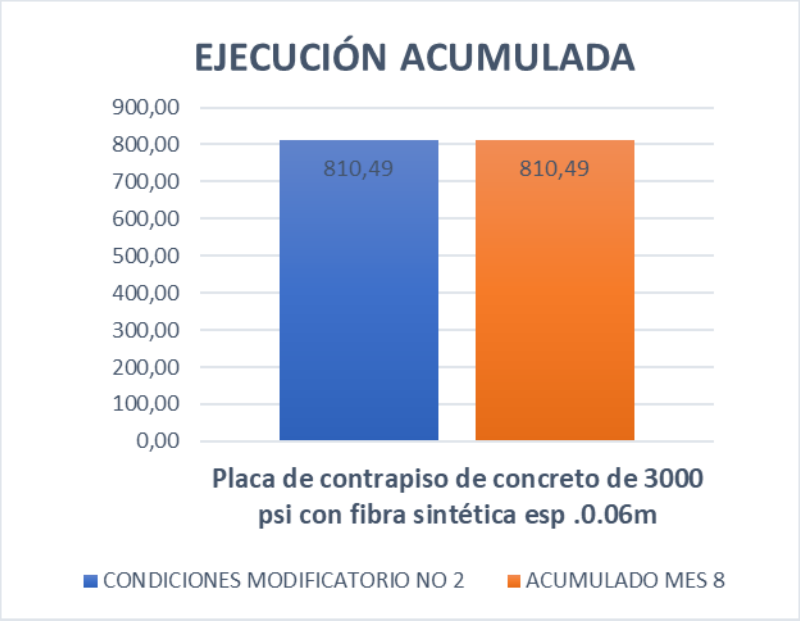

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.7. CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN Y GRADERÍAS.

DESCRIPCIÓN

Siguiendo la instalación del acero de refuerzo proveniente de la cimentación y complementando el refuerzo transversal de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos, se procede a realizar la fundida de los muros de contención de los diferentes sectores, teniendo en cuenta la variación de alturas. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	M3	109,07	$ 946.551,00	$ 103.240.318,00	109,07	$ 103.240.318,00	0,00	$ 0,00

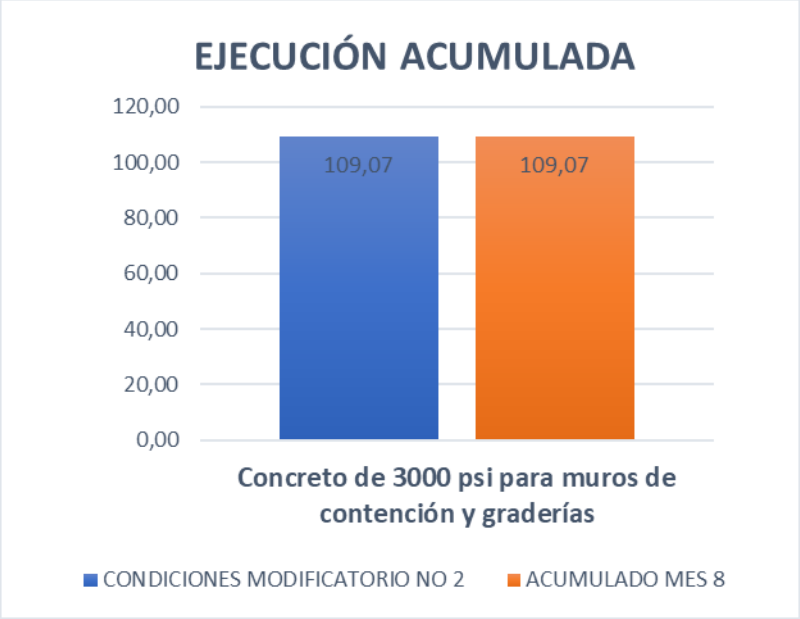

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.8. CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACAS DE GRADERÍAS Y CUBIERTA CUARTO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

Luego de fundida la cimentación y muros de estructura para la escalera en la zona de plazoleta, el armado del acero de refuerzo correspondiente, se realiza la fundida de concreto de 3000 psi para las placas a diferentes alturas, las cuales funcionara con asientos de graderías de espectadores. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativa vigente corroborando el correcto vaciado de concreto. El contratista de obra tomo muestras de concreto para corroborar su resistencia.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	M3	7,95	$ 741.478,00	$ 5.894.750,00	7,95	$ 5.894.750,00	0,00	$ 0,00

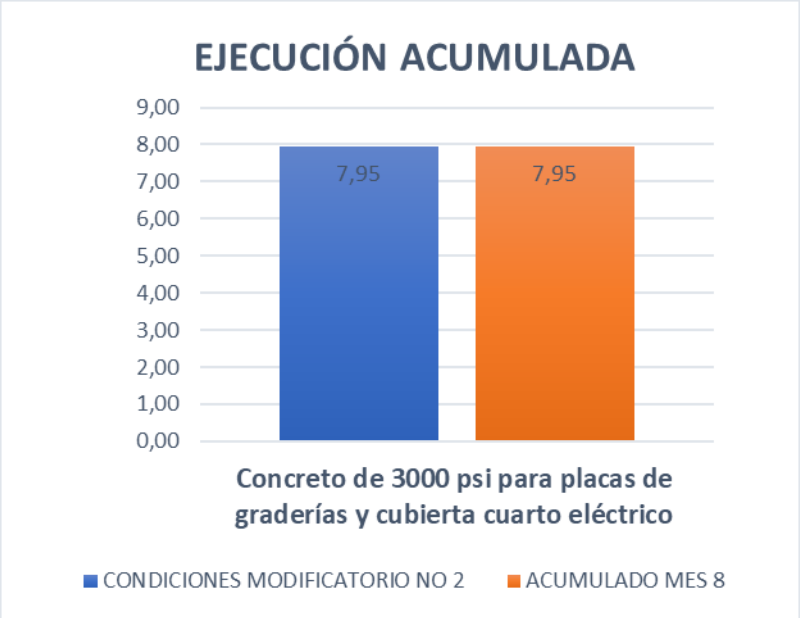

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.9. CONCRETO DE 3000 PSI PARA DETALLES DE ZONAS DE JUEGOS

DESCRIPCIÓN

Para la presente actividad se realizaron trabajos de fundida de elementos en concreto de la zona de juegos del parque Skate Park, en zonas de rampas y demás de acuerdo a los planos y diseños presentados con el fin de llevar a cabo la práctica del deporte del skateboarding.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos	M3	5,97	$ 946.551,00	$ 5.652.659,00	5,97	$ 5.652.659,00	0,00	$ 0,00

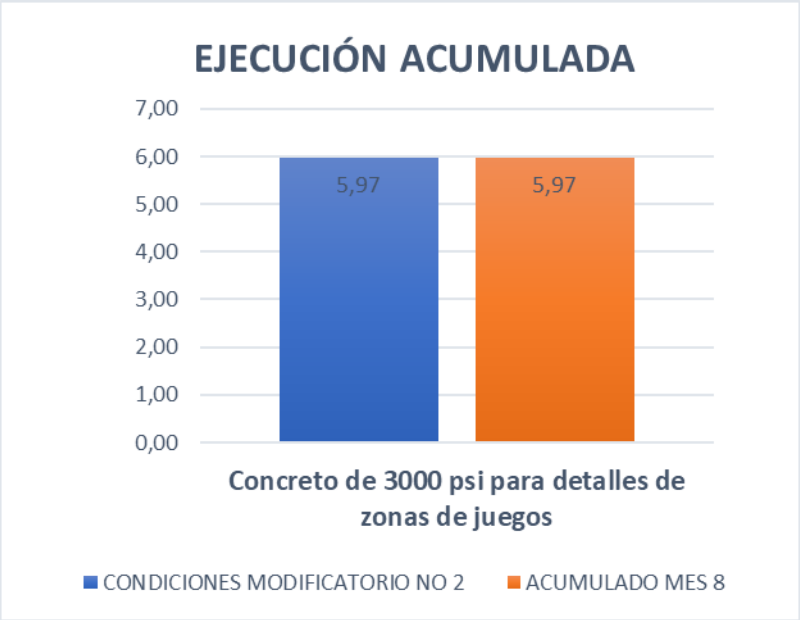

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.11. ACERO DE REFUERZO.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a los trabajos de armado de estructuras en acero para refuerzo de zapatas de cimentación, muros de contención y diferentes elementos requeridos. El acero se figuró, armo e instaló de acuerdo a los planos entregados, respetando traslapos, espesores y longitudes de los diferentes elementos estructurales de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Acero de refuerzo	KG	16755,42	$14.316,00	$ 239.870.593,00	16755,42	$ 239.870.593,00	0,00	$ 0,00

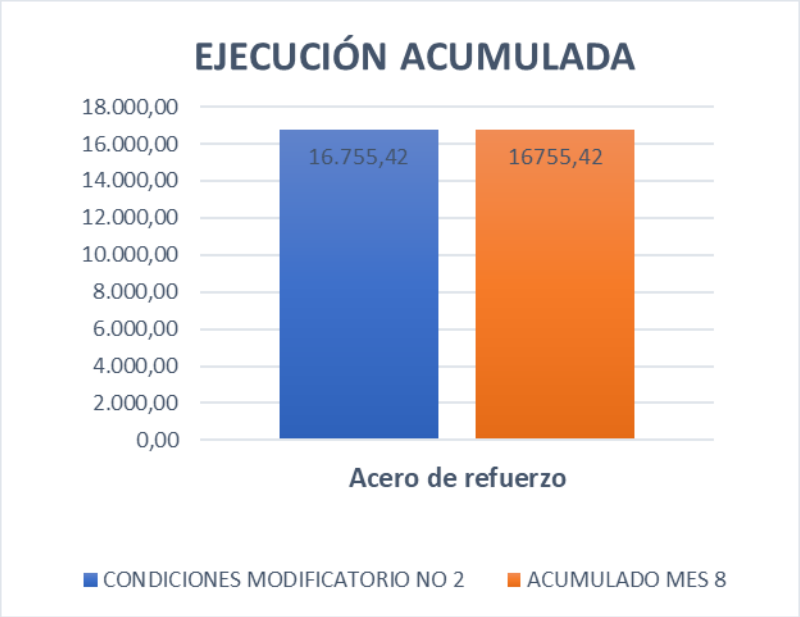

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.12. IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA TIPO CRL1


DESCRIPCIÓN

Una vez realizada la extendida de base granular en las zonas determinadas para el proyecto, con la respectiva compactación y nivelación de la misma, se procede a aplicar la imprimación con emulsión asfáltica de acuerdo a las especificaciones técnicas previo a la aplicación del pavimento flexible con el fin de mejorar la adherencia del mismo.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL1	M2	1765,00	$ 7.649,00	$ 13.500.485,00	1765,00	$ 13.500.485,00	0,00	$ 0,00



Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

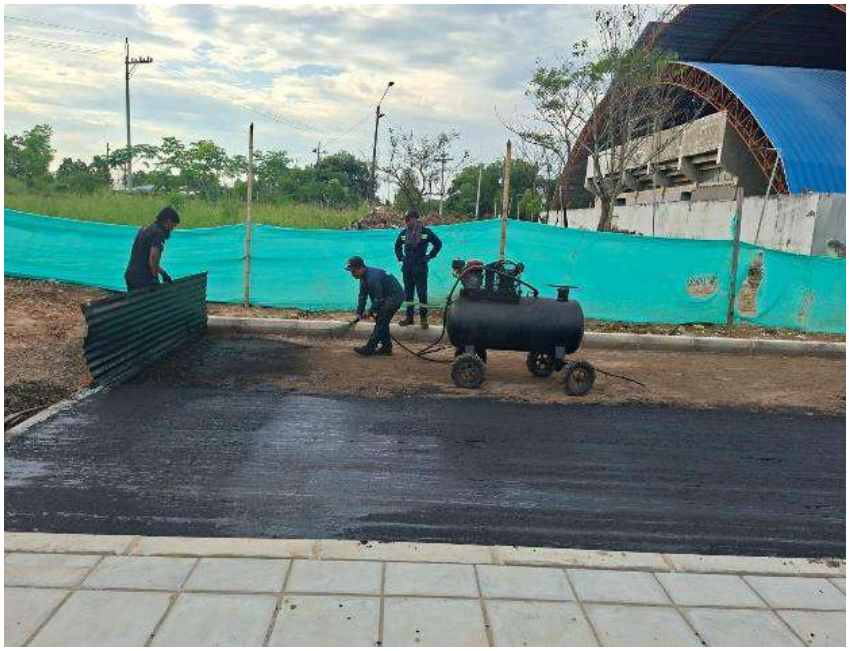


3.13. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19.

DESCRIPCIÓN

Para la presente actividad posteriormente a la nivelación y compactación de base granular y de la aplicación de imprimante asfaltico, se realiza el extendido de mezcla

asfáltica en las zonas determinadas como lo son parqueaderos y vía principal la cual se realiza con los equipos adecuadas y siguiendo las especificaciones técnicas, verificando la correcta temperatura y sellado de la misma.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.	M2	176,50	$ 1.675.876	$ 295.792.114,00	176,50	$ 295.792.114,00	$ 0,00	$ 0,00

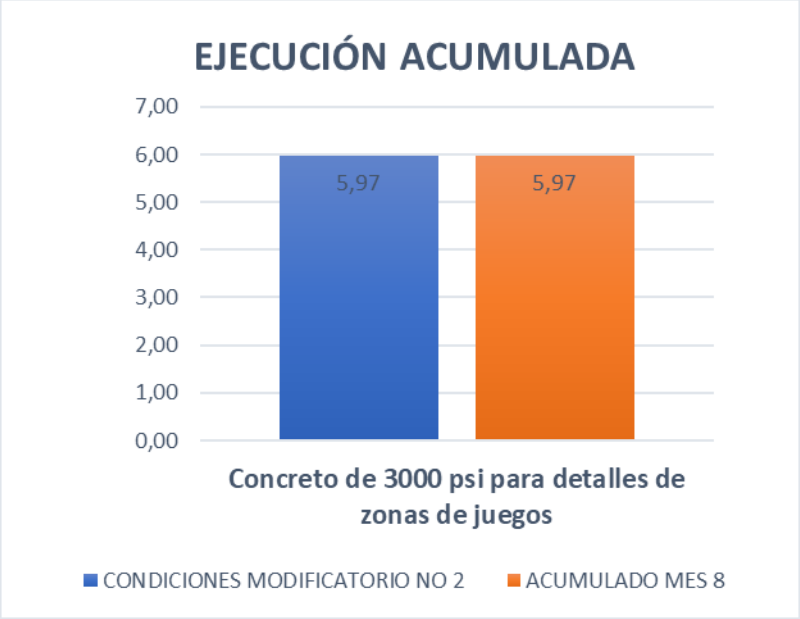

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.14. SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE 0 A 6MM

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a los trabajos de sellado de juntas de dilatación con productos especializados, los cuales funcionan con el fin de que el concreto tenga un mejor comportamiento a los cambios de temperatura y/o a elementos externos.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	KG	1541,21	$ 24.614,00	$ 37.935.343,00	1541,21	$ 37.935.343,00	0,00	$ 0,00

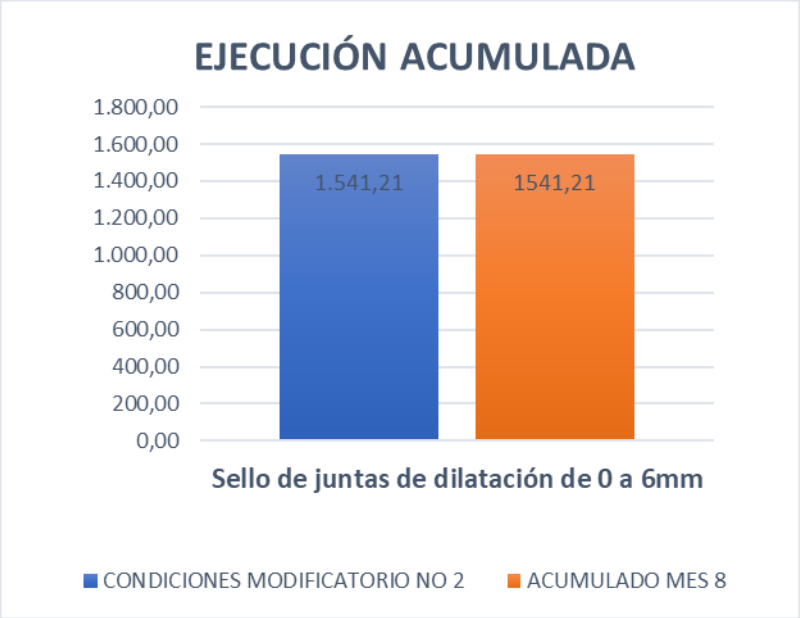

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.15. CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACIÓN GRADERÍAS Y CUARTO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la fundida de elementos de cimentación para la estructura de graderías, los cuales cumplen la función de vigas de amarre para de esta manera garantizar la resistencia y correcto comportamiento de los mismos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativa vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	M3	2,99	$ 206.849,00	$ 618.479,00	2,99	$ 618.479,00	0,00	$ 0,00

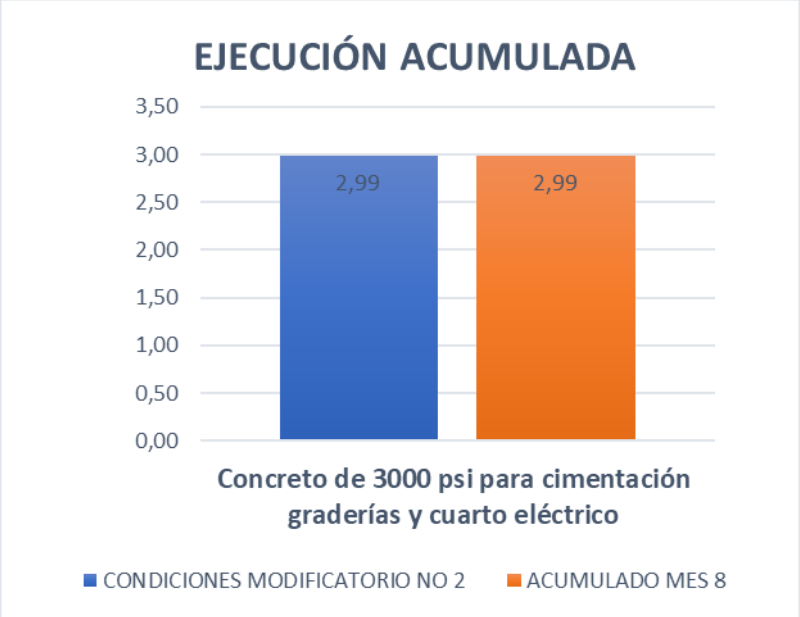

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.16. CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y COLUMNAS CUARTO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la fundida de elementos de la estructura de cuarto electrico, los cuales cumplen la función de soportar la misma y el correcto comportamiento de los mismos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativa vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico	M3	0,57	$ 903.490,00	$ 516.345,00	0,57	$ 516.345,00	0,00	$ 0,00

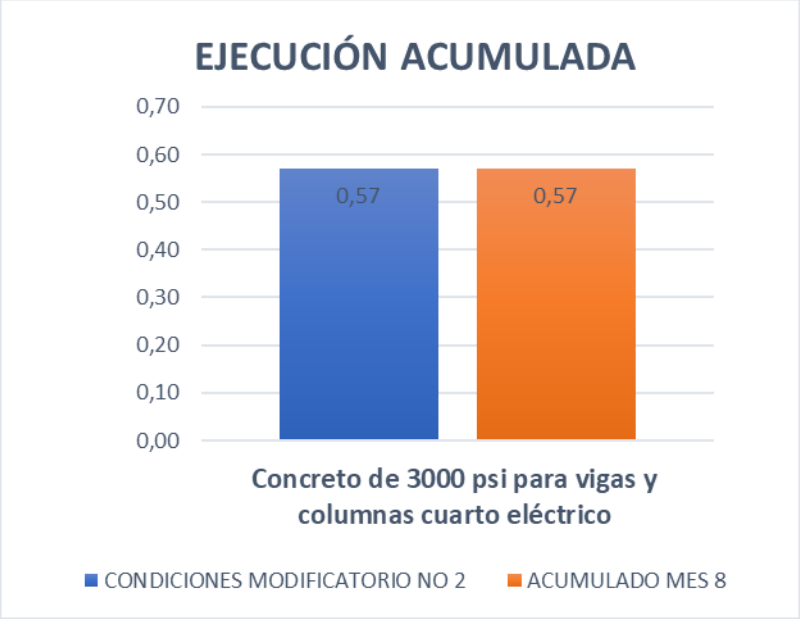

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO PARA CUBIERTAS DE CONTAINER

DESCRIPCIÓN

Se suministró e instaló la estructura metálica en las zonas frontal y posterior de los contenedores adaptados para uso comercial, anclada sobre el nivel de cubierta mediante soldadura, garantizando rapidez, seguridad y modularidad en su montaje. Estas estructuras sirven como soporte para las cubiertas en volado, sobre las cuales se colocarán láminas de policarbonato, proporcionando protección solar y contra la lluvia. El cumplimiento de los requisitos de calidad se verificó mediante los certificados emitidos por el proveedor.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación acero para cubiertas de container	KG	606,50	$ 105.787,00	$ 64.159.932,00	606,50	$ 64.159.932,00	0,00	$ 0,00

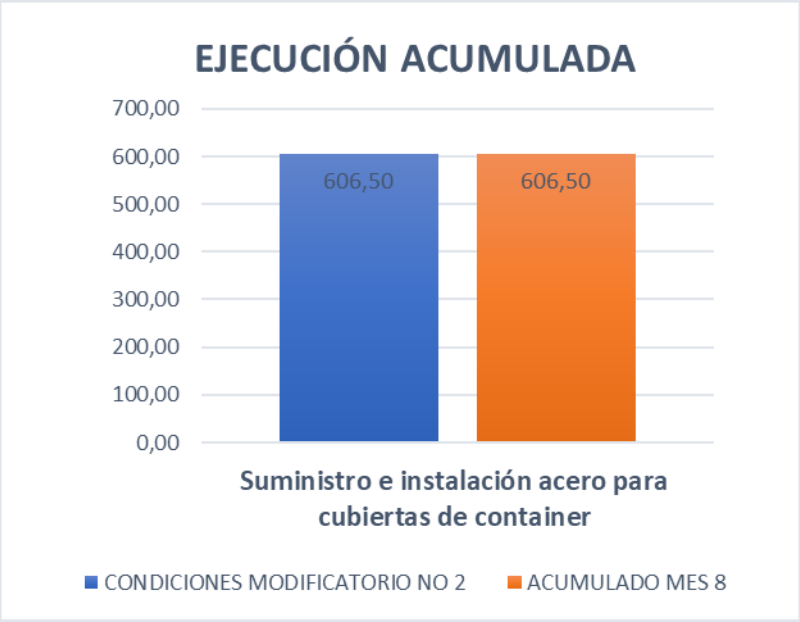


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

3.18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA 0.40 X 0.40 COLOR GRIS

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la instalación de loseta prefabricada de 0.4 x 0.4 sobre mezcla de mortero de pega, en los sectores determinados de acuerdo a los diseños presentados, así como el urbanismo planteado para el proyecto. Se realizó revisión de la correcta instalación de las losetas, respetando brechas que se cumplan de acuerdo a las especificaciones técnicas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	M2	703,80	$ 228.942,00	$ 161.129.380,00	703,80	$ 161.129.380,00	$ 0,00	$ 0,00

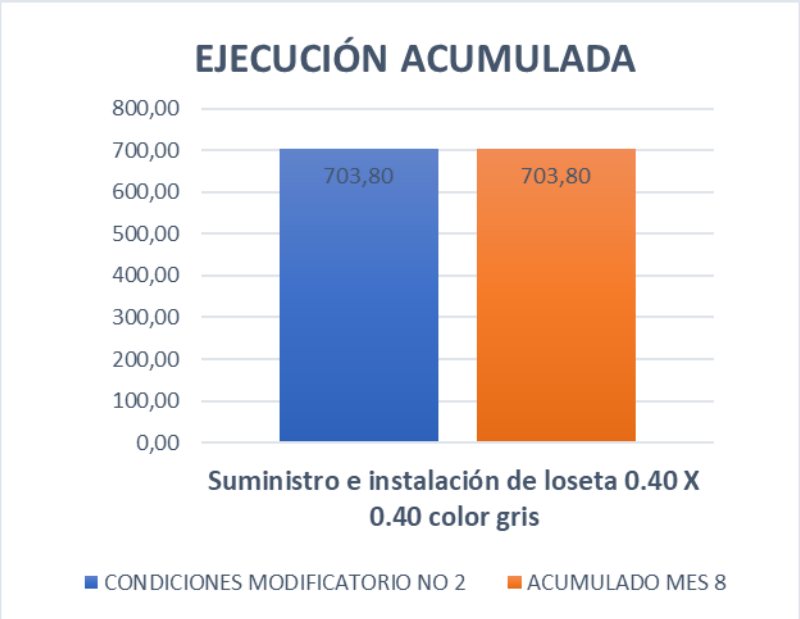

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.19. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PODOTÁCTIL 0.40 X 0.40 COLOR GRIS

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la instalación de loseta prefabricada de 0.4 x 0.4 sobre mezcla de mortero de pega, en los sectores determinados de acuerdo a los diseños presentados,

así como el urbanismo planteado para el proyecto. Se realizó revisión de la correcta instalación de las losetas, respetando brechas que se cumplan de acuerdo a las especificaciones técnicas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	ML	147,75	$ 247.777,00	$ 36.609.052,00	147,75	$ 36.609.052,00	$ 0,00	$ 0,00

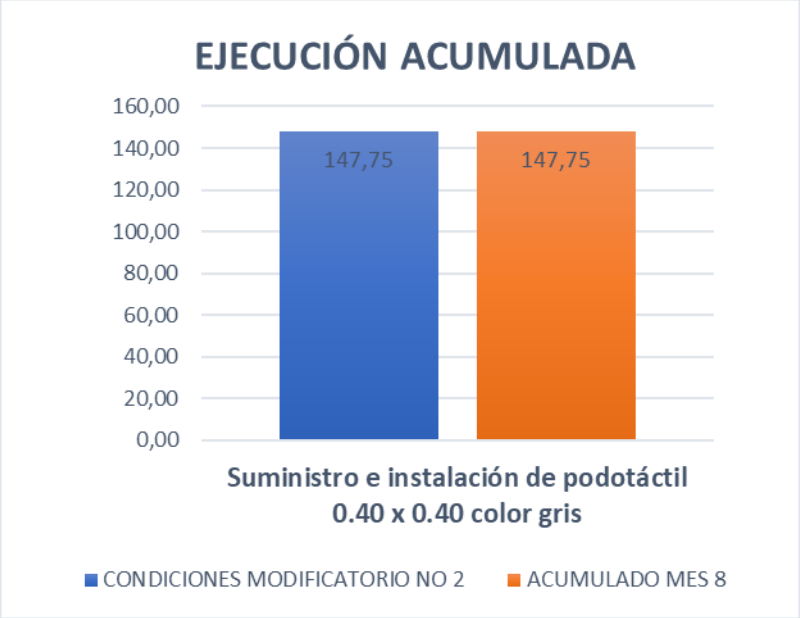

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.20. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS Y PEDESTALES CIMENTACIÓN PÓRTICO, MÁSTILES DE ILUMINACIÓN Y SOPORTES CONTENEDOR

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a la fundida de elementos de cimentación para la estructura donde descansaran los contenedores en la zona de entrada principal del proyecto. Esta actividad se realizó siguiendo las especificaciones técnicas y detalles presentados en los diseños.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	M3	4,91	$ 876.731,00	$ 4.304.749,00	4,91	$ 4.304.749,00	0,00	$ 0,00

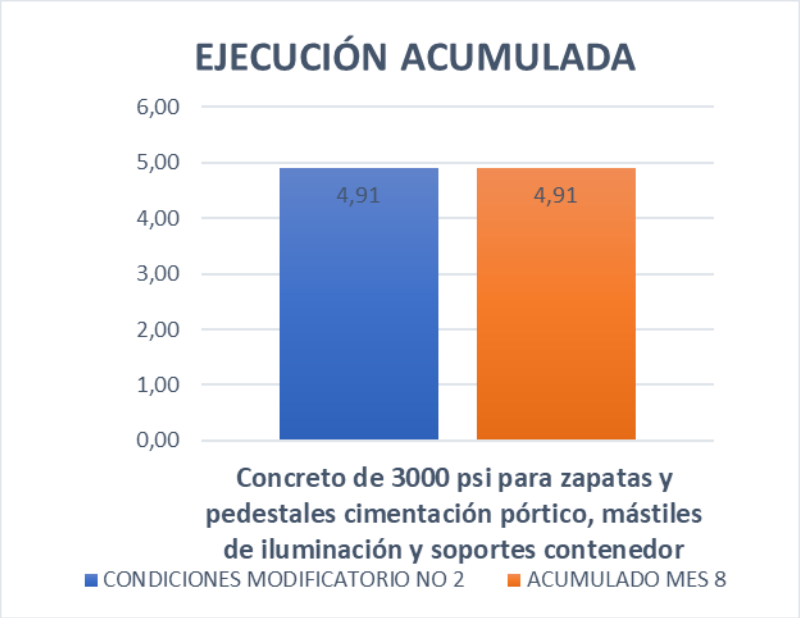

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




4.1. MAMPOSTERIA EN LADRILLO DE ARCILLA A LA VISTA (INSTALACIÓN HORIZONTAL)

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se contempla la instalación de mampostería en ladrillo para el cuarto eléctrico, siguiendo los diseños presentados inicialmente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Mampostería en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)	M2	28,70	$ 136.357,00	$ 3.913.446,00	28,70	$ 3.913.446,00	0,00	$ 0,00

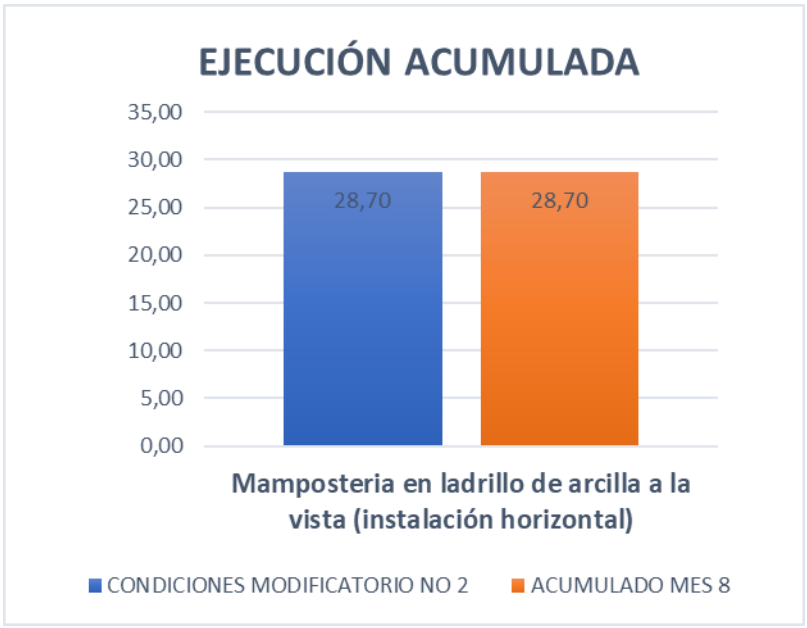

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




4.2. FRISO PARA MUROS IMPERMEABILIZADO INCLUYE DILATACIONES Y FILOS

DESCRIPCIÓN

Se realizó la ejecución del friso para muros impermeabilizado, cuidando la correcta aplicación de la mezcla para garantizar una superficie uniforme y resistente a la humedad. La actividad incluyó la formación de dilataciones y filos, asegurando una adecuada continuidad en los encuentros y esquinas, con el fin de evitar fisuras y permitir el correcto comportamiento estructural del recubrimiento. Se verificó la correcta adherencia del material y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos	M3	62,62	$ 35.979,00	$ 2.253.005,00	62,62	$ 2.253.005,00	$ 0,00	$ 0,00

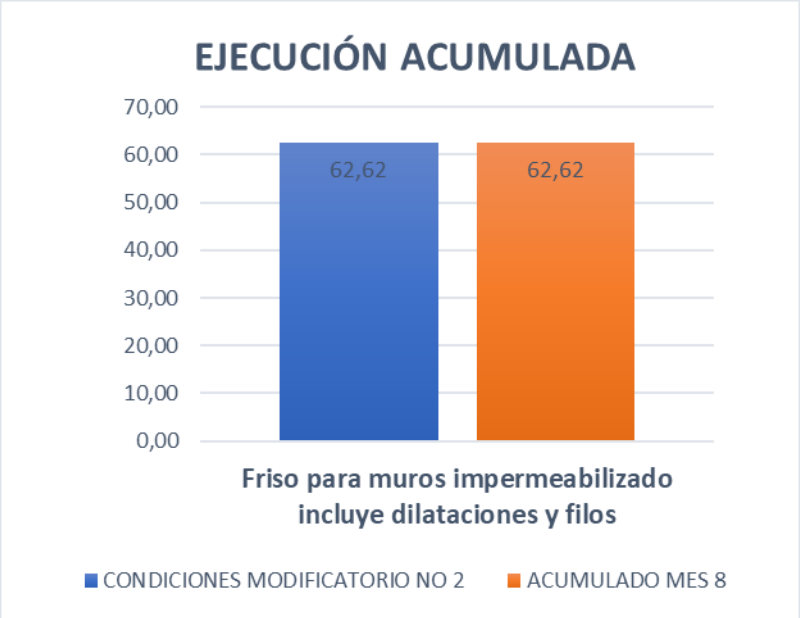

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




4.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3

DESCRIPCIÓN

Se realizó el suministro e instalación de mampostería estructural, utilizando unidades de bloque conforme a las especificaciones del proyecto. La ejecución incluyó el refuerzo vertical garantizando la correcta alineación y nivelación de los muros. Se cuidó la adecuada colocación del mortero, el relleno de juntas y el cumplimiento de las tolerancias

constructivas, asegurando la resistencia y estabilidad estructural del sistema de mampostería.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de mamposteria estructural con refuerzo vertical cada ,20cm con refuerzo numero 3 y horizontal cada ,40 con refuerzo n3	M3	38,46	$ 144.234,00	$ 5.547.240,00	38,46	$ 5.547.240,00	0,00	$ 0,00

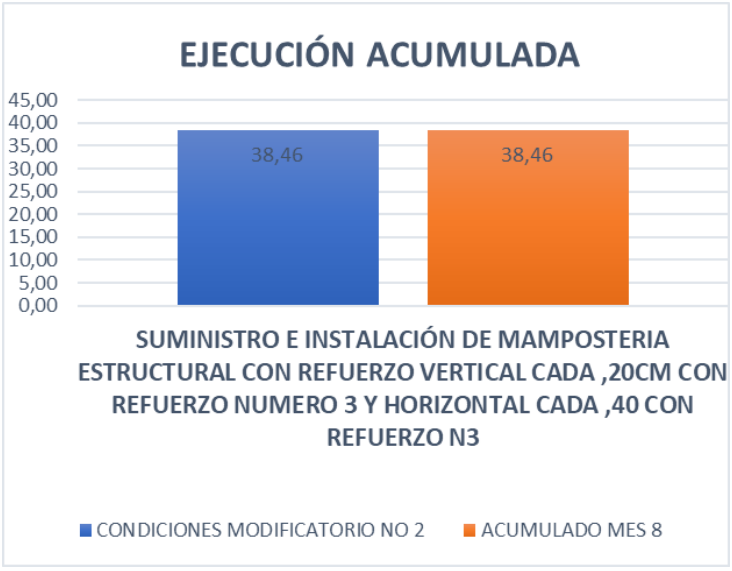

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO 12 M 1050 KGF.

DESCRIPCIÓN

Para garantizar el suministro eléctrico del proyecto, se instaló un transformador de 15 kVA conectado a la red de media tensión existente. Como parte de esta intervención, se retiró la red ACSR, su estructura terminal y el poste actual en el área de conexión, con el fin de liberar espacio para la instalación de un nuevo poste de concreto de 12 m destinado a soportar el transformador y los sistemas eléctricos, cumpliendo con la normativa técnica vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.	UND	1,00	$ 5.229.244	$ 5.229.244,00	1,00	$ 5.229.244,00	0,00	$ 0,00

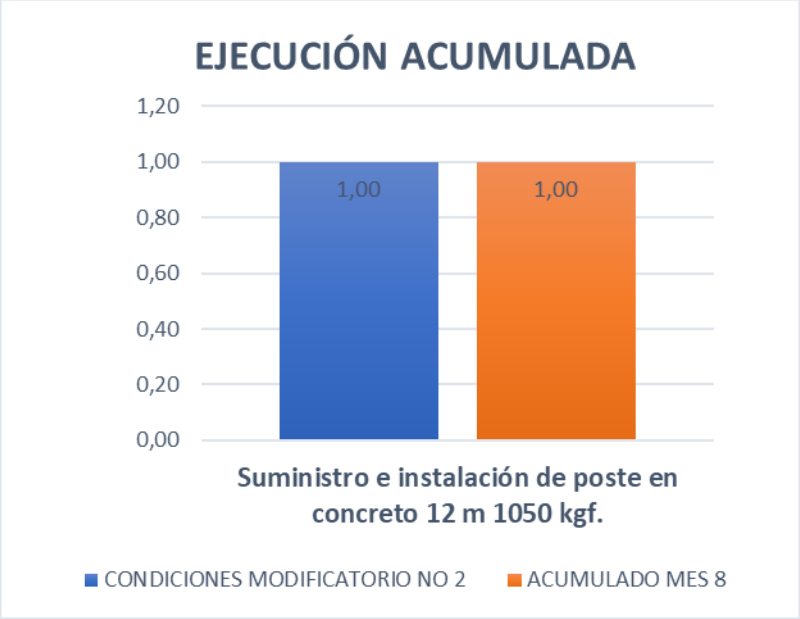

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.1.3. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE, INCLUYE CAJAS CORTACIRCUITOS, DPS, HERRAJES, AISLADORES, GRAPAS, CRUCETAS Y TUBERÍA).

DESCRIPCIÓN

Tras la instalación del poste de concreto, se ejecutó la estructura de arranque, punto inicial del sistema eléctrico aéreo del skatepark, asegurando la transición segura entre la red de media tensión y la instalación interna del proyecto. Como parte de esta etapa, se instalaron cajas cortacircuitos (para protección contra sobrecargas y fallas), herrajes aisladores, grapas y crucetas (para soporte y fijación mecánica de conductores), y la tubería de protección correspondiente, garantizando el aislamiento, la seguridad y la integridad del tendido eléctrico conforme al diseño y normativa vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería).	UND	1,00	$ 13.469.378	$ 13.469.378,00	1,00	$ 13.469.378,00	0,00	$ 0,00

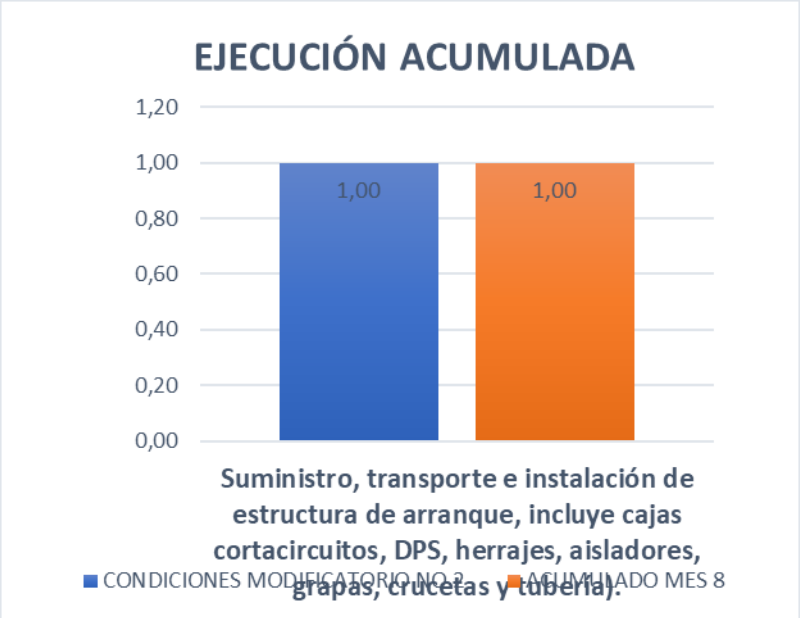

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.1.5. BAJANTE IMC DE 3"

DESCRIPCIÓN

Con el poste izado y el transformador instalado en su corona, se procedió a la colocación del bajante en tubería IMC de 3”, destinado a proteger exteriormente el cableado que conectará el transformador con la red subterránea del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Bajante imc de 3"	UND	1,00	$ 13.469.378	$ 13.469.378,00	1,00	$ 13.469.378,00	0,00	$ 0,00

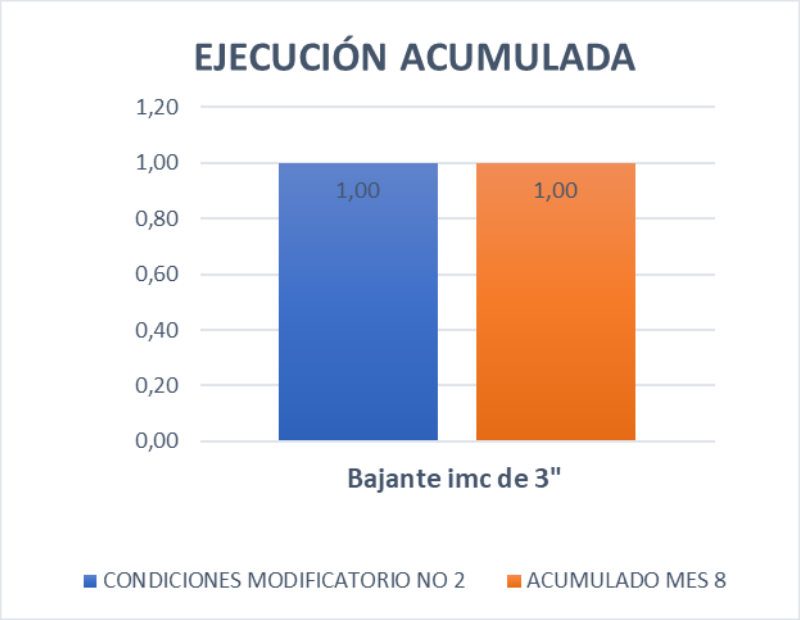

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.1.6. CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 M; EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN MARCO METALICO FUNDIDA EN CONCRETO (INCLUYE HIERRO)

DESCRIPCIÓN

Tras la instalación de la estructura de arranque, se construyó una caja de registro en mampostería, destinada al acceso, inspección, conexión y mantenimiento de la red eléctrica subterránea. Está equipada con una tapa metálica embebida en concreto reforzado con

acero, asegurando resistencia al tránsito peatonal, durabilidad, funcionalidad y acabado estético acorde con el entorno del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mampostería con tapa en marco metálico fundida en concreto (incluye hierro)	UND	1,00	$ 2.484.532	$ 2.484.532,00	1,00	$ 2.484.532,00	0,00	$ 0,00

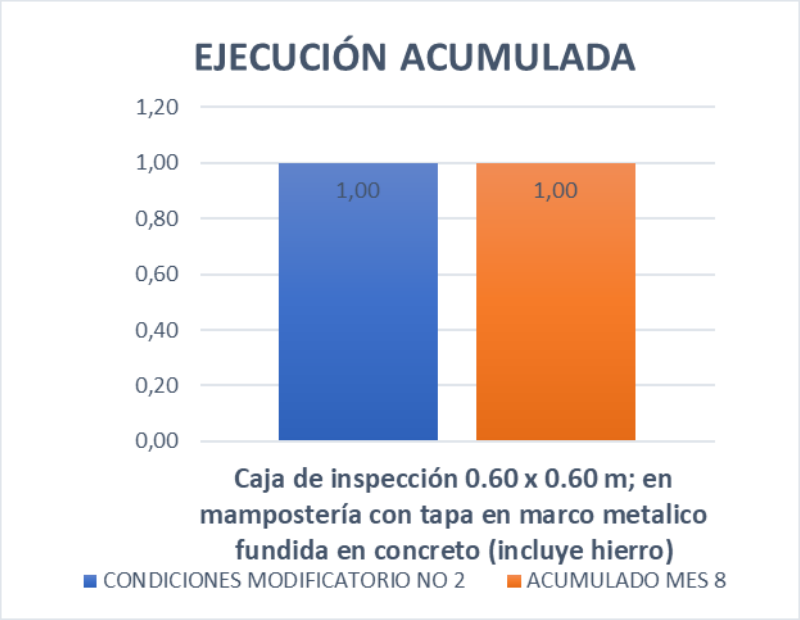

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.1.8. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA 3 DUCTOS PVC 3" . INCLUYE ACCESORIOS, TERMINALES, CURVAS, SOLDADURA PVC, EXCAVACIÓN, BOTADA DE ESCOMBROS, ARENILLA Y COMPACTACIÓN.

DESCRIPCIÓN

Se ejecutó el suministro y colocación del banco de ductos para la red eléctrica principal, compuesto por tres tubos PVC de 3”, destinados a la protección y conducción de los conductores subterráneos. La actividad incluyó excavación de zanja, instalación de accesorios (curvas, terminales), soldadura de uniones, retiro de escombros y compactación final del terreno, asegurando alineación, nivelación, pendiente y protección mecánica conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.	ML	30,00	$ 142.430,00	$ 4.272.900,00	30,00	$ 4.272.900,00	0,00	$ 0,00

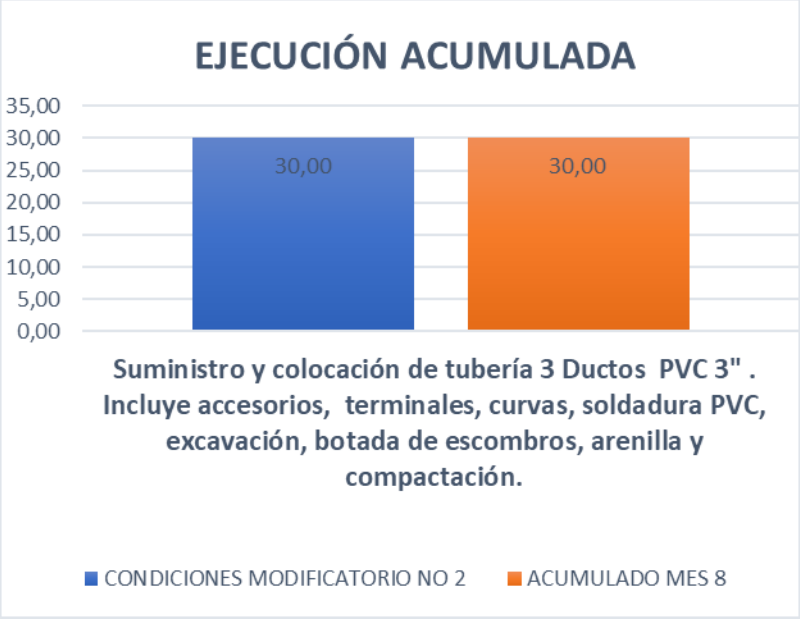


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



5.3.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" DB

Se instaló la tubería PVC de 2” para conformar los ductos subterráneos de interconexión entre cajas eléctricas, destinados a la protección y conducción del cableado hacia los puntos de derivación (luminarias, contenedores, etc.). La actividad comprendió suministro, excavación, tendido, uniones soldadas, colocación de accesorios (curvas, terminales), sellado y verificación de alineación y pendiente, cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normativa RETIE vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubería PVC de 2" DB	ML	70,00	$ 81.870,00	$ 4.272.900,00	70,00	$ 4.272.900,00	0,00	$ 0,00

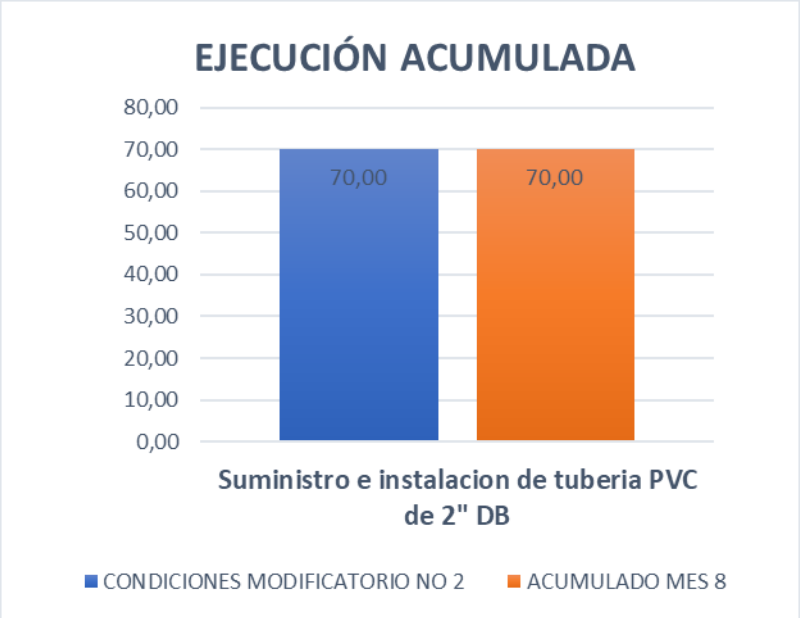


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

5.3.2. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA BAJA TENSIÓN, MEDIDAS 0,6*0,6*0,82 MARCO METÁLICO Y TAPA EN CONCRETO.

Posterior a las excavaciones, se construyó una caja de inspección para redes de baja tensión (0.60 × 0.60 × 0.82 m), ejecutada en mampostería, con marco metálico y tapa en concreto reforzado. Su función es facilitar el registro, empalme y mantenimiento de las redes subterráneas, asegurando resistencia mecánica, durabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa RETIE.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	UND	5,00	$ 2.484.532	$ 12.422.660,00	5,00	$ 12.422.660,00	0,00	$ 0,00

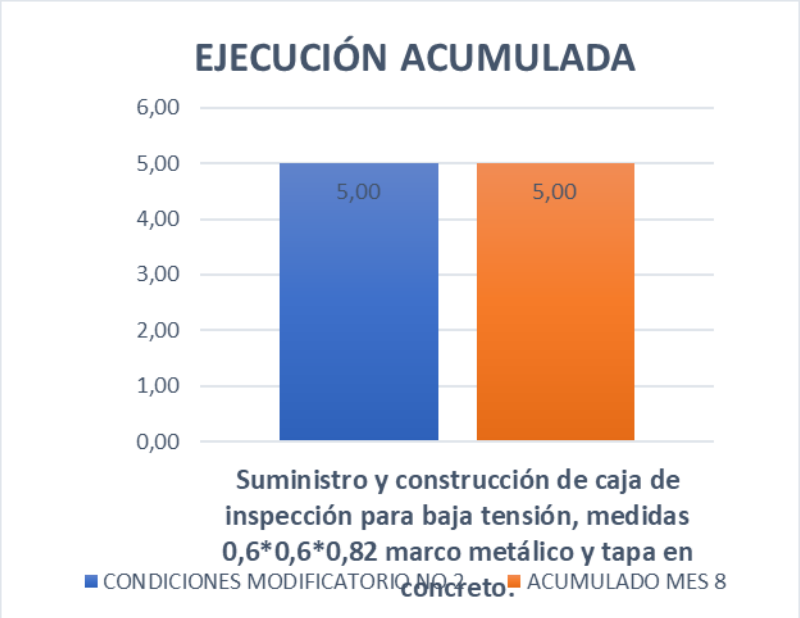

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.3.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 12 CTOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y CERRADURA.

Durante el presente periodo se efectuó la instalación de tablero de fuerza trifásico de 24 circuitos, el cual cumple la función de dispositivo de control y protección específica para la carga de potencia. Su propósito principal es permitir la segmentación del suministro eléctrico hacia los equipos motores, facilitando la operación segura, el mantenimiento preventivo y la respuesta ante fallas operativas. Asimismo, el interruptor principal

proporciona protección integral frente a sobrecorrientes y desbalances de fase, evitando daños en los cableados, maquinarias y dispositivos conectados a la red de fuerza. Al centralizar la gestión de la energía de potencia, garantiza una distribución equilibrada y segura, minimizando riesgos eléctricos y asegurando la estabilidad operativa de la instalación.

La incorporación del interruptor principal, en conjunto con la puerta con cerradura del gabinete, permite restringir el acceso a personal no autorizado, fortaleciendo las condiciones de seguridad industrial y el cumplimiento de los estándares técnicos aplicables a instalaciones de fuerza en cada una de las áreas del proyecto, esta actividad se ejecutó en su totalidad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 ctos. con espacio para totalizador, puerta y cerradura.	UND	2,00	$ 1.446.030	$ 2.892.060,00	2,00	$ 2.892.060,00	$ 0,00	$ 0,00

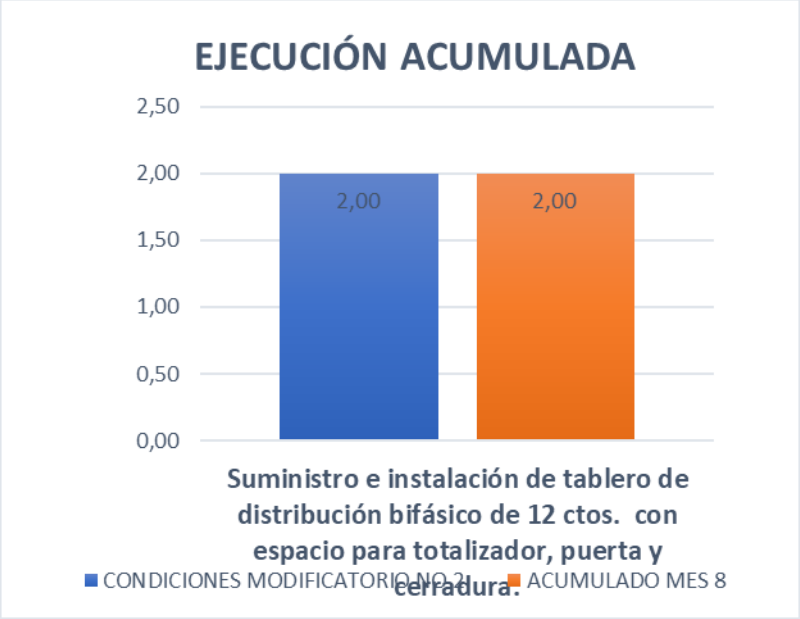


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



5.3.5. Suministro e instalación de salida de iluminación a 120 V en tubería EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metálica, accesorios EMT y de fijación.

La actividad comprendió la instalación de salidas de fuerza a 120 voltios para tomacorrientes de los contenedores del proyecto, mediante el uso de tubería conduit metálica, garantizando una canalización protegida y normada del cableado eléctrico. Previamente, se efectuó el replanteo y acondicionamiento de los puntos de instalación acorde a los planos eléctricos y las especificaciones técnicas establecidas. La ejecución incluyó el suministro, ensamblaje y anclaje de la tubería, así como el jalado y conexión de los conductores, asegurando continuidad, correcta fijación y protección mecánica del sistema. Las conexiones se realizaron cumpliendo con los protocolos de seguridad eléctrica y la normativa vigente, garantizando el adecuado funcionamiento de las salidas de fuerza. Se dejaron los tomacorrientes en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y confiabilidad para su uso en los contenedores del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metalica, accesorios EMT y de fijación.	UND	31,00	$ 624.337,00	$ 19.354.447,00	31,00	$ 19.354.447,00	$ 0,00	$ 0,00

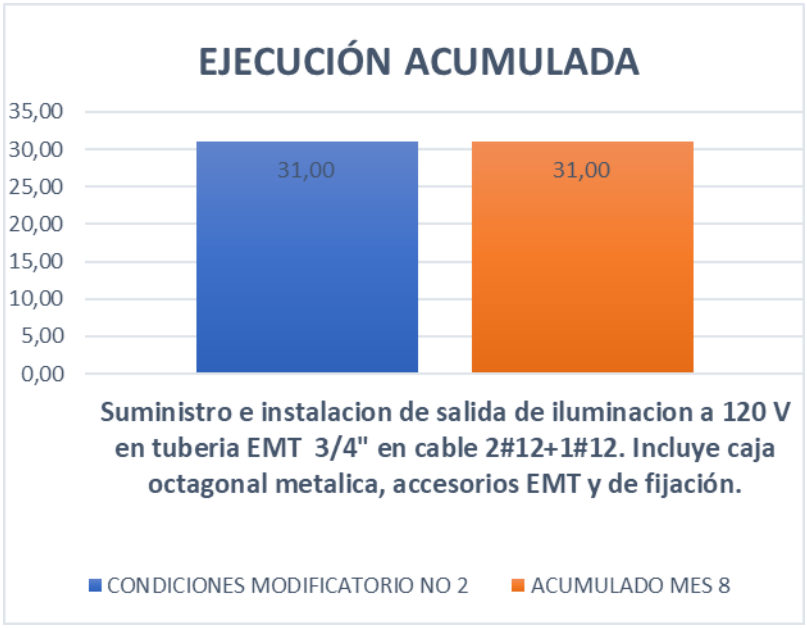

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.3.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR DE 24/18W

La actividad consistió en el suministro e instalación de luminarias tipo panel LED circular de 24/18 W, optimizando los niveles de iluminación en los espacios interiores. Se realizó el montaje físico de los equipos en las ubicaciones establecidas según los planos de diseño, asegurando una fijación mecánica adecuada y una distribución uniforme de la luz.

Posteriormente, se efectuaron las conexiones eléctricas correspondientes, respetando la polaridad, la sección de los conductores y los criterios de seguridad establecidos en la normativa vigente. Se verificó el correcto funcionamiento de cada unidad mediante pruebas de encendido.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel Circular De 24/18w	UND	25,00	$ 117.471,00	$ 2.936.775,00	25,00	$ 2.936.775,00	$ 0,00	$ 0,00

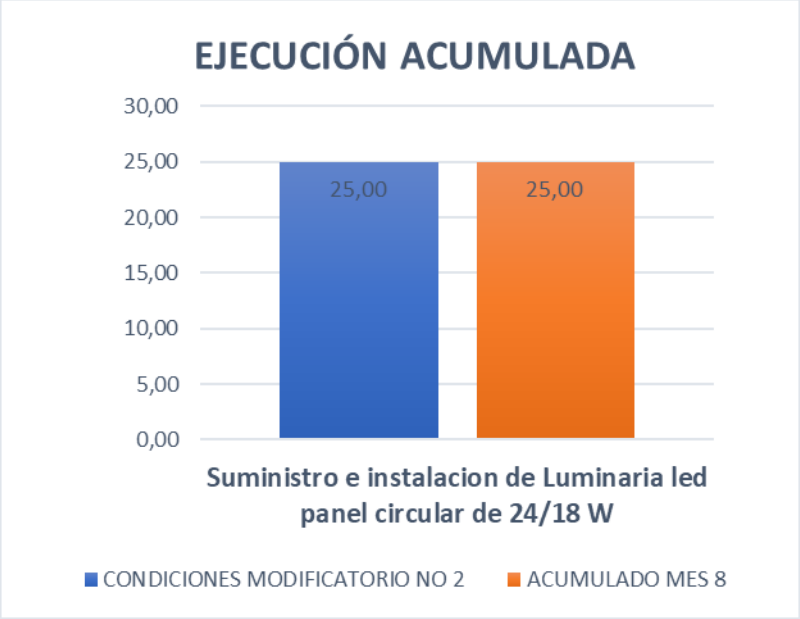


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



5.3.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO.

La actividad consistió en el suministro e instalación de interruptor sencillo, destinado al control individual de los puntos de iluminación en los contenedores del proyecto. Previamente, se realizó la verificación de las cajas de salida eléctrica, asegurando su correcta ubicación, nivelación y fijación conforme a los planos eléctricos y especificaciones técnicas establecidas

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de interruptor sencillo.	UND	3,00	$ 115.938,00	$ 347.814,00	3,00	$ 347.814,00	$ 0,00	$ 0,00

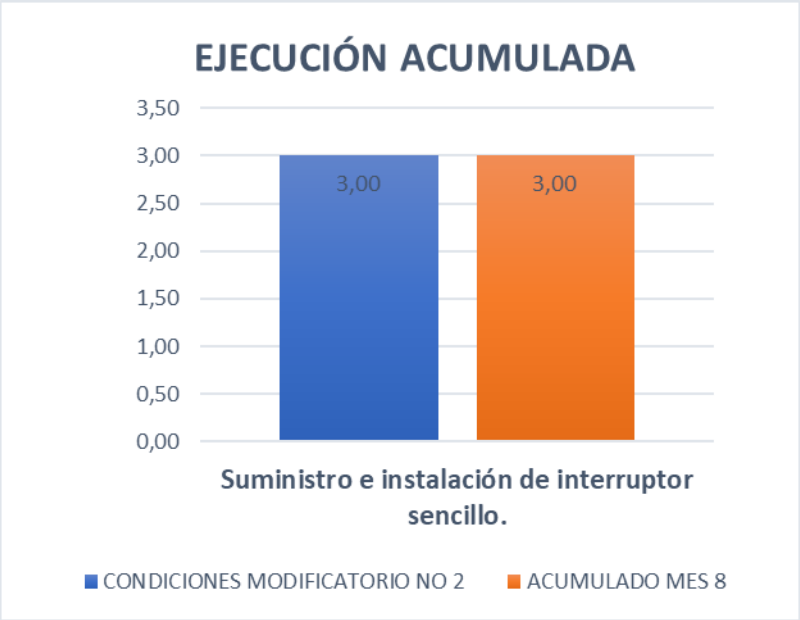


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




5.3.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR INFRARROJO.

La actividad consistió en el suministro e instalación de sensor infrarrojo de presencia para el control automático de los circuitos de iluminación en los contenedores del proyecto. Previamente, se realizó la verificación de la ubicación estratégica del dispositivo conforme a los planos eléctricos y especificaciones técnicas, asegurando un campo de detección óptimo y libre de obstrucciones.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación sensor infrarrojo..	UND	3,00	$ 157.436,00	$ 472.308,00	3,00	$ 472.308,00	$ 0,00	$ 0,00

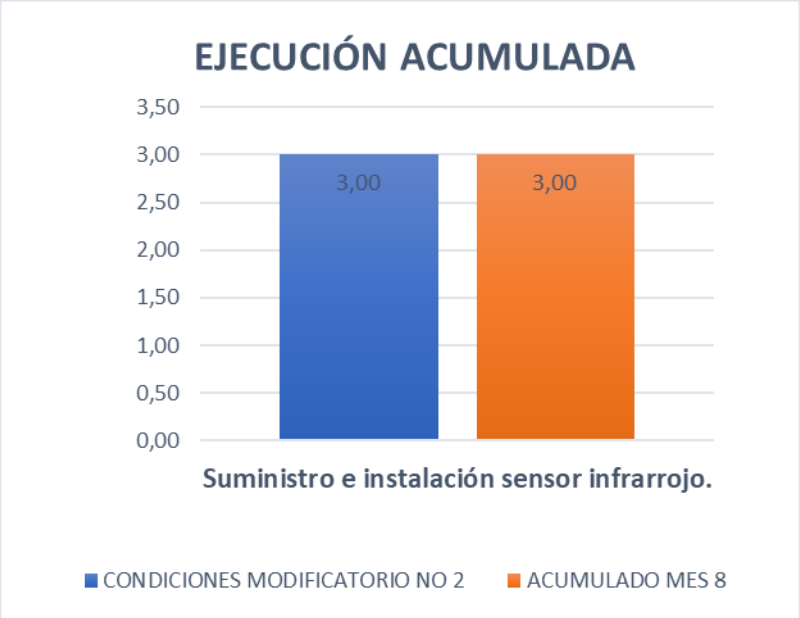

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

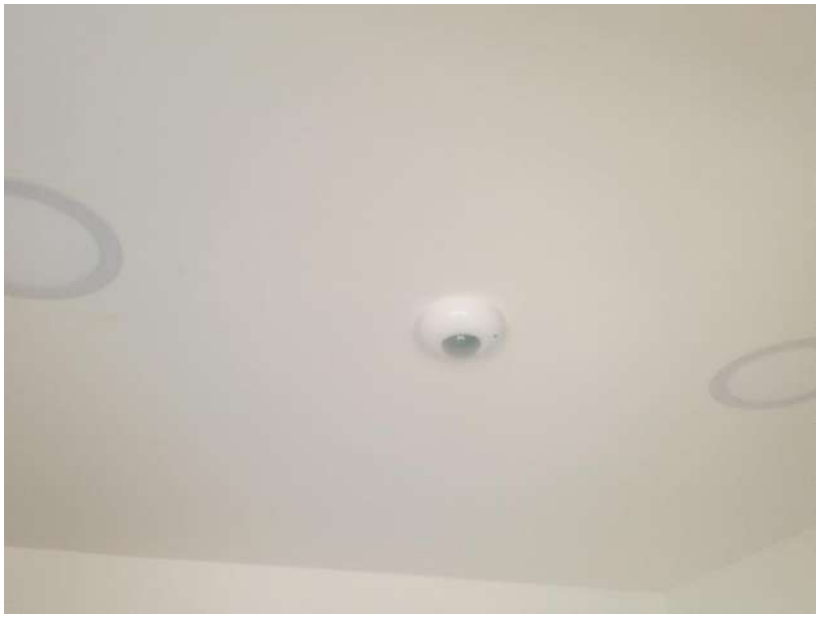


5.3.9. Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".

La actividad consistió en el suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica de 220 Volts, sistema normal, destinada a la alimentación de equipos de potencia en los contenedores del proyecto. Previamente, se realizó la verificación de la ubicación del punto

de instalación conforme a los planos eléctricos y especificaciones técnicas, asegurando la accesibilidad operativa y el cumplimiento de las distancias reglamentarias

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".	UND	3,00	$ 722.712,00	$ 2.168.136,00	3,00	$ 2.168.136,00	$ 0,00	$ 0,00

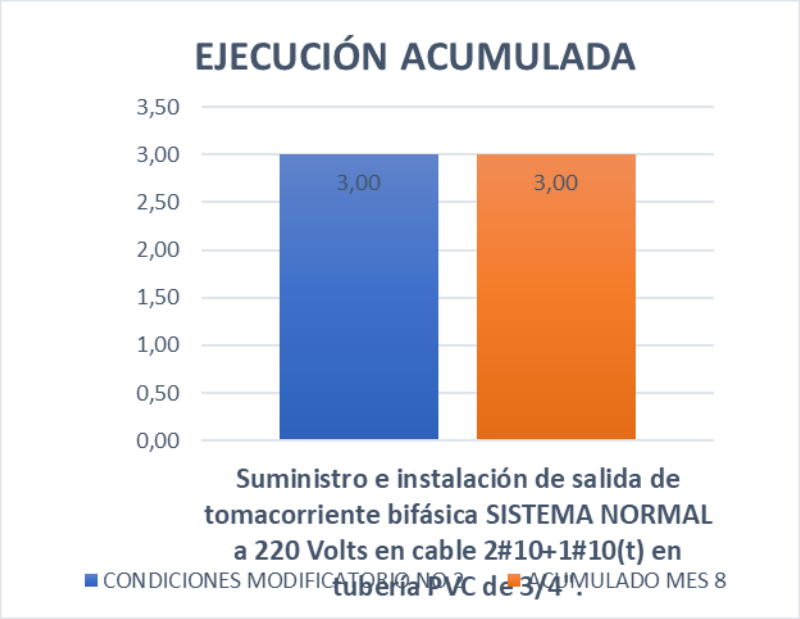


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



5.3.10. Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tubería PVC de 3/4".

La actividad consistió en el suministro e instalación de salida de tomacorriente monofásica de 120 Volts, sistema normal, destinada a la alimentación de equipos y dispositivos eléctricos de uso general en los contenedores del proyecto. Previamente, se realizó la verificación de la ubicación del punto de instalación conforme a los planos eléctricos y especificaciones técnicas, asegurando la accesibilidad operativa y el cumplimiento de las distancias reglamentarias. La ejecución incluyó el tendido de tubería PVC de 3/4" como medio de canalización protegida para el cableado.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tubería PVC de 3/4".	UND	11,00	$ 561.306,00	$ 2.168.136,00	11,00	$ 6.174.366,00	$ 0,00	$ 0,00

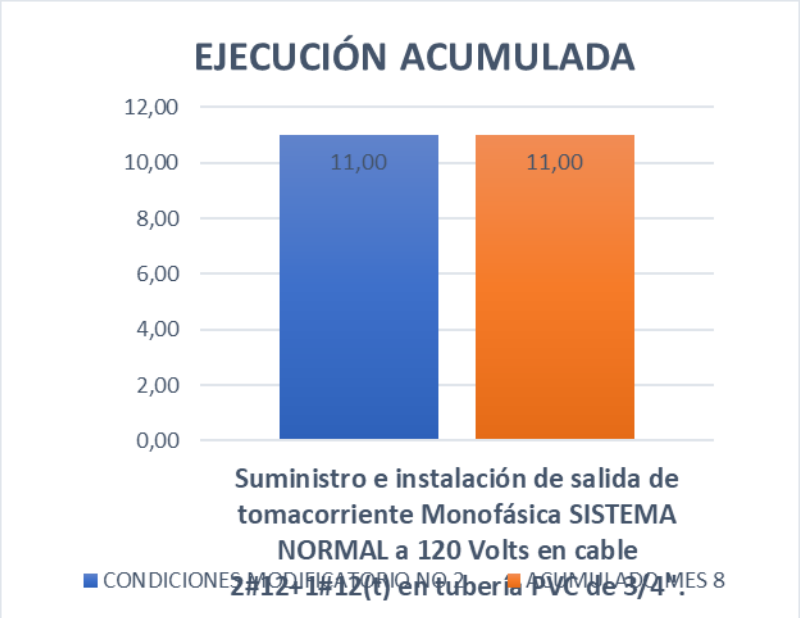

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.1. ESTRUCTURA METÁLICA PARA ACCESO EN TUBERÍA CIRCULAR 4" Y 2" TIPO ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el armado de la estructura metálica principal para el acceso al parque, el cual consta de tubería de 4” y 2” de refuerzos. Por parte de la interventoría se

revisaron los diferentes cordones de soldadura, así como de espesores de tubería que cumplan de acuerdo a las especificaciones técnicas y diseños.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Estructura metálica para acceso en tubería circular 4" y 2" tipo estructural	kg	1640,88	$ 28.999,00	$ 47.583.879,00	1640,88	$ 47.583.879,00	0,00	$ 0,00

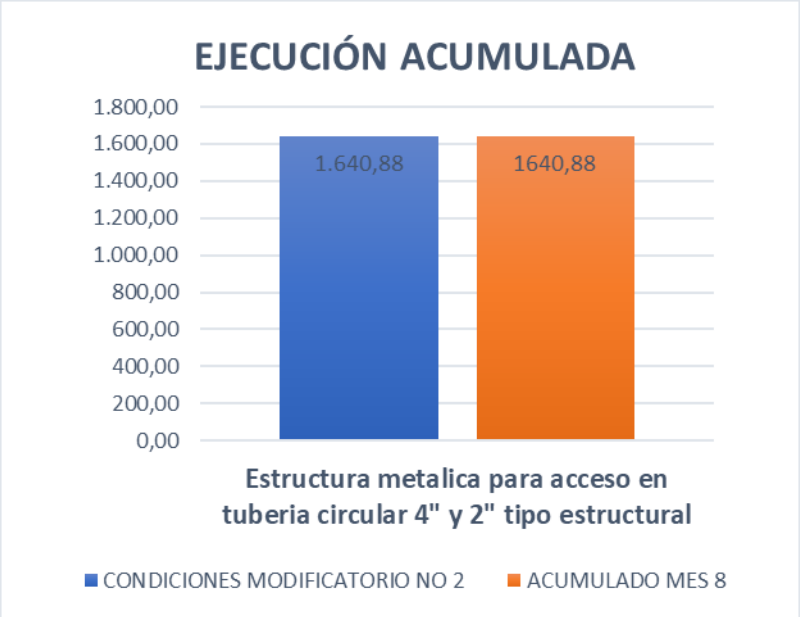

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø2" E= 2.5MM EN SENTIDO VERTICAL Y Ø1 1/2" E= 2.5MM EN SENTIDO HORIZONTAL. (INCLUYE FIJACIONES, PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS)

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende la instalación de pasamanos en tubería de 2” de acuerdo a las especificaciones técnicas, instalándose de acuerdo a los planos y diseños presentados.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de Pasamanos en tubería de acero galvanizado Ø2" E= 2.5mm en sentido vertical y Ø1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)	ML	187,65	$ 466.581,00	$ 87.553.925,00	187,65	$ 87.553.925,00	0,00	$ 0,00

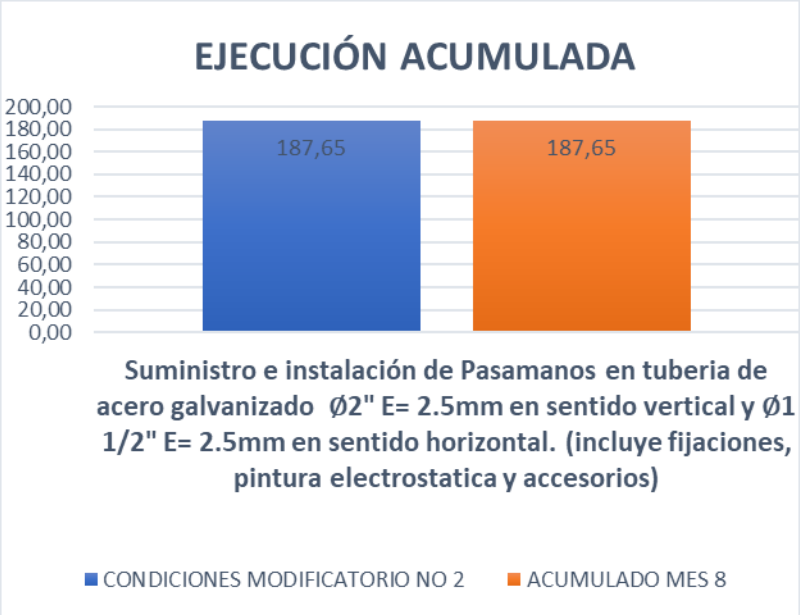

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2" PARA RIELES INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTADO COLOR AMARILLO.

DESCRIPCIÓN

Se efectuó el suministro e instalación de tubo estructural de 2” destinado a la conformación de rieles, conforme a los planos y especificaciones del proyecto. El proceso incluyó el tratamiento de la superficie con recubrimiento anticorrosivo para garantizar la durabilidad del material, seguido del pintado en color amarillo como acabado final. Se verificó la correcta alineación, nivelación y sujeción del tubo, asegurando su estabilidad y cumplimiento con las normas de seguridad y calidad establecidas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo.	M3	130,27	$ 201.632,00	$ 26.266.601,00	130,27	$ 26.266.601,00	0,00	$ 0,00

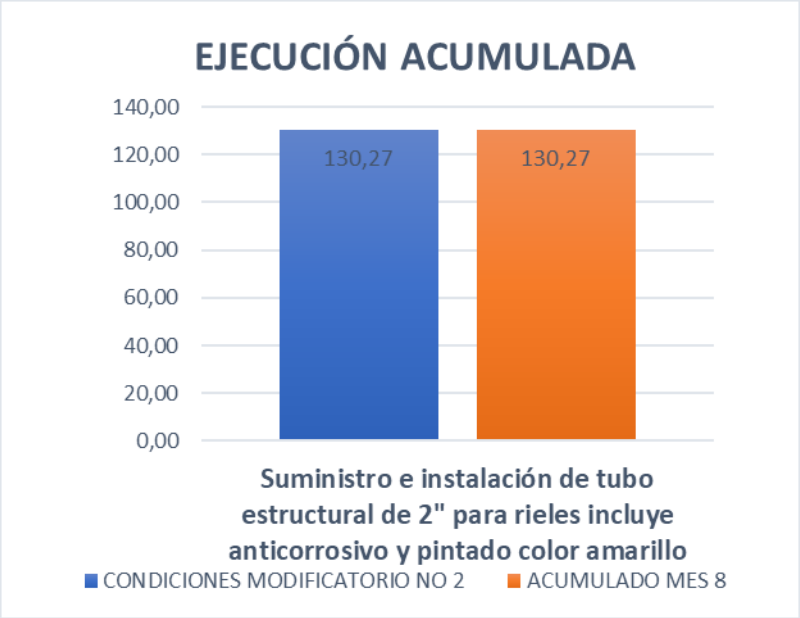

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CUADRADO DE 2" PARA RIELES DE FUN BOX INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTADO EN COLOR AMARILLO

DESCRIPCIÓN

Se efectuó el suministro e instalación de tubo cuadrado de 2” destinado a la conformación de rieles, conforme a los planos y especificaciones del proyecto. El proceso incluyó el tratamiento de la superficie con recubrimiento anticorrosivo para garantizar la durabilidad

del material, seguido del pintado en color amarillo como acabado final. Se verificó la correcta alineación, nivelación y sujeción del tubo, asegurando su estabilidad y cumplimiento con las normas de seguridad y calidad establecidas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo	M3	92,46	$ 202.901,00	$ 18.760.226,00	92,46	$ 18.760.226,00	0,00	$ 0,00

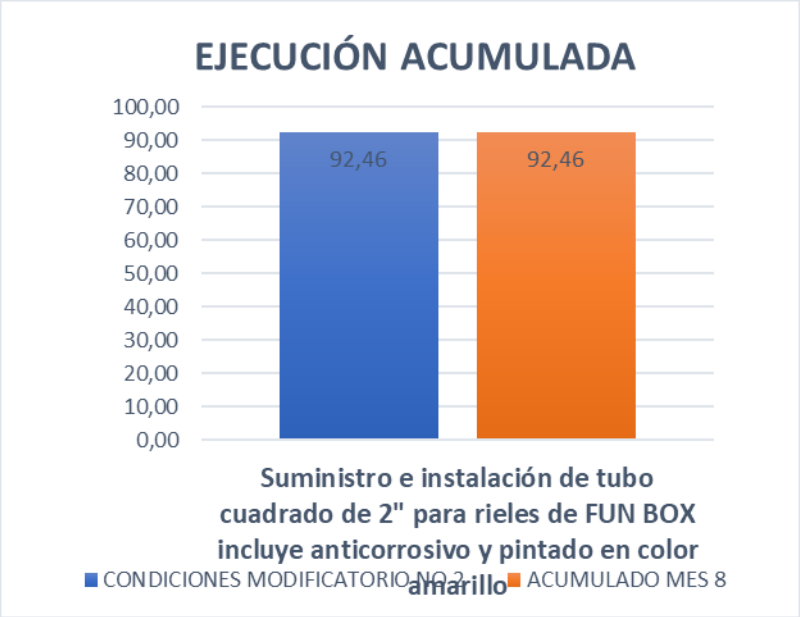

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.5. SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE CALISTENIA MODULO MASTER PARA 8 USUARIOS

DESCRIPCIÓN

En presente periodo de ejecución, se realizó la instalación del kit de calistenia tipo modular con capacidad para ocho (8) usuarios, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los planos del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios	UND	2,00	$ 49.522.297,00	$ 99.044.594,00	2,00	$ 99.044.594,00	0,00	$ 0,00

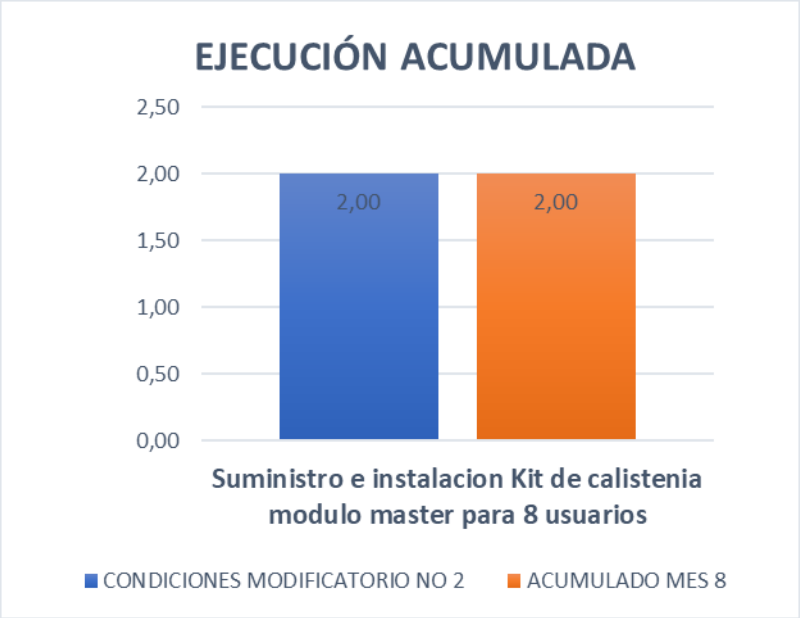

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTAINER MODIFICADO PARA LOCALES.

DESCRIPCIÓN

Se instaló la unidad de contenedores metálicos modificados para uso comercial, según diseños arquitectónicos aprobados, incluyendo cortes, refuerzos estructurales, acabados interiores y exteriores, instalación de puertas (baño, bodega y local principal) y mesón en

acero inoxidable. Gracias a su prefabricación, se logró una ejecución ágil y eficiente, optimizando tiempo y recursos, mientras su estructura en acero corrugado garantiza durabilidad frente a condiciones climáticas, impactos y cargas

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de container modificado para locales.	UND	2,00	$ 237.101.858,00	$ 474.203.716,00	2,00	$ 474.203.716,00	0,00	$ 0,00

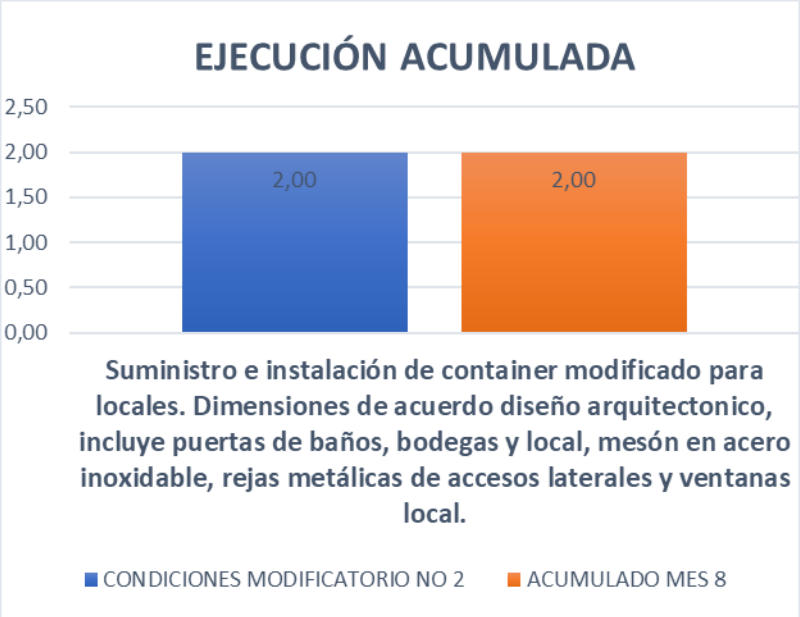

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.7. LETRERO DE ACCESO "DISTRITO URBANO" EN LAMINA METALICA CAL 20.

DESCRIPCIÓN

En presente periodo de ejecución, se realizó la fabricación e instalación de letrero de acceso “DISTRITO URBANO”, elaborado en lámina metálica calibre 20 e instalado sobre la estructura metálica del pórtico al ingreso principal.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.	UND	1,00	$ 13.841.213,00	$ 13.841.213,00	1,00	$ 13.841.213,00	0,00	$ 0,00

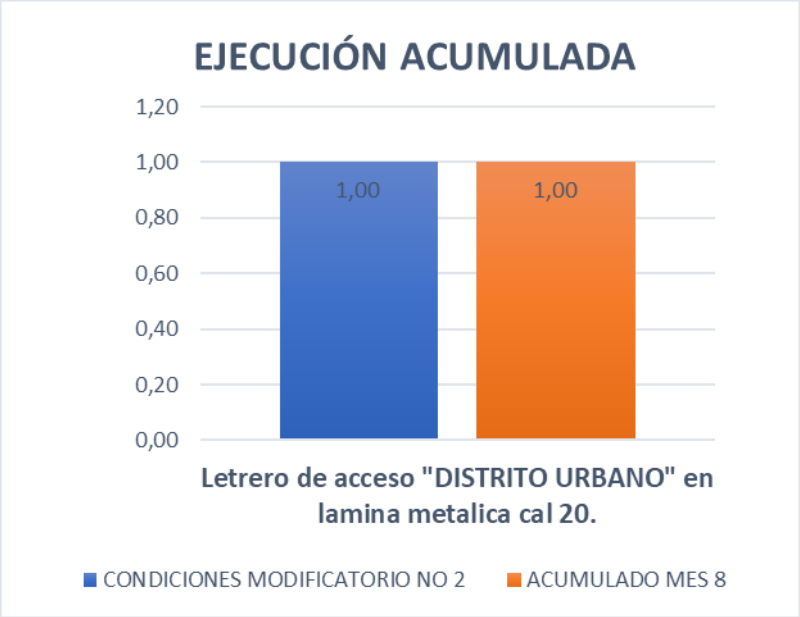

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




6.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CALIBRE 22 CON MARCO EN CALIBRE 16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL TIPO ESMALTE DOS MAMOS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, VISAGRAS Y CERROJO EXTERNO


DESCRIPCIÓN

Para la presente actividad se presenta la instalación de puertas en calibre 22 para los contenedores, así como de las zonas de baños, esto con el fin de brindar seguridad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CALIBRE 22 CON MARCO EN CALIBRE 16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL TIPO ESMALTE DOS MAMOS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, VISAGRAS Y CERROJO EXTERNO	UND	7,00	$ 2.718.329,00	$ 19.028.303,00	7,00	$ 19.028.303,00	0,00	$ 0,00

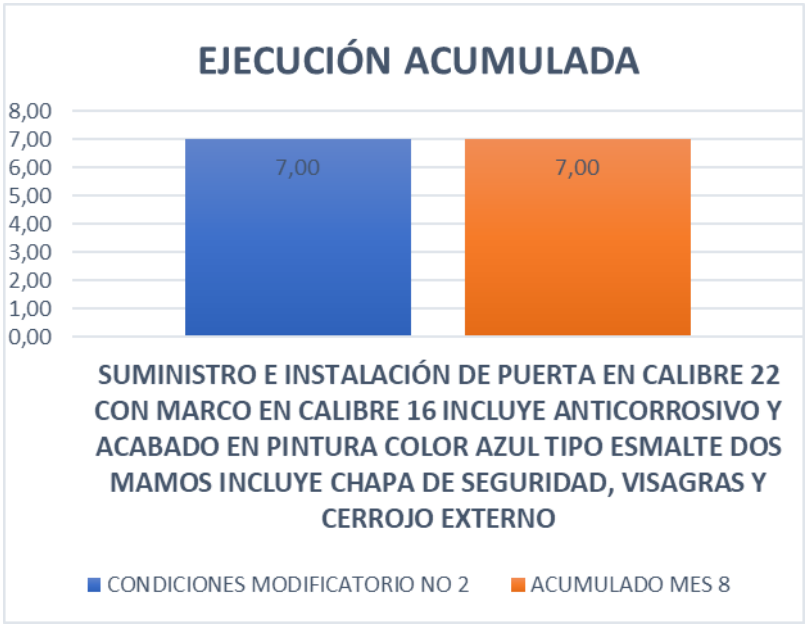

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

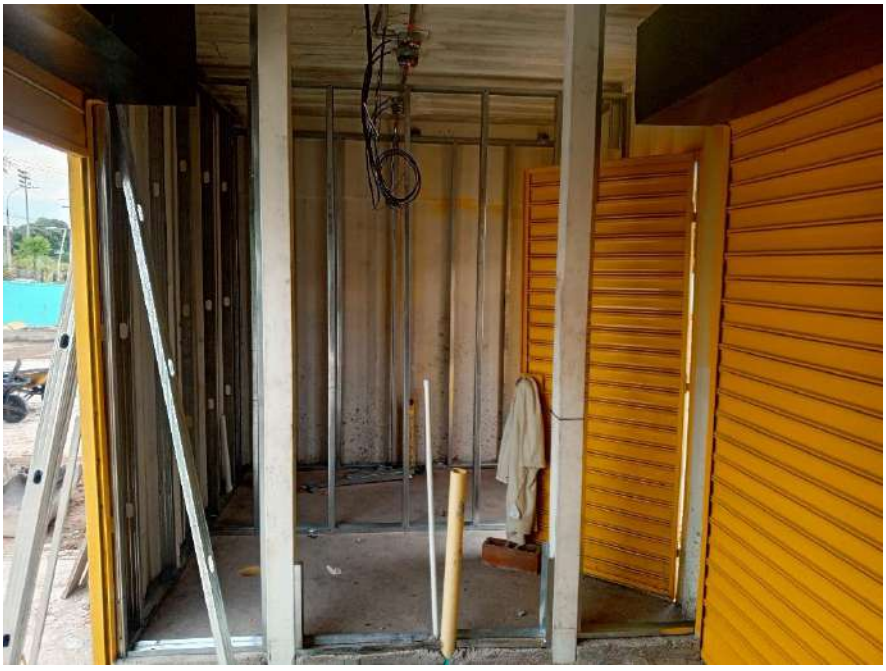


7.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 160 MM (6") NOVAFORT (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTE).

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de tubería de 6” proveniente del bowl, hasta la caja de inspección y de esta manera evitar empozamientos en este sector y garantizar el drenaje de las aguas

lluvias. Esta tubería se asienta sobre una capa de arena con el fin de prolongar su durabilidad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ML	44,82	$ 80.171,00	$ 3.593.264,00	44,82	$ 3.593.264,00	0,00	$ 0,00

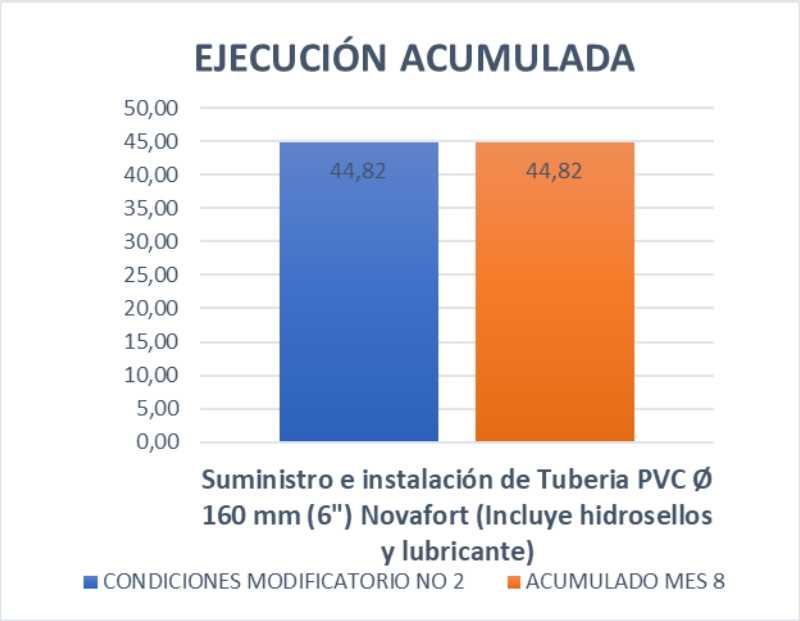

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 4" PVC SANIARIA

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de tubería de 4” proveniente de las instalaciones hidrosanitarias de los contenedores, hasta la caja de inspección y hasta el sistema séptico y al disipador de entrega. Esta tubería se asienta sobre una capa de arena con el fin de prolongar su durabilidad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubería 4" pvc Sanitaria	ML	111,53	$ 93.419,00	$ 10.419.021,00	111,53	$ 10.419.021,00	0,00	$ 0,00

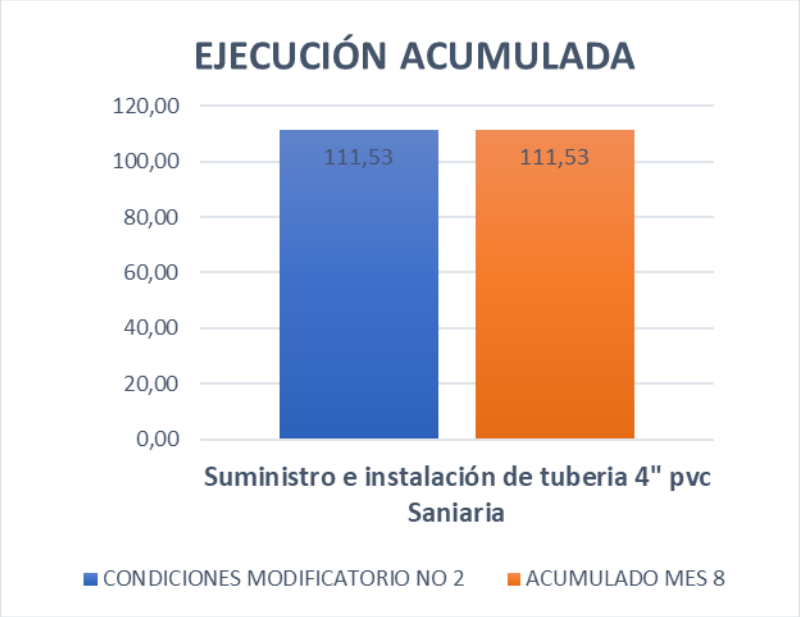

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.3. PUNTO 4" SANITARIO

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de punto sanitario de 4” ubicada en las instalaciones hidrosanitarias de los contenedores, correspondientes a los sanitarios de baterías de baño de damas, de caballeros y de discapacitados.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Punto 4" sanitario	UND	3,00	$ 105.726,00	$ 317.178,00	3,00	$ 317.178,00	0,00	$ 0,00

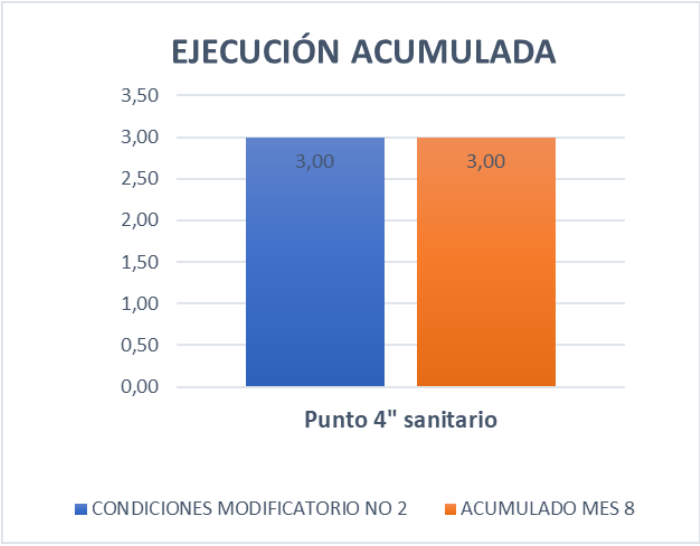


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

7.4. PUNTO 2" SANITARIO

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de punto sanitario de 2” ubicada en las instalaciones hidrosanitarias de los contenedores, correspondientes a los lavamanos y sifones de piso de las baterías de baño de damas, de caballeros y de discapacitados.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Punto 2" sanitario	UND	6,00	$ 75.076,00	$ 450.456,00	6,00	$ 450.456,00	0,00	$ 0,00

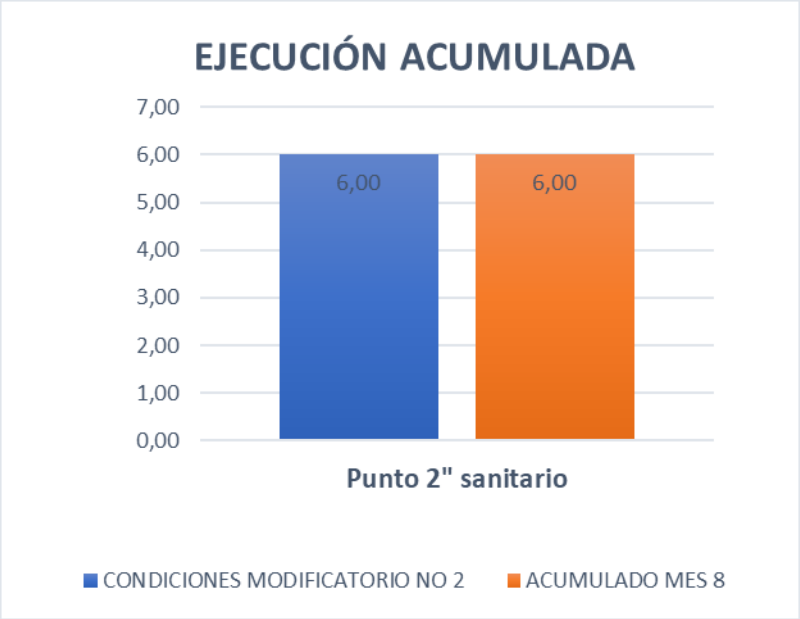


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

7.8. TUBERIA 1" PVC PRESIÓN

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de tubería de 1” de acuerdo al trazado según los planos hidrosanitarios en donde se derivan a los contenedores y poder conectar los diferentes aparatos hidrosanitarios como son sanitarios y lavamanos de las baterías de baños.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Tuberia 1" pvc presión	ML	70,87	$ 38.009,00	$ 2.693.698,00	70,87	$ 2.693.698,00	0,00	$ 0,00

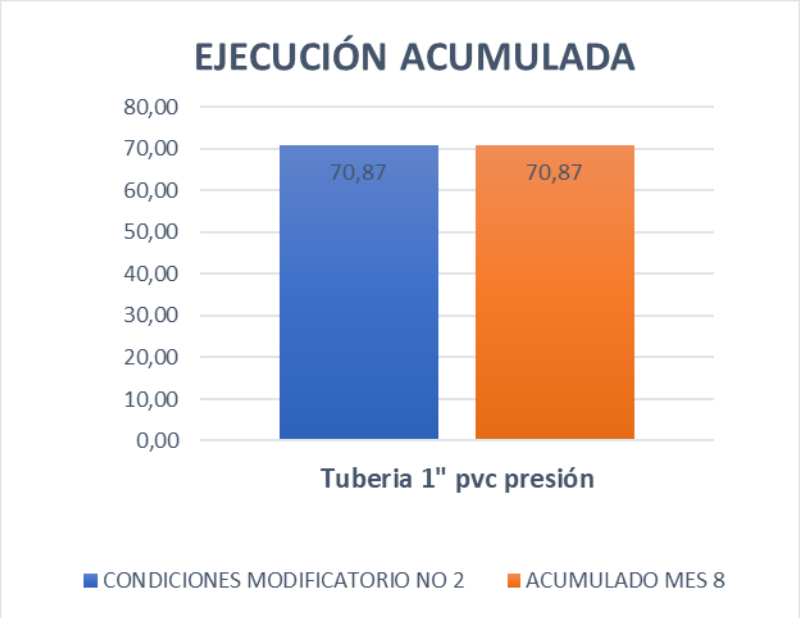


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

7.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE PORCELANA DE 3,5 LT DE CONSUMO CON FLUXOMETRO

DESCRIPCIÓN

La actividad consistió en el suministro e instalación de sanitario de porcelana de 3,5 litros de consumo con fluxómetro, destinado a garantizar el servicio sanitario eficiente y el ahorro de agua en los contenedores del proyecto. Previamente, se realizó la verificación de la ubicación del punto de instalación conforme a los planos hidrosanitarios y especificaciones técnicas, asegurando el correcto alineamiento con la red de desagüe, la nivelación del piso y el cumplimiento de las distancias reglamentarias.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro	UND	3,00	$ 2.164.186	$ 6.492.558,00	3,00	$ 6.492.558,00	$ 0,00	$ 0,00

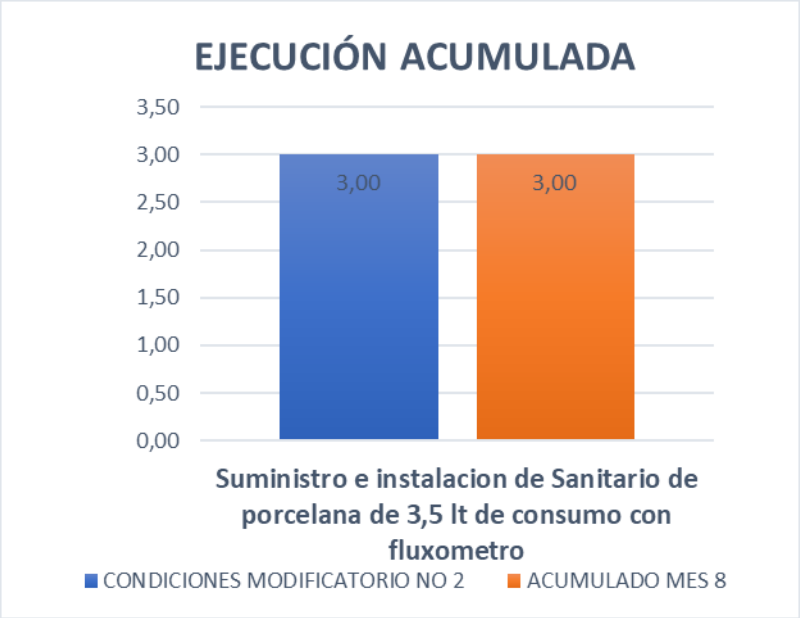

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA INCLUYE GRIFERIA DE PRESION SUAVE TIPO PUSH

DESCRIPCIÓN

La actividad consistió en el suministro e instalación de lavamanos en porcelana con grifería de presión suave tipo PUSH, destinado a garantizar el servicio de aseo personal con eficiencia hídrica y funcionalidad en los contenedores del proyecto. Previamente, se realizó la verificación de la ubicación del punto de instalación conforme a los planos hidrosanitarios

y especificaciones técnicas, asegurando el correcto alineamiento con las redes de agua potable y desagüe, la nivelación del muro o superficie de apoyo, y el cumplimiento de las alturas reglamentarias de uso

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH	UND	3,00	$ 914.318,00	$ 2.742.954,00	3,00	$ 2.742.954,00	$ 0,00	$ 0,00

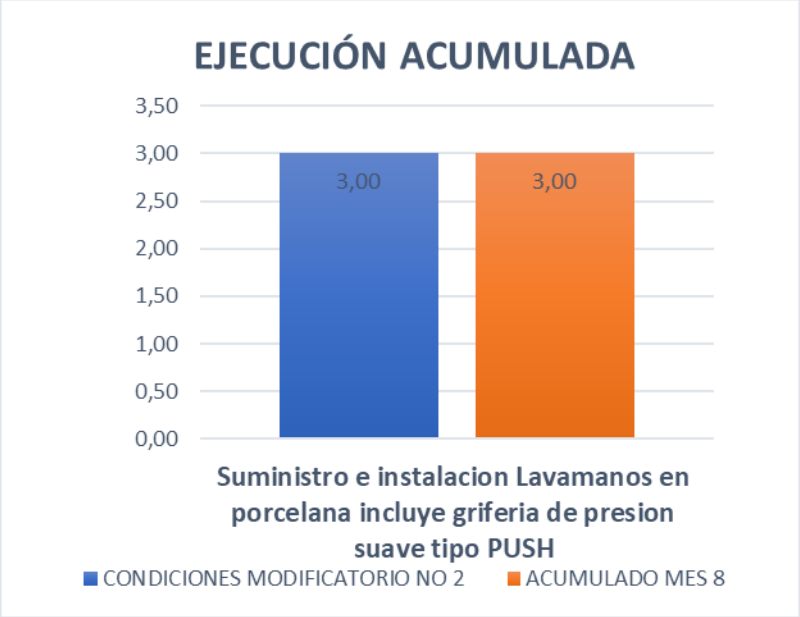

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.11. CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO (INCLUYE HIERRO)

DESCRIPCIÓN

Se realizó la construcción de cajas de inspección para la red sanitaria, de acuerdo a las ubicaciones y profundidades entregados en los planos iniciales para que de esta manera la red tenga un correcto funcionamiento.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	UND	4,00	$ 752.481,00	$ 3.009.924,00	4,00	$ 3.009.924,00	0,00	$ 0,00

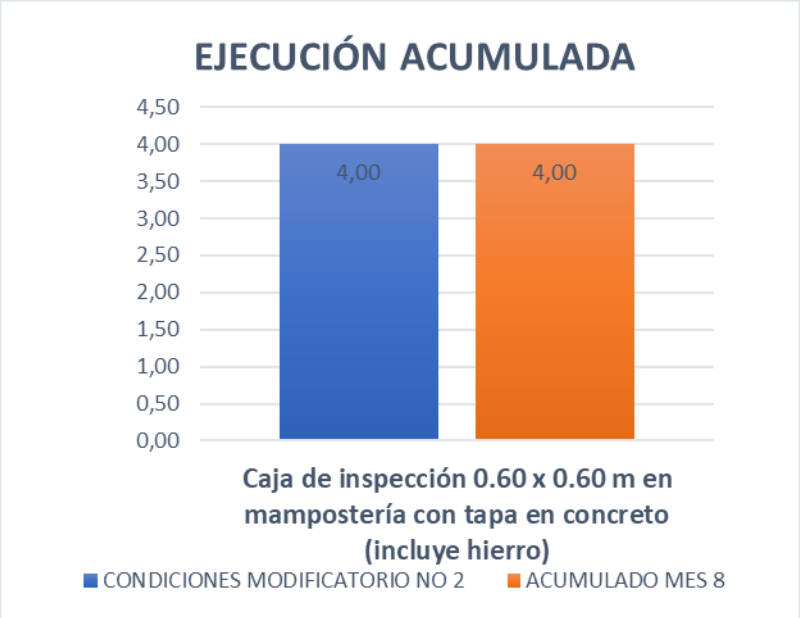

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.12. SISTEMA SEPTICO INTEGRADO SEPTILISTICO 5000 LTS.

DESCRIPCIÓN

Durante el presente periodo constructivo se realizó la instalación del sistema séptico integrado, en el espacio definido en los planos hidrosanitarios para el tratamiento del flujo transportado en la red sanitaria, previo a su entrega en el disipador hacia la ciénaga Miramar.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Sistema séptico integrado septilistico 5000 lts.	UND	1,00	$24.112.760,0	$24.112.760,0	1,00	$ 24.112.760,00	0,00	$ 0,00

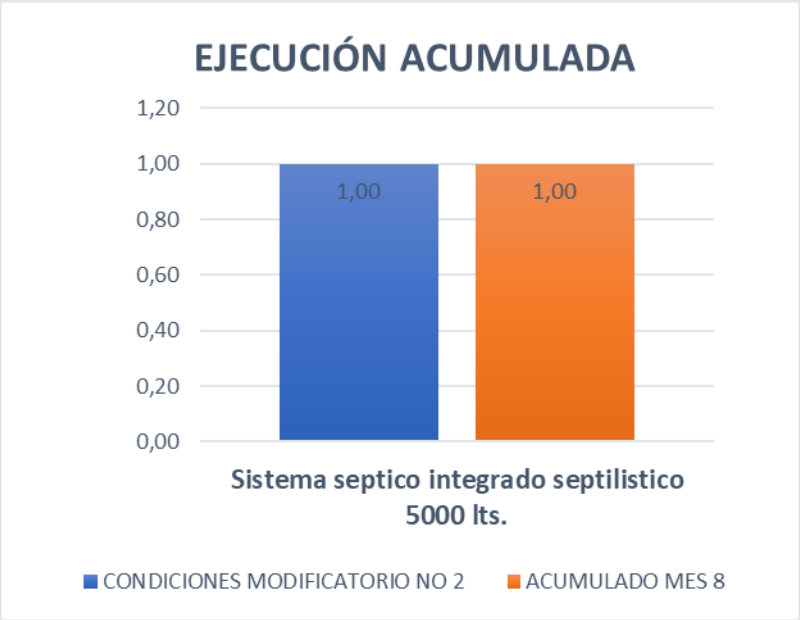

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.13. ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"X1" PVC (INC. MICROMEDIDOR, CAJA EN HIERRO FUNDIDO Y TAPA SEGURIDAD).

DESCRIPCIÓN

Se realizó el seguimiento a la actividad de instalación de la acometida principal del proyecto. La Interventoría verificó que el contratista cumplió con la instalación de la tubería PVC, la

conexión a la red de 6" y el montaje del micromedidor dentro de la caja de hierro fundido con tapa de seguridad. Se constató que los materiales cuentan con las certificaciones de calidad y calibración necesarias.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)	UND	1,00	$ 2.178.239,00	$ 2.178.239,00	1,00	$ 2.178.239,00	0,00	$ 0,00

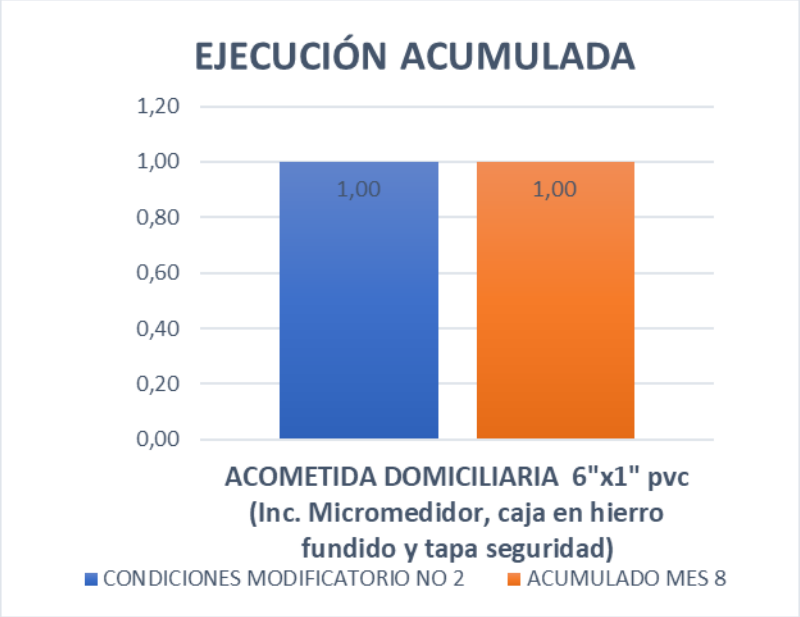

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.14. CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE ENERGIA PARA AGUAS DE LLUVIAS DE 0.60ANCHO X 0.50 ALTURA Y HUELLA DE 0,60M. ESPESOR=10CM

DESCRIPCIÓN

Se realizó la construcción de los dos disipadores de energía para las redes sanitaria y de aguas lluvia, en la zona de la franja de aislamiento de la ciénaga Miramar, de acuerdo con las dimensiones y ubicaciones establecidas en los planos del diseño hidrosanitario y las recomendaciones de los profesionales de la autoridad ambiental en visita de inspección.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Construcción de disipador de energía para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	UND	19,00	$ 327.395,00	$ 6.220.505,00	19,00	$ 6.220.505,00	0,00	$ 0,00

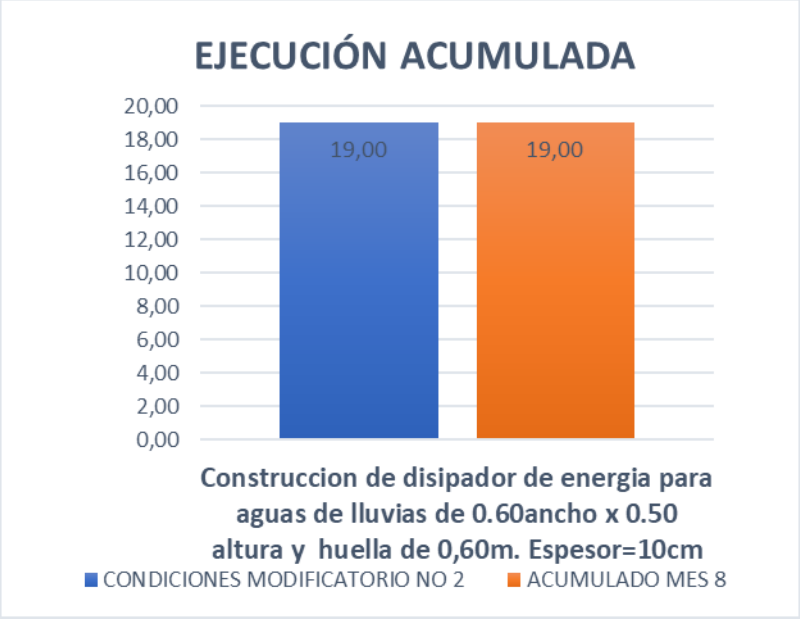

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 200 MM (8") NOVAFORT (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTE).

DESCRIPCIÓN

Se realiza la instalación de tubería de 8” proveniente desde la caja de inspección que recoge las aguas del bowl, hasta el disipador, con el fin de transportar las aguas hacia el sector determinado en el proyecto. Esta tubería se asienta sobre una capa de arena con el fin de prolongar su durabilidad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ML	24,39	$ 306.501,00	$ 7.475.559,00	24,39	$ 7.475.559,00	0,00	$ 0,00

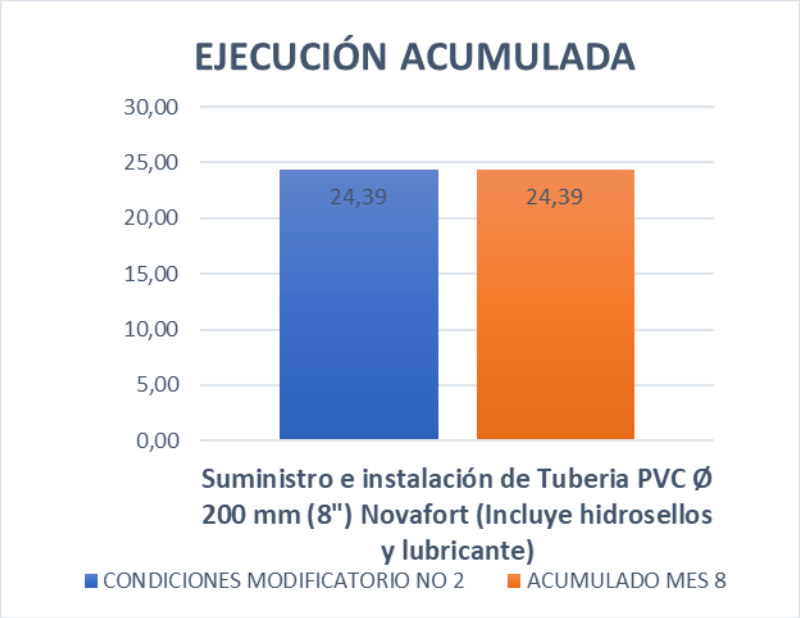

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.16. CAJA DE INSPECCIÓN 1 X 1 M EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO (INCLUYE HIERRO)

DESCRIPCIÓN

Se realizó la construcción de cajas de inspección para la red pluvial, con el fin de transportar las aguas lluvias del bowl principal, esto de acuerdo a las ubicaciones y profundidades entregados en los planos iniciales para que de esta manera la red tenga un correcto funcionamiento.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Caja de inspección 1 x 1 m en	UND	1,00	$1.046.882	$ 1.046.882,00	1,00	$ 1.046.882,00	0,00	$ 0,00

mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)								

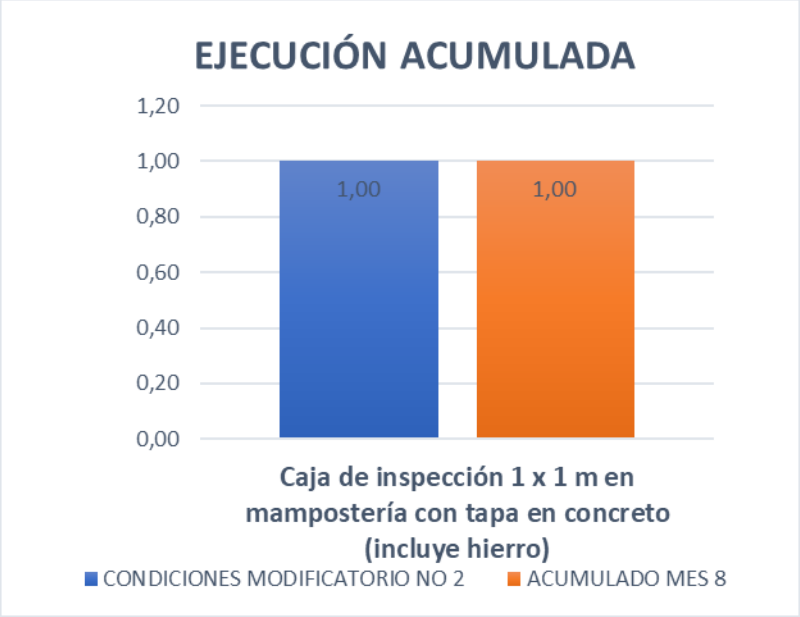

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




7.17. CUNETA PERIMETRAL DE 0.25 X 0.30 CM INTERNO

DESCRIPCIÓN

La cuneta perimetral de 0.25 m × 0.30 m se construye como elemento de drenaje perimetral en las zonas requeridas, con el fin de interceptar y canalizar las aguas lluvias hacia puntos de descarga controlados generados de acuerdo a los planos hidrosanitarios.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno	ML	63,20	$ 182.072,00	$ 11.506.950,00	63,20	$ 11.506.950,00	0,00	$ 0,00

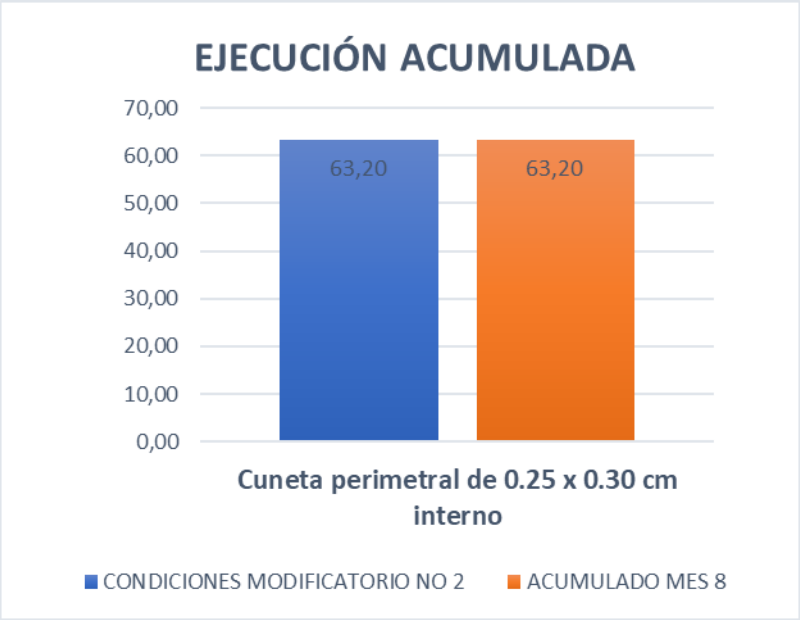

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




8.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLITEROS SEGÚN ESPECIFICACIONES. PARA 4 UNIDADES DE BICICLETAS.

Se realizó el suministro e instalación de la estructura para parqueo de bicicletas, con capacidad para 4 unidades, ubicada conforme a los planos arquitectónicos y

especificaciones técnicas. La actividad incluyó la fijación de la estructura, garantizando estabilidad y resistencia mecánica.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de bicicleteros según especificaciones. Para 4 unidades de bicicletas	UND	6,00	$ 2.065.892	$ 12.395.352,00	6,00	$ 12.395.352,00	0,00	$ 0,00

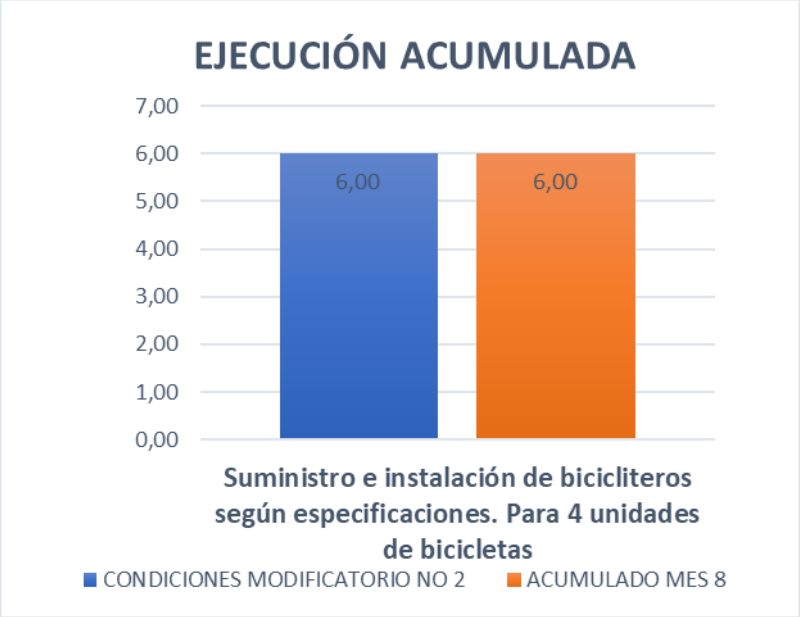

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




8.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA PREFABRICADA TIPO OLAND (0,45*1,80).

Se realizó el suministro e instalación de 10 bancas prefabricada tipo OLAND, con dimensiones de 0,45 m de ancho por 1,80 m de largo, ubicada en de acuerdo a los planos de diseño urbano y especificaciones técnicas del proyecto.

La actividad comprendió el transporte e instalación de la banca, garantizando estabilidad, alineación y resistencia ante cargas de servicio.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalacion de Banca prefabricada tipo OLAND (0,45*1,80)	UND	10,00	$ 3.043.365	$ 12.395.352,00	10,00	$ 30.433.650,00	0,00	$ 0,00

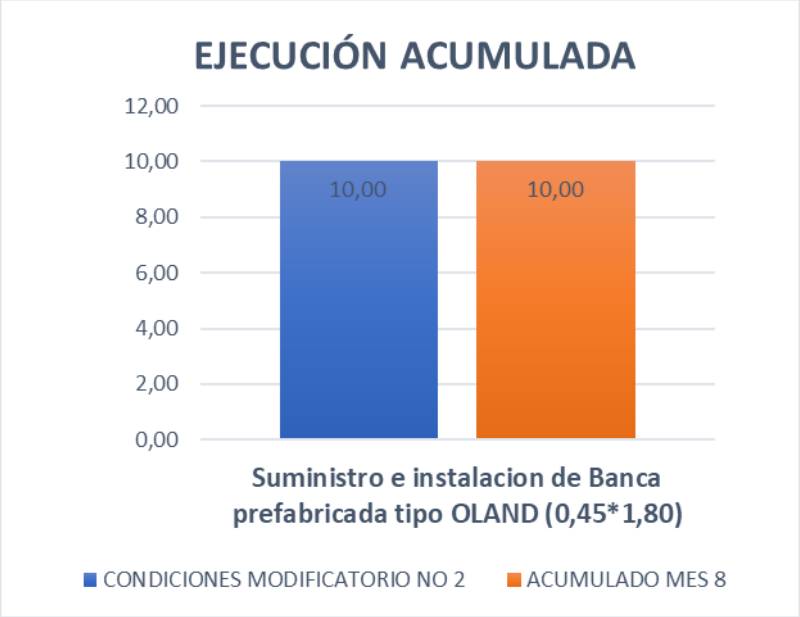

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




8.3. MODULO CIRCULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES RADIO=20CM, ALTURA=10CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

DESCRIPCIÓN

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 538.173,00	$ 538.173,00	1,00	$ 538.173,00	0,00	$ 0,00

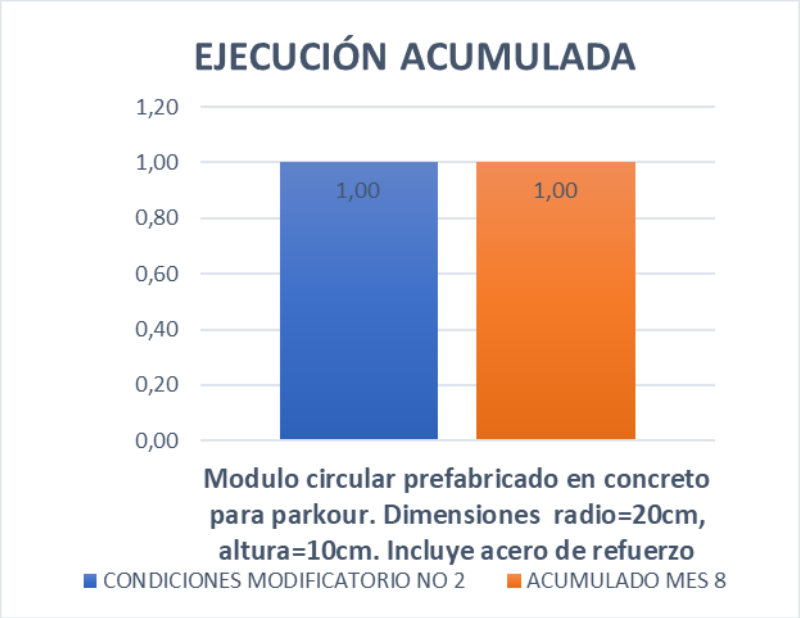


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.4. MODULO CIRCULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES RADIO=20CM, ALTURA=20CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

DESCRIPCIÓN

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 604.748,00	$ 604.748,00	1,00	$ 604.748,00	0,00	$ 0,00

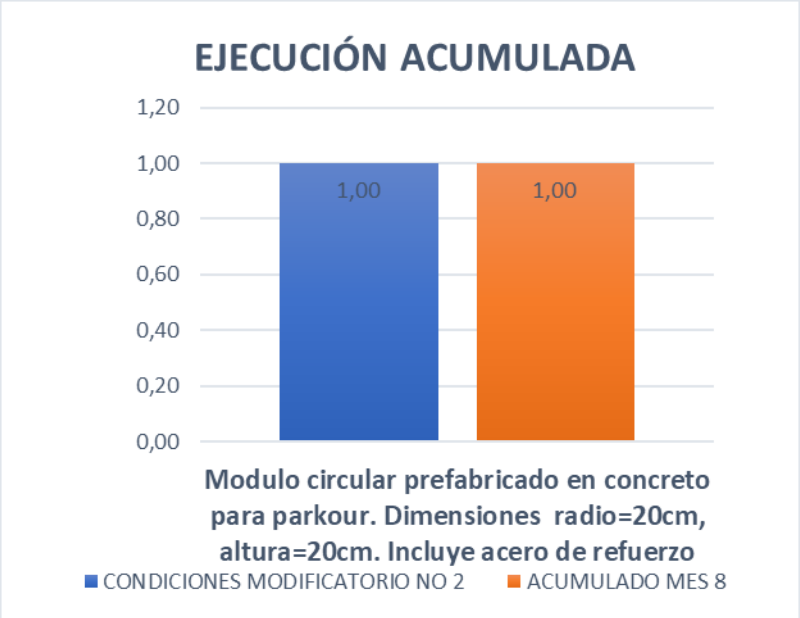


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.5. MODULO CIRCULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES RADIO=20CM, ALTURA=30CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

DESCRIPCIÓN

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 727.307,00	$ 727.307,00	1,00	$ 727.307,00	0,00	$ 0,00

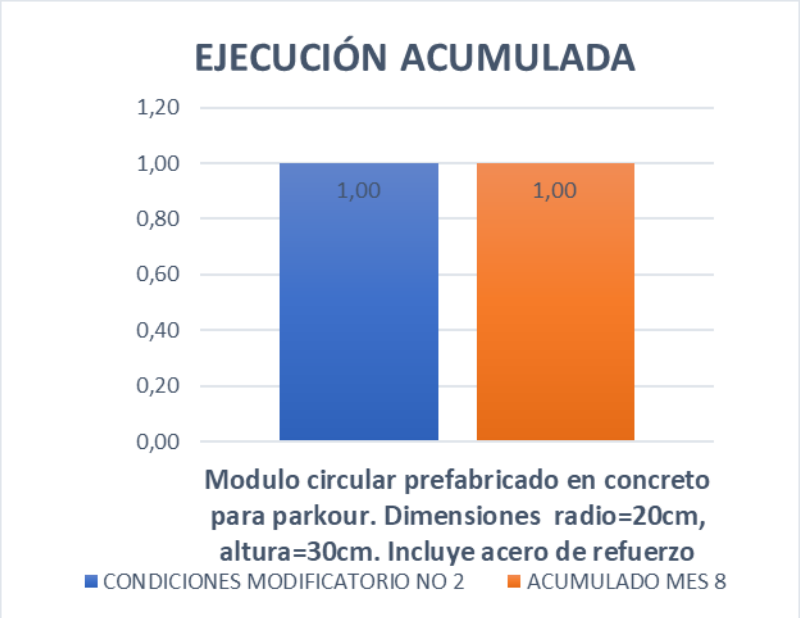


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.6. MODULO CIRCULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES RADIO=20CM, ALTURA=40CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 747.536,00	$ 747.536,00	1,00	$ 747.536,00	0,00	$ 0,00

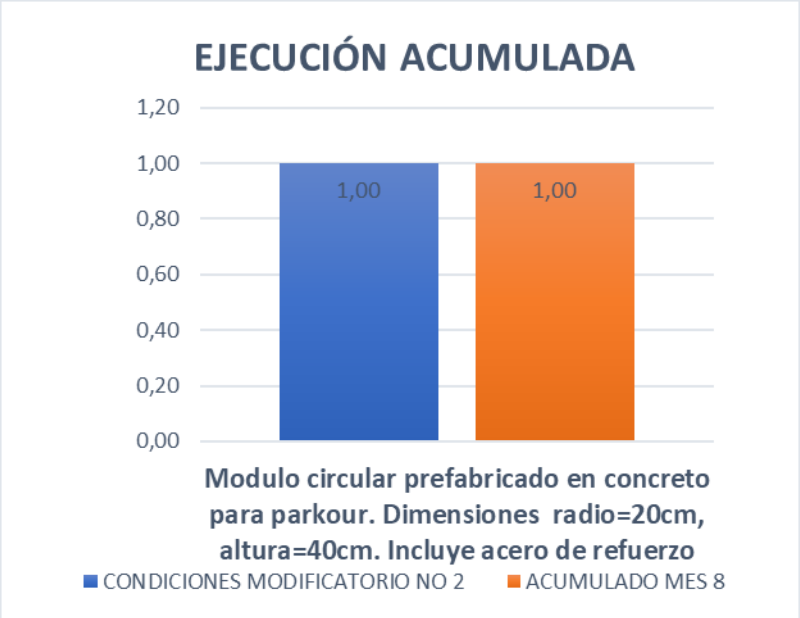


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.7. MODULO CIRCULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES RADIO=20CM, ALTURA=50CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 766.609,00	$ 766.609,00	1,00	$ 766.609,00	0,00	$ 0,00

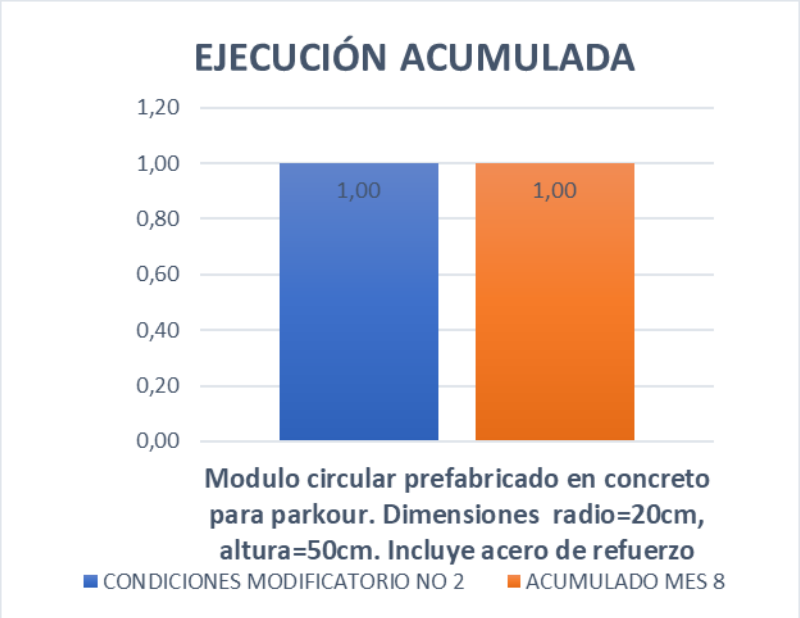


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.8. MODULO RECTANGULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES ANCHO=0,75CM, LARGO=1,25CM Y ALTURA=0,50CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 789.343,00	$ 789.343,00	1,00	$ 789.343,00	0,00	$ 0,00

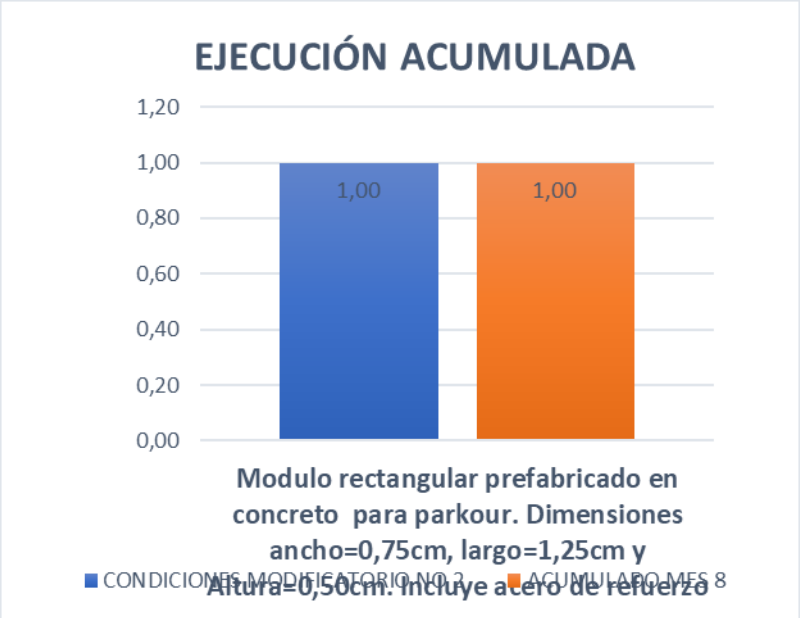


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.9. MODULO RECTANGULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES ANCHO=0,75CM, LARGO=1,25CM Y ALTURA=0,80CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 3.531.034	$ 3.531.034,00	1,00	$ 3.531.034,00	0,00	$ 0,00

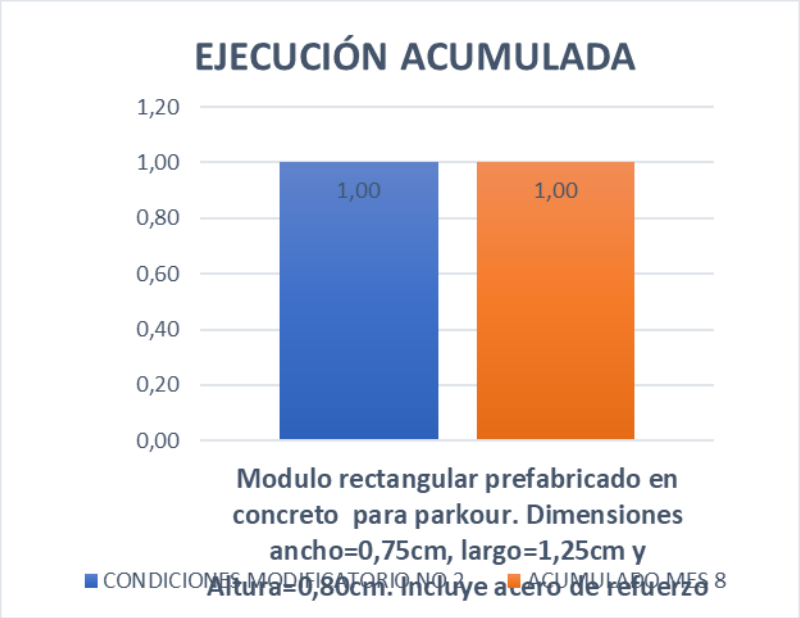


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

8.10. MODULO RECTANGULAR PREFABRICADO EN CONCRETO PARA PARKOUR. DIMENSIONES ANCHO=0,75CM, LARGO=1,25CM Y ALTURA=1M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Se instalaron los módulos prefabricados de concreto reforzado (circulares y rectangulares), según lo indicado en los planos, integrándolos al muro existente para conformar el circuito de parkour. Estos elementos están diseñados para desarrollar agilidad, equilibrio y coordinación, requiriendo movimientos fluidos y controlados, especialmente en los módulos circulares.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo	UND	1,00	$ 4.210.405	$ 4.210.405,00	1,00	$ 4.210.405,00	0,00	$ 0,00

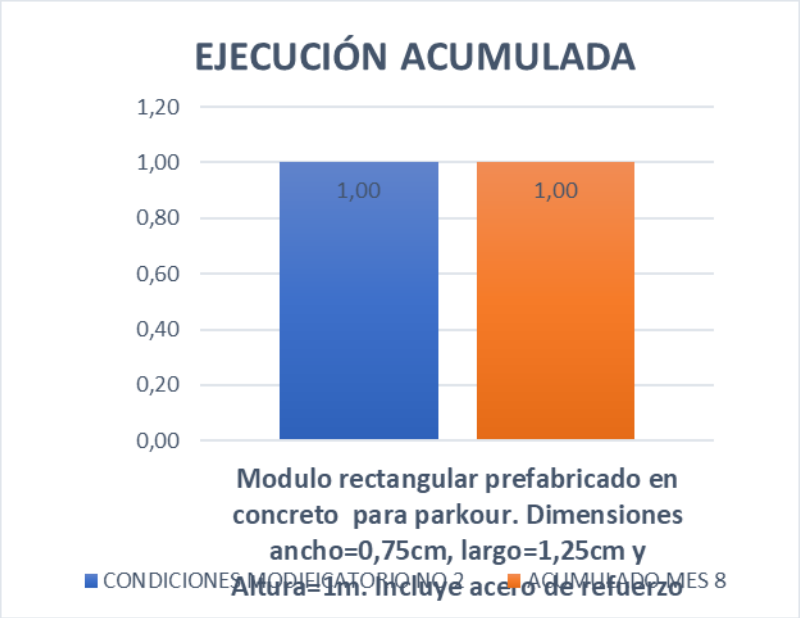

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%






8.11. PUNTO ECOLOGICO EN ACERO INOXIDABLE.

Se realizó el suministro e instalación de 3 unidades de punto ecológico fabricado en acero inoxidable, ubicado de acuerdo a los planos de diseño urbano, especificaciones técnicas y normativa de gestión integral de residuos.

La actividad comprendió el transporte e instalación de los puntos ecológicos en acero inoxidable, garantizando estabilidad, alineación y resistencia ante cargas de servicio.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Punto ecológico en acero inoxidable	UND	3,00	$ 8.297.364	$ 24.892.092,00	3,00	$ 24.892.092,00	0,00	$ 0,00

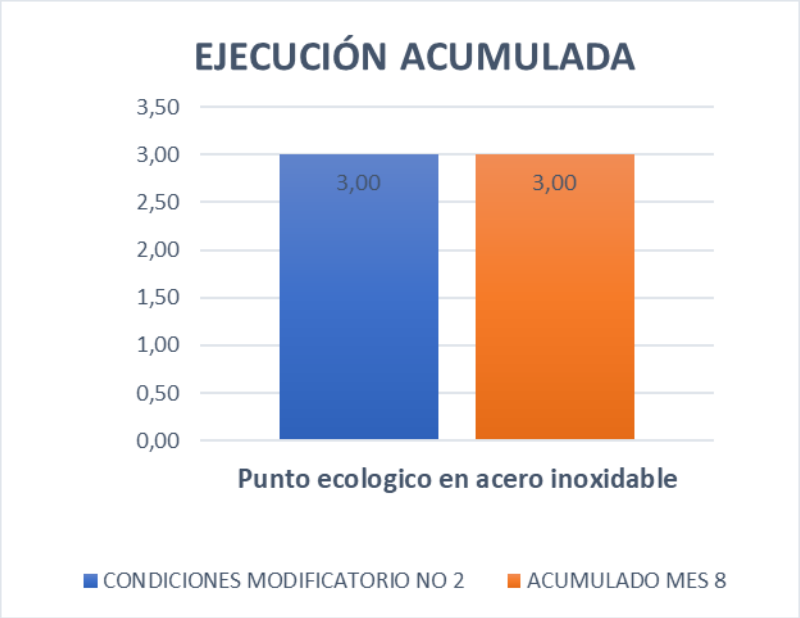


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



9.1. PINTURA PARA MURAL EXTERIORES.

Esta actividad Incluye preparación de superficie, imprimación y acabado en zonas de rodadura (Bowl, Transición, Street, Funbox) y graderías. Utiliza pintura epóxica o de poliuretano de alta resistencia a la abrasión y rayos UV. Comprende ejecución de diseños gráficos aprobados, limpieza final y entrega de superficie protegida y señalizada.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Pintura para mural exteriores	m2	334,35	$ 173.871,00	$ 58.133.096,00	334,35	$ 58.133.096,00	0,00	$ 0,00

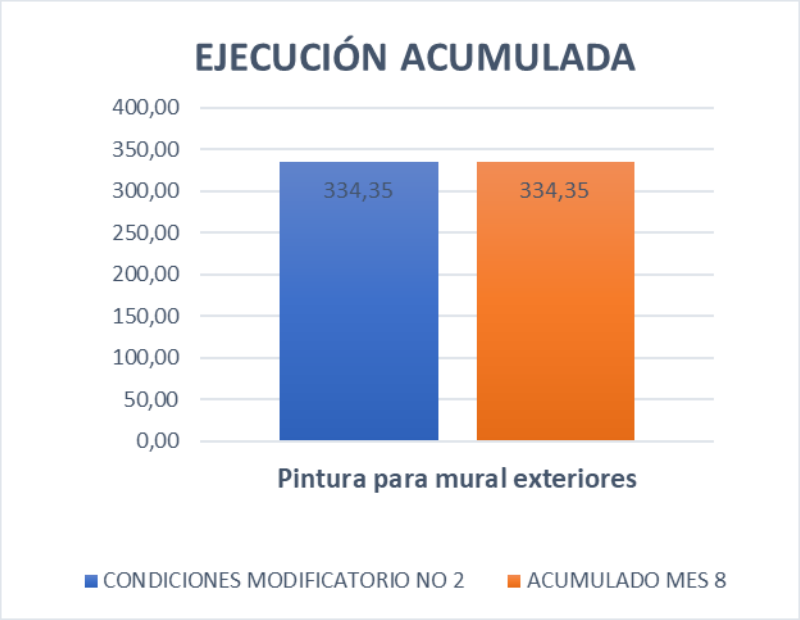

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




9.2. SEÑAL HORIZONTAL DEMARCACION EN LINEA DE 0,12M PARA CRUCE PEATONAL EN PINTURA ACRILICA DE TRAFICO.

Se realizó la demarcación de señalización horizontal correspondiente a cruce peatonal, mediante la aplicación de líneas transversales, ubicadas en las zonas requeridas, conforme a los planos de señalización, especificaciones técnicas y normativa vial vigente.

La actividad comprendió la preparación de la superficie, replanteo geométrico con plantilla y aplicación de pintura acrílica de tráfico de secado rápido, alta visibilidad y resistencia a la abrasión vehicular y peatonal.

ÍTEM	UND	CANT	$ 5.883,00 VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Señal horizontal demarcación en línea de 0,12m para cruce peatonal en pintura acrilica de trafico	ml	39,90	$ 5.883,00	$ 234.732,00	39,90	$ 234.732,00	0,00	$ 0,00

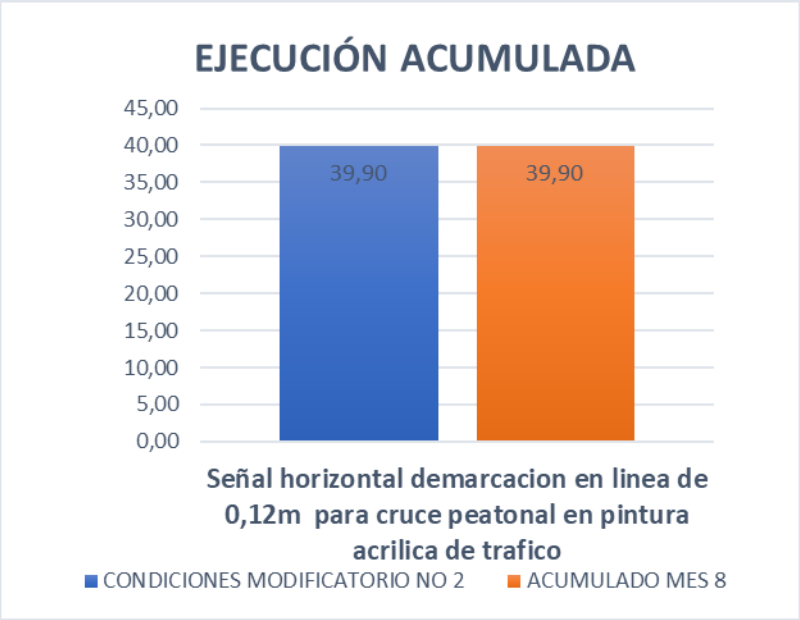


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



9.3. DEMARCACION PINTURA RAL 1003 PARA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS PARQUE COLOR AMARILLA

Se realizó la demarcación y pintura de señalización en color amarillo RAL 1003 sobre elementos urbanos del parque, conforme a los planos de diseño urbano, especificaciones técnicas y criterios de seguridad peatonal.

ÍTEM	UND	CANT	$ 5.883,00 VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Demarcación pintura RAL 1003 Para señalización de elementos parque color amarilla	ml	589,72	$ 4.064,00	$ 2.396.622,00	589,72	$ 2.396.622,00	0,00	$ 0,00

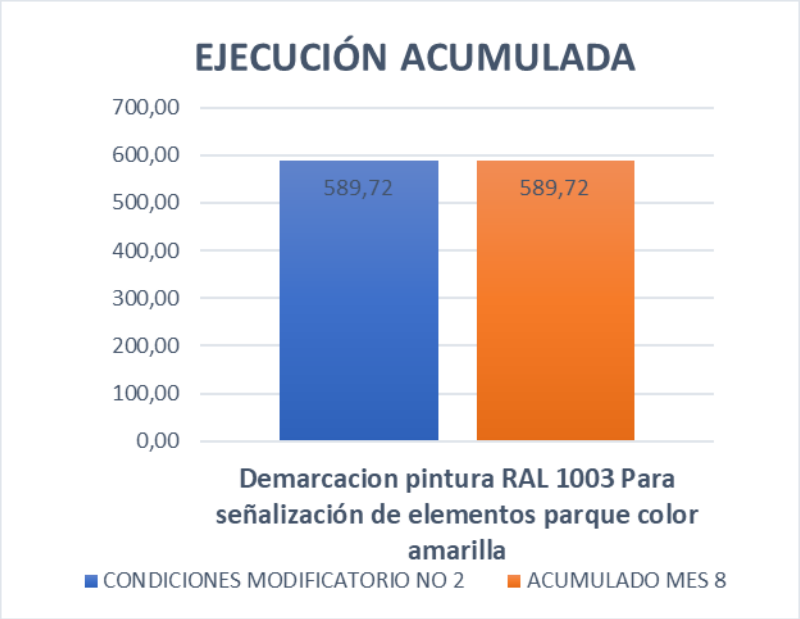


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



9.4. DEMARCACIONES EN PINTURA DE TRAFICO COLOR AZUL Y BLANCO PARA SEÑALIZACIÓN DE PARQUEO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDAD.

Se realizó la pintura de señalización para parqueo destinado a personas con movilidad reducida en el área de parqueaderos zona posterior, mediante la aplicación de pintura de tráfico, garantizando adecuada visibilidad, identificación del espacio y cumplimiento de los criterios de accesibilidad y seguridad, se finalizada esta actividad.

ÍTEM	UND	CANT	$ 5.883,00 VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Demarcaciones en pintura de tráfico color azul y blanco para señalización de parqueo para personas con movilidad reducidad	und	1,00	$ 217.853,00	$ 217.853,00	1,00	$ 217.853,00	0,00	$ 0,00

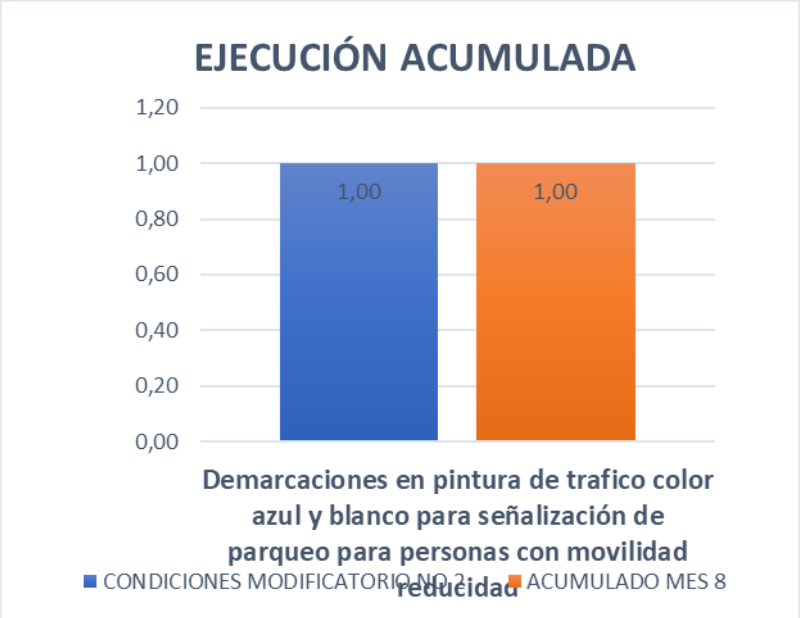


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



9.5. DEMARCACIONES EN PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACIÓN DE PARQUEO PARA VEHÍCULOS.

Esta actividad contempla la demarcación de parqueos y bahías para vehículos mediante la aplicación de pintura de color amarillo, con el fin de delimitar espacios, mejorar la visibilidad y garantizar el ordenamiento y seguridad de la circulación vehicular.

ÍTEM	UND	CANT	$ 5.883,00 VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Demarcaciones en pintura de tráfico color amarillo para señalización de parqueo para vehículos	ml	396,50	$ 5.883,00	$ 2.332.610,00	396,50	$ 2.332.610,00	0,00	$ 0,00

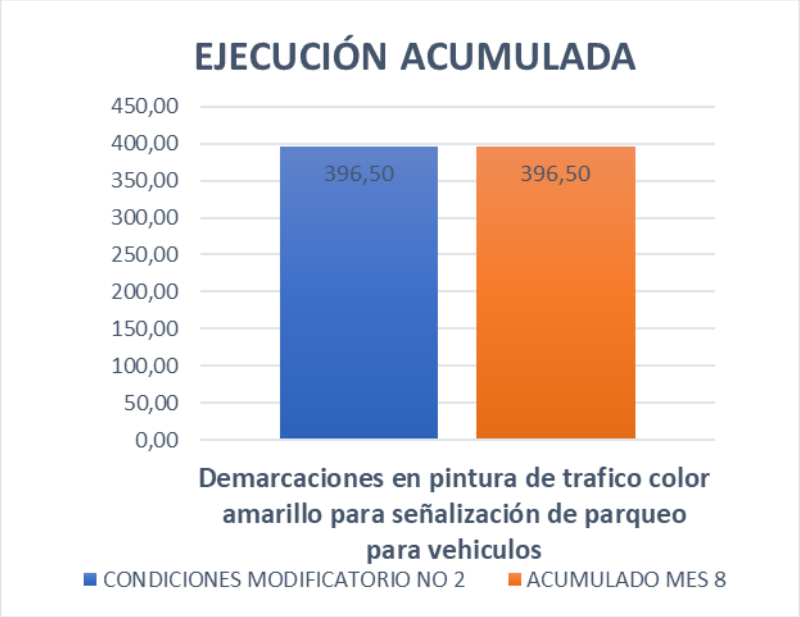


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



9.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALES VERTICALES EN FONDO REFLECTIVO TIPO ALTA INTENSIDAD CON TABLERO EN LÁMINA CAL 16, TERMINADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA

Esta actividad contempla la instalación de señales verticales sobre la vía principal y en los accesos de parqueadero, estas señales cumplen con las especificaciones técnicas, así como con la normativa INVIAS.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca.	UND	10,00	$ 648.530,00	$ 6.485.300,00	10,00	$ 6.485.300,00	0,00	$ 0,00

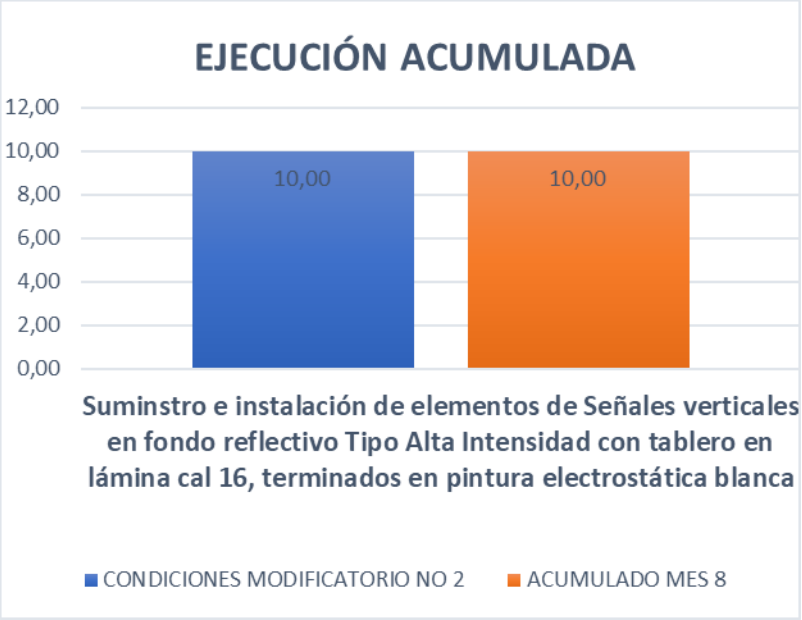


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




9.7. DEMARCACIONES EN PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO Y BLANCO PARA SEÑALIZACIÓN DE ZONA DE PLAZOLETA ARTÍSTICA.

Esta actividad contempla la demarcación decorativas y funcionales mediante aplicación de pintura de tráfico de alto rendimiento en colores negro y blanco, para señalización, delimitación y diseño gráfico en zona de plazoleta artística.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Demarcaciones en pintura de tráfico color negro y blanco para señalización de zona de plazoleta artística	m2	90,70	$ 36.674,00	$ 3.326.332,00	90,70	$ 3.326.332,00	0,00	$ 0,00

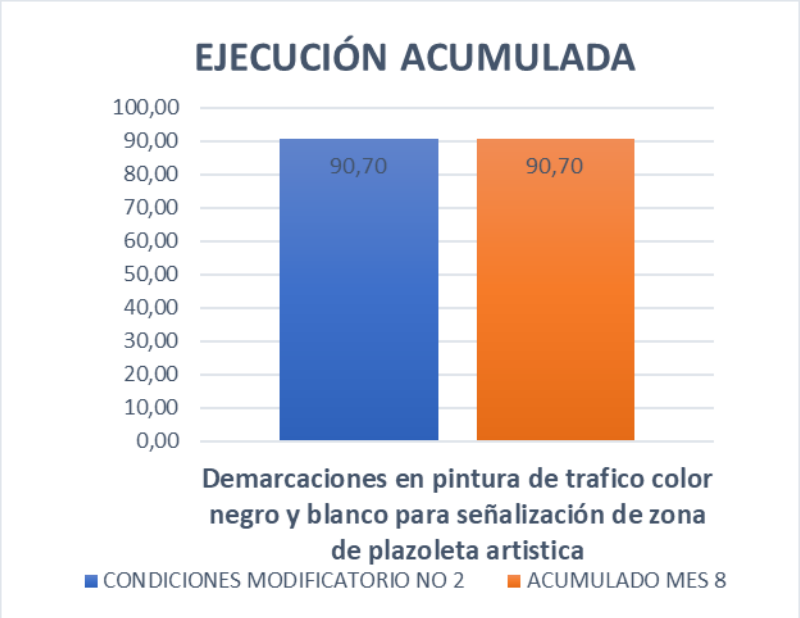


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

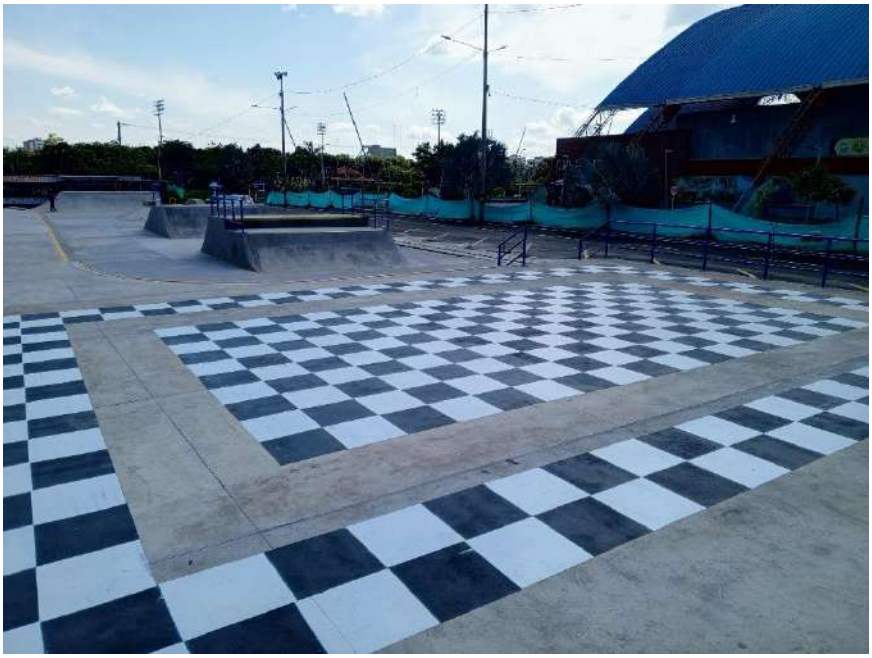

9.8. SEÑAL HORIZONTAL DE FLECHA DOBLE EN PINTURA ACRILICA DE TRAFICO.

Se realizó la demarcación de señalización horizontal sobre la vía del proyecto, mediante la aplicación de flechas direccionales sencillas y dobles con pintura de tráfico de alto rendimiento, en las zonas de ingreso a la vía principal y de acceso/salida al área de parqueadero, conforme a los planos de señalización vial y normativa vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Señal horizontal de flecha doble en Pintura acrilica de Trafico	und	3,00	$ 121.413,00	$ 364.239,00	3,00	$ 364.239,00	0,00	$ 0,00

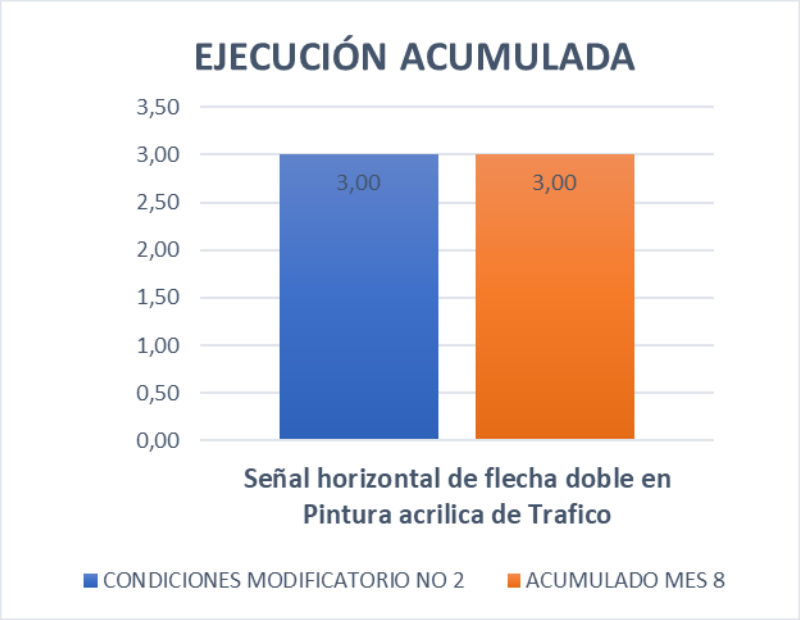


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

9.9. SEÑAL HORIZONTAL DE FECHA SENCILLA EN PINTURA ACRILICA DE TRAFICO.

Se realizó la demarcación de señalización horizontal sobre la vía del proyecto, mediante la aplicación de flechas direccionales sencillas y dobles con pintura de tráfico de alto rendimiento, en las zonas de ingreso a la vía principal y de acceso/salida al área de parqueadero, conforme a los planos de señalización vial y normativa vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Señal horizontal de fecha sencilla en Pintura acrilica de Trafico	und	1,00	$ 115.422,00	$ 115.422,00	1,00	$ 115.422,00	0,00	$ 0,00

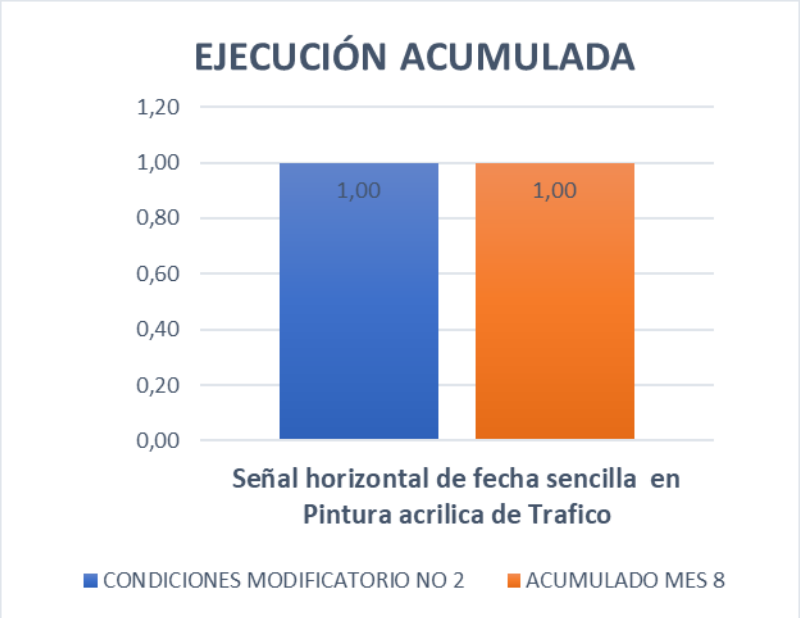

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



9.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL DE EPP Y BUEN USO DEL PARQUE.


Se realizó la instalación de señalización vertical informativa relacionada con el uso de elementos de protección personal (EPP) y las normas de comportamiento para el buen uso del parque, conforme a las especificaciones técnicas y planos de diseño urbano del proyecto.

Las señales fueron ubicadas estratégicamente en los siguientes puntos críticos:

Ingreso principal, Pórtico de bienvenida, Zona de calistenia, Zona de descanso.

La actividad incluyó el replanteo de ubicaciones, fijación y anclaje de la señalización mediante [indicar método: pernos, adhesivo estructural, postes], garantizando adecuada visibilidad, estabilidad vertical y durabilidad frente a la intemperie. El objetivo fue informar y sensibilizar a los usuarios sobre el uso adecuado de los EPP y el correcto aprovechamiento de las instalaciones. Se da por finalizada la actividad con la limpieza del área y verificación de firmeza.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de señalización vertical de EPP y buen uso del parque.	und	4,00	$ 1.166.231	$ 4.664.924,00	4,00	$ 4.664.924,00	0,00	$ 0,00

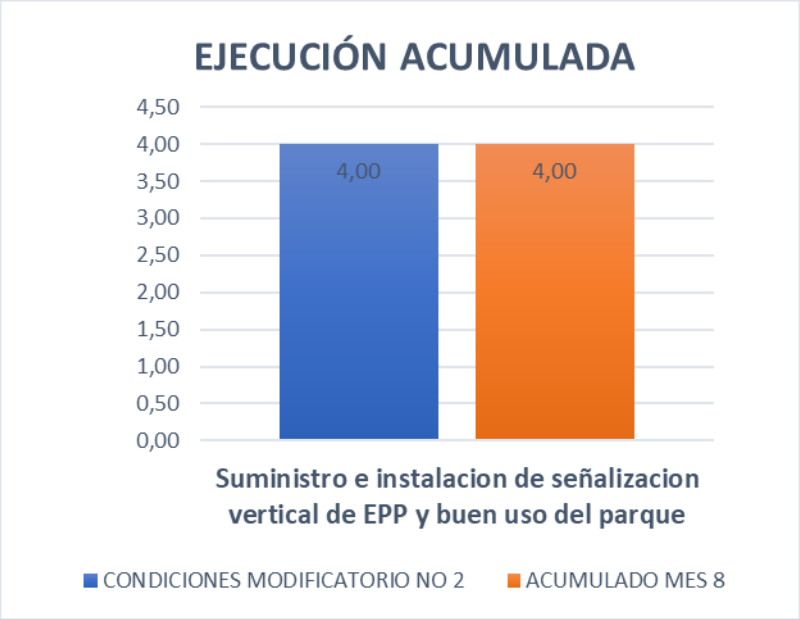


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



10.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPES DE CONCRETO PREFABRICADO PARA PARQUEADERO DE 50CM*14CM*15CM INCLUYE PINTURA AMARILLA.

Se realizó el suministro e instalación de topes de concreto prefabricado para parqueadero, con dimensiones de 50 cm x 14 cm x 15 cm, ubicados en las plazas de estacionamiento del proyecto, conforme a los planos de diseño de parqueaderos y especificaciones técnicas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de topes de concreto prefabricado para parqueadero de 50cm*14cm*15cm incluye pintura amarilla.	und	84,00	$ 244.523,00	$ 20.539.932,00	84,00	$ 20.539.932,00	0,00	$ 0,00

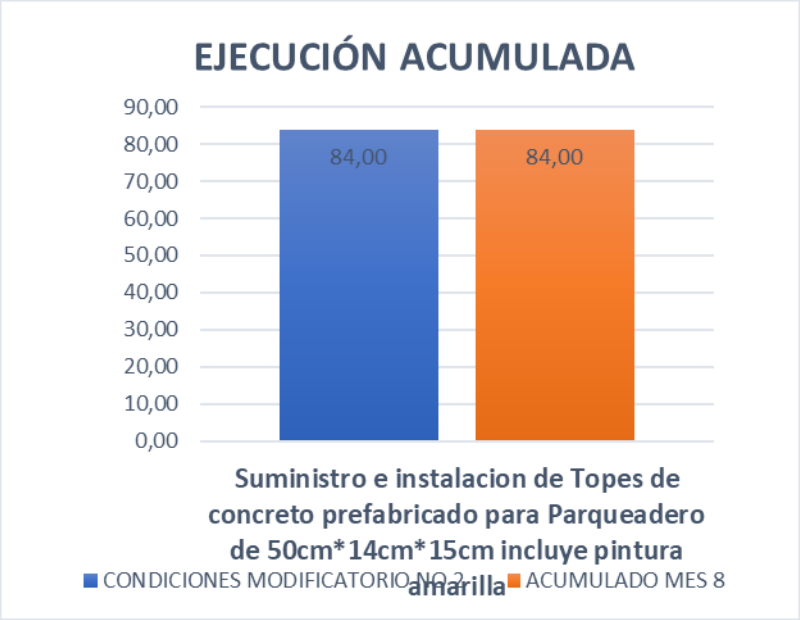


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



10.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDIN EN PRADO CHINO.

Para la presente actividad se realiza la ejecución de área verde inicialmente indicada en los planos arquitectónicos, mediante instalación de césped, incluyendo preparación del terreno enmienda de suelo con tierra vegetal, arena y materia orgánica según especificaciones agronómicas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de jardín en prado chino	m2	252,43	$ 94.830,00	$ 23.937.937,00	252,43	$ 23.937.937,00	0,00	$ 0,00

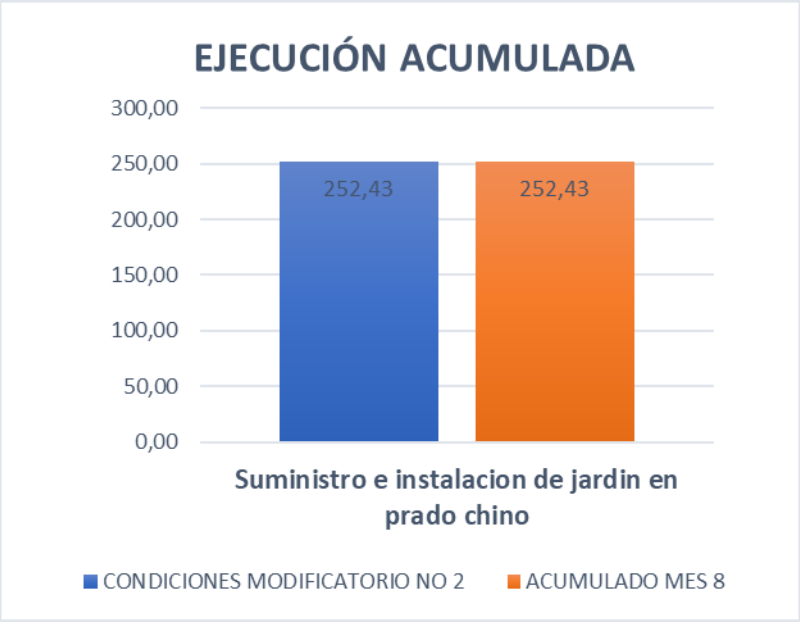


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



10.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES.

Para la presente actividad se realiza la ejecución de instalación de árboles en los diferentes contenedores de raíces previamente construidos, incluye la preparación del terreno enmienda de suelo con tierra vegetal, arena y materia orgánica según especificaciones agronómicas.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de arboles	und	13,00	$ 624.429,00	$ 8.117.577,00	13,00	$ 8.117.577,00	0,00	$ 0,00

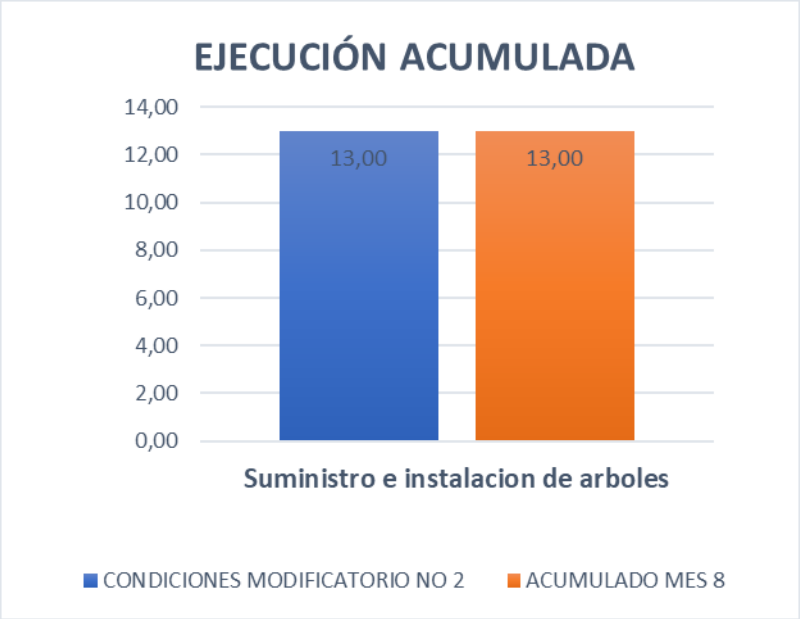

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A-10 (0,80M*0,50M*0,20M)

DESCRIPCIÓN

Se instaló sardinel prefabricados para delimitar las circulaciones peatonales y contener las estructuras de piso en diversas áreas del proyecto, incluyendo el andén perimetral al parqueadero, la zona de parkour y calistenia, y las bahías de parqueo paralelas a la vía de acceso vehicular.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20 m)	ML	403,34	$ 139.007,00	$ 56.067.083,00	403,34	$ 56.067.083,00	0,00	$ 0,00

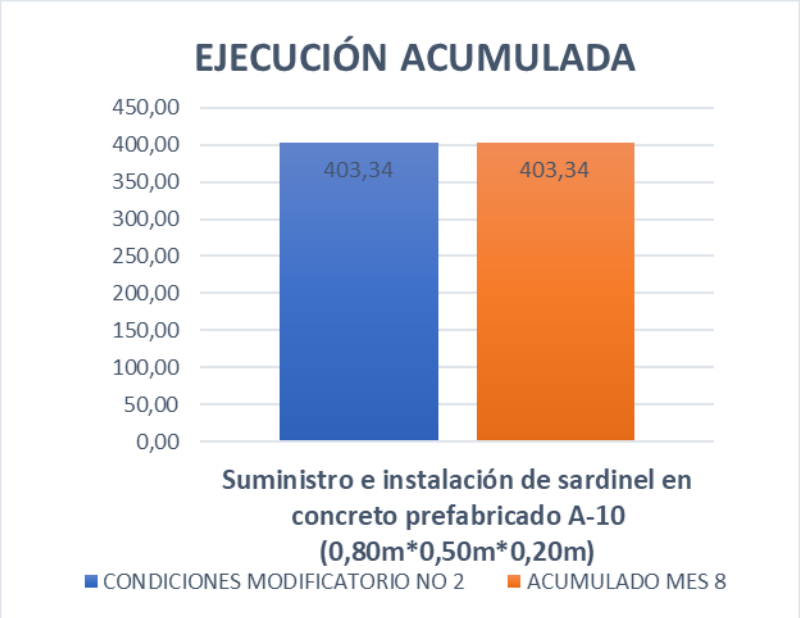

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO (0,80M*0,30M*0,20M)

DESCRIPCIÓN

Se instaló bordillo prefabricados para delimitar las circulaciones peatonales y contener las estructuras de piso en diversas áreas del proyecto, incluyendo el andén perimetral al parqueadero, la zona de parkour y calistenia, y las bahías de parqueo paralelas a la vía de acceso vehicular.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro E Instalación De Bordillo En Concreto Prefabricado (0,80m*0,30m*0,20 m)	ML	289,51	$ 128.533,00	$ 37.211.589,00	289,51	$ 37.211.589,00	0,00	$ 0,00

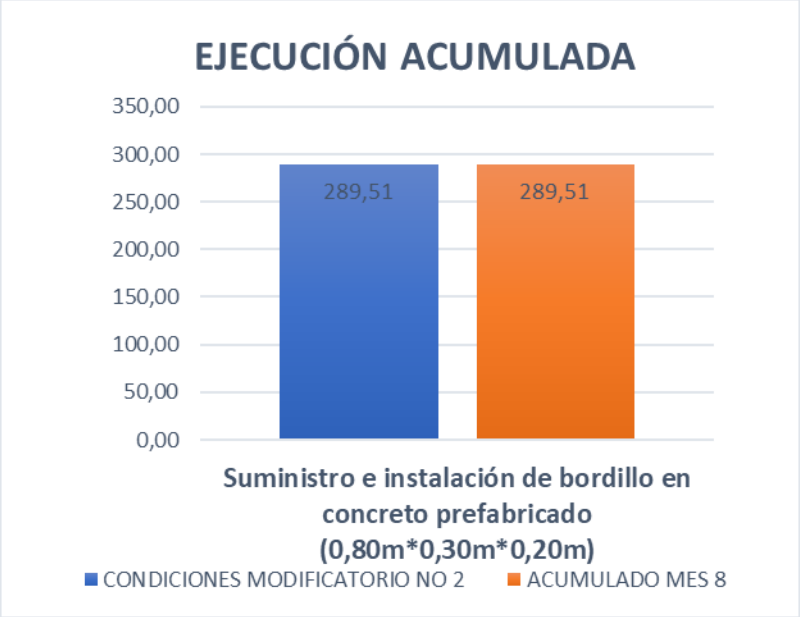

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN CONCRETO PARA CÁRCAMOS

DESCRIPCIÓN

Esta actividad contempla la instalación de rejillas en concreto para tapas de los cárcamos laterales. Estos elementos tienen la finalidad de evitar caídas hacia los mismos, así como evitar arrojar elementos de gran tamaño al sistema de desague.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	ML	63,20	$ 252.799,00	$ 15.976.897,00	63,20	$ 15.976.897,00	0,00	$ 0,00

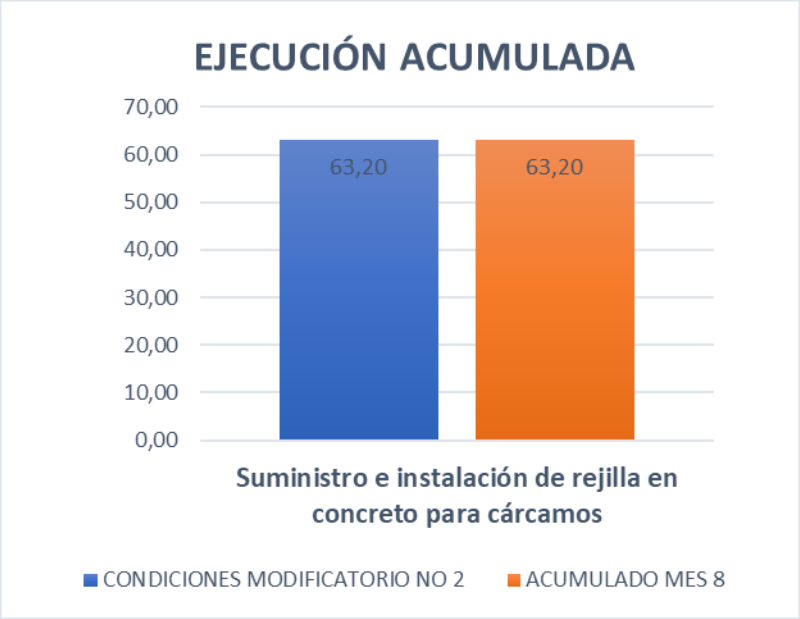

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.4. CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.00M X 1.00M X 1.00M) INCLUYE CINTA DE REMATE

DESCRIPCIÓN

El proyecto contempla la siembra de árboles en diferentes sectores, para lo cual se realiza la construcción de contenedores de raíces, los cuales actúan evitando que las raíces de los árboles sobresalgan a la superficie afectando los diferentes elementos como placas y bordillos a su alrededor.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	UND	13,00	$1.122.872	$ 14.597.336,00	13,00	$ 14.597.336,00	0,00	$ 0,00

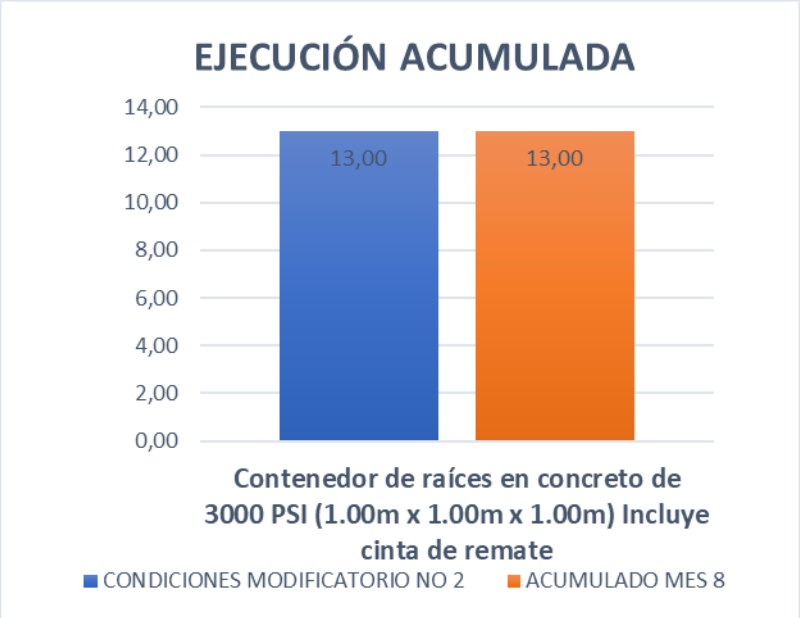

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA XX-257

DESCRIPCIÓN

Durante el proceso constructivo, se procedió a la instalación de malla electrosoldada en las áreas específicas del proyecto, con el fin de reforzar las placas en concreto. Esta instalación garantiza una mayor resistencia a las cargas, evitando fisuras y comportamientos no deseados de los elementos.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	10054,64	$ 16.345,00	$ 164.343.091,00	10054,64	$ 164.343.091,00	0,00	$ 0,00

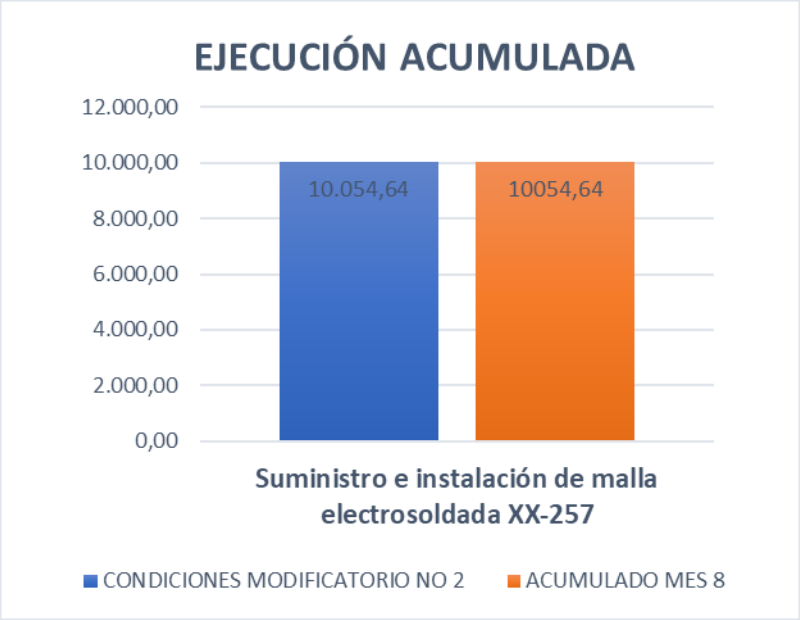

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.6. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SUB BASE GRANULAR

DESCRIPCIÓN

Para la presente actividad se realiza la colocación y compactación de sub base granular utilizada para resistir las cargas en las zonas requeridas son senderos peatonales, zona de parkour y demás, siguiendo los parámetros de uso de material y compactaciones del manual INVIAS, además de las especificaciones técnicas. Esta compactación se realizó por medios mecánicos con el fin de garantizar la estabilidad de la misma.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	430,73	$ 249.748,00	$ 107.573.956,00	430,73	$ 107.573.956,00	0,00	$ 0,00

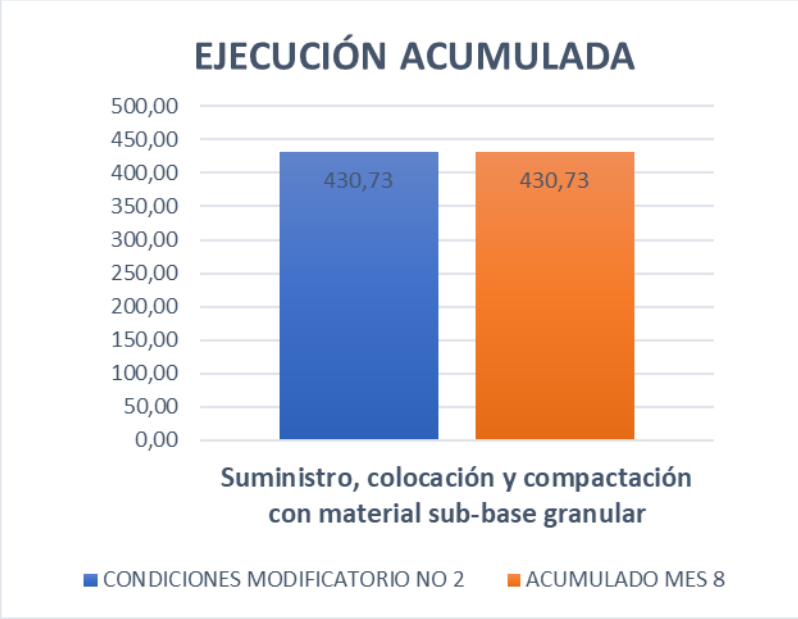

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.7. PUNTO HIDRÁULICO 1" PRESIÓN

DESCRIPCIÓN

Se instaló la tubería hidráulica en PVC (diámetros de 1” y ½”) para la red de agua potable, incluyendo los puntos de conexión destinados a sanitarios y lavamanos de los contenedores.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Punto hidráulico 1" presión	UND	3,00	$ 75.103,00	$ 225.309,00	3,00	$ 225.309,00	0,00	$ 0,00

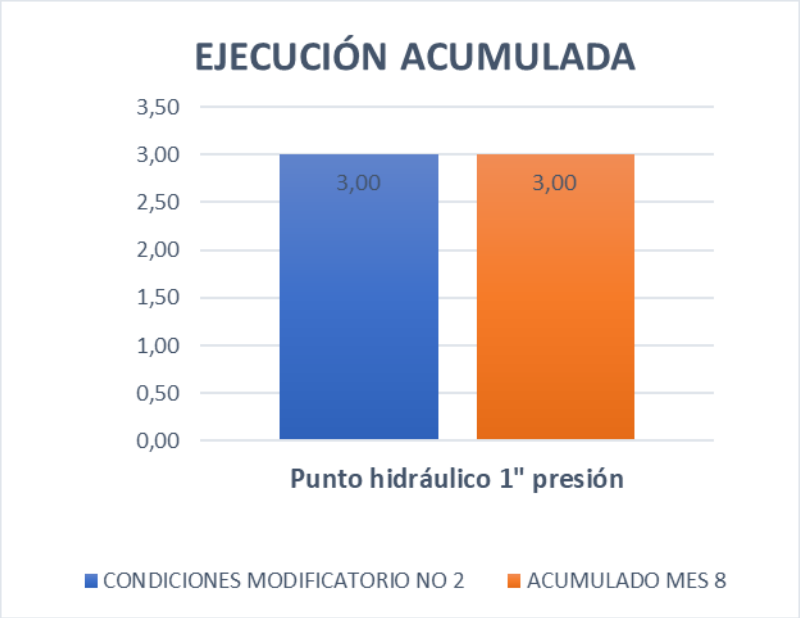


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.8. PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PRESIÓN

DESCRIPCIÓN

Se instaló la tubería hidráulica en PVC (diámetros de 1” y ½”) para la red de agua potable, incluyendo los puntos de conexión destinados a sanitarios y lavamanos de los contenedores.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Punto hidráulico 1/2" presión	UND	3,00	$ 48.257,00	$ 225.309,00	3,00	$ 144.771,00	0,00	$ 0,00

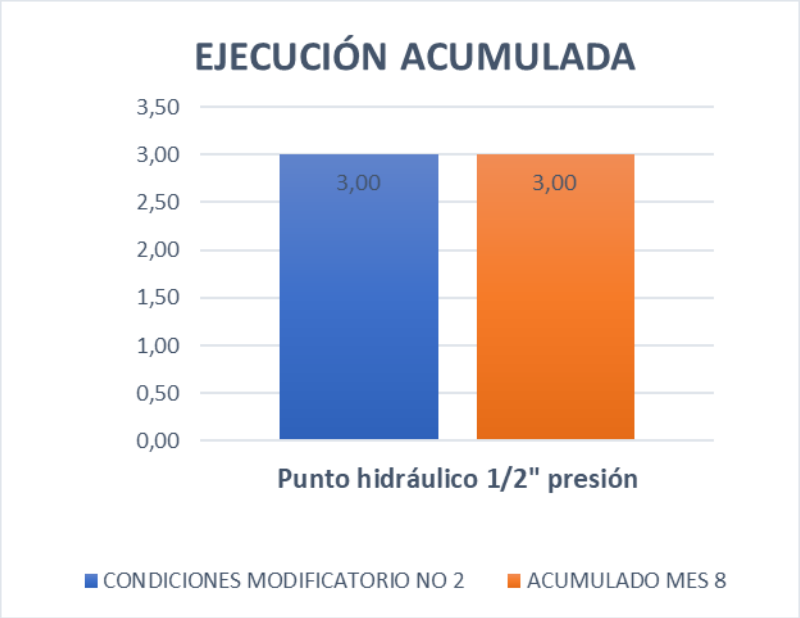


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO AÉREO CONVENCIONAL DE 15 KVA 13200/208-120 V

DESCRIPCIÓN

Para garantizar el suministro eléctrico del proyecto, se instaló un transformador de 15 kVA conectado a la red de media tensión existente. Como parte de esta intervención, se retiró la red ACSR, su estructura terminal y el poste actual en el área de conexión, con el fin de liberar espacio para la instalación de un nuevo poste de concreto de 12 m destinado a soportar el transformador y los sistemas eléctricos, cumpliendo con la normativa técnica vigente

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V	UND	1,00	$ 26.573.019	$ 26.573.019,00	1,00	$ 26.573.019,00	0,00	$ 0,00

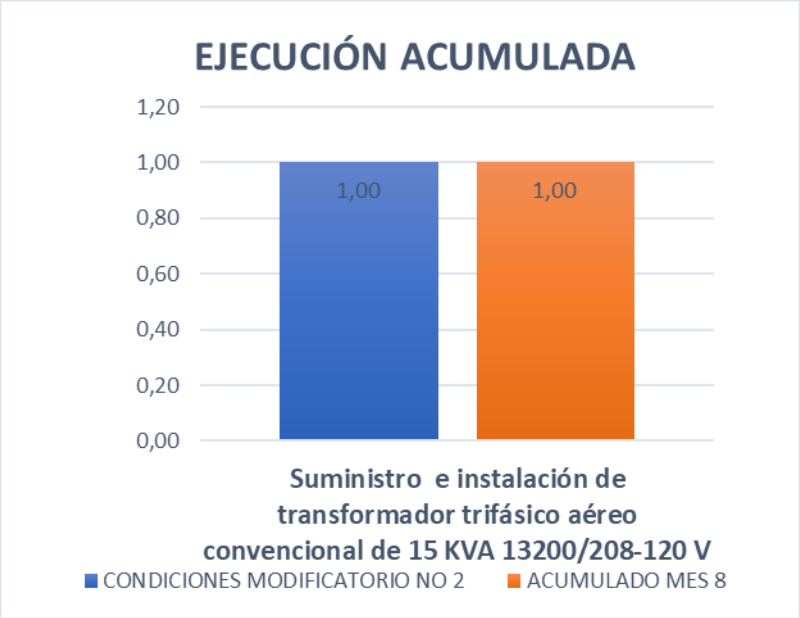

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.10. Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducterìa).

DESCRIPCIÓN

Durante el presente periodo se realizaron las actividades mencionadas anteriormente de red eléctrica, el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la acometida eléctrica

general en baja tensión, mediante conductores en cobre THWN calibre 3×#6 (Fases) + 1×#6 (Neutro) + 1×#8 (Tierra), desde los bornes del transformador hasta el Tablero General de Baja Tensión (TGBT), de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto y la normativa vigente. La actividad se ejecutó sin incluir ductería, conforme a las especificaciones contractuales.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducterìa).	ml	45,00	$ 137.776,00	$ 6.199.920,00	45,00	$ 6.199.920,00	0,00	$ 0,00

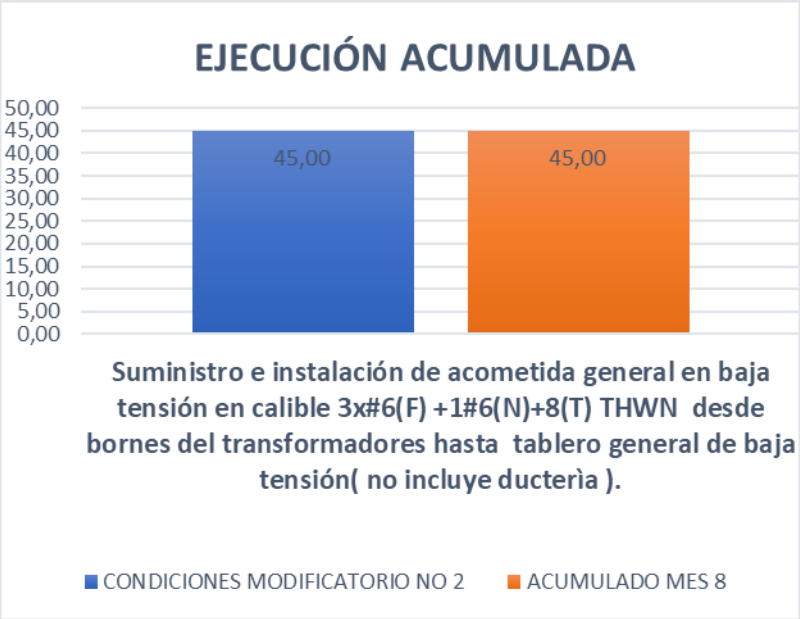

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%


11.11. Suministro e instalación de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestática, para control de suba cometidas e iluminación exterior. Incluye totalizador general, breaker para suba cometidas, temporizadores para iluminación exterior, barraje trifásico, frente muerto, placas de identificación.

DESCRIPCIÓN

Durante el presente periodo se realizaron las actividades mencionadas anteriormente de red eléctrica, el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la acometida eléctrica

general en baja tensión, mediante conductores en cobre THWN calibre 3×#6 (Fases) + 1×#6 (Neutro) + 1×#8 (Tierra), desde los bornes del transformador hasta el Tablero General de Baja Tensión (TGBT), de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto y la normativa vigente. La actividad se ejecutó sin incluir ductería, conforme a las especificaciones contractuales.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de Gabinete TGBT, elaborado en lámina galvanizada y pintura electroestática, para control de suba cometidas e iluminación exterior. Incluye totalizador general, breaker para suba cometidas, temporizadores para iluminación exterior, barraje trifásico, frente muerto, placas de identificación.	und	1,00	$ 13.995.224	$ 13.995.224,00	1,00	$ 13.995.224,00	0,00	$ 0,00

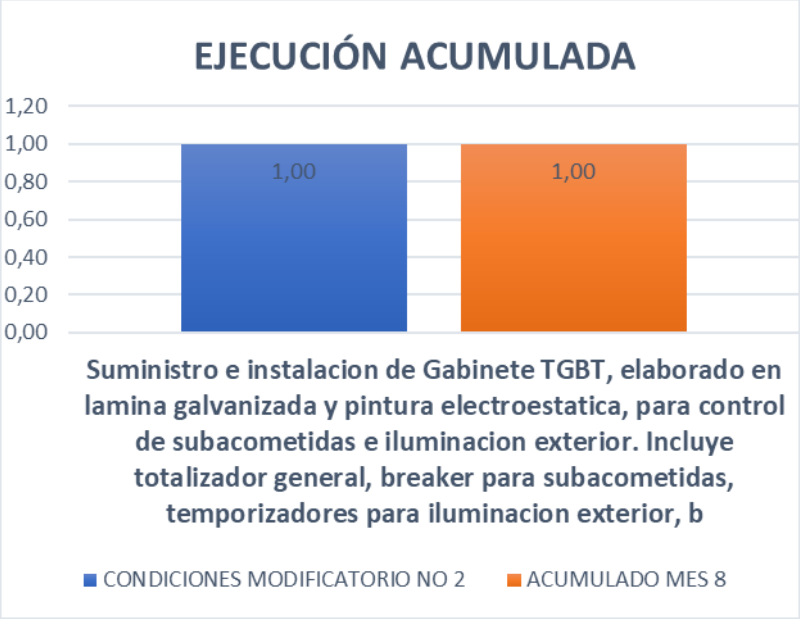

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.12. Suministro e instalación de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para suba cometida desde TGBT hasta tablero de Iluminación exterior y eventos.

DESCRIPCIÓN

Durante el presente periodo se realizaron las actividades mencionadas anteriormente de red eléctrica, el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la acometida eléctrica general en baja tensión, mediante conductores en cobre THWN calibre 3×#6 (Fases) + 1×#6 (Neutro) + 1×#8 (Tierra), desde los bornes del transformador hasta el Tablero General de Baja Tensión (TGBT), de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto y la normativa vigente. La actividad se ejecutó sin incluir ductería, conforme a las especificaciones contractuales.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para suba cometida desde TGBT hasta tablero de Iluminación exterior y eventos.	ml	66,00	$ 96.662,00	$ 13.995.224,00	66,00	$ 6.379.692,00	0,00	$ 0,00

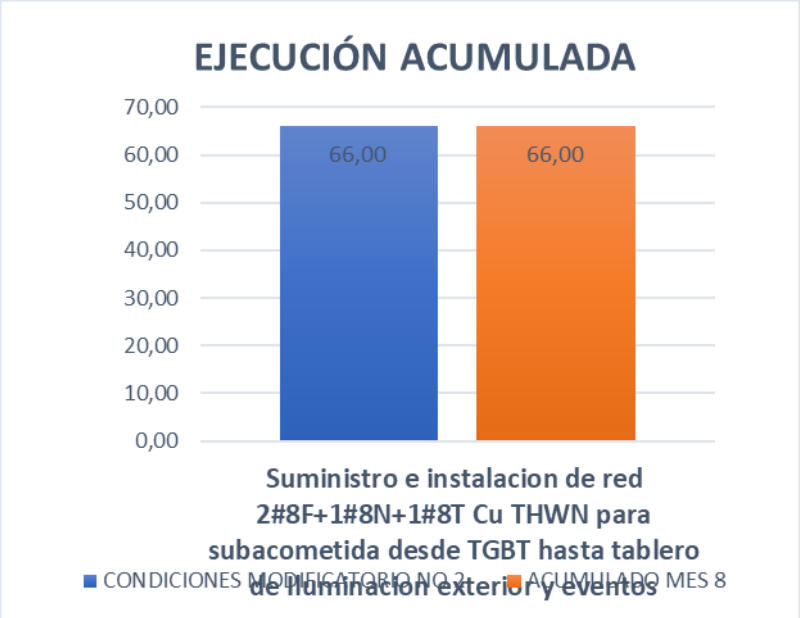


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.13. Suministro e instalación de cable aluminio #6 S8000 para alimentación de iluminación exterior.

DESCRIPCIÓN

Durante el presente periodo se realizaron las actividades mencionadas anteriormente de red eléctrica, el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la acometida eléctrica general en baja tensión, mediante conductores en cobre THWN calibre 3×#6 (Fases) + 1×#6 (Neutro) + 1×#8 (Tierra), desde los bornes del transformador hasta el Tablero General de Baja Tensión (TGBT), de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto y la normativa vigente. La actividad se ejecutó sin incluir ductería, conforme a las especificaciones contractuales.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de cable aluminio #6 S8000 para alimentación de iluminación exterior	ml	30,00	$ 33.456,00	$ 1.003.680,00	30,00	$ 1.003.680,00	0,00	$ 0,00

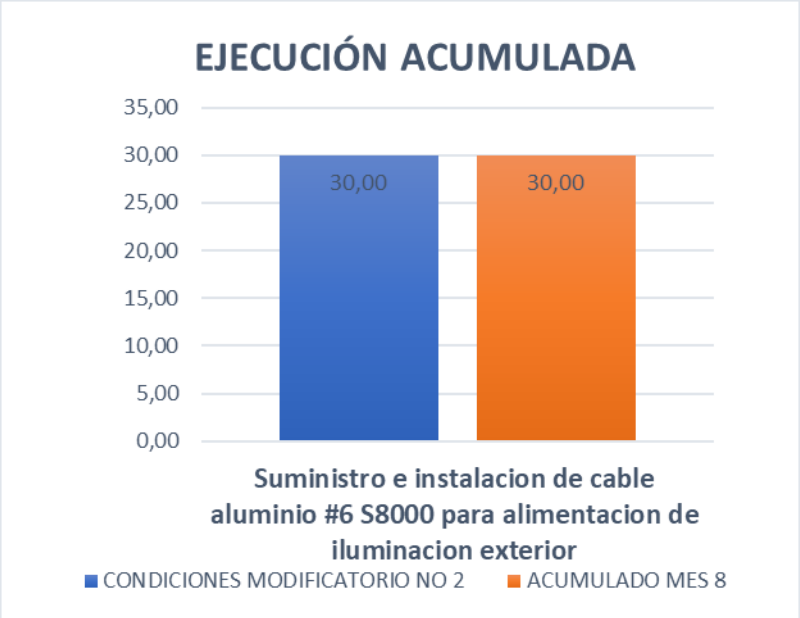


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.14. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" DB

DESCRIPCIÓN

Se instaló tubería eléctrica en PVC de 1” para el tendido de conductores de las balas eléctricas de piso, conforme a los planos aprobados, cumpliendo con las pendientes, alineación y profundidad requeridas. Las acometidas se identificaron, sellaron y protegieron adecuadamente, garantizando la integridad del cableado y facilitando futuras labores de mantenimiento

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubería PVC de 1" DB	UND	170,00	$ 36.022,00	$ 6.123.740,00	170,00	$ 6.123.740,00	0,00	$ 0,00

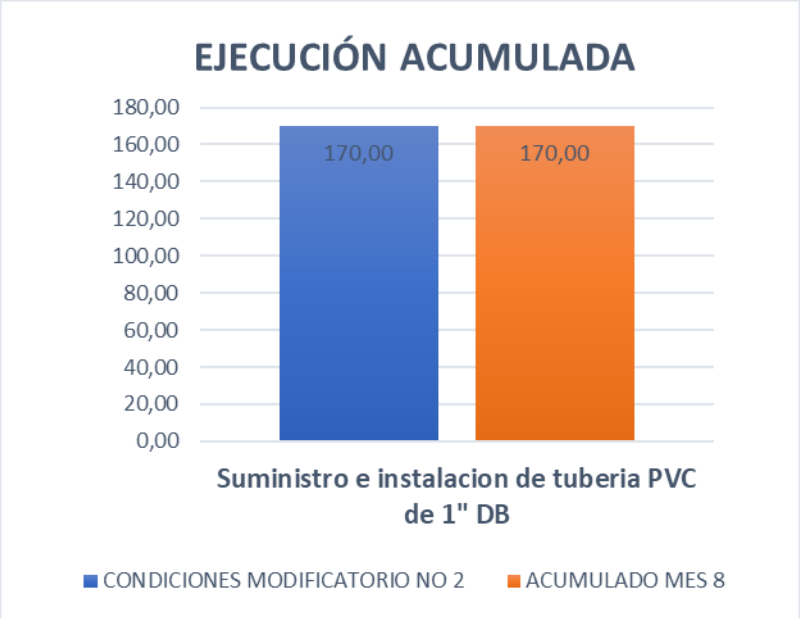

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.15. Suministro e instalación de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cableado encauchetado terminales y demás accesorios.

DESCRIPCIÓN

Se instaló luminaria led empotrada en piso para iluminación indirecta con el fin de mejorar la visibilidad de las diferentes rampas, esto cumpliendo con todos los parámetros y normativa vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cableado encauchetado terminales y demás accesorios	UND	24,00	$ 1.011.864	$ 24.284.736,00	24,00	$ 24.284.736,00	0,00	$ 0,00

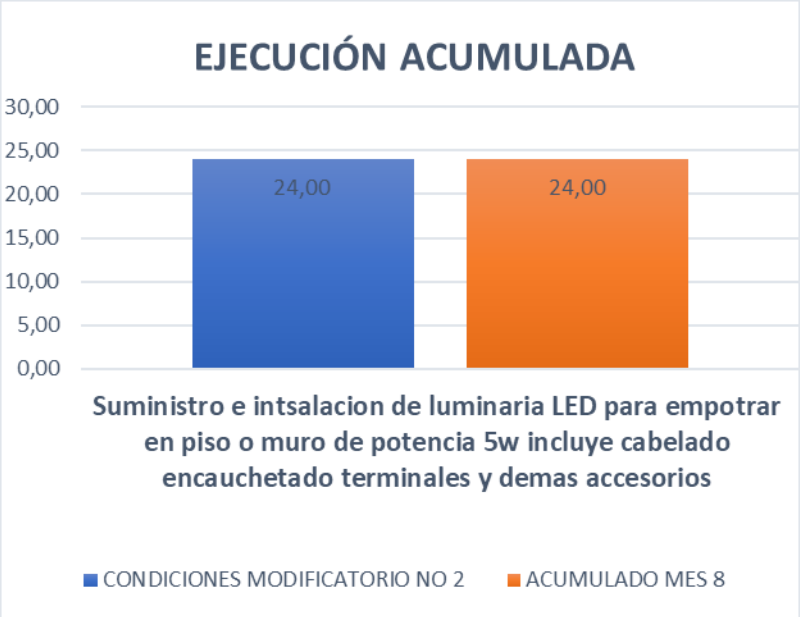


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.16. Suministro e instalación de herrajes para adecuación de estructura de sistema de medida de 3 elementos tipo exterior para 13,2KV, incluye parrilla soporte para transformadores de corriente y de potencial, CT's y PT's.

DESCRIPCIÓN

Se instalaron herrajes para la estructura y medida de elementos exteriores incluyendo soporte para transformador.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de herrajes para adecuación de estructura de sistema de medida de 3 elementos tipo exterior para 13,2KV, incluye parrilla soporte para transformadores de corriente y de potencial, CT's y PT's.	UND	1,00	$ 37.279.920	$ 37.279.920,00	1,00	$ 37.279.920,00	0,00	$ 0,00

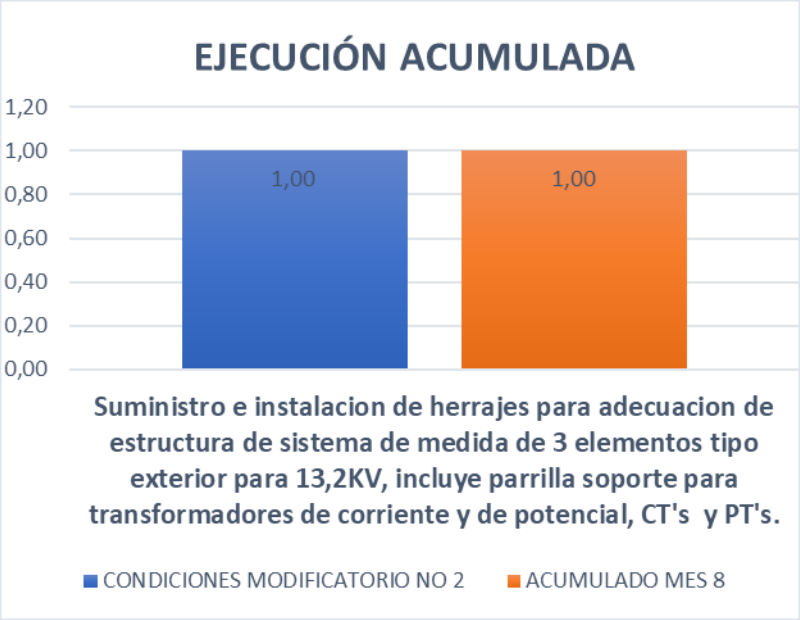


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.17. Suministro e instalación de sistema de medida, incluye medidor principal y de respaldo, gabinete de medida con borneras para señales de tensión y de corriente, nicho de ladrillo a la vista, SPT y demas elementos.

DESCRIPCIÓN

Para la presente actividad se contempla la instalación de sistema de medida.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de sistema de medida, incluye medidor principal y de respaldo, gabinete de medida con borneras para señales de tension y de corriente, nicho de ladrillo a la vista, SPT y demas elementos.	UND	1,00	$ 28.889.884	$ 28.889.884,00	1,00	$ 28.889.884,00	0,00	$ 0,00

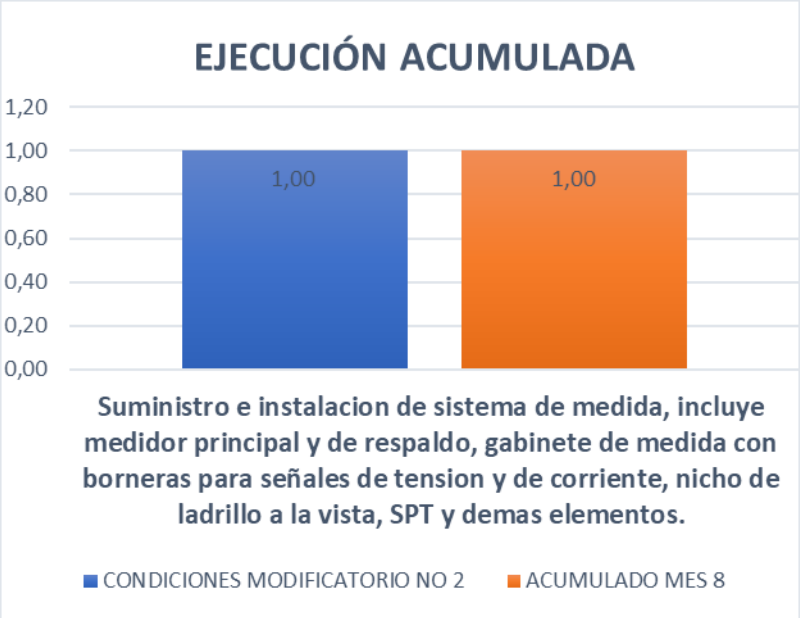


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.18. Retiro de sistema de medida existente.

DESCRIPCIÓN

Como parte del proceso, se efectuó el retiro del sistema de medida existente, garantizando la adecuada disposición y sustitución por el nuevo sistema instalado.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Retiro de sistema de medida existente.	UND	1,00	$ 2.274.482	$ 2.274.482,00	1,00	$ 2.274.482,00	0,00	$ 0,00

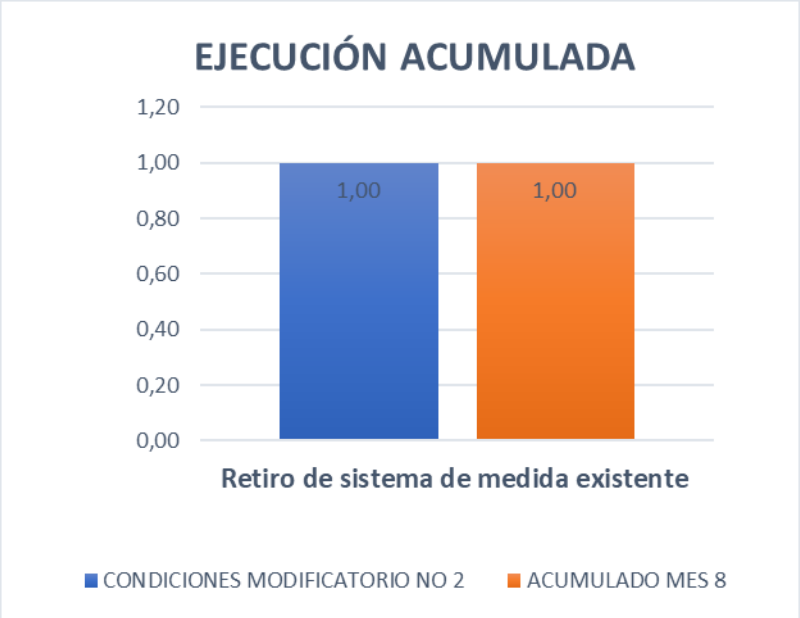


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.19. RETIRO DE RED ACSR, ESTRUCTURA TERMINAL Y POSTE 12 MTS EXISTENTE

DESCRIPCIÓN

Para garantizar el suministro eléctrico del proyecto, se instaló un transformador de 15 kVA conectado a la red de media tensión existente. Como parte de esta intervención, se retiró la red ACSR, su estructura terminal y el poste actual en el área de conexión, con el fin de liberar espacio para la instalación de un nuevo poste de concreto de 12 m destinado a soportar el transformador y los sistemas eléctricos, cumpliendo con la normativa técnica vigente

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Retiro de red ACSR, estructura terminal y poste 12 mts existente	UND	1,00	$ 821.425,00	$ 821.425,00	10,00	$ 821.425,00	0,00	$ 0,00

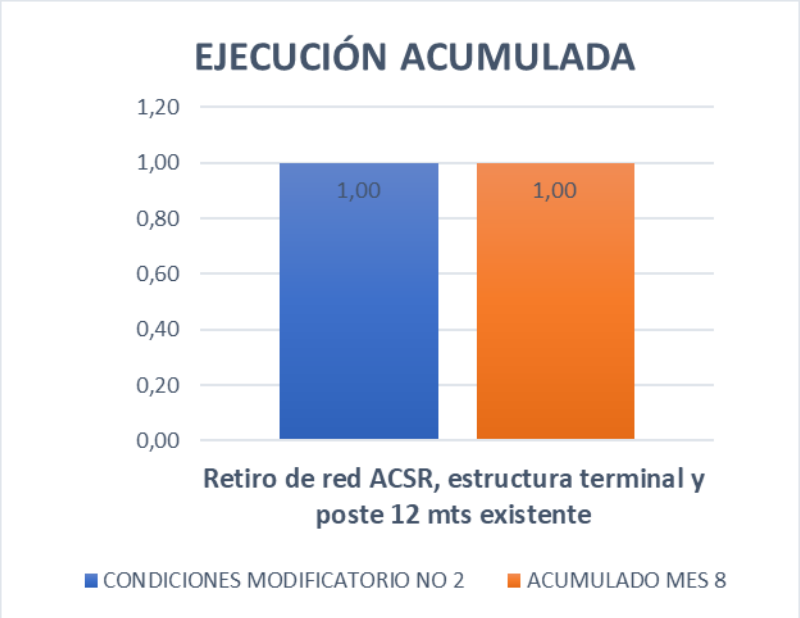


Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

11.20. TRAMITE ANTE ORGANISMO DE INSPECCION PARA CERTIFICADO RETIE, SISTEMA DE MEDIDA, SUBESTACION AEREA, ACOMETIDA PRINCIPAL Y USO FINAL.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad contempla los trámites ante el Organismo de Inspección Acreditado para la obtención del certificado de conformidad RETIE, correspondiente al sistema de medida, subestación aérea, acometida principal y uso final, así como los trámites ante el operador de red, dejando la instalación eléctrica debidamente legalizada y en condiciones óptimas de funcionamiento.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Tramite ante organismo de inspeccion para certificado RETIE, Sistema de medida, subestacion aerea, acometida principal y uso final	UND	1,00	$ 5.830.239	$ 5.830.239,00	1,00	$ 5.830.239,00	0,00	$ 0,00

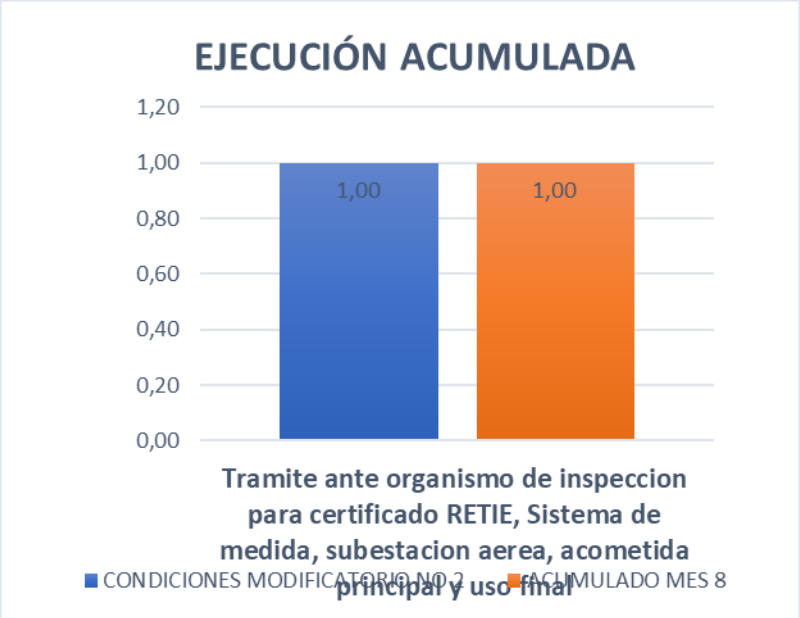

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




11.20. TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad contempla los trámites ante el Organismo de Inspección Acreditado para la obtención del certificado de conformidad RETIE, correspondiente al sistema de medida, subestación aérea, acometida principal y uso final, así como los trámites ante el operador

de red, dejando la instalación eléctrica debidamente legalizada y en condiciones óptimas de funcionamiento.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Trámites ante operador de red	UND	1,00	$ 658.014,00	$ 658.014,00	1,00	$ 658.014,00	0,00	$ 0,00

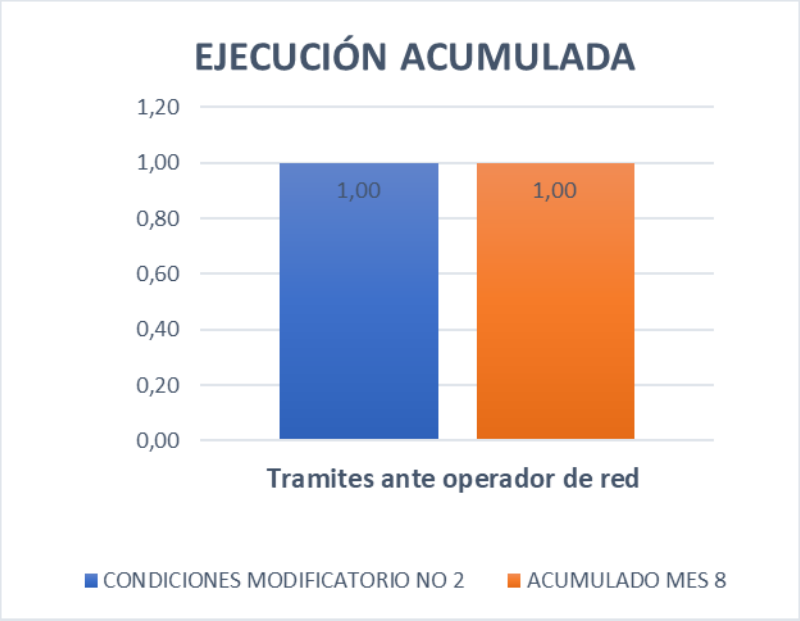

Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

- Entrega de dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores y la socialización de la vinculación a los sistemas generales de seguridad social.
- En cada una de las áreas intervenidas se dispone el material en zonas indicadas por la interventoría con su respectiva señalización y se despejan áreas de circulación. Se colocó cerramiento en poli sombra para aislar las zonas de trabajos.
- Se responderá a las quejas y reclamos de la comunidad dando la solución pertinente.
- Entrega de elementos de protección personal al personal de obra.
- Almacenamiento de residuos peligrosos.
- Señalización de obra.
- Socialización previa a iniciar proyecto con la comunidad.

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos y dando cabalidad a los requerimientos establecidos, el informe de Plan de Manejo ambiental se presentará como anexo a este informe.

Esta actividad tiene un avance por tiempo del 100%.

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

- La interventoría mediante presencia en obra ha realizado un seguimiento permanente al desarrollo de la obra ejecutada. Es así, como ha informado y conceptuado de forma continua y periódica, sobre el avance, problemas presentados, sugerencias y soluciones en el desarrollo de las obras contratadas.
- Revisión de especificaciones técnicas.
- Solicitud de hojas de vida del personal profesional.
- Revisión de afiliación al sistema de seguridad social del personal vinculado a la obra. Ver Anexo: “Planillas de Dotación y Afiliaciones de obra”
- Realización de memorias de cálculo correspondientes a cada ítem del contrato de obra.
- Revisión de entrega de EPPS a personal de obra Ver Anexo: “Planillas de dotación y afiliaciones de obra”.

8.1. INFORME DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

Para el proyecto, la gestión socio ambiental realizara las siguientes actividades:

- Establecer de manera coordinada convenios de trabajo en temas sociales con los representantes de la comunidad.
- Evaluar las matrices con las comunidades trimestralmente, en caso que se encuentren expuestas algún riesgo ambiental.
- Revisión de información y documentación eficaz para el intercambio de información entre los usuarios y los organismos interesados en la solución de los problemas socio-ambientales de la comunidad del sector.
- Capacitaciones de componente ambiental al personal de obra.
- Revisión de actividades y acciones dirigidas a perfeccionar el desempeño social de la comunidad del sector.

8.2. GESTIÓN SOCIAL

La labor de Gestión Social se orienta a:

- Afiliación del personal contratado por parte de CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA al Sistema General de Seguridad Social.
- Verificación de la entrega de Dotación al personal de obra no calificada por parte del contratista CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA.
- Verificación de seguridad social por parte de la interventoría CONSORCIO INTER DEPORTES del personal contratado para la obra.
- Se realizó socialización del proyecto antes de dar inicio con las actividades.
- Se realiza atención a la comunidad cada vez que ellos lo soliciten.
- Reuniones permanentes con el personal obrero para resolver inquietudes.

9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

9.1. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR LA INTERVENTORÍA

El personal presente para la ejecución del contrato se relaciona en los siguientes cuadros, desagregando el personal por cargos y presentando el listado de personal con sus novedades:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Director de Interventoría	1	Si
Residente de interventoría	1	Si
Topógrafo	1	Si
Cadenera	1	Si
PERSONAL TOTAL	**4**	**TODOS**

9.2. RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato:

EQUIPO	CANTIDAD
Equipo de topografía	1
Mezcladora de concreto	1
Benitin compactador	1
Retrocargador	1
Volquetas	4
Planta de energía	1
Tronzadora	1
Vibrador de concreto	1



Minicargador.



Retrocargador.



Mezcladora de concreto.



Benitin compactador.

	
Planta eléctrica.	***Compactador neumático.***


9.3. ALMACENAMIENTO DE MATERIAL.

	
Loseta prefabricada.	***Ladrillo.***

	
Almacenamiento de material.	***Almacenamiento de material.***

9.4. RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO.

El valor ejecutado en dinero hasta el momento por el contratista corresponde a $ $4.116.550.974,00 vs el valor contractual corresponde a $4.116.550.974,00 para un total ejecutado de aproximadamente de 100,00% frente a un programado 100,00%, evidenciando que el proyecto se encuentra finalizado por parte del contratista de obra.

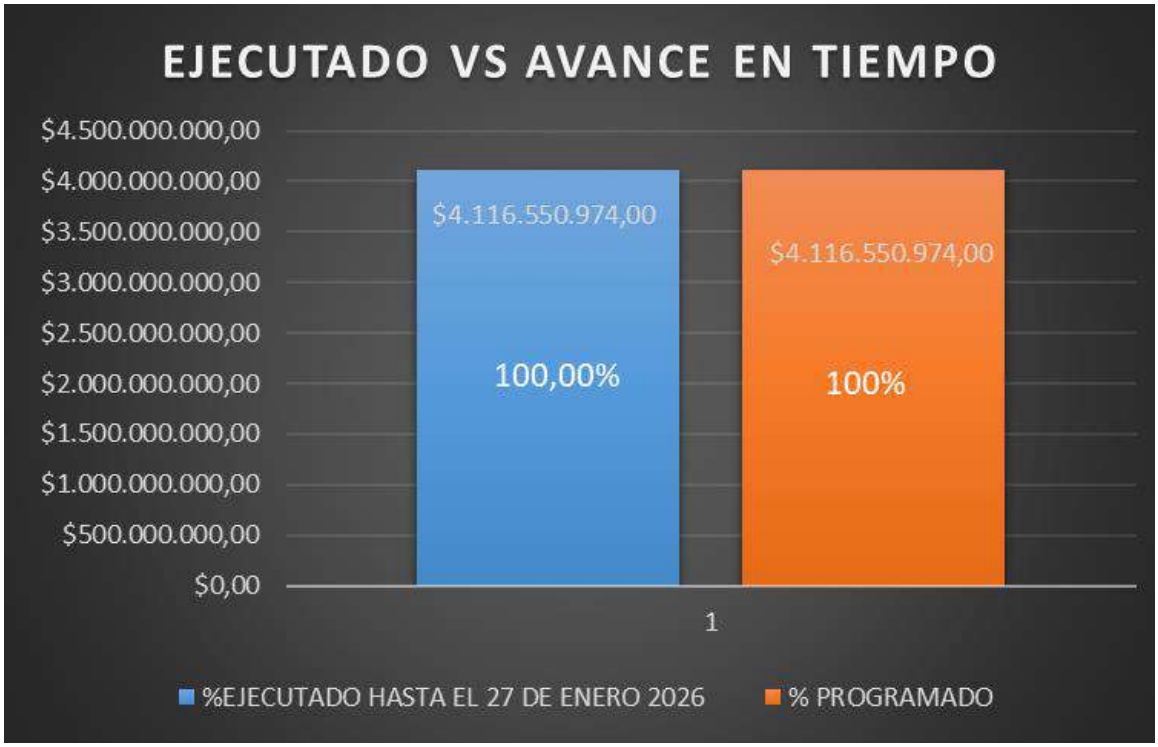



9.5. RELACIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA VS EL AVANCE EN TIEMPO DE LA OBRA.

RESUMEN EJECUCIÓN 28 DE MAYO 2025 – 27 DE ENERO 2026		
	DÍAS	**PORCENTAJE %**
PLAZO TOTAL	**244**	**100,00%**
TIEMPO TRANSCURRIDO	**244**	**100%**
PLAZO DISPONIBLE	**0**	**0,00%**
EJECUTADO A LA FECHA	**$4.116.550.974,00**	**100,00%**
SALDO POR EJECUTAR	**$0,00**	**0,00%**



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance de las obras se evidencia que la totalidad de las obras han sido culminadas.
- Se da por finalizada la ejecución de todas las actividades contempladas en el contrato, incluyendo la acometida de agua potable, mobiliario urbano adecuación del Skatepark, señalización vial topes de parqueadero y zonas verdes en prado chino.
- Se verifica el cumplimiento de los aspectos sociales y laborales fundamentales: dotación adecuada de EPP, afiliación vigente al sistema de seguridad social y desarrollo de acciones de socialización con la comunidad, lo cual contribuye positivamente a la sostenibilidad del proyecto.
- Todas las obras fueron ejecutadas conforme a los planos aprobados, especificaciones técnicas, normas legales vigentes (NTC, Reglamento Técnico) y los estándares de calidad exigidos por la Interventoría.
- Se realizaron y aprobaron las pruebas de funcionamiento, estanqueidad y estabilidad en cada uno de los sistemas instalados (hidráulico, eléctrico, estructural y vegetal), garantizando su operatividad inmediata.

- La interventoría reitera su compromiso de seguimiento riguroso, tanto en lo técnico como en lo administrativo, y recomienda a la Entidad Contratante mantener una supervisión activa para garantizar la culminación oportuna y conforme del proyecto.
- La interventoría mediante este informe pone en total conocimiento a la entidad contratante.



NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L UT INTER DEPORTES 2025
INTERVENTORIA

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

INFORME DE SUPERVISION ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1007-25
CONTRATO DE OBRA No 0889-25

INTRODUCCION

Para el presente contrato se realiza la construcción del parque de deportes extremos y alternativos del distrito de Barrancabermeja con el finde incentivar la práctica de diferentes deportes como el skateboarding, BMX, calistenia, entre otros, para el cual se requiere la construcción de muros de contención, excavaciones mecánicas y manuales, rellenos y compactación de material seleccionado, fundida de placas de concreto, aplicación de material de base y subbase granular, instalación de bordillos y sardineles y aplicación de asfalto, así como componente eléctrico, con el fin de ejecutar correctamente el proyecto.

- **GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA FIRMA UT INTER DEPORTES 2025

CONTRATO No:	1007-25
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	UT INTER DEPORTES 2025
NIT:	901.926.678-6
REPRESENTANTE LEGAL:	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.095.816.909 EXPEDIDA EN FLORIDABLANCA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($431.256.000)
ACTA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE 2025.
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	OCHO (08) MESES
CDP:	25-01012 del 13 de febrero del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Registro presupuestal número 25-02201 del 01 de abril del 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.16808641 del 16 de abril de 2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 de marzo de 2025.
FECHA ACTA DE INICIO: 28 de mayo de 2025.
FECHA DE TERMINACION: 27 de enero de 2026.

El 19 de marzo de 2025 EL DISTRITO y la firma contratista UT INTER DEPORTES. suscribieron el contrato de interventoría No. 1007-25, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"; el valor total del contrato suscrito corresponde al valor en dinero aportado por el distrito, el cual el total asciende a la suma de: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($431.256.000)

El día 28 de mayo de 2025 se suscribió el Acta de inicio del contrato de obra pública No. 0889-25.

El día 05 de agosto de 2025 se suscribió el Acta de cobro parcial No 1 del contrato de interventoría 1007-25

El día 23 de septiembre de 2025 se suscribió el Acta de cobro parcial No 2 del contrato de interventoría 1007-25

El día 21 de octubre de 2025 se suscribió el Acta de Adición en plazo No 1 del contrato de interventoría 1007-25

El día 23 de septiembre de 2025 se suscribió el Acta de cobro parcial No 2 del contrato de interventoría 1007-25

El día 13 de noviembre de 2025 se suscribió el Acta de cobro parcial No 3 del contrato de interventoría 1007-25

El día 05 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Adición en plazo No 2 del contrato de interventoría 1007-25

El día 12 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de cobro parcial No 4 del contrato de interventoría 1007-25

El día 27 de enero de 2026 se suscribió el Acta de terminación del contrato de interventoría 1007-25.

El día 26 de marzo de 2026 se suscribió el Acta de recibo final del contrato de interventoría 1007-25.

Que, para el cumplimiento del objeto del contrato de Obra, se han estimado los siguientes ítems de ejecución.

PRELIMINARES

Para el presente capitulo, ser realizaron las actividades necesarias antes de comenzar la ejecución de los trabajos de construcción las cuales tienen que ver con la planificación, adecuación del terreno, definición de trazado, entre otras, dentro de la cual se destacan Localización y Replanteo. Se ha alcanzado un avance acumulado del 100%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		Preliminares				
	1,1	Localización y replanteo del area del proyecto	5970,70	$ 31.429.765,00	5970,70	$ 31.429.765,00
Subtotal				$ 31.429.765,00		$ 31.429.765,00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Este capítulo comprende las actividades de excavación, relleno, mejoramiento de la subrasante y disposición de material excedente, ejecutadas conforme a las profundidades y estratigrafías definidas en el estudio geotécnico, los planos de diseño y las especificaciones técnicas del proyecto. Se incluye el suministro, extendido y compactación controlada de capas de recebo y subbase, garantizando el cumplimiento de los espesores, resistencia y grados de compactación establecidos por la normativa vigente. Las actividades contempladas son: excavaciones manuales y mecánicas, rellenos con material de sitio y recebo, y transporte y disposición final del material sobrante en botaderos autorizados. Se ha alcanzado un avance acumulado del 100%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2		**Movimiento de tierra**				
	2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	161,83	$ 12.818.231,00	161,83	$ 12.818.231,00
	2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	1399,44	$ 46.755.290,00	1399,44	$ 46.755.290,00
	2,3	Relleno y compactación con material de sitio	217,80	$ 4.831.675,00	217,80	$ 4.831.675,00
	2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	2105,07	$ 203.412.914,00	2105,07	$ 203.412.914,00
	2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular	353,00	$ 88.677.836,00	353,00	$ 88.677.836,00
	2,6	Retiro de material sobrante existente	13826,47	$ 203.221.456,00	13826,47	$ 203.221.456,00
Subtotal				$ 559.717.402,00		$ 559.717.402,00

CONCRETOS Y ASFALTO

Una vez verificadas y aprobadas las actividades de mejoramiento del terreno, se procedió con la fundición de concreto ciclópeo como capa de estabilización y acondicionamiento de la subrasante. Posteriormente, se instaló el acero de refuerzo conforme a los planos estructurales y se ejecutó la fundición de zapatas de cimentación y muros de contención en las zonas definidas del proyecto, bajo estricto control de calidad y en concordancia con el proceso constructivo y las especificaciones técnicas validadas por la consultoría.

En fase de avance programado, se realizó la pavimentación de la vía principal, garantizando el cumplimiento de espesores de capa, dosificación del concreto, curado, alineación y compactación según normativa vigente. De igual forma, se ejecutó la instalación de losetas prefabricadas, verificando en campo su nivelación, alineación geométrica, espesor de juntas, anclaje y comportamiento estructural conforme a los detalles constructivos aprobados.

Todas las actividades fueron inspeccionadas, registradas fotográficamente y documentadas en actas de verificación, asegurando la trazabilidad técnica, el cumplimiento de los estándares de calidad y el avance conforme al cronograma contractual. Se ha alcanzado un avance acumulado del 100%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3		Concretos y asfalto				
	3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	91,43	$ 53.205.220,00	91,43	$ 53.205.220,00
	3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	1,44	$ 1.292.475,00	1,44	$ 1.292.475,00
	3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	144,57	$ 118.349.484,00	144,57	$ 118.349.484,00
	3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	2352,79	$ 360.200.385,00	2352,79	$ 360.200.385,00
	3,5	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	810,49	$ 128.799.829,00	810,49	$ 128.799.829,00
	3,6	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	810,49	$ 117.466.747,00	810,49	$ 117.466.747,00
	3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	109,07	$ 103.240.318,00	109,07	$ 103.240.318,00
	3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	7,95	$ 5.894.750,00	7,95	$ 5.894.750,00
	3,9	Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos	5,97	$ 5.652.659,00	5,97	$ 5.652.659,00
	3,10	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado 1m*0,40m*0,15m	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,11	Acero de refuerzo	16755,42	$ 239.870.593,00	16755,42	$ 239.870.593,00
	3,12	Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1	1765,00	$ 13.500.485,00	1765,00	$ 13.500.485,00
	3,13	Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.	176,50	$ 295.792.114,00	176,50	$ 295.792.114,00
	3,14	Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	1541,21	$ 37.935.343,00	1541,21	$ 37.935.343,00
	3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	2,99	$ 618.479,00	2,99	$ 618.479,00
	3,16	Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico	0,57	$ 516.345,00	0,57	$ 516.345,00
	3,17	Suministro e instalación acero para cubiertas de container	606,50	$ 64.159.932,00	606,50	$ 64.159.932,00
	3,18	Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	703,80	$ 161.129.380,00	703,80	$ 161.129.380,00
	3,19	Suministro e instalación de podotáctil 0.40 x 0.40 color gris	147,75	$ 36.609.052,00	147,75	$ 36.609.052,00
	3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	4,91	$ 4.304.749,00	4,91	$ 4.304.749,00
Subtotal				$ 1.748.538.339,00		$ 1.748.538.339,00

MAMPOSTERIA Y ACABADOS

En el componente Mampostería y acabados, se ha alcanzado un avance acumulado del 100 % en la ejecución de la mampostería estructural con refuerzo vertical y horizontal, cumpliendo con las especificaciones técnicas en cuanto a separaciones y calibres del acero de refuerzo (. Asimismo, se ha avanzado en la aplicación del friso impermeabilizado en muros, incluyendo la correcta ejecución de dilataciones y filos para garantizar continuidad y evitar fisuración. Estas actividades se verificaron conforme a los planos arquitectónicos y normativa aplicable, asegurando la estabilidad y durabilidad de los acabados.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4		Mamposteria y acabados				
	4,1	Mamposteria en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)	28,70	$ 3.913.446,00	28,70	$ 3.913.446,00
	4,2	Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos	62,62	$ 2.253.005,00	62,62	$ 2.253.005,00
	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3	38,46	$ 5.547.240,00	38,46	$ 5.547.240,00
Subtotal				$ 11.713.691,00		$ 11.713.691,00

COMPONENTE ELECTRICO

Se han completado actividades críticas en la red de media tensión y subestación eléctrica, entre las que destacan: la instalación del poste en concreto de 12 m, la estructura de arranque (incluyendo cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería), una caja de inspección 0.60 × 0.60 m, y el banco de 3 ductos PVC de 3" para la red subterránea. Este avance sienta las bases para la conexión a la red principal, pero requiere culminar las etapas de transformación, distribución y protección para garantizar la operatividad integral del sistema eléctrico del proyecto. Se ha alcanzado un avance acumulado del 100%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.0		Eléctrico				
	5.1.0	Red de media tensión y subestacion eléctrica				
	5,1,1	Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.	1,00	$ 5.229.244,00	1,00	$ 5.229.244,00
	5,1,2	Suministro, transporte e instalación de estructura horizontal terminal con cruceta metalica de 2,4 metros según norma ESSA para conexión desde circuito alimentador de operador de red hacia ramal de derivación.	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,1,3	Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería).	1,00	$ 13.469.378,00	1,00	$ 13.469.378,00
	5,1,4	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 45 KVA 13200/208-120 V	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,1,5	Bajante imc de 3"	1,00	$ 1.697.020,00	1,00	$ 1.697.020,00
	5,1,6	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mampostería con tapa en marco metalico fundida en concreto (incluye hierro)	1,00	$ 2.484.532,00	1,00	$ 2.484.532,00
	5,1,7	Suministro e instalación de tablero general de baja tension para alumbrado publico, elaborado en lamina galvanizada calibre 18, sistema control por medio de un temporizador.	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,1,8	Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.	30,00	$ 4.272.900,00	30,00	$ 4.272.900,00
	5,1,9	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#1/0 (F) +1/0(N)+6(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.0		Eléctrico				
	5.3.0	Container				
	5,3,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" DB	70,00	$ 5.730.900,00	70,00	$ 5.730.900,00
	5,3,2	Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	5,00	$ 12.422.660,00	5,00	$ 12.422.660,00
	5,3,3	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 2x#6 (F) +6(N) +10(T) THWN desde tablero general de baja tensión hasta tableros de Containeres (no incluye ductería)	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,3,4	Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 ctos. con espacio para totalizador, puerta y cerradura.	2,00	$ 2.892.060,00	2,00	$ 2.892.060,00
	5,3,5	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metalica, accesorios EMT y de fijación.	31,00	$ 19.354.447,00	31,00	$ 19.354.447,00
	5,3,6	Suministro e instalacion de Luminaria led panel circular de 24/18 W	25,00	$ 2.936.775,00	25,00	$ 2.936.775,00
	5,3,7	Suministro e instalación de interruptor sencillo.	3,00	$ 347.814,00	3,00	$ 347.814,00
	5,3,8	Suministro e instalación sensor infrarrojo.	3,00	$ 472.308,00	3,00	$ 472.308,00
	5,3,9	Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".	3,00	$ 2.168.136,00	3,00	$ 2.168.136,00
	5,3,10	Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tubería PVC de 3/4".	11,00	$ 6.174.366,00	11,00	$ 6.174.366,00
Subtotal				$ 79.652.540,00		$ 79.652.540,00

ESTRUCTURAS METALICAS

El componente de Estructuras metálicas tiene como principal avance para el presente, la instalación de Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo y Suministro e instalación de container modificado para locales, instalación de pasamanos en los sectores requeridos de acuerdo los planos y diseños iniciales, estructura metálica de entrada con su respectivo letrero, así como Kit de calistenia, todos estos elementos cuales se ejecutaron siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto. Se ha alcanzado un avance acumulado del 100%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6		Estructuras metálicas				
	6,1	Estructura metalica para acceso en tuberia circular 4" y 2" tipo estructural	1640,88	$ 47.583.879,00	1640,88	$ 47.583.879,00
	6,2	Suministro e instalación de Pasamanos en tuberia de acero galvanizado Ø2" E= 2.5mm en sentido vertical y Ø1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)	187,65	$ 87.553.925,00	187,65	$ 87.553.925,00
	6,3	Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo	130,27	$ 26.266.601,00	130,27	$ 26.266.601,00
	6,4	Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo	92,46	$ 18.760.226,00	92,46	$ 18.760.226,00
	6,5	Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios	2,00	$ 99.044.594,00	2,00	$ 99.044.594,00
	6,6	Suministro e instalación de container modificado para locales. Dimensiones de acuerdo diseño arquitectonico, incluye puertas de baños, bodegas y local, mesón en acero inoxidable, rejas metálicas de accesos laterales y ventanas local.	2,00	$ 474.203.716,00	2,00	$ 474.203.716,00
	6,7	Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.	1,00	$ 13.841.213,00	1,00	$ 13.841.213,00
	6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CALIBRE 22 CON MARCO EN CALIBRE 16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL TIPO ESMALTE DOS MAMOS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, VISAGRAS Y CERROJO EXTERNO	7,00	$ 19.028.303,00	7,00	$ 19.028.303,00
	6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO ALUZINC CALIBRE 28 COLOR AZUL	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal				$ 786.282.457,00		$ 786.282.457,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Este capítulo representa las actividades de instalación de tuberías de 4", 6" y 8" para la evacuación de las aguas lluvias de la zona del bowl principal y aguas grises desde los desagües de contenedores hacia los disipadores. Adicionalmente la construcción de cajas de inspección y disipadores de energía para entrega hacia lugar de disposición final. Se ha alcanzado un avance acumulado del 100%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7		Instalaciones Hidrosanitarias				
	7,1	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	44,82	$ 3.593.264,00	44,82	$ 3.593.264,00
	7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	111,53	$ 10.419.021,00	111,53	$ 10.419.021,00
	7,3	Punto 4" sanitario	3,00	$ 317.178,00	3,00	$ 317.178,00
	7,4	Punto 2" sanitario	6,00	$ 450.456,00	6,00	$ 450.456,00
	7,5	Punto 2" ventilación	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,6	Punto hidrualico 1 1/4" Presión	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,7	Punto hidraulico 3/4" Presión	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,8	Tuberia 1" pvc presión	70,87	$ 2.693.698,00	70,87	$ 2.693.698,00
	7,9	Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro	3,00	$ 6.492.558,00	3,00	$ 6.492.558,00
	7,10	Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH	3,00	$ 2.742.954,00	3,00	$ 2.742.954,00
	7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	4,00	$ 3.009.924,00	4,00	$ 3.009.924,00
	7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	1,00	$ 24.112.760,00	1,00	$ 24.112.760,00
	7,13	ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)	1,00	$ 2.178.239,00	1,00	$ 2.178.239,00
	7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	19,00	$ 6.220.505,00	19,00	$ 6.220.505,00
	7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	24,39	$ 7.475.559,00	24,39	$ 7.475.559,00
	7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mamposteria con tapa en concreto (incluye hierro)	1,00	$ 1.046.882,00	1,00	$ 1.046.882,00
	7,17	Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno	63,20	$ 11.506.950,00	63,20	$ 11.506.950,00
Subtotal				$ 82.259.948,00		$ 82.259.948,00

MOBILIARIO

Este capítulo representa las actividades de suministro e instalación de los diferentes elementos de mobiliario como son bicicleteros, puntos ecológicos, bancas y diferentes módulos para la práctica de la diciplina del parkour, los cuales complementan e integran el espacio para que este pueda ser utilizado y sea experimentado de una manera mas plena. Se ha alcanzado un avance acumulado del 100%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8		Mobiliario				
	8,1	Suministro e instalación de bicicliteros según especificaciones. Para 4 unidades de bicicletas	6,00	$ 12.395.352,00	6,00	$ 12.395.352,00
	8,2	Suministro e instalacion de Banca prefabricada tipo OLAND (0,45*1,80)	10,00	$ 30.433.650,00	10,00	$ 30.433.650,00
	8,3	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo	1,00	$ 538.173,00	1,00	$ 538.173,00
	8,4	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo	1,00	$ 604.748,00	1,00	$ 604.748,00
	8,5	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo	1,00	$ 727.307,00	1,00	$ 727.307,00
	8,6	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo	1,00	$ 747.536,00	1,00	$ 747.536,00
	8,7	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo	1,00	$ 766.609,00	1,00	$ 766.609,00
	8,8	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo	1,00	$ 789.343,00	1,00	$ 789.343,00
	8,9	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo	1,00	$ 3.531.034,00	1,00	$ 3.531.034,00
	8,10	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo	1,00	$ 4.210.405,00	1,00	$ 4.210.405,00
	8,11	Punto ecologico en acero inoxidable	3,00	$ 24.892.092,00	3,00	$ 24.892.092,00
Subtotal				$ 79.636.249,00		$ 79.636.249,00

DEMARCACIONES Y SEÑALIZACIONES

En el presente capitulo, la demarcación y señalización se ejecuta a lo largo de la vía principal colindante al parque con el fin de ordenar el tránsito, para lo cual se pintaron líneas divisorias de carril, flechas de giro y delimitación de zonas de bahías de parqueo, así como la instalación de señales verticales. Adicionalmente, se realizó la demarcación interna del parque, en zonas de rampas, señalización de uso del parque y señalética normativa que ubican equipamientos, zonas de interés. Se ha alcanzado un avance acumulado del 100%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
9		Demarcaciones y señalizaciones				
	9,1	Pintura para mural exteriores	334,35	$ 58.133.096,00	334,35	$ 58.133.096,00
	9,2	Señal horizontal demarcacion en linea de 0,12m para cruce peatonal en pintura acrilica de trafico	39,90	$ 234.732,00	39,90	$ 234.732,00
	9,3	Demarcacion pintura RAL 1003 Para señalización de elementos parque color amarilla	589,72	$ 2.396.622,00	589,72	$ 2.396.622,00
	9,4	Demarcaciones en pintura de trafico color azul y blanco para señalización de parqueo para personas con movilidad reducidad	1,00	$ 217.853,00	1,00	$ 217.853,00
	9,5	Demarcaciones en pintura de trafico color amarillo para señalización de parqueo para vehiculos	396,50	$ 2.332.610,00	396,50	$ 2.332.610,00
	9,6	Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca	10,00	$ 6.485.300,00	10,00	$ 6.485.300,00
	9,7	Demarcaciones en pintura de trafico color negro y blanco para señalización de zona de plazoleta artistica	90,70	$ 3.326.332,00	90,70	$ 3.326.332,00
	9,8	Señal horizontal de flecha doble en Pintura acrilica de Trafico	3,00	$ 364.239,00	3,00	$ 364.239,00
	9,9	Señal horizontal de fecha sencilla en Pintura acrilica de Trafico	1,00	$ 115.422,00	1,00	$ 115.422,00
	9,10	Suministro e instalacion de señalizacion vertical de EPP y buen uso del parque	4,00	$ 4.664.924,00	4,00	$ 4.664.924,00
Subtotal				$ 78.271.130,00		$ 78.271.130,00

URBANISMO Y ZONAS VERDES

En el presente capítulo, la conformación de las zonas verdes se ejecutó en los espacios de acuerdo a los planos y diseños arquitectónicos del parque, con el fin de integrar la vegetación al entorno y mejorar las condiciones micro climáticas y de confort del proyecto. Se llevaron a cabo trabajos de preparación del terreno, siembra de árboles y arbustos de especies nativas, instalación de prado, así como el riego de los mismos y así garantizar su crecimiento. Adicionalmente se realizaron instalación de topes en concreto para las zonas de bahías de parqueo. Se ha alcanzado un avance acumulado del 100%.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
10		Urbanismo y zonas verdes				
	10,1	Suministro e instalacion de Topes de concreto prefabricado para Parqueadero de 50cm*14cm*15cm incluye pintura amarilla	84,00	$ 20.539.932,00	84,00	$ 20.539.932,00
	10,2	Suministro e instalacion de jardin en prado chino	252,43	$ 23.937.937,00	252,43	$ 23.937.937,00
	10,3	Suministro e instalacion de arboles	13,00	$ 8.117.577,00	13,00	$ 8.117.577,00
Subtotal				$ 52.595.446,00		$ 52.595.446,00

ITEMS NO PREVISTOS

Este capítulo representa las actividades no contempladas en el presupuesto inicial, en donde se agregaban ítems o se ajustaban a las especificaciones técnicas requeridas, con el fin de ejecutar el proyecto en su totalidad, en este capitulo se incluyeron algunas actividades eléctricas y de componente civil que eran requeridas.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11		ítems no previstos				
	11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	403,34	$ 56.067.083,00	403,34	$ 56.067.083,00
	11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	289,51	$ 37.211.589,00	289,51	$ 37.211.589,00
	11,3	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	63,20	$ 15.976.897,00	63,20	$ 15.976.897,00
	11,4	Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	13,00	$ 14.597.336,00	13,00	$ 14.597.336,00
	11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	10054,64	$ 164.343.091,00	10054,64	$ 164.343.091,00
	11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	430,73	$ 107.573.956,00	430,73	$ 107.573.956,00
	11,7	Punto hidráulico 1" presión	3,00	$ 225.309,00	3,00	$ 225.309,00
	11,8	Punto hidráulico 1/2" presión	3,00	$ 144.771,00	3,00	$ 144.771,00
	11,9	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V	1,00	$ 26.573.019,00	1,00	$ 26.573.019,00
	11,10	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).	45,00	$ 6.199.920,00	45,00	$ 6.199.920,00
	11,11	Suministro e instalacion de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestatica, para control de subacometidas e iluminacion exterior. Incluye totalizador general, breaker para subacometidas, temporizadores para iluminacion exterior, barraje trifasico, frente muerto, placas de identificacion.	1,00	$ 13.995.224,00	1,00	$ 13.995.224,00
	11,12	Suministro e instalacion de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para subacometida desde TGBT hasta tablero de Iluminacion exterior y eventos	66,00	$ 6.379.692,00	66,00	$ 6.379.692,00
	11,13	Suministro e instalacion de cable aluminio #6 S8000 para alimentacion de iluminacion exterior	30,00	$ 1.003.680,00	30,00	$ 1.003.680,00
	11,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" DB	170,00	$ 6.123.740,00	170,00	$ 6.123.740,00
	11,15	Suministro e intsalacion de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cabelado encauchetado terminales y demas accesorios	24,00	$ 24.284.736,00	24,00	$ 24.284.736,00
	11,16	Suministro e instalacion de herrajes para adecuacion de estructura de sistema de medida de 3 elementos tipo exterior para 13,2KV, incluye parrilla soporte para transformadores de corriente y de potencial, CT's y PT's.	1,00	$ 37.279.920,00	1,00	$ 37.279.920,00
	11,17	Suministro e instalacion de sistema de medida, incluye medidor principal y de respaldo, gabinete de medida con borneras para señales de tension y de corriente, nicho de ladrillo a la vista, SPT y demas elementos.	1,00	$ 28.889.884,00	1,00	$ 28.889.884,00
	11,18	Retiro de sistema de medida existente	1,00	$ 2.274.482,00	1,00	$ 2.274.482,00
	11,19	Retiro de red ACSR, estructura terminal y poste 12 mts existente	1,00	$ 821.425,00	1,00	$ 821.425,00
	11,20	Tramite ante organismo de inspeccion para certificado RETIE, Sistema de medida, subestacion aerea, acometida principal y uso final	1,00	$ 5.830.239,00	1,00	$ 5.830.239,00
	11,21	Tramites ante operador de red	1,00	$ 658.014,00	1,00	$ 658.014,00
Subtotal				$ 556.454.007,00		$ 556.454.007,00

- **GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA FIRMA CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA.

CONTRATO No: 0889-25

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT:	901.922.463-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN ANDRES SERANO GOMEZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	13.870.690 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR TOTAL:	CUATRO MIL CIENTO DIESCISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974,00)
ACTA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE 2025.
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	OCHO (08) MESES
CDP:	25-01011 del 13 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Registro presupuestal número 25-02162 del 31 de marzo de 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.16683589 del 29 de abril de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07 de marzo de 2025.
FECHA ACTA DE INICIO:	28 de mayo de 2025.
FECHA DE TERMINACION:	27 de enero de 2026.

El 07 de marzo de 2025 EL DISTRITO y la firma contratista CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA. suscribieron el contrato de obra No. 0889-25, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."; el valor total del contrato suscrito corresponde al valor en dinero aportado por el distrito, el cual el total asciende a la suma de CUATRO MIL CIENTO DIESCISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974,00).

El día 28 de mayo de 2025 se suscribió el Acta de inicio del contrato de obra pública No. 0889-25

El día 29 de julio de 2025 se suscribió el otro si aclaratorio No 1 del contrato de obra pública No. 0889-25

El día 01 de agosto de 2025 se suscribió el Acta parcial No 1 del contrato de obra pública No. 0889-25

El día 20 de agosto de 2025 se suscribió el Acta de modificación de cantidades No 1 del contrato de obra pública No. 0889-25

El día 19 de septiembre de 2025 se suscribió el Acta parcial No 2 del contrato de obra pública No. 0889-25

El día 17 de octubre de 2025 se suscribió el Acta de modificación de cantidades No 2 del contrato de obra pública No. 0889-25

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

El día 21 de octubre de 2025 se suscribió el Acta de Adición en plazo No 1 del contrato de obra pública No. 0889-25

El día 11 de noviembre de 2025 se suscribió el Acta parcial No 3 del contrato de obra pública No. 0889-25

El día 05 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Adición en plazo No 12 del contrato de obra pública No. 0889-25

El día 12 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta parcial No 4 del contrato de obra pública No. 0889-25

El día 27 de enero de 2026 se suscribió el Acta de terminación del contrato de obra pública No. 0889-25.

El día 26 de marzo de 2026 se suscribió el Acta de recibo final del contrato de obra pública No. 0889-25.

Se desarrollan los productos enunciados en el seguimiento del contrato de interventoría No. 1007-25 al contrato de Obra No. 0889-25.

Johanna Paola Santos Rey
Secretaria de Infraestructura
Supervisor de los contratos No. 1007-25
MARZO 19 de 2026

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-30, 09:39:26 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	NI 901922463
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078223702
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	2046374870
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 99.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 99.100	$ 0
		SubTotales:		$ 99.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 99.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-30, 01:34:57 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1078223702

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 30/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA		
Documento	NI901922463	**Dirección**	VÍA 1 #32 - 31 CENT IND SAN JORGE BG 16
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6076159848
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13870690	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 99.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-30, 09:34:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	NI 901922463
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078227283
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2046358378
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 1.933.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 567.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 480.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 57.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 120.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 85.100	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	3	$ 360.400	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	$ 263.000	$ 0
		SubTotales:		$ 1.933.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.933.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-30, 01:34:59 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078227283

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 30/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA		
Documento	NI901922463	**Dirección**	VÍA 1 #32 - 31 CENT IND SAN JORGE BG 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076159848
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096224476	JERSON ARLEY AMARIS PALENCIA	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.870.393	$ 299.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.870.393	$ 74.900	6,960	$ 1.870.393	$ 130.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.870.393	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.300
CC 1096224476	JERSON ARLEY AMARIS PALENCIA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 63.765	$ 10.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 63.765	$ 2.600	0,000	$ 63.765	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1096224476	JERSON ARLEY AMARIS PALENCIA	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 189.197	$ 30.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 189.197	$ 7.600	0,000	$ 189.197	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 144.532	$ 5.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.700
CC 1098766271	LEIDY TATIANA BERNAL DUQUE	01	00		X															0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.583.000	$ 103.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 777.400
CC 1098766271	LEIDY TATIANA BERNAL DUQUE	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 100.000	$ 16.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 100.000	$ 4.000	0,000	$ 100.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1098766271	LEIDY TATIANA BERNAL DUQUE	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 400.000	$ 64.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 400.000	$ 16.000	0,000	$ 400.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.000
CC 1098801120	JORGE IVAN HERNANDEZ DELGADO	01	00		X															0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 806.650	$ 129.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 806.650	$ 32.300	6,960	$ 806.650	$ 56.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.900
CC 1098801120	JORGE IVAN HERNANDEZ DELGADO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 47.450	$ 1.900	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 1098801120	JORGE IVAN HERNANDEZ DELGADO	01	00														X			0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 569.400	$ 22.800	0,000	$ 569.400	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.546.855	$ 6.546.855	$ 6.546.855	$ 6.568.875	$ 1.047.800	$ 262.100	$ 360.400	$ 263.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.933.300	$ 0	$ 1.933.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-30, 10:11:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 13870690
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078029261
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2046486100
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 13.331.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 6.405.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 4.448.500	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 2.476.900	$ 0
		SubTotales:		$ 13.331.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 13.331.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-30, 01:44:08 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078029261

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 30/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
Documento	CC13870690	**Dirección**	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13870690	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 35.587.500	$ 6.405.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 35.587.500	$ 4.448.500	6,960	$ 35.587.500	$ 2.476.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.331.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 35.587.500	$ 35.587.500	$ 35.587.500	$ 0	$ 6.405.900	$ 4.448.500	$ 2.476.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.331.300	$ 0	$ 13.331.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-31, 09:48:43 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900849507
Código Sucursal (Nombre)	01 (MAQUINOBRAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078285838
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2049520868
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 51.785.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	26	$ 9.740.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	$ 6.162.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	$ 8.383.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.879.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 953.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	17	$ 1.734.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	$ 980.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 467.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	11	$ 1.017.400	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	$ 102.700	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 394.700	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 184.800	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 190.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	13	$ 1.707.900	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	62	$ 9.894.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	62	$ 7.990.900	$ 0

SubTotales:	$ 51.785.200	$ 0
Total a Pagar:		$ 51.785.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-02, 07:49:09 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078285838

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 31/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS	**Nombre Sucursal**	MAQUINOBRAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900849507	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690		
Total Afiliados	62	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005155007	MARIA CAMILA VARGAS ESPINOSA	01	00	X	X															0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.773.333	$ 283.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.773.333	$ 71.000	0,522	$ 1.773.333	$ 9.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.849.921	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.100
CC 1005155007	MARIA CAMILA VARGAS ESPINOSA	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 63.333	$ 10.200	(EPS010) EPS SURA	$ 63.333	$ 2.600	0,000	$ 63.333	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 63.333	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.400
CC 1005209676	LUISA FERNANDA AREVALO PULIDO	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 72.000	$ 11.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 72.000	$ 2.900	0,000	$ 72.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 72.000	$ 2.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.400
CC 1005209676	LUISA FERNANDA AREVALO PULIDO	01	00		X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.088.000	$ 334.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.088.000	$ 83.600	6,960	$ 2.088.000	$ 145.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.484.000	$ 99.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.500
CC 1007439672	JUAN DARIO PEDRAZA ROJAS	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 52.906	$ 8.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 52.906	$ 2.200	0,000	$ 52.906	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 52.906	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.900
CC 1007439672	JUAN DARIO PEDRAZA ROJAS	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.005.206	$ 160.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.005.206	$ 40.300	6,960	$ 1.005.206	$ 70.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.005.206	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1037479814	JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ	01	00		X								X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.709.178	$ 273.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.709.178	$ 68.400	6,960	$ 1.709.178	$ 119.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.329.042	$ 93.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.100
CC 1037479814	JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 96.535	$ 15.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 96.535	$ 3.900	0,000	$ 96.535	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 67.320	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.100
CC 1063562221	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 2.436.855	$ 389.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.436.855	$ 97.500	6,960	$ 2.436.855	$ 169.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.818.946	$ 152.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.900
CC 1063562221	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 85.759	$ 13.800	(EPS010) EPS SURA	$ 85.759	$ 3.500	0,000	$ 85.759	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.160	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.700
CC 1063563240	ADRIAN JOSE SOLANO FERIAS	01	00		X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.952.280	$ 312.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.952.280	$ 78.100	6,960	$ 1.952.280	$ 135.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.346.667	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 620.300
CC 1063563240	ADRIAN JOSE SOLANO FERIAS	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 67.320	$ 10.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 67.320	$ 2.700	0,000	$ 67.320	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 67.320	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200
CC 1083048485	JENNIFER PAOLA CARDENAS GUTIERREZ	01	00		X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.837.440	$ 294.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.837.440	$ 73.500	6,960	$ 1.837.440	$ 127.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.138.400	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.000
CC 1083048485	JENNIFER PAOLA CARDENAS GUTIERREZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 63.360	$ 10.200	(EPS010) EPS SURA	$ 63.360	$ 2.600	0,000	$ 63.360	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 63.360	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.400
CC 1085047138	MILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00		X								X							0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 2.318.730	$ 371.000	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.318.730	$ 92.800	6,960	$ 2.318.730	$ 161.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.089.594	$ 123.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.800
CC 1085047138	MILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 125.823	$ 20.200	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 125.823	$ 5.100	0,000	$ 125.823	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 95.832	$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.200
CC 1085047138	MILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 251.647	$ 40.300	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 251.647	$ 10.100	0,000	$ 251.647	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 194.709	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.200
CC 1085047138	MILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 880.762	$ 141.000	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 880.762	$ 35.300	0,000	$ 880.762	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 681.479	$ 27.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 1095786179	OSCAR JULIAN PALOMINO DUARTE	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.721.222	$ 435.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.721.222	$ 108.900	6,960	$ 2.721.222	$ 189.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.753.574	$ 150.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 883.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 31/12/2025 | **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** | **Planilla Nro: 1078285838** | **Periodo Cotización: diciembre de 2025** | **Periodo Servicio: enero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095786179	OSCAR JULIAN PALOMINO DUARTE	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 123.757	$ 19.900	(EPS010) EPS SURA	$ 123.757	$ 5.000	0,000	$ 123.757	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.160	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300
CC 1095798988	SERGIO ANDRES OROSTEGUI ARDILA	01	00		X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.740.000	$ 278.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.740.000	$ 69.600	6,960	$ 1.740.000	$ 121.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.300
CC 1095798988	SERGIO ANDRES OROSTEGUI ARDILA	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 60.000	$ 9.600	(EPS010) EPS SURA	$ 60.000	$ 2.400	0,000	$ 60.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 60.000	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.400
CC 1095808270	SERGIO ANDRES PORRAS VILLAMIZAR	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 3.736.863	$ 597.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.736.863	$ 149.500	6,960	$ 3.736.863	$ 260.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.817.883	$ 152.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.300
CC 1095808270	SERGIO ANDRES PORRAS VILLAMIZAR	01	00													L				0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 116.400	$ 18.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 116.400	$ 4.700	0,000	$ 116.400	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 75.240	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.500
CC 1095814603	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.844.154	$ 295.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.844.154	$ 73.800	6,960	$ 1.844.154	$ 128.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.167.579	$ 86.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.100
CC 1095814603	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 61.776	$ 9.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 61.776	$ 2.500	0,000	$ 61.776	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 61.776	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900
CC 1095832559	DEIVER FABIAN LOPEZ PADILLA	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 3.323.528	$ 531.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.323.528	$ 133.000	6,960	$ 3.323.528	$ 231.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.311.258	$ 172.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.068.700
CC 1095832559	DEIVER FABIAN LOPEZ PADILLA	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 113.528	$ 18.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 113.528	$ 4.600	0,000	$ 113.528	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 95.832	$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.700
CC 1095909154	FREDDY ALEXANDER GALVIS MUÑOZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 98.753	$ 15.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 98.753	$ 4.000	0,000	$ 98.753	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.160	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.300
CC 1095909154	FREDDY ALEXANDER GALVIS MUÑOZ	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.961.330	$ 473.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.961.330	$ 118.500	6,960	$ 2.961.330	$ 206.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.260.696	$ 170.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 969.100
CC 1095947638	LIZETH YOLANDA PEREZ PRADO	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 47.450	$ 1.900	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 1095947638	LIZETH YOLANDA PEREZ PRADO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.376.050	$ 220.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.376.050	$ 55.100	0,522	$ 1.376.050	$ 7.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.600
CC 1096214445	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ESCANDON	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.602.527	$ 416.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.602.527	$ 104.200	6,960	$ 2.602.527	$ 181.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.857.153	$ 154.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 856.200
CC 1096214445	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ESCANDON	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 87.554	$ 14.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 87.554	$ 3.600	0,000	$ 87.554	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 67.320	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.400
CC 1098636620	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	01	00		X															0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 2.641.320	$ 422.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.641.320	$ 105.700	6,960	$ 2.641.320	$ 183.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.853.536	$ 114.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.500
CC 1098636620	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	01	00													L				0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 91.080	$ 14.600	(EPS010) EPS SURA	$ 91.080	$ 3.700	0,000	$ 91.080	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 91.080	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1098636979	LUIS ALBERTO RIVERA PEÑUELA	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 83.160	$ 13.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 83.160	$ 3.400	0,000	$ 83.160	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.160	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.200
CC 1098636979	LUIS ALBERTO RIVERA PEÑUELA	01	00		X															0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.411.640	$ 385.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.411.640	$ 96.500	6,960	$ 2.411.640	$ 167.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.528.896	$ 101.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 751.500
CC 1098664993	YURIS MILADYS ESCOBAR MEDINA	01	00		X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.670.400	$ 267.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.670.400	$ 66.900	0,522	$ 1.670.400	$ 8.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.416.896	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.700
CC 1098664993	YURIS MILADYS ESCOBAR MEDINA	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 57.600	$ 9.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 57.600	$ 2.400	0,000	$ 57.600	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 57.600	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.100
CC 1098681601	ALEJANDRO LOAIZA GUTIERREZ	01	00		X															0	29	29	29	29	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 3.152.300	$ 504.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.152.300	$ 126.100	6,960	$ 3.152.300	$ 219.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.094.729	$ 163.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.013.800
CC 1098681601	ALEJANDRO LOAIZA GUTIERREZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 108.700	$ 17.400	(EPS010) EPS SURA	$ 108.700	$ 4.400	0,000	$ 108.700	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 108.700	$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.200
CC 1098714157	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 123.552	$ 19.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 123.552	$ 5.000	0,000	$ 123.552	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 123.552	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.800
CC 1098714157	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00													X				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 61.776	$ 9.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 61.776	$ 2.500	0,000	$ 61.776	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 61.776	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400
CC 1098714157	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00		X								X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.857.492	$ 297.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.857.492	$ 74.300	6,960	$ 1.857.492	$ 129.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.857.492	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.100
CC 1098717464	YESICA PAOLA MURILLO	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 88.596	$ 14.200	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 88.596	$ 3.600	0,000	$ 88.596	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 88.596	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 1098717464	YESICA PAOLA MURILLO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.569.284	$ 411.100	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.569.284	$ 102.800	0,522	$ 2.569.284	$ 13.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.569.284	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630.200
CC 1098732608	JHON JAIRO MARTINEZ HENAO	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.503.778	$ 400.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.503.778	$ 100.200	6,960	$ 2.503.778	$ 174.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.168.540	$ 126.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 802.000
CC 1098732608	JHON JAIRO MARTINEZ HENAO	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 84.546	$ 13.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 84.546	$ 3.400	0,000	$ 84.546	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.160	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.400
CC 1098746750	EDER ESNEIDER GARCIA MARTINEZ	01	00		X															0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 3.282.212	$ 525.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.282.212	$ 131.300	6,960	$ 3.282.212	$ 228.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.282.212	$ 131.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.016.300
CC 1098746750	EDER ESNEIDER GARCIA MARTINEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 113.180	$ 18.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 113.180	$ 4.600	0,000	$ 113.180	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 113.180	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.400
CC 1098752632	KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 73.188	$ 11.800	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 73.188	$ 3.000	0,000	$ 73.188	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 73.188	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.800
CC 1098752632	KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ	01	00													X				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 73.188	$ 11.800	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 73.188	$ 3.000	0,000	$ 73.188	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 73.188	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.800
CC 1098752632	KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.049.264	$ 327.900	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.049.264	$ 82.000	0,522	$ 2.049.264	$ 10.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.049.264	$ 82.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.600
CC 1098753057	JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 101.410	$ 16.300	(EPS010) EPS SURA	$ 101.410	$ 4.100	0,000	$ 101.410	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 101.410	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500
CC 1098753057	JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.940.904	$ 470.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.940.904	$ 117.700	6,960	$ 2.940.904	$ 204.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.940.904	$ 117.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 910.700
CC 1098757795	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00		X								X							0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.552.500	$ 248.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.552.500	$ 62.100	6,960	$ 1.552.500	$ 108.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.573.949	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 31/12/2025 | **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** | **Planilla Nro: 1078285838** | **Periodo Cotización: diciembre de 2025** | **Periodo Servicio: enero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098757795	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 68.455	$ 11.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 68.455	$ 2.800	0,000	$ 68.455	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 60.000	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200
CC 1098757795	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 342.273	$ 54.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 342.273	$ 13.700	0,000	$ 342.273	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 300.981	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.600
CC 1098760722	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 113.420	$ 18.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 113.420	$ 4.600	0,000	$ 113.420	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 113.420	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.400
CC 1098760722	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 3.289.180	$ 526.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.289.180	$ 131.600	6,960	$ 3.289.180	$ 229.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.289.180	$ 131.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.018.500
CC 1098764509	MARIA FERNANDA RIVERA SEPULVEDA	01	00													X				0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.700.000	$ 108.000	0,000	$ 2.700.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.000
CC 1098789071	MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00		X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.225.000	$ 196.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.225.000	$ 49.000	6,960	$ 1.225.000	$ 85.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.225.000	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.300
CC 1098789071	MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.333	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 58.333	$ 2.400	0,000	$ 58.333	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.333	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1098789071	MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.667	$ 18.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 116.667	$ 4.700	0,000	$ 116.667	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.667	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100
CC 1098789071	MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 350.000	$ 56.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 350.000	$ 14.000	0,000	$ 350.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 350.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.000
CC 1098803975	DIEGO MAURICIO NIÑO MECON	01	00		X															0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.416.667	$ 386.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.416.667	$ 96.700	6,960	$ 2.416.667	$ 168.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.149.167	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 777.700
CC 1098803975	DIEGO MAURICIO NIÑO MECON	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 83.333	$ 13.400	(EPS010) EPS SURA	$ 83.333	$ 3.400	0,000	$ 83.333	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.333	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.200
CC 1098805995	OSCAR IVAN URIBE TORRES	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 1098805995	OSCAR IVAN URIBE TORRES	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 47.450	$ 1.900	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 1098805995	OSCAR IVAN URIBE TORRES	01	00														X			0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 854.100	$ 136.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 854.100	$ 34.200	0,000	$ 854.100	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.100
CC 1098822060	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 97.200	$ 15.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 97.200	$ 3.900	0,000	$ 97.200	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 97.200	$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1098822060	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 388.800	$ 62.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 388.800	$ 15.600	0,000	$ 388.800	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 388.800	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.500
CC 1098822060	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.430.000	$ 388.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.430.000	$ 97.200	6,960	$ 2.430.000	$ 169.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.430.000	$ 97.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.400
CC 1099622802	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00		X								X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 989.440	$ 158.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 989.440	$ 39.600	6,960	$ 989.440	$ 68.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.033.134	$ 41.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.300
CC 1099622802	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 51.224	$ 8.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 51.224	$ 2.100	0,000	$ 51.224	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200
CC 1099622802	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00														X			0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 461.020	$ 73.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 461.020	$ 18.500	0,000	$ 461.020	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 429.065	$ 17.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.500
CC 1100890118	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00		X								X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.629.676	$ 260.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.629.676	$ 65.200	6,960	$ 1.629.676	$ 113.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.629.676	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.700
CC 1100890118	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 63.180	$ 10.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 63.180	$ 2.600	0,000	$ 63.180	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 61.776	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.300
CC 1100890118	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00														L			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 252.720	$ 40.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 252.720	$ 10.200	0,000	$ 252.720	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 247.104	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.600
CC 1100952471	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 1.990.013	$ 318.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.990.013	$ 79.700	6,960	$ 1.990.013	$ 138.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.990.013	$ 79.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.500
CC 1100952471	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 87.552	$ 14.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 87.552	$ 3.600	0,000	$ 87.552	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 75.240	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800
CC 1100952471	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 612.864	$ 98.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 612.864	$ 24.600	0,000	$ 612.864	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 528.875	$ 21.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.900
CC 1102350911	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 2.125.271	$ 340.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.125.271	$ 85.100	6,960	$ 2.125.271	$ 148.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.963.881	$ 118.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 691.800
CC 1102350911	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 70.551	$ 11.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 70.551	$ 2.900	0,000	$ 70.551	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 61.776	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.700
CC 1102383610	URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.094.288	$ 335.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.094.288	$ 83.800	6,960	$ 2.094.288	$ 145.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.495.945	$ 99.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.600
CC 1102383610	URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 68.972	$ 11.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 68.972	$ 2.800	0,000	$ 68.972	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 61.776	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.400
CC 1102389388	JONATAN RAMIRO CORDOBA CADENA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.376.000	$ 380.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.376.000	$ 95.100	6,960	$ 2.376.000	$ 165.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.148.200	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 766.700
CC 13700835	PARMENIO RODRIGUEZ AVE	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 57.859	$ 9.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 57.859	$ 2.400	0,000	$ 57.859	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 57.859	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.100
CC 13700835	PARMENIO RODRIGUEZ AVE	01	00	X																0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.099.313	$ 175.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.099.313	$ 44.000	6,960	$ 1.099.313	$ 76.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.099.313	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.500
CC 13716576	OSCAR ARTURO BARON JAIMES	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.135.880	$ 341.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.135.880	$ 85.500	6,960	$ 2.135.880	$ 148.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.765.063	$ 110.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.700
CC 13716576	OSCAR ARTURO BARON JAIMES	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 75.544	$ 12.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 75.544	$ 3.100	0,000	$ 75.544	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 67.320	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.900
CC 13742035	JAIRO ENRIQUE CORNEJO MARTINEZ	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.354.310	$ 376.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.354.310	$ 94.200	6,960	$ 2.354.310	$ 163.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.441.615	$ 137.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.500
CC 13742035	JAIRO ENRIQUE CORNEJO MARTINEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 74.655	$ 12.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 74.655	$ 3.000	0,000	$ 74.655	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 55.440	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.300
CC 13745185	JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ	01	00		X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 4.604.852	$ 736.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.604.852	$ 184.200	6,960	$ 4.604.852	$ 320.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 6.980.320	$ 279.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.520.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 31/12/2025 | **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** | **Planilla Nro: 1078285838** | **Periodo Cotización: diciembre de 2025** | **Periodo Servicio: enero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13745185	JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 158.788	$ 25.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 158.788	$ 6.400	0,000	$ 158.788	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 158.788	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.300
CC 13862051	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00		X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 5.064.367	$ 810.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.064.367	$ 202.600	6,960	$ 5.064.367	$ 352.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 6.978.348	$ 279.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.644.600
CC 13862051	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 174.633	$ 28.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 174.633	$ 7.000	0,000	$ 174.633	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 174.633	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.000
CC 13871814	JUAN DE DIOS PEREZ PABON	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 13871814	JUAN DE DIOS PEREZ PABON	01	00	X																0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 901.550	$ 144.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 901.550	$ 36.100	6,960	$ 901.550	$ 62.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300
CC 13873494	JESUS ALEXIS MANTILLA AMADO	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.338.375	$ 694.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.338.375	$ 173.600	6,960	$ 4.338.375	$ 302.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 6.369.837	$ 254.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.424.600
CC 13873494	JESUS ALEXIS MANTILLA AMADO	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 144.061	$ 23.100	(EPS010) EPS SURA	$ 144.061	$ 5.800	0,000	$ 144.061	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 101.753	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.000
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 234.347	$ 39.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 234.347	$ 9.400	0,000	$ 234.347	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 234.347	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.700
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00														X			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 468.694	$ 79.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 468.694	$ 18.800	0,000	$ 468.694	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 468.694	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.400
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.171.734	$ 199.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.171.734	$ 46.900	0,000	$ 1.171.734	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.171.734	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.100
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.155.627	$ 876.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 5.155.627	$ 206.300	6,960	$ 5.155.627	$ 358.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.155.627	$ 206.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.648.100
CC 37535732	ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	01	00		X															0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 5.850.000	$ 994.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.850.000	$ 234.000	6,960	$ 5.850.000	$ 407.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 7.574.666	$ 303.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.938.800
CC 37535732	ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 216.667	$ 36.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 216.667	$ 8.700	0,000	$ 216.667	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.300
CC 37535732	ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 433.334	$ 73.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 433.334	$ 17.400	0,000	$ 433.334	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.600
CC 37750630	LINETH MARITZA RODRIGUEZ VEGA	01	00		X															0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 2.866.406	$ 458.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.866.406	$ 114.700	6,960	$ 2.866.406	$ 199.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.126.636	$ 165.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.100
CC 37750630	LINETH MARITZA RODRIGUEZ VEGA	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 98.842	$ 15.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 98.842	$ 4.000	0,000	$ 98.842	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 98.842	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.900
CC 37752831	PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 110.771	$ 17.800	(EPS010) EPS SURA	$ 110.771	$ 4.500	0,000	$ 110.771	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 110.771	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800
CC 37752831	PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS	01	00		X															0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.212.350	$ 514.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.212.350	$ 128.500	6,960	$ 3.212.350	$ 223.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.899.128	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.022.100
CC 63302660	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	01	00		X															0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.869.945	$ 299.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.869.945	$ 74.800	6,960	$ 1.869.945	$ 130.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.869.945	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.000
CC 63302660	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 124.663	$ 20.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 124.663	$ 5.000	0,000	$ 124.663	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 124.663	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000
CC 63302660	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	01	00														X			0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.745.282	$ 279.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.745.282	$ 69.900	0,000	$ 1.745.282	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.745.282	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.100
CC 63514916	ADRIANA XIMENA SERRANO ARENAS	01	00		X															0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.633.333	$ 1.807.800	(EPS010) EPS SURA	$ 10.633.333	$ 425.400	6,960	$ 10.633.333	$ 740.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 16.115.000	$ 644.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.617.900
CC 63514916	ADRIANA XIMENA SERRANO ARENAS	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 366.667	$ 62.500	(EPS010) EPS SURA	$ 366.667	$ 14.700	0,000	$ 366.667	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.900
CC 80187378	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	01	00														X			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 142.350	$ 22.800	(EPS010) EPS SURA	$ 142.350	$ 5.700	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.200
CC 80187378	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	$ 47.450	$ 1.900	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 80187378	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	01	00		X															0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.233.700	$ 197.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.233.700	$ 49.400	6,960	$ 1.233.700	$ 85.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100
CC 91110220	WILSON MORENO NIÑO	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.510.865	$ 401.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.510.865	$ 100.500	6,960	$ 2.510.865	$ 174.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.760.310	$ 110.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 787.600
CC 91110220	WILSON MORENO NIÑO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 83.160	$ 13.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 83.160	$ 3.400	0,000	$ 83.160	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.160	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.200
CC 91217581	LUIS ANTONIO SANABRIA REY	01	01		X															0	0	14	14	14	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 664.300	$ 26.600	6,960	$ 664.300	$ 46.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 664.300	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.500
CC 91217581	LUIS ANTONIO SANABRIA REY	01	01														L			0	0	1	1	1	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 47.450	$ 1.900	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800
CC 91217581	LUIS ANTONIO SANABRIA REY	01	01														X			0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 711.750	$ 28.500	0,000	$ 711.750	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000
CC 91265828	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	01	00		X															0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 521.950	$ 83.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 91265828	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 47.450	$ 1.900	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 91265828	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	01	00														X			0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 854.100	$ 136.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 854.100	$ 34.200	0,000	$ 854.100	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.100
CC 91274996	EDUARDO SANTOS USECHE	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.046.463	$ 327.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.046.463	$ 81.900	6,960	$ 2.046.463	$ 142.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.705.662	$ 108.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.200
CC 91274996	EDUARDO SANTOS USECHE	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 73.055	$ 11.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 73.055	$ 3.000	0,000	$ 73.055	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 55.440	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.000
CC 91357047	ARTURO ARENAS JAIMES	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 47.450	$ 1.900	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 91357047	ARTURO ARENAS JAIMES	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 901.550	$ 144.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 901.550	$ 36.100	6,960	$ 901.550	$ 62.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 31/12/2025 **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** **Planilla Nro: 1078285838** **Periodo Cotización: diciembre de 2025** **Periodo Servicio: enero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91499520	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 158.788	$ 25.500	(EPS042) COOSALUD	$ 158.788	$ 6.400	0,000	$ 158.788	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 158.788	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.300
CC 91499520	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00		X															0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 4.604.852	$ 736.800	(EPS042) COOSALUD	$ 4.604.852	$ 184.200	6,960	$ 4.604.852	$ 320.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.994.247	$ 239.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.481.300
CC 93408591	JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 47.450	$ 1.900	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 93408591	JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.456.931	$ 233.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.456.931	$ 58.300	6,960	$ 1.456.931	$ 101.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.456.931	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.300
CE 538468	JOSE LUIS BRICEÑO HERNANDEZ	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 2.021.130	$ 323.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.021.130	$ 80.900	6,960	$ 2.021.130	$ 140.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.021.130	$ 80.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.900
CE 538468	JOSE LUIS BRICEÑO HERNANDEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 67.320	$ 10.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 67.320	$ 2.700	0,000	$ 67.320	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 67.320	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200
PT 5338041	ANNEL EDGARDO HERNANDEZ ESCOBAR	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 50.846	$ 8.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 50.846	$ 2.100	0,000	$ 50.846	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 50.846	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400
PT 5338041	ANNEL EDGARDO HERNANDEZ ESCOBAR	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.654.647	$ 264.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.654.647	$ 66.200	6,960	$ 1.654.647	$ 115.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.654.647	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 167.923.834	$ 169.347.334	$ 169.347.334	$ 202.512.033	$ 27.120.000	$ 6.779.800	$ 9.894.500	$ 7.990.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.785.200	$ 0	$ 51.785.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANCA / BARRANCA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	07/01/2026	2112157	$11.921.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	236.600	0		0		0	0	0	0	236.600	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	257.500	0		0		0	0	0	0	257.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	587.900	0		0		0	0	0	0	587.900	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	355.600	0		0		0	0	0	0	355.600	7
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	81.700	0		0		0	0	0	0	81.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.604.100	0	0	0	0	0	0		1.604.100	6
230301	Porvenir	800224808-8	3.466.100	0	0	0	0	0	0		3.466.100	16
231001	Colfondos	800227940-6	341.800	0	0	0	0	0	0		341.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	622.700	0	0	0	0	0	0		622.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.736.600				2.736.600	0	0	2.736.600			27.366	2.736.600	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	1.573.500	0	0	1.573.500	29

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANCA / BARRANCA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	07/01/2026	2112157	$11.921.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.576.300	1.576.300
Pensión	4	6.034.700	6.034.700
Riesgos Laborales	1	2.736.600	2.736.600
CCF	1	1.573.500	1.573.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	11.921.100	11.921.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANCA	BARRANCA	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	07/01/2026	2112157	$11.921.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001815351	JIMENEZ CORREDOR LEYDY JOHANA	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1005175843	POVEDA GUEVARA WILSON JULIAN	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1005180035	RIVERA MARQUEZ LUIS ALFREDO	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF39	711.750	28.500	0	0	0	0	0
4	CC	1048993220	DIAZ JIMENEZ EDUAR JOSE	1	0			S		X															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1051634004	CAMACHO LUIS ALBERTO	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1052218585	BELEÑO RODRIGUEZ JUAN DAVID	1	0			S		X															230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS041	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF39	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
7	CC	1052218585	BELEÑO RODRIGUEZ JUAN DAVID	1	0			S									X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF39	47.450	0	0	0	0	0	0
8	CC	1096192911	HERNANDEZ BUENO ESTEBAN	1	0			S		X															230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS041	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF39	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
9	CC	1096192911	HERNANDEZ BUENO ESTEBAN	1	0			S									X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	0	14-11	94.900	5	0	CCF39	94.900	0	0	0	0	0	0
10	CC	1096205600	ALVAREZ FUENTES ELIECER	1	0			S	X	X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF39	711.750	28.500	0	0	0	0	0
11	CC	1096220729	ROBLES NAVARRO ALEXANDERSON	1	0			S	X	X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF39	711.750	28.500	0	0	0	0	0
12	CC	1096221092	PUERTA VANEGAS JHON JAIRO	1	0			S		X															230301	2.391.304	382.700	0	0	0	0	EPS037	2.391.304	95.700	14-11	2.391.304	5	166.500	CCF39	2.391.304	95.700	0	0	0	0	0
13	CC	1096226240	MONSALVE NIÑO YILMAR ANTONIO	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	ESSC24	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF39	711.750	28.500	0	0	0	0	0
14	CC	1096242142	PANTOJA GOMEZ YAY DANER	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	1096254336	AGUILAR PIÑERES HEDIER KISSINGER	1	0			S		X															230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	ESSC24	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF39	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
16	CC	1096254336	AGUILAR PIÑERES HEDIER KISSINGER	1	0			S									X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF39	47.450	0	0	0	0	0	0
17	CC	1096254336	AGUILAR PIÑERES HEDIER KISSINGER	1	0			S									X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF39	47.450	0	0	0	0	0	0
18	CC	1098621841	PALENCIA TRIANA SERGIO IVAN	1	0			S		X															231001	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS002	569.400	22.800	14-11	569.400	5	39.700	CCF39	569.400	22.800	0	0	0	0	0
19	CC	1098621841	PALENCIA TRIANA SERGIO IVAN	1	0			S									X							231001	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	0	14-11	142.350	5	0	CCF39	142.350	0	0	0	0	0	0
20	CC	1192758008	SEQUEIRA GUTIERREZ JHON ALBERT	1	0			S		X															230201	2.065.217	330.500	0	0	0	0	EPS037	2.065.217	82.700	14-11	2.065.217	5	143.800	CCF39	2.065.217	82.700	0	0	0	0	0
21	CC	13566075	BENITEZ OLARTE LUIS EDUARDO	1	0			S		X															230201	550.725	88.200	0	0	0	0	EPS041	550.725	22.100	14-11	550.725	5	38.400	CCF39	550.725	22.100	0	0	0	0	0
22	CC	1072752217	VEGA IZQUIERDO NICOLAS	1	0			S		X															230301	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS017	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF39	901.550	36.100	0	0	0	0	0
23	CC	13568170	BERNAL GOMEZ ELKIN ANTONIO	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	13568787	MORON HERNANDEZ MAURICIO	1	0			S		X															230201	2.065.217	330.500	0	0	0	0	EPS037	2.065.217	82.700	14-11	2.065.217	5	143.800	CCF39	2.065.217	82.700	0	0	0	0	0
25	CC	19945033	RAMIREZ HERNANDEZ ELIAS HUMBERTO	1	5			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	3557497	SALAZAR MARTINEZ SAMUEL	1	0			S	X	X															25-14	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.043.900	41.800	14-11	1.043.900	5	72.700	CCF39	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
27	CC	85476756	SANCHEZ CAAMAÑO ROBINSON DAMIAN	1	0			S	X	X															230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF39	427.050	17.100	0	0	0	0	0
28	CC	1096236339	GARCES QUIROGA JERSON ARIEL	1	0			S																	230301	1.996.377	319.500	0	0	0	0	EPS017	1.996.377	79.900	14-11	1.996.377	5	139.000	CCF39	1.996.377	79.900	0	0	0	0	0
29	CC	1096236339	GARCES QUIROGA JERSON ARIEL	1	0			S										X							230301	68.841	11.100	0	0	0	0	EPS017	68.841	2.800	14-11	68.841	5	0	CCF39	68.841	0	0	0	0	0	0
30	CC	9020499	TARRIBA REALES JOSE DAVID	1	0			S		X															230301	2.065.217	330.500	0	0	0	0	EPS002	2.065.217	82.700	14-11	2.065.217	5	143.800	CCF39	2.065.217	82.700	0	0	0	0	0
31	CC	91424052	GARCIA RAMIREZ PEDRO	1	0			S		X															231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
32	CC	91443898	HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO	1	0			S		X															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
33	CC	91448424	HERNANDEZ ORTIZ LISANDRO	1	0			S		X															230201	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS017	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	5	198.400	CCF39	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
34	CC	9160325	CAMPO RIOS HUMBERTO	1	3			S	X	X																0	0	0	0	0	0	EPS017	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF39	616.850	24.700	0	0	0	0	0
35	CC	13566433	ALVEAR CASTELLARES JESUS	1	0			S		X															230201	2.065.217	330.500	0	0	0	0	EPS041	2.065.217	82.700	14-11	2.065.217	5	143.800	CCF39	2.065.217	82.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-06, 08:41:52 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	NI 901922463
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079171183
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	41739267
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 121.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 121.900	$ 0
			SubTotales:	$ 121.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 10:38:57 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1079171183

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 06/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA		
Documento	NI901922463	**Dirección**	VÍA 1 #32 - 31 CENT IND SAN JORGE BG 16
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6076159848
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13870690	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-06, 08:37:33 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	NI 901922463
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079171319
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	41728866
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 1.389.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 300.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 416.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 104.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 75.300	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	2	$ 311.900	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	$ 181.800	$ 0

SubTotales:	$ 1.389.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.389.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 10:38:53 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079171319

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 06/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA		
Documento	NI901922463	**Dirección**	VÍA 1 #32 - 31 CENT IND SAN JORGE BG 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076159848
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096224476	JERSON ARLEY AMARIS PALENCIA	01	00		X						X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.880.233	$ 300.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.880.233	$ 75.300	6,960	$ 1.880.233	$ 130.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.944.644	$ 77.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.900
CC 1098766271	LEIDY TATIANA BERNAL DUQUE	01	00	X																0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.480.233	$ 4.480.233	$ 4.480.233	$ 4.544.644	$ 716.900	$ 179.300	$ 311.900	$ 181.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.389.900	$ 0	$ 1.389.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-06, 08:59:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 13870690
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079179963
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	41783443
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 16.397.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 7.879.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 5.471.600	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 3.046.600	$ 0
		SubTotales:		$ 16.397.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 16.397.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 11:10:03 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079179963

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 06/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
Documento	CC13870690	**Dirección**	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13870690	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.772.625	$ 7.879.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 43.772.625	$ 5.471.600	6,960	$ 43.772.625	$ 3.046.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.397.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 43.772.625	$ 43.772.625	$ 43.772.625	$ 0	$ 7.879.200	$ 5.471.600	$ 3.046.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.397.400	$ 0	$ 16.397.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-03, 04:02:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900849507
Código Sucursal (Nombre)	01 (MAQUINOBRAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079161173
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	33725243
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 48.282.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	25	$ 9.088.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	$ 5.316.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	20	$ 9.043.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.359.600	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 745.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	16	$ 1.563.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	$ 977.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	3	$ 237.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	12	$ 1.049.200	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	$ 153.800	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	7	$ 443.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 223.300	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 184.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	13	$ 1.513.200	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 11.700	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	65	$ 10.112.100	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	65	$ 6.260.700	$ 0
		SubTotales:		$ 48.282.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 48.282.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-04, 08:45:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079161173

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 03/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS	**Nombre Sucursal**	MAQUINOBRAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900849507	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690		
Total Afiliados	65	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007439672	JUAN DARIO PEDRAZA ROJAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.092.132	$ 334.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.092.132	$ 83.700	6,960	$ 2.092.132	$ 145.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.092.132	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.900
CC 1037479814	JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.029.392	$ 324.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.029.392	$ 81.200	6,960	$ 2.029.392	$ 141.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.029.392	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.500
CC 1063562221	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 2.162.160	$ 346.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.162.160	$ 86.500	6,960	$ 2.162.160	$ 150.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.162.160	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.500
CC 1083048485	JENNIFER PAOLA CARDENAS GUTIERREZ	01	00	X	X															0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.733.334	$ 277.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.733.334	$ 69.400	6,960	$ 1.733.334	$ 120.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.805.334	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.800
CC 1085047138	MILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00	X																0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 1.724.976	$ 276.000	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 1.724.976	$ 69.000	6,960	$ 1.724.976	$ 120.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.724.976	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.100
CC 1095786179	OSCAR JULIAN PALOMINO DUARTE	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.755.242	$ 440.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.755.242	$ 110.300	6,960	$ 2.755.242	$ 191.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.755.242	$ 110.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 853.300
CC 1095798988	SERGIO ANDRES OROSTEGUI ARDILA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 720.000	$ 115.200	(EPS010) EPS SURA	$ 720.000	$ 28.800	6,960	$ 720.000	$ 50.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 720.000	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 1095808270	SERGIO ANDRES PORRAS VILLAMIZAR	01	00	X									X							0	21	21	21	21	(231001) COLFONDOS	$ 1.836.540	$ 293.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.836.540	$ 73.500	6,960	$ 1.836.540	$ 127.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.836.540	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.800
CC 1095814603	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 1.364.688	$ 218.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.364.688	$ 54.600	6,960	$ 1.364.688	$ 95.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.364.688	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.600
CC 1095832559	DEIVER FABIAN LOPEZ PADILLA	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 2.491.632	$ 398.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.491.632	$ 99.700	6,960	$ 2.491.632	$ 173.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.491.632	$ 99.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 771.600
CC 1095909154	FREDDY ALEXANDER GALVIS MUÑOZ	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.295.405	$ 367.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.295.405	$ 91.900	6,960	$ 2.295.405	$ 159.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.295.405	$ 91.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.900
CC 1095947638	LIZETH YOLANDA PEREZ PRADO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1096214445	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ESCANDON	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.076.210	$ 332.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.076.210	$ 83.100	6,960	$ 2.076.210	$ 144.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.076.210	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.000
CC 1098636620	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	01	00	X																0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 2.368.080	$ 378.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.368.080	$ 94.800	6,960	$ 2.368.080	$ 164.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.368.080	$ 94.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.400
CC 1098636979	LUIS ALBERTO RIVERA PEÑUELA	01	00	X																0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.411.640	$ 385.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.411.640	$ 96.500	6,960	$ 2.411.640	$ 167.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.411.640	$ 96.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 746.800
CC 1098664993	YURIS MILADYS ESCOBAR MEDINA	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.517.451	$ 60.700	0,522	$ 1.517.451	$ 8.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.200
CC 1098681601	ALEJANDRO LOAIZA GUTIERREZ	01	00	X																0	18	18	18	18	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 1.956.600	$ 313.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.956.600	$ 78.300	6,960	$ 1.956.600	$ 136.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.956.600	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.900
CC 1098714157	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00														L			0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 403.920	$ 64.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 403.920	$ 16.200	0,000	$ 403.920	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 403.920	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.100
CC 1098714157	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.746.878	$ 279.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.746.878	$ 69.900	6,960	$ 1.746.878	$ 121.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.746.878	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 03/02/2026 | **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** | **Planilla Nro: 1079161173** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098717464	YESICA PAOLA MURILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.657.880	$ 425.300	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.657.880	$ 106.400	0,522	$ 2.657.880	$ 13.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.657.880	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.000
CC 1098732608	JHON JAIRO MARTINEZ HENAO	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.162.160	$ 346.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.162.160	$ 86.500	6,960	$ 2.162.160	$ 150.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.162.160	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.500
CC 1098746750	EDER ESNEIDER GARCIA MARTINEZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 2.942.673	$ 470.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.942.673	$ 117.800	6,960	$ 2.942.673	$ 204.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.942.673	$ 117.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.400
CC 1098748181	DARLY PAOLA PEÑARANDA RODRIGUEZ	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 3.093.333	$ 495.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.093.333	$ 123.800	6,960	$ 3.093.333	$ 215.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.093.333	$ 123.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 957.900
CC 1098752632	KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ	01	00													X				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 73.188	$ 11.800	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 73.188	$ 3.000	0,000	$ 73.188	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 73.188	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.800
CC 1098752632	KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ	01	00		X															0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.122.452	$ 339.600	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.122.452	$ 84.900	0,522	$ 2.122.452	$ 11.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.333.233	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.000
CC 1098753057	JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.042.314	$ 486.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.042.314	$ 121.700	6,960	$ 3.042.314	$ 211.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.042.314	$ 121.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 942.000
CC 1098757795	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.746.954	$ 279.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.746.954	$ 69.900	6,960	$ 1.746.954	$ 121.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.746.954	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.000
CC 1098760722	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.948.920	$ 471.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.948.920	$ 118.000	6,960	$ 2.948.920	$ 205.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.948.920	$ 118.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 913.200
CC 1098760722	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 453.680	$ 72.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 453.680	$ 18.200	0,000	$ 453.680	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 453.680	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.000
CC 1098764509	MARIA FERNANDA RIVERA SEPULVEDA	01	00													X				0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.700.000	$ 108.000	0,000	$ 2.700.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.000
CC 1098789071	MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1098797670	FRANCY VANESSA CAICEDO GONZALEZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.166.667	$ 346.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.166.667	$ 86.700	6,960	$ 2.166.667	$ 150.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.166.667	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.000
CC 1098801120	JORGE IVAN HERNANDEZ DELGADO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1098803975	DIEGO MAURICIO NIÑO MECON	01	00	X																0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.166.667	$ 346.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.166.667	$ 86.700	6,960	$ 2.166.667	$ 150.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.166.667	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.000
CC 1098805995	OSCAR IVAN URIBE TORRES	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1098822060	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.527.200	$ 404.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.527.200	$ 101.100	6,960	$ 2.527.200	$ 175.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.527.200	$ 101.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 782.500
CC 1098822060	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 388.800	$ 62.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 388.800	$ 15.600	0,000	$ 388.800	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 388.800	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.500
CC 1099622802	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.719.204	$ 275.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.719.204	$ 68.800	6,960	$ 1.719.204	$ 119.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.719.204	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.400
CC 1100890118	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.606.176	$ 257.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.606.176	$ 64.300	6,960	$ 1.606.176	$ 111.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.606.176	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.400
CC 1100951373	CESAR ANDRES PRADA MAYORGA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 18.700	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 116.727	$ 4.700	6,960	$ 116.727	$ 8.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 121.588	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1100952471	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 2.197.094	$ 351.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.197.094	$ 87.900	6,960	$ 2.197.094	$ 153.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.197.094	$ 87.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.400
CC 1102350911	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.722.006	$ 275.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.722.006	$ 68.900	6,960	$ 1.722.006	$ 119.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.722.006	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.300
CC 1102383610	URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.974.304	$ 315.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.974.304	$ 79.000	6,960	$ 1.974.304	$ 137.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.974.304	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 611.400
CC 1102389388	JONATAN RAMIRO CORDOBA CADENA	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.059.200	$ 329.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.059.200	$ 82.400	6,960	$ 2.059.200	$ 143.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.059.200	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.700
CC 1102391061	JHON FREDY AZA DIAZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 878.256	$ 140.600	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 878.256	$ 35.200	0,522	$ 878.256	$ 4.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 878.256	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.600
CC 13700835	PARMENIO RODRIGUEZ AVE	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.885.207	$ 301.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.885.207	$ 75.500	6,960	$ 1.885.207	$ 131.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.885.207	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.000
CC 13716576	OSCAR ARTURO BARON JAIMES	01	00	X																0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.211.760	$ 193.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.211.760	$ 48.500	6,960	$ 1.211.760	$ 84.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.211.760	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.300
CC 13745185	JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.763.640	$ 762.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.763.640	$ 190.600	6,960	$ 4.763.640	$ 331.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.763.640	$ 190.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.475.000
CC 13862051	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.239.000	$ 838.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.239.000	$ 209.600	6,960	$ 5.239.000	$ 364.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.239.000	$ 209.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.622.200
CC 13871814	JUAN DE DIOS PEREZ PABON	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.885.207	$ 301.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.885.207	$ 75.500	6,960	$ 1.885.207	$ 131.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.885.207	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.000
CC 13873494	JESUS ALEXIS MANTILLA AMADO	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.782.596	$ 445.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.782.596	$ 111.400	6,960	$ 2.782.596	$ 193.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.782.596	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 861.800
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.030.400	$ 1.195.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 7.030.400	$ 281.300	6,960	$ 7.030.400	$ 489.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 7.030.400	$ 281.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.247.300
CC 37535732	ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 5.633.333	$ 901.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.633.333	$ 225.400	6,960	$ 5.633.333	$ 392.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.633.333	$ 225.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.744.300
CC 37535732	ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 866.667	$ 138.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 866.667	$ 34.700	0,000	$ 866.667	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.100
CC 37750630	LINETH MARITZA RODRIGUEZ VEGA	01	00	X																0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 2.569.882	$ 411.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.569.882	$ 102.800	6,960	$ 2.569.882	$ 178.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.569.882	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 795.700
CC 37752831	PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS	01	00	X																0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.212.349	$ 514.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.212.349	$ 128.500	6,960	$ 3.212.349	$ 223.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.212.349	$ 128.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 994.600
CC 5641480	ANGEL DE JESUS GOMEZ LOPEZ	01	04	X																0	0	5	5	5	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 03/02/2026 **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** **Planilla Nro: 1079161173** **Periodo Cotización: enero de 2026** **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63302660	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	01	00	X																0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.241.238	$ 518.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.241.238	$ 129.700	6,960	$ 3.241.238	$ 225.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.241.238	$ 129.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.600
CC 63514916	ADRIANA XIMENA SERRANO ARENAS	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.000.000	$ 1.870.000	(EPS010) EPS SURA	$ 11.000.000	$ 440.000	6,960	$ 11.000.000	$ 765.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 11.000.000	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.515.600
CC 80187378	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 91110220	WILSON MORENO NIÑO	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.426.099	$ 388.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.426.099	$ 97.100	6,960	$ 2.426.099	$ 168.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.426.099	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 751.300
CC 91217581	LUIS ANTONIO SANABRIA REY	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 91265828	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 91274996	EDUARDO SANTOS USECHE	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.051.875	$ 328.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.051.875	$ 82.100	6,960	$ 2.051.875	$ 142.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.051.875	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.400
CC 91357047	ARTURO ARENAS JAIMES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.885.207	$ 301.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.885.207	$ 75.500	6,960	$ 1.885.207	$ 131.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.885.207	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.000
CC 91496535	JAVIER MAURICIO LOPEZ OSORIO	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.761.185	$ 281.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.761.185	$ 70.500	6,960	$ 1.761.185	$ 122.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.761.185	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.400
CC 91499520	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00	X																0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 4.604.852	$ 736.800	(EPS042) COOSALUD	$ 4.604.852	$ 184.200	6,960	$ 4.604.852	$ 320.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.604.852	$ 184.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.425.700
CC 93408591	JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL	01	00								X									0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.517.451	$ 242.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 93408591	JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 233.454	$ 37.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CE 538468	JOSE LUIS BRICEÑO HERNANDEZ	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.767.533	$ 282.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.767.533	$ 70.800	6,960	$ 1.767.533	$ 123.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.767.533	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.600
PT 5338041	ANNEL EDGARDO HERNANDEZ ESCOBAR	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.582.115	$ 253.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.582.115	$ 63.300	6,960	$ 1.582.115	$ 110.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.582.115	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
PT 5338041	ANNEL EDGARDO HERNANDEZ ESCOBAR	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 233.454	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 158.559.520	$ 158.851.338	$ 158.851.338	$ 159.138.980	$ 25.553.000	$ 6.357.100	$ 10.112.100	$ 6.260.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.282.900	$ 0	$ 48.282.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANCA / BARRANCA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	07/01/2026	2112157	$11.921.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	236.600	0		0		0	0	0	0	236.600	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	257.500	0		0		0	0	0	0	257.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	587.900	0		0		0	0	0	0	587.900	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	355.600	0		0		0	0	0	0	355.600	7
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	81.700	0		0		0	0	0	0	81.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.604.100	0	0	0	0	0	0		1.604.100	6
230301	Porvenir	800224808-8	3.466.100	0	0	0	0	0	0		3.466.100	16
231001	Colfondos	800227940-6	341.800	0	0	0	0	0	0		341.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	622.700	0	0	0	0	0	0		622.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.736.600				2.736.600	0	0	2.736.600			27.366	2.736.600	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	1.573.500	0	0	1.573.500	29

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANCA / BARRANCA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	07/01/2026	2112157	$11.921.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.576.300	1.576.300
Pensión	4	6.034.700	6.034.700
Riesgos Laborales	1	2.736.600	2.736.600
CCF	1	1.573.500	1.573.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	11.921.100	11.921.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANCA	BARRANCA	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	07/01/2026	2112157	$11.921.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001815351	JIMENEZ CORREDOR LEYDY JOHANA	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1005175843	POVEDA GUEVARA WILSON JULIAN	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1005180035	RIVERA MARQUEZ LUIS ALFREDO	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF39	711.750	28.500	0	0	0	0	0
4	CC	1048993220	DIAZ JIMENEZ EDUAR JOSE	1	0			S		X															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1051634004	CAMACHO LUIS ALBERTO	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1052218585	BELEÑO RODRIGUEZ JUAN DAVID	1	0			S		X															230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS041	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF39	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
7	CC	1052218585	BELEÑO RODRIGUEZ JUAN DAVID	1	0			S									X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF39	47.450	0	0	0	0	0	0
8	CC	1096192911	HERNANDEZ BUENO ESTEBAN	1	0			S		X															230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS041	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF39	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
9	CC	1096192911	HERNANDEZ BUENO ESTEBAN	1	0			S									X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	0	14-11	94.900	5	0	CCF39	94.900	0	0	0	0	0	0
10	CC	1096205600	ALVAREZ FUENTES ELIECER	1	0			S	X	X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF39	711.750	28.500	0	0	0	0	0
11	CC	1096220729	ROBLES NAVARRO ALEXANDERSON	1	0			S	X	X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF39	711.750	28.500	0	0	0	0	0
12	CC	1096221092	PUERTA VANEGAS JHON JAIRO	1	0			S		X															230301	2.391.304	382.700	0	0	0	0	EPS037	2.391.304	95.700	14-11	2.391.304	5	166.500	CCF39	2.391.304	95.700	0	0	0	0	0
13	CC	1096226240	MONSALVE NIÑO YILMAR ANTONIO	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	ESSC24	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF39	711.750	28.500	0	0	0	0	0
14	CC	1096242142	PANTOJA GOMEZ YAY DANER	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	1096254336	AGUILAR PIÑERES HEDIER KISSINGER	1	0			S		X															230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	ESSC24	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF39	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
16	CC	1096254336	AGUILAR PIÑERES HEDIER KISSINGER	1	0			S									X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF39	47.450	0	0	0	0	0	0
17	CC	1096254336	AGUILAR PIÑERES HEDIER KISSINGER	1	0			S									X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF39	47.450	0	0	0	0	0	0
18	CC	1098621841	PALENCIA TRIANA SERGIO IVAN	1	0			S		X															231001	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS002	569.400	22.800	14-11	569.400	5	39.700	CCF39	569.400	22.800	0	0	0	0	0
19	CC	1098621841	PALENCIA TRIANA SERGIO IVAN	1	0			S									X							231001	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	0	14-11	142.350	5	0	CCF39	142.350	0	0	0	0	0	0
20	CC	1192758008	SEQUEIRA GUTIERREZ JHON ALBERT	1	0			S		X															230201	2.065.217	330.500	0	0	0	0	EPS037	2.065.217	82.700	14-11	2.065.217	5	143.800	CCF39	2.065.217	82.700	0	0	0	0	0
21	CC	13566075	BENITEZ OLARTE LUIS EDUARDO	1	0			S		X															230201	550.725	88.200	0	0	0	0	EPS041	550.725	22.100	14-11	550.725	5	38.400	CCF39	550.725	22.100	0	0	0	0	0
22	CC	1072752217	VEGA IZQUIERDO NICOLAS	1	0			S		X															230301	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS017	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF39	901.550	36.100	0	0	0	0	0
23	CC	13568170	BERNAL GOMEZ ELKIN ANTONIO	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	13568787	MORON HERNANDEZ MAURICIO	1	0			S		X															230201	2.065.217	330.500	0	0	0	0	EPS037	2.065.217	82.700	14-11	2.065.217	5	143.800	CCF39	2.065.217	82.700	0	0	0	0	0
25	CC	19945033	RAMIREZ HERNANDEZ ELIAS HUMBERTO	1	5			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	3557497	SALAZAR MARTINEZ SAMUEL	1	0			S	X	X															25-14	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.043.900	41.800	14-11	1.043.900	5	72.700	CCF39	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
27	CC	85476756	SANCHEZ CAAMAÑO ROBINSON DAMIAN	1	0			S	X	X															230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF39	427.050	17.100	0	0	0	0	0
28	CC	1096236339	GARCES QUIROGA JERSON ARIEL	1	0			S																	230301	1.996.377	319.500	0	0	0	0	EPS017	1.996.377	79.900	14-11	1.996.377	5	139.000	CCF39	1.996.377	79.900	0	0	0	0	0
29	CC	1096236339	GARCES QUIROGA JERSON ARIEL	1	0			S										X							230301	68.841	11.100	0	0	0	0	EPS017	68.841	2.800	14-11	68.841	5	0	CCF39	68.841	0	0	0	0	0	0
30	CC	9020499	TARRIBA REALES JOSE DAVID	1	0			S		X															230301	2.065.217	330.500	0	0	0	0	EPS002	2.065.217	82.700	14-11	2.065.217	5	143.800	CCF39	2.065.217	82.700	0	0	0	0	0
31	CC	91424052	GARCIA RAMIREZ PEDRO	1	0			S		X															231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
32	CC	91443898	HERRERA BUSTAMANTE RODRIGO	1	0			S		X															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
33	CC	91448424	HERNANDEZ ORTIZ LISANDRO	1	0			S		X															230201	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS017	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	5	198.400	CCF39	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
34	CC	9160325	CAMPO RIOS HUMBERTO	1	3			S	X	X																0	0	0	0	0	0	EPS017	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF39	616.850	24.700	0	0	0	0	0
35	CC	13566433	ALVEAR CASTELLARES JESUS	1	0			S		X															230201	2.065.217	330.500	0	0	0	0	EPS041	2.065.217	82.700	14-11	2.065.217	5	143.800	CCF39	2.065.217	82.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
