CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG
NIT 901.994.058-1
CR 55 152B 68 OF 1503
Tel: 6017189431
Bogotá - Colombia
contabilidad@grupotitanium.co

Factura electrónica de venta
No. 4

Señores	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 30 Nº 25-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2026, 11:56
Expedición	17/02/2026, 17:42
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CORTE No. 001 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B 13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA - SGC.	1.00	596,934,216.46	0 %	596,934,216.46
2	Administración 30.10%	1.00	179,677,199.15	0 %	179,677,199.15
3	Imprevistos 2%	1.00	11,938,684.33	0 %	11,938,684.33
4	Utilidad 3%	1.00	17,908,026.49	19 %	21,310,551.52

Total items: 4

Total Bruto	806,458,126.43
IVA 19%	3,402,525.03
Total a Pagar	809,860,651.46

Valor en Letras:
Ochocientos nueve millones ochocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y un pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 809,860,651.46

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Talonario o Papel 18764101681298 aprobado en 20251117 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: e92a6e4c098856a9658721995c5f7cb407adbfe51c69fde729a3541af379d16a742cb35ec4d4eb290314090161bcac2e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Código: GR-PR15-FT02
		Versión: 02
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURÍDICA	Vigencia: 08/04/2021
		Página 1 of 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**Identficación:** 901994058
Correo electrónico: facturasgrupotitaniumsas@gmail.com	**Teléfono:** 6017189431

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No:	630	**De:**	2025	**Plazo de ejecución:**	18	meses	0	dias	
Fecha de inicio:	11	11	2025	**Prorrogas:**	Meses	Dias	Meses	Dias	
					0	0	0	0	

Valor inicial	**Valor adición 1**	**Valor adición 2**	**Valor adición 3**	**Valor total**
$ 14.952.434.853	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.952.434.853

Objeto	Construcción y adecuación de la estación de bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SGC				
Dependencia	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	**Fecha de presentación de la cuenta:**	17	02	2026
Pago No:	2	**Periodo de pago:**	11-11-2025 al 31-12-2025		
Nro Factura:	004				

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya fueron pagados en periodos anteriores)

Total pagado	$ 6.728.595.684	**Saldo Actual**	$ 8.223.839.169	**Valor a pagar**	$ 445.423.358
Porcentaje de ejecución financiera:	45%		**Saldo menos este pago:**	$ 7.778.415.811	

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Proyecto/Rubro	Nº RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
O2301174503202402551401 4 O2320202005040554590	6000007118	2026	Estaciones de bomberos adecuadas - Otros servicios especializados de la construcción	$ 445.423.358
Subtotal				$ 445.423.358

ENDOSO	**En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:**		
Nombre:		**Identificación:**	
Valor a endosar:	$ 0	**Teléfono:**	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

facturacion@daimco.com.co : Aprobado por Interventoría

El valor de la factura 004 corresponde a $809.860.651, de conformidad a lo establecido en la clausula 1 forma de pago el valor a amortizar corresponde a $364.437.293 quedando un saldo a pagar correspondiente a $445.423.358.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de:	$ 445.423.358 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DE PESOS

Supervisor 1 11/11/2025 - 31/12/2025	**Supervisor 2**
Nombre:DAIMCO S A S	Nombre:
Cargo:INTERVENTORIA	Cargo:
Apoyo a la supervisión 1	**Apoyo a la supervisión 2**
Nombre:	Nombre:
No Contrato o Cargo:	No Contrato o Cargo:

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJ-FT08
		Versión: 02
	INFORME DE EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA Y ÓRDENES DE COMPRA	Vigencia: 26/07/2024
		Página 1 of 9

											Número de informe para pago	2	Fecha de presentación del informe	dd	mes	aaaa	
														17	2	2026	
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA																	
DATOS DEL CONTRATO																	
No. Contrato		**Año**	**Dependencia**					**Nombre del contratista**						**No. Identificación del contratista**			
630		2025	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA					CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						901994058			
Observaciones:																	
Objeto contractual:		Construcción y adecuación de la estación de bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SGC									**Valor inicial del contrato:**		**$ 14.952.434.853**	**Registro presupuestal (RP No.):**		**5000930443**	
Fecha de firma del contrato:			**Plazo (dias)**	**Fecha de inicio:**			**Fecha de terminación:**				**Período de reporte:**		**Nombre del supervisor:**		**Cargo del supervisor:**		
dd	**mes**	**aaaa**	**dias**	**dd**	**mes**	**aaaa**	**dd**	**mes**	**aaaa**	**En meses**							
3	10	2025	540	11	11	2025	10	5	2027	12			DAIMCO S A S -		INTERVENTORIA -		
MODIFICACIONES AL CONTRATO																	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN EL PERÍODO Y/O MODIFICACIONES DE PÓLIZAS											**Fecha de cargue**		**Fecha de modificación**	**Fecha de Aprobación de la Póliza**		**No. De poliza y Anexo**	
											26-11-2025		19-11-2025	19-12-2025		NB-100409424; ANEXO 2	
Modificación Contractual		**RP No.**	**Fecha de la modificación contractual**		**Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)**		**Valor de la modificación**			**Justificación de la modificación contractual**							
TOTAL MODIFICACIONES							**$ 0**										
NOMBRE DEL CEDENTE							**No. Identificación**										
NOMBRE DEL CESIONARIO							**No. Identificación**										
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.																	
Terminación anticipada			**Fecha de terminación**	**Acta de terminación**						**Fecha del acta de terminación anticipada**							
				SI		**NO**											
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																	
Valor Total de Contrato										**$ 14.952.434.853**							
Pagos realizados																	
Fecha		**Numero de pagos**	**%**				**Valor pagado ($)**			**Observaciones aclaratorias**							
13-11-2025		**1**	**45%**				**6728595684**										
			Ejecución financiera acumulada:				**$ 6.728.595.684**										
			Saldo Por Girar				**55%**			**$ 8.223.839.169**							
EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES																	
Obligaciones específicas del contrato										**Actividades realizadas**							
1	Previo a la suscripción del acta de inicio:																
2	Entregar la información del Personal propuesto junto con las hojas de vida y demás soportes como los certificados de experiencia, académicos y certificados de cursos de trabajo en alturas, establecidos en el anexo técnico, los cuales deben ser allegados a la interventoría en un plazo máximo de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato.									Se realiza entrega de la hojas de vida del personal junto con los soportes solicitados en los documentos previos del contrato, mediante correo electrónico del 10/10/2025; las cuales fueron aprobadas mediante oficio de interventoría								
3	Otorgar datos de contacto del residente de obra, quien deberá mantenerse al frente de los trabajos,									Se realiza entrega de los datos de contacto del residente de obra, mediante correo electrónico del								

	disponibles las 24 horas del día y del director quien estará autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten. los cuales deben ser allegados a la interventoría en un plazo máximo de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato.	10/10/2025.
4	Entregar tres (03) números telefónicos a la interventoría, y a la supervisión o quien este designe, para la permanente coordinación de los trabajos y garantizará los sistemas de comunicación con disponibilidad de 24 horas de los equipos de comunicación de su personal. los cuales deben ser allegados a la interventoría en un plazo máximo de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato.	Se realiza entrega de los tres números de contacto para la permanente coordinación de los trabajos, mediante correo electrónico del 10/10/2025
5	Anexar el Programa de “seguridad y salud en el trabajo” en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y decreto 1111 de 2017. Certificación expedida por la ARL o carta firmada por el empleador. El cual debe ser allegado a la interventoría en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de la firma del contrato.	Se realiza entrega del programa de seguridad y salud en el trabajo, mediante correo electrónico del 10/10/2025; el cual fue aprobado mediante oficio de interventoría 100025_BOMBEROS_004 del 10/11/2025
6	Remitir los Análisis de Precios Unitarios (APU´s) de cada una las actividades contractuales y desglose del (AIU) debidamente aprobados por la interventoría en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de la firma del contrato.	Se realiza entrega de loa análisis de precios unitarios contractuales y desglose del AIU, mediante correo electrónico del 31/10/2025 y 28/10/2025 respectivamente; los cuales fueron aprobados mediante oficio de interventoría 100025_BOMBEROS_004 del 10/11/2025
7	Programación de actividades de obra y Flujo de Caja. (Programación detallada, la cual incluya duración de las actividades, holguras, recursos físicos, ruta crítica, porcentaje de avance semanal y acumulado, entre otras). Este cronograma deberá ser entregado a la interventoría para su revisión y aprobación. Esta programación será de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, quien no podrá modificarla unilateralmente. La modificación de la programación de obra deberá fundarse en causas plenamente justificadas y demás requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, Teniendo en cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo Técnico Así mismo, se deja la claridad que los ajustes a la programación de obra no deberán superar el plazo de ejecución establecido ni el presupuesto definido para cada una de las vigencias, esta debe ser entregada dentro de los quince (15) días calendario a la firma del contrato	Se realiza entrega de la programación de actividades de obra y el flujo de caja, mediante correo electrónico del 22/10/2025 y 28/10/2025 respectivamente ; las cuales fueron aprobadas mediante oficio de interventoría 100025_BOMBEROS_004 del 10/11/2025
8	Actividades para desarrollar posterior a la suscripción del acta de inicio:	
9	Realizar la apropiación de los estudios y diseños, previa reunión del contratista con la interventoría y la supervisión, además de desarrollar visita técnica y presentar un informe de conclusiones de estos documentos, el cual debe ser allegado a la interventoría en un plazo máximo de un (1) mes calendario, paralelo a la ejecución de actividades preliminares establecidas en el presupuesto. El informe de conclusiones deberá ser entregado a la interventoría para su revisión y posterior aprobación, esta apropiación corresponde a la verificación de los entregables de los estudios y diseños, esto es, los permisos y licencias; topografía, estudio de suelos, ambiental y otros; diseños arquitectónico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades, cantidades, valores unitarios, valores parciales y AU contractuales y las especificaciones. Además, dicha auscultación de estos entregables contempla las siguientes actividades: • Revisión de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos, revisión de la vigencia de permisos y licencias, revisión de la licencia otorgada y el proyecto a construir. • Revisión de topografía, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentación, drenaje y estabilidad, manejo de impactos ambientales. • Revisión de memorias de cálculo y planos de los diseños. • Revisión del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revisión y aval al plan de inversión del anticipo, revisión y aval al plan SST. • Revisión de la programación de obra, es decir, la resultante de la consultoría de estudios y diseños. Dentro de dicho informe se tiene como alcance el revisar, analizar, proponer modificaciones, coordinar reuniones con consultoría de estudios y diseños y/o estructuradores, liderar la obtención de documentación faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad contratante conocer el panorama del proyecto. Adicionalmente el contratista deberá allegar los siguientes documentos dentro del tiempo de apropiación de los estudios y diseños, entre los que se encuentran: - Reprogramación de actividades de obra. De acuerdo con lo evidencia en la apropiación de los estudios y diseños el contratista deberá realizar la reprogramación (Programación detallada, la cual incluya duración de las actividades, holguras, recursos físicos, ruta crítica, porcentaje de avance semanal y acumulado, entre otras). Esta deberá ser entregada a la interventoría para su revisión y aprobación. Y la misma será de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, quien no podrá modificarla unilateralmente. La modificación de la programación de obra deberá fundarse en causas plenamente justificadas y demás requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, Teniendo en cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo Técnico Así mismo, nuevamente se deja la claridad que los ajustes a la programación de obra no deberán superar el plazo de ejecución establecido ni el presupuesto definido para cada una de las vigencias - Balance preliminar de actividades a ejecutar con las correspondientes memorias de cálculo bajo los parámetros establecidos por la interventoría y la supervisión - Programa de calidad, específico para el proyecto, el cual debe contener los lineamientos de calidad e	Se realiza primer envio de apropiación de diseños estructurales mediante correo electrónico por parte de la Directora de Obra el 12 de diciembre de 2025.

	indicadores que se deben tener en cuanto a los procesos constructivos, la calidad de los materiales a emplear, los acabados y las demás actividades y aspectos contemplados en el anexo técnico.	
10	Atender los requerimientos realizados por la interventoría del contrato o la entidad y corregir a su costa las fallas o las actividades que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, ó reemplazando los materiales que resulten defectuosos dentro de plazo máximo de tres (03) días calendario. Los tiempos que se requieran para estas acciones deben ser cumplidos independientemente a los tiempos dados en el cronograma de atención de requerimientos. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar y documentar la situación de forma inmediata al interventor del contrato.	Cumplido. Durante el inicio de la obra a la fecha, se han atendido los requerimientos de interventoría de acuerdo a las actividades ejecutadas.
11	El contratista deberá cumplir y atender de manera estricta las especificaciones técnicas contenidas en los documentos entregados por la consultoría, los cuales hacen parte integral de los insumos del proyecto y constituyen el marco de referencia técnico para la correcta ejecución de las actividades contractuales	Cumplido. Durante el inicio de la obra a la fecha, se han seguido especificaciones técnicas dadas por la consultoría.
12	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos y demás elementos necesarios dispuestos para el cabal cumplimiento del contrato, bajo las recomendación y aprobación del interventor y en las fechas indicadas en la programación detallada, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio.	Cumplido. Durante el inicio de la obra a la fecha, se han utilizado todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos y demás elementos necesarios dispuestos para el cabal cumplimiento del contrato, bajo las recomendación y aprobación del interventor.
13	Adquirir los materiales de construcción necesarios para la ejecución de las actividades contratadas de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su explotación, cumpliendo con las exigencias vigentes en el Distrito y contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos, estos deberán ser nuevos de primera calidad y cumplir con las especificaciones exigidas. Además, estos materiales y elementos a utilizar deben ser sometidos a inspección y aprobación ante la interventoría previo a su utilización y deben contar con la disponibilidad de personal y existencias de equipos, herramientas y materiales que garanticen la realización de estas.	Cumplido. Durante el inicio de la obra a la fecha, se han adquirido todos los materiales de construcción necesarios para la ejecución de las actividades contratadas de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su explotación, cumpliendo con las exigencias vigentes en el Distrito, contando con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos, de primera calidad y cumpliendo con las especificaciones exigidas.
14	Ejercer la dirección y control técnico y administrativo de todos los trabajos, con el objeto de desarrollar la obra, de conformidad con las normas y especificaciones pactadas. En este orden de ideas el ejecutor se compromete a corregir a sus expensas cualquier actividad que a juicio del interventor resulte mal ejecutada siempre y cuando obedezca a causas imputables al mismo sin generar afectaciones en la programación de actividades.	Cumplido. Durante el inicio de la obra a la fecha, se ha realizado la dirección y control técnico y administrativo de todos los trabajos, con el objeto de desarrollar la obra, de conformidad con las normas y especificaciones pactadas.
15	El contratista debe dejar en perfecto estado de aseo las áreas intervenidas y asumir los costos que esto genere.	Cumplido. Durante el inicio de la obra a la fecha, se ha realizado el orden y aseo de las diferentes áreas intervenidas.
16	Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos, defectos constructivos o de la mano de obra, deberá ser demolida y/o remplazada por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR.	Cumplido. A la fecha no se han presentado problemáticas con las actividades ejecutadas ni materiales utilizados.
17	Radicar las facturas correspondientes a las actas parciales de obra, junto con los soportes técnicos que den cumplimiento de sus obligaciones, para revisión y aval de la interventoría	Cumplido. El presente informe es la primera acta parcial de obra.
18	Mantener, proveer e instalar durante la ejecución de la obra, las señales preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente y la orientación vehicular de ser necesario para la circulación. Además de las medidas de seguridad necesarias para aislar la zona de las obras, así como someterse a las normas de vigilancia y seguridad y salud en el trabajo correspondientes y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar las personas y la calidad, estabilidad, acabados de los inmuebles aledaños y las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes y realizar la reparación de los espacios públicos y privados aledaños a los lugares de la obra que hayan sido deteriorados con ocasión de los trabajos de este proceso, dentro de los tres días (03) hábiles siguientes a la intervención	Cumplido. A la fecha se han instalado las diferentes señales en obra y alrededores de acuerdo a normativa.
19	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: - Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. – Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. – Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.	Cumplido. A la fecha se ha seguido a cabalidad el plan de seguridad y salud en el trabajo; junto con seguridad industrial en obra.
20	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostáticas, de estanqueidad, de resistencia del concreto y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto, solicitadas por parte del INTERVENTOR para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y	No aplica. A la fecha no se han realizado actividades o utilizado materiales que requieran ensayos o pruebas.

	demás elementos que se instalen en la obra. Los laboratorios que ejecuten estas pruebas o ensayos deberán contar con la correspondiente certificación ONAC	
21	Usar procedimientos adecuados para la conservación y protección evitando cualquier daño o deterioro que se pueda ocasionar a la arborización o las estructuras que se encuentren en la zona de los trabajos. Los daños y perjuicios ocasionados por el contratista serán reparados o indemnizados a su costa.	Cumplido. Se han implementado procedimientos en pro de no afectar elementos arbóreos o estructuras que se encuentren en la zona.
22	Atender el almacenamiento adecuado, la conservación y la seguridad de todos los materiales, herramientas y elementos que adquiera con destino a la obra y utilice para su desarrollo.	Cumplido. Ya se tiene el cuarto de almacenamiento de la obra debidamente organizado.
23	Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el interventor, el supervisor, la entidad o autoridad competente colombiana, debidamente documentado con registro fotográfico o videos y demás soportes, donde se evidencie las condiciones de la obra y suscribir los documentos necesarios solicitados por la entidad.	Cumplido. A la fecha se han enviado los informes solicitados por interventoría, entidad y autoridad competente.
24	Ceñirse a la programación de obra validada y aprobada por el interventor	Cumplido. Se ha seguido la programación de obra de manera rigurosa.
25	Prestar Asesoría a la obra, a través del personal especializado cuando la naturaleza de los trabajos así lo exijan.	Cumplido. Los asesores contractuales e incluso extracontractuales han estado en constante revisión de diseños y actividades de obra.
26	En caso de que, por cambios normativos, técnicos o por requerimientos de las autoridades competentes, se requiera realizar modificaciones a la licencia de construcción inicialmente otorgada, el contratista deberá adelantar los trámites correspondientes para gestionar dichas modificaciones, incluyendo la actualización de planos, estudios técnicos y documentación exigida por la normatividad vigente, garantizando en todo momento el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables.	No aplica. A la fecha no se han realizado cambios a la licencia de construcción.
27	Controlar todo el personal a su cargo, respondiendo a las exigencias cualitativas que haga el interventor para alcanzar los objetivos fundamentales de la obra, en cuanto a plazo, coordinación, precios y calidad	Cumplido. Se ha controlado el personal a cargo de manera rigurosa.
28	Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance	Cumplido. Se tiene registro fotográfico de las actividades semanales.
29	El contratista no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin previa aprobación por la interventoría, sin que se haya suscrito el acta de aprobación de ítems no previstos. Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa del acta, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA no reconocerá valores por tal concepto.	No aplica. A la fecha no se han tramitado ítems no previstos.
30	Garantizar un canal efectivo de comunicación, el cual será acordado con el interventor previo al acta de inicio del contrato.	Cumplido. Se tiene un canal efectivo de comunicación con interventoría desde el inicio de la obra.
31	Cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y sus anexos.	Cumplido. Desde el inicio de las actividades se ha seguido con rigurosidad las especificaciones en el anexo técnico y anexos.
32	Cumplir con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato y en caso de que se requiera cambios en el personal aprobado, el contratista deberá informar al interventor y presentará la (las) hoja (as) de vida con sus soportes del personal nuevo, el cual deberá cumplir o superar los requisitos solicitados por la Entidad en el Anexo Técnico, debiendo ser aprobado por el interventor.	Cumplido. Desde el inicio de la obra se ha tenido el personal requerido en obra.
33	Cubrir los costos directos e indirectos que se generen con relación al transporte y personal requerido para ejecutar el objeto contractual, así mismo con la correcta instalación de los elementos señalados en el Anexo Técnico.	Cumplido. Se han cubierto los costos directos e indirectos generados por transporte y personal.
34	Informar oportuna y formalmente al interventor sobre cualquier irregularidad que se advierta en el desarrollo del contrato.	No aplica. No se han presentado irregularidades.
35	En caso de requerir prórroga para el plazo de ejecución la misma deberá ser verificada y aprobada por la interventoría,	No aplica. A la fecha no se ha requerido prorroga.
36	ITEM NO PREVISTOS: Para el reconocimiento de ítems no previstos (NP) el contratista deberá seguir el procedimiento establecido en el anexo técnico.	No aplica. A la fecha no han surgido ítems no previstos.
37	Cumplir con los ofrecimientos realizados en la oferta de acuerdo con los factores ponderables previstos en el Pliego de Condiciones.	Cumplido. A la fecha se ha cumplido con los ofrecimientos realizados en la oferta de acuerdo a factores ponderables.
38	El contratista de obra deberá adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.	Cumplido. Se ha adelantado gestiones con entidades para la ubicación de servicios públicos y provisionales de obra.
39	Instalar Una (1) valla de información de la obra (Min. 2 M2), en el sitio de ejecución indicado por el INTERVENTOR, de acuerdo con la información y condiciones exigidas por la UAECOB. Esta valla deberá	En proceso de cumplimiento. Durante la presente semana se recibió arte de la valla informática y esta en proceso de fabricación.

	actualizarse y permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra, acorde con las especificaciones antes establecidas.	
40	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la UAECOB.	Cumplido. Dia a día se ha diligenciado bitácora de obra.
41	En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 modificado por el Artículo 2 del Decreto 634 de 2023, el contratista se obliga a que el 13.8% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Cumplido. A la fecha, mas del 13,8 del personal vinculado es femenino.
42	Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020 modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.	Cumplido. Se han registrado las mujeres que trabajan y que potencialmente trabajaran en el consorcio en la plataforma "Bogotá Trabaja"
43	Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Cumplido. Día a día el consorcio previene el abuso y acoso sexual y demás violencias basadas en genero dentro y fuera de la obra.
44	Asistir a los comités de obra programados por la interventoría y/o la supervisión de interventoría a fin de analizar el avance normal de las diferentes actividades según programación de obra.	Cumplido. Se ha asistido a los comités de obra semanales.
45	El contratista de obra deberá actualizar dentro los 15 días calendario siguientes al requerimiento por parte de la interventoría, el balance de las actividades y las correspondientes memorias de cálculo bajo los parámetros establecidos	No aplica. A la fecha no ha habido requerimientos de balance de actividades o correspondientes a memorias de calculo.
46	Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusivas o parcialmente imputables al contratista sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por esta prórroga serán por cuenta del contratista en la proporción equivalente a su imputabilidad, incluido el pago del interventor.	No aplica. No se ha requerido prorrogar el contrato.
47	En caso que por cambio en apartes de la normativa o modificaciones por parte de las empresas de servicios públicos durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá realizar el o los ajustes pertinentes en los diseños finales	No aplica. No ha habido cambios en normativas de las empresas de servicios públicos.
48	El contratista en atención al Decreto 1860 de 2021, deberá incluir y mantener durante la ejecución del contrato, como mínimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan con alguna(s) de las siguientes características de población: i) Víctimas del conflicto armado interno. ii) Mujeres cabeza de familia. ii) Adultos mayores. iii) Personas en condición de discapacidad. iv) Población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. La verificación del cumplimiento de la presente obligación será realizada por el interventor del contrato.	Cumplido. Desde el inicio de la obra y a la fecha el 5% del personal presenta dichas características de población.
49	Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto del presente proceso	Cumplido. Desde el inicio de la obra y a la fecha se cumplido con rugosidad con la totalidad de las exigencias y especificaciones del contrato.
50	Obligaciones para cumplir posteriores a la suscripción del acta de recibo.	
51	Atender cualquier novedad relacionada con calidad y correcto funcionamiento de los bienes, obras y/o servicios adquiridos dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación por parte del interventor o la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA. Durante la vigencia de las respectivas garantías	No aplica. Dicho informe es de acta parcial.
52	Presentar un informe final avalado por la interventoría dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del acta de recibo final, el cual debe estar elaborado con base a lo descrito en el CAPITULO II. ANEXO TECNICO, numeral 1.6.3 INFORME FINAL.	No aplica. Dicho informe es de acta parcial.
53	OBLIGACIONES AMBIENTALES	
54	El contratista, en el momento en el que se encuentre dentro de las instalaciones de la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA debe cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad,	Cumplido. A la fecha se ha cumplido con lineamientos de la entidad contratante de acuerdo al PIGA.

	establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, para conocer estos, en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato debe solicitar y realizar una reunión con el Área de Gestión Ambiental.	
55	Garantizar que en la obra no se afecte ningún individuo arbóreo, de lo contrario, se deberá realizar el trámite de manejo silvicultural frente a la Secretaría Distrital de Ambiente, hasta la obtención del permiso y cumplir con la compensación que sea aplicada	Cumplido. A la fecha no se afectado ningún individuo arbóreo.
56	Propender porque los materiales de embalaje y/o implementos utilizados en el proceso constructivo sean catalogados como de baja carga contaminante, sin que ello implique pérdida de la calidad de los productos.	No aplica. A la fecha no se han utilizado materiales de baja carga contaminante.
57	El contratista deberá remitir las fichas técnicas y los manuales de uso de los equipos y productos utilizados durante la ejecución de la obra. Así mismo el proveedor deberá proporcionar las hojas de seguridad en español.	Cumplido. La oficina de compras esta trabajando en la entrega de fichas técnicas de los materiales utilizado en obra.
58	El contratista, para la presentación de informes físicos, deberá dar un adecuado uso al recurso papel, donde se garantice su ciclo sostenible. En todo caso, este deberá ser fabricado con papel reciclado, de alto rendimiento, que cuente con procesos de recuperación, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. Adicionalmente, debe estar libre de cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, deberá presentar un certificado que acredite el cumplimiento del presente criterio ambiental	No aplica. A la fecha no se han presentado informes en físico.
59	El contratista deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental -PMA, que garantice la prevención, mitigación, compensación y corrección de los impactos ambientales causados al medio biótico, abiótico y socioeconómico y el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD, dando cumplimiento del Decreto 507 de 2023, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, el cual deberá ser aprobado por la interventoría.	Cumplido. PMA ya fue presentado y enviado con las subsanaciones pertinentes el 11 de diciembre de 2025.
60	Implementar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 507 de 2023, Resolución 0472 de 2017 modificada parcialmente por la resolución 1257 de 2021 y demás que modifiquen o adicionen al Instructivo de Gestión Integral de RCD de la Entidad y de la SDA; mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposición, indicadores, costos, transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el acompañamiento hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidación del contrato.	Cumplido. Desde el inicio de obra se ha implementado la gestión integral de residuos de construcción y demolición.
61	Presentar a la interventoría, cada vez que en el marco del desarrollo de las actividades objeto del contrato, se generen residuos peligrosos y/o especiales, como lo son: tintas, tóner, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE, disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que tengan contacto con los mencionados), el Certificado de Disposición Final adecuada de los residuos peligrosos generados, garantizando el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005. En cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar los soportes que permitan evidenciar esto	No aplica. A la fecha no se han generado residuos considerados peligrosos.
62	Garantizar que el transporte de los RCD se debe realizar por empresas autorizadas para tal fin. El material transportado debe poseer la protección necesaria para evitar el desplazamiento y la emisión del material particulado como lo señala la Resolución 0472 de 2017 modificada parcialmente por la resolución 1257 de 2021 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. La disposición final de residuos de construcción y demolición debe ser realizada por gestores modalidad “sitios de disposición final de RCD” autorizadas por la Autoridad Ambiental competente, haciendo entrega de las certificaciones de disposición final al interventor del contrato.	Cumplido. El transporte de los RCD se ha realizado con empresas certificadas y capacitadas en este ámbito.
63	El contratista deberá velar porque las obras a ejecutar generen el menor impacto auditivo y laborar durante los horarios respectivos para no generar ruido conforme lo dicta el Decreto 948 de 1995, que regula lo relacionado con aire y ruido, y a la Resolución 627 de 2006, la cual reglamente lo relacionado con emisión de ruido y ruido ambiental y la ley de emisión de sonidos en construcciones 450 del 2025	Cumplido. En lo posible, se ha tratado de que el ruido sea mínimo en la obra y, se ha respetado el horario laboral propuesto desde el inicio.
64	El contratista, garantizará que uno de los materiales de construcción sea sostenible, donde la materia prima sea de una fuente abundante y renovable, que los productos sean de larga duración, no contaminantes. Es importante que se conozca el análisis del ciclo de vida (ACV) de los productos de construcción de acuerdo con la norma ISO 14040, lo cual se demostrara mediante la presentación de la ficha técnica ambiental del producto como soporte de cumplimiento	Cumplido. Los materiales utilizados a la fecha son sostenibles, de fuente a abundante y renovables.
65	El contratista deberá contemplar, la viabilidad del aprovechamiento de granulo de caucho reciclado, en zonas y/o áreas del proyecto que así lo ameriten como (pisos de gimnasios, topes de zonas de parqueo, mobiliarios etc.), en cumplimiento a los programas de aprovechamiento de este material reciclado (Si aplica)	No aplica. No se han retirado cauchos.
66	El contratista instalará partes o accesorios de los sistemas hidrosanitarios que estén relacionados con sensores de bajo consumo y ahorradores para el uso racional y eficiente del agua en los baños, orinales,	Cumplido. Se han instalado sistemas hidrosanitarios de bajo consumo y ahorradores.

	duchas y lavamanos conforme se señala en la Ley 373 de 1997 y el Decreto 3102 de 1997 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. Para lo cual, deberá entregar las fichas técnicas al interventor del contrato	
67	El contratista instalará partes o accesorios de los sistemas eléctricos con sensores de alta eficiencia energética mediante la cual se fomente el uso racional y eficiente energías alternativas de acuerdo con la Ley 697 de 2001 y al Decreto 2501 de 2007. Igualmente, debe contemplar los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas conforme a la Resolución 40150 de 2024. Así mismo, debe hacer cumplir el reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE conforme a la resolución 90795 de 2014 y a la Resolución 90708 de 2013 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya Para lo cual, deberá entregar las fichas técnicas al interventor del contrato.	Cumplido. Se han instalado sistemas eléctricos de alta eficiencia.
68	Es necesario que el contratista especifique claramente el parque automotor que pondrá a disposición del contrato, anexando para ello el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente conforme a la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, la cual deberán llevar a cabo en los Centros de Diagnóstico Automotriz –CDA autorizados por la autoridad competente, y el mismo, será entregado a la interventoría del contrato en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato y cuantas veces sea renovado, durante la ejecución.	Cumplido. Desde el inicio de la obra se envio parque automotor que pondrá a disposición del contrato.
69	El contratista deberá aplicar los procedimientos, controles y acciones preventivas necesarias para manejar de manera adecuada y segura los residuos de asbesto y productos que lo contengan, en cumplimiento de la Resolución 07 de 2011, por la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad del Crisolito y otras Fibras de uso similar, publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.	Cumplido. Se ha dado manejo de acuerdo a la ley de los residuos en asbesto y productos que lo contengan.
70	Realizar la estructura de la estación teniendo en cuenta el flujo de aire natural de la zona para aprovechar la aireación y de esta manera generar un flujo de aire constante al interior de los espacios de la estación y una óptima recirculación, lo anterior atendiendo lo estipulado en la NTC 5183 y demás normas aplicables.	Cumplido. Desde el inicio de actividades se tiene contemplado que la estación cuente con flujo natural para los diferentes espacios.
71	El contratista, instalara un sistema de captación de aguas lluvias, el cual permita el almacenamiento y aprovechamiento y distribución de aguas lluvias dentro de la estación. En cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar informe mensual del cumplimiento de los criterios ambientales dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes. Nota 1: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por EL CONTRATISTA deben ser debidamente verificados y avalados por el interventor y remitidos al equipo de gestión ambiental de la entidad. Nota 2: EL CONTRATISTA debe manifestar en la “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” la aceptación y compromiso en el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones ambientales establecidas en el presente Anexo Técnico.	Cumplido. Dentro de los diseños establecidos se tiene la instalación de sistema de captación de aguas lluvias dentro de la estación.
72	OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
73	El contratista debe acreditar previo a la suscripción del acta de inicio, la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019; para ello deberá aportar la última autoevaluación de Estándares Mínimos firmada por el representante legal y el responsable del SGSST.	Cumplido. Antes de la suscripción del acta de inicio se implemento el sistema de gestión y seguridad en el trabajo.
74	El contratista debe contar con el personal idóneo para la prestación del servicio, el cual deberá estar equipado de los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para el ejercicio de sus actividades, lo cual se verificará con los registros de entrega de EPP, para todas las actividades a realizar por el supervisor del contrato o sus apoyos.	Cumplido. Desde el inicio del contrato y a la fecha el personal esta equipado con sus EPPs y realizan actividades debidamente supervisados..
75	Garantizar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad social: salud, pensión, y administradora de riesgos laborales verificado contra la certificación de pago de parafiscales expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal de la Empresa y el anexo seguido de las planillas respectivas debidamente pagadas.	Cumplido. Profesional en seguridad y salud en el trabajo se asegura que personal de obra se encuentra afiliado en salud, pensión y administradora de riesgos laborales.
76	Será obligación del interventor del contrato verificar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensión y la Administradora de Riesgos laborales – ARL y realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo vigente, por parte del contratista.	Cumplido. Interventoría revisa todas las afiliaciones al sistema general de seguridad social de todos los trabajadores del personal de obra.
77	El contratista deberá aportar Certificado de ARL donde indique la clase de riesgo vigente no superior a treinta (30) días.	Cumplido. Personal en seguridad y salud en el trabajo aporta certificados de arl de personal administrativo y operario.
78	El contratista deberá certificar que dentro de su personal no cuenta con menores de dieciocho (18) años.	Cumplido. Profesional de seguridad y salud en el trabajo se ha asegurado que no haya personal menor de edad.
79	Contar con la respectiva señalización de las zonas de trabajo.	Cumplido. Haciendo uso del plan de seguridad y salud en el trabajo se han señalizado las zonas de

		trabajo pertinentes.
80	Presentar las certificaciones de calibración de los equipos utilizados para testeo (cuando aplique). Para las pruebas de testeo y/o calibración los patrones usados deben tener un certificado de calibración vigente de acuerdo con la normatividad de la Superintendencia de Industria y Comercio por uno de los laboratorios autorizados por este Organismo.	Cumplido. A la fecha se han entregado las calibraciones de los equipos utilizados.
81	Contar con las ayudas mecánicas apropiadas para el cargue y descargue de equipos, evitando exponer a trabajadores propios y de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. a lesiones por levantamiento de cargas.	Cumplido. Se han utilizado las cargas mecánicas necesarias para descargue de material y/o equipos.
82	Tener disponible las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados para la labor (si aplica).	No aplica. A la fecha no se han utilizado productos químicos.
83	Entregar recomendaciones sobre el uso seguro y adecuado de los equipos.	No aplica. A la fecha no se han instalado equipos.
84	Entregar la hoja de vida del equipo instalado especificando los mantenimientos preventivos a realizar en cantidad y periodicidad.	No aplica. A la fecha no se han instalado equipos.
85	Para realizar trabajos de alto riesgo es necesario contar con procedimientos y normas de seguridad aplicables a las distintas actividades que se realizan, en estos procedimientos debe estar muy claro que personal es responsable y que personal realiza la labor, así como las medidas que se tomaron en el antes, durante y después de la actividad siguiendo los lineamientos exigidos por el área de Seguridad y salud en el Trabajo. Entiéndase como tareas de alto riesgo (Trabajos en alturas, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, espacios confinados). Dando cumplimiento a los lineamientos anteriormente descritos el personal contratista debe cumplir con los siguientes requerimientos: Contar con personal debidamente certificado para la realización de la tarea de alto riesgo al interior de las instalaciones de la UAECOB. En cada tarea de alto riesgo que se ejecute al interior de las instalaciones de la UAECOB, el contratista deber asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, esto será corroborado por personal del contratista previo al desarrollo de las actividades. Contar con las herramientas y equipos de protección adecuados para la labor. Cumplir con la señalización del área a intervenir limitando el acceso al personal no autorizado.	Cumplido. Se cuenta con procedimientos y normas aplicables a las actividades de alto riesgo. Dejando claro personal responsable.
86	El contratista debe garantizar que cumple con toda la normatividad correspondiente a sismorresistencia, ingreso y egreso para personal en condición de discapacidad o movilidad reducida, seguridad y riesgo público, señalización de seguridad vial, señalización de emergencias, ventilación y contar con las zonas de almacenamiento, mantenimiento y reparación que se requieran conforme a la misionalidad de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá.	Cumplido. Se ha garantizado cumplimiento de normatividad sismorresistente, señalización vial, emergencias y ventilación
87	OBLIGACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ	
88	Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el pliego de Condiciones	
89	Entregar al Contratista toda la información y facilidades que sean necesarias para la adecuada ejecución del contrato.	
90	Verificar el adecuado funcionamiento de los bienes, obras y/o servicios adquiridos.	
91	Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.	

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS) SI APLICA

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega:			Anexo al informe del mes de:	Observaciones
ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01	aa	mm	yyyy	Diciembre	
	17	2	2026		

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

facturacion@daimco.com.co : Aprobado por Interventoría

El valor de la factura 004 corresponde a $809.860.651, de conformidad a lo establecido en la clausula 1 forma de pago el valor a amortizar corresponde a $364.437.293 quedando un saldo a pagar correspondiente a $445.423.358.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Nombre del Contratista:	Nombre del apoyo a la supervisión	Nombre del supervisor 1	Nombre del supervisor 2

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**DAIMCO S A S**	
					INTERVENTORIA	
					11/11/2025 - 31/12/2025	
NÚMERO DE FACTURA	004	**Supervisor:** Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Compra Pública (SECOP) y a reportar el avance al expediente contractual o como lo dispongan las normas de gestión documental de la UAECOB				
FECHA DE FACTURA	004	FECHA APROBACION INFORME	17-02-2026		FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA AL AREA FINANCIERA	17-02-2026
						

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos de calidad

UAECOB-CONTRATO-630-2025 - 0013 - 45667

Bogotá, D.C. 4 de febrero de 2026

Señores
DAIMCO S.A.S
Atn. ARQ. GABRIEL DUARTE ORJUELA
DIRECTOR DE OBRA
Calle 44B #57a-52, Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. UAECOB – 630 - 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC"

Asunto: CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Yo, **CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON,** identificado con cedula de ciudadanía No.1.019.007.501 de BOGOTA D.C., en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, certifico que CONSORCIO OBRAS COMANDO 2023 identificado con NIT. 901.734.446-1 ha cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y actualmente se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Agradecemos su atención y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Cordialmente,

ING. CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
01	**PRELIMINARES**																
1.01	**DEMOLICIONES Y RETIROS**																
1.01.01	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	m3	52.90	280,636.31	14,845,660.80	52.90	$ 14,845,660.80	541.65	$ 152,007,218.58	541.65	$ 152,007,218.58	1023.92%	1.39%	-488.75	-$ 137,161,557.79	-923.92%	-1.26%
1.01.02	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA DE ENTREPISO < e= 20 CMS	m2	405.03	80,562.62	32,630,277.98	405.03	$ 32,630,277.98	556.74	$ 44,852,433.06	556.74	$ 44,852,433.06	137.46%	0.41%	-151.71	-$ 12,222,155.08	-37.46%	-0.11%
1.01.03	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMIENTOS	m3	14.54	301,269.54	4,380,459.11	14.54	$ 4,380,459.11	115.00	$ 34,645,997.10	115.00	$ 34,645,997.10	790.92%	0.32%	-100.46	-$ 30,265,537.99	-690.92%	-0.28%
1.01.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m	222.71	45,366.69	10,103,615.53	222.71	$ 10,103,615.53		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	222.71	$ 10,103,615.53	100.00%	0.09%
1.01.05	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE	m2	292.98	60,110.03	17,610,916.37	292.98	$ 17,610,916.37	154.78	$ 9,303,590.00	154.78	$ 9,303,590.00	52.83%	0.09%	138.20	$ 8,307,326.37	47.17%	0.08%
1.02	**INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES**																
1.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROVISIONAL DE AGUA	m	30.00	39,625.52	1,188,765.60	30.00	$ 1,188,765.60	58.80	$ 2,329,980.58	58.80	$ 2,329,980.58	196.00%	0.02%	-28.80	-$ 1,141,214.98	-96.00%	-0.01%
1.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROVISIONAL DE ENERGÍA	m	30.00	184,795.86	5,543,875.80	30.00	$ 5,543,875.80	112.06	$ 20,708,224.07	112.06	$ 20,708,224.07	373.53%	0.19%	-82.06	-$ 15,164,348.27	-273.53%	-0.14%
1.03	**TRABAJOS PRELIMINARES**																
1.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMACIÓN LICENCIA	und	1.00	62,983.80	62,983.80	1.00	$ 62,983.80	1.00	$ 62,983.80	1.00	$ 62,983.80	100.00%	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	2,968.11	7,485.28	22,217,134.42	2,968.11	$ 22,217,134.42	2,964.49	$ 22,190,037.71	2,964.49	$ 22,190,037.71	99.88%	0.20%	3.62	$ 27,096.71	0.12%	0.00%
1.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA Y DESCAPOTE	m2	2,968.11	36,569.11	108,541,141.08	2,968.11	$ 108,541,141.08	2,135.16	$ 78,081,047.18	2,135.16	$ 78,081,047.18	71.94%	0.71%	832.95	$ 30,460,093.90	28.06%	0.28%
1.03.04	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESCAPOTE	m3	593.62	82,003.13	48,678,862.04	593.62	$ 48,678,862.04	427.03	$ 35,018,026.21	427.03	$ 35,018,026.21	71.94%	0.32%	166.59	$ 13,660,835.82	28.06%	0.12%
1.04	**CAMPAMENTO DE OBRA**																
1.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO DE OBRA MAMPOSTERÍA	m2	52.00	178,984.76	9,307,207.52	52.00	$ 9,307,207.52	68.53	$ 12,265,825.60	68.53	$ 12,265,825.60	131.79%	0.11%	-16.53	-$ 2,958,618.08	-31.79%	-0.03%
1.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALQUILER DE 3 BAÑOS PORTÁTILES	mes	10.00	607,040.50	6,070,405.00	10.00	$ 6,070,405.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 6,070,405.00	100.00%	0.06%
1.05	**CERRAMIENTO**																
1.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA	m	222.71	40,778.18	9,081,708.47	222.71	$ 9,081,708.47	199.83	$ 8,148,703.71	199.83	$ 8,148,703.71	89.73%	0.07%	22.88	$ 933,004.76	10.27%	0.01%
1.06	**RELLENOS Y REEMPLAZOS**																
1.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO Y CONFORMACIÓN EN RECEBO B-200 PLATAFORMA PARA PILOTAJE CAPACIDAD 80 TON - SEGÚN SOLICITUD CONTRATISTA	m3	327.50	37,375.80	12,240,574.50	327.50	$ 12,240,574.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	327.50	$ 12,240,574.50	100.00%	0.11%
1.07	**TALA Y TRASLADO DE ARBOLES**																
1.07.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TALA DE ÁRBOL PORTE MENOR HASTA 2,50 METROS DE ALTURA	und	18.00	489,240.49	8,806,328.82	18.00	$ 8,806,328.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.00	$ 8,806,328.82	100.00%	0.08%
1.07.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TALA DE ÁRBOL PORTE MEDIO ENTRE 2,51 A 5,00 METROS DE ALTURA	und	12.00	951,241.47	11,414,897.64	12.00	$ 11,414,897.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 11,414,897.64	100.00%	0.10%
1.07.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TALA DE ÁRBOL PORTE MAYOR ALTURA MAYOR A 5.01 METRO	und	15.00	1,347,283.30	20,209,249.50	15.00	$ 20,209,249.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 20,209,249.50	100.00%	0.18%
02	**CIMENTACIÓN**																
2.01	**MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACIÓN**																
2.01.01	EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA TANQUES	m3	214.68	56,438.67	12,115,971.48	214.68	$ 12,115,971.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	214.68	$ 12,115,971.48	100.00%	0.11%
2.01.02	EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN MANUAL PREHUECOS (PILOTES)	m3	10.96	111,763.58	1,224,603.58	10.96	$ 1,224,603.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.96	$ 1,224,603.58	100.00%	0.01%
2.01.03	EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	104.74	51,592.06	5,403,752.36	104.74	$ 5,403,752.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	104.74	$ 5,403,752.36	100.00%	0.05%
2.01.04	EJECUCIÓN DE PERFILADA DE TALUDES PARA TANQUES	m3	187.50	33,426.73	6,267,518.56	187.50	$ 6,267,518.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	187.50	$ 6,267,518.56	100.00%	0.06%
2.01.05	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	m3	517.87	79,695.53	41,272,106.61	517.87	$ 41,272,106.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	517.87	$ 41,272,106.61	100.00%	0.38%
2.02	**CIMENTACIONES SUPERFICIALES**																
2.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASES EN CONCRETO CICLÓPEO e=40 cm - 40% rajón - 60% Concreto f'c=21MPa	m3	33.97	381,834.79	12,971,691.49	33.97	$ 12,971,691.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	33.97	$ 12,971,691.49	100.00%	0.12%
2.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DADOS EN CONCRETO f'c=28 MPa	m3	56.03	938,694.37	52,595,045.55	56.03	$ 52,595,045.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	56.03	$ 52,595,045.55	100.00%	0.48%
2.02.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 35x45 f'c=24.5 Mpa	m	154.83	200,522.22	31,046,855.32	154.83	$ 31,046,855.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	154.83	$ 31,046,855.32	100.00%	0.28%
2.02.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 55x75 f'c=24.5 MPa	m	104.29	373,002.59	38,900,440.11	104.29	$ 38,900,440.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	104.29	$ 38,900,440.11	100.00%	0.36%
2.02.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 35x35 f'c=24.5 MPa - CERRAMIENTO	m	179.50	172,492.37	30,962,380.42	179.50	$ 30,962,380.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	179.50	$ 30,962,380.42	100.00%	0.28%
2.03	**CIMENTACIONES Profundas**																
2.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-1 L=30m D=0.5m - f'c=24.5MPa	m	1,440.00	315,067.05	453,696,552.00	1,440.00	$ 453,696,552.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,440.00	$ 453,696,552.00	100.00%	4.15%
2.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-2 L=31m D=0.5m - f'c=24.5MPa	m	93.00	315,067.05	29,301,235.65	93.00	$ 29,301,235.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	93.00	$ 29,301,235.65	100.00%	0.27%
2.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-3 L=30m D=0.7m - f'c=24.5MPa	m	240.00	446,208.20	107,089,968.00	240.00	$ 107,089,968.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	240.00	$ 107,089,968.00	100.00%	0.98%
2.03.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-4 L=32m D=0.5m - f'c=24.5MPa	m	288.00	315,067.05	90,739,310.40	288.00	$ 90,739,310.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	288.00	$ 90,739,310.40	100.00%	0.83%
2.03.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-5 L=7m D=0.3m - f'c=24.5MPa	m	273.00	103,466.08	28,246,239.84	273.00	$ 28,246,239.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	273.00	$ 28,246,239.84	100.00%	0.26%
2.03.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DESCABECE DE PILOTES	m3	24.50	251,399.37	6,159,284.57	24.50	$ 6,159,284.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	24.50	$ 6,159,284.57	100.00%	0.06%
2.04	**LOSAS DE CIMENTACIÓN**																
2.04.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO e=15cm f'c=24.5 MPa - INTERIORES	m2	892.35	142,313.79	126,993,710.51	892.35	$ 126,993,710.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	892.35	$ 126,993,710.51	100.00%	1.16%
2.05	**SUMINISTROS CONCRETOS Y OTROS (ACTIVIDADES DIFERENTES A ELEMENTOS ESTRUCTURALES)**																
2.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 1.500PSI (CONCRETO DE LIMPIEZA)	m3	8.61	451,298.71	3,884,027.13	8.61	$ 3,884,027.13		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.61	$ 3,884,027.13	100.00%	0.04%
2.06	**ACERO DE REFUERZO**																
2.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	kg	63,535.50	5,307.21	337,196,240.96	63,535.50	$ 337,196,240.96	33,411.18	$ 177,320,148.85	33,411.18	$ 177,320,148.85	52.59%	1.62%	30,124.32	$ 159,876,092.11	47.41%	1.46%
2.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR XX-257	kg	4,780.45	5,929.57	28,345,991.73	4,780.45	$ 28,345,991.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4,780.45	$ 28,345,991.73	100.00%	0.26%
03	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**																
3.01	**EXCAVACIONES**																
3.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN MANUAL	m3	220.45	51,592.06	11,373,469.63	220.45	$ 11,373,469.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	220.45	$ 11,373,469.63	100.00%	0.10%
3.02	**RELLENOS Y REEMPLAZOS**																
3.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA)	m3	22.78	99,994.64	2,278,077.89	22.78	$ 2,278,077.89		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.78	$ 2,278,077.89	100.00%	0.02%
3.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN GRAVILLA	m3	72.58	100,999.13	7,330,112.86	72.58	$ 7,330,112.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	72.58	$ 7,330,112.86	100.00%	0.07%
3.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	m3	81.00	24,968.24	2,022,477.38	81.00	$ 2,022,477.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	81.00	$ 2,022,477.38	100.00%	0.02%
3.03	**RETIROS**																
3.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE RETIRO MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	139.45	91,465.80	12,754,722.88	139.45	$ 12,754,722.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	139.45	$ 12,754,722.88	100.00%	0.12%

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
3.04	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA**																
3.04.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE NICHO MAMPOSTERÍA PARA CAJILLA METÁLICA Y MEDIDOR TOTALIZ. 1/2" DIM=0,30x0,60x0,15 M. INCLUYE CAJILLA Y MEDIDOR.	und	1.00	484,175.77	484,175.77	1.00	$ 484,175.77		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 484,175.77	100.00%	0.00%
3.04.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (1.00X1.00)M	und	2.00	736,508.79	1,473,017.58	2.00	$ 1,473,017.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,473,017.58	100.00%	0.01%
3.04.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (0.80X0.80)M	und	1.00	681,146.56	681,146.56	1.00	$ 681,146.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 681,146.56	100.00%	0.01%
3.04.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (0.60X0.60)M	und	5.00	435,555.62	2,177,778.10	5.00	$ 2,177,778.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 2,177,778.10	100.00%	0.02%
3.04.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (0.80X0.80)M	und	6.00	681,146.56	4,086,879.36	6.00	$ 4,086,879.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 4,086,879.36	100.00%	0.04%
3.04.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (0.60X0.60)M	und	5.00	435,555.62	2,177,778.10	5.00	$ 2,177,778.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 2,177,778.10	100.00%	0.02%
3.05	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**																
3.05.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CAJA DE AFORO. DIM PROPUESTA = 1,20x1,20xVariable. Considera Vertedero y Zona Seca	und	1.00	1,772,915.07	1,772,915.07	1.00	$ 1,772,915.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,772,915.07	100.00%	0.02%
3.05.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CÁRCAMO DE PROTECCIÓN TUBERÍA DE CONEXIÓN A POZO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOX CULVERT - DIM= 2 VECES EL DIÁMETRO DE TUBERÍA EN AMBOS SENTIDOS	und	1.00	3,465,966.97	3,465,966.97	1.00	$ 3,465,966.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,465,966.97	100.00%	0.03%
3.06	**ELEMENTOS PREFABRICADOS**																
3.06.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SISTEMA TRAMPA DE GRASAS 10 GPM	und	1.00	2,037,200.21	2,037,200.21	1.00	$ 2,037,200.21		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,037,200.21	100.00%	0.02%
3.07	**POZOS DE INSPECCIÓN Y SÉPTICOS**																
3.07.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE POZO INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES - DIAM= 1 METRO PROF.=SEGÚN DISEÑOS	und	1.00	4,085,119.13	4,085,119.13	1.00	$ 4,085,119.13		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,085,119.13	100.00%	0.04%
3.07.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE POZO INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS - DIAM= 1 METRO PROF.=SEGÚN DISEÑOS	und	1.00	4,272,066.27	4,272,066.27	1.00	$ 4,272,066.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,272,066.27	100.00%	0.04%
3.08	**CAÑUELAS, CANALETAS, CÁRCAMOS Y Cunetas**																
3.08.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CÁRCAMO CON REJILLA .25 M X .20 M AGUAS LLUVIAS	m	91.00	153,108.08	13,932,835.28	91.00	$ 13,932,835.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	91.00	$ 13,932,835.28	100.00%	0.13%
3.08.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CÁRCAMO CON REJILLA .15 M X .30 M CUARTO DE BOMBAS	m	2.60	46,686.86	121,385.84	2.60	$ 121,385.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.60	$ 121,385.84	100.00%	0.00%
3.09	**OBRAS PARA CONEXIONES ACOMETIDAS Y DOMICILIARIAS**																
3.09.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN A POZO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	und	1.00	1,748,944.46	1,748,944.46	1.00	$ 1,748,944.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,748,944.46	100.00%	0.02%
3.09.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN A POZO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	und	1.00	856,698.72	856,698.72	1.00	$ 856,698.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 856,698.72	100.00%	0.01%
3.09.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN A RED ACOMETIDA 6" x 1/2"	und	1.00	1,026,697.07	1,026,697.07	1.00	$ 1,026,697.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,026,697.07	100.00%	0.01%
3.10	**FILTROS Y DRENAJES**																
3.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	18.33	6,699.98	122,810.63	18.33	$ 122,810.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.33	$ 122,810.63	100.00%	0.00%
04	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y MADERA**																
4.01	**PRELIMINARES DE ESTRUCTURA**																
4.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA	m2	2,136.27	5,284.88	11,289,930.60	2,136.27	$ 11,289,930.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2,136.27	$ 11,289,930.60	100.00%	0.10%
4.02	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**																
4.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PANTALLAS EN CONCRETO e=0.35 f'c=28MPa	m3	55.42	1,031,469.31	57,164,029.16	55.42	$ 57,164,029.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	55.42	$ 57,164,029.16	100.00%	0.52%
4.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PANTALLAS EN CONCRETO e=0.60 f'c=28MPa	m3	49.05	1,087,957.83	53,364,331.56	49.05	$ 53,364,331.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	49.05	$ 53,364,331.56	100.00%	0.49%
4.02.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO f'c=28MPa	m3	48.91	1,015,001.18	49,643,707.71	48.91	$ 49,643,707.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	48.91	$ 49,643,707.71	100.00%	0.45%
4.03	**ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO**																
4.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 35x55 f'c=24,5MPa	m	76.08	157,919.07	12,014,482.85	76.08	$ 12,014,482.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	76.08	$ 12,014,482.85	100.00%	0.11%
4.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 40x55 f'c=24,5MPa	m	456.71	175,495.00	80,150,321.45	456.71	$ 80,150,321.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	456.71	$ 80,150,321.45	100.00%	0.73%
4.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 15x55 f'c=24,5MPa	m	46.97	87,615.35	4,115,292.99	46.97	$ 4,115,292.99		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	46.97	$ 4,115,292.99	100.00%	0.04%
4.03.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 35x60 f'c=24,5MPa	m	41.96	171,029.50	7,176,397.82	41.96	$ 7,176,397.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	41.96	$ 7,176,397.82	100.00%	0.07%
4.03.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 50x60 f'c=24,5MPa	m	21.61	228,165.57	4,930,657.97	21.61	$ 4,930,657.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	21.61	$ 4,930,657.97	100.00%	0.05%
4.03.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 50x55 f'c=24,5MPa	m	21.61	212,059.07	4,582,596.50	21.61	$ 4,582,596.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	21.61	$ 4,582,596.50	100.00%	0.04%
4.03.07	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 50x75 f'c=24,5MPa	m	15.80	275,072.87	4,346,151.35	15.80	$ 4,346,151.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.80	$ 4,346,151.35	100.00%	0.04%
4.03.08	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 60x55 f'c=24,5MPa	m	16.47	247,210.93	4,071,564.02	16.47	$ 4,071,564.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.47	$ 4,071,564.02	100.00%	0.04%
4.03.09	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 35x55 f'c=24,5MPa	m	71.14	169,380.37	12,049,719.52	71.14	$ 12,049,719.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	71.14	$ 12,049,719.52	100.00%	0.11%
4.03.10	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 40x55 f'c=24,5MPa	m	235.86	186,956.30	44,095,512.92	235.86	$ 44,095,512.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	235.86	$ 44,095,512.92	100.00%	0.40%
4.03.11	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 15x55 f'c=24,5MPa	m	5.51	99,076.65	545,912.34	5.51	$ 545,912.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.51	$ 545,912.34	100.00%	0.00%
4.03.12	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 35x60 f'c=24,5MPa	m	21.47	198,025.15	4,251,599.97	21.47	$ 4,251,599.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	21.47	$ 4,251,599.97	100.00%	0.04%
4.03.13	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 60x55 f'c=24,5MPa	m	16.47	274,206.58	4,516,182.37	16.47	$ 4,516,182.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.47	$ 4,516,182.37	100.00%	0.04%
4.03.14	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 45x55 f'c=24,5MPa	m	37.93	222,891.00	8,454,255.63	37.93	$ 8,454,255.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	37.93	$ 8,454,255.63	100.00%	0.08%
4.03.15	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 50x75 f'c=24,5MPa	m	14.37	283,709.74	4,076,908.96	14.37	$ 4,076,908.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.37	$ 4,076,908.96	100.00%	0.04%
4.03.16	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 30x35 f'c=24,5MPa	m	55.75	110,889.30	6,182,078.48	55.75	$ 6,182,078.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	55.75	$ 6,182,078.48	100.00%	0.06%
4.04	**PLACAS MACIZAS EN CONCRETO**																
4.04.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO 24,5 Mpa - e=0.125m	m2	44.56	194,560.28	8,669,606.08	44.56	$ 8,669,606.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	44.56	$ 8,669,606.08	100.00%	0.08%
4.05	**LOSAS ALIGERADAS EN CONCRETO**																
4.05.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOSA ALIGERADA CON LAMINA COLABORANTE 1-1/2 CAL 22 e=10 cm f'c 24,5 MPa - SOBRE VIGAS DE CONCRETO	m2	649.20	200,793.33	130,355,029.84	649.20	$ 130,355,029.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	649.20	$ 130,355,029.84	100.00%	1.19%
4.05.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOSA ALIGERADA CON LAMINA COLABORANTE 1-1/2 CAL 22 e=10 cm f'c 24,5 MPa - SOBRE VIGAS DE ACERO	m2	417.43	203,617.75	84,996,157.38	417.43	$ 84,996,157.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	417.43	$ 84,996,157.38	100.00%	0.78%
4.06	**ESCALERAS Y GRADERÍAS EN CONCRETO**																
4.06.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO 24,5 MPa	m3	14.71	1,129,885.76	16,620,619.53	14.71	$ 16,620,619.53		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.71	$ 16,620,619.53	100.00%	0.15%
4.07	**FOSOS EN CONCRETO**																
4.07.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE FOSO ASCENSOR EN CONCRETO 24,5MPa	m3	3.12	998,003.31	3,113,770.33	3.12	$ 3,113,770.33		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.12	$ 3,113,770.33	100.00%	0.03%
4.08	**TANQUES EN CONCRETO**																
4.08.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PLACA, MUROS Y TAPA TANQUE EN CONCRETO 28 MPa	m3	79.81	1,162,542.71	92,779,976.09	79.81	$ 92,779,976.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	79.81	$ 92,779,976.09	100.00%	0.85%
4.09	**ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA**																
4.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	kg	88,392.00	5,244.27	463,551,513.84	88,392.00	$ 463,551,513.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	88,392.00	$ 463,551,513.84	100.00%	4.24%
4.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR XX-131	kg	5,714.09	5,866.63	33,522,447.63	5,714.09	$ 33,522,447.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5,714.09	$ 33,522,447.63	100.00%	0.31%

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
4.10	**ELEMENTOS HORIZONTALES METÁLICOS**																
4.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN PERFIL METÁLICO ASTM A572 Gr 50 ARM-150X250X1/2"	kg	5,259.50	16,739.47	88,041,242.47	5,259.50	$ 88,041,242.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5,259.50	$ 88,041,242.47	100.00%	0.81%
4.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN PERFIL METÁLICO ASTM A572 Gr 50 ARM-650X250X1/2"	kg	22,372.50	16,739.47	374,503,792.58	22,372.50	$ 374,503,792.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22,372.50	$ 374,503,792.58	100.00%	3.43%
4.10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN PERFIL METÁLICO ASTM A572 Gr 50 ARM-250X250X1/2"	kg	8,572.20	16,739.47	143,494,084.73	8,572.20	$ 143,494,084.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8,572.20	$ 143,494,084.73	100.00%	1.31%
4.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN PERFIL METÁLICO ASTM A572 Gr 50 ARM I 650X500X3/4"	kg	3,532.50	13,693.66	48,372,853.95	3,532.50	$ 48,372,853.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3,532.50	$ 48,372,853.95	100.00%	0.44%
4.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN PERFIL METÁLICO ASTM A500 Gr C PTE-150X50X4mm	kg	5,966.00	9,959.38	59,417,661.08	5,966.00	$ 59,417,661.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5,966.00	$ 59,417,661.08	100.00%	0.54%
4.11	**CUBIERTA METÁLICA**																
4.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA ASTM A572 Gr 50 ARM-150X250X1/2"	kg	8,242.50	15,010.32	123,722,562.60	8,242.50	$ 123,722,562.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8,242.50	$ 123,722,562.60	100.00%	1.13%
4.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA ASTM A572 Gr 50 ARM-650X250X1/2"	kg	25,826.50	15,010.32	387,664,029.48	25,826.50	$ 387,664,029.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25,826.50	$ 387,664,029.48	100.00%	3.55%
4.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA ASTM A500 Gr C PTE-200X100X6mm	kg	5,024.00	10,984.11	55,184,168.64	5,024.00	$ 55,184,168.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5,024.00	$ 55,184,168.64	100.00%	0.50%
4.11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA ASTM A500 Gr C PTE-150X50X4mm	kg	628.00	10,796.80	6,780,390.40	628.00	$ 6,780,390.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	628.00	$ 6,780,390.40	100.00%	0.06%
4.12	**OTROS ELEMENTOS METÁLICOS**																
4.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERAS METÁLICAS ASTM A500 Gr C PTE-400X200X9mm	kg	3,689.50	12,639.40	46,633,066.30	3,689.50	$ 46,633,066.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3,689.50	$ 46,633,066.30	100.00%	0.43%
4.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERAS METÁLICAS ASTM A500 Gr C PTE-200X100X7mm	kg	706.50	12,894.46	9,109,935.99	706.50	$ 9,109,935.99		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	706.50	$ 9,109,935.99	100.00%	0.08%
4.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERAS METÁLICAS ASTM A36 L 1 1/2"X3/16"	kg	628.00	11,684.90	7,338,117.20	628.00	$ 7,338,117.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	628.00	$ 7,338,117.20	100.00%	0.07%
4.13	**Juntas DE CONSTRUCCIÓN**																
4.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Juntas DE DILATACIÓN JDV 4.12-200 (PLANA) - PARA MUROS	m	26.75	1,473,356.86	39,412,296.01	26.75	$ 39,412,296.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	26.75	$ 39,412,296.01	100.00%	0.36%
4.13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Juntas TIPO JDV 4.12-200 A (ANGULAR) - PARA MUROS	m	13.18	1,716,403.18	22,622,193.91	13.18	$ 22,622,193.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.18	$ 22,622,193.91	100.00%	0.21%
4.13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Juntas TIPO JDH 6.18-210 - PARA PISOS INTERIORES	m	1.50	2,500,834.05	3,751,251.08	1.50	$ 3,751,251.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.50	$ 3,751,251.08	100.00%	0.03%
4.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Juntas TIPO JDH 6.18-210 A (CANTONERA INVISIBLE) - PARA PISOS INTERIORES	m	6.99	2,500,834.05	17,480,830.01	6.99	$ 17,480,830.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.99	$ 17,480,830.01	100.00%	0.16%
4.13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Juntas TIPO JDH 5.06-200 - PARA PISOS EXTERIORES	m	2.70	2,587,103.19	6,985,178.61	2.70	$ 6,985,178.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.70	$ 6,985,178.61	100.00%	0.06%
4.14	**CUBIERTAS EN CONCRETO**																
4.14.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PLACA DE CUBIERTA CON LAMINA COLABORANTE 1-1/2 CAL 18 e=10 cm f'c 24.5 MPa - SOBRE VIGAS DE CONCRETO	m2	427.90	206,442.18	88,336,608.82	427.90	$ 88,336,608.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	427.90	$ 88,336,608.82	100.00%	0.81%
05	**MAMPOSTERÍA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES**																
5.01	**MURO BLOQUE EN CEMENTO**																
5.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO BLOQUE EN CEMENTO X M2 BLOQUE TOLETE 90 X 120 X 390 COLOR JASPEADO	m2	2,043.45	125,187.72	255,814,846.43	2,043.45	$ 255,814,846.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2,043.45	$ 255,814,846.43	100.00%	2.34%
5.01.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO BLOQUE EN CEMENTO X ML BLOQUE TOLETE 90 X 120 X 390 COLOR JASPEADO	m	286.35	46,342.97	13,270,309.46	286.35	$ 13,270,309.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	286.35	$ 13,270,309.46	100.00%	0.12%
5.01.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ENCHAPES BLOQUE EN CEMENTO X M2 BLOQUE TOLETE 90 X 120 X 390 COLOR JASPEADO	m2	484.87	94,030.71	45,592,670.36	484.87	$ 45,592,670.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	484.87	$ 45,592,670.36	100.00%	0.42%
5.01.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ENCHAPES BLOQUE EN CEMENTO X ML BLOQUE TOLETE 90 X 120 X 390 COLOR JASPEADO	m	256.80	46,342.97	11,900,874.70	256.80	$ 11,900,874.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	256.80	$ 11,900,874.70	100.00%	0.11%
5.01.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REMATE EN HILADA PARADA BLOQUE EN CEMENTO X ML BLOQUE TOLETE 90 X 120 X 390 COLOR JASPEADO	m	5.50	51,050.28	280,776.54	5.50	$ 280,776.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.50	$ 280,776.54	100.00%	0.00%
5.02	**MAMPOSTERÍA EN BLOQUE ARCILLA**																
5.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO BLOQUE ARCILLA X M2 BLOQUE No. 4 33 X 9 X 23	m2	144.88	58,354.68	8,454,426.04	144.88	$ 8,454,426.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	144.88	$ 8,454,426.04	100.00%	0.08%
5.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO BLOQUE ARCILLA X ML BLOQUE No. 4 33 X 9 X 23	m	4.00	35,824.53	143,298.12	4.00	$ 143,298.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 143,298.12	100.00%	0.00%
5.02.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MUROS EN FIBROCEMENTO una CARA X M2 ANCLADO A SUBESTRUCTURA DANPAL	m2	16.82	106,459.24	1,790,644.42	16.82	$ 1,790,644.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.82	$ 1,790,644.42	100.00%	0.02%
5.03	**ACEROS Y REFUERZOS EN CONCRETO PARA MAMPOSTERÍAS**																
5.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE COLUMNETAS EN CONCRETO DIM=16,5X8 CMS	m	264.28	28,945.49	7,649,714.10	264.28	$ 7,649,714.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	264.28	$ 7,649,714.10	100.00%	0.07%
5.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DINTELES EN CONCRETO DIM=12X12 CMS	m	65.40	29,509.51	1,929,921.95	65.40	$ 1,929,921.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	65.40	$ 1,929,921.95	100.00%	0.02%
5.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO DIM=12X12 CMS	m	757.10	29,509.51	22,341,650.02	757.10	$ 22,341,650.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	757.10	$ 22,341,650.02	100.00%	0.20%
5.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN CONCRETO - GROUTING DIM=12X12 CMS	m	4,034.68	20,092.32	81,066,081.66	4,034.68	$ 81,066,081.66		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4,034.68	$ 81,066,081.66	100.00%	0.74%
5.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS EN CONCRETO E=10 CMS - f'c = 21 MPa - INCLUYE REFUERZO DE ACERO	m	87.41	84,140.85	7,354,751.70	87.41	$ 7,354,751.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	87.41	$ 7,354,751.70	100.00%	0.07%
5.04	**ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MAMPOSTERÍAS**																
5.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPÓXICO	und	1,400.00	8,092.20	11,329,080.00	1,400.00	$ 11,329,080.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,400.00	$ 11,329,080.00	100.00%	0.10%
5.05	**AISLANTES Y RECUBRIMIENTOS**																
5.05.01	AISLAMIENTO CON LAMINA DE ICOPOR	m2	541.33	7,277.34	3,939,442.46	541.33	$ 3,939,442.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	541.33	$ 3,939,442.46	100.00%	0.04%
06	**PAÑETES**																
6.01	**PAÑETES INTERIORES**																
6.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2	m2	473.79	22,619.64	10,716,959.24	473.79	$ 10,716,959.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	473.79	$ 10,716,959.24	100.00%	0.10%
6.01.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X ML	m	63.65	14,064.99	895,236.61	63.65	$ 895,236.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	63.65	$ 895,236.61	100.00%	0.01%
6.02	**PAÑETES EXTERIORES**																
6.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE EN CONCRETO COLOR BLANCO	m2	151.43	99,182.59	15,019,219.60	151.43	$ 15,019,219.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	151.43	$ 15,019,219.60	100.00%	0.14%
6.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE EN CONCRETO X ML COLOR BLANCO	m	4.15	64,051.15	265,812.27	4.15	$ 265,812.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.15	$ 265,812.27	100.00%	0.00%
6.03	**PAÑETE OTROS ELEMENTOS**																
6.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE X M2	m2	135.68	27,322.17	3,707,072.03	135.68	$ 3,707,072.03		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	135.68	$ 3,707,072.03	100.00%	0.03%
6.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE X ML	m	5.16	17,134.74	88,415.26	5.16	$ 88,415.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.16	$ 88,415.26	100.00%	0.00%
6.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FOSO ASCENSOR X M2	m2	122.13	27,322.17	3,336,856.62	122.13	$ 3,336,856.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	122.13	$ 3,336,856.62	100.00%	0.03%
6.03.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FOSO ASCENSOR X ML	m	34.45	19,017.66	655,158.39	34.45	$ 655,158.39		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.45	$ 655,158.39	100.00%	0.01%
6.03.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE GOTERO BAJO PLACAS	m	92.82	11,582.95	1,075,129.42	92.82	$ 1,075,129.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	92.82	$ 1,075,129.42	100.00%	0.01%
6.03.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REMATES DE CAJAS ,SALIDAS Y REGISTROS	und	246.00	12,599.00	3,099,354.00	246.00	$ 3,099,354.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	246.00	$ 3,099,354.00	100.00%	0.03%
07	**PREFABRICADOS**																
7.01	**ALFAJÍAS EN CONCRETO**																

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
7.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍAS EN CONCRETO TERRAZAS PISO 3	m	72.02	57,647.33	4,151,760.71	72.02	$ 4,151,760.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	72.02	$ 4,151,760.71	100.00%	0.04%
7.02	**GÁRGOLAS EN CONCRETO**																
7.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GÁRGOLAS EN CONCRETO	und	10.00	51,977.00	519,770.00	10.00	$ 519,770.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 519,770.00	100.00%	0.00%
7.03	**PELDAÑOS EN CONCRETO**																
7.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELDAÑOS PREFABRICADOS EN CONCRETO (INTERIORES) ESCALERAS METÁLICAS - DIM 1,40 X,30 M	und	65.00	120,057.91	7,803,764.15	65.00	$ 7,803,764.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	65.00	$ 7,803,764.15	100.00%	0.07%
7.04	**TOPE LLANTAS EN SINTÈTICO**																
7.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE LLANTAS EN SINTÈTICO EN POLIURETANO PARA VEHÍCULO PESADO 60X20X20 CMS	und	10.00	434,596.30	4,345,963.00	10.00	$ 4,345,963.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 4,345,963.00	100.00%	0.04%
08	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS**																
8.01	**ACOMETIDA O RED DE LLENADO DE TANQUES**																
8.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2"	m	129.38	10,267.39	1,328,394.92	129.38	$ 1,328,394.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	129.38	$ 1,328,394.92	100.00%	0.01%
8.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1/2"	und	46.00	7,501.01	345,046.46	46.00	$ 345,046.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	46.00	$ 345,046.46	100.00%	0.00%
8.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TOTALIZADOR 1/2"	und	1.00	221,965.02	221,965.02	1.00	$ 221,965.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 221,965.02	100.00%	0.00%
8.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO BOLA 1/2"	und	20.00	24,820.63	496,412.60	20.00	$ 496,412.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 496,412.60	100.00%	0.00%
8.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR MECÁNICO 1/2"	und	3.00	71,159.43	213,478.29	3.00	$ 213,478.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 213,478.29	100.00%	0.00%
8.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión DRESSER 1/2"	und	1.00	20,423.21	20,423.21	1.00	$ 20,423.21		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 20,423.21	100.00%	0.00%
8.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA 1/2" EN BR	und	1.00	48,478.16	48,478.16	1.00	$ 48,478.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 48,478.16	100.00%	0.00%
8.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 1/2"	und	3.00	64,000.15	192,000.45	3.00	$ 192,000.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 192,000.45	100.00%	0.00%
8.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 1/2"	und	1.00	46,687.43	46,687.43	1.00	$ 46,687.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 46,687.43	100.00%	0.00%
8.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1/2"	und	4.00	11,476.52	45,906.08	4.00	$ 45,906.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 45,906.08	100.00%	0.00%
8.02	**CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**																
8.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 2.1/2"	und	3.00	453,227.17	1,359,681.51	3.00	$ 1,359,681.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,359,681.51	100.00%	0.01%
8.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 1.1/2"	und	1.00	298,552.27	298,552.27	1.00	$ 298,552.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 298,552.27	100.00%	0.00%
8.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO Fundido ROSCA NPT O SIMILAR 3"	und	2.00	590,107.03	1,180,214.06	2.00	$ 1,180,214.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,180,214.06	100.00%	0.01%
8.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	2.00	1,518,986.60	3,037,973.20	2.00	$ 3,037,973.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,037,973.20	100.00%	0.03%
8.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 2.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	3.00	993,992.85	2,981,978.55	3.00	$ 2,981,978.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 2,981,978.55	100.00%	0.03%
8.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	1.00	565,263.52	565,263.52	1.00	$ 565,263.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 565,263.52	100.00%	0.01%
8.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 1.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	2.00	391,918.20	783,836.40	2.00	$ 783,836.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 783,836.40	100.00%	0.01%
8.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión FLEXIBLE BORRACHA 3"	und	2.00	237,352.89	474,705.78	2.00	$ 474,705.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 474,705.78	100.00%	0.00%
8.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión FLEXIBLE BORRACHA 2.1/2"	und	2.00	214,950.17	429,900.34	2.00	$ 429,900.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 429,900.34	100.00%	0.00%
8.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE universal 1.1/2"	und	1.00	49,175.22	49,175.22	1.00	$ 49,175.22		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 49,175.22	100.00%	0.00%
8.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO 1.1/2"	und	1.00	423,796.11	423,796.11	1.00	$ 423,796.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 423,796.11	100.00%	0.00%
8.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA - TIPO 1.3" X 1.1/2"	und	2.00	162,466.17	324,932.34	2.00	$ 324,932.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 324,932.34	100.00%	0.00%
8.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA EXCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA ASMT-A351 - TIPO 1 2.1/2" X 1.1/2"	und	2.00	464,666.59	929,333.18	2.00	$ 929,333.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 929,333.18	100.00%	0.01%
8.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2"	und	1.00	185,069.23	185,069.23	1.00	$ 185,069.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 185,069.23	100.00%	0.00%
8.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2.1/2"	und	2.00	14,144.13	28,288.26	2.00	$ 28,288.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 28,288.26	100.00%	0.00%
8.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	und	2.00	12,093.66	24,187.32	2.00	$ 24,187.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 24,187.32	100.00%	0.00%
8.02.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 3"	m	4.96	70,634.31	350,346.18	4.96	$ 350,346.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.96	$ 350,346.18	100.00%	0.00%
8.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 2.1/2"	m	4.09	76,227.13	311,768.96	4.09	$ 311,768.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.09	$ 311,768.96	100.00%	0.00%
8.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 1.1/2"	m	18.95	36,178.96	685,591.29	18.95	$ 685,591.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.95	$ 685,591.29	100.00%	0.01%
8.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 3"	und	3.00	56,987.90	170,963.70	3.00	$ 170,963.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 170,963.70	100.00%	0.00%
8.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 2.1/2"	und	7.00	47,498.29	332,488.03	7.00	$ 332,488.03		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 332,488.03	100.00%	0.00%
8.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 1.1/2"	und	18.00	24,507.16	441,128.88	18.00	$ 441,128.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.00	$ 441,128.88	100.00%	0.00%
8.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 2"	und	4.28	47,628.04	203,848.01	4.28	$ 203,848.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.28	$ 203,848.01	100.00%	0.00%
8.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 2"	und	2.00	28,606.54	57,213.08	2.00	$ 57,213.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 57,213.08	100.00%	0.00%
8.03	**CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**																
8.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 2.1/2"	und	3.00	453,227.17	1,359,681.51	3.00	$ 1,359,681.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,359,681.51	100.00%	0.01%
8.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 1.1/2"	und	1.00	298,552.27	298,552.27	1.00	$ 298,552.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 298,552.27	100.00%	0.00%
8.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO Fundido ROSCA NPT O SIMILAR 3"	und	2.00	590,107.03	1,180,214.06	2.00	$ 1,180,214.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,180,214.06	100.00%	0.01%
8.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	2.00	1,518,986.60	3,037,973.20	2.00	$ 3,037,973.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,037,973.20	100.00%	0.03%
8.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 2.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	3.00	993,992.85	2,981,978.55	3.00	$ 2,981,978.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 2,981,978.55	100.00%	0.03%
8.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	1.00	565,263.52	565,263.52	1.00	$ 565,263.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 565,263.52	100.00%	0.01%
8.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 1.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	3.00	391,918.20	1,175,754.60	3.00	$ 1,175,754.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,175,754.60	100.00%	0.01%
8.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión FLEXIBLE BORRACHA 3"	und	2.00	237,352.89	474,705.78	2.00	$ 474,705.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 474,705.78	100.00%	0.00%
8.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión FLEXIBLE BORRACHA 2.1/2"	und	2.00	214,950.17	429,900.34	2.00	$ 429,900.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 429,900.34	100.00%	0.00%
8.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE universal 1.1/2"	und	1.00	49,175.22	49,175.22	1.00	$ 49,175.22		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 49,175.22	100.00%	0.00%
8.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO 1.1/2"	und	1.00	423,796.11	423,796.11	1.00	$ 423,796.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 423,796.11	100.00%	0.00%
8.03.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA - TIPO 1.3"X2"	und	2.00	162,466.17	324,932.34	2.00	$ 324,932.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 324,932.34	100.00%	0.00%
8.03.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA EXCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA ASMT-A351 - TIPO 1 2.1/2"X2"	und	2.00	464,666.59	929,333.18	2.00	$ 929,333.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 929,333.18	100.00%	0.01%
8.03.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2"	und	1.00	185,069.23	185,069.23	1.00	$ 185,069.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 185,069.23	100.00%	0.00%
8.03.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2-1/2"	und	2.00	14,144.13	28,288.26	2.00	$ 28,288.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 28,288.26	100.00%	0.00%
8.03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	und	2.00	12,093.66	24,187.32	2.00	$ 24,187.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 24,187.32	100.00%	0.00%
8.03.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 3"	m	5.33	70,634.31	376,480.87	5.33	$ 376,480.87		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.33	$ 376,480.87	100.00%	0.00%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO:	
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS CARRERA 14B No. 146-05	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	VERSIÓN:	
			FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01	PROCESO No:		TIPO DE PROCESO:	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	N.I.T:	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	N.I.T:	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	N.I.T:	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario ofertado	Valor total ofertado	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Ejec. del Item	% Ejec. del Contrato	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Pend. Ejec. del Item	% Pend. Ejec. del Contrato
8.03.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 2,1/2"	m	4.03	76,227.13	307,195.33	4.03	$ 307,195.33		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.03	$ 307,195.33	100.00%	0.00%
8.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 1.1/2"	m	19.97	36,178.96	722,493.83	19.97	$ 722,493.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	19.97	$ 722,493.83	100.00%	0.01%
8.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 3"	und	3.00	56,987.90	170,963.70	3.00	$ 170,963.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 170,963.70	100.00%	0.00%
8.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 2,1/2"	und	3.00	47,498.29	142,494.87	3.00	$ 142,494.87		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 142,494.87	100.00%	0.00%
8.03.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 1.1/2"	und	11.00	24,507.16	269,578.76	11.00	$ 269,578.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 269,578.76	100.00%	0.00%
8.04	**CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO**																
8.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4"	m	11.85	78,565.41	931,000.11	11.85	$ 931,000.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.85	$ 931,000.11	100.00%	0.01%
8.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 1.1/2"	m	3.30	73,792.70	243,515.91	3.30	$ 243,515.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.30	$ 243,515.91	100.00%	0.00%
8.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS RANURADOS 4"	und	12.00	67,938.32	815,259.84	12.00	$ 815,259.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 815,259.84	100.00%	0.01%
8.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS RANURADOS 1.1/2"	und	2.00	52,131.52	104,263.04	2.00	$ 104,263.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 104,263.04	100.00%	0.00%
8.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RÍGIDO EN HIERRO DÚCTIL DE UNIÓN RANURADA 4"	und	38.00	72,270.01	2,746,260.38	38.00	$ 2,746,260.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	38.00	$ 2,746,260.38	100.00%	0.03%
8.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RÍGIDO EN HIERRO DÚCTIL DE unión RANURADA 1.1/2"	und	10.00	48,888.89	488,888.90	10.00	$ 488,888.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 488,888.90	100.00%	0.00%
8.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO 4"	und	1.00	1,145,206.48	1,145,206.48	1.00	$ 1,145,206.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,145,206.48	100.00%	0.01%
8.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VÁSTAGO OS&Y ASCENDENTE LISTADO 4"	und	2.00	2,094,984.57	4,189,969.14	2.00	$ 4,189,969.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 4,189,969.14	100.00%	0.04%
8.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VÁSTAGO OS&Y ASCENDENTE LISTADO 2"	und	1.00	424,211.14	424,211.14	1.00	$ 424,211.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 424,211.14	100.00%	0.00%
8.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 4"	und	2.00	3,100,297.85	6,200,595.70	2.00	$ 6,200,595.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 6,200,595.70	100.00%	0.06%
8.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 1-1/2"	und	1.00	493,882.92	493,882.92	1.00	$ 493,882.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 493,882.92	100.00%	0.00%
8.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA 1-1/2"	und	1.00	275,223.04	275,223.04	1.00	$ 275,223.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 275,223.04	100.00%	0.00%
8.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO 4"	und	1.00	1,565,826.65	1,565,826.65	1.00	$ 1,565,826.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,565,826.65	100.00%	0.01%
8.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO 2"	und	1.00	370,590.63	370,590.63	1.00	$ 370,590.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 370,590.63	100.00%	0.00%
8.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE GLICERINA-300 PSI	und	5.00	120,656.91	603,284.55	5.00	$ 603,284.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 603,284.55	100.00%	0.01%
8.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2"	m	8.94	76,033.86	679,742.71	8.94	$ 679,742.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.94	$ 679,742.71	100.00%	0.01%
8.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO COBRE 1/2"	und	33.00	26,383.10	870,642.30	33.00	$ 870,642.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	33.00	$ 870,642.30	100.00%	0.01%
8.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE 1/2"	und	4.00	114,907.03	459,628.12	4.00	$ 459,628.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 459,628.12	100.00%	0.00%
8.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE universal 1/2" COBRE	und	4.00	26,383.10	105,532.40	4.00	$ 105,532.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 105,532.40	100.00%	0.00%
8.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2"	und	8.00	20,313.73	162,509.84	8.00	$ 162,509.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 162,509.84	100.00%	0.00%
8.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ANTI VÓRTICE 4" DE UNIÓN SOLDADA- NFPA 20	und	1.00	263,642.74	263,642.74	1.00	$ 263,642.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 263,642.74	100.00%	0.00%
8.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2"	und	1.00	352,310.68	352,310.68	1.00	$ 352,310.68		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 352,310.68	100.00%	0.00%
8.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES ANTISÍSMICOS 4"	und	2.00	20,368.64	40,737.28	2.00	$ 40,737.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 40,737.28	100.00%	0.00%
8.05	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**																
8.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 2 1/2"	m	5.09	47,409.86	241,316.19	5.09	$ 241,316.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.09	$ 241,316.19	100.00%	0.00%
8.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 2"	m	11.68	31,874.63	372,295.68	11.68	$ 372,295.68		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.68	$ 372,295.68	100.00%	0.00%
8.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1.1/2"	m	8.44	23,755.36	200,495.24	8.44	$ 200,495.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.44	$ 200,495.24	100.00%	0.00%
8.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1.1/4"	m	47.67	19,318.26	920,901.45	47.67	$ 920,901.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	47.67	$ 920,901.45	100.00%	0.01%
8.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1"	m	50.23	13,231.79	664,632.81	50.23	$ 664,632.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.23	$ 664,632.81	100.00%	0.01%
8.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=11 3/4"	m	54.87	12,547.56	688,484.62	54.87	$ 688,484.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	54.87	$ 688,484.62	100.00%	0.01%
8.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=9 1/2"	m	200.34	10,267.39	2,056,968.91	200.34	$ 2,056,968.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	200.34	$ 2,056,968.91	100.00%	0.02%
8.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 2 1/2"	und	14.00	47,498.29	664,976.06	14.00	$ 664,976.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 664,976.06	100.00%	0.01%
8.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 2"	und	4.00	28,606.54	114,426.16	4.00	$ 114,426.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 114,426.16	100.00%	0.00%
8.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1.1/2"	und	5.00	15,649.82	78,249.10	5.00	$ 78,249.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 78,249.10	100.00%	0.00%
8.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1.1/4"	und	20.00	16,211.33	324,226.60	20.00	$ 324,226.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 324,226.60	100.00%	0.00%
8.05.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1"	und	21.00	10,433.23	219,097.83	21.00	$ 219,097.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	21.00	$ 219,097.83	100.00%	0.00%
8.05.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 3/4"	und	36.00	6,208.43	223,503.48	36.00	$ 223,503.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	36.00	$ 223,503.48	100.00%	0.00%
8.05.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1/2"	und	162.00	4,985.87	807,710.94	162.00	$ 807,710.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	162.00	$ 807,710.94	100.00%	0.01%
8.05.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1.1/4"	und	2.00	119,011.64	238,023.28	2.00	$ 238,023.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 238,023.28	100.00%	0.00%
8.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1"	und	3.00	92,056.34	276,169.02	3.00	$ 276,169.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 276,169.02	100.00%	0.00%
8.05.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 3/4"	und	2.00	66,593.98	133,187.96	2.00	$ 133,187.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 133,187.96	100.00%	0.00%
8.05.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1/2"	und	16.00	25,596.83	409,549.28	16.00	$ 409,549.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 409,549.28	100.00%	0.00%
8.05.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	und	1.00	405,310.50	405,310.50	1.00	$ 405,310.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 405,310.50	100.00%	0.00%
8.05.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2.1/2"	und	2.00	14,144.13	28,288.26	2.00	$ 28,288.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 28,288.26	100.00%	0.00%
8.05.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2"	und	4.00	13,089.35	52,357.40	4.00	$ 52,357.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 52,357.40	100.00%	0.00%
8.05.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	und	3.00	12,093.66	36,280.98	3.00	$ 36,280.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 36,280.98	100.00%	0.00%
8.05.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/4"	und	16.00	12,488.64	199,818.24	16.00	$ 199,818.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 199,818.24	100.00%	0.00%
8.05.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1"	und	17.00	12,331.22	209,630.74	17.00	$ 209,630.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	17.00	$ 209,630.74	100.00%	0.00%
8.05.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3/4"	und	19.00	11,425.28	217,080.32	19.00	$ 217,080.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	19.00	$ 217,080.32	100.00%	0.00%
8.05.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1/2"	und	67.00	11,476.52	768,926.84	67.00	$ 768,926.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	67.00	$ 768,926.84	100.00%	0.01%
8.05.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1.1/2"	und	2.00	7,232.40	14,464.80	2.00	$ 14,464.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 14,464.80	100.00%	0.00%
8.05.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1.1/4"	und	2.00	7,089.93	14,179.86	2.00	$ 14,179.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 14,179.86	100.00%	0.00%
8.05.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1"	und	3.00	6,932.50	20,797.50	3.00	$ 20,797.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 20,797.50	100.00%	0.00%
8.06	**RED SUMINISTRO RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**																
8.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 2 1/2"	m	15.49	47,409.86	734,378.73	15.49	$ 734,378.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.49	$ 734,378.73	100.00%	0.01%
8.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 2"	m	36.03	31,874.63	1,148,442.92	36.03	$ 1,148,442.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	36.03	$ 1,148,442.92	100.00%	0.01%
8.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1.1/2"	m	65.87	23,755.36	1,564,765.56	65.87	$ 1,564,765.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	65.87	$ 1,564,765.56	100.00%	0.01%
8.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1.1/4"	m	87.71	18,263.39	1,601,881.94	87.71	$ 1,601,881.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	87.71	$ 1,601,881.94	100.00%	0.01%
8.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1"	m	6.42	13,231.79	84,948.09	6.42	$ 84,948.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.42	$ 84,948.09	100.00%	0.00%
8.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=11 3/4"	m	7.57	12,547.56	94,985.03	7.57	$ 94,985.03		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.57	$ 94,985.03	100.00%	0.00%
8.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=9 1/2"	m	177.76	10,175.47	1,808,791.55	177.76	$ 1,808,791.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	177.76	$ 1,808,791.55	100.00%	0.02%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01		**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**		
			CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA	
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA		**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$	14,952,434,853
			VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$	14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE	HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**		
			CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1	
			INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1	

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
8.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 2 1/2"	und	7.00	47,498.29	332,488.03	7.00	$ 332,488.03		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 332,488.03	100.00%	0.00%
8.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 2"	und	11.00	28,606.54	314,671.94	11.00	$ 314,671.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 314,671.94	100.00%	0.00%
8.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1 1/2"	und	36.00	15,649.82	563,393.52	36.00	$ 563,393.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	36.00	$ 563,393.52	100.00%	0.01%
8.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1 1/4"	und	85.00	16,211.33	1,377,963.05	85.00	$ 1,377,963.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	85.00	$ 1,377,963.05	100.00%	0.01%
8.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1"	und	3.00	10,433.23	31,299.69	3.00	$ 31,299.69		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 31,299.69	100.00%	0.00%
8.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 3/4"	und	10.00	6,208.43	62,084.30	10.00	$ 62,084.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 62,084.30	100.00%	0.00%
8.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1/2"	und	123.00	4,985.87	613,262.01	123.00	$ 613,262.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	123.00	$ 613,262.01	100.00%	0.01%
8.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 2"	und	1.00	101,168.96	101,168.96	1.00	$ 101,168.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 101,168.96	100.00%	0.00%
8.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1.1/2"	und	3.00	85,879.33	257,637.99	3.00	$ 257,637.99		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 257,637.99	100.00%	0.00%
8.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1.1/4"	und	7.00	119,011.64	833,081.48	7.00	$ 833,081.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 833,081.48	100.00%	0.01%
8.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1"	und	1.00	92,056.34	92,056.34	1.00	$ 92,056.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 92,056.34	100.00%	0.00%
8.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1/2"	und	16.00	25,880.79	414,092.64	16.00	$ 414,092.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 414,092.64	100.00%	0.00%
8.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	und	1.00	405,310.50	405,310.50	1.00	$ 405,310.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 405,310.50	100.00%	0.00%
8.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2.1/2"	und	6.00	14,144.13	84,864.78	6.00	$ 84,864.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 84,864.78	100.00%	0.00%
8.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2"	und	13.00	13,089.35	170,161.55	13.00	$ 170,161.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.00	$ 170,161.55	100.00%	0.00%
8.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	und	22.00	12,631.11	277,884.42	22.00	$ 277,884.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.00	$ 277,884.42	100.00%	0.00%
8.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/4"	und	30.00	12,488.64	374,659.20	30.00	$ 374,659.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 374,659.20	100.00%	0.00%
8.06.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3/4"	und	3.00	11,425.28	34,275.84	3.00	$ 34,275.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 34,275.84	100.00%	0.00%
8.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1/2"	und	60.00	11,476.52	688,591.20	60.00	$ 688,591.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 688,591.20	100.00%	0.01%
8.06.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 2"	und	3.00	7,690.63	23,071.89	3.00	$ 23,071.89		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 23,071.89	100.00%	0.00%
8.06.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1"	und	2.00	6,932.50	13,865.00	2.00	$ 13,865.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 13,865.00	100.00%	0.00%
8.07	**RED SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE**																
8.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 1.1/2"	m	13.42	111,714.85	1,499,213.29	13.42	$ 1,499,213.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.42	$ 1,499,213.29	100.00%	0.01%
8.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 1.1/4"	m	23.89	100,224.90	2,394,372.86	23.89	$ 2,394,372.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	23.89	$ 2,394,372.86	100.00%	0.02%
8.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 1"	m	28.07	73,442.12	2,061,520.31	28.07	$ 2,061,520.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	28.07	$ 2,061,520.31	100.00%	0.02%
8.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 3/4"	m	139.22	60,497.96	8,422,525.99	139.22	$ 8,422,525.99		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	139.22	$ 8,422,525.99	100.00%	0.08%
8.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 1/2"	m	117.78	55,424.05	6,527,844.61	117.78	$ 6,527,844.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	117.78	$ 6,527,844.61	100.00%	0.06%
8.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CPVC 1.1/2"	und	10.00	8,451.43	84,514.30	10.00	$ 84,514.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 84,514.30	100.00%	0.00%
8.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CPVC 1.1/4"	und	6.00	7,772.62	46,635.72	6.00	$ 46,635.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 46,635.72	100.00%	0.00%
8.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CPVC 1"	und	7.00	7,575.95	53,031.65	7.00	$ 53,031.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 53,031.65	100.00%	0.00%
8.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CPVC 3/4"	und	110.00	7,252.73	797,800.30	110.00	$ 797,800.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	110.00	$ 797,800.30	100.00%	0.01%
8.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CPVC 1/2"	und	79.00	6,050.95	478,025.05	79.00	$ 478,025.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	79.00	$ 478,025.05	100.00%	0.00%
8.07.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1.1/4"	und	1.00	119,011.64	119,011.64	1.00	$ 119,011.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 119,011.64	100.00%	0.00%
8.07.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 3/4"	und	3.00	66,593.98	199,781.94	3.00	$ 199,781.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 199,781.94	100.00%	0.00%
8.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1/2"	und	21.00	25,596.83	537,533.43	21.00	$ 537,533.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	21.00	$ 537,533.43	100.00%	0.00%
8.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BALANCEADORA DE FLUJO 1/2"	und	8.00	65,450.46	523,603.68	8.00	$ 523,603.68		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 523,603.68	100.00%	0.00%
8.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 1.1/2"	m	13.42	9,606.41	128,918.02	13.42	$ 128,918.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.42	$ 128,918.02	100.00%	0.00%
8.07.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 1.1/4"	m	23.89	8,973.30	214,372.14	23.89	$ 214,372.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	23.89	$ 214,372.14	100.00%	0.00%
8.07.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 1"	m	28.07	8,403.39	235,883.16	28.07	$ 235,883.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	28.07	$ 235,883.16	100.00%	0.00%
8.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 3/4"	m	74.25	7,890.48	585,868.14	74.25	$ 585,868.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	74.25	$ 585,868.14	100.00%	0.01%
8.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 1/2"	m	57.56	7,428.85	427,604.61	57.56	$ 427,604.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	57.56	$ 427,604.61	100.00%	0.00%
8.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	und	5.00	12,093.66	60,468.30	5.00	$ 60,468.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 60,468.30	100.00%	0.00%
8.07.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/4"	und	8.00	12,488.64	99,909.12	8.00	$ 99,909.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 99,909.12	100.00%	0.00%
8.07.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1"	und	10.00	12,331.22	123,312.20	10.00	$ 123,312.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 123,312.20	100.00%	0.00%
8.07.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3/4"	und	47.00	11,425.28	536,988.16	47.00	$ 536,988.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	47.00	$ 536,988.16	100.00%	0.00%
8.07.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1/2"	und	40.00	11,476.52	459,060.80	40.00	$ 459,060.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	40.00	$ 459,060.80	100.00%	0.00%
8.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1.1/4"	und	3.00	7,089.93	21,269.79	3.00	$ 21,269.79		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 21,269.79	100.00%	0.00%
8.07.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 3/4"	und	3.00	6,026.57	18,079.71	3.00	$ 18,079.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 18,079.71	100.00%	0.00%
8.07.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 3/4"	und	8.00	391,288.66	3,130,309.28	8.00	$ 3,130,309.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 3,130,309.28	100.00%	0.03%
8.08	**RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES**																
8.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 160MM	m	50.28	59,741.22	3,003,788.54	50.28	$ 3,003,788.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.28	$ 3,003,788.54	100.00%	0.03%
8.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 110MM	m	69.41	29,410.87	2,041,408.49	69.41	$ 2,041,408.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	69.41	$ 2,041,408.49	100.00%	0.02%
8.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 160MM	und	9.00	106,020.97	954,188.73	9.00	$ 954,188.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 954,188.73	100.00%	0.01%
8.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 110MM	und	12.00	47,151.49	565,817.88	12.00	$ 565,817.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 565,817.88	100.00%	0.01%
8.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 4"	m	196.37	44,668.76	8,771,604.40	196.37	$ 8,771,604.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	196.37	$ 8,771,604.40	100.00%	0.08%
8.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	m	103.98	34,602.30	3,597,947.15	103.98	$ 3,597,947.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	103.98	$ 3,597,947.15	100.00%	0.03%
8.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 2"	m	152.39	24,243.06	3,694,399.91	152.39	$ 3,694,399.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	152.39	$ 3,694,399.91	100.00%	0.03%
8.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-L 4"	m	50.97	44,668.76	2,276,766.70	50.97	$ 2,276,766.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.97	$ 2,276,766.70	100.00%	0.02%
8.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-L 3"	m	5.14	34,602.30	177,855.82	5.14	$ 177,855.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.14	$ 177,855.82	100.00%	0.00%
8.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-L 2"	m	118.90	24,243.06	2,882,499.83	118.90	$ 2,882,499.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	118.90	$ 2,882,499.83	100.00%	0.03%
8.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S 4"	und	246.00	24,647.39	6,063,257.94	246.00	$ 6,063,257.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	246.00	$ 6,063,257.94	100.00%	0.06%
8.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S 3"	und	94.00	18,092.56	1,700,700.64	94.00	$ 1,700,700.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	94.00	$ 1,700,700.64	100.00%	0.02%
8.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S 2"	und	269.00	12,533.49	3,371,508.81	269.00	$ 3,371,508.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	269.00	$ 3,371,508.81	100.00%	0.03%
8.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"	und	22.00	89,565.43	1,970,439.46	22.00	$ 1,970,439.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.00	$ 1,970,439.46	100.00%	0.02%
8.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4"	und	66.00	17,290.58	1,141,178.28	66.00	$ 1,141,178.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	66.00	$ 1,141,178.28	100.00%	0.01%
8.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3"	und	35.00	15,224.42	532,854.70	35.00	$ 532,854.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 532,854.70	100.00%	0.00%
8.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2"	und	51.00	13,089.35	667,556.85	51.00	$ 667,556.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	51.00	$ 667,556.85	100.00%	0.01%
8.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 4"	und	14.00	12,463.76	174,492.64	14.00	$ 174,492.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 174,492.64	100.00%	0.00%
8.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 3"	und	6.00	9,801.80	58,810.80	6.00	$ 58,810.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 58,810.80	100.00%	0.00%
8.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 6"	und	3.00	32,174.08	96,522.24	3.00	$ 96,522.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 96,522.24	100.00%	0.00%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
8.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 4"	und	6.00	26,300.48	157,802.88	6.00	$ 157,802.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 157,802.88	100.00%	0.00%
8.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 2 1/2"	und	4.00	13,957.46	55,829.84	4.00	$ 55,829.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 55,829.84	100.00%	0.00%
8.09	**RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS**																
8.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 315MM	m	53.40	85,483.99	4,564,845.07	53.40	$ 4,564,845.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	53.40	$ 4,564,845.07	100.00%	0.04%
8.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 250MM	m	10.03	24,158.13	242,306.04	10.03	$ 242,306.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.03	$ 242,306.04	100.00%	0.00%
8.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 200MM	m	6.13	75,711.88	464,113.82	6.13	$ 464,113.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.13	$ 464,113.82	100.00%	0.00%
8.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 160MM	m	38.39	59,741.22	2,293,465.44	38.39	$ 2,293,465.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	38.39	$ 2,293,465.44	100.00%	0.02%
8.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 110MM	m	31.34	29,410.87	921,736.67	31.34	$ 921,736.67		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	31.34	$ 921,736.67	100.00%	0.01%
8.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 315MM	und	9.00	465,880.68	4,192,926.12	9.00	$ 4,192,926.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 4,192,926.12	100.00%	0.04%
8.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 250MM	und	2.00	321,496.08	642,992.16	2.00	$ 642,992.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 642,992.16	100.00%	0.01%
8.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 200MM	und	2.00	164,889.30	329,778.60	2.00	$ 329,778.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 329,778.60	100.00%	0.00%
8.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 160MM	und	7.00	106,020.97	742,146.79	7.00	$ 742,146.79		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 742,146.79	100.00%	0.01%
8.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 110MM	und	6.00	47,151.49	282,908.94	6.00	$ 282,908.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 282,908.94	100.00%	0.00%
8.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIAM= 6"	m	34.04	81,516.23	2,774,812.47	34.04	$ 2,774,812.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.04	$ 2,774,812.47	100.00%	0.03%
8.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIAM= 4"	m	453.09	44,668.76	20,238,968.47	453.09	$ 20,238,968.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	453.09	$ 20,238,968.47	100.00%	0.19%
8.09.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIAM= 3"	m	98.38	34,602.30	3,404,174.27	98.38	$ 3,404,174.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	98.38	$ 3,404,174.27	100.00%	0.03%
8.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIAM= 2"	m	31.00	24,243.06	751,534.86	31.00	$ 751,534.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	31.00	$ 751,534.86	100.00%	0.01%
8.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 6"	und	5.00	96,291.90	481,459.50	5.00	$ 481,459.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 481,459.50	100.00%	0.00%
8.09.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 4"	und	259.00	24,647.39	6,383,674.01	259.00	$ 6,383,674.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	259.00	$ 6,383,674.01	100.00%	0.06%
8.09.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 3"	und	29.00	18,092.56	524,684.24	29.00	$ 524,684.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	29.00	$ 524,684.24	100.00%	0.00%
8.09.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 2"	und	3.00	12,533.49	37,600.47	3.00	$ 37,600.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 37,600.47	100.00%	0.00%
8.09.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE 4"	und	12.00	56,046.37	672,556.44	12.00	$ 672,556.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 672,556.44	100.00%	0.01%
8.09.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 4"	und	14.00	43,285.24	605,993.36	14.00	$ 605,993.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 605,993.36	100.00%	0.01%
8.09.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 3"	und	3.00	27,411.55	82,234.65	3.00	$ 82,234.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 82,234.65	100.00%	0.00%
8.09.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4"	und	152.00	17,290.58	2,628,168.16	152.00	$ 2,628,168.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	152.00	$ 2,628,168.16	100.00%	0.02%
8.09.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3"	und	33.00	15,224.42	502,405.86	33.00	$ 502,405.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	33.00	$ 502,405.86	100.00%	0.00%
8.09.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DIAM= 4"	und	15.00	12,463.76	186,956.40	15.00	$ 186,956.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 186,956.40	100.00%	0.00%
8.09.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DIAM= 3"	und	6.00	9,801.80	58,810.80	6.00	$ 58,810.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 58,810.80	100.00%	0.00%
8.09.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 6"	und	9.00	32,174.08	289,566.72	9.00	$ 289,566.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 289,566.72	100.00%	0.00%
8.09.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN + FILTRO CON GRAVA 4"	und	22.00	64,560.34	1,420,327.48	22.00	$ 1,420,327.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.00	$ 1,420,327.48	100.00%	0.01%
8.10	**RED GENERAL DE DESAGÜES DE AIRE ACONDICIONADO**																
8.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 DIAM= 1"	m	18.39	13,231.79	243,332.62	18.39	$ 243,332.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.39	$ 243,332.62	100.00%	0.00%
8.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P DIAM= 1"	und	9.00	10,433.23	93,899.07	9.00	$ 93,899.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 93,899.07	100.00%	0.00%
8.10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1"	und	7.00	8,467.16	59,270.12	7.00	$ 59,270.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 59,270.12	100.00%	0.00%
8.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DIAM= 1"	und	2.00	6,932.50	13,865.00	2.00	$ 13,865.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 13,865.00	100.00%	0.00%
8.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 3"	und	2.00	22,939.67	45,879.34	2.00	$ 45,879.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 45,879.34	100.00%	0.00%
8.10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 1.1/4"	und	4.00	15,758.95	63,035.80	4.00	$ 63,035.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 63,035.80	100.00%	0.00%
8.11	**Puntos HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA**																
8.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F LAVAMANOS 1/2"	und	25.00	62,831.57	1,570,789.25	25.00	$ 1,570,789.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 1,570,789.25	100.00%	0.01%
8.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F DUCHA 1/2"	und	30.00	62,831.57	1,884,947.10	30.00	$ 1,884,947.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 1,884,947.10	100.00%	0.02%
8.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F DUCHA DE EMERGENCIA 1.1/4"	und	1.00	98,271.51	98,271.51	1.00	$ 98,271.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 98,271.51	100.00%	0.00%
8.11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F LAVAPLATOS 1/2"	und	2.00	62,831.57	125,663.14	2.00	$ 125,663.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 125,663.14	100.00%	0.00%
8.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F LAVADORA 1/2"	und	4.00	63,758.72	255,034.88	4.00	$ 255,034.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 255,034.88	100.00%	0.00%
8.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F CALENTADOR 3/4"	und	2.00	70,483.62	140,967.24	2.00	$ 140,967.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 140,967.24	100.00%	0.00%
8.12	**Puntos HIDRÁULICOS RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**																
8.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F.ALL ORINAL 3/4"	und	8.00	69,200.85	553,606.80	8.00	$ 553,606.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 553,606.80	100.00%	0.01%
8.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F.ALL SANITARIO DE TANQUE 1/2"	und	4.00	62,714.32	250,857.28	4.00	$ 250,857.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 250,857.28	100.00%	0.00%
8.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F.ALL SANITARIO DE FLUXÓMETRO 1.1/4"	und	16.00	96,410.66	1,542,570.56	16.00	$ 1,542,570.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 1,542,570.56	100.00%	0.01%
8.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F.ALL LLAVE MANGUERA 1/2"	und	12.00	62,714.32	752,571.84	12.00	$ 752,571.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 752,571.84	100.00%	0.01%
8.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.F.ALL POCETA DE ASEO 1/2"	und	5.00	62,714.32	313,571.60	5.00	$ 313,571.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 313,571.60	100.00%	0.00%
8.13	**Puntos HIDRÁULICOS DE AGUA CALIENTE**																
8.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.C DUCHA 1/2"	und	30.00	46,901.54	1,407,046.20	30.00	$ 1,407,046.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 1,407,046.20	100.00%	0.01%
8.13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.C LAVADORA 1/2"	und	4.00	46,489.18	185,956.72	4.00	$ 185,956.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 185,956.72	100.00%	0.00%
8.13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto HIDRÁULICO A.C CALENTADOR 3/4"	und	2.00	49,300.26	98,600.52	2.00	$ 98,600.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 98,600.52	100.00%	0.00%
8.14	**SALIDAS SANITARIAS**																
8.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIO FLUXÓMETRO 4"	und	16.00	80,619.23	1,289,907.68	16.00	$ 1,289,907.68		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 1,289,907.68	100.00%	0.01%
8.14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIO TANQUE 4"	und	4.00	80,619.23	322,476.92	4.00	$ 322,476.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 322,476.92	100.00%	0.00%
8.14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LAVAMANOS 2"	und	25.00	59,291.46	1,482,286.50	25.00	$ 1,482,286.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 1,482,286.50	100.00%	0.01%
8.14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DUCHA 2"	und	30.00	32,747.05	982,411.50	30.00	$ 982,411.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 982,411.50	100.00%	0.01%
8.14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DUCHA 4"	und	1.00	79,150.52	79,150.52	1.00	$ 79,150.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 79,150.52	100.00%	0.00%
8.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LAVAPLATOS 2"	und	2.00	39,085.47	78,170.94	2.00	$ 78,170.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 78,170.94	100.00%	0.00%
8.14.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LAVADORA 2"	und	4.00	39,085.47	156,341.88	4.00	$ 156,341.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 156,341.88	100.00%	0.00%
8.14.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA POCETA ASEO 2"	und	5.00	39,085.47	195,427.35	5.00	$ 195,427.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 195,427.35	100.00%	0.00%
8.14.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ORINAL 2"	und	8.00	39,085.47	312,683.76	8.00	$ 312,683.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 312,683.76	100.00%	0.00%
8.14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SIFÓN 3"	und	7.00	111,057.53	777,402.71	7.00	$ 777,402.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 777,402.71	100.00%	0.01%
8.14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SIFÓN 2"	und	29.00	40,012.62	1,160,365.98	29.00	$ 1,160,365.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	29.00	$ 1,160,365.98	100.00%	0.01%
8.14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SIFÓN 4"	und	7.00	47,595.76	333,170.32	7.00	$ 333,170.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 333,170.32	100.00%	0.00%
8.15	**RED DE CARGA POZO EYECTOR RED DE AGUAS RESIDUALES**																

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
8.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 DIAM=1 1/2"	m	59.00	23,755.36	1,401,566.24	59.00	$ 1,401,566.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	59.00	$ 1,401,566.24	100.00%	0.01%
8.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P DIAM= 1 1/2"	und	11.00	15,649.82	172,148.02	11.00	$ 172,148.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 172,148.02	100.00%	0.00%
8.15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DIAM=1 1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT.	und	2.00	50,905.30	101,810.60	2.00	$ 101,810.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 101,810.60	100.00%	0.00%
8.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO DIAM=1 1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT.	und	2.00	44,567.98	89,135.96	2.00	$ 89,135.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 89,135.96	100.00%	0.00%
8.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión universal DIAM=1 1/2" PVC ROSCA NPT.	und	2.00	10,815.75	21,631.50	2.00	$ 21,631.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 21,631.50	100.00%	0.00%
8.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DIAM= 1 1/2"	und	2.00	12,279.49	24,558.98	2.00	$ 24,558.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 24,558.98	100.00%	0.00%
8.16	**RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO**																
8.16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C900 4"	m	48.40	141,612.77	6,854,058.07	48.40	$ 6,854,058.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	48.40	$ 6,854,058.07	100.00%	0.06%
8.16.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD10 4"	m	51.72	81,596.68	4,220,180.29	51.72	$ 4,220,180.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	51.72	$ 4,220,180.29	100.00%	0.04%
8.16.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD10 3"	m	0.50	67,210.99	33,605.50	0.50	$ 33,605.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.50	$ 33,605.50	100.00%	0.00%
8.16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD10 2.1/2"	m	89.61	56,367.66	5,051,106.01	89.61	$ 5,051,106.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	89.61	$ 5,051,106.01	100.00%	0.05%
8.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD10 2"	m	371.33	46,403.28	17,230,929.96	371.33	$ 17,230,929.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	371.33	$ 17,230,929.96	100.00%	0.16%
8.16.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD10 1.1/2"	m	80.74	47,994.62	3,875,085.62	80.74	$ 3,875,085.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	80.74	$ 3,875,085.62	100.00%	0.04%
8.16.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD40 1.1/4"	m	59.76	33,444.34	1,998,633.76	59.76	$ 1,998,633.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	59.76	$ 1,998,633.76	100.00%	0.02%
8.16.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD40 1"	m	180.38	63,369.93	11,430,667.97	180.38	$ 11,430,667.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	180.38	$ 11,430,667.97	100.00%	0.10%
8.16.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC C900 4"	m	8.00	375,140.13	3,001,121.04	8.00	$ 3,001,121.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 3,001,121.04	100.00%	0.03%
8.16.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	und	37.00	78,432.55	2,902,004.35	37.00	$ 2,902,004.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	37.00	$ 2,902,004.35	100.00%	0.03%
8.16.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 3"	und	6.00	45,820.32	274,921.92	6.00	$ 274,921.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 274,921.92	100.00%	0.00%
8.16.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2.1/2"	und	118.00	45,348.55	5,351,128.90	118.00	$ 5,351,128.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	118.00	$ 5,351,128.90	100.00%	0.05%
8.16.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2"	und	232.00	33,668.45	7,811,080.40	232.00	$ 7,811,080.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	232.00	$ 7,811,080.40	100.00%	0.07%
8.16.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1.1/2"	und	97.00	27,265.97	2,644,799.09	97.00	$ 2,644,799.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	97.00	$ 2,644,799.09	100.00%	0.02%
8.16.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO ROSCADO 1.1/4"	und	95.00	26,791.71	2,545,212.45	95.00	$ 2,545,212.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	95.00	$ 2,545,212.45	100.00%	0.02%
8.16.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO ROSCADO 1"	und	272.00	22,081.99	6,006,301.28	272.00	$ 6,006,301.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	272.00	$ 6,006,301.28	100.00%	0.05%
8.16.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTORES HD TUBO PVC X TUBO PVC 4"	und	8.00	23,973.54	191,788.32	8.00	$ 191,788.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 191,788.32	100.00%	0.00%
8.16.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTORES HD TUBO PVC X ACC PVC4"	und	8.00	25,241.64	201,933.12	8.00	$ 201,933.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 201,933.12	100.00%	0.00%
8.16.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SENSORA DE FLUJO 2.1/2"	und	3.00	1,080,463.48	3,241,390.44	3.00	$ 3,241,390.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 3,241,390.44	100.00%	0.03%
8.16.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE 2.1/2"	und	3.00	437,851.72	1,313,555.16	3.00	$ 1,313,555.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,313,555.16	100.00%	0.01%
8.16.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR 2.1/2"	und	3.00	618,043.90	1,854,131.70	3.00	$ 1,854,131.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,854,131.70	100.00%	0.02%
8.16.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING 4"	und	27.00	44,551.27	1,202,884.29	27.00	$ 1,202,884.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	27.00	$ 1,202,884.29	100.00%	0.01%
8.16.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING 3"	und	5.00	36,082.38	180,411.90	5.00	$ 180,411.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 180,411.90	100.00%	0.00%
8.16.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING 2 1/2"	und	249.00	38,791.62	9,659,113.38	249.00	$ 9,659,113.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	249.00	$ 9,659,113.38	100.00%	0.09%
8.16.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING 2"	und	462.00	28,609.82	13,217,736.84	462.00	$ 13,217,736.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	462.00	$ 13,217,736.84	100.00%	0.12%
8.16.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING 1 1/2"	und	152.00	29,625.28	4,503,042.56	152.00	$ 4,503,042.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	152.00	$ 4,503,042.56	100.00%	0.04%
8.16.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP 2.1/2"	und	14.00	42,757.86	598,610.04	14.00	$ 598,610.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 598,610.04	100.00%	0.01%
8.16.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP 2"	und	68.00	36,082.38	2,453,601.84	68.00	$ 2,453,601.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	68.00	$ 2,453,601.84	100.00%	0.02%
8.16.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	und	1.00	551,238.37	551,238.37	1.00	$ 551,238.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 551,238.37	100.00%	0.01%
8.16.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE 1"	und	4.00	103,041.74	412,166.96	4.00	$ 412,166.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 412,166.96	100.00%	0.00%
8.16.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 4" X 2.1/2" X 2.1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	und	1.00	2,234,107.23	2,234,107.23	1.00	$ 2,234,107.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,234,107.23	100.00%	0.02%
8.16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA BOMBEROS 2.1/2"	und	2.00	700,059.40	1,400,118.80	2.00	$ 1,400,118.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,400,118.80	100.00%	0.01%
8.16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADOR AUTOMÁTICO PENDENT (K=5.6)	und	43.00	44,275.45	1,903,844.35	43.00	$ 1,903,844.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	43.00	$ 1,903,844.35	100.00%	0.02%
8.16.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADOR AUTOMÁTICO UPRIGHT (K=5.6)	und	121.00	41,784.60	5,055,936.60	121.00	$ 5,055,936.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	121.00	$ 5,055,936.60	100.00%	0.05%
8.16.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO ROCIADOR	und	164.00	139,411.77	22,863,530.28	164.00	$ 22,863,530.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	164.00	$ 22,863,530.28	100.00%	0.21%
8.16.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA	m	834.12	18,784.29	15,668,351.97	834.12	$ 15,668,351.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	834.12	$ 15,668,351.97	100.00%	0.14%
8.16.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LB	und	8.00	129,883.31	1,039,066.48	8.00	$ 1,039,066.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 1,039,066.48	100.00%	0.01%
8.16.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR A BASE DE CO2 10 LB	und	6.00	332,314.80	1,993,888.80	6.00	$ 1,993,888.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 1,993,888.80	100.00%	0.02%
8.16.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR K DE 10 LB	und	1.00	129,883.31	129,883.31	1.00	$ 129,883.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 129,883.31	100.00%	0.00%
8.16.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA/GABINETE CON ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RÁPIDA K=5.6 TEMP. 135°	und	1.00	120,966.57	120,966.57	1.00	$ 120,966.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 120,966.57	100.00%	0.00%
8.16.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE III	und	3.00	879,368.19	2,638,104.57	3.00	$ 2,638,104.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 2,638,104.57	100.00%	0.02%
8.16.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN PVC C900 A ACERO 4"	und	2.00	463,173.36	926,346.72	2.00	$ 926,346.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 926,346.72	100.00%	0.01%
8.16.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 4"	und	12.00	26,849.64	322,195.68	12.00	$ 322,195.68		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 322,195.68	100.00%	0.00%
8.16.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 3"	und	1.00	25,838.35	25,838.35	1.00	$ 25,838.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 25,838.35	100.00%	0.00%
8.16.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 2.1/2"	und	20.00	25,998.76	519,975.20	20.00	$ 519,975.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 519,975.20	100.00%	0.00%
8.16.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 2"	und	83.00	24,054.90	1,996,556.70	83.00	$ 1,996,556.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.00	$ 1,996,556.70	100.00%	0.02%
8.16.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1.1/2"	und	18.00	23,948.30	431,069.40	18.00	$ 431,069.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.00	$ 431,069.40	100.00%	0.00%
8.16.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1.1/4"	und	14.00	23,805.82	333,281.48	14.00	$ 333,281.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 333,281.48	100.00%	0.00%
8.16.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1"	und	14.00	23,648.40	331,077.60	14.00	$ 331,077.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 331,077.60	100.00%	0.00%
8.16.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMO RESISTENTE 4 VÍAS	und	6.00	271,913.89	1,631,483.34	6.00	$ 1,631,483.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 1,631,483.34	100.00%	0.01%
8.16.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORRESISTENTE LATERAL	und	16.00	203,086.68	3,249,386.88	16.00	$ 3,249,386.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 3,249,386.88	100.00%	0.03%
8.16.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORRESISTENTE TRANSVERSAL	und	5.00	151,066.75	755,333.75	5.00	$ 755,333.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 755,333.75	100.00%	0.01%
8.16.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS UL/FM 4"	und	3.00	16,746.59	50,239.77	3.00	$ 50,239.77		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 50,239.77	100.00%	0.00%
8.16.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS UL/FM 1"	und	2.00	12,728.35	25,456.70	2.00	$ 25,456.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 25,456.70	100.00%	0.00%
8.16.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIERRO DÚCTIL 3"	m	0.40	67,210.99	26,884.40	0.40	$ 26,884.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.40	$ 26,884.40	100.00%	0.00%
8.16.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL 3"	und	1.00	45,820.32	45,820.32	1.00	$ 45,820.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 45,820.32	100.00%	0.00%
8.16.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE 3"	und	1.00	2,571,566.78	2,571,566.78	1.00	$ 2,571,566.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,571,566.78	100.00%	0.02%
8.16.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA OS&Y 3"	und	1.00	1,031,679.19	1,031,679.19	1.00	$ 1,031,679.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,031,679.19	100.00%	0.01%
8.17	**RED DE GAS MEDIA PRESIÓN**																
8.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.G SCH 40 1"	m	7.21	65,174.81	469,910.38	7.21	$ 469,910.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.21	$ 469,910.38	100.00%	0.00%
8.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.G SCH 40 3/4"	m	59.71	25,749.12	1,537,479.96	59.71	$ 1,537,479.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	59.71	$ 1,537,479.96	100.00%	0.01%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
8.17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A.G SCH 40 1"	und	10.00	25,749.12	257,491.20	10.00	$ 257,491.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 257,491.20	100.00%	0.00%
8.17.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A.G SCH 40 3/4"	und	42.00	25,749.12	1,081,463.04	42.00	$ 1,081,463.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	42.00	$ 1,081,463.04	100.00%	0.01%
8.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA 3/4"	und	3.00	25,749.12	77,247.36	3.00	$ 77,247.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 77,247.36	100.00%	0.00%
8.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR PRIMERA ETAPA	und	1.00	125,632.26	125,632.26	1.00	$ 125,632.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 125,632.26	100.00%	0.00%
8.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO	und	6.00	25,749.12	154,494.72	6.00	$ 154,494.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 154,494.72	100.00%	0.00%
8.17.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR	und	1.00	25,749.12	25,749.12	1.00	$ 25,749.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 25,749.12	100.00%	0.00%
8.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.G SCH 40 1/2"	m	6.88	25,749.12	177,153.95	6.88	$ 177,153.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.88	$ 177,153.95	100.00%	0.00%
8.17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A.G SCH 40 1/2"	und	29.00	25,749.12	746,724.48	29.00	$ 746,724.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	29.00	$ 746,724.48	100.00%	0.01%
8.17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA 1/2"	und	4.00	25,749.12	102,996.48	4.00	$ 102,996.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 102,996.48	100.00%	0.00%
8.18	**RED DE GAS BAJA PRESIÓN**																
8.18.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.G SCH 40 1"	m	0.51	17,258.52	8,801.85	0.51	$ 8,801.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.51	$ 8,801.85	100.00%	0.00%
8.18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.G SCH 40 3/4"	m	2.01	14,231.42	28,605.15	2.01	$ 28,605.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.01	$ 28,605.15	100.00%	0.00%
8.18.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A.G SCH 40 1"	und	4.00	17,258.52	69,034.08	4.00	$ 69,034.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 69,034.08	100.00%	0.00%
8.18.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A.G SCH 40 3/4"	und	4.00	22,361.56	89,446.24	4.00	$ 89,446.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 89,446.24	100.00%	0.00%
8.19	**Puntos GAS NATURAL**																
8.19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto CALENTADOR - TIPO 1 3/4"	und	2.00	117,685.89	235,371.78	2.00	$ 235,371.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 235,371.78	100.00%	0.00%
8.19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto ESTUFA - TIPO 1 3/4"	und	1.00	85,812.11	85,812.11	1.00	$ 85,812.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 85,812.11	100.00%	0.00%
8.19.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADORA	und	4.00	85,812.11	343,248.44	4.00	$ 343,248.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 343,248.44	100.00%	0.00%
8.20	**PRUEBAS DEL SISTEMA**																
8.20.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA LAS REDES DE PRESIÓN	und	16.00	529,325.67	8,469,210.72	16.00	$ 8,469,210.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 8,469,210.72	100.00%	0.08%
8.20.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA LAS REDES A GRAVEDAD	und	15.00	423,838.57	6,357,578.55	15.00	$ 6,357,578.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 6,357,578.55	100.00%	0.06%
8.20.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA LAS REDES DE GAS	und	2.00	423,838.57	847,677.14	2.00	$ 847,677.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 847,677.14	100.00%	0.01%
8.20.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRUEBA PARA LAS REDES RCI	und	1.00	423,838.57	423,838.57	1.00	$ 423,838.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 423,838.57	100.00%	0.00%
8.20.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES	und	1.00	999,957.55	999,957.55	1.00	$ 999,957.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 999,957.55	100.00%	0.01%
8.20.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	gb	1.00	3,715,947.01	3,715,947.01	1.00	$ 3,715,947.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,715,947.01	100.00%	0.03%
8.21	**CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS PARA LLENADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS**																
8.21.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 4"	m	6.02	464,977.80	2,799,166.36	6.02	$ 2,799,166.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.02	$ 2,799,166.36	100.00%	0.03%
8.21.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 2"	m	1.87	188,430.38	352,364.81	1.87	$ 352,364.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.87	$ 352,364.81	100.00%	0.00%
8.21.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 1.1/2"	m	2.79	132,989.43	371,040.51	2.79	$ 371,040.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.79	$ 371,040.51	100.00%	0.00%
8.21.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 4"	und	20.00	17,529.31	350,586.20	20.00	$ 350,586.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 350,586.20	100.00%	0.00%
8.21.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 2"	und	6.00	17,529.31	105,175.86	6.00	$ 105,175.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 105,175.86	100.00%	0.00%
8.21.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 1.1/2"	und	5.00	17,529.31	87,646.55	5.00	$ 87,646.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 87,646.55	100.00%	0.00%
8.21.07	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REGISTRO CORTINA 4" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	6.00	2,635,394.10	15,812,364.60	6.00	$ 15,812,364.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 15,812,364.60	100.00%	0.14%
8.21.08	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REGISTRO CORTINA 2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	1.00	565,391.75	565,391.75	1.00	$ 565,391.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 565,391.75	100.00%	0.01%
8.21.09	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REGISTRO CORTINA 1.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	1.00	391,918.20	391,918.20	1.00	$ 391,918.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 391,918.20	100.00%	0.00%
8.21.10	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VÁLVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO Fundido ROSCA NPT O SIMILAR 4"	und	2.00	1,667,554.87	3,335,109.74	2.00	$ 3,335,109.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,335,109.74	100.00%	0.03%
8.21.11	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CHEQUE HIDRO 4"	und	3.00	1,576,356.83	4,729,070.49	3.00	$ 4,729,070.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 4,729,070.49	100.00%	0.04%
8.21.12	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CHEQUE HIDRO 1,1/2"	und	1.00	298,552.27	298,552.27	1.00	$ 298,552.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 298,552.27	100.00%	0.00%
8.21.13	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE unión FLEXIBLE BORRACHA 4"	und	4.00	341,058.94	1,364,235.76	4.00	$ 1,364,235.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 1,364,235.76	100.00%	0.01%
8.21.14	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE universal 1,1/2"	und	2.00	49,175.22	98,350.44	2.00	$ 98,350.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 98,350.44	100.00%	0.00%
8.21.15	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE COPA CONCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA 4" X 2"	und	2.00	165,543.59	331,087.18	2.00	$ 331,087.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 331,087.18	100.00%	0.00%
8.21.16	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE COPA EXCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA 4" X 2"	und	2.00	200,705.96	401,411.92	2.00	$ 401,411.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 401,411.92	100.00%	0.00%
8.21.17	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 4"	und	1.00	346,706.71	346,706.71	1.00	$ 346,706.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 346,706.71	100.00%	0.00%
8.21.18	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 3"	und	1.00	316,617.23	316,617.23	1.00	$ 316,617.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 316,617.23	100.00%	0.00%
8.21.19	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2"	und	1.00	215,887.20	215,887.20	1.00	$ 215,887.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 215,887.20	100.00%	0.00%
8.21.20	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TRANSICIÓN TUBERÍA PVC-SCH80 A C900 4"	und	1.00	529,510.30	529,510.30	1.00	$ 529,510.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 529,510.30	100.00%	0.00%
09	**INSTALACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV**																
9.01	**DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS PVC CONDUIT**																
9.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 6"	m	380.00	67,753.44	25,746,307.20	380.00	$ 25,746,307.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	380.00	$ 25,746,307.20	100.00%	0.24%
9.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 4"	m	60.00	32,274.81	1,936,476.60	60.00	$ 1,936,476.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 1,936,476.60	100.00%	0.02%
9.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3"	m	75.00	28,577.12	2,143,284.00	75.00	$ 2,143,284.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	75.00	$ 2,143,284.00	100.00%	0.02%
9.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 2"	m	15.00	20,372.05	305,580.75	15.00	$ 305,580.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 305,580.75	100.00%	0.00%
9.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 1.1/2"	m	15.00	17,993.40	269,901.00	15.00	$ 269,901.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 269,901.00	100.00%	0.00%
9.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 1"	m	20.00	12,809.62	256,192.40	20.00	$ 256,192.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 256,192.40	100.00%	0.00%
9.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3/4"	m	750.00	10,984.65	8,238,487.50	750.00	$ 8,238,487.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	750.00	$ 8,238,487.50	100.00%	0.08%
9.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 1/2"	m	13.00	9,066.72	117,867.36	13.00	$ 117,867.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.00	$ 117,867.36	100.00%	0.00%
9.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 6"	und	40.00	82,896.92	3,315,876.80	40.00	$ 3,315,876.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	40.00	$ 3,315,876.80	100.00%	0.03%
9.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 4"	und	10.00	29,422.32	294,223.20	10.00	$ 294,223.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 294,223.20	100.00%	0.00%
9.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 3"	und	12.00	18,572.67	222,872.04	12.00	$ 222,872.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 222,872.04	100.00%	0.00%
9.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 2"	und	10.00	12,108.41	121,084.10	10.00	$ 121,084.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 121,084.10	100.00%	0.00%
9.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 1.1/2"	und	20.00	10,464.20	209,284.00	20.00	$ 209,284.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 209,284.00	100.00%	0.00%
9.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 1"	und	20.00	8,505.15	170,103.00	20.00	$ 170,103.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 170,103.00	100.00%	0.00%
9.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 3/4"	und	500.00	7,597.98	3,798,990.00	500.00	$ 3,798,990.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	500.00	$ 3,798,990.00	100.00%	0.03%
9.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 1/2"	und	13.00	7,079.78	92,037.14	13.00	$ 92,037.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.00	$ 92,037.14	100.00%	0.00%

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
9.02	**DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS EMT**																
9.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA EMT Diam= 2"	m	30.00	42,197.70	1,265,931.00	30.00	$ 1,265,931.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 1,265,931.00	100.00%	0.01%
9.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA EMT Diam= 1-1/4"	m	115.00	33,638.07	3,868,378.05	115.00	$ 3,868,378.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	115.00	$ 3,868,378.05	100.00%	0.04%
9.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA EMT Diam= 1"	m	50.00	25,060.50	1,253,025.00	50.00	$ 1,253,025.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.00	$ 1,253,025.00	100.00%	0.01%
9.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA EMT Diam= 3/4"	m	1,350.00	18,959.84	25,595,784.00	1,350.00	$ 25,595,784.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,350.00	$ 25,595,784.00	100.00%	0.23%
9.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA EMT Diam= 1/2"	m	10.00	12,102.95	121,029.50	10.00	$ 121,029.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 121,029.50	100.00%	0.00%
9.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS EMT Diam= 2"	und	20.00	18,966.03	379,320.60	20.00	$ 379,320.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 379,320.60	100.00%	0.00%
9.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS EMT Diam= 1-1/4"	und	53.00	14,178.54	751,462.62	53.00	$ 751,462.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	53.00	$ 751,462.62	100.00%	0.01%
9.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS EMT Diam= 1"	und	31.00	10,273.31	318,472.61	31.00	$ 318,472.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	31.00	$ 318,472.61	100.00%	0.00%
9.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS EMT Diam= 3/4"	und	450.00	8,929.68	4,018,356.00	450.00	$ 4,018,356.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	450.00	$ 4,018,356.00	100.00%	0.04%
9.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS EMT Diam= 1/2"	und	10.00	7,978.10	79,781.00	10.00	$ 79,781.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 79,781.00	100.00%	0.00%
9.03	**DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS IMC**																
9.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC Diam= 6"	m	68.00	336,502.37	22,882,161.16	68.00	$ 22,882,161.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	68.00	$ 22,882,161.16	100.00%	0.21%
9.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC Diam= 4"	m	15.00	188,100.30	2,821,504.50	15.00	$ 2,821,504.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 2,821,504.50	100.00%	0.03%
9.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS IMC Diam= 6"	und	20.00	248,643.57	4,972,871.40	20.00	$ 4,972,871.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 4,972,871.40	100.00%	0.05%
9.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS IMC Diam= 4"	und	20.00	168,432.67	3,368,653.40	20.00	$ 3,368,653.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 3,368,653.40	100.00%	0.03%
9.04	**DE BANDEJAS PORTACABLES Y CANALETAS**																
9.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO 50x120 MM	m	9.00	41,268.28	371,414.52	9.00	$ 371,414.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 371,414.52	100.00%	0.00%
9.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO 50x150 MM	m	140.00	43,226.09	6,051,652.60	140.00	$ 6,051,652.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	140.00	$ 6,051,652.60	100.00%	0.06%
9.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO 50x200 MM	m	90.00	60,291.41	5,426,226.90	90.00	$ 5,426,226.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	90.00	$ 5,426,226.90	100.00%	0.05%
9.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO 50x300 MM	m	60.00	73,204.98	4,392,298.80	60.00	$ 4,392,298.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 4,392,298.80	100.00%	0.04%
9.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CURVA 90 GRADOS TIPO DUCTO CERRADO 50x120 MM	und	15.00	33,836.58	507,548.70	15.00	$ 507,548.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 507,548.70	100.00%	0.00%
9.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CURVA 90 GRADOS TIPO DUCTO CERRADO 50x150 MM	und	15.00	35,876.09	538,141.35	15.00	$ 538,141.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 538,141.35	100.00%	0.00%
9.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CURVA 90 GRADOS TIPO DUCTO CERRADO 50x200 MM	und	15.00	50,485.43	757,281.45	15.00	$ 757,281.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 757,281.45	100.00%	0.01%
9.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CURVA 90 GRADOS TIPO DUCTO CERRADO 50x300 MM	und	15.00	64,822.77	972,341.55	15.00	$ 972,341.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 972,341.55	100.00%	0.01%
9.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CAMBIO DE NIVEL TIPO DUCTO CERRADO 50x120 MM	und	8.00	30,965.13	247,721.04	8.00	$ 247,721.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 247,721.04	100.00%	0.00%
9.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CAMBIO DE NIVEL TIPO DUCTO CERRADO 50x150 MM	und	8.00	32,685.81	261,486.48	8.00	$ 261,486.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 261,486.48	100.00%	0.00%
9.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CAMBIO DE NIVEL TIPO DUCTO CERRADO 50x200 MM	und	8.00	41,268.28	330,146.24	8.00	$ 330,146.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 330,146.24	100.00%	0.00%
9.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CAMBIO DE NIVEL TIPO DUCTO CERRADO 50x300 MM	und	8.00	47,589.07	380,712.56	8.00	$ 380,712.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 380,712.56	100.00%	0.00%
9.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA CON SEPARADOR 120x54 MM	m	120.00	25,463.27	3,055,592.40	120.00	$ 3,055,592.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 3,055,592.40	100.00%	0.03%
9.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CHANEL PARA BANDEJA 50x120 MM	und	150.00	24,040.00	3,606,000.00	150.00	$ 3,606,000.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	150.00	$ 3,606,000.00	100.00%	0.03%
9.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CHANEL PARA BANDEJA 50x150 MM	und	120.00	24,589.23	2,950,707.60	120.00	$ 2,950,707.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 2,950,707.60	100.00%	0.03%
9.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CHANEL PARA BANDEJA 50x200 MM	und	80.00	25,504.62	2,040,369.60	80.00	$ 2,040,369.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	80.00	$ 2,040,369.60	100.00%	0.02%
9.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CHANEL PARA BANDEJA 50x300 MM	und	60.00	26,346.18	1,580,770.80	60.00	$ 1,580,770.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 1,580,770.80	100.00%	0.01%
9.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 3/8" PARA SOPORTE CHANEL - (incluye Accesorios de Sujeción)	und	450.00	23,856.17	10,735,276.50	450.00	$ 10,735,276.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	450.00	$ 10,735,276.50	100.00%	0.10%
9.05	**DE CAJAS ELÉCTRICAS**																
9.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA INSPECCIÓN VEHICULAR TAPA REDONDA Ref. CS 280	und	1.00	2,150,569.40	2,150,569.40	1.00	$ 2,150,569.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,150,569.40	100.00%	0.02%
9.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA DOBLE INSPECCIÓN 2.00 x 1.00 - Ref. CS 276	und	5.00	3,586,508.89	17,932,544.45	5.00	$ 17,932,544.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 17,932,544.45	100.00%	0.16%
9.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA SENCILLA INSPECCIÓN 1.00 x 1.00 - Ref. CS 275	und	2.00	3,046,615.22	6,093,230.44	2.00	$ 6,093,230.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 6,093,230.44	100.00%	0.06%
9.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA CS 30X30 CM AP280	und	6.00	1,014,409.64	6,086,457.84	6.00	$ 6,086,457.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 6,086,457.84	100.00%	0.06%
9.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 30X30 CM	und	25.00	60,581.54	1,514,538.50	25.00	$ 1,514,538.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 1,514,538.50	100.00%	0.01%
9.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 15X15 CM 10x10 cm	und	25.00	27,456.20	686,405.00	25.00	$ 686,405.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 686,405.00	100.00%	0.01%
9.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	und	440.00	17,144.33	7,543,505.20	440.00	$ 7,543,505.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	440.00	$ 7,543,505.20	100.00%	0.07%
9.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 5800	und	120.00	10,794.65	1,295,358.00	120.00	$ 1,295,358.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 1,295,358.00	100.00%	0.01%
9.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2400	und	250.00	12,820.21	3,205,052.50	250.00	$ 3,205,052.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	250.00	$ 3,205,052.50	100.00%	0.03%
9.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2400 DOBLE FONDO	und	50.00	22,428.92	1,121,446.00	50.00	$ 1,121,446.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.00	$ 1,121,446.00	100.00%	0.01%
9.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	und	5.00	65,572.46	327,862.30	5.00	$ 327,862.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 327,862.30	100.00%	0.00%
9.06	**DE CABLES ELÉCTRICOS Y VARILLAS DE PUESTA A TIERRA CON ACCESORIOS**																
9.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 14	m	320.00	3,915.40	1,252,928.00	320.00	$ 1,252,928.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	320.00	$ 1,252,928.00	100.00%	0.01%
9.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 12	m	3,560.00	4,995.43	17,783,730.80	3,560.00	$ 17,783,730.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3,560.00	$ 17,783,730.80	100.00%	0.16%
9.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 10	m	980.00	6,272.74	6,147,285.20	980.00	$ 6,147,285.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	980.00	$ 6,147,285.20	100.00%	0.06%
9.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 8	m	475.00	8,585.25	4,077,993.75	475.00	$ 4,077,993.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	475.00	$ 4,077,993.75	100.00%	0.04%
9.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO FPLR NO 6 Aluminio	m	880.00	8,468.68	7,452,438.40	880.00	$ 7,452,438.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	880.00	$ 7,452,438.40	100.00%	0.07%
9.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 4 Aluminio	m	310.00	12,952.21	4,015,185.10	310.00	$ 4,015,185.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	310.00	$ 4,015,185.10	100.00%	0.04%
9.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 2 Aluminio	m	110.00	16,314.86	1,794,634.60	110.00	$ 1,794,634.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	110.00	$ 1,794,634.60	100.00%	0.02%
9.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 1/0 Aluminio	m	75.00	25,406.47	1,905,485.25	75.00	$ 1,905,485.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	75.00	$ 1,905,485.25	100.00%	0.02%
9.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 2/0 Aluminio	m	160.00	12,229.86	1,956,777.60	160.00	$ 1,956,777.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	160.00	$ 1,956,777.60	100.00%	0.02%
9.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 4/0 Aluminio	m	76.00	15,119.25	1,149,063.00	76.00	$ 1,149,063.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	76.00	$ 1,149,063.00	100.00%	0.01%
9.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 250 Aluminio	m	192.00	20,648.94	3,964,596.48	192.00	$ 3,964,596.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	192.00	$ 3,964,596.48	100.00%	0.04%
9.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 350 Aluminio	m	145.00	29,173.59	4,230,170.55	145.00	$ 4,230,170.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	145.00	$ 4,230,170.55	100.00%	0.04%
9.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 400 Aluminio	m	175.00	32,959.69	5,767,945.75	175.00	$ 5,767,945.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	175.00	$ 5,767,945.75	100.00%	0.05%
9.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 500 Aluminio	m	228.00	35,002.19	7,980,499.32	228.00	$ 7,980,499.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	228.00	$ 7,980,499.32	100.00%	0.07%
9.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 12 0	m	720.00	4,209.32	3,030,710.40	720.00	$ 3,030,710.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	720.00	$ 3,030,710.40	100.00%	0.03%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
9.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 10 0	m	250.00	4,856.94	1,214,235.00	250.00	$ 1,214,235.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	250.00	$ 1,214,235.00	100.00%	0.01%
9.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 8 0	m	195.00	7,596.88	1,481,391.60	195.00	$ 1,481,391.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	195.00	$ 1,481,391.60	100.00%	0.01%
9.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO NO 6 0	m	320.00	10,585.90	3,387,488.00	320.00	$ 3,387,488.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	320.00	$ 3,387,488.00	100.00%	0.03%
9.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 4 0	m	120.00	15,368.34	1,844,200.80	120.00	$ 1,844,200.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 1,844,200.80	100.00%	0.02%
9.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 2 0	m	120.00	22,073.71	2,648,845.20	120.00	$ 2,648,845.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 2,648,845.20	100.00%	0.02%
9.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 1/0 0	m	55.00	42,843.42	2,356,388.10	55.00	$ 2,356,388.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	55.00	$ 2,356,388.10	100.00%	0.02%
9.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 2/0 0	m	120.00	49,436.21	5,932,345.20	120.00	$ 5,932,345.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 5,932,345.20	100.00%	0.05%
9.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 250 0	m	120.00	89,296.80	10,715,616.00	120.00	$ 10,715,616.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 10,715,616.00	100.00%	0.10%
9.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE XLPE 2 3x185mm2 15kV - Plo de conexion hasta trafo	m	110.00	76,879.41	8,456,735.10	110.00	$ 8,456,735.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	110.00	$ 8,456,735.10	100.00%	0.08%
9.06.25	ALAMBRON 8 mm	m	230.00	7,375.69	1,696,408.70	230.00	$ 1,696,408.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	230.00	$ 1,696,408.70	100.00%	0.02%
9.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE FIBRA OPTICA OM4	m	150.00	110,293.64	16,544,046.00	150.00	$ 16,544,046.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	150.00	$ 16,544,046.00	100.00%	0.15%
9.06.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CATEGORIA 6A FUTP DE 500 MHZ	m	520.00	5,638.92	2,932,238.40	520.00	$ 2,932,238.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	520.00	$ 2,932,238.40	100.00%	0.03%
9.06.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CONECTORES DE RESORTE CABLES NO.22-12	und	700.00	3,099.24	2,169,468.00	700.00	$ 2,169,468.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	700.00	$ 2,169,468.00	100.00%	0.02%
9.06.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 10	und	110.00	5,185.34	570,387.40	110.00	$ 570,387.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	110.00	$ 570,387.40	100.00%	0.01%
9.06.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 8	und	30.00	5,633.69	169,010.70	30.00	$ 169,010.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 169,010.70	100.00%	0.00%
9.06.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 6	und	82.00	5,683.51	466,047.82	82.00	$ 466,047.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	82.00	$ 466,047.82	100.00%	0.00%
9.06.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 4	und	25.00	5,783.14	144,578.50	25.00	$ 144,578.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 144,578.50	100.00%	0.00%
9.06.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 2	und	50.00	5,882.78	294,139.00	50.00	$ 294,139.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.00	$ 294,139.00	100.00%	0.00%
9.06.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 1/0	und	45.00	5,982.41	269,208.45	45.00	$ 269,208.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 269,208.45	100.00%	0.00%
9.06.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 2/0	und	45.00	6,082.04	273,691.80	45.00	$ 273,691.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 273,691.80	100.00%	0.00%
9.06.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 3/0	und	45.00	6,181.68	278,175.60	45.00	$ 278,175.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 278,175.60	100.00%	0.00%
9.06.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 4/0	und	45.00	6,281.31	282,658.95	45.00	$ 282,658.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 282,658.95	100.00%	0.00%
9.06.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 250	und	25.00	6,380.95	159,523.75	25.00	$ 159,523.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 159,523.75	100.00%	0.00%
9.06.39	TERMINAL TIPO PALA NO 350	und	45.00	6,480.58	291,626.10	45.00	$ 291,626.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 291,626.10	100.00%	0.00%
9.06.40	TERMINAL TIPO PALA NO 400	und	45.00	6,580.21	296,109.45	45.00	$ 296,109.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 296,109.45	100.00%	0.00%
9.06.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 500	und	45.00	6,679.85	300,593.25	45.00	$ 300,593.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 300,593.25	100.00%	0.00%
9.06.42	PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLEP No 2/0 185mm 15kV	und	230.00	375,247.53	86,306,931.90	230.00	$ 86,306,931.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	230.00	$ 86,306,931.90	100.00%	0.79%
9.06.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE BASE PLASTICA PARA CABLE ALAMBRON 8 mm	und	250.00	12,800.22	3,200,055.00	250.00	$ 3,200,055.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	250.00	$ 3,200,055.00	100.00%	0.03%
9.06.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE VARILLA COOPER WELL 2,4 MTS	und	25.00	295,107.10	7,377,677.50	25.00	$ 7,377,677.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 7,377,677.50	100.00%	0.07%
9.06.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE COAXIAL	m	550.00	4,786.80	2,632,740.00	550.00	$ 2,632,740.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	550.00	$ 2,632,740.00	100.00%	0.02%
9.06.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PREMOLDEADO TIPO INTERIOR PARA CABLE XLEP No 2/0 185mm 15kV	und	25.00	326,325.44	8,158,136.00	25.00	$ 8,158,136.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 8,158,136.00	100.00%	0.07%
9.06.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CONECTOR BIMETALICO ALUMINIO - COBRE 1/0 AWG	m	50.00	26,443.87	1,322,193.50	50.00	$ 1,322,193.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.00	$ 1,322,193.50	100.00%	0.01%
9.07	**DE TABLEROS ELÉCTRICOS**																
9.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO MONOFÁSICO 6 CTOS 4 CTOS	und	3.00	223,128.90	669,386.70	3.00	$ 669,386.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 669,386.70	100.00%	0.01%
9.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO MONOFÁSICO 12 CTOS 6 CTOS	und	5.00	207,645.76	1,038,228.80	5.00	$ 1,038,228.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,038,228.80	100.00%	0.01%
9.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO 12 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR	und	3.00	511,031.46	1,533,094.38	3.00	$ 1,533,094.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,533,094.38	100.00%	0.01%
9.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO 18 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR	und	11.00	408,476.26	4,493,238.86	11.00	$ 4,493,238.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 4,493,238.86	100.00%	0.04%
9.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO TG-BOMBAS GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL; CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA DE LA PINTURA (MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO); CON ACABADO FINAL COLOR GRIS CLARO AL HORNO Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - TENSIÓN DE TRABAJO 208/120 VOLT. - und (1) und BREAKERS TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X120AMP - DOS (2) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X40AMP - CUATRO (4) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X30AMP	und	1.00	5,034,891.00	5,034,891.00	1.00	$ 5,034,891.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 5,034,891.00	100.00%	0.05%
9.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO TG-HVAC GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL; CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA DE LA PINTURA (MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO); CON ACABADO FINAL COLOR GRIS CLARO AL HORNO Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - TENSIÓN DE TRABAJO 208/120 VOLT. - und (1) und BREAKERS TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X80AMP - und (1) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X60AMP - und (1) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X30AMP	und	1.00	4,870,398.60	4,870,398.60	1.00	$ 4,870,398.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,870,398.60	100.00%	0.04%
9.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO TGR GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL; CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA DE LA PINTURA (MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO); CON ACABADO FINAL COLOR GRIS CLARO AL HORNO Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - TENSIÓN DE TRABAJO 208/120 VOLT. - TRES (3) und BREAKERS ENCHUFABLES DE 3X30AMP	und	1.00	4,828,854.19	4,828,854.19	1.00	$ 4,828,854.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,828,854.19	100.00%	0.04%
9.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO TGE GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL; CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA DE LA PINTURA (MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO); CON ACABADO FINAL COLOR GRIS CLARO AL HORNO Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - TENSIÓN DE TRABAJO 208/120 VOLT. - und (1) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X70AMP - und (1) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X630AMP NECESARIO AGUAS ABAJO DE LA PLANTA ELÉCTRICA	und	1.00	8,135,191.37	8,135,191.37	1.00	$ 8,135,191.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 8,135,191.37	100.00%	0.07%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:**
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**VERSIÓN:**
			FECHA:
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
9.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ILUMINACIÓN - CONTROL DE ILUMINACIÓN Comunal	und	3.00	8,489,734.17	25,469,202.51	3.00	$ 25,469,202.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 25,469,202.51	100.00%	0.23%
9.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BY-PASS 220V - USO INTERIOR GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL; CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA DE LA PINTURA (MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO); CON ACABADO FINAL COLOR GRIS CLARO AL HORNO Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - Transferencia Manual por Contactores 3X30 Amp AC3. Consta de dos contactores tripolares de la corriente indicada montados sobre lámina metálica y enclavamiento manual - Barraje Tetrapolar en cobre electrolítico montado sobre aisladores de resina para las tres fases, neutro y tierra según especificaciones. - 2 und de Interruptor Termomagnético 3x30 Amp, 30kA/220 – 240V	und	1.00	4,566,369.27	4,566,369.27	1.00	$ 4,566,369.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,566,369.27	100.00%	0.04%
9.07.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA - TGA-TRANSFERENCIA und (1) interruptor automático totalizador tipo industrial de 3 x 630Amp - 15kA Amp und (1) barraje en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina; de tres (3) barras de - 40 x 10 mm para las fases y und barra - 40 x 5 mm para el neutro y und barra - 20 x 5 mm para la tierra; Tornillería zincada con tuerca, guasa de presión y arandela; de longitud suficiente para efectuar las derivaciones trifásicas que indica el diagrama unifilar. BREAKERS segund diagrama unifilar	und	1.00	28,990,226.10	28,990,226.10	1.00	$ 28,990,226.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 28,990,226.10	100.00%	0.27%
9.07.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA - BCI Transferencia automática con base en contactores de 220Amp de AC3	und	1.00	9,367,457.39	9,367,457.39	1.00	$ 9,367,457.39		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 9,367,457.39	100.00%	0.09%
9.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE BOMBAS EQUIPO DE PRESIÓN	und	1.00	3,747,153.16	3,747,153.16	1.00	$ 3,747,153.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,747,153.16	100.00%	0.03%
9.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE BOMBAS JOCKEY	und	1.00	3,272,895.06	3,272,895.06	1.00	$ 3,272,895.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,272,895.06	100.00%	0.03%
9.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE BOMBAS EYECTORAS	und	1.00	3,272,895.06	3,272,895.06	1.00	$ 3,272,895.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,272,895.06	100.00%	0.03%
9.07.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE BOMBAS AGUAS LLUVIAS	und	1.00	3,510,024.11	3,510,024.11	1.00	$ 3,510,024.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,510,024.11	100.00%	0.03%
9.07.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE ASCENSOR	und	1.00	3,628,588.63	3,628,588.63	1.00	$ 3,628,588.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,628,588.63	100.00%	0.03%
9.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL FACTOR DE POTENCIA - Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante procesos de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris claro al horno y compuesto de los siguientes elementos: - Tensión de trabajo 208/120 Volt. - und (1) und BREAKERS industrial de 3x80amp - Dos (1) und BREAKERS industrial de 3x50amp	und	1.00	10,178,767.54	10,178,767.54	1.00	$ 10,178,767.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 10,178,767.54	100.00%	0.09%
9.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE COMPRESOR	und	1.00	3,391,459.58	3,391,459.58	1.00	$ 3,391,459.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,391,459.58	100.00%	0.03%
9.08	**DE BREAKERS ELÉCTRICOS**																
9.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 1X20A	und	110.00	21,248.38	2,337,321.80	110.00	$ 2,337,321.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	110.00	$ 2,337,321.80	100.00%	0.02%
9.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 1X30A	und	30.00	21,633.97	649,019.10	30.00	$ 649,019.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 649,019.10	100.00%	0.01%
9.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 1X40A	und	20.00	23,452.29	469,045.80	20.00	$ 469,045.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 469,045.80	100.00%	0.00%
9.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 1X50A	und	15.00	23,925.55	358,883.25	15.00	$ 358,883.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 358,883.25	100.00%	0.00%
9.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 2X20A	und	20.00	48,036.99	960,739.80	20.00	$ 960,739.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 960,739.80	100.00%	0.01%
9.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 2X30A	und	20.00	48,036.99	960,739.80	20.00	$ 960,739.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 960,739.80	100.00%	0.01%
9.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 2X40A	und	20.00	55,011.38	1,100,227.60	20.00	$ 1,100,227.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 1,100,227.60	100.00%	0.01%
9.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 2X50A	und	20.00	55,011.38	1,100,227.60	20.00	$ 1,100,227.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 1,100,227.60	100.00%	0.01%
9.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 2X60A	und	10.00	69,418.46	694,184.60	10.00	$ 694,184.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 694,184.60	100.00%	0.01%
9.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 3X20A	und	15.00	44,155.25	662,328.75	15.00	$ 662,328.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 662,328.75	100.00%	0.01%
9.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 3X30A	und	15.00	133,925.53	2,008,882.95	15.00	$ 2,008,882.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 2,008,882.95	100.00%	0.02%
9.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 3X40A	und	5.00	130,928.54	654,642.70	5.00	$ 654,642.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 654,642.70	100.00%	0.01%
9.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 3X50A	und	5.00	66,697.45	333,487.25	5.00	$ 333,487.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 333,487.25	100.00%	0.00%
9.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X30A	und	22.00	184,156.04	4,051,432.88	22.00	$ 4,051,432.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.00	$ 4,051,432.88	100.00%	0.04%
9.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X40A	und	3.00	184,156.04	552,468.12	3.00	$ 552,468.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 552,468.12	100.00%	0.01%
9.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X50A	und	3.00	66,697.45	200,092.35	3.00	$ 200,092.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 200,092.35	100.00%	0.00%
9.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X60A	und	4.00	108,444.12	433,776.48	4.00	$ 433,776.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 433,776.48	100.00%	0.00%
9.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X70A	und	1.00	228,164.40	228,164.40	1.00	$ 228,164.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 228,164.40	100.00%	0.00%
9.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X100A 80 Amp	und	2.00	202,438.89	404,877.78	2.00	$ 404,877.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 404,877.78	100.00%	0.00%
9.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X125A	und	2.00	257,775.65	515,551.30	2.00	$ 515,551.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 515,551.30	100.00%	0.00%
9.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X150A	und	4.00	257,775.65	1,031,102.60	4.00	$ 1,031,102.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 1,031,102.60	100.00%	0.01%
9.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X175A	und	1.00	279,367.83	279,367.83	1.00	$ 279,367.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 279,367.83	100.00%	0.00%
9.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X200A	und	2.00	481,640.90	963,281.80	2.00	$ 963,281.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 963,281.80	100.00%	0.01%
9.08.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X250A	und	1.00	334,329.96	334,329.96	1.00	$ 334,329.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 334,329.96	100.00%	0.00%
9.08.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X300A	und	2.00	1,064,594.77	2,129,189.54	2.00	$ 2,129,189.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 2,129,189.54	100.00%	0.02%
9.08.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X500A	und	2.00	1,644,863.51	3,289,727.02	2.00	$ 3,289,727.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,289,727.02	100.00%	0.03%
9.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X600A	und	2.00	1,644,863.51	3,289,727.02	2.00	$ 3,289,727.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,289,727.02	100.00%	0.03%
9.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X630A	und	4.00	2,195,436.31	8,781,745.24	4.00	$ 8,781,745.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 8,781,745.24	100.00%	0.08%
9.09	**DE TOMAS ELÉCTRICAS, INTERRUPTORES Y SENSORES**																
9.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MONOFÁSICA SYS NORMAL	und	116.00	17,346.17	2,012,155.72	116.00	$ 2,012,155.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	116.00	$ 2,012,155.72	100.00%	0.02%
9.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI MONOFÁSICA	und	5.00	48,953.08	244,765.40	5.00	$ 244,765.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 244,765.40	100.00%	0.00%
9.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA REGULADA	und	55.00	25,095.71	1,380,264.05	55.00	$ 1,380,264.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	55.00	$ 1,380,264.05	100.00%	0.01%
9.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA BIFÁSICA	und	3.00	23,148.86	69,446.58	3.00	$ 69,446.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 69,446.58	100.00%	0.00%
9.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA TRIFÁSICA	und	2.00	41,756.52	83,513.04	2.00	$ 83,513.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 83,513.04	100.00%	0.00%
9.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO 1	und	8.00	75,626.12	605,008.96	8.00	$ 605,008.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 605,008.96	100.00%	0.01%
9.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO 2 DUAL	und	8.00	85,643.32	685,146.56	8.00	$ 685,146.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 685,146.56	100.00%	0.01%
9.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE	und	4.00	23,977.82	95,911.28	4.00	$ 95,911.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 95,911.28	100.00%	0.00%

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01		**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**		
			CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA	
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA		**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$	14,952,434,853
			VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$	14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE	HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**		
			CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1	
			INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1	

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
9.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	und	3.00	36,478.90	109,436.70	3.00	$ 109,436.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 109,436.70	100.00%	0.00%
9.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	und	6.00	30,731.01	184,386.06	6.00	$ 184,386.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 184,386.06	100.00%	0.00%
9.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	und	36.00	26,266.41	945,590.76	36.00	$ 945,590.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	36.00	$ 945,590.76	100.00%	0.01%
9.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA EQUIPO EYECTOR	und	6.00	41,756.52	250,539.12	6.00	$ 250,539.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 250,539.12	100.00%	0.00%
9.09.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	und	7.00	28,753.28	201,272.96	7.00	$ 201,272.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 201,272.96	100.00%	0.00%
9.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	und	6.00	41,756.52	250,539.12	6.00	$ 250,539.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 250,539.12	100.00%	0.00%
9.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA SECADOR DE MANOS	und	8.00	29,554.33	236,434.64	8.00	$ 236,434.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 236,434.64	100.00%	0.00%
9.10	**DE SALIDA DE ILUMINACIÓN**																
9.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 1 Incrustar	und	94.00	46,427.42	4,364,177.48	94.00	$ 4,364,177.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	94.00	$ 4,364,177.48	100.00%	0.04%
9.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 2 Descolgada	und	83.00	46,427.42	3,853,475.86	83.00	$ 3,853,475.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.00	$ 3,853,475.86	100.00%	0.04%
9.10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 3 Sobreponer	und	166.00	46,427.42	7,706,951.72	166.00	$ 7,706,951.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	166.00	$ 7,706,951.72	100.00%	0.07%
9.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 4 Piso	und	2.00	46,427.42	92,854.84	2.00	$ 92,854.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 92,854.84	100.00%	0.00%
9.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EXTERIOR TIPO 1 Poste	und	4.00	350,773.59	1,403,094.36	4.00	$ 1,403,094.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 1,403,094.36	100.00%	0.01%
9.10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EXTERIOR TIPO 2 Pared	und	46.00	42,096.32	1,936,430.72	46.00	$ 1,936,430.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	46.00	$ 1,936,430.72	100.00%	0.02%
9.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA PARED TIPO 1 Aplique	und	35.00	46,427.42	1,624,959.70	35.00	$ 1,624,959.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 1,624,959.70	100.00%	0.01%
9.10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA PARED TIPO 2 Emergencia	und	43.00	42,096.32	1,810,141.76	43.00	$ 1,810,141.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	43.00	$ 1,810,141.76	100.00%	0.02%
9.10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA PISO TIPO 1 Piso	und	15.00	46,427.42	696,411.30	15.00	$ 696,411.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 696,411.30	100.00%	0.01%
9.11	**DE VOZ Y DATOS**																
9.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK 42UR	und	1.00	4,946,501.96	4,946,501.96	1.00	$ 4,946,501.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,946,501.96	100.00%	0.05%
9.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK CAT. 6A	und	70.00	22,425.41	1,569,778.70	70.00	$ 1,569,778.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	70.00	$ 1,569,778.70	100.00%	0.01%
9.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE SENCILLO	und	140.00	21,010.61	2,941,485.40	140.00	$ 2,941,485.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	140.00	$ 2,941,485.40	100.00%	0.03%
9.11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE DOBLE	und	140.00	22,206.21	3,108,869.40	140.00	$ 3,108,869.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	140.00	$ 3,108,869.40	100.00%	0.03%
9.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORE DE 2 MTS	und	140.00	51,219.65	7,170,751.00	140.00	$ 7,170,751.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	140.00	$ 7,170,751.00	100.00%	0.07%
9.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN DE 24 PUERTOS CAT 6A	und	2.00	4,042,837.61	8,085,675.22	2.00	$ 8,085,675.22		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 8,085,675.22	100.00%	0.07%
9.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE ACCESO DE 24 PUERTOS CAT 6A	und	70.00	2,240,869.04	156,860,832.80	70.00	$ 156,860,832.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	70.00	$ 156,860,832.80	100.00%	1.44%
9.11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PUERTOS	und	2.00	877,337.15	1,754,674.30	2.00	$ 1,754,674.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,754,674.30	100.00%	0.02%
9.11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES DE CABLE VERTICAL TIPO 1	und	2.00	179,898.76	359,797.52	2.00	$ 359,797.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 359,797.52	100.00%	0.00%
9.12	**DE APANTALLAMIENTO**																
9.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punta CAPTADORA 2 MTS	und	5.00	142,447.81	712,239.05	5.00	$ 712,239.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 712,239.05	100.00%	0.01%
9.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punta CAPTADORA 1 MTS	und	5.00	163,938.87	819,694.35	5.00	$ 819,694.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 819,694.35	100.00%	0.01%
9.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punta CAPTADORA,6 MTS	und	35.00	82,786.94	2,897,542.90	35.00	$ 2,897,542.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 2,897,542.90	100.00%	0.03%
9.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE uniones TIPO CRUZ PARA CABLE	und	30.00	68,105.31	2,043,159.30	30.00	$ 2,043,159.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 2,043,159.30	100.00%	0.02%
9.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE uniones TIPO T PARA CABLE	und	15.00	19,234.80	288,522.00	15.00	$ 288,522.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 288,522.00	100.00%	0.00%
9.12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL BIMETÁLICO	und	350.00	9,529.41	3,335,293.50	350.00	$ 3,335,293.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	350.00	$ 3,335,293.50	100.00%	0.03%
9.12.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CAMBIO DE MATERIAL	und	3.00	66,926.63	200,779.89	3.00	$ 200,779.89		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 200,779.89	100.00%	0.00%
9.12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA 0.30X0.30M	und	5.00	97,946.52	489,732.60	5.00	$ 489,732.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 489,732.60	100.00%	0.00%
9.13	**DE SUBESTACIÓN**																
9.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA TIPO 1	und	1.00	32,403,151.24	32,403,151.24	1.00	$ 32,403,151.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 32,403,151.24	100.00%	0.30%
9.13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS DE ALFAJOR TIPO 1	m	1.00	148,072.95	148,072.95	1.00	$ 148,072.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 148,072.95	100.00%	0.00%
9.13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO TIPO 1	m	1.00	98,429.72	98,429.72	1.00	$ 98,429.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 98,429.72	100.00%	0.00%
9.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR (MEDIDA INDIRECTA)	und	2.00	8,735,451.98	17,470,903.96	2.00	$ 17,470,903.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 17,470,903.96	100.00%	0.16%
9.13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES	und	6.00	2,899,117.58	17,394,705.48	6.00	$ 17,394,705.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 17,394,705.48	100.00%	0.16%
9.13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS	und	5.00	640,819.69	3,204,098.45	5.00	$ 3,204,098.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 3,204,098.45	100.00%	0.03%
9.14	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**																
9.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCENDIOS	und	2.00	6,353,122.12	12,706,244.24	2.00	$ 12,706,244.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 12,706,244.24	100.00%	0.12%
9.14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE ÓPTICO	und	8.00	587,598.77	4,700,790.16	8.00	$ 4,700,790.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 4,700,790.16	100.00%	0.04%
9.14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO	und	63.00	566,257.16	35,674,201.08	63.00	$ 35,674,201.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	63.00	$ 35,674,201.08	100.00%	0.33%
9.14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	und	2.00	447,150.68	894,301.36	2.00	$ 894,301.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 894,301.36	100.00%	0.01%
9.14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA Y ALARMA	und	25.00	237,158.95	5,928,973.75	25.00	$ 5,928,973.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 5,928,973.75	100.00%	0.05%
9.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO NAC	und	1.00	741,920.02	741,920.02	1.00	$ 741,920.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 741,920.02	100.00%	0.01%
9.14.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE HUMO BEAM	und	1.00	755,167.37	755,167.37	1.00	$ 755,167.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 755,167.37	100.00%	0.01%
9.14.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MONITOR	und	1.00	302,369.44	302,369.44	1.00	$ 302,369.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 302,369.44	100.00%	0.00%
9.14.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2X18 FPLR	m	980.00	4,856.94	4,759,801.20	980.00	$ 4,759,801.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	980.00	$ 4,759,801.20	100.00%	0.04%
9.15	**SISTEMA DE CCTV**																
9.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR DE CONTROL	und	2.00	7,705,530.25	15,411,060.50	2.00	$ 15,411,060.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 15,411,060.50	100.00%	0.14%
9.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA INTERIOR TIPO 1 Bullet	und	35.00	1,413,314.29	49,466,000.15	35.00	$ 49,466,000.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 49,466,000.15	100.00%	0.45%
9.15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA INTERIOR TIPO 2	und	12.00	680,973.26	8,171,679.12	12.00	$ 8,171,679.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 8,171,679.12	100.00%	0.07%
9.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA POE EXTERIOR TIPO 1	und	8.00	2,563,091.28	20,504,730.24	8.00	$ 20,504,730.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 20,504,730.24	100.00%	0.19%
9.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE MONITOREO CCTV TIPO 1	und	1.00	7,254,287.07	7,254,287.07	1.00	$ 7,254,287.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 7,254,287.07	100.00%	0.07%
9.16	**POSTES Y EXCAVACIONES**																
9.16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO 6M	und	3.00	878,166.00	2,634,498.00	3.00	$ 2,634,498.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 2,634,498.00	100.00%	0.02%
9.16.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXCAVACIÓN PARA DUCTO DE TUBOS 6"	m	80.00	254,578.94	20,366,315.20	80.00	$ 20,366,315.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	80.00	$ 20,366,315.20	100.00%	0.19%
9.16.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN PARA DUCTO DE TUBOS 4"	m	80.00	100,982.68	8,078,614.40	80.00	$ 8,078,614.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	80.00	$ 8,078,614.40	100.00%	0.07%
9.17	**CERTIFICACIONES**																
9.17.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CERTIFICACIÓN Puntos LÓGICOS DE VOZ T DATOS	und	44.00	39,853.62	1,753,559.28	44.00	$ 1,753,559.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	44.00	$ 1,753,559.28	100.00%	0.02%
9.17.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRUEBA VLF CIRCUITO DE MEDIA TENSION	und	1.00	2,077,975.14	2,077,975.14	1.00	$ 2,077,975.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,077,975.14	100.00%	0.02%
10	**INSTALACIONES MECANICAS DE AIRE ACONDICIONADO**																
10.01	**DE EQUIPOS MECANICOS, unidades condensadoras de refrigerante variable Cooling Only**																

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**FECHA:**	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
10.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unidad CONDENSADORA COOLING ONLY, 96 MBH, 208/3/60 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	27,018,953.28	27,018,953.28	1.00	$ 27,018,953.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 27,018,953.28	100.00%	0.25%
10.02	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, unidades condensadoras de refrigerante variable Heat Pump**																
10.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unidad CONDENSADORA HEAT PUMP, 96 MBH, 208/3/60 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	28,108,592.81	28,108,592.81	1.00	$ 28,108,592.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 28,108,592.81	100.00%	0.26%
10.03	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, unidades evaporadoras VRF tipo FanCoil Desnudo Alta Estática**																
10.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unidad EVAPORADORA VRF TIPO FANCOIL DESNUDO, 76,000 BTUH, 208/1/60 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	10,748,361.64	10,748,361.64	1.00	$ 10,748,361.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 10,748,361.64	100.00%	0.10%
10.04	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, unidades evaporadoras VRF tipo Pared**																
10.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unidad EVAPORADORA VRF TIPO PARED, 12,000 BTUH, 208/1/60 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	2,942,494.74	2,942,494.74	1.00	$ 2,942,494.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,942,494.74	100.00%	0.03%
10.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unidad EVAPORADORA VRF TIPO PARED, 24,000 BTUH, 208/1/60 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	3.00	3,526,991.94	10,580,975.82	3.00	$ 10,580,975.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 10,580,975.82	100.00%	0.10%
10.05	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Ventiladores tipo centrífugos.**																
10.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO HONGO DE CARGA VERTICAL, VE-01 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	9,001,407.95	9,001,407.95	1.00	$ 9,001,407.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 9,001,407.95	100.00%	0.08%
10.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO HONGO DE CARGA VERTICAL, VE-02 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	9,796,329.29	9,796,329.29	1.00	$ 9,796,329.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 9,796,329.29	100.00%	0.09%
10.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO HONGO DE CARGA VERTICAL, VE-03 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	9,752,969.55	9,752,969.55	1.00	$ 9,752,969.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 9,752,969.55	100.00%	0.09%
10.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO HONGO DE CARGA VERTICAL, VE-04 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	9,001,407.95	9,001,407.95	1.00	$ 9,001,407.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 9,001,407.95	100.00%	0.08%
10.06	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Ventiladores tipo helicocentrífugos.**																
10.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGOS, VS-01 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, filtro MERV 8, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	6,424,972.64	6,424,972.64	1.00	$ 6,424,972.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 6,424,972.64	100.00%	0.06%
10.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGOS, VS-02 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, filtro MERV 8, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	2,773,153.38	2,773,153.38	1.00	$ 2,773,153.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,773,153.38	100.00%	0.03%
10.07	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Ventiladores tipo individual.**																
10.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INDIVIDUAL TIPO CENTRIFUGO, CFP-01 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	2.00	5,039,009.93	10,078,019.86	2.00	$ 10,078,019.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 10,078,019.86	100.00%	0.09%
10.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INDIVIDUAL TIPO CENTRIFUGO, CFP-03 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	10,310,068.91	10,310,068.91	1.00	$ 10,310,068.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 10,310,068.91	100.00%	0.09%
10.08	**MATERIALES, Materiales para la fabricación de ductos rectangulares**																
10.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lamina Galvanizada Calibre 16	m2	40.00	152,183.38	6,087,335.20	40.00	$ 6,087,335.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	40.00	$ 6,087,335.20	100.00%	0.06%
10.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lamina Galvaniza calibre 24	m2	350.00	108,845.55	38,095,942.50	350.00	$ 38,095,942.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	350.00	$ 38,095,942.50	100.00%	0.35%
10.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lamina de fibra de vidrio tipo ducto glass neto	m2	60.00	138,598.37	8,315,902.20	60.00	$ 8,315,902.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 8,315,902.20	100.00%	0.08%
10.09	**ACCESORIOS SISTEMA DE DUCTOS, Dampers de balanceo**																
10.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPERS DE BALANCEO	und	5.00	393,859.52	1,969,297.60	5.00	$ 1,969,297.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,969,297.60	100.00%	0.02%
10.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPERS DE GRAVEDAD	und	1.00	406,544.93	406,544.93	1.00	$ 406,544.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 406,544.93	100.00%	0.00%
10.10	**DIFUSORES Y REJILLAS, Difusores 3 vias**																
10.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS CON DÁMPER, DS3V, 6"x6" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	2.00	153,365.78	306,731.56	2.00	$ 306,731.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 306,731.56	100.00%	0.00%
10.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS CON DÁMPER, DS3V, 12"x12" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	185,271.59	185,271.59	1.00	$ 185,271.59		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 185,271.59	100.00%	0.00%
10.11	**DIFUSORES Y REJILLAS, Difusores 4 vias**																
10.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DÁMPER, DS4V, 12"x12" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	6.00	121,459.96	728,759.76	6.00	$ 728,759.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 728,759.76	100.00%	0.01%
10.12	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas de extracción aleta fija**																
10.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 6"x6" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	35.00	151,942.01	5,317,970.35	35.00	$ 5,317,970.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 5,317,970.35	100.00%	0.05%
10.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 8"x8" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	2.00	170,440.06	340,880.12	2.00	$ 340,880.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 340,880.12	100.00%	0.00%
10.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 10"x8" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	3.00	192,566.80	577,700.40	3.00	$ 577,700.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 577,700.40	100.00%	0.01%
10.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 10"x10" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	2.00	219,033.59	438,067.18	2.00	$ 438,067.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 438,067.18	100.00%	0.00%
10.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 12"x12" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	4.00	250,693.30	1,002,773.20	4.00	$ 1,002,773.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 1,002,773.20	100.00%	0.01%
10.12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 14"x14" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	288,563.21	288,563.21	1.00	$ 288,563.21		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 288,563.21	100.00%	0.00%
10.13	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas de retorno aleta fija**																
10.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER, RRAF, 20"x20" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	2.00	97,723.15	195,446.30	2.00	$ 195,446.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 195,446.30	100.00%	0.00%
10.14	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas tipo louver**																
10.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO LOUVER, RTLV, 8"x6" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	93,754.72	93,754.72	1.00	$ 93,754.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 93,754.72	100.00%	0.00%
10.14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO LOUVER, RTLV, 8"x8" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	99,321.28	99,321.28	1.00	$ 99,321.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 99,321.28	100.00%	0.00%
10.14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO LOUVER, RTLV, 12"x6" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	107,752.31	107,752.31	1.00	$ 107,752.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 107,752.31	100.00%	0.00%
10.14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO LOUVER, RTLV, 20"x10" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	116,150.46	116,150.46	1.00	$ 116,150.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 116,150.46	100.00%	0.00%
10.15	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, Tuberia de refrigerante Rigida**																
10.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/4"	m	5.00	34,266.59	171,332.95	5.00	$ 171,332.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 171,332.95	100.00%	0.00%
10.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/8"	m	105.00	37,562.49	3,944,061.45	105.00	$ 3,944,061.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	105.00	$ 3,944,061.45	100.00%	0.04%

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

		Condiciones contractuales				**Condiciones actualizadas**		**ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01**		**ACUMULADO**				**PENDIENTE POR EJECUTAR**			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
10.15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/2"	m	20.00	41,414.34	828,286.80	20.00	$ 828,286.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 828,286.80	100.00%	0.01%
10.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 5/8"	m	60.00	45,912.82	2,754,769.20	60.00	$ 2,754,769.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 2,754,769.20	100.00%	0.03%
10.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/4"	m	22.00	51,168.52	1,125,707.44	22.00	$ 1,125,707.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.00	$ 1,125,707.44	100.00%	0.01%
10.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 7/8"	m	35.00	60,807.11	2,128,248.85	35.00	$ 2,128,248.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 2,128,248.85	100.00%	0.02%
10.16	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, Accesorios derivadores de cobre aislados (BRANCH).**																
10.16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DERIVADOR DE COBRE AISLADOS (BRANCH) PARA INTERIORES	und	3.00	352,562.54	1,057,687.62	3.00	$ 1,057,687.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,057,687.62	100.00%	0.01%
10.17	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, Adicionales**																
10.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cantidad de refrigerante adicional R410A	kg	12.00	52,804.53	633,654.36	12.00	$ 633,654.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 633,654.36	100.00%	0.01%
10.18	**SISTEMA ELÉCTRICO, Tableros eléctricos**																
10.18.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, TAE-01 (Incluye: Cofre para exteriores según norma vigente, protecciones, accesorios de instalación, soportería, transporte, puesta en sitio, instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	4,886,895.18	4,886,895.18	1.00	$ 4,886,895.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,886,895.18	100.00%	0.04%
10.18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, TAE-02 (Incluye: Cofre para interiores según norma vigente, protecciones, accesorios de instalación, soportería, transporte, puesta en sitio, instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	4,165,157.05	4,165,157.05	1.00	$ 4,165,157.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,165,157.05	100.00%	0.04%
10.19	**SISTEMA ELÉCTRICO, Variadores de frecuencia**																
10.19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA, 1,5 HP (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	2,673,467.37	2,673,467.37	1.00	$ 2,673,467.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,673,467.37	100.00%	0.02%
10.19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA, 2 HP (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	2,765,206.42	2,765,206.42	1.00	$ 2,765,206.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,765,206.42	100.00%	0.03%
10.20	**SISTEMA DE CONTROL, tableros de control**																
10.20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, TC-00 (Incluye: Cofre para exteriores según norma vigente, relevos, accesorios de instalación, soportería, transporte, puesta en sitio, instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	4,289,793.35	4,289,793.35	1.00	$ 4,289,793.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,289,793.35	100.00%	0.04%
10.20.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, TC-01 (Incluye: Cofre para interiores según norma vigente, relevos, accesorios de instalación, soportería, transporte, puesta en sitio, instalación, puesta en marcha y pruebas	und	1.00	4,252,134.92	4,252,134.92	1.00	$ 4,252,134.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,252,134.92	100.00%	0.04%
10.20.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, TC-02 (Incluye: Cofre para interiores según norma vigente, relevos, accesorios de instalación, soportería, transporte, puesta en sitio, instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	4,252,134.92	4,252,134.92	1.00	$ 4,252,134.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,252,134.92	100.00%	0.04%
10.21	**SISTEMA DE CONTROL, controladores**																
10.21.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR CENTRAL VRF, MAX 64 unidades INTERNAS, TC-00 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	14,537,885.40	14,537,885.40	1.00	$ 14,537,885.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 14,537,885.40	100.00%	0.13%
10.21.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE CAMPO, TC-01 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	8,828,995.53	8,828,995.53	1.00	$ 8,828,995.53		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 8,828,995.53	100.00%	0.08%
10.21.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE CAMPO, TC-02 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	8,505,688.01	8,505,688.01	1.00	$ 8,505,688.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 8,505,688.01	100.00%	0.08%
10.22	**SISTEMA DE CONTROL, Sensores - actuadores**																
10.22.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Termostatos VRF independientes por área	und	5.00	784,603.16	3,923,015.80	5.00	$ 3,923,015.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 3,923,015.80	100.00%	0.04%
10.22.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Rele contactor	und	4.00	644,891.30	2,579,565.20	4.00	$ 2,579,565.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 2,579,565.20	100.00%	0.02%
10.22.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Dona de corriente	und	4.00	393,116.05	1,572,464.20	4.00	$ 1,572,464.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 1,572,464.20	100.00%	0.01%
10.22.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Switch diferencial de presión	und	2.00	529,365.62	1,058,731.24	2.00	$ 1,058,731.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,058,731.24	100.00%	0.01%
10.23	**SISTEMA DE CONTROL, Otras actividades**																
10.23.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Transformador tableros de control	und	3.00	410,155.16	1,230,465.48	3.00	$ 1,230,465.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,230,465.48	100.00%	0.01%
10.23.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cableado de control SENSORES (Incluye canalización y soportería).	m	125.00	10,275.14	1,284,392.50	125.00	$ 1,284,392.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	125.00	$ 1,284,392.50	100.00%	0.01%
10.23.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cableado de control Comunicación (Incluye canalización y soportería).	m	300.00	23,875.19	7,162,557.00	300.00	$ 7,162,557.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	300.00	$ 7,162,557.00	100.00%	0.07%
11	**SOBREPISOS Y AFINADOS INTERIORES**																
11.01	**ALISTADOS DE PISOS**																
11.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO LLANA METÁLICA	m2	226.02	40,318.60	9,112,809.97	226.02	$ 9,112,809.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	226.02	$ 9,112,809.97	100.00%	0.08%
11.01.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO LLANA MADERA	m2	366.45	34,071.57	12,485,526.83	366.45	$ 12,485,526.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	366.45	$ 12,485,526.83	100.00%	0.11%
11.01.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO INTEGRAL	m2	90.51	48,415.39	4,382,076.95	90.51	$ 4,382,076.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	90.51	$ 4,382,076.95	100.00%	0.04%
11.01.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO MORTERO CON ENDURECEDOR	m2	1,279.85	47,774.76	61,144,526.59	1,279.85	$ 61,144,526.59		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,279.85	$ 61,144,526.59	100.00%	0.56%
11.01.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO	m2	628.34	39,326.26	24,710,262.21	628.34	$ 24,710,262.21		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	628.34	$ 24,710,262.21	100.00%	0.23%
11.01.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MORTERO ESTRIADO RAMPA	m2	45.24	47,087.62	2,130,243.93	45.24	$ 2,130,243.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.24	$ 2,130,243.93	100.00%	0.02%
11.02	**POYOS, BORDILLOS Y CÁRCAMOS Fundidos**																
11.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE POYO EN CONCRETO E= 15 CM	m	13.61	102,354.01	1,393,038.08	13.61	$ 1,393,038.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.61	$ 1,393,038.08	100.00%	0.01%
11.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE POYO EN CONCRETO EN CUBIERTA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E=20 CM	m2	1.76	124,671.24	219,421.38	1.76	$ 219,421.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.76	$ 219,421.38	100.00%	0.00%
11.02.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO Fundido EN SITIO 10 x 15 CM	m	132.04	50,986.79	6,732,295.75	132.04	$ 6,732,295.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	132.04	$ 6,732,295.75	100.00%	0.06%
11.02.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO Fundido EN SITIO 10 x 25 CM	m	34.49	61,729.54	2,129,051.83	34.49	$ 2,129,051.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.49	$ 2,129,051.83	100.00%	0.02%
11.02.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO Fundido	m	14.60	40,937.66	597,689.84	14.60	$ 597,689.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.60	$ 597,689.84	100.00%	0.01%
11.02.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAÑUELA PARA CUBIERTAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	m	104.37	42,679.09	4,454,416.62	104.37	$ 4,454,416.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	104.37	$ 4,454,416.62	100.00%	0.04%
12	**ACABADOS DE PISOS**																
12.01	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA**																
12.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA YARUMO TABACO CARAS DIFERENCIADAS 30X60	m2	8.70	65,569.35	570,453.35	8.70	$ 570,453.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.70	$ 570,453.35	100.00%	0.01%
12.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA YARUMO GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60	m2	34.80	65,569.35	2,281,813.38	34.80	$ 2,281,813.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.80	$ 2,281,813.38	100.00%	0.02%
12.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA NOW GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60	m2	34.77	66,179.11	2,301,047.65	34.77	$ 2,301,047.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.77	$ 2,301,047.65	100.00%	0.02%
12.02	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS EN PORCELANATO**																
12.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO CHICAGO GRIS CENIZO	m2	248.63	118,106.65	29,364,856.39	248.63	$ 29,364,856.39		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	248.63	$ 29,364,856.39	100.00%	0.27%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**FECHA:**	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
12.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PORCELANATO CHICAGO GRIS CENIZO	m	160.82	59,409.05	9,554,163.42	160.82	$ 9,554,163.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	160.82	$ 9,554,163.42	100.00%	0.09%
12.03	**PISOS EN CONCRETO**																
12.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO	m2	1,136.70	30,945.67	35,175,943.09	1,136.70	$ 35,175,943.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,136.70	$ 35,175,943.09	100.00%	0.32%
12.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO ACABADO TIPO HELICÓPTERO	m2	832.35	61,513.95	51,201,136.28	832.35	$ 51,201,136.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	832.35	$ 51,201,136.28	100.00%	0.47%
12.04	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS EN ARCILLA Y GRES**																
12.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA DE GRES ETRUSCA SAHARA 7 X 5cm	m2	12.24	54,392.48	665,763.96	12.24	$ 665,763.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.24	$ 665,763.96	100.00%	0.01%
12.05	**PISOS EN GRANITO**																
12.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA ECO KRISTAL BLANCO 30X30	m2	366.45	135,068.41	49,495,818.84	366.45	$ 49,495,818.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	366.45	$ 49,495,818.84	100.00%	0.45%
12.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN GRANITO BALDOSA ECO KRISTAL BLANCO 30X30	m2	26.72	53,174.55	1,420,823.98	26.72	$ 1,420,823.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	26.72	$ 1,420,823.98	100.00%	0.01%
12.06	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS SINTÉTICOS**																
12.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO - ROLLO ESPRIT COLOR ROJO	m2	9.18	179,079.19	1,643,946.96	9.18	$ 1,643,946.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.18	$ 1,643,946.96	100.00%	0.02%
12.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN VINILO ESPRIT COLOR ROJO	m	13.13	58,180.34	763,907.86	13.13	$ 763,907.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.13	$ 763,907.86	100.00%	0.01%
12.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO RECICLADO BALDOSA DE CAUCHO ALTA RESISTENCIA A IMPACTO COLOR NEGRO - 5CM	m2	90.77	99,363.64	9,019,237.60	90.77	$ 9,019,237.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	90.77	$ 9,019,237.60	100.00%	0.08%
12.07	**PISOS EN ALFOMBRA**																
12.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ALFOMBRA ARRANGE COLOR ROJO 61X61	m2	77.49	156,794.10	12,149,974.81	77.49	$ 12,149,974.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	77.49	$ 12,149,974.81	100.00%	0.11%
12.08	**PISO EN MADERA**																
12.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA LAMINADA COLOR JAVA FC084	m2	48.58	134,194.94	6,519,190.19	48.58	$ 6,519,190.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	48.58	$ 6,519,190.19	100.00%	0.06%
12.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN MADERA LAMINADA COLOR JAVA FC084	m	79.17	20,155.01	1,595,672.14	79.17	$ 1,595,672.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	79.17	$ 1,595,672.14	100.00%	0.01%
12.09	**PIRLANES**																
12.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN ALUMINIO	m	65.40	13,382.24	875,198.50	65.40	$ 875,198.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	65.40	$ 875,198.50	100.00%	0.01%
12.09.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PIRLAN EN GRES ANTIDESLIZANTE ESCALERA EN CONCRETO	m	99.00	7,783.45	770,561.55	99.00	$ 770,561.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	99.00	$ 770,561.55	100.00%	0.01%
12.10	**ACABADOS PARA ESCALERAS**																
12.10.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE HUELLA / CONTRA HUELLA EN CONCRETO ESMALTADO	m	99.00	32,307.75	3,198,467.25	99.00	$ 3,198,467.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	99.00	$ 3,198,467.25	100.00%	0.03%
13	**CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS**																
13.01	**CUBIERTAS METÁLICAS**																
13.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ANCHO 18cm	m	59.88	28,120.15	1,683,834.58	59.88	$ 1,683,834.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	59.88	$ 1,683,834.58	100.00%	0.02%
13.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CAL.26 ANCHO 30cm	m	71.72	52,785.88	3,785,803.31	71.72	$ 3,785,803.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	71.72	$ 3,785,803.31	100.00%	0.03%
13.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CAL.26 ANCHO 50cm	m	19.32	66,336.11	1,281,613.65	19.32	$ 1,281,613.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	19.32	$ 1,281,613.65	100.00%	0.01%
13.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CAL.26 ANCHO 52cm	m	12.65	67,691.13	856,292.79	12.65	$ 856,292.79		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.65	$ 856,292.79	100.00%	0.01%
13.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CAL.26 ANCHO 27cm	m	27.20	50,753.34	1,380,490.85	27.20	$ 1,380,490.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	27.20	$ 1,380,490.85	100.00%	0.01%
13.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA CAL. 16 ANCHO 30cm	m	37.90	63,086.79	2,390,989.34	37.90	$ 2,390,989.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	37.90	$ 2,390,989.34	100.00%	0.02%
13.02	**CUBIERTAS TERMOACÚSTICAS**																
13.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA METECNO MONOROOF E= 80 MM	m2	574.97	224,561.14	129,115,918.67	574.97	$ 129,115,918.67		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	574.97	$ 129,115,918.67	100.00%	1.18%
14	**IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES**																
14.01	**IMPERMEABILIZACIONES EN MANTO ASFALTICO**																
14.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO BICAPA CON FOIL DE ALUMINIO SISTEMA ASFALTICO PARA CUBIERTA VERDE CERESIT VAPORTITE	m2	183.43	80,276.08	14,725,041.35	183.43	$ 14,725,041.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	183.43	$ 14,725,041.35	100.00%	0.13%
14.02	**IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO**																
14.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA CUBIERTA CON TRAFICO MODERADO	m2	176.50	85,308.60	15,056,967.90	176.50	$ 15,056,967.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	176.50	$ 15,056,967.90	100.00%	0.14%
14.03	**CUBIERTAS VERDES**																
14.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE DRENAJE	m2	183.43	56,895.14	10,436,275.53	183.43	$ 10,436,275.53		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	183.43	$ 10,436,275.53	100.00%	0.10%
14.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUSTRATO LIVIANO DRENANTE	m2	361.69	38,325.24	13,861,856.06	361.69	$ 13,861,856.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	361.69	$ 13,861,856.06	100.00%	0.13%
14.04	**GEOTEXTILES Y GEOMEMBRANAS**																
14.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100	m2	183.43	10,835.02	1,987,467.72	183.43	$ 1,987,467.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	183.43	$ 1,987,467.72	100.00%	0.02%
14.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	183.43	7,725.34	1,417,059.12	183.43	$ 1,417,059.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	183.43	$ 1,417,059.12	100.00%	0.01%
14.05	**IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES**																
14.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CEMENTOSO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	m2	62.01	95,059.91	5,894,665.02	62.01	$ 5,894,665.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	62.01	$ 5,894,665.02	100.00%	0.05%
15	**METALISTERÍA**																
15.01	**PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO**																
15.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 10mm PC-01 D= 1.20 X 2.50m - CORREDIZA	und	1.00	1,552,758.72	1,552,758.72	1.00	$ 1,552,758.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,552,758.72	100.00%	0.01%
15.02	**PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED**																
15.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-01 D= 1.20 X 2.50m - SENCILLA	und	6.00	2,730,003.45	16,380,020.70	6.00	$ 16,380,020.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 16,380,020.70	100.00%	0.15%
15.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-02 D=.95 X 2.50m - SENCILLA	und	2.00	2,189,053.31	4,378,106.62	2.00	$ 4,378,106.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 4,378,106.62	100.00%	0.04%
15.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-03 D=.85 X 2.50m - SENCILLA	und	3.00	2,023,062.97	6,069,188.91	3.00	$ 6,069,188.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 6,069,188.91	100.00%	0.06%
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-04 D=.95 X 2.50m - SENCILLA REJILLA INFERIOR	und	6.00	1,800,754.48	10,804,526.88	6.00	$ 10,804,526.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 10,804,526.88	100.00%	0.10%
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-05 D=.85 X 2.50m - SENCILLA REJILLA INFERIOR	und	4.00	2,561,049.01	10,244,196.04	4.00	$ 10,244,196.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 10,244,196.04	100.00%	0.09%
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-06 D=.75 X 2.50m - SENCILLA REJILLA INFERIOR	und	5.00	2,329,848.18	11,649,240.90	5.00	$ 11,649,240.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 11,649,240.90	100.00%	0.11%
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL_7 D= 1.05 X 2.50m - SENCILLA REJILLA COMPLETA	und	7.00	3,513,708.61	24,595,960.27	7.00	$ 24,595,960.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 24,595,960.27	100.00%	0.23%
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL_8 D=.95 X 2.50m - SENCILLA REJILLA COMPLETA	und	4.00	3,513,708.61	14,054,834.44	4.00	$ 14,054,834.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 14,054,834.44	100.00%	0.13%

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01		**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**		
			CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA	
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA		**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$	14,952,434,853
			VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$	14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE	HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**		
			CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1	
			INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1	

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL_9 D= 1,50 X 2,50m - DOBLE	und	2.00	3,037,958.98	6,075,917.96	2.00	$ 6,075,917.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 6,075,917.96	100.00%	0.06%
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL_10 D= 1,50 X 2,50m - DOBLE REJILLA COMPLETA	und	3.00	3,117,852.54	9,353,557.62	3.00	$ 9,353,557.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 9,353,557.62	100.00%	0.09%
15.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL LAMINA COLD ROLLED PE-01 - D= 16.10 X 2,50m - DIMENSIONES Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	21,298,684.33	21,298,684.33	1.00	$ 21,298,684.33		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 21,298,684.33	100.00%	0.19%
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL LAMINA COLD ROLLED PE-02 - D= 4.11 X 2,50m - DIMENSIONES Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	6,042,394.02	6,042,394.02	1.00	$ 6,042,394.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 6,042,394.02	100.00%	0.06%
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL LAMINA COLD ROLLED PE-03 - D= 3.83 X 2,50m - DIMENSIONES Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	4,732,551.93	4,732,551.93	1.00	$ 4,732,551.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,732,551.93	100.00%	0.04%
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL LAMINA COLD ROLLED PE-04 - VEHICULAR EN MALLA ESLABONADA Y CIERRE ELECTRÓNICO - D=3.70 X 2,40m	und	6.00	10,023,485.38	60,140,912.28	6.00	$ 60,140,912.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 60,140,912.28	100.00%	0.55%
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL LAMINA COLD ROLLED PE-05 - VEHICULAR EN MALLA ESLABONADA Y CIERRE ELECTRÓNICO - D=3.00 X 2.30m	und	1.00	5,435,038.25	5,435,038.25	1.00	$ 5,435,038.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 5,435,038.25	100.00%	0.05%
15.03	**PUERTAS CORTAFUEGOS EN LAMINA COLD ROLLED**																
15.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA CAL 18 D= 1.20 X 2,50m - SENCILLA PARA EVACUACIÓN	und	5.00	6,451,009.98	32,255,049.90	5.00	$ 32,255,049.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 32,255,049.90	100.00%	0.30%
15.04	**PUERTAS VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO**																
15.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-01 D= 7,76 X 7,90m Area:61,47m2	m2	61.47	646,158.41	39,719,357.46	61.47	$ 39,719,357.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	61.47	$ 39,719,357.46	100.00%	0.36%
15.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-02 D= 1,81 X 3,20m Area:5,79m2	m2	5.79	1,634,258.23	9,462,355.15	5.79	$ 9,462,355.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.79	$ 9,462,355.15	100.00%	0.09%
15.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-03 D= 2,62 X 2,50m Area:6,55m2	m2	6.55	966,843.57	6,332,825.38	6.55	$ 6,332,825.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.55	$ 6,332,825.38	100.00%	0.06%
15.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-04 SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	33.49	1,190,927.53	39,884,162.98	33.49	$ 39,884,162.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	33.49	$ 39,884,162.98	100.00%	0.36%
15.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-05 D= 4,31 X 2,50m Area:10,70m2	m2	10.70	1,190,836.87	12,741,954.51	10.70	$ 12,741,954.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.70	$ 12,741,954.51	100.00%	0.12%
15.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-06 D= 6,53 X 2,50m Area:16,31m2	m2	16.31	1,436,453.74	23,428,560.50	16.31	$ 23,428,560.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.31	$ 23,428,560.50	100.00%	0.21%
15.05	**VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO**																
15.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-01 D= 10,61 X 7,90m Area:83,80m2	m2	83.80	625,022.69	52,376,901.42	83.80	$ 52,376,901.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.80	$ 52,376,901.42	100.00%	0.48%
15.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-02 D= 1,14 X 1,50m Area:1,72m2	m2	1.72	1,194,927.02	2,055,274.47	1.72	$ 2,055,274.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.72	$ 2,055,274.47	100.00%	0.02%
15.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-03A V-03B SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	10.35	863,354.85	8,935,722.70	10.35	$ 8,935,722.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.35	$ 8,935,722.70	100.00%	0.08%
15.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-04 D= 1,00 X 3,10m Area:3,10m2	m2	3.00	855,404.05	2,566,212.15	3.00	$ 2,566,212.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 2,566,212.15	100.00%	0.02%
15.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-05 D= 3,37 X 2,40m Area:16,20m2	m2	16.20	858,190.29	13,902,682.70	16.20	$ 13,902,682.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.20	$ 13,902,682.70	100.00%	0.13%
15.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-06A V-06B SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	12.30	841,026.85	10,344,630.26	12.30	$ 10,344,630.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.30	$ 10,344,630.26	100.00%	0.09%
15.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-07A V-07B SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	14.13	901,809.61	12,742,569.79	14.13	$ 12,742,569.79		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.13	$ 12,742,569.79	100.00%	0.12%
15.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-08 D= 15,17 X 1,45m Area:22,00m2	m2	22.76	918,331.92	20,901,234.50	22.76	$ 20,901,234.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.76	$ 20,901,234.50	100.00%	0.19%
15.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-09A V-09B SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	25.76	918,373.77	23,657,308.32	25.76	$ 23,657,308.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.76	$ 23,657,308.32	100.00%	0.22%
15.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-10A V-10B - V-10C SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	22.65	796,789.33	18,047,278.32	22.65	$ 18,047,278.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.65	$ 18,047,278.32	100.00%	0.17%
15.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-11 D= 3.14 X 1,50m Area:4.72m2	m2	4.64	675,902.81	3,136,189.04	4.64	$ 3,136,189.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.64	$ 3,136,189.04	100.00%	0.03%
15.05.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-12 D= 5.60 X,70m Area:3.92m2	m2	3.92	901,853.44	3,535,265.48	3.92	$ 3,535,265.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.92	$ 3,535,265.48	100.00%	0.03%
15.05.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-13 D=.55 X 1,72m Area:0.95m2	m2	0.95	921,364.78	875,296.54	0.95	$ 875,296.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.95	$ 875,296.54	100.00%	0.01%
15.06	**DIVISIONES EN ALUMINIO**																
15.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN OFICINA ALUMINIO DV-01 SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	19.70	515,560.60	10,156,543.82	19.70	$ 10,156,543.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	19.70	$ 10,156,543.82	100.00%	0.09%
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN OFICINA ALUMINIO DV-02 SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	68.18	572,813.15	39,054,400.57	68.18	$ 39,054,400.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	68.18	$ 39,054,400.57	100.00%	0.36%
15.07	**BARANDAS Y PASAMANOS METÁLICOS**																
15.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN LAMINA BA-01 CON PERFILES VERTICALES CADA 90CM - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m	41.27	371,010.86	15,311,618.19	41.27	$ 15,311,618.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	41.27	$ 15,311,618.19	100.00%	0.14%
15.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN LAMINA BA-02. ESTRUCTURA PRINCIPAL EN PERFILERÍA TUBULAR, PANEL EN ALUZINC GEOCLAD	m	37.93	181,435.82	6,881,860.65	37.93	$ 6,881,860.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	37.93	$ 6,881,860.65	100.00%	0.06%
15.08	**BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE**																
15.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PA-01 EN ESCALERA - DOBLE H= SUPERIOR 90CM / INFERIOR 70CM - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m	47.80	103,798.60	4,961,573.08	47.80	$ 4,961,573.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	47.80	$ 4,961,573.08	100.00%	0.05%
15.09	**REJILLAS EN ALUMINIO**																
15.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN ALUMINIO TIPO TC 4X4"	und	19.00	37,712.14	716,530.66	19.00	$ 716,530.66		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	19.00	$ 716,530.66	100.00%	0.01%
15.10	**ACCESORIOS NO ESTRUCTURALES**																
15.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL PTE REDONDA 1-1/2"X3mm ASTM 500 GRADO C x 7. METROS PARA DESCENSO DE BOMBEROS- INCLUYE PLATINAS, PERNOS DE ANCLAJE Y COLCHONETA DE 8CM DE ESPESOR / 1.20M DE DIÁMETRO UBICADA EN LA BASE DEL PERFIL PTE PARA EVITAR LESIONES.	und	2.00	1,840,523.79	3,681,047.58	2.00	$ 3,681,047.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,681,047.58	100.00%	0.03%
15.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE SEGURIDAD EN ÁREA DE MAQUINAS PARA LÍNEAS DE VIDA DE BOMBEROS	und	10.00	242,697.30	2,426,973.00	10.00	$ 2,426,973.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 2,426,973.00	100.00%	0.02%
15.11	**ACCESORIOS EN LAMINA**																
15.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ESCALERA DE GATO EN VARILLA CORRUGADA 1". 7 PELDAÑOS	und	8.00	465,833.98	3,726,671.84	8.00	$ 3,726,671.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 3,726,671.84	100.00%	0.03%
15.12	**FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS EXTERIORES METÁLICOS**																
15.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADAS METÁLICAS GEOCLAD (GEO-0159) COLOR ROJO AMAPOLA - INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y Funcionamiento	M2	486.78	502,415.30	244,565,719.73	486.78	$ 244,565,719.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	486.78	$ 244,565,719.73	100.00%	2.24%
15.13	**FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS EXTERIORES EN VIDRIO**																
15.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADAS EN POLICARBONATO CON PANEL MULTICELL COLOR OPAL DG SOFTLITE - INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y Funcionamiento	M2	670.63	526,788.16	353,279,943.74	670.63	$ 353,279,943.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	670.63	$ 353,279,943.74	100.00%	3.23%
16	**CARPINTERÍA EN MADERA**																
16.01	**CLOSETS Y VESTIERES EN MADERA**																
16.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EN MADERA CLM1 CUARTO OFICIAL - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	4,528,946.91	4,528,946.91	1.00	$ 4,528,946.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,528,946.91	100.00%	0.04%
16.02	**MUEBLES FIJOS**																
16.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO MUEBLE PARA GUARDIA EN L - MF-01 - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	2,075,412.27	2,075,412.27	1.00	$ 2,075,412.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,075,412.27	100.00%	0.02%

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario ofertado	Valor total ofertado	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Ejec. del Item	% Ejec. del Contrato	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Pend. Ejec. del Item	% Pend. Ejec. del Contrato
16.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO MUEBLE SALA AMIGA - MF-02 - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	1,557,292.78	1,557,292.78	1.00	$ 1,557,292.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,557,292.78	100.00%	0.01%
16.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO BANCA VESTIER - MF-03 - L=0.98m - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	2.00	2,500,723.31	5,001,446.62	2.00	$ 5,001,446.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 5,001,446.62	100.00%	0.05%
16.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO BANCA VESTIER - MF-04 - L=1.20m - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	10.00	2,880,401.91	28,804,019.10	10.00	$ 28,804,019.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 28,804,019.10	100.00%	0.26%
17	**ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS**																
17.01	**ENCHAPES SOBRE MUROS**																
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA X M2 PISO PARED YARUMO GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60	m2	147.78	82,262.21	12,156,709.39	147.78	$ 12,156,709.39		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	147.78	$ 12,156,709.39	100.00%	0.11%
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA X ML PISO PARED YARUMO GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60	m	15.40	54,320.84	836,540.94	15.40	$ 836,540.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.40	$ 836,540.94	100.00%	0.01%
17.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA X M2 PARED REC ANTÁRTICA BLANCO CARA ÚNICA 30X60	m2	326.01	98,319.24	32,053,055.43	326.01	$ 32,053,055.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	326.01	$ 32,053,055.43	100.00%	0.29%
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA X ML PARED REC ANTÁRTICA BLANCO CARA ÚNICA 30X60	m	48.25	59,830.61	2,886,826.93	48.25	$ 2,886,826.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	48.25	$ 2,886,826.93	100.00%	0.03%
18	**CIELO RASOS**																
18.01	**CIELO RASO EN YESO**																
18.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO DRY WALL	m2	410.60	59,688.60	24,508,139.16	410.60	$ 24,508,139.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	410.60	$ 24,508,139.16	100.00%	0.22%
18.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE CIELO RASO PLANO	m	96.02	42,502.64	4,081,103.49	96.02	$ 4,081,103.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	96.02	$ 4,081,103.49	100.00%	0.04%
18.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO DRY WALL RH	m2	83.61	78,162.08	6,535,131.51	83.61	$ 6,535,131.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.61	$ 6,535,131.51	100.00%	0.06%
18.01.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 0,60x0,60M	und	18.00	83,604.74	1,504,885.32	18.00	$ 1,504,885.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.00	$ 1,504,885.32	100.00%	0.01%
18.01.05	EJECUCIÓN DE APERTURA EN CIELO RASO PARA LUMINARIAS O APARATOS ELÉCTRICOS	und	415.00	18,481.77	7,669,934.55	415.00	$ 7,669,934.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	415.00	$ 7,669,934.55	100.00%	0.07%
18.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN PLÁSTICA CIELO RASO	m	381.00	9,694.99	3,693,791.19	381.00	$ 3,693,791.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	381.00	$ 3,693,791.19	100.00%	0.03%
18.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PERIMETRAL EN PVC TIPO J PARA CIELORRASOS	m	381.00	12,903.90	4,916,385.90	381.00	$ 4,916,385.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	381.00	$ 4,916,385.90	100.00%	0.04%
19	**ILUMINACIÓN**																
19.01	**LÁMPARAS DE SOBREPONER**																
19.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER Panel LED Redondo 12W NW	und	235.00	31,470.57	7,395,583.95	235.00	$ 7,395,583.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	235.00	$ 7,395,583.95	100.00%	0.07%
19.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER Panel LED 60x60 40W	und	58.00	37,620.98	2,182,016.84	58.00	$ 2,182,016.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	58.00	$ 2,182,016.84	100.00%	0.02%
19.02	**LUMINARIAS DESCOLGAR**																
19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DESCOLGAR High Bay 100W CW GC350	und	12.00	182,296.60	2,187,559.20	12.00	$ 2,187,559.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 2,187,559.20	100.00%	0.02%
19.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DESCOLGAR Hermética 36W DL und	und	50.00	161,568.12	8,078,406.00	50.00	$ 8,078,406.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.00	$ 8,078,406.00	100.00%	0.07%
19.03	**LUMINARIAS LINEALES**																
19.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL Minicontinuum	und	7.00	422,724.53	2,959,071.71	7.00	$ 2,959,071.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 2,959,071.71	100.00%	0.03%
19.04	**PROYECTORES Y REFLECTORES**																
19.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED Tortuga	und	9.00	37,288.20	335,593.80	9.00	$ 335,593.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 335,593.80	100.00%	0.00%
19.05	**APLIQUES (AP)**																
19.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE Roseta	und	10.00	13,665.96	136,659.60	10.00	$ 136,659.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 136,659.60	100.00%	0.00%
19.06	**LUMINARIAS EXTERIORES**																
19.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR LED JETA PRO 100W DL und	und	4.00	165,006.10	660,024.40	4.00	$ 660,024.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 660,024.40	100.00%	0.01%
19.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR Tabaco	und	6.00	282,820.39	1,696,922.34	6.00	$ 1,696,922.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 1,696,922.34	100.00%	0.02%
19.07	**LUMINARIA DE EMERGENCIA**																
19.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TECHO - P26848-LED EMERG APLIQUE 4W	und	28.00	110,143.61	3,084,021.08	28.00	$ 3,084,021.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	28.00	$ 3,084,021.08	100.00%	0.03%
19.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA PARED - P26848-LED EMERG APLIQUE 4W	und	15.00	93,944.11	1,409,161.65	15.00	$ 1,409,161.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 1,409,161.65	100.00%	0.01%
19.08	**ACCESORIOS Y VARIOS**																
19.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL LÁMPARAS	und	25.00	44,741.82	1,118,545.50	25.00	$ 1,118,545.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 1,118,545.50	100.00%	0.01%
19.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ANCLAJE METÁLICOS	und	45.00	44,741.82	2,013,381.90	45.00	$ 2,013,381.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 2,013,381.90	100.00%	0.02%
19.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO PARA LUMINARIAS EXTERIORES	und	5.00	2,424,081.77	12,120,408.85	5.00	$ 12,120,408.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 12,120,408.85	100.00%	0.11%
19.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD PARA LUMINARIAS	und	45.00	63,960.24	2,878,210.80	45.00	$ 2,878,210.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 2,878,210.80	100.00%	0.03%
20	**DOTACIÓN BAÑOS**																
20.01	**SANITARIOS Y TAZAS**																
20.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIÁTICA - GRIF ANTIVANDÁLICA PMR	und	8.00	1,909,447.87	15,275,582.96	8.00	$ 15,275,582.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 15,275,582.96	100.00%	0.14%
20.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BÁLTICA - GRIF ANTIVANDÁLICA	und	7.00	1,858,036.70	13,006,256.90	7.00	$ 13,006,256.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 13,006,256.90	100.00%	0.12%
20.01.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR LAVAMANOS DE INCRUSTAR AQUAJET PMR	und	3.00	488,035.86	1,464,107.58	3.00	$ 1,464,107.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,464,107.58	100.00%	0.01%
20.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO LC-01 - EN CORIAN TUMBLED GLASS CON SALPICADERO Y FRENTERO INTEGRADO	m	11.57	1,826,636.50	21,134,184.31	11.57	$ 21,134,184.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.57	$ 21,134,184.31	100.00%	0.19%
20.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO LC-02 - EN ACERO INOXIDABLE Y PEDAL DE ACCIÓN INTEGRADO	m	1.16	2,986,011.70	3,463,773.57	1.16	$ 3,463,773.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.16	$ 3,463,773.57	100.00%	0.03%
20.02	**ORINALES**																
20.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTA ENTRADA POSTERIOR	und	9.00	883,071.19	7,947,640.71	9.00	$ 7,947,640.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 7,947,640.71	100.00%	0.07%
20.03	**COMBOS SANITARIOS**																
20.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO AQUAPRO AL (SANITARIO AQUAPRO CON TAZA ALONGADA, LAVAMANOS CON SEMIPEDESTAL, GRIFERÍA MONO CONTROL AQUAPRO, KIT DE ACCESORIOS THAMES (INCLUYE PERCHA, TOALLERO, PORTARROLLOS) Y DISPENSADOR DE JABÓN SOCODA 1.2L FD-923PVS)	und	4.00	920,468.26	3,681,873.04	4.00	$ 3,681,873.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 3,681,873.04	100.00%	0.03%
20.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO SMART AL (SANITARIO SMART CON TAZA ALONGADA, MUEBLE ELEVADO CON LAVAMANOS MARSELLA, GRIFERÍA MONO CONTROL AQUAPRO, KIT DE ACCESORIOS THAMES (INCLUYE PERCHA, TOALLERO, PORTARROLLOS) Y DISPENSADOR DE JABÓN SOCODA 1.2L FD-923PVS)	und	2.00	991,108.81	1,982,217.62	2.00	$ 1,982,217.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,982,217.62	100.00%	0.02%
20.04	**GRIFERÍAS Y LLAVES**																
20.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS PUSH PICO EMPOTRADO	und	16.00	513,919.55	8,222,712.80	16.00	$ 8,222,712.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 8,222,712.80	100.00%	0.08%
20.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS PUSH DE MESA	und	5.00	233,939.88	1,169,699.40	5.00	$ 1,169,699.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,169,699.40	100.00%	0.01%
20.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE DUCHA MONO CONTROL NOGAL	und	14.00	406,514.03	5,691,196.42	14.00	$ 5,691,196.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 5,691,196.42	100.00%	0.05%
20.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE DUCHA MONO CONTROL THAMES + TELEDUCHA	und	1.00	405,569.50	405,569.50	1.00	$ 405,569.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 405,569.50	100.00%	0.00%
20.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL	und	8.00	52,039.32	416,314.56	8.00	$ 416,314.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 416,314.56	100.00%	0.00%

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						**Condiciones actualizadas**		**ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01**		**ACUMULADO**				**PENDIENTE POR EJECUTAR**					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**		
20.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA Y LAVA OJOS	und	1.00	1,982,231.94	1,982,231.94	1.00	$ 1,982,231.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,982,231.94	100.00%	0.02%		
20.05	**ACCESORIOS DE BAÑO**																		
20.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE	und	10.00	279,673.44	2,796,734.40	10.00	$ 2,796,734.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 2,796,734.40	100.00%	0.03%		
20.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA THAMES	und	37.00	64,583.52	2,388,850.24	37.00	$ 2,388,850.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	37.00	$ 2,388,850.24	100.00%	0.02%		
20.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA FIJA 24"	und	6.00	143,922.85	863,537.10	6.00	$ 863,537.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 863,537.10	100.00%	0.01%		
20.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA PLEGABLE	und	5.00	459,762.80	2,298,814.00	5.00	$ 2,298,814.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 2,298,814.00	100.00%	0.02%		
20.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN DE EMPOTRAR A MURO	und	12.00	265,833.09	3,189,997.08	12.00	$ 3,189,997.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 3,189,997.08	100.00%	0.03%		
20.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA COLOR CROMO LIQUID CROMO	und	15.00	155,216.37	2,328,245.55	15.00	$ 2,328,245.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 2,328,245.55	100.00%	0.02%		
20.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE	und	25.00	369,495.35	9,237,383.75	25.00	$ 9,237,383.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 9,237,383.75	100.00%	0.08%		
20.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO EN ACERO INOXIDABLE	und	9.00	973,924.35	8,765,319.15	9.00	$ 8,765,319.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 8,765,319.15	100.00%	0.08%		
20.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA BAÑO PMR PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE	und	1.00	1,388,601.28	1,388,601.28	1.00	$ 1,388,601.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,388,601.28	100.00%	0.01%		
20.06	**REJILLAS DE BAÑOS**																		
20.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO CUADRADA 4"X4"X2"	und	40.00	58,388.83	2,335,553.20	40.00	$ 2,335,553.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	40.00	$ 2,335,553.20	100.00%	0.02%		
20.07	**TAPAS DE REGISTRO**																		
20.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20x20 CMS Acero Inoxidable	und	9.00	61,103.86	549,934.74	9.00	$ 549,934.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 549,934.74	100.00%	0.01%		
20.08	**EXTRACTORES DE OLORES**																		
20.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLOR	und	9.00	126,351.04	1,137,159.36	9.00	$ 1,137,159.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 1,137,159.36	100.00%	0.01%		
21	**DOTACIÓN COCINAS**																		
21.01	**MUEBLES DE COCINA**																		
21.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA MUEBLE ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE - MC-02 - D=0,69 X.69cm H=90cm	und	1.00	1,207,076.29	1,207,076.29	1.00	$ 1,207,076.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,207,076.29	100.00%	0.01%		
21.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA MUEBLE ALMACENAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE - MC-03 - MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	11,866,027.12	11,866,027.12	1.00	$ 11,866,027.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 11,866,027.12	100.00%	0.11%		
21.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA MUEBLE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE - MC 04 - ANCHO 22CM	und	1.00	1,918,463.44	1,918,463.44	1.00	$ 1,918,463.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,918,463.44	100.00%	0.02%		
21.02	**GRIFERÍA COCINA**																		
21.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAPLATOS GRIFERÍA MONO CONTROL KORAL	und	3.00	384,553.84	1,153,661.52	3.00	$ 1,153,661.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,153,661.52	100.00%	0.01%		
21.03	**LAVAPLATOS**																		
21.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE LAVAPLATOS 1 POCETA EN ACERO INOXIDABLE	und	1.00	204,774.85	204,774.85	1.00	$ 204,774.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 204,774.85	100.00%	0.00%		
21.03.02	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE MUEBLE LAVAPLATOS MC-01 - 2 POCETAS D=1.75 X.69cm H=90cm	und	1.00	2,091,445.31	2,091,445.31	1.00	$ 2,091,445.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,091,445.31	100.00%	0.02%		
21.04	**ESTUFAS**																		
21.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA COCINA INDUSTRIAL 6 PUESTOS Y PLANCHA	und	1.00	7,202,263.13	7,202,263.13	1.00	$ 7,202,263.13		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 7,202,263.13	100.00%	0.07%		
21.05	**CAMPANAS EXTRACTORAS**																		
21.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA EX3 – CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA – ZINGAL	und	1.00	24,963,262.91	24,963,262.91	1.00	$ 24,963,262.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 24,963,262.91	100.00%	0.23%		
21.06	**CAJILLAS DE GAS**																		
21.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLAS PARA GAS - DIM=15x15 CMS	und	4.00	707,857.37	2,831,429.48	4.00	$ 2,831,429.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 2,831,429.48	100.00%	0.03%		
21.07	**CAJAS DE EQUIPOS**																		
21.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA LAVADORA - DIM=15x15 CMS	und	4.00	53,420.06	213,680.24	4.00	$ 213,680.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 213,680.24	100.00%	0.00%		
21.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA LLAVE DE NEVERA - DIM=15x15 CMS	und	2.00	47,442.01	94,884.02	2.00	$ 94,884.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 94,884.02	100.00%	0.00%		
21.08	**REJILLAS DE COCINA**																		
21.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE PISO REJILLA DE PISO CUADRADA INVISIBLE 10X10	und	1.00	58,401.76	58,401.76	1.00	$ 58,401.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 58,401.76	100.00%	0.00%		
22	**VIDRIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES**																		
22.01	**ESPEJOS CANTO PULIDO**																		
22.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO ESPEJO FLOTADO INDIVIDUAL 90 X 70 CMS	und	4.00	101,161.91	404,647.64	4.00	$ 404,647.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 404,647.64	100.00%	0.00%		
22.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO INCLINADO 10° INDIVIDUAL 90 X 60 CMS PARA BAÑOS PMR - BISELADO	und	3.00	85,172.02	255,516.06	3.00	$ 255,516.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 255,516.06	100.00%	0.00%		
22.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO ESPEJO FLOTADO Y BISELADO CORRIDO	m2	15.65	104,901.89	1,641,714.58	15.65	$ 1,641,714.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.65	$ 1,641,714.58	100.00%	0.02%		
22.02	**DIVISIONES EN ACERO**																		
22.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE DIVISIÓN PARA DUCHA	m2	43.85	1,194,501.99	52,378,912.26	43.85	$ 52,378,912.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	43.85	$ 52,378,912.26	100.00%	0.48%		
22.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINAS SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE	m2	48.20	1,158,529.11	55,841,103.10	48.20	$ 55,841,103.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	48.20	$ 55,841,103.10	100.00%	0.51%		
22.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE ORINAL	m2	12.45	1,031,107.44	12,837,287.63	12.45	$ 12,837,287.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.45	$ 12,837,287.63	100.00%	0.12%		
22.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE BASURAS	m2	12.34	774,883.52	9,562,062.64	12.34	$ 9,562,062.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.34	$ 9,562,062.64	100.00%	0.09%		
23	**CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS**																		
23.01	**CERRADURAS DE SOBREPONER**																		
23.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE SOBREPONER CERRADURA DE SOBREPONER SENCILLA VIDRIO MEDIA Luna	und	4.00	229,689.30	918,757.20	4.00	$ 918,757.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 918,757.20	100.00%	0.01%		
23.02	**CERRADURAS DE EMBUTIR**																		
23.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE EMBUTIR CERRADURA DE EMBUTIR SERIE E MINI - CILINDRO INTERIOR EN ACERO 5 PINES	und	25.00	81,134.93	2,028,373.25	25.00	$ 2,028,373.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 2,028,373.25	100.00%	0.02%		
23.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE EMBUTIR CERRADURA DE EMBUTIR PICO LORO PARA PUERTA CORREDIZA	und	1.00	81,134.93	81,134.93	1.00	$ 81,134.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 81,134.93	100.00%	0.00%		
23.03	**CERRADURAS INSTITUCIONALES**																		
23.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS INSTITUCIONAL TIPO DANE SERIE W REF. W561 GRADO 2	und	18.00	229,689.30	4,134,407.40	18.00	$ 4,134,407.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.00	$ 4,134,407.40	100.00%	0.04%		
23.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS INSTITUCIONAL PARA BAÑO - ACERO 701	und	9.00	81,134.93	730,214.37	9.00	$ 730,214.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 730,214.37	100.00%	0.01%		
23.04	**CERRADURAS ELÉCTRICAS**																		
23.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTAS EN SALIDA DE MAQUINAS	und	7.00	694,581.80	4,862,072.60	7.00	$ 4,862,072.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 4,862,072.60	100.00%	0.04%		

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

		Condiciones contractuales					**Condiciones actualizadas**		**ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01**		**ACUMULADO**				**PENDIENTE POR EJECUTAR**			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**		**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
23.05	**CIERRAPUERTAS**																	
23.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS Y1001 PUERTAS EN VIDRIO	und	14.00	326,234.70	4,567,285.80		14.00	$ 4,567,285.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 4,567,285.80	100.00%	0.04%
23.06	**BARRAS ANTIPÁNICO**																	
23.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS ANTIPÁNICO DE EMPUJE TIPO ORLANDO DE 2 Puntos - OPERACIÓN MECÁNICA	und	5.00	314,884.73	1,574,423.65		5.00	$ 1,574,423.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,574,423.65	100.00%	0.01%
23.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS ANTIPÁNICO	und	10.00	210,360.29	2,103,602.90		10.00	$ 2,103,602.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 2,103,602.90	100.00%	0.02%
23.07	**TOPES DE PUERTAS**																	
23.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE PUERTA MEDIA Luna ANTICADO	und	60.00	37,196.31	2,231,778.60		60.00	$ 2,231,778.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 2,231,778.60	100.00%	0.02%
23.08	**MANIJAS DE PUERTAS**																	
23.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA MANIJA DE PUERTA ROMA TIRADOR DOBLE EN ACERO INOXIDABLE	und	5.00	210,360.29	1,051,801.45		5.00	$ 1,051,801.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,051,801.45	100.00%	0.01%
23.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA MANIJA INSTITUCIONAL TIPO "ORION"	und	5.00	319,509.40	1,597,547.00		5.00	$ 1,597,547.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,597,547.00	100.00%	0.01%
23.08.03	MANIJA DE PUERTA MANIJA INSTITUCIONAL TIPO VERSAILLES	und	10.00	123,678.67	1,236,786.70		10.00	$ 1,236,786.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 1,236,786.70	100.00%	0.01%
24	**PINTURA**																	
24.01	**ESTUCOS Y PINTURAS INTERIORES**																	
24.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO CIELO RASO (3 MANOS) X M2	m2	463.30	29,131.54	13,496,642.48		463.30	$ 13,496,642.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	463.30	$ 13,496,642.48	100.00%	0.12%
24.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO CIELO RASO (3 MANOS) X ML	m	96.02	20,365.99	1,955,542.36		96.02	$ 1,955,542.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	96.02	$ 1,955,542.36	100.00%	0.02%
24.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X M2 PINTURA ANTIHONGOS	m2	83.61	24,776.29	2,071,545.61		83.61	$ 2,071,545.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.61	$ 2,071,545.61	100.00%	0.02%
24.02	**PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES**																	
24.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PLÁSTICA PARA ZONA HÚMEDAS (2 MANOS) X M2	m2	65.74	39,847.87	2,619,598.97		65.74	$ 2,619,598.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	65.74	$ 2,619,598.97	100.00%	0.02%
24.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PLÁSTICA PARA ZONA HÚMEDAS (2 MANOS) X ML	m	4.16	27,482.52	114,327.28		4.16	$ 114,327.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.16	$ 114,327.28	100.00%	0.00%
24.03	**EXTERIOR**																	
24.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA DE PROTECCIÓN SOBRE MUROS X M2	m2	33.65	26,437.79	889,631.63		33.65	$ 889,631.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	33.65	$ 889,631.63	100.00%	0.01%
24.04	**PINTURA PARA PISOS**																	
24.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA PISO EN CANCHA INTERNA RESISTENTE AL TRAFICO PEATONAL Y DEPORTIVO COLOR ARENAL O SIMILAR	m2	95.06	46,306.13	4,401,860.72		95.06	$ 4,401,860.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	95.06	$ 4,401,860.72	100.00%	0.04%
24.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA PISO EN CANCHA INTERNA RESISTENTE AL TRAFICO PEATONAL Y DEPORTIVO COLOR CANELA O SIMILAR	m2	67.69	46,306.13	3,134,461.94		67.69	$ 3,134,461.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	67.69	$ 3,134,461.94	100.00%	0.03%
24.05	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																	
24.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN CANCHAS DEMARCACIÓN CANCHA INTERNA	m	83.68	23,080.71	1,931,393.81		83.68	$ 1,931,393.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.68	$ 1,931,393.81	100.00%	0.02%
24.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELIMITACIÓN DE PARQUEADERO	m	220.30	24,774.49	5,457,820.15		220.30	$ 5,457,820.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	220.30	$ 5,457,820.15	100.00%	0.05%
24.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUMERACIÓN PARQUEADEROS	und	23.00	72,295.10	1,662,787.30		23.00	$ 1,662,787.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	23.00	$ 1,662,787.30	100.00%	0.02%
24.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJAS PARQUEADERO	m	64.50	23,498.99	1,515,684.86		64.50	$ 1,515,684.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	64.50	$ 1,515,684.86	100.00%	0.01%
25	**EQUIPOS**																	
25.01	**EQUIPOS HIDROSANITARIOS**																	
25.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESIÓN TIPO 1 EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN AGUA POTABLE IHM HY-FLO MODELO 15H-6W O SIMILAR; Q=4.06 L/s; CDT=58.50 m; POT=6.0 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) con variadores de velocidad. Incluye 1 tanque hidro acumulador (V=100 L), tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	und	1.00	36,998,888.99	36,998,888.99		1.00	$ 36,998,888.99		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 36,998,888.99	100.00%	0.34%
25.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESIÓN TIPO 2 EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS IHM HY-FLO MODELO 20A-6W O SIMILAR; Q=5.12 L/s; CDT=43.1 m; POT=6.0 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) con variadores de velocidad. Incluye 1 tanque hidro acumulador (V=300 L), tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	und	1.00	19,243,495.62	19,243,495.62		1.00	$ 19,243,495.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 19,243,495.62	100.00%	0.18%
25.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESIÓN TIPO 3 EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN LLENADO DE VEHÍCULOS IHM CARACOL MODELO 2X4-2MW O SIMILAR; Q=6.31 L/s; CDT=10.10 m; POT=2.0 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) con variadores de velocidad. Incluye 1 tanque hidro acumulador (V=300 L), tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	und	1.00	37,819,651.42	37,819,651.42		1.00	$ 37,819,651.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 37,819,651.42	100.00%	0.35%
25.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESIÓN TIPO 4 EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE BARNES MODELO HE 1.5 20-1 O SIMILAR; Q=0.71 L/s; CDT=32.40m; 2.0 HP (1 TITULAR). Incluye tablero de control y accesorios especificados por el fabricante).	und	1.00	8,206,086.82	8,206,086.82		1.00	$ 8,206,086.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 8,206,086.82	100.00%	0.08%
25.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO RED CONTRA INCENDIO TIPO 1 EQUIPO RED CONTRA INCENDIOS BOMBA PRINCIPAL Q=334,90GPM; CDT=94,60 PSI; POT=45 HP + BOMBA JOCKEY Q=3,30GPM; CDT=104,60 PSI; POT=3,00 HP. Incluye tableros de control y accesorios especificados por el fabricante.	und	1.00	100,519,553.50	100,519,553.50		1.00	$ 100,519,553.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 100,519,553.50	100.00%	0.92%
25.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO EYECTOR TIPO 1 BARNES MODELO NE 2 4-1-4-110 O SIMILAR; Q=1.30 L/s; CDT=5.10m; POT=0.50 HP. Incluye accesorios especificados por el fabricante.	und	1.00	5,730,044.05	5,730,044.05		1.00	$ 5,730,044.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 5,730,044.05	100.00%	0.05%
25.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LLUVIA TIPO 1 Compacta, con filtración y cloración. Incluye bomba.	gb	1.00	67,435,340.21	67,435,340.21		1.00	$ 67,435,340.21		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 67,435,340.21	100.00%	0.62%
25.02	**EQUIPOS ELÉCTRICOS**																	
25.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PLANTA ELECTRICA Planta electrica de 163kVA 140kW 3Ø 208/120V Segun D.U	und	1.00	82,127,951.40	82,127,951.40		1.00	$ 82,127,951.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 82,127,951.40	100.00%	0.75%
25.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS DE CELDA Transformador 150kVA 3Ø Seco 11,400V - 208/120V Segun D.U	und	1.00	41,178,608.12	41,178,608.12		1.00	$ 41,178,608.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 41,178,608.12	100.00%	0.38%
25.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CELDA COMPACTA MODULAR Entrada Segun D.U	und	1.00	16,952,701.24	16,952,701.24		1.00	$ 16,952,701.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 16,952,701.24	100.00%	0.16%
25.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CELDA COMPACTA MODULAR Salida Segun D.U	und	1.00	17,700,990.85	17,700,990.85		1.00	$ 17,700,990.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 17,700,990.85	100.00%	0.16%
25.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CELDA COMPACTA MODULAR Proteccion con Fusible HH2S Segun D.U	und	1.00	18,690,408.83	18,690,408.83		1.00	$ 18,690,408.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 18,690,408.83	100.00%	0.17%
25.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE PROTECCION UPS UPs de 5 kVA Segun D.U	und	1.00	14,924,886.83	14,924,886.83		1.00	$ 14,924,886.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 14,924,886.83	100.00%	0.14%
25.03	**EQUIPOS DE Comunicación Y DATOS**																	
25.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE DATOS	und	1.00	4,261,020.73	4,261,020.73		1.00	$ 4,261,020.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,261,020.73	100.00%	0.04%
25.04	**EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL**																	
25.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR CAMILLERO CABINA 210X135	und	1.00	88,902,147.09	88,902,147.09		1.00	$ 88,902,147.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 88,902,147.09	100.00%	0.81%
26	**SEÑALIZACIÓN Y DOTACIÓN**																	
26.01	**SEÑALES INFORMATIVAS - INDICADOR DE PISO O NUMERACIÓN**																	

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario ofertado	Valor total ofertado	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Ejec. del Item	% Ejec. del Contrato	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Pend. Ejec. del Item	% Pend. Ejec. del Contrato
26.01.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - INDICADOR DE PISO	und	6.00	314,008.50	1,884,051.00	6.00	$ 1,884,051.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 1,884,051.00	100.00%	0.02%
26.02	**SEÑALES INFORMATIVAS - HORARIO**																
26.02.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - HORARIO ACCESO PRINCIPAL	und	1.00	321,400.44	321,400.44	1.00	$ 321,400.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 321,400.44	100.00%	0.00%
26.03	**SEÑAL DE ORIENTACIÓN - DIRECTORIOS DE PISO**																
26.03.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - DIRECTORIO DE PISO	und	3.00	371,217.47	1,113,652.41	3.00	$ 1,113,652.41		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,113,652.41	100.00%	0.01%
26.04	**SEÑALES ORIENTATIVAS - TÓTEM**																
26.04.01	SEÑALES ORIENTATIVAS - TÓTEM	und	3.00	3,499,726.80	10,499,180.40	3.00	$ 10,499,180.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 10,499,180.40	100.00%	0.10%
26.05	**SEÑALES ORIENTATIVAS - DESCOLGADAS**																
26.05.01	SEÑALES ORIENTATIVAS - DESCOLGADAS	und	11.00	709,973.26	7,809,705.86	11.00	$ 7,809,705.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 7,809,705.86	100.00%	0.07%
26.05.02	SEÑALES ORIENTATIVAS - DESCOLGADAS	und	4.00	1,208,143.53	4,832,574.12	4.00	$ 4,832,574.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 4,832,574.12	100.00%	0.04%
26.06	**SEÑALES ORIENTATIVAS - PINTADAS EN MURO**																
26.06.01	SEÑALES ORIENTATIVAS - PINTADAS EN MURO	m2	7.50	82,278.71	617,090.33	7.50	$ 617,090.33		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.50	$ 617,090.33	100.00%	0.01%
26.07	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR**																
26.07.01	SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR	und	44.00	132,095.74	5,812,212.56	44.00	$ 5,812,212.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	44.00	$ 5,812,212.56	100.00%	0.05%
26.07.02	SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR	und	30.00	92,242.12	2,767,263.60	30.00	$ 2,767,263.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 2,767,263.60	100.00%	0.03%
26.08	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (PRECAUCIÓN)**																
26.08.01	SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (PRECAUCIÓN)	und	3.00	191,876.17	575,628.51	3.00	$ 575,628.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 575,628.51	100.00%	0.01%
26.09	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (RIESGO)**																
26.09.01	SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (RIESGO)	und	5.00	191,876.17	959,380.85	5.00	$ 959,380.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 959,380.85	100.00%	0.01%
26.10	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (PROHIBICIÓN)**																
26.10.01	SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (PROHIBICIÓN)	und	7.00	191,876.17	1,343,133.19	7.00	$ 1,343,133.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 1,343,133.19	100.00%	0.01%
26.11	**SEÑALES INDICATIVAS - NÚMERO DE PARQUEADERO**																
26.11.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO AUTOMÓVILES	und	7.00	52,388.49	366,719.43	7.00	$ 366,719.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 366,719.43	100.00%	0.00%
26.11.02	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO BICICLETAS	und	16.00	361,254.06	5,780,064.96	16.00	$ 5,780,064.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 5,780,064.96	100.00%	0.05%
26.11.03	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO ACCESIBLE	und	1.00	411,071.09	411,071.09	1.00	$ 411,071.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 411,071.09	100.00%	0.00%
26.11.04	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO MOTOS	und	7.00	52,388.49	366,719.43	7.00	$ 366,719.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 366,719.43	100.00%	0.00%
26.11.05	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO CAMIONETAS	und	3.00	52,388.49	157,165.47	3.00	$ 157,165.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 157,165.47	100.00%	0.00%
26.11.06	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO MAQUINAS	und	5.00	181,912.77	909,563.85	5.00	$ 909,563.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 909,563.85	100.00%	0.01%
26.12	**SEÑALES REGLAMENTARIAS - EVACUACIÓN -CONDICIÓN SEGURA**																
26.12.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - (EVACUACIÓN DERECHA)	und	35.00	87,260.41	3,054,114.35	35.00	$ 3,054,114.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 3,054,114.35	100.00%	0.03%
26.12.02	SUMINISTRO DE SEÑAL - (EVACUACIÓN IZQUIERDA)	und	40.00	87,260.41	3,490,416.40	40.00	$ 3,490,416.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	40.00	$ 3,490,416.40	100.00%	0.03%
26.12.03	SUMINISTRO DE SEÑAL - (EVACUACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA)	und	10.00	87,260.41	872,604.10	10.00	$ 872,604.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 872,604.10	100.00%	0.01%
26.12.04	SUMINISTRO DE SEÑAL - (ESCALERA BAJANDO)	und	5.00	87,260.41	436,302.05	5.00	$ 436,302.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 436,302.05	100.00%	0.00%
26.12.05	SUMINISTRO DE SEÑAL - (BOTIQUÍN)	und	3.00	87,260.41	261,781.23	3.00	$ 261,781.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 261,781.23	100.00%	0.00%
26.12.06	SUMINISTRO DE SEÑAL - (Punto DE ENCUENTRO)	und	1.00	1,407,411.64	1,407,411.64	1.00	$ 1,407,411.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,407,411.64	100.00%	0.01%
26.12.07	SUMINISTRO DE SEÑAL - (EVACUACIÓN SALIDA LED)	und	11.00	261,620.01	2,877,820.11	11.00	$ 2,877,820.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 2,877,820.11	100.00%	0.03%
26.13	**SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA**																
26.13.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - EQUIPOS CONTRA EMERGENCIA	und	3.00	87,260.41	261,781.23	3.00	$ 261,781.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 261,781.23	100.00%	0.00%
26.14	**SEÑALES INDICATIVAS - AVISOS - AVISOS FACHADA**																
26.14.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - AVISO TIPO 1	und	3.00	610,339.20	1,831,017.60	3.00	$ 1,831,017.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,831,017.60	100.00%	0.02%
26.14.02	SUMINISTRO DE SEÑAL - AVISO TIPO 2	und	3.00	1,008,875.42	3,026,626.26	3.00	$ 3,026,626.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 3,026,626.26	100.00%	0.03%
26.14.03	SUMINISTRO DE SEÑAL - AVISO TIPO 3 - FACHADA	und	2.00	5,990,578.17	11,981,156.34	2.00	$ 11,981,156.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 11,981,156.34	100.00%	0.11%
27	**OBRAS EXTERIORES**																
27.01	**ELEMENTOS EN CONCRETO**																
27.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO ACABADO ESCOBADO	m2	329.63	113,393.25	37,377,817.00	329.63	$ 37,377,817.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	329.63	$ 37,377,817.00	100.00%	0.34%
27.01.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO RAMPA EN CONCRETO ACCESO VEHICULAR 10CM	m2	45.24	157,752.29	7,136,713.60	45.24	$ 7,136,713.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.24	$ 7,136,713.60	100.00%	0.07%
27.01.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO RAMPA EN CONCRETO ACCESO VEHICULAR MAQUINAS TIPO B10	m2	25.90	158,175.37	4,096,742.08	25.90	$ 4,096,742.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.90	$ 4,096,742.08	100.00%	0.04%
27.01.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO RAMPA EN CONCRETO PEATONAL TIPO B5	m2	6.59	132,582.53	873,718.87	6.59	$ 873,718.87		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.59	$ 873,718.87	100.00%	0.01%
27.01.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PLACA EN CONCRETO E=10cm 3.000 PSI	m2	498.39	151,556.75	75,534,368.63	498.39	$ 75,534,368.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	498.39	$ 75,534,368.63	100.00%	0.69%
27.01.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MUROS EN CONCRETO 15cm ANCHO PARA BANCAS	m	6.00	185,099.46	1,110,596.76	6.00	$ 1,110,596.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 1,110,596.76	100.00%	0.01%
27.01.07	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MUROS EN CONCRETO 12cm ANCHO	m	57.53	180,091.96	10,360,690.46	57.53	$ 10,360,690.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	57.53	$ 10,360,690.46	100.00%	0.09%
27.02	**PISOS EN CONCRETO Y/O CEMENTO**																
27.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PISO EN ADOQUÍN DE CONCRETO GRAMOQUIN N EN CONCRETO 20X20cm	m2	278.49	87,278.00	24,306,050.22	278.49	$ 24,306,050.22		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	278.49	$ 24,306,050.22	100.00%	0.22%
27.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PISO EN ADOQUÍN DE CONCRETO RECTANGULAR 20X10X6 COLOR GRIS	m2	371.48	71,608.04	26,600,954.70	371.48	$ 26,600,954.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	371.48	$ 26,600,954.70	100.00%	0.24%
27.02.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DECK EN CONCRETO COLOR OCRE / BLANCO Y GRIS	m2	95.40	202,009.69	19,271,724.43	95.40	$ 19,271,724.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	95.40	$ 19,271,724.43	100.00%	0.18%
27.02.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL GUÍA 20X20cm EN CONCRETO	m2	18.89	97,846.03	1,848,311.51	18.89	$ 1,848,311.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.89	$ 1,848,311.51	100.00%	0.02%
27.02.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA 20X20cm EN CONCRETO	m2	11.20	97,796.21	1,095,317.55	11.20	$ 1,095,317.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.20	$ 1,095,317.55	100.00%	0.01%
27.02.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA 20X10cm EN CONCRETO	m2	8.79	129,056.39	1,134,405.67	8.79	$ 1,134,405.67		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.79	$ 1,134,405.67	100.00%	0.01%
27.03	**ESCALERAS EN CONCRETO**																
27.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO ACABADO ESCOBEADO	m3	6.74	1,040,420.44	7,012,433.77	6.74	$ 7,012,433.77		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.74	$ 7,012,433.77	100.00%	0.06%
27.04	**CINTAS Y BORDILLOS**																
27.04.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CINTA DE CONFINAMIENTO 10cm x 30cm EN CONCRETO	m	155.14	24,382.01	3,782,625.03	155.14	$ 3,782,625.03		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	155.14	$ 3,782,625.03	100.00%	0.03%
27.05	**SARDINELES PREFABRICADOS**																
27.05.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-80 80X20x35cm	m	274.90	86,540.38	23,789,950.46	274.90	$ 23,789,950.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	274.90	$ 23,789,950.46	100.00%	0.22%
27.06	**EMPRADIZACIÓN**																
27.06.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRADIZACIÓN GRAMA NATURAL KIKUYO	m2	335.97	10,900.06	3,662,093.16	335.97	$ 3,662,093.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	335.97	$ 3,662,093.16	100.00%	0.03%

CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA** **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	01		**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**		
			CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA	
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA		**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$	14,952,434,853
			VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$	14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE	HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**		
			CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1	
			INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1	

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario ofertado	Valor total ofertado	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Ejec. del Item	% Ejec. del Contrato	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Pend. Ejec. del Item	% Pend. Ejec. del Contrato
27.07	**CÁRCAMOS Y CAÑUELAS**																
27.07.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO	m	72.11	54,381.89	3,921,478.09	72.11	$ 3,921,478.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	72.11	$ 3,921,478.09	100.00%	0.04%
27.08	**REJILLAS**																
27.08.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REJILLA METÁLICA EN PLATINA - D=100 X 25 X 5cm - TRAFICO VEHICULAR PESADO PARA ÁREAS EXTERIORES	m	72.11	392,118.59	28,275,671.52	72.11	$ 28,275,671.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	72.11	$ 28,275,671.52	100.00%	0.26%
27.09	**AMOBLAMIENTO URBANO**																
27.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PREFABRICADAS EN CONCRETO ASIENTO ADOSADO SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	m	38.50	217,311.58	8,366,495.83	38.50	$ 8,366,495.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	38.50	$ 8,366,495.83	100.00%	0.08%
27.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PREFABRICADAS EN CONCRETO TIPO M-10-A SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	und	24.00	897,381.31	21,537,151.44	24.00	$ 21,537,151.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	24.00	$ 21,537,151.44	100.00%	0.20%
27.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	und	7.00	2,407,965.99	16,855,761.93	7.00	$ 16,855,761.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 16,855,761.93	100.00%	0.15%
27.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINERA EN CONCRETO 10 CMS ANCHO SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	m2	93.99	114,195.92	10,733,274.52	93.99	$ 10,733,274.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	93.99	$ 10,733,274.52	100.00%	0.10%
27.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINERA EN CONCRETO 12 CMS ANCHO SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	m2	140.02	126,397.57	17,698,187.75	140.02	$ 17,698,187.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	140.02	$ 17,698,187.75	100.00%	0.16%
27.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE LLANTAS PREFABRICADO EN POLIURETANO PARA VEHÍCULO LIVIANO 50X15X10	und	16.00	64,270.40	1,028,326.40	16.00	$ 1,028,326.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 1,028,326.40	100.00%	0.01%
27.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN MADERA CON LISTONES DE 4.5x10CM, COLOR CAOBA O EQUIVALENTE	und	6.00	957,914.58	5,747,487.48	6.00	$ 5,747,487.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 5,747,487.48	100.00%	0.05%
27.10	**ELEMENTOS METÁLICOS**																
27.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE	und	6.00	496,776.26	2,980,657.56	6.00	$ 2,980,657.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 2,980,657.56	100.00%	0.03%
27.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MÚLTIPLE DEPORTIVA (PARA MICROFUTBOL Y BALONCESTO)	und	2.00	12,104,460.70	24,208,921.40	2.00	$ 24,208,921.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 24,208,921.40	100.00%	0.22%
27.11	**JARDINES**																
27.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL HIEDRA HOJA ANCHA	m2	222.41	66,744.26	14,844,590.87	222.41	$ 14,844,590.87		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	222.41	$ 14,844,590.87	100.00%	0.14%
27.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL BALAZO	m2	102.59	67,989.69	6,975,062.30	102.59	$ 6,975,062.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	102.59	$ 6,975,062.30	100.00%	0.06%
27.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL PANAMEÑA	m2	14.30	53,044.58	758,537.49	14.30	$ 758,537.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.30	$ 758,537.49	100.00%	0.01%
27.11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL DÓLAR	m2	2.39	65,000.67	155,351.60	2.39	$ 155,351.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.39	$ 155,351.60	100.00%	0.00%
27.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL CINTAS	m2	5.53	67,391.88	372,677.10	5.53	$ 372,677.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.53	$ 372,677.10	100.00%	0.00%
27.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL COLA DE ZORRO	m2	15.33	45,611.88	699,230.12	15.33	$ 699,230.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.33	$ 699,230.12	100.00%	0.01%
27.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL PASTO AZUL	m2	5.78	90,506.98	523,130.34	5.78	$ 523,130.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.78	$ 523,130.34	100.00%	0.00%
27.11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL LANTANA	m2	11.81	101,616.18	1,200,087.09	11.81	$ 1,200,087.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.81	$ 1,200,087.09	100.00%	0.01%
27.11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL HELECHO PEINE	m2	1.39	160,773.90	223,475.72	1.39	$ 223,475.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.39	$ 223,475.72	100.00%	0.00%
27.11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA GRIS	m2	23.67	11,643.81	275,608.98	23.67	$ 275,608.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	23.67	$ 275,608.98	100.00%	0.00%
27.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA LAJA TRITURADO DE MÁRMOL BLANCO 1 1/2"	m2	15.86	15,617.96	247,700.85	15.86	$ 247,700.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.86	$ 247,700.85	100.00%	0.00%
27.11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA LAJA	m2	5.92	129,001.52	763,689.00	5.92	$ 763,689.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.92	$ 763,689.00	100.00%	0.01%
27.12	**ARBORIZACIÓN**																
27.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL GUAYACÁN DE MANIZALES	und	5.00	379,581.84	1,897,909.20	5.00	$ 1,897,909.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,897,909.20	100.00%	0.02%
27.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL YARUMO PLATEADO	und	3.00	384,563.54	1,153,690.62	3.00	$ 1,153,690.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,153,690.62	100.00%	0.01%
27.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL EUCALIPTO POMARROSA	und	4.00	404,490.35	1,617,961.40	4.00	$ 1,617,961.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 1,617,961.40	100.00%	0.01%
27.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL SAN GREGADO	und	5.00	329,764.81	1,648,824.05	5.00	$ 1,648,824.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,648,824.05	100.00%	0.02%
27.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL CAUCHO TEQUENDAMA	und	3.00	284,929.49	854,788.47	3.00	$ 854,788.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 854,788.47	100.00%	0.01%
27.12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL HELECHO ARBÓREO	und	12.00	339,728.22	4,076,738.64	12.00	$ 4,076,738.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 4,076,738.64	100.00%	0.04%
27.13	**CERRAMIENTOS**																
27.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MURO DE SOPORTE - ALTURA 2.50m SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m	187.17	452,432.74	84,681,835.95	187.17	$ 84,681,835.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	187.17	$ 84,681,835.95	100.00%	0.77%
27.14	**RELLENOS PARA CONFORMACIÓN DE TERRENO**																
27.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO SUBBASE GRANULAR SBG.40m	m3	405.49	92,972.14	37,699,273.05	405.49	$ 37,699,273.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	405.49	$ 37,699,273.05	100.00%	0.34%
27.14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES.25m	m3	156.80	95,780.32	15,018,354.18	156.80	$ 15,018,354.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	156.80	$ 15,018,354.18	100.00%	0.14%
27.15	**VÍAS Y SENDEROS**																
27.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO PLACA EN CONCRETO MR=42 kg/cm2	m2	689.19	209,376.91	144,300,472.60	689.19	$ 144,300,472.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	689.19	$ 144,300,472.60	100.00%	1.32%
27.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBRASANTE MEJORADA PIEDRA TAMAÑO RAJÓN 25cm	m3	172.30	116,429.12	20,060,737.38	172.30	$ 20,060,737.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	172.30	$ 20,060,737.38	100.00%	0.18%
27.15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBRASANTE MEJORADA SUBBASE GRANULAR SBG.05 M	m3	34.46	92,972.14	3,203,819.94	34.46	$ 3,203,819.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.46	$ 3,203,819.94	100.00%	0.03%
27.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SBG.30 M	m3	89.32	92,972.14	8,304,271.54	89.32	$ 8,304,271.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	89.32	$ 8,304,271.54	100.00%	0.08%
27.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR BG.20 M	m3	59.55	119,932.61	7,141,986.93	59.55	$ 7,141,986.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	59.55	$ 7,141,986.93	100.00%	0.07%
27.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO TIPO 2400	m2	1,002.45	11,381.73	11,409,615.24	1,002.45	$ 11,409,615.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,002.45	$ 11,409,615.24	100.00%	0.10%
27.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SBG,25 M	m3	172.30	92,972.14	16,019,099.72	172.30	$ 16,019,099.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	172.30	$ 16,019,099.72	100.00%	0.15%
27.16	**GEOTEXTIL**																
29.34.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO TIPO 1 TIPO 2100	m2	1,006.36	11,787.97	11,862,941.49	1,006.36	$ 11,862,941.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,006.36	$ 11,862,941.49	100.00%	0.11%
28	**ASEO Y LIMPIEZA**																
28.01	**ASEO INTERIOR**																
28.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ASEO FINO DE OBRA	m2	2,136.27	15,972.77	34,122,149.37	2,136.27	$ 34,122,149.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2,136.27	$ 34,122,149.37	100.00%	0.31%
28.02	**ASEO EXTERIOR**																
28.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA FACHADA MAS HIDROFUGO	m2	2,528.32	15,236.81	38,523,531.46	2,528.32	$ 38,523,531.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2,528.32	$ 38,523,531.46	100.00%	0.35%
28.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA DE VIDRIOS	m2	342.52	15,442.68	5,289,426.75	342.52	$ 5,289,426.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	342.52	$ 5,289,426.75	100.00%	0.05%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**FECHA:**	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	01	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

		Condiciones contractuales				**Condiciones actualizadas**		**ACTA DE CORTE DE OBRA No. 01**		**ACUMULADO**				**PENDIENTE POR EJECUTAR**			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
29	**CERTIFICACIONES**																
29.01	**RETIE**	gb	1.00	24,309,123.56	24,309,123.56	1.00	$ 24,309,123.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 24,309,123.56	100.00%	0.22%
29.02	**RETILAP**	gb	1.00	2,600,115.06	2,600,115.06	1.00	$ 2,600,115.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,600,115.06	100.00%	0.02%
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 10,901,839,473.70**		**$ 10,901,839,473.60**		**$ 596,934,216.46**		**$ 596,934,216.46**		**5.45%**		**$ 10,304,905,257.14**		**93.98%**
	TOTAL COSTO DIRECTO + CERTIFICACIONES				**$ 10,928,748,712.32**		**$ 10,928,748,712.22**		**$ 596,934,216.46**		**$ 596,934,216.46**		**5.45%**		**$ 10,331,814,495.76**		**94.22%**
	ADMINISTRACIÓN			30.10%	$ 3,281,453,681.58		$ 3,281,453,681.55		$ 179,677,199.15		$ 179,677,199.15				$ 3,101,776,482.40		
	UTILIDAD			3.00%	$ 327,055,184.21		$ 327,055,184.21		$ 17,908,026.49		$ 17,908,026.49				$ 309,147,157.71		
	IMPREVISTOS			2.00%	$ 218,036,789.47		$ 218,036,789.47		$ 11,938,684.33		$ 11,938,684.33				$ 206,098,105.14		
	IVA SOBRE UTILIDAD			19.00%	$ 62,140,485.00		$ 62,140,485.00		$ 3,402,525.03		$ 3,402,525.03				$ 58,737,959.96		
	TOTAL AIU				$ 3,888,686,140.26		$ 3,888,686,140.23		$ 212,926,435.00		$ 212,926,435.00				$ 3,675,759,705.21		
	COSTO DIRECTO + AIU+ VALOR CERTIFICACIONES				$ 14,817,434,852.58		$ 14,817,434,852.45		$ 809,860,651.46		$ 809,860,651.46				$ 14,007,574,200.97		
	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES UND X 3.000.000				135,000,000.00		135,000,000.00				-				135,000,000.00		
	VALOR TOTAL				**$ 14,952,434,852.58**		**$ 14,952,434,852.45**		**$ 809,860,651.46**		**$ 809,860,651.46**		**$ 0.00**		**$ 14,142,574,200.97**		**$ 0.00**

Contratista de Obra: Ing. Carlos Andres Salazar Tobon Representante Legal Consorcio Obras CAOBOS MG 1.019.007.501	Contratista de Interventoria: Ing. Jose Vicente Bocanegra García Representante Legañl DAIMCO SAS 73.138.660

DAIMCO	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **1.01.01**	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	**UNIDAD:** m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**








UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	M3		
BLOQUE ADMINISTRATIVO	27.68	13.30	1.07		1.00	393.91
TAPA DE TANQUE	6.60	6.60	0.35		1.00	15.25
BASE DE TANQUE	6.60	6.60	0.35		1.00	15.25
MUROS DE TANQUE	6.00	2.80	0.30		4.00	20.16
CASETA FLORES	3.10	5.10	1.07		1.00	16.95
ESTACIONAMIENTO DOBLE ALTURA	9.5	8.0	1.43		1.00	108.65
DESCUENTO POR EXPANSION				28.51	-1.00	-28.51

OBSERVACIONES :


TOTAL	541.65
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**541.65**


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Pazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.01.01**	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**

ESQUEMA

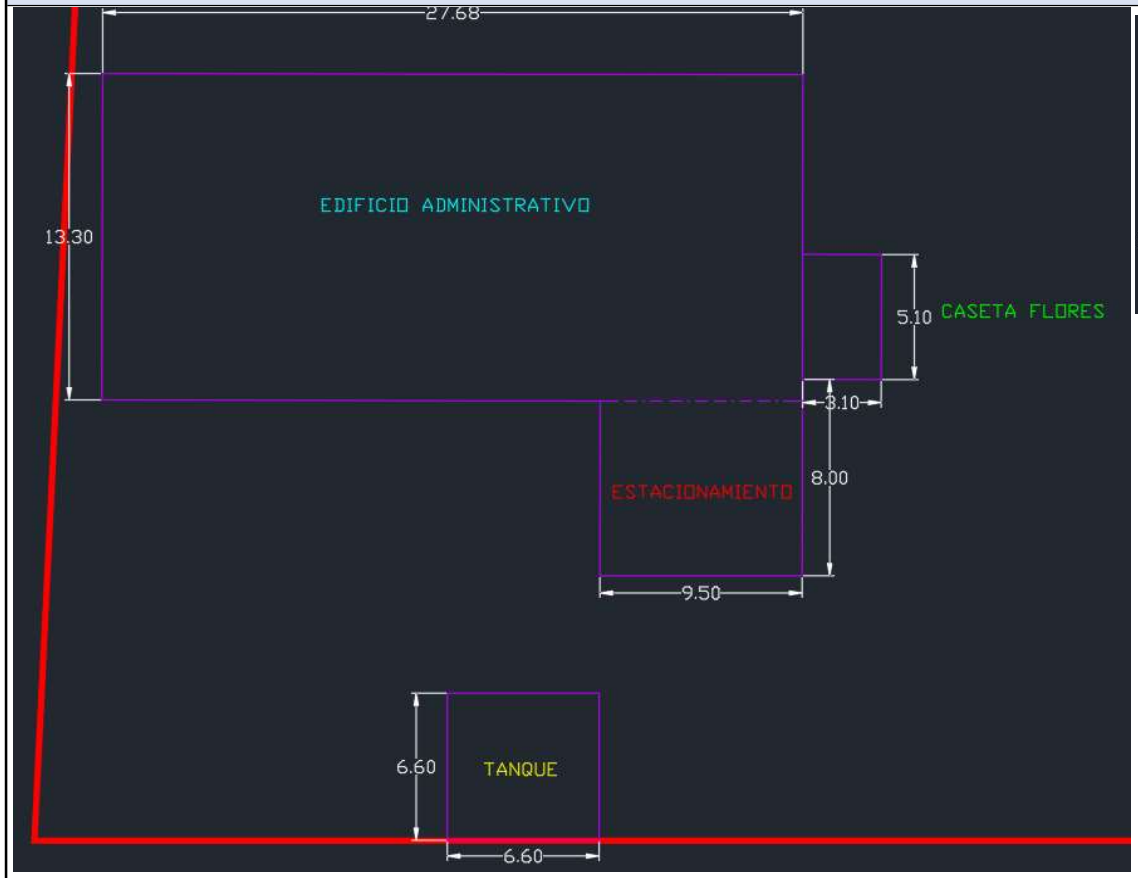

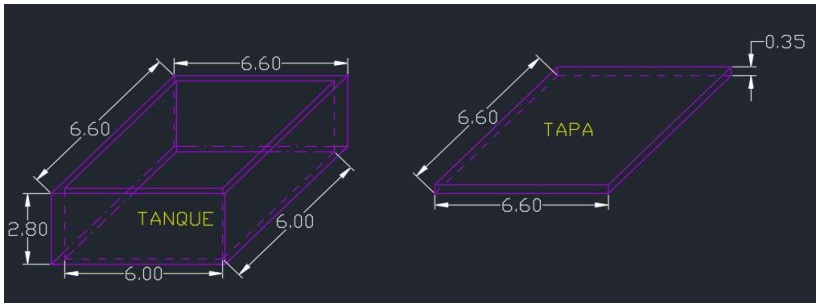

DAIMCO / CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG / U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
	MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **1.01.02**	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA DE ENTREPISO < e= 20 CMS	**UNIDAD:** m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**







UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	Area		
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	27.70	13.30		368.41	1.00	368.41
ACCESO	8.00	17.92		143.36	1.00	143.36
CASETA FLORES	3.10	5.10		15.81	1.00	15.81
ZONA BBQ	2.43	12.00		29.16	1.00	29.16
PLACA DE ENTRENAMIENTO	9.35	12.60		117.81	1.00	


OBSERVACIONES :

TOTAL	556.74
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**556.74**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.01.02**	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA DE ENTREPISO < e= 20 CMS	**UNIDAD:**	m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		


ESQUEMA

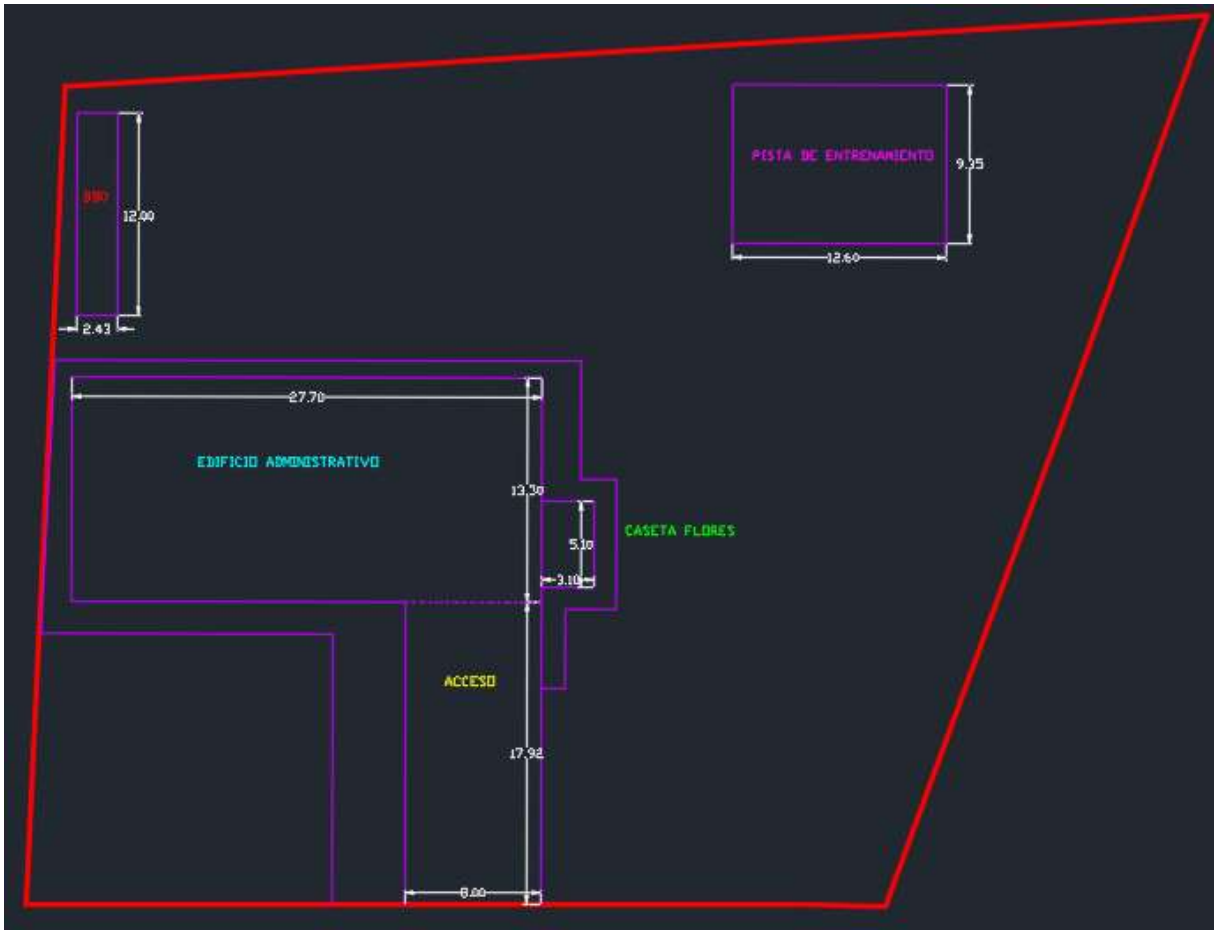

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.				**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS				**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG				**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.01.03**	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMIENTOS	**UNIDAD:** m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**



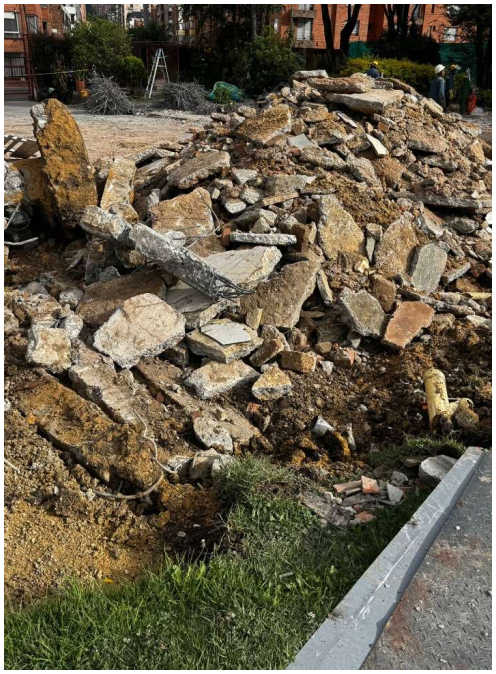

UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	M3		
VIGAS DE CIMIENTO	0.40	4.53	0.60		1.00	1.09
	0.40	4.21	0.60		1.00	1.01
	0.40	1.00	0.60		1.00	0.24
	0.40	1.70	0.60		1.00	0.41
	0.40	0.50	0.60		1.00	0.12
	0.40	4.87	0.60		1.00	1.17
	0.40	4.81	0.60		1.00	1.15
	0.40	2.01	0.60		1.00	0.48
	0.40	4.21	0.60		1.00	1.01
	0.40	3.00	0.60		1.00	0.72
	0.40	1.91	0.60		1.00	0.46
	0.40	2.49	0.60		1.00	0.60
	0.40	2.00	0.60		1.00	0.48
	0.40	9.22	0.60		1.00	2.21
	0.40	2.71	0.60		1.00	0.65
	0.40	3.00	0.60		1.00	0.72
	0.40	4.87	0.60		1.00	1.17
	0.40	3.40	0.60		1.00	0.82
	0.40	3.40	0.60		1.00	0.82
	0.40	3.00	0.60		1.00	0.72
	0.40	4.87	0.60		1.00	1.17
	0.40	3.40	0.60		1.00	0.82
	0.40	3.40	0.60		1.00	0.82
	0.40	3.10	0.60		1.00	0.74
	0.40	19.70	0.60		1.00	4.73
	0.40	3.40	0.60		1.00	0.82
	0.40	3.40	0.60		1.00	0.82
	0.40	3.40	0.60		1.00	0.82
	0.40	3.41	0.60		1.00	0.82
	0.40	3.41	0.60		1.00	0.82
	0.40	3.41	0.60		1.00	0.82
	0.40	8.01	0.60		1.00	1.92

DAIMCO	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	FECHA:	
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG / U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN	CÓDIGO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.01.03**	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMIENTOS	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**



VIGAS DE CIMIENTO	0.40	6.25	0.60		1.00	1.50
	0.40	5.83	0.60		1.00	1.40
	0.40	4.35	0.60		1.00	1.04
	0.40	1.50	0.60		1.00	0.36
	0.40	12.50	0.60		1.00	3.00
	0.40	4.34	0.60		1.00	1.04
	0.40	3.27	0.60		1.00	0.78
	0.40	1.10	0.60		1.00	0.26
	0.40	2.60	0.60		1.00	0.62
	0.40	4.27	0.60		1.00	1.02
	0.40	7.94	0.60		1.00	1.91
	0.40	1.10	0.60		1.00	0.26
	0.40	2.61	0.60		1.00	0.63
	0.40	4.93	0.60		1.00	1.18
	0.40	3.10	0.60		1.00	0.74
	0.40	2.78	0.60		1.00	0.67
	0.40	0.50	0.60		1.00	0.12
	0.40	6.72	0.60		1.00	1.61
	0.40	5.65	0.60		1.00	1.36
	0.40	4.35	0.60		1.00	1.04
	0.40	3.10	0.60		1.00	0.74
	0.40	2.79	0.60		1.00	0.67
	0.40	0.47	0.60		1.00	0.11
	0.40	6.71	0.60		1.00	1.61
	0.40	5.65	0.60		1.00	1.36
	0.40	4.35	0.60		1.00	1.04
	0.40	4.92	0.60		1.00	1.18
	0.40	3.10	0.60		1.00	0.74
	0.40	7.32	0.60		1.00	1.76
	0.40	4.30	0.60		1.00	1.03
	0.40	18.80	0.60		1.00	4.51
	0.40	5.00	0.60		1.00	1.20
	0.40	0.40	0.60		3.00	0.29
ZAPATAS	2.00	2.00	0.40		23.00	36.80
	2.00	3.40	0.40		2.00	5.44
	2.00	3.00	0.40		2.00	4.80

OBSERVACIONES :


TOTAL	115.00
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**115.00**


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yaza Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.01.03**	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMIENTOS	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	

ESQUEMA

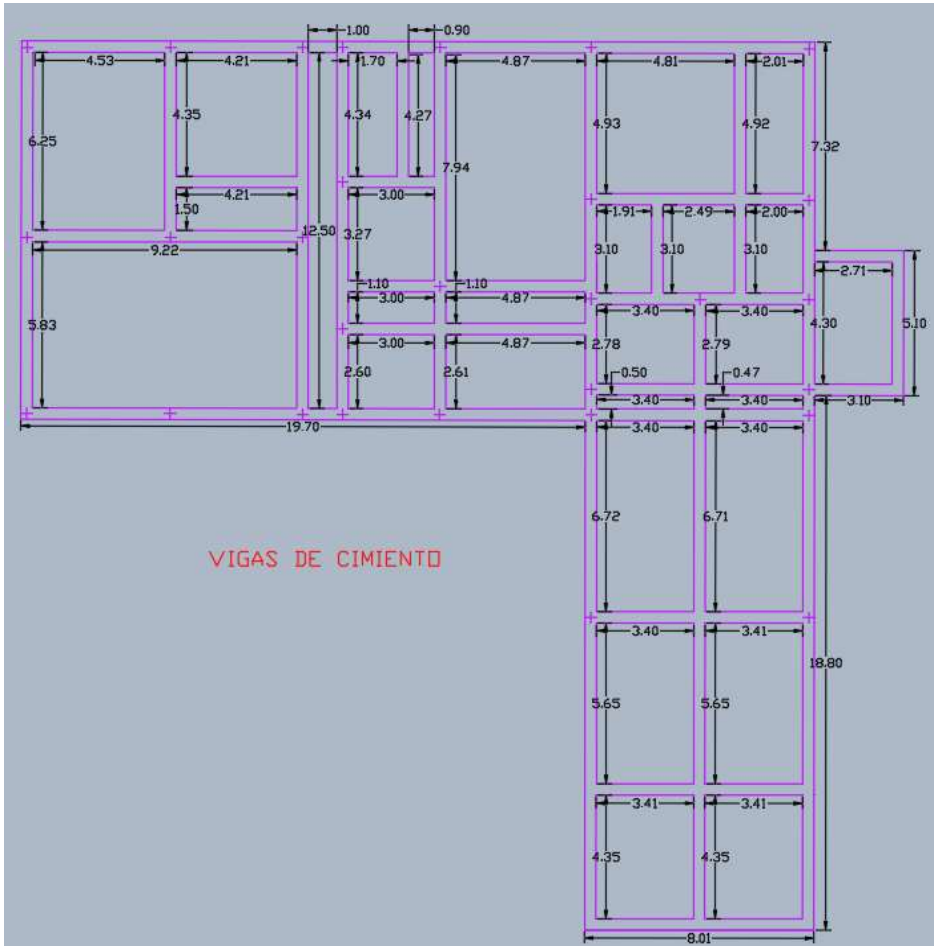

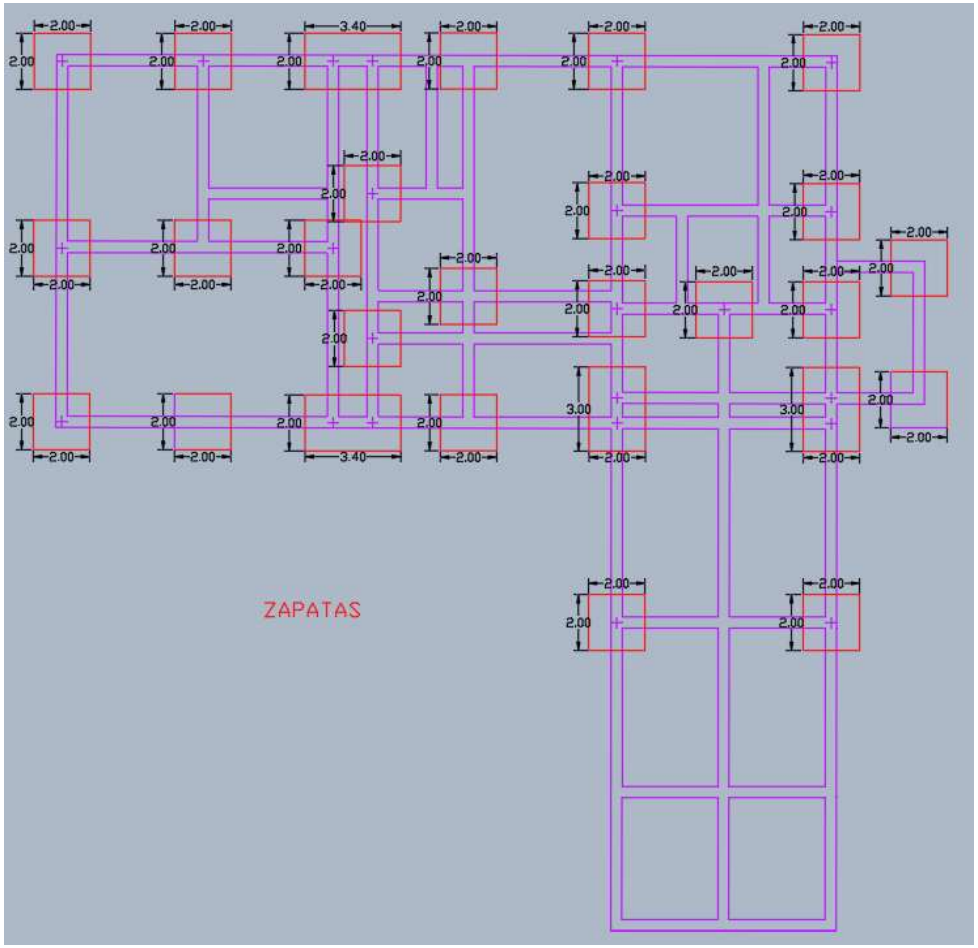

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **1.01.05**	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE	**UNIDAD:** m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**







UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	Area		
ANDEN S	1.40	16.20		22.68	1.00	22.68
ANDEN E1	1.90	19.70		37.43	1.00	37.43
ANDEN E2	4.30	6.10		26.23	1.00	26.23
ANDEN N1	1.40	4.69		6.57	1.00	6.57
ANDEN E3	4.40	1.30		5.72	1.00	5.72
ANDEN N2	1.30	5.10		6.63	1.00	6.63
ANDEN O1	4.40	1.30		5.72	1.00	5.72
ANDEN N3	2.30	7.00		16.10	1.00	16.10
ANDEN O2	27.70	1.00		27.70	1.00	27.70

OBSERVACIONES :


TOTAL	154.78
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**154.78**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.01.05**	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE	**UNIDAD:**	m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	


ESQUEMA

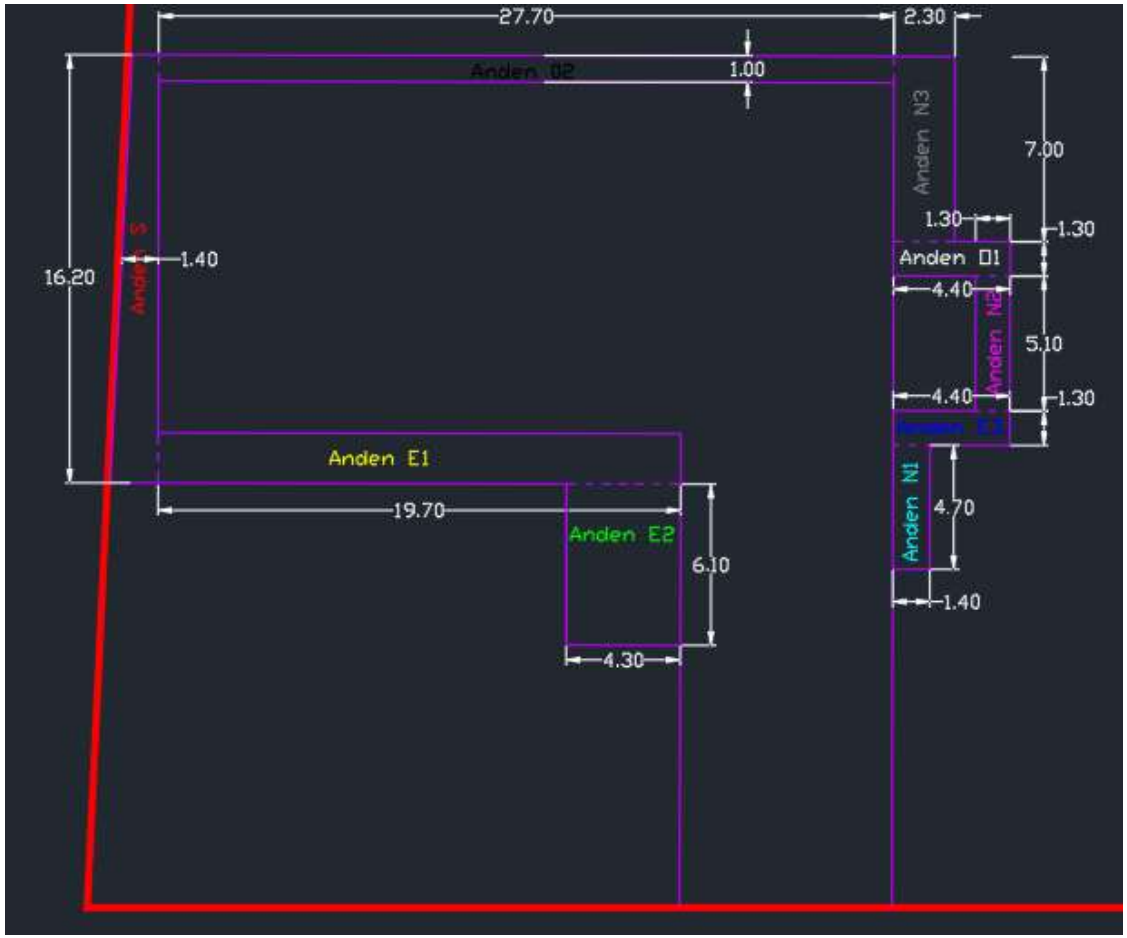

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **1.02.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROVISIONAL DE AGUA	**UNIDAD:** m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**



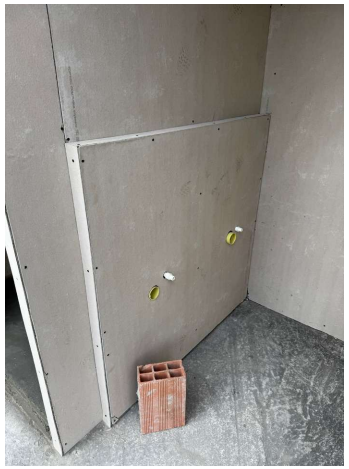



UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	Area		
COSTADO ORIENTAL		15.44			1.00	15.44
CURVA		2.86			2.00	5.72
COSTADO NORTE		24.94			1.00	24.94
ENTRE CERRAMIENTO Y CAMPAMENTO		10.31			1.00	10.31
LATERAL CAMPAMENTO		2.39			1.00	2.39


OBSERVACIONES :

TOTAL	58.80
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**58.80**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.							**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO							**VERSIÓN**	**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.02.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROVISIONAL DE AGUA	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

ESQUEMA

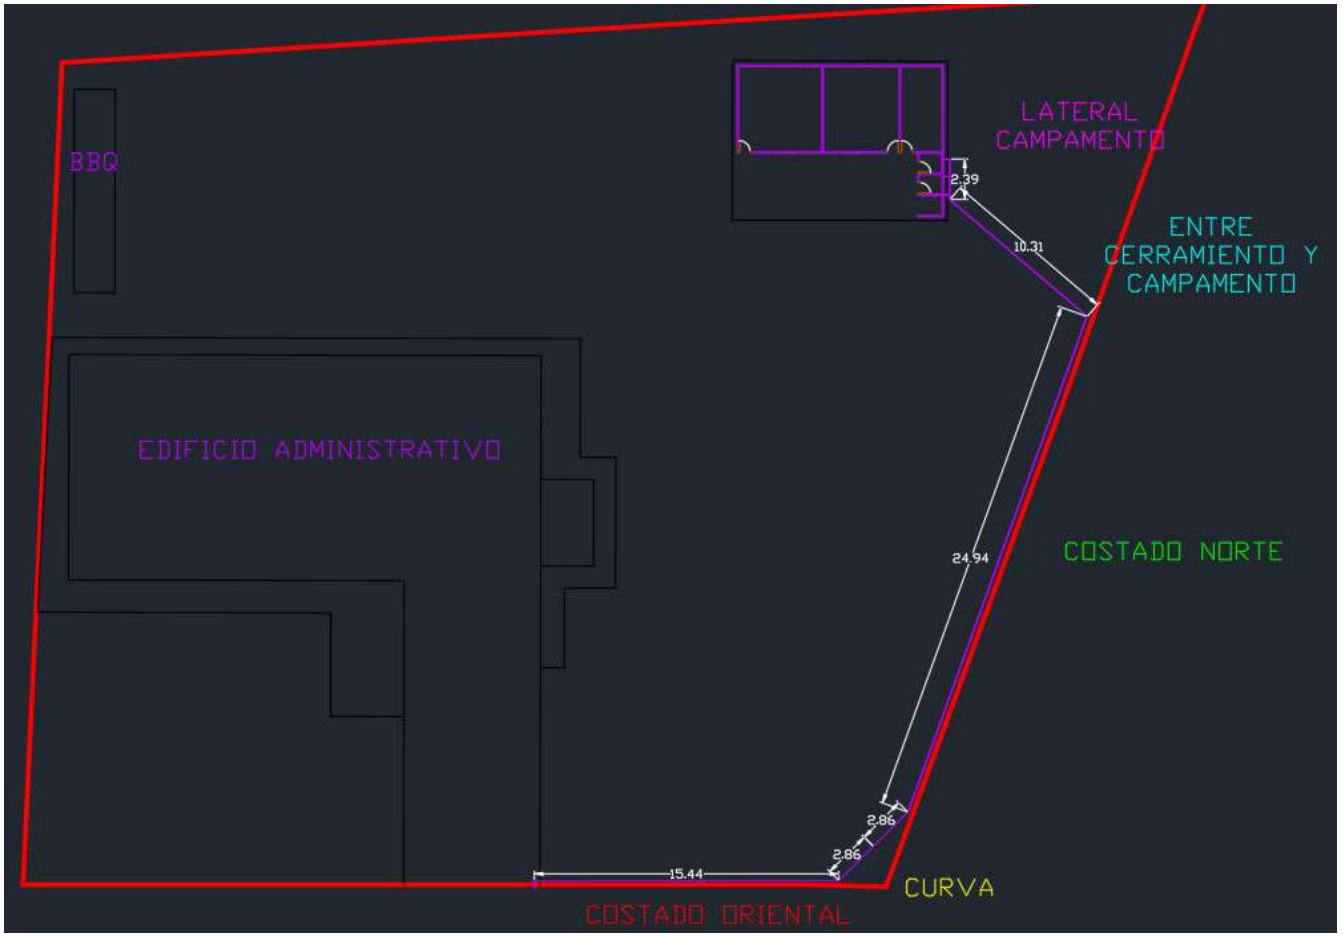

DAIMCO		UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	FECHA:
	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN / CÓDIGO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.				**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS				**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG				**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.02.02**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROVISIONAL DE ENERGÍA	**UNIDAD:** m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**







UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	Area		
H INICIAL		1.00			1.00	1.00
COSTADO ORIENTAL		18.30			1.00	18.30
COSTADO NORTE		27.80			1.00	27.80
DESDE COTADO NORTE A CAMPAMENTO		12.70			1.00	12.70
H POSTE LATERAL		4.00			1.00	4.00
SOBRE CAMPAMENTO		12.10			1.00	12.10
OF CONTRATISTA DE OBRA		4.24			1.00	4.24
		4.70			1.00	4.70
		4.82			1.00	4.82
		3.86			1.00	3.86
OF CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		3.29			1.00	3.29
		4.82			1.00	4.82
		4.23			1.00	4.23
		3.11			1.00	3.11
BODEGA		2.22			1.00	2.22
		0.87			1.00	0.87


OBSERVACIONES :


TOTAL	112.06
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**112.06**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Trazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.							**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO							**VERSIÓN**	**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.02.02**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROVISIONAL DE ENERGÍA	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

ESQUEMA

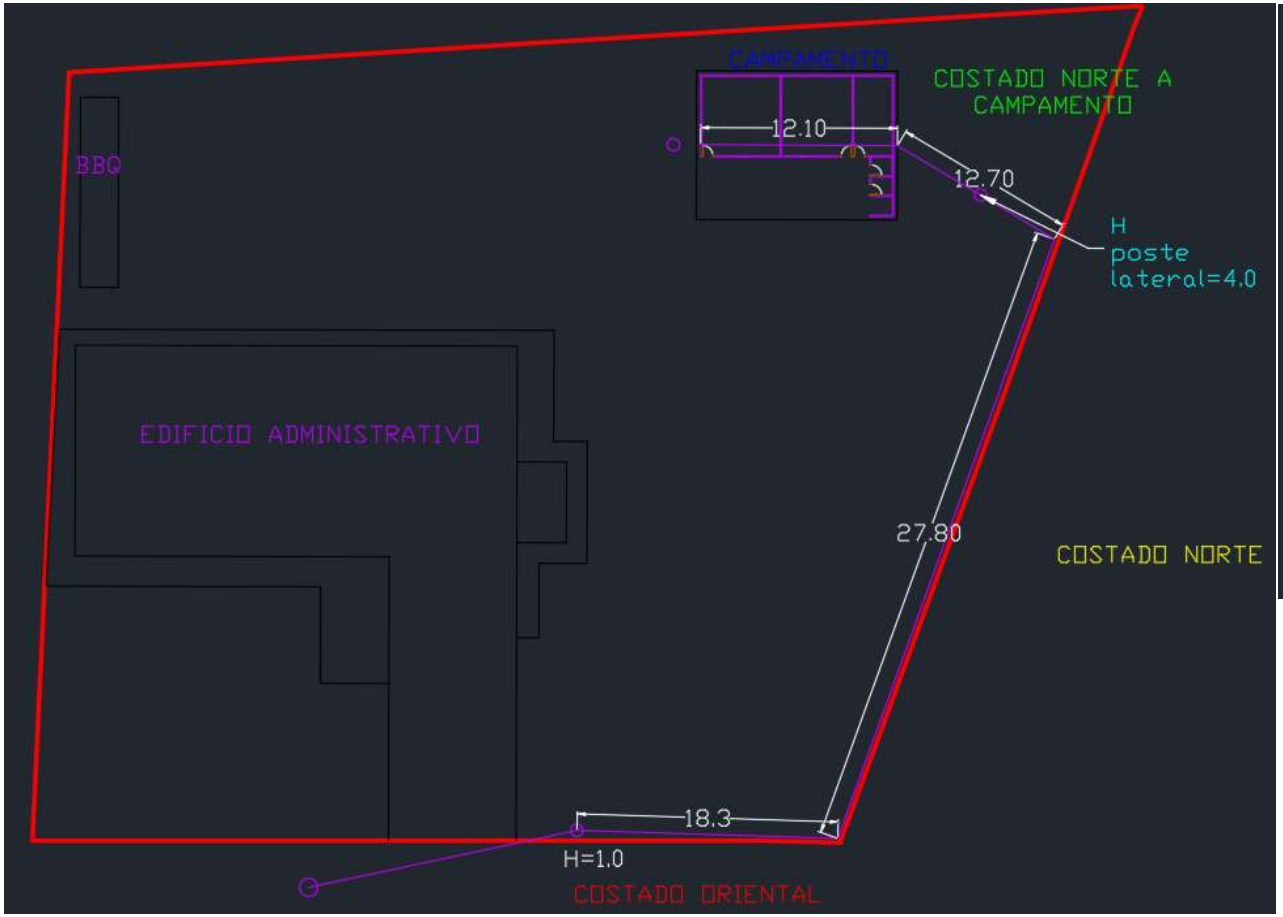

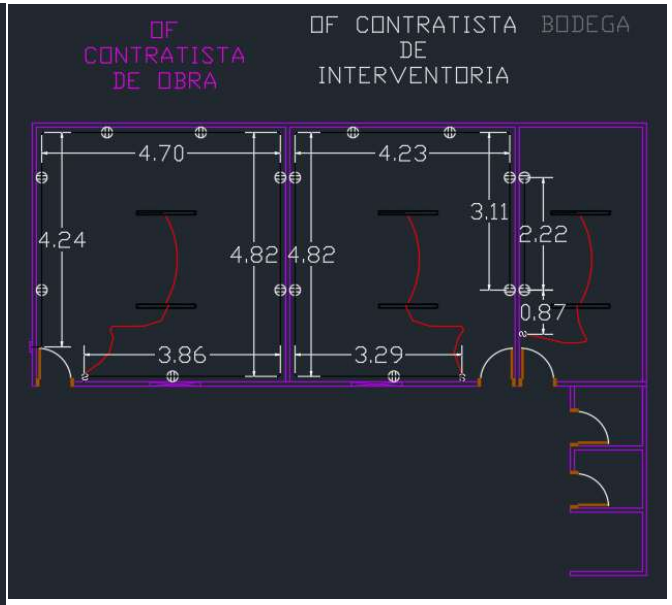

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 1	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **1.03.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMACIÓN LICENCIA	**UNIDAD:** und	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	





UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	Area		
ACCESO PRINCIPAL					1.00	1.00

OBSERVACIONES :

TOTAL	1.00
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**1.00**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **1.03.02**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	**UNIDAD:** m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	





UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	Area		
AREA TOTAL DEL PREDIO				2964.49	1.00	2964.49


OBSERVACIONES :
Corresponde a levnatamiento topografico inicial del proyecto, control de niveles, replanteo del proyecto, areas de implantacion.

TOTAL	2,964.49
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**2,964.49**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.03.02**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	**UNIDAD:**	m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

ESQUEMA

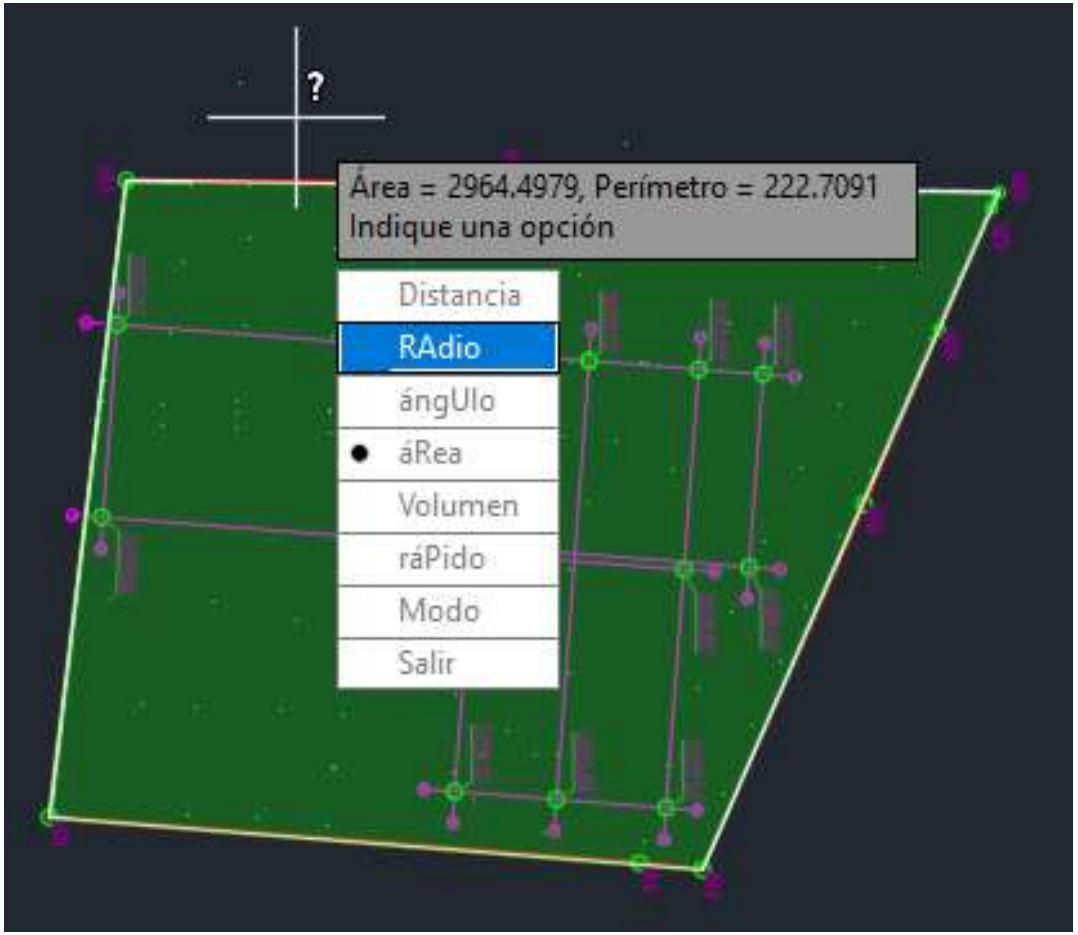

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **1.03.03**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA Y DESCAPOTE	**UNIDAD:** m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**





UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	Area		
AREA TOTAL DEL PREDIO				2964.49	1.00	2964.49
DESCUENTOS PLACAS						
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	27.70	13.30		368.41	-1.00	-368.41
ACCESO	8.00	17.92		143.36	-1.00	-143.36
CASETA FLORES	3.10	5.10		15.81	-1.00	-15.81
ZONA BBQ	2.43	12.00		29.16	-1.00	-29.16
PLACA DE ENTRENAMIENTO	9.35	12.60		117.81	-1.00	-117.81
ANDEN S	1.40	16.20		22.68	-1.00	-22.68
ANDEN E1	1.90	19.70		37.43	-1.00	-37.43
ANDEN E2	4.30	6.10		26.23	-1.00	-26.23
ANDEN N1	1.40	4.69		6.57	-1.00	-6.57
ANDEN E3	4.40	1.30		5.72	-1.00	-5.72
ANDEN N2	1.30	5.10		6.63	-1.00	-6.63
ANDEN O1	4.40	1.30		5.72	-1.00	-5.72
ANDEN N3	2.30	7.00		16.10	-1.00	-16.10
ANDEN O2	27.70	1.00		27.70	-1.00	-27.70


OBSERVACIONES :


TOTAL	2,135.16
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**2,135.16**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**3**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.03.03**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA Y DESCAPOTE	**UNIDAD:**	m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		


ESQUEMA

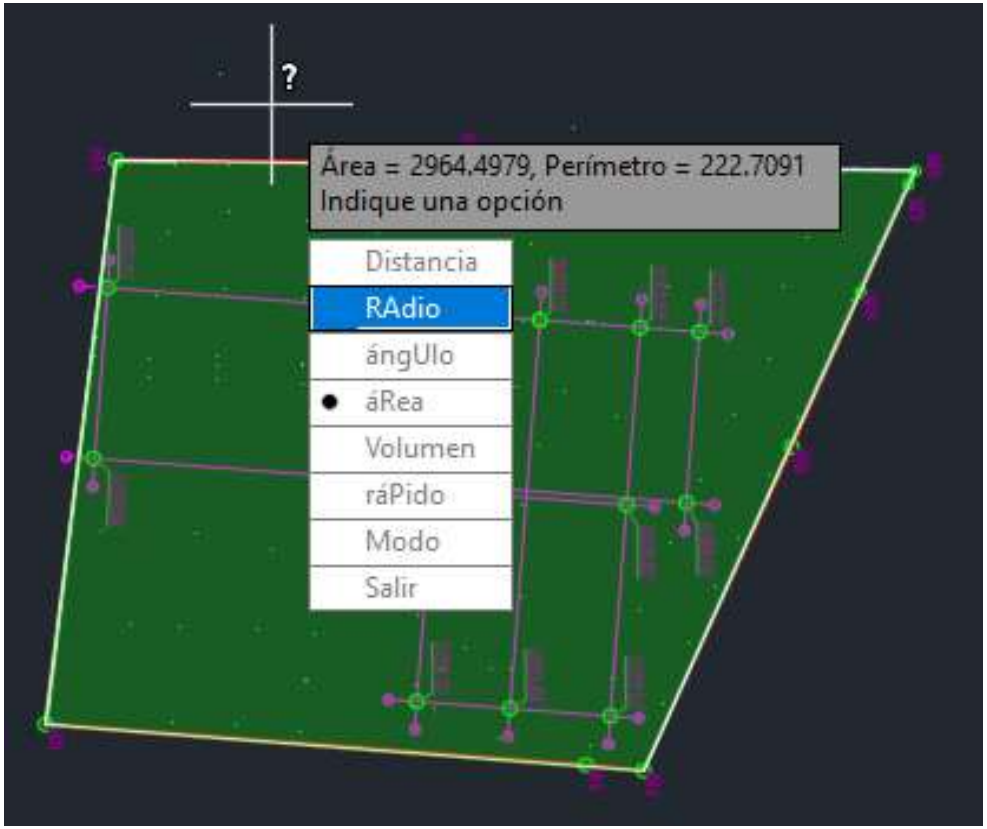

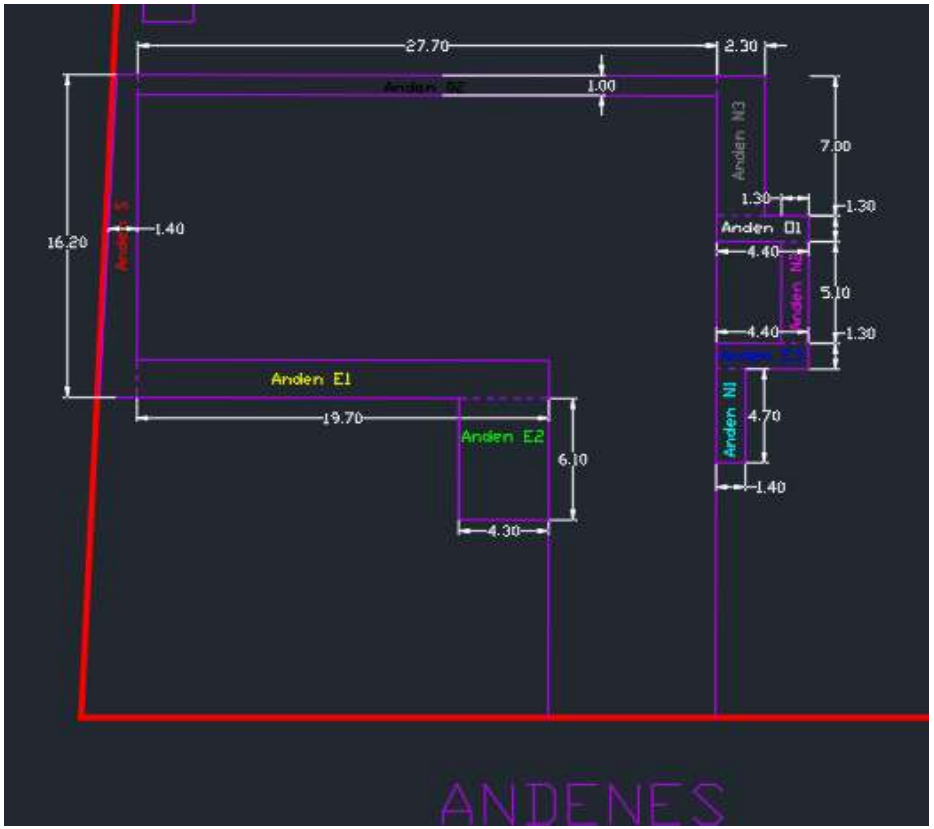

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**3**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.03.03**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA Y DESCAPOTE	**UNIDAD:**	m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

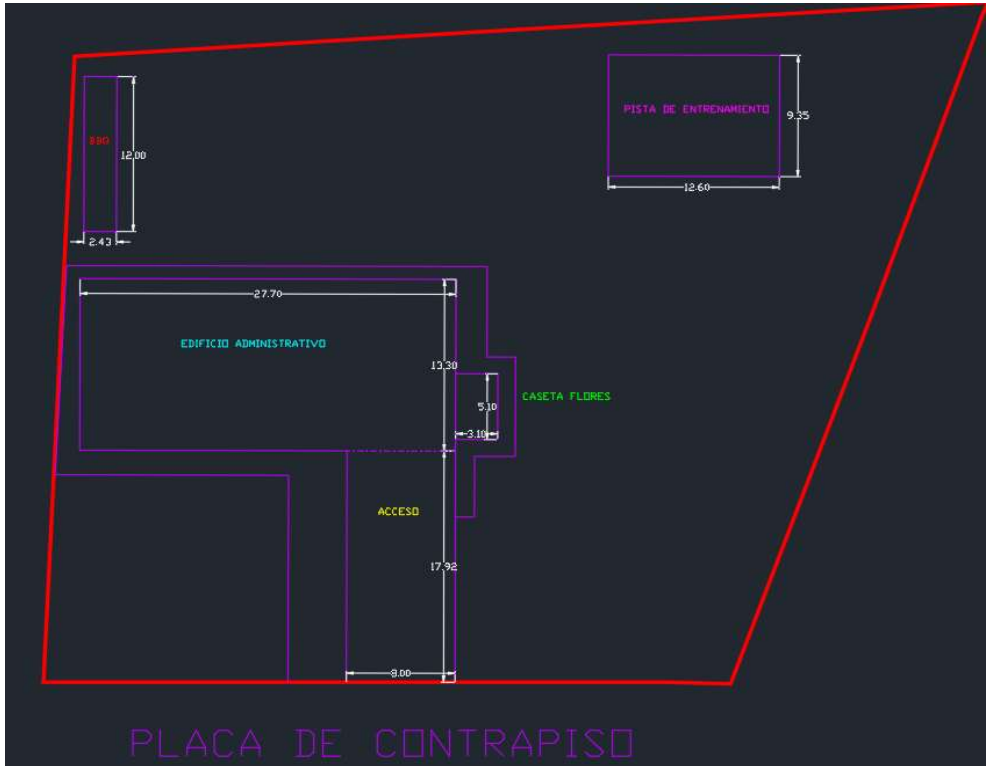

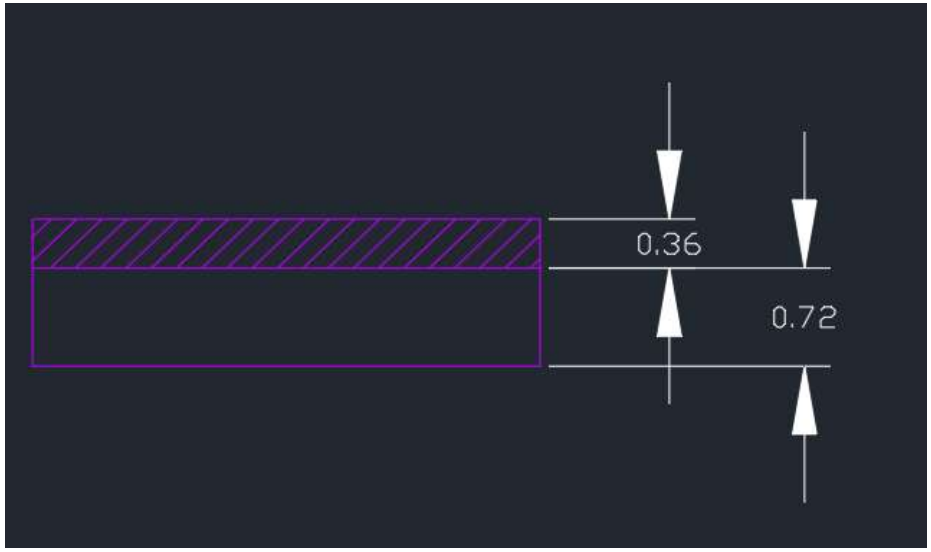

DAIMCO	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	FECHA:	
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG / U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN	CÓDIGO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **1.03.04**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESCAPOTE	**UNIDAD:** m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**





UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	Area		
AREA TOTAL DEL PREDIO			0.20	2964.49	1.00	592.90
DESCUENTOS PLACAS						
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	27.70	13.30	0.20	368.41	-1.00	-73.68
ACCESO	8.00	17.92	0.20	143.36	-1.00	-28.67
CASETA FLORES	3.10	5.10	0.20	15.81	-1.00	-3.16
ZONA BBQ	2.43	12.00	0.20	29.16	-1.00	-5.83
PLACA DE ENTRENAMIENTO	9.35	12.60	0.20	117.81	-1.00	-23.56
ANDEN S	1.40	16.20	0.20	22.68	-1.00	-4.54
ANDEN E1	1.90	19.70	0.20	37.43	-1.00	-7.49
ANDEN E2	4.30	6.10	0.20	26.23	-1.00	-5.25
ANDEN N1	1.40	4.69	0.20	6.57	-1.00	-1.31
ANDEN E3	4.40	1.30	0.20	5.72	-1.00	-1.14
ANDEN N2	1.30	5.10	0.20	6.63	-1.00	-1.33
ANDEN O1	4.40	1.30	0.20	5.72	-1.00	-1.14
ANDEN N3	2.30	7.00	0.20	16.10	-1.00	-3.22
ANDEN O2	27.70	1.00	0.20	27.70	-1.00	-5.54


OBSERVACIONES :
La altura tomada por descapote es la enunciada por la consultoria 0.20


TOTAL	427.03
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**427.03**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						FECHA:			
			MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN		CÓDIGO	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	3	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025			
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.03.04**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESCAPOTE	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**			


ESQUEMA

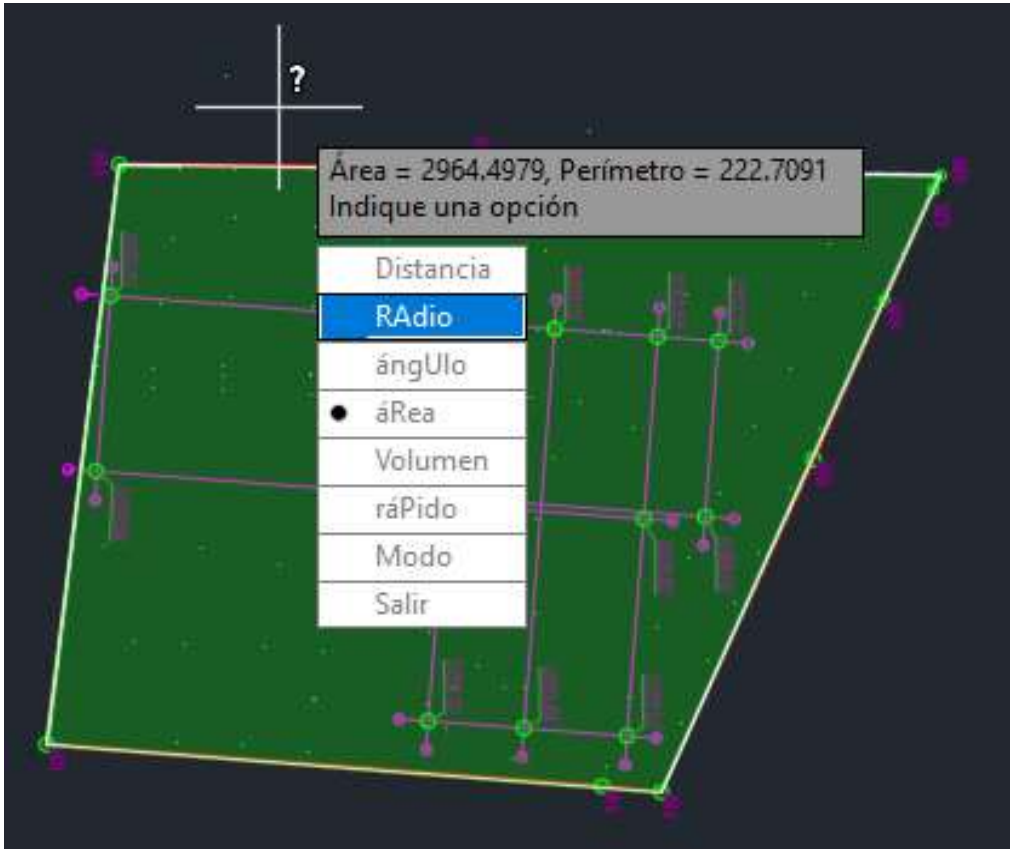

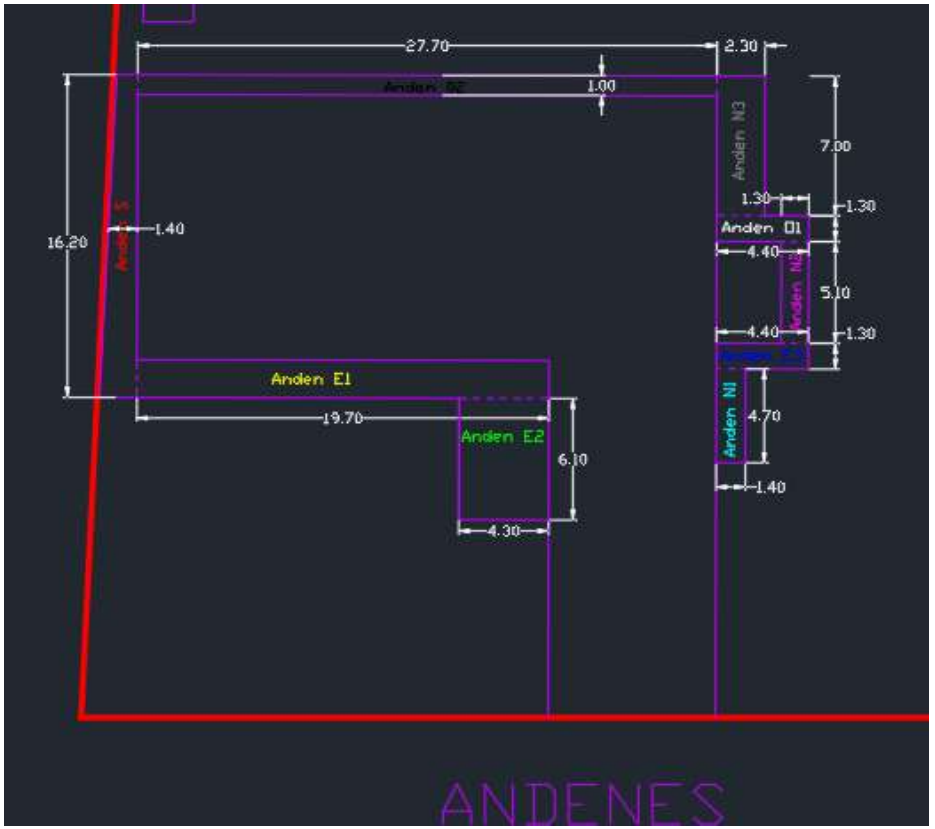

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	3		
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025				
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.03.04**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESCAPOTE	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

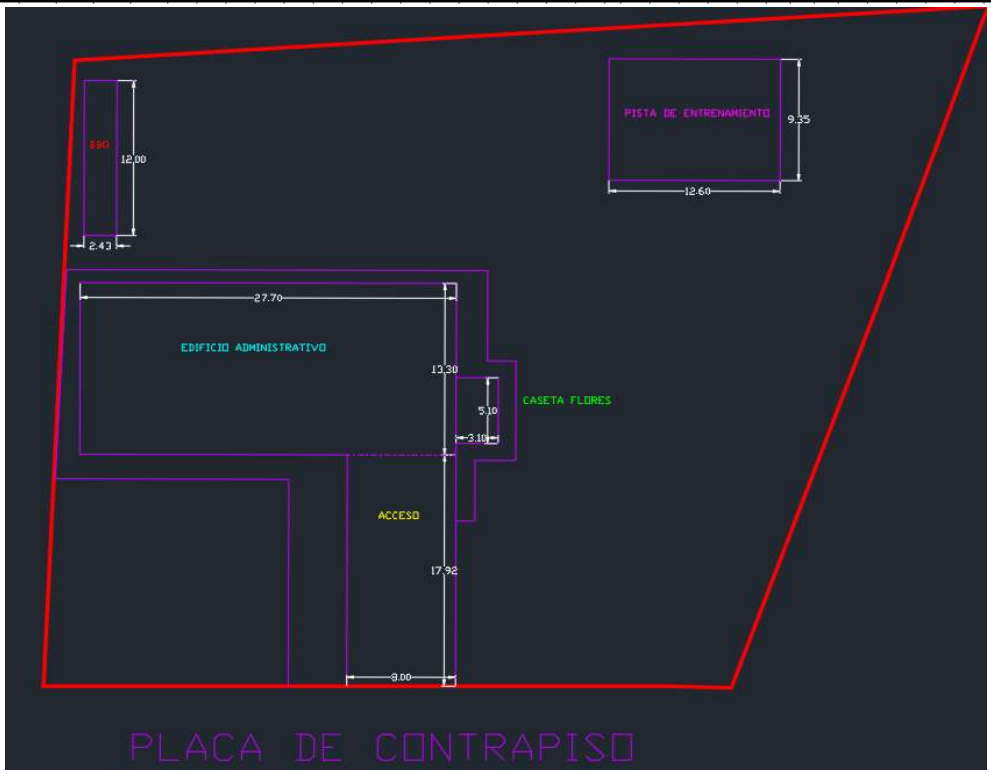

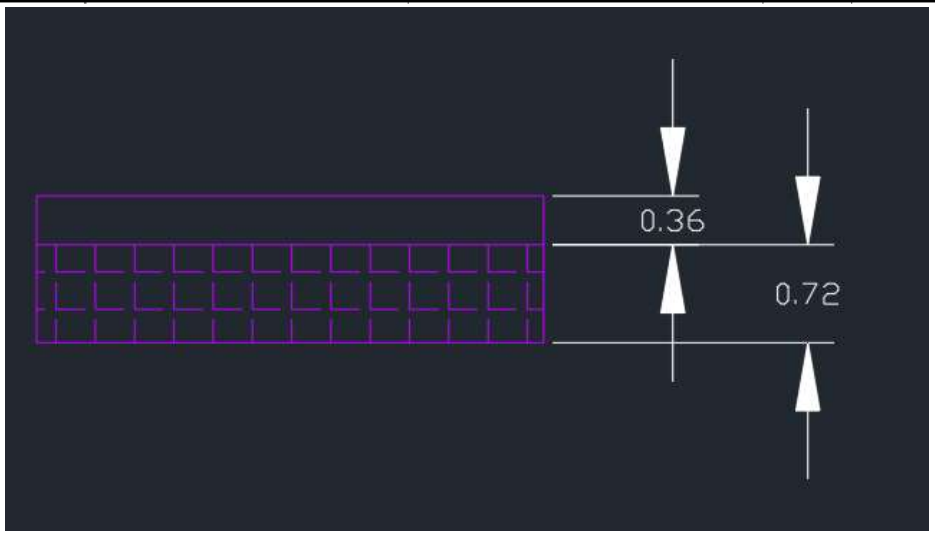

DAIMCO / CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG / U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
	MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **1.04.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO DE OBRA MAMPOSTERÍA	**UNIDAD:** M2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**





UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	Area		
CAMPAMENTO	5.20	12.10		62.92	1.00	62.92
BAÑOS	3.74	1.50		5.61	1.00	5.61


OBSERVACIONES :

TOTAL	68.53
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**68.53**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.04.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO DE OBRA MAMPOSTERÍA	**UNIDAD:**	M2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

ESQUEMA

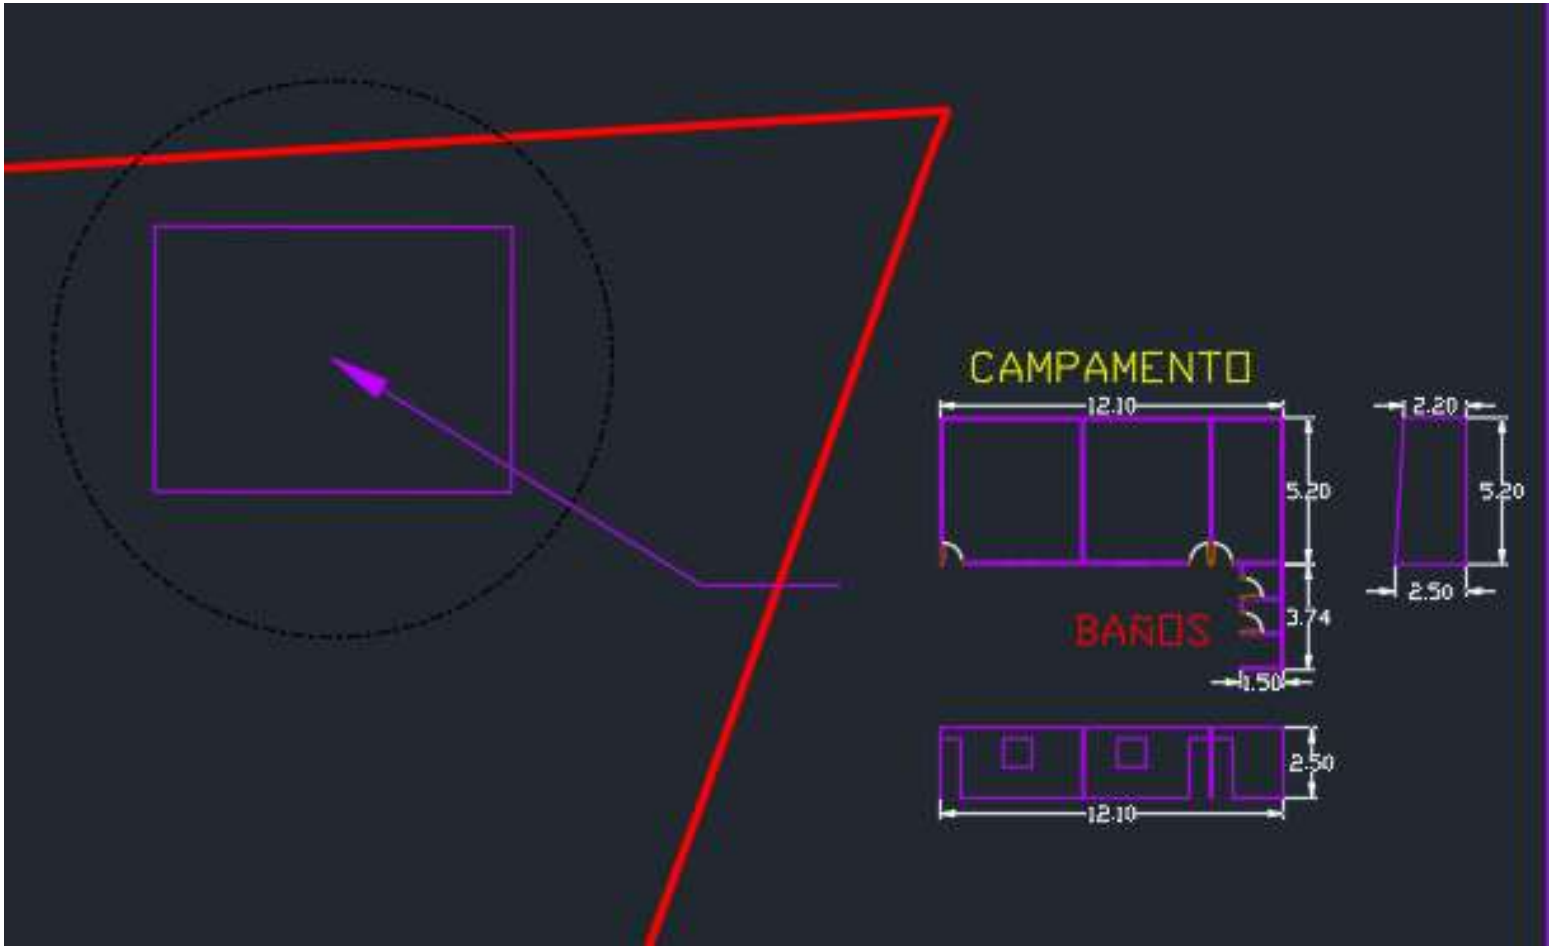

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **1.05.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA	**UNIDAD:** m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**







UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto			
COSTADO NORTE		32.80			1.00	32.80
COSTADO OCCIDENTAL		67.90			1.00	67.90
COSTADO SUR		48.50			1.00	48.50
COSTADO ORIENTAL		50.63			1.00	50.63


OBSERVACIONES :

TOTAL	199.83
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**199.83**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	2
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**1.05.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

ESQUEMA

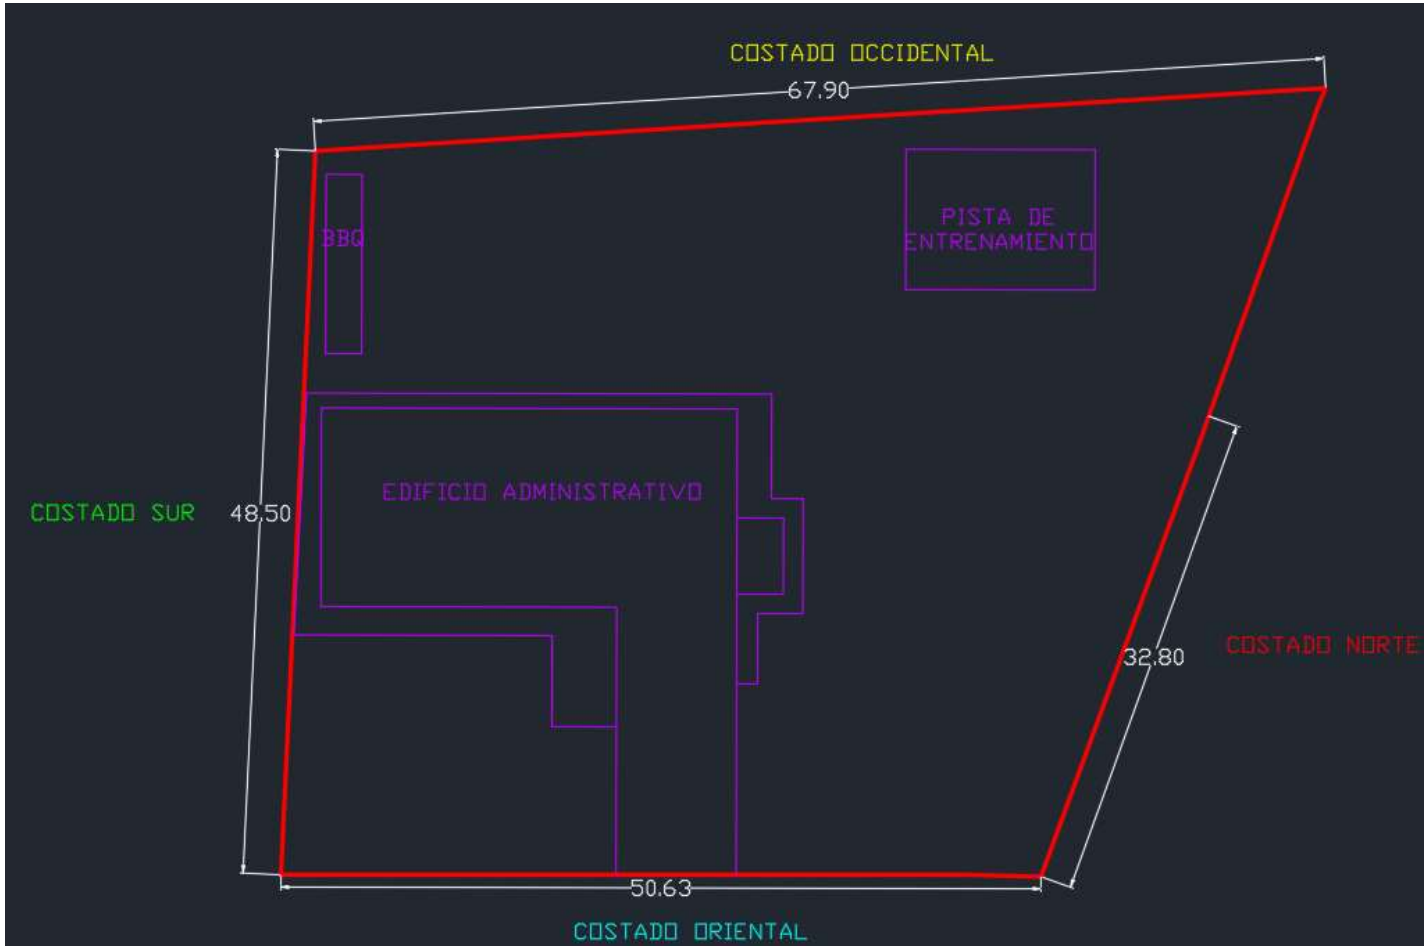


DAIMCO / CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG / U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.		**FECHA:**	
	MEMORIA DE CALCULO		**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 5	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:** **2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	**UNIDAD:** KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	







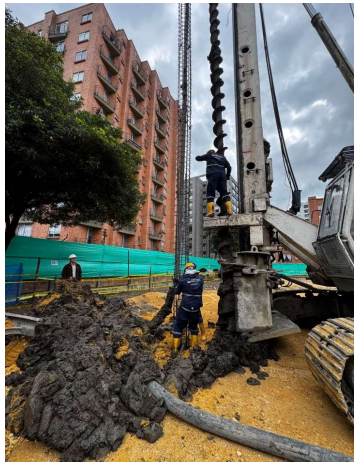

UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	kg	% smistro		
PLT-1			533.68	88.05%	38.00	17856.40
PLT-2			550.47	88.05%	3.00	1454.07
PLT-3			1113.19	88.05%	8.00	7841.31
PLT-4			789.88	88.05%	9.00	6259.40

OBSERVACIONES :
El 88.05% corresponde al suministro del acero figurado el restante deacuerdo con el APU corresponde a la instalacion.


TOTAL	33,411.18
PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL A PAGAR	**33,411.18**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela


DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**


PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 5
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**

ESQUEMA









PLT-1 D=0.50m x 30m (Son 38) Peso/Elemento= 533.68Kg Peso 38 elementos=20279.71Kg


DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
0.25 / 8.75	4	#5	9.00	56.2	(Total =152)
0.25 / 11.75	4	#5	12.00	74.9	(Total =152)
12.00	8	#5	12.00	149.8	(Total =304)
11.50	4	#5	11.50	71.8	(Total =152)
8.50	4	#5	8.50	53.0	(Total =152)
Espiral vueltas=16.0 ø=0.35	1	#3	17.593	9.9	(Total =38)
Espiral vueltas=192.0 ø=0.35	1	#3	¡¡¡ 211.115 !!!	118.2	(Total =38)


PLT-2 D=0.50m x 31m (Son 3) Peso/Elemento= 550.47Kg Peso 3 elementos=1651.40Kg


DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
0.25 / 9.75	4	#5	10.00	62.4	(Total =12)
0.25 / 11.75	4	#5	12.00	74.9	(Total =12)
12.00	8	#5	12.00	149.8	(Total =24)
11.50	4	#5	11.50	71.8	(Total =12)
9.50	4	#5	9.50	59.3	(Total =12)


DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de 5
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA		**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	









Espiral vueltas=16.0 ø=0.35	1	#3	17.593	9.9	(Total =3)
Espiral vueltas=199.0 ø=0.35	1	#3	¡¡¡ 218.812 !!!	122.5	(Total =3)

PLT-3 D=0.70m x 30m (Son 8) Peso/Elemento= 1113.19Kg Peso 8 elementos=8905.50Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
0.40 9.85	6	#6	10.25	138.4	(Total =48)
0.40 5.60	6	#6	6.00	81.0	(Total =48)
12.00	18	#6	12.00	486.0	(Total =144)
10.70	6	#6	10.70	144.4	(Total =48)
4.60	6	#6	4.60	62.1	(Total =48)
Espiral vueltas=16.0 ø=0.55	1	#3	27.646	15.5	(Total =8)
Espiral vueltas=192.0 ø=0.55	1	#3	¡¡¡ 331.752 !!!	185.8	(Total =8)

PLT-4 D=0.50m x 32m (Son 9) Peso/Elemento= 789.88Kg Peso 9 elementos=7108.89Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS

DAIMCO	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.							**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO							**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**5**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA		**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

0.25 — 8.75	6	#5	9.00	84.2	(Total =54)
0.25 — 11.75	6	#5	12.00	112.3	(Total =54)
12.00	12	#5	12.00	224.6	(Total =108)
8.50	6	#5	8.50	79.6	(Total =54)
10.50	6	#5	10.50	98.3	(Total =54)
ø — Espiral vueltas=16.0 ø=0.35	1	#3	17.593	9.9	(Total =9)
ø — Espiral vueltas=205.0 ø=0.35	1	#3	¡¡¡ 225.409 !!!	126.2	(Total =9)
5.85	6	#5	5.85	54.8	(Total =54)

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.							**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO							**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**5**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**01**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA		**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

