CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG
NIT 901.994.058-1
CR 55 152B 68 OF 1503
Tel: 6017189431
Bogotá - Colombia
contabilidad@grupotitanium.co

Factura electrónica de venta
No. 6

Señores	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 30 Nº 25-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2026, 16:14
Expedición	14/04/2026, 16:19
Vencimiento	14/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CORTE No. 003 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B 13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA - SGC.	1.00	513,856,717.18	0 %	513,856,717.18
2	Administración 30.10%	1.00	154,670,871.87	0 %	154,670,871.87
3	Imprevistos 2%	1.00	10,277,134.34	0 %	10,277,134.34
4	Utilidad 3%	1.00	15,415,701.52	19 %	18,344,684.81

Total items: 4

Total Bruto	694,220,424.91
IVA 19%	2,928,983.29
Total a Pagar	697,149,408.20

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y siete millones ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ocho pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-14 por $ 697,149,408.20

Observaciones:
A la presente factura se le debe amortizar la suma correspondiente al valor del anticipo por un valor de $313.717.233,69.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Talonario o Papel 18764101681298 aprobado en 20251117 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: bbf9f3dcfad62e1e3b23cf4d0e3f0af0b7718df96e5d15b6fb4de5100c19709d869d033238c2d78da5db736de0ddf27d

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Código: GR-PR15-FT02
		Versión: 02
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURÍDICA	Vigencia: 08/04/2021
		Página 1 of 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**Identficación:** 901994058
Correo electrónico: facturasgrupotitaniumsas@gmail.com	**Teléfono:** 6017189431

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No:	630	**De:**	2025	**Plazo de ejecución:**	18	meses	0	dias	
Fecha de inicio:	11	11	2025	**Prorrogas:**	Meses	Dias	Meses	Dias	
					0	0	0	0	

Valor inicial	Valor adición 1	Valor adición 2	Valor adición 3	Valor total
$ 14.952.434.853	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.952.434.853

Objeto	Construcción y adecuación de la estación de bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SGC				
Dependencia	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	**Fecha de presentación de la cuenta:**	20	04	2026
Pago No:	4	**Periodo de pago:**	01-03-2026 al 31-03-2026		
Nro Factura:	6				

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya fueron pagados en periodos anteriores)

Total pagado	$ 7.618.407.929	**Saldo Actual**	$ 7.334.026.924	**Valor a pagar**	$ 383.432.175
Porcentaje de ejecución financiera:	50,95%	**Saldo menos este pago:**	$ 6.950.594.749		

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Proyecto/Rubro	Nº RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
O2301174503202402551401 4 O2320202005040554590	6000007118	2026	Estaciones de bomberos adecuadas - Otros servicios especializados de la construcción	$ 383.432.175
Subtotal				$ 383.432.175

ENDOSO	**En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:**		
Nombre:		**Identificación:**	
Valor a endosar:	$ 0	**Teléfono:**	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR



El valor de la factura 006 corresponde a $697.149.408, de conformidad a lo establecido en la clausula 1 forma de pago el valor a amortizar corresponde a $313.717.234 quedando un saldo a pagar correspondiente a $383.432.175

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de:	$ 383.432.175 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO DE PESOS

FIRMAS DE REVISORES

Tipo Revisor	Nombre del Revisor	Estado	Firma
REFERENTE	FABIAN HUMBERTO SALAMANCA JIMENEZ Contratista SGC Marzo 2026	**VoBo**	
REFERENTE	CRISTIAN CAMILO GOMEZ RIOS Contratista SGC Marzo 2026	**VoBo**	
REFERENTE	SANDRO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ Contratista SGC Marzo 2026	**VoBo**	
REFERENTE	FATIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ Subdirectora de Gestión Corporativa Marzo 2026	**VoBo**	
SUPERVISOR	DAIMCO S A S Interventoria Marzo 2026	**APROBAR**	

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

											Número de informe para pago	4	Fecha de presentación del informe	dd	mes	aaaa	
														20	4	2026	
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA																	
DATOS DEL CONTRATO																	
No. Contrato		**Año**	**Dependencia**				**Nombre del contratista**						**No. Identificación del contratista**				
630		2025	SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA				CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						901994058				
Observaciones:																	
Objeto contractual:		Construcción y adecuación de la estación de bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SGC									**Valor inicial del contrato:**		**$ 14.952.434.853**	**Registro presupuestal (RP No.):**		**5000930443 6000007118**	
Fecha de firma del contrato:			**Plazo (dias)**	**Fecha de inicio:**			**Fecha de terminación:**				**Período de reporte:**		**Nombre del supervisor:**	**Cargo del supervisor:**			
dd	**mes**	**aaaa**	**dias**	**dd**	**mes**	**aaaa**	**dd**	**mes**	**aaaa**		**En meses**						
3	10	2025	540	11	11	2025	10	5	2027		3		DAIMCO S A S	Interventoria			
MODIFICACIONES AL CONTRATO																	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN EL PERÍODO Y/O MODIFICACIONES DE PÓLIZAS											**Fecha de cargue**		**Fecha de modificación**	**Fecha de Aprobación de la Póliza**		**No. De poliza y Anexo**	
											26-11-2025		19-11-2025	19-12-2025		NB-100409424;ANEXO 2	
Modificación Contractual		**RP No.**	**Fecha de la modificación contractual**		**Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)**		**Valor de la modificación**				**Justificación de la modificación contractual**						
TOTAL MODIFICACIONES							**$ 0**										
NOMBRE DEL CEDENTE							**No. Identificación**										
NOMBRE DEL CESIONARIO							**No. Identificación**										
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.																	
Terminación anticipada		**Fecha de terminación**		**Acta de terminación**							**Fecha del acta de terminación anticipada**						
				SI		**NO**											
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																	
Valor Total de Contrato											**$ 14.952.434.853**						
Pagos realizados																	
Fecha		**Numero de pagos**		**%**			**Valor pagado ($)**				**Observaciones aclaratorias**						
13-11-2025		**1**		**45%**			**6728595684**										
17-02-2026		**2**		**2,98%**			**445423358**										
16-03-2026		**3**		**2,97%**			**444388887**										
				Ejecución financiera acumulada:			**$ 7.618.407.929**										
				Saldo Por Girar			**49,05%**				**$ 7.334.026.924**						
EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES																	
Obligaciones específicas del contrato											**Actividades realizadas**						
1	Previo a la suscripción del acta de inicio:																
2	Entregar la información del Personal propuesto junto con las hojas de vida y demás soportes como los certificados de experiencia, académicos y certificados de cursos de trabajo en alturas, establecidos en el										Se realizó entrega de la hojas de vida del personal junto con los soportes solicitados en los documentos previos del contrato el día 10 de octubre de 2025. Estas fueron aprobadas mediante Acta de Aprobación de Personal el día 23 de otubre de 2025.						

	anexo técnico, los cuales deben ser allegados a la interventoría en un plazo máximo de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato.	
3	Otorgar datos de contacto del residente de obra, quien deberá mantenerse al frente de los trabajos, disponibles las 24 horas del día y del director quien estará autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten. los cuales deben ser allegados a la interventoría en un plazo máximo de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato.	Se realizó entrega de los datos de contacto del residente de obra, mediante correo electrónico del 10 de octubre de 2025 a la Firma de Interventoría.
4	Entregar tres (03) números telefónicos a la interventoría, y a la supervisión o quien este designe, para la permanente coordinación de los trabajos y garantizará los sistemas de comunicación con disponibilidad de 24 horas de los equipos de comunicación de su personal. los cuales deben ser allegados a la interventoría en un plazo máximo de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato.	
5	Anexar el Programa de “seguridad y salud en el trabajo” en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y decreto 1111 de 2017. Certificación expedida por la ARL o carta firmada por el empleador. El cual debe ser allegado a la interventoría en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de la firma del contrato.	Se realizó entrega del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante correo electrónico el 10 de octubre de 2025 y dicho documento fue aprobado por interventoría mediante comunicado No.100025_BOMBEROS_004 del 110 de noviembre de 2025
6	Remitir los Análisis de Precios Unitarios (APU´s) de cada una las actividades contractuales y desglose del (AIU) debidamente aprobados por la interventoría en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de la firma del contrato.	Se realizó entrega de loa análisis de precios unitarios contractuales y desglose del AIU, mediante correo electrónico del 31/10/2025 y 28/10/2025 respectivamente; los cuales fueron aprobados mediante oficio de interventoría 100025_BOMBEROS_004 del 10 de noviembre de 2025
7	Programación de actividades de obra y Flujo de Caja. (Programación detallada, la cual incluya duración de las actividades, holguras, recursos físicos, ruta crítica, porcentaje de avance semanal y acumulado, entre otras). Este cronograma deberá ser entregado a la interventoría para su revisión y aprobación. Esta programación será de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, quien no podrá modificarla unilateralmente. La modificación de la programación de obra deberá fundarse en causas plenamente justificadas y demás requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, Teniendo en cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo Técnico Así mismo, se deja la claridad que los ajustes a la programación de obra no deberán superar el plazo de ejecución establecido ni el presupuesto definido para cada una de las vigencias, esta debe ser entregada dentro de los quince (15) días calendario a la firma del contrato	Se realizó entrega de la programación de actividades de obra y el flujo de caja, mediante correo electrónico el día 22 y 28 de octubre de 2025, cuyo documento fue aprobado mediante oficio de interventoría 100025_BOMBEROS_004 del 10 de noviembre de 2025
8	Actividades para desarrollar posterior a la suscripción del acta de inicio:	
9	Realizar la apropiación de los estudios y diseños, previa reunión del contratista con la interventoría y la supervisión, además de desarrollar visita técnica y presentar un informe de conclusiones de estos documentos, el cual debe ser allegado a la interventoría en un plazo máximo de un (1) mes calendario, paralelo a la ejecución de actividades preliminares establecidas en el presupuesto. El informe de conclusiones deberá ser entregado a la interventoría para su revisión y posterior aprobación, esta apropiación corresponde a la verificación de los entregables de los estudios y diseños, esto es, los permisos y licencias; topografía, estudio de suelos, ambiental y otros; diseños arquitectónico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades, cantidades, valores unitarios, valores parciales y AU contractuales y las especificaciones. Además, dicha auscultación de estos entregables contempla las siguientes actividades: • Revisión de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos, revisión de la vigencia de permisos y licencias, revisión de la licencia otorgada y el proyecto a construir. • Revisión de topografía, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentación, drenaje y estabilidad, manejo de impactos ambientales. • Revisión de memorias de cálculo y planos de los diseños. • Revisión del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revisión y aval al plan de inversión del anticipo, revisión y aval al plan SST. • Revisión de la programación de obra, es decir, la resultante de la consultoría de estudios y diseños. Dentro de dicho informe se tiene como alcance el revisar, analizar, proponer modificaciones, coordinar reuniones con consultoría de estudios y diseños y/o estructuradores, liderar la obtención de documentación faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad contratante conocer el panorama del proyecto. Adicionalmente el contratista deberá allegar los siguientes documentos dentro del tiempo de apropiación de los estudios y diseños, entre los que se encuentran: - Reprogramación de actividades de obra. De acuerdo con lo evidencia en la apropiación de los estudios y diseños el contratista deberá realizar la reprogramación (Programación detallada, la cual incluya duración de las actividades, holguras, recursos físicos, ruta crítica, porcentaje de avance semanal y acumulado, entre otras). Esta deberá ser entregada a la interventoría para su revisión y aprobación. Y la misma será de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, quien no podrá modificarla unilateralmente. La modificación de la programación de obra deberá fundarse en causas plenamente justificadas y demás requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, Teniendo en cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo Técnico Así mismo, nuevamente se deja	Durante el período de ejecución, se han atendido oportunamente los requerimientos realizados por la interventoría, en concordancia con las actividades desarrolladas.

	la claridad que los ajustes a la programación de obra no deberán superar el plazo de ejecución establecido ni el presupuesto definido para cada una de las vigencias - Balance preliminar de actividades a ejecutar con las correspondientes memorias de cálculo bajo los parámetros establecidos por la interventoría y la supervisión - Programa de calidad, específico para el proyecto, el cual debe contener los lineamientos de calidad e indicadores que se deben tener en cuanto a los procesos constructivos, la calidad de los materiales a emplear, los acabados y las demás actividades y aspectos contemplados en el anexo técnico.	
10	Atender los requerimientos realizados por la interventoría del contrato o la entidad y corregir a su costa las fallas o las actividades que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, ó reemplazando los materiales que resulten defectuosos dentro de plazo máximo de tres (03) días calendario. Los tiempos que se requieran para estas acciones deben ser cumplidos independientemente a los tiempos dados en el cronograma de atención de requerimientos. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar y documentar la situación de forma inmediata al interventor del contrato.	Durante la ejecución de la obra, se han seguido las especificaciones técnicas establecidas por la consultoría para el desarrollo de las actividades contractuales. En los casos en que han surgido modificaciones o actividades no previstas, estos cambios han sido gestionados mediante los procesos correspondientes ante la Entidad Contratante, contando con la aprobación previa antes de su ejecución.
11	El contratista deberá cumplir y atender de manera estricta las especificaciones técnicas contenidas en los documentos entregados por la consultoría, los cuales hacen parte integral de los insumos del proyecto y constituyen el marco de referencia técnico para la correcta ejecución de las actividades contractuales	Durante la ejecución de la obra, se han seguido las especificaciones técnicas establecidas por la consultoría para el desarrollo de las actividades contractuales. En los casos en que han surgido modificaciones o actividades no previstas, estos cambios han sido gestionados mediante los procesos correspondientes ante la Entidad Contratante, contando con la aprobación previa antes de su ejecución.
12	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos y demás elementos necesarios dispuestos para el cabal cumplimiento del contrato, bajo las recomendación y aprobación del interventor y en las fechas indicadas en la programación detallada, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio.	Durante la ejecución de la obra, se han dispuesto y utilizado los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, todo ello bajo las recomendaciones y con la aprobación de la interventoría.
13	Adquirir los materiales de construcción necesarios para la ejecución de las actividades contratadas de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su explotación, cumpliendo con las exigencias vigentes en el Distrito y contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos, estos deberán ser nuevos de primera calidad y cumplir con las especificaciones exigidas. Además, estos materiales y elementos a utilizar deben ser sometidos a inspección y aprobación ante la interventoría previo a su utilización y deben contar con la disponibilidad de personal y existencias de equipos, herramientas y materiales que garanticen la realización de estas.	Los materiales de construcción requeridos para la ejecución de las actividades han sido adquiridos de fuentes y proveedores que cuentan con los permisos y licencias vigentes para su explotación, en cumplimiento de las exigencias del Distrito, esto se puede evidenciar en el Informe Ambiental No.5. Se ha garantizado la disponibilidad suficiente de materiales para no afectar el avance de los trabajos
14	Ejercer la dirección y control técnico y administrativo de todos los trabajos, con el objeto de desarrollar la obra, de conformidad con las normas y especificaciones pactadas. En este orden de ideas el ejecutor se compromete a corregir a sus expensas cualquier actividad que a juicio del interventor resulte mal ejecutada siempre y cuando obedezca a causas imputables al mismo sin generar afectaciones en la programación de actividades.	Durante la ejecución de la obra, se ha ejercido la dirección y el control técnico y administrativo de todos los trabajos, en conformidad con las normas y especificaciones. A la fecha, no se han identificado planes de acción requeridos, en los casos en que la interventoría identifique actividades de corrección, estas serán atendidas por el contratista, sin generar afectaciones en la programación de actividades.
15	El contratista debe dejar en perfecto estado de aseo las áreas intervenidas y asumir los costos que esto genere.	Durante la ejecución de la obra, se ha mantenido el orden y aseo de las áreas intervenidas, asumiendo los costos asociados a estas actividades.
16	Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos, defectos constructivos o de la mano de obra, deberá ser demolida y/o remplazada por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR.	A la fecha, las actividades ejecutadas y los materiales utilizados han cumplido con los estándares de calidad requeridos para el proyecto, sin que se hayan presentado observaciones que ameriten demolición, reemplazo o corrección por parte del contratista.
17	Radicar las facturas correspondientes a las actas parciales de obra, junto con los soportes técnicos que den cumplimiento de sus obligaciones, para revisión y aval de la interventoría	En el marco del presente informe, se radica el Acta de Cobro N.° 3 de obra, acompañada de los soportes técnicos correspondientes a los Informes Mensuales de Obra No.5.
18	Mantener, proveer e instalar durante la ejecución de la obra, las señales preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente y la orientación vehicular de ser necesario para la circulación. Además de las medidas de seguridad necesarias para aislar la zona de las obras, así como someterse a las normas de vigilancia y seguridad y salud en el trabajo correspondientes y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar las personas y la calidad, estabilidad, acabados de los inmuebles aledaños y las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes y realizar la reparación de los espacios públicos y privados aledaños a los lugares de la obra que hayan sido deteriorados con ocasión de los trabajos de este proceso, dentro de los tres días (03) hábiles siguientes a la intervención	Durante la ejecución de la obra, se han instalado y mantenido las señales preventivas requeridas, tanto en el área de intervención como en sus alrededores, en cumplimiento de la normativa vigente y conforme a lo aprobado en el PMT COI N.° 48. Así mismo, se han implementado las medidas de seguridad necesarias para el aislamiento de la zona de obras y la protección de personas, inmuebles aledaños, redes de servicios y estructuras existentes. Se evidencia en Informes Mensuales de Obra No.5 del Componente SST
19	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: - Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. – Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. – Dotación	Durante la ejecución de la obra, se ha dado cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, se han observado las normas de seguridad industrial en la manipulación de equipos, herramientas, combustibles y demás elementos requeridos para el desarrollo del objeto contractual. Se evidencia en Informes Mensuales de Obra No.5 del Componente SST

	de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.	
20	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostáticas, de estanqueidad, de resistencia del concreto y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto, solicitadas por parte del INTERVENTOR para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. Los laboratorios que ejecuten estas pruebas o ensayos deberán contar con la correspondiente certificación ONAC	Los reportes de ensayos y pruebas realizados se encuentran debidamente documentados y evidenciados en los Informes Mensuales de Obra No.5, en el componente técnico correspondiente.
21	Usar procedimientos adecuados para la conservación y protección evitando cualquier daño o deterioro que se pueda ocasionar a la arborización o las estructuras que se encuentren en la zona de los trabajos. Los daños y perjuicios ocasionados por el contratista serán reparados o indemnizados a su costa.	Durante la ejecución de la obra, se han implementado los procedimientos necesarios para la conservación y protección de la arborización y las estructuras existentes en la zona de intervención, sin que se hayan registrado daños o afectaciones. Lo anterior se encuentra debidamente documentado en los Informes Mensuales de Obra No.5, en el componente ambiental
22	Atender el almacenamiento adecuado, la conservación y la seguridad de todos los materiales, herramientas y elementos que adquiera con destino a la obra y utilice para su desarrollo.	Se cuenta con el espacio de almacenamiento de obra debidamente organizado y acondicionado, garantizando la adecuada conservación y seguridad de los materiales, herramientas y elementos destinados a la ejecución del proyecto. Lo anterior se encuentra evidenciado en los Informes Mensuales de Obra No.5, en el componente ambiental y SST
23	Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el interventor, el supervisor, la entidad o autoridad competente colombiana, debidamente documentado con registro fotográfico o videos y demás soportes, donde se evidencie las condiciones de la obra y suscribir los documentos necesarios solicitados por la entidad.	A la fecha, se han presentado oportunamente los informes solicitados por la interventoría, la Entidad documentados con registro fotográfico y los soportes requeridos que evidencian las condiciones de avance de la obra. Lo anterior se encuentra debidamente documentado en los Informes Mensuales de Obra No.5, en el componente técnico
24	Ceñirse a la programación de obra validada y aprobada por el interventor	Durante la ejecución de la obra, se ha dado cumplimiento a la programación desarrollando las actividades conforme a los tiempos y establecidos.
25	Prestar Asesoría a la obra, a través del personal especializado cuando la naturaleza de los trabajos así lo exijan.	A la fecha, no se han presentado cambios normativos, técnicos ni requerimientos por parte de las autoridades competentes que exijan modificaciones a la licencia de construcción otorgada
26	En caso de que, por cambios normativos, técnicos o por requerimientos de las autoridades competentes, se requiera realizar modificaciones a la licencia de construcción inicialmente otorgada, el contratista deberá adelantar los trámites correspondientes para gestionar dichas modificaciones, incluyendo la actualización de planos, estudios técnicos y documentación exigida por la normatividad vigente, garantizando en todo momento el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables.	Durante la ejecución de la obra, se ha ejercido el control y seguimiento del personal a cargo
27	Controlar todo el personal a su cargo, respondiendo a las exigencias cualitativas que haga el interventor para alcanzar los objetivos fundamentales de la obra, en cuanto a plazo, coordinación, precios y calidad	Durante la ejecución de la obra, se ha ejercido el control y seguimiento del personal a cargo
28	Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance	Se cuenta con registro fotográfico y de video del avance semanal de la obra, documentando el progreso de las actividades ejecutadas desde puntos de referencia fijos
29	El contratista no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin previa aprobación por la interventoría, sin que se haya suscrito el acta de aprobación de ítems no previstos. Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa del acta, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA no reconocerá valores por tal concepto.	Las actividades No Previstas en el contrato han sido gestionadas mediante el conducto regular establecido, suscribiendo el acta de fijación de precios con la participación de las tres partes: contratista, interventoría y entidad contratante. Dicho proceso se encuentra debidamente documentado y se refleja en los Informes Técnicos de Obra No.5.
30	Garantizar un canal efectivo de comunicación, el cual será acordado con el interventor previo al acta de inicio del contrato.	Se mantiene un canal de comunicación con la interventoría, a través del cual se tramitan oportunamente los requerimientos, observaciones y demás comunicaciones relacionadas con la ejecución del contrato.
31	Cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y sus anexos.	Desde el inicio de la obra, se ha dado cumplimiento a las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico para el desarrollo de todas las actividades contractuales.
32	Cumplir con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato y en caso de que se requiera cambios en el personal aprobado, el contratista deberá informar al interventor y presentará la (las) hoja (as) de vida con sus soportes del personal nuevo, el cual deberá cumplir o superar los requisitos solicitados por la Entidad en el Anexo Técnico, debiendo ser aprobado por el interventor.	Desde el inicio de la obra, se ha contado con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, en cumplimiento de los perfiles y requisitos establecidos por la entidad en el Anexo Técnico y con la aprobación de la interventoría.
33	Cubrir los costos directos e indirectos que se generen con relación al transporte y personal requerido para ejecutar el objeto contractual, así mismo con la correcta instalación de los elementos señalados en el Anexo Técnico.	Durante la ejecución del contrato, se han asumido los costos directos e indirectos generados por concepto de transporte, personal y demás aspectos requeridos para el correcto desarrollo del objeto contractual.
34	Informar oportuna y formalmente al interventor sobre cualquier irregularidad que se advierta en el desarrollo del contrato.	Durante el período en ejecucion, se han verificado e informado todos los procesos a la interventoria con el fin de preveer la correcta ejecucion futura del proyecto.
35	En caso de requerir prórroga para el plazo de ejecución la misma deberá ser verificada y aprobada por la interventoría,	A la fecha no se ha solicitado prorroga.

36	ITEM NO PREVISTOS: Para el reconocimiento de ítems no previstos (NP) el contratista deberá seguir el procedimiento establecido en el anexo técnico.	Durante el período en ejecucion, se evidencio la necesidad de incluir items no previstos al contrato de obra, realizando el debido conducto regular y o establecido en el anexo tecnico.
37	Cumplir con los ofrecimientos realizados en la oferta de acuerdo con los factores ponderables previstos en el Pliego de Condiciones.	Durante el período en ejecucion, se ha cumplido con los ofrecimientos realizadose de acuerdo con los factores ponderables previstos en el Pliego de Condiciones.
38	El contratista de obra deberá adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.	Durante el período en ejecucion, se han venido adelantado gestiones con entidades para la ubicación de servicios públicos y provisionales de obra.
39	Instalar Una (1) valla de información de la obra (Min. 2 M2), en el sitio de ejecución indicado por el INTERVENTOR, de acuerdo con la información y condiciones exigidas por la UAECOB. Esta valla deberá actualizarse y permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra, acorde con las especificaciones antes establecidas.	Cumplido.
40	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la UAECOB.	Durante el período en ejecucion, se viene adelantando el diligenciamiento de la bitacora de obra tal y como se registra en el anexo tecnico de los informes de obra No.5.
41	En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 modificado por el Artículo 2 del Decreto 634 de 2023, el contratista se obliga a que el 13.8% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Cumplido. A la fecha, mas del 13,8% del personal vinculado es femenino.
42	Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020 modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.	
43	Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Durante el período en ejecucion, se viene adelantando charlas y capacitaciones en contra del abuso y acoso sexual al diferente personal de obra tal y como se registra en el anexo de los informes de obra No.5. componente SST.
44	Asistir a los comités de obra programados por la interventoría y/o la supervisión de interventoría a fin de analizar el avance normal de las diferentes actividades según programación de obra.	Durante el período en ejecucion, se ha asistido a todos los comites establecidos tanto por la entidad contratante como por la interventoria.
45	El contratista de obra deberá actualizar dentro los 15 días calendario siguientes al requerimiento por parte de la interventoría, el balance de las actividades y las correspondientes memorias de cálculo bajo los parámetros establecidos	Durante el período en ejecucion, y una vez aprobada la vinculacion de las actividades no previstas se realizo actualizacion del balance de actividades de obra.
46	Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusivas o parcialmente imputables al contratista sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por esta prórroga serán por cuenta del contratista en la proporción equivalente a su imputabilidad, incluido el pago del interventor.	No aplica. No se ha requerido prorrogar el contrato.
47	En caso que por cambio en apartes de la normativa o modificaciones por parte de las empresas de servicios públicos durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá realizar el o los ajustes pertinentes en los diseños finales	No aplica. No ha habido cambios en normativas de las empresas de servicios públicos.
48	El contratista en atención al Decreto 1860 de 2021, deberá incluir y mantener durante la ejecución del contrato, como mínimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan con alguna(s) de las siguientes características de población: i) Víctimas del conflicto armado interno. ii) Mujeres cabeza de familia. ii) Adultos mayores. iii) Personas en condición de discapacidad. iv) Población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. La verificación del cumplimiento de la presente obligación será realizada por el interventor del contrato.	Durante el período en ejecucion, el 5% del personal del personal vinculado presenta dichas características de población.
49	Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto del presente proceso	Cumplido. Desde el inicio de la obra y a la fecha se cumplido con rugosidad con la totalidad de las exigencias y especificaciones del contrato.
50	Obligaciones para cumplir posteriores a la suscripción del acta de recibo.	
51	Atender cualquier novedad relacionada con calidad y correcto funcionamiento de los bienes, obras y/o servicios adquiridos dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación por parte del interventor	No aplica.

	o la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA. Durante la vigencia de las respectivas garantías	
52	Presentar un informe final avalado por la interventoría dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del acta de recibo final, el cual debe estar elaborado con base a lo descrito en el CAPITULO II. ANEXO TECNICO, numeral 1.6.3 INFORME FINAL.	No aplica.
53	OBLIGACIONES AMBIENTALES	
54	El contratista, en el momento en el que se encuentre dentro de las instalaciones de la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA debe cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad, establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, para conocer estos, en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato debe solicitar y realizar una reunión con el Área de Gestión Ambiental.	Durante el período en ejecucion, se ha cumplido con lineamientos establecidos por la entidad contratante de acuerdo al PIGA, tal y como se establece en los informes mesuales No. 05 del componente ambiental.
55	Garantizar que en la obra no se afecte ningún individuo arbóreo, de lo contrario, se deberá realizar el trámite de manejo silvicultural frente a la Secretaría Distrital de Ambiente, hasta la obtención del permiso y cumplir con la compensación que sea aplicada	Durante el período en ejecucion no se afectado ningún individuo arbóreo, ni se tiene prevista la intervencion de alguno de estos.
56	Propender porque los materiales de embalaje y/o implementos utilizados en el proceso constructivo sean catalogados como de baja carga contaminante, sin que ello implique pérdida de la calidad de los productos.	Durante el período en ejecucion, se ha realizado seguimiento continuo con el fin de usar materiales de emabaje y/o implementos de obra que sean catalogados como de baja carga contaminante, tal y como se establece en los informes mesuales No. 05 del componente ambiental.
57	El contratista deberá remitir las fichas técnicas y los manuales de uso de los equipos y productos utilizados durante la ejecución de la obra. Así mismo el proveedor deberá proporcionar las hojas de seguridad en español.	Durante el período en ejecucion, se ha realizado entrega de todas las fichas tecnicas y manuales de uso de los equipos y productos utilizados, tal y como se establece en los informes mensuales No. 05 del companente ambiental, SST y tecnico.
58	El contratista, para la presentación de informes físicos, deberá dar un adecuado uso al recurso papel, donde se garantice su ciclo sostenible. En todo caso, este deberá ser fabricado con papel reciclado, de alto rendimiento, que cuente con procesos de recuperación, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. Adicionalmente, debe estar libre de cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, deberá presentar un certificado que acredite el cumplimiento del presente criterio ambiental	A la fecha todos los informes ya se han entregado de forma digistal y fisica a la interventoria del proyecto.
59	El contratista deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental -PMA, que garantice la prevención, mitigación, compensación y corrección de los impactos ambientales causados al medio biótico, abiótico y socioeconómico y el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD, dando cumplimiento del Decreto 507 de 2023, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, el cual deberá ser aprobado por la interventoría.	Cumplido. PMA ya fue presentado y aprobado desde el informe de obra No. 01. tal y como se establece en los lineamientos que se llevan para la ejecucion del proyecto y lo relacionado en los informes de obra No. 05 del componente ambiental.
60	Implementar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 507 de 2023, Resolución 0472 de 2017 modificada parcialmente por la resolución 1257 de 2021 y demás que modifiquen o adicionen al Instructivo de Gestión Integral de RCD de la Entidad y de la SDA; mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposición, indicadores, costos, transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el acompañamiento hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidación del contrato.	Durante el período en ejecucion, se ha realizado retiro de RCD en cumplimientos del decreto 507 de 2023,Resolución 0472 de 2017 modificada parcialmente por la resolución 1257 de 2021 y demás que modifiquen o adicionen al Instructivo de Gestión Integral de RCD de la Entidad y de la SDA, tal y como se relaciona en los informes de obra No. 05 del componente ambiental.
61	Presentar a la interventoría, cada vez que en el marco del desarrollo de las actividades objeto del contrato, se generen residuos peligrosos y/o especiales, como lo son: tintas, tóner, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE, disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que tengan contacto con los mencionados), el Certificado de Disposición Final adecuada de los residuos peligrosos generados, garantizando el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005. En cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar los soportes que permitan evidenciar esto	No aplica. A la fecha no se han generado residuos considerados peligrosos.
62	Garantizar que el transporte de los RCD se debe realizar por empresas autorizadas para tal fin. El material transportado debe poseer la protección necesaria para evitar el desplazamiento y la emisión del material particulado como lo señala la Resolución 0472 de 2017 modificada parcialmente por la resolución 1257 de 2021 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. La disposición final de residuos de construcción y demolición debe ser realizada por gestores modalidad “sitios de disposición final de RCD” autorizadas por la Autoridad Ambiental competente, haciendo entrega de las certificaciones de disposición final al interventor del contrato.	Durante el período en ejecucion, se ha realizado retiro de RCD con empresas certificadas y capacitadas en este ámbito, tal y como se relaciona en los informes de obra No. 05 del componente ambiental.
63	El contratista deberá velar porque las obras a ejecutar generen el menor impacto auditivo y laborar durante los horarios respectivos para no generar ruido conforme lo dicta el Decreto 948 de 1995, que regula lo relacionado con aire y ruido, y a la Resolución 627 de 2006, la cual reglamente lo relacionado con emisión de ruido y ruido ambiental y la ley de emisión de sonidos en construcciones 450 del 2025	Durante el período en ejecucion, se ha propendido que el ruido generado sea mínimo en la obra y, se ha respetado el horario laboral propuesto desde el inicio.
64	El contratista, garantizará que uno de los materiales de construcción sea sostenible, donde la materia prima sea de una fuente abundante y renovable, que los productos sean de larga duración, no contaminantes. Es importante que se conozca el análisis del ciclo de vida (ACV) de los productos de construcción de acuerdo	Durante el período en ejecucion, los materiales utilizados a la fecha se ha verificado mediante certificado de explotacion ambiental que son sostenibles, de fuente a abundante y renovables, tal y como se establece en los informes mensuales No. 05 del componente ambiental.

	con la norma ISO 14040, lo cual se demostrara mediante la presentación de la ficha técnica ambiental del producto como soporte de cumplimiento	
65	El contratista deberá contemplar, la viabilidad del aprovechamiento de granulo de caucho reciclado, en zonas y/o áreas del proyecto que así lo ameriten como (pisos de gimnasios, topes de zonas de parqueo, mobiliarios etc.), en cumplimiento a los programas de aprovechamiento de este material reciclado (Si aplica)	No aplica. No se han retirado cauchos
66	El contratista instalará partes o accesorios de los sistemas hidrosanitarios que estén relacionados con sensores de bajo consumo y ahorradores para el uso racional y eficiente del agua en los baños, orinales, duchas y lavamanos conforme se señala en la Ley 373 de 1997 y el Decreto 3102 de 1997 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. Para lo cual, deberá entregar las fichas técnicas al interventor del contrato	Cumplido. Se han instalado sistemas hidrosanitarios de bajo consumo y ahorradores.
67	El contratista instalará partes o accesorios de los sistemas eléctricos con sensores de alta eficiencia energética mediante la cual se fomente el uso racional y eficiente energías alternativas de acuerdo con la Ley 697 de 2001 y al Decreto 2501 de 2007. Igualmente, debe contemplar los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas conforme a la Resolución 40150 de 2024. Así mismo, debe hacer cumplir el reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE conforme a la resolución 90795 de 2014 y a la Resolución 90708 de 2013 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya Para lo cual, deberá entregar las fichas técnicas al interventor del contrato.	Cumplido. Se han instalado sistemas eléctricos de alta eficiencia.
68	Es necesario que el contratista especifique claramente el parque automotor que pondrá a disposición del contrato, anexando para ello el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente conforme a la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, la cual deberán llevar a cabo en los Centros de Diagnóstico Automotriz –CDA autorizados por la autoridad competente, y el mismo, será entregado a la interventoría del contrato en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato y cuantas veces sea renovado, durante la ejecución.	Durante el período en ejecucion, se ha presentado toda la documentacion del parque automotor que estara ingresando a la obra durante este periodo, verificando que cuente con toda la documentacion al dia, tal y como se establece en los informes mensuales No. 05 del componente ambiental y SST.
69	El contratista deberá aplicar los procedimientos, controles y acciones preventivas necesarias para manejar de manera adecuada y segura los residuos de asbesto y productos que lo contengan, en cumplimiento de la Resolución 07 de 2011, por la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad del Crisolito y otras Fibras de uso similar, publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.	Cumplido. Se ha dado manejo de acuerdo a la ley de los residuos en asbesto y productos que lo contengan.
70	Realizar la estructura de la estación teniendo en cuenta el flujo de aire natural de la zona para aprovechar la aireación y de esta manera generar un flujo de aire constante al interior de los espacios de la estación y una óptima recirculación, lo anterior atendiendo lo estipulado en la NTC 5183 y demás normas aplicables.	Cumplido. Desde el inicio de actividades se tiene contemplado que la estación cuente con flujo natural para los diferentes espacios.
71	El contratista, instalara un sistema de captación de aguas lluvias, el cual permita el almacenamiento y aprovechamiento y distribución de aguas lluvias dentro de la estación. En cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar informe mensual del cumplimiento de los criterios ambientales dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes. Nota 1: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por EL CONTRATISTA deben ser debidamente verificados y avalados por el interventor y remitidos al equipo de gestión ambiental de la entidad. Nota 2: EL CONTRATISTA debe manifestar en la “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” la aceptación y compromiso en el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones ambientales establecidas en el presente Anexo Técnico.	Cumplido. Dentro de los diseños establecidos se tiene la instalación de sistema de captación de aguas lluvias dentro de la estación.
72	OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
73	El contratista debe acreditar previo a la suscripción del acta de inicio, la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019; para ello deberá aportar la última autoevaluación de Estándares Mínimos firmada por el representante legal y el responsable del SGSST.	Cumplido. Antes de la suscripción del acta de inicio se implemento el sistema de gestión y seguridad en el trabajo.
74	El contratista debe contar con el personal idóneo para la prestación del servicio, el cual deberá estar equipado de los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para el ejercicio de sus actividades, lo cual se verificará con los registros de entrega de EPP, para todas las actividades a realizar por el supervisor del contrato o sus apoyos.	Durante el período en ejecucion, se ha contado con un profesional idoneo para la prestacion de este servicio contando con todos sus elementos de proteccion personales necesarios para el ejercicio de sus actividades tal y como se registra en los informes de obra No. 05 del componente SST.
75	Garantizar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad social: salud, pensión, y administradora de riesgos laborales verificado contra la certificación de pago de parafiscales expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal de la Empresa y el anexo seguido de las planillas respectivas debidamente pagadas.	Durante el período en ejecucion, se ha contado con un profesional idoneo para la prestacion de este servicio contando con su respectiva afiliacion al sistema se seguridad social necesarios para el ejercicio de sus actividades tal y como se registra en los informes de obra No. 05 del componente SST y tecnico.

76	Será obligación del interventor del contrato verificar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensión y la Administradora de Riesgos laborales – ARL y realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo vigente, por parte del contratista.	Durante el período en ejecucion, la interventoría revisa todas las afiliaciones al sistema general de seguridad social de todos los trabajadores del personal de obra y el respectivo pago de las planillas.
77	El contratista deberá aportar Certificado de ARL donde indique la clase de riesgo vigente no superior a treinta (30) días.	Durante el período en ejecucion, se presenta mediante formato de vinculacion la certificacion de afiliacion con riesgo maximo y se puede constatar en los informes de obra No. 05 del componente SST.
78	El contratista deberá certificar que dentro de su personal no cuenta con menores de dieciocho (18) años.	Durante el período en ejecucion, no se vinculo personal menor de dieciocho (18) años y se puede constatar en los informes de obra No. 05 del componente SST.
79	Contar con la respectiva señalización de las zonas de trabajo.	Durante el período en ejecucion, se ha reforzado la señalizacion instalada con el fin de evitar un deterioro prematuro de la misma, tal y como se registra en el informe de obra No. 05 del componente SST.
80	Presentar las certificaciones de calibración de los equipos utilizados para testeo (cuando aplique). Para las pruebas de testeo y/o calibración los patrones usados deben tener un certificado de calibración vigente de acuerdo con la normatividad de la Superintendencia de Industria y Comercio por uno de los laboratorios autorizados por este Organismo.	Durante el periodo de ejecucion, se han entregado los diferentes certificados de calibracion de los equipos usados para el testeo de las obras a ejecutar o ya ejecutadas según corresponda, tal y como se muestra en los anexos de informe de obra No 05 del componente tecnico.
81	Contar con las ayudas mecánicas apropiadas para el cargue y descargue de equipos, evitando exponer a trabajadores propios y de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. a lesiones por levantamiento de cargas.	Durante el periodo de ejecucion, se ha contado con ayudas mecanicas para el cargue y descargue de material esto con el fin de evitar lesiones por levantamiento de cargas.
82	Tener disponible las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados para la labor (si aplica).	Durante el periodo de ejecucion, no se han utilizado productos quimicos para la ejecucion de obra.
83	Entregar recomendaciones sobre el uso seguro y adecuado de los equipos.	Durante el periodo de ejecucion, se entrego recomendaciones sobre el uso seguro y adecuado de los equipos que se encuentran en obra. Tal y como se describe en los informes de obra No. 05 del componente SST.
84	Entregar la hoja de vida del equipo instalado especificando los mantenimientos preventivos a realizar en cantidad y periodicidad.	No aplica, a la fecha del presente periodo de ejecucion no se han instalado equipos
85	Para realizar trabajos de alto riesgo es necesario contar con procedimientos y normas de seguridad aplicables a las distintas actividades que se realizan, en estos procedimientos debe estar muy claro que personal es responsable y que personal realiza la labor, así como las medidas que se tomaron en el antes, durante y después de la actividad siguiendo los lineamientos exigidos por el área de Seguridad y salud en el Trabajo. Entiéndase como tareas de alto riesgo (Trabajos en alturas, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, espacios confinados). Dando cumplimiento a los lineamientos anteriormente descritos el personal contratista debe cumplir con los siguientes requerimientos: Contar con personal debidamente certificado para la realización de la tarea de alto riesgo al interior de las instalaciones de la UAECOB. En cada tarea de alto riesgo que se ejecute al interior de las instalaciones de la UAECOB, el contratista deber asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, esto será corroborado por personal del contratista previo al desarrollo de las actividades. Contar con las herramientas y equipos de protección adecuados para la labor. Cumplir con la señalización del área a intervenir limitando el acceso al personal no autorizado.	Durante el periodo de ejecucion, se entrego procedimientos y normas de seguridad aplicables. Tal y como se describe en los informes de obra No. 05 del componente SST
86	El contratista debe garantizar que cumple con toda la normatividad correspondiente a sismorresistencia, ingreso y egreso para personal en condición de discapacidad o movilidad reducida, seguridad y riesgo público, señalización de seguridad vial, señalización de emergencias, ventilación y contar con las zonas de almacenamiento, mantenimiento y reparación que se requieran conforme a la misionalidad de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá.	Cumplido. Se ha garantizado cumplimiento de normatividad sismorresistente, señalización vial, emergencias y ventilación en la contruccion del proyecto tal y como se muestra en la consultoria del proyecto que se ejecuta.
87	OBLIGACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ	
88	Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el pliego de Condiciones	Cumplido
89	Entregar al Contratista toda la información y facilidades que sean necesarias para la adecuada ejecución del contrato.	Cumplido
90	Verificar el adecuado funcionamiento de los bienes, obras y/o servicios adquiridos.	Cumplido
91	Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.	Cumplido

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS) SI APLICA

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega:			Anexo al informe del mes de:	Observaciones
ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03	aa	mm	yyyy	Marzo	

	20	4	2026		


DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

El valor de la factura 006 corresponde a $697.149.408, de conformidad a lo establecido en la clausula 1 forma de pago el valor a amortizar corresponde a $313.717.234 quedando un saldo a pagar correspondiente a $383.432.175

FIRMAS DE REVISORES

Tipo Revisor	Nombre del Revisor	Estado	Firma
Contratista	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**APROBAR**	
REFERENTE	FABIAN HUMBERTO SALAMANCA JIMENEZ Contratista SGC Marzo 2026	**VoBo**	
REFERENTE	CRISTIAN CAMILO GOMEZ RIOS Contratista SGC Marzo 2026	**VoBo**	
REFERENTE	SANDRO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ Contratista SGC Marzo 2026	**VoBo**	
REFERENTE	FATIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ Subdirectora de Gestión Corporativa Marzo 2026	**VoBo**	
SUPERVISOR	DAIMCO S A S Interventoria Marzo 2026	**APROBAR**	

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos de calidad

UAECOB-CONTRATO-630-2025 - 0013 - 45667

Bogotá, D.C. 06 de abril de 2026

Señores
DAIMCO S.A.S
Atn. ARQ. GABRIEL DUARTE ORJUELA
DIRECTOR DE OBRA
Calle 44B #57a-52, Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. UAECOB – 630 - 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC"

Asunto: CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Yo, **CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON,** identificado con cedula de ciudadanía No.1.019.007.501 de BOGOTA D.C., en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, certifico que CONSORCIO OBRAS COMANDO 2023 identificado con NIT. 901.734.446-1 ha cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y actualmente se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Agradecemos su atención y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Cordialmente,

ING. CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS CARRERA 14B No. 146-05		FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	03	PROCESO No:		TIPO DE PROCESO:	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	N.I.T:	
	1-mar-26 / 31-mar-26	CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	N.I.T:	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	N.I.T:	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario ofertado	Valor total ofertado	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Ejec. del Item	% Ejec. del Contrato	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Pend. Ejec. del Item	% Pend. Ejec. del Contrato
01	PRELIMINARES																
1.01	DEMOLICIONES Y RETIROS																
1.01.01	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	m3	52.90	280,636.31	14,845,660.80	541.65	$ 152,007,218.58		$ -	541.65	$ 152,007,218.58	100.00%	1.38%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.01.02	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA DE ENTREPISO < e= 20 CMS	m2	405.03	80,562.62	32,630,277.98	556.74	$ 44,852,433.06		$ -	556.74	$ 44,852,433.06	100.00%	0.41%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.01.03	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMIENTOS	m3	14.54	301,269.54	4,380,459.11	115.00	$ 34,645,997.10		$ -	115.00	$ 34,645,997.10	100.00%	0.31%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.01.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m	222.71	45,366.69	10,103,615.53	222.71	$ 10,103,615.53		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	222.71	$ 10,103,615.53	100.00%	0.09%
1.01.05	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE	m2	292.98	60,110.03	17,610,916.37	154.78	$ 9,303,710.22		$ -	154.78	$ 9,303,590.00	100.00%	0.08%	0.00	$ 120.22	0.00%	0.00%
1.02	INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES																
1.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROVISIONAL DE AGUA	m	30.00	39,625.52	1,188,765.60	58.80	$ 2,329,980.58		$ -	58.80	$ 2,329,980.58	100.00%	0.02%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROVISIONAL DE ENERGÍA	m	30.00	184,795.86	5,543,875.80	112.06	$ 20,708,224.07		$ -	112.06	$ 20,708,224.07	100.00%	0.19%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.03	TRABAJOS PRELIMINARES																
1.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMACIÓN LICENCIA	und	1.00	62,983.80	62,983.80	1.00	$ 62,983.80		$ -	1.00	$ 62,983.80	100.00%	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	2,968.11	7,485.28	22,217,134.42	2,964.49	$ 22,190,037.71		$ -	2,964.49	$ 22,190,037.71	100.00%	0.20%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA Y DESCAPOTE	m2	2,968.11	36,569.11	108,541,141.08	2,135.16	$ 78,081,047.18		$ -	2,135.16	$ 78,081,047.18	100.00%	0.71%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.03.04	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESCAPOTE	m3	593.62	82,003.13	48,678,862.04	427.03	$ 35,017,960.61		$ -	427.03	$ 35,018,026.21	100.00%	0.32%	0.00	$ -65.60	0.00%	0.00%
1.04	CAMPAMENTO DE OBRA																
1.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO DE OBRA MAMPOSTERÍA	m2	52.00	178,984.76	9,307,207.52	68.53	$ 12,265,825.60		$ -	68.53	$ 12,265,825.60	100.00%	0.11%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALQUILER DE 3 BAÑOS PORTÁTILES	mes	10.00	607,040.50	6,070,405.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
1.05	CERRAMIENTO																
1.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA	m	222.71	40,778.18	9,081,708.47	199.83	$ 8,148,703.71		$ -	199.83	$ 8,148,703.71	100.00%	0.07%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
1.06	RELLENOS Y REEMPLAZOS																
1.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO Y CONFORMACIÓN EN RECEBO B-200 PLATAFORMA PARA PILOTAJE CAPACIDAD 80 TON - SEGÚN SOLICITUD CONTRATISTA	m3	327.50	37,375.80	12,240,574.50	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
1.07	TALA Y TRASLADO DE ARBOLES																
1.07.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TALA DE ÁRBOL PORTE MENOR HASTA 2,50 METROS DE ALTURA	und	18.00	489,240.49	8,806,328.82	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
1.07.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TALA DE ÁRBOL PORTE MEDIO ENTRE 2,51 A 5,00 METROS DE ALTURA	und	12.00	951,241.47	11,414,897.64	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
1.07.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TALA DE ÁRBOL PORTE MAYOR ALTURA MAYOR A 5.01 METRO	und	15.00	1,347,283.30	20,209,249.50	3.00	$ 4,041,849.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 4,041,849.90	100.00%	0.04%
02	CIMENTACIÓN																
2.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACIÓN																
2.01.01	EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA TANQUES	m3	214.68	56,438.67	12,115,971.48	842.60	$ 47,555,149.44		$ -	633.77	$ 35,768,977.86	75.22%	0.32%	208.83	$ 11,786,171.58	24.78%	0.11%
2.01.02	EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN MANUAL PREHUECOS (PILOTES)	m3	10.96	111,763.58	1,224,603.58	6.45	$ 720,664.85		$ -	6.45	$ 720,664.85	100.00%	0.01%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
2.01.03	EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	104.74	51,592.06	5,403,752.36	104.74	$ 5,403,752.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	104.74	$ 5,403,752.36	100.00%	0.05%
2.01.04	EJECUCIÓN DE PERFILADA DE TALUDES PARA TANQUES	m3	187.50	33,426.73	6,267,518.56	187.50	$ 6,267,518.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	187.50	$ 6,267,518.56	100.00%	0.06%
2.01.05	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	m3	517.87	79,695.53	41,272,106.61	1,592.12	$ 126,884,845.50	362.43	$ 28,884,037.45	1,359.60	$ 108,353,927.97	85.40%	0.98%	232.52	$ 18,530,917.52	14.60%	0.17%
2.02	CIMENTACIONES SUPERFICIALES																
2.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASES EN CONCRETO CICLÓPEO e=40 cm - 40% rajón - 60% Concreto f'c=21MPa	m3	33.97	381,834.79	12,971,691.49	33.97	$ 12,971,691.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	33.97	$ 12,971,691.49	100.00%	0.12%
2.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DADOS EN CONCRETO f'c=28 Mpa	m3	56.03	938,694.37	52,595,045.55	56.03	$ 52,595,045.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	56.03	$ 52,595,045.55	100.00%	0.48%
2.02.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 35x45 f'c=24.5 Mpa	m	154.83	200,522.22	31,046,855.32	154.83	$ 31,046,855.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	154.83	$ 31,046,855.32	100.00%	0.28%
2.02.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 55x75 f'c=24.5 MPa	m	104.29	373,002.59	38,900,440.11	104.29	$ 38,900,440.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	104.29	$ 38,900,440.11	100.00%	0.35%
2.02.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 35x35 f'c=24.5 MPa - CERRAMIENTO	m	179.50	172,492.37	30,962,380.42	179.50	$ 30,962,380.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	179.50	$ 30,962,380.42	100.00%	0.28%
2.03	CIMENTACIONES Profundas																
2.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-1 L=30m D=0.5m - f'c=24.5MPa	m	1,440.00	315,067.05	453,696,552.00	1,140.00	$ 359,176,437.00	300.00	$ 94,520,115.00	1,140.00	$ 359,176,437.00	100.00%	3.26%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
2.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-2 L=31m D=0.5m - f'c=24.5MPa	m	93.00	315,067.05	29,301,235.65	93.00	$ 29,301,235.65	31.00	$ 9,767,078.55	93.00	$ 29,301,235.65	100.00%	0.27%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
2.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-3 L=30m D=0.7m - f'c=24.5MPa	m	240.00	446,208.20	107,089,968.00	240.00	$ 107,089,968.00	180.00	$ 80,317,476.00	240.00	$ 107,089,968.00	100.00%	0.97%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
2.03.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-4 L=32m D=0.5m - f'c=24.5MPa	m	288.00	315,067.05	90,739,310.40	288.00	$ 90,739,310.40	224.00	$ 70,575,019.20	288.00	$ 90,739,310.40	100.00%	0.82%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
2.03.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-5 L=7m D=0.3m - f'c=24.5MPa	m	273.00	103,466.08	28,246,239.84	273.00	$ 28,246,239.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	273.00	$ 28,246,239.84	100.00%	0.26%
2.03.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DESCABECE DE PILOTES	m3	24.50	251,399.37	6,159,284.57	24.50	$ 6,159,284.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	24.50	$ 6,159,284.57	100.00%	0.06%
2.04	LOSAS DE CIMENTACIÓN																
2.04.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO e=15cm f'c=24.5 MPa - INTERIORES	m2	892.35	142,313.79	126,993,710.51	892.35	$ 126,993,710.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	892.35	$ 126,993,710.51	100.00%	1.15%
2.05	SUMINISTROS CONCRETOS Y OTROS (ACTIVIDADES DIFERENTES A ELEMENTOS ESTRUCTURALES)																
2.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 1.500PSI (CONCRETO DE LIMPIEZA)	m3	8.61	451,298.71	3,884,027.13	8.61	$ 3,884,027.13		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.61	$ 3,884,027.13	100.00%	0.04%
2.06	ACERO DE REFUERZO																
2.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	kg	63,535.50	5,307.21	337,196,240.96	63,535.50	$ 337,196,240.96	10,510.52	$ 55,781,534.51	43,921.70	$ 233,101,683.36	69.13%	2.11%	19,613.80	$ 104,094,557.60	30.87%	0.94%
2.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR XX-257	kg	4,780.45	5,929.57	28,345,991.73	4,780.45	$ 28,345,991.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4,780.45	$ 28,345,991.73	100.00%	0.26%
03	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS																
3.01	EXCAVACIONES																
3.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN MANUAL	m3	220.45	51,592.06	11,373,469.63	220.45	$ 11,373,469.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	220.45	$ 11,373,469.63	100.00%	0.10%
3.02	RELLENOS Y REEMPLAZOS																
3.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA)	m3	22.78	99,994.64	2,278,077.89	22.78	$ 2,278,077.89		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.78	$ 2,278,077.89	100.00%	0.02%
3.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN GRAVILLA	m3	72.58	100,999.13	7,330,112.86	72.58	$ 7,330,112.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	72.58	$ 7,330,112.86	100.00%	0.07%
3.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	m3	81.00	24,968.24	2,022,477.38	81.00	$ 2,022,477.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	81.00	$ 2,022,477.38	100.00%	0.02%
3.03	RETIROS																
3.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE RETIRO MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	139.45	91,465.80	12,754,722.88	139.45	$ 12,754,722.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	139.45	$ 12,754,722.88	100.00%	0.12%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS CARRERA 14B No. 146-05		FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	03	PROCESO No:		TIPO DE PROCESO:	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	N.I.T:	
	1-mar-26 / 31-mar-26	CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	N.I.T:	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	N.I.T:	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario ofertado	Valor total ofertado	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Ejec. del Item	% Ejec. del Contrato	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Pend. Ejec. del Item	% Pend. Ejec. del Contrato
3.04	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA**																
3.04.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE NICHO MAMPOSTERÍA PARA CAJILLA METÁLICA Y MEDIDOR TOTALIZ. 1/2" DIM=0,30x0,60x0,15 M. INCLUYE CAJILLA Y MEDIDOR.	und	1.00	484,175.77	484,175.77	1.00	$ 484,175.77		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 484,175.77	100.00%	0.00%
3.04.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (1.00X1.00)M	und	2.00	736,508.79	1,473,017.58	2.00	$ 1,473,017.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,473,017.58	100.00%	0.01%
3.04.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (0.80X0.80)M	und	1.00	681,146.56	681,146.56	1.00	$ 681,146.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 681,146.56	100.00%	0.01%
3.04.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (0.60X0.60)M	und	5.00	435,555.62	2,177,778.10	5.00	$ 2,177,778.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 2,177,778.10	100.00%	0.02%
3.04.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (0.80X0.80)M	und	6.00	681,146.56	4,086,879.36	6.00	$ 4,086,879.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 4,086,879.36	100.00%	0.04%
3.04.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (0.60X0.60)M	und	5.00	435,555.62	2,177,778.10	5.00	$ 2,177,778.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 2,177,778.10	100.00%	0.02%
3.05	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**																
3.05.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CAJA DE AFORO. DIM PROPUESTA = 1,20x1,20xVariable. Considera Vertedero y Zona Seca	und	1.00	1,772,915.07	1,772,915.07	1.00	$ 1,772,915.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,772,915.07	100.00%	0.02%
3.05.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CÁRCAMO DE PROTECCIÓN TUBERÍA DE CONEXIÓN A POZO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOX CULVERT - DIM= 2 VECES EL DIÁMETRO DE TUBERÍA EN AMBOS SENTIDOS	und	1.00	3,465,966.97	3,465,966.97	1.00	$ 3,465,966.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,465,966.97	100.00%	0.03%
3.06	**ELEMENTOS PREFABRICADOS**																
3.06.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SISTEMA TRAMPA DE GRASAS 10 GPM	und	1.00	2,037,200.21	2,037,200.21	1.00	$ 2,037,200.21		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,037,200.21	100.00%	0.02%
3.07	**POZOS DE INSPECCIÓN Y SÉPTICOS**																
3.07.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE POZO INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES - DIAM= 1 METRO PROF.=SEGÚN DISEÑOS	und	1.00	4,085,119.13	4,085,119.13	1.00	$ 4,085,119.13		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,085,119.13	100.00%	0.04%
3.07.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE POZO INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS - DIAM= 1 METRO PROF.=SEGÚN DISEÑOS	und	1.00	4,272,066.27	4,272,066.27	1.00	$ 4,272,066.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,272,066.27	100.00%	0.04%
3.08	**CAÑUELAS, CANALETAS, CÁRCAMOS Y Cunetas**																
3.08.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CÁRCAMO CON REJILLA .25 M X .20 M AGUAS LLUVIAS	m	91.00	153,108.08	13,932,835.28	91.00	$ 13,932,835.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	91.00	$ 13,932,835.28	100.00%	0.13%
3.08.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CÁRCAMO CON REJILLA .15 M X .30 M CUARTO DE BOMBAS	m	2.60	46,686.86	121,385.84	2.60	$ 121,385.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.60	$ 121,385.84	100.00%	0.00%
3.09	**OBRAS PARA CONEXIONES ACOMETIDAS Y DOMICILIARIAS**																
3.09.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN A POZO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	und	1.00	1,748,944.46	1,748,944.46	1.00	$ 1,748,944.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,748,944.46	100.00%	0.02%
3.09.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN A POZO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	und	1.00	856,698.72	856,698.72	1.00	$ 856,698.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 856,698.72	100.00%	0.01%
3.09.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN A RED ACOMETIDA 6" x 1/2"	und	1.00	1,026,697.07	1,026,697.07	1.00	$ 1,026,697.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,026,697.07	100.00%	0.01%
3.10	**FILTROS Y DRENAJES**																
3.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	18.33	6,699.98	122,810.63	18.33	$ 122,810.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.33	$ 122,810.63	100.00%	0.00%
04	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y MADERA**																
4.01	**PRELIMINARES DE ESTRUCTURA**																
4.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA	m2	2,136.27	5,284.88	11,289,930.60	2,136.27	$ 11,289,930.60	1,092.39	$ 5,773,173.32	1,092.39	$ 5,773,173.32	51.14%	0.05%	1,043.88	$ 5,516,757.28	48.86%	0.05%
4.02	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**																
4.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PANTALLAS EN CONCRETO e=0.35 f'c=28MPa	m3	55.42	1,031,469.31	57,164,029.16	55.42	$ 57,164,029.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	55.42	$ 57,164,029.16	100.00%	0.52%
4.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PANTALLAS EN CONCRETO e=0.60 f'c=28MPa	m3	49.05	1,087,957.83	53,364,331.56	49.05	$ 53,364,331.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	49.05	$ 53,364,331.56	100.00%	0.48%
4.02.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO f'c=28MPa	m3	48.91	1,015,001.18	49,643,707.71	48.91	$ 49,643,707.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	48.91	$ 49,643,707.71	100.00%	0.45%
4.03	**ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO**																
4.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 35x55 f'c=24,5MPa	m	76.08	157,919.07	12,014,482.85	76.08	$ 12,014,482.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	76.08	$ 12,014,482.85	100.00%	0.11%
4.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 40x55 f'c=24,5MPa	m	456.71	175,495.00	80,150,321.45	456.71	$ 80,150,321.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	456.71	$ 80,150,321.45	100.00%	0.73%
4.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 15x55 f'c=24,5MPa	m	46.97	87,615.35	4,115,292.99	46.97	$ 4,115,292.99		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	46.97	$ 4,115,292.99	100.00%	0.04%
4.03.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 35x60 f'c=24,5MPa	m	41.96	171,029.50	7,176,397.82	41.96	$ 7,176,397.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	41.96	$ 7,176,397.82	100.00%	0.07%
4.03.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 50x60 f'c=24,5MPa	m	21.61	228,165.57	4,930,657.97	21.61	$ 4,930,657.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	21.61	$ 4,930,657.97	100.00%	0.04%
4.03.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 50x55 f'c=24,5MPa	m	21.61	212,059.07	4,582,596.50	21.61	$ 4,582,596.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	21.61	$ 4,582,596.50	100.00%	0.04%
4.03.07	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 50x75 f'c=24,5MPa	m	15.80	275,072.87	4,346,151.35	15.80	$ 4,346,151.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.80	$ 4,346,151.35	100.00%	0.04%
4.03.08	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO 60x55 f'c=24,5MPa	m	16.47	247,210.93	4,071,564.02	16.47	$ 4,071,564.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.47	$ 4,071,564.02	100.00%	0.04%
4.03.09	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 35x55 f'c=24,5MPa	m	71.14	169,380.37	12,049,719.52	71.14	$ 12,049,719.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	71.14	$ 12,049,719.52	100.00%	0.11%
4.03.10	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 40x55 f'c=24,5MPa	m	235.86	186,956.30	44,095,512.92	235.86	$ 44,095,512.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	235.86	$ 44,095,512.92	100.00%	0.40%
4.03.11	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 15x55 f'c=24,5MPa	m	5.51	99,076.65	545,912.34	5.51	$ 545,912.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.51	$ 545,912.34	100.00%	0.00%
4.03.12	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 35x60 f'c=24,5MPa	m	21.47	198,025.15	4,251,599.97	21.47	$ 4,251,599.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	21.47	$ 4,251,599.97	100.00%	0.04%
4.03.13	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 60x55 f'c=24,5MPa	m	16.47	274,206.58	4,516,182.37	16.47	$ 4,516,182.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.47	$ 4,516,182.37	100.00%	0.04%
4.03.14	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 45x55 f'c=24,5MPa	m	37.93	222,891.00	8,454,255.63	37.93	$ 8,454,255.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	37.93	$ 8,454,255.63	100.00%	0.08%
4.03.15	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 50x75 f'c=24,5MPa	m	14.37	283,709.74	4,076,908.96	14.37	$ 4,076,908.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.37	$ 4,076,908.96	100.00%	0.04%
4.03.16	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 30x35 f'c=24,5MPa	m	55.75	110,889.30	6,182,078.48	55.75	$ 6,182,078.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	55.75	$ 6,182,078.48	100.00%	0.06%
4.04	**PLACAS MACIZAS EN CONCRETO**																
4.04.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO 24,5 Mpa - e=0.125m	m2	44.56	194,560.28	8,669,606.08	44.56	$ 8,669,606.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	44.56	$ 8,669,606.08	100.00%	0.08%
4.05	**LOSAS ALIGERADAS EN CONCRETO**																
4.05.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOSA ALIGERADA CON LAMINA COLABORANTE 1-1/2 CAL 22 e=10 cm f'c 24,5 MPa - SOBRE VIGAS DE CONCRETO	m2	649.20	200,793.33	130,355,029.84	649.20	$ 130,355,029.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	649.20	$ 130,355,029.84	100.00%	1.18%
4.05.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOSA ALIGERADA CON LAMINA COLABORANTE 1-1/2 CAL 22 e=10 cm f'c 24,5 MPa - SOBRE VIGAS DE ACERO	m2	417.43	203,617.75	84,996,157.38	417.43	$ 84,996,157.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	417.43	$ 84,996,157.38	100.00%	0.77%
4.06	**ESCALERAS Y GRADERÍAS EN CONCRETO**																
4.06.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO 24,5 MPa	m3	14.71	1,129,885.76	16,620,619.53	14.71	$ 16,620,619.53		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.71	$ 16,620,619.53	100.00%	0.15%
4.07	**FOSOS EN CONCRETO**																
4.07.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE FOSO ASCENSOR EN CONCRETO 24,5MPa	m3	3.12	998,003.31	3,113,770.33	3.12	$ 3,113,770.33		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.12	$ 3,113,770.33	100.00%	0.03%
4.08	**TANQUES EN CONCRETO**																
4.08.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PLACA, MUROS Y TAPA TANQUE EN CONCRETO 28 MPa	m3	79.81	1,162,542.71	92,779,976.09	79.81	$ 92,779,976.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	79.81	$ 92,779,976.09	100.00%	0.84%
4.09	**ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA**																
4.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	kg	88,392.00	5,244.27	463,551,513.84	88,392.00	$ 463,551,513.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	88,392.00	$ 463,551,513.84	100.00%	4.20%
4.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR XX-131	kg	5,714.09	5,866.63	33,522,447.63	5,714.09	$ 33,522,447.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5,714.09	$ 33,522,447.63	100.00%	0.30%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
4.10	**ELEMENTOS HORIZONTALES METÁLICOS**																
4.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN PERFIL METÁLICO ASTM A572 Gr 50 ARM-150X250X1/2"	kg	5,259.50	16,739.47	88,041,242.47	5,259.50	$ 88,041,242.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5,259.50	$ 88,041,242.47	100.00%	0.80%
4.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN PERFIL METÁLICO ASTM A572 Gr 50 ARM-650X250X1/2"	kg	22,372.50	16,739.47	374,503,792.58	22,372.50	$ 374,503,792.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22,372.50	$ 374,503,792.58	100.00%	3.40%
4.10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN PERFIL METÁLICO ASTM A572 Gr 50 ARM-250X250X1/2"	kg	8,572.20	16,739.47	143,494,084.73	8,572.20	$ 143,494,084.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8,572.20	$ 143,494,084.73	100.00%	1.30%
4.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN PERFIL METÁLICO ASTM A572 Gr 50 ARM I 650X500X3/4"	kg	3,532.50	13,693.66	48,372,853.95	3,532.50	$ 48,372,853.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3,532.50	$ 48,372,853.95	100.00%	0.44%
4.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN PERFIL METÁLICO ASTM A500 Gr C PTE-150X50X4mm	kg	5,966.00	9,959.38	59,417,661.08	5,966.00	$ 59,417,661.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5,966.00	$ 59,417,661.08	100.00%	0.54%
4.11	**CUBIERTA METÁLICA**																
4.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA ASTM A572 Gr 50 ARM-150X250X1/2"	kg	8,242.50	15,010.32	123,722,562.60	8,242.50	$ 123,722,562.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8,242.50	$ 123,722,562.60	100.00%	1.12%
4.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA ASTM A572 Gr 50 ARM-650X250X1/2"	kg	25,826.50	15,010.32	387,664,029.48	25,826.50	$ 387,664,029.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25,826.50	$ 387,664,029.48	100.00%	3.52%
4.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA ASTM A500 Gr C PTE-200X100X6mm	kg	5,024.00	10,984.11	55,184,168.64	5,024.00	$ 55,184,168.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5,024.00	$ 55,184,168.64	100.00%	0.50%
4.11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA ASTM A500 Gr C PTE-150X50X4mm	kg	628.00	10,796.80	6,780,390.40	628.00	$ 6,780,390.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	628.00	$ 6,780,390.40	100.00%	0.06%
4.12	**OTROS ELEMENTOS METÁLICOS**																
4.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERAS METÁLICAS ASTM A500 Gr C PTE-400X200X9mm	kg	3,689.50	12,639.40	46,633,066.30	3,689.50	$ 46,633,066.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3,689.50	$ 46,633,066.30	100.00%	0.42%
4.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERAS METÁLICAS ASTM A500 Gr C PTE-200X100X7mm	kg	706.50	12,894.46	9,109,935.99	706.50	$ 9,109,935.99		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	706.50	$ 9,109,935.99	100.00%	0.08%
4.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERAS METÁLICAS ASTM A36 L 1 1/2"X3/16"	kg	628.00	11,684.90	7,338,117.20	628.00	$ 7,338,117.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	628.00	$ 7,338,117.20	100.00%	0.07%
4.13	**Juntas DE CONSTRUCCIÓN**																
4.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Juntas DE DILATACIÓN JDV 4.12-200 (PLANA) - PARA MUROS	m	26.75	1,473,356.86	39,412,296.01	26.75	$ 39,412,296.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	26.75	$ 39,412,296.01	100.00%	0.36%
4.13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Juntas TIPO JDV 4.12-200 A (ANGULAR) - PARA MUROS	m	13.18	1,716,403.18	22,622,193.91	13.18	$ 22,622,193.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.18	$ 22,622,193.91	100.00%	0.21%
4.13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Juntas TIPO JDH 6.18-210 - PARA PISOS INTERIORES	m	1.50	2,500,834.05	3,751,251.08	1.50	$ 3,751,251.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.50	$ 3,751,251.08	100.00%	0.03%
4.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Juntas TIPO JDH 6.18-210 A (CANTONERA INVISIBLE) - PARA PISOS INTERIORES	m	6.99	2,500,834.05	17,480,830.01	6.99	$ 17,480,830.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.99	$ 17,480,830.01	100.00%	0.16%
4.13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Juntas TIPO JDH 5.06-200 - PARA PISOS EXTERIORES	m	2.70	2,587,103.19	6,985,178.61	2.70	$ 6,985,178.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.70	$ 6,985,178.61	100.00%	0.06%
4.14	**CUBIERTAS EN CONCRETO**																
4.14.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PLACA DE CUBIERTA CON LAMINA COLABORANTE 1-1/2 CAL 18 e=10 cm f'c 24.5 MPa - SOBRE VIGAS DE CONCRETO	m2	427.90	206,442.18	88,336,608.82	427.90	$ 88,336,608.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	427.90	$ 88,336,608.82	100.00%	0.80%
05	**MAMPOSTERÍA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES**																
5.01	**MURO BLOQUE EN CEMENTO**																
5.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO BLOQUE EN CEMENTO X M2 BLOQUE TOLETE 90 X 120 X 390 COLOR JASPEADO	m2	2,043.45	125,187.72	255,814,846.43	2,043.45	$ 255,814,846.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2,043.45	$ 255,814,846.43	100.00%	2.32%
5.01.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO BLOQUE EN CEMENTO X ML BLOQUE TOLETE 90 X 120 X 390 COLOR JASPEADO	m	286.35	46,342.97	13,270,309.46	286.35	$ 13,270,309.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	286.35	$ 13,270,309.46	100.00%	0.12%
5.01.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ENCHAPES BLOQUE EN CEMENTO X M2 BLOQUE TOLETE 90 X 120 X 390 COLOR JASPEADO	m2	484.87	94,030.71	45,592,670.36	484.87	$ 45,592,670.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	484.87	$ 45,592,670.36	100.00%	0.41%
5.01.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ENCHAPES BLOQUE EN CEMENTO X ML BLOQUE TOLETE 90 X 120 X 390 COLOR JASPEADO	m	256.80	46,342.97	11,900,874.70	256.80	$ 11,900,874.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	256.80	$ 11,900,874.70	100.00%	0.11%
5.01.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REMATE EN HILADA PARADA BLOQUE EN CEMENTO X ML BLOQUE TOLETE 90 X 120 X 390 COLOR JASPEADO	m	5.50	51,050.28	280,776.54	5.50	$ 280,776.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.50	$ 280,776.54	100.00%	0.00%
5.02	**MAMPOSTERÍA EN BLOQUE ARCILLA**																
5.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO BLOQUE ARCILLA X M2 BLOQUE No. 4 33 X 9 X 23	m2	144.88	58,354.68	8,454,426.04	144.88	$ 8,454,426.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	144.88	$ 8,454,426.04	100.00%	0.08%
5.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO BLOQUE ARCILLA X ML BLOQUE No. 4 33 X 9 X 23	m	4.00	35,824.53	143,298.12	4.00	$ 143,298.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 143,298.12	100.00%	0.00%
5.02.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MUROS EN FIBROCEMENTO una CARA X M2 ANCLADO A SUBESTRUCTURA DANPAL	m2	16.82	106,459.24	1,790,644.42	16.82	$ 1,790,644.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.82	$ 1,790,644.42	100.00%	0.02%
5.03	**ACEROS Y REFUERZOS EN CONCRETO PARA MAMPOSTERÍAS**																
5.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE COLUMNETAS EN CONCRETO DIM=16,5X8 CMS	m	264.28	28,945.49	7,649,714.10	264.28	$ 7,649,714.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	264.28	$ 7,649,714.10	100.00%	0.07%
5.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DINTELES EN CONCRETO DIM=12X12 CMS	m	65.40	29,509.51	1,929,921.95	65.40	$ 1,929,921.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	65.40	$ 1,929,921.95	100.00%	0.02%
5.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO DIM=12X12 CMS	m	757.10	29,509.51	22,341,650.02	757.10	$ 22,341,650.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	757.10	$ 22,341,650.02	100.00%	0.20%
5.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN CONCRETO - GROUTING DIM=12X12 CMS	m	4,034.68	20,092.32	81,066,081.66	4,034.68	$ 81,066,081.66		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4,034.68	$ 81,066,081.66	100.00%	0.74%
5.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS EN CONCRETO E=10 CMS - f'c = 21 MPa - INCLUYE REFUERZO DE ACERO	m	87.41	84,140.85	7,354,751.70	87.41	$ 7,354,751.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	87.41	$ 7,354,751.70	100.00%	0.07%
5.04	**ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MAMPOSTERÍAS**																
5.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPÓXICO	und	1,400.00	8,092.20	11,329,080.00	1,400.00	$ 11,329,080.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,400.00	$ 11,329,080.00	100.00%	0.10%
5.05	**AISLANTES Y RECUBRIMIENTOS**																
5.05.01	AISLAMIENTO CON LAMINA DE ICOPOR	m2	541.33	7,277.34	3,939,442.46	541.33	$ 3,939,442.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	541.33	$ 3,939,442.46	100.00%	0.04%
06	**PAÑETES**																
6.01	**PAÑETES INTERIORES**																
6.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2	m2	473.79	22,619.64	10,716,959.24	473.79	$ 10,716,959.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	473.79	$ 10,716,959.24	100.00%	0.10%
6.01.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X ML	m	63.65	14,064.99	895,236.61	63.65	$ 895,236.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	63.65	$ 895,236.61	100.00%	0.01%
6.02	**PAÑETES EXTERIORES**																
6.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE EN CONCRETO COLOR BLANCO	m2	151.43	99,182.59	15,019,219.60	151.43	$ 15,019,219.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	151.43	$ 15,019,219.60	100.00%	0.14%
6.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE EN CONCRETO X ML COLOR BLANCO	m	4.15	64,051.15	265,812.27	4.15	$ 265,812.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.15	$ 265,812.27	100.00%	0.00%
6.03	**PAÑETE OTROS ELEMENTOS**																
6.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE X M2	m2	135.68	27,322.17	3,707,072.03	135.68	$ 3,707,072.03		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	135.68	$ 3,707,072.03	100.00%	0.03%
6.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE X ML	m	5.16	17,134.74	88,415.26	5.16	$ 88,415.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.16	$ 88,415.26	100.00%	0.00%
6.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FOSO ASCENSOR X M2	m2	122.13	27,322.17	3,336,856.62	122.13	$ 3,336,856.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	122.13	$ 3,336,856.62	100.00%	0.03%
6.03.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FOSO ASCENSOR X ML	m	34.45	19,017.66	655,158.39	34.45	$ 655,158.39		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.45	$ 655,158.39	100.00%	0.01%
6.03.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE GOTERO BAJO PLACAS	m	92.82	11,582.95	1,075,129.42	92.82	$ 1,075,129.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	92.82	$ 1,075,129.42	100.00%	0.01%
6.03.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REMATES DE CAJAS ,SALIDAS Y REGISTROS	und	246.00	12,599.00	3,099,354.00	246.00	$ 3,099,354.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	246.00	$ 3,099,354.00	100.00%	0.03%
07	**PREFABRICADOS**																
7.01	**ALFAJÍAS EN CONCRETO**																

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
7.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍAS EN CONCRETO TERRAZAS PISO 3	m	72.02	57,647.33	4,151,760.71	72.02	$ 4,151,760.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	72.02	$ 4,151,760.71	100.00%	0.04%
7.02	**GÁRGOLAS EN CONCRETO**																
7.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GÁRGOLAS EN CONCRETO	und	10.00	51,977.00	519,770.00	10.00	$ 519,770.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 519,770.00	100.00%	0.00%
7.03	**PELDAÑOS EN CONCRETO**																
7.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELDAÑOS PREFABRICADOS EN CONCRETO (INTERIORES) ESCALERAS METÁLICAS - DIM 1,40 X,30 M	und	65.00	120,057.91	7,803,764.15	65.00	$ 7,803,764.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	65.00	$ 7,803,764.15	100.00%	0.07%
7.04	**TOPE LLANTAS EN SINTÈTICO**																
7.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE LLANTAS EN SINTÈTICO EN POLIURETANO PARA VEHÍCULO PESADO 60X20X20 CMS	und	10.00	434,596.30	4,345,963.00	10.00	$ 4,345,963.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 4,345,963.00	100.00%	0.04%
08	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS**																
8.01	**ACOMETIDA O RED DE LLENADO DE TANQUES**																
8.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2"	m	129.38	10,267.39	1,328,394.92	129.38	$ 1,328,394.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	129.38	$ 1,328,394.92	100.00%	0.01%
8.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1/2"	und	46.00	7,501.01	345,046.46	46.00	$ 345,046.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	46.00	$ 345,046.46	100.00%	0.00%
8.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TOTALIZADOR 1/2"	und	1.00	221,965.02	221,965.02	1.00	$ 221,965.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 221,965.02	100.00%	0.00%
8.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO BOLA 1/2"	und	20.00	24,820.63	496,412.60	20.00	$ 496,412.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 496,412.60	100.00%	0.00%
8.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR MECÁNICO 1/2"	und	3.00	71,159.43	213,478.29	3.00	$ 213,478.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 213,478.29	100.00%	0.00%
8.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión DRESSER 1/2"	und	1.00	20,423.21	20,423.21	1.00	$ 20,423.21		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 20,423.21	100.00%	0.00%
8.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA 1/2" EN BR	und	1.00	48,478.16	48,478.16	1.00	$ 48,478.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 48,478.16	100.00%	0.00%
8.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 1/2"	und	3.00	64,000.15	192,000.45	3.00	$ 192,000.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 192,000.45	100.00%	0.00%
8.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 1/2"	und	1.00	46,687.43	46,687.43	1.00	$ 46,687.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 46,687.43	100.00%	0.00%
8.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1/2"	und	4.00	11,476.52	45,906.08	4.00	$ 45,906.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 45,906.08	100.00%	0.00%
8.02	**CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**																
8.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 2.1/2"	und	3.00	453,227.17	1,359,681.51	3.00	$ 1,359,681.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,359,681.51	100.00%	0.01%
8.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 1.1/2"	und	1.00	298,552.27	298,552.27	1.00	$ 298,552.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 298,552.27	100.00%	0.00%
8.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO Fundido ROSCA NPT O SIMILAR 3"	und	2.00	590,107.03	1,180,214.06	2.00	$ 1,180,214.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,180,214.06	100.00%	0.01%
8.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	2.00	1,518,986.60	3,037,973.20	2.00	$ 3,037,973.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,037,973.20	100.00%	0.03%
8.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 2.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	3.00	993,992.85	2,981,978.55	3.00	$ 2,981,978.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 2,981,978.55	100.00%	0.03%
8.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	1.00	565,263.52	565,263.52	1.00	$ 565,263.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 565,263.52	100.00%	0.01%
8.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 1.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	2.00	391,918.20	783,836.40	2.00	$ 783,836.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 783,836.40	100.00%	0.01%
8.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión FLEXIBLE BORRACHA 3"	und	2.00	237,352.89	474,705.78	2.00	$ 474,705.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 474,705.78	100.00%	0.00%
8.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión FLEXIBLE BORRACHA 2.1/2"	und	2.00	214,950.17	429,900.34	2.00	$ 429,900.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 429,900.34	100.00%	0.00%
8.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE universal 1.1/2"	und	1.00	49,175.22	49,175.22	1.00	$ 49,175.22		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 49,175.22	100.00%	0.00%
8.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO 1.1/2"	und	1.00	423,796.11	423,796.11	1.00	$ 423,796.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 423,796.11	100.00%	0.00%
8.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA - TIPO 1.3" X 1.1/2"	und	2.00	162,466.17	324,932.34	2.00	$ 324,932.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 324,932.34	100.00%	0.00%
8.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA EXCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA ASMT-A351 - TIPO 1 2.1/2" X 1.1/2"	und	2.00	464,666.59	929,333.18	2.00	$ 929,333.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 929,333.18	100.00%	0.01%
8.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2"	und	1.00	185,069.23	185,069.23	1.00	$ 185,069.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 185,069.23	100.00%	0.00%
8.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2.1/2"	und	2.00	14,144.13	28,288.26	2.00	$ 28,288.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 28,288.26	100.00%	0.00%
8.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	und	2.00	12,093.66	24,187.32	2.00	$ 24,187.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 24,187.32	100.00%	0.00%
8.02.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 3"	m	4.96	70,634.31	350,346.18	4.96	$ 350,346.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.96	$ 350,346.18	100.00%	0.00%
8.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 2.1/2"	m	4.09	76,227.13	311,768.96	4.09	$ 311,768.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.09	$ 311,768.96	100.00%	0.00%
8.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 1.1/2"	m	18.95	36,178.96	685,591.29	18.95	$ 685,591.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.95	$ 685,591.29	100.00%	0.01%
8.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 3"	und	3.00	56,987.90	170,963.70	3.00	$ 170,963.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 170,963.70	100.00%	0.00%
8.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 2.1/2"	und	7.00	47,498.29	332,488.03	7.00	$ 332,488.03		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 332,488.03	100.00%	0.00%
8.02.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 1.1/2"	und	18.00	24,507.16	441,128.88	18.00	$ 441,128.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.00	$ 441,128.88	100.00%	0.00%
8.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 2"	und	4.28	47,628.04	203,848.01	4.28	$ 203,848.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.28	$ 203,848.01	100.00%	0.00%
8.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 2"	und	2.00	28,606.54	57,213.08	2.00	$ 57,213.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 57,213.08	100.00%	0.00%
8.03	**CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**																
8.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 2.1/2"	und	3.00	453,227.17	1,359,681.51	3.00	$ 1,359,681.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,359,681.51	100.00%	0.01%
8.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 1.1/2"	und	1.00	298,552.27	298,552.27	1.00	$ 298,552.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 298,552.27	100.00%	0.00%
8.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO Fundido ROSCA NPT O SIMILAR 3"	und	2.00	590,107.03	1,180,214.06	2.00	$ 1,180,214.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,180,214.06	100.00%	0.01%
8.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	2.00	1,518,986.60	3,037,973.20	2.00	$ 3,037,973.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,037,973.20	100.00%	0.03%
8.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 2.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	3.00	993,992.85	2,981,978.55	3.00	$ 2,981,978.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 2,981,978.55	100.00%	0.03%
8.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	1.00	565,263.52	565,263.52	1.00	$ 565,263.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 565,263.52	100.00%	0.01%
8.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 1.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	3.00	391,918.20	1,175,754.60	3.00	$ 1,175,754.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,175,754.60	100.00%	0.01%
8.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión FLEXIBLE BORRACHA 3"	und	2.00	237,352.89	474,705.78	2.00	$ 474,705.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 474,705.78	100.00%	0.00%
8.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión FLEXIBLE BORRACHA 2.1/2"	und	2.00	214,950.17	429,900.34	2.00	$ 429,900.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 429,900.34	100.00%	0.00%
8.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE universal 1.1/2"	und	1.00	49,175.22	49,175.22	1.00	$ 49,175.22		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 49,175.22	100.00%	0.00%
8.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO 1.1/2"	und	1.00	423,796.11	423,796.11	1.00	$ 423,796.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 423,796.11	100.00%	0.00%
8.03.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA - TIPO 1.3"X2"	und	2.00	162,466.17	324,932.34	2.00	$ 324,932.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 324,932.34	100.00%	0.00%
8.03.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA EXCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA ASMT-A351 - TIPO 1 2.1/2"X2"	und	2.00	464,666.59	929,333.18	2.00	$ 929,333.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 929,333.18	100.00%	0.01%
8.03.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2"	und	1.00	185,069.23	185,069.23	1.00	$ 185,069.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 185,069.23	100.00%	0.00%
8.03.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2-1/2"	und	2.00	14,144.13	28,288.26	2.00	$ 28,288.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 28,288.26	100.00%	0.00%
8.03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	und	2.00	12,093.66	24,187.32	2.00	$ 24,187.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 24,187.32	100.00%	0.00%
8.03.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 3"	m	5.33	70,634.31	376,480.87	5.33	$ 376,480.87		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.33	$ 376,480.87	100.00%	0.00%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
8.03.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 2,1/2"	m	4.03	76,227.13	307,195.33	4.03	$ 307,195.33		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.03	$ 307,195.33	100.00%	0.00%
8.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 1.1/2"	m	19.97	36,178.96	722,493.83	19.97	$ 722,493.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	19.97	$ 722,493.83	100.00%	0.01%
8.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 3"	und	3.00	56,987.90	170,963.70	3.00	$ 170,963.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 170,963.70	100.00%	0.00%
8.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 2,1/2"	und	3.00	47,498.29	142,494.87	3.00	$ 142,494.87		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 142,494.87	100.00%	0.00%
8.03.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 1.1/2"	und	11.00	24,507.16	269,578.76	11.00	$ 269,578.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 269,578.76	100.00%	0.00%
8.04	**CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO**																
8.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4"	m	11.85	78,565.41	931,000.11	11.85	$ 931,000.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.85	$ 931,000.11	100.00%	0.01%
8.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 1.1/2"	m	3.30	73,792.70	243,515.91	3.30	$ 243,515.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.30	$ 243,515.91	100.00%	0.00%
8.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS RANURADOS 4"	und	12.00	67,938.32	815,259.84	12.00	$ 815,259.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 815,259.84	100.00%	0.01%
8.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS RANURADOS 1.1/2"	und	2.00	52,131.52	104,263.04	2.00	$ 104,263.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 104,263.04	100.00%	0.00%
8.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RÍGIDO EN HIERRO DÚCTIL DE UNIÓN RANURADA 4"	und	38.00	72,270.01	2,746,260.38	38.00	$ 2,746,260.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	38.00	$ 2,746,260.38	100.00%	0.02%
8.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RÍGIDO EN HIERRO DÚCTIL DE unión RANURADA 1.1/2"	und	10.00	48,888.89	488,888.90	10.00	$ 488,888.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 488,888.90	100.00%	0.00%
8.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SENSOR DE FLUJO 4"	und	1.00	1,145,206.48	1,145,206.48	1.00	$ 1,145,206.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,145,206.48	100.00%	0.01%
8.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VÁSTAGO OS&Y ASCENDENTE LISTADO 4"	und	2.00	2,094,984.57	4,189,969.14	2.00	$ 4,189,969.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 4,189,969.14	100.00%	0.04%
8.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VÁSTAGO OS&Y ASCENDENTE LISTADO 2"	und	1.00	424,211.14	424,211.14	1.00	$ 424,211.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 424,211.14	100.00%	0.00%
8.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 4"	und	2.00	3,100,297.85	6,200,595.70	2.00	$ 6,200,595.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 6,200,595.70	100.00%	0.06%
8.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 1-1/2"	und	1.00	493,882.92	493,882.92	1.00	$ 493,882.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 493,882.92	100.00%	0.00%
8.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA 1-1/2"	und	1.00	275,223.04	275,223.04	1.00	$ 275,223.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 275,223.04	100.00%	0.00%
8.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO 4"	und	1.00	1,565,826.65	1,565,826.65	1.00	$ 1,565,826.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,565,826.65	100.00%	0.01%
8.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO 2"	und	1.00	370,590.63	370,590.63	1.00	$ 370,590.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 370,590.63	100.00%	0.00%
8.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE GLICERINA-300 PSI	und	5.00	120,656.91	603,284.55	5.00	$ 603,284.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 603,284.55	100.00%	0.01%
8.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2"	m	8.94	76,033.86	679,742.71	8.94	$ 679,742.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.94	$ 679,742.71	100.00%	0.01%
8.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO COBRE 1/2"	und	33.00	26,383.10	870,642.30	33.00	$ 870,642.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	33.00	$ 870,642.30	100.00%	0.01%
8.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE 1/2"	und	4.00	114,907.03	459,628.12	4.00	$ 459,628.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 459,628.12	100.00%	0.00%
8.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE universal 1/2" COBRE	und	4.00	26,383.10	105,532.40	4.00	$ 105,532.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 105,532.40	100.00%	0.00%
8.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2"	und	8.00	20,313.73	162,509.84	8.00	$ 162,509.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 162,509.84	100.00%	0.00%
8.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ANTI VÓRTICE 4" DE UNIÓN SOLDADA- NFPA 20	und	1.00	263,642.74	263,642.74	1.00	$ 263,642.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 263,642.74	100.00%	0.00%
8.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2"	und	1.00	352,310.68	352,310.68	1.00	$ 352,310.68		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 352,310.68	100.00%	0.00%
8.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES ANTISÍSMICOS 4"	und	2.00	20,368.64	40,737.28	2.00	$ 40,737.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 40,737.28	100.00%	0.00%
8.05	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**																
8.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 2 1/2"	m	5.09	47,409.86	241,316.19	5.09	$ 241,316.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.09	$ 241,316.19	100.00%	0.00%
8.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 2"	m	11.68	31,874.63	372,295.68	11.68	$ 372,295.68		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.68	$ 372,295.68	100.00%	0.00%
8.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1.1/2"	m	8.44	23,755.36	200,495.24	8.44	$ 200,495.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.44	$ 200,495.24	100.00%	0.00%
8.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1.1/4"	m	47.67	19,318.26	920,901.45	47.67	$ 920,901.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	47.67	$ 920,901.45	100.00%	0.01%
8.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1"	m	50.23	13,231.79	664,632.81	50.23	$ 664,632.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.23	$ 664,632.81	100.00%	0.01%
8.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=11 3/4"	m	54.87	12,547.56	688,484.62	54.87	$ 688,484.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	54.87	$ 688,484.62	100.00%	0.01%
8.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=9 1/2"	m	200.34	10,267.39	2,056,968.91	200.34	$ 2,056,968.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	200.34	$ 2,056,968.91	100.00%	0.02%
8.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 2 1/2"	und	14.00	47,498.29	664,976.06	14.00	$ 664,976.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 664,976.06	100.00%	0.01%
8.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 2"	und	4.00	28,606.54	114,426.16	4.00	$ 114,426.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 114,426.16	100.00%	0.00%
8.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1.1/2"	und	5.00	15,649.82	78,249.10	5.00	$ 78,249.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 78,249.10	100.00%	0.00%
8.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1.1/4"	und	20.00	16,211.33	324,226.60	20.00	$ 324,226.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 324,226.60	100.00%	0.00%
8.05.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1"	und	21.00	10,433.23	219,097.83	21.00	$ 219,097.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	21.00	$ 219,097.83	100.00%	0.00%
8.05.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 3/4"	und	36.00	6,208.43	223,503.48	36.00	$ 223,503.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	36.00	$ 223,503.48	100.00%	0.00%
8.05.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1/2"	und	162.00	4,985.87	807,710.94	162.00	$ 807,710.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	162.00	$ 807,710.94	100.00%	0.01%
8.05.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1.1/4"	und	2.00	119,011.64	238,023.28	2.00	$ 238,023.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 238,023.28	100.00%	0.00%
8.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1"	und	3.00	92,056.34	276,169.02	3.00	$ 276,169.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 276,169.02	100.00%	0.00%
8.05.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 3/4"	und	2.00	66,593.98	133,187.96	2.00	$ 133,187.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 133,187.96	100.00%	0.00%
8.05.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1/2"	und	16.00	25,596.83	409,549.28	16.00	$ 409,549.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 409,549.28	100.00%	0.00%
8.05.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	und	1.00	405,310.50	405,310.50	1.00	$ 405,310.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 405,310.50	100.00%	0.00%
8.05.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2.1/2"	und	2.00	14,144.13	28,288.26	2.00	$ 28,288.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 28,288.26	100.00%	0.00%
8.05.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2"	und	4.00	13,089.35	52,357.40	4.00	$ 52,357.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 52,357.40	100.00%	0.00%
8.05.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	und	3.00	12,093.66	36,280.98	3.00	$ 36,280.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 36,280.98	100.00%	0.00%
8.05.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/4"	und	16.00	12,488.64	199,818.24	16.00	$ 199,818.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 199,818.24	100.00%	0.00%
8.05.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1"	und	17.00	12,331.22	209,630.74	17.00	$ 209,630.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	17.00	$ 209,630.74	100.00%	0.00%
8.05.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3/4"	und	19.00	11,425.28	217,080.32	19.00	$ 217,080.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	19.00	$ 217,080.32	100.00%	0.00%
8.05.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1/2"	und	67.00	11,476.52	768,926.84	67.00	$ 768,926.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	67.00	$ 768,926.84	100.00%	0.01%
8.05.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1.1/2"	und	2.00	7,232.40	14,464.80	2.00	$ 14,464.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 14,464.80	100.00%	0.00%
8.05.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1.1/4"	und	2.00	7,089.93	14,179.86	2.00	$ 14,179.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 14,179.86	100.00%	0.00%
8.05.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1"	und	3.00	6,932.50	20,797.50	3.00	$ 20,797.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 20,797.50	100.00%	0.00%
8.06	**RED SUMINISTRO RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**																
8.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 2 1/2"	m	15.49	47,409.86	734,378.73	15.49	$ 734,378.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.49	$ 734,378.73	100.00%	0.01%
8.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 2"	m	36.03	31,874.63	1,148,442.92	36.03	$ 1,148,442.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	36.03	$ 1,148,442.92	100.00%	0.01%
8.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1.1/2"	m	65.87	23,755.36	1,564,765.56	65.87	$ 1,564,765.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	65.87	$ 1,564,765.56	100.00%	0.01%
8.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1.1/4"	m	87.71	18,263.39	1,601,881.94	87.71	$ 1,601,881.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	87.71	$ 1,601,881.94	100.00%	0.01%
8.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 1"	m	6.42	13,231.79	84,948.09	6.42	$ 84,948.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.42	$ 84,948.09	100.00%	0.00%
8.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=11 3/4"	m	7.57	12,547.56	94,985.03	7.57	$ 94,985.03		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.57	$ 94,985.03	100.00%	0.00%
8.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=9 1/2"	m	177.76	10,175.47	1,808,791.55	177.76	$ 1,808,791.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	177.76	$ 1,808,791.55	100.00%	0.02%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**		
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA	
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$	14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$	14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**		
	1-mar-26 / 31-mar-26	**CONTRATISTA OBRA:**	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1	
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1	

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
8.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 2 1/2"	und	7.00	47,498.29	332,488.03	7.00	$ 332,488.03		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 332,488.03	100.00%	0.00%
8.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 2"	und	11.00	28,606.54	314,671.94	11.00	$ 314,671.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 314,671.94	100.00%	0.00%
8.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1.1/2"	und	36.00	15,649.82	563,393.52	36.00	$ 563,393.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	36.00	$ 563,393.52	100.00%	0.01%
8.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1.1/4"	und	85.00	16,211.33	1,377,963.05	85.00	$ 1,377,963.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	85.00	$ 1,377,963.05	100.00%	0.01%
8.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1"	und	3.00	10,433.23	31,299.69	3.00	$ 31,299.69		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 31,299.69	100.00%	0.00%
8.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 3/4"	und	10.00	6,208.43	62,084.30	10.00	$ 62,084.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 62,084.30	100.00%	0.00%
8.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P 1/2"	und	123.00	4,985.87	613,262.01	123.00	$ 613,262.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	123.00	$ 613,262.01	100.00%	0.01%
8.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 2"	und	1.00	101,168.96	101,168.96	1.00	$ 101,168.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 101,168.96	100.00%	0.00%
8.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1.1/2"	und	3.00	85,879.33	257,637.99	3.00	$ 257,637.99		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 257,637.99	100.00%	0.00%
8.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1.1/4"	und	7.00	119,011.64	833,081.48	7.00	$ 833,081.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 833,081.48	100.00%	0.01%
8.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1"	und	1.00	92,056.34	92,056.34	1.00	$ 92,056.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 92,056.34	100.00%	0.00%
8.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1/2"	und	16.00	25,880.79	414,092.64	16.00	$ 414,092.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 414,092.64	100.00%	0.00%
8.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	und	1.00	405,310.50	405,310.50	1.00	$ 405,310.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 405,310.50	100.00%	0.00%
8.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2.1/2"	und	6.00	14,144.13	84,864.78	6.00	$ 84,864.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 84,864.78	100.00%	0.00%
8.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2"	und	13.00	13,089.35	170,161.55	13.00	$ 170,161.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.00	$ 170,161.55	100.00%	0.00%
8.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	und	22.00	12,631.11	277,884.42	22.00	$ 277,884.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.00	$ 277,884.42	100.00%	0.00%
8.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/4"	und	30.00	12,488.64	374,659.20	30.00	$ 374,659.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 374,659.20	100.00%	0.00%
8.06.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3/4"	und	3.00	11,425.28	34,275.84	3.00	$ 34,275.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 34,275.84	100.00%	0.00%
8.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1/2"	und	60.00	11,476.52	688,591.20	60.00	$ 688,591.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 688,591.20	100.00%	0.01%
8.06.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 2"	und	3.00	7,690.63	23,071.89	3.00	$ 23,071.89		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 23,071.89	100.00%	0.00%
8.06.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1"	und	2.00	6,932.50	13,865.00	2.00	$ 13,865.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 13,865.00	100.00%	0.00%
8.07	**RED SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE**																
8.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 1.1/2"	m	13.42	111,714.85	1,499,213.29	13.42	$ 1,499,213.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.42	$ 1,499,213.29	100.00%	0.01%
8.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 1.1/4"	m	23.89	100,224.90	2,394,372.86	23.89	$ 2,394,372.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	23.89	$ 2,394,372.86	100.00%	0.02%
8.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 1"	m	28.07	73,442.12	2,061,520.31	28.07	$ 2,061,520.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	28.07	$ 2,061,520.31	100.00%	0.02%
8.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 3/4"	m	139.22	60,497.96	8,422,525.99	139.22	$ 8,422,525.99		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	139.22	$ 8,422,525.99	100.00%	0.08%
8.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 1/2"	m	117.78	55,424.05	6,527,844.61	117.78	$ 6,527,844.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	117.78	$ 6,527,844.61	100.00%	0.06%
8.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CPVC 1.1/2"	und	10.00	8,451.43	84,514.30	10.00	$ 84,514.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 84,514.30	100.00%	0.00%
8.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CPVC 1.1/4"	und	6.00	7,772.62	46,635.72	6.00	$ 46,635.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 46,635.72	100.00%	0.00%
8.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CPVC 1"	und	7.00	7,575.95	53,031.65	7.00	$ 53,031.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 53,031.65	100.00%	0.00%
8.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CPVC 3/4"	und	110.00	7,252.73	797,800.30	110.00	$ 797,800.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	110.00	$ 797,800.30	100.00%	0.01%
8.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CPVC 1/2"	und	79.00	6,050.95	478,025.05	79.00	$ 478,025.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	79.00	$ 478,025.05	100.00%	0.00%
8.07.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1.1/4"	und	1.00	119,011.64	119,011.64	1.00	$ 119,011.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 119,011.64	100.00%	0.00%
8.07.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 3/4"	und	3.00	66,593.98	199,781.94	3.00	$ 199,781.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 199,781.94	100.00%	0.00%
8.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO PESADO 1/2"	und	21.00	25,596.83	537,533.43	21.00	$ 537,533.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	21.00	$ 537,533.43	100.00%	0.00%
8.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BALANCEADORA DE FLUJO 1/2"	und	8.00	65,450.46	523,603.68	8.00	$ 523,603.68		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 523,603.68	100.00%	0.00%
8.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 1.1/2"	m	13.42	9,606.41	128,918.02	13.42	$ 128,918.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.42	$ 128,918.02	100.00%	0.00%
8.07.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 1.1/4"	m	23.89	8,973.30	214,372.14	23.89	$ 214,372.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	23.89	$ 214,372.14	100.00%	0.00%
8.07.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 1"	m	28.07	8,403.39	235,883.16	28.07	$ 235,883.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	28.07	$ 235,883.16	100.00%	0.00%
8.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 3/4"	m	74.25	7,890.48	585,868.14	74.25	$ 585,868.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	74.25	$ 585,868.14	100.00%	0.01%
8.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX 1/2"	m	57.56	7,428.85	427,604.61	57.56	$ 427,604.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	57.56	$ 427,604.61	100.00%	0.00%
8.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2"	und	5.00	12,093.66	60,468.30	5.00	$ 60,468.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 60,468.30	100.00%	0.00%
8.07.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/4"	und	8.00	12,488.64	99,909.12	8.00	$ 99,909.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 99,909.12	100.00%	0.00%
8.07.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1"	und	10.00	12,331.22	123,312.20	10.00	$ 123,312.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 123,312.20	100.00%	0.00%
8.07.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3/4"	und	47.00	11,425.28	536,988.16	47.00	$ 536,988.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	47.00	$ 536,988.16	100.00%	0.00%
8.07.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1/2"	und	40.00	11,476.52	459,060.80	40.00	$ 459,060.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	40.00	$ 459,060.80	100.00%	0.00%
8.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 1.1/4"	und	3.00	7,089.93	21,269.79	3.00	$ 21,269.79		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 21,269.79	100.00%	0.00%
8.07.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 3/4"	und	3.00	6,026.57	18,079.71	3.00	$ 18,079.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 18,079.71	100.00%	0.00%
8.07.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 3/4"	und	8.00	391,288.66	3,130,309.28	8.00	$ 3,130,309.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 3,130,309.28	100.00%	0.03%
8.08	**RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES**																
8.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 160MM	m	50.28	59,741.22	3,003,788.54	50.28	$ 3,003,788.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.28	$ 3,003,788.54	100.00%	0.03%
8.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 110MM	m	69.41	29,410.87	2,041,408.49	69.41	$ 2,041,408.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	69.41	$ 2,041,408.49	100.00%	0.02%
8.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 160MM	und	9.00	106,020.97	954,188.73	9.00	$ 954,188.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 954,188.73	100.00%	0.01%
8.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 110MM	und	12.00	47,151.49	565,817.88	12.00	$ 565,817.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 565,817.88	100.00%	0.01%
8.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 4"	m	196.37	44,668.76	8,771,604.40	196.37	$ 8,771,604.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	196.37	$ 8,771,604.40	100.00%	0.08%
8.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	m	103.98	34,602.30	3,597,947.15	103.98	$ 3,597,947.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	103.98	$ 3,597,947.15	100.00%	0.03%
8.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 2"	m	152.39	24,243.06	3,694,399.91	152.39	$ 3,694,399.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	152.39	$ 3,694,399.91	100.00%	0.03%
8.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-L 4"	m	50.97	44,668.76	2,276,766.70	50.97	$ 2,276,766.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.97	$ 2,276,766.70	100.00%	0.02%
8.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-L 3"	m	5.14	34,602.30	177,855.82	5.14	$ 177,855.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.14	$ 177,855.82	100.00%	0.00%
8.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-L 2"	m	118.90	24,243.06	2,882,499.83	118.90	$ 2,882,499.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	118.90	$ 2,882,499.83	100.00%	0.03%
8.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S 4"	und	246.00	24,647.39	6,063,257.94	246.00	$ 6,063,257.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	246.00	$ 6,063,257.94	100.00%	0.05%
8.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S 3"	und	94.00	18,092.56	1,700,700.64	94.00	$ 1,700,700.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	94.00	$ 1,700,700.64	100.00%	0.02%
8.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S 2"	und	269.00	12,533.49	3,371,508.81	269.00	$ 3,371,508.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	269.00	$ 3,371,508.81	100.00%	0.03%
8.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"	und	22.00	89,565.43	1,970,439.46	22.00	$ 1,970,439.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.00	$ 1,970,439.46	100.00%	0.02%
8.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4"	und	66.00	17,290.58	1,141,178.28	66.00	$ 1,141,178.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	66.00	$ 1,141,178.28	100.00%	0.01%
8.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3"	und	35.00	15,224.42	532,854.70	35.00	$ 532,854.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 532,854.70	100.00%	0.00%
8.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2"	und	51.00	13,089.35	667,556.85	51.00	$ 667,556.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	51.00	$ 667,556.85	100.00%	0.01%
8.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 4"	und	14.00	12,463.76	174,492.64	14.00	$ 174,492.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 174,492.64	100.00%	0.00%
8.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS 3"	und	6.00	9,801.80	58,810.80	6.00	$ 58,810.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 58,810.80	100.00%	0.00%
8.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 6"	und	3.00	32,174.08	96,522.24	3.00	$ 96,522.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 96,522.24	100.00%	0.00%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
8.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 4"	und	6.00	26,300.48	157,802.88	6.00	$ 157,802.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 157,802.88	100.00%	0.00%
8.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 2 1/2"	und	4.00	13,957.46	55,829.84	4.00	$ 55,829.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 55,829.84	100.00%	0.00%
8.09	**RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS**																
8.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 315MM	m	53.40	85,483.99	4,564,845.07	53.40	$ 4,564,845.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	53.40	$ 4,564,845.07	100.00%	0.04%
8.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 250MM	m	10.03	24,158.13	242,306.04	10.03	$ 242,306.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.03	$ 242,306.04	100.00%	0.00%
8.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 200MM	m	6.13	75,711.88	464,113.82	6.13	$ 464,113.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.13	$ 464,113.82	100.00%	0.00%
8.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 160MM	m	38.39	59,741.22	2,293,465.44	38.39	$ 2,293,465.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	38.39	$ 2,293,465.44	100.00%	0.02%
8.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 110MM	m	31.34	29,410.87	921,736.67	31.34	$ 921,736.67		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	31.34	$ 921,736.67	100.00%	0.01%
8.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 315MM	und	9.00	465,880.68	4,192,926.12	9.00	$ 4,192,926.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 4,192,926.12	100.00%	0.04%
8.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 250MM	und	2.00	321,496.08	642,992.16	2.00	$ 642,992.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 642,992.16	100.00%	0.01%
8.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 200MM	und	2.00	164,889.30	329,778.60	2.00	$ 329,778.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 329,778.60	100.00%	0.00%
8.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 160MM	und	7.00	106,020.97	742,146.79	7.00	$ 742,146.79		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 742,146.79	100.00%	0.01%
8.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 110MM	und	6.00	47,151.49	282,908.94	6.00	$ 282,908.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 282,908.94	100.00%	0.00%
8.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIAM= 6"	m	34.04	81,516.23	2,774,812.47	34.04	$ 2,774,812.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.04	$ 2,774,812.47	100.00%	0.03%
8.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIAM= 4"	m	453.09	44,668.76	20,238,968.47	453.09	$ 20,238,968.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	453.09	$ 20,238,968.47	100.00%	0.18%
8.09.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIAM= 3"	m	98.38	34,602.30	3,404,174.27	98.38	$ 3,404,174.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	98.38	$ 3,404,174.27	100.00%	0.03%
8.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIAM= 2"	m	31.00	24,243.06	751,534.86	31.00	$ 751,534.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	31.00	$ 751,534.86	100.00%	0.01%
8.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 6"	und	5.00	96,291.90	481,459.50	5.00	$ 481,459.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 481,459.50	100.00%	0.00%
8.09.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 4"	und	259.00	24,647.39	6,383,674.01	259.00	$ 6,383,674.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	259.00	$ 6,383,674.01	100.00%	0.06%
8.09.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 3"	und	29.00	18,092.56	524,684.24	29.00	$ 524,684.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	29.00	$ 524,684.24	100.00%	0.00%
8.09.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 2"	und	3.00	12,533.49	37,600.47	3.00	$ 37,600.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 37,600.47	100.00%	0.00%
8.09.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE 4"	und	12.00	56,046.37	672,556.44	12.00	$ 672,556.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 672,556.44	100.00%	0.01%
8.09.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 4"	und	14.00	43,285.24	605,993.36	14.00	$ 605,993.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 605,993.36	100.00%	0.01%
8.09.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 3"	und	3.00	27,411.55	82,234.65	3.00	$ 82,234.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 82,234.65	100.00%	0.00%
8.09.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4"	und	152.00	17,290.58	2,628,168.16	152.00	$ 2,628,168.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	152.00	$ 2,628,168.16	100.00%	0.02%
8.09.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3"	und	33.00	15,224.42	502,405.86	33.00	$ 502,405.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	33.00	$ 502,405.86	100.00%	0.00%
8.09.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DIAM= 4"	und	15.00	12,463.76	186,956.40	15.00	$ 186,956.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 186,956.40	100.00%	0.00%
8.09.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DIAM= 3"	und	6.00	9,801.80	58,810.80	6.00	$ 58,810.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 58,810.80	100.00%	0.00%
8.09.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 6"	und	9.00	32,174.08	289,566.72	9.00	$ 289,566.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 289,566.72	100.00%	0.00%
8.09.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN + FILTRO CON GRAVA 4"	und	22.00	64,560.34	1,420,327.48	22.00	$ 1,420,327.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.00	$ 1,420,327.48	100.00%	0.01%
8.10	**RED GENERAL DE DESAGÜES DE AIRE ACONDICIONADO**																
8.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 DIAM= 1"	m	18.39	13,231.79	243,332.62	18.39	$ 243,332.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.39	$ 243,332.62	100.00%	0.00%
8.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P DIAM= 1"	und	9.00	10,433.23	93,899.07	9.00	$ 93,899.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 93,899.07	100.00%	0.00%
8.10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1"	und	7.00	8,467.16	59,270.12	7.00	$ 59,270.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 59,270.12	100.00%	0.00%
8.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DIAM= 1"	und	2.00	6,932.50	13,865.00	2.00	$ 13,865.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 13,865.00	100.00%	0.00%
8.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 3"	und	2.00	22,939.67	45,879.34	2.00	$ 45,879.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 45,879.34	100.00%	0.00%
8.10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE 1.1/4"	und	4.00	15,758.95	63,035.80	4.00	$ 63,035.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 63,035.80	100.00%	0.00%
8.11	**Puntos HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA**																
8.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F LAVAMANOS 1/2"	und	25.00	62,831.57	1,570,789.25	25.00	$ 1,570,789.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 1,570,789.25	100.00%	0.01%
8.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F DUCHA 1/2"	und	30.00	62,831.57	1,884,947.10	30.00	$ 1,884,947.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 1,884,947.10	100.00%	0.02%
8.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F DUCHA DE EMERGENCIA 1.1/4"	und	1.00	98,271.51	98,271.51	1.00	$ 98,271.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 98,271.51	100.00%	0.00%
8.11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F LAVAPLATOS 1/2"	und	2.00	62,831.57	125,663.14	2.00	$ 125,663.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 125,663.14	100.00%	0.00%
8.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F LAVADORA 1/2"	und	4.00	63,758.72	255,034.88	4.00	$ 255,034.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 255,034.88	100.00%	0.00%
8.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F CALENTADOR 3/4"	und	2.00	70,483.62	140,967.24	2.00	$ 140,967.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 140,967.24	100.00%	0.00%
8.12	**Puntos HIDRÁULICOS RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**																
8.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F.ALL ORINAL 3/4"	und	8.00	69,200.85	553,606.80	8.00	$ 553,606.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 553,606.80	100.00%	0.01%
8.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F.ALL SANITARIO DE TANQUE 1/2"	und	4.00	62,714.32	250,857.28	4.00	$ 250,857.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 250,857.28	100.00%	0.00%
8.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F.ALL SANITARIO DE FLUXÓMETRO 1.1/4"	und	16.00	96,410.66	1,542,570.56	16.00	$ 1,542,570.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 1,542,570.56	100.00%	0.01%
8.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F.ALL LLAVE MANGUERA 1/2"	und	12.00	62,714.32	752,571.84	12.00	$ 752,571.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 752,571.84	100.00%	0.01%
8.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.F.ALL POCETA DE ASEO 1/2"	und	5.00	62,714.32	313,571.60	5.00	$ 313,571.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 313,571.60	100.00%	0.00%
8.13	**Puntos HIDRÁULICOS DE AGUA CALIENTE**																
8.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.C DUCHA 1/2"	und	30.00	46,901.54	1,407,046.20	30.00	$ 1,407,046.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 1,407,046.20	100.00%	0.01%
8.13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.C LAVADORA 1/2"	und	4.00	46,489.18	185,956.72	4.00	$ 185,956.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 185,956.72	100.00%	0.00%
8.13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Punto HIDRÁULICO A.C CALENTADOR 3/4"	und	2.00	49,300.26	98,600.52	2.00	$ 98,600.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 98,600.52	100.00%	0.00%
8.14	**SALIDAS SANITARIAS**																
8.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIO FLUXÓMETRO 4"	und	16.00	80,619.23	1,289,907.68	16.00	$ 1,289,907.68		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 1,289,907.68	100.00%	0.01%
8.14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIO TANQUE 4"	und	4.00	80,619.23	322,476.92	4.00	$ 322,476.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 322,476.92	100.00%	0.00%
8.14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LAVAMANOS 2"	und	25.00	59,291.46	1,482,286.50	25.00	$ 1,482,286.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 1,482,286.50	100.00%	0.01%
8.14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DUCHA 2"	und	30.00	32,747.05	982,411.50	30.00	$ 982,411.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 982,411.50	100.00%	0.01%
8.14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DUCHA 4"	und	1.00	79,150.52	79,150.52	1.00	$ 79,150.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 79,150.52	100.00%	0.00%
8.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LAVAPLATOS 2"	und	2.00	39,085.47	78,170.94	2.00	$ 78,170.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 78,170.94	100.00%	0.00%
8.14.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LAVADORA 2"	und	4.00	39,085.47	156,341.88	4.00	$ 156,341.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 156,341.88	100.00%	0.00%
8.14.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA POCETA ASEO 2"	und	5.00	39,085.47	195,427.35	5.00	$ 195,427.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 195,427.35	100.00%	0.00%
8.14.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ORINAL 2"	und	8.00	39,085.47	312,683.76	8.00	$ 312,683.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 312,683.76	100.00%	0.00%
8.14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SIFÓN 3"	und	7.00	111,057.53	777,402.71	7.00	$ 777,402.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 777,402.71	100.00%	0.01%
8.14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SIFÓN 2"	und	29.00	40,012.62	1,160,365.98	29.00	$ 1,160,365.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	29.00	$ 1,160,365.98	100.00%	0.01%
8.14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SIFÓN 4"	und	7.00	47,595.76	333,170.32	7.00	$ 333,170.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 333,170.32	100.00%	0.00%
8.15	**RED DE CARGA POZO EYECTOR RED DE AGUAS RESIDUALES**																

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
8.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE=21 DIAM=1 1/2"	m	59.00	23,755.36	1,401,566.24	59.00	$ 1,401,566.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	59.00	$ 1,401,566.24	100.00%	0.01%
8.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-P DIAM= 1 1/2"	und	11.00	15,649.82	172,148.02	11.00	$ 172,148.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 172,148.02	100.00%	0.00%
8.15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DIAM=1 1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT.	und	2.00	50,905.30	101,810.60	2.00	$ 101,810.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 101,810.60	100.00%	0.00%
8.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO DIAM=1 1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT.	und	2.00	44,567.98	89,135.96	2.00	$ 89,135.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 89,135.96	100.00%	0.00%
8.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unión universal DIAM=1 1/2" PVC ROSCA NPT.	und	2.00	10,815.75	21,631.50	2.00	$ 21,631.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 21,631.50	100.00%	0.00%
8.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DIAM= 1 1/2"	und	2.00	12,279.49	24,558.98	2.00	$ 24,558.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 24,558.98	100.00%	0.00%
8.16	**RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO**																
8.16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C900 4"	m	48.40	141,612.77	6,854,058.07	48.40	$ 6,854,058.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	48.40	$ 6,854,058.07	100.00%	0.06%
8.16.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD10 4"	m	51.72	81,596.68	4,220,180.29	51.72	$ 4,220,180.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	51.72	$ 4,220,180.29	100.00%	0.04%
8.16.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD10 3"	m	0.50	67,210.99	33,605.50	0.50	$ 33,605.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.50	$ 33,605.50	100.00%	0.00%
8.16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD10 2.1/2"	m	89.61	56,367.66	5,051,106.01	89.61	$ 5,051,106.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	89.61	$ 5,051,106.01	100.00%	0.05%
8.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD10 2"	m	371.33	46,403.28	17,230,929.96	371.33	$ 17,230,929.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	371.33	$ 17,230,929.96	100.00%	0.16%
8.16.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD10 1.1/2"	m	80.74	47,994.62	3,875,085.62	80.74	$ 3,875,085.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	80.74	$ 3,875,085.62	100.00%	0.04%
8.16.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD40 1.1/4"	m	59.76	33,444.34	1,998,633.76	59.76	$ 1,998,633.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	59.76	$ 1,998,633.76	100.00%	0.02%
8.16.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO SCHD40 1"	m	180.38	63,369.93	11,430,667.97	180.38	$ 11,430,667.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	180.38	$ 11,430,667.97	100.00%	0.10%
8.16.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC C900 4"	m	8.00	375,140.13	3,001,121.04	8.00	$ 3,001,121.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 3,001,121.04	100.00%	0.03%
8.16.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	und	37.00	78,432.55	2,902,004.35	37.00	$ 2,902,004.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	37.00	$ 2,902,004.35	100.00%	0.03%
8.16.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 3"	und	6.00	45,820.32	274,921.92	6.00	$ 274,921.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 274,921.92	100.00%	0.00%
8.16.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2.1/2"	und	118.00	45,348.55	5,351,128.90	118.00	$ 5,351,128.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	118.00	$ 5,351,128.90	100.00%	0.05%
8.16.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2"	und	232.00	33,668.45	7,811,080.40	232.00	$ 7,811,080.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	232.00	$ 7,811,080.40	100.00%	0.07%
8.16.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1.1/2"	und	97.00	27,265.97	2,644,799.09	97.00	$ 2,644,799.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	97.00	$ 2,644,799.09	100.00%	0.02%
8.16.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO ROSCADO 1.1/4"	und	95.00	26,791.71	2,545,212.45	95.00	$ 2,545,212.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	95.00	$ 2,545,212.45	100.00%	0.02%
8.16.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO ROSCADO 1"	und	272.00	22,081.99	6,006,301.28	272.00	$ 6,006,301.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	272.00	$ 6,006,301.28	100.00%	0.05%
8.16.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTORES HD TUBO PVC X TUBO PVC 4"	und	8.00	23,973.54	191,788.32	8.00	$ 191,788.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 191,788.32	100.00%	0.00%
8.16.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTORES HD TUBO PVC X ACC PVC4"	und	8.00	25,241.64	201,933.12	8.00	$ 201,933.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 201,933.12	100.00%	0.00%
8.16.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SENSORA DE FLUJO 2.1/2"	und	3.00	1,080,463.48	3,241,390.44	3.00	$ 3,241,390.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 3,241,390.44	100.00%	0.03%
8.16.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE 2.1/2"	und	3.00	437,851.72	1,313,555.16	3.00	$ 1,313,555.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,313,555.16	100.00%	0.01%
8.16.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR 2.1/2"	und	3.00	618,043.90	1,854,131.70	3.00	$ 1,854,131.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,854,131.70	100.00%	0.02%
8.16.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING 4"	und	27.00	44,551.27	1,202,884.29	27.00	$ 1,202,884.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	27.00	$ 1,202,884.29	100.00%	0.01%
8.16.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING 3"	und	5.00	36,082.38	180,411.90	5.00	$ 180,411.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 180,411.90	100.00%	0.00%
8.16.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING 2 1/2"	und	249.00	38,791.62	9,659,113.38	249.00	$ 9,659,113.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	249.00	$ 9,659,113.38	100.00%	0.09%
8.16.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING 2"	und	462.00	28,609.82	13,217,736.84	462.00	$ 13,217,736.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	462.00	$ 13,217,736.84	100.00%	0.12%
8.16.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING 1 1/2"	und	152.00	29,625.28	4,503,042.56	152.00	$ 4,503,042.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	152.00	$ 4,503,042.56	100.00%	0.04%
8.16.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP 2.1/2"	und	14.00	42,757.86	598,610.04	14.00	$ 598,610.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 598,610.04	100.00%	0.01%
8.16.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP 2"	und	68.00	36,082.38	2,453,601.84	68.00	$ 2,453,601.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	68.00	$ 2,453,601.84	100.00%	0.02%
8.16.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	und	1.00	551,238.37	551,238.37	1.00	$ 551,238.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 551,238.37	100.00%	0.00%
8.16.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE 1"	und	4.00	103,041.74	412,166.96	4.00	$ 412,166.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 412,166.96	100.00%	0.00%
8.16.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 4" X 2.1/2" X 2.1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	und	1.00	2,234,107.23	2,234,107.23	1.00	$ 2,234,107.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,234,107.23	100.00%	0.02%
8.16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA BOMBEROS 2.1/2"	und	2.00	700,059.40	1,400,118.80	2.00	$ 1,400,118.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,400,118.80	100.00%	0.01%
8.16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADOR AUTOMÁTICO PENDENT (K=5.6)	und	43.00	44,275.45	1,903,844.35	43.00	$ 1,903,844.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	43.00	$ 1,903,844.35	100.00%	0.02%
8.16.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADOR AUTOMÁTICO UPRIGHT (K=5.6)	und	121.00	41,784.60	5,055,936.60	121.00	$ 5,055,936.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	121.00	$ 5,055,936.60	100.00%	0.05%
8.16.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO ROCIADOR	und	164.00	139,411.77	22,863,530.28	164.00	$ 22,863,530.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	164.00	$ 22,863,530.28	100.00%	0.21%
8.16.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA	m	834.12	18,784.29	15,668,351.97	834.12	$ 15,668,351.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	834.12	$ 15,668,351.97	100.00%	0.14%
8.16.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LB	und	8.00	129,883.31	1,039,066.48	8.00	$ 1,039,066.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 1,039,066.48	100.00%	0.01%
8.16.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR A BASE DE CO2 10 LB	und	6.00	332,314.80	1,993,888.80	6.00	$ 1,993,888.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 1,993,888.80	100.00%	0.02%
8.16.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR K DE 10 LB	und	1.00	129,883.31	129,883.31	1.00	$ 129,883.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 129,883.31	100.00%	0.00%
8.16.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA/GABINETE CON ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RÁPIDA K=5.6 TEMP. 135°	und	1.00	120,966.57	120,966.57	1.00	$ 120,966.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 120,966.57	100.00%	0.00%
8.16.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE III	und	3.00	879,368.19	2,638,104.57	3.00	$ 2,638,104.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 2,638,104.57	100.00%	0.02%
8.16.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN PVC C900 A ACERO 4"	und	2.00	463,173.36	926,346.72	2.00	$ 926,346.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 926,346.72	100.00%	0.01%
8.16.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 4"	und	12.00	26,849.64	322,195.68	12.00	$ 322,195.68		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 322,195.68	100.00%	0.00%
8.16.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 3"	und	1.00	25,838.35	25,838.35	1.00	$ 25,838.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 25,838.35	100.00%	0.00%
8.16.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 2.1/2"	und	20.00	25,998.76	519,975.20	20.00	$ 519,975.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 519,975.20	100.00%	0.00%
8.16.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 2"	und	83.00	24,054.90	1,996,556.70	83.00	$ 1,996,556.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.00	$ 1,996,556.70	100.00%	0.02%
8.16.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1.1/2"	und	18.00	23,948.30	431,069.40	18.00	$ 431,069.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.00	$ 431,069.40	100.00%	0.00%
8.16.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1.1/4"	und	14.00	23,805.82	333,281.48	14.00	$ 333,281.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 333,281.48	100.00%	0.00%
8.16.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1"	und	14.00	23,648.40	331,077.60	14.00	$ 331,077.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 331,077.60	100.00%	0.00%
8.16.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMO RESISTENTE 4 VÍAS	und	6.00	271,913.89	1,631,483.34	6.00	$ 1,631,483.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 1,631,483.34	100.00%	0.01%
8.16.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORRESISTENTE LATERAL	und	16.00	203,086.68	3,249,386.88	16.00	$ 3,249,386.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 3,249,386.88	100.00%	0.03%
8.16.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORRESISTENTE TRANSVERSAL	und	5.00	151,066.75	755,333.75	5.00	$ 755,333.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 755,333.75	100.00%	0.01%
8.16.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS UL/FM 4"	und	3.00	16,746.59	50,239.77	3.00	$ 50,239.77		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 50,239.77	100.00%	0.00%
8.16.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS UL/FM 1"	und	2.00	12,728.35	25,456.70	2.00	$ 25,456.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 25,456.70	100.00%	0.00%
8.16.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIERRO DÚCTIL 3"	m	0.40	67,210.99	26,884.40	0.40	$ 26,884.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.40	$ 26,884.40	100.00%	0.00%
8.16.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL 3"	und	1.00	45,820.32	45,820.32	1.00	$ 45,820.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 45,820.32	100.00%	0.00%
8.16.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE 3"	und	1.00	2,571,566.78	2,571,566.78	1.00	$ 2,571,566.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,571,566.78	100.00%	0.02%
8.16.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA OS&Y 3"	und	1.00	1,031,679.19	1,031,679.19	1.00	$ 1,031,679.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,031,679.19	100.00%	0.01%
8.17	**RED DE GAS MEDIA PRESIÓN**																
8.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.G SCH 40 1"	m	7.21	65,174.81	469,910.38	7.21	$ 469,910.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.21	$ 469,910.38	100.00%	0.00%
8.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.G SCH 40 3/4"	m	59.71	25,749.12	1,537,479.96	59.71	$ 1,537,479.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	59.71	$ 1,537,479.96	100.00%	0.01%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
8.17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A.G SCH 40 1"	und	10.00	25,749.12	257,491.20	10.00	$ 257,491.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 257,491.20	100.00%	0.00%
8.17.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A.G SCH 40 3/4"	und	42.00	25,749.12	1,081,463.04	42.00	$ 1,081,463.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	42.00	$ 1,081,463.04	100.00%	0.01%
8.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA 3/4"	und	3.00	25,749.12	77,247.36	3.00	$ 77,247.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 77,247.36	100.00%	0.00%
8.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR PRIMERA ETAPA	und	1.00	125,632.26	125,632.26	1.00	$ 125,632.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 125,632.26	100.00%	0.00%
8.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO	und	6.00	25,749.12	154,494.72	6.00	$ 154,494.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 154,494.72	100.00%	0.00%
8.17.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR	und	1.00	25,749.12	25,749.12	1.00	$ 25,749.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 25,749.12	100.00%	0.00%
8.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.G SCH 40 1/2"	m	6.88	25,749.12	177,153.95	6.88	$ 177,153.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.88	$ 177,153.95	100.00%	0.00%
8.17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A.G SCH 40 1/2"	und	29.00	25,749.12	746,724.48	29.00	$ 746,724.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	29.00	$ 746,724.48	100.00%	0.01%
8.17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA 1/2"	und	4.00	25,749.12	102,996.48	4.00	$ 102,996.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 102,996.48	100.00%	0.00%
8.18	**RED DE GAS BAJA PRESIÓN**																
8.18.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.G SCH 40 1"	m	0.51	17,258.52	8,801.85	0.51	$ 8,801.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.51	$ 8,801.85	100.00%	0.00%
8.18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.G SCH 40 3/4"	m	2.01	14,231.42	28,605.15	2.01	$ 28,605.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.01	$ 28,605.15	100.00%	0.00%
8.18.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A.G SCH 40 1"	und	4.00	17,258.52	69,034.08	4.00	$ 69,034.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 69,034.08	100.00%	0.00%
8.18.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS A.G SCH 40 3/4"	und	4.00	22,361.56	89,446.24	4.00	$ 89,446.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 89,446.24	100.00%	0.00%
8.19	**Puntos GAS NATURAL**																
8.19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto CALENTADOR - TIPO 1 3/4"	und	2.00	117,685.89	235,371.78	2.00	$ 235,371.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 235,371.78	100.00%	0.00%
8.19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punto ESTUFA - TIPO 1 3/4"	und	1.00	85,812.11	85,812.11	1.00	$ 85,812.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 85,812.11	100.00%	0.00%
8.19.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADORA	und	4.00	85,812.11	343,248.44	4.00	$ 343,248.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 343,248.44	100.00%	0.00%
8.20	**PRUEBAS DEL SISTEMA**																
8.20.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA LAS REDES DE PRESIÓN	und	16.00	529,325.67	8,469,210.72	16.00	$ 8,469,210.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 8,469,210.72	100.00%	0.08%
8.20.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA LAS REDES A GRAVEDAD	und	15.00	423,838.57	6,357,578.55	15.00	$ 6,357,578.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 6,357,578.55	100.00%	0.06%
8.20.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA LAS REDES DE GAS	und	2.00	423,838.57	847,677.14	2.00	$ 847,677.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 847,677.14	100.00%	0.01%
8.20.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRUEBA PARA LAS REDES RCI	und	1.00	423,838.57	423,838.57	1.00	$ 423,838.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 423,838.57	100.00%	0.00%
8.20.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES	und	1.00	999,957.55	999,957.55	1.00	$ 999,957.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 999,957.55	100.00%	0.01%
8.20.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	gb	1.00	3,715,947.01	3,715,947.01	1.00	$ 3,715,947.01		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,715,947.01	100.00%	0.03%
8.21	**CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS PARA LLENADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS**																
8.21.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 4"	m	6.02	464,977.80	2,799,166.36	6.02	$ 2,799,166.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.02	$ 2,799,166.36	100.00%	0.03%
8.21.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 2"	m	1.87	188,430.38	352,364.81	1.87	$ 352,364.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.87	$ 352,364.81	100.00%	0.00%
8.21.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TUBERÍA PVC-SCH 80 1.1/2"	m	2.79	132,989.43	371,040.51	2.79	$ 371,040.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.79	$ 371,040.51	100.00%	0.00%
8.21.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 4"	und	20.00	17,529.31	350,586.20	20.00	$ 350,586.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 350,586.20	100.00%	0.00%
8.21.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 2"	und	6.00	17,529.31	105,175.86	6.00	$ 105,175.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 105,175.86	100.00%	0.00%
8.21.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ACCESORIOS PVC-SCH 80 1.1/2"	und	5.00	17,529.31	87,646.55	5.00	$ 87,646.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 87,646.55	100.00%	0.00%
8.21.07	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REGISTRO CORTINA 4" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	6.00	2,635,394.10	15,812,364.60	6.00	$ 15,812,364.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 15,812,364.60	100.00%	0.14%
8.21.08	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REGISTRO CORTINA 2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	1.00	565,391.75	565,391.75	1.00	$ 565,391.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 565,391.75	100.00%	0.01%
8.21.09	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REGISTRO CORTINA 1.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	und	1.00	391,918.20	391,918.20	1.00	$ 391,918.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 391,918.20	100.00%	0.00%
8.21.10	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE VÁLVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO Fundido ROSCA NPT O SIMILAR 4"	und	2.00	1,667,554.87	3,335,109.74	2.00	$ 3,335,109.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,335,109.74	100.00%	0.03%
8.21.11	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CHEQUE HIDRO 4"	und	3.00	1,576,356.83	4,729,070.49	3.00	$ 4,729,070.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 4,729,070.49	100.00%	0.04%
8.21.12	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CHEQUE HIDRO 1,1/2"	und	1.00	298,552.27	298,552.27	1.00	$ 298,552.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 298,552.27	100.00%	0.00%
8.21.13	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE unión FLEXIBLE BORRACHA 4"	und	4.00	341,058.94	1,364,235.76	4.00	$ 1,364,235.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 1,364,235.76	100.00%	0.01%
8.21.14	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE universal 1,1/2"	und	2.00	49,175.22	98,350.44	2.00	$ 98,350.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 98,350.44	100.00%	0.00%
8.21.15	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE COPA CONCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA 4" X 2"	und	2.00	165,543.59	331,087.18	2.00	$ 331,087.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 331,087.18	100.00%	0.00%
8.21.16	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE COPA EXCÉNTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE unión SOLDADA 4" X 2"	und	2.00	200,705.96	401,411.92	2.00	$ 401,411.92		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 401,411.92	100.00%	0.00%
8.21.17	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 4"	und	1.00	346,706.71	346,706.71	1.00	$ 346,706.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 346,706.71	100.00%	0.00%
8.21.18	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 3"	und	1.00	316,617.23	316,617.23	1.00	$ 316,617.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 316,617.23	100.00%	0.00%
8.21.19	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2"	und	1.00	215,887.20	215,887.20	1.00	$ 215,887.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 215,887.20	100.00%	0.00%
8.21.20	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TRANSICIÓN TUBERÍA PVC-SCH80 A C900 4"	und	1.00	529,510.30	529,510.30	1.00	$ 529,510.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 529,510.30	100.00%	0.00%
09	**INSTALACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV**																
9.01	**DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS PVC CONDUIT**																
9.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 6"	m	380.00	67,753.44	25,746,307.20	380.00	$ 25,746,307.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	380.00	$ 25,746,307.20	100.00%	0.23%
9.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 4"	m	60.00	32,274.61	1,936,476.60	60.00	$ 1,936,476.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 1,936,476.60	100.00%	0.02%
9.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3"	m	75.00	28,577.12	2,143,284.00	75.00	$ 2,143,284.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	75.00	$ 2,143,284.00	100.00%	0.02%
9.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 2"	m	15.00	20,372.05	305,580.75	15.00	$ 305,580.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 305,580.75	100.00%	0.00%
9.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 1.1/2"	m	15.00	17,993.40	269,901.00	15.00	$ 269,901.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 269,901.00	100.00%	0.00%
9.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 1"	m	20.00	12,809.62	256,192.40	20.00	$ 256,192.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 256,192.40	100.00%	0.00%
9.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3/4"	m	750.00	10,984.65	8,238,487.50	750.00	$ 8,238,487.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	750.00	$ 8,238,487.50	100.00%	0.07%
9.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 1/2"	m	13.00	9,066.72	117,867.36	13.00	$ 117,867.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.00	$ 117,867.36	100.00%	0.00%
9.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 6"	und	40.00	82,896.92	3,315,876.80	40.00	$ 3,315,876.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	40.00	$ 3,315,876.80	100.00%	0.03%
9.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 4"	und	10.00	29,422.32	294,223.20	10.00	$ 294,223.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 294,223.20	100.00%	0.00%
9.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 3"	und	12.00	18,572.67	222,872.04	12.00	$ 222,872.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 222,872.04	100.00%	0.00%
9.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 2"	und	10.00	12,108.41	121,084.10	10.00	$ 121,084.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 121,084.10	100.00%	0.00%
9.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 1.1/2"	und	20.00	10,464.20	209,284.00	20.00	$ 209,284.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 209,284.00	100.00%	0.00%
9.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 1"	und	20.00	8,505.15	170,103.00	20.00	$ 170,103.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 170,103.00	100.00%	0.00%
9.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 3/4"	und	500.00	7,597.98	3,798,990.00	500.00	$ 3,798,990.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	500.00	$ 3,798,990.00	100.00%	0.03%
9.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS PVC CONDUIT Diam= 1/2"	und	13.00	7,079.78	92,037.14	13.00	$ 92,037.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.00	$ 92,037.14	100.00%	0.00%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
9.02	**DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS EMT**																
9.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA EMT Diam= 2"	m	30.00	42,197.70	1,265,931.00	30.00	$ 1,265,931.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 1,265,931.00	100.00%	0.01%
9.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA EMT Diam= 1-1/4"	m	115.00	33,638.07	3,868,378.05	115.00	$ 3,868,378.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	115.00	$ 3,868,378.05	100.00%	0.04%
9.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA EMT Diam= 1"	m	50.00	25,060.50	1,253,025.00	50.00	$ 1,253,025.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.00	$ 1,253,025.00	100.00%	0.01%
9.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA EMT Diam= 3/4"	m	1,350.00	18,959.84	25,595,784.00	1,350.00	$ 25,595,784.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,350.00	$ 25,595,784.00	100.00%	0.23%
9.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERIA EMT Diam= 1/2"	m	10.00	12,102.95	121,029.50	10.00	$ 121,029.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 121,029.50	100.00%	0.00%
9.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS EMT Diam= 2"	und	20.00	18,966.03	379,320.60	20.00	$ 379,320.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 379,320.60	100.00%	0.00%
9.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS EMT Diam= 1-1/4"	und	53.00	14,178.54	751,462.62	53.00	$ 751,462.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	53.00	$ 751,462.62	100.00%	0.01%
9.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS EMT Diam= 1"	und	31.00	10,273.31	318,472.61	31.00	$ 318,472.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	31.00	$ 318,472.61	100.00%	0.00%
9.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS EMT Diam= 3/4"	und	450.00	8,929.68	4,018,356.00	450.00	$ 4,018,356.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	450.00	$ 4,018,356.00	100.00%	0.04%
9.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIOS EMT Diam= 1/2"	und	10.00	7,978.10	79,781.00	10.00	$ 79,781.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 79,781.00	100.00%	0.00%
9.03	**DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS IMC**																
9.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC Diam= 6"	m	68.00	336,502.37	22,882,161.16	68.00	$ 22,882,161.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	68.00	$ 22,882,161.16	100.00%	0.21%
9.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC Diam= 4"	m	15.00	188,100.30	2,821,504.50	15.00	$ 2,821,504.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 2,821,504.50	100.00%	0.03%
9.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS IMC Diam= 6"	und	20.00	248,643.57	4,972,871.40	20.00	$ 4,972,871.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 4,972,871.40	100.00%	0.05%
9.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS IMC Diam= 4"	und	20.00	168,432.67	3,368,653.40	20.00	$ 3,368,653.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 3,368,653.40	100.00%	0.03%
9.04	**DE BANDEJAS PORTACABLES Y CANALETAS**																
9.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO 50x120 MM	m	9.00	41,268.28	371,414.52	9.00	$ 371,414.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 371,414.52	100.00%	0.00%
9.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO 50x150 MM	m	140.00	43,226.09	6,051,652.60	140.00	$ 6,051,652.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	140.00	$ 6,051,652.60	100.00%	0.05%
9.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO 50x200 MM	m	90.00	60,291.41	5,426,226.90	90.00	$ 5,426,226.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	90.00	$ 5,426,226.90	100.00%	0.05%
9.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO 50x300 MM	m	60.00	73,204.98	4,392,298.80	60.00	$ 4,392,298.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 4,392,298.80	100.00%	0.04%
9.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CURVA 90 GRADOS TIPO DUCTO CERRADO 50x120 MM	und	15.00	33,836.58	507,548.70	15.00	$ 507,548.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 507,548.70	100.00%	0.00%
9.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CURVA 90 GRADOS TIPO DUCTO CERRADO 50x150 MM	und	15.00	35,876.09	538,141.35	15.00	$ 538,141.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 538,141.35	100.00%	0.00%
9.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CURVA 90 GRADOS TIPO DUCTO CERRADO 50x200 MM	und	15.00	50,485.43	757,281.45	15.00	$ 757,281.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 757,281.45	100.00%	0.01%
9.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CURVA 90 GRADOS TIPO DUCTO CERRADO 50x300 MM	und	15.00	64,822.77	972,341.55	15.00	$ 972,341.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 972,341.55	100.00%	0.01%
9.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CAMBIO DE NIVEL TIPO DUCTO CERRADO 50x120 MM	und	8.00	30,965.13	247,721.04	8.00	$ 247,721.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 247,721.04	100.00%	0.00%
9.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CAMBIO DE NIVEL TIPO DUCTO CERRADO 50x150 MM	und	8.00	32,685.81	261,486.48	8.00	$ 261,486.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 261,486.48	100.00%	0.00%
9.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CAMBIO DE NIVEL TIPO DUCTO CERRADO 50x200 MM	und	8.00	41,268.28	330,146.24	8.00	$ 330,146.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 330,146.24	100.00%	0.00%
9.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CAMBIO DE NIVEL TIPO DUCTO CERRADO 50x300 MM	und	8.00	47,589.07	380,712.56	8.00	$ 380,712.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 380,712.56	100.00%	0.00%
9.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA CON SEPARADOR 120x54 MM	m	120.00	25,463.27	3,055,592.40	120.00	$ 3,055,592.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 3,055,592.40	100.00%	0.03%
9.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CHANEL PARA BANDEJA 50x120 MM	und	150.00	24,040.00	3,606,000.00	150.00	$ 3,606,000.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	150.00	$ 3,606,000.00	100.00%	0.03%
9.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CHANEL PARA BANDEJA 50x150 MM	und	120.00	24,589.23	2,950,707.60	120.00	$ 2,950,707.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 2,950,707.60	100.00%	0.03%
9.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CHANEL PARA BANDEJA 50x200 MM	und	80.00	25,504.62	2,040,369.60	80.00	$ 2,040,369.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	80.00	$ 2,040,369.60	100.00%	0.02%
9.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CHANEL PARA BANDEJA 50x300 MM	und	60.00	26,346.18	1,580,770.80	60.00	$ 1,580,770.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 1,580,770.80	100.00%	0.01%
9.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 3/8" PARA SOPORTE CHANEL - (incluye Accesorios de Sujeción)	und	450.00	23,856.17	10,735,276.50	450.00	$ 10,735,276.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	450.00	$ 10,735,276.50	100.00%	0.10%
9.05	**DE CAJAS ELÉCTRICAS**																
9.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA INSPECCIÓN VEHICULAR TAPA REDONDA Ref. CS 280	und	1.00	2,150,569.40	2,150,569.40	1.00	$ 2,150,569.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,150,569.40	100.00%	0.02%
9.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA DOBLE INSPECCIÓN 2.00 x 1.00 - Ref. CS 276	und	5.00	3,586,508.89	17,932,544.45	5.00	$ 17,932,544.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 17,932,544.45	100.00%	0.16%
9.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA SENCILLA INSPECCIÓN 1.00 x 1.00 - Ref. CS 275	und	2.00	3,046,615.22	6,093,230.44	2.00	$ 6,093,230.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 6,093,230.44	100.00%	0.06%
9.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA CS 30X30 CM AP280	und	6.00	1,014,409.64	6,086,457.84	6.00	$ 6,086,457.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 6,086,457.84	100.00%	0.06%
9.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 30X30 CM	und	25.00	60,581.54	1,514,538.50	25.00	$ 1,514,538.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 1,514,538.50	100.00%	0.01%
9.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 15X15 CM 10x10 cm	und	25.00	27,456.20	686,405.00	25.00	$ 686,405.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 686,405.00	100.00%	0.01%
9.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	und	440.00	17,144.33	7,543,505.20	440.00	$ 7,543,505.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	440.00	$ 7,543,505.20	100.00%	0.07%
9.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 5800	und	120.00	10,794.65	1,295,358.00	120.00	$ 1,295,358.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 1,295,358.00	100.00%	0.01%
9.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2400	und	250.00	12,820.21	3,205,052.50	250.00	$ 3,205,052.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	250.00	$ 3,205,052.50	100.00%	0.03%
9.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2400 DOBLE FONDO	und	50.00	22,428.92	1,121,446.00	50.00	$ 1,121,446.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.00	$ 1,121,446.00	100.00%	0.01%
9.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	und	5.00	65,572.46	327,862.30	5.00	$ 327,862.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 327,862.30	100.00%	0.00%
9.06	**DE CABLES ELÉCTRICOS Y VARILLAS DE PUESTA A TIERRA CON ACCESORIOS**																
9.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 14	m	320.00	3,915.40	1,252,928.00	320.00	$ 1,252,928.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	320.00	$ 1,252,928.00	100.00%	0.01%
9.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 12	m	3,560.00	4,995.43	17,783,730.80	3,560.00	$ 17,783,730.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3,560.00	$ 17,783,730.80	100.00%	0.16%
9.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 10	m	980.00	6,272.74	6,147,285.20	980.00	$ 6,147,285.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	980.00	$ 6,147,285.20	100.00%	0.06%
9.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 8	m	475.00	8,585.25	4,077,993.75	475.00	$ 4,077,993.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	475.00	$ 4,077,993.75	100.00%	0.04%
9.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO FPLR NO 6 Aluminio	m	880.00	8,468.68	7,452,438.40	880.00	$ 7,452,438.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	880.00	$ 7,452,438.40	100.00%	0.07%
9.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 4 Aluminio	m	310.00	12,952.21	4,015,185.10	310.00	$ 4,015,185.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	310.00	$ 4,015,185.10	100.00%	0.04%
9.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 2 Aluminio	m	110.00	16,314.86	1,794,634.60	110.00	$ 1,794,634.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	110.00	$ 1,794,634.60	100.00%	0.02%
9.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 1/0 Aluminio	m	75.00	25,406.47	1,905,485.25	75.00	$ 1,905,485.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	75.00	$ 1,905,485.25	100.00%	0.02%
9.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 2/0 Aluminio	m	160.00	12,229.86	1,956,777.60	160.00	$ 1,956,777.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	160.00	$ 1,956,777.60	100.00%	0.02%
9.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 4/0 Aluminio	m	76.00	15,119.25	1,149,063.00	76.00	$ 1,149,063.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	76.00	$ 1,149,063.00	100.00%	0.01%
9.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 250 Aluminio	m	192.00	20,648.94	3,964,596.48	192.00	$ 3,964,596.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	192.00	$ 3,964,596.48	100.00%	0.04%
9.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 350 Aluminio	m	145.00	29,173.59	4,230,170.55	145.00	$ 4,230,170.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	145.00	$ 4,230,170.55	100.00%	0.04%
9.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 400 Aluminio	m	175.00	32,959.89	5,767,945.75	175.00	$ 5,767,945.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	175.00	$ 5,767,945.75	100.00%	0.05%
9.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 500 Aluminio	m	228.00	35,002.19	7,980,499.32	228.00	$ 7,980,499.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	228.00	$ 7,980,499.32	100.00%	0.07%
9.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 12 0	m	720.00	4,209.32	3,030,710.40	720.00	$ 3,030,710.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	720.00	$ 3,030,710.40	100.00%	0.03%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS CARRERA 14B No. 146-05		FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	03	PROCESO No:		TIPO DE PROCESO:	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	N.I.T:	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	N.I.T:	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	N.I.T:	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario ofertado	Valor total ofertado	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Ejec. del Item	% Ejec. del Contrato	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Pend. Ejec. del Item	% Pend. Ejec. del Contrato
9.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 10 0	m	250.00	4,856.94	1,214,235.00	250.00	$ 1,214,235.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	250.00	$ 1,214,235.00	100.00%	0.01%
9.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 8 0	m	195.00	7,596.88	1,481,391.60	195.00	$ 1,481,391.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	195.00	$ 1,481,391.60	100.00%	0.01%
9.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU AISLADO NO 6 0	m	320.00	10,585.90	3,387,488.00	320.00	$ 3,387,488.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	320.00	$ 3,387,488.00	100.00%	0.03%
9.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 4 0	m	120.00	15,368.34	1,844,200.80	120.00	$ 1,844,200.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 1,844,200.80	100.00%	0.02%
9.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 2 0	m	120.00	22,073.71	2,648,845.20	120.00	$ 2,648,845.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 2,648,845.20	100.00%	0.02%
9.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 1/0 0	m	55.00	42,843.42	2,356,388.10	55.00	$ 2,356,388.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	55.00	$ 2,356,388.10	100.00%	0.02%
9.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 2/0 0	m	120.00	49,436.21	5,932,345.20	120.00	$ 5,932,345.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 5,932,345.20	100.00%	0.05%
9.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CU DESNUDO NO 250 0	m	120.00	89,296.80	10,715,616.00	120.00	$ 10,715,616.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	120.00	$ 10,715,616.00	100.00%	0.10%
9.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE XLPE 2 3x185mm2 15kV - Plo de conexion hasta trafo	m	110.00	76,879.41	8,456,735.10	110.00	$ 8,456,735.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	110.00	$ 8,456,735.10	100.00%	0.08%
9.06.25	ALAMBRON 8 mm	m	230.00	7,375.69	1,696,408.70	230.00	$ 1,696,408.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	230.00	$ 1,696,408.70	100.00%	0.02%
9.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE FIBRA OPTICA OM4	m	150.00	110,293.64	16,544,046.00	150.00	$ 16,544,046.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	150.00	$ 16,544,046.00	100.00%	0.15%
9.06.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE CATEGORIA 6A FUTP DE 500 MHZ	m	520.00	5,638.92	2,932,238.40	520.00	$ 2,932,238.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	520.00	$ 2,932,238.40	100.00%	0.03%
9.06.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CONECTORES DE RESORTE CABLES NO.22-12	und	700.00	3,099.24	2,169,468.00	700.00	$ 2,169,468.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	700.00	$ 2,169,468.00	100.00%	0.02%
9.06.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 10	und	110.00	5,185.34	570,387.40	110.00	$ 570,387.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	110.00	$ 570,387.40	100.00%	0.01%
9.06.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 8	und	30.00	5,633.69	169,010.70	30.00	$ 169,010.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 169,010.70	100.00%	0.00%
9.06.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 6	und	82.00	5,683.51	466,047.82	82.00	$ 466,047.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	82.00	$ 466,047.82	100.00%	0.00%
9.06.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 4	und	25.00	5,783.14	144,578.50	25.00	$ 144,578.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 144,578.50	100.00%	0.00%
9.06.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 2	und	50.00	5,882.78	294,139.00	50.00	$ 294,139.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.00	$ 294,139.00	100.00%	0.00%
9.06.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 1/0	und	45.00	5,982.41	269,208.45	45.00	$ 269,208.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 269,208.45	100.00%	0.00%
9.06.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 2/0	und	45.00	6,082.04	273,691.80	45.00	$ 273,691.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 273,691.80	100.00%	0.00%
9.06.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 3/0	und	45.00	6,181.68	278,175.60	45.00	$ 278,175.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 278,175.60	100.00%	0.00%
9.06.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 4/0	und	45.00	6,281.31	282,658.95	45.00	$ 282,658.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 282,658.95	100.00%	0.00%
9.06.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 250	und	25.00	6,380.95	159,523.75	25.00	$ 159,523.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 159,523.75	100.00%	0.00%
9.06.39	TERMINAL TIPO PALA NO 350	und	45.00	6,480.58	291,626.10	45.00	$ 291,626.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 291,626.10	100.00%	0.00%
9.06.40	TERMINAL TIPO PALA NO 400	und	45.00	6,580.21	296,109.45	45.00	$ 296,109.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 296,109.45	100.00%	0.00%
9.06.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TERMINAL TIPO PALA NO 500	und	45.00	6,679.85	300,593.25	45.00	$ 300,593.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 300,593.25	100.00%	0.00%
9.06.42	PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLEP No 2/0 185mm 15kV	und	230.00	375,247.53	86,306,931.90	230.00	$ 86,306,931.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	230.00	$ 86,306,931.90	100.00%	0.78%
9.06.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE BASE PLASTICA PARA CABLE ALAMBRON 8 mm	und	250.00	12,800.22	3,200,055.00	250.00	$ 3,200,055.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	250.00	$ 3,200,055.00	100.00%	0.03%
9.06.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE VARILLA COOPER WELL 2,4 MTS	und	25.00	295,107.10	7,377,677.50	25.00	$ 7,377,677.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 7,377,677.50	100.00%	0.07%
9.06.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CABLE COAXIAL	m	550.00	4,786.80	2,632,740.00	550.00	$ 2,632,740.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	550.00	$ 2,632,740.00	100.00%	0.02%
9.06.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PREMOLDEADO TIPO INTERIOR PARA CABLE XLEP No 2/0 185mm 15kV	und	25.00	326,325.44	8,158,136.00	25.00	$ 8,158,136.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 8,158,136.00	100.00%	0.07%
9.06.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CONECTOR BIMETALICO ALUMINIO - COBRE 1/0 AWG	m	50.00	26,443.87	1,322,193.50	50.00	$ 1,322,193.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.00	$ 1,322,193.50	100.00%	0.01%
9.07	**DE TABLEROS ELÉCTRICOS**																
9.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO MONOFÁSICO 6 CTOS 4 CTOS	und	3.00	223,128.90	669,386.70	3.00	$ 669,386.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 669,386.70	100.00%	0.01%
9.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO MONOFÁSICO 12 CTOS 6 CTOS	und	5.00	207,645.76	1,038,228.80	5.00	$ 1,038,228.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,038,228.80	100.00%	0.01%
9.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO 12 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR	und	3.00	511,031.46	1,533,094.38	3.00	$ 1,533,094.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,533,094.38	100.00%	0.01%
9.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO 18 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR	und	11.00	408,476.26	4,493,238.86	11.00	$ 4,493,238.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 4,493,238.86	100.00%	0.04%
9.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO TG-BOMBAS GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL; CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA DE LA PINTURA (MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO); CON ACABADO FINAL COLOR GRIS CLARO AL HORNO Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - TENSIÓN DE TRABAJO 208/120 VOLT. - und (1) und BREAKERS TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X120AMP - DOS (2) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X40AMP - CUATRO (4) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X30AMP	und	1.00	5,034,891.00	5,034,891.00	1.00	$ 5,034,891.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 5,034,891.00	100.00%	0.05%
9.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO TG-HVAC GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL; CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA DE LA PINTURA (MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO); CON ACABADO FINAL COLOR GRIS CLARO AL HORNO Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - TENSIÓN DE TRABAJO 208/120 VOLT. - und (1) und BREAKERS TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X80AMP - und (1) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X60AMP - und (1) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X30AMP	und	1.00	4,870,398.60	4,870,398.60	1.00	$ 4,870,398.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,870,398.60	100.00%	0.04%
9.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO TGR GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL; CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA DE LA PINTURA (MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO); CON ACABADO FINAL COLOR GRIS CLARO AL HORNO Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - TENSIÓN DE TRABAJO 208/120 VOLT. - TRES (3) und BREAKERS ENCHUFABLES DE 3X30AMP	und	1.00	4,828,854.19	4,828,854.19	1.00	$ 4,828,854.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,828,854.19	100.00%	0.04%
9.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO TGE GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL; CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA DE LA PINTURA (MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO); CON ACABADO FINAL COLOR GRIS CLARO AL HORNO Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - TENSIÓN DE TRABAJO 208/120 VOLT. - und (1) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X70AMP - und (1) und BREAKERS INDUSTRIAL DE 3X630AMP NECESARIO AGUAS ABAJO DE LA PLANTA ELÉCTRICA	und	1.00	8,135,191.37	8,135,191.37	1.00	$ 8,135,191.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 8,135,191.37	100.00%	0.07%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
9.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ILUMINACIÓN - CONTROL DE ILUMINACIÓN Comunal	und	3.00	8,489,734.17	25,469,202.51	3.00	$ 25,469,202.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 25,469,202.51	100.00%	0.23%
9.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BY-PASS 220V - USO INTERIOR GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL; CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA DE LA PINTURA (MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO); CON ACABADO FINAL COLOR GRIS CLARO AL HORNO Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - Transferencia Manual por Contactores 3X30 Amp AC3. Consta de dos contactores tripolares de la corriente indicada montados sobre lámina metálica y enclavamiento manual - Barraje Tetrapolar en cobre electrolítico montado sobre aisladores de resina para las tres fases, neutro y tierra según especificaciones. - 2 und de Interruptor Termomagnético 3x30 Amp, 30kA/220 – 240V	und	1.00	4,566,369.27	4,566,369.27	1.00	$ 4,566,369.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,566,369.27	100.00%	0.04%
9.07.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA - TGA-TRANSFERENCIA und (1) interruptor automático totalizador tipo industrial de 3 x 630Amp - 15kA Amp und (1) barraje en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina; de tres (3) barras de - 40 x 10 mm para las fases y und barra - 40 x 5 mm para el neutro y und barra - 20 x 5 mm para la tierra; Tornillería zincada con tuerca, guasa de presión y arandela; de longitud suficiente para efectuar las derivaciones trifásicas que indica el diagrama unifilar. BREAKERS segund diagrama unifilar	und	1.00	28,990,226.10	28,990,226.10	1.00	$ 28,990,226.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 28,990,226.10	100.00%	0.26%
9.07.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA - BCI Transferencia automática con base en contactores de 220Amp de AC3	und	1.00	9,367,457.39	9,367,457.39	1.00	$ 9,367,457.39		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 9,367,457.39	100.00%	0.08%
9.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE BOMBAS EQUIPO DE PRESIÓN	und	1.00	3,747,153.16	3,747,153.16	1.00	$ 3,747,153.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,747,153.16	100.00%	0.03%
9.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE BOMBAS JOCKEY	und	1.00	3,272,895.06	3,272,895.06	1.00	$ 3,272,895.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,272,895.06	100.00%	0.03%
9.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE BOMBAS EYECTORAS	und	1.00	3,272,895.06	3,272,895.06	1.00	$ 3,272,895.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,272,895.06	100.00%	0.03%
9.07.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE BOMBAS AGUAS LLUVIAS	und	1.00	3,510,024.11	3,510,024.11	1.00	$ 3,510,024.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,510,024.11	100.00%	0.03%
9.07.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE ASCENSOR	und	1.00	3,628,588.63	3,628,588.63	1.00	$ 3,628,588.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,628,588.63	100.00%	0.03%
9.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL FACTOR DE POTENCIA - Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante procesos de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris claro al horno y compuesto de los siguientes elementos: - Tensión de trabajo 208/120 Volt. - und (1) und BREAKERS industrial de 3x80amp - Dos (1) und BREAKERS industrial de 3x50amp	und	1.00	10,178,767.54	10,178,767.54	1.00	$ 10,178,767.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 10,178,767.54	100.00%	0.09%
9.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE COMPRESOR	und	1.00	3,391,459.58	3,391,459.58	1.00	$ 3,391,459.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 3,391,459.58	100.00%	0.03%
9.08	**DE BREAKERS ELÉCTRICOS**																
9.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 1X20A	und	110.00	21,248.38	2,337,321.80	110.00	$ 2,337,321.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	110.00	$ 2,337,321.80	100.00%	0.02%
9.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 1X30A	und	30.00	21,633.97	649,019.10	30.00	$ 649,019.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 649,019.10	100.00%	0.01%
9.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 1X40A	und	20.00	23,452.29	469,045.80	20.00	$ 469,045.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 469,045.80	100.00%	0.00%
9.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 1X50A	und	15.00	23,925.55	358,883.25	15.00	$ 358,883.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 358,883.25	100.00%	0.00%
9.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 2X20A	und	20.00	48,036.99	960,739.80	20.00	$ 960,739.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 960,739.80	100.00%	0.01%
9.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 2X30A	und	20.00	48,036.99	960,739.80	20.00	$ 960,739.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 960,739.80	100.00%	0.01%
9.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 2X40A	und	20.00	55,011.38	1,100,227.60	20.00	$ 1,100,227.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 1,100,227.60	100.00%	0.01%
9.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 2X50A	und	20.00	55,011.38	1,100,227.60	20.00	$ 1,100,227.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	20.00	$ 1,100,227.60	100.00%	0.01%
9.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 2X60A	und	10.00	69,418.46	694,184.60	10.00	$ 694,184.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 694,184.60	100.00%	0.01%
9.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 3X20A	und	15.00	44,155.25	662,328.75	15.00	$ 662,328.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 662,328.75	100.00%	0.01%
9.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 3X30A	und	15.00	133,925.53	2,008,882.95	15.00	$ 2,008,882.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 2,008,882.95	100.00%	0.02%
9.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 3X40A	und	5.00	130,928.54	654,642.70	5.00	$ 654,642.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 654,642.70	100.00%	0.01%
9.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Breaker 3X50A	und	5.00	66,697.45	333,487.25	5.00	$ 333,487.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 333,487.25	100.00%	0.00%
9.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X30A	und	22.00	184,156.04	4,051,432.88	22.00	$ 4,051,432.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.00	$ 4,051,432.88	100.00%	0.04%
9.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X40A	und	3.00	184,156.04	552,468.12	3.00	$ 552,468.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 552,468.12	100.00%	0.01%
9.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X50A	und	3.00	66,697.45	200,092.35	3.00	$ 200,092.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 200,092.35	100.00%	0.00%
9.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X60A	und	4.00	108,444.12	433,776.48	4.00	$ 433,776.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 433,776.48	100.00%	0.00%
9.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X70A	und	1.00	228,164.40	228,164.40	1.00	$ 228,164.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 228,164.40	100.00%	0.00%
9.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X100A 80 Amp	und	2.00	202,438.89	404,877.78	2.00	$ 404,877.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 404,877.78	100.00%	0.00%
9.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X125A	und	2.00	257,775.65	515,551.30	2.00	$ 515,551.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 515,551.30	100.00%	0.00%
9.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TOTALIZADOR 3X150A	und	4.00	257,775.65	1,031,102.60	4.00	$ 1,031,102.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 1,031,102.60	100.00%	0.01%
9.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X175A	und	1.00	279,367.83	279,367.83	1.00	$ 279,367.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 279,367.83	100.00%	0.00%
9.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X200A	und	2.00	481,640.90	963,281.80	2.00	$ 963,281.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 963,281.80	100.00%	0.01%
9.08.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X250A	und	1.00	334,329.96	334,329.96	1.00	$ 334,329.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 334,329.96	100.00%	0.00%
9.08.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X300A	und	2.00	1,064,594.77	2,129,189.54	2.00	$ 2,129,189.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 2,129,189.54	100.00%	0.02%
9.08.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X500A	und	2.00	1,644,863.51	3,289,727.02	2.00	$ 3,289,727.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,289,727.02	100.00%	0.03%
9.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X600A	und	2.00	1,644,863.51	3,289,727.02	2.00	$ 3,289,727.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,289,727.02	100.00%	0.03%
9.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X630A	und	4.00	2,195,436.31	8,781,745.24	4.00	$ 8,781,745.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 8,781,745.24	100.00%	0.08%
9.09	**DE TOMAS ELÉCTRICAS, INTERRUPTORES Y SENSORES**																
9.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MONOFÁSICA SYS NORMAL	und	116.00	17,346.17	2,012,155.72	116.00	$ 2,012,155.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	116.00	$ 2,012,155.72	100.00%	0.02%
9.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI MONOFÁSICA	und	5.00	48,953.08	244,765.40	5.00	$ 244,765.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 244,765.40	100.00%	0.00%
9.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA REGULADA	und	55.00	25,095.71	1,380,264.05	55.00	$ 1,380,264.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	55.00	$ 1,380,264.05	100.00%	0.01%
9.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA BIFÁSICA	und	3.00	23,148.86	69,446.58	3.00	$ 69,446.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 69,446.58	100.00%	0.00%
9.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA TRIFÁSICA	und	2.00	41,756.52	83,513.04	2.00	$ 83,513.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 83,513.04	100.00%	0.00%
9.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO 1	und	8.00	75,626.12	605,008.96	8.00	$ 605,008.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 605,008.96	100.00%	0.01%
9.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO 2 DUAL	und	8.00	85,643.32	685,146.56	8.00	$ 685,146.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 685,146.56	100.00%	0.01%
9.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE	und	4.00	23,977.82	95,911.28	4.00	$ 95,911.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 95,911.28	100.00%	0.00%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
9.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	und	3.00	36,478.90	109,436.70	3.00	$ 109,436.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 109,436.70	100.00%	0.00%
9.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	und	6.00	30,731.01	184,386.06	6.00	$ 184,386.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 184,386.06	100.00%	0.00%
9.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	und	36.00	26,266.41	945,590.76	36.00	$ 945,590.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	36.00	$ 945,590.76	100.00%	0.01%
9.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA EQUIPO EYECTOR	und	6.00	41,756.52	250,539.12	6.00	$ 250,539.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 250,539.12	100.00%	0.00%
9.09.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	und	7.00	28,753.28	201,272.96	7.00	$ 201,272.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 201,272.96	100.00%	0.00%
9.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	und	6.00	41,756.52	250,539.12	6.00	$ 250,539.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 250,539.12	100.00%	0.00%
9.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA SECADOR DE MANOS	und	8.00	29,554.33	236,434.64	8.00	$ 236,434.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 236,434.64	100.00%	0.00%
9.10	**DE SALIDA DE ILUMINACIÓN**																
9.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 1 Incrustar	und	94.00	46,427.42	4,364,177.48	94.00	$ 4,364,177.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	94.00	$ 4,364,177.48	100.00%	0.04%
9.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 2 Descolgada	und	83.00	46,427.42	3,853,475.86	83.00	$ 3,853,475.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.00	$ 3,853,475.86	100.00%	0.03%
9.10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 3 Sobreponer	und	166.00	46,427.42	7,706,951.72	166.00	$ 7,706,951.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	166.00	$ 7,706,951.72	100.00%	0.07%
9.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 4 Piso	und	2.00	46,427.42	92,854.84	2.00	$ 92,854.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 92,854.84	100.00%	0.00%
9.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EXTERIOR TIPO 1 Poste	und	4.00	350,773.59	1,403,094.36	4.00	$ 1,403,094.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 1,403,094.36	100.00%	0.01%
9.10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EXTERIOR TIPO 2 Pared	und	46.00	42,096.32	1,936,430.72	46.00	$ 1,936,430.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	46.00	$ 1,936,430.72	100.00%	0.02%
9.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA PARED TIPO 1 Aplique	und	35.00	46,427.42	1,624,959.70	35.00	$ 1,624,959.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 1,624,959.70	100.00%	0.01%
9.10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA PARED TIPO 2 Emergencia	und	43.00	42,096.32	1,810,141.76	43.00	$ 1,810,141.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	43.00	$ 1,810,141.76	100.00%	0.02%
9.10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA PISO TIPO 1 Piso	und	15.00	46,427.42	696,411.30	15.00	$ 696,411.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 696,411.30	100.00%	0.01%
9.11	**DE VOZ Y DATOS**																
9.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK 42UR	und	1.00	4,946,501.96	4,946,501.96	1.00	$ 4,946,501.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,946,501.96	100.00%	0.04%
9.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK CAT. 6A	und	70.00	22,425.41	1,569,778.70	70.00	$ 1,569,778.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	70.00	$ 1,569,778.70	100.00%	0.01%
9.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE SENCILLO	und	140.00	21,010.61	2,941,485.40	140.00	$ 2,941,485.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	140.00	$ 2,941,485.40	100.00%	0.03%
9.11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE DOBLE	und	140.00	22,206.21	3,108,869.40	140.00	$ 3,108,869.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	140.00	$ 3,108,869.40	100.00%	0.03%
9.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORE DE 2 MTS	und	140.00	51,219.65	7,170,751.00	140.00	$ 7,170,751.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	140.00	$ 7,170,751.00	100.00%	0.07%
9.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN DE 24 PUERTOS CAT 6A	und	2.00	4,042,837.61	8,085,675.22	2.00	$ 8,085,675.22		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 8,085,675.22	100.00%	0.07%
9.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE ACCESO DE 24 PUERTOS CAT 6A	und	70.00	2,240,869.04	156,860,832.80	70.00	$ 156,860,832.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	70.00	$ 156,860,832.80	100.00%	1.42%
9.11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PUERTOS	und	2.00	877,337.15	1,754,674.30	2.00	$ 1,754,674.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,754,674.30	100.00%	0.02%
9.11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES DE CABLE VERTICAL TIPO 1	und	2.00	179,898.76	359,797.52	2.00	$ 359,797.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 359,797.52	100.00%	0.00%
9.12	**DE APANTALLAMIENTO**																
9.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punta CAPTADORA 2 MTS	und	5.00	142,447.81	712,239.05	5.00	$ 712,239.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 712,239.05	100.00%	0.01%
9.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punta CAPTADORA 1 MTS	und	5.00	163,938.87	819,694.35	5.00	$ 819,694.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 819,694.35	100.00%	0.01%
9.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Punta CAPTADORA,6 MTS	und	35.00	82,786.94	2,897,542.90	35.00	$ 2,897,542.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 2,897,542.90	100.00%	0.03%
9.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE uniones TIPO CRUZ PARA CABLE	und	30.00	68,105.31	2,043,159.30	30.00	$ 2,043,159.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 2,043,159.30	100.00%	0.02%
9.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE uniones TIPO T PARA CABLE	und	15.00	19,234.80	288,522.00	15.00	$ 288,522.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 288,522.00	100.00%	0.00%
9.12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL BIMETÁLICO	und	350.00	9,529.41	3,335,293.50	350.00	$ 3,335,293.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	350.00	$ 3,335,293.50	100.00%	0.03%
9.12.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CAMBIO DE MATERIAL	und	3.00	66,926.63	200,779.89	3.00	$ 200,779.89		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 200,779.89	100.00%	0.00%
9.12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA 0.30X0.30M	und	5.00	97,946.52	489,732.60	5.00	$ 489,732.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 489,732.60	100.00%	0.00%
9.13	**DE SUBESTACIÓN**																
9.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA TIPO 1	und	1.00	32,403,151.24	32,403,151.24	1.00	$ 32,403,151.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 32,403,151.24	100.00%	0.29%
9.13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS DE ALFAJOR TIPO 1	m	1.00	148,072.95	148,072.95	1.00	$ 148,072.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 148,072.95	100.00%	0.00%
9.13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO TIPO 1	m	1.00	98,429.72	98,429.72	1.00	$ 98,429.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 98,429.72	100.00%	0.00%
9.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR (MEDIDA INDIRECTA)	und	2.00	8,735,451.98	17,470,903.96	2.00	$ 17,470,903.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 17,470,903.96	100.00%	0.16%
9.13.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES	und	6.00	2,899,117.58	17,394,705.48	6.00	$ 17,394,705.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 17,394,705.48	100.00%	0.16%
9.13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS	und	5.00	640,819.69	3,204,098.45	5.00	$ 3,204,098.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 3,204,098.45	100.00%	0.03%
9.14	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**																
9.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCENDIOS	und	2.00	6,353,122.12	12,706,244.24	2.00	$ 12,706,244.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 12,706,244.24	100.00%	0.12%
9.14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE ÓPTICO	und	8.00	587,598.77	4,700,790.16	8.00	$ 4,700,790.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 4,700,790.16	100.00%	0.04%
9.14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO	und	63.00	566,257.16	35,674,201.08	63.00	$ 35,674,201.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	63.00	$ 35,674,201.08	100.00%	0.32%
9.14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	und	2.00	447,150.68	894,301.36	2.00	$ 894,301.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 894,301.36	100.00%	0.01%
9.14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA Y ALARMA	und	25.00	237,158.95	5,928,973.75	25.00	$ 5,928,973.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 5,928,973.75	100.00%	0.05%
9.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO NAC	und	1.00	741,920.02	741,920.02	1.00	$ 741,920.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 741,920.02	100.00%	0.01%
9.14.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE HUMO BEAM	und	1.00	755,167.37	755,167.37	1.00	$ 755,167.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 755,167.37	100.00%	0.01%
9.14.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MONITOR	und	1.00	302,369.44	302,369.44	1.00	$ 302,369.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 302,369.44	100.00%	0.00%
9.14.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2X18 FPLR	m	980.00	4,856.94	4,759,801.20	980.00	$ 4,759,801.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	980.00	$ 4,759,801.20	100.00%	0.04%
9.15	**SISTEMA DE CCTV**																
9.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR DE CONTROL	und	2.00	7,705,530.25	15,411,060.50	2.00	$ 15,411,060.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 15,411,060.50	100.00%	0.14%
9.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA INTERIOR TIPO 1 Bullet	und	35.00	1,413,314.29	49,466,000.15	35.00	$ 49,466,000.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 49,466,000.15	100.00%	0.45%
9.15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA INTERIOR TIPO 2	und	12.00	680,973.26	8,171,679.12	12.00	$ 8,171,679.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 8,171,679.12	100.00%	0.07%
9.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA POE EXTERIOR TIPO 1	und	8.00	2,563,091.28	20,504,730.24	8.00	$ 20,504,730.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 20,504,730.24	100.00%	0.19%
9.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE MONITOREO CCTV TIPO 1	und	1.00	7,254,287.07	7,254,287.07	1.00	$ 7,254,287.07		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 7,254,287.07	100.00%	0.07%
9.16	**POSTES Y EXCAVACIONES**																
9.16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO 6M	und	3.00	878,166.00	2,634,498.00	3.00	$ 2,634,498.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 2,634,498.00	100.00%	0.02%
9.16.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXCAVACIÓN PARA DUCTO DE TUBOS 6"	m	80.00	254,578.94	20,366,315.20	80.00	$ 20,366,315.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	80.00	$ 20,366,315.20	100.00%	0.18%
9.16.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN PARA DUCTO DE TUBOS 4"	m	80.00	100,982.68	8,078,614.40	80.00	$ 8,078,614.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	80.00	$ 8,078,614.40	100.00%	0.07%
9.17	**CERTIFICACIONES**																
9.17.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CERTIFICACIÓN Puntos LÓGICOS DE VOZ T DATOS	und	44.00	39,853.62	1,753,559.28	44.00	$ 1,753,559.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	44.00	$ 1,753,559.28	100.00%	0.02%
9.17.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRUEBA VLF CIRCUITO DE MEDIA TENSION	und	1.00	2,077,975.14	2,077,975.14	1.00	$ 2,077,975.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,077,975.14	100.00%	0.02%
10	**INSTALACIONES MECANICAS DE AIRE ACONDICIONADO**																
10.01	**DE EQUIPOS MECANICOS, unidades condensadoras de refrigerante variable Cooling Only**																

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
10.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unidad CONDENSADORA COOLING ONLY, 96 MBH, 208/3/60 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	27,018,953.28	27,018,953.28	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.02	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, unidades condensadoras de refrigerante variable Heat Pump**																
10.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unidad CONDENSADORA HEAT PUMP, 96 MBH, 208/3/60 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	28,108,592.81	28,108,592.81	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.03	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, unidades evaporadoras VRF tipo FanCoil Desnudo Alta Estática**																
10.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unidad EVAPORADORA VRF TIPO FANCOIL DESNUDO, 76,000 BTUH, 208/1/60 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	10,748,361.64	10,748,361.64	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.04	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, unidades evaporadoras VRF tipo Pared**																
10.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unidad EVAPORADORA VRF TIPO PARED, 12,000 BTUH, 208/1/60 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	2,942,494.74	2,942,494.74	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE unidad EVAPORADORA VRF TIPO PARED, 24,000 BTUH, 208/1/60 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	3.00	3,526,991.94	10,580,975.82	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.05	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Ventiladores tipo centrífugos.**																
10.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO HONGO DE CARGA VERTICAL, VE-01 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	9,001,407.95	9,001,407.95	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO HONGO DE CARGA VERTICAL, VE-02 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	9,796,329.29	9,796,329.29	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO HONGO DE CARGA VERTICAL, VE-03 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	9,752,969.55	9,752,969.55	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO HONGO DE CARGA VERTICAL, VE-04 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	9,001,407.95	9,001,407.95	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.06	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Ventiladores tipo helicocentrífugos.**																
10.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGOS, VS-01 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, filtro MERV 8, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	6,424,972.64	6,424,972.64	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGOS, VS-02 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, filtro MERV 8, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	2,773,153.38	2,773,153.38	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.07	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Ventiladores tipo individual.**																
10.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INDIVIDUAL TIPO CENTRIFUGO, CFP-01 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	2.00	5,039,009.93	10,078,019.86	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INDIVIDUAL TIPO CENTRIFUGO, CFP-03 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, soporteria anti vibratoria, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	10,310,068.91	10,310,068.91	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.08	**MATERIALES, Materiales para la fabricación de ductos rectangulares**																
10.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lamina Galvanizada Calibre 16	m2	40.00	152,183.38	6,087,335.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lamina Galvaniza calibre 24	m2	350.00	108,845.55	38,095,942.50	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lamina de fibra de vidrio tipo ducto glass neto	m2	60.00	138,598.37	8,315,902.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.09	**ACCESORIOS SISTEMA DE DUCTOS, Dampers de balanceo**																
10.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPERS DE BALANCEO	und	5.00	393,859.52	1,969,297.60	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPERS DE GRAVEDAD	und	1.00	406,544.93	406,544.93	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.10	**DIFUSORES Y REJILLAS, Difusores 3 vias**																
10.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS CON DÁMPER, DS3V, 6"x6" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	2.00	153,365.78	306,731.56	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS CON DÁMPER, DS3V, 12"x12" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	185,271.59	185,271.59	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.11	**DIFUSORES Y REJILLAS, Difusores 4 vias**																
10.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DÁMPER, DS4V, 12"x12" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	6.00	121,459.96	728,759.76	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.12	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas de extracción aleta fija**																
10.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 6"x6" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	35.00	151,942.01	5,317,970.35	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 8"x8" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	2.00	170,440.06	340,880.12	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 10"x8" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	3.00	192,566.80	577,700.40	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 10"x10" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	2.00	219,033.59	438,067.18	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 12"x12" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	4.00	250,693.30	1,002,773.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DÁMPER, REAF, 14"x14" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	288,563.21	288,563.21	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.13	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas de retorno aleta fija**																
10.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER, RRAF, 20"x20" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	2.00	97,723.15	195,446.30	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.14	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas tipo louver**																
10.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO LOUVER, RTLV, 8"x6" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	93,754.72	93,754.72	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO LOUVER, RTLV, 8"x8" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	99,321.28	99,321.28	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO LOUVER, RTLV, 12"x6" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	107,752.31	107,752.31	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO LOUVER, RTLV, 20"x10" (Incluye: Transporte, instalación, accesorios de instalación)	und	1.00	116,150.46	116,150.46	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.15	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, Tuberia de refrigerante Rigida**																
10.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/4"	m	5.00	34,266.59	171,332.95	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/8"	m	105.00	37,562.49	3,944,061.45	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
10.15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/2"	m	20.00	41,414.34	828,286.80	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 5/8"	m	60.00	45,912.82	2,754,769.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/4"	m	22.00	51,168.52	1,125,707.44	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 7/8"	m	35.00	60,807.11	2,128,248.85	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.16	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, Accesorios derivadores de cobre aislados (BRANCH).**																
10.16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DERIVADOR DE COBRE AISLADOS (BRANCH) PARA INTERIORES	und	3.00	352,562.54	1,057,687.62	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.17	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, Adicionales**																
10.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cantidad de refrigerante adicional R410A	kg	12.00	52,804.53	633,654.36	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.18	**SISTEMA ELÉCTRICO, Tableros eléctricos**																
10.18.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, TAE-01 (Incluye: Cofre para exteriores según norma vigente, protecciones, accesorios de instalación, soportería, transporte, puesta en sitio, instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	4,886,895.18	4,886,895.18	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, TAE-02 (Incluye: Cofre para interiores según norma vigente, protecciones, accesorios de instalación, soportería, transporte, puesta en sitio, instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	4,165,157.05	4,165,157.05	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.19	**SISTEMA ELÉCTRICO, Variadores de frecuencia**																
10.19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA, 1,5 HP (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	2,673,467.37	2,673,467.37	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA, 2 HP (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	2,765,206.42	2,765,206.42	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.20	**SISTEMA DE CONTROL, tableros de control**																
10.20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, TC-00 (Incluye: Cofre para exteriores según norma vigente, relevos, accesorios de instalación, soportería, transporte, puesta en sitio, instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	4,289,793.35	4,289,793.35	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.20.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, TC-01 (Incluye: Cofre para interiores según norma vigente, relevos, accesorios de instalación, soportería, transporte, puesta en sitio, instalación, puesta en marcha y pruebas	und	1.00	4,252,134.92	4,252,134.92	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.20.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, TC-02 (Incluye: Cofre para interiores según norma vigente, relevos, accesorios de instalación, soportería, transporte, puesta en sitio, instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	4,252,134.92	4,252,134.92	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.21	**SISTEMA DE CONTROL, controladores**																
10.21.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR CENTRAL VRF, MAX 64 unidades INTERNAS, TC-00 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	14,537,885.40	14,537,885.40	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.21.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE CAMPO, TC-01 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	8,828,995.53	8,828,995.53	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.21.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE CAMPO, TC-02 (Incluye: Transporte, puesta en sitio, instalación, accesorios de instalación, puesta en marcha y pruebas)	und	1.00	8,505,688.01	8,505,688.01	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.22	**SISTEMA DE CONTROL, Sensores - actuadores**																
10.22.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Termostatos VRF independientes por área	und	5.00	784,603.16	3,923,015.80	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.22.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Rele contactor	und	4.00	644,891.30	2,579,565.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.22.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Dona de corriente	und	4.00	393,116.05	1,572,464.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.22.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Switch diferencial de presión	und	2.00	529,365.62	1,058,731.24	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.23	**SISTEMA DE CONTROL, Otras actividades**																
10.23.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Transformador tableros de control	und	3.00	410,155.16	1,230,465.48	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.23.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cableado de control SENSORES (Incluye canalización y soportería).	m	125.00	10,275.14	1,284,392.50	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.23.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cableado de control Comunicación (Incluye canalización y soportería).	m	300.00	23,875.19	7,162,557.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
11	**SOBREPISOS Y AFINADOS INTERIORES**																
11.01	**ALISTADOS DE PISOS**																
11.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO LLANA METÁLICA	m2	226.02	40,318.60	9,112,809.97	226.02	$ 9,112,809.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	226.02	$ 9,112,809.97	100.00%	0.08%
11.01.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO LLANA MADERA	m2	366.45	34,071.57	12,485,526.83	366.45	$ 12,485,526.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	366.45	$ 12,485,526.83	100.00%	0.11%
11.01.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO INTEGRAL	m2	90.51	48,415.39	4,382,076.95	90.51	$ 4,382,076.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	90.51	$ 4,382,076.95	100.00%	0.04%
11.01.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO MORTERO CON ENDURECEDOR	m2	1,279.85	47,774.76	61,144,526.59	1,279.85	$ 61,144,526.59		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,279.85	$ 61,144,526.59	100.00%	0.55%
11.01.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO	m2	628.34	39,326.26	24,710,262.21	628.34	$ 24,710,262.21		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	628.34	$ 24,710,262.21	100.00%	0.22%
11.01.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MORTERO ESTRIADO RAMPA	m2	45.24	47,087.62	2,130,243.93	45.24	$ 2,130,243.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.24	$ 2,130,243.93	100.00%	0.02%
11.02	**POYOS, BORDILLOS Y CÁRCAMOS Fundidos**																
11.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE POYO EN CONCRETO E= 15 CM	m	13.61	102,354.01	1,393,038.08	13.61	$ 1,393,038.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.61	$ 1,393,038.08	100.00%	0.01%
11.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE POYO EN CONCRETO EN CUBIERTA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E=20 CM	m2	1.76	124,671.24	219,421.38	1.76	$ 219,421.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.76	$ 219,421.38	100.00%	0.00%
11.02.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO Fundido EN SITIO 10 x 15 CM	m	132.04	50,986.79	6,732,295.75	132.04	$ 6,732,295.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	132.04	$ 6,732,295.75	100.00%	0.06%
11.02.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO Fundido EN SITIO 10 x 25 CM	m	34.49	61,729.54	2,129,051.83	34.49	$ 2,129,051.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.49	$ 2,129,051.83	100.00%	0.02%
11.02.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO Fundido	m	14.60	40,937.66	597,689.84	14.60	$ 597,689.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.60	$ 597,689.84	100.00%	0.01%
11.02.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAÑUELA PARA CUBIERTAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	m	104.37	42,679.09	4,454,416.62	104.37	$ 4,454,416.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	104.37	$ 4,454,416.62	100.00%	0.04%
12	**ACABADOS DE PISOS**																
12.01	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA**																
12.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA YARUMO TABACO CARAS DIFERENCIADAS 30X60	m2	8.70	65,569.35	570,453.35	8.70	$ 570,453.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.70	$ 570,453.35	100.00%	0.01%
12.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA YARUMO GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60	m2	34.80	65,569.35	2,281,813.38	34.80	$ 2,281,813.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.80	$ 2,281,813.38	100.00%	0.02%
12.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA NOW GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60	m2	34.77	66,179.11	2,301,047.65	34.77	$ 2,301,047.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.77	$ 2,301,047.65	100.00%	0.02%
12.02	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS EN PORCELANATO**																
12.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO CHICAGO GRIS CENIZO	m2	248.63	118,106.65	29,364,856.39	248.63	$ 29,364,856.39		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	248.63	$ 29,364,856.39	100.00%	0.27%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS CARRERA 14B No. 146-05		FECHA:	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	03	PROCESO No:		TIPO DE PROCESO:	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	N.I.T:	
	1-mar-26 / 31-mar-26	CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	N.I.T:	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	N.I.T:	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario ofertado	Valor total ofertado	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Ejec. del Item	% Ejec. del Contrato	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Pend. Ejec. del Item	% Pend. Ejec. del Contrato
12.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PORCELANATO CHICAGO GRIS CENIZO	m	160.82	59,409.05	9,554,163.42	160.82	$ 9,554,163.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	160.82	$ 9,554,163.42	100.00%	0.09%
12.03	**PISOS EN CONCRETO**																
12.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO	m2	1,136.70	30,945.67	35,175,943.09	1,136.70	$ 35,175,943.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,136.70	$ 35,175,943.09	100.00%	0.32%
12.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO ACABADO TIPO HELICÓPTERO	m2	832.35	61,513.95	51,201,136.28	832.35	$ 51,201,136.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	832.35	$ 51,201,136.28	100.00%	0.46%
12.04	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS EN ARCILLA Y GRES**																
12.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA DE GRES ETRUSCA SAHARA 7 X 5cm	m2	12.24	54,392.48	665,763.96	12.24	$ 665,763.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.24	$ 665,763.96	100.00%	0.01%
12.05	**PISOS EN GRANITO**																
12.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA ECO KRISTAL BLANCO 30X30	m2	366.45	135,068.41	49,495,818.84	366.45	$ 49,495,818.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	366.45	$ 49,495,818.84	100.00%	0.45%
12.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN GRANITO BALDOSA ECO KRISTAL BLANCO 30X30	m2	26.72	53,174.55	1,420,823.98	26.72	$ 1,420,823.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	26.72	$ 1,420,823.98	100.00%	0.01%
12.06	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS SINTÉTICOS**																
12.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO - ROLLO ESPRIT COLOR ROJO	m2	9.18	179,079.19	1,643,946.96	9.18	$ 1,643,946.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.18	$ 1,643,946.96	100.00%	0.01%
12.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN VINILO ESPRIT COLOR ROJO	m	13.13	58,180.34	763,907.86	13.13	$ 763,907.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	13.13	$ 763,907.86	100.00%	0.01%
12.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO RECICLADO BALDOSA DE CAUCHO ALTA RESISTENCIA A IMPACTO COLOR NEGRO - 5CM	m2	90.77	99,363.64	9,019,237.60	90.77	$ 9,019,237.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	90.77	$ 9,019,237.60	100.00%	0.08%
12.07	**PISOS EN ALFOMBRA**																
12.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ALFOMBRA ARRANGE COLOR ROJO 61X61	m2	77.49	156,794.10	12,149,974.81	77.49	$ 12,149,974.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	77.49	$ 12,149,974.81	100.00%	0.11%
12.08	**PISO EN MADERA**																
12.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA LAMINADA COLOR JAVA FC084	m2	48.58	134,194.94	6,519,190.19	48.58	$ 6,519,190.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	48.58	$ 6,519,190.19	100.00%	0.06%
12.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN MADERA LAMINADA COLOR JAVA FC084	m	79.17	20,155.01	1,595,672.14	79.17	$ 1,595,672.14		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	79.17	$ 1,595,672.14	100.00%	0.01%
12.09	**PIRLANES**																
12.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN ALUMINIO	m	65.40	13,382.24	875,198.50	65.40	$ 875,198.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	65.40	$ 875,198.50	100.00%	0.01%
12.09.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PIRLAN EN GRES ANTIDESLIZANTE ESCALERA EN CONCRETO	m	99.00	7,783.45	770,561.55	99.00	$ 770,561.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	99.00	$ 770,561.55	100.00%	0.01%
12.10	**ACABADOS PARA ESCALERAS**																
12.10.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE HUELLA / CONTRA HUELLA EN CONCRETO ESMALTADO	m	99.00	32,307.75	3,198,467.25	99.00	$ 3,198,467.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	99.00	$ 3,198,467.25	100.00%	0.03%
13	**CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS**																
13.01	**CUBIERTAS METÁLICAS**																
13.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.26 ANCHO 18cm	m	59.88	28,120.15	1,683,834.58	59.88	$ 1,683,834.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	59.88	$ 1,683,834.58	100.00%	0.02%
13.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CAL.26 ANCHO 30cm	m	71.72	52,785.88	3,785,803.31	71.72	$ 3,785,803.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	71.72	$ 3,785,803.31	100.00%	0.03%
13.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CAL.26 ANCHO 50cm	m	19.32	66,336.11	1,281,613.65	19.32	$ 1,281,613.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	19.32	$ 1,281,613.65	100.00%	0.01%
13.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CAL.26 ANCHO 52cm	m	12.65	67,691.13	856,292.79	12.65	$ 856,292.79		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.65	$ 856,292.79	100.00%	0.01%
13.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CAL.26 ANCHO 27cm	m	27.20	50,753.34	1,380,490.85	27.20	$ 1,380,490.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	27.20	$ 1,380,490.85	100.00%	0.01%
13.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA CAL. 16 ANCHO 30cm	m	37.90	63,086.79	2,390,989.34	37.90	$ 2,390,989.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	37.90	$ 2,390,989.34	100.00%	0.02%
13.02	**CUBIERTAS TERMOACÚSTICAS**																
13.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA METECNO MONOROOF E= 80 MM	m2	574.97	224,561.14	129,115,918.67	574.97	$ 129,115,918.67		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	574.97	$ 129,115,918.67	100.00%	1.17%
14	**IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES**																
14.01	**IMPERMEABILIZACIONES EN MANTO ASFALTICO**																
14.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO BICAPA CON FOIL DE ALUMINIO SISTEMA ASFALTICO PARA CUBIERTA VERDE CERESIT VAPORTITE	m2	183.43	80,276.08	14,725,041.35	183.43	$ 14,725,041.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	183.43	$ 14,725,041.35	100.00%	0.13%
14.02	**IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO**																
14.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA CUBIERTA CON TRAFICO MODERADO	m2	176.50	85,308.60	15,056,967.90	176.50	$ 15,056,967.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	176.50	$ 15,056,967.90	100.00%	0.14%
14.03	**CUBIERTAS VERDES**																
14.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE DRENAJE	m2	183.43	56,895.14	10,436,275.53	183.43	$ 10,436,275.53		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	183.43	$ 10,436,275.53	100.00%	0.09%
14.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUSTRATO LIVIANO DRENANTE	m2	361.69	38,325.24	13,861,856.06	361.69	$ 13,861,856.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	361.69	$ 13,861,856.06	100.00%	0.13%
14.04	**GEOTEXTILES Y GEOMEMBRANAS**																
14.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100	m2	183.43	10,835.02	1,987,467.72	183.43	$ 1,987,467.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	183.43	$ 1,987,467.72	100.00%	0.02%
14.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	183.43	7,725.34	1,417,059.12	183.43	$ 1,417,059.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	183.43	$ 1,417,059.12	100.00%	0.01%
14.05	**IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES**																
14.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CEMENTOSO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	m2	62.01	95,059.91	5,894,665.02	62.01	$ 5,894,665.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	62.01	$ 5,894,665.02	100.00%	0.05%
15	**METALISTERÍA**																
15.01	**PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO**																
15.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 10mm PC-01 D= 1.20 X 2.50m - CORREDIZA	und	1.00	1,552,758.72	1,552,758.72	1.00	$ 1,552,758.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,552,758.72	100.00%	0.01%
15.02	**PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED**																
15.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-01 D= 1.20 X 2.50m - SENCILLA	und	6.00	2,730,003.45	16,380,020.70	6.00	$ 16,380,020.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 16,380,020.70	100.00%	0.15%
15.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-02 D=.95 X 2.50m - SENCILLA	und	2.00	2,189,053.31	4,378,106.62	2.00	$ 4,378,106.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 4,378,106.62	100.00%	0.04%
15.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-03 D=.85 X 2.50m - SENCILLA	und	3.00	2,023,062.97	6,069,188.91	3.00	$ 6,069,188.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 6,069,188.91	100.00%	0.06%
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-04 D=.95 X 2.50m - SENCILLA REJILLA INFERIOR	und	6.00	1,800,754.48	10,804,526.88	6.00	$ 10,804,526.88		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 10,804,526.88	100.00%	0.10%
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-05 D=.85 X 2.50m - SENCILLA REJILLA INFERIOR	und	4.00	2,561,049.01	10,244,196.04	4.00	$ 10,244,196.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 10,244,196.04	100.00%	0.09%
15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL-06 D=.75 X 2.50m - SENCILLA REJILLA INFERIOR	und	5.00	2,329,848.18	11,649,240.90	5.00	$ 11,649,240.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 11,649,240.90	100.00%	0.11%
15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL_7 D= 1.05 X 2.50m - SENCILLA REJILLA COMPLETA	und	7.00	3,513,708.61	24,595,960.27	7.00	$ 24,595,960.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 24,595,960.27	100.00%	0.22%
15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL_8 D=.95 X 2.50m - SENCILLA REJILLA COMPLETA	und	4.00	3,513,708.61	14,054,834.44	4.00	$ 14,054,834.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 14,054,834.44	100.00%	0.13%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA **UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.** **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**CÓDIGO:** **VERSIÓN:** **FECHA:** **PÁGINA No:** DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA 31/03/2026	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

		Condiciones contractuales				**Condiciones actualizadas BALANCE 3**		**ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03**		**ACUMULADO**				**PENDIENTE POR EJECUTAR**			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
15.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL_9 D= 1,50 X 2,50m - DOBLE	und	2.00	3,037,958.98	6,075,917.96	2.00	$ 6,075,917.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 6,075,917.96	100.00%	0.06%
15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA CAL 18 PL_10 D= 1,50 X 2,50m - DOBLE REJILLA COMPLETA	und	3.00	3,117,852.54	9,353,557.62	3.00	$ 9,353,557.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 9,353,557.62	100.00%	0.08%
15.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL LAMINA COLD ROLLED PE-01 - D= 16.10 X 2,50m - DIMENSIONES Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	21,298,684.33	21,298,684.33	1.00	$ 21,298,684.33		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 21,298,684.33	100.00%	0.19%
15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL LAMINA COLD ROLLED PE-02 - D= 4.11 X 2,50m - DIMENSIONES Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	6,042,394.02	6,042,394.02	1.00	$ 6,042,394.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 6,042,394.02	100.00%	0.05%
15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL LAMINA COLD ROLLED PE-03 - D= 3.83 X 2,50m - DIMENSIONES Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	4,732,551.93	4,732,551.93	1.00	$ 4,732,551.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,732,551.93	100.00%	0.04%
15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL LAMINA COLD ROLLED PE-04 - VEHICULAR EN MALLA ESLABONADA Y CIERRE ELECTRÓNICO - D=3.70 X 2,40m	und	6.00	10,023,485.38	60,140,912.28	6.00	$ 60,140,912.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 60,140,912.28	100.00%	0.55%
15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESPECIAL LAMINA COLD ROLLED PE-05 - VEHICULAR EN MALLA ESLABONADA Y CIERRE ELECTRÓNICO - D=3.00 X 2.30m	und	1.00	5,435,038.25	5,435,038.25	1.00	$ 5,435,038.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 5,435,038.25	100.00%	0.05%
15.03	**PUERTAS CORTAFUEGOS EN LAMINA COLD ROLLED**																
15.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA CAL 18 D= 1.20 X 2,50m - SENCILLA PARA EVACUACIÓN	und	5.00	6,451,009.98	32,255,049.90	5.00	$ 32,255,049.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 32,255,049.90	100.00%	0.29%
15.04	**PUERTAS VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO**																
15.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-01 D= 7,76 X 7,90m Area:61,47m2	m2	61.47	646,158.41	39,719,357.46	61.47	$ 39,719,357.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	61.47	$ 39,719,357.46	100.00%	0.36%
15.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-02 D= 1,81 X 3,20m Area:5,79m2	m2	5.79	1,634,258.23	9,462,355.15	5.79	$ 9,462,355.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.79	$ 9,462,355.15	100.00%	0.09%
15.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-03 D= 2,62 X 2,50m Area:6,55m2	m2	6.55	966,843.57	6,332,825.38	6.55	$ 6,332,825.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.55	$ 6,332,825.38	100.00%	0.06%
15.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-04 SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	33.49	1,190,927.53	39,884,162.98	33.49	$ 39,884,162.98		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	33.49	$ 39,884,162.98	100.00%	0.36%
15.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-05 D= 4,31 X 2,50m Area:10,70m2	m2	10.70	1,190,836.87	12,741,954.51	10.70	$ 12,741,954.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.70	$ 12,741,954.51	100.00%	0.12%
15.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA-VENTANA PV-06 D= 6,53 X 2,50m Area:16,31m2	m2	16.31	1,436,453.74	23,428,560.50	16.31	$ 23,428,560.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.31	$ 23,428,560.50	100.00%	0.21%
15.05	**VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO**																
15.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-01 D= 10,61 X 7,90m Area:83,80m2	m2	83.80	625,022.69	52,376,901.42	83.80	$ 52,376,901.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.80	$ 52,376,901.42	100.00%	0.47%
15.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-02 D= 1,14 X 1,50m Area:1,72m2	m2	1.72	1,194,927.02	2,055,274.47	1.72	$ 2,055,274.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.72	$ 2,055,274.47	100.00%	0.02%
15.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-03A V-03B SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	10.35	863,354.85	8,935,722.70	10.35	$ 8,935,722.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.35	$ 8,935,722.70	100.00%	0.08%
15.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-04 D= 1,00 X 3,10m Area:3,10m2	m2	3.00	855,404.05	2,566,212.15	3.00	$ 2,566,212.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 2,566,212.15	100.00%	0.02%
15.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-05 D= 3,37 X 2,40m Area:16,20m2	m2	16.20	858,190.29	13,902,682.70	16.20	$ 13,902,682.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.20	$ 13,902,682.70	100.00%	0.13%
15.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-06A V-06B SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	12.30	841,026.85	10,344,630.26	12.30	$ 10,344,630.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.30	$ 10,344,630.26	100.00%	0.09%
15.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-07A V-07B SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	14.13	901,809.61	12,742,569.79	14.13	$ 12,742,569.79		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.13	$ 12,742,569.79	100.00%	0.12%
15.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-08 D= 15,17 X 1,45m Area:22,00m2	m2	22.76	918,331.92	20,901,234.50	22.76	$ 20,901,234.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.76	$ 20,901,234.50	100.00%	0.19%
15.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-09A V-09B SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	25.76	918,373.77	23,657,308.32	25.76	$ 23,657,308.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.76	$ 23,657,308.32	100.00%	0.21%
15.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-10A V-10B - V-10C SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	22.65	796,789.33	18,047,278.32	22.65	$ 18,047,278.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	22.65	$ 18,047,278.32	100.00%	0.16%
15.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-11 D= 3.14 X 1,50m Area:4.72m2	m2	4.64	675,902.81	3,136,189.04	4.64	$ 3,136,189.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.64	$ 3,136,189.04	100.00%	0.03%
15.05.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-12 D= 5.60 X,70m Area:3.92m2	m2	3.92	901,853.44	3,535,265.48	3.92	$ 3,535,265.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.92	$ 3,535,265.48	100.00%	0.03%
15.05.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-13 D=.55 X 1,72m Area:0.95m2	m2	0.95	921,364.78	875,296.54	0.95	$ 875,296.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.95	$ 875,296.54	100.00%	0.01%
15.06	**DIVISIONES EN ALUMINIO**																
15.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN OFICINA ALUMINIO DV-01 SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	19.70	515,560.60	10,156,543.82	19.70	$ 10,156,543.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	19.70	$ 10,156,543.82	100.00%	0.09%
15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN OFICINA ALUMINIO DV-02 SUBTIPO Y DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m2	68.18	572,813.15	39,054,400.57	68.18	$ 39,054,400.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	68.18	$ 39,054,400.57	100.00%	0.35%
15.07	**BARANDAS Y PASAMANOS METÁLICOS**																
15.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN LAMINA BA-01 CON PERFILES VERTICALES CADA 90CM - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m	41.27	371,010.86	15,311,618.19	41.27	$ 15,311,618.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	41.27	$ 15,311,618.19	100.00%	0.14%
15.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN LAMINA BA-02. ESTRUCTURA PRINCIPAL EN PERFILERÍA TUBULAR, PANEL EN ALUZINC GEOCLAD	m	37.93	181,435.82	6,881,860.65	37.93	$ 6,881,860.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	37.93	$ 6,881,860.65	100.00%	0.06%
15.08	**BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE**																
15.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PA-01 EN ESCALERA - DOBLE H= SUPERIOR 90CM / INFERIOR 70CM - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m	47.80	103,798.60	4,961,573.08	47.80	$ 4,961,573.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	47.80	$ 4,961,573.08	100.00%	0.04%
15.09	**REJILLAS EN ALUMINIO**																
15.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN ALUMINIO TIPO TC 4X4"	und	19.00	37,712.14	716,530.66	19.00	$ 716,530.66		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	19.00	$ 716,530.66	100.00%	0.01%
15.10	**ACCESORIOS NO ESTRUCTURALES**																
15.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL PTE REDONDA 1-1/2"X3mm ASTM 500 GRADO C x 7. METROS PARA DESCENSO DE BOMBEROS- INCLUYE PLATINAS, PERNOS DE ANCLAJE Y COLCHONETA DE 8CM DE ESPESOR / 1.20M DE DIÁMETRO UBICADA EN LA BASE DEL PERFIL PTE PARA EVITAR LESIONES.	und	2.00	1,840,523.79	3,681,047.58	2.00	$ 3,681,047.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 3,681,047.58	100.00%	0.03%
15.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE SEGURIDAD EN ÁREA DE MAQUINAS PARA LÍNEAS DE VIDA DE BOMBEROS	und	10.00	242,697.30	2,426,973.00	10.00	$ 2,426,973.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 2,426,973.00	100.00%	0.02%
15.11	**ACCESORIOS EN LAMINA**																
15.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ESCALERA DE GATO EN VARILLA CORRUGADA 1". 7 PELDAÑOS	und	8.00	465,833.98	3,726,671.84	8.00	$ 3,726,671.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 3,726,671.84	100.00%	0.03%
15.12	**FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS EXTERIORES METÁLICOS**																
15.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADAS METÁLICAS GEOCLAD (GEO-0159) COLOR ROJO AMAPOLA - INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y Funcionamiento	M2	486.78	502,415.30	244,565,719.73	486.78	$ 244,565,719.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	486.78	$ 244,565,719.73	100.00%	2.22%
15.13	**FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS EXTERIORES EN VIDRIO**																
15.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADAS EN POLICARBONATO CON PANEL MULTICELL COLOR OPAL DG SOFTLITE - INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y Funcionamiento	M2	670.63	526,788.16	353,279,943.74	670.63	$ 353,279,943.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	670.63	$ 353,279,943.74	100.00%	3.20%
16	**CARPINTERÍA EN MADERA**																
16.01	**CLOSETS Y VESTIERES EN MADERA**																
16.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EN MADERA CLM1 CUARTO OFICIAL - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	4,528,946.91	4,528,946.91	1.00	$ 4,528,946.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,528,946.91	100.00%	0.04%
16.02	**MUEBLES FIJOS**																
16.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO MUEBLE PARA GUARDIA EN L - MF-01 - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	2,075,412.27	2,075,412.27	1.00	$ 2,075,412.27		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,075,412.27	100.00%	0.02%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

			Condiciones contractuales			**Condiciones actualizadas BALANCE 3**		**ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03**		**ACUMULADO**				**PENDIENTE POR EJECUTAR**			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
16.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO MUEBLE SALA AMIGA - MF-02 - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	1,557,292.78	1,557,292.78	1.00	$ 1,557,292.78		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,557,292.78	100.00%	0.01%
16.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO BANCA VESTIER - MF-03 - L=0.98m - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	2.00	2,500,723.31	5,001,446.62	2.00	$ 5,001,446.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 5,001,446.62	100.00%	0.05%
16.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO BANCA VESTIER - MF-04 - L=1.20m - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	10.00	2,880,401.91	28,804,019.10	10.00	$ 28,804,019.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 28,804,019.10	100.00%	0.26%
17	**ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS**																
17.01	**ENCHAPES SOBRE MUROS**																
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA X M2 PISO PARED YARUMO GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60	m2	147.78	82,262.21	12,156,709.39	147.78	$ 12,156,709.39		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	147.78	$ 12,156,709.39	100.00%	0.11%
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA X ML PISO PARED YARUMO GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60	m	15.40	54,320.84	836,540.94	15.40	$ 836,540.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.40	$ 836,540.94	100.00%	0.01%
17.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA X M2 PARED REC ANTÁRTICA BLANCO CARA ÚNICA 30X60	m2	326.01	98,319.24	32,053,055.43	326.01	$ 32,053,055.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	326.01	$ 32,053,055.43	100.00%	0.29%
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA X ML PARED REC ANTÁRTICA BLANCO CARA ÚNICA 30X60	m	48.25	59,830.61	2,886,826.93	48.25	$ 2,886,826.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	48.25	$ 2,886,826.93	100.00%	0.03%
18	**CIELO RASOS**																
18.01	**CIELO RASO EN YESO**																
18.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO DRY WALL	m2	410.60	59,688.60	24,508,139.16	410.60	$ 24,508,139.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	410.60	$ 24,508,139.16	100.00%	0.22%
18.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE CIELO RASO PLANO	m	96.02	42,502.64	4,081,103.49	96.02	$ 4,081,103.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	96.02	$ 4,081,103.49	100.00%	0.04%
18.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO DRY WALL RH	m2	83.61	78,162.08	6,535,131.51	83.61	$ 6,535,131.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.61	$ 6,535,131.51	100.00%	0.06%
18.01.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO 0,60x0,60M	und	18.00	83,604.74	1,504,885.32	18.00	$ 1,504,885.32		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.00	$ 1,504,885.32	100.00%	0.01%
18.01.05	EJECUCIÓN DE APERTURA EN CIELO RASO PARA LUMINARIAS O APARATOS ELÉCTRICOS	und	415.00	18,481.77	7,669,934.55	415.00	$ 7,669,934.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	415.00	$ 7,669,934.55	100.00%	0.07%
18.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN PLÁSTICA CIELO RASO	m	381.00	9,694.99	3,693,791.19	381.00	$ 3,693,791.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	381.00	$ 3,693,791.19	100.00%	0.03%
18.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PERIMETRAL EN PVC TIPO J PARA CIELORRASOS	m	381.00	12,903.90	4,916,385.90	381.00	$ 4,916,385.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	381.00	$ 4,916,385.90	100.00%	0.04%
19	**ILUMINACIÓN**																
19.01	**LÁMPARAS DE SOBREPONER**																
19.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER Panel LED Redondo 12W NW	und	235.00	31,470.57	7,395,583.95	235.00	$ 7,395,583.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	235.00	$ 7,395,583.95	100.00%	0.07%
19.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER Panel LED 60x60 40W	und	58.00	37,620.98	2,182,016.84	58.00	$ 2,182,016.84		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	58.00	$ 2,182,016.84	100.00%	0.02%
19.02	**LUMINARIAS DESCOLGAR**																
19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DESCOLGAR High Bay 100W CW GC350	und	12.00	182,296.60	2,187,559.20	12.00	$ 2,187,559.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 2,187,559.20	100.00%	0.02%
19.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DESCOLGAR Hermética 36W DL und	und	50.00	161,568.12	8,078,406.00	50.00	$ 8,078,406.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	50.00	$ 8,078,406.00	100.00%	0.07%
19.03	**LUMINARIAS LINEALES**																
19.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL Minicontinuum	und	7.00	422,724.53	2,959,071.71	7.00	$ 2,959,071.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 2,959,071.71	100.00%	0.03%
19.04	**PROYECTORES Y REFLECTORES**																
19.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED Tortuga	und	9.00	37,288.20	335,593.80	9.00	$ 335,593.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 335,593.80	100.00%	0.00%
19.05	**APLIQUES (AP)**																
19.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE Roseta	und	10.00	13,665.96	136,659.60	10.00	$ 136,659.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 136,659.60	100.00%	0.00%
19.06	**LUMINARIAS EXTERIORES**																
19.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR LED JETA PRO 100W DL und	und	4.00	165,006.10	660,024.40	4.00	$ 660,024.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 660,024.40	100.00%	0.01%
19.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR Tabaco	und	6.00	282,820.39	1,696,922.34	6.00	$ 1,696,922.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 1,696,922.34	100.00%	0.02%
19.07	**LUMINARIA DE EMERGENCIA**																
19.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TECHO - P26848-LED EMERG APLIQUE 4W	und	28.00	110,143.61	3,084,021.08	28.00	$ 3,084,021.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	28.00	$ 3,084,021.08	100.00%	0.03%
19.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA PARED - P26848-LED EMERG APLIQUE 4W	und	15.00	93,944.11	1,409,161.65	15.00	$ 1,409,161.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 1,409,161.65	100.00%	0.01%
19.08	**ACCESORIOS Y VARIOS**																
19.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL LÁMPARAS	und	25.00	44,741.82	1,118,545.50	25.00	$ 1,118,545.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 1,118,545.50	100.00%	0.01%
19.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ANCLAJE METÁLICOS	und	45.00	44,741.82	2,013,381.90	45.00	$ 2,013,381.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 2,013,381.90	100.00%	0.02%
19.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO PARA LUMINARIAS EXTERIORES	und	5.00	2,424,081.77	12,120,408.85	5.00	$ 12,120,408.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 12,120,408.85	100.00%	0.11%
19.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD PARA LUMINARIAS	und	45.00	63,960.24	2,878,210.80	45.00	$ 2,878,210.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.00	$ 2,878,210.80	100.00%	0.03%
20	**DOTACIÓN BAÑOS**																
20.01	**SANITARIOS Y TAZAS**																
20.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIÁTICA - GRIF ANTIVANDÁLICA PMR	und	8.00	1,909,447.87	15,275,582.96	8.00	$ 15,275,582.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 15,275,582.96	100.00%	0.14%
20.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BÁLTICA - GRIF ANTIVANDÁLICA	und	7.00	1,858,036.70	13,006,256.90	7.00	$ 13,006,256.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 13,006,256.90	100.00%	0.12%
20.01.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR LAVAMANOS DE INCRUSTAR AQUAJET PMR	und	3.00	488,035.86	1,464,107.58	3.00	$ 1,464,107.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,464,107.58	100.00%	0.01%
20.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO LC-01 - EN CORIAN TUMBLED GLASS CON SALPICADERO Y FRENTERO INTEGRADO	m	11.57	1,826,636.50	21,134,184.31	11.57	$ 21,134,184.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.57	$ 21,134,184.31	100.00%	0.19%
20.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO LC-02 - EN ACERO INOXIDABLE Y PEDAL DE ACCIÓN INTEGRADO	m	1.16	2,986,011.70	3,463,773.57	1.16	$ 3,463,773.57		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.16	$ 3,463,773.57	100.00%	0.03%
20.02	**ORINALES**																
20.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTA ENTRADA POSTERIOR	und	9.00	883,071.19	7,947,640.71	9.00	$ 7,947,640.71		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 7,947,640.71	100.00%	0.07%
20.03	**COMBOS SANITARIOS**																
20.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO AQUAPRO AL (SANITARIO AQUAPRO CON TAZA ALONGADA, LAVAMANOS CON SEMIPEDESTAL, GRIFERÍA MONO CONTROL AQUAPRO, KIT DE ACCESORIOS THAMES (INCLUYE PERCHA, TOALLERO, PORTARROLLOS) Y DISPENSADOR DE JABÓN SOCODA 1.2L FD-923PVS)	und	4.00	920,468.26	3,681,873.04	4.00	$ 3,681,873.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 3,681,873.04	100.00%	0.03%
20.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO SMART AL (SANITARIO SMART CON TAZA ALONGADA, MUEBLE ELEVADO CON LAVAMANOS MARSELLA, GRIFERÍA MONO CONTROL AQUAPRO, KIT DE ACCESORIOS THAMES (INCLUYE PERCHA, TOALLERO, PORTARROLLOS) Y DISPENSADOR DE JABÓN SOCODA 1.2L FD-923PVS)	und	2.00	991,108.81	1,982,217.62	2.00	$ 1,982,217.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 1,982,217.62	100.00%	0.02%
20.04	**GRIFERÍAS Y LLAVES**																
20.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS PUSH PICO EMPOTRADO	und	16.00	513,919.55	8,222,712.80	16.00	$ 8,222,712.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 8,222,712.80	100.00%	0.07%
20.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS PUSH DE MESA	und	5.00	233,939.88	1,169,699.40	5.00	$ 1,169,699.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,169,699.40	100.00%	0.01%
20.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE DUCHA MONO CONTROL NOGAL	und	14.00	406,514.03	5,691,196.42	14.00	$ 5,691,196.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 5,691,196.42	100.00%	0.05%
20.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE DUCHA MONO CONTROL THAMES + TELEDUCHA	und	1.00	405,569.50	405,569.50	1.00	$ 405,569.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 405,569.50	100.00%	0.00%
20.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL	und	8.00	52,039.32	416,314.56	8.00	$ 416,314.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.00	$ 416,314.56	100.00%	0.00%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
20.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA Y LAVA OJOS	und	1.00	1,982,231.94	1,982,231.94	1.00	$ 1,982,231.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,982,231.94	100.00%	0.02%
20.05	**ACCESORIOS DE BAÑO**																
20.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE	und	10.00	279,673.44	2,796,734.40	10.00	$ 2,796,734.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 2,796,734.40	100.00%	0.03%
20.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA THAMES	und	37.00	64,563.52	2,388,850.24	37.00	$ 2,388,850.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	37.00	$ 2,388,850.24	100.00%	0.02%
20.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA FIJA 24"	und	6.00	143,922.85	863,537.10	6.00	$ 863,537.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 863,537.10	100.00%	0.01%
20.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA PLEGABLE	und	5.00	459,762.80	2,298,814.00	5.00	$ 2,298,814.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 2,298,814.00	100.00%	0.02%
20.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN DE EMPOTRAR A MURO	und	12.00	265,833.09	3,189,997.08	12.00	$ 3,189,997.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 3,189,997.08	100.00%	0.03%
20.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA COLOR CROMO LIQUID CROMO	und	15.00	155,216.37	2,328,245.55	15.00	$ 2,328,245.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.00	$ 2,328,245.55	100.00%	0.02%
20.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE	und	25.00	369,495.35	9,237,383.75	25.00	$ 9,237,383.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 9,237,383.75	100.00%	0.08%
20.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO EN ACERO INOXIDABLE	und	9.00	973,924.35	8,765,319.15	9.00	$ 8,765,319.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 8,765,319.15	100.00%	0.08%
20.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA BAÑO PMR PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE	und	1.00	1,388,601.28	1,388,601.28	1.00	$ 1,388,601.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,388,601.28	100.00%	0.01%
20.06	**REJILLAS DE BAÑOS**																
20.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO CUADRADA 4"X4"X2"	und	40.00	58,388.83	2,335,553.20	40.00	$ 2,335,553.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	40.00	$ 2,335,553.20	100.00%	0.02%
20.07	**TAPAS DE REGISTRO**																
20.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20x20 CMS Acero Inoxidable	und	9.00	61,103.86	549,934.74	9.00	$ 549,934.74		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 549,934.74	100.00%	0.00%
20.08	**EXTRACTORES DE OLORES**																
20.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLOR	und	9.00	126,351.04	1,137,159.36	9.00	$ 1,137,159.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 1,137,159.36	100.00%	0.01%
21	**DOTACIÓN COCINAS**																
21.01	**MUEBLES DE COCINA**																
21.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA MUEBLE ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE - MC-02 - D=0,69 X.69cm H=90cm	und	1.00	1,207,076.29	1,207,076.29	1.00	$ 1,207,076.29		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,207,076.29	100.00%	0.01%
21.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA MUEBLE ALMACENAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE - MC-03 - MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR - Según DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1.00	11,866,027.12	11,866,027.12	1.00	$ 11,866,027.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 11,866,027.12	100.00%	0.11%
21.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA MUEBLE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE - MC 04 - ANCHO 22CM	und	1.00	1,918,463.44	1,918,463.44	1.00	$ 1,918,463.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,918,463.44	100.00%	0.02%
21.02	**GRIFERÍA COCINA**																
21.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAPLATOS GRIFERÍA MONO CONTROL KORAL	und	3.00	384,553.84	1,153,661.52	3.00	$ 1,153,661.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,153,661.52	100.00%	0.01%
21.03	**LAVAPLATOS**																
21.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE LAVAPLATOS 1 POCETA EN ACERO INOXIDABLE	und	1.00	204,774.85	204,774.85	1.00	$ 204,774.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 204,774.85	100.00%	0.00%
21.03.02	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE MUEBLE LAVAPLATOS MC-01 - 2 POCETAS D=1.75 X.69cm H=90cm	und	1.00	2,091,445.31	2,091,445.31	1.00	$ 2,091,445.31		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,091,445.31	100.00%	0.02%
21.04	**ESTUFAS**																
21.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA COCINA INDUSTRIAL 6 PUESTOS Y PLANCHA	und	1.00	7,202,263.13	7,202,263.13	1.00	$ 7,202,263.13		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 7,202,263.13	100.00%	0.07%
21.05	**CAMPANAS EXTRACTORAS**																
21.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA EX3 – CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA – ZINGAL	und	1.00	24,963,262.91	24,963,262.91	1.00	$ 24,963,262.91		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 24,963,262.91	100.00%	0.23%
21.06	**CAJILLAS DE GAS**																
21.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLAS PARA GAS - DIM=15x15 CMS	und	4.00	707,857.37	2,831,429.48	4.00	$ 2,831,429.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 2,831,429.48	100.00%	0.03%
21.07	**CAJAS DE EQUIPOS**																
21.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA LAVADORA - DIM=15x15 CMS	und	4.00	53,420.06	213,680.24	4.00	$ 213,680.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 213,680.24	100.00%	0.00%
21.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA LLAVE DE NEVERA - DIM=15x15 CMS	und	2.00	47,442.01	94,884.02	2.00	$ 94,884.02		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 94,884.02	100.00%	0.00%
21.08	**REJILLAS DE COCINA**																
21.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE PISO REJILLA DE PISO CUADRADA INVISIBLE 10X10	und	1.00	58,401.76	58,401.76	1.00	$ 58,401.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 58,401.76	100.00%	0.00%
22	**VIDRIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES**																
22.01	**ESPEJOS CANTO PULIDO**																
22.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO ESPEJO FLOTADO INDIVIDUAL 90 X 70 CMS	und	4.00	101,161.91	404,647.64	4.00	$ 404,647.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 404,647.64	100.00%	0.00%
22.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO INCLINADO 10° INDIVIDUAL 90 X 60 CMS PARA BAÑOS PMR - BISELADO	und	3.00	85,172.02	255,516.06	3.00	$ 255,516.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 255,516.06	100.00%	0.00%
22.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO ESPEJO FLOTADO Y BISELADO CORRIDO	m2	15.65	104,901.89	1,641,714.58	15.65	$ 1,641,714.58		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	15.65	$ 1,641,714.58	100.00%	0.01%
22.02	**DIVISIONES EN ACERO**																
22.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE DIVISIÓN PARA DUCHA	m2	43.85	1,194,501.99	52,378,912.26	43.85	$ 52,378,912.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	43.85	$ 52,378,912.26	100.00%	0.47%
22.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINAS SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE	m2	48.20	1,158,529.11	55,841,103.10	48.20	$ 55,841,103.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	48.20	$ 55,841,103.10	100.00%	0.51%
22.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE ORINAL	m2	12.45	1,031,107.44	12,837,287.63	12.45	$ 12,837,287.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.45	$ 12,837,287.63	100.00%	0.12%
22.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE BASURAS	m2	12.34	774,883.52	9,562,062.64	12.34	$ 9,562,062.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.34	$ 9,562,062.64	100.00%	0.09%
23	**CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS**																
23.01	**CERRADURAS DE SOBREPONER**																
23.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE SOBREPONER CERRADURA DE SOBREPONER SENCILLA VIDRIO MEDIA Luna	und	4.00	229,689.30	918,757.20	4.00	$ 918,757.20		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 918,757.20	100.00%	0.01%
23.02	**CERRADURAS DE EMBUTIR**																
23.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE EMBUTIR CERRADURA DE EMBUTIR SERIE E MINI - CILINDRO INTERIOR EN ACERO 5 PINES	und	25.00	81,134.93	2,028,373.25	25.00	$ 2,028,373.25		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.00	$ 2,028,373.25	100.00%	0.02%
23.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE EMBUTIR CERRADURA DE EMBUTIR PICO LORO PARA PUERTA CORREDIZA	und	1.00	81,134.93	81,134.93	1.00	$ 81,134.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 81,134.93	100.00%	0.00%
23.03	**CERRADURAS INSTITUCIONALES**																
23.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS INSTITUCIONAL TIPO DANE SERIE W REF. W561 GRADO 2	und	18.00	229,689.30	4,134,407.40	18.00	$ 4,134,407.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.00	$ 4,134,407.40	100.00%	0.04%
23.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS INSTITUCIONAL PARA BAÑO - ACERO 701	und	9.00	81,134.93	730,214.37	9.00	$ 730,214.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	9.00	$ 730,214.37	100.00%	0.01%
23.04	**CERRADURAS ELÉCTRICAS**																
23.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTAS EN SALIDA DE MAQUINAS	und	7.00	694,581.80	4,862,072.60	7.00	$ 4,862,072.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 4,862,072.60	100.00%	0.04%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE / HASTA	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
	1-mar-26 / 31-mar-26	**CONTRATISTA OBRA:**	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

						Condiciones contractuales				**Condiciones actualizadas BALANCE 3**		**ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03**		**ACUMULADO**				**PENDIENTE POR EJECUTAR**			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
23.05	**CIERRAPUERTAS**																				
23.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS Y1001 PUERTAS EN VIDRIO	und	14.00	326,234.70	4,567,285.80	14.00	$ 4,567,285.80		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 4,567,285.80	100.00%	0.04%
23.06	**BARRAS ANTIPÁNICO**					0.00															
23.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS ANTIPÁNICO DE EMPUJE TIPO ORLANDO DE 2 Puntos - OPERACIÓN MECÁNICA	und	5.00	314,884.73	1,574,423.65	5.00	$ 1,574,423.65		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,574,423.65	100.00%	0.01%
23.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS ANTIPÁNICO	und	10.00	210,360.29	2,103,602.90	10.00	$ 2,103,602.90		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 2,103,602.90	100.00%	0.02%
23.07	**TOPES DE PUERTAS**																				
23.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE PUERTA MEDIA Luna ANTICADO	und	60.00	37,196.31	2,231,778.60	60.00	$ 2,231,778.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	60.00	$ 2,231,778.60	100.00%	0.02%
23.08	**MANIJAS DE PUERTAS**																				
23.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA MANIJA DE PUERTA ROMA TIRADOR DOBLE EN ACERO INOXIDABLE	und	5.00	210,360.29	1,051,801.45	5.00	$ 1,051,801.45		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,051,801.45	100.00%	0.01%
23.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA MANIJA INSTITUCIONAL TIPO "ORION"	und	5.00	319,509.40	1,597,547.00	5.00	$ 1,597,547.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 1,597,547.00	100.00%	0.01%
23.08.03	MANIJA DE PUERTA MANIJA INSTITUCIONAL TIPO VERSAILLES	und	10.00	123,678.67	1,236,786.70	10.00	$ 1,236,786.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 1,236,786.70	100.00%	0.01%
24	**PINTURA**																				
24.01	**ESTUCOS Y PINTURAS INTERIORES**																				
24.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO CIELO RASO (3 MANOS) X M2	m2	463.30	29,131.54	13,496,642.48	463.30	$ 13,496,642.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	463.30	$ 13,496,642.48	100.00%	0.12%
24.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO CIELO RASO (3 MANOS) X ML	m	96.02	20,365.99	1,955,542.36	96.02	$ 1,955,542.36		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	96.02	$ 1,955,542.36	100.00%	0.02%
24.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X M2 PINTURA ANTIHONGOS	m2	83.61	24,776.29	2,071,545.61	83.61	$ 2,071,545.61		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.61	$ 2,071,545.61	100.00%	0.02%
24.02	**PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES**																				
24.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PLÁSTICA PARA ZONA HÚMEDAS (2 MANOS) X M2	m2	65.74	39,847.87	2,619,598.97	65.74	$ 2,619,598.97		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	65.74	$ 2,619,598.97	100.00%	0.02%
24.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PLÁSTICA PARA ZONA HÚMEDAS (2 MANOS) X ML	m	4.16	27,482.52	114,327.28	4.16	$ 114,327.28		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.16	$ 114,327.28	100.00%	0.00%
24.03	**EXTERIOR**																				
24.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA DE PROTECCIÓN SOBRE MUROS X M2	m2	33.65	26,437.79	889,631.63	33.65	$ 889,631.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	33.65	$ 889,631.63	100.00%	0.01%
24.04	**PINTURA PARA PISOS**																				
24.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA PISO EN CANCHA INTERNA RESISTENTE AL TRAFICO PEATONAL Y DEPORTIVO COLOR ARENAL O SIMILAR	m2	95.06	46,306.13	4,401,860.72	95.06	$ 4,401,860.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	95.06	$ 4,401,860.72	100.00%	0.04%
24.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA PISO EN CANCHA INTERNA RESISTENTE AL TRAFICO PEATONAL Y DEPORTIVO COLOR CANELA O SIMILAR	m2	67.69	46,306.13	3,134,461.94	67.69	$ 3,134,461.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	67.69	$ 3,134,461.94	100.00%	0.03%
24.05	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																				
24.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN CANCHAS DEMARCACIÓN CANCHA INTERNA	m	83.68	23,080.71	1,931,393.81	83.68	$ 1,931,393.81		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	83.68	$ 1,931,393.81	100.00%	0.02%
24.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELIMITACIÓN DE PARQUEADERO	m	220.30	24,774.49	5,457,820.15	220.30	$ 5,457,820.15		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	220.30	$ 5,457,820.15	100.00%	0.05%
24.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUMERACIÓN PARQUEADEROS	und	23.00	72,295.10	1,662,787.30	23.00	$ 1,662,787.30		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	23.00	$ 1,662,787.30	100.00%	0.02%
24.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJAS PARQUEADERO	m	64.50	23,498.99	1,515,684.86	64.50	$ 1,515,684.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	64.50	$ 1,515,684.86	100.00%	0.01%
25	**EQUIPOS**																				
25.01	**EQUIPOS HIDROSANITARIOS**																				
25.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESIÓN TIPO 1 EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN AGUA POTABLE IHM HY-FLO MODELO 15H-6W O SIMILAR; Q=4.06 L/s; CDT=58.50 m; POT=6.0 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) con variadores de velocidad. Incluye 1 tanque hidro acumulador (V=100 L), tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	und	1.00	36,998,888.99	36,998,888.99	1.00	$ 36,998,888.99		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 36,998,888.99	100.00%	0.34%
25.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESIÓN TIPO 2 EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS IHM HY-FLO MODELO 20A-6W O SIMILAR; Q=5.12 L/s; CDT=43.1 m; POT=6.0 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) con variadores de velocidad. Incluye 1 tanque hidro acumulador (V=300 L), tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	und	1.00	19,243,495.62	19,243,495.62	1.00	$ 19,243,495.62		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 19,243,495.62	100.00%	0.17%
25.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESIÓN TIPO 3 EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN LLENADO DE VEHÍCULOS IHM CARACOL MODELO 2X4-2MW O SIMILAR; Q=6.31 L/s; CDT=10.10 m; POT=2.0 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) con variadores de velocidad. Incluye 1 tanque hidro acumulador (V=300 L), tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	und	1.00	37,819,651.42	37,819,651.42	1.00	$ 37,819,651.42		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 37,819,651.42	100.00%	0.34%
25.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESIÓN TIPO 4 EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE BARNES MODELO HE 1.5 20-1 O SIMILAR; Q=0.71 L/s; CDT=32.40m; 2.0 HP (1 TITULAR). Incluye tablero de control y accesorios especificados por el fabricante).	und	1.00	8,206,086.82	8,206,086.82	1.00	$ 8,206,086.82		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 8,206,086.82	100.00%	0.07%
25.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO RED CONTRA INCENDIO TIPO 1 EQUIPO RED CONTRA INCENDIOS BOMBA PRINCIPAL Q=334,90GPM; CDT=94,60 PSI; POT=45 HP + BOMBA JOCKEY Q=3,30GPM; CDT=104,60 PSI; POT=3,00 HP. Incluye tableros de control y accesorios especificados por el fabricante.	und	1.00	100,519,553.50	100,519,553.50	1.00	$ 100,519,553.50		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 100,519,553.50	100.00%	0.91%
25.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO EYECTOR TIPO 1 BARNES MODELO NE 2 4-1-4-110 O SIMILAR; Q=1.30 L/s; CDT=5.10m; POT=0.50 HP. Incluye accesorios especificados por el fabricante.	und	1.00	5,730,044.05	5,730,044.05	1.00	$ 5,730,044.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 5,730,044.05	100.00%	0.05%
25.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LLUVIA TIPO 1 Compacta, con filtración y cloración. Incluye bomba.	gb	1.00	67,435,340.21	67,435,340.21	1.00	$ 67,435,340.21		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 67,435,340.21	100.00%	0.61%
25.02	**EQUIPOS ELÉCTRICOS**																				
25.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PLANTA ELECTRICA Planta electrica de 163kVA 140kW 3Ø 208/120V Segun D.U	und	1.00	82,127,951.40	82,127,951.40	1.00	$ 82,127,951.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 82,127,951.40	100.00%	0.74%
25.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS DE CELDA Transformador 150kVA 3Ø Seco 11,400V - 208/120V Segun D.U	und	1.00	41,178,608.12	41,178,608.12	1.00	$ 41,178,608.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 41,178,608.12	100.00%	0.37%
25.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CELDA COMPACTA MODULAR Entrada Segun D.U	und	1.00	16,952,701.24	16,952,701.24	1.00	$ 16,952,701.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 16,952,701.24	100.00%	0.15%
25.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CELDA COMPACTA MODULAR Salida Segun D.U	und	1.00	17,700,990.85	17,700,990.85	1.00	$ 17,700,990.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 17,700,990.85	100.00%	0.16%
25.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CELDA COMPACTA MODULAR Proteccion con Fusible HH2S Segun D.U	und	1.00	18,690,408.83	18,690,408.83	1.00	$ 18,690,408.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 18,690,408.83	100.00%	0.17%
25.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE EQUIPO DE PROTECCION UPS UPs de 5 kVA Segun D.U	und	1.00	14,924,886.83	14,924,886.83	1.00	$ 14,924,886.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 14,924,886.83	100.00%	0.14%
25.03	**EQUIPOS DE Comunicación Y DATOS**																				
25.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE DATOS	und	1.00	4,261,020.73	4,261,020.73	1.00	$ 4,261,020.73		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 4,261,020.73	100.00%	0.04%
25.04	**EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL**																				
25.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR CAMILLERO CABINA 210X135	und	1.00	88,902,147.09	88,902,147.09	1.00	$ 88,902,147.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 88,902,147.09	100.00%	0.81%
26	**SEÑALIZACIÓN Y DOTACIÓN**																				
26.01	**SEÑALES INFORMATIVAS - INDICADOR DE PISO O NUMERACIÓN**																				

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**
			VERSIÓN:
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**
			PÁGINA No: DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
26.01.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - INDICADOR DE PISO	und	6.00	314,008.50	1,884,051.00	6.00	$ 1,884,051.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 1,884,051.00	100.00%	0.02%
26.02	**SEÑALES INFORMATIVAS - HORARIO**																
26.02.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - HORARIO ACCESO PRINCIPAL	und	1.00	321,400.44	321,400.44	1.00	$ 321,400.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 321,400.44	100.00%	0.00%
26.03	**SEÑAL DE ORIENTACIÓN - DIRECTORIOS DE PISO**																
26.03.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - DIRECTORIO DE PISO	und	3.00	371,217.47	1,113,652.41	3.00	$ 1,113,652.41		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,113,652.41	100.00%	0.01%
26.04	**SEÑALES ORIENTATIVAS - TÓTEM**																
26.04.01	SEÑALES ORIENTATIVAS - TÓTEM	und	3.00	3,499,726.80	10,499,180.40	3.00	$ 10,499,180.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 10,499,180.40	100.00%	0.10%
26.05	**SEÑALES ORIENTATIVAS - DESCOLGADAS**																
26.05.01	SEÑALES ORIENTATIVAS - DESCOLGADAS	und	11.00	709,973.26	7,809,705.86	11.00	$ 7,809,705.86		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 7,809,705.86	100.00%	0.07%
26.05.02	SEÑALES ORIENTATIVAS - DESCOLGADAS	und	4.00	1,208,143.53	4,832,574.12	4.00	$ 4,832,574.12		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 4,832,574.12	100.00%	0.04%
26.06	**SEÑALES ORIENTATIVAS - PINTADAS EN MURO**																
26.06.01	SEÑALES ORIENTATIVAS - PINTADAS EN MURO	m2	7.50	82,278.71	617,090.33	7.50	$ 617,090.33		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.50	$ 617,090.33	100.00%	0.01%
26.07	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR**																
26.07.01	SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR	und	44.00	132,095.74	5,812,212.56	44.00	$ 5,812,212.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	44.00	$ 5,812,212.56	100.00%	0.05%
26.07.02	SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR	und	30.00	92,242.12	2,767,263.60	30.00	$ 2,767,263.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	30.00	$ 2,767,263.60	100.00%	0.03%
26.08	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (PRECAUCIÓN)**																
26.08.01	SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (PRECAUCIÓN)	und	3.00	191,876.17	575,628.51	3.00	$ 575,628.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 575,628.51	100.00%	0.01%
26.09	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (RIESGO)**																
26.09.01	SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (RIESGO)	und	5.00	191,876.17	959,380.85	5.00	$ 959,380.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 959,380.85	100.00%	0.01%
26.10	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (PROHIBICIÓN)**																
26.10.01	SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (PROHIBICIÓN)	und	7.00	191,876.17	1,343,133.19	7.00	$ 1,343,133.19		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 1,343,133.19	100.00%	0.01%
26.11	**SEÑALES INDICATIVAS - NÚMERO DE PARQUEADERO**																
26.11.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO AUTOMÓVILES	und	7.00	52,388.49	366,719.43	7.00	$ 366,719.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 366,719.43	100.00%	0.00%
26.11.02	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO BICICLETAS	und	16.00	361,254.06	5,780,064.96	16.00	$ 5,780,064.96		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 5,780,064.96	100.00%	0.05%
26.11.03	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO ACCESIBLE	und	1.00	411,071.09	411,071.09	1.00	$ 411,071.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 411,071.09	100.00%	0.00%
26.11.04	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO MOTOS	und	7.00	52,388.49	366,719.43	7.00	$ 366,719.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 366,719.43	100.00%	0.00%
26.11.05	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO CAMIONETAS	und	3.00	52,388.49	157,165.47	3.00	$ 157,165.47		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 157,165.47	100.00%	0.00%
26.11.06	SUMINISTRO DE SEÑAL - PARQUEADERO MAQUINAS	und	5.00	181,912.77	909,563.85	5.00	$ 909,563.85		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 909,563.85	100.00%	0.01%
26.12	**SEÑALES REGLAMENTARIAS - EVACUACIÓN -CONDICIÓN SEGURA**																
26.12.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - (EVACUACIÓN DERECHA)	und	35.00	87,260.41	3,054,114.35	35.00	$ 3,054,114.35		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	35.00	$ 3,054,114.35	100.00%	0.03%
26.12.02	SUMINISTRO DE SEÑAL - (EVACUACIÓN IZQUIERDA)	und	40.00	87,260.41	3,490,416.40	40.00	$ 3,490,416.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	40.00	$ 3,490,416.40	100.00%	0.03%
26.12.03	SUMINISTRO DE SEÑAL - (EVACUACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA)	und	10.00	87,260.41	872,604.10	10.00	$ 872,604.10		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	10.00	$ 872,604.10	100.00%	0.01%
26.12.04	SUMINISTRO DE SEÑAL - (ESCALERA BAJANDO)	und	5.00	87,260.41	436,302.05	5.00	$ 436,302.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 436,302.05	100.00%	0.00%
26.12.05	SUMINISTRO DE SEÑAL - (BOTIQUÍN)	und	3.00	87,260.41	261,781.23	3.00	$ 261,781.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 261,781.23	100.00%	0.00%
26.12.06	SUMINISTRO DE SEÑAL - (Punto DE ENCUENTRO)	und	1.00	1,407,411.64	1,407,411.64	1.00	$ 1,407,411.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1,407,411.64	100.00%	0.01%
26.12.07	SUMINISTRO DE SEÑAL - (EVACUACIÓN SALIDA LED)	und	11.00	261,620.01	2,877,820.11	11.00	$ 2,877,820.11		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 2,877,820.11	100.00%	0.03%
26.13	**SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA**																
26.13.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - EQUIPOS CONTRA EMERGENCIA	und	3.00	87,260.41	261,781.23	3.00	$ 261,781.23		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 261,781.23	100.00%	0.00%
26.14	**SEÑALES INDICATIVAS - AVISOS - AVISOS FACHADA**																
26.14.01	SUMINISTRO DE SEÑAL - AVISO TIPO 1	und	3.00	610,339.20	1,831,017.60	3.00	$ 1,831,017.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 1,831,017.60	100.00%	0.02%
26.14.02	SUMINISTRO DE SEÑAL - AVISO TIPO 2	und	3.00	1,008,875.42	3,026,626.26	3.00	$ 3,026,626.26		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 3,026,626.26	100.00%	0.03%
26.14.03	SUMINISTRO DE SEÑAL - AVISO TIPO 3 - FACHADA	und	2.00	5,990,578.17	11,981,156.34	2.00	$ 11,981,156.34		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 11,981,156.34	100.00%	0.11%
27	**OBRAS EXTERIORES**																
27.01	**ELEMENTOS EN CONCRETO**																
27.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO ACABADO ESCOBADO	m2	329.63	113,393.25	37,377,817.00	329.63	$ 37,377,817.00		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	329.63	$ 37,377,817.00	100.00%	0.34%
27.01.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO RAMPA EN CONCRETO ACCESO VEHICULAR 10CM	m2	45.24	157,752.29	7,136,713.60	45.24	$ 7,136,713.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	45.24	$ 7,136,713.60	100.00%	0.06%
27.01.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO RAMPA EN CONCRETO ACCESO VEHICULAR MAQUINAS TIPO B10	m2	25.90	158,175.37	4,096,742.08	25.90	$ 4,096,742.08		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	25.90	$ 4,096,742.08	100.00%	0.04%
27.01.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO RAMPA EN CONCRETO PEATONAL TIPO B5	m2	6.59	132,582.53	873,718.87	6.59	$ 873,718.87		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.59	$ 873,718.87	100.00%	0.01%
27.01.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PLACA EN CONCRETO E=10cm 3.000 PSI	m2	498.39	151,556.75	75,534,368.63	498.39	$ 75,534,368.63		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	498.39	$ 75,534,368.63	100.00%	0.68%
27.01.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MUROS EN CONCRETO 15cm ANCHO PARA BANCAS	m	6.00	185,099.46	1,110,596.76	6.00	$ 1,110,596.76		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 1,110,596.76	100.00%	0.01%
27.01.07	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MUROS EN CONCRETO 12cm ANCHO	m	57.53	180,091.96	10,360,690.46	57.53	$ 10,360,690.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	57.53	$ 10,360,690.46	100.00%	0.09%
27.02	**PISOS EN CONCRETO Y/O CEMENTO**																
27.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PISO EN ADOQUÍN DE CONCRETO GRAMOQUIN N EN CONCRETO 20X20cm	m2	278.49	87,278.00	24,306,050.22	278.49	$ 24,306,050.22		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	278.49	$ 24,306,050.22	100.00%	0.22%
27.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PISO EN ADOQUÍN DE CONCRETO RECTANGULAR 20X10X6 COLOR GRIS	m2	371.48	71,608.04	26,600,954.70	371.48	$ 26,600,954.70		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	371.48	$ 26,600,954.70	100.00%	0.24%
27.02.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DECK EN CONCRETO COLOR OCRE / BLANCO Y GRIS	m2	95.40	202,009.69	19,271,724.43	95.40	$ 19,271,724.43		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	95.40	$ 19,271,724.43	100.00%	0.17%
27.02.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL GUÍA 20X20cm EN CONCRETO	m2	18.89	97,846.03	1,848,311.51	18.89	$ 1,848,311.51		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	18.89	$ 1,848,311.51	100.00%	0.02%
27.02.05	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA 20X20cm EN CONCRETO	m2	11.20	97,796.21	1,095,317.55	11.20	$ 1,095,317.55		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	11.20	$ 1,095,317.55	100.00%	0.01%
27.02.06	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA 20X10cm EN CONCRETO	m2	8.79	129,056.39	1,134,405.67	8.79	$ 1,134,405.67		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	8.79	$ 1,134,405.67	100.00%	0.01%
27.03	**ESCALERAS EN CONCRETO**																
27.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO ACABADO ESCOBEADO	m3	6.74	1,040,420.44	7,012,433.77	6.74	$ 7,012,433.77		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.74	$ 7,012,433.77	100.00%	0.06%
27.04	**CINTAS Y BORDILLOS**																
27.04.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CINTA DE CONFINAMIENTO 10cm x 30cm EN CONCRETO	m	155.14	24,382.01	3,782,625.03	155.14	$ 3,782,625.03		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	155.14	$ 3,782,625.03	100.00%	0.03%
27.05	**SARDINELES PREFABRICADOS**																
27.05.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-80 80X20x35cm	m	274.90	86,540.38	23,789,950.46	274.90	$ 23,789,950.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	274.90	$ 23,789,950.46	100.00%	0.22%
27.06	**EMPRADIZACIÓN**																
27.06.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PRADIZACIÓN GRAMA NATURAL KIKUYO	m2	335.97	10,900.06	3,662,093.16	335.97	$ 3,662,093.16		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	335.97	$ 3,662,093.16	100.00%	0.03%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO:			
			VERSIÓN:			
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS CARRERA 14B No. 146-05		FECHA:			
			PÁGINA No:		DE:	

ACTA No.	03	PROCESO No:		TIPO DE PROCESO:	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	VALOR DE LAS ADICIONES:	$ -	VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	N.I.T:	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	N.I.T:	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	N.I.T:	900.021.482-1

Condiciones contractuales						Condiciones actualizadas BALANCE 3		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario ofertado	Valor total ofertado	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Ejec. del Item	% Ejec. del Contrato	Cantidad	Valor Parcial Directo	% Pend. Ejec. del Item	% Pend. Ejec. del Contrato
27.07	**CÁRCAMOS Y CAÑUELAS**																
27.07.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO	m	72.11	54,381.89	3,921,478.09	72.11	$ 3,921,478.09		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	72.11	$ 3,921,478.09	100.00%	0.04%
27.08	**REJILLAS**																
27.08.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REJILLA METÁLICA EN PLATINA - D=100 X 25 X 5cm - TRAFICO VEHICULAR PESADO PARA ÁREAS EXTERIORES	m	72.11	392,118.59	28,275,671.52	72.11	$ 28,275,671.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	72.11	$ 28,275,671.52	100.00%	0.26%
27.09	**AMOBLAMIENTO URBANO**																
27.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PREFABRICADAS EN CONCRETO ASIENTO ADOSADO SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	m	38.50	217,311.58	8,366,495.83	38.50	$ 8,366,495.83		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	38.50	$ 8,366,495.83	100.00%	0.08%
27.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PREFABRICADAS EN CONCRETO TIPO M-10-A SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	und	24.00	897,381.31	21,537,151.44	24.00	$ 21,537,151.44		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	24.00	$ 21,537,151.44	100.00%	0.20%
27.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	und	7.00	2,407,965.99	16,855,761.93	7.00	$ 16,855,761.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 16,855,761.93	100.00%	0.15%
27.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINERA EN CONCRETO 10 CMS ANCHO SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	m2	93.99	114,195.92	10,733,274.52	93.99	$ 10,733,274.52		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	93.99	$ 10,733,274.52	100.00%	0.10%
27.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINERA EN CONCRETO 12 CMS ANCHO SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO	m2	140.02	126,397.57	17,698,187.75	140.02	$ 17,698,187.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	140.02	$ 17,698,187.75	100.00%	0.16%
27.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE LLANTAS PREFABRICADO EN POLIURETANO PARA VEHÍCULO LIVIANO 50X15X10	und	16.00	64,270.40	1,028,326.40	16.00	$ 1,028,326.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 1,028,326.40	100.00%	0.01%
27.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN MADERA CON LISTONES DE 4.5x10CM, COLOR CAOBA O EQUIVALENTE	und	6.00	957,914.58	5,747,487.48	6.00	$ 5,747,487.48		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 5,747,487.48	100.00%	0.05%
27.10	**ELEMENTOS METÁLICOS**																
27.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE	und	6.00	496,776.26	2,980,657.56	6.00	$ 2,980,657.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 2,980,657.56	100.00%	0.03%
27.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MÚLTIPLE DEPORTIVA (PARA MICROFUTBOL Y BALONCESTO)	und	2.00	12,104,460.70	24,208,921.40	2.00	$ 24,208,921.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 24,208,921.40	100.00%	0.22%
27.11	**JARDINES**																
27.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL HIEDRA HOJA ANCHA	m2	222.41	66,744.26	14,844,590.87	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL BALAZO	m2	102.59	67,989.69	6,975,062.30	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL PANAMEÑA	m2	14.30	53,044.58	758,537.49	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL DÓLAR	m2	2.39	65,000.67	155,351.60	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL CINTAS	m2	5.53	67,391.88	372,677.10	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL COLA DE ZORRO	m2	15.33	45,611.88	699,230.12	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL PASTO AZUL	m2	5.78	90,506.98	523,130.34	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL LANTANA	m2	11.81	101,616.18	1,200,087.09	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN ORNAMENTAL HELECHO PEINE	m2	1.39	160,773.90	223,475.72	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA GRIS	m2	23.67	11,643.81	275,608.98	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA LAJA TRITURADO DE MÁRMOL BLANCO 1 1/2"	m2	15.86	15,617.96	247,700.85	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA LAJA	m2	5.92	129,001.52	763,689.00	2.88	$ 371,935.04		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2.88	$ 371,935.04	100.00%	0.00%
27.12	**ARBORIZACIÓN**																
27.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL GUAYACÁN DE MANIZALES	und	5.00	379,581.84	1,897,909.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL YARUMO PLATEADO	und	3.00	384,563.54	1,153,690.62	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL EUCALIPTO POMARROSA	und	4.00	404,490.35	1,617,961.40	4.00	$ 1,617,961.40		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 1,617,961.40	100.00%	0.01%
27.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL SAN GREGADO	und	5.00	329,764.81	1,648,824.05	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL CAUCHO TEQUENDAMA	und	3.00	284,929.49	854,788.47	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ -	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
27.12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL HELECHO ARBÓREO	und	12.00	339,728.22	4,076,738.64	12.00	$ 4,076,738.64		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 4,076,738.64	100.00%	0.04%
27.13	**CERRAMIENTOS**																
27.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MURO DE SOPORTE - ALTURA 2.50m SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	m	187.17	452,432.74	84,681,835.95	187.17	$ 84,681,835.95		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	187.17	$ 84,681,835.95	100.00%	0.77%
27.14	**RELLENOS PARA CONFORMACIÓN DE TERRENO**																
27.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO SUBBASE GRANULAR SBG.40m	m3	405.49	92,972.14	37,699,273.05	405.49	$ 37,699,273.05		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	405.49	$ 37,699,273.05	100.00%	0.34%
27.14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES.25m	m3	156.80	95,780.32	15,018,354.18	156.80	$ 15,018,354.18		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	156.80	$ 15,018,354.18	100.00%	0.14%
27.15	**VÍAS Y SENDEROS**																
27.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO PLACA EN CONCRETO MR=42 kg/cm2	m2	689.19	209,376.91	144,300,472.60	689.19	$ 144,300,472.60		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	689.19	$ 144,300,472.60	100.00%	1.31%
27.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBRASANTE MEJORADA PIEDRA TAMAÑO RAJÓN 25cm	m3	172.30	116,429.12	20,060,737.38	172.30	$ 20,060,737.38		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	172.30	$ 20,060,737.38	100.00%	0.18%
27.15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBRASANTE MEJORADA SUBBASE GRANULAR SBG.05 M	m3	34.46	92,972.14	3,203,819.94	34.46	$ 3,203,819.94		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	34.46	$ 3,203,819.94	100.00%	0.03%
27.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SBG.30 M	m3	89.32	92,972.14	8,304,271.54	89.32	$ 8,304,271.54		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	89.32	$ 8,304,271.54	100.00%	0.08%
27.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR BG.20 M	m3	59.55	119,932.61	7,141,986.93	59.55	$ 7,141,986.93		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	59.55	$ 7,141,986.93	100.00%	0.06%
27.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO TIPO 2400	m2	1,002.45	11,381.73	11,409,615.24	1,002.45	$ 11,409,615.24		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,002.45	$ 11,409,615.24	100.00%	0.10%
27.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SBG,25 M	m3	172.30	92,972.14	16,019,099.72	172.30	$ 16,019,099.72		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	172.30	$ 16,019,099.72	100.00%	0.15%
27.16	**GEOTEXTIL**																
29.34.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO TIPO 1 TIPO 2100	m2	1,006.36	11,787.97	11,862,941.49	1,006.36	$ 11,862,941.49		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1,006.36	$ 11,862,941.49	100.00%	0.11%
28	**ASEO Y LIMPIEZA**																
28.01	**ASEO INTERIOR**																
28.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ASEO FINO DE OBRA	m2	2,136.27	15,972.77	34,122,149.37	2,136.27	$ 34,122,149.37		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2,136.27	$ 34,122,149.37	100.00%	0.31%
28.02	**ASEO EXTERIOR**																
28.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA FACHADA MAS HIDROFUGO	m2	2,528.32	15,236.81	38,523,531.46	2,528.32	$ 38,523,531.46		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	2,528.32	$ 38,523,531.46	100.00%	0.35%
28.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA DE VIDRIOS	m2	342.52	15,442.68	5,289,426.75	342.52	$ 5,289,426.75		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	342.52	$ 5,289,426.75	100.00%	0.05%

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		**CÓDIGO:**	
			VERSIÓN:	
	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C. **ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS** **CARRERA 14B No. 146-05**		**FECHA:**	
			PÁGINA No:	DE:

ACTA No.	03	**PROCESO No:**		**TIPO DE PROCESO:**	
		CONTRATO No.	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA
FECHA ACTA	DD/MM/AAAA	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
	31/03/2026	**VALOR DE LAS ADICIONES:**	$ -	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 14,952,434,853
PERIODO ACTA	DESDE: 1-mar-26 / HASTA: 31-mar-26	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**N.I.T:**	
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG	**N.I.T:**	901.994.058-1
		INTERVENTORÍA:	DAIMCO SAS	**N.I.T:**	900.021.482-1

					Condiciones contractuales				**Condiciones actualizadas BALANCE 3**		**ACTA DE CORTE DE OBRA No. 03**		**ACUMULADO**				**PENDIENTE POR EJECUTAR**			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario ofertado**	**Valor total ofertado**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Ejec. del Item**	**% Ejec. del Contrato**	**Cantidad**	**Valor Parcial Directo**	**% Pend. Ejec. del Item**	**% Pend. Ejec. del Contrato**
29	**CERTIFICACIONES**																
29.01	**RETIE**	gb	1.00	24,309,123.56	24,309,123.56	1.00	$ 24,309,123.56		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 24,309,123.56	100.00%	0.22%
29.02	**RETILAP**	gb	1.00	2,600,115.06	2,600,115.06	1.00	$ 2,600,115.06		$ -	0.00	$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2,600,115.06	100.00%	0.02%
30	**ITEMS NO PREVISTOS**																
NP.30.01	**RELLENOS**																
NP.30.01 .01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO Y CONFORMACIÓN EN RECEBO B-400 PARA MEJOR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO ALISTADA PARA PILOTAJE DE CAPACIDAD DE 80TON Y SOPORTE PARA LA EDIFICACION.	M3		182,613.44		812.98	$ 148,461,074.45		$ -	812.98	$ 148,461,074.45	100.00%	1.35%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
NP.30.01 .02	SUMINITRO E INSTALACION DE CONCRETO ADICIONAL TIPO TREMIE DE 3500PSI, BOMBEADO CON EQUIPO ESTACIONARIO PARA PILOTES ESTABILIZADOS CON POLIMEROS DEBIDO A MAYOR CONSUMO POR INESTABILIDAD DEL SUELO.	M3		748,091.44		224.89	$ 168,238,283.15	224.89	$ 168,238,283.15	224.89	$ 168,238,283.15	100.00%	1.53%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 10,901,839,473.70**		**$ 11,001,345,628.33**		**$ 513,856,717.18**		**$ 1,706,338,803.62**		**15.47%**		**$ 9,295,006,824.71**		**83.93%**
	TOTAL COSTO DIRECTO + CERTIFICACIONES				**$ 10,928,748,712.32**		**$ 11,028,254,866.95**		**$ 513,856,717.18**		**$ 1,706,338,803.62**		**15.47%**		**$ 9,321,916,063.33**		**84.17%**
	ADMINISTRACIÓN			30.10%	$ 3,281,453,681.58		$ 3,311,405,034.13		$ 154,670,871.87		$ 513,607,979.89				$ 2,797,797,054.24		
	UTILIDAD			3.00%	$ 327,055,184.21		$ 330,040,368.85		$ 15,415,701.52		$ 51,190,164.11				$ 278,850,204.74		
	IMPREVISTOS			2.00%	$ 218,036,789.47		$ 220,026,912.57		$ 10,277,134.34		$ 34,126,776.07				$ 185,900,136.49		
	IVA SOBRE UTILIDAD			19.00%	$ 62,140,485.00		$ 62,707,670.08		$ 2,928,983.29		$ 9,726,131.18				$ 52,981,538.90		
	TOTAL AIU				$ 3,888,686,140.26		$ 3,924,179,985.63		$ 183,292,691.02		$ 608,651,051.25				$ 3,315,528,934.37		
	COSTO DIRECTO + AIU+ VALOR CERTIFICACIONES				$ 14,817,434,852.58		$ 14,952,434,852.58		$ 697,149,408.20		$ 2,314,989,854.87				$ 12,637,444,997.70		
	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES UND X 3.000.000				135,000,000.00		-				-				-		
	VALOR TOTAL				**$ 14,952,434,852.58**		**$ 14,952,434,852.58**		**$ 697,149,408.20**		**$ 2,314,989,854.87**		**$ 0.00**		**$ 12,637,444,997.70**		**$ 0.00**

Contratista de Obra:

Ing. Carlos Andres Salazar Tobon
Representante Legal
Consorcio Obras CAOBOS MG
1.019.007.501

Contratista de Interventoria:

Ing. Jose Vicente Bocanegra García
Representante Legal
DAIMCO SAS
73.138.660

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.			**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 11
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS			**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG			**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:** **2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	**UNIDAD:** m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**









UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Diametro	Largo	Alto	Area M2		
PILOTE						
(PLT - 1)	0.50		30.00	0.20	38.00	223.84
(PLT - 2)	0.50		31.00	0.20	3.00	18.26
(PLT - 3)	0.70		30.00	0.38	8.00	92.36
(PLT - 4)	0.50		32.00	0.20	9.00	56.55
EXPANSION DE MATERIAL					0.856	334.82
	Cut Area	**Longitud**	**Area prom**	**Alto**		
EXCAVACION DE NIVELACION DE TERRENO						
ABSCISA 0+000.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00
ABSCISA 0+005.00	9.22	5.00	4.61		1.00	23.05
ABSCISA 0+010.00	10.55	5.00	9.89		1.00	49.43
ABSCISA 0+015.00	11.03	5.00	10.79		1.00	53.95
ABSCISA 0+020.00	11.37	5.00	11.20		1.00	56.00
ABSCISA 0+025.00	11.89	5.00	11.63		1.00	58.15
ABSCISA 0+030.00	11.49	5.00	11.69		1.00	58.45
ABSCISA 0+035.00	26.27	5.00	18.88		1.00	94.40
ABSCISA 0+040.00	33.41	5.00	29.84		1.00	149.20
ABSCISA 0+045.00	35.69	5.00	34.55		1.00	172.75
ABSCISA 0+050.00	32.94	5.00	34.32		1.00	171.58
ABSCISA 0+055.00	18.30	5.00	25.62		1.00	128.10
ABSCISA 0+060.00	0.00	5.00	9.15		1.00	45.75
ABSCISA 0+065.00	0.00	5.00	0.00		1.00	0.00
ABSCISA 0+065.36					1.00	0.00
Descuentos Descapote	**2135.16**			**0.20**	**-1.00**	**-427.03**

OBSERVACIONES : La expansion sale del volumen pendiente por recibir en el APU correspondiente a 0.13 y el volumen real retirdo con expansion de 0.73 para un toptal de 0.856


TOTAL EJECUTADO	1,359.60
EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	997.17
EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	**362.43**


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 11
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**


ESQUEMA

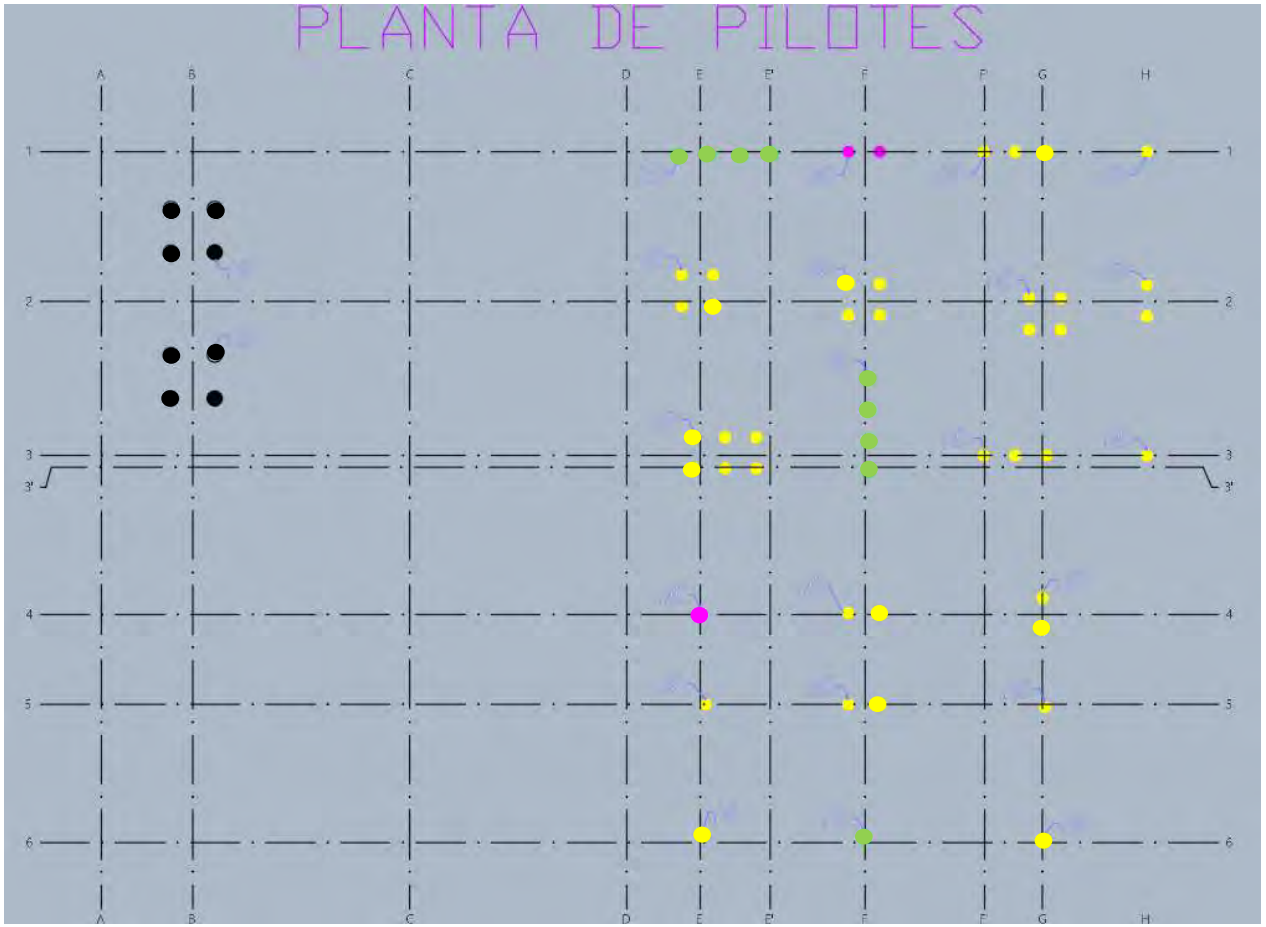

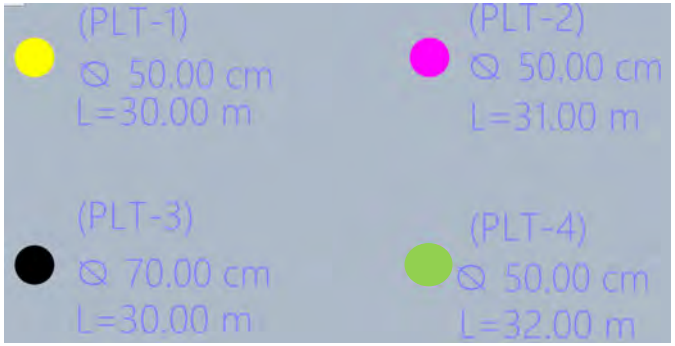



VOL EXCAVADO		
Pilotaje		
Vol excavado	Vol retirado	Expansion
391.01	675.000	0.72629646
APU de retiro		
Vol asignado	Vol correspondiente	Vol faltante
0.87	1	0.13
Total vol faltante		0.85629646

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**11**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		





DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.							**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO							**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**11**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN		**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

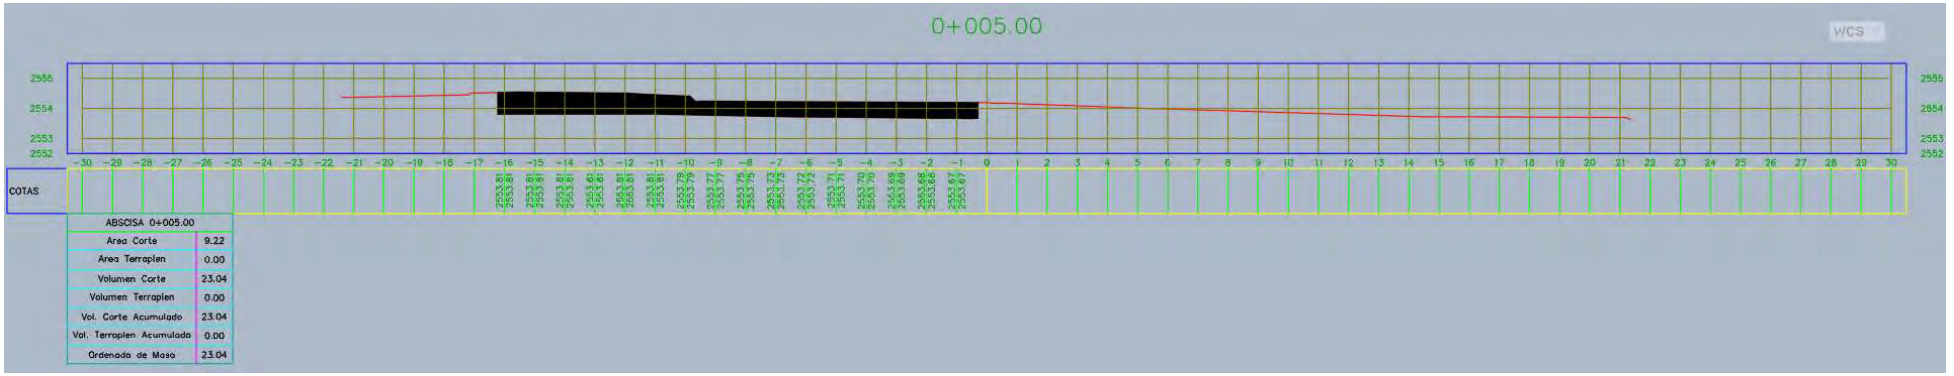

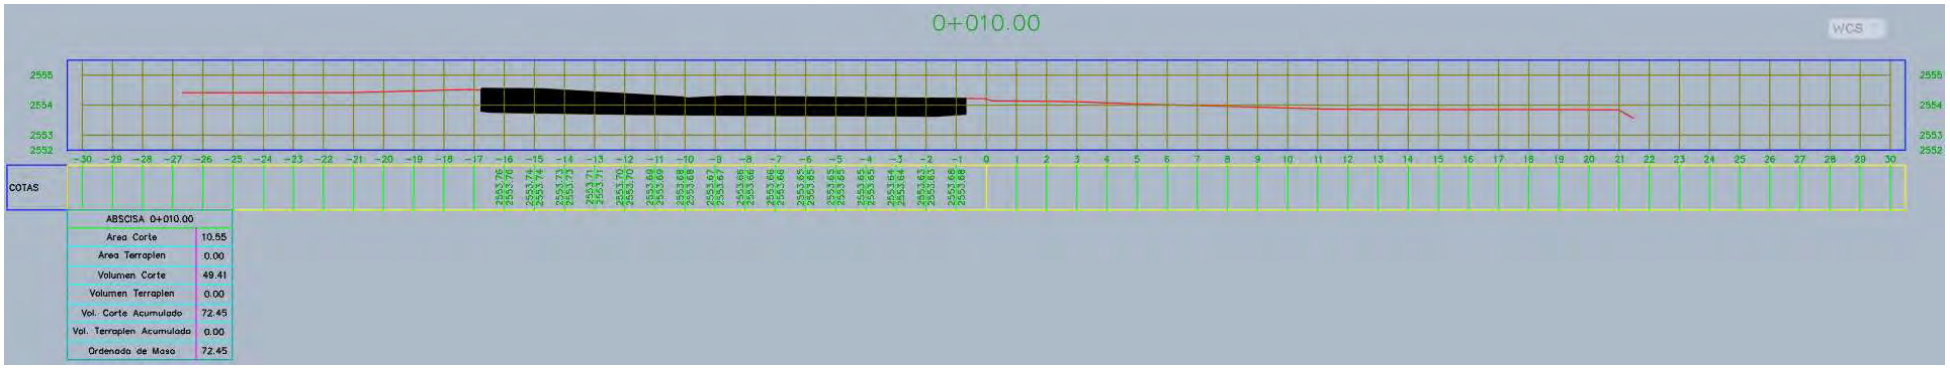



DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**11**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

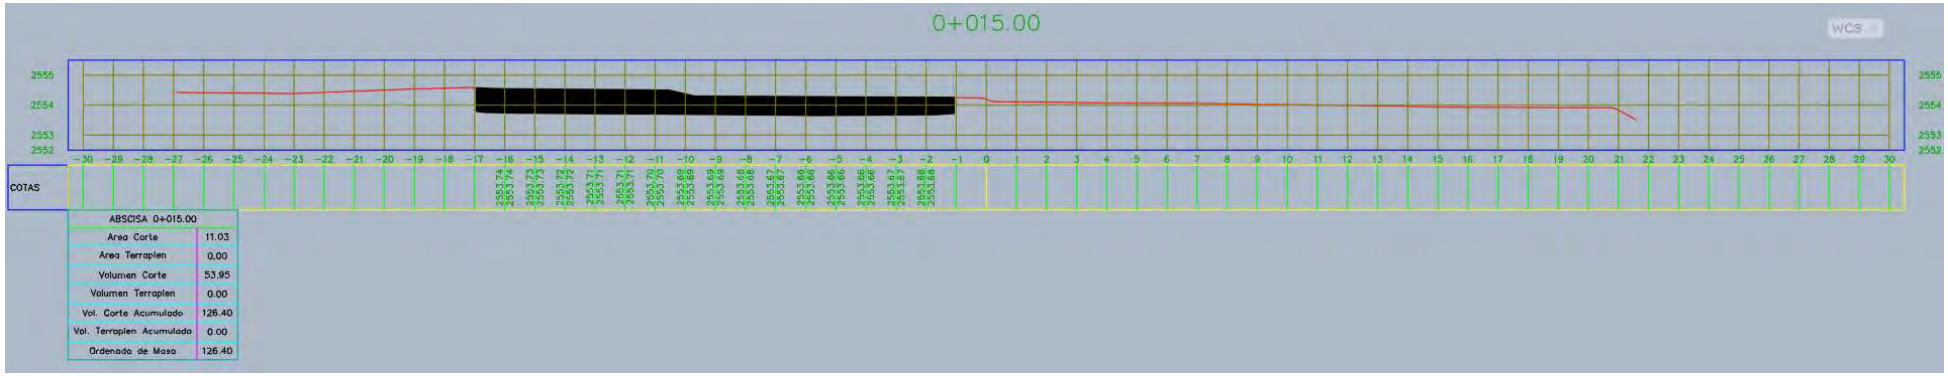

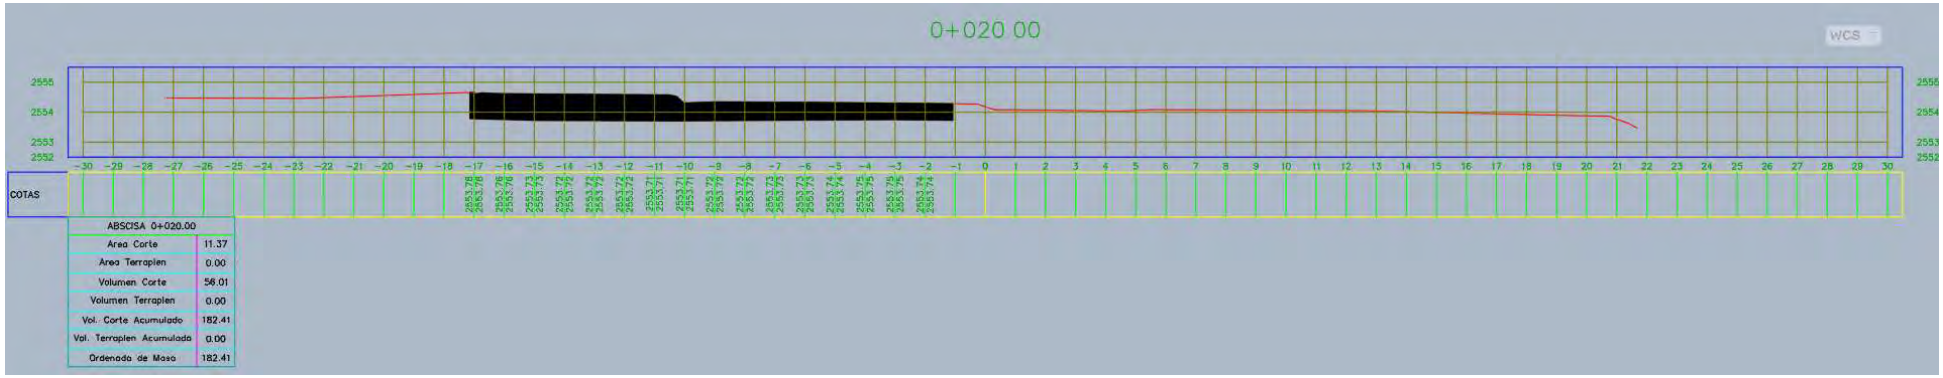



DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**11**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

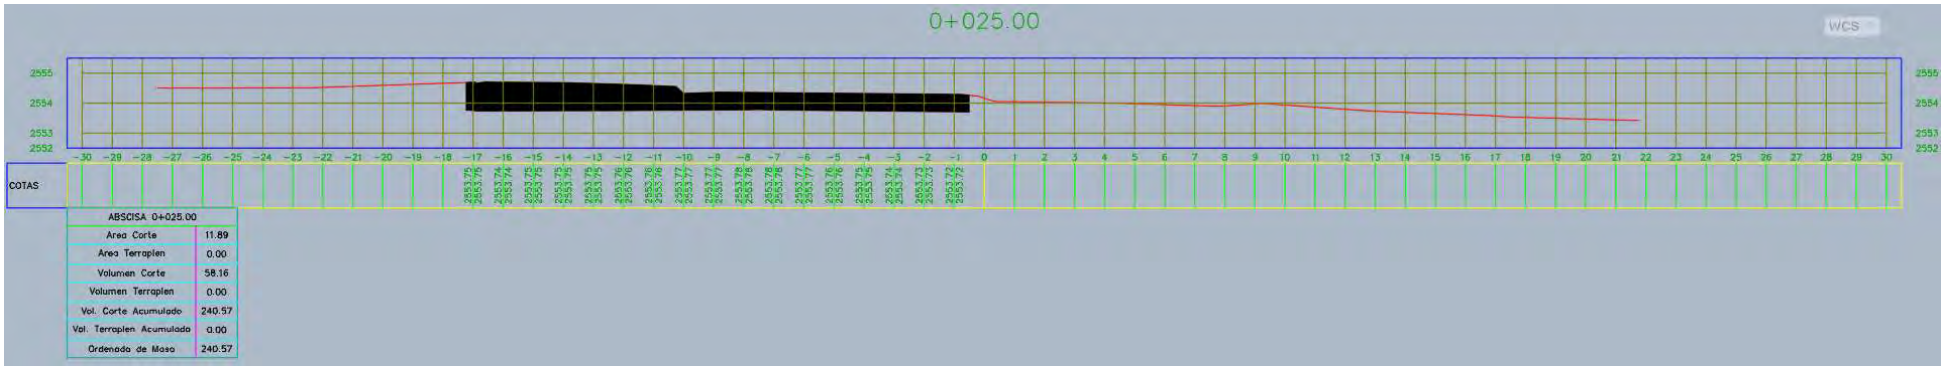

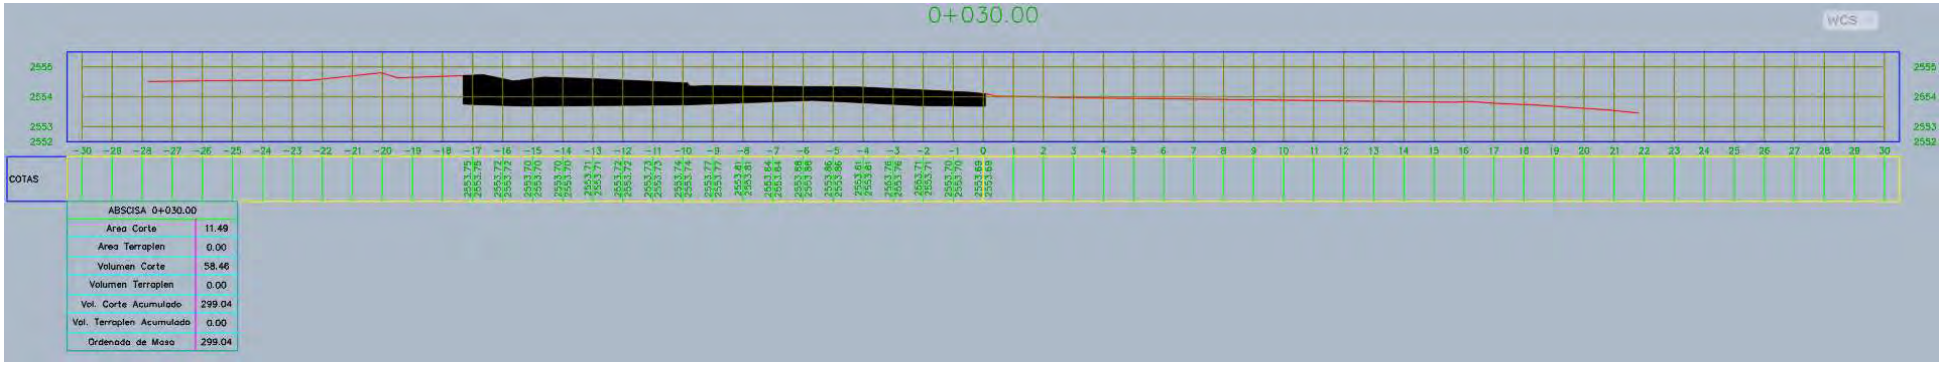


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	11
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

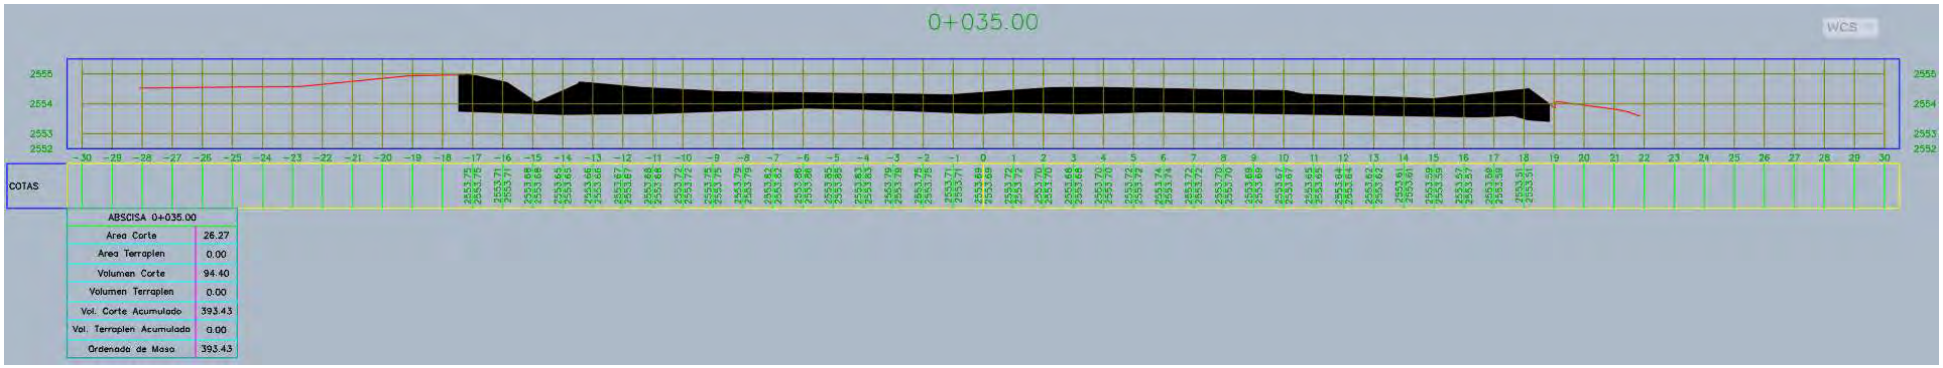


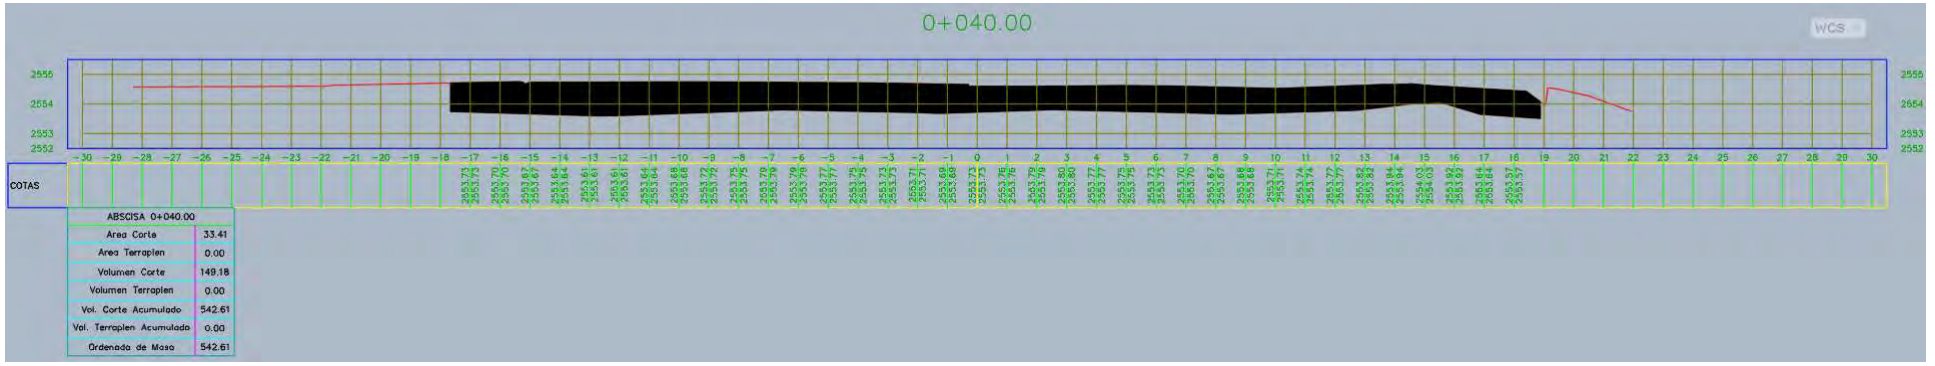

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.							**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO							**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**11**	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025			
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**			

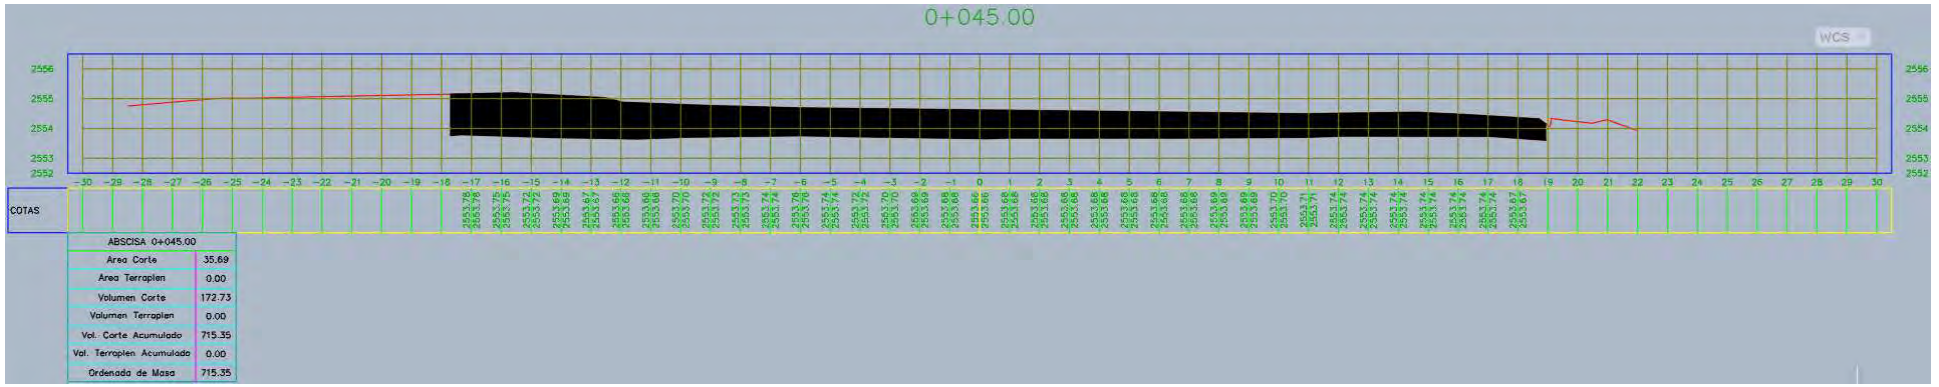



ABSCISA 0+045.00	
Area Corte	35.69
Area Terraplen	0.00
Volumen Corte	172.73
Volumen Terraplen	0.00
Vol. Corte Acumulado	715.35
Vol. Terraplen Acumulado	0.00
Ordenada de Masa	715.35

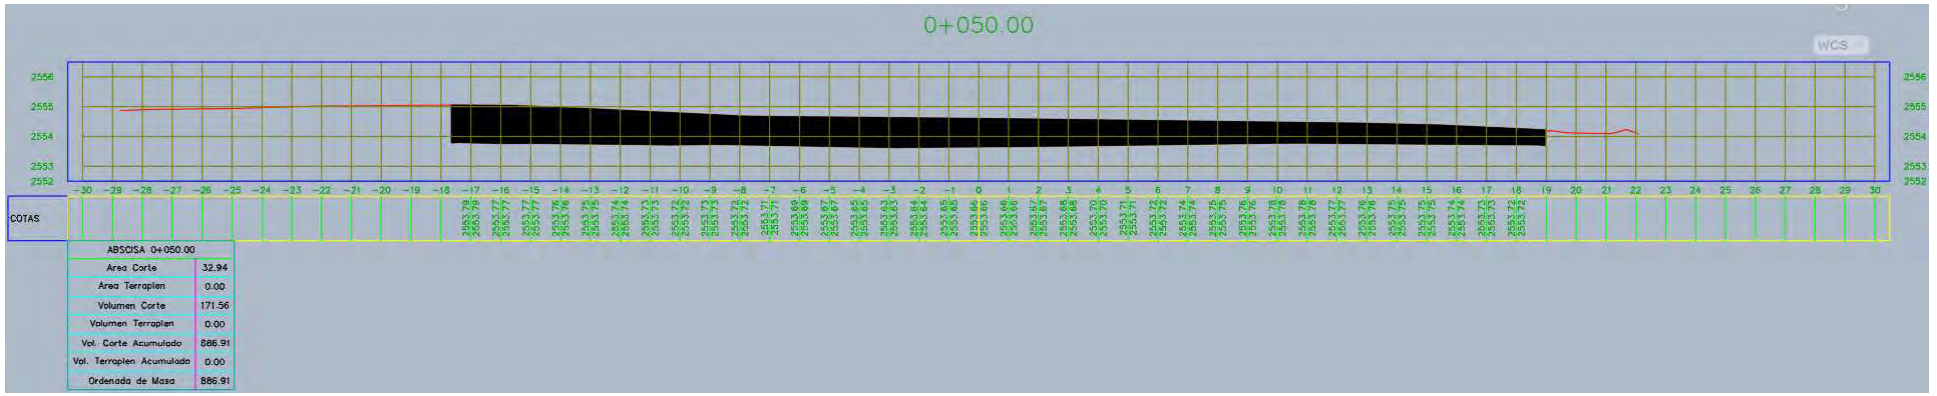


ABSCISA 0+050.00	
Area Corte	32.94
Area Terraplen	0.00
Volumen Corte	171.56
Volumen Terraplen	0.00
Vol. Corte Acumulado	886.91
Vol. Terraplen Acumulado	0.00
Ordenada de Masa	886.91


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.				**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	11	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS				**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG				**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025			
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

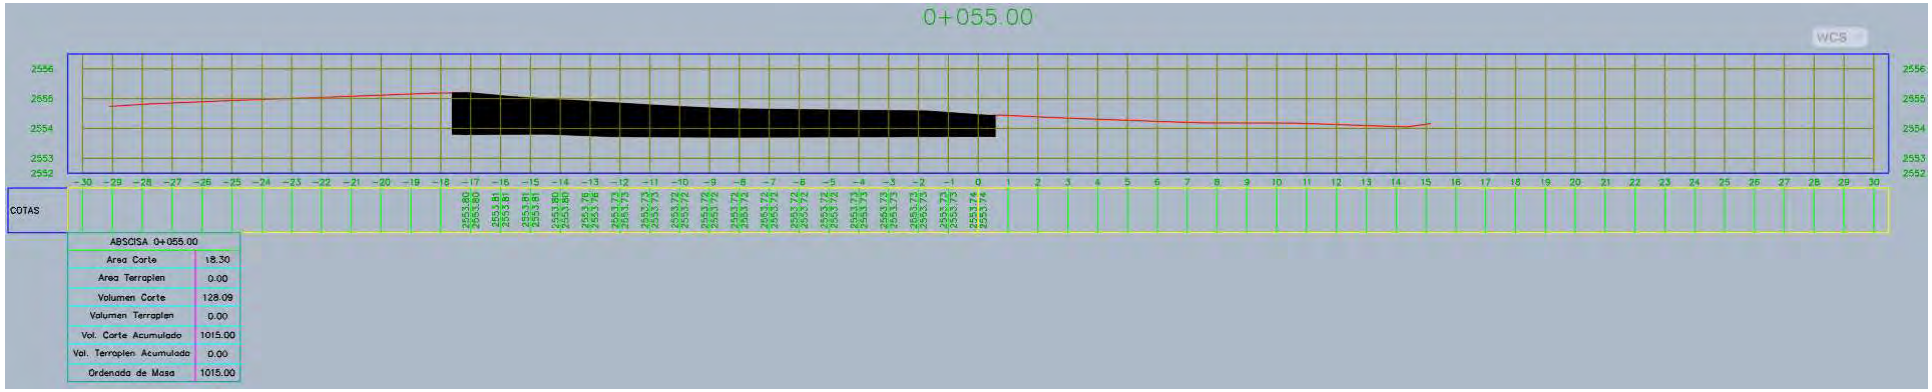

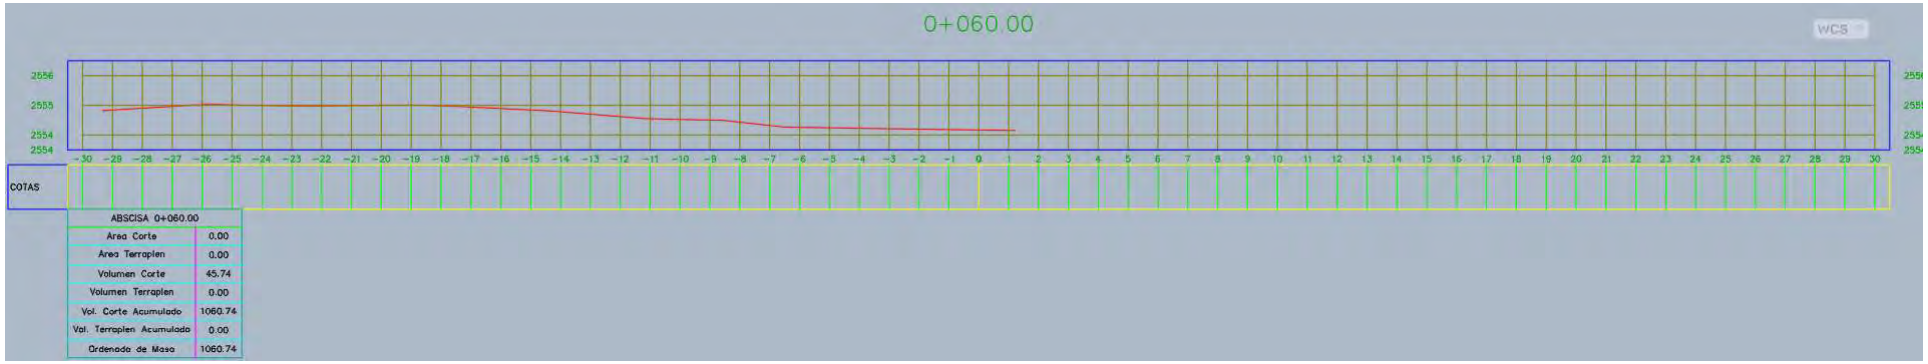


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**11**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

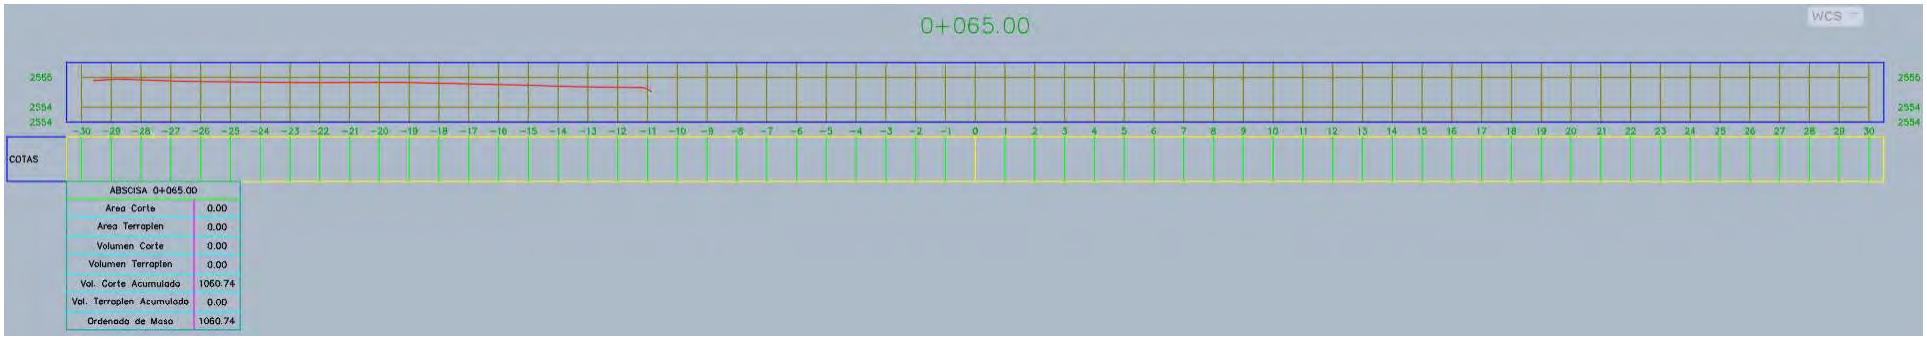

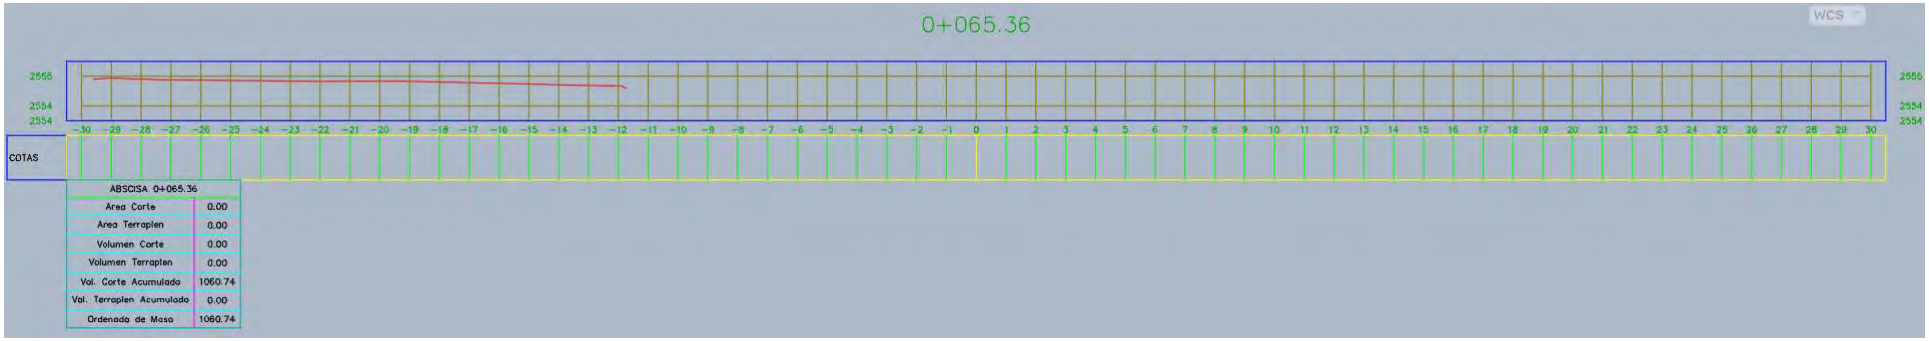

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**11**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.01.05**	EJECUCIÓN DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

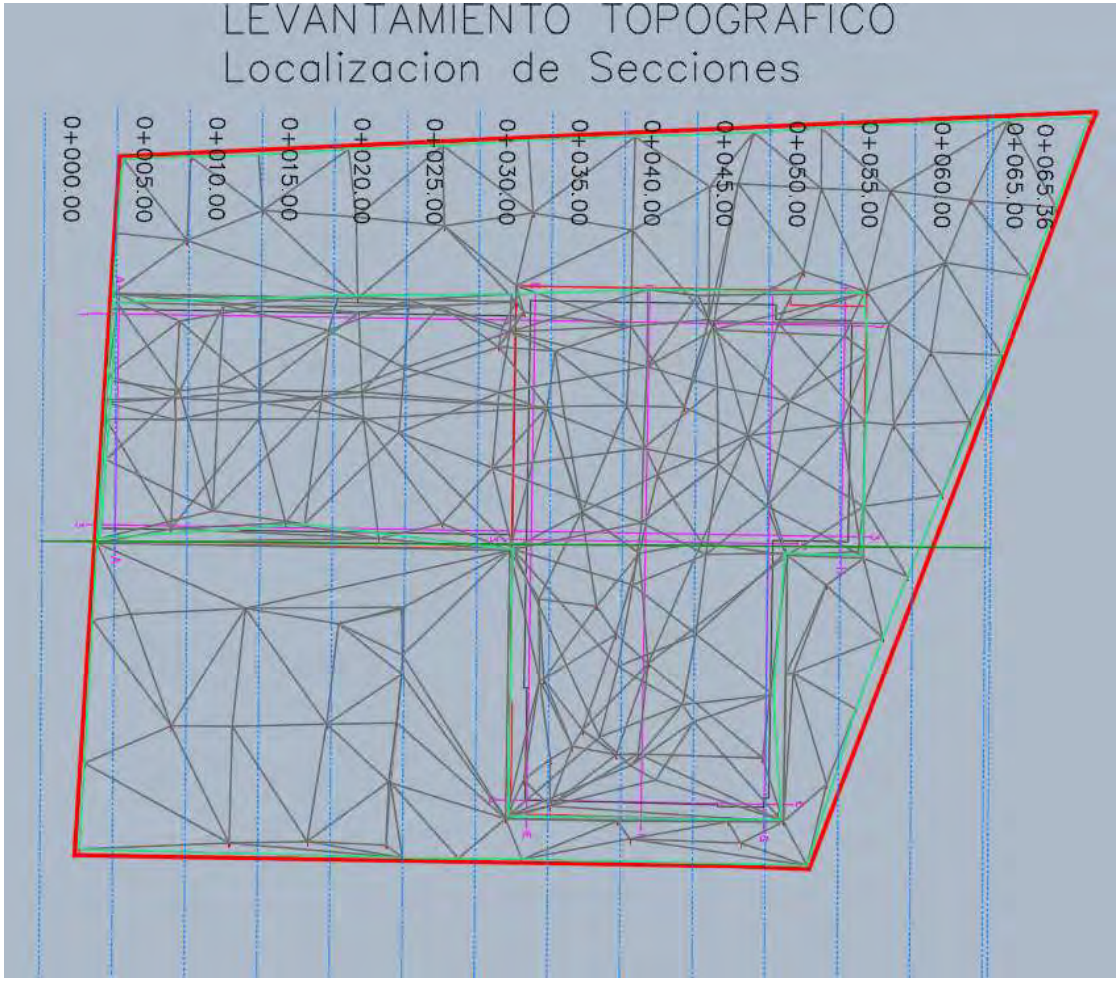

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**3**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.01**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-1 L=30m D=0.5m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		







UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Diametro	Largo	Alto	Area M2		
PLT - 1			30.00		1.00	30.00
PLT - 2			30.00		1.00	30.00
PLT - 3			30.00		1.0	30.00
PLT - 4			30.00		1.0	30.00
PLT - 5			30.00		1.0	30.00
PLT - 6			30.00		1.0	30.00
PLT - 7			30.00		1.0	30.00
PLT - 8			30.00		1.0	30.00
PLT - 9			30.00		1.0	30.00
PLT - 10			30.00		1.0	30.00
PLT - 11			30.00		1.0	30.00
PLT - 12			30.00		1.0	30.00
PLT - 13			30.00		1.0	30.00
PLT - 14			30.00		1.0	30.00
PLT - 15			30.00		1.0	30.00
PLT - 16			30.00		1.0	30.00
PLT - 17			30.00		1.0	30.00
PLT - 18			30.00		1.0	30.00
PLT - 20			30.00		1.0	30.00
PLT - 21			30.00		1.0	30.00
PLT - 26			30.00		1.0	30.00
PLT - 27			30.00		1.0	30.00

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.												FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO												VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	3				
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025						
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025						
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.01**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-1 L=30m D=0.5m - f'c=24.5MPa		**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**						

PLT - 30			30.00		1.0	30.00
PLT - 31			30.00		1.0	30.00
PLT - 32			30.00		1.0	30.00
PLT - 33			30.00		1.0	30.00
PLT - 36			30.00		1.0	30.00
PLT - 37			30.00		1.0	30.00
PLT - 39			30.00		1.0	30.00
PLT - 40			30.00		1.0	30.00
PLT - 41			30.00		1.0	30.00
PLT - 42			30.00		1.0	30.00
PLT - 44			30.00		1.0	30.00
PLT - 45			30.00		1.0	30.00
PLT - 46			30.00		1.0	30.00
PLT - 47			30.00		1.0	30.00
PLT - 49			30.00		1.0	30.00
PLT - 50			30.00		1.0	30.00

OBSERVACIONES :


TOTAL EJECUTADO	1,140.00
EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	840.00
EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	**300.00**


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Pazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**


PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.01**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-1 L=30m D=0.5m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

ESQUEMA

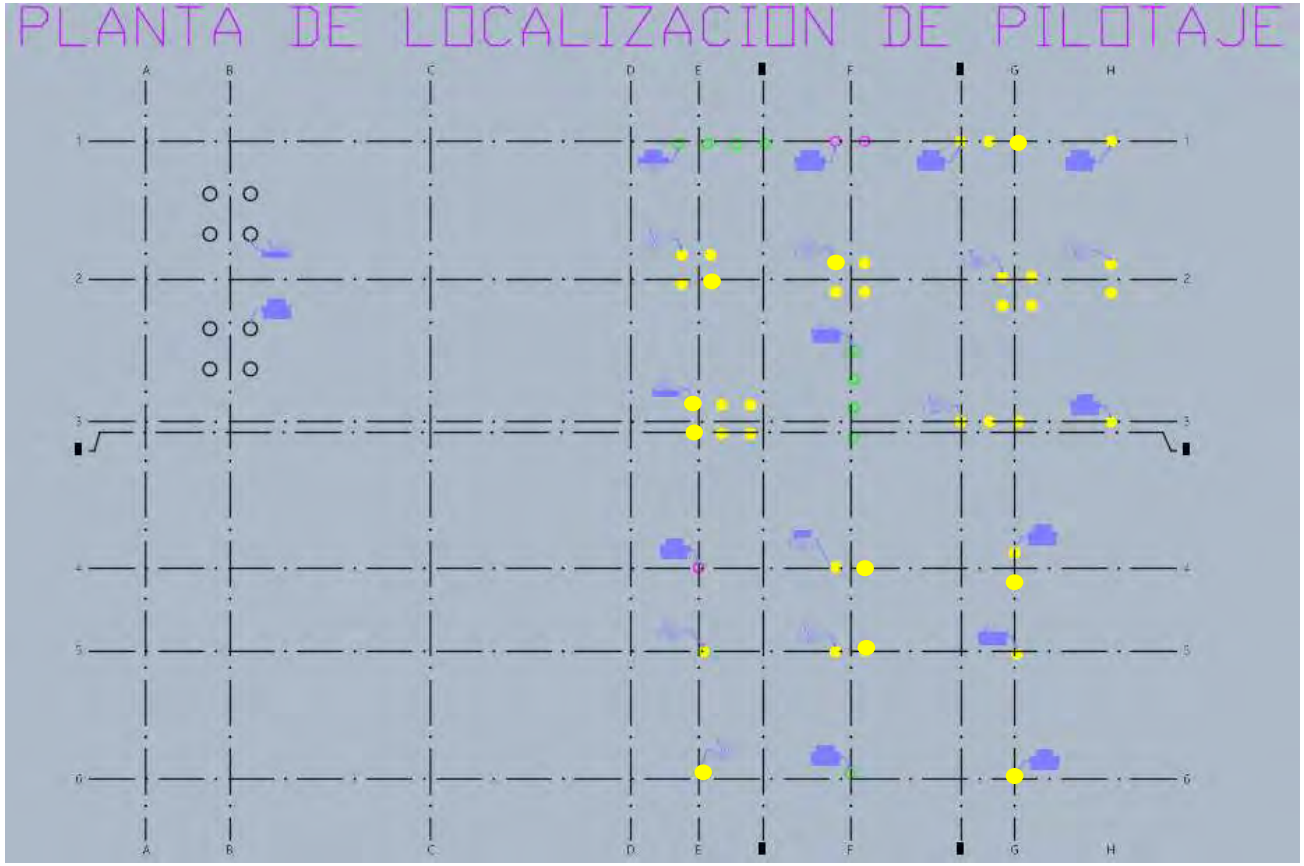

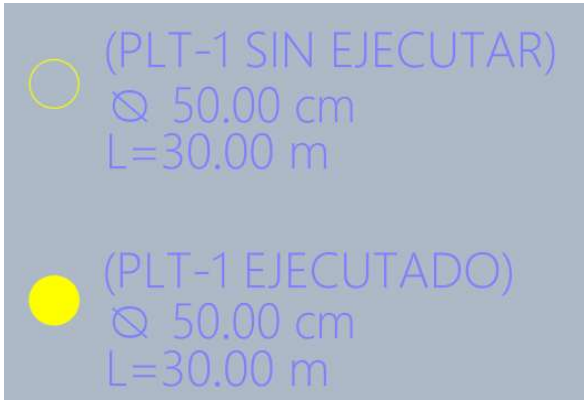

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**3**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.01**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-1 L=30m D=0.5m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

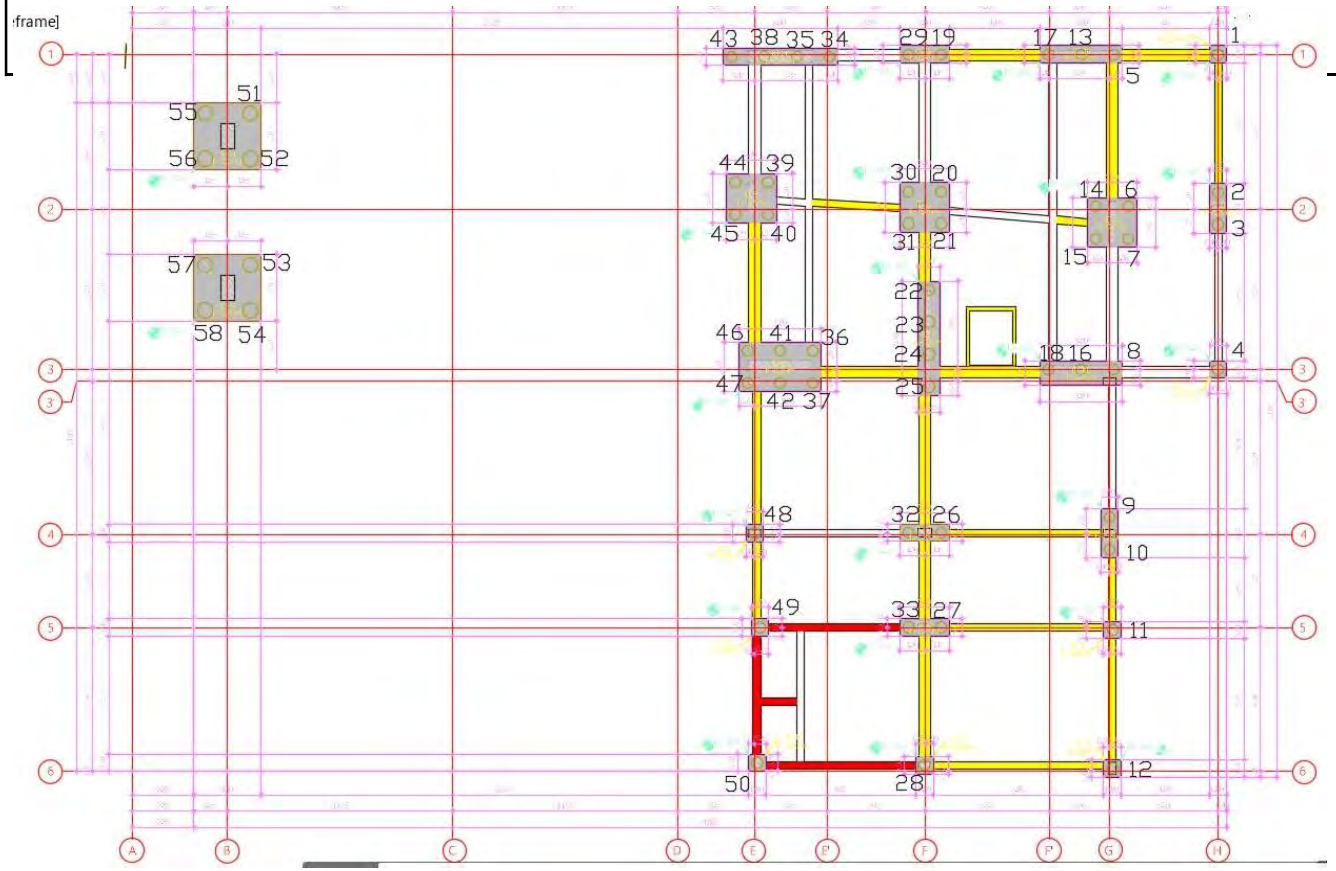

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.01**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-1 L=30m D=0.5m - f'c=24.5MPa		**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	

TABLA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

MUESTRA	*FECHA DE TOMA*	*UBICACIÓN*	*RESISTENCIA NOMINAL*	*7 DIAS*		*14 DIAS*		*28 DIAS*	
				PSI	*%*	*PSI*	*%*	*PSI*	*%*
M1	26/01/2026	PILOTES NO.14, 11 Y 3	3500	2493.6	71.2%	3096.1	88.5%	3616.9	103.3%
M2	27/01/2026	PILOTE NO.21	3500	2563.6	73.2%	3029	86.5%	3621.5	103.5%
M3	28/01/2026	PILOTES NO.44 Y 36	3500	2495.1	71.3%	3151.5	90.0%	3585.2	102.4%
M4	29/01/2026	PILOTE NO.18	3500	2474.6	70.7%	3135.7	89.6%	3694.2	105.5%
M5	2/02/2026	PILOTES NO.4, 2 Y 16	3500	2596.7	74.2%	2980.2	85.1%	3578.7	102.2%
M6	3/02/2026	PILOTES NO.1, 9 Y 15	3500	2553.1	72.9%	2962.4	84.6%	3549.2	101.4%
M7	4/02/2026	PILOTES NO. 33 Y 42	3500	2550.5	72.9%	3239.1	92.5%	3710.5	106.0%
M8	5/02/2026	PILOTES NO.6, 8, 32 Y 49	3500	2490.7	71.2%	3079.00	88.0%	4892.8	139.8%
M9	6/02/2026	PILOTE NO.35	3500	2552.7	72.9%	2995.1	85.6%	4211.5	120.3%
M10	9/02/2026	PILOTE NO.54	3500	2532.2	72.3%	3137.4	89.6%	4725.8	135.0%
M11	11/02/2026	PILOTE NO.37	3500	2552.7	72.9%	3073.2	87.8%	3782.3	108.1%
M12	20/02/2026	PILOTES NO. 7 Y 17	3500	3283.7	93.8%	3502.7	100.1%		0.0%
M13	21/02/2026	PILOTE NO.29	3500	2652.2	75.8%	3799.4	108.6%		0.0%
M14	23/02/2026	PILOTES NO.13 Y 20	3500	2610.2	74.6%	3251.9	92.9%		0.0%
M15	24/02/2026	PILOTES NO. 23 Y 39	3500	3208.4	91.7%	3920	112.0%		0.0%
M16	25/02/2026	PILOTE NO.54	3500	2617.5	74.8%	3439	98.3%		0%
M17	26/02/2026	PILOTES NO. 52 Y 31	3500	3042.7	86.9%	3462.8	98.9%		0%
M18	27/02/2026	PILOTES NO. 19 Y 25	3500	3031.5	86.6%	3258.6	93.1%		0%
M19	28/02/2026	PILOTE NO. 41	3500	2351.8	67.2%	2734.7	78.1%		0%
M20	2/03/2023	PILOTES NO. 58 Y 56	3500	2982.9	85.2%		0%		0%
M21	3/03/2023	PILOTES NO. 5 Y 10	3500	3077.2	87.9%		0%		0%
M22	4/03/2023	PILOTES NO. 30 Y 40	3500	2805.8	80.2%		0%		0%
M23	5/03/2023	PILOTES NO. 12 Y 27	3500	3135.8	89.6%		0%		0%
M24	6/03/2023	PILOTES NO. 55 Y 57	3500	2725	77.9%		0%		0%
M25	9/03/2023	PILOTES NO. 24 Y 38	3500	3243.8	92.7%		0%		0%

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.				**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS				**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG				**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.02**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-2 L=31m D=0.5m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:** m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**





UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Diametro	Largo	Alto	Area M2		
PLT - 19			31.00		1.00	31.00
PLT - 29			31.00		1.0	31.00
PLT - 48			31.00		1.0	31.00

OBSERVACIONES :


TOTAL EJECUTADO	93.00
EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	62.00
EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	**31.00**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.02**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-2 L=31m D=0.5m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**

ESQUEMA

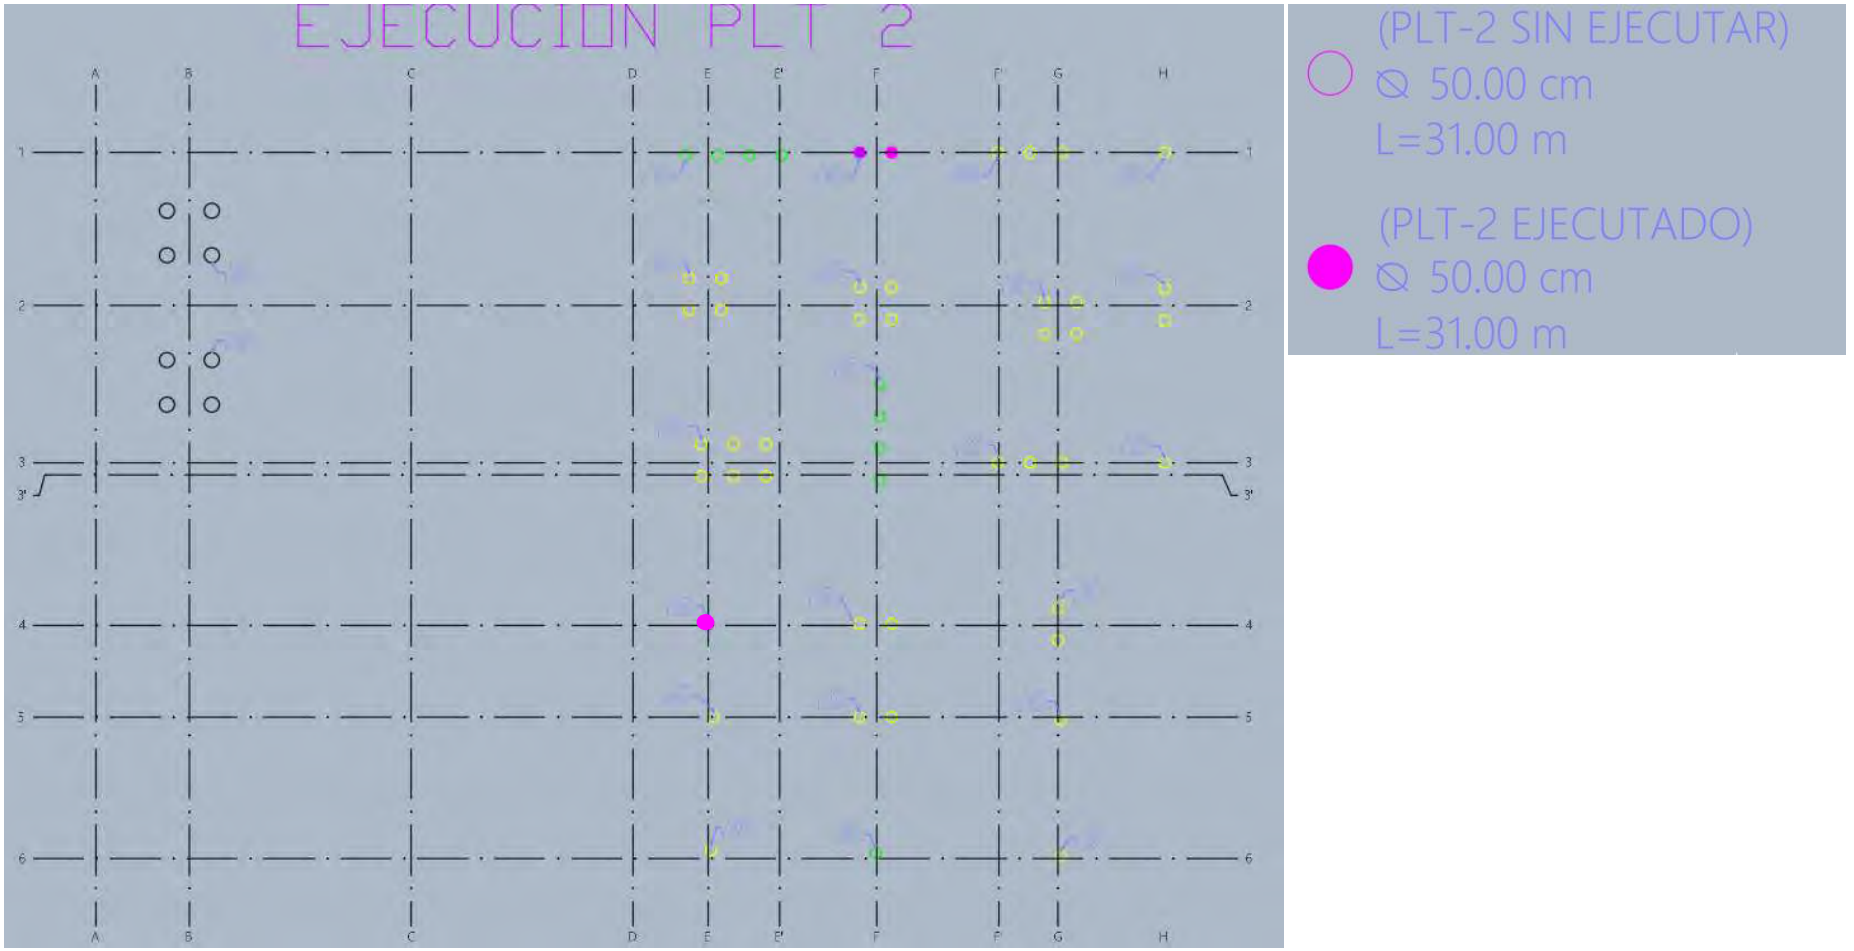

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**3**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.02**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-2 L=31m D=0.5m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

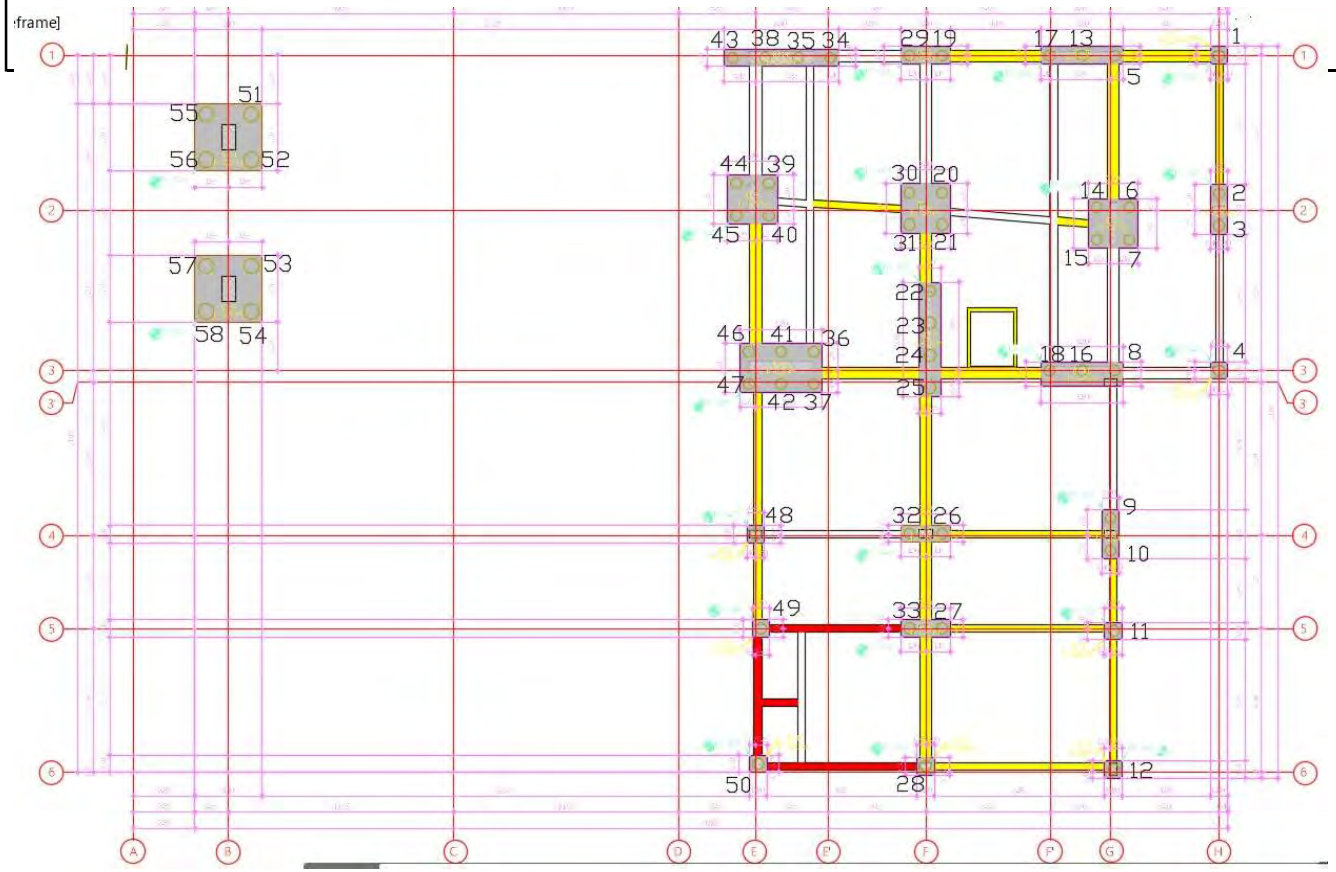

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.02**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-2 L=31m D=0.5m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

TABLA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

MUESTRA	*FECHA DE TOMA*	*UBICACIÓN*	*RESISTENCIA NOMINAL*	*7 DIAS*		*14 DIAS*		*28 DIAS*	
				PSI	*%*	*PSI*	*%*	*PSI*	*%*
M1	26/01/2026	PILOTES NO.14, 11 Y 3	3500	2493.6	71.2%	3096.1	88.5%	3616.9	103.3%
M2	27/01/2026	PILOTE NO.21	3500	2563.6	73.2%	3029	86.5%	3621.5	103.5%
M3	28/01/2026	PILOTES NO.44 Y 36	3500	2495.1	71.3%	3151.5	90.0%	3585.2	102.4%
M4	29/01/2026	PILOTE NO.18	3500	2474.6	70.7%	3135.7	89.6%	3694.2	105.5%
M5	2/02/2026	PILOTES NO.4, 2 Y 16	3500	2596.7	74.2%	2980.2	85.1%	3578.7	102.2%
M6	3/02/2026	PILOTES NO.1, 9 Y 15	3500	2553.1	72.9%	2962.4	84.6%	3549.2	101.4%
M7	4/02/2026	PILOTES NO. 33 Y 42	3500	2550.5	72.9%	3239.1	92.5%	3710.5	106.0%
M8	5/02/2026	PILOTES NO.6, 8, 32 Y 49	3500	2490.7	71.2%	3079.00	88.0%	4892.8	139.8%
M9	6/02/2026	PILOTE NO.35	3500	2552.7	72.9%	2995.1	85.6%	4211.5	120.3%
M10	9/02/2026	PILOTE NO.54	3500	2532.2	72.3%	3137.4	89.6%	4725.8	135.0%
M11	11/02/2026	PILOTE NO.37	3500	2552.7	72.9%	3073.2	87.8%	3782.3	108.1%
M12	20/02/2026	PILOTES NO. 7 Y 17	3500	3283.7	93.8%	3502.7	100.1%		0.0%
M13	21/02/2026	PILOTE NO.29	3500	2652.2	75.8%	3799.4	108.6%		0.0%
M14	23/02/2026	PILOTES NO.13 Y 20	3500	2610.2	74.6%	3251.9	92.9%		0.0%
M15	24/02/2026	PILOTES NO. 23 Y 39	3500	3208.4	91.7%	3920	112.0%		0.0%
M16	25/02/2026	PILOTE NO.54	3500	2617.5	74.8%	3439	98.3%		0%
M17	26/02/2026	PILOTES NO. 52 Y 31	3500	3042.7	86.9%	3462.8	98.9%		0%
M18	27/02/2026	PILOTES NO. 19 Y 25	3500	3031.5	86.6%	3258.6	93.1%		0%
M19	28/02/2026	PILOTE NO. 41	3500	2351.8	67.2%	2734.7	78.1%		0%
M20	2/03/2023	PILOTES NO. 58 Y 56	3500	2982.9	85.2%		0%		0%
M21	3/03/2023	PILOTES NO. 5 Y 10	3500	3077.2	87.9%		0%		0%
M22	4/03/2023	PILOTES NO. 30 Y 40	3500	2805.8	80.2%		0%		0%
M23	5/03/2023	PILOTES NO. 12 Y 27	3500	3135.8	89.6%		0%		0%
M24	6/03/2023	PILOTES NO. 55 Y 57	3500	2725	77.9%		0%		0%
M25	9/03/2023	PILOTES NO. 24 Y 38	3500	3243.8	92.7%		0%		0%

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.				**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS				**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG				**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.03**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-3 L=30m D=0.7m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:** m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**







UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Diametro	Largo	Alto	Area M2		
PLT - 51			30.00		1.00	30.00
PLT - 52			30.00		1.00	30.00
PLT - 53			30.00		1.00	30.00
PLT - 54			30.00		1.00	30.00
PLT - 55			30.00		1.00	30.00
PLT - 56			30.00		1.00	30.00
PLT - 57			30.00		1.00	30.00
PLT - 58			30.00		1.00	30.00

OBSERVACIONES :


TOTAL EJECUTADO	240.00
EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	60.00
EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	**180.00**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.03**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-3 L=30m D=0.7m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

ESQUEMA

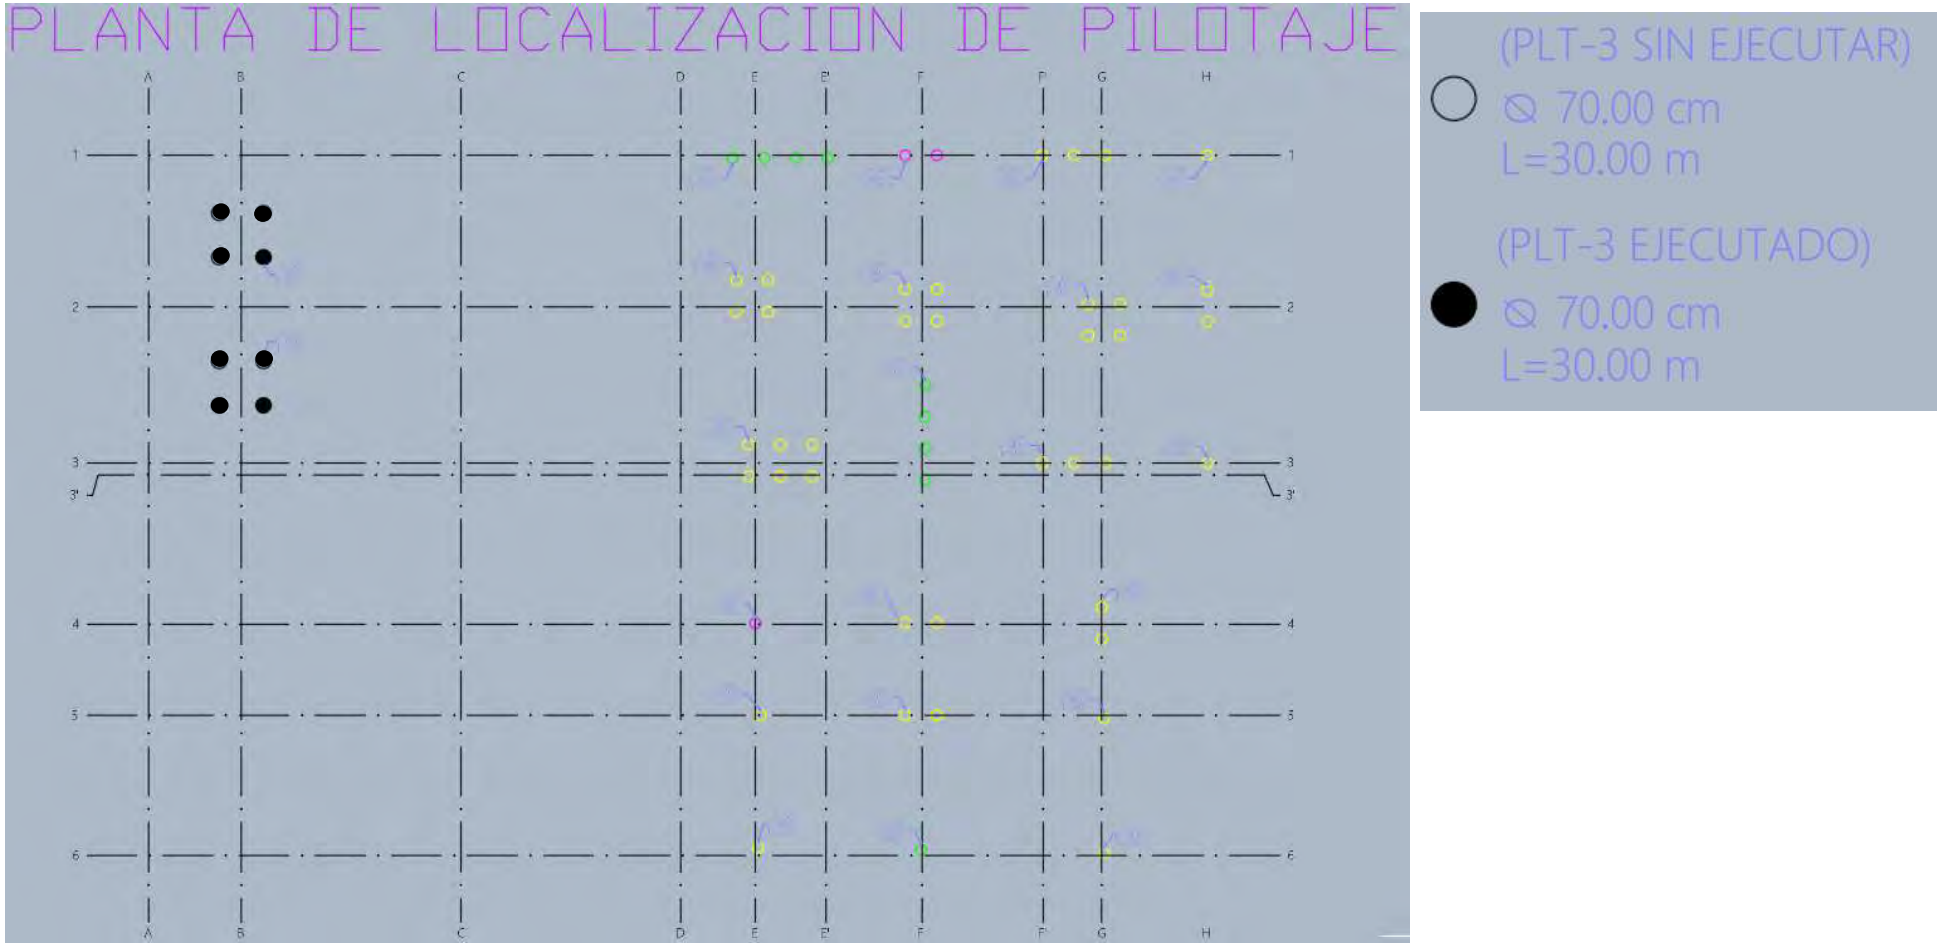

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.03**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-3 L=30m D=0.7m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

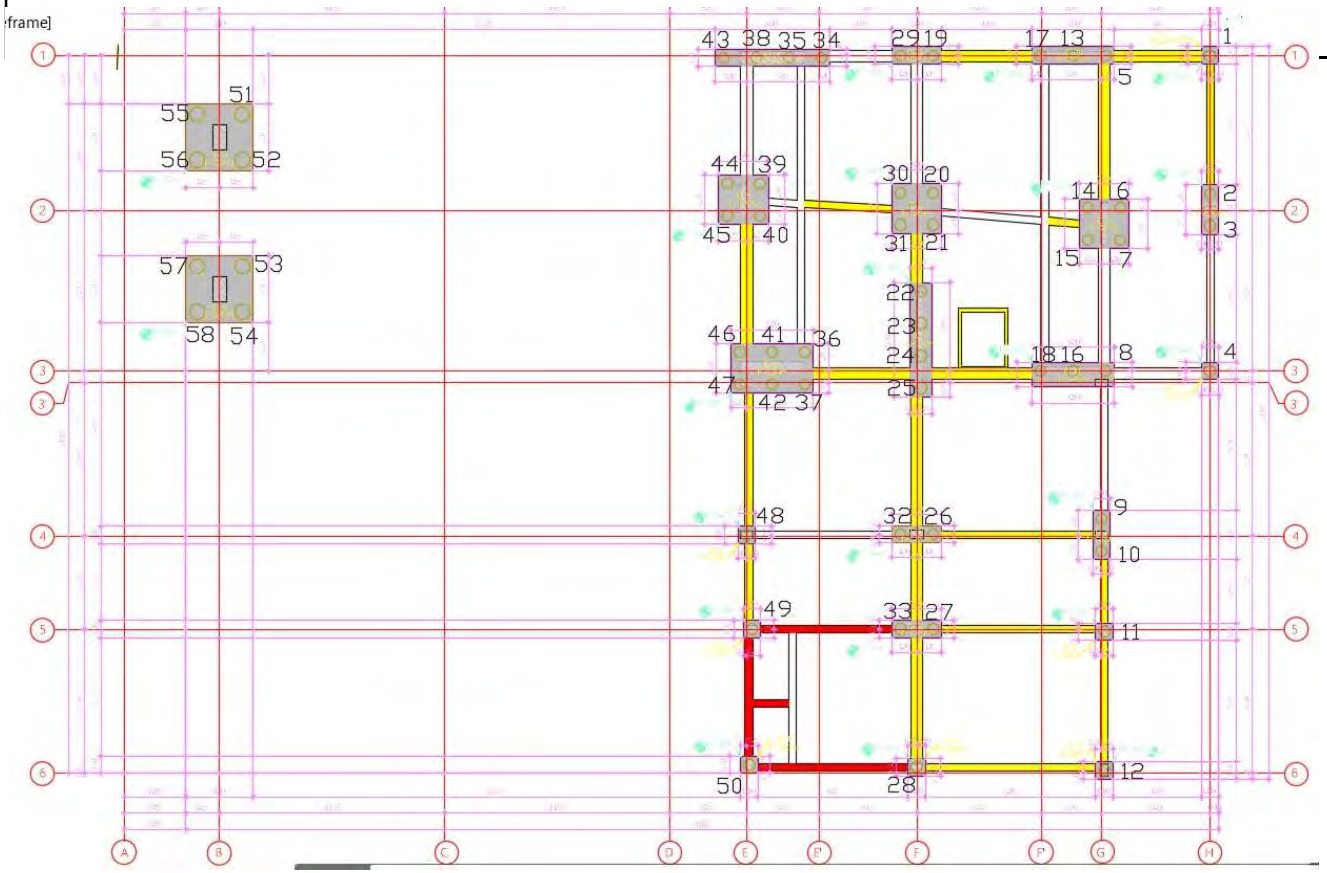

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.03**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-3 L=30m D=0.7m - f'c=24.5MPa		**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	

TABLA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

MUESTRA	*FECHA DE TOMA*	*UBICACIÓN*	*RESISTENCIA NOMINAL*	*7 DIAS*		*14 DIAS*		*28 DIAS*	
				PSI	*%*	*PSI*	*%*	*PSI*	*%*
M1	26/01/2026	PILOTES NO.14, 11 Y 3	3500	2493.6	71.2%	3096.1	88.5%	3616.9	103.3%
M2	27/01/2026	PILOTE NO.21	3500	2563.6	73.2%	3029	86.5%	3621.5	103.5%
M3	28/01/2026	PILOTES NO.44 Y 36	3500	2495.1	71.3%	3151.5	90.0%	3585.2	102.4%
M4	29/01/2026	PILOTE NO.18	3500	2474.6	70.7%	3135.7	89.6%	3694.2	105.5%
M5	2/02/2026	PILOTES NO.4, 2 Y 16	3500	2596.7	74.2%	2980.2	85.1%	3578.7	102.2%
M6	3/02/2026	PILOTES NO.1, 9 Y 15	3500	2553.1	72.9%	2962.4	84.6%	3549.2	101.4%
M7	4/02/2026	PILOTES NO. 33 Y 42	3500	2550.5	72.9%	3239.1	92.5%	3710.5	106.0%
M8	5/02/2026	PILOTES NO.6, 8, 32 Y 49	3500	2490.7	71.2%	3079.00	88.0%	4892.8	139.8%
M9	6/02/2026	PILOTE NO.35	3500	2552.7	72.9%	2995.1	85.6%	4211.5	120.3%
M10	9/02/2026	PILOTE NO.54	3500	2532.2	72.3%	3137.4	89.6%	4725.8	135.0%
M11	11/02/2026	PILOTE NO.37	3500	2552.7	72.9%	3073.2	87.8%	3782.3	108.1%
M12	20/02/2026	PILOTES NO. 7 Y 17	3500	3283.7	93.8%	3502.7	100.1%		0.0%
M13	21/02/2026	PILOTE NO.29	3500	2652.2	75.8%	3799.4	108.6%		0.0%
M14	23/02/2026	PILOTES NO.13 Y 20	3500	2610.2	74.6%	3251.9	92.9%		0.0%
M15	24/02/2026	PILOTES NO. 23 Y 39	3500	3208.4	91.7%	3920	112.0%		0.0%
M16	25/02/2026	PILOTE NO.54	3500	2617.5	74.8%	3439	98.3%		0%
M17	26/02/2026	PILOTES NO. 52 Y 31	3500	3042.7	86.9%	3462.8	98.9%		0%
M18	27/02/2026	PILOTES NO. 19 Y 25	3500	3031.5	86.6%	3258.6	93.1%		0%
M19	28/02/2026	PILOTE NO. 41	3500	2351.8	67.2%	2734.7	78.1%		0%
M20	2/03/2023	PILOTES NO. 58 Y 56	3500	2982.9	85.2%		0%		0%
M21	3/03/2023	PILOTES NO. 5 Y 10	3500	3077.2	87.9%		0%		0%
M22	4/03/2023	PILOTES NO. 30 Y 40	3500	2805.8	80.2%		0%		0%
M23	5/03/2023	PILOTES NO. 12 Y 27	3500	3135.8	89.6%		0%		0%
M24	6/03/2023	PILOTES NO. 55 Y 57	3500	2725	77.9%		0%		0%
M25	9/03/2023	PILOTES NO. 24 Y 38	3500	3243.8	92.7%		0%		0%

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.				**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS				**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG				**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.04**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-4 L=32m D=0.5m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:** m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**







UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Diametro	Largo	Alto	Area M2		
PLT - 22			32.00		1.00	32.00
PLT - 23			32.00		1.00	32.00
PLT - 24			32.00		1.00	32.00
PLT - 25			32.00		1.00	32.00
PLT - 28			32.00		1.00	32.00
PLT - 34			32.00		1.00	32.00
PLT - 35			32.00		1.00	32.00
PLT - 38			32.00		1.00	32.00
PLT - 43			32.00		1.00	32.00

OBSERVACIONES :


TOTAL EJECUTADO	288.00
EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	64.00
EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	**224.00**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.04**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-4 L=32m D=0.5m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

ESQUEMA

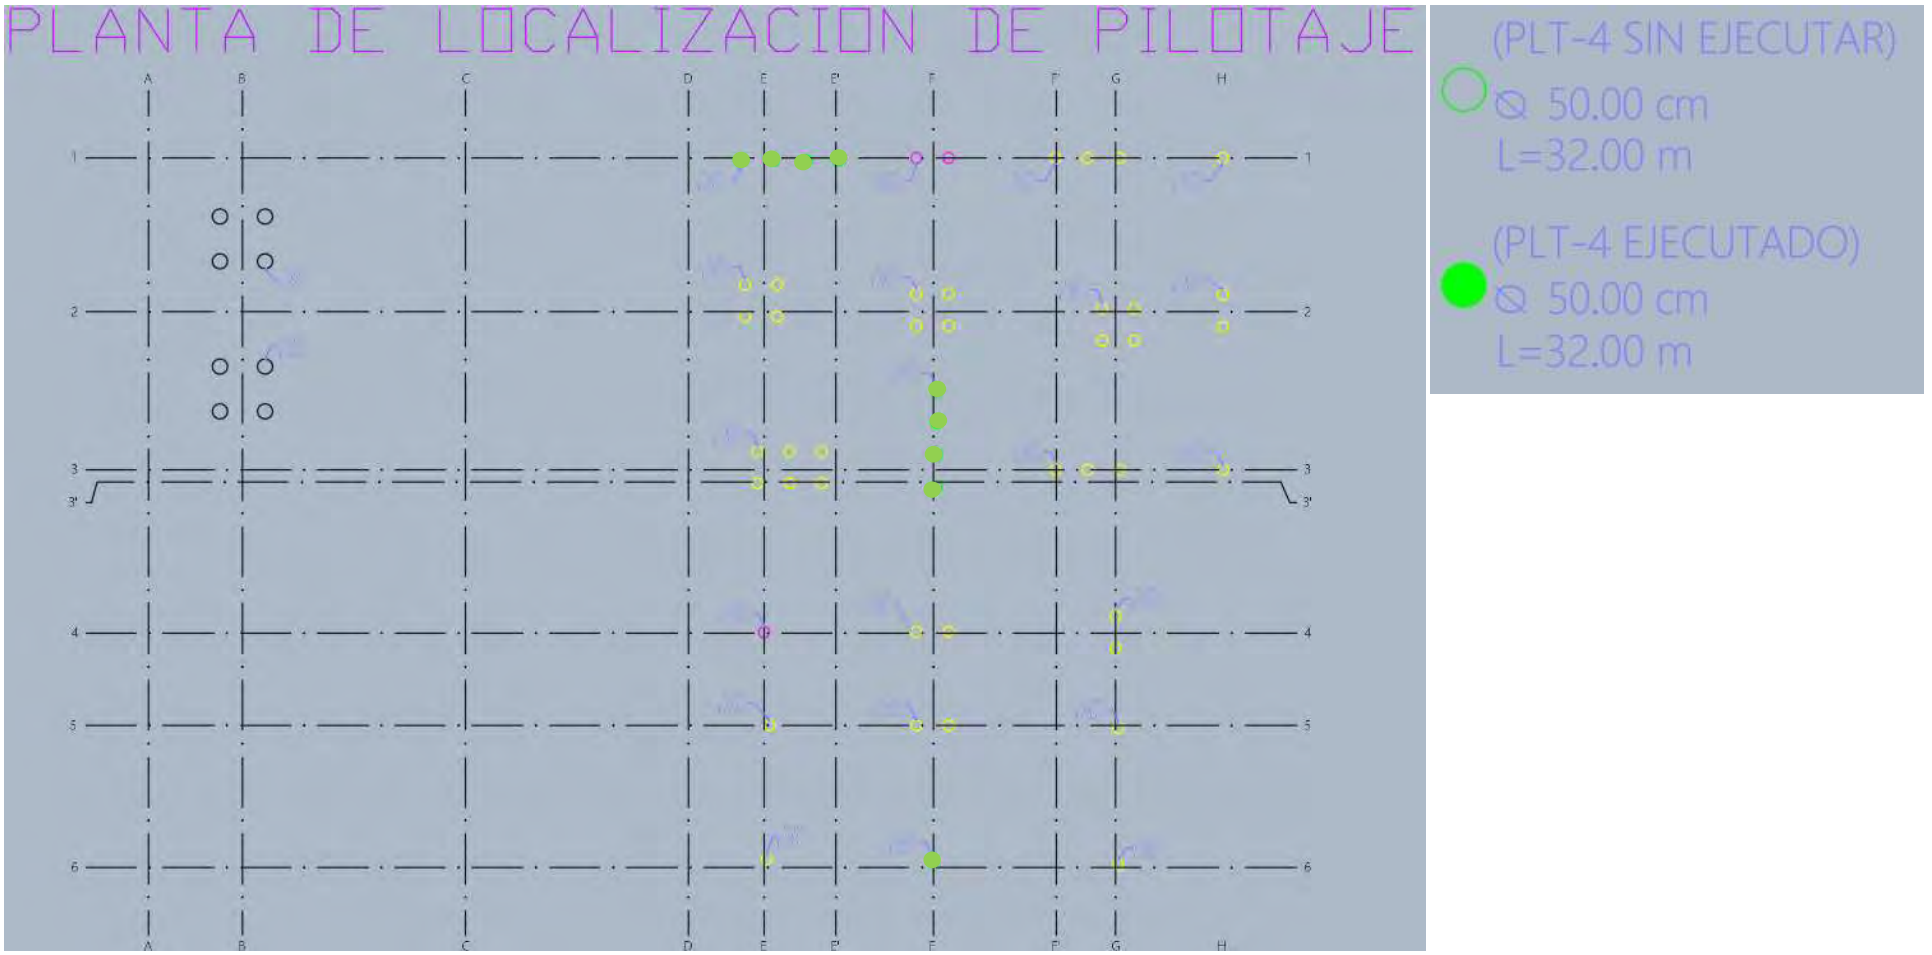

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.04**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-4 L=32m D=0.5m - f'c=24.5MPa	**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

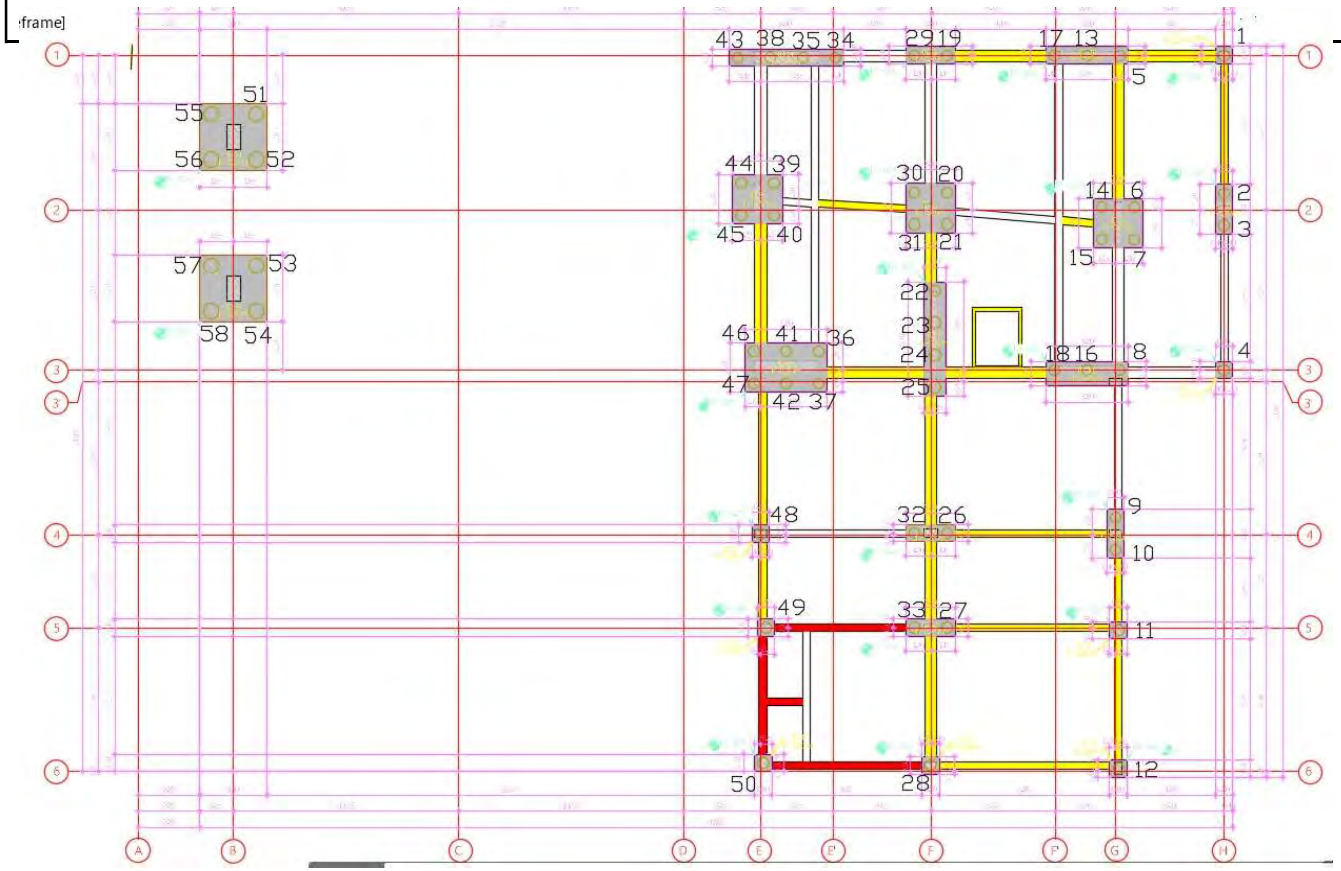

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 02**	**ITEM:**	**2.03.04**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-4 L=32m D=0.5m - f'c=24.5MPa		**UNIDAD:**	m	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	

TABLA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

MUESTRA	*FECHA DE TOMA*	*UBICACIÓN*	*RESISTENCIA NOMINAL*	*7 DIAS*		*14 DIAS*		*28 DIAS*	
				PSI	*%*	*PSI*	*%*	*PSI*	*%*
M1	26/01/2026	PILOTES NO.14, 11 Y 3	3500	2493.6	71.2%	3096.1	88.5%	3616.9	103.3%
M2	27/01/2026	PILOTE NO.21	3500	2563.6	73.2%	3029	86.5%	3621.5	103.5%
M3	28/01/2026	PILOTES NO.44 Y 36	3500	2495.1	71.3%	3151.5	90.0%	3585.2	102.4%
M4	29/01/2026	PILOTE NO.18	3500	2474.6	70.7%	3135.7	89.6%	3694.2	105.5%
M5	2/02/2026	PILOTES NO.4, 2 Y 16	3500	2596.7	74.2%	2980.2	85.1%	3578.7	102.2%
M6	3/02/2026	PILOTES NO.1, 9 Y 15	3500	2553.1	72.9%	2962.4	84.6%	3549.2	101.4%
M7	4/02/2026	PILOTES NO. 33 Y 42	3500	2550.5	72.9%	3239.1	92.5%	3710.5	106.0%
M8	5/02/2026	PILOTES NO.6, 8, 32 Y 49	3500	2490.7	71.2%	3079.00	88.0%	4892.8	139.8%
M9	6/02/2026	PILOTE NO.35	3500	2552.7	72.9%	2995.1	85.6%	4211.5	120.3%
M10	9/02/2026	PILOTE NO.54	3500	2532.2	72.3%	3137.4	89.6%	4725.8	135.0%
M11	11/02/2026	PILOTE NO.37	3500	2552.7	72.9%	3073.2	87.8%	3782.3	108.1%
M12	20/02/2026	PILOTES NO. 7 Y 17	3500	3283.7	93.8%	3502.7	100.1%		0.0%
M13	21/02/2026	PILOTE NO.29	3500	2652.2	75.8%	3799.4	108.6%		0.0%
M14	23/02/2026	PILOTES NO.13 Y 20	3500	2610.2	74.6%	3251.9	92.9%		0.0%
M15	24/02/2026	PILOTES NO. 23 Y 39	3500	3208.4	91.7%	3920	112.0%		0.0%
M16	25/02/2026	PILOTE NO.54	3500	2617.5	74.8%	3439	98.3%		0%
M17	26/02/2026	PILOTES NO. 52 Y 31	3500	3042.7	86.9%	3462.8	98.9%		0%
M18	27/02/2026	PILOTES NO. 19 Y 25	3500	3031.5	86.6%	3258.6	93.1%		0%
M19	28/02/2026	PILOTE NO. 41	3500	2351.8	67.2%	2734.7	78.1%		0%
M20	2/03/2023	PILOTES NO. 58 Y 56	3500	2982.9	85.2%		0%		0%
M21	3/03/2023	PILOTES NO. 5 Y 10	3500	3077.2	87.9%		0%		0%
M22	4/03/2023	PILOTES NO. 30 Y 40	3500	2805.8	80.2%		0%		0%
M23	5/03/2023	PILOTES NO. 12 Y 27	3500	3135.8	89.6%		0%		0%
M24	6/03/2023	PILOTES NO. 55 Y 57	3500	2725	77.9%		0%		0%
M25	9/03/2023	PILOTES NO. 24 Y 38	3500	3243.8	92.7%		0%		0%

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.							**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO							**VERSIÓN**	**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	10
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		



Traslapo entre tramos de espirales





Traslapo entre tramos de espirales







UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Largo	No.	kg/ml	Cant/Ele		
PILOTE 1	9.00	5.00	1.56	4.00	38.00	2134.08
	12.00	5.00	1.56	4.00	38.00	2845.44
	12.00	5.00	1.56	8.00	38.00	5690.88
	11.50	5.00	1.56	4.00	38.00	2726.88
	8.50	5.00	1.56	4.00	38.00	2015.52
	1.10	3.00	0.56	208.00	38.00	4866.91
Traslapo entre tramos de espirales pilote 1	1.10	3.00	0.56	20.00	38.00	467.97
PILOTE 2	10.00	5.00	1.56	4.00	3.00	187.20
	12.00	5.00	1.56	4.00	3.00	224.64
	12.00	5.00	1.56	8.00	3.00	449.28
	11.50	5.00	1.56	4.00	3.00	215.28
	9.50	5.00	1.56	4.00	3.00	177.84
	1.10	3.00	0.56	215.00	3.00	397.16
Traslapo entre tramos de espirales pilote 2	1.10	3.00	0.56	22.00	3.00	40.64
PILOTE 3	10.25	6.00	2.25	6.00	8.00	1107.00
	6.00	6.00	2.25	6.00	8.00	648.00
	12.00	6.00	2.25	18.00	8.00	3888.00
	10.70	6.00	2.25	6.00	8.00	1155.60
	4.60	6.00	2.25	6.00	8.00	496.80
	1.73	3.00	0.56	208.00	8.00	1610.10
Traslapo entre tramos de espirales pilote 3	1.57	3.00	0.56	20.00	8.00	140.74
PILOTE 4	9.00	5.00	1.56	6.00	9.00	758.16
	12.00	5.00	1.56	6.00	9.00	1010.88
	12.00	5.00	1.56	12.00	9.00	2021.76
	8.50	5.00	1.56	6.00	9.00	716.04
	10.50	5.00	1.56	6.00	9.00	884.52
	5.85	5.00	1.56	6.00	9.00	492.80
	1.10	3.00	0.56	215.00	9.00	1191.48
Traslapo entre tramos de espirales pilote 4	1.10	3.00	0.56	20.00	9.00	110.84
PILOTAJE						38672.44
DADO 2	3.40	6.00	2.25	8.00	2.00	122.40
	1.90	5.00	1.56	18.00	2.00	106.70
	3.40	5.00	1.56	3.00	2.00	31.82
	3.50	4.00	1.00	6.00	2.00	42.00
DADO 4	4.90	6.00	2.25	8.00	1.00	88.20
	1.90	5.00	1.56	30.00	1.00	88.92
	4.90	5.00	1.56	3.00	1.00	22.93
	5.00	4.00	1.00	6.00	1.00	30.00
DADO 5	5.00	4.00	1.00	6.00	3.00	90.00
	3.40	5.00	1.56	36.00	3.00	572.83
	3.40	6.00	2.25	16.00	3.00	367.20
	3.74	6.00	2.25	4.00	3.00	100.98
	3.90	6.00	2.25	4.00	3.00	105.30
	4.06	6.00	2.25	4.00	3.00	109.62
	4.22	6.00	2.25	4.00	3.00	113.94

DAIMCO	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
	MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 10
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**





DADO 6	6.40	6.00	2.25	10.00	1.00	144.00
	1.90	5.00	1.56	42.00	1.00	124.49
	6.40	5.00	1.56	3.00	1.00	29.95
	6.50	4.00	1.00	6.00	1.00	39.00
DADO 7	6.40	6.00	2.25	10.00	1.00	144.00
	2.10	5.00	1.56	42.00	1.00	137.59
	6.40	5.00	1.56	4.00	1.00	39.94
	6.70	4.00	1.00	6.00	1.00	40.20
DADO 8	4.90	6.00	2.25	18.00	1.00	198.45
	3.40	6.00	2.25	27.00	1.00	206.55
	4.90	5.00	1.56	8.00	1.00	61.15
	4.90	5.00	1.56	9.00	1.00	68.80
	3.40	5.00	1.56	15.00	1.00	79.56
	6.55	4.00	1.00	6.00	1.00	39.30
DADO 9	6.60	4.00	1.00	6.00	2.00	79.20
	4.20	5.00	1.56	48.00	2.00	628.99
	4.20	6.00	2.25	18.00	2.00	340.20
	4.71	6.00	2.25	4.00	2.00	84.78
	5.03	6.00	2.25	4.00	2.00	90.54
	5.19	6.00	2.25	4.00	2.00	93.42
	5.35	6.00	2.25	4.00	2.00	96.30
	4.87	6.00	2.25	4.00	2.00	87.66
DADO 10	4.90	6.00	2.25	11.00	1.00	121.28
	2.25	5.00	1.56	30.00	1.00	105.30
	4.90	6.00	2.25	5.00	1.00	55.13
	5.35	4.00	1.00	6.00	1.00	32.10
DADO 11	1.90	5.00	1.56	12.00	2.00	71.14
	2.90	4.00	1.00	3.00	2.00	17.40

OBSERVACIONES :


TOTAL EJECUTADO	43,921.70
EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	33,411.18
EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	**10,510.52**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de** **10**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA		**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	


ESQUEMA




Traslapo entre tramos de espirales de pilote tipo 1
20 espirales





Traslapo entre tramos de espirales de pilote tipo 2
22 espirales





PLT-1 D=0.50m x 30m (Son 38) Peso/Elemento= 533.68Kg Peso 38 elementos=20279.71Kg


DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
0.25 / 9.75	4	#5	9.00	56.2	(Total =152)
0.25 / 11.75	4	#5	12.00	74.9	(Total =152)
12.00	8	#5	12.00	149.8	(Total =304)
11.50	4	#5	11.50	71.8	(Total =152)
9.50	4	#5	9.50	59.3	(Total =152)
	1	#3	17.593	9.9	(Total =38)
	1	#3	¡¡¡ 211.115 !!!	118.2	(Total =38)

PLT-2 D=0.50m x 31m (Son 3) Peso/Elemento= 550.47Kg Peso 3 elementos=1651.40Kg


DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
0.25 / 9.75	4	#5	10.00	62.4	(Total =12)
0.25 / 11.75	4	#5	12.00	74.9	(Total =12)
12.00	8	#5	12.00	149.8	(Total =24)
11.50	4	#5	11.50	71.8	(Total =12)
9.50	4	#5	9.50	59.3	(Total =12)

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**


PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de** **10**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA		**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	




Traslapo entre tramos de espirales de pilote tipo 3
20 espirales



Traslapo entre tramos de espirales de pilote tipo 4
24 espirales





Espiral vueltas=16.0 a=0.35	1	#3	17.593	9.9	(Total =3)
Espiral vueltas=199.0 a=0.35	1	#3	¡¡¡ 218.812 !!!	122.5	(Total =3)


PLT-3 D=0.70m x 30m (Son 8) Peso/Elemento= 1113.19Kg Peso 8 elementos=8905.50Kg


DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
0.40 9.85	6	#6	10.25	138.4	(Total =48)
0.40 5.60	6	#6	6.00	81.0	(Total =48)
12.00	18	#6	12.00	486.0	(Total =144)
10.70	6	#6	10.70	144.4	(Total =48)
4.60	6	#6	4.60	62.1	(Total =48)
Espiral vueltas=16.0 a=0.55	1	#3	27.646	15.5	(Total =8)
Espiral vueltas=192.0 a=0.55	1	#3	¡¡¡ 331.752 !!!	185.8	(Total =8)

PLT-4 D=0.50m x 32m (Son 9) Peso/Elemento= 789.88Kg Peso 9 elementos=7108.89Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
0.25 8.75	6	#5	9.00	84.2	(Total =54)
0.25 11.75	6	#5	12.00	112.3	(Total =54)
12.00	12	#5	12.00	224.6	(Total =108)
8.50	6	#5	8.50	79.6	(Total =54)
10.50	6	#5	10.50	98.3	(Total =54)
Espiral vueltas=16.0 a=0.35	1	#3	17.593	9.9	(Total =9)
Espiral vueltas=205.0 a=0.35	1	#3	¡¡¡ 225.409 !!!	126.2	(Total =9)
5.85	6	#5	5.85	54.8	(Total =54)


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.							FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO							VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	5
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	03	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA		**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

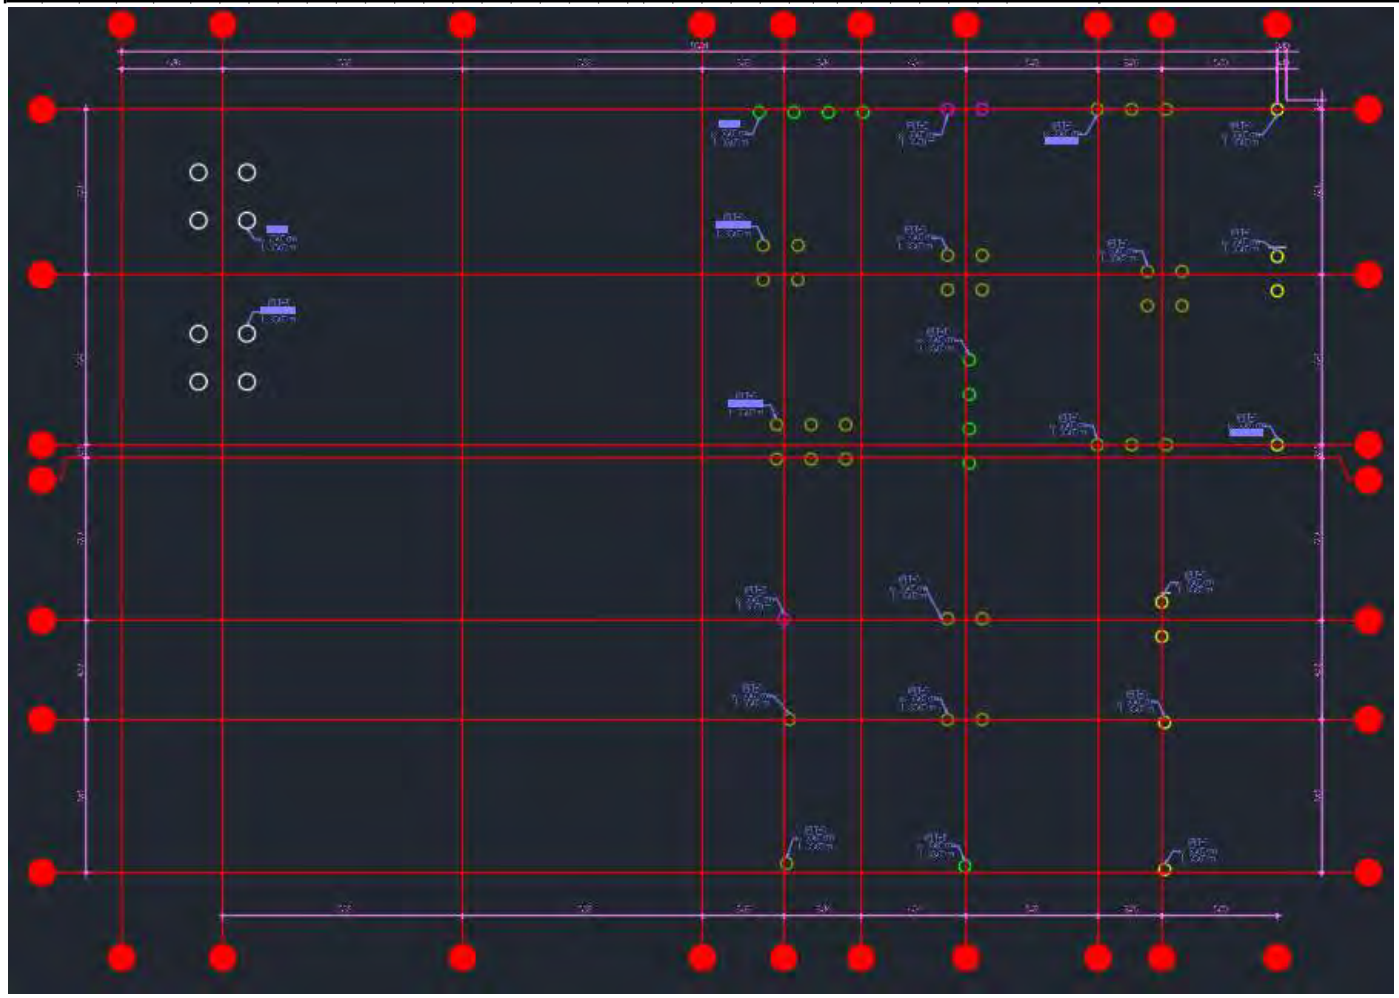

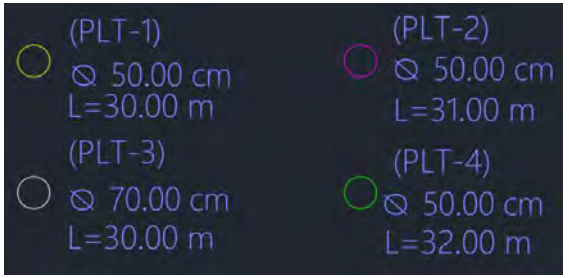




DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.			UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.					FECHA:			
					MEMORIA DE CALCULO					VERSIÓN			CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	10	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025			
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA		**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**			

PLANTA DE LOCALIZACION DE PILOTES




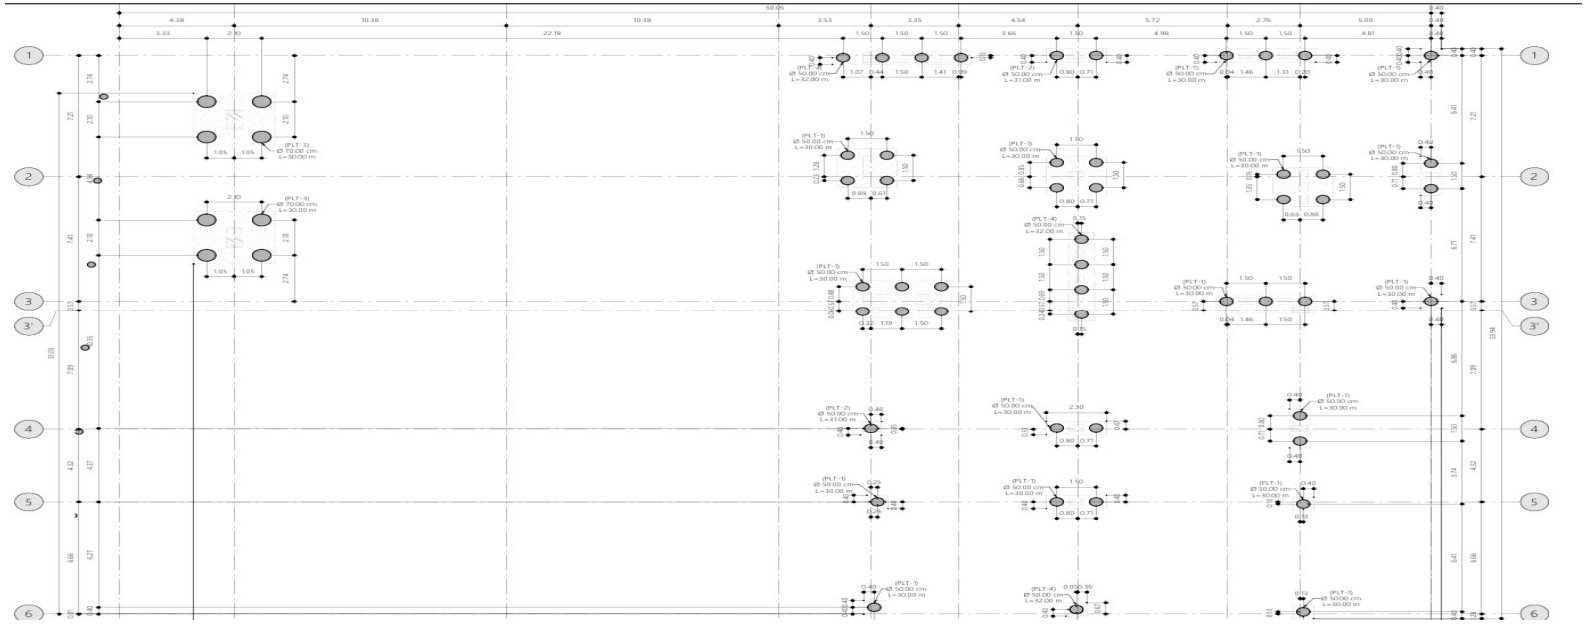


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.		UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.					**FECHA:**		
				MEMORIA DE CALCULO					**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**10**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		








DADO 2 (Son 4) Peso/Elemento= 151.46Kg Peso 4 elementos=605.86Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
	8	#6	3.40	61.2	(Total =32)
	18	#5	1.90	53.4	(Total =72)
	3	#5	3.40	15.9	(Total =12)
	6	#4	3.50	21.0	(Total =24)




DADO 4 (Es 1) Peso/Elemento= 230.05Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
	8	#6	4.90	88.2	
	30	#5	1.90	88.9	
	3	#5	4.90	22.9	
	6	#4	5.00	30.0	





DADO 5 (Son 3) Peso/Elemento= 486.62Kg Peso 3 elementos=1459.87Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
	6	#4	5.00	30.0	(Total =18)
	36	#5	3.40	190.9	(Total =108)
	16	#6	3.40	122.4	(Total =48)
	4	#6	3.74	33.7	(Total =12)
	4	#6	3.90	35.1	(Total =12)
	4	#6	4.06	36.5	(Total =12)
	4	#6	4.22	38.0	(Total =12)





DADO 6 (Es 1) Peso/Elemento= 337.44Kg


DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
	10	#6	6.40	144.0	
	42	#5	1.90	124.5	
	3	#5	6.40	30.0	
	6	#4	6.50	39.0	

DADO 7 (Es 1) Peso/Elemento= 361.73Kg







DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
	10	#6	6.40	144.0	
	42	#5	2.10	137.6	
	4	#5	6.40	39.9	
	6	#4	6.70	40.2	

DADO 8 (Es 1) Peso/Elemento= 653.81Kg




DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
	18	#6	4.90	198.4	
	27	#6	3.40	206.6	
	8	#5	4.90	61.2	
	9	#5	4.90	68.8	

	15	#5	3.40	79.6	
	6	#4	6.55	39.3	

DADO 9 (Son 2) Peso/Elemento= 750.55Kg Peso 2 elementos=1501.09Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
	6	#4	6.60	39.6	(Total =12)
	48	#5	4.20	314.5	(Total =96)
	18	#6	4.20	170.1	(Total =36)
	4	#6	4.71	42.4	(Total =8)
	4	#6	5.03	45.3	(Total =8)
	4	#6	5.19	46.7	(Total =8)
	4	#6	5.35	48.1	(Total =8)
	4	#6	4.87	43.8	(Total =8)


DADO 10 (Es 1) Peso/Elemento= 313.80Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
	11	#6	4.90	121.3	
	30	#5	2.25	105.3	
	5	#6	4.90	55.1	
	6	#4	5.35	32.1	


DADO 11 (Son 2) Peso/Elemento= 44.27Kg Peso 2 elementos=88.54Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO TOT	NOTAS
	12	#5	1.90	35.6	(Total =24)
	3	#4	2.90	8.7	(Total =6)


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**			
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**			**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**			**HOJA No.**	**1**	**de**	**10**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1		**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1		**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA		**UNIDAD:**	KG		**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

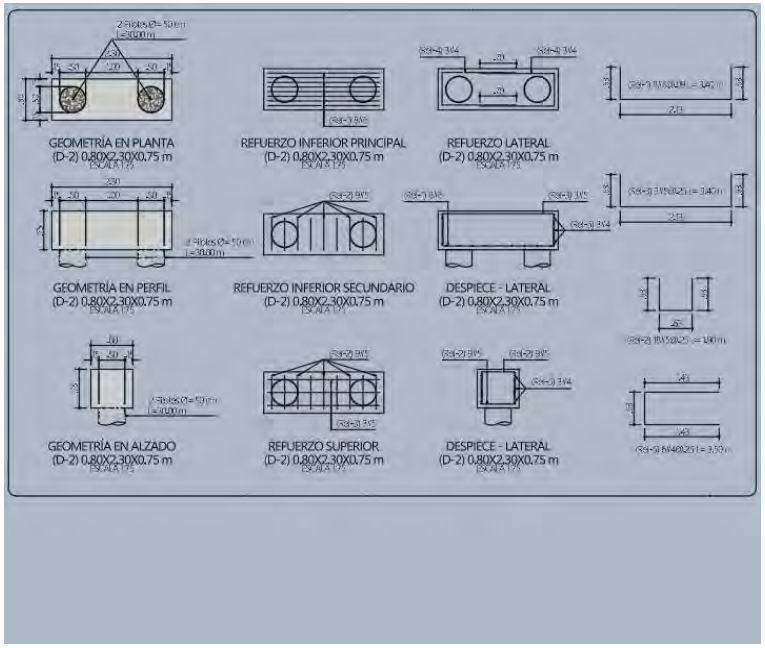


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**10**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

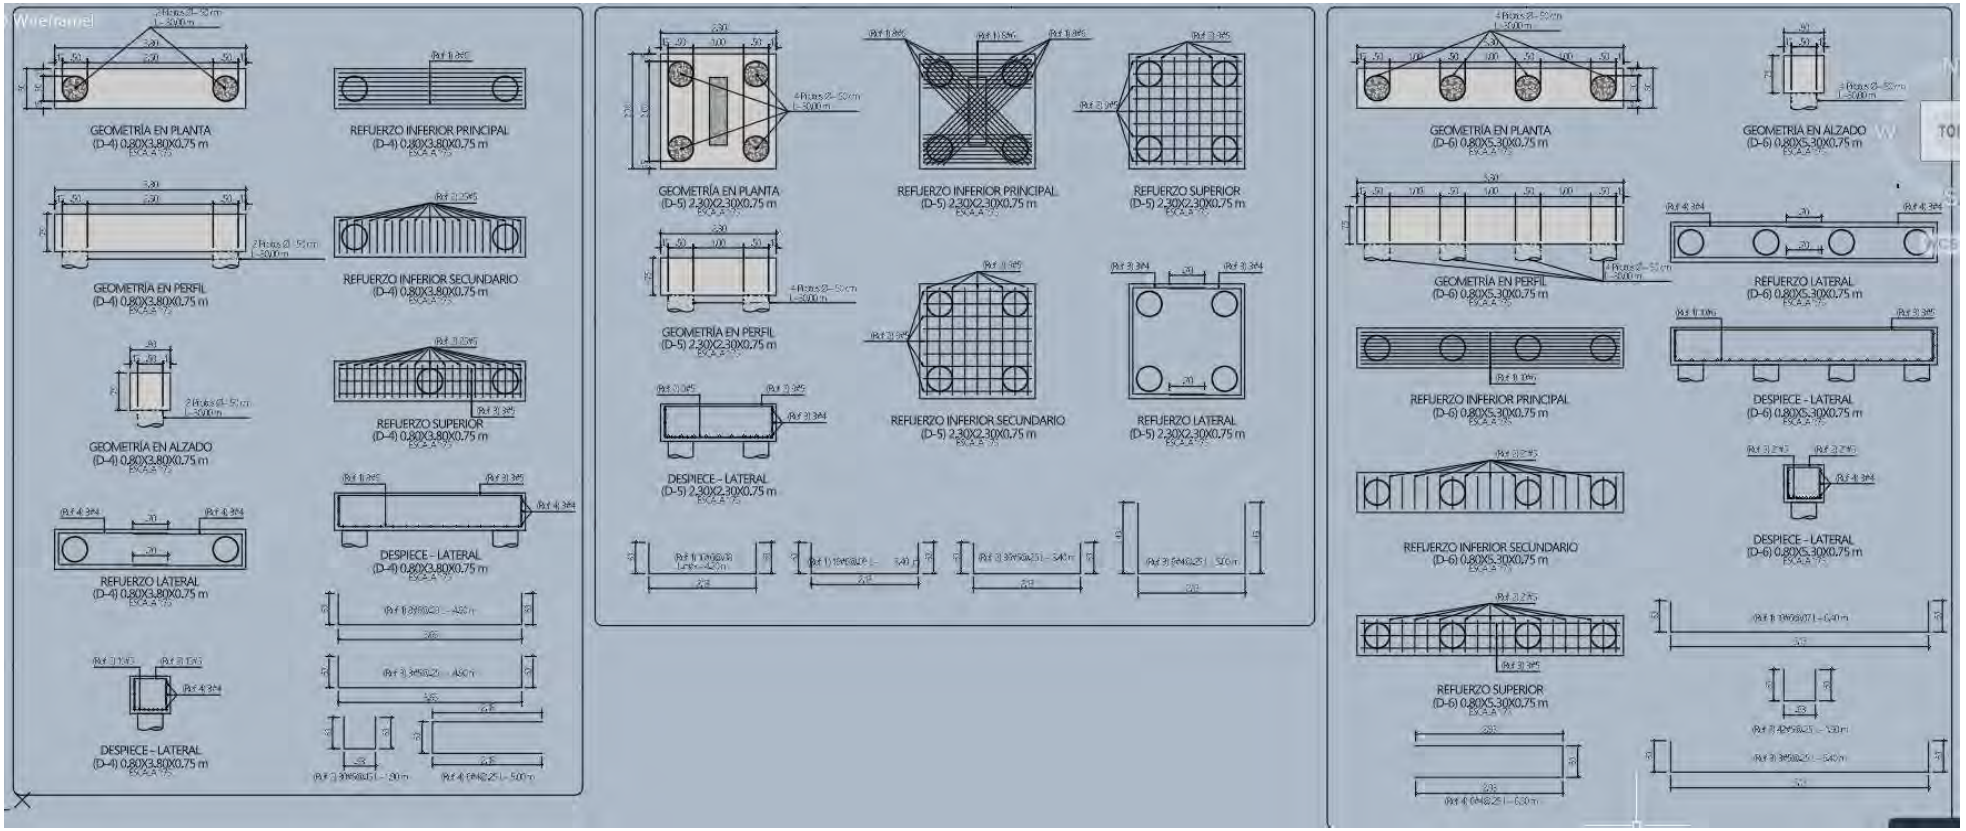


DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**10**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

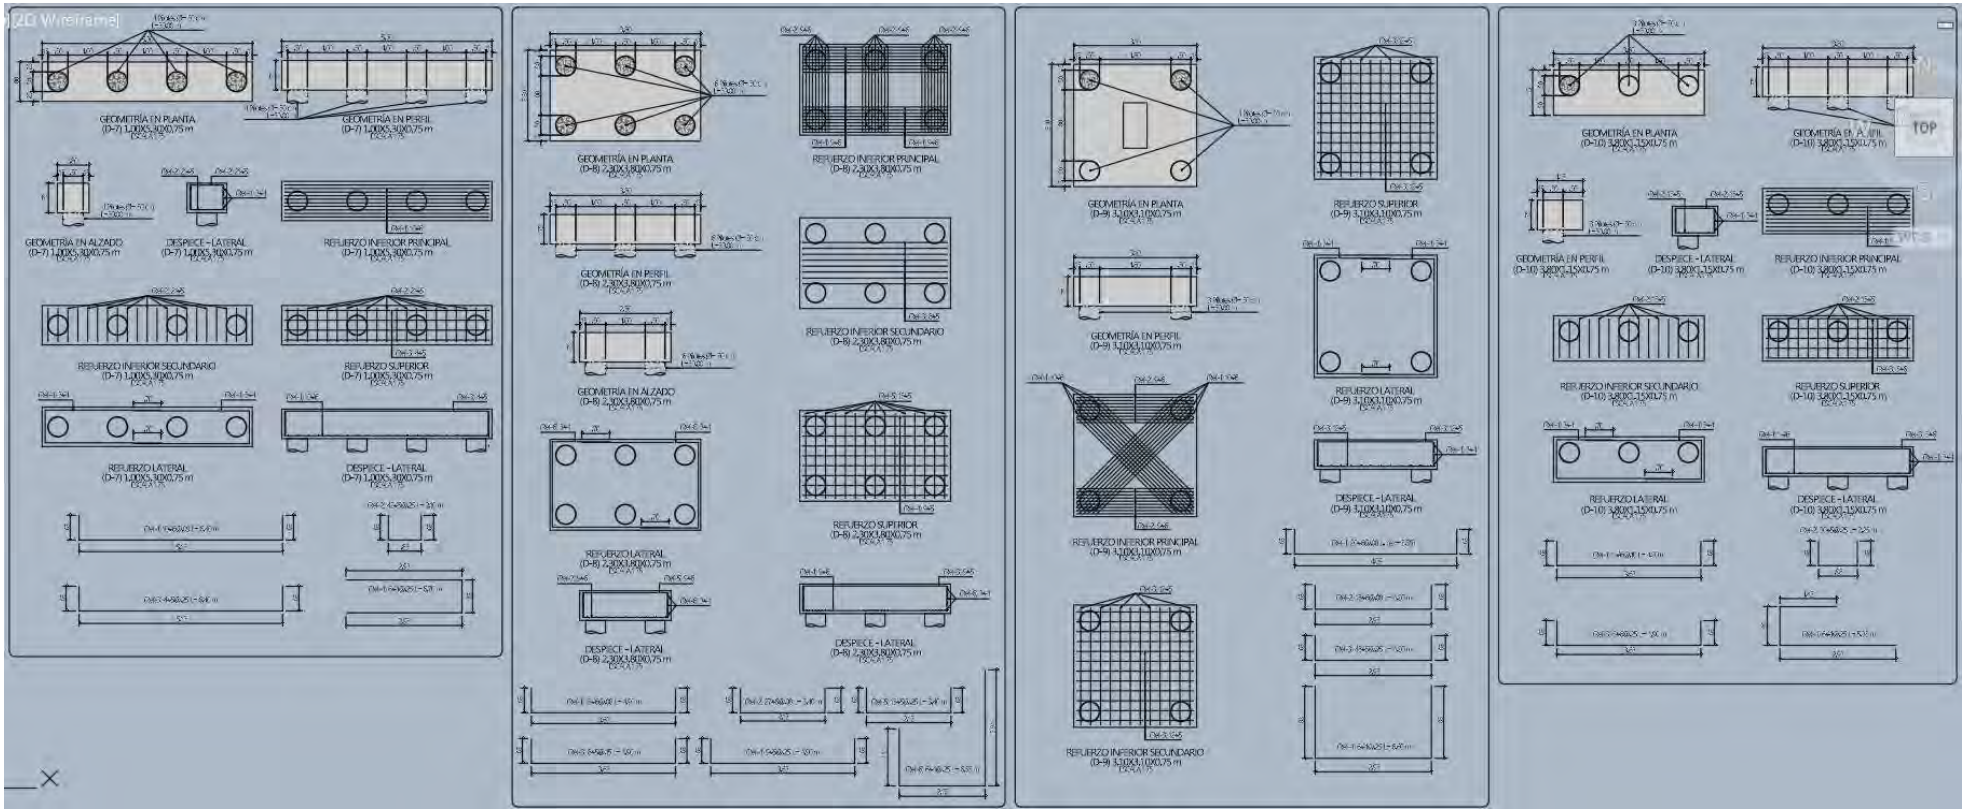

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						**FECHA:**		
			MEMORIA DE CALCULO						**VERSIÓN**		**CÓDIGO**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	**1**	**de**	**10**
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 01**	**ITEM:**	**2.06.01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA	**UNIDAD:**	KG	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

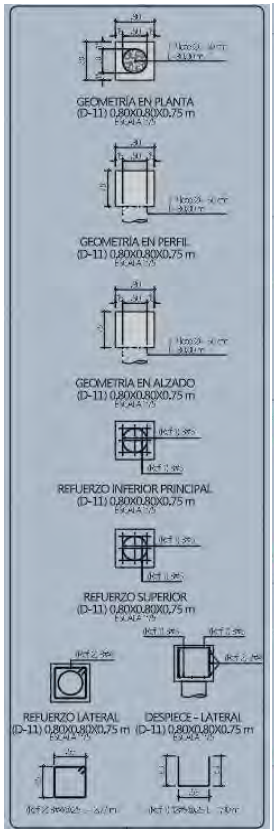

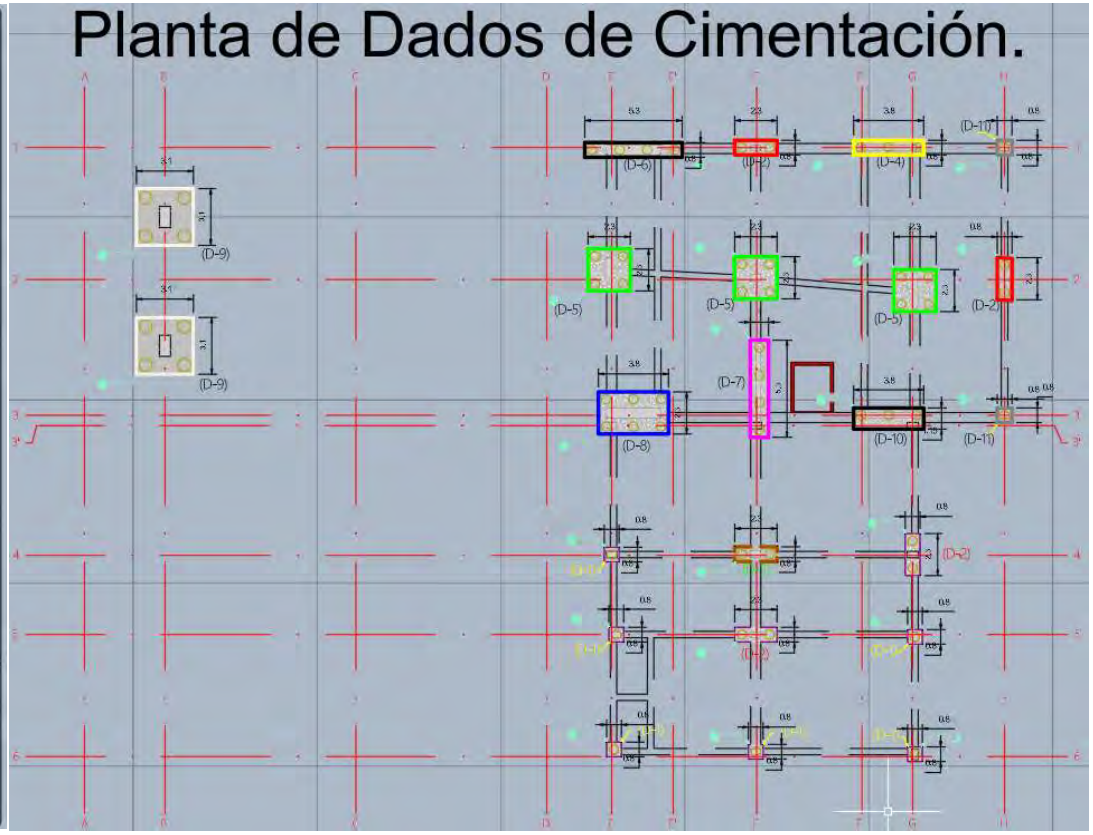

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.				**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS				**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG				**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 04**	**ITEM:**	**4.01.01**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA	**UNIDAD:** m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**





UBICACIÓN	MEDIDA				Cant	Medida TOTAL PAGADO
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
BLOQUE OCCIDENTAL PRIMER NIVEL	28.49	14.97			1.00	426.50
	16.99	1.20			1.00	20.39
	16.99	14.97			1.00	254.34
	5.00	14.97			1.00	74.85
BLOQUE ORIENTAL PRIMER NIVEL	16.97	18.64			1.00	316.32


OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO	1,092.39
EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	**1,092.39**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.						FECHA:		
			MEMORIA DE CALCULO						VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	3
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: 04**	**ITEM:**	**4.01.01**	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA	**UNIDAD:**	m2	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

ESQUEMA

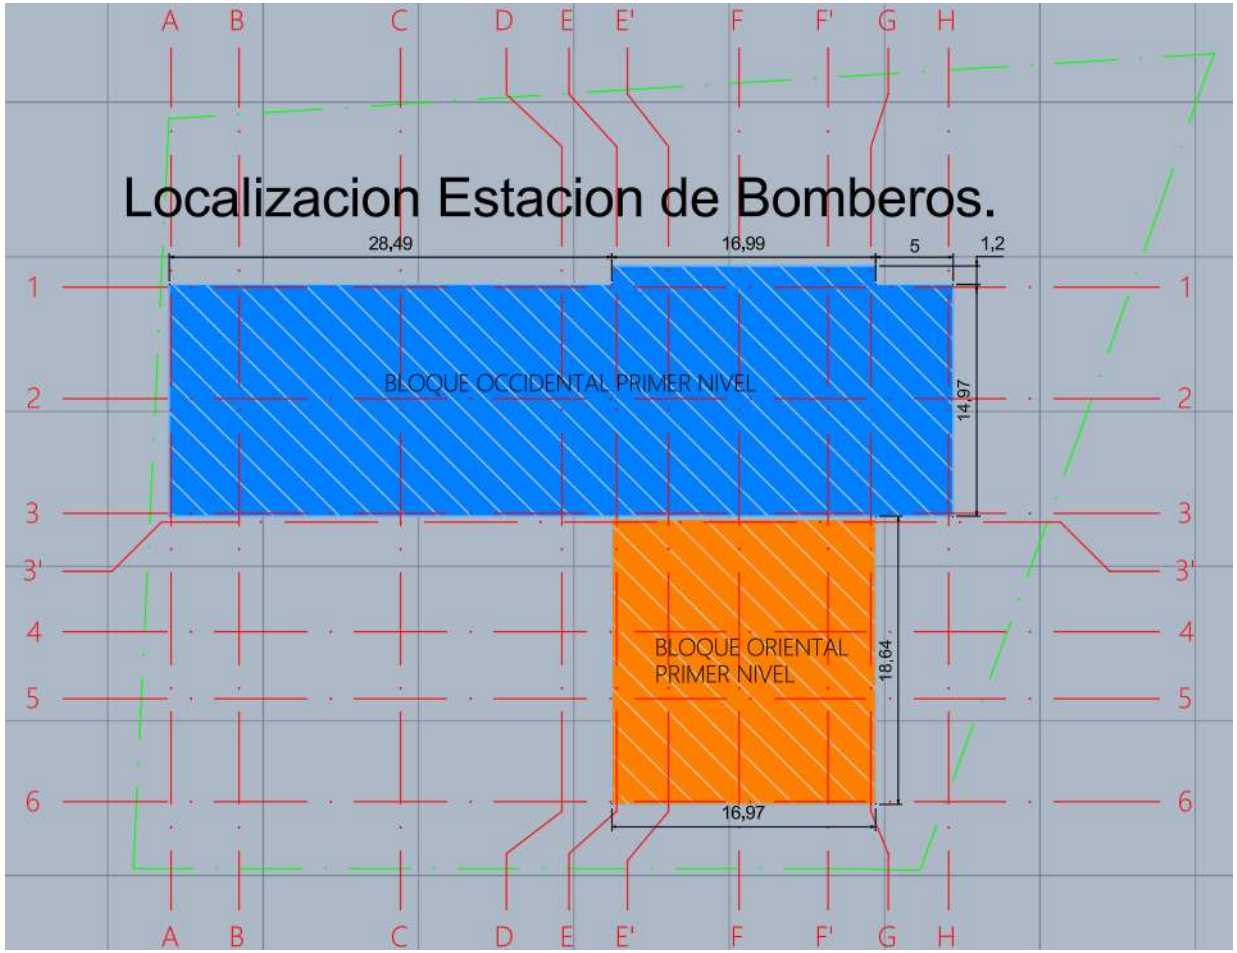

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 4	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: NP**	**ITEM:**	**NP.30.01.02**	SUMINITRO E INSTALACION DE CONCRETO ADICIONAL TIPO TREMIE DE 3500PSI, BOMBEADO CON EQUIPO ESTACIONARIO PARA PILOTES ESTABILIZADOS CON POLIMEROS DEBIDO A MAYOR CONSUMO POR INESTABILIDAD DEL SUELO.	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**	





UBICACIÓN	MEDIDA				Concreto Utilizado	TOTAL (Diferencia)
	Diametro	Area	Longitud	Vol Teorico + 10 % Desperdicio contemplado en APU		
Pilote 3	0.50	0.20	30.00	6.48	17.00	10.52
Pilote 14	0.50	0.20	30.00	6.48	9.00	2.52
Pilote 11 (Doble perforacion)	0.50	0.20	30.00	6.48	16.25	9.77
Pilote 21 (Triple perforacion)	0.50	0.20	30.00	6.48	30.00	23.52
Pilote 36 (Doble perforacion)	0.50	0.20	30.00	6.48	16.00	9.52
Pilote 44 (Triple perforacion no se logro fundir en la primer jornada)		0.00		0.00	25.50	25.50
Pilote 18	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 2	0.50	0.20	30.00	6.48	8.50	2.02
Pilote 4	0.50	0.20	30.00	6.48	8.50	2.02
Pilote 16	0.50	0.20	30.00	6.48	8.50	2.02
Pilote 1	0.50	0.20	30.00	6.48	10.50	4.02
Pilote 15	0.50	0.20	30.00	6.48	9.00	2.52
Pilote 9	0.50	0.20	30.00	6.48	8.50	2.02
Pilote 42	0.50	0.20	30.00	6.48	9.00	2.52
Pilote 33	0.50	0.20	30.00	6.48	9.00	2.52
Pilote 6	0.50	0.20	30.00	6.48	11.00	4.52
Pilote 8	0.50	0.20	30.00	6.48	9.00	2.52
Pilote 32	0.50	0.20	30.00	6.48	9.00	2.52
Pilote 49	0.50	0.20	30.00	6.48	9.00	2.52
Pilote 35	0.50	0.20	32.00	6.91	10.50	3.59
Pilote 54 (Doble perforacion no se logro fundir en la primer jornada)		0.00		0.00	18.00	18.00
Pilote 44	0.50	0.20	30.00	6.48	9.00	2.52
Pilote 37	0.50	0.20	30.00	6.48	9.00	2.52
Pilote 29 (Doble perforacion no se logro fundir en la primer jornada)		0.00		0.00	9.00	9.00
Pilote 17	0.50	0.20	30.00	6.48	9.00	2.52
Pilote 7	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 29	0.50	0.20	31.00	6.70	9.00	2.30

DAIMCO	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**
		MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN** / **CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1 de 4
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: NP**	**ITEM:**	**NP.30.01.02**	SUMINITRO E INSTALACION DE CONCRETO ADICIONAL TIPO TREMIE DE 3500PSI, BOMBEADO CON EQUIPO ESTACIONARIO PARA PILOTES ESTABILIZADOS CON POLIMEROS DEBIDO A MAYOR CONSUMO POR INESTABILIDAD DEL SUELO.	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**



Pilote 13	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 20	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 23	0.50	0.20	32.00	6.91	9.00	2.09
Pilote 39	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 54	0.70	0.38	30.00	12.70	17.00	4.30
Pilote 52	0.70	0.38	30.00	12.70	16.00	3.30
Pilote 31	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 19	0.50	0.20	31.00	6.70	8.50	1.80
Pilote 45	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 41	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 58	0.70	0.38	30.00	12.70	16.00	3.30
Pilote 56	0.70	0.38	30.00	12.70	16.00	3.30
Pilote 5	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 10	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 30	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 40	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 12	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 27	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 57	0.70	0.38	30.00	12.70	16.00	3.30
Pilote 55	0.70	0.38	30.00	12.70	16.00	3.30
Pilote 24	0.50	0.20	32.00	6.91	8.50	1.59
Pilote 38	0.50	0.20	32.00	6.91	8.50	1.59
Pilote 28	0.50	0.20	32.00	6.91	8.50	1.59
Pilote 22	0.50	0.20	32.00	6.91	8.50	1.59
Pilote 34	0.50	0.20	32.00	6.91	8.50	1.59
Pilote 53	0.70	0.38	30.00	12.70	16.00	3.30
Pilote 26	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 46	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 25	0.50	0.20	32.00	6.91	8.50	1.59
Pilote 43	0.50	0.20	32.00	6.91	8.50	1.59
Pilote 50	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 48	0.50	0.20	31.00	6.70	8.25	1.55
Pilote 47	0.50	0.20	30.00	6.48	8.00	1.52
Pilote 51	0.70	0.38	30.00	12.70	16.00	3.30


OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO	224.89
EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	0.00
EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	**224.89**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Residente de Obra: Ing. Hugo Moreno Rodriguez	Directora de Obra: Ing. Jazmin Yazo Patarroyo	Residente de interventoria: Arq. Jonathan Martinez	Director de Interventoria: Gabriel Duarte Orjuela

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.			UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.				FECHA:		
					MEMORIA DE CALCULO				VERSIÓN		CÓDIGO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.					**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de	4
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS					**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG					**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025		
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: NP**	**ITEM:**	**NP.30.01.02**	SUMINITRO E INSTALACION DE CONCRETO ADICIONAL TIPO TREMIE DE 3500PSI, BOMBEADO CON EQUIPO ESTACIONARIO PARA PILOTES ESTABILIZADOS CON POLIMEROS DEBIDO A MAYOR CONSUMO POR INESTABILIDAD DEL SUELO.	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

ESQUEMA

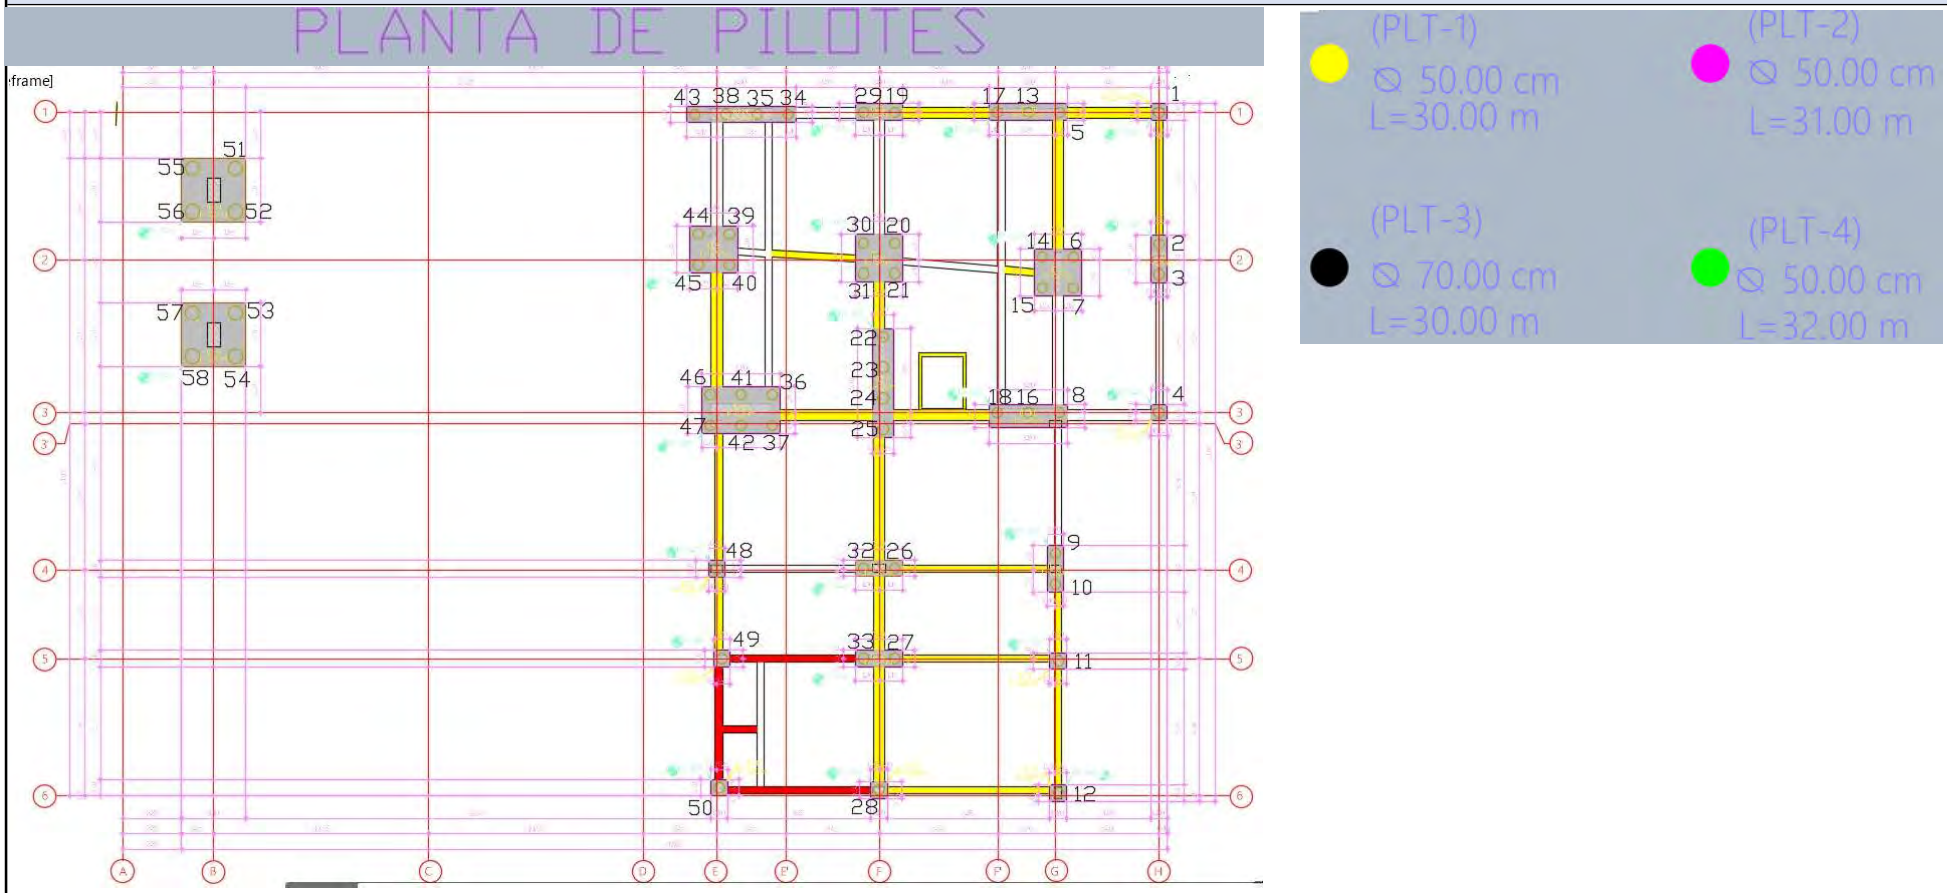

DAIMCO		U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.	UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.	**FECHA:**	
			MEMORIA DE CALCULO	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ – SGC.						**FECHA:**		**HOJA No.**	1	de 4
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS						**NIT O C.C.**	900.021.482-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 635 - 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG						**NIT O C.C.**	901.994.058-1	**CONTRATO N°**	UAECOB - CONTRATO - 630 - 2025	
CORTE N°:	**03**	**CAPÍTULO: NP**	**ITEM:**	**NP.30.01.02**	SUMINITRO E INSTALACION DE CONCRETO ADICIONAL TIPO TREMIE DE 3500PSI, BOMBEADO CON EQUIPO ESTACIONARIO PARA PILOTES ESTABILIZADOS CON POLIMEROS DEBIDO A MAYOR CONSUMO POR INESTABILIDAD DEL SUELO.	**UNIDAD:**	m3	**UBICACIÓN**	**ESTACION DE BOMBEROS CAOBOS**		

2.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-1 L=30m D=0.5m - f'c=24.5MPa	1440.0	m							315,067.05
				INS37	CONCRETO TREMIE DE 3500 PSI	m3	0.21599	581,982.71	125,699.54	10.00%
				EM6	HERRAMIENTA BÁSICA ALBAÑILERÍA AAA	%	0.00323	817,905.89	2,641.84	
				T5	CAMA BAJA	VJ	0.01000	2,000,000.00	20,000.00	
				INS36	DISTANCIADOR	UND	3.00000	394.56	1,183.68	
				INS950	NUDO DE PERRO HIERRO	UND	1.70000	20,000.00	34,000.00	
				INS38	PILOTEADORA TIPO KELLY DIAM=0,50 M	M	1.00000	126,310.10	126,310.10	
				INS39	POLÍMERO DE CONTENCIÓN O BENTONITA	LT	0.74001	7,070.04	5,231.90	
2.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-2 L=31m D=0.5m - f'c=24.5MPa	93.0	m							315,067.05
				INS37	CONCRETO TREMIE DE 3500 PSI	m3	0.21599	581,982.71	125,699.54	10.00%
				EM6	HERRAMIENTA BÁSICA ALBAÑILERÍA AAA	%	0.00323	817,905.89	2,641.84	
				T5	CAMA BAJA	VJ	0.01000	2,000,000.00	20,000.00	
				INS36	DISTANCIADOR	UND	3.00000	394.56	1,183.68	
				INS950	NUDO DE PERRO HIERRO	UND	1.70000	20,000.00	34,000.00	
				INS38	PILOTEADORA TIPO KELLY DIAM=0,50 M	M	1.00000	126,310.10	126,310.10	
				INS39	POLÍMERO DE CONTENCIÓN O BENTONITA	LT	0.74001	7,070.04	5,231.90	
2.03.03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-3 L=30m D=0.7m - f'c=24.5MPa	240.0	m							446,206.20
				INS37	CONCRETO TREMIE DE 3500 PSI	m3	0.42333	581,982.71	246,371.09	10.00%
				EM6	HERRAMIENTA BÁSICA ALBAÑILERÍA AAA	%	0.00323	817,905.89	2,642.00	
				T5	CAMA BAJA	VJ	0.01000	2,000,000.00	20,000.00	
				INS950	NUDO DE PERRO HIERRO	UND	1.70000	20,000.00	34,000.00	
				INS36	DISTANCIADOR	UND	3.00000	394.56	1,183.68	
				EM21	PILOTEADORA TIPO KELLY DIAM=0,70 M	M	1.00000	131,784.36	131,784.36	
				INS39	POLÍMERO DE CONTENCIÓN O BENTONITA	LT	1.44654	7,070.04	10,227.07	
2.03.04	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN Y Fundida PILOTE TIPO KELLY PLT-4 L=32m D=0.5m - f'c=24.5MPa	288.0	m							315,067.05
				INS37	CONCRETO TREMIE DE 3500 PSI	m3	0.21599	581,982.71	125,699.54	10.00%
				EM6	HERRAMIENTA BÁSICA ALBAÑILERÍA AAA	%	0.00323	817,905.89	2,642.32	
				T5	CAMA BAJA	VJ	0.01000	2,000,000.00	20,000.00	
				INS36	DISTANCIADOR	UND	3.00000	394.56	1,183.68	
				INS950	NUDO DE PERRO HIERRO	UND	1.70000	20,000.00	34,000.00	
				INS38	PILOTEADORA TIPO KELLY DIAM=0,50 M	M	1.00000	126,310.10	126,310.10	

PLT 21

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FECHA:
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	27/01/2026 **REMISIÓN:** 42265 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 43.50 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27772.	KNM136	Willinton Lopez Gonzalez	Pilote 21

HORARIOS					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
713	820				

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
Cargo: C.C 17.345.403
Firma y CC: COOR. PRODUCCION
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Santiago Rueda
Cargo: Residente Obras
Firma y CC: 1032498257
Responsable de Obra (recepción del producto)

PLT 21

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FECHA:
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	27/01/2026 **REMISIÓN:** 42269 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 43.50 M3.

Planta 21

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27776	KNM138	Nelson Giovanny Arguello	

HORARIOS					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
9:21	10:19				

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
Cargo: C.C 17.315.403
Firma y CC: COOR PRODUCCION
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Santiago Rueda
Cargo: Residente Obra
Firma y CC: 1032409857
Responsable de Obra (recepción del producto)

2 PLT 3
1 PLT 14
1 PLT 11

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 26/01/2026 **REMISIÓN:** 42260 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	4,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 42.25 M3 DE SU ORDEN POR 42.25 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27767	WPS898	Arley Ancizar Antonio Ramos	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
4:01	5:20	5:35	5:39		

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Fabián Palacio
Cargo: Coordinador de Producción
Firma y CC: CC No. 1.121.913.025
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Florez
Cargo: Residente Obra
Firma y CC:
Responsable de Obra (recepción del producto)
1015[illegible]72

OK

P11

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 26/01/2026 **REMISIÓN:** 42248 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 37.50 M3 DE SU ORDEN POR 37.50 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27755	KSK423	Duvier Gonzalo Rojas Cubides	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
12:23	12:53	13:15	13:35		

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
Cargo: ~~C.C 17.345.403~~ COOR. PRODUCCION
Firma y CC:
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Moreno R
Cargo: Residente Ob
Firma y CC:
Responsable de Obra (recepción del producto)
1015469497

P11

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FECHA:
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	26/01/2026 **REMISIÓN:** 42245 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	7,25

ESTE DESPACHO TOTALIZA 30.25 M3 DE SU ORDEN POR 37.50 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27252	GKV844	Ivan Lopez Correa	

HORARIOS					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
	13:15	14:40	14:54		

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
Cargo: C.C 17.345.403
Firma y CC: COOR. PRODUCCION
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Forero R
Cargo: Residente Obra
Firma y CC:
Responsable de Obra (recepción del producto)
1015469942

OK

P14

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 26/01/2026 **REMISIÓN:** 42243 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 22.25 M3 DE SU ORDEN POR 36.75 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27750	KSK564	Juan Felipe Murillo Marmolejo	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
	11:12	11:50	12:00		

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
C.C 17.345.403
Cargo: COOR. PRODUCCION
Firma y CC:

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Moreno
Cargo: Residente Obra
Firma y CC:

Responsable de Obra (recepción del producto)
10 1546197

OK

P3

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 26/01/2026 **REMISIÓN:** 42242 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	7,25

ESTE DESPACHO TOTALIZA 15.25 M3 DE SU ORDEN POR 37.00 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27749	KNM138	Nelson Giovanny Arguello	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
9:32	10:10	10:20	10:50		

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
Cargo: CC 17.345.303
Firma y CC: COOR PRODUCCION
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Lorenz
Cargo: Residente
Firma y CC:
Responsable de Obra (recepción del producto)
1015466427

O.K

P3

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 26/01/2026 **REMISIÓN:** 42237 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	7,75

ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.25 M3 DE SU ORDEN POR 36.25 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27742	TAU556	Jorge Humberto Monsalve Estepa	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
07138	08:30	8:40	9:05		

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
Cargo: C.C 17.345.403
Firma y CC: COOR. PRODUCCION
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Herrera P
Cargo: Residente Obra
Firma y CC:
Responsable de Obra (recepción del producto)
1015469972

Ok

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	[redacted] 42271 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 30.00 M3 DE SU ORDEN POR 41.50 M3.

Planta 21

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27784	WOW123	Jonathan Steven Bolaños Linare	

HORARIOS					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
01 10	02 [illegible]				

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
C.C 17.345.403
Cargo: COOR. PRODUCCION
Firma y CC:

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Santiago Rueda C.C
Cargo: Residente Obra
Firma y CC: 1032400857

Responsable de Obra (recepción del producto)

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 27/01/2026 **REMISIÓN:** 42273 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	6,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 24.00 M3 DE SU ORDEN POR 43.50 M3.

Nota 21

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
22781	WCU308	Juan Manuel Riaño	

HORARIOS					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
10:53	11:45				

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
C.C 1.345.403
Cargo: COOR PRODUCCION
Firma y CC:

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Santiago Rueda Gomez
Cargo: Residente Obra
Firma y CC: 1032408257

Responsable de Obra (recepción del producto)

P44

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 28/01/2026 **REMISIÓN:** 42302 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 51.25 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27805	KSK423	Duvier Gonzalo Rojas Cubides	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
7:10	8:00				

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
Cargo: C.C 17.345.103
Firma y CC: COOR. PRODUCCION
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Santiago Rueda Gomez
Cargo: Residente Obra
Firma y CC: 1032408857
Responsable de Obra (recepción del producto)

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 28/01/2026 **REMISIÓN:** 42305 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 15.00 M3 DE SU ORDEN POR 52.25 M3.

Pilote 36

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27808	KNM138	Nelson Giovanny Arguello	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
8:06	9:05	9:58	10:18	10:30	

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
Cargo: C.C 17.345.403
Firma y CC: COOR. PRODUCCION

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Santiago Rueda
Cargo: Residente Admon
Firma y CC: 1032460257

Responsable de Obra (recepción del producto)

OK

FAC. FE6408

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FECHA:
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	28/01/2026 **REMISIÓN:** 42312 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 32.00 M3 DE SU ORDEN POR 53.75 M3.

Pilote 36

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27813	KSK564	Juan Felipe Murillo Marmolejo	fluidez 66cm

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
11:25	11:45	11:46			

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: ~~Javier Quiroz Bareño~~
Cargo: ~~C.C 17.345.403~~
Firma y CC: ~~COOR. PRODUCCION~~
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Santiago Rueda
Cargo: Residente Admon
Firma y CC: 1032400854
Responsable de Obra (recepción del producto)

P18

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 29/01/2026 **REMISIÓN:** 42341 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 51.25 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27842	KNM136	Jhon Alexander Hernández Agude	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
11:45	12:33P	13:00	13:20	13:30	

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
Cargo: C.C 17.345.403
Firma y CC: COOR. PRODUCCION

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Cabrera
Cargo: Residente
Firma y CC:

Responsable de Obra (recepción del producto)

1015469972 C.

2/2/26, 12:00 p.m. PET 167

REMISIÓN 42454

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FECHA:
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	2/02/2026 **REMISIÓN:** 42454 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 24.00 M3 DE SU ORDEN POR 35.00 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27958	KSK570	Roberth Achury Florez	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
C.C 17.346.403
Cargo: COOR. PRODUCCION
Firma y CC:

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Moreno R
Cargo: Residente Obra
Firma y CC:
1015466942

Responsable de Obra (recepción del producto)

 P2

REMISIÓN 42443

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 2/02/2026 **REMISIÓN:** 42443 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 33.00 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
21947	KSK570	Roberth Achury Florez	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
	9:40	10:00	10:30		

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre:
Cargo:
Firma y CC:
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Santiago Rueda
Cargo: Residente Administrativo
Firma y CC: 1032490857
Responsable de Obra (recepción del producto)

2/2/26, 9:02 a.m.

P4

REMISIÓN 42448

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FECHA:
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	2/02/2026 **REMISIÓN:** 42448 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 16.00 M3 DE SU ORDEN POR 34.00 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27952	GKV854	Jhonatan Lopez Cañaveral	

HORARIOS					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
09:55	10:44	11:31			

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre:
Cargo:
Firma y CC:

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Moreno R
Cargo: Residente Obra
Firma y CC:

Responsable de Obra (recepción del producto)

1018460972

P2 - P4 - P16
05 05 55

REMISIÓN 42463

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FECHA:
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	2/02/2026 **REMISIÓN:** 42463 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	1,50

ESTE DESPACHO TOTALIZA 25.50 M3 DE SU ORDEN POR 25.50 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27969	WCU308	Cesar Rocha	

HORARIOS					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Javier Quiroz Bareño
Cargo: C.C 17.345.403
Firma y CC: COOR. PRODUCCION

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Rosero R
Cargo: Residente Obra
Firma y CC: 1015469972

Responsable de Obra (recepción del producto)

3/2/26, 7:08 a.m. PLT 1

REMISIÓN 42480

Fac# FE26487

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 3/02/2026 **REMISIÓN:** 42480 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	8,00

ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 33.00 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
21981	KNM136	Willinton Lopez Gonzalez	

HORARIOS					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
7.54	9.04		9.46		

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre:
Cargo: anad arcno
Firma y CC:
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Moreno
Cargo: Residente Obra
Firma y CC:
Responsable de Obra (recepción del producto)
1015446497

3/2/26, 9:15 a.m. PLT 1 - 2,5 PLT 15 - 2

REMISIÓN 42486

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 3/02/2026 **REMISIÓN:** 42486 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	4,50

ESTE DESPACHO TOTALIZA 12.50 M3 DE SU ORDEN POR 30.50 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
21987	GKV854	Jhonatan Lopez Cañaveral	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Jonud Jaime
Cargo:
Firma y CC:
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Moreno R
Cargo: Residente Obra
Firma y CC:
Responsable de Obra (recepción del producto)
1015484 Cedula

3/2/26, 9:53 a.m. PLT 15

REMISIÓN 42487

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE: CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	**FECHA:** 3/02/2026 **REMISIÓN:** 42487 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	5,00 ✓

ESTE DESPACHO TOTALIZA 17.00 M3 DE SU ORDEN POR 28.00 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27a88	KSK564	Juan Felipe Murillo Marmolejo	

HORARIOS

Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
			13:00		

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre:
Cargo:
Firma y CC:

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Alonso R
Cargo: Residente Obra
Firma y CC:

Responsable de Obra (recepción del producto)
1015446972

3/2/26, 11:42 a.m.

PLT 15 ; PLT 9
2.00 3

REMISIÓN 42492

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FECHA:
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	3/02/2026 **REMISIÓN:** 42492 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	5,25

ESTE DESPACHO TOTALIZA 22.75 M3 DE SU ORDEN POR 26.75 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
27093	TAW602	Jhon Alexander Hernández Agude	

HORA					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
12:12p	12:57p				

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre:
Cargo:
Firma y CC:
Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Moreno
Cargo: Residente Obra
Firma y CC:
Responsable de Obra (recepción del producto)
1015604942

3/2/26, 11:56 a.m. PLT 9

REMISIÓN 42493

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FECHA:
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	3/02/2026 **REMISIÓN:** 42493 **PLANTA:** Puente Aranda **CIUDAD:** Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	5,25

ESTE DESPACHO TOTALIZA 28.00 M3 DE SU ORDEN POR 28.00 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
21004	KNM138	Roberth Achury Florez	

HORARIOS					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Jairo Jaramillo

Cargo:

Firma y CC:

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Hugo Moreno R

Cargo: Residente Obra

Firma y CC: 1015466472

Responsable de Obra (recepción del producto)

OK.

REMISIÓN 42519

CONCREMACK

NIT 900.558.342-4

Plote 44

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FECHA:
CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG CRA 55 # 152 B - 68 OF 1503 Bogotá D.C., Bogotá 6017189431	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL Avenida Cra 14b # 146 - 05 Bogotá D.C., Bogotá ING. SANTIAGO RUEDA, 3152942538	4/02/2026 REMISIÓN: 42519 PLANTA: Puente Aranda CIUDAD: Bogotá D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD M3
PTF-245-28-650±25-G13-2,6	PTF-245-28-650±25-G13-2,6 (Tremie Tornillo Continuo 245,00 kg/cm² 28 Dias 13mm 650 mm)	4,25

ESTE DESPACHO TOTALIZA 4.25 M3 DE SU ORDEN POR 32.50 M3.

SELLO SEGURIDAD	PLACA	CONDUCTOR RESPONSABLE	OBSERVACIONES
28319	KSK570	Juan Manuel Riaño	- Asentamiento 90 cm

HORARIOS					
Salida planta	Llega obra	Inicio descarga	Fin descarga	Salida obra	Llegada planta
7:10	8:02		8:50		

Importante: 1. El criterio para la aceptación o rechazo del concreto en obra será el asentamiento, el cual debe medirse según lo establecido en la norma NTC 396 (ASTM C143) y dentro de los parámetros definidos en la ficha técnica del producto; este ensayo deberá realizarse en un tiempo máximo de 15 minutos después de la llegada del vehículo a la obra. 2. Cualquier manipulación del concreto, como la adición de agua, fibras, aditivos u otros componentes, exime a CONCREMACK S.A.S. de toda responsabilidad por la calidad, resistencia o desempeño del producto. 3. Si el concreto no cumple con el asentamiento estipulado y el cliente decide usarlo, lo hará bajo su propia responsabilidad. 4. El tiempo máximo para la descarga del concreto será de 1 hora para concretos normales y de 45 minutos para concretos acelerados. 5. El cliente debe garantizar condiciones seguras de acceso hasta el punto de descargue, brindando vías en buen estado para tránsito pesado y libres de obstáculos; los conductores de CONCREMACK están autorizados para evaluar la ruta y podrán decidir no ingresar si consideran que existe riesgo, en cuyo caso el pedido será facturado, incluyendo el costo de disposición final del concreto. 6. El cliente es responsable de proporcionar auxiliares viales para la orientación y seguridad de los equipos durante su ingreso a la obra, así como de garantizar la seguridad en el traslado de los equipos desde planta. 7. Debe disponer un área adecuada para el lavado de canales del mixer y/o bomba, y cuando solicite servicio de bombeo debe tener lista la mezcla de purga. 8. La programación anticipada de los pedidos garantiza un mejor servicio; si el cliente requiere cancelar, debe hacerlo con mínimo 3 horas de anticipación. 9. La firma del presente comprobante valida y prueba la satisfacción y conformidad con el producto entregado (especificación, cantidad solicitada), siendo obligatorio que este sea firmado por la persona responsable de recibir el concreto en obra. 10. CONCREMACK S.A.S. se encuentra inscrito como proveedor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número de registro 20222351509181, habilitado para el suministro de concretos en obras públicas de Bogotá.

Nombre: Juan Jairo

Cargo:

Firma y CC:

Coordinador de Produccion Concremack

Nombre: Santiago Rueda

Cargo: Ing. Admin

Firma y CC: 1032498757

Responsable de Obra (recepción del producto)
