
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**PROYECTO PARQUES TEUSAQUILLO**	**129 días**	**jue 15/01/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 960,000,000.02**
2		**INICIO**	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0.00
3		**I. ETAPA ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO**	**18 días**	**jue 22/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 0.00**
12		**II. ETAPA PROGRAMA DE INTERVENCIONES**	**14 días**	**sáb 7/02/26**	**lun 23/02/26**		**$ 0.00**
14		**III. ETAPA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN**	**89 días**	**mar 3/03/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 960,000,000.02**
15		**URBANIZACIÓN SAN LUIS COD. 13-003**	**56 días**	**mar 31/03/26**	**mié 3/06/26**		**$ 131,307,086.70**
44		**PARQUE ALFONSO LOPEZ COD: 13-013**	**65 días**	**mar 3/03/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 78,291,728.60**
45		**TRAMITES ANTE IDPC**	**45 días**	**mar 3/03/26**	**jue 23/04/26**		**$ 0.00**
46		ELABORACION Y PRESENTACION DOCUMENTOS	15 días	mar 3/03/26	jue 19/03/26	6FC+20 día	$ 0.00
47		REVISION Y APROBACION PERMISOS IDPC	30 días	vie 20/03/26	jue 23/04/26	46	$ 0.00
48		**PRELIMINARES**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**lun 27/04/26**		**$ 7,206,932.59**
49		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	2 días	vie 24/04/26	sáb 25/04/26	47	$ 4,658,193.79
50		Localización y Replanteo	1 día	lun 27/04/26	lun 27/04/26	49	$ 2,548,738.80
51		**MOBILIARIO**	**15 días**	**mié 29/04/26**	**vie 15/05/26**		**$ 9,641,475.90**
52		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	10 días	mar 5/05/26	vie 15/05/26	57	$ 4,509,811.30
53		Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	2 días	jue 14/05/26	vie 15/05/26	52FF	$ 1,787,073.03
54		Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	5 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	60CC	$ 3,344,591.57
55		**ITEMS NO PREVISTOS**	**17 días**	**mar 28/04/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 61,443,320.11**
56		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	10 días	mié 6/05/26	sáb 16/05/26	62	$ 28,624,944.93
57		Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	3 días	vie 1/05/26	mar 5/05/26	66CF	$ 2,079,315.38
58		DesmonteCorte y reinstal.adoquin+arena+B-600(15cm)	3 días	mié 29/04/26	vie 1/05/26	63	$ 1,388,298.39
59		Pintura Modulo M-5 Columpio **	5 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	63	$ 965,695.63
60		PINTURA MODULO M-3A	5 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	59CC	$ 1,127,648.68
61		RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	5 días	mar 5/05/26	sáb 9/05/26	60	$ 3,455,043.47
62		Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	1 día	mar 5/05/26	mar 5/05/26	54	$ 142,170.66
63		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	50	$ 7,129,475.59
64		Pintura Baranda M-80 (2 manos)	5 días	mar 5/05/26	sáb 9/05/26	60	$ 405,730.22
65		ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	2 días	vie 8/05/26	sáb 9/05/26	61FF	$ 2,718,488.78
66		Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	10 días	mar 5/05/26	vie 15/05/26	67	$ 601,623.54
67		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	5 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	63	$ 12,804,884.84
68		**PARQUE SANTA CLARA COD.13-015**	**67 días**	**mié 25/03/26**	**mié 10/06/26**		**$ 167,110,749.37**
98		**URBANIZACION QUINTA PAREDES EL POTRERO COD. 13-018**	**38 días**	**lun 16/03/26**	**mar 28/04/26**		**$ 191,585,603.81**
118		**URBANIZACIÓN LA MAGDALENA COD. 13-034**	**84 días**	**lun 9/03/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 51,416,368.53**
136		**URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE COD. 13-066**	**64 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 165,119,788.30**
163		**FUTURA COD. 13-149**	**37 días**	**mar 17/03/26**	**mar 28/04/26**		**$ 175,168,674.71**
185		**FIN PROYECTO**	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0.00

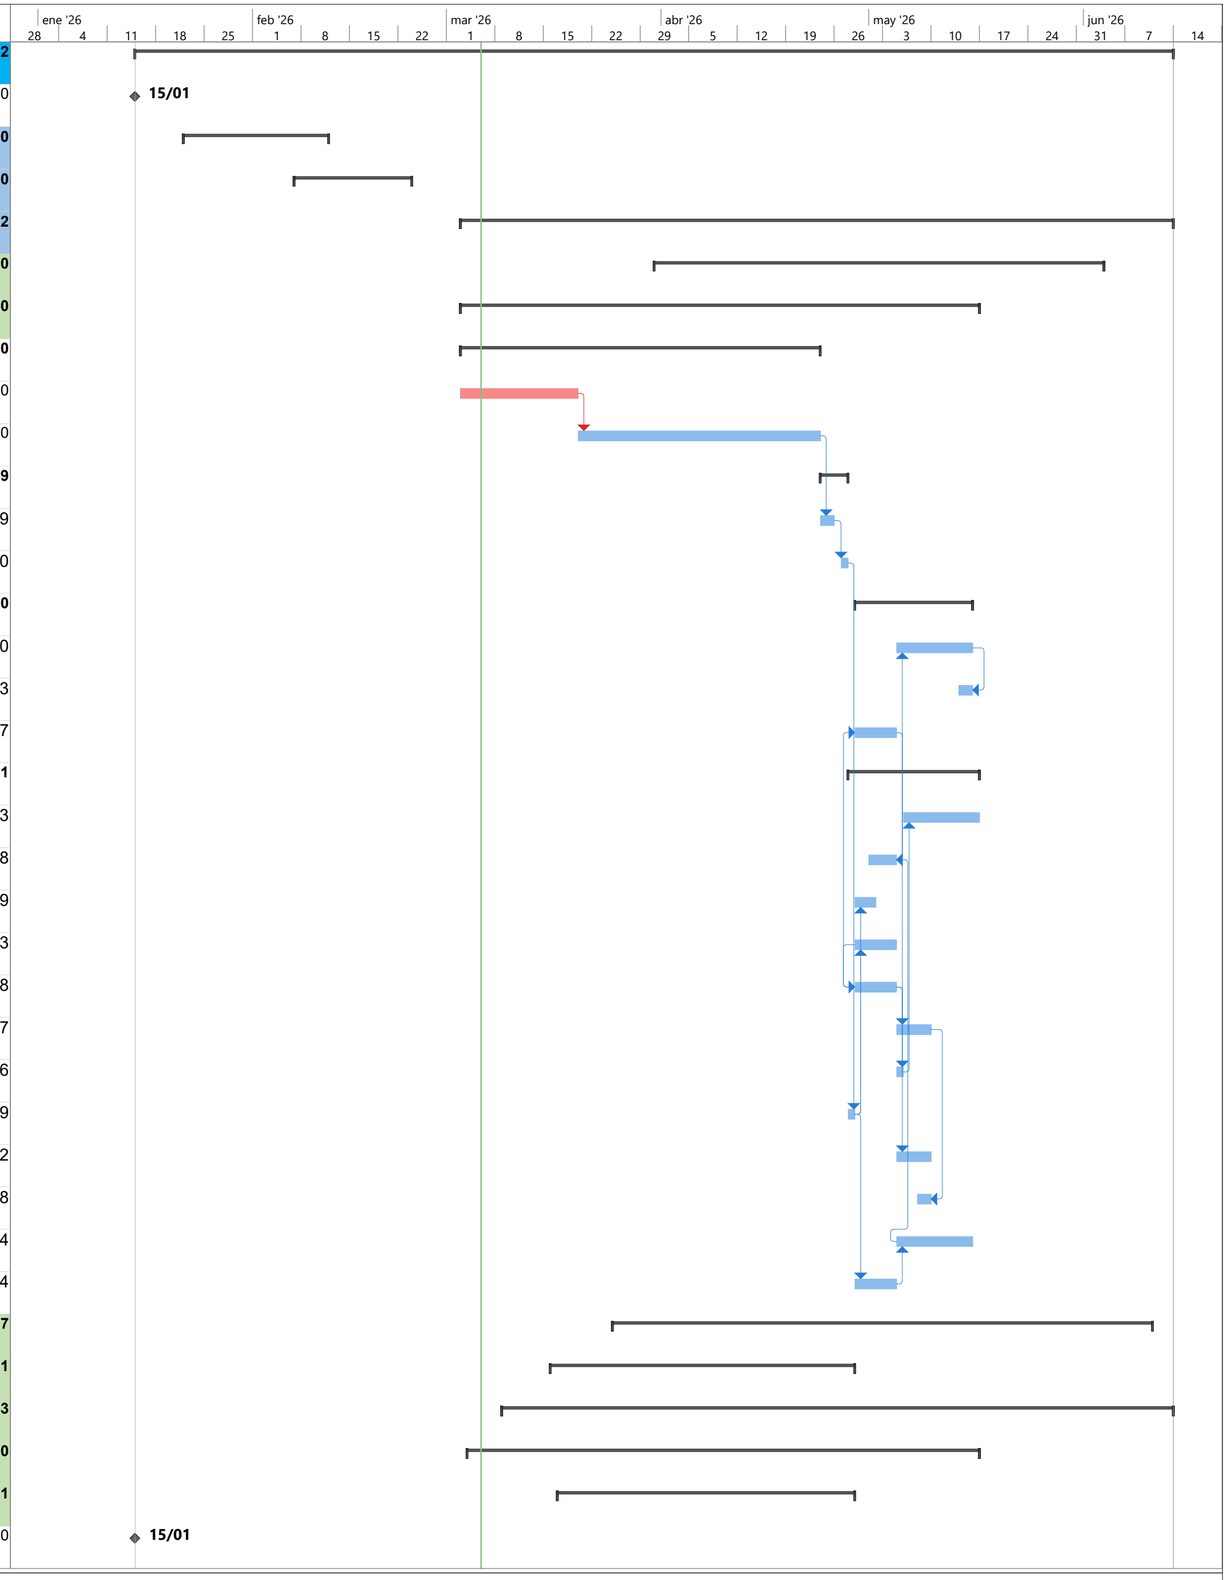

Proyecto: C:\Users\USUARIO\D
Fecha: vie 6/03/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Retrasada | Progreso manual
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | División crítica

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
