CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

Neiva, 26 de marzo de 2026

CONS-DIAG9-043

Señores
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
Ing. James Andrade Zambrano
Interventor
Neiva – Huila

REFERENCIA: Contrato de obra No. No. 1151 de 2024; objeto **"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Asunto: Acta final de obra

Mediante la presente, en calidad de Contratista de Obra, nos permitimos remitir los documentos para cobro de acta final, de acuerdo con los requisitos de la entidad contratante:

1. Acta final formato Word.
2. Acta final formato Excel.
3. Memorias de calculo
4. Factura
5. Registro Único Tributario
6. Resolución de facturación
7. Certificación bancaria
8. Informe de obra.
9. Informe de interventoría
10. Bitácora de obra.
11. Ensayos de laboratorio.
12. Seguridad social de personal y consorciados.
13. Copia contrato de Obra.
14. Registro presupuestal contrato
15. Registro presupuestal regalías
16. Acta de Inicio.
17. Pago de estampillas
18. Pólizas aprobadas
19. Informe PAGA.
20. Informe PMT.

21. Acta de justificación de imprevistos.
22. Documento consorcial
23. Certificados de calidad materiales
24. Formato de identificación tributaria
25. Certificado de parafiscales
26. Desglose de administración
27. Soporte de nominas
28. Actas de suspensión y reinicio 1
29. Otro sí 1
30. Pago de estampillas Otro sí 1
31. Actas de suspensión y reinicio 2
32. Otro sí 2
33. Pago de estampillas Otro sí 2
34. Registro presupuestal Otro sí 2
35. Registro presupuestal regalías Otro sí 2
36. Composición accionaria
37. Valla informativa del proyecto
38. Registro fotográfico
39. Actas cierre de vecindad
40. Acta conformación de veeduría
41. Acta cierre conformación de veeduría
42. Planos récords
43. Proyección acta de liquidación
44. Paz y salvo ministerio
45. Paz y salvo comfamiliar
46. Paz y salvo FIC
47. Manual de mantenimiento y operación
48. CD con información del proyecto
49. Certificaciones de Paz y Salvo expedido por la Personería de Campoalegre donde manifiesten que no hubo solicitudes de PQR o si las hubo se le dio respuesta oportuna y satisfactoria
50. Certificaciones de Cumplimiento Ambiental expedido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)
51. Paz y Salvo de la toma de agua para la construcción de la obra
52. Paz y Salvo Ambiental de los materiales de construcción utilizados en la ejecución de la obra

53. Paz y Salvo Materiales Pétreos
54. Paz y Salvo de contratación del personal de la zona para la ejecución de la obra, Expedido por el Presidente de la Junta de Acción Comunal
55. Cierre fiducia y rendimientos financieros
56. ORPAS
57. Póliza de estabilidad

Sin otro particular,

ARIEL SERRANO GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

Anexos: 709 Folios en 03 Tomos

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

ACTA WORD

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X____ PARCIAL: ____ No.:___**				
_x_ CONTRATO DE: **___ CONVENIO DE:**	**OBRA**	**Nº:**	**1151**	**AÑO:**	**2024**

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024		
	NIT O CC:	901.854.721 – 5		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 47 # 6-41 CASA 31	**TEL:**	3124958588
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	ARIEL SERRANO GONZALEZ		
	CC:	88.141.364		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 11,120 DE 2024 **FECHA:** 17/09/2024 **No.** 1,291 DE 2025 **FECHA:** 20/02/2025 **No.** 6,231 DE 2025 **FECHA:** 24/09/2025			
CUENTA BANCARIA	**No. 076-0000-9740 Banco. BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: AHORROS**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$1.682.623.926,28**			
	MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS, AIU Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUIDOS			

APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	NO APLICA		
	NO APLICA		
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$118.268.088,82	
VALOR TOTAL	$1.800.892.015,10		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	Dos (2) meses	
	Nº2	Un (1) mes	
	Nº3		
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	04 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	10/03/2025
		REINICIACIÒN	01/04/2025
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	04/06/2025
		REINICIACIÒN	01/09/2025
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__ MM__ AÑO__
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	21 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	08 DE ABRIL DE 2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JAMES ANDRADE ZAMBRANO
	EN CALIDAD DE:	RL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **INTERVENTORIA**
	NOMBRE:	ARIEL SERRANO GONZALEZ
	EN CALIDAD DE:	RL CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **CONTRATISTA DE OBRA**
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial contratado	16/09/2024		**$1.682.623.926,28**	**$1.682.623.926,28**
2. Acta parcial No. 1	24/04/2025	$ 688,189,148,37		$ 994,434,777.91
3. Acta parcial No. 2	22/08/2025	$ 699.279.054,59		$ 295,155,723.32
4. Valor adicional	19/09/2025		**$118.268.088,82**	$ 413.423.812,14
5. Acta parcial No. 3	21/10/2025	$ 232.946.999,41		$ 180.476.812,73
6. Acta final	08/04/2026	$ 169,097,942.77		$ 11,378,869.96
TOTAL		$ 1,789,513,145.14	**$ 1.800.892.015,10**	$ 11,378,869.96

7. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 35444649 y 35444832** del mes de **OCTUBRE DE 2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
OCTUBRE 2025 Planilla No. 35444649 $ 2.549.200	Salud	$343.400
	Pensión	$1.265.200
	ARL	$597.300
	CCF	$343.300

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
OCTUBRE 2025 Planilla No. 35444832 $594.800	Salud	$77.000
	Pensión	$307.200
	ARL	$133.700
	CCF	$76.900

Que los consorciados que hacen parte del **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024, ARIEL SERRANO GONZALEZ Y JCONSTRUCTORA SAS**, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 9497850754 y 35467527** del mes de **OCTUBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
OCTUBRE 2025 Planilla No. 9497850754 $1.760.000	Salud	$ 227.600
	Pensión	$ 291.300
	ARL	$9.600
	CCF	$ 0.00

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
OCTUBRE 2025 Planilla No. 35467527 $1.423.500	Salud	$57.000
	Pensión	$227.800
	ARL	$99.100
	CCF	$57.000

Que la empresa **OSCAR IVAN GUTIERREZ PALACIOS,** como apoyo a la mano de obra del **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024**, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 91349862** del mes de **OCTUBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
OCTUBRE 2025 Planilla No. 91349862 $ 202.400	Salud	$39.000
	Pensiórl	$91.200
	ARL	$39.900
	CCF	$22.800

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	N/A

8. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato se autorizó y desembolso el anticipo correspondiente al 30%, por el valor de **QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 504.787.177,88)**, por parte del Departamento del Huila.

3. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: Acta final de fecha del 08 de abril de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 al 21 de octubre del 2025 por un valor de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 169,097,942.77)** M/CTE, valor al que se amortizará **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 18,662,617.17) M/CTE** por concepto de anticipo, por lo tanto el valor neto a pagar es DE **CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 150,435,325.60) M/CTE.**

4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

ARIEL SERRANO GONZALEZ
RL CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
CONTRATISTA DE OBRA

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
RL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
INTERVENTORIA

Reviso: Hans Jairet Muñoz Aragón
Técnico Operativo SVI

Reviso:

Profesional universitario SVI
Supervisor del contrato de Interventoría No. 1416 de 2024

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

V°B°: Supervisora Contrato de interventoría 1416/2024
El visto bueno consagrado en la presente acta por parte de la supervisión de la interventoría corresponde a la revisión informativa y documentada en que el aprobante de la autorización de pago es la interventoría.

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

ACTA FINAL EXCEL

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA	Nº:	1151	AÑO:	2024			VALOR CONTRATO:	$ 1.682.623.926,28
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	FINAL	HOJA		DE			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO	PLAZO INICIAL	4 MESES	ADICIONAL	
INTERVENTORR:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA		21	10	2025	PLAZO ADICIONAL	3 MESES	118.268.088,82	
INICIACIÒN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA "					V.R. TOTAL	
04/dic/2024	Nº 1 / 10/mar/2024 / 01/abr/2024					PLAZO TOTAL	7 MESES	1.800.892.015,10	
	Nº 2 / 04/jun/2025 / 01/sep/2025								
	Nº 3 / DD/MM/AA / DD/MM/A								

			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES #3			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	
1.1 PRELIMINARES					$ 254.718.111,00			$ 224.030.573,55		$ 222.550.117,95		$ 1.222.236,60		$ 223.772.354,55	
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	5061	$ 5.738,20	$ 29.041.030,20		5.009,00	$ 28.742.643,80	4751,00	$ 27.262.188,20	213,00	$ 1.222.236,60	4964,00	$ 28.484.424,80	
1.1.2	DEMOLICION DE BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE)	ml	1360,00	$ 16.685,03	$ 22.691.640,80		926,00	$ 15.450.337,78	926,00	$ 15.450.337,78	0,00	$ 0,00	926,00	$ 15.450.337,78	
1.1.3	DEMOLICION DE ASFALTO HASTA UN ESPESOR DE 10 cm (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	m²	4760,00	$ 42.644,00	$ 202.985.440,00		4.165,00	$ 177.612.260,00	4165,00	$ 177.612.260,00	0,00	$ 0,00	4165,00	$ 177.612.260,00	
NP2	CORTE Y DEMOLICIÓN DE ANDENES	m²		$ 38.508,09			21,90	$ 843.327,17	21,90	$ 843.327,17	0,00	$ 0,00	21,90	$ 843.327,17	
NP3	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO	m³		$ 233.841,76			5,91	$ 1.382.004,80	5,91	$ 1.382.004,80	0,00	$ 0,00	5,91	$ 1.382.004,80	
1.2 SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS					$ 1.370.971.026,27			$ 1.515.358.344,77		$ 1.365.358.731,42		$ 138.888.962,39		$ 1.504.247.693,81	
1.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN HASTA 2m, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	m³	1.820	$ 32.958,85	$ 59.972.912,23		2.471,17	$ 81.446.921,35	2244,84	$ 73.987.344,83	217,63	$ 7.172.834,53	2462,47	$ 81.160.179,36	
1.2.2	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.)	m²	5.061	$ 6.000,00	$ 30.366.000,00		5.069,73	$ 30.418.380,00	4751,00	$ 28.506.000,00	273,73	$ 1.642.380,00	5024,73	$ 30.148.380,00	
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CON MATERIAL TRITURADO COMPACTADO A UNA DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN UN ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO (COMPRENDE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DEL MATERIAL) EN UN E=15 cm. NORMAS INVIAS VIGENTES	m²	759	$ 175.767,83	$ 133.434.148,14		1.184,79	$ 208.248.583,46	1115,04	$ 195.988.161,16	61,88	$ 10.876.513,32	1176,92	$ 206.864.674,48	
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 0,50X0,20X0,80 MTS, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	1.390	$ 82.556,81	$ 114.753.965,90		1.269,80	$ 104.830.637,34	1198,30	$ 98.927.825,42	71,50	$ 5.902.811,92	1269,80	$ 104.830.637,34	
1.2.5	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 45, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MAX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL (SEGUN DISEÑO)	m²	1.012	$ 1.020.000,00	$ 1.032.444.000,00		1.012,71	$ 1.032.964.200,00	948,97	$ 967.949.400,00	54,74	$ 55.834.800,00	1003,71	$ 1.023.784.200,00	
NP1	REALCE DE POZOS, INCLUYE RETIRO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA, Y REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA, CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI.	UND		$ 1.431.234,16			17,00	$ 24.330.980,72			17,00	$ 24.330.980,72	17,00	$ 24.330.980,72	
NP4	SUMINISRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KGF/CM2).	m³		$ 926.525,16			21,28	$ 19.716.455,40			21,28	$ 19.716.455,40	21,28	$ 19.716.455,40	

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 3
		Pagina 1 de 2

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA	Nº:	1151	AÑO:	2024					VALOR CONTRATO:	$ 1.682.623.926,28
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	FINAL	HOJA		DE		PLAZO INICIAL	4 MESES	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO						
INTERVENTORR:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA		21	10	2025			PLAZO ADICIONAL	3 MESES	118.268.088,82	
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA "							V.R. TOTAL	
04/dic/2024	Nº 1 / 10/mar/2024 / 01/abr/2024							PLAZO TOTAL	7 MESES	1.800.892.015,10	
	Nº 2 / 04/jun/2025 / 01/sep/2025										
	Nº 3 / DD/MM/AA / DD/MM/A										

							CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES #3		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL		
NP5	ACERO DE REFUERZO 4,200 KG/CM² (60,000 PSI) ESP,640-13 INV.	Kg		$ 9.389,00			1.428,50	$ 13.412.186,50			1.428,50	$ 13.412.186,50	1428,50	$ 13.412.186,50		
1.3	SEÑALIZACION				$ 22.486.355,63			$ 27.044.663,40		$ -		$ 27.044.663,40		$ 27.044.663,40		
1.3.1	SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 3 (0,60M X 0,60M)	und	8,00	$ 447.802,64	$ 3.582.421,12		9,00	$ 4.030.223,76			9,00	$ 4.030.223,76	9,00	$ 4.030.223,76		
1.3.2	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	m²	29,40	$ 97.227,78	$ 2.858.496,73		88,18	$ 8.573.545,64			88,18	$ 8.573.545,64	88,18	$ 8.573.545,64		
1.3.3	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	ml	2169,00	$ 7.397,62	$ 16.045.437,78		1.952,10	$ 14.440.894,00			1.952,10	$ 14.440.894,00	1952,10	$ 14.440.894,00		
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 1.648.175.492,90			$ 1.766.443.581,73		$ 1.587.908.849,37		$ 167.155.862,39		$ 1.755.064.711,76		
PAGA					$ 15.944.348,38			$ 15.944.348,38		$ 15.044.348,00		$ 900.000,38		$ 15.944.348,38		
PMT					$ 18.504.085,00			$ 18.504.085,00		$ 17.462.005,00		$ 1.042.080,00		$ 18.504.085,00		
VALOR TOTAL					$ 1.682.623.926,28			$ 1.800.892.015,11		$ 1.620.415.202,37		$ 169.097.942,77		$ 1.789.513.145,14		

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.682.623.926,28
ADICIONAL 1	$ 118.268.088,82
ADICIONAL 2	
TOTAL	$ 1.800.892.015,11
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 688.189.148,37
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 699.279.054,59
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$ 232.946.999,41
VALOR ACTA PARCIAL No. 04	$ 169.097.942,77
SALDO POR EJECUTAR	$ 11.378.869,96
VALOR PRESENTE ACTA	$ 169.097.942,77
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 18.662.617,17
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	$ 150.435.325,60

ANTICIPO CONCEDIDO (30,00%)	$ 504.787.177,88

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 01	$ 206.456.744,51
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 02	$ 209.783.716,38
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 03	$ 69.884.099,82
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	$ 18.662.617,17
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	$ -

ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
Contratista

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
Interventor

Documento original firmado y controlado por calidad

	REVISÓ	ELABORÓ			APRÓBÓ
FIRMA					
NOMBRE					
CARGO					

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES
ACTA FINAL DE OBRA

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

	CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA	

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	MODIFICACION ☐		EJECUTADAS [X]
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	FINAL		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,1	1.1.1	m²	LOCALIZACION Y REPLANTEO

LOCALIZACION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE LA ABSISA 0 + 680 A LA 0 + 400	7,00		280,00			1960,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 400 A LA 0 + 340	6,85		60,00			411,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 340 A LA 0 + 000	7,00		340,00			2380,00
CARRERA 5 ENTRE EL PUENTE Y LA DIAGONAL 9	6,00		35,50			213,00
					TOTAL	4.964,00
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	4751,00
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	213,00

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA





NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA	GOBERNACIÓN DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	MODIFICACION		EJECUTADAS X
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	FINAL		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,2	1.2.1	m3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN HASTA 2m, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	Vol. (m3)	CANTIDAD	TOTAL
DIAGONAL 9NA ENTRE CARRERAS 9 Y 3 ESTE				1922,94		1922,94
CARRERA 5 ENTRE EL PUENTE Y DIAGONAL 9				59,29		59,29
FALLO EN LA ABSCISA K0 + 570 HASTA K0 + 590	3,50	0,30	20,00			21,00
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 650 HASTA K0 + 680 CALZADA DERECHA	3,40	0,30	30,00			30,60
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 670 HASTA K0 + 680 CALZARA IZQUIERDA	3,40	0,30	10,00			10,20
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 430 HASTA K0 + 400 CALZARA IZQUIERDA	3,40	0,30	30,00			30,60
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 430 HASTA K0 + 400 CALZARA DERECHA	3,40	0,30	25,00			25,50
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 400 HASTA K0 + 340 CALZARA IZQUIERDA	3,40	0,30	50,00			51,00
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 400 HASTA K0 + 340 CALZARA DERECHA	3,40	0,30	40,00			40,80
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 340 HASTA K0 + 200 CALZARA IZQUIERDA	3,40	0,30	70,00			71,40
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 340 HASTA K0 + 200 CALZARA DERECHA	3,40	0,30	99,50			101,49
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 200 HASTA K0 + 000 CALZARA IZQUIERDA	3,40	0,30	50,00			51,00
EXCAVACION DE SARDINELES	0,20	0,10	1269,80			25,40
SOBRE ANCHOS MARGEN DERECHA ABSCISA K0 + 000	6,94	0,35	3,38			8,22
SOBRE ANCHOS MARGEN IZQUIERDA ABSCISA K0 + 000	7,76	0,35	4,80			13,04
					TOTAL	2.462,47
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	2244,84
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	217,63

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE LAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA

Localizacion : DIAGONAL 9NA ENTRE CARRERAS 9 Y 3 ESTE

SIMBOLOGIA	
DC	DESPALME EN CORTE
DT	DESPALME EN TERRAPLEN
C	CORTE
T	TERRAPLEN
BH	BASE
CA	CARPETA

NOTA: Los conceptos que se incluirán en el cálculo de volúmenes aparecen subrayados. Se ha considerado el terreno ya despalmado al calcular áreas y volúmenes de corte y terraplén.

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA			10.000,00		AREAS								VOLUMENES							
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	T	BH	CA	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	DESPALME		C	T	BH	CA	RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT							DC	DT						
																			0+000,000	10.000,00
0+000,000	529,824	529,474	0,35	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	1,05	1,40										
0+010,000	529,984	529,602	0,38	0,00	0,00	0,00	2,80	0,03	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	37,31	0,15	10,50	14,00	0+010,000	10.037,16
0+020,000	530,098	529,731	0,37	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	38,08	0,13	10,50	14,00	0+020,000	10.075,11
0+030,000	530,224	529,860	0,36	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	39,42	0,03	10,50	14,00	0+030,000	10.114,51
0+040,000	530,339	529,989	0,35	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	40,30	0,02	10,50	14,00	0+040,000	10.154,78
0+050,000	530,500	530,157	0,34	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	39,57	0,02	10,50	14,00	0+050,000	10.194,33
0+060,000	530,644	530,373	0,27	0,00	0,00	0,00	2,48	0,01	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	34,92	0,05	10,50	14,00	0+060,000	10.229,19
0+070,000	530,851	530,637	0,21	0,00	0,00	0,00	1,90	0,03	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	28,46	0,17	10,50	14,00	0+070,000	10.257,48
0+080,000	531,290	530,949	0,34	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	30,79	0,15	10,50	14,00	0+080,000	10.288,12
0+090,000	531,710	531,309	0,40	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	40,08	0,03	10,50	14,00	0+090,000	10.328,18
0+100,000	532,151	531,716	0,44	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	46,71	0,02	10,50	14,00	0+100,000	10.374,87
0+110,000	532,607	532,172	0,44	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	48,88	0,00	10,50	14,00	0+110,000	10.423,75
0+120,000	533,037	532,675	0,36	0,00	0,00	0,00	2,99	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	33,25	0,06	10,50	14,00	0+120,000	10.456,95
0+130,000	533,403	533,090	0,31	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	29,27	0,06	10,50	14,00	0+130,000	10.486,15
0+140,000	533,776	533,471	0,30	0,00	0,00	0,00	2,69	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,79	0,06	10,50	14,00	0+140,000	10.513,88
0+150,000	534,173	533,851	0,32	0,00	0,00	0,00	2,60	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,45	0,17	10,50	14,00	0+150,000	10.540,16
0+160,000	534,587	534,232	0,35	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,96	0,13	10,50	14,00	0+160,000	10.567,99
0+170,000	534,950	534,616	0,33	0,00	0,00	0,00	2,61	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,01	0,07	10,50	14,00	0+170,000	10.595,93
0+180,000	535,339	535,001	0,34	0,00	0,00	0,00	2,90	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,54	0,09	10,50	14,00	0+180,000	10.623,38
0+190,000	535,726	535,376	0,35	0,00	0,00	0,00	2,79	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,43	0,14	10,50	14,00	0+190,000	10.651,67
0+200,000	536,126	535,735	0,39	0,00	0,00	0,00	2,95	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,72	0,20	10,50	14,00	0+200,000	10.680,19
0+210,000	536,442	536,095	0,35	0,00	0,00	0,00	2,54	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,47	0,20	10,50	14,00	0+210,000	10.707,45
0+220,000	536,797	536,464	0,33	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,94	0,10	10,50	14,00	0+220,000	10.735,30
0+230,000	537,216	536,842	0,37	0,00	0,00	0,00	3,06	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	30,54	0,04	10,50	14,00	0+230,000	10.765,80
0+240,000	537,590	537,220	0,37	0,00	0,00	0,00	2,84	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	29,51	0,06	10,50	14,00	0+240,000	10.795,24
0+250,000	537,865	537,559	0,31	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,83	0,05	10,50	14,00	0+250,000	10.823,03
0+260,000	538,094	537,823	0,27	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	25,88	0,03	10,50	14,00	0+260,000	10.848,88
0+270,000	538,360	538,087	0,27	0,00	0,00	0,00	2,61	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	25,31	0,05	10,50	14,00	0+270,000	10.874,14
0+280,000	538,661	538,351	0,31	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,22	0,03	10,50	14,00	0+280,000	10.900,32
0+290,000	538,931	538,657	0,27	0,00	0,00	0,00	2,36	0,06	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	24,98	0,31	10,50	14,00	0+290,000	10.924,99
0+300,000	539,285	539,011	0,27	0,00	0,00	0,00	2,23	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	22,94	0,42	10,50	14,00	0+300,000	10.947,52
0+310,000	539,662	539,366	0,30	0,00	0,00	0,00	2,45	0,03	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	23,40	0,27	10,50	14,00	0+310,000	10.970,64
0+320,000	540,048	539,721	0,33	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	25,59	0,19	10,50	14,00	0+320,000	10.996,04
0+330,000	540,446	540,075	0,37	0,00	0,00	0,00	2,99	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,31	0,06	10,50	14,00	0+330,000	11.024,30
0+340,000	540,687	540,343	0,34	0,00	0,00	0,00	2,80	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,97	0,09	10,50	14,00	0+340,000	11.053,19
0+350,000	540,948	540,596	0,35	0,00	0,00	0,00	2,76	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,83	0,11	10,50	14,00	0+350,000	11.080,90
0+360,000	541,160	540,848	0,31	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,95	0,07	10,50	14,00	0+360,000	11.107,78
0+370,000	541,396	541,101	0,30	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,41	0,02	10,50	14,00	0+370,000	11.134,18
0+380,000	541,681	541,354	0,33	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,74	0,03	10,50	14,00	0+380,000	11.161,89
0+390,000	541,937	541,607	0,33	0,00	0,00	0,00	2,75	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,20	0,12	10,50	14,00	0+390,000	11.189,97
0+400,000	542,200	541,859	0,34	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,89	0,11	10,50	14,00	0+400,000	11.218,75
0+410,000	542,414	542,061	0,35	0,00	0,00	0,00	2,81	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	29,22	0,05	10,50	14,00	0+410,000	11.247,92
0+420,000	542,609	542,230	0,38	0,00	0,00	0,00	2,96	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,87	0,09	10,50	14,00	0+420,000	11.276,70
0+430,000	542,892	542,542	0,35	0,00	0,00	0,00	2,39	0,04	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,75	0,24	10,50	14,00	0+430,000	11.303,21
0+440,000	543,299	542,936	0,36	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	29,29	0,20	10,50	14,00	0+440,000	11.332,30
0+450,000	543,763	543,412	0,35	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	31,48	0,01	10,50	14,00	0+450,000	11.363,77
0+460,000	544,238	543,928	0,31	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,88	0,02	10,50	14,00	0+460,000	11.390,63
0+470,000	544,796	544,409	0,39	0,00	0,00	0,00	2,99	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,69	0,05	10,50	14,00	0+470,000	11.418,27
0+480,000	545,272	544,848	0,42	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	31,70	0,04	10,50	14,00	0+480,000	11.449,93
0+490,000	545,696	545,287	0,41	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	33,32	0,01	10,50	14,00	0+490,000	11.483,24
0+500,000	546,100	545,726	0,37	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	32,95	0,00	10,50	14,00	0+500,000	11.516,18
0+510,000	546,490	546,144	0,35	0,00	0,00	0,00	2,79	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	30,32	0,04	10,50	14,00	0+510,000	11.546,46

0+520,000	546,854	546,479	0,38	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,74	0,06	10,50	14,00	0+520,000	11.575,14
0+530,000	547,178	546,813	0,36	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	30,25	0,02	10,50	14,00	0+530,000	11.605,36
0+540,000	547,469	547,148	0,32	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	30,84	0,02	10,50	14,00	0+540,000	11.636,18
0+550,000	547,803	547,450	0,35	0,00	0,00	0,00	2,80	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	29,41	0,09	10,50	14,00	0+550,000	11.665,49
0+560,000	548,023	547,663	0,36	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,43	0,10	10,50	14,00	0+560,000	11.693,82
0+570,000	548,204	547,922	0,28	0,00	0,00	0,00	2,32	0,03	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,00	0,17	10,50	14,00	0+570,000	11.719,65
0+580,000	548,484	548,283	0,20	0,00	0,00	0,00	1,79	0,05	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	20,53	0,40	10,50	14,00	0+580,000	11.739,79
0+590,000	548,872	548,688	0,18	0,00	0,00	0,00	1,62	0,09	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	17,06	0,69	10,50	14,00	0+590,000	11.756,16
0+600,000	549,256	549,137	0,12	0,00	0,00	0,00	1,06	0,11	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	13,40	0,97	10,50	14,00	0+600,000	11.768,59
0+610,000	549,687	549,629	0,06	0,00	0,00	0,00	0,75	0,12	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	9,04	1,12	10,50	14,00	0+610,000	11.776,51
0+620,000	550,248	550,166	0,08	0,00	0,00	0,00	0,97	0,06	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	8,63	0,86	10,50	14,00	0+620,000	11.784,28
0+630,000	550,909	550,746	0,16	0,00	0,00	0,00	1,36	0,05	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	11,68	0,51	10,50	14,00	0+630,000	11.795,45
0+640,000	551,698	551,341	0,36	0,00	0,00	0,00	2,66	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	20,09	0,32	10,50	14,00	0+640,000	11.815,22
0+650,000	552,107	551,778	0,33	0,00	0,00	0,00	2,59	0,04	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,23	0,27	10,50	14,00	0+650,000	11.841,19
0+660,000	552,416	552,216	0,20	0,00	0,00	0,00	1,97	0,03	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	22,80	0,35	10,50	14,00	0+660,000	11.863,63
0+670,000	552,931	552,653	0,28	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	22,48	0,17	10,50	14,00	0+670,000	11.885,94
0+680,000	553,452	553,091	0,36	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,98	1,31	1,00	5,00	0,00	0,00	26,03	0,02	10,16	13,55	0+680,000	11.911,95
												Total			1922,94	11,00	713,66	951,55		

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

SIMBOLOGIA	
DC	DESPALME EN CORTE
DT	DESPALME EN TERRAPLEN
C	CORTE
T	TERRAPLEN
BH	BASE
CA	CARPETA

NOTA: Los conceptos que se incluirán en el cálculo de volúmenes aparecen subrayados. Se ha considerado el terreno ya despalmado al calcular áreas y volúmenes de corte y terraplén.

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA			10.000,00		AREAS								VOLUMENES							
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	T	BH	CA	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	DESPALME		C	T	BH	CA	RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT							DC	DT						
																			0+000,000	10.000,00
0+000,000	540,460	540,140	0,32	0,00	0,00	0,00	2,17	0,03	0,90	1,20										
0+005,000	540,459	540,259	0,20	0,00	0,00	0,00	1,55	0,03	0,90	1,20	1,00	2,50	0,00	0,00	9,28	0,15	4,50	6,00	0+005,000	10.009,12
0+010,000	540,512	540,378	0,13	0,00	0,00	0,00	1,39	0,04	0,90	1,20	1,20	2,50	0,00	0,00	8,82	0,18	4,50	6,00	0+010,000	10.017,76
0+015,000	540,702	540,497	0,21	0,00	0,00	0,00	1,47	0,05	0,90	1,20	1,00	2,50	0,00	0,00	7,17	0,22	4,50	6,00	0+015,000	10.024,71
0+020,000	540,805	540,616	0,19	0,00	0,00	0,00	1,44	0,06	0,90	1,20	1,20	2,50	0,00	0,00	8,75	0,29	4,50	6,00	0+020,000	10.033,18
0+025,000	540,921	540,735	0,19	0,00	0,00	0,00	1,42	0,08	0,90	1,20	1,00	2,50	0,00	0,00	7,17	0,36	4,50	6,00	0+025,000	10.039,99
0+030,000	541,025	540,854	0,17	0,00	0,00	0,00	1,44	0,06	0,90	1,20	1,20	2,50	0,00	0,00	8,60	0,35	4,50	6,00	0+030,000	10.048,25
0+035,000	541,291	540,973	0,32	0,00	0,00	0,00	2,35	0,01	0,90	1,20	1,00	2,50	0,00	0,00	9,49	0,19	4,50	6,00	0+035,000	10.057,56
												Total			59,29	1,92	36,00	48,00		

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA	GOBERNACIÓN DEL HUILA


MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS	X
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	FINAL		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO		
No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,2	1.2.2	m²	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE LA ABSISA 0 + 680 A LA 0 + 400	7,00		280,00			1960,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 400 A LA 0 + 340	6,85		60,00			411,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 340 A LA 0 + 000	7,00		340,00			2380,00
CARRERA 5 ENTRE EL PUENTE Y LA DIAGONAL 9	6,00		35,50			213,00
SOBRE ANCHOS MARGEN DERECHA ABSCISA K0 + 000	6,94		3,38			23,48
SOBRE ANCHOS MARGEN IZQUIERDA ABSCISA K0 + 000	7,76		4,80			37,25
					TOTAL	5.024,73
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	4751,00
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	273,73

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA

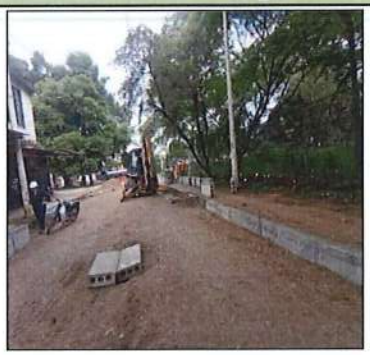



NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE CAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA	GOBERNACIÓN DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	MODIFICACION	☐	EJECUTADAS X
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	FINAL		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,2	1.2.3	m3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CON MATERIAL TRITURADO COMPACTADO A UNA DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN UN ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO (COMPRENDE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DEL MATERIAL) EN UN E=15 cm. NORMAS INVIAS VIGENTES

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE LA ABSISA 0 + 680 A LA 0 + 400	7,00	0,15	280,00			294,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 400 A LA 0 + 340	6,85	0,15	60,00			61,65
ENTRE LA ABSISA 0 + 340 A LA 0 + 000	7,00	0,15	340,00			357,00
CARRERA 5 ENTRE EL PUENTE Y LA DIAGONAL 9	7,00	0,15	35,50			37,28
SOBRE ANCHOS MARGEN DERECHA ABSCISA K0 + 000	6,94	0,15	3,38			3,52
SOBRE ANCHOS MARGEN IZQUIERDA ABSCISA K0 + 000	7,76	0,15	4,80			5,59
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 400 HASTA K0 + 340 CALZARA DERECHA	3,40	0,30	40,00			40,80
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 340 HASTA K0 + 200 CALZARA IZQUIERDA	3,40	0,30	70,00			71,40
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 340 HASTA K0 + 200 CALZARA DERECHA	3,40	0,30	99,50			101,49
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 200 HASTA K0 + 000 CALZARA IZQUIERDA	3,40	0,30	50,00			51,00
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 650 HASTA K0 + 680 CALZADA DERECHA	3,40	0,30	30,00			30,60
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 670 HASTA K0 + 680 CALZARA IZQUIERDA	3,40	0,30	10,00			10,20
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 430 HASTA K0 + 400 CALZARA IZQUIERDA	3,40	0,30	30,00			30,60
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 430 HASTA K0 + 400 CALZARA DERECHA	3,40	0,30	10,19			10,39
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 400 HASTA K0 + 340 CALZARA IZQUIERDA	3,40	0,30	70,00			71,40
					TOTAL	1.176,92
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	1115,04
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	61,88

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA**	GOBERNACIÓN DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	**MODIFICACION** ☐	**EJECUTADAS**	X
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**CONTRATO No. : 1151 - 2024**	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	FINAL		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,2	1.2.4	ml	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 0,50X0,20X0,80 MTS, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO

DESCRIPCION	DIMENSIONES						
		ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 4E Y 3E COSTADO DERECHO				39,10			39,10
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 4E Y 3E COSTADO IZQUIERDO				38,60			38,60
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 3E Y 2E COSTADO DERECHO				68,00			68,00
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 3E Y 2E COSTADO IZQUIERDO				68,40			68,40
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 2E Y 1 COSTADO DERECHO				10,60			10,60
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 COSTADO DERECHO				35,10			35,10
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 2E Y 2 COSTADO IZQUIERDO				49,20			49,20
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 COSTADO DERECHO				33,40			33,40
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 COSTADO IZQUIERDO				34,90			34,90
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 COSTADO DERECHO				39,70			39,70
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 COSTADO IZQUIERDO				41,30			41,30
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 COSTADO DERECHO				70,00			70,00
CARRERA 5 ENTRE EL PUENTE Y LA DIAGONAL 9 DERECHO				35,75			35,75
CARRERA 5 ENTRE EL PUENTE Y LA DIAGONAL 9 IZQUIERDO				35,75			35,75
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 5 Y 7 COSTADO DERECHO				30,00			30,00
				50,00			50,00
TRIÁNGULO SEPARADOR DE LA CARRERA 7				30,00			30,00
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 9 (RUTA 45) COSTADO				150,00			150,00
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 4 Y CARRERA 9 (RUTA 45) COSTADO IZQUIERDO				410,00			410,00
						TOTAL	**1.269,80**
						COBRADO ACTAS ANTERIORES	1198,30
						POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	**71,50**

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA	GOBERNACIÓN DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS	X
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	FINAL		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO		
No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,2	1.2.5	m3	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 45, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MAX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL (SEGUN DISEÑO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE LA ABSISA 0 + 680 A LA 0 + 400	7,00	0,20	280,00			392,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 400 A LA 0 + 340	6,85	0,20	60,00			82,20
ENTRE LA ABSISA 0 + 340 A LA 0 + 000	7,00	0,20	340,00			476,00
CARRERA 5 ENTRE EL PUENTE Y LA DIAGONAL 9	6,00	0,20	35,50			42,60
SOBRE ANCHOS MARGEN DERECHA ABSCISA K0 + 000	6,94	0,20	3,38			4,70
SOBRE ANCHOS MARGEN IZQUIERDA ABSCISA K0 + 000	7,76	0,20	4,80			7,45
DESCUENTO DE TAPA DE POZOS		0,20		0,36	-17,00	-1,23
					TOTAL	1.003,71
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	948,97
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	54,74

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

	CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA	

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS	X
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	FINAL		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO		
No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
NP1		UND	REALCE DE POZOS, INCLUYE RETIRO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA, Y REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA, CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI.

DESCRIPCION		DIMENSIONES					
			ANCHO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
Pozo 1, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+638.						1,00	1,00
Pozo 2, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+566.						1,00	1,00
Pozo 3, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+547.						1,00	1,00
Pozo 4, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+508.						1,00	1,00
Pozo 5, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+465.						1,00	1,00
Pozo 6, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+443.						1,00	1,00
Pozo 7, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+424.						1,00	1,00
Pozo 8, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+404.						1,00	1,00
Pozo 9, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+332.						1,00	1,00
Pozo 10, localizado en la carrera 5 sobre la abscisa 0+000.						1,00	1,00
Pozo11, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+285.						1,00	1,00
Pozo12, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+247.						1,00	1,00
Pozo13, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+215.						1,00	1,00
Pozo14, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+186.						1,00	1,00
Pozo15, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+160.						1,00	1,00
Pozo16, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+123.						1,00	1,00
Pozo17, localizado en la diagonal 9 sobre la abscisa 0+041.						1,00	1,00
						TOTAL	17,00
						COBRADO ACTAS ANTERIORES	
						POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	17,00

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA





NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA**	GOBERNACION DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	**MODIFICACION**	**EJECUTADAS**
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**CONTRATO No. : 1151 - 2024**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA
ACTA	FINAL	
FECHA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025	

CAMPOALEGRE

	0		
No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
NP4		m³	SUMINISRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F´C=210 KGF/CM2).

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ancho(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
Sardinel especial	0,15	0,85	10,00		1,00	1,28
Resamen de andenes (vacios entre nuevos sardineles y andenes existentes) nivelacion de andenes - costado derecho entre la abcisa450 a la 500	0,20	0,10	500,00		1,00	10,00
Resamen de andenes (vacios entre nuevos sardineles y andenes existentes) nivelacion de andenes - costado izquierdo entre la abcisa 450 a la 500	0,20	0,10	500,00		1,00	10,00
					TOTAL	**21,28**
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	**21,28**

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA**	GOBERNACIÓN DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	**MODIFICACION**	☐	**EJECUTADAS** ☒ x
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**CONTRATO No. : 1151 - 2024**	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	FINAL		
FECHA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
NP5		Kg	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV.

DESCRIPCION				DIMENSIONES					
					ANCHO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
No. 3 cada 0,15 m.	Tapa de las cajas de ACUEDCUTO	Transversal		1,40	0,56	9,00	4,00		28,22
		Longitudinal		1,40	0,56	9,00	4,00		28,22
No. 4 cada 0,20 m.	LOSAS IRREGULARES VER CARTILLA								1372,05
								TOTAL	**1.428,50**
								COBRADO ACTAS ANTERIORES	
								POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	**1.428,50**

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA " MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA- ACERO REFUERZO LOSAS IRREGULARES	Gobernación del Huila


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES :	MODIFICACIÓN :		EJECUTADAS	X
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE		CONTRATO DE OBRA No.	1151 DE 2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1416 DE 2024
ACTA	FINAL			

ACERO REFUERZO LOSAS IRREGULARES

CIUDADES		VIA ANCHO	VIA LONG.	POZOS EMPALMES	POZOS POZ	MATERAS	SUM	LOSAS REFORZAR	LOSAS ANCHO	LOSAS LONG	AREA LOSAS A REFORZAR	DESCUENTO AREA POZO	CUANTÍA DE ACERO (M2)	PESO POR LOSA IRREGULAR	DESCUENTO ACERO KG	PESO POR LOSA IRREGULAR
1	DIAGONAL 9	7,00	680,00	1	15,00		3	19	3,5	3,5	232,75	-25,35	5,96	1387,19	-151,09	1236,10
	CARRERA 5	7,00	35,75	1	1,00			2	3,5	3,5	24,5	-1,69	5,96	146,02	-10,07	135,95
TOTAL																1372,05
																1372



DETALLE EN PLANTA DE LOSAS IRREGULARES
ESCALA_____1:100

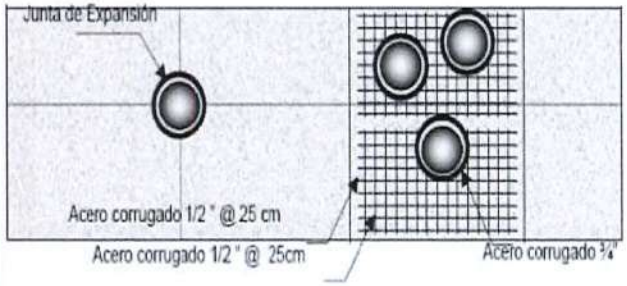

Detalle de las losas que requieren que sean reforzadas.

ARIEL SERRANO GONZALEZ
R.L. CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE
Contratista de Obra

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAU
Interventoría

12

	CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA	

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS ☒	
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE	
ACTA	FINAL		
FECHA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO		
No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1.3.1		und	SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 3

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
SEÑAL DE "PARE" EN ABSISA 0+010 SENTIDO ORIENTE-					1,00	1,00
SEÑAL DE "PARE" EN ABSISA 0+005 SOBRE CARRERA 5 SENTIDO					1,00	1,00
SEÑAL DE "PUENTE" EN ABSISA 0+035 SOBRE CARRERA 5					1,00	1,00
SEÑAL DE "ZONA ESCOLAR" EN ABSISA 0+360 SENTIDO ORIENTE-					1,00	1,00
SEÑAL DE "ZONA ESCOLAR" EN ABSISA 0+050 SENTIDO					1,00	1,00
SEÑAL DE "MAXIMA VELOCIDAD 30 KM/H" EN ABSISA 0+360					2,00	2,00
SEÑAL DE "MAXIMA VELOCIDAD 30 KM/H" EN ABSISA 0+050 SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE					2,00	2,00
					TOTAL	9,00
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	9,00

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA	GOBERNACIÓN DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS ☒	
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE	
ACTA	FINAL		
FECHA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO							
No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION					
1.3.3		ml	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO					
DESCRIPCION			DIMENSIONES					
				ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
DEMARCACION VIAL SOBRE LA CARRERA 9 LINEA CENTRAL						661,70		1,00	661,70
DEMARCACION VIAL SOBRE LA CARRERA 9 LINEA LATERAL						571,40		1,00	571,40
DEMARCACION VIAL SOBRE LA CARRERA 9 LINEA LATERAL						609,95		1,00	609,95
DEMARCACION VIAL SOBRE LA CALLE DE LA CARRERA 5						35,3		1,00	35,30
DEMARCACION VIAL SOBRE LA CALLE DE LA CARRERA 5						35,75		1,00	35,75
DEMARCACION VIAL SOBRE LA CALLE DE LA CARRERA 5						38		1,00	38,00
								TOTAL	1.952,10
								COBRADO ACTAS ANTERIORES	
								POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	1.952,10

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

	CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA	

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA FINAL	**MODIFICACION** ☐	**EJECUTADAS** ☒	
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**CONTRATO No. : 1151 - 2024**	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE	
ACTA	FINAL		
FECHA:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1.3.2		m²	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (Cebras) ABSISA	0,45		4,00	1,80	7,00	12,60
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (liena de	0,60		3,40	2,04	1,00	2,04
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (zona escolar)				17,50	1,00	17,50
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (zona escolar)				17,50	1,00	17,50
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (Cebras) ABSISA	0,42		3,05	1,28	7,00	8,97
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (liena de	0,60		3,55	2,13	2,00	4,26
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (Cebras) ABSISA	0,42		3,00	1,26	13,00	16,38
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (liena de	0,60		6,10	3,66	1,00	3,66
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (Flecha de frente)				1,20	2,00	2,40
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (Flecha de frente)				1,20	1,00	1,20
DEMARCACION VIAL SOBRE LA DIAGONAL 9 (Flechas a la				1,67	1,00	1,67
					TOTAL	88,18
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	88,18

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA





Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

ANALISIS DE PMT ACTA FINAL

ELEMENTOS DE ACTIVIDAD		CONTRACTUALES			ACTA ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT MES	VR TOTAL	CANT MES	VR TOTAL	CANT MES	VR TOTAL
CINTA DE SEÑALIZACIÓN	ROLLO	5	$ 25.900,00	$ 129.500,00	5,00	$ 129.500,00		$ -	5,00	$ 129.500,00
PALETAS DE PARE	UND	2	$ 24.850,00	$ 49.700,00	2,00	$ 49.700,00		$ -	2,00	$ 49.700,00
SEÑAL SPO-OI TRABAJOS EN LA VIA (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	4	$ 102.700,00	$ 410.800,00	4,00	$ 410.800,00		$ -	4,00	$ 410.800,00
SEÑAL SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA '(INCLUYE INSTALACIÓN	UND	4	$ 150.000,00	$ 600.000,00	4,00	$ 600.000,00		$ -	4,00	$ 600.000,00
SEÑAL SRO-02 DESVIO	UND	2	$ 295.000,00	$ 590.000,00	2,00	$ 590.000,00		$ -	2,00	$ 590.000,00
SEÑAL OBRA EN LA VIA SIO-OI	UND	2	$ 175.000,00	$ 350.000,00	2,00	$ 350.000,00		$ -	2,00	$ 350.000,00
SEÑAL INICIO Y FIN DE OBRA- SIO-0203	UND	2	$ 193.700,00	$ 387.400,00	2,00	$ 387.400,00		$ -	2,00	$ 387.400,00
SEÑAL SIO-OS DESVIO	UND	2	$ 175.000,00	$ 350.000,00	2,00	$ 350.000,00		$ -	2,00	$ 350.000,00
2 AUXILIARES DE TRAFICO (UNO AL INCIO DEL TRAMO -UNO AL FINAL), INCLUYE PRESTACIONES.	UND	8,00	$ 1.680.773,10	$ 13.446.185,00	7,38	$ 12.404.106,00	0,62	$ 1.042.080,00	8,00	$ 13.446.185,00
BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES)	UND	5	$ 135.900,00	$ 679.500,00	5,00	$ 679.500,00		$ -	5,00	$ 679.500,00
SEÑAL REFLECTIVA	UND	2	73.100,00	$ 146.200,00	2,00	$ 146.200,00		$ -	2,00	$ 146.200,00
CERRAMIENTO DE OBRA (MALLA	ROLLO	5	$ 92.000,00	$ 460.000,00	5,00	$ 460.000,00		$ -	5,00	$ 460.000,00
DELINEADORES TOBULARES	UND	7	110.000	$ 770.000,00	7,00	$ 770.000,00		$ -	7,00	$ 770.000,00
SRI- INICIO DE OBRA	UND	2	67.400,00	$ 134.800,00	2,00	$ 134.800,00		$ -	2,00	$ 134.800,00
TOTAL COMPRA				$ 18.504.085,00		$ 17.462.006,00		$ 1.042.080,00		$ 18.504.085,00

COSTO PMT	$ 18.504.085,00
COSTO PMT PRESENTE ACTA (ACTA 1)	$ 7.321.246,00
COSTO PMT PRESENTE ACTA (ACTA 2)	$ 7.457.492,00
COSTO PMT PRESENTE ACTA (ACTA 3)	$ 2.683.267,00
COSTO PMT PRESENTE ACTA FINAL	$ 1.042.080,00
ACUMULADO PMT ACTAS	$ 18.504.085,00

ARIEL SERRANO GONZALEZ
R.L. CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
Contratista de Obra

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R.L. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
Contratista de Interventoria

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PAGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPAOLEGRE 2024

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA "

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PROGRAMA 1. APLICACIÓN DE GESTION AMBIENTAL												
		Conformacion del grupo de gestion ambiental										
	DAGA-1.1-01	Grupo de Gestion Ambiental, Implementacion de informes, recoleccion de informacion, revisicion de documentacion	1	UNIDAD	$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00	1	$ 1.650.000,00		$ 0,00	1	$ 1.650.000,00
		Reuniones de comité de orientacion y atencion cuidadana Incluye reuniones de socializacion de inicio, cierre de obra (Incluye refrigerios)	2	UNIDAD	$ 80.000,00	$ 160.000,00	2	$ 160.000,00		$ 0,00	2	$ 160.000,00
					SUBTOTAL	$ 1.810.000,00	SUBTOTAL	$ 1.810.000,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 1.810.000,00
		Capacitacion ambiental al personal de obra										
	DAGA-1.1-02	capacitacion, charlas, para la concienciacion para el manejo de recursos naturales	50	UNIDAD	$ 45.000,00	$ 2.250.000,00	40	$ 1.800.000,00	10	$ 450.000,00	50	$ 2.250.000,00
		Realización de talleres de sensibilización ambiental	40	UNIDAD	$ 45.000,00	$ 1.800.000,00	30	$ 1.350.000,00	10	$ 450.000,00	40	$ 1.800.000,00
		Volantes, folletos de la informacion correspondiente a las capacitaciones	300	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 300.000,00	300	$ 300.000,00		$ 0,00	300	$ 300.000,00
					SUBTOTAL	$ 4.350.000,00		$ 3.450.000,00	SUBTOTA	$ 900.000,00	SUBTOTA	$ 4.350.000,00
	DAGA-1.3-03	**Cumplimiento de requisitos legales**										
					SUBTOTAL	$ -		$ -	SUBTOTA	$ -	SUBTOTA	$ -
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												
		Señalizacion de frentes de obra y sitios temporales										
	PAC-2.3-06	Señalizacion sitio de obra en acrilico kit 16	2	UNIDAD	$ 240.000,00	$ 480.000,00	2	$ 480.000,00		$ 0,00	2	$ 480.000,00
		Canecas de almacenamiento con capacidad de 55 galones	2	UNIDAD	$ 130.000,00	$ 260.000,00	2	$ 260.000,00		$ 0,00	2	$ 260.000,00
		Geotextil para mezclas de concreto	4	ROLLO	$ 846.407,00	$ 3.385.628,00	4	$ 3.385.628,00		$ 0,00	4	$ 3.385.628,00
					SUBTOTAL	$ 4.125.628,00	SUBTOTAL	$ 4.125.628,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 4.125.628,00
	PAC-2.4-06	**Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.**										
					SUBTOTAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 0,00
	PAC-2.5-08	**Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.**										
		Punto Ecologico	1	UNIDAD	$ 699.990,00	$ 699.990,00	1	$ 699.990,00		$ 0,00	1	$ 699.990,00
		Paquete de Bolsas de Colores(Blanca, Negra, verde)	100	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 100.000,00	100	$ 100.000,00		$ 0,00	100	$ 100.000,00
					SUBTOTAL	$ 799.990,00	SUBTOTAL	$ 799.990,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 799.990,00
PROGRAMA 4. GESTION DEL RECURSO HIDRICO												
		Proyecto de Manejo de Residuos Liquidos domesticos industriales										
	PGH-3-2-10	Alquiler de inmueble en cercanias del Proyecto para uso de los Baños personal (Incluye limpieza y mantenimiento)	2	UNIDAD	$ 1.600.000,00	$ 3.200.000,00	2	$ 3.200.000,00	0	$ 0,00	2	$ 3.200.000,00
					SUBTOTAL	$ 3.200.000,00	SUBTOTAL	$ 3.200.000,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 3.200.000,00
PROGRAMA 3. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS												
		Proteccion a la Fauna										
	PAC-2.4-06	capacitacion y concienciacion para el cuidado y proteccion de la fauna	4	UNIDAD	$ 45.000,00	$ 180.000,00	4	$ 180.000,00		$ 0,00	4	$ 180.000,00
		Volantes, folletos y carteleras alucibas al cuidado y proteccion de la fauna	130	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 130.000,00	130	$ 130.000,00		$ 0,00	130	$ 130.000,00
					SUBTOTAL	$ 310.000,00	SUBTOTAL	$ 310.000,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 310.000,00
PROGRAMA 4. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL												
		Proyecto de atencion a la comunidad										
		camilla rigida con inmovilizadores	1	UNIDAD	$ 321.900,00	$ 321.900,00	1	$ 321.900,00		$ 0,00	1	$ 321.900,00
		Botiquin basico para primeros auxilios	1	UNIDAD	$ 144.438,00	$ 144.438,00	1	$ 144.438,00		$ 0,00	1	$ 144.438,00
	PSG-6.1-16	Inmovilizador Cervical	1	UNIDAD	$ 50.670,00	$ 50.670,00	1	$ 50.670,00		$ 0,00	1	$ 50.670,00
		extintor Multiproposito	1	UNIDAD	95.664,00 €	$ 95.664,00	1	$ 95.664,00		$ 0,00	1	$ 95.664,00
					SUBTOTAL	$ 612.672,00	SUBTOTAL	$ 612.672,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 612.672,00
		Proyecto de informacion y divulgacion										
	PSG-6.2-19	Reuniones programadas	2	UNIDAD	$ 126.384,00	$ 252.768,00	2	$ 252.768,00		$ 0,00	2	$ 252.768,00
		Volantes y papeleria personalizada	150	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 150.000,00	150	$ 150.000,00		$ 0,00	150	$ 150.000,00
					SUBTOTAL	$ 402.768,00	SUBTOTAL	$ 402.768,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 402.768,00
	PSG-6.6-21	**contratacion mano de obra**										
					SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 0,00

PROGRAMA 5. PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS											
PSG-6.2-19	Proyecto de manejo de Maquinaria, equipos y vehiculos										
	Kit antiderrames	1	UNIDAD	$ 193.290,00	$ 193.290,00	1	$ 193.290,00		$ 0,00	1	$ 193.290,00
	canecas de 55 galones para almacenamiento	1	UNIDAD	$ 140.000,00	$ 140.000,00	1	$ 140.000,00		$ 0,00	1	$ 140.000,00
				SUBTOTAL	$ 333.290,00	SUBTOTAL	$ 333.290,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 333.290,00
COSTO PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL				TOTAL	$ 15.944.348,00	TOTAL	$ 15.044.348,00	TOTAL	$ 900.000,38	TOTAL	$ 15.944.348,00

COSTO PAGA ACTAS ANTERIORES	**$ 15.044.348,00**
COSTO PAGA PRESENTE ACTA FINAL	**$ 900.000,38**
TOTAL COSTO PAGA	**$ 15.944.348,38**

ARIEL SERRANO GONZALEZ
R.L. CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
Contratista de Obra

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R.L. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
Contratista de Interventoria

62

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

FACTURA

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
NIT 901.854.721-5
CARRERA 47 N 6 41 CONJUNTO PAISAJE DE ALTAMIRA
Tel: (3125212497)
Neiva - Colombia
contabilidadmarvasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECM 14

Señores	GOBERNACION DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(608) 8671300
Dirección	Carrera 4 Calle 8 Esquina	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2026, 08:30
Expedición	15/04/2026, 08:30
Vencimiento	15/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 1151 DE 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.00	167,155,862.39
2	PAGA	1.00	900,000.38
3	PMT	1.00	1,042,080.00

Total items: 3

Total Bruto	169,097,942.77
Total a Pagar	169,097,942.77

Valor en Letras:
Ciento sesenta y nueve millones noventa y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos m/cte con setenta y siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 169,097,942.77

Observaciones:
AUTORIZO AL DEPARTAMENTO DEL HUILA EL DESCUENTO A LA PRESENTE ACTA POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL EQUIVALENTE $18,662,617.17; QUEDANDO UN TOTAL A PAGAR $150,435,325.6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092457673 aprobado en 20250428 prefijo FECM desde el número 11 al 1000 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: c212c393b99a346da169e7778756b42954f5e06b90fbfa0a11598ef3dbb1361cb55eb4cabd034c2287e778a0032a8809

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

RUT ACTUALIZADO

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141137738762

(415)7707212489984(8020) 000014113773876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 4 7 2 1	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 6 41 CA 31 CON PAISAJE DE ALMERIA

42. Correo electrónico contabilidadjconstructorasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 9 5 8 5 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades			
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0 / 2 0 2 4 0 3 2 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	1	6	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 05-02-2026 10:54:17AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141137738762

(415)7707212489984(8020) 000014113773876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 4 7 2 1	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 3 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 3 2 6	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 3 2 6
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación — 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141137738762

(415)7707212489984(8020) 000014113773876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 4 7 2 1	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 8 1 4 1 3 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SERRANO	GONZALEZ	ARIEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 3 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 6 9 4 1 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	CHARRY	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 05-02-2026 10:54:17AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141137738762

(415)7707212489984(8020) 000014113773876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 4 7 2 1	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 8 1 4 1 3 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SERRANO	GONZALEZ	ARIEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 4 0 3 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 9 5 0 9 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: JCONSTRUCTORA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 3 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764092457673

(415)7707212489984(8020) 001876409245767 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 5 4 7 2 1	5				

11. Razón social
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

Cód. 1 3

24. Dirección
CR 47 6 41 CA 31 CON PAISAJE DE ALMERIA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Huila	Neiva

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-04-28 / 03:20:25 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DIAZ CHARRY JUAN CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7694138 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

997. Fecha formalización 2025-04-28/15:20:25

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764092457673

(415)7707212489984(8020) 001876409245767 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901854721	5				

11. Razón social

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 CR 47 6 41 CA 31 CON PAISAJE DE ALMERIA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FECM	11	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

CERTIFICADO BANCARIO

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

Certificación Bancaria

Bancolombia

Neiva, 23 Enero 2026.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024** identificado (a) con **NIT** No **901.854.721,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto, Mejoramiento de vías urbanas mediante la construcción de pavimento rígido en la diagonal 9 del Municipio de Campoalegre Departamento del Huila.

Nombre Producto	Numero producto	Estado
CUENTA DE AHORROS	076-0000-9740	ACTIVA

BANCOLOMBIA. Nombre - Of. 076 Neiva
Ejecutivo Senior No 225
Cédula Nº 1075307878.

Atentamente,
Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 358 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

INFORME FINAL

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1151 DE 2024

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA



INFORME ACTA FINAL
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2025

CAMPOALEGRE – HUILA

CONTENIDO

1. INTRODUCCION **6**
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO **7**
2.1 Localización y Descripción General del Proyecto **7**
2.2 Inventario y estado general de la vía **8**
2.3 Características técnicas del proyecto **8**
2.4 Estudios y diseños **10**
2.5 Canteras y botaderos **10**
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA **13**
3.1 Pólizas contractuales 14
3.1.1 Socialización del proyecto 18
3.1.2 Veeduría del proyecto 19
3.1.2.1 Acta de conformación de la Veeduría del proyecto 19
3.2 Descripción de actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe 25
3.2.1. Componente técnico. 25
3.2.2. Componente de seguridad y salud en el trabajo 28
3.2.1.1. Relación de Personal 28
3.2.1.2. Control de Personal de obra 30
3.2.2.2. Inducción, Notificación de Peligros y Divulgación de Políticas – Cierre 31
3.2.1.2.1. Capacitaciones 32
3.2.1.2.2. Entrega de Elementos de protección Personal 35
3.2.1.2.3. Inspecciones Realizadas en Obra 36
3.2.1.2.4. Señalización frentes de trabajo de obra 37
3.2.3. Componente de gestión socio ambiental 38
3.2.3.1. Programas ambientales 38

3.2.3.2. Actividades ambientales del PAGA 40

3.2.3.3. Evaluación de los indicadores ambientales 40

3.2.3.3.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales 41

3.2.3.3.2. Gestión ambiental derivada de los impactos ambientales 42

3.2.3.3.3. Estado de cumplimiento de indicadores ambientales 42

3.2.3.3.4. Implementación y Aplicación de las Fichas Técnicas Ambientales 43

3.2.3.4. Incidentes ambientales 63

3.2.3.5. Estado de cumplimiento de plan de gestión ambiental 63

3.2.3.6. Evaluación de daños y perjuicios a terceros 64

3.2.3.7. Quejas y reclamos relacionadas con el medio ambiente 64

3.3. Informe de avance en medio físico 64

3.4. Avance de obra, programada, ejecutada y acumulada para el periodo en mención. 65

3.4.1. Bitácora de obra 66

3.4.2. Registro fotográfico de obra 66

3.5. Actos administrativos 69

3.5.1. Suspendidos 69

3.5.2. Reiniciados 69

3.5.3. Otrosí 69

3.5.4. Prorroga 69

3.6. Informe semanal de interventoría y evidencia fotográfica. 70

3.7. Copia de actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra. 70

3.8. Control diario de equipo del contratista de obra 71

3.9. Control diario del personal del contratista de obra 71
3.10. Información financiera del contrato de obra 73
3.11. Estado general del tiempo si se requiere suspensión 74
3.12. Ensayos de laboratorios 74
3.13. Pagos de seguridad social del personal del contratista 74
3.14. Disponibilidad de vehículo mediante propiedad o contrato de alquiler 75
3.15. Disponibilidad de oficina 76
3.16. Contrato de personal profesional y especializado 76
3.17. COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 76
3.17.1. Seguimiento al PMT 76
3.18. CONCLUSIONES 78

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Localización del Proyecto 7
Ilustración 2. *Publicación de las Políticas de Seguridad en Obra.* 32
Ilustración 3. *Inducción, Notificación de Riesgos.* 32
Ilustración 4. *Pausas Activas* 34
Ilustración 5. *Orden y aseo* 34
Ilustración 6. *Entrega de Elementos de Protección personal al personal de obra.* 35
Ilustración 7. *Uso de EPP personal de obra.* 35
Ilustración 8. *Inspección Punto de primeros auxilios* 36
Ilustración 9. *Inspección final del Orden y aseo de obra.* 36
Ilustración 10. *Demarcación de La vía* 37
Ilustración 11. *Demarcación de la Vía* 37
Ilustración 12. *Como cuidar la naturaleza y Manejo Integral de Residuos Sólidos en Obra* 44
Ilustración 13. *Separación de Residuos en la Fuente y Uso Eficiente y Ahorro del Agua.* ... 44
Ilustración 14. *Control de Emisiones de Material Particulado y Protección de Flora* 44
Ilustración 15. *Prevención de Derrames y Uso del Kit Antiderrame* 44
Ilustración 16. *Control de Ruido y Responsabilidad Ambiental* 45
Ilustración 17. *Taller Práctico de Clasificación de Residuos en Obra y Jornada de Sensibilización Ambiental* 45
Ilustración 18. *Taller de Buenas Prácticas Ambientales* 45
Ilustración 19. *Actividad de Orden y Aseo y Cultura Ambiental* 46
Ilustración 20. *Taller manejo de Extintores y Practica en campo para atender un incendio.* 46

Ilustración 21. *Taller Recolección de Residuos y Conciencia Ambiental.* 46
Ilustración 22. *Demarcación de la vía* 50
Ilustración 23. *Demarcación de La vía* 50
Ilustración 24. *Punto Ecológico* 53
Ilustración 25. *Entrega del Proyecto* 58
Ilustración 26. *Entrega del Proyecto* 58
Ilustración 40. Seguimiento al PMT. 77
Ilustración 44. Seguimiento al PMT 77
Ilustración 45. Seguimiento al PMT 77

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra 13
Tabla 2. Cronograma de Capacitaciones. 33
Tabla 3. *nombres y códigos de los programas a implementar y sus respectivos proyectos.* ... 39
Tabla 4. Cálculo de indicador ambiental 41
Tabla 5. Comparación Avance de Obra 65
Tabla 6. Control diario de equipo. 71
Tabla 7. Control diario de personal. 71
Tabla 8. Control financiero 73
Tabla 9. Estado del tiempo, se anexa los formatos de cada semana, en el presente informe.. 74
Tabla 10. Personal de Obra para el periodo en mención 74

1. INTRODUCCION

El presente informe de obra contiene los componentes técnicos, administrativos y financieros desarrollados durante el período de ejecución comprendido entre el 01 de octubre al 21 de octubre de 2025, correspondientes al proyecto cuyo objeto fue el "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA", en conformidad con lo estipulado en el Contrato de Obra Pública No. 1151 de 2024.


Así mismo, se presentó el informe correspondiente al acta final, en cumplimiento de lo establecido en el citado contrato, mediante el cual se dejó constancia de que las actividades contractuales se ejecutaron y finalizaron, registrando un avance del 99,37 % de ejecución del contrato de obra para el período evaluado.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización y Descripción General del Proyecto

El proyecto se localiza en el municipio de Campoalegre - Huila, en vía de tercer orden que de la ruta 45, comunica con las veredas Potosi, pirabante alto, bejucal, las pavas, el esmero en una longitud de 680 m y del cruce en la carrera 5 entre la diagonal novena y el puente.

Ilustración 1. *Localización del Proyecto*

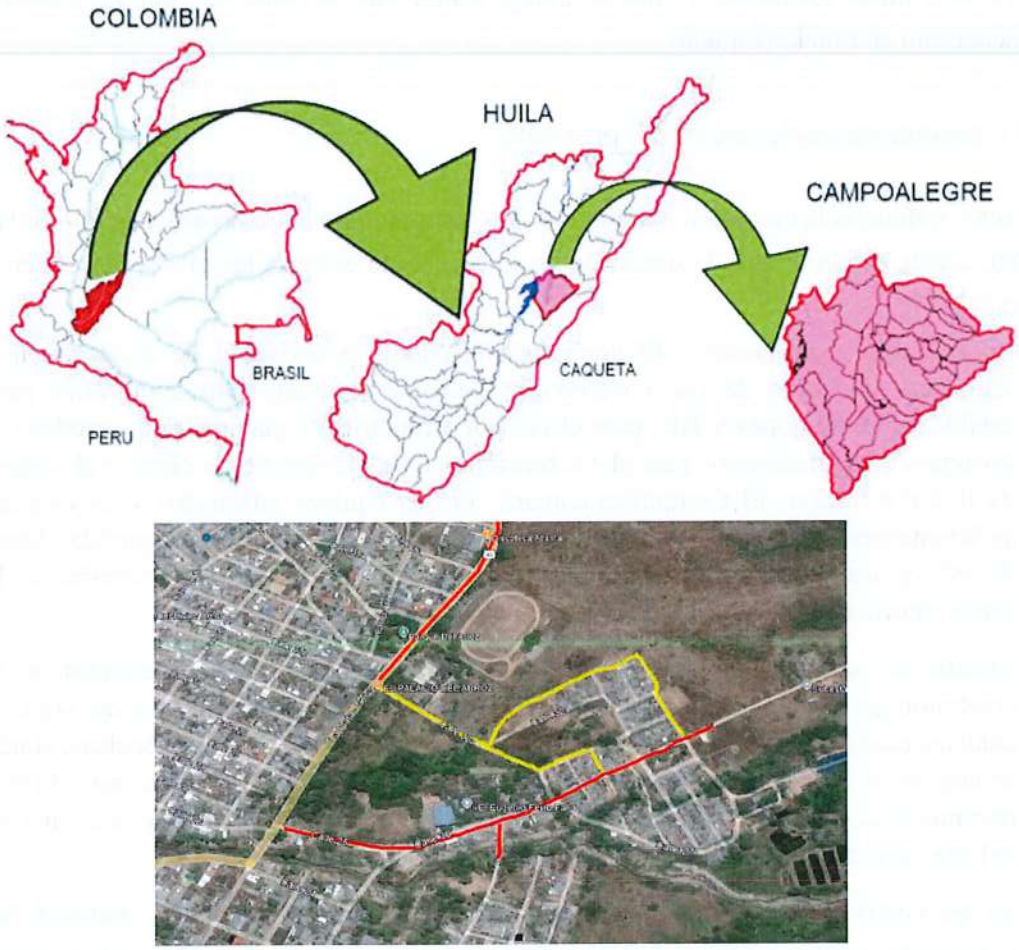

2.2 Inventario y estado general de la vía

Actualmente el tramo de vía a intervenir localizado desde la abscisa K0+00 al K0+680,00 desde la ruta 45 a la vía de la salida veredales, se encuentra en buen estado de conservación con afirmado en material de asfalto con material de sedimentación. De igual en el referido tramo de vía a intervenir se lograron identificar 2 obras de drenaje transversal (alcantarillas), 3 sumideros que actualmente se encuentran en funcionamiento.
De igual forma para el tramo comprendido desde el puente de la carrera 5 a empalmar con la diagonal 9 existente sobre esta misma vía, el tramo se encuentra en buen estado de conservación con afirmado en material de recebo. De igual en el referido tramo de vía a intervenir se lograron identificar 1 obra de drenaje transversal (alcantarilla), que actualmente no se encuentran en funcionamiento.

2.3 Características técnicas del proyecto

El proyecto contempla la ejecución del tramo de vía comprendido entra las abscisas K0 +00 al K00+680, donde se contempla la ejecución de una serie de actividades que se describen a continuación:

- Localización y replanteo: El contratista ejecutará la actividad de localización y replanteo del tramo de vía a intervenir, mediante levantamiento topográfico para establecer los mojones y BM para el control altimétrico y planimétrico; y todos los levantamientos necesarios para el establecimiento de los ejes de las obras y el control de la construcción. El Contratista contará con los equipos adecuados y el personal suficientemente entrenado para ejecutar el replanteo con la precisión requerida. Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la Interventoría de la localización general del proyecto y sus niveles.

- Estudio de suelos para determinar el CBR: Mediante el cual se determinará, la condición geológica en el área del estudio, la caracterización geotécnica del sitio, el análisis, ensayos y toma de muestras In Situ cumpliendo con las normas técnicas, donde se determina la estratigrafía, clasificación, índice de liquidez, CBR de campo (PDC), herramientas claves para la toma de decisiones por parte del diseñador de la estructura del pavimento.

  Es así como el laboratorio de suelos seleccionado por el contratista, realizará los trabajos de campo y laboratorio, consistente en la ejecución de dos (02) sondeos a una

profundidad máxima de 1,5 m, según lo indicado en la Norma, se toman muestras y se hacen los análisis y ensayos cumpliendo con los procedimientos indicados para ello en las normas vigentes para Colombia, con el fin de determinar la estratigrafía, clasificación, limites, compresión y capacidad portante del suelo; factores claves en la toma de decisiones para el diseño de las estructuras del proyecto. Como también se realiza sondeos cuatro (4) con Penetrómetro Dinámico De Cono (PDC), con el fin de evaluar la resistencia del suelo y estimar el CBR en Laboratorio.

- Socialización del proyecto: El contratista socializará las actividades con las partes interesadas, garantizando la amplia y oportuna divulgación de la información técnica, jurídica, económica, social, ambiental y predial relacionada con el proyecto, a través de reunión de socialización con la comunidad. Todo lo anterior acorde con la normativa aplicable a los procesos de participación social e información pública.
- Conformación de la veeduría ciudadana: En el marco del mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos y a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia a contratos de obra pública ejecutados con recursos públicos. El día de la socialización del proyecto la comunidad participante de la actividad elegirá libremente sus representantes a conformar la veeduría ciudadana, en lo relacionado con la ejecución del proyecto. Todo esto en cumplimiento de los principios constitucionales de participación ciudadana, deber y control social efectivo en la función del Estado; además acorde con la Ley 850 de 2003, relacionados con la participación de las veedurías en el control fiscal y la entrega de informes para auditoría ciudadana. De la presente actividad se suscribirá el acta de apertura de la veeduría ciudadana, debidamente firmada por los integrantes de la misma.
- Levantamiento de las actas de vecindad: El contratista identificará los predios y redes de servicios públicos cercanos a las obras a ejecutar; luego, registrará el estado físico de infraestructura de predios, áreas de uso y ocupación temporal e infraestructura de servicios públicos, con el fin de prevenir afectaciones sobre estos. Así mismo el contratista realizará el cronograma para el levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre, actas de compromiso y esquemas de localización de las redes de servicios públicos. Todo esto en consideración al cumplimiento del Código Civil colombiano para determinar la responsabilidad civil que debe asumir el constructor, por los predios, las áreas de uso y ocupación que pueden ser afectadas por las obras.
- Excavación mecánica (explanación). esp. 210-13 inv. incluye retiro de material proveniente de la excavación a disposición final del mismo: La actividad cubierta por

esta especificación consiste en la excavación, cargue y transporte de los materiales resultantes, hasta los sitios los sitios de botadero. Este trabajo cobija también las excavaciones generales en material común en taludes de la banca, excavaciones para reemplazo de tuberías de alcantarillas donde lo indiquen los planos de los diseños elaborados por el Contratista.

- suministro, instalación, extendida, nivelación, humedecimiento o aireación y compactación de base granular CBR $\geq$ 40%. esp. 320-13 inv: Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor.
- Suministro e instalación sardinel prefabricado 0,50x0,20x0,80 m, incluye la preparación de la superficie de apoyo.
- Pavimento en concreto hidráulico - MR-45: Este ítem, corresponde el concreto cuya dosificación, fabricación, colocación y curado que se especifica, corresponde a instalación para la placa de concreto en tramo de vía a intervenir, de acuerdo a los espesores establecidos en el respectivo diseño del pavimento hidráulico y que cumpla con las especificaciones de resistencia mecánica a la flexión establecida para este tipo de concretos.
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-13 inv. para alcantarilla, box, muros, incluye transporte: Ítem que corresponde a al acero requerido a instalar en las estructuras de drenaje (alcantarillas), de acuerdo a las especificaciones estipuladas y requerimientos estructurales de diseño, para este tipo de estructuras.

2.4 Estudios y diseños

A la fecha de presentación del informe de la referencia, no se han realizado ningún tipo de estudios.

2.5 Canteras y botaderos

Inicialmente, se realizó una solicitud formal para la compra de materiales pétreos necesarios para la ejecución de la obra, cumpliendo con los requisitos técnicos y legales establecidos.

Asimismo, se gestionó la disposición adecuada del material sobrante generado durante el desarrollo de las actividades constructivas.

En cuanto a la selección de las canteras y botaderos:

- Canteras: Se identificaron y seleccionaron proveedores autorizados que cumplen con la normativa local en cuanto a extracción y transporte de materiales pétreos.
- Botaderos: La alcaldía municipal del Municipio de Campoalegre-Huila nos otorgó un sitio autorizado para la disposición final del material sobrante, priorizando aquellos que cuentan con el permiso correspondiente para depositar el material sobrante de obra.

Más información detallada sobre el manejo ambiental relacionado con estas actividades será desarrollada en el componente ambiental del presente informe.

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

Campoalegre - Huila, 12 de diciembre de 2024

Ingeniero
RODRIGO MOLANO CUELLAR
Secretario de Planeación
Municipio de Campoalegre-Huila.

Asunto: Solicitud autorización para disposición de material sobrante del Contrato de Obra No. 1151 de 2024.

Cordial saludo

Yo, DANIEL RAMIREZ LOSADA, identificado con C.C. 83.091.855 de campoalegre - Huila, respetuosamente me permito manifestar ante ustedes que he autorizado al CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPAOLEGRE 2024, identificado con NIT. 9 0 1 8 5 4 7 2 1-5, a que realice la disposición de material sobrante y residuos de movimiento de tierras, producto de la ejecución de las obras en el marco del CONTRATO DE OBRA No. 1151 DE 2024, cuyo objeto es *"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA". Es de anotar que esto no afectara ningún recurso hídrico, ni Forestal, con una distancia de 5 km*

Estos residuos se utilizarán como relleno en un punto estratégico dentro del predio, ubicado en vereda san isidro bajo del municipio de campaolegre, el cual es de mi propiedad.

Dado lo anterior me permito solicitar su visto bueno para dicha actividad.

Gracias

por su atención, quedo atenta a su respuesta. Cordialmente,

DANIEL RAMIRZ LOSADA

C.C. 83.091.855 de campoalegre - Huila
Tel:3158000077

cc CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. *Información general del Contrato de Obra*

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1151 DE 2024, CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SVLPOB0035-23	
Fecha	16 de septiembre de 2024
Contratante	Gobernación del Huila
Contratista	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
Objeto	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA ".
Valor Inicial del Contrato	MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTIOCIOCHO CENTAVOS AIU Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUIDOS ($1.682.623.926,28) MONEDA CORRIENTE.
Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Acta de Inicio	04 de diciembre de 2024
Acta de suspensión 1	10 de marzo de 2024
Acta de reinicio 1	01 de abril del 2025
Adición en tiempo 1	DOS (2) MESES
Acta de suspensión 2	3 de junio de 2025
Acta de reinicio 2	01 de septiembre del 2025
Otro si#1	DOS (2) MESES
Otro si #2	Uno (1) MES
Plazo Final	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de terminación	21 DE OCTUBRE DEL 2025
Otro si #2 (Adición en dinero)	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS ($ 118,268,088.82) MONEDA CORRIENTE.
Valor Final del Contrato	MIL OCHOCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINCE CON ONCE AIU Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUIDOS (**$1,800,892,015.11**) MONEDA CORRIENTE.

3.1 Pólizas contractuales

Tabla 2. *Control de Pólizas*
Anexo 0, suscripción del contrato

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA CUMPLIMIENTO: Anexo 0							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000182667	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/09/2024**	**16/07/2025**	**$336.524.785,40**	15-11-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**16/09/2024**	**16/07/2025**	**$504.787.178,10**	15-11-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/09/2024**	**16/01/2028**	**$168.262.392,70**	15-11-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 336.524.785,40	15-11-2024	Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Anexo 0							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-74-994000033365	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	16/09/2024	20/01/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	16/09/2024	20/01/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	16/09/2024	20/01/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada

Anexo 1, suscripción acta de inicio.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA CUMPLIMIENTO: Anexo 1							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000182667	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**04/12/2024**	**04/02/2026**	**$336.524.785,40**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**04/12/2024**	**04/02/2026**	**$504.787.178,10**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**04/12/2024**	**04/08/2028**	**$168.262.392,70**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 336.524.785,40	18-18-2024	Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Anexo 1							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-74-994000033365	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	20/01/2025	20/05/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	20/01/2025	20/05/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20/01/2025	20/05/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada

Anexo 5, otro si #1

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA CUMPLIMIENTO:							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000182667	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**04/03/2026**	**05/05/2026**	**$360.178.403.20**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**04/03/2026**	**05/05/2026**	**$540.267.604,80**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**04/03/2026**	**05/11/2028**	**$180.089.201.60**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 360.178.403.20	18-18-2024	Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Anexo 5							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-74-994000033365	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	20/08/2025	30/09/2025	$284,700,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	20/08/2025	30/09/2025	$284,700,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20/08/2025	30/09/2025	$284,700,000.0	15-11-2024	Aprobada

Anexo 4, otro si #2

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA CUMPLIMIENTO:							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000182667	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**04/03/2026**	**05/05/2026**	**$360.178.403.20**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**04/03/2026**	**05/05/2026**	**$540.267.604,80**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**04/03/2026**	**05/11/2028**	**$180.089.201.60**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 360.178.403.20	18-18-2024	Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Anexo 4							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-74-994000033365	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	20/08/2025	30/09/2025	$284,700,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	20/08/2025	30/09/2025	$284,700,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20/08/2025	30/09/2025	$284,700,000.0	15-11-2024	Aprobada

1908

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607955274

PÓLIZA No: 560-47-994000182667 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA NEIVA — COD AGENCIA 560 — RAMO 47

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION — TIPO DE IMPRESIÓN IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DÍA	MES	AÑO
20	09	2024	20	09	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT 901.854.721-5

DIRECCIÓN CR 47 NO 6 41 — CIUDAD NEIVA, HUILA — TELÉFONO 3124958588

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO . GOBERNACION DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN NIT 800.103.913-4

BENEFICIARIO . GOBERNACION DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN NIT 800.103.913-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	16/09/2024	16/07/2025	336,524,785.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/09/2024	16/07/2025	504,787,178.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	16/09/2024	16/01/2028	168,262,392.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	336,524,785.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 88141364 - SERRANO GONZALEZ, ARIEL - PART: 90.00%
NIT 901295090 - JCONSTRUCTORA SAS - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1151 DE 2024 , DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA .

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA:	TOTAL A PAGAR
$ **1,346,099,141.60	$ ********5,129,053	$****11,000.00	$ ******976,610	$ ********6,116,663

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURADORA CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
GOBERNACIÓN DEL HUILA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN		

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y [illegible] PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE NOTIFICACIONES [illegible] Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA: CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJES DE TEXTO Y MMS, LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE IGUAL MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA ASEGURADORA PARA QUE EN CASO DE [illegible] SEA NECESARIO CONTACTARME A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ANTES MENCIONADOS, EL DE CONTACTO O TENGA UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO [illegible] PARA FINES COMERCIALES, PUBLICITARIOS Y/O PROMOCIONALES, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE [illegible] EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENGA UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO [illegible] PARA FINES COMERCIALES, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO [illegible] Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO [illegible]. MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, ACTÚO EN CALIDAD DE TITULAR/AUTORIZADO DE LA INFORMACIÓN, DE IGUAL FORMA, EXPRESA, [illegible] HISTORIA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA QUE PUEDA O PUDIERA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A REALIZAR/ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR ESTE SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIERA OTRA RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DEL REFERIDA ANTERIORMENTE, LAS QUE APLICA EL USO DE LOS DATOS DE ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE ESO EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LA RECAUDA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA, EN TODO CASO, ASEGURADORA [illegible] DE LOS DATOS PERSONALES ACCEDER CON LA AUTORIZACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE ENTENDERÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA RELACIÓN DEL TITULAR CON LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE APLICABLES EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACCEDER CON LA AUTORIZACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE ENTENDERÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA RELACIÓN DEL TITULAR CON LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE APLICABLES EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE [illegible] DISPUESTA EN LA PÁGINA WEB [illegible] Y ACEPTO LOS TÉRMINOS ALLÍ CONTENIDOS. [illegible] DE SUS DATOS PERSONALES [illegible] DE ENTRE OTROS.

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU PATRIMONIO - SEGUROS PATRIMONIALES O ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN TU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701581000019(8020)000000000570005607955274

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-49 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CRCE207F060AF97CS8

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 29-24 Oficina 221, Bogotá * Teléfonos: (601) 7919190
Fax: (601) 7919190 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información le invitamos a consultar el boletín en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

15-11-2024

Powered by CamScanner

97

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 900.326.864-8

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607957015

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000033365 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD AGE: 560 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS / DIAS)	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
20 / 09 / 2024	16 / 09 / 2024 / 23:59 A LAS	20 / 01 / 2025 / 23:59 A LAS / 126 DIAS	20 / 09 / 2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA DEL ANEXO HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS / DIAS)
16 / 09 / 2024 / 23:59 A LAS	20 / 01 / 2025 / 23:59 A LAS / 126 DIAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.854.721-5
DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 3124958588

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.854.721-5
DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 3124958588
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 NIT : 901854721

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA CIUDAD: NEIVA

DIRECCION: SEGUN CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA $ INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00	
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00	
	PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	260,000,000.00	
	BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	260,000,000.00	
	RCE PATRONAL	260,000,000.00	
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00	
	CONTAMINACION	260,000,000.00	
	GASTOS MEDICOS	260,000,000.00	
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	260,000,000.00	

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1151 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 REFERENTE A " MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA .

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********179,507	$ **********	$ **********	$ **********213,613

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	00.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COASEGURADOR	%PART	VALOR ASEGURADO

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN 25 NOV 2024

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, DARÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y EL ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS INCURRIDOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701561000010(8020)000000000007806547957701

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-49 Piso 12 Bogotá

ACCIONALES 0

CRDE207F060AFB7E5E — CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Barrera * Dirección: Carrera 13 A # 28-36 Oficina 221, Bogotá * Teléfonos: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 343 8229 * Correo electrónico: defensorasolidaria@gmail.com
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

15-11-2024

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor luego en cuanto sea posible contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

1909

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607955274

PÓLIZA No: 560-47-994000182667 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD AGENCIA: 560 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	11	12	2024
FECHA DE IMPRESIÓN	11	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.854.721-5

DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 3124958588

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . GOBERNACION DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.103.913-4

BENEFICIARIO: . GOBERNACION DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.103.913-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	04/12/2024	04/02/2026	336,524,785.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/12/2024	04/02/2026	504,787,178.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04/12/2024	04/08/2028	168,262,392.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	336,524,785.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 88141364 - SERRANO GONZALEZ, ARIEL - PART: 90.00%
NIT 901295090 - JCONSTRUCTORA SAS - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
!
OBJETO DE LA GARANTIA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUEDAN SIN MODIFICAR

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ *1,346,099,141.60	$ **********	$**********0.00	$ **********	$ **********

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00			

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN
FECHA
FIRMA DEL RESPONSABLE

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB www.solidaria.com.co EN LA OPCIÓN SERVICIOS - NUESTROS PRODUCTOS. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB www.solidaria.com.co EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560791527

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-49 Piso 12 Bogotá — CLIENTE

CBDE20700F0AF97D5B

12-12-2024

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Barrera * Celular: 312 342 8228 * Correo electrónico: defensorsolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: defensorsolidaria@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 29-38 oficina 721, Bogotá * Teléfono: (601) 791 81 88 * Fax: (601) 791 81 88 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://www.solidaria.com.co/wp-content/uploads/sites/2/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEL-TOMADOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

1910

Solidaria

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

J ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607957015

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000033365 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA NEIVA — COD AGE 560 — RAMO 74 — PAP.

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
11	12	2024	20	01	2025	23:59	20	05	2025	23:59	120	11	12	2024

VIGENCIA DESDE — A LAS — VIGENCIA HASTA — A LAS

MODALIDAD FACTURACIÓN ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA — VIGENCIA DEL ANEXO

DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
20	01	2025	23:59	20	05	2025	23:59	120

VIGENCIA DESDE — A LAS — VIGENCIA HASTA — A LAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT 901.854.721-5

DIRECCIÓN CR 47 NO 6 41 — CIUDAD NEIVA, HUILA — TELEFONO 3124958588

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT 901.854.721-5

DIRECCIÓN CR 47 NO 6 41 — CIUDAD NEIVA, HUILA — TELEFONO 3124958588

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 NIT : 901854721

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA CIUDAD: NEIVA

DIRECCION: SEGUN CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA % IVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00	
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00	
	PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	260,000,000.00	
	BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	260,000,000.00	
	RCE PATRONAL	260,000,000.00	
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00	
	CONTAMINACION	260,000,000.00	
	GASTOS MEDICOS	260,000,000.00	
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	260,000,000.00	

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUEDAN SIN MODIFICAR

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***260,000,000.00	$ **********	$ **********	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO — COASEGURO CEDIDO

NOMBRE	%	PART	VALOR ASEGURADO
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. 2119	100.00		

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN 18 DIC 2024
18-12-2024

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

(415)7701851000018(8020)000000000700356795701

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-45 Piso 12 Bogotá

ACOGNIZALEZ 0

CBDE20700F0AF97D58 — CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Defensor del Consumidor Financiero - Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 343 6270 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero - Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezluna@gmail.com
Dirección: Carrera 13A # 29-24 oficina 201, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Para mayor información le invitamos a consultar el boletín en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/sites/1/Carrera/2023/Servicios/FOLLETO DEFENSOR CONSUMIDOR FINANCIERO-30-01-2

Scanned with CamScanner

48

588

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607955274

PÓLIZA No: 560-47-994000182667 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD AGENCIA: 560 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	29	04	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	29	04	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.854.721-5

DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 3124958588

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: GOBERNACION DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.103.913-4

BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.103.913-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	04/03/2026	05/05/2026	336,524,785.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/03/2026	05/05/2026	504,787,178.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04/03/2026	05/11/2028	168,262,392.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	336,524,785.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 88141364 - SERRANO GONZALEZ, ARIEL - PART: 90.00%
NIT 901295090 - JCONSTRUCTORA SAS - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA SEGUN OTRO SI NO 1 DE FECHA 24/ABRIL/2025 EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO CONTRACTUAL EN EL TERMINO DE 2 MESES PARA UN PLAZO DE EJECUCION TOTAL DE 6 MESES.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ *1,346,099,141.60	$ **********248,936	$**********0.00	$ *******47,298	$ **********296,234

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00			

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FECHA DE APROBACIÓN: 29 ABR 2025
FIRMA DEL RESPONSABLE

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FEDERADOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA ENVIAR MENSAJES DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ANTERIORMENTE CONSIGNADOS. TENGO EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, SOLICITO POR ESCRITO, CORREO ELECTRÓNICO GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A https://www.solidaria.com.co/es/_digitalizacion/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, PREVIA, EXPRESA E INFORMADA AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y TÉCNICAS DE SEGUROS EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO CUANDO LA ACTIVIDAD LO REQUIERA, SU TRANSMISIÓN A TERCEROS PAÍSES, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA APLICARÁ LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE A: https://www.solidaria.com.co/ Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB EN EL MENÚ "SERVICIOS" OPCIÓN CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS.

(415)7701861000019(8020)000000000070005607955527

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

19/05/2025

CBDE20700D0FF47C5A

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Scanned with CamScanner

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
GRAN CONTRIBUYENTE RES 2409 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA NEIVA COD. AGENCIA 560 RAMO 47 No PÓLIZA 994000182667 ANEXO 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 IDENTIFICACIÓN NIT 901.854.721-5

ASEGURADO . GOBERNACION DEL HUILA IDENTIFICACIÓN NIT 800.103.913-4

BENEFICIARIO . GOBERNACION DEL HUILA IDENTIFICACIÓN NIT 800.103.913-4

TEXTO ITEM 1

SE INFORMA QUE, POR RAZONES INTERNAS DE LA COMPAÑIA, CADA VEZ QUE SE HAGA LLEGAR UNA MODIFICACIÓN, LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE LOS AMPAROS PASARA A SER AUTOMÁTICAMENTE A LA DE INICIO. ESTE AJUSTE RESPONDE A NECESIDADES DE CONTROL, PERO NO ALTERA EN NINGÚN ASPECTO LA PÓLIZA, YA QUE SE MANTIENE EL REGISTRO DE SU COMIENZO.

POR LO TANTO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO:

CUMPLIMIENTO 04/12/2024 HASTA 05/05/2026
BUEN MANEJO DE ANTICIPO 04/12/2024 HASTA 05/05/2026
PAGO DE SALARIOS 04/12/2024 HASTA 05/11/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04/12/2024 HASTA EL 04/12/2029

LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUEDAN SIN MODIFICAR

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1151 DE 2024 , DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA .

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

GOBERNACION DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACION
FECHA DE APROBACION 14 MAY 2025
FIRMA DEL RESPONSABLE

CLIENTE

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607957015

589

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000033365 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD AGE 560 — RAMO 74 — PAP

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
29 / 04 / 2025		20 / 06 / 2025	23:59	20 / 08 / 2025	23:59	61	29 / 04 / 2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	20 / 06 / 2025 / 23:59		20 / 08 / 2025 / 23:59		61

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.854.721-5
DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELEFONO: 3124958589

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.854.721-5
DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELEFONO: 3124958589
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN NIT: 001-0

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 NIT : 901854721

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA CIUDAD: NEIVA

DIRECCION: SEGUN CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284,700,000.00		
	PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	284,700,000.00		
	BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	284,700,000.00		
	RCE PATRONAL	284,700,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00		
	CONTAMINACION	284,700,000.00		
	GASTOS MEDICOS	284,700,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA,
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1151 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 REFERENTE A " MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA .

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***284,700,000.00	$ **********95,160	$*********0.00	$ *******18,080	$ **********113,240

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	119	100.00

COASEGURO CEDIDO

% PART	VALOR ASEGURADO

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN 19 MAY 2025
FIRMA DE RESPONSABLE

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE A ... Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA ... OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No 9A 45 Piso 12 Bogotá

CBDE20700D0FF57E5F

CLIENTE 19/05/2025

Defensor del Consumidor Financiero - Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriadelsolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero - Suplente: Jorge Humberto Martinez Luna * Celular: 310 223 4364 * Correo electrónico: martinezluna.abogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221 Bogotá * Telefono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Scanned with CamScanner

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA NEIVA | COD. AGENCIA 560 | RAMO 74 | No PÓLIZA 994000033365 | ANEXO 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT 901.854.721-5

ASEGURADO: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT 901.854.721-5

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

ASEGURADO Y BENEFICIARIO : GOBERNACION DEL HUILA Y TERCEROS AFECTADOS

AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

PERJUICIOS PATRIMONIALES:
DAÑO EMERGENTE: VALOR ASEGURADO $284.700.000 EVENTO/VIGENCIA
LUCRO CESANTE: VALOR ASEGURADO $284.700.000 EVENTO/VIGENCIA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES: VALOR ASEGURADO $284.700.000 EVENTO/VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA: VALOR ASEGURADO $284.700.000 EVENTO/VIGENCIA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: VALOR ASEGURADO $284.700.000 EVENTO/VIGENCIA
RCE PATRONAL: VALOR ASEGURADO $284.700.000 EVENTO/VIGENCIA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: VALOR ASEGURADO $284.700.000 EVENTO/VIGENCIA

SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

OBJETO DE LA GARANTIA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA SEGÚN OTRO SI NO 1 DE FECHA 24/ABRIL/2025 EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO CONTRACTUAL EN EL TERMINO DE 4 MESES PARA UN PLAZO DE EJECUCION TOTAL DE 8 MESES

SE INFORMA QUE, POR PAGOS INTERNOS DE LA COMPAÑIA, CADA VEZ QUE SE HAGA LLEGAR UNA MODIFICACIÓN, LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE LOS AMPAROS PASARA A SER AUTOMATICAMENTE A LA DE INICIO, ESTE AJUSTE RESPONDE A NECESIDADES DE CONTROL, PERO NO ALTERA EN NINGÚN ASPECTO LA PÓLIZA, YA QUE SE MANTIENE EL REGISTRO DE SU COMIENZO.

POR LO TANTO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO:

DESDE 04/12/2024 HASTA 20/08/2026

LOS DEMAS TERMINOS CONDICIONES QUEDAN SIN MODIFICAR

** AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS: OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O CONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES CONTRATADA O NO, CON LÍMITES MÍNIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL VEHÍCULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PÓLIZA.

** AMPARO PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA ARL

LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
- RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MEDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES
- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN 19 MAY 2025
FIRMA DEL RESPONSABLE

CLIENTE

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607955274

PÓLIZA No: 560-47-994000182667 ANEXO: 2

Compañía de Seguros

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD AGENCIA: 560 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	09	04	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	09	04	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.854.721-5

DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 3124958588

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . GOBERNACION DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.103.913-4

BENEFICIARIO: . GOBERNACION DEL HUILA — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.103.913-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	04/02/2026	04/03/2026	336,524,785.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/02/2026	04/03/2026	504,787,178.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04/02/2026	04/09/2028	168,262,392.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	336,524,785.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 88141364 - SERRANO GONZALEZ, ARIEL - PART: 90.00%
NIT 901295090 - JCONSTRUCTORA SAS - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE [illegible]

OBJETO DE LA GARANTIA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA SEGUN ACTA DE SUSPENCION NO 01 /2025 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2025 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 01/04/2025
LOS DEMAS TERMINOS CONDICIONES QUEDAN SIN MODIFICAR

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ *1,346,099,141.60	$ **********171,689	$*****5,000.00	$ *******33,533	$ **********210,022

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FEDEDIGNOS ME SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A https://www.solidaria.com.co/en_digitalcenter/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD. LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE. CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE ME CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/SALACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://aseguradorasolidaria.com.co/centrales-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co EN EL MENÚ "SERVICIOS" OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560795527

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE20700E06FD7658

Scanned with CamScanner

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA NEIVA | COD AGENCIA 560 | RAMO 47 | No PÓLIZA 994000182667 | ANEXO 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024	IDENTIFICACIÓN NIT	901.854.721-5
ASEGURADO	. GOBERNACION DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN NIT	800.103.913-4
BENEFICIARIO	. GOBERNACION DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN NIT	800.103.913-4

TEXTO ITEM 1

SE INFORMA QUE, POR RAZONES INTERNAS DE LA COMPAÑÍA, CADA VEZ QUE SE HAGA LLEGAR UNA MODIFICACIÓN, LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE LOS AMPAROS PASARA A SER AUTOMÁTICAMENTE A LA DE INICIO. ESTE AJUSTE RESPONDE A NECESIDADES DE CONTROL, PERO NO ALTERA EN NINGÚN ASPECTO LA PÓLIZA, YA QUE SE MANTIENE EL REGISTRO DE SU COMIENZO.

POR LO TANTO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO:

CUMPLIMIENTO 04/12/2024 HASTA 04/03/2026
BUEN MANEJO DE ANTICIPO 04/12/2024 HASTA 04/03/2026
PAGO DE SALARIOS 04/12/2024 HASTA 04/09/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04/12/2024 HASTA EL 04/12/2029

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1151 DE 2024 , DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA .

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607957015

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000033365 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD AGE: 560 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
09	04	2025		20	05	2025	23:59 A LAS	20	06	2025	23:59 A LAS	31	09	04	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	20	05	2025	23:59		20	06	2025	23:59	31
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.854.721-5
DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 3124958588

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.854.721-5
DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 3124958588
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN NIT: 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 NIT : 901854721

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA CIUDAD: NEIVA

DIRECCION: SEGUN CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284,700,000.00		
	PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	284,700,000.00		
	BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	284,700,000.00		
	RCE PATRONAL	284,700,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00		
	CONTAMINACION	284,700,000.00		
	GASTOS MEDICOS	284,700,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA SEGUN ACTA DE SUSPENCION NO 1 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2025 Y SEGUN ACTA DE REINICIO NO 01 DEFECHA 01 DE ABRIL DEL 2025 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUEDAN SIN MODIFICAR

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,700,000.00	$ **********43,524	$*********0.00	$ ********8,270	$ **********51,794

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENU "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560795701

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDE20700E06FE795B

CLIENTE

ACGONZALEZ 0

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 29-36 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web. https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor langa en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA NEIVA | COD AGENCIA 560 | RAMO 74 | No PÓLIZA 994000033365 | ANEXO 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024	IDENTIFICACIÓN NIT	901.854.721-5
ASEGURADO	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024	IDENTIFICACIÓN NIT	901.854.721-5
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN NIT	001-8

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1151 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 REFERENTE A " MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA .

ASEGURADO Y BENEFICIARIO : GOBERNACION DEL HUILA Y TERCEROS AFECTADOS

AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

PERJUICIOS PATRIMONIALES
DAÑO EMERGENTE: VALOR ASEGURADO $260.000.000 EVENTO/VIGENCIA
LUCRO CESANTE: VALOR ASEGURADO $260.000.000 EVENTO/VIGENCIA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES: VALOR ASEGURADO $260.000.000 EVENTO/VIGENCIA.
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA: VALOR ASEGURADO $6.000.000 EVENTO/VIGENCIA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: VALOR ASEGURADO $6.000.000 EVENTO/VIGENCIA
RCE PATRONAL: VALOR ASEGURADO $6.000.000 EVENTO/VIGENCIA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: VALOR ASEGURADO $1.000.000 EVENTO/VIGENCIA
SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

** AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS: OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O CONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES CONTRATADA O NO, CON LÍMITES MÍNIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL VEHÍCULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PÓLIZA.

** AMPARO PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA ARL

LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
- TODA RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MÉDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES
- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL

CLIENTE

Scanned with CamScanner

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000033365 ANEXO: 3 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 IDENTIFICACION: 901.854.721-5

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMP	901854721-5	SEGUN CONTRATO	NEIVA	284,700,000.00	43,524	51,794

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
43,524	51,794

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607955274

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000182667 ANEXO: 5

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	09	2025	12	02	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.854.721-5**

DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3124958588

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . **GOBERNACION DEL HUILA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.913-4**

BENEFICIARIO: . **GOBERNACION DEL HUILA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.913-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	04/03/2026	05/06/2026	360,178,403.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	04/03/2026	05/06/2026	540,267,604.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04/03/2026	05/12/2028	180,089,201.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	360,178,403.20

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 88141364 - SERRANO GONZALEZ, ARIEL - PART: 90.00%
NIT 901295090 - JCONSTRUCTORA SAS - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA SEGUN OTRO SI NO 2 DE FECHA 19/SEPTIEMBRE/2025 EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO CONTRACTUAL EN EL TERMINO DE 1 MES PARA UN PLAZO DE EJECUCION TOTAL DE 7 MESES Y ADICIONAR LA SUMA DE $118.268.088,82 PARA UN VALOR TOTAL DE $1.800.892.015,10

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,440,713,612.80	$ **********215,663	$*********0.00	$ *******40,976	$ **********256,639

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560795527

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE20700C0AFF7F57

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000182667 ANEXO: 5

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.854.721-5**

ASEGURADO: **. GOBERNACION DEL HUILA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.913-4**

BENEFICIARIO: **. GOBERNACION DEL HUILA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.913-4**

TEXTO ITEM 1

SE INFORMA QUE, POR RAZONES INTERNAS DE LA COMPAÑÍA, CADA VEZ QUE SE HAGA LLEGAR UNA MODIFICACIÓN, LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE LOS AMPAROS PASARA A SER AUTOMÁTICAMENTE A LA DE INICIO. ESTE AJUSTE RESPONDE A NECESIDADES DE CONTROL, PERO NO ALTERA EN NINGÚN ASPECTO LA PÓLIZA, YA QUE SE MANTIENE EL REGISTRO DE SU COMIENZO.

POR LO TANTO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO:

CUMPLIMIENTO 04/12/2024 HASTA 05/06/2026
BUEN MANEJO DE ANTICIPO 04/12/2024 HASTA 05/06/2026
PAGO DE SALARIOS 04/12/2024 HASTA 05/12/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04/12/2024 HASTA EL 04/12/2029

LOS DEMAS TERMINOS CONDICIONES QUEDAN SIN MODIFICAR

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1151 DE 2024 , DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA .

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607957015

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000033365 ANEXO:5

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGE: 560 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
25	09	2025	20	08	2025	23:59			30	09	2025	23:59		41	12	02	2026

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
20	08	2025	23:59		30	09	2025	23:59		41

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.854.721-5**

DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3124958588

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.854.721-5**

DIRECCIÓN: CR 47 NO 6 41 CIUDAD: **NEIVA, HUILA** TELÉFONO: 3124958588

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 NIT : 901854721

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA CIUDAD: NEIVA

DIRECCION: SEGUN CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284,700,000.00		
	PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	284,700,000.00		
	BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	284,700,000.00		
	RCE PATRONAL	284,700,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00		
	CONTAMINACION	284,700,000.00		
	GASTOS MEDICOS	284,700,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/CONTAMINACION/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DE LA GARANTIA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA SEGUN OTRO SI NO 2 DE FECHA 19/SEPTIEMBRE/2025 EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO CONTRACTUAL EN EL TERMINO DE 1 MES PARA UN PLAZO DE EJECUCION TOTAL DE 7 MESES Y ADICIONAR LA SUMA DE $118.268.088,82 PARA UN VALOR TOTAL DE $1.800.892.015,10

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,700,000.00	$ **********63,960	$*********0.00	$ *******12,152	$ **********76,112

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560795701

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

ACGONZALEZ 0

CBDE20700C0AFF7C5C

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000033365 ANEXO: 5

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.854.721-5**

ASEGURADO: **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.854.721-5**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

SE INFORMA QUE, POR RAZONES INTERNAS DE LA COMPAÑÍA, CADA VEZ QUE SE HAGA LLEGAR UNA MODIFICACIÓN, LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE LOS AMPAROS PASARA A SER AUTOMÁTICAMENTE A LA DE INICIO. ESTE AJUSTE RESPONDE A NECESIDADES DE CONTROL, PERO NO ALTERA EN NINGÚN ASPECTO LA PÓLIZA, YA QUE SE MANTIENE EL REGISTRO DE SU COMIENZO.

POR LO TANTO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO:
DESDE 04/12/2024 HASTA 30/09/2025

LOS DEMAS TERMINOS CONDICIONES QUEDAN SIN MODIFICAR

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1151 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 REFERENTE A " MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA .

ASEGURADO Y BENEFICIARIO : GOBERNACION DEL HUILA Y TERCEROS AFECTADOS

AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

PERJUICIOS PATRIMONIALES
DAÑO EMERGENTE: VALOR ASEGURADO $ 284,700,000 EVENTO/VIGENCIA
LUCRO CESANTE: VALOR ASEGURADO $ 284,700,000 EVENTO/VIGENCIA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES: VALOR $ 284,700,000 VENTO/VIGENCIA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: VALOR ASEGURADO $ 284,700,000 EVENTO/VIGENCIA
RCE PATRONAL: VALOR ASEGURADO $ 284,700,000 EVENTO/VIGENCIA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: VALOR ASEGURADO $ 284,700,000 EVENTO/VIGENCIA
GASTOS MEDICOS: VALOR ASEGURADO $ 284,700,000 EVENTO/VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA: VALOR ASEGURADO $ 284,700,000 EVENTO/VIGENCIA
SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

** AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS: OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL O CONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES CONTRATADA O NO, CON LÍMITES MÍNIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL VEHÍCULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PÓLIZA.

** AMPARO PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA ARL

LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
- TODA RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MÉDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES
- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000033365 ANEXO: 5 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALGRE 2024 IDENTIFICACION: 901.854.721-5

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMP	901854721-5	SEGUN CONTRATO	NEIVA	284,700,000.00	63,960	76,112

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
63,960	76,112

3.1.1 Socialización del proyecto

La socialización del proyecto se llevó a cabo el día 10 de diciembre de 2024, con la participación de las siguientes partes interesadas:

- Un delegado de la entidad contratante.
- Representación de la interventoría.
- Un representante de la administración municipal.
- Representantes del contratista.
- Miembros de la comunidad directamente involucrada en la ejecución de la obra.
- Miembros y delegados de la gobernación del Huila.

Durante esta actividad, el contratista presentó las actividades contractuales ante las partes interesadas, detallando los siguientes aspectos:

- Alcance físico de la obra, en sus componentes técnicos, jurídicos, económicos, sociales y ambientales.
- Cronograma contractual, especificando los tiempos estimados para la ejecución y entrega del proyecto.

La reunión sirvió como un espacio para establecer una comunicación abierta con la comunidad, garantizando que comprendieran los objetivos y las implicaciones del proyecto, fomentando la aceptación y la cooperación durante el desarrollo de la obra.

Registro fotográfico de actividad de Socialización del proyecto



Ilustración 1. *Socialización del Proyecto*



Ilustración 2. *Socialización del Proyecto*



Ilustración 3. *Socialización del Proyecto*



Ilustración 4. *Socialización del Proyecto*

3.1.2 Veeduría del proyecto

La veeduría ciudadana del proyecto, quedo conformada el día de la socialización del proyecto en el marco del mecanismo democrático de representación en el cual los ciudadanos y a las diferentes organizaciones comunitarias participantes ejercerán vigilancia al contrato de obra pública ejecutado en la zona, a través de sus representantes elegidos libremente y que conformaron la veeduría ciudadana, en lo relacionado con la ejecución del proyecto. Todo esto en cumplimiento de los principios constitucionales de participación ciudadana, deber y control social efectivo en la función del Estado; además acorde con la Ley 850 de 2003, relacionados con la participación de las veedurías en el control fiscal. De la presente actividad se suscribió el acta de veeduría ciudadana, debidamente firmada por los integrantes de la misma.

3.1.2.1 Acta de conformación de la Veeduría del proyecto

la fecha del presente informe se encontró conformada y debidamente suscrita el acta de apertura de la veeduría ciudadana, la cual se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2024, junto con el respectivo anexo de conformación de la veeduría del proyecto del presente contrato. Así mismo, se realizó el cierre formal de la veeduría, dejando constancia de la finalización de su ejercicio de seguimiento y control social conforme a lo establecido y sin observaciones pendientes por parte de los veedores.

3.1.2.1 Cierre del contrato y veeduría

la fecha del presente informe se realizó el cierre del contrato, llevando a cabo una reunión con la comunidad del sector intervenido con el fin de efectuar el cierre del proceso de veeduría ciudadana, así como la verificación de vecindad y el reconocimiento de las personas que resultaron afectadas durante la ejecución de las obras, dejando constancia de la finalización de las actividades y la socialización de los resultados del proyecto.

En ese mismo sentido se realizó el reconocimiento económico por algunos daños ocasionado, no directos del contratista, si embargo en acuerdo con las partes se asumió dicho compromiso, con la finalidad de hacer entrega a satisfacción y respectivas firmas de cierre en documentos de veeduría y actas de vecindad.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA VEEDURIA CIUDADANA PARA EL PROYECTO/OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA"

En el Municipio de Campoalegre - Huila, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2024, a las 3 p m, se realiza la reunión de Inicio compuesta por representantes del municipio de campoalegre, líderes del municipio y representantes del contratista, convocados por la Gobernación del Huila, con el objeto de promover la conformación de una veeduría ciudadana para **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA"**

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y a cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que la Personería Municipal, de acuerdo con sus funciones promueve la conformación de veedurías ciudadanas.

Que la comunidad congregada participó en la Consulta Ciudadana, organizada en el municipio de campoalegre.

El grupo de control social se compromete a realizar informes periódicos de su labor y a servir de interlocutor entre las instancias ejecutoras de los proyectos y la comunidad. Todos sus aportes seguirán los principios que rigen el control social, consignados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo

Que el municipio de campaolegre, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, han decidido conformar una veeduría local, la cual adelantará el ejercicio del control social a los compromisos adquiridos por los actores del sistema convocados por el Ministerio de Cultura.

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedoras y veedores a las personas que firmaron el acta de Conformación de la Veeduría Ciudadana en Construcción de: " **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA"**, según el artículo 3 de la Ley 850 de 2003.

SEGUNDO: La veeduría se denominará "Veeduría de REALIZAR el **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA**; estará domiciliada en esta población, su campo de acción será local y se acordó que la Veeduría se designa hasta el Recibo a Satisfacción de la Obra, por parte de la Entidad Territorial.

TERCERO: Las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	TELEFONO	FIRMA
Presidente	Jovica A. Novosel t	12130 007	3024778061	
Secretario	Geny Paola Gutierrez otro	36346634	3132554919	
Vocal				

Como funciones de la Veeduría se establecieron las siguientes:

- Denunciar oportunamente ante las autoridades locales sobre eventuales irregularidades en la ejecución del proyecto y en los casos pertinentes, poner en conocimiento de los organismos de control.
- Elaborar Informes o llevar las actas que evidencien el seguimiento a la Veeduría del Proyecto.
- Generar el espacio para hacer seguimiento al desarrollo y operación de la obra, realizando asambleas durante la ejecución de la obra.
- Gestionar y asistir a las capacitaciones requeridas para el cabal cumplimiento de sus funciones.
- Mantener el flujo de Información necesario entre Alcaldía Municipal de campoalegre, Comunidad e interventoria.
- Mantener informados a los beneficiarios de la naturaleza de los recursos y de todo lo relacionado con la obra.
- Ser proactiva contribuyendo con el normal desarrollo de la obra, cumpliendo sus funciones sin paralizar su ejecución.
- Velar por que las obras se terminen de acuerdo con las caracteristicas pactadas en el contrato y en el tiempo estipulado.

Siendo las 3:00 pm del día 10 del mes de diciembre del 2024, se da por terminada la reunión y para constancia firman:

Firmas

ARIEL SERRANO GONZALEZ
R.L. Consorcio mejoramiento campoalegre 2024
Contratista

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R.L. Consorcio Infraestructura Cauca
Interventoría

APOYO SUPERVISIÓN
DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA VIAS E INFRAESTRUCTURA.

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

Anexo listado de asistentes.

Firmas de los asistentes para la conformación de la veeduría (presidente, secretario u otros)

NOMBRE	CEDULA	TELEFONO
Claudia Patricia Castañeda	1.081.153.135	3217228187
Claudia Lorena Sambonis	1082744493	3133661586
Gloria Eloy Apache R	36.088.654	3123767428
Jesus Cuellar Lasso	83087702	3107618301
Rafaela Bastidas	36149512	
Hilber Borrero	83084511	3167148490
Oscar Osorio	4.946.397	3044406451
Yandi Lorena Solindo	36347163	3213454336
Anelly Zuñiga	36087853	3144611429
Ana Elisa Guilombo	26468465	3142293205
Bellanur Calderon Z.	36086671	3176803254
Beatriz Gutierrez	26468375	3124395740
Eliana Mildred Caviedes	1.079.175.224	3204995391
Jose Santos Gracia	83086986	3229259717
Andrés Ricardo Garcia	83090.219	3184688471
ALFREDO CULMA MEDINA	80206261	3134660891
CESAR A. OROZCO	1079389629	3235453877

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

Anexo listado de asistentes.

Firmas de los asistentes para la conformación de la veeduría (presidente, secretario u otros)

NOMBRE	CEDULA	TELEFONO
Mª Consuelo Valderrama	1079.174794	3144159890
gloria N. Tovar	36.086 364	8115508557
Silvia Murcia	VE07[illegible]03	315-7824363 2.
Irma Camilo [illegible]	40774 859	3107947161
Orlando Gamboa M.	83086719	313 8559143.
Jhon Jairo [illegible]	83089420	3158314838
Carmiña Mª Trujillo	36345.150	3185620701
[illegible] Pacheco	56345156	3127802924.
Angi lorena Norcia A.	1079172774	3165721536
[illegible]	5987957	
[illegible]	4.894919	3177015208
Maria Cristina Castillo	36088926	3123380379
Farith Mariaca Diaz	83085699	3123793119
Fabiola Guzmán G.	36089.724 c/gui.	3202052663
Mª Fernanda Trujillo	1079177430	3134363373.
Carmiña Mª Trujillo	36345150	3185620701
Yeny Paola Gutierrez O.	36346634	3132554919.
José Nelson Marín Patiño	83088778	3133193069.

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

3.2 Descripción de actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe

3.2.1. Componente técnico.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas acumuladas al corte del presente informe:

Tabla 3. *Actividades ejecutadas acumuladas*

CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES #3		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	+ / -	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1.1 PRELIMINARES						**$ 224,030,573.55**		**$ 1,222,236.60**		**$ 223,772,354.55**
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	$ 5,738.20		5,009.00	$ 28,742,643.80	213.00	$ 1,222,236.60	4964.00	$ 28,484,424.80
1.1.2	DEMOLICION DE BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE)	ml	$ 16,685.03		926.00	$ 15,450,337.78	0.00	$ 0.00	926.00	$ 15,450,337.78
1.1.3	DEMOLICION DE ASFALTO HASTA UN ESPESOR DE 10 cm (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	m²	$ 42,644.00		4,165.00	$ 177,612,260.00	0.00	$ 0.00	4165.00	$ 177,612,260.00
NP2	CORTE Y DEMOLICIÓN DE ANDENES	m²	$ 38,508.09		21.90	$ 843,327.17	0.00	$ 0.00	21.90	$ 843,327.17
NP3	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO	m³	$ 233,841.76		5.91	$ 1,382,004.80	0.00	$ 0.00	5.91	$ 1,382,004.80
1.2 SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS						**$ 1,515,368,344.77**		**$ 138,888,962.39**		**$ 1,504,247,693.81**
1.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN HASTA 2m, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	m³	$ 32,958.85		2,471.17	$ 81,446,921.35	217.63	$ 7,172,834.53	2462.47	$ 81,160,179.36
1.2.2	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.)	m²	$ 6,000.00		5,069.73	$ 30,418,380.00	273.73	$ 1,642,380.00	5024.73	$ 30,148,380.00

1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CON MATERIAL TRITURADO COMPACTADO A UNA DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN UN ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO (COMPRENDE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DEL MATERIAL) EN UN E=15 cm. NORMAS INVIAS VIGENTES	m³	$ 175,767.83		1,184.79	$ 208,248,583.46	61.88	$ 10,876,513.32	1176.92	$ 206,864,674.48
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 0,50X0,20X0,80 MTS, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	$ 82,556.81		1,269.80	$ 104,830,637.34	71.50	$ 5,902,811.92	1269.80	$ 104,830,637.34
1.2.5	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 45, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MAX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL (SEGUN DISEÑO)	m³	$ 1,020,000.00		1,012.71	$ 1,032,964,200.00	54.74	$ 55,834,800.00	1003.71	$ 1,023,784,200.00
NP1	REALCE DE POZOS, INCLUYE RETIRO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA, Y REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA, CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI.	UND	$ 1,431,234.16		17.00	$ 24,330,980.72	17.00	$ 24,330,980.72	17.00	$ 24,330,980.72

NP4	SUMINISRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D-(F´C=210 KGF/CM2).	m³	$ 926,525.16	21.28	$ 19,716,455.40	21.28	$ 19,716,455.40	21.28	$ 19,716,455.40
NP5	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV.	Kg	$ 9,389.00	1,428.50	$ 13,412,186.50	1,428.50	$ 13,412,186.50	1428.50	$ 13,412,186.50
1.3 SEÑALIZACION					**$ 27,044,663.40**		**$ 27,044,663.40**		**$ 27,044,663.40**
1.3.1	SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 3 (0,60M X 0,60M)	und	$ 447,802.64	9.00	$ 4,030,223.76	9.00	$ 4,030,223.76	9.00	$ 4,030,223.76
1.3.2	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	m²	$ 97,227.78	88.18	$ 8,573,545.64	88.18	$ 8,573,545.64	88.18	$ 8,573,545.64
1.3.3	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	ml	$ 7,397.62	1,952.10	$ 14,440,894.00	1,952.10	$ 14,440,894.00	1952.10	$ 14,440,894.00
TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 1,648,175,492.90**		**$ 1,766,443,581.73**		**$ 167,155,862.39**		**$ 1,755,064,711.76**
PAGA			**$ 15,944,348.38**		**$ 15,944,348.38**		**$ 900,000.38**		**$ 15,944,348.38**
PMT			**$ 18,504,085.00**		**$ 18,504,085.00**		**$ 1,042,080.00**		**$ 18,504,085.00**
VALOR TOTAL			**$ 1,682,623,926.28**		**$ 1,800,892,015.11**		**$ 169,097,942.77**		**$ 1,789,513,145.14**

A la fecha de la presentación del presente informe se han ejecutado las actividades que se relacionan a continuación:

- Se realizó excavación mecánica en material común hasta 2 m de profundidad, incluyendo el retiro y disposición del material producto de la excavación, en el sector correspondiente a la Carrera 5 y la Diagonal 9.
- Se realizó la conformación de la calzada existente, garantizando las condiciones adecuadas de nivelación y compactación en el tramo intervenido de la Carrera 5 y la Diagonal 9.
- Se realizó el suministro e instalación de base granular, como capa estructural de soporte para el pavimento, en el sector de la Carrera 5 y la Diagonal 9.

- Se realizó el suministro e instalación de sardinel prefabricado de 0,50 x 0,20 x 0,80 m, con el fin de delimitar la calzada y mejorar el confinamiento del pavimento en la Carrera 5 y la Diagonal 9.
- Se realizó el suministro e instalación de pavimento en concreto hidráulico MR-45, garantizando las especificaciones técnicas requeridas para la vía intervenida en la Carrera 5 y la Diagonal 9.
- Se realizó la instalación de señalización vertical y la demarcación de señalización horizontal, con el fin de garantizar la adecuada regulación del tránsito y la seguridad vial en la Carrera 5 y la Diagonal 9.
- Comité de obra No 1, 2 , 3,4,5 6 , 7 y 8 en la cual participaron miembros de la gobernación del Huila, Interventoría, alcaldía municipal, contratista, veeduría y población en general.
- Se realizó el cierre del contrato mediante reunión con la comunidad del sector intervenido, en la cual se efectuó el cierre del proceso de veeduría ciudadana y la entrega de las obras, actividad que se desarrolló con la presencia de la supervisora y la interventoría del proyecto. Durante la reunión se realizó la verificación de vecindad y el reconocimiento de las personas afectadas, quienes presentaron inundaciones en sus viviendas debido a las fuertes lluvias registradas en el sector durante la ejecución de las obras, dejando constancia de la finalización de las actividades y de la socialización de los resultados del proyecto.

3.2.2. Componente de seguridad y salud en el trabajo

3.2.1.1.Relación de Personal

El contratista ha designado el siguiente personal para las actividades administrativas y técnicas que exige la ley y de las cuales se ha confirmado su idoneidad:

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

MES	ITEM	CC	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO PENSION	FECHA RETIRO
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	1020810192	JESUS FELIPE CAMARGO	INGENIERO RESIDENTE	01/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	21/10/2025
	2	26593081	ARIEL SERRANO GONZALEZ	DIRECTOR DE OBRA	01/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	21/10/2025
	3	79450429	CHELMAN ROBERT HIGUERA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTO	01/04/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	21/10/2025
	4	11310184	MIGUEL ANTONIO LAGUNA PEREZ	TOPOGRAFO	01/04/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	PROTECCIÓN	21/10/2025
	5	1082158973	EDUARD FERNANDO GÓMEZ JOVEN	AUXILIAR DE OBRA	01/04/2025	SURA	SALUD TOTAL	COMFAMILIAR	PORVENIR	21/10/2025
	6	1075303221	MARÍA CAMILA POLANCO ROJAS	DIBUJANTE Y AUXILIAR ADM	6/12/2024	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	21/10/2025
	7	7708852	FAIBER POLANIA ANDRADE	INSPECTOR DE OBRA	01/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	21/10/2025
	8	1075208046	GABRIEL GUSTAVO PASTRANA FRANCO	ALMACENISTA	01/04/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	PORVENIR	21/10/2025
	9	4943584	FABIO ROMERO VARGAS	CONDUCTOR	01/04/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	COLFONDOS	21/10/2025
	10	1079176542	MAGDA GISELA CRUZ SANCHEZ	PROFESIONAL SST	01/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLFONDOS	21/10/2025
	11	1080184511	ALVARO JAVIER VILLALBA PUENTES	VIGILANTE	01/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	21/10/2025
	PERSONAL SUBCONTRATADO									
OCTUBRE	13	1080181807	FAJARDO CRUZ PABLO ANDRES	AUX. DE OBRA	01/10/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PROTECCION	21/10/2025
	14	12125256	CAQUIMBO DUSSAN DANIEL	AUX. DE OBRA	01/10/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	21/10/2025
	15	12208325	SEGURA ALEXANDER	AUX. DE OBRA	01/10/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	21/10/2025

19

3.2.1.2.Control de Personal de obra

Durante este periodo solo se conto con personal que improviso en actividades finales, lo tanto se adjunta Soporte de Pago de Seguridad Social.

3.2.2.1.1. Accidentes e incidentes

Durante este periodo no hubo ningún tipo de accidente e incidente durante la ejecución de la obra.

3.2.2.2. Inducción, Notificación de Peligros y Divulgación de Políticas – Cierre

Durante el período correspondiente al cierre del proyecto, no se realizaron nuevas inducciones, toda vez que el personal vinculado ya venía desarrollando actividades en obra desde períodos anteriores y contaba con su respectiva inducción inicial y reinducciones registradas conforme a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
No obstante, se dio continuidad al seguimiento permanente en campo, verificando el cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo y la correcta aplicación de las políticas establecidas por el proyecto.

Como parte del proceso de cierre, se procedió a reforzar y socializar nuevamente información clave a todo el personal activo, recordando:

- Los peligros y riesgos asociados a sus actividades.
- La obligatoriedad del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Las políticas de Responsabilidad Social y Ambiental.
- La política de prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
- El cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo.

Estas acciones permitieron fortalecer la cultura preventiva dentro del proyecto, garantizar la apropiación de las normas internas y cerrar el periodo contractual manteniendo condiciones seguras y controladas en cada frente de trabajo.

Ilustración 2. *Publicación de las Políticas de Seguridad en Obra.*

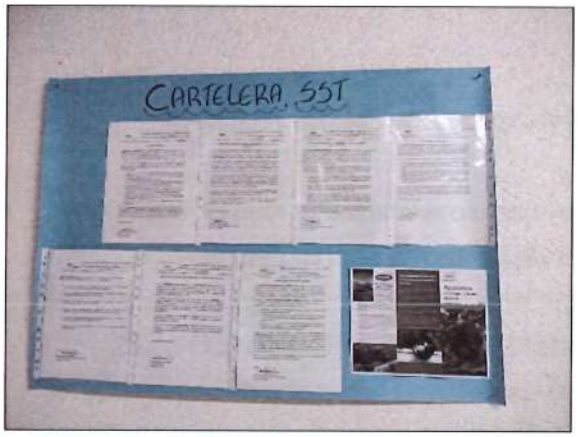


Ilustración 3. *Inducción, Notificación de Riesgos.*



3.2.1.2.1. Capacitaciones

Para el período final del contrato se dio cierre a las actividades formativas programadas dentro del SG-SST, toda vez que el personal ya había recibido las capacitaciones correspondientes en etapas anteriores del proyecto.

No obstante, como parte del proceso de finalización de obra, se desarrollaron jornadas de capacitación específicas en:

- Pausas activas, enfocadas en la prevención de fatiga física y sobrecarga muscular, promoviendo el bienestar del trabajador.
- Orden y aseo final en obra, reforzando la importancia de mantener condiciones seguras, prevenir actos y condiciones inseguras y garantizar la adecuada entrega del área intervenida.

Con estas actividades se aseguró el cumplimiento del plan de capacitación establecido y se cerró el componente formativo del SG-SST, manteniendo una cultura preventiva hasta la culminación del proyecto.

Tabla 2. Cronograma de Capacitaciones.

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	VERSION 1
	CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES	CODIGO SG-SST-F-01
		PAGINA 1 (1)

No	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5	
			Prog	Ejec	Prog	Prog	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1	POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
1.1	Divulgación política de SST	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.2	Divulgación política Ambiental	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.3	Divulgación política No alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.4	Divulgación política Uso adecuado de EPP	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.5	políticas del acoso laboral	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.6	política convivencia laboral	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.7	Reglamento higiene seguridad y salud en el trabajo	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
2	COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL/VIGÍA DE SALUD OCUPACIONAL											
2.1	Vigía Ocupacional: La empresa cuenta con menos de 10 trabajadores. COPASST si la empresa cuenta con más de 10 trabajadores	Prof. SST Residente	P	E	P	E						
2.2	Reunión mensual de COPASST	Prof. SST Residente					P	E				
3	SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA											
3.1	Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social	Talento Humano Contratista	ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES									
3.2	Campañas de prevención sobre control del fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo	Prof. SST Residente					P	E				
4	SUBPROGRAMA DE MEDICINA EN EL TRABAJO											
4.1	Suministro y registro de inspección de botiquín y camilla	Prof. SST Residente	P	E	P	E	P	E	P	E	P	
5	REGISTRO DE CAPACITACIONES ASST- AMBIENTAL											
5.1	Manejo de Herramientas	Prof. SST Residente	P	E	E		P	E			P	E
5.2	Pausas Activas	Prof. SST Residente	P	E	E							
5.3	Como atender un accidente	Prof. SST Residente			P	E			P	E		
5.4	Manejo de cargas	Prof. SST Residente			P	E						
5.5	Capacitación uso adecuado del kit de primeros auxilios	Prof. SST Residente					P	E			P	E
5.6	Separación de los residuos solidos	Prof. SST Residente	P	E					P	E	P	E
5.7	Taller de protección la fauna	Prof. SST Residente	P	E					P	E		
5.8	¿Cuál es el objetivo de las 3 R?	Prof. SST Residente	P	E			P	E			P	E
5.9	Como cuidar los animales en las cercanías del proyecto	Prof. SST Residente					P	E				
5.10	Importancia de darle buen uso a los guantes de Vaqueta para el medio ambiente	Prof. SST Residente			P	E					P	E
5.11	como reciclar en el área de trabajo	Prof. SST Residente			P	E			P	E		
6	EVALUACION EN SST											
6,1	Reporte de actos y condiciones inseguras, incidentes y accidentes y no conformidades al interior del Sistema de SST	Todo el personal	EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE									
6,2	Establecimiento de acciones correctivas, preventivas a los incidentes -accidentes presentados y a las no conformidades del sistema de SST	Prof. SST - Residente	EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE									
6,3	Informe mensual de SST	Prof. SST	P	E	P	E	P	E	P	E	P	
Fecha:		Elaboró:			Revisó				Aprobó			

1/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR DE PROYECTOS	REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO CONTROLADO			

PROGRAMADO	
EJECUTADO	

Ilustración 4. *Pausas Activas*



Ilustración 5. *Orden y aseo*



Formatos de Capacitaciones del Personal

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	30 min
Capacitación	X	Reinducción			LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		04 10 2025	Obra
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Magna Gisela Cruz				CARGO: Ing. SST
TEMA DEL EVENTO:	Orden y Aseo				

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Pablo Andres Lagardo	1080186107	Aux	Pablo Lagardo
2	Alexander Segura	12208325	Ayu	Alex
3	daniel Cagumbo	12735256	Aux.	Daniel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR	

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año		30 min
Capacitación	X	Reinducción						LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		04	10	25		oficina
NOMBRE DEL EXPOSITOR:		Magna Giseth Cruz					CARGO:	SST
TEMA DEL EVENTO:		PAUSAS ACTIVAS						

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ALEXANDER FIGUERA	12205325	Aguador	Alexander
2	Pablo fajardo.	1080181803	Aseo	Pablo fajardo
3	Daniel Caguimbo	12175256	Auxiliar	Daniel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR

3.2.1.2.2. Entrega de Elementos de protección Personal

Con la entrega oportuna de los Elementos de Protección Personal al personal vinculado y la verificación de su uso adecuado en obra, se dio cumplimiento a lo establecido en el SG-SST del proyecto. No quedaron entregas pendientes ni requerimientos adicionales, garantizando que los trabajadores contaran con la dotación necesaria para el desarrollo seguro de sus actividades. Con lo anterior, se procede al cierre satisfactorio del presente ítem.

Ilustración 6. *Entrega de Elementos de Protección personal al personal de obra.*



Ilustración 7. *Uso de EPP personal de obra.*



3.2.1.2.3. Inspecciones Realizadas en Obra

Durante el período evaluado se dio cumplimiento al programa de inspecciones establecido dentro del Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, verificando las condiciones de los equipos de emergencia, Elementos de Protección Personal y el mantenimiento del orden y aseo en el frente de trabajo.

Las inspecciones permitieron evidenciar el adecuado estado del botiquín, camilla y extintor, así como el cumplimiento en el uso de los EPP por parte del personal, garantizando condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

Con la culminación de las labores en obra y como parte del proceso de cierre del proyecto, se realizó el levantamiento del punto de primeros auxilios, asegurando previamente que no existieran actividades en ejecución ni personal expuesto a riesgos.

Con lo anterior, se da cierre satisfactorio al presente ítem, sin hallazgos pendientes ni condiciones inseguras por subsanar.

Ilustración 8. *Inspección Punto de primeros auxilios*



Ilustración 9. *Inspección final del Orden y aseo de obra.*



3.2.1.2.4. Señalización frentes de trabajo de obra

Durante la ejecución del proyecto se implementó la señalización preventiva, informativa y reglamentaria necesaria en los frentes de trabajo, con el fin de advertir a trabajadores, peatones y usuarios de la vía sobre las condiciones temporales de intervención y los riesgos asociados a las actividades constructivas.
Una vez culminadas las labores en obra, se procedió al levantamiento final de la señalización temporal instalada, garantizando que no quedaran elementos que pudieran generar confusión o interferencia en la movilidad del sector.

Posteriormente, se realizó la demarcación definitiva de la vía intervenida, asegurando condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial para los usuarios.
Con lo anterior, se da cierre satisfactorio al presente ítem, dejando la zona intervenida en condiciones óptimas de señalización y tránsito.

Ilustración 10. *Demarcación de La vía*



Ilustración 11. *Demarcación de la Vía*



3.2.3. Componente de gestión socio ambiental

3.2.3.1. Programas ambientales

Durante la ejecución del proyecto se realizó seguimiento permanente a los programas establecidos en la Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, verificando el cumplimiento de cada una de las medidas de prevención, control, mitigación y compensación definidas para los componentes ambientales intervenidos.

Se evidenció la implementación adecuada de las acciones planteadas, garantizando la minimización de impactos ambientales negativos y el fortalecimiento de los aspectos positivos derivados de la ejecución de la obra.

Al finalizar el proyecto, se verificó el cumplimiento del 100% de los ítems contemplados dentro del PAGA, dando efectivo cumplimiento a los compromisos ambientales adquiridos y asegurando que la intervención se desarrollara conforme a los principios de sostenibilidad y normatividad ambiental vigente.

Con lo anterior, se da cierre satisfactorio al Componente de Gestión Socio Ambiental, sin obligaciones pendientes por ejecutar.

Tabla 3. *nombres y códigos de los programas a implementar y sus respectivos proyectos.*

PROGRAMA	PROYECTO	CODIGO
Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental.	Conformación del grupo de gestión ambiental.	DAGA-1.1-01
	Capacitación y concientización al personal de obra.	DAGA-1.2-02
	Cumplimiento de los requisitos legales	DAGA-1.3-03
Programa actividades constructivas	Proyecto manejo integral de materiales de construcción	PAC-2.1-04
	Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales	PAC-2.3-06
	Manejo y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición y lodos.	PAC-2.4-07
	Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	PAC-2.5-08
programa gestión recurso hídrico	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	PGH-3-2-10
Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal.	PBSE-4.1-11
	Protección a la fauna	PBSE-4.3-13
Programa manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.	Proyecto Manejo de Maquinaria Equipos y Vehículos.	PMIT-5.3-17
Programas de Gestión Social.	Proyecto de Atención a la Comunidad.	PGS-6.1- 18
	Proyecto de Información y Divulgación	PGS-6.2- 19
	Proyecto de manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.	PBS-6.3-20
	Cultura Vial y Participación Comunitaria	PGS-6.5-22
	Contratación Mano de mano de obra	PGS-6.6-23

3.2.3.2.Actividades ambientales del PAGA

Durante el desarrollo del proyecto se ejecutaron de manera permanente las actividades contempladas dentro del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), garantizando el seguimiento, control y verificación de las acciones ambientales en cada frente de trabajo.
Las inspecciones, capacitaciones, monitoreos, manejo adecuado de residuos, control de maquinaria, atención a requerimientos y presentación de informes se realizaron conforme a lo programado, dejando los respectivos soportes y registros para validación de la Interventoría.
Se evidenció el cumplimiento satisfactorio de cada uno de los programas de manejo ambiental y de gestión social establecidos en el PAGA, asegurando la correcta aplicación de las medidas de prevención, mitigación y control ambiental.
Con lo anterior, se da cierre al presente ítem, confirmando el cumplimiento integral y efectivo de las actividades ambientales durante la ejecución del proyecto, sin compromisos pendientes.

3.2.3.3.Evaluación de los indicadores ambientales

Durante el periodo se realizaron las siguientes medidas de manejo ambiental con el grupo de gestión ambiental:

1. Recolección los residuos sólidos
2. Instalación de puntos ecológicos
3. Orden y Aseo de la obra
4. Verificación de que la documentación de los vehículos.
5. Disposición de RCD en sitio autorizado
6. Capacitación e inducción al personal de obra.
7. Charlas preoperacionales

Tabla 4. Cálculo de indicador ambiental

INDICADOR
• *7 medidas de manejo implementadas / 7 medidas de manejo implementadas* *100
7/7 * 100= 100%
Análisis: En el periodo se realizaron 7 medidas de manejo que se tenían consideradas.Por lo tanto, el indicador se cumple al 100%.

3.2.3.3.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales

Durante la ejecución de las actividades constructivas contempladas en el contrato 1151 de 2024, se realizó la identificación y evaluación permanente de los aspectos e impactos ambientales asociados a cada fase del proyecto, tales como excavación, cerramiento, señalización y pavimentación.

Como resultado del seguimiento efectuado, no se identificaron impactos ambientales significativos, manteniéndose un nivel de afectación mínimo y controlado, gracias a la implementación adecuada de las medidas establecidas en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).

En la etapa final del proyecto se ejecutaron actividades de cierre ambiental, incluyendo jornadas de orden y aseo, levantamiento final de obra, retiro de elementos temporales, demarcación definitiva de la vía e inspecciones generales para verificar la correcta entrega del área intervenida.

Con lo anterior, se confirma que el proyecto fue ejecutado bajo criterios de sostenibilidad y cumplimiento ambiental, dando cierre satisfactorio al presente ítem sin afectaciones relevantes al entorno.

3.2.3.3.2. Gestión ambiental derivada de los impactos ambientales

Durante el período evaluado se dio cumplimiento a los programas de manejo ambiental y social establecidos en el PAGA, ejecutando acciones orientadas a la prevención, mitigación y control de los impactos identificados en el desarrollo del proyecto.

Las actividades de capacitación, inspección, control operativo, manejo de residuos, protección de fauna y flora, señalización, atención a la comunidad y seguimiento a maquinaria fueron implementadas de manera continua y conforme a la planificación establecida, dejando los respectivos soportes y registros.

En la etapa final del proyecto se verificó que no quedaran medidas pendientes por ejecutar, garantizando el adecuado manejo de los recursos, la correcta disposición de materiales y la entrega del área intervenida en condiciones óptimas.

Con lo anterior, se da cierre satisfactorio a la gestión ambiental derivada de los impactos identificados, confirmando el cumplimiento integral de los compromisos ambientales y sociales adquiridos dentro del contrato.

3.2.3.3.3. Estado de cumplimiento de indicadores ambientales

Estado de cumplimiento de indicadores ambientales en el desarrollo del proyecto, se ha dado cumplimiento a los indicadores ambientales establecidos, destacando el adecuado manejo y disposición de los materiales sobrantes de obra. Inicialmente, se gestionó y habilitó un sitio de disposición autorizado por la Administración Municipal, destinado específicamente para recibir estos materiales con el propósito de su reutilización. Esta medida ha permitido reducir la generación de residuos, promoviendo un uso eficiente de los recursos y generando un impacto ambiental positivo.

Adicionalmente, se continúa utilizando la misma fuente de extracción de materiales pétreos aprobada al inicio de la obra, específicamente una cantera que cuenta con la totalidad de la documentación legal exigida, incluyendo permisos y licencias ambientales vigentes. Esta continuidad en la fuente de suministro garantiza la trazabilidad, legalidad y sostenibilidad en el uso de materiales, cumpliendo con las normas ambientales aplicables y contribuyendo al control de impactos negativos asociados a la explotación minera.

3.2.3.3.4. Implementación y Aplicación de las Fichas Técnicas Ambientales

Durante el período evaluado se dio cumplimiento a los programas de manejo ambiental y social establecidos en el PAGA, ejecutando acciones orientadas a la prevención, mitigación y control de los impactos identificados en el desarrollo del proyecto.

Las actividades de capacitación, inspección, control operativo, manejo de residuos, protección de fauna y flora, señalización, atención a la comunidad y seguimiento a maquinaria fueron implementadas de manera continua y conforme a la planificación establecida, dejando los respectivos soportes y registros.

En la etapa final del proyecto se verificó que no quedaran medidas pendientes por ejecutar, garantizando el adecuado manejo de los recursos, la correcta disposición de materiales y la entrega del área intervenida en condiciones óptimas.

Con lo anterior, se da cierre satisfactorio a la gestión ambiental derivada de los impactos identificados, confirmando el cumplimiento integral de los compromisos ambientales y sociales adquiridos dentro del contrato.

DAGA-1.2-02 CAPACITACIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL DE OBRA:

Durante el período comprendido entre el 01 al 21 de octubre del 2025, se registraron 10 capacitaciones ambientales y 10 actividades ambientales complementarias, desarrolladas en cumplimiento de lo establecido en la ficha técnica ambiental del PAGA.

Estas jornadas permitieron fortalecer la cultura ambiental del personal de obra, garantizando la apropiación de buenas prácticas relacionadas con el manejo adecuado de residuos, protección de flora y fauna y control de impactos derivados de las actividades constructivas.

Con los respectivos soportes documentales y registros de asistencia, se alcanzó el cumplimiento total de las metas establecidas para el indicador, dando cierre satisfactorio al presente programa conforme a los lineamientos ambientales del contrato.

(10⁄10) *100= 100% siendo (Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas) *100 donde los valores ≥ 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

(10⁄10) *100= 100% siendo (Número de Talleres ejecutadas / número de Talleres programadas) *100 donde los valores ≥ 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

Ilustración 12. *Como cuidar la naturaleza y Manejo Integral de Residuos Sólidos en Obra*



Ilustración 13. *Separación de Residuos en la Fuente y Uso Eficiente y Ahorro del Agua.*



Ilustración 14. *Control de Emisiones de Material Particulado y Protección de Flora*



Ilustración 15. *Prevención de Derrames y Uso del Kit Antiderrame*



Ilustración 16. *Control de Ruido y Responsabilidad Ambiental*



Ilustración 17. *Taller Práctico de Clasificación de Residuos en Obra y Jornada de Sensibilización Ambiental*

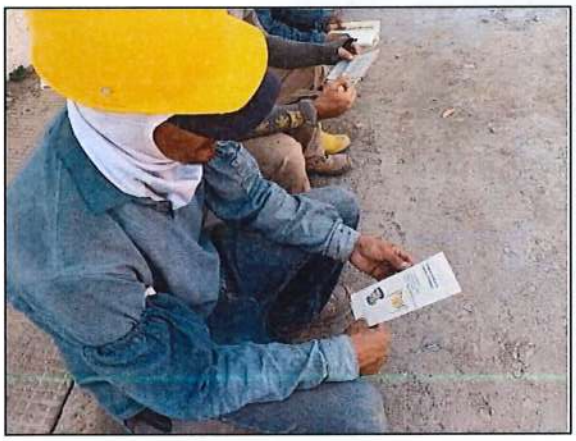


Ilustración 18. *Taller de Buenas Prácticas Ambientales*



Ilustración 19. *Actividad de Orden y Aseo y Cultura Ambiental*



Ilustración 20. *Taller manejo de Extintores y Practica en campo para atender un incendio.*



Ilustración 21. *Taller Recolección de Residuos y Conciencia Ambiental.*



Listado de asistencia

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL**	**Versión:** 001
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Código:** SG-SST-AMB-9
		Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año		30 min
Capacitación	X	Reinducción						LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		04	10	2025		Obra
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Magra Gisela Cruz						CARGO:	Ing. SST
TEMA DEL EVENTO:	Como Cuidar la naturaleza - Manejo Integral de los Residuos Solidos							

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	PABLO Andres Fajardo	1080181807	Ayudante	Pablo fajardo
2	Alexander Segura	12208325	Ayudante.	Alexander
3	Daniel Caquimbo D	12125856	Ayudante	Daniel.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR	

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE
DOCUMENTO CONTROLADO			

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año		30 min
Capacitación	X	Reinducción						LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		07	10	2025		Ing SST - Obra
NOMBRE DEL EXPOSITOR:		Magna Gisela Cruz					CARGO:	SST
TEMA DEL EVENTO:		Separación de los Residuos en la Fuente – Ahorro del Agua						

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Alexander Segura	1220533 75	Ayudante	Alexander
2	Pablo Andres Fajardo	1050181807	Ayu	Pablo Fajardo
3	Daniel Caquimbo	12125258	Ayudante	Daniel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR	

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año		30 mm
Capacitación	X	Reinducción						LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		24	10	25		Obra.
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Magna Gisela Cruz						CARGO:	Ing SST
TEMA DEL EVENTO:	Control de Emisiones de Material y protección ala Fauna							

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ALEXANDER FEQUPA	12205 325	Aguador	Alexander
2	Pablo fajardo.	1 080 181 803	Aguador	Pablo fajardo
3	Daniel Caguimbo	12175256	Aguador	Daniel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR	

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año		30 min
Capacitación	X	Reinducción						LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		21	10	25		El Recreo
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Mayra Gisela Cruz						CARGO:	Ing. SST
TEMA DEL EVENTO:	Control y Ruido - Responsabilidad Ambiental							

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Alexander Segura	12205375	Ayudante	Alexander
2	Pablo Andres Fajardo	1058181807	Ayu	Pablo Fajardo
3	Daniel Caquimbo	12125286	Ayudante	Daniel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR	

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Código: SG-SST-AMB-9
		Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO			INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año	30 min
Capacitación	X	Reinducción					LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		20	10	25	Obra
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Magnes Gisela Cruz.						CARGO: Ing. SST
TEMA DEL EVENTO:	Prevención del Kit antiderrames - Uso del Kit antiderrames						

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Alexander Segura	1220533 75	Ayudante	Alexander
2	Pablo Andres Fajardo	1050181807	Ayu	Pablo Fajardo
3	Daniel Caquimbo	1212528	Ayudante	Daniel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 01/10/2024

TIPO DE EVENTO			FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año	
Capacitación	X	Reinducción					LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		02	10	25	El Recreo
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Magna Gisela Cruz						CARGO: Ing. SST
TEMA DEL EVENTO:	Talleres – Clasificación de Residuos - Sensibilización Ambiental						

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ALEXANDER FOQUPA	12205325	Aguador	Alexander
2	Pablo fajardo.	1080181807	Aguador	Pablo fajardo
3	Daniel Caquimbo	12175256	Aguador	Daniel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR	

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año		30 min
Capacitación		X Reinducción						LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		13	10	25		Obra
NOMBRE DEL EXPOSITOR:		Magna Gisela Cruz					CARGO:	~~En~~ SST
TEMA DEL EVENTO:		Taller Orden y Aseo – Cultura Ambiental						

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Alexander Segura	12205 325	Aguador	Alexander
2	Pablo fajardo.	1 080 181 803	Aguador	Pablo fajardo
3	Daniel Caguimbo	12175256	Aguador	Daniel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR	

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Código: SG-SST-AMB-9
		Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año		30min
Capacitación		Reinducción						LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización	X	16	10	25		obra
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Magna Gisela Cruz.						CARGO:	SST
TEMA DEL EVENTO:	Taller manejo de Extintores - Practica en Campo							

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ALEXANDER FIGUERA	12205 325	Aguador	Alexander
2	Pablo fajardo.	1 080 181 803	Aguador	Pablo fajardo
3	Daniel Caguimbo	12175256	Aguador	Daniel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día	Mes	Año		
Capacitación		Reinducción						LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		X	20	10	25	Obra
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Magna Gizela Cruz						CARGO:	Ing SST
TEMA DEL EVENTO:	Taller recoleccion de Residuos - Cartilla Ambiental							

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ALEXANDER FIGUERA	12205 325	Aguador	Alexander
2	Pablo fajardo.	1 080 181 803	Aguador	Pablo fajardo
3	Daniel Caquimbo	12175256	Aguador	Daniel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EXPOSITOR

DAGA-1.3-03 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES:

Durante la ejecución del proyecto se garantizó el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales aplicables al contrato, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos en el PAGA.

El suministro de materiales pétreos fue realizado por la empresa CONSTRUCCIONES LIMAT S.A.S. – AGREGADOS PÉTREOS, proveedor autorizado, quien expidió el respectivo paz y salvo por concepto de compra y suministro de materiales, garantizando la legalidad de su procedencia y comercialización.

En cuanto a la disposición final del material sobrante de obra, esta se efectuó en el sitio autorizado por la Administración Municipal, contando con la certificación correspondiente emitida por el municipio, la cual respalda el adecuado manejo y disposición del material en cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales establecidas.

Con los soportes documentales correspondientes (paz y salvo del proveedor y certificación municipal de disposición), se evidencia el cumplimiento integral de los requisitos legales ambientales exigidos para la ejecución del proyecto.

(2/2) *100= 100% siendo (Número de permisos obtenidos / número de permisos requeridos por el proyecto) *100 donde los valores ≥ 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

Paz y salvo Materiales Pétreos

LIMAT
CONSTRUCCIONES SAS.

Neiva, 9 de febrero de 2026

CONSTRUCCIONES LIMAT S.A.S.

900.172.092-1

AGREGADOS PETREOS

CERTIFICA:

Que nuestra empresa le suministro los materiales de cantera al **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024** identificada con Nit 901854721-5, y está a PAZ Y SALVO por todo concepto.

La presente certificación se expide en Neiva a los 9 días del mes de febrero del año 2026 a solicitud del interesado.

Atentamente,

LINA MARGARITA TRUJILLO BERNAL
Representante Legal
CONSTRUCCIONES LIMAT S.A.S.

Paz y salvo Sitio de Disposición de Escombros

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

CERTIFICA:

Que el material sobrante y de movimientos de tierra provenientes del proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA", el cual ha sido utilizado para el mejoramiento de la malla vial urbana del municipio de Campoalegre.

En particular, 350 m ³de material de excavación y 80 m³ de material proveniente de demolición de asfalto, sobrantes del proyecto, fueron reutilizados en actividades de mantenimiento de vías urbanas y para rellenos solicitados por la comunidad, en cumplimiento de las necesidades del entorno urbano.

La autorización escrita para dicha disposición hace parte integral de la presente certificación. Este material ha sido reutilizado en el marco de actividades destinadas al mejoramiento o estabilización de la malla vial del municipio, las cuales se encuentran dentro de los programas establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Campoalegre.

Esta medida se adopta considerando que el municipio de Campoalegre (Huila) no cuenta actualmente con un sitio de disposición final para material aluvial y/o escombros (escombreras). Así mismo, se tiene en cuenta lo dispuesto en la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, "por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", específicamente lo establecido en su Artículo 11 – Disposición final de RCD, el cual indica que los municipios y distritos deberán seleccionar sitios específicos para disposición final de estos residuos, ya sean de carácter regional o local.

Finalmente, se resalta que el contratista ha tenido en cuenta todas las medidas de manejo ambiental de manera eficiente, sin poner en peligro la salud humana ni utilizar procedimientos que puedan afectar negativamente el medio ambiente, evitando riesgos sobre recursos hídricos, suelo, aire, flora, fauna, o impactos paisajísticos y auditivos.

Se expide la presente certificación en Campoalegre, Huila, a los cinco (01) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

RODRIGO MOLANO CUELLAR
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS SOCIALES

PROYECTADO POR: (firma)	REVISADO POR: (firma)	APROBADO POR: (firma)
NOMBRE: Daniel Francisco Gutiérrez Casanova	NOMBRE: Cristhian Ricardo López Cuellar	NOMBRE: Rodrigo Molano Cuellar
CARGO: Apoyo Profesional	CARGO: Director Operativo	CARGO: Secretario De Planeación, Infraestructura y Asuntos Sociales

Certificaciones de Cumplimiento Ambiental expedido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)

DTN-

Neiva,

Numero de radicado: 3261 2026-S
Fecha y Hora: 10/02/2026 14:08:53

Señor:
ARIEL SERRANO GONZALEZ
Representante legal **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024**
Email: consorciomejoramiento2024@gmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta a petición con radicado CAM No. 2026-E 1826.

Reciba un cordial saludo.

De manera atenta y en respuesta al radicado del asunto a través del cual solicita "… *expedir certificación o paz y salvo ambiental, previa verificación en el Centro de Información de Trámites Ambientales y demás aplicativos de la Corporación, que no se registran denuncias ambientales ni procesos sancionatorios en los registros de esa Autoridad Ambiental en relación con el proyecto denominado: Contrato de obra No. 1151 de 2024; objeto "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA". El proyecto fue ejecutado en jurisdicción del municipio de Campoalegre – Huila por CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 NIT. 901854721 (…)"*; comedidamente me permito informarle que, consultados los sistemas de información de la Corporación (CITA – SILA), no se identifica en esta Dirección Territorial, denuncias y/o proceso sancionatorio ambiental en contra el CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 con NIT. 901.854.721, correspondiente a la vigencia 2024 a la fecha.

Sin otro particular,

CAROLINA TRUJILLO CASANOVA
Directora Territorial Norte

Documentos Facilitativos / Derecho de petición
Proyectó: DCardoza – Profesional Universitario DTN
Oficio: 2026-E 1826

79

PAC-2.3-06 SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES:

Durante la ejecución del proyecto se contó con señalización preventiva, informativa y cerramientos temporales en los diferentes frentes de trabajo, garantizando la seguridad de peatones, trabajadores y comunidad en general, conforme a los lineamientos establecidos en el PAGA y la normatividad vigente.

Para el período final evaluado, y una vez culminadas las actividades constructivas, se procedió al retiro y levantamiento total de la señalización temporal y de los elementos de cerramiento que se encontraban instalados en la zona de intervención, verificando que no quedaran estructuras, avisos o materiales que pudieran generar confusión o afectar la movilidad del sector.

Posteriormente, se realizó la demarcación definitiva de la vía intervenida, asegurando condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial para los usuarios.

(1/1) *100= 100% siendo (Número de frentes de obra señalizados adecuadamente / número de frentes de obra) *100. Donde los valores iguales a 100 demuestran el cumplimiento del indicado.

Ilustración 22. *Demarcación de la vía*



Ilustración 23. *Demarcación de La vía*



PAC-2.1-04 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Durante la ejecución del proyecto se dispuso de un predio tipo vivienda como área temporal de almacenamiento de materiales de construcción, el cual fue acondicionado para garantizar el adecuado manejo y conservación de insumos como arena, grava y demás materiales requeridos en obra.

El espacio contó con condiciones apropiadas de protección frente a factores climáticos, ventilación adecuada y organización interna, permitiendo un almacenamiento seguro, controlado y evitando la generación de pérdidas, desperdicios o afectaciones ambientales. Asimismo, se implementaron controles para la correcta manipulación, cargue y descargue de materiales, reduciendo riesgos operativos y ambientales.

Como parte del manejo integral, se llevó control mediante inventario de los materiales almacenados, asegurando su uso eficiente y trazabilidad durante el desarrollo de las actividades constructivas.

En la etapa de cierre del proyecto, se realizó el levantamiento total de los materiales adicionales o sobrantes, procediendo a su retiro y desplazamiento del lugar de almacenamiento, dejando el predio en condiciones adecuadas y libres de acopios.

Adicionalmente, se efectuó la solicitud y recopilación de los respectivos paz y salvos ambientales relacionados con la compra y suministro de materiales, con el fin de respaldar la legalidad de su procedencia y dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la ficha ambiental del PAGA.

Con lo anterior, se da cierre satisfactorio al presente programa, evidenciando el cumplimiento integral de las medidas de manejo y control ambiental asociadas a los materiales de construcción utilizados en el proyecto.

Paz y Salvo ambiental de material de Construcción.

LA DIRECCION NACIONAL DE CREDITO Y CARTERA DE GYJ FERRETERIAS S.A

CERTIFICA QUE

La empresa **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOLAGRE 2024 c**on NIT **901854721-5** se encuentra vinculada con **GYJ FERRETERIAS S.A** identificada con el **Nit 800130426-3.** en calidad de cliente quien se encontraba manejando la modalidad de Anticipado, a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto

El presente certificado se expide por solicitud del interesado al **10 d**ías del mes de **diciembre** del año **2025**

Atentamente,

Laura Tatiana Ruiz Bonilla
Asistente Crédito y Cartera
Calle 94ª No11ª 27 piso 5
Tel.6220320
Cons:87

91

Neiva, febrero 17 de 2026

Señores:
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
NIT. 901.854.721-5

ASUNTO: PAZ Y SALVO

Por medio de la presente informamos que la empresa en asunto se encuentra a paz y salvo por todo concepto con CONCREMEX S.A.S., identificada con NIT. 900.684.724-3, en el suministro de concreto correspondiente a la obra ubicada en el municipio de Campoalegre Huila en el proyecto "Construcción Pavimento Rígido", cumpliendo con todos los compromisos adquiridos.

La presente se expide a solicitud del interesado en el municipio de Neiva Huila a los Diecisiete (17) días del mes de febrero del 2026.

Cordialmente,

ELENA CADENA CASAS
ADMINISTRADORA
CONCREMEX S.A.S.
Móvil 310 8728520
concremex1@gmail.com

APLIKAR
Soluciones Industriales S.A.S

Bogotá, Febrero 17 de 2026

PAZ Y SALVO

A quien interese:

Por medio de la presente nos permitimos informar que la empresa CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 identificada con NIT: 901.854.721-5, se encuentra a paz y salvo con APLIKAR SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS por concepto de pagos o saldos pendientes derivados de la venta de materiales a corte del 31 de diciembre de 2025.

Cordialmente;

MILENA PICO ALVAREZ
Representante Legal
CC: 22.478.505 de Barranquilla

Dirección: Carrera 46 No. 171-41 Bogotá. Teléfonos: 3101911
Celular: 310-2824303 / 313-4714376 / 312-2982444
e-mail: gerencia@aplikar.com.co
www.aplikar.com.co

PAC-2.5-08 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES:

Durante la ejecución del proyecto se mantuvo habilitado y señalizado el punto ecológico para la adecuada clasificación y disposición de los residuos generados en obra, garantizando su manejo conforme a los lineamientos establecidos en el PAGA y la normatividad ambiental vigente.

Se realizaron inspecciones periódicas al punto ecológico, dejando los respectivos registros, con el fin de verificar su correcto funcionamiento y promover la cultura de separación en la fuente entre el personal vinculado al proyecto.

Para el período evaluado no se generaron residuos aprovechables, evidenciando un adecuado control en el consumo de materiales y en la minimización de residuos.

Con lo anterior, se da cierre satisfactorio al presente programa, confirmando el cumplimiento de las medidas de manejo y disposición de residuos sólidos implementadas durante la ejecución del proyecto, sin obligaciones pendientes.

(0/0) *100= 100% siendo (Volumen de materiales de residuos sólidos aprovechables /Volumen de material de residuo aprovechable dispuesto) *100 donde los valores iguales a 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

Ilustración 24. *Punto Ecológico*



PBSE-4.3-13 PROTECCIÓN A LA FAUNA

Durante el período evaluado no se ejecutaron actividades específicas correspondientes a la ficha técnica protección a la Fauna, debido a que las labores desarrolladas no generaron intervención en áreas con presencia de fauna silvestre ni situaciones que requirieran acciones adicionales de manejo o capacitación.

No obstante, se mantuvo el seguimiento preventivo en campo, garantizando que las actividades ejecutadas no ocasionaran afectaciones a la fauna del área de influencia.

En consecuencia, para el período reportado no se registran actividades ejecutadas ni impactos asociados a este componente, dando cierre a la ficha técnica sin obligaciones pendientes.

(0/0) *100= 100% siendo (No. de actividades implementadas/No. Total, de actividades programadas) *100 donde los valores iguales a 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

PGH-3-2-10 PROGRAMA USO Y MANEJO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO

Durante el período evaluado, el proyecto realizó el uso del recurso hídrico exclusivamente para actividades constructivas menores tales como preparación de mezclas, humectación de superficies y servicios provisionales de obra, garantizando en todo momento un consumo racional y controlado.

Se implementaron medidas de ahorro y uso eficiente del agua, evitando desperdicios, controlando puntos de abastecimiento y verificando permanentemente el adecuado estado de las conexiones temporales instaladas en obra. No se evidenciaron fugas, vertimientos inadecuados ni afectaciones a fuentes hídricas superficiales o subterráneas.

Como soporte del cumplimiento normativo, el proyecto cuenta con certificación de paz y salvo vigente expedida por la empresa prestadora del servicio de acueducto, en la cual se deja constancia de que el suministro utilizado para las actividades del contrato se encuentra autorizado y al día en sus obligaciones económicas, sin presentar mora ni requerimientos pendientes.

En consecuencia, el programa de Uso y Manejo Eficiente del Recurso Hídrico presenta cumplimiento satisfactorio durante el período evaluado, sin hallazgos ambientales ni observaciones por parte de la interventoría.

Paz y Salvo Uso del Agua

PAZ Y SALVO

, USO DE AGUA – BENEFICIARIO CERCANO AL PROYECTO

Yo, Carlos Alberto Giraldo., mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4946391., residente en el sector cercano al área de influencia del proyecto, Certifico que autoricé el uso y suministro de agua de mi propiedad para la ejecución del **Contrato de Obra No. 1151 de 2024**, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**.

Dejo constancia de que dicho uso se realizó de común acuerdo, sin que a la fecha existan reclamaciones, cobros, afectaciones o compromisos pendientes derivados del suministro del recurso hídrico.

Por lo anterior, expido el presente Paz y Salvo para los fines legales y contractuales a que haya lugar, especialmente para la liquidación del contrato.

Se firma en Campoalegre (Huila), a los 12 días del mes de Febrero de 2026.

Carlos A. Giraldo

Nombre del beneficiario
C.C. No. 4-946391
Dirección / Sector
Teléfono

Powered by CamScanner

PMIT-5.3-15 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Durante el período comprendido entre el 01 al 21 octubre del 2025, las actividades en obra se limitaron únicamente a labores de limpieza y organización, por lo cual no se realizó operación activa de maquinaria pesada.
La maquinaria, equipos y vehículos permanecieron en condiciones adecuadas de resguardo, con documentación vigente y en óptimo estado técnico-mecánico. No se presentaron incidentes, emisiones significativas ni situaciones que generaran impactos ambientales.
En consecuencia, la ficha presenta cumplimiento satisfactorio durante el período evaluado.

PGS-6.1-18 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD – CIERRE

Durante el período evaluado, el punto de atención a la comunidad permaneció habilitado para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), sin que se registraran solicitudes que afectaran el desarrollo del proyecto.

Con el fin de respaldar formalmente esta situación, se realizó solicitud ante la Personería Municipal para la expedición del respectivo paz y salvo, certificando la inexistencia de PQRS relacionadas con la ejecución del contrato.

Con lo anterior, se da cierre satisfactorio al presente ítem, dejando constancia de que no quedaron requerimientos pendientes por atender y que el proyecto culminó sin inconformidades registradas por parte de la comunidad.

(0/0) *100= 100% siendo (N° de peticiones y quejas realizados / N° de peticiones y quejas contestados) *100. Donde los valores iguales a 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

Paz y Salvo Personería Municipal NO PQRS

Personería de Campoalegre

Al contestar por favor cite estos datos:
P.M.C. 081/26

Campoalegre, febrero 14 de 2026

Señor,
ARIEL SERRANO GONZÁLEZ
C.C. No. 88.141.364 de Ocaña – Norte de Santander
Representante Legal Consorcio Mejoramiento Campoalegre 2024
consorciomejoramiento2024@gmail.com

Asunto: Respuesta solicitud certificación Paz y Salvo

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud radicada ante este Despacho el día 28 de enero de 2026, mediante la cual solicita certificación en la que conste que no reposan Peticiones, Quejas o Reclamos (PQR) en contra del CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024, identificado con NIT 901854721-5, me permito informar lo siguiente:

Que, revisados los libros de correspondencia, el sistema de radicación y los archivos físicos y digitales de la Personería Municipal de Campoalegre, la Secretaría de esta entidad certifica que no reposan solicitudes de Peticiones, Quejas o Reclamos (PQR) en contra del CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024, durante el período correspondiente al Contrato de Obra No. 1151 de 2024, cuyo objeto es: "*Mejoramiento de vías urbanas mediante la construcción de pavimento rígido en la Diagonal 9 del Municipio de Campoalegre, Departamento del Huila*".

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines pertinentes relacionados con la liquidación contractual.

Atentamente,

IVONNE GIGLIOLA FIESCO HOYOS
Personera Municipal

PGS-6.2-19 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN:

Durante la ejecución del proyecto se garantizó el seguimiento a los mecanismos de información y divulgación establecidos en el Plan de Gestión Social, manteniendo los canales de comunicación disponibles para la comunidad y los actores institucionales.

En la etapa final, se realizó la entrega oficial de la vía ante el ente contratante, dejando constancia del cumplimiento de las actividades contractuales y de las condiciones técnicas establecidas.

Asimismo, se procedió al cierre formal de la veeduría ciudadana, dando por finalizado el proceso de acompañamiento comunitario sin observaciones ni requerimientos pendientes.

Con lo anterior, se da cierre satisfactorio al presente ítem, evidenciando el cumplimiento de los compromisos de información, divulgación y participación social contemplados dentro del proyecto.

(1/1) *100= 100% siendo (Nº reuniones programadas / Nº de reuniones realizadas) *100.
Donde los valores iguales a 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

Ilustración 25. *Entrega del Proyecto*



Ilustración 26. *Entrega del Proyecto*



Paz y Salvo Resolución de Cierre de Veeduria
expedida por personería Municipal

Al contestar por favor cite estos datos:
P.M.C. 662/25

Campoalegre, diciembre 17 de 2025

Señores,
INTEGRANTES DE LA VEEDURÍA CIUDADANA
Contrato de Obra No. 1151-2024
Municipio de Campoalegre
javierantonionf2@gmail.com

Asunto: ***Cierre de acompañamiento a Veeduría Ciudadana – Contrato de Obra No. 1151-2024***

Cordial saludo,

La Personería Municipal de Campoalegre, en ejercicio de las funciones constitucionales y legales consagradas en los artículos 118 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y la Ley 850 de 2003, se permite manifestar lo siguiente:

Que esta Agencia del Ministerio Público recibió Acta suscrita por los integrantes de la Veeduría Ciudadana, con fecha 05 de diciembre de 2025, mediante la cual dejan constancia del cierre formal de la labor de seguimiento y control social adelantada frente al Contrato de Obra No. 1151-2024, cuyo objeto corresponde al *Mejoramiento de vías urbanas mediante la construcción de pavimento rígido en la Zona Novena del municipio de Campoalegre, departamento del Huila*.

Que, en la citada acta, los integrantes de la veeduría manifiestan haber culminado su ejercicio de control social, ratificando el cumplimiento de su labor conforme a los principios de participación ciudadana y control social, y dando por concluida su actuación respecto del proyecto mencionado.

Que la veeduría ciudadana fue reconocida mediante la Resolución No. 024 del 20 de mayo de 2025, "*por medio de la cual se reconoce la inscripción de una veeduría ciudadana en el municipio de Campoalegre*", acto administrativo que sirvió de soporte para el acompañamiento institucional realizado por esta Personería.

En consecuencia, y una vez recibido el documento de cierre presentado por la veeduría, la Personería Municipal da por finalizado el acompañamiento y orientación institucional brindados, procediendo al archivo del expediente correspondiente.

Al contestar por favor cite estos datos:
P.M.C. 662/25

La Personería Municipal deja expresa constancia de que su actuación se limitó al acompañamiento y orientación del ejercicio de control social, sin que ello implique certificación, aval, validación técnica, contractual, financiera o fiscal de la obra ejecutada, competencias que corresponden exclusivamente a la entidad contratante, la interventoría y los organismos de control respectivos.

El presente oficio se expide para los fines pertinentes.

Atentamente,

IVONNE GIGLIOLA FIESCO HOYOS
Personera Municipal

cc. consorciomejoramiento2024@gmail.com

PGS-6.6-23 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA:

En concordancia con lo establecido en el Plan de Gestión Social y conforme al seguimiento efectuado durante el período comprendido entre el 01 al 21 de octubre del 2025, se verificó el cumplimiento del indicador relacionado con la priorización de mano de obra local dentro del área de influencia del proyecto.

El proyecto contó con un total de 25 personas vinculadas laboralmente, garantizando que el 100% del personal operativo correspondiera a trabajadores residentes en la zona, cumpliendo así con el porcentaje mínimo exigido para la contratación de mano de obra regional.

Con el fin de brindar mayor transparencia y respaldo comunitario al proceso de vinculación laboral, se solicitó certificación al veedor principal del proyecto, quien validó la participación de personal del área de influencia. Lo anterior se realizó considerando que, debido al reciente fallecimiento del presidente de la Junta de Acción Comunal, no fue posible contar con su certificación directa. En consecuencia, la validación fue emitida por el representante comunitario que actualmente ejerce funciones de seguimiento y control social al contrato.

En virtud de lo anterior, se concluye que el programa PGS-6.6-23 presenta cumplimiento satisfactorio para el período evaluado, sin observaciones ni requerimientos pendientes por parte de la interventoría.

Paz y Salvo de la contratación de la mano de obra del proyecto

PAZ Y SALVO
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

CERTIFICADO:

El suscrito Presidente de la Junta de Acción Comunal de Ferro Diagonal 9, en uso de sus facultades y funciones comunitarias, Certifica que el contratista encargado de la ejecución del **Contrato de Obra No. 1151 de 2024**, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA", cumplió con la contratación de mano de obra local**, priorizando personal residente en la zona de influencia del proyecto, conforme a los compromisos sociales establecidos durante la ejecución de la obra.

Así mismo, se deja constancia de que no existen reclamaciones, inconformidades ni obligaciones pendientes por parte de la comunidad relacionadas con la vinculación laboral del personal de la zona, razón por la cual se expide el presente Paz y Salvo para los fines pertinentes, especialmente para el proceso de liquidación del contrato.

Se expide la presente certificación en el municipio de **Campoalegre (Huila)**, a los 12 días del mes de Febrero de 2026.

Atentamente,

Carlos A. Giraldo

Nombre del Presidente(a):
Presidente Junta de Acción Comunal :
C.C. No. 4-97639?
Teléfono: _____

Powered by CamScanner

PGS-6.7-1 PROYECTO DE MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Previo al inicio de las actividades constructivas, se realizó el levantamiento de actas de vecindad con el fin de registrar el estado inicial de la infraestructura de los predios colindantes y de los servicios públicos existentes en el área de influencia del proyecto. Este procedimiento permitió documentar de manera detallada las condiciones físicas iniciales y establecer un soporte técnico para el seguimiento durante la ejecución de la obra.

Dentro de la verificación efectuada se incluyeron aspectos relacionados con el estado de vías de acceso, andenes, cerramientos, redes de acueducto y alcantarillado, suministro de energía eléctrica y demás elementos de infraestructura susceptible de afectación por las actividades constructivas. La información recopilada sirvió como línea base para prevenir impactos y definir medidas de manejo y protección.

Una vez finalizadas las actividades del proyecto, se procedió a realizar el cierre de las actas de vecindad, efectuando visita de verificación a los predios previamente registrados. Como resultado del proceso de revisión, no se evidenciaron afectaciones atribuibles a la ejecución del contrato sobre la infraestructura ni sobre los servicios públicos existentes, dejándose constancia del recibo a satisfacción por parte de los propietarios o responsables de los inmuebles verificados.

En consecuencia, se cumplió con lo establecido en la ficha de manejo, quedando debidamente cerrado el proceso de actas de vecindad y sin reclamaciones pendientes asociadas a posibles daños o interferencias en predios y servicios públicos.

Cierre del acta de vecindad

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024**
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOF** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Zenaida Guzmán Cordoba
Nº de Identificación: 1144624771 Direccion: Calle 29 #2-55
ILocalizacion: Barrio villa clarita etapa 2.
Teléfonos: 3203796490 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Teléfonos			
5. Gas			

USO ACTUAL

1. Agropecuario	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
2. Vivienda	[X]	1. Propia	[X]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
3. Comercial	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
4. Institucional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
5. Deshabitado	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
6. Parqueadero	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
7. Recreacional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
8. Inst. educativa	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- El anden de la fachada se encuentra rustica, con bastante deterioro y grietas.
- la fachada se encuentra en bloque tolete común, se evidencia en buen estado.

- la puerta y las ventanas, son metálicas, los vidrios se encuentran en buen estado.

187

CONSORCIO MEJORAMIENTO ZAMBRANO 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- La cubierta de la vivienda se encuentra en zinc y estructura metálica, en buen estado.
- El piso de la vivienda se encuentra esmaltado de color amarillo, con bastante deterioro
- Los muros de la vivienda en bloque tolete común, en buen estado; Sin grietas, cuenta con columnas y vigas de amarre.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[x]	[x]	[ ]

FIRMA	Zenaida Guzman Coro	
NOMBRE	Zenaida Guzman	
C. c. Nº	1144624171	
	PROPIETARIO O TENEDOR	FIRMA
		NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN
		C. c. Nº: 1,079,389,629
		RESIDENTE DE OBRA
		FIRMA
		NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
		C. c. Nº
		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[x]	[x]	[ ]

FIRMA		
NOMBRE		
C. c. Nº		
	PROPIETARIO O TENEDOR	FIRMA
		NOMBRE:CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN
		C. c. Nº: 1,079,389,629
		RESIDENTE DE OBRA
		FIRMA
		NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
		C. c. Nº
		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
Se le hizo el llamado al teletono indicado pero se confirma que la persona no se encuentra por motivo de viaje.

182

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :



1. En el anden, frente a la puerta del lado izquierdo se evidencia grieta de 2m aproximado, profunda y abierta.
2. En el anden, frente a la puerta del lado derecho se evidencia grieta de 170 cm aproximado.
3. frente a la ventana del lado derecho se evidencia

483

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024**
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:

DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Ana luz Perdomo
Nº de Identificación: 26.477.736 Direccion: calle 29
ILocalizacion: Ferro Primera etapa
Teléfonos: 317.836 1883 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua			
2. Alcantarillado			
3. Energia			
4. Teléfonos			
5. Gas			

USO ACTUAL

1. Agropecuario	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
2. Vivienda	[X]	1. Propia	[X]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
3. Comercial	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
4. Institucional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
5. Deshabitado	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
6. Parqueadero	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
7. Recreacional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
8. Inst. educativa	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La vivienda se encuentra en demolición.

NO ESTA EN EL MUNICIPIO.
CECILIA PERDOMO

595

26

FORMATO ACTA DE VECINDAD

□

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[X]	[X]	[ ]
FIRMA Ana Luc Perdomo Ulloa C.	FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 26471736	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[X]	[X]	[ ]
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
Se llamo al propietario pero ya no vive en la vivienda,

995

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :	

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024**
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Norberto Cruz
Nº de Identificación: 6.209.066 Direccion: Calle 29.
ILocalizacion: Villa Carita segunda etapa
Teléfonos: 320 776 7159 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Agropecuario	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
2. Vivienda	[X]	1. Propia	[X]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
3. Comercial	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
4. Institucional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
5. Deshabitado	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
6. Parqueadero	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
7. Recreacional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
8. Inst. educativa	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDA EN BLOQUE # 4 Y CUENTA CON TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS.
- LA FACHADA NO PRESENTA NINGUNA FISURA.
- EL ANDEN SE ENCUENTRA EN PISO RUSTICO, NO SE EVIDENCIA FISURAS,
- LOS PISOS INTERNOS DE LA VIVIENDA, ESTAN CONSTRUIDOS EN RUSTICO Y NO PRESENTA FISURAS

635

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- MUROS INTERNOS NO PRESENTAN FISURAS
- CUBIERTA EN TEJA ETERNIT, CON ESTRUCTURA METALICA EN BUENAS CONDICIONES
- LA VENTANA Y LA PUERTA CUENTA CON VIDRIOS Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

	REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
	[X]	[X]	[ ]
FIRMA			
NOMBRE		NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº	6.209.066	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
	PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

	REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
	[X]	[X]	[ ]
FIRMA			
NOMBRE		NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº		C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
	PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Se le hizo la visita, Se le hizo el llamado y el teletono no responde Por lo tanto no lo podimos hobicar.


CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

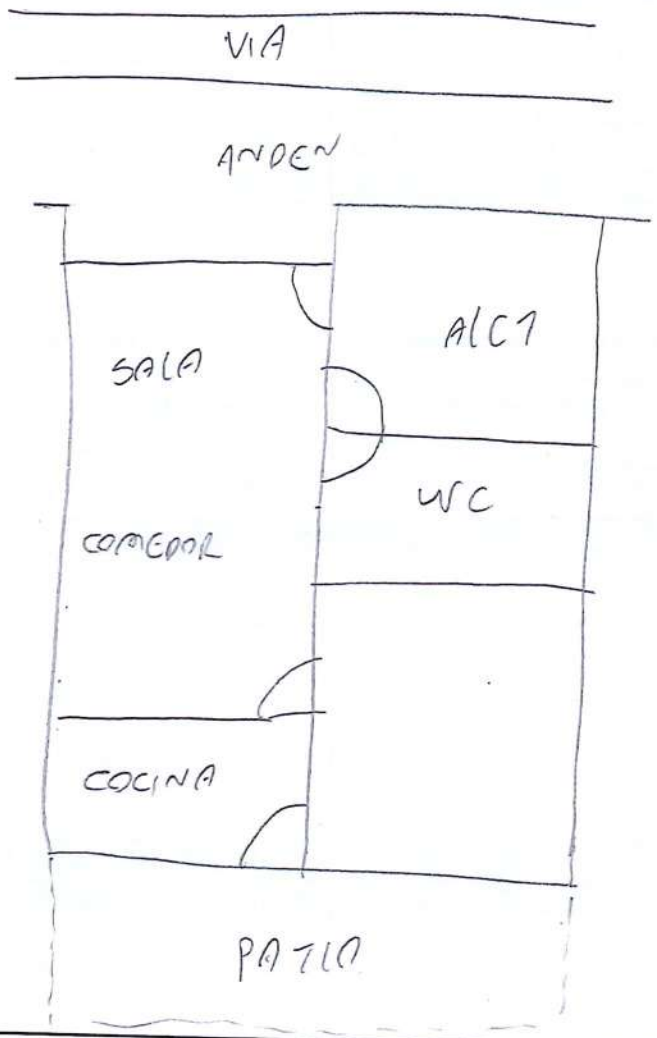

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD


TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:

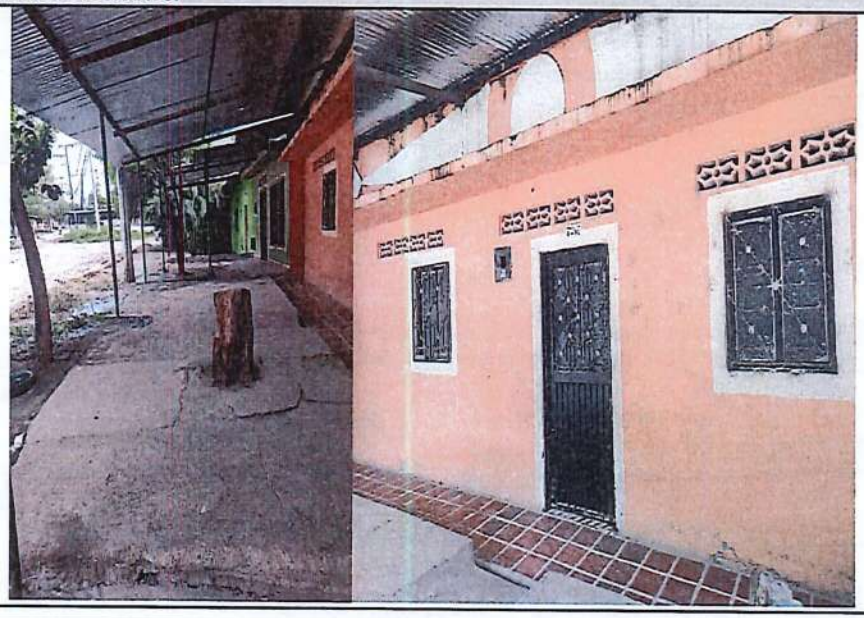

DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Gilber Cruz Diaz
Nº de Identificación: 83093492 Direccion: Calle 29 #4-31
Localizacion: Barrio el Faro
Teléfonos: 3164683191 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Agropecuario	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
2. Vivienda	[X]	1. Propia	[X]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
3. Comercial	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
4. Institucional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
5. Deshabitado	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
6. Parqueadero	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
7. Recreacional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
8. Inst. educativa	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- El anden de la vivienda se encuentra rustico, con bastante deterioro, grietas profundas
- La cubierta de la fachada se encuentra en zinc y estructora metálica en buenas condiciones, con algunos hundimientos en el zinc.
- la fachada de la vivienda se encuentra en bloque tolete común, se evidencia grietas, a nivel general en buenas condiciones.

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- La puerta es metàlica, uno de los vidrios de la ventana se encuentra roto, las ventanas de la vivienda son metàlicas y sus vidrios en buenestado
- los muros de la vivienda son en bloque tolete comùn, se encuentra en buenl estado, sin fisuras.
- la cubierta de la vivienda se encuentra en zinc, su estructura està en madera, a nivel general se encuentra en buen estado.
- El piso de la vivienda se encuentra en tableta de colores, desgaste natural.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
X	X	
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Gilbert Cruz Diaz	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 93.093.492.	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
X	X	
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Se le hizo la visita y se llamó, el señor no se encuentra en el municipio.

494

Teletoro fuera de servicio.


CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

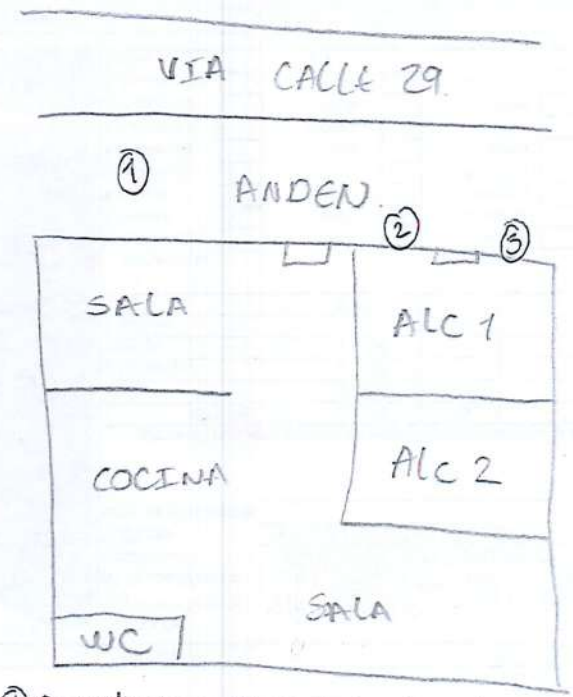

1. Se evidencia grietas profundas, de aproximadamente 2 mts en general, alrededor de un tronco, en el anden del lado izquierdo.
2. En el muro de la fachada parte derecha se evidencia una grieta en forma de Y con aproximado de 80 cm, lado izquierdo de la ventana.
3. En la parte derecha del muro de la fachada, hay otra grieta, aproximadamente de 150 cm al lado derecho de la ventana.

8617

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VIAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: YAQUELINE SILVA MURILLO
Nº de Identificación: 1.111.339.589 Direccion: calle 29 # 3-10
Localizacion: BARRIO EL FERRO
Teléfonos: 3102134313 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Agropecuario	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
2. Vivienda	[X]	1. Propia	[X]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
3. Comercial	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
4. Institucional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
5. Deshabitado	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
6. Parqueadero	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
7. Recreacional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
8. Inst. educativa	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- LA VIVIENDA CUENTA CON COLUMNAS Y VIGAS, ESTA CONSTRUIDA EN BLOQUE # 4
- LA FACHADA NO CUENTA CON FISURAS, SE OBSERVA UNA CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA CON ESTRUCTURA METALICA
- LA VIVIENDA NO CUENTA CON ANDEN
- LOS PISOS INTERNOS ESTAN RUSTICOS, NO PRESENTAN FISURAS.

895

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- LOS MUROS INTERNOS ESTAN SIN REVOQUE, NO PRESENTAN FISURAS
- EL PORTON Y LA VENTANA NO CUENTA CON VIDRIOS
- CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA CON ESTRUCTURA METALICA.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

	REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
	[x]	[x]	[ ]
FIRMA	Yaqueline Silva Movillo		
NOMBRE		NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº	1111337589	C. c. Nº: 1,079,389,628	C. c. Nº
	PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

	REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
	[x]	[x]	[ ]
FIRMA	Jackeline Claros		
NOMBRE		NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº		C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
	PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
El propietario procede a firmar el acta de Cierre manifestando no tener Inconvenientes en su propiedad

SAZ SE ENCUENTRA

098

66


FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

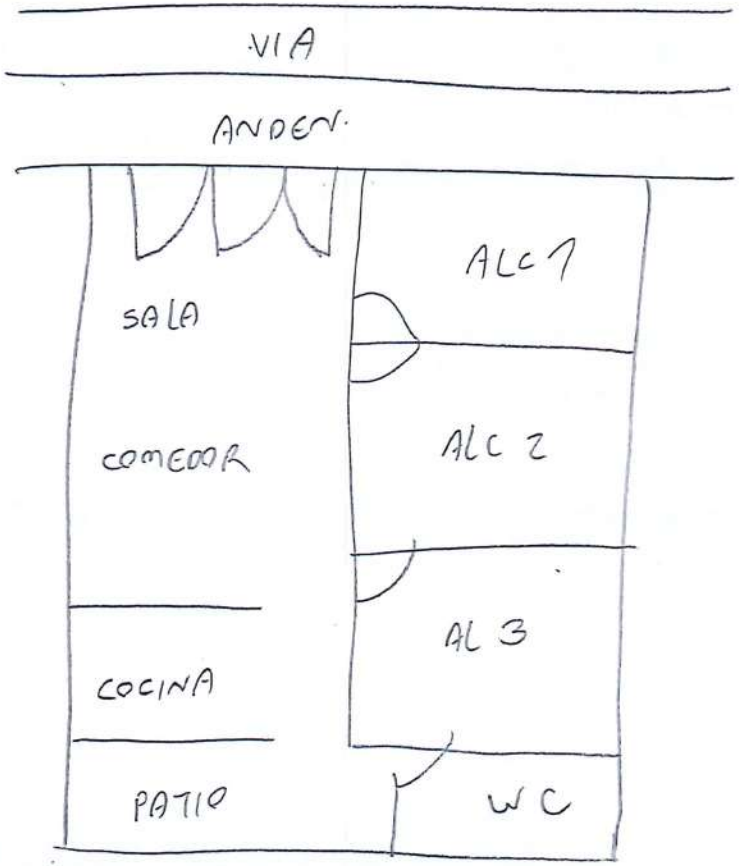

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024**
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Jaqueline Claros
Nº de Identificación: 36089246 Direccion: Calle 29 #2-17
Localizacion: Villa clarito etapa 2.
Teléfonos: 3214722110 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Agropecuario	1. Propia	2. Arriendo	3.Otros	
2. Vivienda	1. Propia	2. Arriendo	3.Otros	
3. Comercial	1. Propia	2. Arriendo	3.Otros	
4. Institucional	1. Propia	2. Arriendo	3.Otros	
5. Deshabitado	1. Propia	2. Arriendo	3.Otros	
6. Parqueadero	1. Propia	2. Arriendo	3.Otros	
7. Recreacional	1. Propia	2. Arriendo	3.Otros	
8. Inst. educativa	1. Propia	2. Arriendo	3.Otros	
9. Otros	Cual:			

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- El anden de la vivienda se encuentra en tierra.
- La fachada de la vivienda se encuentra en bloque tolete común, en buenas condiciones, sin grietas.
- La puerta y las ventanas son metálicas, los vidrios de las ventanas se evidencian en buen estado.

469

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

□

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- La cobierta de la vivienda se encuentra en eternit y estructura de madera, en buen estado

- El piso de la vivienda se encuentra en tableta blanca, en buen estado.

- Los muros de la vivienda se encuentran en bloque tolete común, con columnas y vigas de amarre, se evidencia en buen estado, sin grietas.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO [x]	REGISTRO FILMICO [x]	OTROS [ ]
FIRMA Jackeline claros	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Jackeline claros	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 36089246 clgr	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO [x]	REGISTRO FILMICO [x]	OTROS [ ]
FIRMA Jackeline claros	FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE:CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 36089246.	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
El propietario procede a Firmar el acta de cierre manifestando no tener ningun inconveniente

470

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :



411

89

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: JAVIER ANTONIO NAVARRO FIERRO
Nº de Identificación: 12.139.007 Direccion: CALLE 29 # 4-65
ILocalizacion: BARRIO EL FERRO I ETAPA
Teléfonos: 3024773061 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Aqua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
1. Agropecuario		1. Propia	X	2. Arriendo		3.Otros	
2. Vivienda	X	1. Propia	X	2. Arriendo		3.Otros	
3. Comercial		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
4. Institucional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
5. Deshabitado		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
6. Parqueadero		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
7. Recreacional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
8. Inst. educativa		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

VIVIENDA CONSTRUIDA CON BLOQUE TOLETE COMUN, CUENTA CON COLUMNAS Y ALGUNAS VIGAS DE AMARRE.

- LA FACHADA CUENTA CON CERAMICA, LA CUAL ESTA EN BUENAS CONDICIONES
- REJA METALICA CON PINTURA VERDE OSCURO, SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
- PISO DEL ANDEN EN CERAMICA COLOR CAFE, EN BUENAS CONDICIONES

4/29

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- PISOS INTERNOS DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN CERAMICA, ITEM EN BUENAS CONDICIONES
- LOS MUROS INTERNOS NO PRESENTAN NINGUN TIPO DE FISURAS.
- LA VIVIENDA CUENTA CON CIELORASO EN MACHIMBRE, SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
- CUBIERTA EN TEJA DE ZINC, CON ESTRUCTURA METALICA Y DE MADERA.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[X]	[X]	[ ]
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 36086471	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[X]	[X]	[ ]
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 36086.471	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

El Señor Fallecio y no se encuentra nadie en la Vivienda.
FIRMA LA ESPOSA.

140


CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

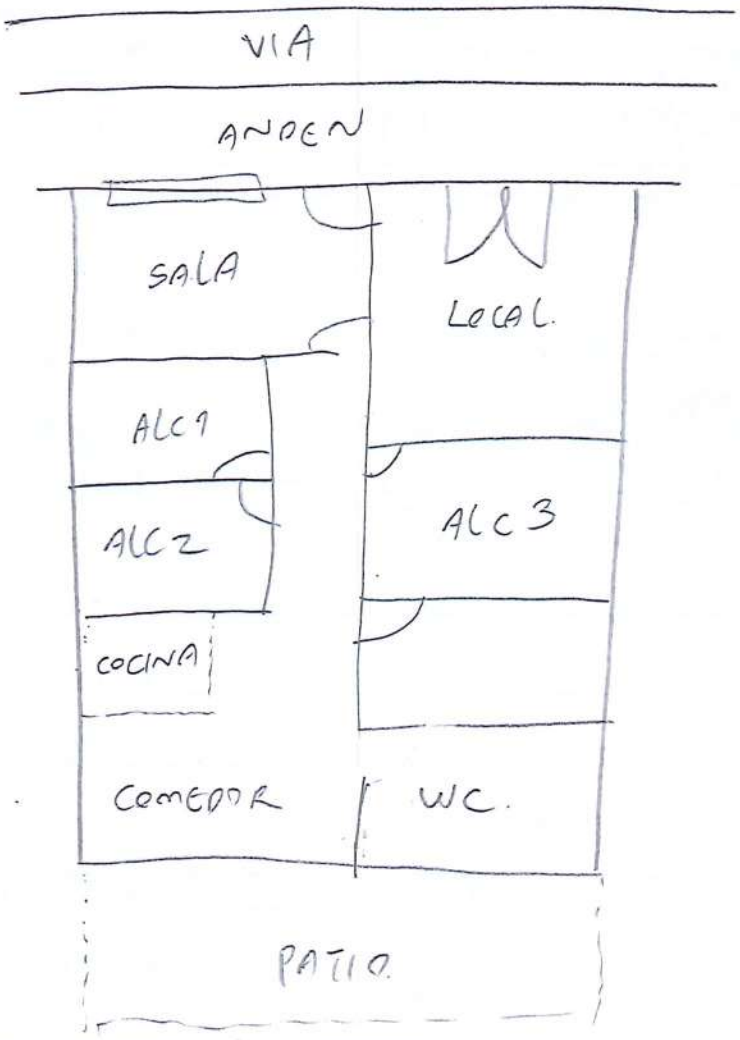

444

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VIAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Luis Maria Rodriguez Vargas
Nº de Identificación: 12 121 039 Direccion: calle 29 # 3-10
ILocalizacion: Barrio el ferro
Teléfonos: 311 450 1825 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL							
1. Agropecuario		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
2. Vivienda	X	1. Propia		2. Arriendo	X	3.Otros	
3. Comercial		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
4. Institucional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
5. Deshabitado		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
6. Parqueadero		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
7. Recreacional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
8. Inst. educativa		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- El anden se encuentra en piso rostico, en buenas condiciones, con fisuras o grietas, con un parche en cemento por cambio de alcantarillado.
- La fachada de la vivienda se encuentra en bloque tolete, en buenas condiciones, no tiene fisuras.
- La puerta y las ventanas, son metalicas en buenas condiciones, con sus respectivos vidrios.
- la cubierta de la vivienda se encuentra en zinc, con estructura metalica y en buen estado.

SIT

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

□

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- Los muros de la vivienda son en bloque folete, se encuentran en buenas condiciones, sin grietas, no cuenta con columnas, ni vigas de amarre.

- El piso de la vivienda es esmaltado blanco, en buen estado general, presenta desgaste natural y algunas fisuras.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[x]	[x]	[ ]
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Luis M. Rodriguez	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 92,121,038.	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[x]	[x]	[ ]
FIRMA Yhon Jenson Narvaez	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Jhon Jenson Narvaez	NOMBRE:CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 7.693610.	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Firmo el nuevo arrendatario.

BTG


FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

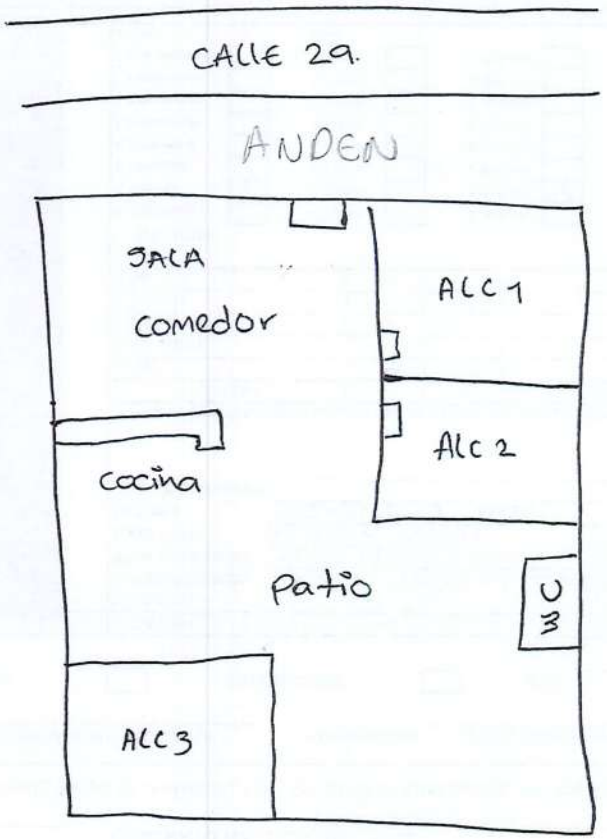

bTG

201

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Derly Johana Camelo Ramirez
Nº de Identificación: 1079186384 Direccion: Calle 29 #5-70
Localizacion: Barrio el Ferro
Teléfonos: 3224217534 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Agropecuario		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
2. Vivienda	X	1. Propia		2. Arriendo	X	3.Otros	
3. Comercial		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
4. Institucional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
5. Deshabitado		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
6. Parqueadero		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
7. Recreacional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
8. Inst. educativa		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

-El anden de la vivienda se encuentra rustico con bastante deterioro y grietas.
- la fachada de la vivienda se encuentra en bareque, en buenas condiciones, sin grietas

- la puerta y las ventanas son metálicas, se encuentran con vidrios en buen estado.

448

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- la cubierta de la vivienda se encuentra en zinc y estructura metálica, en buenas condiciones
- el piso de la vivienda se encuentra esmaltado, con grietas frente a la puerta de la fachado, el resto en buen estado
- los muros de la casa son en bareque la sala, la alcoba 1 y 2, el resto de la vivienda en bloque tolete común, se evidencia en buen estado.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[x]	[x]	[ ]
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Nerly Thonna Camelo R.	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 1079863384.	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[x]	[x]	[ ]
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Wilson Calderon B	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 1079174798	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
se le hizo la respectiva visita pero la señora no esta. regresamos nuevamente y firmo el nuevo arrendatario.

479

103


CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

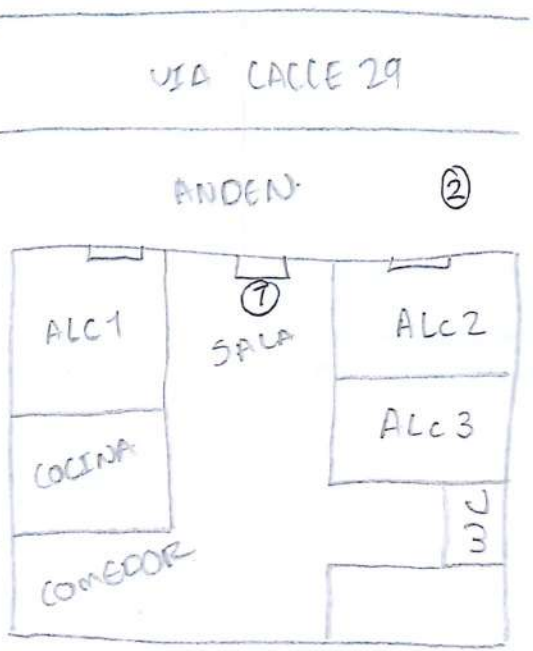

1 frente a la puerta, en el piso se evidencia una grieta aproximadamente de 1.50 mts.

2 En la parte derecha del anden, se evidencian 3 grietas de aproximadamente de 2 mts.

480

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024**
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: MAMA YICELA CARVAJAL FIGUEROA
Nº de Identificación: 1049681582 Direccion: CALLE 29 # 5-41
ILocalizacion: BARRIO EL FEMO I ETAPA
Teléfonos: Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Agropecuario	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
2. Vivienda	[X]	1. Propia	[X]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
3. Comercial	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
4. Institucional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
5. Deshabitado	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
6. Parqueadero	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
7. Recreacional	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
8. Inst. educativa	[ ]	1. Propia	[ ]	2. Arriendo	[ ]	3.Otros	[ ]
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

VIVIENDA CONSTRUIDA CON BLOQUE TOLETE COMUN, FACHADA NO PRESENTA FISURAS.
-LOS MUROS INTERNOS DE LA VIVIENDA ESTAN CON PINTURA COLOR BLANCO HUESO Y NO PRESENTA NINGUNA FISURA.
- EL ANDEN ESTA CONSTRUIDO EN PISO ESMALTADO COLOR AMARILLO, PRESENTA ALGUNAS FISURAS Y DETERIOROS DEL MISMO.

035

FORMATO ACTA DE VECINDAD

□

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- LOS PISOS INTERNOS ESTAN ESMALTADOS, PRESENTAN FISURAS Y ALGUNOS DETERIOROS

- CUBIERTA EN TEJA DE ZINC. CON ESTRUCTURA EN MADERA

- PUERTAS Y VENTANAS DE LA FACHADA CUENTAN CON VIDRIOS Y ESTAN EN BUENAS CONDICIONES

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[x]	[x]	[ ]
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE María Yisela Carvajal	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 1079181582	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[x]	[x]	[ ]
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE María Yisela Carvajal	NOMBRE:CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 1079181582	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Se le hizo la respectiva visita a la señora pero no está

584


FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

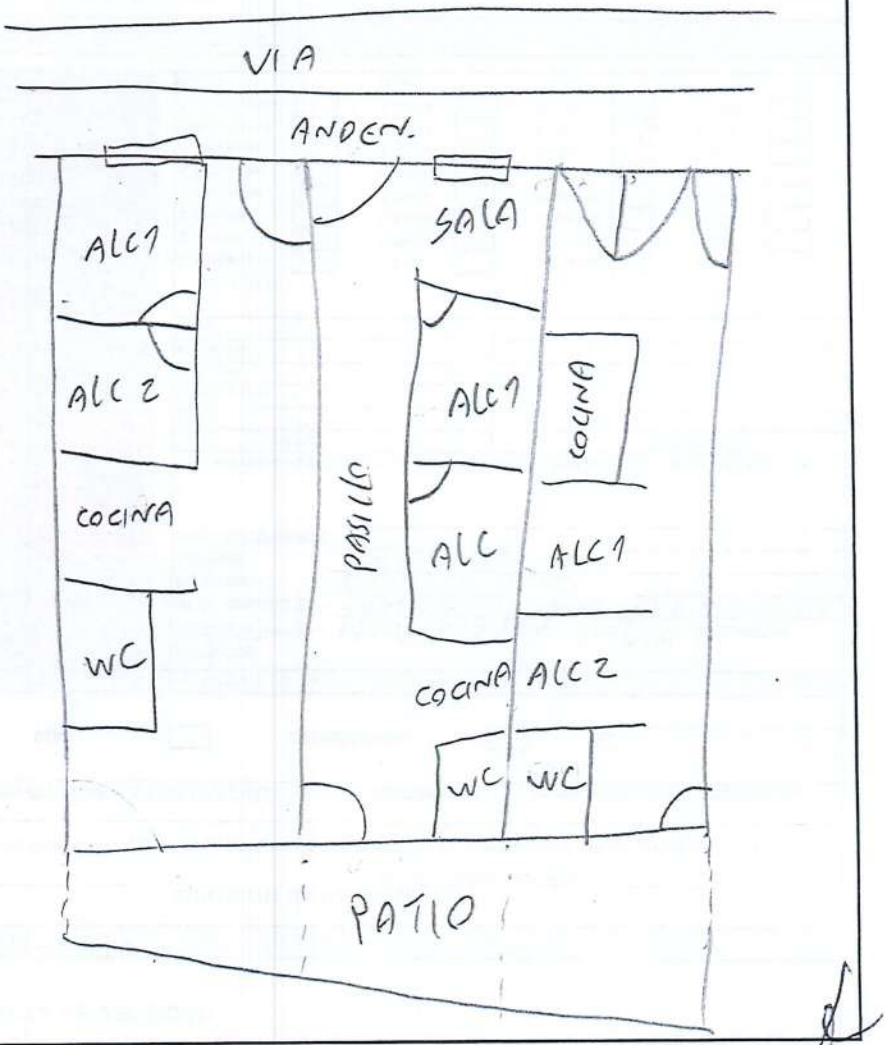

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: María Marquly Trujillo Ramos
Nº de Identificación: 1079180083 Direccion: Calle 29 #5-45
ILocalizacion: Barrio el cerro
Teléfonos: 3172974866 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Agropecuario		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
2. Vivienda	X	1. Propia	X	2. Arriendo		3.Otros	
3. Comercial		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
4. Institucional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
5. Deshabitado		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
6. Parqueadero		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
7. Recreacional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
8. Inst. educativa		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- El anden de la vivienda se encuentra en tableta y se evidencia en buen estado.
- La cubierta de la fachada se encuentra en zinc y estructura metálica, en buen estado.
- los muros de la fachada se encuentra en bloque tolete común, se evidencia en buen estado, sin grietas.
- La puerta y la ventana son metàlicas, los vidrios de la puerta en buen estado.

494

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

□

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- El piso de la vivienda se encuentra en tableta, se evidencia deterioro natural, sin fisuras.
- la cobierta de la vivienda se encuentra en zinc, con estructura metàlica, en buenas condciones
- los muros de la vivienda se encuentran en bloque tolete comùn, no cuenta con columnas y vigas de amarre, no presentan fisuras, buen estado en general.
- la ventana de la vivienda no cuenta con vidrios.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[X]	[X]	[ ]
FIRMA María M. Trujillo R.	FIRMA	FIRMA
NOMBRE María Maryuly Trujillo Ramos	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 1.079.180.683	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[X]	[X]	[ ]
FIRMA María M. Trujillo R.	FIRMA	FIRMA
NOMBRE María Maryuly Trujillo-R.	NOMBRE:CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº C.c. 1.079.180.683 C/gre-	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
Se le hizo la respectiva visita a la Señora pero no esta, se procedio a volver dicp despues y el propietario Firma acta de Cierre Sin observaciones

100

901

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD


TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VIAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:

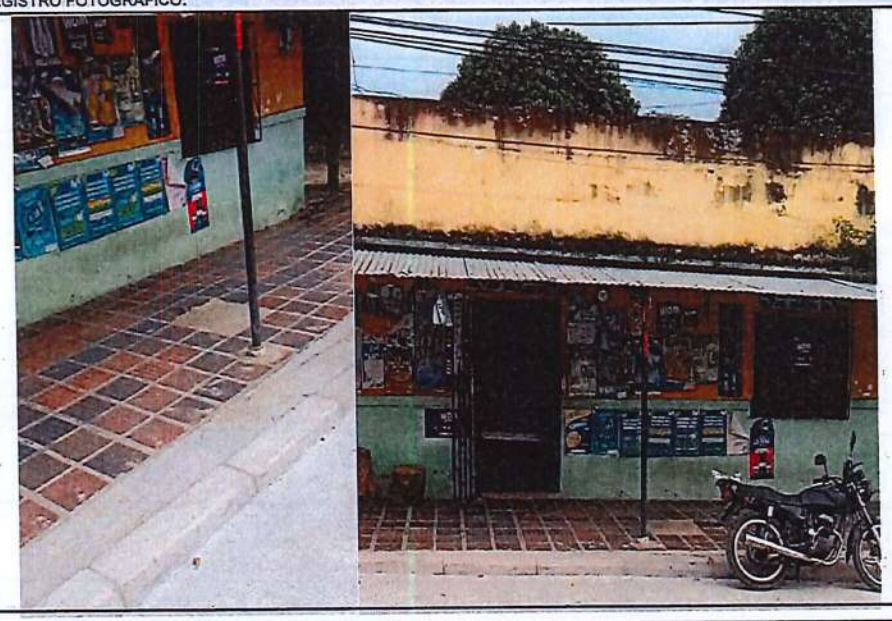

DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Derlay Cardozo Polania.
Nº de Identificación: 55 165 793 Direccion: calle 29 # 7-29
ILocalizacion: Barrio el ferro
Teléfonos: 3112878871 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Agropecuario		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		
2. Vivienda	X	1. Propia		2. Arriendo	X	3.Otros		
3. Comercial	X	1. Propia		2. Arriendo	X	3.Otros		
4. Institucional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		
5. Deshabitado		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		
6. Parqueadero		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		
7. Recreacional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		
8. Inst. educativa		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros		
9. Otros		Cual:						

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- El anden de la vivienda se encuentra en tableta en gres, en buena condicion, deterioro normal.
- la fachada de la vivienda se encuentra en bloque tolete, en buenas condiciones, sin columnas, ni grietas.
- la fachada cuenta con estructura metalica, con zinc, en buenas condiciones.
- La puerta se encuentra en buena condición, es metalica y sus vidrios en buena condición
- la ventana es en estructura metalica toda, en buen estado.

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- los muros de la vivienda son en bloque tolete comun, en buenas condiciones, sin grietas.
- la cubierta se encuentra en zinc y estructura metalica, en buenas condiciones.
- El piso de la vivienda se encuentra esmaltado gres, en buenas condiciones, con grietas y deterioro

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO [x]	REGISTRO FILMICO [x]	OTROS [ ]
FIRMA Desby Cardozo P.	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Desby Cardozo Polanía	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 55165193	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO [x]	REGISTRO FILMICO [x]	OTROS [ ]
FIRMA Desby Cardozo P.	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Desby Cardozo Polanía	NOMBRE:CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 55165193	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Se le hizo la visita y la persona no se encuentra, trabaja lejos, luego se procede a realizar una segunda visita y el propietario firma acta de cierre sin observaciones


FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

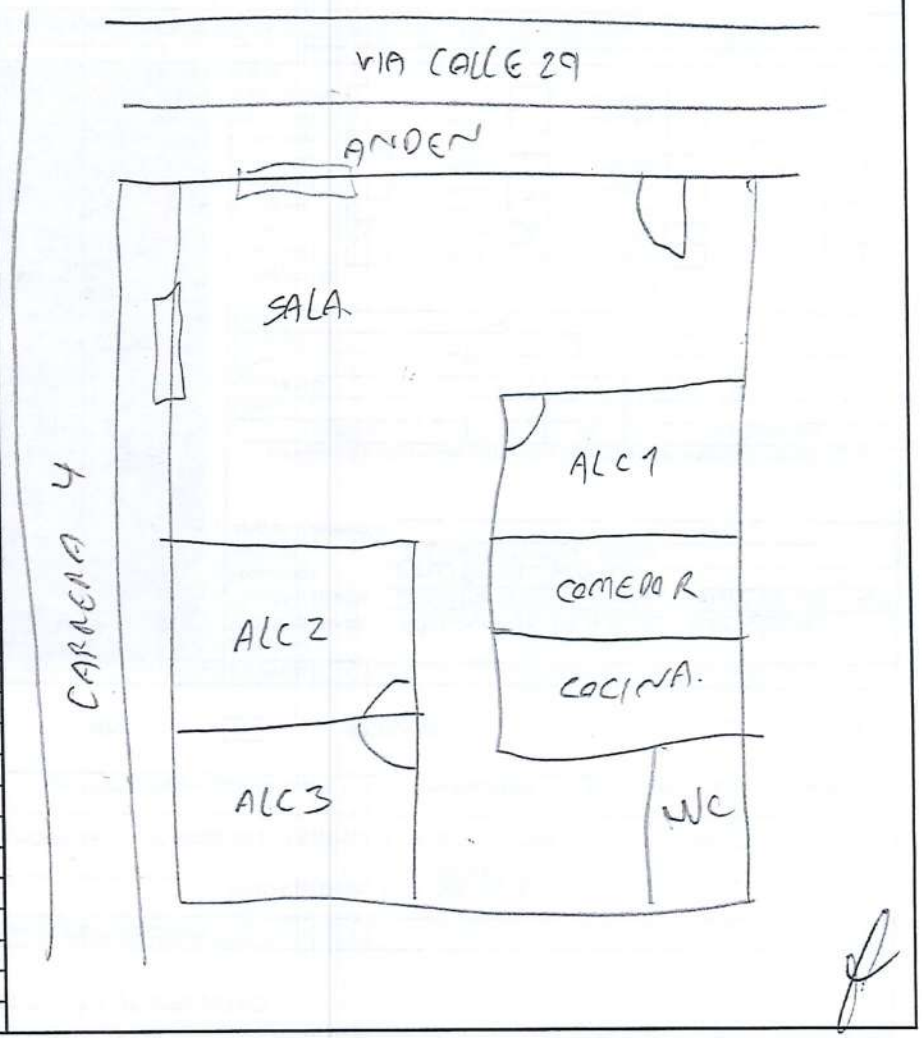

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Margarita Patricia avendaño
Nº de Identificación: 43 517 448 Direccion: Calle 29 # 7-29
ILocalizacion: Barrio el ferro
Teléfonos: 3206170170 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Agropecuario	[ ]	1. Propia [ ]	2. Arriendo [ ]	3.Otros [ ]
2. Vivienda	[X]	1. Propia [X]	2. Arriendo [ ]	3.Otros [ ]
3. Comercial	[ ]	1. Propia [ ]	2. Arriendo [ ]	3.Otros [ ]
4. Institucional	[ ]	1. Propia [ ]	2. Arriendo [ ]	3.Otros [ ]
5. Deshabitado	[ ]	1. Propia [ ]	2. Arriendo [ ]	3.Otros [ ]
6. Parqueadero	[ ]	1. Propia [ ]	2. Arriendo [ ]	3.Otros [ ]
7. Recreacional	[ ]	1. Propia [ ]	2. Arriendo [ ]	3.Otros [ ]
8. Inst. educativa	[ ]	1. Propia [ ]	2. Arriendo [ ]	3.Otros [ ]
9. Otros		Cual:		

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- el anden de la vivienda se encuentra en piso rustico, en buen estado.
- La fachada de la vivienda se encuentra en bloque tolete común, en buenas condiciones, sin grietas.
- La cubierta de la fachada se encuentra en zinc y estructura metálica, en buenas condiciones.
- La fachada de la vivienda cuenta con reja blanca, metálica en buenas condiciones.

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- La puerta, la ventana y el portón son metálicos, cuentan con vidrios en buen estado
- Los muros de la vivienda se encuentra en bloque tolete común, cuenta con columnas y vigas de amarre, en buen estado, sin fisuras.
- El piso de la vivienda se encuentra en tableta en perfecto estado.
- La cubierta es en zinc industrial, con estructura de metal, y cielo raso de machimbre, se encuentra en buenas condiciones.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO [x]	REGISTRO FILMICO [x]	OTROS [ ]
FIRMA Margarita Avendaño	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Margarita Avendaño	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 43517448	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO [x]	REGISTRO FILMICO [x]	OTROS [ ]
FIRMA Margarita Avendaño	FIRMA	FIRMA
NOMBRE 43517448	NOMBRE:CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Se llamo a la señora se le informo, la señora autoriza a la vecina para que firme por ella. Porque se encuentra de viaje.

NO ESTA


CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

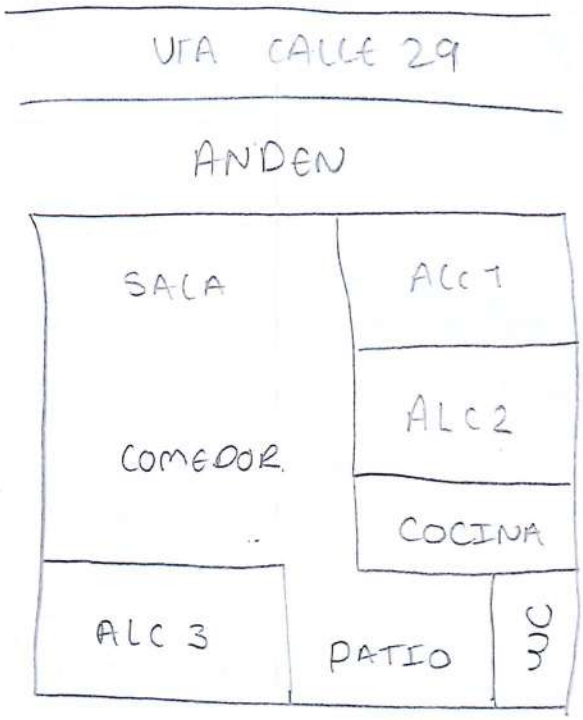

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:

DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: RICARDO GONZALEZ MURCIA
Nº de Identificación: 83038921 Direccion: CALLE 29 5-09
Localizacion: BARRIO EL FERRO I ETAPA
Teléfonos: Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Agropecuario		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
2. Vivienda	X	1. Propia	X	2. Arriendo		3.Otros	
3. Comercial		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
4. Institucional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
5. Deshabitado		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
6. Parqueadero		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
7. Recreacional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
8. Inst. educativa		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDA CON MAMPOSTERIA TOLETE COMUN, NO CUENTA CON COLUMNAS NI VIGAS DE AMARRE

LA FACHA LATERAL Y PRINCIPAL ESTAN PINTADAS DE COLOR VERDE AZULADO Y NO PRESENTAN FISURAS, EL ANDEN ESTA EN PISO ESMALTADO DE COLOR AMARILLO EL CUAL PRESENTA 5 FISURAS. TRANSVERSALES EN EL MISMO

356

CONSORCIO REJUVENECIMIENTO CAMPOALEGRE 2014

FORMATO ACTA DE VECINDAD

□

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

LOS PISOS INTERNOS DE LA VIVIENDA ESTAN ESMALTADOS Y PRESENTA ALGUNAS DETERIOROS Y FISURAS

LA MAMPOSTERIA NO PRESENTA FISURAS DE NINGUNA ESPECIE.

CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CON ESTRUCTURA PERFIL METALICO, SIN FISURAS.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[X]	[X]	[ ]
FIRMA Ricardo Gonzalez	FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 83.088.981	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Ricardo Gonzalez

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
[X]	[X]	[ ]
FIRMA Isaias Rodrigo	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Isaias	NOMBRE:CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº 12252 201	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Se le hizo la visita y el señor no habita la vivienda y el arrendatario no quiso firmar. Regresamos y el nuevo arrendatario si firmo.

655


FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

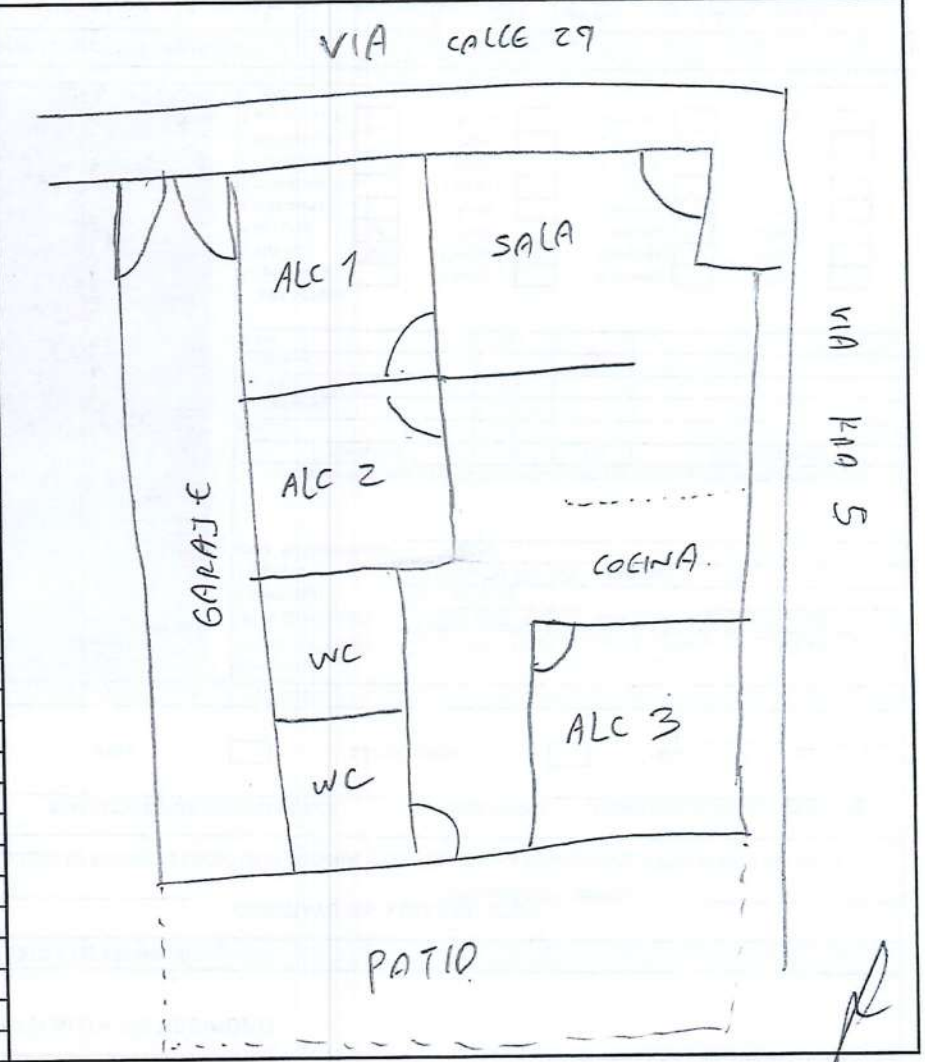

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VIAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:



DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Sully stefan Castro Lavao
Nº de Identificación: 1049179505 Direccion: calle 29 #8-33
ILocalizacion: Panama
Teléfonos: 3123547118 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL							
1. Agropecuario		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
2. Vivienda	X	1. Propia	X	2. Arriendo		3.Otros	
3. Comercial	X	1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
4. Institucional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
5. Deshabitado		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
6. Parqueadero		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
7. Recreacional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
8. Inst. educativa		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- El anden de la vivienda se encuentra rustico la mitad, entrada del taller, la otra está esmaltado con bastante deterioro.

- La cubierta de la fachada se encuentra en zinc y estructura metálica, se evidencia con hendiduras la cubierta.
- La fachada de la vivienda se encuentra en bloque ladrillo común, en buen estado.

744

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

□

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- La puerta es metálica, en buen estado, cuenta con vidrios en buena condición.
- Los 2 portones son metálicos, se evidencia en buenas condiciones, deterioro natural.
- Los muros de la vivienda se encuentran en bloque tolete, cuenta con columnas y vigas de amarre, sin grietas.
- La cubierta de la vivienda se encuentra en zinc y estructura metálica en buen estado. La cubierta del taller se evidencia con bastantes hendiduras.
- El piso de la vivienda es tableta, se evidencia en buen estado y el piso del taller es rustico con bastante deterioro.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	[x]	REGISTRO FILMICO	[x]	OTROS	[ ]
FIRMA	Sully Stefan Cl	FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Sully Stefan Castro. L	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN		NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO	
C. c. Nº	1079179505.	C. c. Nº: 1,079,389,629		C. c. Nº	
	PROPIETARIO O TENEDOR		RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO	[x]	REGISTRO FILMICO	[x]	OTROS	[ ]
FIRMA	Sully Stefan Cl	FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Sully Stefan Castro L.	NOMBRE:CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN		NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO	
C. c. Nº	1079179505	C. c. Nº: 1,079,389,629		C. c. Nº	
	PROPIETARIO O TENEDOR		RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
El propietario de la vivienda procede a firmar el acta de cierre sin observaciones dejando constancia que su vivienda no sufrio daño alguno.

242

211


CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :

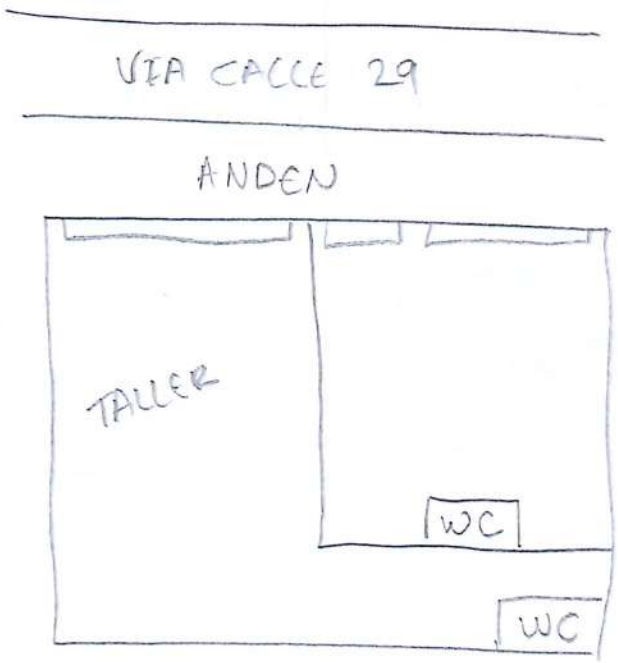

4+4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD


TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No. 1151 DEL 2024** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **SUPERVISOR:** Angela Matilde Zambrano Caviedes

TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VIAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] HOJA 1 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO:

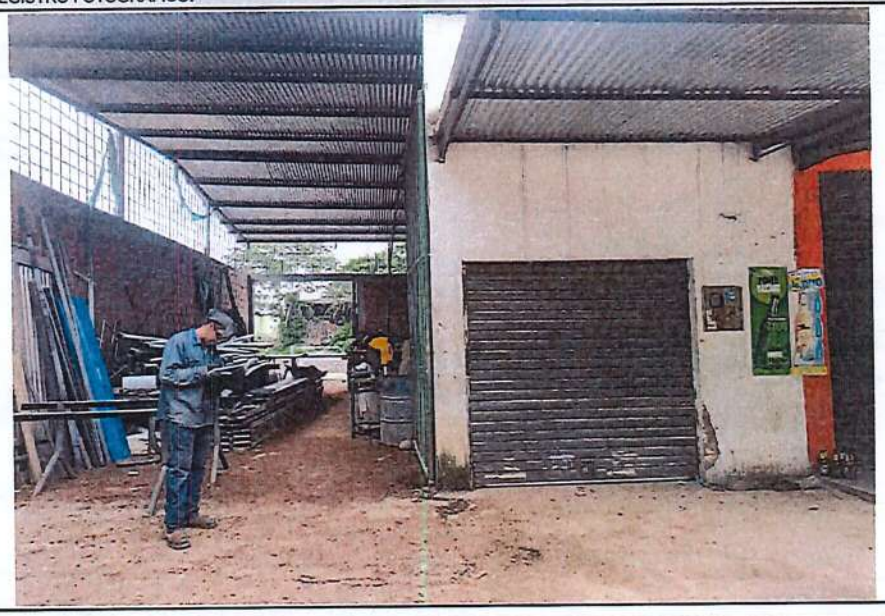

DATOS

Nombre del Propietario/Tenedor: Jhon Fredy Martínez Vargas
Nº de Identificación: 80 158 328 Direccion: calle 29 # n. 39
ILocalizacion: barrio kirro
Teléfonos: 3167149470 Abscisas:
Long. de Intervención:

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Agropecuario		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
2. Vivienda		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
3. Comercial	X	1. Propia		2. Arriendo	X	3.Otros	
4. Institucional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
5. Deshabitado		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
6. Parqueadero		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
7. Recreacional		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
8. Inst. educativa		1. Propia		2. Arriendo		3.Otros	
9. Otros		Cual:					

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- El anden del predio se encuentra en rustico una parte y arena la mitad.
- La fachada del predio se encuentra en tolete bloque, en la parte inferior del porton pequeño al lado izquierdo se evidencia deterioro de revoque.
- La cubierta de la fachada se encuentra en zinc y estructura metálica en buen estado.

445

113

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD

ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- los muros del predio se encuentran en bloque tolete, se evidencian en buen estado sin grietas.
- la cubierta del predio se encuentra en zinc y estructura metálica, se evidencia en buen estado.
- el piso del predio es en terreno natural, en el predio funciona un taller de ornamentación.

APERTURA DEL ACTA DE VECINDAD

	REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
	[x]	[x]	[ ]
FIRMA			
NOMBRE	John Fredy Martinez	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº	80158328 BTA	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
	PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

CIERRE ACTA DE VECINDAD

	REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FILMICO	OTROS
	[x]	[x]	[ ]
FIRMA	Hilbo Ramos		
NOMBRE	Hilbo Ramos	NOMBRE:CESAR AUGUSTO OROZCO DUSSAN	NOMBRE: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C. c. Nº	83084546	C. c. Nº: 1,079,389,629	C. c. Nº
	PROPIETARIO O TENEDOR	RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: EL SEÑOR YA NO TRABAJA. FIRMA EL DUEÑO de la propiedad manifestando no tener observaciones y que la propiedad no sufrio ningún daño.

474

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

ACTA DE VECINDAD

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

OBSERVACIONES :



444
