INFORME No. 03

CONTRATO:	**347**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA**	**C.C. No.**	**1.052.393.749**
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO: **SUPERVISOR TECNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO, CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION Y REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTUTRA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACION DE REDES EN LA SEDE DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES** DE LA E.S.E. UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**ABRILDE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
48.000.000,00	8.000.000,00	FEBRERO DE 2026	40.000.000,00	CUENTA DE COBRO 01
	8.000.000,00	MARZO DE 2026	32.000.000,00	CUENTA DE COBRO 2
	8.000.000,00	ABRIL DE 2026	24.000.000,00	CUENTA DE COBRO 3

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo con la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE) T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1) DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO							
1	VERIFICAR LA APLICABILIDAD DE LAS REDES DE LOS SISTEMAS CRÍTICOS HOSPITALARIOS, REGULADAS POR LA NTC 5B54, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, TÍTULO J DE LA NSR-10, LEY 1796 DE 2016.	DENTRO DE LOS COMITÉS TÉCNICOS, LOS COMITÉS DE OBRA Y LAS VISITAS DE OBRA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA APLICABILIDAD DE TODAS LAS NORMAS QUE EXIJA CADA DISCIPLINA TALES COMO: NSR-10 – REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, TÍTULO J: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. RETIE – REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. RETIQ – REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO. NTC 2050 – CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO, COMO NORMA DE REFERENCIA PARA RETIE. NTC ISO 7396-1 Y NTC ISO 7396-2 – DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES. NTC 5854 – SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICACIONES HOSPITALARIAS. TC 4995 – VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN HOSPITALARIA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 59 CONTRATO URGENCIAS DEL 6 DE ABRIL DE 2026 ACTA 60 CONTRATO URGENCIAS DEL 8 DE ABRIL DE 2026 ACTA 61 CONTRATO URGENCIAS DEL 15 DE ABRIL DE 2026 ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 24 DE ABRIL DE 2026

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		ASRAE 170 – VENTILACIÓN PARA INSTALÁCIONES DE ATENCIÓN EN SALUD. LEY 400 DE 1997 Y LA LEY 1796 DE 2016 – SUPERVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. DECRETO 4725 DE 2005 – REGLAMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y CONDICIONES TÉCNICAS HOSPITALARIAS.					ACTA 63 CONTRATO URGENCIAS DEL 28 DE ABRIL DE 2026.
2	GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE REDES TÉCNICAS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS.
3	GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CONFORME A NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y HABILITACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS.
4	GARANTIZAR EL CONTROL DE GASES MEDICINALES, TABLEROS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS.
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DEL ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1).	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE ANALIZAN LAS REDES DE LAS SALAS DE REANIMACIÓN, AVANCES Y CONEXIONES DE HVAC Y GASES MEDICINALES EN LA SALA DE OBSERVACIÓN FASTRACK, SE HACE RECORRIDO GENERAL DE OBRA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE APRUEBA EL MATERIAL DE LA CUBIERTA DE LA PÉRGOLA DE ACCESO, SE DETERMINA MANEJAR TEJA ARQUITECTÓNICA, TENIENDO EN CUENTA QUE ES EXTERIOR Y NO SE REQUIERE LA TIPO SÁNDWICH, SE APRUEBA CERRAR DEBAJO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA DEL COSTADO SUR, PARA APROVECHAR ESTE ESPACIO, INTERVENTORÍA SOLICITA CORREGIR EL PROBLEMA DE FUGAS QUE HAY EN EL SEGUNDO PISO EN LA ZONA DE ESTERILIZACIÓN, LO QUE AFECTA ESPACIOS DE DOS SALAS DE REANIMACIÓN, CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESO HA IMPEDIDO EMPLACAR Y CERRAR ESTOS ESPACIOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE REVISAN AVANCES DE LA	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 59 CONTRATO URGENCIAS DEL 6 DE ABRIL DE 2026. ACTA 60 CONTRATO URGENCIAS DEL 8 DE ABRIL DE 2026. ACTA 61 CONTRATO URGENCIAS DEL 15 DE ABRIL DE 2026. ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 24 DE ABRIL DE 2026. ACTA 63 CONTRATO URGENCIAS DEL 28 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, SE VERIFICA EL TRAZADO FINAL DE LA VIO, PARA LA CONEXIÓN Y SALIDA A LA CARRERA 12, SE REVISAN LAS CAJAS DE INSPECCIÓN, POSOS DE INSPECCIÓN Y CONEXIÓN A EMISORES FINALES Y SALIDA A LA RED PRINCIPAL. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE MODIFICA LA UBICACIÓN DE LOS CALDERINES, DEBIDO A QUE SU UBICACIÓN ORIGINAL TENDRÍA INCONVENIENTES POR FALTA DE VENTILACIÓN, YA QUE EN SU UBICACIÓN INICIAL AL LADO DE LOS ASCENSORES DE VISITANTES SE MODIFICÓ ESE ESPACIO SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE EXPONE EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, AVANCES DEL CONTRATO, EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, SE DESCRIBEN LOS ÍTEMS Y TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO, SECRETARÍA DE SALUD PLANTEA REALIZAR UN SOLO MODIFICATORIO PARA EL CONVENIO, SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES EN UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS.					
6	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, LA ARQUITECTA MELISA BERMÚDEZ, EL ARQUITECTO FABIÁN MORENO, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE VERIFICAN LOS NUEVOS TRAZADOS DE LA RED CONTRAINCENDIOS, APROBADA PASANDO DE RED NEBULIZADA A UNA RED HÚMEDA,. SE AVALAN DISEÑOS Y LOS ÍTEMS PARA SU INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, LA ARQUITECTA MELISA BERMÚDEZ, EL ARQUITECTO FABIÁN MORENO, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE ANALIZAN MODIFICACIONES DE FACHADAS, SE DEFINEN MATERIALES Y SE PLANTEAN COLORES, SE DETERMINA EL TAMAÑO, DIMENSIÓN, COLOR Y TIPO DE PERSIANA A INSTALAR EN LA FACHADA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 8 CONTRATO PISO 3 DEL 6 DE ABRIL DE 2026. ACTA 9 CONTRATO PISO 3 DEL 8 DE ABRIL DE 2026. ACTA 10 CONTRATO PISO 3 DEL 15 DE ABRIL DE 2026.. ACTA 10 CONTRATO PISO 3 DEL 24 DE ABRIL DE 2026. ACTA 12 CONTRATO PISO 3 DEL 28 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE MODIFICA LA UBICACIÓN DE LOS CALDERINES, DEBIDO A QUE SU UBICACIÓN ORIGINAL TENDRÍA INCONVENIENTES POR FALTA DE VENTILACIÓN, YA QUE EN SU UBICACIÓN INICIAL AL LADO DE LOS ASCENSORES DE VISITANTES SE MODIFICÓ ESE ESPACIO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE EXPONE EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, AVANCES DEL CONTRATO, EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, SE DESCRIBEN LAS NECESIDADES Y LA PROYECCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO.					
7	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS EN REDES DE COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 10 CONTRATO PISO 3 DEL 15 DE ABRIL DE 2026.
8	ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RACKS, CANALETAS, Y EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS.	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDO, VERIFICANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 10 CONTRATO PISO 3 DEL 15 DE ABRIL DE 2026.
9	VALIDAR LA COMPATIBILIDAD DE REDES ESPECIALES CON LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 8 CONTRATO PISO 3 DEL 6 DE ABRIL DE 2026.
10	CONFIRMAR LA CONECTIVIDAD DE SERVIDORES, SWITCHES, PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO Y DEMÁS ELEMENTOS DE RED.	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDO, VERIFICANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 9 CONTRATO PISO 3 DEL 8 DE ABRIL DE 2026.
11	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS OPERATIVAS, DE COBERTURA, RENDIMIENTO Y REDUNDANCIA.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 8 CONTRATO PISO 3 DEL 6 DE ABRIL DE 2026. ACTA 9 CONTRATO PISO 3 DEL 8 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

12	ASEGURAR EL USO DE MATERIALES CERTIFICADOS Y EQUIPOS HOMOLOGADOS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 9 CONTRATO PISO 3 DEL 8 DE ABRIL DE 2026.
13	REVISAR PROTOCOLOS DE INSTALACIÓN, ETIQUETADO Y ORDEN ESTRUCTURAL EN CUARTOS TÉCNICOS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 8 CONTRATO PISO 3 DEL 6 DE ABRIL DE 2026.
14	BRINDAR SOPORTE DURANTE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO O VISITAS INSTITUCIONALES.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 60 CONTRATO URGENCIAS DEL 8 DE ABRIL DE 2026.
15	ATENDER LAS VISITAS DE AUDITORÍA QUE SE RECIBAN EN LA INSTITUCIÓN Y GENERAR LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y PLANES DE MEJORA.	SE ATIENDE VISITA DE CURADURÍA, CON RECORRIDO EN OBRA, SE VERIFICAN INSTALACIONES, DISTRIBUCIÓN, PLANOS APROBADOS Y PUNTOS DE CONEXIÓN A ACOMETIDAS.	X				SE ANEXA ACTA ACTA 61 CONTRATO URGENCIAS DEL 15 DE ABRIL DE 2026.
16	ASISTIR A COMITÉS TÉCNICOS Y DE OBRA CUANDO SE REQUIERA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE ANALIZAN LAS REDES DE LAS SALAS DE REANIMACIÓN, AVANCES Y CONEXIONES DE HVAC Y GASES MEDICINALES EN LA SALA DE OBSERVACIÓN FASTRACK, SE HACE RECORRIDO GENERAL DE OBRA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE APRUEBA EL MATERIAL DE LA CUBIERTA DE LA PÉRGOLA DE ACCESO, SE DETERMINA MANEJAR TEJA ARQUITECTÓNICA, TENIENDO EN CUENTA QUE ES EXTERIOR Y NO SE REQUIERE LA TIPO SÁNDWICH, SE APRUEBA CERRAR DEBAJO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA DEL COSTADO SUR, PARA APROVECHAR ESTE ESPACIO, INTERVENTORÍA SOLICITA CORREGIR EL PROBLEMA DE FUGAS QUE HAY EN EL SEGUNDO PISO EN LA ZONA DE ESTERILIZACIÓN, LO QUE AFECTA ESPACIOS DE DOS SALAS DE REANIMACIÓN, CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESO HA IMPEDIDO EMPLACAR Y CERRAR ESTOS ESPACIOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 59 CONTRATO URGENCIAS DEL 6 DE ABRIL DE 2026. ACTA 60 CONTRATO URGENCIAS DEL 8 DE ABRIL DE 2026. ACTA 61 CONTRATO URGENCIAS DEL 15 DE ABRIL DE 2026. ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 24 DE ABRIL DE 2026. ACTA 63 CONTRATO URGENCIAS DEL 28 DE ABRIL DE 2026. ACTA 8 CONTRATO PISO 3 DEL 6 DE ABRIL DE 2026. ACTA 9 CONTRATO PISO 3 DEL 8 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE REVISAN AVANCES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, SE VERIFICA EL TRAZADO FINAL DE LA VIO, PARA LA CONEXIÓN Y SALIDA A LA CARRERA 12, SE REVISAN LAS CAJAS DE INSPECCIÓN, POSOS DE INSPECCIÓN Y CONEXIÓN A EMISORES FINALES Y SALIDA A LA RED PRINCIPAL. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, Y PRDFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE MODIFICA LA UBICACIÓN DE LOS CALDERINES, DEBIDO A QUE SU UBICACIÓN ORIGINAL TENDRÍA INCONVENIENTES POR FALTA DE VENTILACIÓN, YA QUE EN SU UBICACIÓN INICIAL AL LADO DE LOS ASCENSORES DE VISITANTES SE MODIFICÓ ESE ESPACIO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE EXPONE EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, AVANCES DEL CONTRATO, EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, SE DESCRIBEN LOS ÍTEMS Y TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO, SECRETARÍA DE SALUD PLANTEA REALIZAR UN SOLO MODIFICATORIO PARA EL CONVENIO, SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES EN UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, LA ARQUITECTA MELISA BERMÚDEZ, EL ARQUITECTO FABIÁN MORENO, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE VERIFICAN LOS NUEVOS TRAZADOS DE LA RED CONTRAINCENDIOS, APROBADA PASANDO DE RED NEBULIZADA A UNA RED HÚMEDA, SE AVALAN DISEÑOS Y LOS ÍTEMS PARA SU INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, LA ARQUITECTA MELISA BERMÚDEZ, EL ARQUITECTO FABIÁN MORENO, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE ANALIZAN MODIFICACIONES DE FACHADAS, SE DEFINEN					ACTA 10 CONTRATO PISO 3 DEL 15 DE ABRIL DE 2026. ACTA 10 CONTRATO PISO 3 DEL 24 DE ABRIL DE 2026. ACTA 12 CONTRATO PISO 3 DEL 28 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		MATERIALES Y SE PLANTEAN COLORES, SE DETERMINA EL TAMAÑO, DIMENSIÓN, COLOR Y TIPO DE PERSIANA A INSTALAR EN LA FACHADA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE MODIFICA LA UBICACIÓN DE LOS CALDERINES, DEBIDO A QUE SU UBICACIÓN ORIGINAL TENDRÍA INCONVENIENTES POR FALTA DE VENTILACIÓN, YA QUE EN SU UBICACIÓN INICIAL AL LADO DE LOS ASCENSORES DE VISITANTES SE MODIFICÓ ESE ESPACIO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y PROFESIONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE EXPONE EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, AVANCES DEL CONTRATO, EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, SE DESCRIBEN LAS NECESIDADES Y LA PROYECCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO.					
17	EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS, RECOMENDACIONES O ALERTAS.	SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERMANENTEMENTE EN LAS MESAS TÉCNICAS Y COMITÉS A NECESIDAD.	X				SE ANEXAN ACTAS.
18	GENERAR UN INFORME FINAL CONCLUYENTE CON LAS RECOMENDACIONES RESPECTO AL OBJETO DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	SE ELABORA INFORME DEL MES CON DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	X				SE ENTREGA INFORME Y DOCUMENTOS ANEXOS SOPORTE.
CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
19	VERIFICAR LA APLICABILIDAD DE LAS REDES DE LOS SISTEMAS CRÍTICOS HOSPITALARIOS, REGULADAS POR LA NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, TÍTULO J DE LA NSR-10, LEY 1796 DE 2016.	DENTRO DE LOS COMITÉS TÉCNICOS, LOS COMITÉS DE OBRA Y LAS VISITAS DE OBRA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA APLICABILIDAD DE TODAS LAS NORMAS QUE EXIJA CADA DISCIPLINA TALES COMO: NSR-10 – REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, TÍTULO J: INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 48 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 8 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		RETIE – REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. RETIQ – REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO. NTC 2050 – CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO, COMO NORMA DE REFERENCIA PARA RETIE. NTC ISO 7396-1 Y NTC ISO 7396-2 – DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES. NTC 5854 – SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICACIONES HOSPITALARIAS. NTC 4995 – VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN HOSPITALARIA. ASRAE 170 -- VENTILACIÓN PARA INSTALACIONES DE ATENCIÓN EN SALUD. LEY 400 DE 1997 Y LA LEY 1796 DE 2016 – SUPERVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. DECRETO 4725 DE 2005 – REGLAMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y CONDICIONES TÉCNICAS HOSPITALARIAS.					ACTA 49 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 15 DE ABRIL DE 2026. ACTA 50 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026. ACTA 23 CONTRATO REDES UMI DEL 8 DE ABRIL DE 2026. ACTA 24 CONTRATO REDES UMI DEL 15 DE ABRIL DE 2026. ACTA 25 CONTRATO REDES UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026.
20	GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE REDES TÉCNICAS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 23 CONTRATO REDES UMI DEL 8 DE ABRIL DE 2026.
21	GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CONFORME A NORMAS DE BIDSEGURIDAD Y HABILITACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 24 CONTRATO REDES UMI DEL 15 DE ABRIL DE 2026
22	GARANTIZAR EL CONTROL DE GASES MEDICINALES, TABLEROS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 25 CONTRATO REDES UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026.
23	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.SE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN ACABADOS EN LOS QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS SE VERIFICAN ALTURAS, GARANTIZANDO LOS 2.80 METROS, PARA QUE LA LAMPARA CIELITICA FUNCIONE DE MANERA ADECUADA, SE VERIFICAN ACABADOS DE MUROS Y TECHOS, LA ADECUADA UBICACIÓN DE MEDIA CAÑAS EN MUROS, PISOS Y TECHOS.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 48 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 8 DE ABRIL DE 2026. ACTA 49 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 15 DE ABRIL DE 2026. ACTA 50 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE AVALAN DISEÑOS DE MUEBLES DE ESTACIONES DE ENFERMERÍA, CLOSETHS DE HABITACIONES, Y SE SOLICITAN AJUSTES EN LAS REDES ELÉCTRICAS, GASES MEDICINALES Y AUTOMATIZACIÓN PARA LOS PANELES DE CABECERA EN LAS HABITACIONES PARA PASAR A PANELES DOBLES EN ALGUNAS HABITACIONES PARA PASAR A SER BIPERSONALES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y PROFESIONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE EXPONE EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, AVANCES DEL CONTRATO, EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO Y ETAPA FINAL DEL PROYECTO, SE ANALIZAN FECHAS DE CULMINACIÓN.					
24	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES, SE REVISAN LOS TABLEROS DE AISLAMIENTO, SE REALIZAN PRUEBAS, SE VERIFICAN SUS REDES DE ACOMETIDAS, CABLEADOS Y DEMÁS COMPONENTES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN INSTALACIONES Y PREINSTALACIONES FINALES EN	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 23 CONTRATO REDES UMI DEL 8 DE ABRIL DE 2026. ACTA 24 CONTRATO REDES UMI DEL 15 DE ABRIL DE 2026. ACTA 25 CONTRATO REDES UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		LOS QUIRÓFANOS DE LA RED DE HVAC, DIFUSORES, DUCTOS, REJILLAS DE EXTRACCIÓN, REJILLAS DE FLUJO LAMINAR, UBICACIÓN DE SOPORTES PARA TORRES DE VIDA, SOPORTES PARA LAMPARA CIELITICA, TABLEROS DE AISLAMIENTO, CONEXIONES ELÉCTRICAS, REDES DE GASES MEDICINALES, PUNTOS ELÉCTRICOS Y PUNTOS DE VOZ Y DATOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y PROFESIONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE EXPONE EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, AVANCES DEL CONTRATO, EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO Y ETAPA FINAL DEL PROYECTO, SE ANALIZAN FECHAS DE CULMINACIÓN.					
25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS EN REDES DE COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 50 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026.
26	ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RACKS, CANALETAS, Y EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS.	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDO, VERIFICANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 48 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 8 DE ABRIL DE 2026. ACTA 49 CDNTRATO TERMINACION UMI DEL 15 DE ABRIL DE 2026.
27	VALIDAR LA COMPATIBILIDAD DE REDES ESPECIALES CON LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 23 CONTRATO REDES UMI DEL 8 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

28	CDNFIRMAR LA CDNECTIVIDAD DE SERVIDDRES, SWITCHES, PUNTDS DE ACCESO INALÁMBRICD Y DEMÁS ELEMENTDS DE RED.	SE HACE SEGUIMIENTD DEL CAPÍTULD DE AUTDMATIZACIÓN, VDZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDD, VERIFICANDD SU CDRRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 25 CONTRATO REDES UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026.
29	CDDRDINAR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DPERATIVAS, DE CDBERTURA, RENDIMIENTO Y REDUNDANCIA.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE DBRA, CDMITÉS TÉCNICDS Y CDMITÉS DE SEGUIMIENTD SEMANAL EN LA DBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 25 CDNTRATD REDES UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026.
30	ASEGURAR EL USD DE MATERIALES CERTIFICADDS Y EQUIPDS HDMDLDGADDS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICDS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTD SEMANAL EN LA DBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 24 CDNTRATD REDES UMI DEL 15 DE ABRIL DE 2026 ACTA 25 CONTRATO REDES UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026.
31	REVI5AR PRDTDCOLDS DE INSTALACIÓN, ETIQUETADD Y ORDEN ESTRUCTURAL EN CUARTDS TÉCNICOS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE DBRA, CDMITÉS TÉCNICDS Y CDMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 50 CDNTRATD TERMINACION UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026.
32	BRINDAR SDPDRTE DURANTE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO TÉCNICD D VISITAS INSTITUCIDNALES.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE DBRA, COMITÉS TÉCNICDS Y CDMITÉS DE SEGUIMIENTD SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 48 CDNTRATO TERMINACION UMI DEL 8 DE ABRIL DE 2026. ACTA 49 CONTRATD TERMINACIDN UMI DEL 15 DE ABRIL DE 2026.
33	ATENDER LAS VISITAS DE AUDITDRÍA QUE SE RECIBAN EN LA INSTITUCIÓN Y GENERAR LDS CDRRESPDNDIENTES INFDRMES Y PLANES DE MEJORA.	SE ATIENDE VISITA DE CONTROL URBANO, CDN RECDRRIDO EN OBRA, SE VERIFICAN DDCUMENTDS, PLANDS APRDBADDS, FACHADAS, POSIBLES MDDIFICACIDNES, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EL CUMPLIMIENTO EN GENERAL DE LA NORMATIVIDAD URBANA Y LINEAMIENTOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTD TERRITDRIAL.	X				ACTA DE REUNION.
34	GENERAR UN INFORME FINAL CDNCLUYENTE CDN LAS RECOMENDACIDNES RESPECTD AL OBJETO DEL CONTRATO.	SE ELABDRA INFORME DEL MES CON DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	X				SE ENTREGA INFORME Y DDCUMENTOS ANEXDS SDPDRTE.
35	ASISTIR A COMITÉS TÉCNICOS Y DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICD DE DBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, CDN PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVD, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PRDFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNDS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 48 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 8 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA CODRDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		ACABADOS EN LOS QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS SE VERIFICAN ALTURAS, GARANTIZANDO LOS 2.80 METROS, PARA QUE LA LAMPARA CIELITICA FUNCIONE DE MANERA ADECUADA, SE VERIFICAN ACABADOS DE MUROS Y TECHOS, LA ADECUADA UBICACIÓN DE MEDIA CAÑAS EN MUROS, PISOS Y TECHOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE AVALAN DISEÑOS DE MUEBLES DE ESTACIONES DE ENFERMERÍA, CLOSETHS DE HABITACIONES, Y SE SOLICITAN AJUSTES EN LAS REDES ELÉCTRICAS, GASES MEDICINALES Y AUTOMATIZACIÓN PARA LOS PANELES DE CABECERA EN LAS HABITACIONES PARA PASAR A PANELES DOBLES EN ALGUNAS HABITACIONES PARA PASAR A SER BIPERSONALES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIDNES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y PROFESIONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE EXPONE EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, AVANCES DEL CONTRATO, EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO Y ETAPA FINAL DEL PROYECTO, SE ANALIZAN FECHAS DE CULMINACIÓN. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES, SE REVISAN LOS TABLEROS DE AISLAMIENTO, SE REALIZAN PRUEBAS, SE VERIFICAN SUS REDES DE ACOMETIDAS, CABLEADOS Y DEMÁS COMPONENTES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO					ACTA 49 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 15 DE ABRIL DE 2026.. ACTA 50 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026. ACTA 23 CONTRATO REDES UMI DEL 8 DE ABRIL DE 2026. ACTA 24 CONTRATO REDES UMI DEL 15 DE ABRIL DE 2026. ACTA 25 CONTRATO REDES UMI DEL 28 DE ABRIL DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 513 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA,** presentó INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexos a la presente), realizadas durante el mes de **ABRIL DE 2026.**

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	X		FACTURA		
CUENTA DE COBRO	X		CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA		
INFORME DE ACTIVIDADES	X		CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad, tal como lo certificó el Asesor de Gerencia y Asesor Hospitalario a la Supervisión del Contrato de Construcción de la Ampliación de Urgencias e Infraestructura de Alta Complejidad de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja (ETAPA 1) Departamento de Boyacá y la Construcción de las Instalaciones de la Umi y demás Obras en Ejecución. (documento adjunto a la presente), en su condición de Apoyo a la Supervisión del Contrato.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, abril de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: **Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		INFANTIL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN INSTALACIONES Y PREINSTALACIONES FINALES EN LOS QUIRÓFANOS DE LA RED DE HVAC, DIFUSORES, DUCTOS, REJILLAS DE EXTRACCIÓN, REJILLAS DE FLUJO LAMINAR, UBICACIÓN DE SOPORTES PARA TORRES DE VIDA, SOPORTES PARA LAMPARA CIELITICA, TABLEROS DE AISLAMIENTO, CONEXIONES ELÉCTRICAS, REDES DE GASES MEDICINALES, PUNTOS ELÉCTRICOS Y PUNTOS DE VOZ Y DATOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICAN AVANCES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UMI UNIDAD MATERNO INFANTIL, DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y PROFESIONALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE EXPONE EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, AVANCES DEL CONTRATO, EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO Y ETAPA FINAL DEL PROYECTO, SE ANALIZAN FECHAS DE CULMINACIÓN.					
36	EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS, RECOMENDACIONES O ALERTAS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTE EN LA INTERACCIÓN CON EL CONTRATISTA DE OBRA Y CON LA INTERVENTORÍA, ADICIONALMENTE SE SOCIALIZA TODOS LOS DÍAS CON EL ARQUITECTO CRISTIAN GOMEZ.	X				SE HAN REALIZADO CON INTERVENTORÍA Y AL SUPERVISOR.
37	GENERAR UN INFORME FINAL CONCLUYENTE CON LAS RECOMENDACIONES RESPECTO AL OBJETO DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES	SE ELABORA INFORME DEL MES CON DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	X				SE ENTREGA INFORME Y DOCUMENTOS ANEXOS SOPORTE.

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Tunja, abril de 2026

Doctor
VICTOR MANUEL SANCHEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 347 de 2026

Respetado Doctor:

Comedidamente me permito hacer entrega del Informe de las actividades realizadas durante el mes de **abril de 2026,** en Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 347 del 2026, el cual tiene como OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR TECNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO, CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRCUTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, así:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1) DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO							
1	Verificar la aplicabilidad de las redes de los sistemas críticos hospitalarios, reguladas por la NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, Título J de la NSR-10, Ley 1796 de 2016	Dentro de los comités técnicos, los comités de obra y las visitas de obra se le solicita al contratista la aplicabilidad de todas las normas que exija cada disciplina tales como: - NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Título J: Instalaciones eléctricas. - RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. - RETIQ – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. - NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano, como norma de referencia para RETIE.	X				Se anexan actas Acta 59 contrato urgencias del 6 de abril de 2026 Acta 60 contrato urgencias del 8 de abril de 2026 Acta 61 contrato urgencias del 15 de abril de 2026 Acta 62 contrato urgencias del 24 de abril de 2026

		- NTC ISO 7396-1 y NTC ISO 7396-2 – Diseño e instalación de redes de gases medicinales. - NTC 5854 – Sistema de aire acondicionado en edificaciones hospitalarias. - NTC 4995 – Ventilación y climatización hospitalaria. - ASRAE 170 – Ventilación para instalaciones de atención en salud. - Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 – Supervisión técnica obligatoria. - Decreto 4725 de 2005 – Reglamentación de dispositivos médicos y condiciones técnicas hospitalarias.					Acta 63 contrato urgencias del 28 de abril de 2026
2	Garantizar la compatibilidad entre redes técnicas	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas
3	Garantizar la Instalación conforme a normas de bioseguridad y habilitación	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas
4	Garantizar el Control de gases medicinales, tableros eléctricos y automatización	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas
5	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato de la construcción de la ampliación de urgencias e infraestructura de alta complejidad del ESE hospital universitario San Rafael de Tunja (etapa 1).	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se analizan las redes de las salas de reanimación, avances y conexiones de HVAC y gases medicinales en la sala de observación fastrack, se hace recorrido general de obra. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se aprueba el material de la cubierta de la pérgola de acceso, se determina manejar teja arquitectónica, teniendo en cuenta que es exterior y no se requiere la tipo sándwich, se aprueba cerrar debajo de la escalera de emergencia del costado sur, para aprovechar este espacio, interventoría solicita corregir el problema de fugas que hay en el segundo piso en la zona de esterilización, lo que afecta espacios de dos salas de reanimación, contratista manifiesta que eso ha impedido emplacar y cerrar estos espacios.	X				Se anexan actas Acta 59 contrato urgencias del 6 de abril de 2026 Acta 60 contrato urgencias del 8 de abril de 2026 Acta 61 contrato urgencias del 15 de abril de 2026 Acta 62 contrato urgencias del 24 de abril de 2026 Acta 63 contrato urgencias del 28 de abril de 2026

		Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se revisan avances de la construcción de la vía, se verifica el trazado final de la vio, para la conexión y salida a la carrera 12, se revisan las cajas de inspección, posos de inspección y conexión a emisores finales y salida a la red principal. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se modifica la ubicación de los calderines, debido a que su ubicación original tendría inconvenientes por falta de ventilación, ya que en su ubicación inicial al lado de los ascensores de visitantes se modificó ese espacio Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, director de planeación de la secretaria de Salud departamental, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se expone el estado actual de la obra, avances del contrato, ejecución física y financiera, se describen los ítems y todos los requerimientos para el ajuste del proyecto, secretaría de salud plantea realizar un solo modificatorio para el convenio, se solicita al contratista presentar todos los documentos y soportes en un máximo de ocho días.					
6	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato de la construcción de infraestructura de alta complejidad para la ampliación del servicio de hospitalización adulto de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se verifican los nuevos trazados de la red contraincendios, aprobada pasando de red nebulizada a una red húmeda, se avalan diseños y los ítems para su inclusión en el presupuesto. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se analizan modificaciones de fachadas, se definen materiales y se plantean colores, se	X				Se anexan actas Acta 8 contrato piso 3 del 6 de abril de 2026 Acta 9 contrato piso 3 del 8 de abril de 2026 Acta 10 contrato piso 3 del 15 de abril de 2026 Acta 10 contrato piso 3 del 24 de abril de 2026 Acta 12 contrato piso 3 del 28 de abril de 2026

		determina el tamaño, dimensión, color y tipo de persiana a instalar en la fachada. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se modifica la ubicación de los calderines, debido a que su ubicación original tendría inconvenientes por falta de ventilación, ya que en su ubicación inicial al lado de los ascensores de visitantes se modificó ese espacio. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, director de planeación de la secretaria de Salud departamental, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se expone el estado actual de la obra, avances del contrato, ejecución física y financiera, se describen las necesidades y la proyección de terminación del proyecto.					
7	Verificar el cumplimiento técnico de planos, especificaciones y normativas en redes de comunicación, seguridad y automatización.	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 10 contrato piso 3 del 15 de abril de 2026
8	Asegurar la correcta instalación de cableado estructurado, racks, canaletas, y equipos activos y pasivos.	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				Se anexan actas Acta 10 contrato piso 3 del 15 de abril de 2026
9	Validar la compatibilidad de redes especiales con la infraestructura hospitalaria existente	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				se anexan actas Acta 8 contrato piso 3 del 6 de abril de 2026
10	Confirmar la conectividad de servidores, switches, puntos de acceso inalámbrico y demás elementos de red	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				se anexan actas Acta 9 contrato piso 3 del 8 de abril de 2026
11	Coordinar la realización de pruebas operativas, de cobertura, rendimiento y redundancia	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 8 contrato piso 3 del 6 de abril de 2026 Acta 9 contrato piso 3 del 8 de abril de 2026

12	Asegurar el uso de materiales certificados y equipos homologados	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 9 contrato piso 3 del 8 de abril de 2026
13	Revisar protocolos de instalación, etiquetado y orden estructural en cuartos técnicos	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 8 contrato piso 3 del 6 de abril de 2026
14	Brindar soporte durante inspecciones de cumplimiento técnico o visitas institucionales	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 60 contrato urgencias del 8 de abril de 2026
15	Atender las visitas de auditoría que se reciban en la institución y generar los correspondientes informes y planes de mejora.	Se atiende visita de curaduría, con recorrido en obra, se verifican instalaciones, distribución, planos aprobados y puntos de conexión a acometidas.	X				Se anexa acta Acta 61 contrato urgencias del 15 de abril de 2026
16	Asistir a comités técnicos y de obra cuando se requiera	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se analizan las redes de las salas de reanimación, avances y conexiones de HVAC y gases medicinales en la sala de observación fastrack, se hace recorrido general de obra. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se aprueba el material de la cubierta de la pérgola de acceso, se determina manejar teja arquitectónica, teniendo en cuenta que es exterior y no se requiere la tipo sándwich, se aprueba cerrar debajo de la escalera de emergencia del costado sur, para aprovechar este espacio, interventoría solicita corregir el problema de fugas que hay en el segundo piso en la zona de esterilización, lo que afecta espacios de dos salas de reanimación, contratista manifiesta que eso ha impedido emplacar y cerrar estos espacios. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se revisan avances de la construcción de la vía, se verifica el trazado final de la vio, para la conexión y salida a la carrera 12, se revisan las cajas de inspección, posos	X				Se anexan actas Acta 59 contrato urgencias del 6 de abril de 2026 Acta 60 contrato urgencias del 8 de abril de 2026 Acta 61 contrato urgencias del 15 de abril de 2026 Acta 62 contrato urgencias del 24 de abril de 2026 Acta 63 contrato urgencias del 28 de abril de 2026 Acta 8 contrato piso 3 del 6 de abril de 2026 Acta 9 contrato piso 3 del 8 de abril de 2026 Acta 10 contrato piso 3 del 15 de abril de 2026

		de inspección y conexión a emisores finales y salida a la red principal. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se modifica la ubicación de los calderines, debido a que su ubicación original tendría inconvenientes por falta de ventilación, ya que en su ubicación inicial al lado de los ascensores de visitantes se modificó ese espacio Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, director de planeación de la secretaria de Salud departamental, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se expone el estado actual de la obra, avances del contrato, ejecución física y financiera, se describen los ítems y todos los requerimientos para el ajuste del proyecto, secretaría de salud plantea realizar un solo modificatorio para el convenio, se solicita al contratista presentar todos los documentos y soportes en un máximo de ocho días. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se verifican los nuevos trazados de la red contraincendios, aprobada pasando de red nebulizada a una red húmeda, se avalan diseños y los ítems para su inclusión en el presupuesto. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se analizan modificaciones de fachadas, se definen materiales y se plantean colores, se determina el tamaño, dimensión, color y tipo de persiana a instalar en la fachada. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se modifica la ubicación de los calderines, debido a que su ubicación original tendría inconvenientes por falta de ventilación, ya que en su					Acta 10 contrato piso 3 del 24 de abril de 2026 Acta 12 contrato piso 3 del 28 de abril de 2026

		ubicación inicial al lado de los ascensores de visitantes se modificó ese espacio. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, director de planeación de la secretaria de Salud departamental y profesionales de la secretaría de Salud Departamental, de apoyo a la supervisión del convenio, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se expone el estado actual de la obra, avances del contrato, ejecución física y financiera, se describen las necesidades y la proyección de terminación del proyecto.					
17	Emitir conceptos técnicos, recomendaciones o alertas.	Se realiza la actividad permanentemente en las mesas técnicas y comités a necesidad.	X				Se anexan actas
18	Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto de los contratos relacionados con la construcción de infraestructura para la ampliación del servicio de hospitalización Adulto de La ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.	X				Se entrega informe y documentos anexos soporte
CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
19	Verificar la aplicabilidad de las redes de los sistemas críticos hospitalarios, reguladas por la NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, Título J de la NSR-10, Ley 1796 de 2016	Dentro de los comités técnicos, los comités de obra y las visitas de obra se le solicita al contratista la aplicabilidad de todas las normas que exija cada disciplina tales como: - NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Título J: Instalaciones eléctricas. - RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. - RETIQ – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. - NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano, como norma de referencia para RETIE. - NTC ISO 7396-1 y NTC ISO 7396-2 – Diseño e instalación de redes de gases medicinales.	X				Se anexan actas Acta 48 contrato terminacion UMI del 8 de abril de 2026 Acta 49 contrato terminacion UMI del 15 de abril de 2026 Acta 50 contrato terminacion UMI del 28 de abril de 2026

		- NTC 5854 – Sistema de aire acondicionado en edificaciones hospitalarias. - NTC 4995 – Ventilación y climatización hospitalaria. - ASRAE 170 – Ventilación para instalaciones de atención en salud. - Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 – Supervisión técnica obligatoria. - Decreto 4725 de 2005 – Reglamentación de dispositivos médicos y condiciones técnicas hospitalarias.					Acta 23 contrato redes UMI del 8 de abril de 2026 Acta 24 contrato redes UMI del 15 de abril de 2026 Acta 25 contrato redes UMI del 28 de abril de 2026
20	Garantizar la compatibilidad entre redes técnicas	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 23 contrato redes UMI del 8 de abril de 2026
21	Garantizar la Instalación conforme a normas de bioseguridad y habilitación	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 24 contrato redes UMI del 15 de abril de 2026
22	Garantizar el Control de gases medicinales, tableros eléctricos y automatización	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 25 contrato redes UMI del 28 de abril de 2026
23	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato construcción para la terminación de la remodelación y ampliación de la infraestructura física de la Unidad Materno Infantil de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican acabados en los quirófanos y salas de partos se verifican alturas, garantizando los 2.80 metros, para que la lampara cielitica funcione de manera adecuada, se verifican acabados de muros y techos, la adecuada ubicación de media cañas en muros, pisos y techos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, se avalan diseños de muebles de estaciones de enfermería, closeths de habitaciones, y se solicitan ajustes en las redes eléctricas, gases medicinales y automatización para los paneles de cabecera en las habitaciones para pasar a paneles dobles en algunas habitaciones para pasar a ser bipersonales. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales	X				Se anexan actas Acta 48 contrato terminacion UMI del 8 de abril de 2026 Acta 49 contrato terminacion UMI del 15 de abril de 2026 Acta 50 contrato terminacion UMI del 28 de abril de 2026

		apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, director de planeación de la secretaria de Salud departamental y profesionales de la secretaría de Salud Departamental, de apoyo a la supervisión del convenio, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se expone el estado actual de la obra, avances del contrato, ejecución física y financiera, teniendo en cuenta el estado y etapa final del proyecto, se analizan fechas de culminación.					
24	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato modernización de redes en la sede unidad materno infantil María Josefa canelones de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances, se revisan los tableros de aislamiento, se realizan pruebas, se verifican sus redes de acometidas, cableados y demás componentes. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican instalaciones y preinstalaciones finales en los quirófanos de la red de HVAC, difusores, ductos, rejillas de extracción, rejillas de flujo laminar, ubicación de soportes para torres de vida, soportes para lampara cielitica, tableros de aislamiento, conexiones eléctricas, redes de gases medicinales, puntos eléctricos y puntos de voz y datos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, director de planeación de la secretaria de Salud departamental y profesionales de la secretaría de Salud Departamental, de apoyo a la supervisión del convenio, para hacer seguimiento de ejecución del	X				Se anexan actas Acta 23 contrato redes UMI del 8 de abril de 2026 Acta 24 contrato redes UMI del 15 de abril de 2026 Acta 25 contrato redes UMI del 28 de abril de 2026

		proyecto, se expone el estado actual de la obra, avances del contrato, ejecución física y financiera, teniendo en cuenta el estado y etapa final del proyecto, se analizan fechas de culminación.					
25	Verificar el cumplimiento técnico de planos, especificaciones y normativas en redes de comunicación, seguridad y automatización	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 50 contrato terminacion UMI del 28 de abril de 2026
26	Asegurar la correcta instalación de cableado estructurado, racks, canaletas, y equipos activos y pasivos	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				Se anexan actas Acta 48 contrato terminacion UMI del 8 de abril de 2026 Acta 49 contrato terminacion UMI del 15 de abril de 2026
27	Validar la compatibilidad de redes especiales con la infraestructura hospitalaria existente	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 23 contrato redes UMI del 8 de abril de 2026
28	Confirmar la conectividad de servidores, switches, puntos de acceso inalámbrico y demás elementos de red	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				Se anexan actas Acta 25 contrato redes UMI del 28 de abril de 2026
29	Coordinar la realización de pruebas operativas, de cobertura, rendimiento y redundancia	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 25 contrato redes UMI del 28 de abril de 2026
30	Asegurar el uso de materiales certificados y equipos homologados	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 24 contrato redes UMI del 15 de abril de 2026 Acta 25 contrato redes UMI del 28 de abril de 2026
31	Revisar protocolos de instalación, etiquetado y orden estructural en cuartos técnicos	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 50 contrato terminacion UMI del 28 de abril de 2026
32	Brindar soporte durante inspecciones de cumplimiento técnico o visitas institucionales.	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 48 contrato terminacion UMI del 8 de abril de 2026 Acta 49 contrato terminacion UMI del 15 de abril de 2026

33	Atender las visitas de auditoría que se reciban en la institución y generar los correspondientes informes y planes de mejora.	Se atiende visita de control urbano, con recorrido en obra, se verifican documentos, planos aprobados, fachadas, posibles modificaciones, estructuras metálicas y el cumplimiento en general de la normatividad urbana y lineamientos del plan de ordenamiento territorial.	X				
34	Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto del contrato.	Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.	X				Se entrega informe y documentos anexos soporte
35	Asistir a comités técnicos y de obra cuando se requiera	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican acabados en los quirófanos y salas de partos se verifican alturas, garantizando los 2.80 metros, para que la lampara cielitica funcione de manera adecuada, se verifican acabados de muros y techos, la adecuada ubicación de media cañas en muros, pisos y techos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, se avalan diseños de muebles de estaciones de enfermería, closeths de habitaciones, y se solicitan ajustes en las redes eléctricas, gases medicinales y automatización para los paneles de cabecera en las habitaciones para pasar a paneles dobles en algunas habitaciones para pasar a ser bipersonales. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, director de planeación de la secretaria de Salud departamental y profesionales de la secretaría de Salud Departamental, de apoyo a la supervisión del convenio, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se expone el estado actual de la obra, avances del contrato, ejecución física y financiera, teniendo en cuenta el estado y etapa final del proyecto, se analizan fechas de culminación.	X				Se anexan actas Acta 48 contrato terminacion UMI del 8 de abril de 2026 Acta 49 contrato terminacion UMI del 15 de abril de 2026 Acta 50 contrato terminacion UMI del 28 de abril de 2026 Acta 23 contrato redes UMI del 8 de abril de 2026 Acta 24 contrato redes UMI del 15 de abril de 2026 Acta 25 contrato redes UMI del 28 de abril de 2026

		Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión y supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances, se revisan los tableros de aislamiento, se realizan pruebas, se verifican sus redes de acometidas, cableados y demás componentes. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican instalaciones y preinstalaciones finales en los quirófanos de la red de HVAC, difusores, ductos, rejillas de extracción, rejillas de flujo laminar, ubicación de soportes para torres de vida, soportes para lampara cielitica, tableros de aislamiento, conexiones eléctricas, redes de gases medicinales, puntos eléctricos y puntos de voz y datos. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifican avances. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones de la UMI unidad materno infantil, del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, director de planeación de la secretaria de Salud departamental y profesionales de la secretaría de Salud Departamental, de apoyo a la supervisión del convenio, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se expone el estado actual de la obra, avances del contrato, ejecución física y financiera, teniendo en cuenta el estado y etapa final del proyecto, se analizan fechas de culminación.					
36	Emitir conceptos técnicos, recomendaciones o alertas.	Esta actividad se realiza permanente en la interacción con el contratista de obra y con la interventoría, adicionalmente se socializa todos los días con el arquitecto Cristian Gomez.	X				Se han realizado con interventoría y al supervisor
37	Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto de los contratos relacionados con la Sede Unidad Materno Infantil María Josefa Canelones	Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.	X				Se entrega informe y documentos anexos soporte

1). Se cumplio en su totalidad la actividad definida.
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR).

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)	VALOR PAGO PLANILLA ($)	VALOR DEL CONTRATO IBC ($)	NÚMERO DE PLANILLA
Abril de 2026	23-04-2026	$ 4.920.000.00	$3.200.000	6012897340
OBSERVACIONES				

Cordialmente,

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Ingeniero civil
Especialista en infraestructura vial
C.C. 1.052.393.749 de Duitama
Contratista.

ACTA DE COMITÉ

PROYECTO: "MODERNIZACION DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO/TELÉFONO	FIRMA
Fabian Forero	HUSRT	311816 5354	
Yuri Sebri	Coc Salud	3138377552	
Carmen Sabrib	U.S.T	3006787856	
Sergio Lopez	JSB	3213572812	
Nicolas Sanchez	HUSRT	3117229103	
Daniel Sandoval			

Scanned with CamScanner

ACTA DE COMITÉ

PROYECTO: *"MODERNIZACION DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*

procesos finales, sin observaciones técnicas relevantes durante el recorrido efectuado.

2. Se continua comité de obra con recorrido de obra por todos los pisos y espacios para verificar el avance mencionado.

- Sotano: Se inicia recorrido por areas administrativas y archivo constatando los avances en instalación de RCI, voz y datos y estructura para cielo raso
- Piso 1: Se constata avance en cierres de iluminación y cielos rasos, al igual que la instalación de rejillas HVAC.
- Piso 2: Se verifican los avances y las alturas establecidas, tanto en salas de partos como en quirofanos
- Piso 3: Se constatan avances de cierre en actividades como: Instalaciones electricas. Cielo raso y luminaria en áreas de Uci pediatrica, hospitalización y ludoteca.
- Piso 4: Se inicia recorrido en areas de hospitalización, verificando instalación en Cielos rasos y redes eléctricas, se mantiene el nivel cerrado y liberado para

Scanned with CamScanner

VISTA	**ACTA DE COMITÉ** PROYECTO: "MODERNIZACION DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ACTA No.	Acta de comite N° 15		
FECHA REUNIÓN	28 de Abril del 2026		
LUGAR	Obra: Unidad materno infantil.		
HORA INICIO:	11:30 a.m.	12:30 P.M	
ASISTENTES:	• Supervisión obra HUSRT • Contratista de obra • Interventoria.		
OBJETIVO	Seguimiento de temas tecnicos y administrativos.		

ORDEN DEL DÍA:

- Revisión de actividades ejecutadas durante la semana
- Recorrido de obra

DESARROLLO DEL COMITÉ:

1. Dando inicio al orden del dia se da presentacion por obra (contratista) de los porcentajes de ejecucion de obra.

% Financiero
- Programado: 99%
- Ejecutado: 88%
- Diferencia: -11

% Fisico:
- Programado: 99%
- Ejecutado: 92%
- Diferencia: -7%

CONSORCIO INTERHOSPITALIZACIÓN	ACTA DE COMITE	Versión: 01
		FECHA: 01/06/2023

ACTA No.			
OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa tecnica.		
LUGAR:	Subgerencia	**FECHA:**	06/04/2026.
HORA INICIO:		**HORA FINALIZACIÓN:**	11:20am

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO/ TELÉFONO	FIRMA
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSET.	3138281340	
Fabian Quijano	HUSET	3112414049.	
Santiago Cifuentes	HUSET	3204699812	
Fabian Moreno G	HUSET.	3181653354	
GERMAN RODRIGUEZ W	CJACH	3123194648.	

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS A TRATAR :

1.	4.
2.	5.
3.	6.





2. DESARROLLO DEL COMITÉ: Se realeza mesa tecnica donde se tratan los siguientes temas:

1. Render - Fachada: Se solecita esta información a fin de identificar y materializar las franjas y colores.

3. COMPROMISOS:	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

MESON EN ACERO INCLUYE POCETA								LAVAMANOS QUIRURGICO					VERTEDERO					LAVAPLATOS
UBICACIÓN	POCETAS ACERO INOX	Cantidad	Longitud	Long total	Ancho	Observacion	Esquema ilustrativo	Cantidad	Largo	Ancho	Observacion	Esquema ilustrativo	Cantidad	Largo	Ancho	Observacion	Esquema ilustrativo	Observacion
PISO 3	CIRCULACION TRABAJO LIMPIO	1,00		1,22	0,60		La jefe Laura Rodriguez Solicita punto electrico en este punto y solicita que NO se instale punto hidraulico ni sanitario.											
PISO 3	EXCLUSAS	2,00																Especificaciones Dimensiones: 400 x 400 x 350mm Prof, Material: Lámina de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Con Sensor

Escaneado con Cam

								LAVAMANOS DOMINICO					VERTEDERO						
UBICACION	POCETAS ACERO INOX	Cantidad	Longitud	Long total	Ancho	Observacion	Esquema ilustrativo	Cantidad	Largo	Ancho	Observacion	Esquema ilustrativo	Cantidad	Largo	Ancho	Observacion	Esquema ilustrativo	Observacion	Esquema ilustrativo
PISO 3	PROCEDIMIENTOS	1,00	1,27	1,27	0,60	Meson con 1 poceta (1 izq) de 50 cm ancho- 40 cm largo -30 cm profundidad c/u. Salpicadero en U. Incluye entrepaño en Al. Estructura tubo. Griferia Sensor		1,00	0,60	0,60	Ver pesos lavamanos quirurgico tipo 1. Griferia sensor								
PISO 3	TRABAJO LIMPIO	1,00	3,80	3,80	0,60	Meson con 1 poceta izq de 60 cm ancho- 40 cm largo -15 cm profundidad c/u. Salpicadero en U. Soporte con mueble en madera RH formica. Griferia con sensor. Incluye entrepaño en madera													
PISO 3	TRABAJO SUCIO Y LAVAPATOS	1,00	1,54	1,54	0,60	Meson con 1 poceta al lado del vertedero de 50 cm ancho- 40 cm largo -30 cm profundidad c/u. Salpicadero en U. Incluye entrepaño en Al. Estructura tubo. Griferia cuello de ganzo							1,00	0,60	0,60	Diametro del vertedero 0.4 m y faldon de 0.50m. Incluye push			
		1,00	1,54	1,54	0,60	Meson con 1 poceta (1 izq) de 50 cm ancho- 40 cm largo -30 cm profundidad c/u. Salpicadero en U. Incluye entrepaño en Al. Estructura tubo. Griferia Sensor												Especificaciones Dimensiones: 400 x 400 x 390mm Prof, Material: Lámina de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Con Sensor	
PISO 3	CIRCULACION LAVADO	1,00																Especificaciones Dimensiones: 400 x 400 x 390mm Prof, Material: Lámina de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Con Sensor	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO

ACTA DE COMITE

Version 01

FECHA 01/09/2021

CONTINUA - 2 DESARROLLO DEL COMITÉ:

3. Rieles: el color queda definido como tipo 8 oder.

4. Redes de descanso medico: Arq. Cristian Gomez solicita que se instale puntos electrico y punto de datos.

5. Programacion llamados de enfermeria: el arq. Cristian Gomez menciona que la numeracion esta desde la derecha. Se anexa plano

6. Plano guardacamilla: Se anexa plano de ubicacion de estos elementos.

7. Tipologia Ventanas: Arq. Cristian Gomez solicita que estas ventanas son corredoras con apertura de 18cm.

8. Dotas telefono: Arq. Cristian Gomez menciona que enviara ficha tecnica de teleducta con soporte graduable a pared.

9. Pantallas tv. estacion de enfermeria: Arq. Cristian Gomez solicita que se incluya:
Estacion de enfermeria (grande): 5 Puntos.
Estacion de enfermeria (satelital) 1 punto en cada espacio.

10. Iluminacion: Arq. Cristian Gomez solicita, que sea lineal pero que sea Asimetrica. Revisar tema con Retrofab.

11. Descanso medico: Arq. Cristian Gomez solicita que ~~la~~ se realice Ventana en costado oriental (antepecho + ventana). Muro completo costado Norte y Sur.

12. Trabajo limpio: en circulacion el Arq. Cristian Gomez y Tefe Laura R. Solicitan que no se instale punto hidraulico ni sanitario este espacio funcionara como cuarto Paro y solicita un Punto de conexion Regulada.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO	ACTA DE COMITE	Versión 01
		FECHA 01/09/2023

ACTA No.			
OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa tecnica.		
LUGAR:	Subgerencia.	FECHA:	14/01/2026.
HORA INICIO:	9:50am.	HORA FINALIZACIÓN:	

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO/ TELÉFONO	FIRMA
Fabian Mateo	HUSET	3118165354	
Santiago Chaparro	HUSRT	3204899612	
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSET	3138284310	
GERMAN RODRIGUEZ M	CAEH	3123194669	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS A TRATAR :


1. Media Caña Pic.
2. Media Caña granito - Guardaescoba.
3. Puertas
4. Redes de descanso medico.
5. Programacion llamadas enfermeria
6. Plano guardacamilla.

2. DESARROLLO DEL COMITÉ: Se realiza mesa tecnica donde se tratan los siguientes temas:

1. Media caña Pic: el arq. Cristian Gomez indica que se instale en baños, circulaciones y habitaciones. (techos).

2. Guardaescoba: El arq. Cristian Gomez menciona que en el ppto queb como guardaescoba, pero se solicita que se realice media caña en granito; esto con el fin de realizar la actividad en obra nueva. " esto en todos los pisos.


3. COMPROMISOS:	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

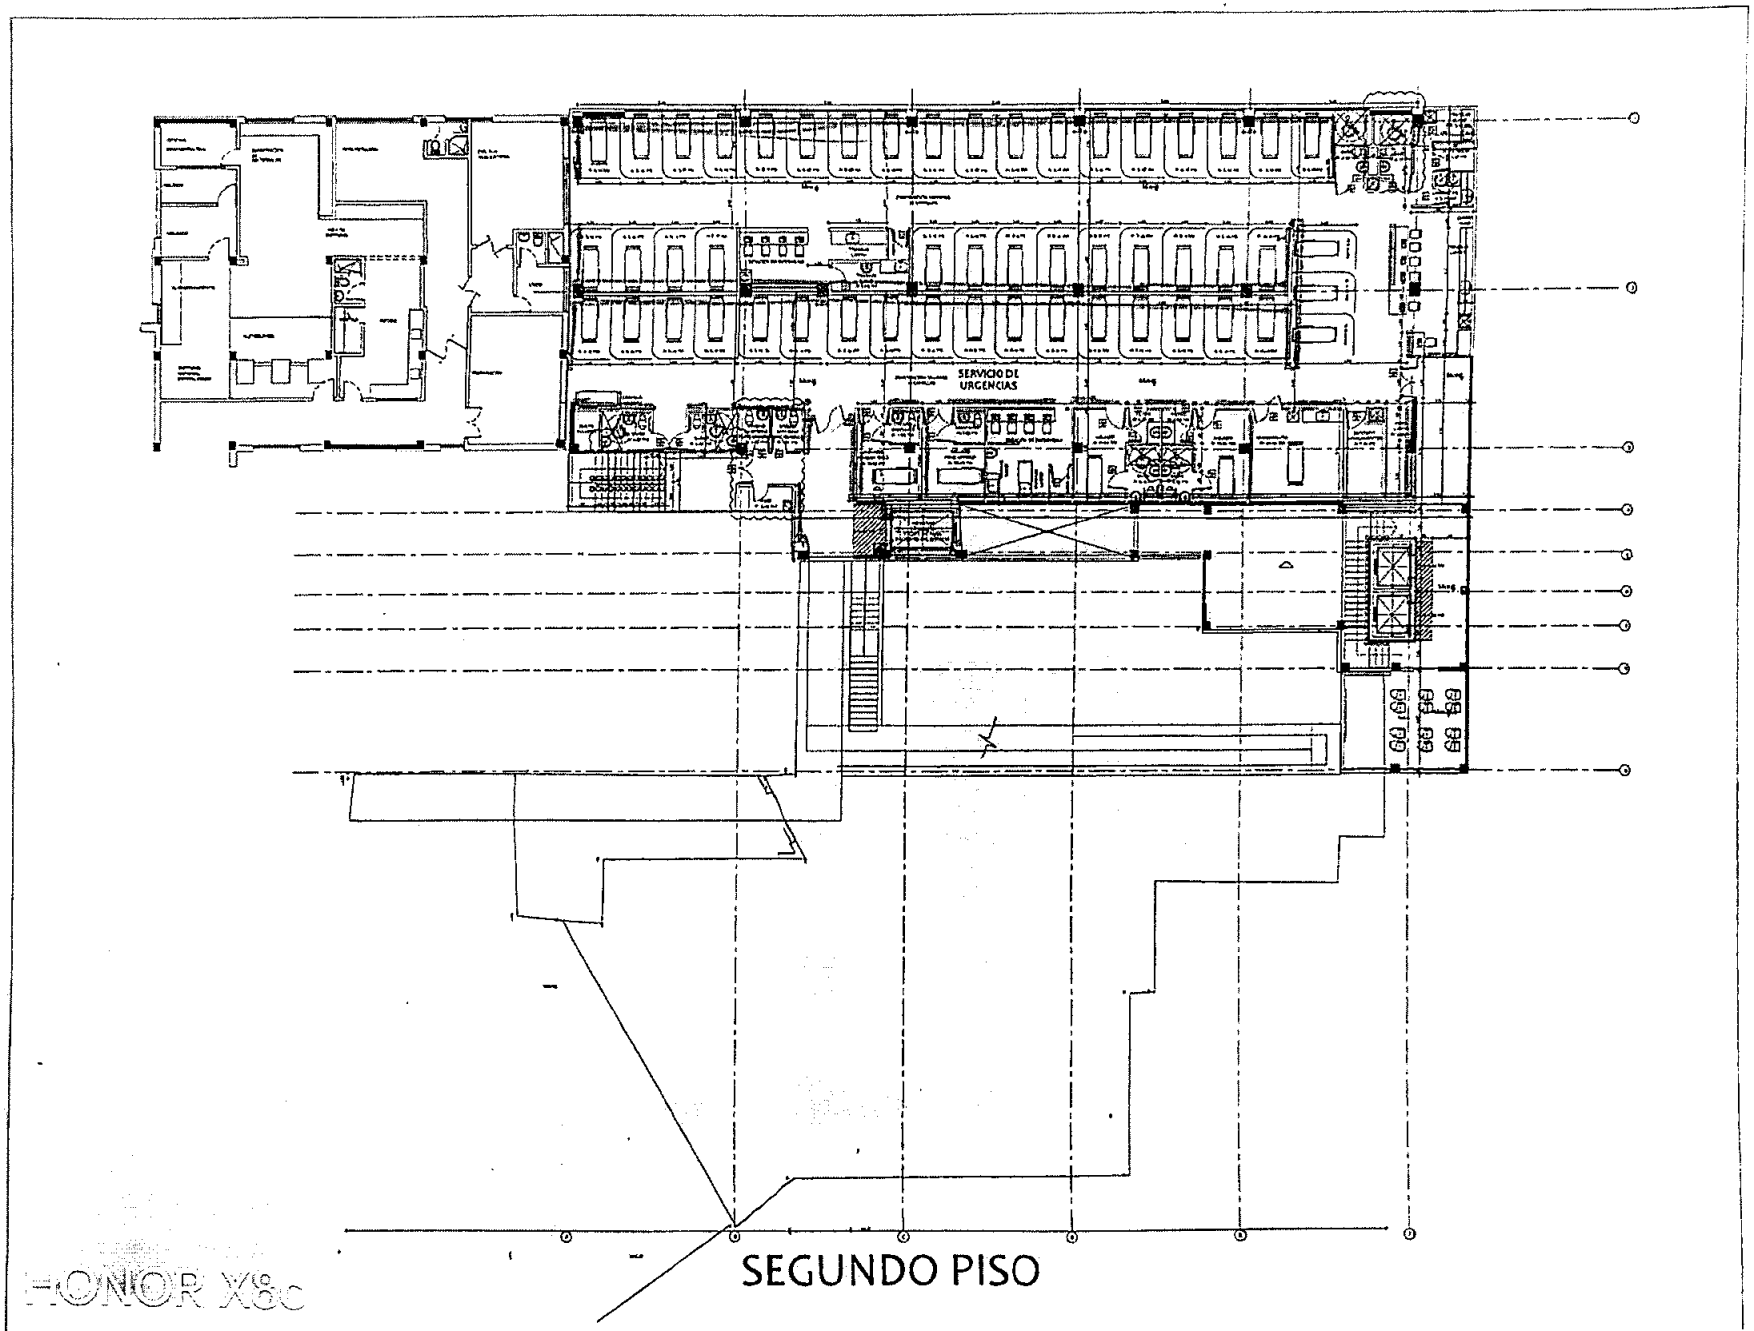

SEGUNDO PISO

HONOR X8c

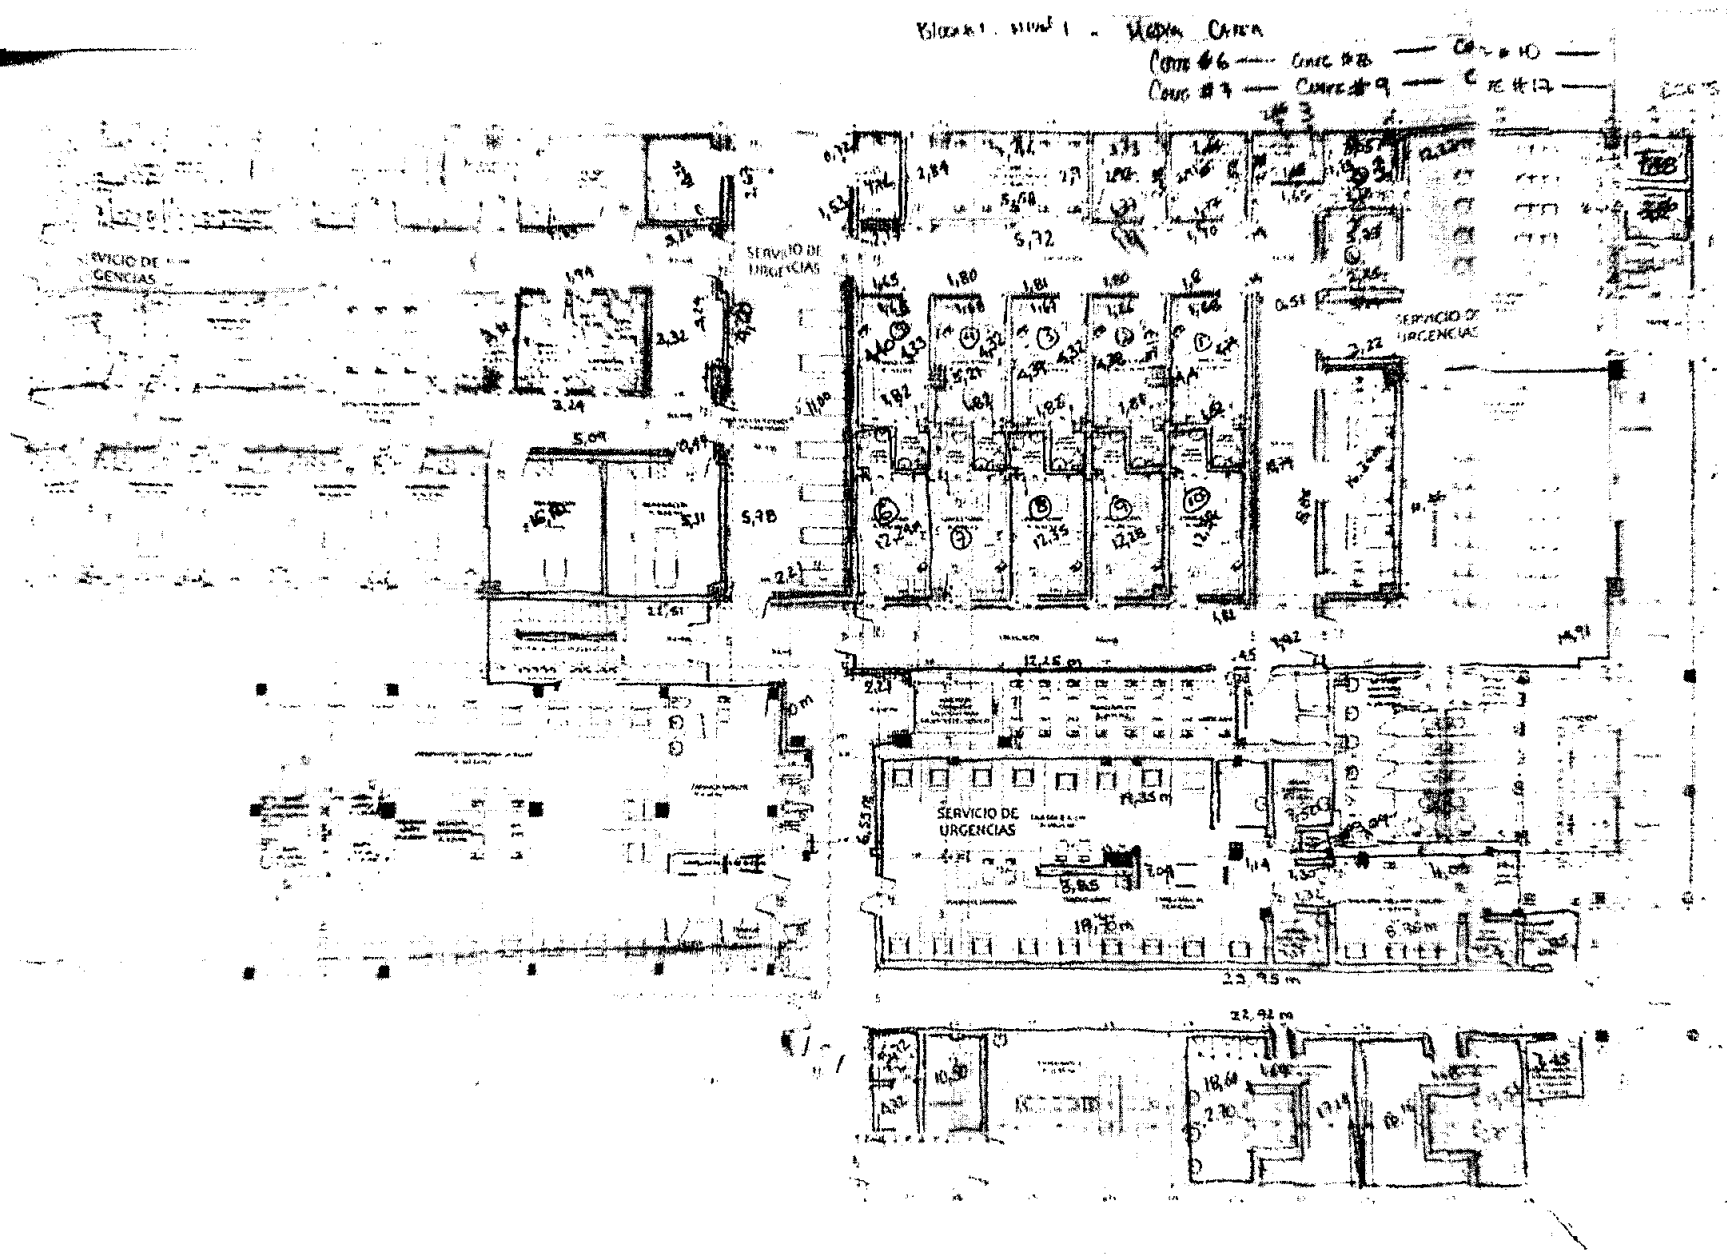Escaneado con CamS



PRIMER PISO
ARQUITECTÓNICO

Escaneado con CamScanner

Consorcio	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa técnica				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia A-	FECHA:	06/04/2026	HORA DE INICIO:	10:40am.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Fabian Moreno	HUSRT	3118165354	
Fabian Rojano	HUSRT	3112414049.	
Santiago Chaparro	HUSRT	3204890612	
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSRT	3138284340	

Escaneado con CamScanner

Consorcio	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Mesa tecnica.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia.	FECHA:	06/04/2026	HORA DE INICIO:	10:40am.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza mesa tecnica donde se tratan los siguientes temas:

1. Pergola: teja-cubierta: Por parte del arq. Cristian Gomez solicita que se instale teja sencilla arquitectonica, la cual esta contemplada dentro de los item precios gobernacion. (de referencia).

2. Escalera Sur: Por parte del Arq. Fabian Moreno Solicita cerrar este grado se contemple muro desde el piso, que llegue hasta la placa de descanso y se contemple una puerta tesa sencilla. Actividad aprobada por el Arq. Cristian Gomez.

3. Render - Pintura: El arq. Cristian Gomez menciona que el dia miercoles proximo comite entrega este material.

4. Plano guardacamilla: Se adjunta plano de ubicacion. La altura a instalar es de 0.85mts al eje de acuerdo a indicacion del Arq. cristian Gomez.

5. Puerta cortafuego: El arq. Cristian Gomez solicita que se instale en el sentido de acceso a la escalera. (rada un costado) y considerar que sea doble puerta.

6. Caseta - Tanque de reserva: El arq. cristian Gomez Solicita que en fachada se use actividades contractuales (estuco + pintura).

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Consorcio	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comite de Obra				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Subgerencia	FECHA:	18/04/2026	HORA DE INICIO:	

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Fabian Rojas	HUSRT	3112414049	
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSRT	3138284340	
Melissa Bermúdez	HUSRT	3167041381	
Camilo Fontes	H.U.S.R.T.	3006568856	
Fabian Pano	Husrt.	3118165354	

Escaneado con CamScanner

Consorcio INTERHOSPITAL URGENCIAS	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comite de Obra				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSITAL 2023	
LUGAR:	Sibaperencia	FECHA:	15/04/2026	HORA DE INICIO:	10:00am

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. Urbanismo.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza comite tecnico de obra donde se tratan los siguientes temas:

1. Urbanismo - Anden: Se realiza en obra ajustes en el anden, debido a que por cruce no hay salida peatonal para lo cual desde el HUSRT autorizan dicho cambio. Se conservará el alineamiento hasta la caseta de gas y finaliza en cebra.

2. Muro escalera Sur: teniendo en cuenta que es este espacio esta proximo la puerta cortafuego el arq. Fabian Moreno solicita que no se realice.

3. Puerta acceso descanso medico: El arq. Cristian Gomez solicita que en este espacio se instale vidrio similar al acceso anterior aledaño a tomografo.

4. Recepcion: El dr. Perfuz solicita que en este espacio se contemple puerta con apertura hacia afuera con chapa. Adicionalmente para facturacion contemplar en los laterales fijos.

5. Puerta de acceso Urgencias. el arq. Cristian Gomez solicita que en esta puerta se considere un montante en la parte superior. y dos hojas con apertura de acuerdo al diseño entregado en el anterior comite y/o mesa tecnica.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

INTERVENTORÍA LPM	**ACTA DE COMITE**	

ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	**ENTIDAD**	**CORREO ELECTRÓNICO/TELÉFONO**	**FIRMA**
Fabian Yanez	HUSRT	3114165354	
[illegible]	Sec Salud	3188702269	
EDWARD SUAREZ	SEC. SALUD	3142511893	
David Cantor	Sec Salud	3176244706	
Sergio Soare	SJB	3233679612	Serrat
[illegible]	HUSRT	3115228103	
Carmen Ortiz	H.U.S.R.T.	3006768776	
Natalia Peñaranda	Interventoria	3224337717	
David Leandro	Contratista	3147668604	

Scanned with CamScanner

INTERVENTORÍA UMB	**ACTA DE COMITE**	

al igual que la instalacion de carpinteria metalica como ventanas y puertas.

Se hace cierre de acta el 28 de Abril 2026 a las 12:30pm

2. Se da inicio de recorrido por las instalaciones liderado por el contratista de obra y con el acompañamiento de interventoria, con el objetivo de presentar el avance de las actividades a la supervision.

- Piso 4. Como avance significativo se verifica instalacion de ventanas y puertas en areas de hospitalizacion y puestos de trabajo al igual que los acabados en estuco y pintura.
- Sotano: Se constata avance significativo en pintura y acabados en areas administrativas y archivo,
- Piso 1: Se constata instalaciones de carpinteria y acabados en areas de farmacia, laboratorios, salas de imageneologia, urgencias y observacion, por ultimo se realiza verificacion en auditorio en cuanto acabados y estructura
- Piso 2: Se constata avance en acabados y estructura en U.A.R.O, quirofanos, salas de parto. Simultaneamente se verifican las alturas establecidas.
- En piso 3: Se constata el avance en acabados de estuco y pintura en areas de UCI Pediatrica y hospitalizacion

Scanned with CamScanner

INTERVENTORÍA LTDA	**ACTA DE COMITE**	

ACTA No.	Acta de comite N° 38		
FECHA REUNIÓN	28 de Abril del 2026		
LUGAR	Obra: Unidad Materno Infantil.		
HORA INICIO:	11:30 am	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:30pm.
ASISTENTES:	• Supervisión • Contratista de obra • Interventoria		
OBJETIVO	Revisión de temas administrativos y avance de obra		

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de avances de obra
2. Recorrido técnico de obra.

DESARROLLO DEL COMITÉ:

1. Se realizo la revisión de los porcentajes de avance reportados por el contratista de obra, permitiendo constatar el progreso tanto físico como financiero de las actividades durante el recorrido en la obra.

% Financiero.
- Programado: 99%
- Ejecutado: 90%
- Diferencia. -4

% Físico:
- Programado, 96%
- Ejecutado: 95%
- Diferencia: -1.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052393749
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 A 4 53	TELÉFONO:	7614490
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6012897340**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		246813498

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 787.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 787.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 615.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 615.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 119.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 119.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.522.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO	**$ 1.522.100** ✓
