INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 10

CONSORCIO MS

CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025



Versión 2

PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025

BOGOTÁ, D.C DICIEMBRE DEL 2025

Revisión	Descripción	Numerales que cambian de la anterior revisión	Fecha
1	Primera versión del informe mensual	Versión 1	Marzo 2026
2	Segunda versión del informe mensual	Versión 2	Abril 2026
3	Tercera Versión del informe mensual	Versión 3	Abril 2026

Firma			
Nombre	Ing. Natalia Ariza	Ing. María Stella Agudelo	Ing. José Alexander Román
Cargo	Ingeniero Residente	Especialista En Tránsito y Transporte	Director de Obra
	Elaboró	**Elaboró**	**Revisó**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 7
2.1. ENTIDAD CONTRATANTE 7
2.2. CONTRATISTA 7
2.3. INTERVENTORÍA 8
3. Periodo de reporte 8
4. Balance técnico del contrato 8
4.1. Estado de avance de las Fases y productos requeridos del contrato. 8
4.2. Avance de visitas técnicas de reconocimiento a los puntos asignados. 11
4.3. Gestión, avances y particularidades sobre los Planes de Manejo de Tránsito tramitados por punto/tramo. 14
4.4. Estado (por ejecutar, en ejecución, ejecutados) y descripción detallada de las actividades realizadas por punto/tramo. 18
4.5. Resultado de las matrices de duración exigible por punto a intervenir. 20
4.6. Reporte de los certificados de calibración y formatos de seguimiento al estado de los equipos, maquinaria y elementos de control de obra. 20
4.7. Reporte de la señalización retirada de vía y entregada a las entidades territoriales. 22
4.8. Inventario detallado y listado de las medidas implementadas con sus cantidades, descripción del ítem, y observaciones. 22
4.9. Reporte estadístico de las acciones ejecutadas por municipio e institución beneficiada. 23
4.10. Aspectos técnicos, modificaciones surgidas en desarrollo de las actividades, problemas y soluciones adoptadas. 26
4.11. Copia de Bitácora 27
5. Balance ambiental y SST 27
5.1. Permisos licencias y demás autorizaciones ambientales 27
5.2. Reporte de incidentes y acontecimientos 28
5.3. Informe ambiental y SST 28
5.4. Soporte de pago parafiscales y seguridad social 28
6. Balance social 28
6.1. Vinculación de población vulnerable 28

6.2. Resumen de actividades realizadas 30
7. Balance financiero 32
7.1. Meta contractual y su estado financiero 35
8. balance juridico 36
8.1. Estado de las pólizas 36
8.2. Aspectos contractuales relevantes 37
9. Balance administrativo 38
9.1. Actas de reunión 38
9.2. Comités de seguimiento 38
9.3. Correspondencia enviada y recibida 39
9.4. PQR´S tramitados 48
10. Comentarios y conclusiones 48
11. Anexos 50

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 7
TABLA 2 DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 7
TABLA 3 DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA 7
TABLA 4 DATOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 8
TABLA 5 ESTADO DE AVANCE Y PRODUCTOS DEL CONTRATO 9
TABLA 6 AVANCES DE VISITAS PRELIMINARES 11
TABLA 7 VISITAS Y EJECUCIÓN 18
TABLA 8 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 21
TABLA 9 ACCIONES REALIZADAS VS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 23
TABLA 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LO IMPLEMENTADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 25
TABLA 11 POBLACIÓN VINCULADA PARA EL CONTRATO PERTENECIENTE AL CONSORCIO MS 28
TABLA 12 INICIO Y CIERRE DE SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 30
TABLA 13 ESTADO FINANCIERO DEL COMPONENTE DE OBRA 32
TABLA 14 META CONTRACTUAL Y SU ESTADO FINANCIERO 35
TABLA 15 ESTADO DE LAS PÓLIZAS 36
TABLA 16 MODIFICACIONES EN LOS DISEÑOS Y ADICIÓN DE ACTIVIDADES 38
TABLA 17 COMITÉS DE SEGUIMIENTO 38
TABLA 18 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 39

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. MATRICES DE GARANTÍAS 50

ANEXO 2. BITÁCORA 50
ANEXO 3. INFORME AMBIENTAL 50
ANEXO 4. PARAFISCALES 50
ANEXO 5. ACTAS DE REUNIÓN 50
ANEXO 6. INFORME SG-SST 50
ANEXO 7. REGISTRO DE LLUVIAS 50
ANEXO 8. INFORMES SEMANALES 50
ANEXO 9. CONTROL DE EQUIPOS Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 50
ANEXO 10. SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA 50
ANEXO 11. ACTAS DE MAYORES Y MENORES - PLANOS RECORD 50

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Movilidad Contemporánea (SMC), tiene como misión orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema de movilidad y asegurar la organización y mantenimiento del orden en materia de tránsito y transporte, garantizando la preservación y mejoramiento de la seguridad y la calidad de vida de la comunidad en el Departamento de Cundinamarca.

Por lo anterior la SMC por medio del proceso de licitación STM-LP-286-2024, cuyo objeto es ***"IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."*** adjudicó al **CONSORCIO MS** el **LOTE 1 - ZONA ORIENTE** y posteriormente celebró el contrato No. STM-LP-009-2025 con dicho consorcio. El mencionado contrato de obra tiene como alcance implementar la señalización de los diseños, y esquemas priorizados de los puntos con mayor accidentalidad del departamento.

Como parte de sus obligaciones contractuales, el CONSORCIO MS debe presentar informes mensuales con la información de avance de obras, ejecución financiera, legal, contable y administrativa según lo requerido en el Anexo Técnico.

El presente documento contiene el Informe de las actividades realizadas durante el **décimo mes** de ejecución, comprendido entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre del 2025.

Este documento detalla de manera específica las actividades realizadas dentro de cada una de las líneas estratégicas y programas establecidos en el Anexo Técnico del contrato, los cuales son clave para cumplir con los estándares de transparencia, participación y sostenibilidad social. A lo largo de este informe, se presentarán los componentes trabajados durante la ejecución del proyecto, los cuales abarcan aspectos fundamentales del mismo, como son; estado de las etapas, avance de visitas técnicas, Planes de Manejo de Tránsito, estado de ejecución, resultado de matrices de garantías, certificados de calibración y formato de estado de equipos, reporte de señalización retirada, inventario detallado y medidas implementadas, reporte de las actividades realizadas por municipio, aspectos técnicos, copia bitácora, balance ambiental y SST, balance social, balance financiero, balance jurídico, balance administrativo, comentarios y conclusiones y anexos.

De esta manera lo que se desea es mostrar un avance general del contrato con cada una de las características que ocurran durante la ejecución de este, para que la entidad Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca (SMC) tenga información actualizada y pertinente del avance del contrato.

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se muestran en la Tabla 1 los datos generales del contrato:

Tabla 1 Información General Contrato de Obra

Ficha Informativa Contrato De Obra	
Contrato de obra N°	STM-LP-009-2025
Objeto	IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Entidad contratante	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE MOVILDIAD CONTEMPORÁNEA
Contratista	CONSORCIO MS
NIT	901.903.385– 4
Valor del contrato	TRES MIL SEICIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($3.625.158.645)
Plazo inicial	DIEZ (10) MESES
Fecha de inicio	21 de febrero de 2025

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

2.1. ENTIDAD CONTRATANTE

En la Tabla 2 se describen los datos generales de la entidad contratante, la cual corresponde al Departamento de Cundinamarca - secretaria de Movilidad Contemporánea.

Tabla 2 Datos generales de la entidad contratante

Datos Generales De La Entidad Contratante	
Nombre o razón social	Departamento De Cundinamarca – Secretaría De Movilidad Contemporánea
Supervisor	Juan David Heredia Castiblanco

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

2.2. CONTRATISTA

En la Tabla 3 se relaciona los datos generales del contratista que ejecutará el contrato N° STM-LP-009-2025, el cual fue adjudicado por medio de licitación pública.

Tabla 3 Datos generales del contratista

Datos Generales Del Contratista

Nombre o razón social	CONSORCIO MS
NIT	901.903.385– 4
Dirección	Calle: 26 #38-26
Teléfono	PBX: (604) 4442249
Correo electrónico	Consorcioms2025@pinturasycolores.com
Plazo del contrato	DIEZ (10) MESES
Fecha de inicio	21 de febrero de 2025
Fecha de terminación	20 de diciembre de 2025

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

2.3. INTERVENTORÍA

En la Tabla 4 se relaciona los datos generales de la interventoría quien hará la vigilancia y control al contrato.

Tabla 4 Datos generales de la interventoría

Datos Generales De La Interventoría	
Nombre o razón social	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL
NIT	901.902.065-8
Dirección	CARRERA 70D No.48-40 Normandía
Teléfono	715 0016
Correo electrónico	intseguridadvial@gmail.com
Plazo del contrato	ONCE (11) MESES
Fecha de inicio	21 de febrero de 2025
Fecha de terminación	20 de enero de 2026

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

3. PERIODO DE REPORTE

El periodo a reportar en la versión #3 del informe mensual 10 que corresponde desde el 21 de noviembre del 2025 hasta el 20 de diciembre del 2025.

4. BALANCE TÉCNICO DEL CONTRATO

En el presente numeral se muestra el avance técnico general del contrato STM-LP-009-2025.

4.1. Estado de avance de las Fases y productos requeridos del contrato.

En el presente numeral se muestra el avance de las fases y productos requeridos en la ejecución de los municipios con corte al 20/12/2025.

Tabla 5 Estado de avance y productos del contrato

Codificación	Municipio	Estado Del Informe	Fecha Aprobación Informe	Fecha Acta Apropiación Diseños	Estado Actual
25151_CN_01	Cáqueza	Aprobado	8/08/2025	7/08/2025	Terminado y recibido
25151_CN_02	Cáqueza	Aprobado	8/08/2025	7/08/2025	Terminado y recibido
25151_CN_03	Cáqueza	Aprobado	12/08/2025	8/08/2025	Terminado y recibido
25151_CN_04	Cáqueza	Aprobado	12/08/2025	8/08/2025	Terminado y recibido
25154_CN_01	Carmen De Carupa	Aprobado	4/7/2025	2/7/2025	Terminado y recibido
25154_CN_02	Carmen De Carupa	Aprobado	4/7/2025	2/7/2025	Terminado y recibido
25154_CN_03	Carmen De Carupa	Aprobado	4/7/2025	2/7/2025	Terminado y recibido
25224_CN_01	Cucunubá	Aprobado	15/7/2025	11/7/2025	Terminado y recibido
25281_CN_01	Fosca	Aprobado	7/7/2025	4/7/2025	Terminado y recibido
25281_CN_02	Fosca	Aprobado	7/7/2025	4/7/2025	Terminado y recibido
25281_CN_03	Fosca	Aprobado	7/7/2025	4/7/2025	Terminado y recibido
25281_CN_04	Fosca	Aprobado	7/7/2025	4/7/2025	Terminado y recibido
25317_CN_01	Guacheta	Aprobado	15/7/2025	11/7/2025	Terminado y recibido
25317_CN_02	Guacheta	Aprobado	15/7/2025	11/7/2025	Terminado y recibido
25317_CN_03	Guacheta	Aprobado	15/7/2025	11/7/2025	Terminado y recibido
25335_CN_01	Guayabetal	Aprobado	7/6/2025	7/6/2025	Terminado y recibido
25335_CN_02	Guayabetal	Aprobado	4/7/2025	4/7/2025	Terminado y recibido
25426_CN_01	Machetá	Aprobado	19/08/2025	14/08/2025	Terminado y recibido
25486_CN_01	Nemocón	Aprobado	7/6/2025	7/6/2025	Terminado y recibido
25530_CN_01	Paratebueno	Aprobado	25/09/2025	23/09/2025	Terminado y recibido
25594_CN_01	Quetame	Aprobado	8/08/2025	7/08/2025	Terminado y recibido
25594_CN_02	Quetame	Aprobado	8/08/2025	7/08/2025	Terminado y recibido
25745_CN_01	Simijaca	Aprobado	8/7/2025	7/7/2025	Terminado y recibido
25745_CN_02	Simijaca	Aprobado	8/7/2025	4/7/2025	Terminado y recibido
25745_CN_03	Simijaca	Aprobado	8/7/2025	4/7/2025	Terminado y recibido
25779_CN_01	Susa	Aprobado	21/08/2025	20/08/2025	Terminado y recibido

Codificación	Municipio	Estado Del Informe	Fecha Aprobación Informe	Fecha Acta Apropiación Diseños	Estado Actual
25781_CN_01	Sutatausa	Aprobado	8/08/2025	7/08/2025	Terminado y recibido
25781_CN_02	Sutatausa	Aprobado	8/08/2025	7/08/2025	Terminado y recibido
25785_CN_01	Tabio	Aprobado	13/5/2025	13/5/2025	Terminado y recibido
FR_56CN20-1_374_2023	Tabio	Aprobado	13/5/2025	13/5/2025	Terminado y recibido
25785_CN_02	Tabio	Aprobado	28/4/2025	28/4/2025	Terminado y recibido
25793_CN_01	Tausa	Aprobado	03/09/2025	02/09/2025	Terminado y recibido
25817_CN_01	Tocancipá	Aprobado	6/08/2025	5/08/2025	Terminado y recibido
25839_CN_01	Ubala	-	-	-	Descartado
25839_CN_02	Ubala	Aprobado	4/08/2025	4/08/2025	Terminado y recibido
25841_CN_01	Ubaque	Aprobado	30/5/2025	15/5/2025	Terminado y recibido
25841_CN_02	Ubaque	-	-	-	Descartado
25841_CN_03	Ubaque	Aprobado	30/5/2025	21/5/2025	Terminado y recibido
25845_CN_01	Ubaté	Aprobado	7/6/2025	7/6/2025	Terminado y recibido
25845_CN_02	Ubaté	Aprobado	7/6/2025	7/6/2025	Terminado y recibido
25845_CN_01	Une	Aprobado	28/08/2025	27/08/2025	Terminado y recibido
25845_CN_02	Une	Aprobado	13/08/2025	8/08/2025	Terminado y recibido
25845_CN_03	Une	Aprobado	25/08/2025	25/08/2025	Terminado y recibido
25845_CN_04	Une	Aprobado	1/08/2025	1/08/2025	Terminado y recibido
25845_CN_05	Une	Aprobado	8/08/2025	5/08/2025	Terminado y recibido
25326_CN_01	Guatavita	Aprobado	22/09/2025	19/09/2025	Terminado y recibido
25649_CN_02	San Bernardo	Aprobado	25/09/2025	23/09/2025	Terminado y recibido
25649_CN_03	San Bernardo	Aprobado	25/09/2025	23/09/2025	Terminado y recibido
25372_CN_01	Junín	Aprobado	22/09/2025	19/09/2025	Terminado y recibido
25372_CN_02	Junín	Aprobado	22/09/2025	19/09/2025	Terminado y recibido
Complemento	Tocancipá	Aprobado	06/08/2025	05/08/2025	Terminado y recibido
25053_CN_02	Arbeláez	Aprobado	07/11/2025	07/11/2025	Terminado y recibido

Codificación	Municipio	Estado Del Informe	Fecha Aprobación Informe	Fecha Acta Apropiación Diseños	Estado Actual
25053_CN_03	Arbeláez	Aprobado	07/11/2025	07/11/2025	Terminado y recibido
25535_CN_01	Pasca	Aprobado	18/11/2025	13/11/2025	Terminado y recibido
25535_CN_02	Pasca	Aprobado	18/11/2025	13/11/2025	Terminado y recibido
25372_CN_03	Junín	Aprobado	17/10/2025	17/10/2025	Terminado y recibido
25799_CN_03	Tenjo	Aprobado	05/11/2025	04/11/2025	Terminado y recibido

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

4.2. Avance de visitas técnicas de reconocimiento a los puntos asignados.

El CONSORCIO MS, en desarrollo de sus obligaciones contractuales y con base en las propuestas esquemáticas de diseño, llevó a cabo las visitas preliminares requeridas, orientadas a la verificación en campo de las condiciones de seguridad vial existentes. Durante estas visitas se validó que el contenido de cada propuesta cumpliera con los objetivos planteados, así como la correspondencia entre la información técnica y las condiciones reales observadas.

Como resultado de lo anterior, se procedió con la elaboración de los respectivos informes de visita preliminar, así como con la apropiación y/o ajuste de los diseños, cantidades de obra y el valor estimado de las intervenciones.

Para el periodo correspondiente al presente informe, no se realizaron nuevas visitas preliminares. No obstante, se mantiene un acumulado de 57 visitas ejecutadas, de las cuales se han entregado 55 informes de visita preliminar, contando igualmente con 55 actas de aprobación y apropiación de diseños. A la fecha de corte, no se registran puntos pendientes por la ejecución de visitas preliminares.

A continuación, se presenta el consolidado de las visitas preliminares ejecutadas:

Tabla 6 Avances de visitas preliminares

Codificación	Municipio	Localización Punto	Fecha entrega información a CI	Visita preliminar
25151_CN_01	CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	6/5/2025	16/6/2025
25151_CN_02	CÁQUEZA	2. Escuela Ubatoque 2	6/5/2025	16/6/2025
25151_CN_03	CÁQUEZA	3. Consolidado Sector El Campin	6/5/2025	16/6/2025
25151_CN_04	CÁQUEZA	4. Curva Salida Cáqueza - Fosca	6/5/2025	16/6/2025
25154_CN_01	CARMEN DE CARUPA	2. Sector La U	1/4/2025	22/5/2025

Codificación	Municipio	Localización Punto	Fecha entrega información a CI	Visita preliminar
25154_CN_02	CARMEN DE CARUPA	3. Sector El Prado	1/4/2025	22/5/2025
25154_CN_03	CARMEN DE CARUPA	4. Sector Peligros	1/4/2025	22/5/2025
25224_CN_01	CUCUNUBÁ	PUNTO CRITICO PR 4+100	1/4/2025	22/5/2025
25281_CN_01	FOSCA	1. Colegio IDER	6/5/2025	17/6/2025
25281_CN_02	FOSCA	2. Consolidado El Tablón	6/5/2025	17/6/2025
25281_CN_03	FOSCA	4. Cementerio Municipal	6/5/2025	17/6/2025
25281_CN_04	FOSCA	5. Sáname - Sector Finca Humberto Guevara	6/5/2025	17/6/2025
25317_CN_01	GUACHETA	ESCUELA LA ISLA	25/2/2025	5/3/2025
25317_CN_02	GUACHETA	I.E. MIÑA Y TICHA	25/2/2025	5/3/2025
25317_CN_03	GUACHETA	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	25/2/2025	5/3/2025
25335_CN_01	GUAYABETAL	Vda San Antonio Reductores de velocidad / ocho (8)	25/2/2025	20/3/2025
25335_CN_02	GUAYABETAL	Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo	6/5/2025	17/6/2025
25426_CN_01	MACHETÁ	ESCUELA GUINA	6/5/2025	10/6/2025
25486_CN_01	NEMOCON	ESCUELA LA PUERTA	25/2/2025	21/3/2025
25530_CN_01	PARATEBUENO	Colegio Josué Manrique Inspección de Maya Ingreso	6/5/2025	18/5/2025
25594_CN_01	QUETAME	1. Escuela Rural Granadillo	25/2/2025	20/3/2025
25594_CN_02	QUETAME	2. Intersección Matemango	25/2/2025	20/3/2025
25745_CN_01	SIMIJACA	COLEGIO AGUSTIN PARRA	25/2/2025	5/3/2025
25745_CN_02	SIMIJACA	ESCUELA EL FICAL	25/2/2025	5/3/2025
25745_CN_03	SIMIJACA	ESCUELA EL PANTANO	25/2/2025	5/3/2025
25779_CN_01	SUSA	ESCUELA EL TABLON	25/2/2025	21/3/2025
25781_CN_01	SUTATAUSA	ESCUELA PALACIO	25/2/2025	21/3/2025
25781_CN_02	SUTATAUSA	ESCUELA HATO VIEJO	25/2/2025	21/3/2025
25785_CN_01	TABIO	1. Vía Tabio - Cajicá (Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia)	25/2/2025	13/3/2025
FR_56CN20-1_374_2023	TABIO	2. Vía Tabio - Subachoque	25/2/2025	28/3/2025
25785_CN_02	TABIO	2. Vía Tabio - Subachoque	25/2/2025	13/3/2025
25793_CN_01	TAUSA	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	1/4/2025	20/6/2025
25817_CN_01	TOCANCIPÁ	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	6/5/2025	10/6/2025
25839_CN_01	UBALA	P1 UBALÁ - GACHETÁ	25/2/2025	27/3/2025
25839_CN_02	UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	25/2/2025	27/3/2025

Codificación	Municipio	Localización Punto	Fecha entrega información a CI	Visita preliminar
25841_CN_01	UBAQUE	1. Ubaque - Chipaque	25/2/2025	14/3/2025
25841_CN_02	UBAQUE	2. Escuela Puente Amarillo	25/2/2025	14/3/2025
25841_CN_03	UBAQUE	3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico	25/2/2025	14/3/2025
25845_CN_01	UBATÉ	1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas	1/4/2025	22/5/2025
25845_CN_02	UBATÉ	2. Intersección Colegio Bruselas	1/4/2025	22/5/2025
25845_CN_01	UNE	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	6/5/2025	16/6/2025
25845_CN_02	UNE	Entrada Estación De Servicio Texaco	6/5/2025	16/6/2025
25845_CN_03	UNE	Escuela Combura	6/5/2025	16/6/2025
25845_CN_04	UNE	Punto Crítico Timasita	6/5/2025	16/6/2025
25845_CN_05	UNE	Sector Vda Salitre-costado Villa Natalia	6/5/2025	16/6/2025
25326_CN_01	GUATAVITA	Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé	28/7/2025	12/8/2025
25649_CN_02	SAN BERNARDO	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	28/7/2025	19/8/2025
25649_CN_03	SAN BERNARDO	3. Institución Educativa Departamental San Bernardo	28/7/2025	19/8/2025
25372_CN_01	JUNIN	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	28/7/2025	12/8/2025
25372_CN_02	JUNIN	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	28/7/2025	12/8/2025
Complemento	TOCANCIPÁ	Complemento C.R. ENTRELOMAS	12/08/2025	10/6/2025
25053_CN_02	ARBELAEZ	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	29/09/2025	15/10/2025
25053_CN_03	ARBELAEZ	SECTOR: KIRPALAMAR	29/09/2025	15/10/2025
25535_CN_01	PASCA	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	6/10/2025	15/10/2025
25535_CN_02	PASCA	VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	6/10/2025	15/10/2025
25372_CN_03	JUNIN	Intersección Vía San Roque - Junín	6/10/2025	9/10/2025
25799_CN_03	TENJO	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	21/10/2025	21/10/2025

4.3. Gestión, avances y particularidades sobre los Planes de Manejo de Tránsito tramitados por punto/tramo.

En este periodo, el trámite del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) ya se encuentra completamente cumplido, dado que las aprobaciones correspondientes fueron emitidas y entregadas en las fechas señaladas por la Interventoría y el Consorcio MS. Por lo tanto, no resulta necesario adelantar nuevas gestiones, ya que la documentación oficial garantiza la validez técnica y administrativa del proceso, permitiendo continuar con la ejecución del contrato sin requerir trámites adicionales.

A continuación, se presenta el consolidado de los PMTs aprobados en el transcurso del proyecto:

Codificación	Municipio	Código Vía	Localización Punto	Radicación PMT	Aprobación PMT	Comunicado de Aprobación
25151_CN_01	CÁQUEZA	40CN31	1. Colegio Jhon Dalton	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25151_CN_02	CÁQUEZA	40CN31	2. Escuela Ubatoque 2	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25151_CN_03	CÁQUEZA	40CN31	3. Consolidado Sector El Campin	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25151_CN_04	CÁQUEZA	40CN31	4. Curva Salida Cáqueza - Fosca	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25154_CN_01	CARMEN DE CARUPA	56CN17	2. Sector La U	30/5/2025	9/6/2025	GOB-E-CR-2025-0019571
25154_CN_02	CARMEN DE CARUPA	56CN17	3. Sector El Prado	30/5/2025	9/6/2025	GOB-E-CR-2025-0019571
25154_CN_03	CARMEN DE CARUPA	56CN17	4. Sector Peligros	30/5/2025	9/6/2025	GOB-E-CR-2025-0019571
25224_CN_01	CUCUNUBÁ	5606	PUNTO CRITICO PR 4+100	30/5/2025	9/6/2025	GOB-E-CR-2025-0019571
25281_CN_01	FOSCA	40CN31	1. Colegio IDER	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25281_CN_02	FOSCA	40CN31	2. Consolidado El Tablón	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25281_CN_03	FOSCA	40CN27	4. Cementerio Municipal	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292

Codificación	Municipio	Código Vía	Localización Punto	Radicación PMT	Aprobación PMT	Comunicado de Aprobación
25281_CN_04	FOSCA	40CN27	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25317_CN_01	GUACHETA	45ANCN08-1	ESCUELA LA ISLA	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25317_CN_02	GUACHETA	45ANCN09	I.E. MIÑA Y TICHA	11/4/2025	24/4/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25317_CN_03	GUACHETA	45ANCN08-1	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	11/4/2025	24/4/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25335_CN_01	GUAYABETAL	40CN31	Vda San Antonio Reductores de velocidad / ocho (8)	12/5/2025	19/5/2025	GOB-E-CR-2025-0007747
25335_CN_02	GUAYABETAL	40CN31	Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25426_CN_01	MACHETÁ	56CN32	ESCUELA GUINA	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25486_CN_01	NEMOCON	45ANCN01	ESCUELA LA PUERTA	8/5/2025	19/5/2025	GOB-E-CR-2025-0007747
25530_CN_01	PARATEBUENO	65CN05	Colegio Josué Manrique Inspección de Maya Ingreso	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25594_CN_01	QUETAME	???	1. Escuela Rural Granadillo	11/4/2025	24/4/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25594_CN_02	QUETAME	40CN28	2. Intersección Matemango	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25745_CN_01	SIMIJACA	45ANCN13	COLEGIO AGUSTIN PARRA	12/5/2025	19/5/2025	GOB-E-CR-2025-0007747
25745_CN_02	SIMIJACA	45ANCN05-3	ESCUELA EL FICAL	11/4/2025	24/4/2025	GOB-E-CR-2025-0007747
25745_CN_03	SIMIJACA	45ANCN14	ESCUELA EL PANTANO	11/4/2025	24/4/2025	GOB-E-CR-2025-0007747
25779_CN_01	SUSA	45ANCN22	ESCUELA EL TABLON	11/4/2025	24/4/2025	DPC-0102025-059-2025
25781_CN_01	SUTATAUSA	45ANCN15-2	ESCUELA PALACIO	11/4/2025	24/4/2025	DPC-0102025-059-2025

Codificación	Municipio	Código Vía	Localización Punto	Radicación PMT	Aprobación PMT	Comunicado de Aprobación
25781_CN_02	SUTATAUSA	45ANCN15	ESCUELA HATO VIEJO	11/4/2025	24/4/2025	DPC-0102025-059-2025
25785_CN_01	TABIO	40CN14-2	1. Vía Tabio - Cajicá (Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia)	12/5/2025	19/5/2025	GOB-E-CR-2025-0007747
FR_56CN20-1_374_2023	TABIO	56CN20-1	2. Vía Tabio - Subachoque	11/4/2025	24/4/2025	DPC-0102025-059-2025
25785_CN_02	TABIO	56CN20-1	2. Vía Tabio - Subachoque	11/4/2025	24/4/2025	DPC-0102025-059-2025
25793_CN_01	TAUSA	45ANCN06	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	30/5/2025	9/6/2025	GOB-E-CR-2025-0019571
25817_CN_01	TOCANCIPÁ	55CN01	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25839_CN_01	UBALA	5010	P1 UBALÁ - GACHETÁ	11/4/2025	24/4/2025	DPC-0102025-059-2025
25839_CN_02	UBALA	5111	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	11/4/2025	24/4/2025	DPC-0102025-059-2025
25841_CN_01	UBAQUE	40CN18	1. Ubaque - Chipaque	11/4/2025	24/4/2025	DPC-0102025-059-2025
25841_CN_02	UBAQUE	40CN18	2. Escuela Puente Amarillo	11/4/2025	24/4/2025	DPC-0102025-059-2025
25841_CN_03	UBAQUE	40CN28	3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico	11/4/2025	24/4/2025	DPC-0102025-059-2025
25845_CN_01	UBATÉ	45ACN08	1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas	30/5/2025	9/6/2025	GOB-E-CR-2025-0019571
25845_CN_02	UBATÉ	56CN17	2. Intersección Colegio Bruselas	30/5/2025	9/6/2025	GOB-E-CR-2025-0019571
25845_CN_01	UNE	40CN20	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25845_CN_02	UNE	40CN19	Entrada Estación De Servicio Texaco	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25845_CN_03	UNE	40CN19	Escuela Combura	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292

Codificación	Municipio	Código Vía	Localización Punto	Radicación PMT	Aprobación PMT	Comunicado de Aprobación
25845_CN_04	UNE	40CN20	Punto Critico Timasita	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25845_CN_05	UNE	40CN20	Sector Vda Salitre-costado Villa Natalia	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25326_CN_01	GUATAVITA	55CN02	Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé	6/08/2025 27/10/2025	14/8/2025	GOB-E-CR-2025-0051511
25649_CN_02	SAN BERNARDO	40CN07-3-1	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	6/8/2025	14/8/2025	GOB-E-CR-2025-0051511
25649_CN_03	SAN BERNARDO	40CN07	3. Institución Educativa Departamental San Bernardo	6/8/2025	14/8/2025	GOB-E-CR-2025-0051511
25372_CN_01	JUNIN	5009 (10-03)	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	6/8/2025	14/8/2025	GOB-E-CR-2025-0051511
25372_CN_02	JUNIN	5009 (10-03)	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	6/8/2025	14/8/2025	GOB-E-CR-2025-0051511
Complemento	TOCANCIPÁ	55CN01	Complemento C.R. ENTRELOMAS	24/6/2025	1/7/2025	GOB-E-CR-2025-0030292
25053_CN_02	ARBELAEZ	40CN07	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	14/10/2025	21/10/2025	DPC-0102025-760-2025
25053_CN_03	ARBELAEZ	40CN07	SECTOR: KIRPALAMAR	14/10/2025	21/10/2025	DPC-0102025-760-2025
25535_CN_01	PASCA	40CN15	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	14/10/2025	21/10/2025	GOB-S-CR-2025-0053023
25535_CN_02	PASCA	40CN15	VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	14/10/2025	21/10/2025	GOB-S-CR-2025-0053023
25372_CN_03	JUNIN	5009 (10-03) intersección 50CN36	Intersección Vía San Roque - Junín	14/10/2025	21/10/2025	GOB-E-CR-2025-0051511

Codificación	Municipio	Código Vía	Localización Punto	Radicación PMT	Aprobación PMT	Comunicado de Aprobación
25799_CN_03	TENJO	47CN14-2	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	27/10/2025	6/11/2025	GOB-E-CR-2025-0089091

4.4. Estado (por ejecutar, en ejecución, ejecutados) y descripción detallada de las actividades realizadas por punto/tramo.

Para la fecha el estado de las visitas a los municipios ya fue correspondidas y finalizadas, por lo cual para este periodo no hubo ninguna visita realizada.

Tabla 7 Visitas y ejecución

Codificación	Municipio	Estado Actual
25151_CN_01	Cáqueza	Ejecutado
25151_CN_02	Cáqueza	Ejecutado
25151_CN_03	Cáqueza	Ejecutado
25151_CN_04	Cáqueza	Ejecutado
25154_CN_01	Carmen De Carupa	Ejecutado
25154_CN_02	Carmen De Carupa	Ejecutado
25154_CN_03	Carmen De Carupa	Ejecutado
25224_CN_01	Cucunubá	Ejecutado
25281_CN_01	Fosca	Ejecutado
25281_CN_02	Fosca	Ejecutado
25281_CN_03	Fosca	Ejecutado
25281_CN_04	Fosca	Ejecutado
25317_CN_01	Guachetá	Ejecutado
25317_CN_02	Guachetá	Ejecutado
25317_CN_03	Guachetá	Ejecutado
25335_CN_01	Guayabetal	Ejecutado
25335_CN_02	Guayabetal	Ejecutado
25426_CN_01	Machetá	Ejecutado

Codificación	Municipio	Estado Actual
25486_CN_01	Nemocón	Ejecutado
25530_CN_01	Paratebueno	Ejecutado
25594_CN_01	Quetame	Ejecutado
25594_CN_02	Quetame	Ejecutado
25745_CN_01	Simijaca	Ejecutado
25745_CN_02	Simijaca	Ejecutado
25745_CN_03	Simijaca	Ejecutado
25779_CN_01	Susa	Ejecutado
25781_CN_01	Sutatausa	Ejecutado
25781_CN_02	Sutatausa	Ejecutado
25785_CN_01	Tabio	Ejecutado
FR_56CN20-1_374_2023	Tabio	Ejecutado
25785_CN_02	Tabio	Ejecutado
25793_CN_01	Tausa	Ejecutado
25817_CN_01	Tocancipá	Ejecutado
25839_CN_01	Ubalá	-
25839_CN_02	Ubalá	Ejecutado
25841_CN_01	Ubaque	Ejecutado
25841_CN_02	Ubaque	-
25841_CN_03	Ubaque	Ejecutado
25845_CN_01	Ubaté	Ejecutado
25845_CN_02	Ubaté	Ejecutado
25845_CN_01	Une	Ejecutado
25845_CN_02	Une	Ejecutado
25845_CN_03	Une	Ejecutado
25845_CN_04	Une	Ejecutado
25845_CN_05	Une	Ejecutado
25326_CN_01	Guatavita	Ejecutado

Codificación	Municipio	Estado Actual
25649_CN_02	San Bernardo	Ejecutado
25649_CN_03	San Bernardo	Ejecutado
25372_CN_01	Junín	Ejecutado
25372_CN_02	Junín	Ejecutado
Complemento	Tocancipá	Ejecutado
25053_CN_02	Arbeláez	Ejecutado
25053_CN_03	Arbeláez	Ejecutado
25535_CN_01	Pasca	Ejecutado
25535_CN_02	Pasca	Ejecutado
25372_CN_03	Junín	Ejecutado
25799_CN_03	Tenjo	Ejecutado

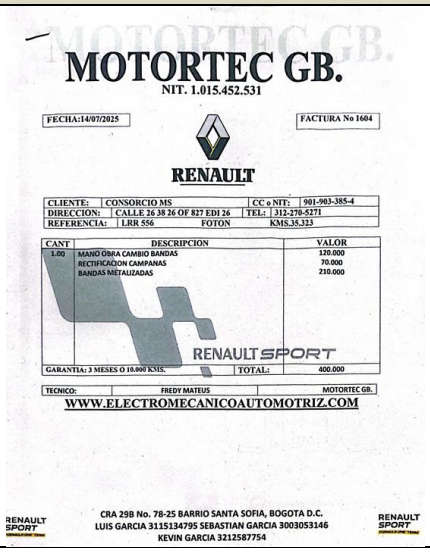
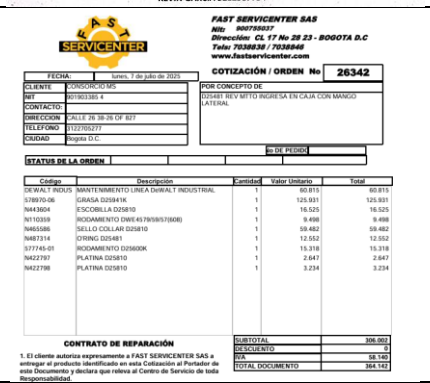
4.5. Resultado de las matrices de duración exigible por punto a intervenir.

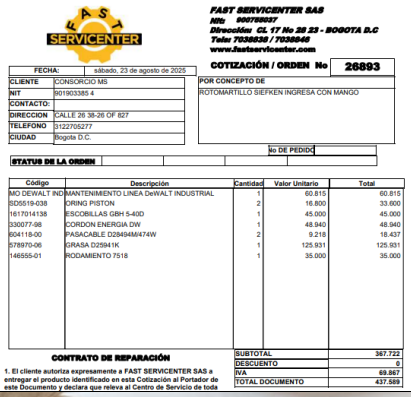
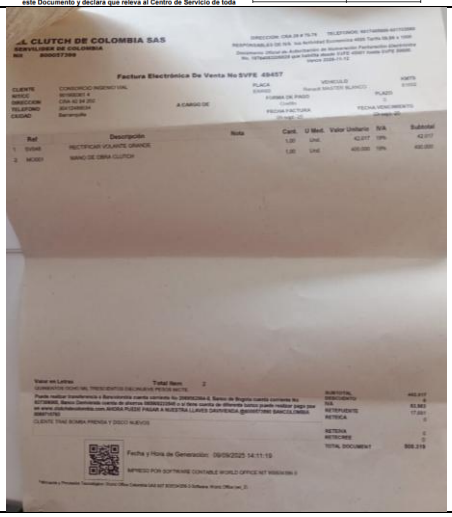
En el Anexo 1 se encuentran las matrices de duración exigible por punto a intervenir.

4.6. Reporte de los certificados de calibración y formatos de seguimiento al estado de los equipos, maquinaria y elementos de control de obra.

A continuación, en la Tabla 8 se muestran los certificados de mantenimiento, calibración y seguimiento de los equipos y maquinarias de la obra:

Tabla 8 Certificados de calibración, mantenimiento de los equipos y maquinarias

Fecha	Tipo De Certificado	Equipo	Evidencia
14/07/2025	Factura	Vehículo LRR556	 MOTORTEC GB. NIT. 1.015.452.531 FECHA:14/07/2025 FACTURA No 1604 RENAULT CLIENTE: CONSORCIO MS CC o NIT: 901-903-385-4 DIRECCION: CALLE 26 38 26 OF 827 EDI 26 TEL: 312-270-5271 REFERENCIA: LRR 556 FOTON KMS.35.323 CANT DESCRIPCION VALOR 1.00 MANO OBRA CAMBIO BANDAS 120.000 RECTIFICACION CAMPANAS 70.000 BANDAS METALIZADAS 210.000 RENAULT SPORT GARANTIA: 3 MESES O 10.000 KMS. TOTAL: 400.000 TECNICO: FREDY MATEUS MOTORTEC GB. WWW.ELECTROMECANICOAUTOMOTRIZ.COM CRA 29B No. 78-25 BARRIO SANTA SOFIA, BOGOTA D.C. LUIS GARCIA 3115134795 SEBASTIAN GARCIA 3003053146 KEVIN GARCIA 3212587754
07/07/2025	Factura	Mantenimiento D25481 REV MTTO	 FAST SERVICENTER SAS Nit: 900750037 Dirección: CL 17 No 28 23 - BOGOTA D.C Tels: 7038838 / 7038846 www.fastservicenter.com COTIZACIÓN / ORDEN No 26342 FECHA: lunes, 7 de julio de 2025 CLIENTE CONSORCIO MS NIT 901903385 4 CONTACTO: DIRECCION CALLE 26 38-26 OF 827 TELEFONO 3122705277 CIUDAD Bogota D.C. POR CONCEPTO DE D25481 REV MTTO INGRESA EN CAJA CON MANGO LATERAL No DE PEDIDO STATUS DE LA ORDEN Código Descripción Cantidad Valor Unitario Total DEWALT INDUS MANTENIMIENTO LINEA DeWALT INDUSTRIAL 1 60.815 60.815 578970-06 GRASA D25941K 1 125.931 125.931 N443604 ESCOBILLA D25810 1 16.525 16.525 N110359 RODAMIENTO DWE4578/59/57(608) 1 9.498 9.498 N465586 SELLO COLLAR D25810 1 59.482 59.482 N487314 ORING D25481 1 12.552 12.552 577745-01 RODAMIENTO D25600K 1 15.318 15.318 N422797 PLATINA D25810 1 2.647 2.647 N422798 PLATINA D25810 1 3.234 3.234 CONTRATO DE REPARACIÓN 1. El cliente autoriza expresamente a FAST SERVICENTER SAS a entregar el producto identificado en esta Cotización al Portador de este Documento y declara que releva al Centro de Servicio de toda Responsabilidad. SUBTOTAL 306.002 DESCUENTO 0 IVA 58.140 TOTAL DOCUMENTO 364.142
29/07/2025	Mantenimiento	Demoledor Siefken	 FAST SERVICENTER SAS Nit: 900750037 Dirección: CL 17 No 28 23 - BOGOTA D.C Tels: 7038838 / 7038846 www.fastservicenter.com COTIZACIÓN / ORDEN No 26615 POR CONCEPTO DE DEMOLEDOR SIEFKEN CONTRATO DE REPARACIÓN SUBTOTAL 482.415 DESCUENTO 0 IVA 67.859 TOTAL DOCUMENTO 550.274 atencionalcliente@fastservicenter.com - Celular 310 554 0095 servicotecnico@fastservicenter.com - celular 320 872 5575 - 3182096583 HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8 A.m a 5:30 P.m - SABADO de 9:00 A.m a 1:00 P.m

Fecha	Tipo De Certificado	Equipo	Evidencia
23/08/2025	Mantenimiento	Rotomartillo Siefken	
09/09/2025	Mantenimiento, factura	Vehículo EIM660	

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

Como se observa no se han realizado en el periodo compra de equipos, herramientas o mantenimiento de estas.

4.7. Reporte de la señalización retirada de vía y entregada a las entidades territoriales.

En el Anexo 10. Se encuentran las actas de entrega de señalización a los municipios.

4.8. Inventario detallado y listado de las medidas implementadas con sus cantidades, descripción del ítem, y observaciones.

Durante el periodo de ejecución del presente informe se han realizado implementaciones en los municipios de: Paratebueno, San Bernardo, Pasca y Tenjo, el inventario, listado de medidas implementadas y su respectiva descripción están en el Anexo 2.

4.9. Reporte estadístico de las acciones ejecutadas por municipio e institución beneficiada.

Durante el periodo de ejecución del presente informe se observan en la Tabla 9 las acciones ejecutadas por municipio e institución beneficiada:

Tabla 9 Acciones realizadas vs Instituciones educativas

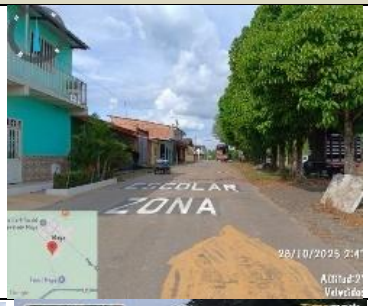
Municipio	Código del Punto	Institución Educativa	# De Estudiantes	Acciones Realizadas
PARATEBUENO	25530_CN_01	Colegio Josué Manrique Inspección de Maya Ingreso	457	implementación de señalización vertical preventivas y reglamentarias, para controlar la velocidad de esta zona, dispositivos reductores de velocidad tipo resaltos portátiles acompañados de tachas reflectivas para mejorar su visibilidad y franjas de estoperoles, también se incluyen pictogramas de "DESPACIO", pictogramas de "zona escolar" y pasos peatonales.
GUATAVITA	25326_CN_01	Institución Educativa Pio XII	532	Ejecución de demarcación horizontal, de pasos peatonales, textos de advertencia como "ZONA ESCOLAR" y "DESPACIO", pictogramas de "CRUCE ESCOLAR" y "VELOCIDAD MAX PERMITIDA" y flechas direccionales.
SAN BERNARDO	25649_CN_02	Escuela Normal Superior	339	implementación de señalización vertical preventiva (SP-75, SP47A) reglamentaria (SR-30) e informativa (SI-27), para controlar la velocidad de esta zona.
	25649_CN_03	Institución Educativa Departamental San Bernardo	280	implementación de señalización vertical preventivas y reglamentarias, para controlar la velocidad de esta zona, en cuando a la demarcación horizontal, se implementó Pictograma de Zona Escolar,

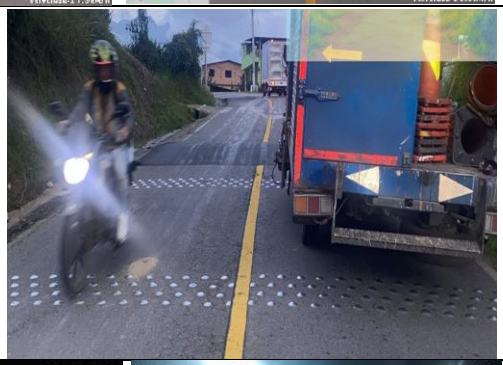
Municipio	Código del Punto	Institución Educativa	# De Estudiantes	Acciones Realizadas
				Achurados para canalizar el tráfico vehicular y flechas de frente y giro.
ARBELÁEZ	25053_CN_03	Institución educativa Departamental Kirpalamar	510	implementación de señalización vertical preventivas y reglamentarias, para controlar la velocidad de esta zona, dispositivos reductores de velocidad tipo resaltos parabólicos acompañados de tachas reflectivas para mejorar su visibilidad, adicionalmente en parte de sector se ejecutaron franjas de estoperoles, también se incluyen pictogramas de "DESPACIO", pictogramas de "zona escolar", "Velocidad máx. permitida" y pasos peatonales.
PASCA	25535_CN_02	Escuela rural Alto del Molino	50	Se realizó la instalación de resaltos portátiles acompañado de tachas reflectivas para mejorar su visibilidad, franjas de estoperoles, la construcción de bandas alertadoras en agregado y la construcción de resalto parabólico. Asimismo, se implementaron pictogramas de "DESPACIO" y "VELOCIDAD MAX. PERMITIDA", pictogramas de "zona escolar" y pasos peatonales.
TENJO	25799_CN_03	Gimnasio Campestre Howard Gardner	210	implementación de señalización vertical preventivas, informativas y reglamentarias, para controlar la velocidad de esta zona, dispositivos reductores de velocidad tipo resaltos portátiles acompañados de tachas reflectivas para mejorar su visibilidad, estoperoles metálicos con espigo, demarcación de pasos peatonales, también se incluyen pictogramas de zona escolar, flechas de frente y giro y de velocidad máxima (30Km/h).

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

En la Tabla 1 se evidencia el registro fotográfico de zonas escolares implementadas a corte del presente informe.

Tabla 10 Registro fotográfico de lo implementado en las instituciones educativas

Municipio y código del punto	Institución Educativa	Registro Fotográfico
PARATEBUENO 25530_CN_01	Colegio Josué Manrique Inspección de Maya Ingreso	 
GUATAVITA 25326_CN_01	Institución Educativa Pio XII	 
SAN BERNARDO 25649_CN_02 25649_CN_03	Escuela Normal Superior	 
	Institución Educativa Departamental San Bernardo	 

Municipio y código del punto	Institución Educativa	Registro Fotográfico
ARBELAEZ 25535_CN_03	Institución educativa Departamental Kirpalamar	 
PASCA 25535_CN_02	Escuela rural Alto del Molino	 
TENJO 25799_CN_03	Gimnasio Campestre Howard Gardner	 

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

4.10. Aspectos técnicos, modificaciones surgidas en desarrollo de las actividades, problemas y soluciones adoptadas.

Se presento una variación en el municipio de PASCA punto 25535_CN_01, vereda Zaque-sector la capilla que obedece a que no se realiza la implementación de la demarcación medida en metro cuadrado, debido a las limitaciones del presupuesto general del contrato. En consecuencia, se ejecuta la demarcación en metro lineal y la instalación de señalización vertical, garantizando en todo momento las condiciones de seguridad vial en el punto intervenido.

El día 18 de diciembre de 2025 La SMC vía correo el electrónico envió el acta de aprobación del NP -19 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LECHADA ASFÁLTICA (SLURRY SEAL), TIPO LA-10, ESPESOR 1 CM.

4.11. Copia de Bitácora

En el Anexo 3 se encuentra la bitácora escaneada de obra para la ejecución del presente informe.

5. BALANCE AMBIENTAL Y SST

En este numeral se reúne la información relacionada al componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo relacionada al contrato STM-LP-009-2025.

5.1. Permisos licencias y demás autorizaciones ambientales

Acorde a las características del contrato STM-LP-009-2025, cuyo objetivo es "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" no es necesario realizar trámites ambientales hasta la fecha del presente documento, todo ello en base al Decreto 1076 del 2015 en donde se define:

- En el capítulo 5 en el artículo 2.2.2.5.1.1 se establecen las actividades terrestre-carretero que están exentas de solicitar la licencia ambiental, en el numeral 19. *"La instalación de señalización vertical y horizontal, barreras y defensas metálicas."*
- En el capítulo 1 en el artículo 2.2.1.1.9.6 se establecen las actividades o proyectos que requieren de licencia ambiental o plan de manejo ambiental. *"Cuando para la ejecución de proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen igualo menor a veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso, concesión o autorización, bastarán las obligaciones y medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, de las obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad ambiental competente."*

Adicionalmente, como no se van a realizar actividades en puentes o que influyan directamente con un cuerpo de agua no es necesario el permiso de ocupación de cauce.

A la fecha, no se ha efectuado la entrega del soporte correspondiente a la disposición final de los materiales residuales generados en la obra, en razón a que este proceso se encuentra en curso. No obstante, se deja constancia de que dicha información será consolidada y se anexará en el informe final, No obstante, se deja constancia de que dicha información será consolidada y se anexará en el informe final, una vez se expida el certificado correspondiente.

5.2. Reporte de incidentes y acontecimientos

Si bien ya se está realizando algunas implementaciones no se han presentado en campo ni en oficina incidentes o acontecimientos que afecten a los trabajadores.

5.3. Informe ambiental y SST

El avance en el componente ambiental y SST del contrato está recopilado en los informes mensuales correspondientes, los cuales son visibles en el Anexo 4 para el informe ambiental y en el Anexo 7 el Informe SG-SST.

5.4. Soporte de pago parafiscales y seguridad social

En el Anexo 5 se evidencia los pagos parafiscales y seguridad social que aplican al presente contrato.

6. BALANCE SOCIAL

En este numeral se reúne la información relacionada al componente social del contrato STM-LP-009-2025.

6.1. Vinculación de población vulnerable

Durante el periodo no se realizó la contratación de nuevo personal. A la fecha se han contratado 18 personas para el contrato, de los que 5 pertenecen a mano de obra no calificada, dos de ellos reside en Bogotá y son población vulnerable como población joven Ley 1780 de 2016.

En la Tabla 11 se adjunta el listado de personal contratado, en el cual se encuentra subrayado el personal perteneciente a la categoría de MONC vinculada al proyecto.

Tabla 11 población vinculada para el contrato perteneciente al Consorcio MS

N	Nombre y Apellido	Cargo	Número de Identificación	Consorcio al que Pertenece	Lugar de Residencia	Personal MOC o MONC
1	Juan Diego Román	Representante Legal Suplente	1000409260	Consorcio MS	Medellín	MOC
2	Sonia Rodríguez	Profesional Social	53132186	Consorcio MS	Bogotá	MOC
3	Brayan Stiven Velásquez Munera	Director SST	1036652730	Consorcio MS	Medellín	MOC
4	María Stella Agudelo Pineda	Especialista en Tránsito	51692899	Consorcio MS	Bogotá	MOC

N	Nombre y Apellido	Cargo	Número de Identificación	Consorcio al que Pertenece	Lugar de Residencia	Personal MOC o MONC
5	Wilson Andrés Garzón Linares	Auxiliar Administrativo	80142581	Consorcio MS	Bogotá	MOC
6	Noel Narciso Robles	Jefe de Cuadrilla	79833326	Consorcio MS	Bogotá	MOC
7	Carlos Julio Pinzón	Operador De Maquinaria	16693242	Consorcio MS	Armenia	MOC
8	Alejandro Narciso Robles	Conductor Operario	79802809	Consorcio MS	Bogotá	MOC
9	Sergio Narciso González	Operario	1023364668	Consorcio MS	Bogotá	MOC
10	Yeime Gustavo Torres Rozo	Jefe De Cuadrilla	79209853	Consorcio MS	No refiere	MOC
11	José Alexander Román Ruiz	Director De Obra	71785655	Consorcio MS	Medellín	MOC
12	Laura Natalia Ariza Ardila	Residente De Obra	1019148711	Consorcio MS	Santander	MOC
13	Esteban García Olarte	Auxiliar De Señalización Vial	1019610956	Consorcio MS	No refiere	MONC
14	Juan Camilo Gómez Valentin	Auxiliar De Señalización Vial	1005457894	Consorcio MS	No refiere	MONC
15	Yinder Alexis Reyes Cante	Auxiliar De señalización Vial	1127391283	Consorcio MS	No refiere	MONC
16	Marlon Santiago Vacca	Jefe De Cuadrilla	1007135516	Consorcio MS	No refiere	MOC
17	Jerson Rodríguez Sarmiento	Auxiliar De señalización Vial	1010044553	Consorcio MS	Bogotá	MONC

N	Nombre y Apellido	Cargo	Número de Identificación	Consorcio al que Pertenece	Lugar de Residencia	Personal MOC o MONC
18	Jhon Fredy Holguín Zanabria	Auxiliar De señalización Vial	1.013.678.179,00	Consorcio MS	Bogotá	MONC

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

6.2. Resumen de actividades realizadas

De los 57 puntos asignados hasta la fecha por la secretaria de Movilidad, se han realizado 57 socializaciones de los cuales 1 son municipios nuevos que ya se visitaron, Tenjo. A la fecha se han realizado socializaciones de cierre en 6 puntos de intervención de los cuales en el presente periodo se socializó en 9 puntos en los municipios de Paratebueno, Guatavita, Arbeláez, Pasca, Tenjo y San Bernardo.

En el periodo comprendido del 21 de noviembre de 2025 al 20 de diciembre de 2025 no se realizaron visitas de inicio.

Tabla 12 Inicio y Cierre de socializaciones correspondientes al periodo

Socializaciones de Inicio y Cierre Correspondientes al Periodo			
Fecha	**Municipio**	**Sector Socializado**	**Evidencia Fotográfica**
25/11/2025	San Bernardo (Visita cierre)	Escuela Normal Superior de San Bernardo e Institución Educativa Departamental San Bernardo	

Socializaciones de Inicio y Cierre Correspondientes al Periodo			
Fecha	**Municipio**	**Sector Socializado**	**Evidencia Fotográfica**
09/12/2025	Tenjo (Visita cierre)	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	
19/12/2025	Pasca (visita de cierre)	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS - VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	
19/12/2025	Arbeláez (visita de cierre)	SECTOR VIA SAN BERNARDO – ARBELAEZ y KIRPALAMAR	

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

7. BALANCE FINANCIERO

En este numeral se reúne la información relacionada al balance financiero del contrato STM-LP-009-2025.

Los siguientes son los valores del componente obra y suministros.

Tabla 13 Estado financiero del componente de obra

Valor Inicial Obra	**$ 3.625.158.645**
Valor Ejecutado	**$ 3.613.046.927**
Valor Total Por Ejecutar	**$ 12.111.718**

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

Durante el décimo mes de ejecución, se ha realizado la intervención de Paratebueno, Pasca, San Bernardo, Tenjo, Arbeláez y Guatavita, con lo cual se ha implementado $ 3.613.046.927 del presupuesto.

En cuanto a la facturación del contrato se han realizado los siguientes trámites:

Cuenta No. 1:

MUNICIPIO	***SUBTOTAL***	***AIU***	***TOTAL***
TABIO			
SANTA RITA	$ 55.271.563,00	$ 17.686.900,00	$ 72.958.463,00
MIRADOR	$ 50.294.202,00	$ 16.094.145,00	$ 66.388.347,00
SUBACHOQUE	$ 198.895.277,00	$ 63.646.489,00	$ 262.541.766,00

Se facturó un total de $401.888.576 para un total del 11.09% del valor total del contrato. A corte del presente informe, esta cuenta ya se encuentra pagada.

Cuenta No.2:

MUNICIPIO	SUBTOTAL	AIU	TOTAL
UBATÉ			
25845_CN_01	$ 59.473.462,00	$ 19.031.508,00	$ 78.504.970,00
25845_CN_02	$ 112.540.507,00	$ 36.012.962,00	$ 148.553.469,00
UBAQUE			
25841_CN_01	$ 80.578.824,00	$ 25.785.223,00	$ 106.364.047,00
25841_CN_03	$ 36.652.349,00	$ 11.728.751,00	$ 48.381.100,00
CARMEN DE CARUPA			
25154_CN_01	$ 38.604.650,00	$ 12.353.489,00	$ 50.958.139,00
25154_CN_03	$ 33.548.714,00	$ 10.735.589,00	$ 44.284.303,00
CUCUNUBÁ			
25224_CN_01	$ 92.218.142,00	$ 29.509.806,00	$ 121.727.948,00

Se facturó un total de: $598.773.976 para un total del 16.52% del valor total del contrato y un 27.60% acumulado, esta cuenta ya se encuentra pagada.

Cuenta No. 3:

LOTE 1	SUBTOTAL	AIU	TOTAL
Carmen De Carupa			
25154_Cn_02	$ 57.355.471,00	$ 18.353.751,00	$ 75.709.222,00
Guachetá			
25317_Cn_01	$ 23.033.365,00	$ 7.370.676,00	$ 30.404.041,00
25317_Cn_02	$ 8.719.638,00	$ 2.790.285,00	$ 11.509.923,00
25317_Cn_03	$ 5.933.668,00	$ 1.898.773,00	$ 7.832.441,00
Nemocón			
25846_Cn_01	$ 27.698.865,00	$ 8.863.636,00	$ 36.562.501,00
Simijaca			
25745_Cn_01	$ 35.169.253,00	$ 11.254.161,00	$ 46.423.414,00
25745_Cn_02	$ 8.642.113,00	$ 2.765.476,00	$ 11.407.589,00
25745_Cn_03	$ 17.141.960,00	$ 5.485.427,00	$ 22.627.387,00
Sutatausa			
25781_Cn_01	$ 4.136.121,00	$ 1.323.558,00	$ 5.459.679,00
25781_Cn_02	$ 10.829.533,00	$ 3.465.451,00	$ 14.294.984,00

Tocancipá			
25817_Cn_01	$ 252.322.940,00	$ 80.743.341,00	$ 333.066.281,00

Se facturó un total de: $595.297.462 para un total del 16.42% del valor total del contrato y un 44,02% acumulado, esta cuenta ya se encuentra pagada.

Cuenta No. 4:

LOTE 1	SUBTOTAL	AIU	TOTAL
CAQUEZA			
25151_CN_01	$ 32.537.075,00	$ 10.411.865,00	$ 42.948.940,00
25151_CN_02	$ 27.664.176,00	$ 8.852.537,00	$ 36.516.713,00
25151_CN_03	$ 72.976.973,00	$ 23.352.631,00	$ 96.329.604,00
25151_CN_04	$ 31.384.009,00	$ 10.042.882,00	$ 41.426.891,00
FOSCA			
25281_CN_01	$ 17.308.258,00	$ 5.538.643,00	$ 22.846.901,00
25281_CN_02	$ 136.253.287,00	$ 43.601.052,00	$ 179.854.339,00
25281_CN_03	$ 46.935.832,00	$ 15.019.467,00	$ 61.955.299,00
25281_CN_04	$ 8.717.289,00	$ 2.789.532,00	$ 11.506.821,00
GUAYABETAL			
25335_CN_01	$ 42.765.185,00	$ 13.684.859,00	$ 56.450.044,00
25335_CN_02	$ 30.637.917,00	$ 9.804.133,00	$ 40.442.050,00
QUETAME			
25594_CN_01	$ 5.030.421,00	$ 1.609.734,00	$ 6.640.155,00
25594_CN_02	$ 5.410.992,00	$ 1.731.518,00	$ 7.142.510,00
UBALÁ			
25839_CN_02	$ 65.044.742,00	$ 20.814.318,00	$ 85.859.060,00
UNE			
25845_CN_01	$ 37.625.274,00	$ 12.040.088,00	$ 49.665.362,00
25845_CN_02	$ 62.647.964,00	$ 20.047.348,00	$ 82.695.312,00
25845_CN_03	$ 48.894.011,00	$ 15.646.084,00	$ 64.540.095,00
25845_CN_04	$ 38.679.883,00	$ 12.377.563,00	$ 51.057.446,00
25845_CN_05	$ 53.792.987,00	$ 17.213.756,00	$ 71.006.743,00

Se facturó un total de: $1.008.884.285 para un total del 28% del valor total del contrato y un 71,85% acumulado, esta cuenta ya se encuentra pagada.

Cuenta No. 5:

LOTE 1	SUBTOTAL	AIU	TOTAL
JUNIN			

25372_CN_01	$ 63.459.221,00	$ 20.306.950,00	$ 83.766.171,00
25372_CN_02	$ 102.674.002,00	$ 32.855.681,00	$ 135.529.683,00
25372_CN_03	$ 38.611.924,00	$ 12.355.815,00	$ 50.967.739,00
MACHETÁ			
25426_CN_01	$ 5.894.451,00	$ 1.886.225,00	$ 7.780.676,00
SUSA			
25779_CN_01	$ 10.285.541,00	$ 3.291.373,00	$ 13.576.914,00
TAUSA			
25594_CN_01	$ 16.471.723,00	$ 5.270.951,00	$ 21.742.674,00

Se facturó un total de: $ 313.363.857,00 para un total del 8,64% del valor total del contrato y un 80,5% acumulado, esta cuenta ya se encuentra pagada.

Cuenta No. 6:

LOTE 1	SUBTOTAL	AIU	TOTAL
PARATEBUENO			
25530_CN_01	$ 51.946.618,00	$ 16.622.918,00	$ 68.569.536,00
PASCA			
25535_CN_01	$ 27,730,584,00	$ 8.873.787,00	$ 36.604.371,00
25535_CN_02	$ 77.136.014,00	$ 24.683.525,00	$ 101.819.539,00
SAN BERNARDO			
25649_CN_02	$ 12.927.614,00	$ 4.136.837,00	$ 17.064.451,00
25649_CN_03	$ 34.375.033,00	$ 11.000.011,00	$ 45.375.044,00
TENJO			
25799_CN_03	$ 168707506	$ 53.986.402,00	$ 222.693.908,00

Se desea facturar un total de: $ 492.126.849 para un total del 13,58% del valor total del contrato y un 94,07% acumulado.

Queda un saldo de facturación correspondiente a $ 202.711.922 equivalente a un 5.59% del valor total del contrato, el cual será tramitado en la liquidación del contrato.

7.1. Meta contractual y su estado financiero

En este apartado se exponen las metas contractuales con respecto al estado financiero del contrato, la información está resumida en la Tabla 14.

Tabla 14 Meta contractual y su estado financiero

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Físico	Porcentaje físico acumulado %	¿CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 181.257.932					NO
3	20-may-25	10%	$ 362.515.864,50			$ 369.801.264,58	10,20%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 725.031.729	$ 401.888.576	11,09%	$ 807.397.167	22,27%	NO
5	20-jul-25	35%	$1.268.805.526	$ 783.692.162	21,62%	$ 1.223.717.964	33,76%	NO
6	20-ago-25	50%	$1.812.579.323	$ 1.000.662.552	27,60%	$ 1.697.861.006	46,84%	NO
7	20-sep-25	70%	$2.537.611.052	$ 1.595.960.014	44,02%	$ 2.577.624.979	71,10%	NO
8	20-oct-25	90%	$3.262.642.781	$ 2.604.844.299	71,85%	$ 2.826.558.685	77,97%	NO
9	20-nov-25	100%	$3.625.158.645	$ 2.918.208.156	80,50%	$ 3.305.189.896,06	91,17%	NO
10	20-dic-25	100%	$3.625.158.645	$ 3.613.046.927	99,67%	$ 3.613.046.927	99,67%	NO

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

8. BALANCE JURIDICO

En este numeral se reúne la información relacionada al balance jurídico del contrato STM-LP-009-2025.

Al corte del presente informe se mantienen las condiciones iniciales del contrato, no se ha realizado ninguna modificación ni adición correspondiente.

8.1. Estado de las pólizas

Mediante la Tabla 15 se muestra el estado actual de las pólizas:

Tabla 15 Estado de las pólizas

Contrato De Obra			
AMPARO	VIGENCIA (Fechas)		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21/2/2025	20/4/2026	$ 1.044.006.941,70
PAGO DE SALARIO- PRESTACIONES SOCIALES LEGALES- INDEMNIZACIONES LABORALES	21/2/2025	20/12/2028	$ 348.002.313,90

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS después desde la entrega de la obra o finalizado el contrato		$	1.044.006.941,70
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- RCE ASEGURADORA SOLIDARIA No. 496 74 994000008792	13/11/2025	20/12/2025	$	711.750.000

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

8.2. Aspectos contractuales relevantes

A la fecha del presente informe no se identifican aspectos contractuales relevantes en relación con el aspecto jurídico, con respecto a las metas contractuales se tiene la siguiente información:

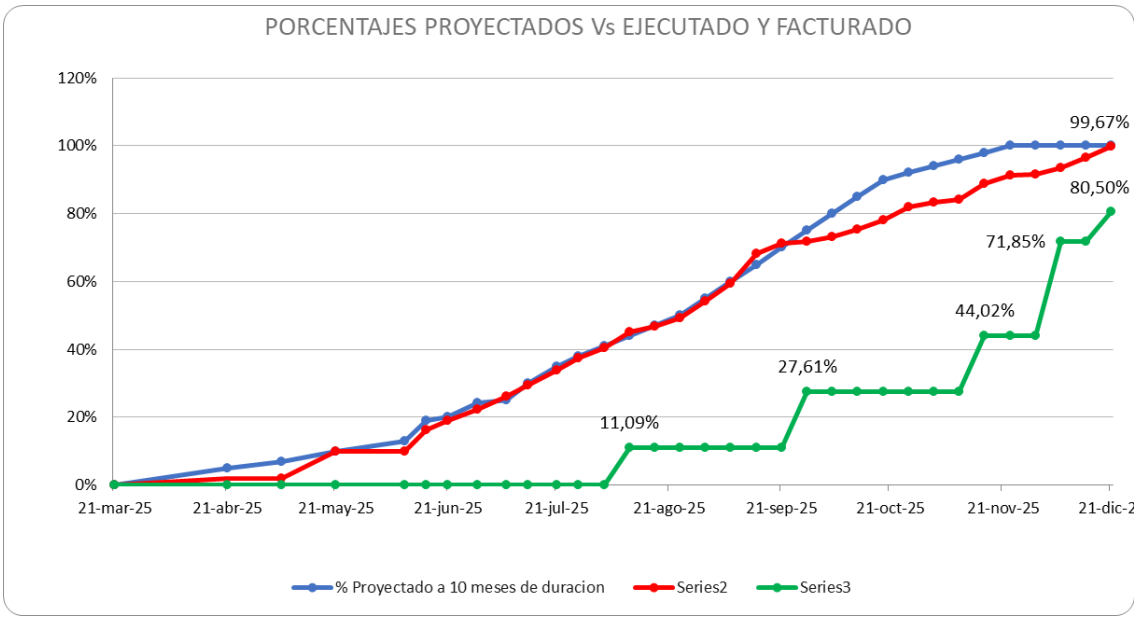


Ilustración 1 Metas contractuales vs el avance en obra

Con respecto a las modificaciones de los diseños originales y actividades se tiene la siguiente información resumida en la Tabla 16:

Tabla 16 Modificaciones en los diseños y adición de actividades

Municipio	Código del punto	Cambios en el diseño
Guatavita	25326_CN_01	Incluir en la ejecución de actividades el NP -19 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LECHADA ASFÁLTICA (SLURRY SEAL), TIPO LA-10, ESPESOR 1 CM, aplicable para CONSORCIO MS.

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

Es importante aclara que al momento de la implementación en los municipios de San Bernardo y Junín se presentaron fuertes lluvias que retrasaron la implementación de las obras contempladas en los diseños apropiados.

9. BALANCE ADMINISTRATIVO

En este numeral se reúne la información relacionada al balance administrativo relacionado al contrato STM-LP-009-2025.

9.1. Actas de reunión

En el Anexo 6 se evidencia las actas de reunión que se han realizado en el periodo contemplado del presente documento.

9.2. Comités de seguimiento

A continuación, se muestra en la Tabla 17 los comités de seguimiento correspondientes al periodo 21 de octubre del 2025 al 20 de noviembre del 2025.

Tabla 17 Comités de seguimiento

Entidades	Fecha
SMC	27/11/ 2025
Consorcio INT Seguridad Vial	
SMC	27/11/ 2025
Consorcio MS	
Consorcio INT Seguridad Vial	
SMC	27/11/ 2025
Consorcio INGENIO VIAL	
Consorcio INT Seguridad Vial	
SMC	05/12/ 2025
Consorcio INT Seguridad Vial	
SMC	05/12/ 2025
Consorcio MS	
Consorcio INT Seguridad Vial	

Entidades	Fecha
SMC	05/12/ 2025
Consorcio INGENIO VIAL	
Consorcio INT Seguridad Vial	
SMC	15/12/ 2025
Consorcio INT Seguridad Vial	
SMC	15/12/ 2025
Consorcio MS	
Consorcio INT Seguridad Vial	
SMC	15/12/ 2025
Consorcio INGENIO VIAL	
Consorcio INT Seguridad Vial	
SMC	19/12/ 2025
Consorcio INT Seguridad Vial	
SMC	19/12/ 2025
Consorcio MS	
Consorcio INT Seguridad Vial	
SMC	19/12/ 2025
Consorcio INGENIO VIAL	
Consorcio INT Seguridad Vial	

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

9.3. Correspondencia enviada y recibida

En la Tabla 18 se encuentra la información resumida de la información recibida y enviada por parte del correo electrónico; Consorcioms2025@pinturasycolores.com hacia las diferentes entidades relacionadas al contrato STM-LP-009-2025.

Tabla 18 Correspondencia enviada y recibida

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	21/11/2025	Remisión Documentación cierre Social. Contrato de Obra N° STM-LP-009-2025
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	24/11/2025	MS-213-2025-APROPIACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO VIGENTE- MUNICIPIO GUATAVITA
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	24/11/2025	MS-214-2025 Informe_final_Municipio_de_Tausa
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	24/11/2025	CRONOGRAMA DE VISITAS DE ENTREGA - LOTE 1
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	25/11/2025	MS-216-2025-Retiro resaltos portátiles Municipio de San Bernardo – Sector I.E.D San Bernardo

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	25/11/2025	MS-217-2025-REMISIÓN PLANOS RECORD Y ACTAS DE MAYORES Y MENORES MUNICIPIO DE SAN BERNADO
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	26/11/2025	MS-218-2025-Informe_final_Municipio_de_Susa
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	26/11/2025	MS-220-2025 - RESPUESTA OFICIO DPC-0102025-929-2025 – ATENCIÓN OBSERVACIONES CUENTA No. 4
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	26/11/2025	MS-219-2025 - ENTREGA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL – INFORME No. 8 DE OBRA.
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	26/11/2025	MS-221-2025 - AJUSTE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 8.
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	MS-223-2025-Informe_final_Municipio_de_Machetá
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	Remisión Documentación cierre Social. Contrato de Obra N° STM-LP-009-2025
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	Remisión Documentación cierre Social. Contrato de Obra N° STM-LP-009-2025
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	Fwd: Concepto Revisión INFORMES FINALES ANAPOIMA (4 Puntos)
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	Concepto Revisión TABIO (3 Puntos) LOTE 1
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	Remisión Documentación cierre Social. Contrato de Obra N° STM-LP-009-2025
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA INFORME FINAL CUCUNUBA
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	CONTRATO DEOBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION A OBSERVACIONES GENERADAS ENVISITA DE CAMPO Y ENTREGA A LA SMC EN EL MUNICIPIO DE UNE
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA INFORME FINAL NEMOCÓN
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	29/11/2025	MS-222-2025 PROPUESTA TÉCNICA PARA EL BORRADO DE MARCAS VIALES EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE GUATAVITA.

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	01/12/2025	Fwd: Concepto técnico Revisión Informe Final Municipio de CUCUNUBA - CONSORCIO MS
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	01/12/2025	Fwd: Concepto técnico Revisión Informe Final Municipio de NEMOCON - CONSORCIO MS
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	02/12/2025	CRONOGRAMA DE VISITAS DE ENTREGA - LOTE 1
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	02/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025-CUENTA DE COBRO No.04
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	04/12/2025	Remisión del informe mensual social No 9. MS-215-2025
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	04/12/2025	MS-228-2025-REMISIÓN PLANOS RECORD Y ACTAS DE MAYORES Y MENORES MUNICIPIO DE TENJO
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	05/12/2025	MS-229-2025-REMISIÓN INFOMRE TÉCNICO MENSUAL No 9
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	06/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 - OBSERVACIONES INFORMES FINALES MUNICIPIOS DE GUAYABETAL - SUTATAUSA
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	06/12/2025	MS-229-2025 - REMISIÓN DOCUMENTOS PARA CUENTA DE COBRO No. 5 DE OBRA
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	09/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL UBATÉ
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	09/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-008-2025 – ENTREGA SUBSANACIÓN INFORME FINAL PUNTOS MUNICIPIO DE TABIO
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	10/12/2025	MS-230-2025 REMISIÓN DE NO PREVISTO (NP-19) Y PRESUPUESTO PARA BORRADO DE MARCAS VIALES MUNICIPIO DE GUATAVITA.
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	10/12/2025	MS-231-2025 - REMISIÓN INFORME MENSUAL SST No.9 DE OBRA
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	11/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 - OBSERVACIONES INFORMES FINALES MUNICIPIO DE UBALA
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	11/12/2025	MS-134-2025 INFORME FINAL MUNICIPIO UBAQUE

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	11/12/2025	MS-232-2025 Sustentación técnica del APU NP-19 – Actividad de suministro e instalación de lechada asfáltica (Slurry Seal) LA-10 e = 1 cm.
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	11/12/2025	MS-232-2025 INFORME FINAL DEL MUNICIPIO DE JUNIN
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	12/12/2025	MS-234-2025 Alcance oficio MS-232-2025 - Sustentación técnica del APU NP-19 – Actividad de suministro e instalación de lechada asfáltica (Slurry Seal) LA-10 e = 1 cm.
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	12/12/2025	MS-176-2025 REMISIÓN DE INFORME DE VISITA INICIAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	12/12/2025	MS-150-2025 INFORME FINAL MUNICIPIO DE GUACHETÁ
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	15/12/2025	comité 10 am 15/12/2025
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	15/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – AVAL NP -19 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LECHADA ASFÁLTICA (SLURRY SEAL), TIPO LA-10, ESPESOR 1 CM
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	15/12/2025	MS-158-2025 INFORME FINAL MUNICIPIO CARMEN DE CARUPA
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	16/12/2025	MS-235-2025 - PLAN DE TRABAJO – PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SLURRY - GUATAVITA
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	16/12/2025	MS-236-2025 - AJUSTE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 9.
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	16/12/2025	MS-237-2025 - RESPUESTA OFICIO DPC-0102025-1021-2025 – ATENCIÓN OBSERVACIONES CUENTA No. 5
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	17/12/2025	MS-238-2025
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	17/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025-CUENTA DE COBRO No.05
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	17/12/2025	MS-235-2025 -ALCANCE OFICIO MS-222-2025 PARA EL PLAN DE TRABAJO – PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SLURRY - GUATAVITA

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	18/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 - OBSERVACIONES INFORMES FINALES MUNICIPIO DE SUSA
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	18/12/2025	Observaciones (Ensayos) INFORME FINAL PUNTO Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia - MUNICIPIO DE TABIO
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	18/12/2025	MS-239-2025-REMISIÓN INFORME FINAL CONTRATO STM-LP-009-2025
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	19/12/2025	comité lote 1
Recibida	Consorcio ms	21/11/2025	Remisión Documentación cierre Social. Contrato de Obra N° STM-LP-009-2025
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	21/11/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES GENERADAS EN VISITA DE CAMPO Y ENTREGA A LA SMC EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	21/11/2025	CONTRATO DEOBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION A OBSERVACIONES GENERADAS ENVISITA DE CAMPO Y ENTREGA A LA SMC EN EL MUNICIPIO DE UBALA
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	21/11/2025	CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025 – OBSERVACIONES CUENTA DE COBRO No.4
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	22/11/2025	CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025 – SOLICITUD ENTREGA DE SUBSANACIÓN DE PUNTOS TERMINADOS-PLAN DE CONTINGENCIA (CULMINACIÓN CONTRATO)-BALANCE PRESUPUESTAL Vs PRESUPUESTO INICIAL
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	24/11/2025	CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025 – SOLICITUD ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (OCTUBRE 2025)
Recibida	Consorcio ms	24/11/2025	MS-214-2025-Informe_final_Municipio_de_Tausa
Recibida	Consorcio ms	25/11/2025	MS-213-2025-APROPIACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO VIGENTE- MUNICIPIO GUATAVITA

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Recibida	Consorcio ms	25/11/2025	MS-216-2025-Retiro resaltos portátiles Municipio de San Bernardo – Sector I.E.D San Bernardo
Recibida	Consorcio ms	25/11/2025	MS-217-2025-REMISIÓN PLANOS RECORD Y ACTAS DE MAYORES Y MENORES MUNICIPIO DE SAN BERNADO
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	25/11/2025	CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025 – SOLICITUD GARANTÍA- CERTIFICADO DE CALIDAD RADARES MEDIDORES DE VELOCIDAD.
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	26/11/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA ACTA DE CANTIDADES Y PLANOS RECORD DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO.
Recibida	Consorcio ms	27/11/2025	Remisión Documentación cierre Social. Contrato de Obra N° STM-LP-009-2025
Recibida	Consorcio ms	27/11/2025	Remisión Documentación cierre Social. Contrato de Obra N° STM-LP-009-2025
Recibida	Consorcio ms	27/11/2025	Remisión Documentación cierre Social. Contrato de Obra N° STM-LP-009-2025
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA INFORME FINAL CUCUNUBA
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	CONTRATO DEOBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION A OBSERVACIONES GENERADAS ENVISITA DE CAMPO Y ENTREGA A LA SMC EN EL MUNICIPIO DE UNE
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	27/11/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA INFORME FINAL NEMOCÓN
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	29/11/2025	MS-222-2025 PROPUESTA TÉCNICA PARA EL BORRADO DE MARCAS VIALES EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE GUATAVITA.
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	02/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025-CUENTA DE COBRO No.04
Recibida	Juan David Heredia Castiblanco	03/12/2025	RV: 009-2025 CUENTA DE COBRO No.4
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	03/12/2025	CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025 – RESPUESTA COMUNICACIÓN MS-222-

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
			2025 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 PROPUESTA TÉCNICA PARA EL BORRADO DE MARCAS VIALES EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE GUATAVITA
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	03/12/2025	CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025 – RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO No.4
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	03/12/2025	CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025 RESPUESTA COMUNICADO MS-216-2025 - RETIRO RESALTOS PORTÁTILES MUNICIPIO DE SAN BERNARDO – SECTOR I.E.D SAN BERNARDO.
Recibida	Consorcio ms	04/12/2025	MS-228-2025-REMISIÓN PLANOS RECORD Y ACTAS DE MAYORES Y MENORES MUNICIPIO DE TENJO
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	04/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA ACTA DE CANTIDADES Y PLANOS RECORD DE TENJO
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	04/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 - ACTA DE RECIBO SAN BERNARDO
Recibida	Consorcio ms	05/12/2025	MS-229-2025-REMISIÓN INFOMRE TÉCNICO MENSUAL No 9
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	06/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 - OBSERVACIONES INFORMES FINALES MUNICIPIOS DE GUAYABETAL - SUTATAUSA
Recibida	Giovanna Naranjo Guzman	09/12/2025	RV: CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL CUCUNUBA
Recibida	Giovanna Naranjo Guzman	09/12/2025	RV: CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL NEMOCON
Recibida	Giovanna Naranjo Guzman	09/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL UBATÉ
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	10/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL CUCUNUBA

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	10/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL NEMOCON
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	10/12/2025	MS-230-2025 REMISIÓN DE NO PREVISTO (NP-19) Y PRESUPUESTO PARA BORRADO DE MARCAS VIALES MUNICIPIO DE GUATAVITA
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	10/12/2025	CONTRATO DE OBRANo.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL TABIO
Recibida	Consorcio ms	10/12/2025	MS-231-2025 - REMISIÓN INFORME MENSUAL SST No.9 DE OBRA
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	10/12/2025	CONTRATO DE OBRANo.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL UBATÉ
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	10/12/2025	CONTRATO DE OBRANo.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL SUTATAUSA
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	11/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 - OBSERVACIONES INFORMES FINALES MUNICIPIO DE UBALA
Recibida	Consorcio ms	11/12/2025	MS-229-2025 - REMISIÓN DOCUMENTOS PARA CUENTA DE COBRO No. 5 DE OBRA
Recibida	Consorcio ms	11/12/2025	MS-134-2025 INFORME FINAL MUNICIPIO UBAQUE
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	11/12/2025	CONTRATO DE OBRANo.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL GUAYABETAL
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	11/12/2025	CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025. ENTREGA CONSECUTIVOS ETIQUETAS MUNICIPIOS DE PASCA
Recibida	Consorcio ms	11/12/2025	MS-232-2025 Sustentación técnica del APU NP-19 – Actividad de suministro e instalación de lechada asfáltica (Slurry Seal) LA-10 e = 1 cm.
Recibida	Consorcio ms	11/12/2025	MS-232-2025 INFORME FINAL DEL MUNICIPIO DE JUNIN
Recibida	Consorcio ms	12/12/2025	MS-234-2025 Alcance oficio MS-232-2025 - Sustentación técnica del APU NP-19 – Actividad

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
			de suministro e instalación de lechada asfáltica (Slurry Seal) LA-10 e = 1 cm.
Recibida	Consorcio ms	12/12/2025	Remisión del informe mensual social No 9. MS-215-2025
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	12/12/2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025-ENTREGA ACTAS DE RECIBO SMC TENJO-VERGARA
Recibida	Consorcio ms	12/12/2025	MS-176-2025 REMISIÓN DE INFORME DE VISITA INICIAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA
Recibida	Consorcio ms	12/12/2025	MS-150-2025 INFORME FINAL MUNICIPIO DE GUACHETÁ
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	13/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION INFORME FINAL UBALÁ
Recibida	Consorcio ms	15/12/2025	MS-158-2025 INFORME FINAL MUNICIPIO CARMEN DE CARUPA
Recibida	Consorcio ms	16/12/2025	MS-235-2025 - PLAN DE TRABAJO – PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SLURRY - GUATAVITA
Recibida	Consorcio ms	16/12/2025	MS-236-2025 - AJUSTE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 9.
Recibida	Consorcio ms	16/12/2025	MS-237-2025 - RESPUESTA OFICIO DPC-0102025-1021-2025 – ATENCIÓN OBSERVACIONES CUENTA No. 5
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	16/12/2025	CONTRATO DE OBRA No. STM-LP-009-2025. APROBACION INFORME MENSUALNo.9
Recibida	Consorcio ms	17/12/2025	MS-238-2025
Recibida	Consorcio ms	17/12/2025	MS-235-2025 -ALCANCE OFICIO MS-222-2025 PARA EL PLAN DE TRABAJO – PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SLURRY - GUATAVITA
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	17/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 ALCANCE AL OFICIO DPC-0102025-1036-2025 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2026 TRASLADO COMUNICACIÓN CONTRATISTA – PLAN DE TRABAJO SLURRY– MUNICIPIO DE GUATAVITA

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Recibida	Giovanna Naranjo Guzman	17/12/2025	RV: CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025- CUENTA DE COBRO No.05
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	18/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025-CUENTA DE COBRO No.05
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	18/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – AVAL NP -19 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LECHADA ASFÁLTICA (SLURRY SEAL), TIPO LA-10, ESPESOR 1 CM
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	18/12/2025	CONTRATODE OBRA STM-LP-009-2025 – TRASLADO ACTA DE NO PREVISTO SUSCRITA DEL NP-19 SUMINISTROY APLICACIÓN DE LECHADA ASFÁLTICA (SLURRY SEAL), TIPO LA-10, ESPESOR 1CM (INCLUYE PREPARACIÓN YLIMPIEZA DE LA SUPERFICIE). CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE INVIAS ARTÍCULO 433 – 13., CONTRATO STM-LP009-2025, LOTE 1 – CONSORCIOMS.
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	18/12/2025	CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 - OBSERVACIONES INFORMES FINALES MUNICIPIO DE SUSA

Fuente: Consorcio MS, Contrato STM-LP-009-2025.

9.4. PQR´S tramitados

Durante el periodo de ejecución del presente informe no se hizo recepción de Peticiones, Quejas ni Reclamos (PQR´S) a través de los canales dispuestos para la atención a la comunidad. No obstante, la interventoría deja constancia de que los mecanismos de recepción permanecieron activos y disponibles durante todo el periodo reportado, garantizando la posibilidad de atención oportuna a cualquier manifestación ciudadana relacionada con la ejecución de las obras de señalización vial en los municipios intervenidos.

10. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre de 2025, el CONTRATISTA ejecutó las actividades correspondientes a los contratos de obra STM-LP-009-2025 (Lote 1) y STM-LP-008-2025 (Lote 2), garantizando el cumplimiento de los requisitos

técnicos, administrativos y de calidad en las intervenciones desarrolladas en los municipios del departamento de Cundinamarca, bajo el seguimiento permanente de la interventoría.

En relación con el avance general, para el Lote 1 se alcanzó un porcentaje de ejecución física del 99,67% del valor total del contrato, equivalente a $ 3.613.046.927, con la totalidad de los puntos apropiados ejecutados, terminados y entregados a la entidad-SMC en 26 municipios. Es importante señalar que el 100% de los puntos fueron finalizados antes del vencimiento del plazo contractual el 20 de diciembre de 2025, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Si bien el cronograma inicial presentó ajustes, las actividades implementadas durante el mes de diciembre permitieron culminar satisfactoriamente la totalidad de las obras, garantizando el cumplimiento de las metas establecidas, así como los estándares de calidad y alcance definidos para el proyecto.

En cuanto al componente social, el CONTRATISTA ejecutó de manera satisfactoria las actividades de socialización inicial, así como la elaboración de actas de vecindad y actas de entorno en todos los puntos intervenidos, sin que se registraran PQRs a través de los canales dispuestos para la atención a la comunidad durante el periodo reportado.

Respecto al componente de calidad, los ensayos realizados durante el periodo, incluyendo granulometría de microesfera, medición de espesores húmedos y secos, resistencia al deslizamiento, retrorreflectividad horizontal y vertical, resistencia del concreto, así como ensayos de compresión y flexión de tachas y estoperoles, arrojaron resultados conformes con los parámetros establecidos en las normas técnicas colombianas aplicables, garantizando la calidad y durabilidad de las intervenciones ejecutadas.

No obstante, se identifican actividades pendientes por gestionar en la etapa de cierre contractual. Algunos puntos ubicados en los municipios de Tocancipá, San Bernardo, Arbeláez y Pasca se encuentran en proceso de atención de observaciones emitidas por la entidad-SMC, y un número de informes finales se encuentra en trámite de aprobación. En este sentido, el CONTRATISTA se encuentra adelantando las acciones necesarias para la subsanación de dichas observaciones y la consolidación de los informes requeridos, con el fin de avanzar oportunamente en el proceso de terminación y liquidación del contrato.

Adicionalmente, en el municipio de Guatavita se vienen gestionando las acciones correspondientes para ajustar la implementación vial, atendiendo los requerimientos del concesionario de la vía, en el marco del cumplimiento de las disposiciones contractuales.

Finalmente, el CONTRATISTA reitera su compromiso con la atención oportuna de los requerimientos formulados por la entidad y la interventoría, así como con el cumplimiento de los estándares de calidad, las buenas prácticas constructivas y la normatividad vigente, con miras a lograr el cierre y liquidación de los contratos en debida forma.

11. ANEXOS

ANEXO 1. MATRICES DE GARANTÍAS
ANEXO 2. BITÁCORA
ANEXO 3. INFORME AMBIENTAL
ANEXO 4. PARAFISCALES
ANEXO 5. ACTAS DE REUNIÓN
ANEXO 6. INFORME SG-SST
ANEXO 7. REGISTRO DE LLUVIAS
ANEXO 8. INFORMES SEMANALES
ANEXO 9. CONTROL DE EQUIPOS Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN
ANEXO 10. SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA
ANEXO 11. ACTAS DE MAYORES Y MENORES - PLANOS RECORD
