Gobernación de Cundinamarca	**INFORME SEMANAL DE OBRA**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	VIGENCIA:	**2025-01-22**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	42	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	8 de diciembre de 2025	Y EL	14 de diciembre de 2025
ALCANCE	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
LOCALIZACIÓN	Las obras objeto de los contratos de obra a los cuales se les realizará Interventoría con el presente proceso, serán ejecutadas en el Departamento de Cundinamarca, en las vías a cargo de la Secretaría de Movilidad Contemporánea - SMC, que estén definidos en las áreas de influencia de las propuestas esquemáticas de diseños de señalización y dispositivos de seguridad vial que requieran intervención para la reglamentación, prevención e información				

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA LOTE 1**	
CONTRATO No.:	STM-CM-010-2025	CONTRATO No.:	STM-LP-009-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	CONTRATISTA:	CONSORCIO MS
PLAZO INICIAL (En meses)	ONCE (11) MESES	PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE FEBRERO DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 DE ENERO 2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIO:	N/A	*FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	20 DE ENERO 2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	20 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	ONCE (11) MESES	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	DIEZ (10) MESES
VALOR INICIAL :	$ 1.651.573.119,00	VALOR INICIAL :	$ 3.625.158.645,00
VALOR ADICION(ES):	-	VALOR ADICION(ES):	-
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.651.573.119,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.625.158.645,00
VALOR PAGADO:	$ 321.444.924,00	VALOR PAGADO:	$ 1.595.960.014,00
VALOR POR PAGAR:	$ 1.330.128.195,00	VALOR POR PAGAR:	$ 2.029.198.631,00

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS


CONTRATO DE INTERVENTORÍA- SEGUROS DEL ESTADO POLIZA CUMPLIMIENTO No. 21-44-101462141

AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	21/2/2025	21/9/2026	$ 165.157.311,90
PAGO DE SALARIO-PRESTACIONES SOCIALES LEGALES- INDEMNIZACIONES LABORALES	21/2/2025	21/1/2029	$ 82.578.655,95
CALIDAD DEL SERVICIO	21/1/2026	21/1/2031	$ 165.157.311,90

CONTRATO DE OBRA - SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA CUMPLIMIENTO No.65-44-101237241

AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	21/2/2025	21/6/2026	$ 1.087.547.593,50
PAGO DE SALARIO-PRESTACIONES SOCIALES LEGALES- INDEMNIZACIONES LABORALES	21/2/2025	22/12/2028	$ 362.515.864,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS después desde la entrega de la obra o finalizado el contrato		$ 1.087.547.593,50
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- RCE SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 65-40-101080082	21/2/2025	22/12/2025	$ 711.750.000,00

3. AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO CURVA "S"

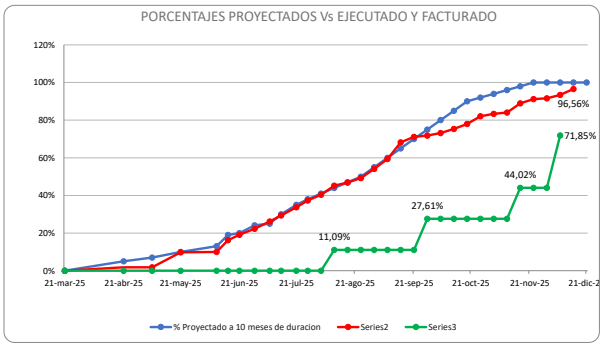

La grafica presenta el valor proyectado durante los 10 meses de ejecución programados mediante el contrato de obra, Vs lo ejecutado a la fecha que es 96,56% sobre el valor total del contrato.

PV (Valor Planeado)	$	3.625.158.645
EV (Valor Ejecutado)	$	3.500.497.721
SV (Variación del Cronograma)	-$	124.660.924
SPI (Índice Desempeño del Cronograma)		0,97
Valor Facturado	$	2.604.844.299
Pendiente por Cobrar	$	895.653.422
Índice de avance financiero		74,41%

Notas:

VALOR PLANEADO (PV):

$ 3.625.158.645

VALOR EJECUTADO:

$ 3.500.497.721

VALOR FACTURADO:

$ 2.604.844.299

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

% AVANCE DE EJECUCIÓN

Municipio	Localizacion Punto	Fecha inicio obra	Fecha fin obra	Avance de obra fisica (%)	Valor parcial ejecutado	Entrega planos récord CO a CI	Fecha Acta mayores y menores	Valor ejecutado Acta mayores y menores	Fecha acta visita con SMC	Fecha Acta entrega y recibo a satisfacción	Socialización fin	Actas cierre de vecindad	Actas cierre entorno	Cobrado SI/NO	Valor cobrado $	ESTADO ACTUAL
CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	8/9/2025	30/09/2025	100%	$ 42.948.940,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 42.948.940,00	8/10/2025	8/10/2025	15/11/2025	N/A	15/11/2025	SI	$ 42.948.940,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CÁQUEZA	2. Escuela Ubatoque 2	8/9/2025	30/09/2025	100%	$ 36.516.713,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 36.516.713,00	8/10/2025	8/10/2025	15/11/2025	N/A	15/11/2025	SI	$ 36.516.713,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CÁQUEZA	3. Consolidado Sector El Campin	8/9/2025	30/09/2025	100%	$ 96.329.604,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 96.329.604,00	8/10/2025	8/10/2025	15/11/2025	N/A	15/11/2025	SI	$ 96.329.604,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CÁQUEZA	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	3/9/2025	30/09/2025	100%	$ 41.426.891,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 41.426.891,00	8/10/2025	8/10/2025	15/11/2025	N/A	15/11/2025	SI	$ 41.426.891,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CARMEN DE CARUPA	2. Sector La U	5/7/2025	12/8/2025	100%	$ 50.958.139,00	15/8/2025	15/8/2025	$ 50.958.139,00	19/8/2025	19/8/2025	5/09/2025	N/A	5/09/2025	SI	$ 50.958.139,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CARMEN DE CARUPA	3. Sector El Prado	5/7/2025	3/9/2025	100%	$ 75.709.222,00	4/9/2025	4/9/2025	$ 75.709.222,00	5/9/2025	5/9/2025	5/09/2025	N/A	5/09/2025	SI	$ 75.709.222,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CARMEN DE CARUPA	4.Sector Peligros	5/7/2025	15/7/2025	100%	$ 44.284.303,00	15/8/2025	15/8/2025	$ 44.284.303,00	19/8/2025	19/8/2025	5/09/2025	N/A	5/09/2025	SI	$ 44.284.303,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CUCUNUBÁ	PUNTO CRITICO PR 4+100	16/7/2025	12/8/2025	100%	$ 121.727.948,00	15/8/2025	15/8/2025	$ 121.727.948,00	19/8/2025	19/8/2025	5/09/2025	5/09/2025	5/09/2025	SI	$ 121.727.948,00	TERMINADO Y RECIBIDO
FOSCA	1. Colegio IDER	23/7/2025	14/9/2025	100%	$ 22.846.901,00	18/9/2025	18/9/2025	$ 22.846.901,00	8/10/2025	8/10/2025	14/9/2025	N/A	14/9/2025	SI	$ 22.846.901,00	TERMINADO Y RECIBIDO
FOSCA	2. Consolidado El Tablon	11/7/2025	14/9/2025	100%	$ 179.854.339,00	18/9/2025	18/9/2025	$ 179.854.339,00	8/10/2025	8/10/2025	14/9/2025	N/A	14/9/2025	SI	$ 179.854.339,00	TERMINADO Y RECIBIDO
FOSCA	4. Cementerio Municipal	10/7/2025	14/9/2025	100%	$ 61.955.299,00	18/9/2025	18/9/2025	$ 61.955.299,00	8/10/2025	8/10/2025	14/9/2025	14/9/2025	14/9/2025	SI	$ 61.955.299,00	TERMINADO Y RECIBIDO
FOSCA	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	22/7/2025	24/7/2025	100%	$ 11.506.821,00	18/9/2025	18/9/2025	$ 11.506.821,00	8/10/2025	8/10/2025	14/9/2025	N/A	14/9/2025	SI	$ 11.506.821,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUACHETA	ESCUELA LA ISLA	16/7/2025	27/7/2025	100%	$ 30.404.041,00	7/8/2025	7/8/2025	$ 30.404.041,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 30.404.041,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUACHETA	I.E. MIÑA Y TICHA	16/7/2025	28/7/2025	100%	$ 11.509.923,00	7/8/2025	7/8/2025	$ 11.509.923,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 11.509.923,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUACHETA	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	16/7/2025	28/7/2025	100%	$ 7.832.441,00	7/8/2025	7/8/2025	$ 7.832.441,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 7.832.441,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUAYABETAL	Vda San Antonio Reductores de velocidad / ocho (8)	23/6/2025	24/09/2025	100%	$ 56.450.044,00	1/10/2025	1/10/2025	$ 56.450.044,00	9/10/2025	9/10/2025	15/11/2025	N/A	15/11/2025	SI	$ 56.450.044,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUAYABETAL	Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo	5/7/2025	25/09/2025	100%	$ 40.442.050,00	1/10/2025	1/10/2025	$ 40.442.050,00	9/10/2025	9/10/2025	15/11/2025	15/11/2025	15/11/2025	SI	$ 40.442.050,00	TERMINADO Y RECIBIDO
MACHETÁ	ESCUELA GUINA	20/10/2025	20/10/2025	100%	$ 7.780.676,00	28/10/2025	28/10/2025	$ 7.780.676,00	20/11/2025	20/11/2025	29/10/2025	N/A	29/10/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
NEMOCON	ESCUELA LA PUERTA	23/6/2025	3/9/2025	100%	$ 36.562.501,00	4/9/2025	4/9/2025	$ 36.562.501,00	5/9/2025	5/9/2025	5/09/2025	N/A	5/09/2025	SI	$ 36.562.501,00	TERMINADO Y RECIBIDO
PARATEBUENO	Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso	27/10/2025		53,77%	$ 36.259.568,29											EN EJECUCIÓN
QUETAME	1. Escuela Rural Granadillo	26/09/2025	27/09/2025	100%	$ 6.640.155,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 6.640.155,00	8/10/2025	8/10/2025	14/11/2025	N/A	14/11/2025	SI	$ 6.640.155,00	TERMINADO Y RECIBIDO
QUETAME	2. Intersección Matemango	26/09/2025	27/09/2025	100%	$ 7.142.510,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 7.142.510,00	8/10/2025	8/10/2025	14/11/2025	N/A	14/11/2025	SI	$ 7.142.510,00	TERMINADO Y RECIBIDO
SIMIJACA	COLEGIO AGUSTIN PARRA	13/7/2025	13/8/2025	100%	$ 46.423.414,00	15/8/2025	15/8/2025	$ 46.423.414,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 46.423.414,00	TERMINADO Y RECIBIDO
SIMIJACA	ESCUELA EL FICAL	13/7/2025	13/7/2025	100%	$ 11.407.589,00	15/08/2025 22/08/2025	15/08/2025 22/08/2025	$ 11.407.589,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 11.407.589,00	TERMINADO Y RECIBIDO
SIMIJACA	ESCUELA EL PANTANO	13/7/2025	3/9/2025	100%	$ 22.627.387,00	15/08/2025 22/08/2025	15/08/2025 22/08/2025	$ 22.627.387,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 22.627.387,00	TERMINADO Y RECIBIDO
SUSA	ESCUELA EL TABLON	22/10/2025	23/10/2025	100%	$ 13.576.914,00	28/10/2025	28/10/2025	$ 13.576.914,00	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	N/A	29/10/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
SUTATAUSA	ESCUELA PALACIO	27/8/2025	28/8/2025	100%	$ 5.459.679,00	15/9/2025	15/9/2025	$ 5.459.679,00	16/9/2025	16/9/2025	12/9/2025	N/A	12/9/2025	SI	$ 5.459.679,00	TERMINADO Y RECIBIDO
SUTATAUSA	ESCUELA HATO VIEJO	27/8/2025	11/9/2025	100%	$ 14.294.984,00	15/9/2025	15/9/2025	$ 14.294.984,00	16/9/2025	16/9/2025	12/9/2025	N/A	12/9/2025	SI	$ 14.294.984,00	TERMINADO Y RECIBIDO
TABIO	1. Vía Tabio - Cajicá (Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia)	21/5/2025	10/6/2025	100%	$ 72.958.463,00	18/6/2025	18/6/2025	$ 72.958.463,00	20/6/2025	20/6/2025	6/6/2025	6/6/2025	6/6/2025	SI	$ 72.958.463,00	TERMINADO Y RECIBIDO
TABIO	2. Vía Tabio - Subachoque	16/5/2025	7/6/2025	100%	$ 262.541.766,00	18/6/2025	18/6/2025	$ 262.541.766,00	20/6/2025	20/6/2025	6/6/2025	N/A	6/6/2025	SI	$ 262.541.766,00	TERMINADO Y RECIBIDO
TABIO	2. Vía Tabio - Subachoque	2/5/2025	23/5/2025	100%	$ 66.388.347,00	18/6/2025	18/6/2025	$ 66.388.347,00	20/6/2025	20/6/2025	6/6/2025	N/A	6/6/2025	SI	$ 66.388.347,00	TERMINADO Y RECIBIDO
TAUSA	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	21/10/2025	23/10/2025	100%	$ 21.742.674,00	28/10/2025	28/10/2025	$ 21.742.674,00	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
TOCANCIPÁ	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	31/7/2025	15/9/2025	100%	$ 309.473.126,62	15/9/2025	15/9/2025	$ 309.473.126,62	16/9/2025	16/9/2025	12/9/2025	N/A	12/9/2025	SI	$ 309.473.126,62	TERMINADO Y RECIBIDO
UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	6/8/2025	17/9/2025	100%	$ 85.859.060,00	3/10/2025	3/10/2025	$ 85.859.060,00	6/10/2025	6/10/2025	1/10/2025	N/A	1/10/2025	SI	$ 85.859.060,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UBAQUE	1. Ubaque - Chipaque	3/6/2025	7/7/2025	100%	$ 106.364.047,00	11/7/2025	11/7/2025	$ 106.364.047,00	21/7/2025	21/7/2025	12/7/2025	N/A	12/7/2025	SI	$ 106.364.047,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UBAQUE	3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico	3/6/2025	8/7/2025	100%	$ 48.381.100,00	11/7/2025	11/7/2025	$ 48.381.100,00	21/7/2025	21/7/2025	12/7/2025	N/A	12/7/2025	SI	$ 48.381.100,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UBATÉ	1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas	11/6/2025	25/6/2025	100%	$ 78.504.970,00	7/7/2025	7/7/2025	$ 78.504.970,00	18/7/2025	18/7/2025	11/7/2025	N/A	11/7/2025	SI	$ 78.504.970,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UBATÉ	2. Intersección Colegio Bruselas	16/6/2025	27/6/2025	100%	$ 148.553.469,00	7/7/2025	7/7/2025	$ 148.553.469,00	18/7/2025	18/7/2025	11/7/2025	N/A	11/7/2025	SI	$ 148.553.469,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UNE	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	1/9/2025	23/09/2025	100%	$ 49.665.362,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 49.665.362,00	9/10/2025	9/10/2025	13/9/2025	N/A	13/9/2025	SI	$ 49.665.362,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UNE	Entrada Estación De Servicio Texaco	14/8/2025	23/09/2025	100%	$ 82.695.312,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 82.695.312,00	9/10/2025	9/10/2025	13/9/2025	N/A	13/9/2025	SI	$ 82.695.312,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UNE	Escuela Combura	27/8/2025	22/09/2025	100%	$ 64.540.095,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 64.540.095,00	9/10/2025	9/10/2025	13/9/2025	N/A	13/9/2025	SI	$ 64.540.095,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UNE	Punto Critico Timasita	3/8/2025	22/09/2025	100%	$ 51.057.446,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 51.057.446,00	9/10/2025	9/10/2025	13/9/2025	N/A	13/9/2025	SI	$ 51.057.446,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UNE	Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia	12/8/2025	22/09/2025	100%	$ 71.006.743,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 71.006.743,00	9/10/2025	9/10/2025	13/9/2025	N/A	13/9/2025	SI	$ 71.006.743,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUATAVITA	Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé	3/10/2025	6/10/2025	9,47%	$ 19.048.913,00											TERMINADO
SAN BERNARDO	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	21/10/2025	21/10/2025	100%	$ 17.064.451,00	25/11/2025	25/11/2025	$ 17.064.451,00	1/12/2025	1/12/2025	25/11/2025	N/A	25/11/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
SAN BERNARDO	3. Institución Educativa Departametal San Bernardo	22/10/2025	25/11/2025	100%	$ 48.088.890,00	25/11/2025	25/11/2025	$ 48.088.890,00	1/12/2025	1/12/2025	25/11/2025	N/A	25/11/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
JUNIN	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	10/10/2025	17/10/2025	100%	$ 83.766.171,00	19/11/2025	19/11/2025	$ 83.766.171,00	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
JUNIN	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	7/10/2025	17/10/2025	100%	$ 135.529.683,00	19/11/2025	19/11/2025	$ 135.529.683,00	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	N/A	20/11/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
TOCANCIPÁ	Complemento C.R. ENTRELOMAS	31/7/2025	15/9/2025	100%	$ 23.593.154,38	15/9/2025	15/9/2025	$ 23.593.154,38	16/9/2025	16/9/2025	12/9/2025	N/A	12/9/2025	SI	$ 23.593.154,38	TERMINADO Y RECIBIDO
ARBELAEZ	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	10/11/2025	14/12/2025	100%	$ 69.025.528,00											TERMINADO
ARBELAEZ	SECTOR: KIRPALAMAR	10/11/2025	14/12/2025	100%	$ 89.192.907,00											TERMINADO
PASCA	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	13/12/2025		33,98	$ 30.804.277,11											EN EJECUCIÓN
PASCA	VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	5/12/2025		49,91%	$ 50.111.122,83											EN EJECUCIÓN
JUNIN	Intersección Vía San Roque - Junín	25/10/2025	27/10/2025	100%	$ 50.967.739,00	19/11/2025	19/11/2025	$ 50.967.739,00	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	N/A	20/11/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
TENJO	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	7/11/2025	3/12/2025	100%	$ 222.693.908,00	4/12/2025	4/12/2025	$ 222.693.908,00	5/12/2025	5/12/2025	4/12/2025	4/12/2025	4/12/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
	VALOR TOTAL EJECUTADO				**$ 3.500.497.721,23**											

Para la fecha del presente informe se encuentran con un avance de ejecución los siguientes puntos:
1. Tabio - Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia: 100%
2. Tabio - Tabio-Subachoque: 100%
3. Tabio - El mirador: 100%
4. Ubaque - Ubaque-Chipaque: 100%
5. Ubaque - La Unión: 100%
6. Ubaté - Salida Lenguazaque: 100%
7. Ubaté - Colegio Bruselas: 100%
8. Guayabetal - Vda. San Antonio: 100%
9. Guayabetal- Instituto Clara Theresia: 100%
10. Nemocón - Escuela La Puerta: 100%
11. Carmen de Carupa - Sector la U: 100%
12. Carmen de Carupa - Sector el Prado: 100%
13. Carmen de Carupa - Sector Peligros: 100%
14. Simijaca - Colegio Agustin Parra: 100%
15. Simijaca - Escuela El Fical: 100%
16. Simijaca - Escuela El Pantano: 100%
17, Fosca - Colegio IDER: 100%
18. Fosca - El Tablon: 100%
19. Fosca - Cementerio Municipal: 100%
20. Fosca - Saname: 100%
21. Cucunuba - PUNTO CRITICO PR 4+100: 100%
22. Guacheta - Escuela La Isla: 100%
23. Guacheta - I.E. Miña y Ticha: 100%
24. Guacheta - Escuela Rural Pueblo Viejo: 100%
25. Tocancipa - Parque Jaime Duque: 100%
26. Tocancipa - Entre Lomas: 100%
27. Une - Curva Alta Siniestralidad: 100%
28. Une - Estación Texaco: 100%
29. Une - Escuela Combura: 100%
30. Une - Punto Critico Timasita: 100%
31. Une - Vereda Salitre: 100%
32. Ubala - I.E. El Tabor: 100%
33. Sutatausa - Escuela Palacio: 100%
34. Sutatausa - Escuela Hato Viejo: 100%
35. Caqueza - Colegio Jhon Dalton: 100%
36. Caqueza - Escuela Ubatoque: 100%
37. Caqueza - Sector El Campin: 100%
38. Caqueza - Curva Salida: 100%
39. Quetame - Escuela Rural Granadillo: 100%
40. Quetame - Intersección Matemango: 100%
41. Guatavita - Intersección Calle 2 y Calle 5A: 9,47%
42. Junin - IED Nuestra Señora del Carmen: 100%
43. Junin - Campo Alegre: 100%
44. Junin - Intersección Vía San Roque - Junin: 100%
45. Macheta - Escuela Guina: 100%
46. Tausa - IED San Antonio: 100%
47. Susa - Escuela El Tablon: 100%
48. San Bernardo - Escuela Normal Superior: 100%
49. San Bernardo - IED San Bernardo: 100%
50. Paratebueno - Inspección de Maya: 53,77%
51. Tenjo - Intersecćon el Zoque: 100%
52. Arbeleaz - Sector Vía San Bernardo: 100%
53. Arbeleaz - Sector Kirpalamar: 100%
54. Pasca - Sector la Capilla: 33,98%
55. Pasca - Escuela Rural El Molino: 49,91%

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En el anexo N° 1 se encuentra el cuadro de seguimiento al cronograma de los puntos que cuentan con acta de apropiación y/o estan en ejecución.

CUADRO DE SEGUIMIENTO

En el anexo N° 2 se encuentra el cuadro de seguimiento de los puntos que cuentan con acta de apropiación y/o estan en ejecución..

Para el periodo se encuentran:
52 puntos terminados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Simijaca (3), Carmen de Carupa (3), Fosca (4), Guacheta (3), Cucunuba (1), Sutatausa (2), Nemocon (1), Tocancipa (2), Ubala (1), Guayabetal (2), Une (5), Quetame (2), Caqueza (4), Guatavita (1), Junín (3), Macheta (1), Tausa (1), Susa (1), San Bernardo (2), Tenjo (1) y Arbelaez (2).
3 puntos en ejecución.

CONCEPTO	CANTIDAD
ACTAS DE APROPIACIÓN SUSCRITAS	55
TOTAL PUNTOS EN EJECUCIÓN	3
PUNTOS TERMINADOS	52
PUNTOS SIN INICIAR CON ACTAS DE APROPIACIÓN SUSCRITAS	0

Durante el periodo no se suscribieron actas de apropiación, se mantiene un total de 55 actas.
De los 55 puntos con actas apropiadas 52 se encuentran terminados, 3 en ejecución y 0 sin iniciar.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continuaron las actividades de instalación de señalización vertical, implementación de demarcación horizontal e instalación de dispositivos de control de velocidad según diseños apropiados en los puntos ubicados en los municipios de Paratebueno (1), Arbelaez (2) y Pasca (1).
2. Se iniciaron las actividades de instalación de señalización vertical, implementación de demarcación horizontal e instalación de dispositivos de control de velocidad según diseños apropiados en el punto ubicado en el municipio de Pasca; Sector la Capilla.
3. Se terminaron las actividades de instalación de señalización vertical, implementación de demarcación horizontal e instalación de dispositivos de control de velocidad según diseños apropiados en los puntos ubicados en el municipio de Arbeleaz; Sector Vía San Bernardo y Sector Kirpalamar.
4. El contratista realizo el envio del informe final de los puntos ubicados en el municipio de Junín.
5. Actividades programadas para la próxima semana:
- Entrega de informes finales de los puntos entregados a la entidad - SMC faltantes.
- Continuación de implementación de señalización en los puntos ubicados en los municipios de Paratebueno (1) y Pasca (2).

4a. Factores Climáticos

Observaciones tiempo perdido por factores climáticos:

Ítem	Estado del Clima	lunes 8 diciembre			martes 9 diciembre			miércoles 10 diciembre			jueves 11 diciembre			viernes 12 diciembre			sábado 13 diciembre			domingo 14 diciembre			TOTAL
		Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	
1	Lluvioso Pasca																						0
2	Lluvioso Arbelaez																						0
3	Lluvioso Paratebueno																						0
4	TOTAL LLUVIA SEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TOTAL LLUVIA SEMANA ANTERIOR	30	16	10	26	14	21	33	16	11	32	22	22	33	20	16	12	5	8	6	6	11	398
6	TOTAL LLUVIA	30	16	10	26	14	21	33	16	11	32	22	22	33	20	16	12	5	8	6	6	11	398

Durante la semana no se presentaron horas de lluvias en los municipios con actividades de obra, se registra una afectación al rendimiento de implementación en el presente contrato con un total de lluvia de 398 horas acumuladas, estas totalizadas de los registros no simultaneos obtenidos en los municipios con puntos de obra en ejecución.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

En este campo, se deben informar las actividades sociales realizadas en el período del informe:
a. Socializaciones inicio y cierre de obra:
En el periodo no se realizaron actas de cierre
b. Levantamiento actas de inicio vecindad / entorno:
No se levantaron actas en el periodo
c. Levantamiento actas de cierre vecindad / entorno:
En el periodo no se realizaron actas de cierre
Reporte y estado PQR's: N/A
e. Identificación de problemática: N/A
Otros:
2025-12-09 Contratista remitió informe semanal No. 41
2025-12-09 Contratista remite correo con información recolectada durante las visitas en los municipios de Quedtame y Caqueza
2025-12-10 Contratista remite actas de socialización y entorno para revisión y firma de Tenjo
2025-12-10 Contratista remite actas de vecindad para revisión y firma de Tenjo
2025-12-12 Interventoría remite actas de socialización y entorno revisada y firmada
2025-12-12 Interventoría remite actas de vecindad revisada y firmada
2025-12-12 Interventoría remite aprobación del informe social No. 9 v2 mediante el oficio DPC-0102025-1024-2025
2025-12-12 Interventoría remite acta del comité social No. 18

5a. Socializaciones

Fecha de realización	Punto	Tipo de socialización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Acta de vecindad	Acta de entorno	Compromisos	Responsable	Fecha

4

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Dirigido a	Acción realizada	Fecha acción	Cierre
	NO SE PRESENTAN A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME					

A la fecha del presente informe se han realizado:

Socializaciones iniciales en 57 puntos, con sus respectivas actas de entorno, en los municipios de Cáqueza (4), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Fosca (4), Guachetá (3), Guayabetal (2), Macheta (1), Nemocón (1), Quetame (2), Simijaca (3), Susa (1), Sutatausa (2), Tabio (3), Tocancipá (2), Ubalá (2), Ubaque (3), Ubaté (2), Tausa (1) , Une (5), Guatavita (1), Junín (3), San Bernardo (2), Pasca (2), Arbelaez (2), Tenjo (1) y Paratebueno (1)

Socializaciones de cierre en 49 puntos, con sus respectivas actas de entorno en el municipio de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque(2), Ubalá (1), Guacheta (3), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Simijaca (3), Tocancipá (2), Sutatausa (2), Une (5), Fosca (4), Ubala (1), Tausa (1), Susa(1), Macheta (1), Guayabetal (2), Quetame (2), Caqueza (4), Junín (3), San Bernardo (2), Tenjo (1) y Nemocon (1).

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA - COMPONENTE SST

Acompañamiento en actividades durante el 08 al 14 de diciembre
Se realiza acompañamiento verificando las condiciones seguras en el punto a intervenir dando cumplimiento con las condiciones seguras.
1-Implementación del PMT señalización.
2-Charla de seguridad.
3-No se presentan reportes de accidentes e incidentes.
4-Se verifica uso adecuado de epp
5-No se presentan reportes de actos y condiciones inseguras.
6-No se presentan reportes de accidentes e incidentes.
7-No se presentan reportes de enfermedades común.

6a. Accidentes laborales

Fecha	Punto	Municipio	Trabajador	Accidente	Gravedad	Acción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA - COMPONENTE AMBIENTAL

Revisado el documento Plan de manejo ambiental -PMA, entregado por el contratista de obra el 08 de abril 2025 mediante comunicación MS-027-2025 dando alcance a la comunicación MS 022-2025 de fecha 03 de abril de 2025, se emite concepto de APROBADO, el 8 de abril 2025 con comunicación DPC-0102025-116-2025.

7a. Estado de licencias y/o permisos

Tipo de permiso	Punto	Municipio	Entidad que lo otorga	Fecha de radicación	Estado	Fecha de expedición	Fecha de vencimiento
PMT ESPECIFICO	ESCUELA EL TABLON	SUSA	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	ESCUELA PALACIO	SUTATAUSA	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	ESCUELA HATO VIEJO	SUTATAUSA	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	ESCUELA EL FICAL	SIMIJACA	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	ESCUELA EL PANTANO	SIMIJACA	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	I.E. MIÑA Y TICHA	GUACHETA	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	GUACHETA	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	1. Ubaque - Chipaque	UBAQUE	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	2. Escuela Puente Amarillo	UBAQUE	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico	UBAQUE	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	1. Escuela Rural Granadillo	QUETAME	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	2. Vía Tabio - Subachoque	TABIO	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	2. Vía Tabio - Subachoque	TABIO	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	P1 UBALÁ - GACHETÁ	UBALA	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	UBALA	SMC	11/4/2025	APROBADO	25/4/2025	1/8/2025
PMT ESPECIFICO	SECTOR: VEREDA SAN ANTONIO	GUAYABETAL	SMC	8/5/2025	APROBADO	19/5/2025	25/8/2025
PMT ESPECIFICO	SECTOR: COLEGIO AGUSTIN PARRA	SIMIJACA	SMC	8/5/2025	APROBADO	19/5/2025	25/8/2025
PMT ESPECIFICO	SECTOR: GIMNASIO CAMPESTRE SANTA RITA DE CASIA	TABIO	SMC	8/5/2025	APROBADO	19/5/2025	25/8/2025
PMT ESPECIFICO	SECOR I.E ESCUELA LA PUERTA	NEMOCON	SMC	8/5/2025	APROBADO	19/5/2025	25/8/2025
PMT ESPECIFICO	2. Sector La U	CARMEN DE CARUPA	SMC	30/5/2025	APROBADO	30/5/2025	19/9/2025
PMT ESPECIFICO	3. Sector El Prado	CARMEN DE CARUPA	SMC	30/5/2025	APROBADO	30/5/2025	19/9/2025
PMT ESPECIFICO	4.Sector Peligros	CARMEN DE CARUPA	SMC	30/5/2025	APROBADO	30/5/2025	19/9/2025
PMT ESPECIFICO	PUNTO CRITICO PR 4+100	CUCUNUBÁ	SMC	30/5/2025	APROBADO	30/5/2025	19/9/2025
PMT ESPECIFICO	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	TAUSA	SMC	30/5/2025	APROBADO	30/5/2025	19/9/2025
PMT ESPECIFICO	1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas	UBATÉ	SMC	30/5/2025	APROBADO	30/5/2025	19/9/2025
PMT ESPECIFICO	2. Intersección Colegio Bruselas	UBATÉ	SMC	30/5/2025	APROBADO	30/5/2025	19/9/2025
PMT ESPECIFICO	PARQUE JAIME DUQUE	TOCANCIPA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	ESCUELA GUINA	MACHETA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	I.E.D. Josue Manrique Ingreso Inspección de Maya	PARATEBUENO	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Ingreso UNE_ Curva Alta Siniestralidad	UNE	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Entrada EDS Texaco	UNE	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Escuela Rural LA COMBURA	UNE	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Timasita	UNE	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Vereda Salitre - Villla Natalia	UNE	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	COLEGIO JHON DALTON	CAQUEZA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Acceso Escuela Ubatoque 2	CAQUEZA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Consolidado Sector El Campín	CAQUEZA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Curva Salida Caqueza - Fosca	CAQUEZA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Institución Educativa de Desarrollo Rural - IDER	FOSCA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	"El Tablón"	FOSCA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Cementerio Municipal	FOSCA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	VIA FOSCA - SÁNAME - PONIENTE QUETAME	FOSCA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025

PMT ESPECIFICO	Instituto Clara Theresia - Monteredondo	GUAYABETAL	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	ESCUELA LA ISLA	GUACHETA	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	INTERSECCIÓN MATEMANGO	QUETAME	SMC	24/6/2025	APROBADO	21/6/2025	11/10/2025
PMT ESPECIFICO	Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé	GUATAVITA	SMC	6/8/2025	APROBADO	4/8/2025	24/11/2025
PMT ESPECIFICO	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	SAN BERNARDO	SMC	6/8/2025	APROBADO	4/8/2025	24/11/2025
PMT ESPECIFICO	3. Institución Educativa Departametal San Bernardo	SAN BERNARDO	SMC	6/8/2025	APROBADO	4/8/2025	24/11/2025
PMT ESPECIFICO	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	JUNIN	SMC	6/8/2025	APROBADO	4/8/2025	24/11/2025
PMT ESPECIFICO	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	JUNIN	SMC	6/8/2025	APROBADO	4/8/2025	24/11/2025
PMT ESPECIFICO	Intersección Vía San Roque - Junín	JUNIN	SMC	14/10/2025	APROBADO	6/10/2025	6/12/2025
PMT ESPECIFICO	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	ARBELAEZ	SMC	14/10/2025	APROBADO	6/10/2025	6/12/2025
PMT ESPECIFICO	SECTOR: KIRPALAMAR	ARBELAEZ	SMC	14/10/2025	APROBADO	6/10/2025	6/12/2025
PMT ESPECIFICO	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	PASCA	SMC	14/10/2025	APROBADO	6/10/2025	6/12/2025
PMT ESPECIFICO	VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	PASCA	SMC	14/10/2025	APROBADO	6/10/2025	6/12/2025
PMT ESPECIFICO	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	TENJO	SMC	27/10/2025	APROBADO	3/11/2025	20/12/2025
PMT ESPECIFICO	Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé	GUATAVITA	ANI	27/10/2025	EN TRÁMITE		

A la fecha se han radicado a la entidad un total de 57 PMT de los cuales han sido aprobados 56 y se encuentra en trámite el correspondientes al punto ubicado en el municipio de Guatavita.

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

1. El 21 de abril mediante comunicado CE – 2025042581 la entidad realizo la entrega del acta de aprobación de ítem no previstos NP-1 al NP-18, mediante comunicado DPC-0102025-134-2025 del 21 de abril de 2025, la interventoría dio traslado de la aprobación al contratista.
2. Se presenta que los delineadores cambian de dimensión en el tablero según el manual vigente y de acuerdo con las condiciones específicas de los tramos viales a intervenir, se ha determinado que la dimensión del tablero a instalar será de 36 x 51 cm, lo cual equivale a un área total de 0,18 m2. Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista informa que el cobro correspondiente a esta señal será efectuado mediante el No Previsto No. 15 del presupuesto, descrito como: "Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 50 x 40 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).", el contratista presenta la subsanación el 28 de mayo 2025 e interventoría revisa y emite aval mediante comunicado DPC-0102025-233-2025 del 04 de junio de 2025.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP01	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	403,00	$447.150,00	$ 180.201.450,00
NP02	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria e informativa de 60 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	202,00	$690.450,00	$139.470.900,00
NP03	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	34,00	$ 600.450,00	$ 20.415.300,00
NP04	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria e informativa de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	202,00	$ 854.520,00	$172.613.040,00
NP05	Fabricación, suministro e instalación de señal SP-47, SP-47A de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	224,00	$654.120,00	$146.522.880,00
NP06	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SP-47/SR, SP-47A /SR de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	112,00	$862.560,00	$96.606.720,00
NP07	Fabricación, suministro e instalación de señal SP-54, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	14,00	$862.120,00	$ 12.069.680,00
NP08	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	56,00	$644.527,00	$36.093.512,00
NP09	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 100 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	14,00	$802.450,00	$ 11.234.300,00
NP10	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 125 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	6,00	$ 805.320,00	$ 4.831.920,00
NP11	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE tipo SI26 - SR39/SR-38, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	8,00	$906.540,00	$ 7.252.320,00
NP12	Fabricación, suministro e instalación de señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	11,00	$ 654.710,00	$ 7.201.810,00
NP13	Fabricación, suministro e instalación de señal SR-30 con baliza destellante de panel solar, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	3,00	$1.945.750,00	$ 5.837.250,00
NP14	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 45 x 30 cm,en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	14,00	$405.680,00	$5.679.520,00
NP15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 50 x 40 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre	Und.	448,00	$441.450,00	$197.769.600,00

NP16	Fabricación, suministro e instalación de marcador sencillo de obstáculo (dol) 80 x 15 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	8,00	$362.309,00	$2.898.472,00
NP17	Fabricación, suministro e instalación de marcador DOBLE de obstáculo (chevron) 80 x 30 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	8,00	$711.127,00	$ 5.689.016,00
NP18	Fabricación, suministro e instalación de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (poste sencillo para tableros iguales o menores a 75 x 100 cm), cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	Und.	112,00	$258.381,00	$28.938.672,00


9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

1. Se han realizado 57 visitas preliminares de los 57 puntos asignados.
2. A la fecha de este informe se han realizado 57 visitas preliminares de las cuales se han entregado 55 informes de visita preliminar y no se encuentra pendiente por visita preliminar ningún punto.
3. Los 55 informes de visita preliminar que se han entregado corresponden a los puntos presentes en los municipios de Carmen de Carupa (3), Cucunubá (1), Guachetá (3), Guayabetal (2), Fosca (4), Nemocón (1), Simijaca (3), Tabio (3), Ubaque (2) , Ubaté (2), Ubala (1), Une (5), Tocancipá (2), Quetame (2), Sutatausa (2), Cáqueza (4), Macheta (1), Susa (1), Tausa (1), Guatavita (1), Junín (3), Paratebueno (1), San Bernardo (2), Pasca (2), Arbeláez (2) y Tenjo (1).
4. Los informes de visita previa que ya fueron aprobados por la interventoría corresponden a los 55 puntos presentes en los municipios de Carmen de Carupa (3), Guayabetal (2), Fosca (4), Nemocón (1), Simijaca (3), Tabio (3), Ubaque (2), Ubaté (2), Cucunuba (1), Guachetá (3), Tocancipá (2), Une (5), Ubala (1), Quetame (2), Cáqueza (4), Sutatausa (2) Macheta (1), Susa (1), Tausa (1), Guatavita (1), Junín (3), Paratebueno (1), San Bernardo (2), Tenjo (1), Arbeláez (2) y Pasca (2), los cuales todos cuentan con acta de apropiación.
5. No se encuentra pendiente por entregar ningún informe de visita preliminar.
6. A la fecha 55 puntos cuentan con actas de apropiación suscritas, de los cuales; 52 han sido terminados y se han entregado a la entidad-SMC; 49 que son los que se encuentran ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Simijaca (3), Guachetá (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Quetame (2), Cáqueza (4), Susa (1), Tausa (1), Junín (3), Macheta (1) San Bernardo (2) y Tenjo (1), y están pendientes por entregar 3 puntos ubicados en los municipios de Guatavita (1) y Arbeláez (2), 3 están en ejecución y 0 se encuentra pendiente por iniciar.
7. Se cuenta con la aprobación de PMT para 56 puntos, correspondientes a los municipios de Susa (1), Sutatausa (2), Simijaca (3), Guachetá (3), Ubaque (3), Quetame (1), Tabio (3), Ubalá (2), Guayabetal (2), Nemocón (1), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Tausa (1), Ubaté (2), Tocancipá (2), Macheta (1), Paratebueno (1), Une (5), Cáqueza (4), Fosca (4), Quetame (1), San Bernardo (2), Junín (3), Arbeláez (2), Pasca (2) y Tenjo (1).
8. A la fecha se encuentra en trámite el PMT del punto ubicado en el municipio Guatavita.
9. De las observaciones realizadas por la entidad-SMC durante la visita de entrega de los 49 puntos entregados, se encuentran pendientes de subsanación las correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Tocancipá, San Bernardo y Tenjo.
11. Los informes de subsanaciones realizadas en los puntos entregados a la entidad-SMC que fueron entregados por el contratista corresponden a los puntos ubicados en los municipios de Tabio, Ubaté, Ubaque, Carmen de Carupa, Cucunuba, Simijaca, Nemocón, Ubala, Cáqueza, Fosca, Une y Guayabetal.
12. De los 52 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 44 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Guachetá (3), Simijaca (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Cáqueza (4), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Susa (1), Tausa (1), Macheta (1) y Junín (3), los cuales ya fueron revisados por la interventoría, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoría se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Tabio, Nemocón y Cucunuba, los cuales ya fueron aprobados por la interventoría y remitidos a la entidad - SMC.
13. Un 88,44% del valor total del contrato ha sido entregado a la entidad - SMC que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 3.206.055.405,00, correspondiente a los 49 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Simijaca (3), Guachetá (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Quetame (2), Cáqueza (4), Susa (1), Tausa (1), Macheta (1), Junín (3), San Bernardo (2) y Tenjo (1).
14. A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 96,56% del valor total del contrato.

En el anexo N° 3 se encuentra el cuadro de los puntos entregados a la SMC.

ESTADO DE DOCUMENTOS					
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN	ENTREGA DOCUMENTACION	REVISION	ENTREGA SUBSANACION	REVISIÓN	ESTADO
Revisión de información:	10/03/2025	11/03/2025			Aprobado
Cronograma de actividades	17/02/2025	21/02/2025			Aprobado
El Plan de Control, inspección y ensayo	9/03/2025	19/03/2025	8/04/2025	8/04/2025	Aprobado
Plan de manejo de tráfico (PMT)	8/03/2025	10/03/2025	12/03/2025 8/04/25	17/03/2025 11/04/25	Aprobado
Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro de presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta	3/03/2025	4/03/2025	3/04/2025	4/04/2025	Aprobado
Discriminación del A.I.U, de acuerdo con la oferta presentada.	10/03/2025	21/03/2025	7/04/2025	7/04/2025	Aprobado
Plan de manejo ambiental que incluya las actividades de almacenamiento, el transporte y disposición de escombros "RCD" y residuos "RESPEL"	3/03/2025	10/03/2025	3/04/2025 8/04/25	8/04/2025	Aprobado
Programa de seguridad y salud en el trabajo	3/03/2025	4/03/2025	12/03/25 1/04/2025 9/04/25 24/04/25	28/04/2025	Aprobado
Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra	9/03/2025	19/03/2025	8/04/2025	9/04/2025	Aprobado
Plan de Gestión Social	5/03/2025	7/03/2025	12/03/2025	1/04/2025	Aprobado
Programa de gerencia de proyectos	9/03/2025	19/03/2025	3/04/2025	8/04/2025	Aprobado
Profesional para el programa de gerencia de proyectos	13/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	2/04/2025	Aprobado

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE LA SEMANA

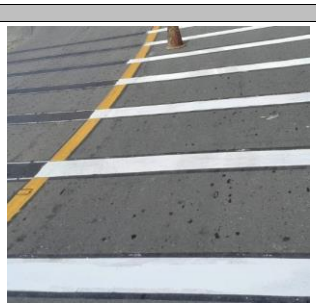

Descripción: Actividades de implementación Arbelaez 25053_CN_02 SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ



Descripción: Actividades de implementación Arbelaez 25053_CN_03 SECTOR: KIRPALAMAR



Descripción: Actividades de implementacion Pasca 25535_CN_01 INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS

FIRMA DIRECTOR OBRA
Alexander Román

MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		AVANCE	DÍAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
TABIO	25785_CN_01	1. Vía Tabio - Cajicá (Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia)	16/5/2025	20/5/2025	21/5/2025	10/6/2025	100%	TERMINADO CON 21 DIAS DE ATRASO
TABIO	FR_56CN20-1_374_2023	2. Vía Tabio - Subachoque	2/5/2025	16/5/2025	16/5/2025	7/6/2025	100%	TERMINADO CON 22 DIAS DE ATRASO
TABIO	25785_CN_02	2. Vía Tabio - Subachoque	2/5/2025	16/5/2025	2/5/2025	23/5/2025	100%	TERMINADO CON 7 DIAS DE ATRASO
UBAQUE	25841_CN_01	1. Ubaque - Chipaque	3/6/2025	20/6/2025	3/6/2025	7/7/2025	100%	TERMINADO CON 17 DIAS DE ATRASO
UBAQUE	25841_CN_03	3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico	3/6/2025	20/6/2025	3/6/2025	8/7/2025	100%	TERMINADO CON 18 DIAS DE ATRASO
UBATE	25845_CN_01	1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas	10/6/2025	20/6/2025	11/6/2025	25/6/2025	100%	TERMINADO CON 5 DIAS DE ATRASO
UBATE	25845_CN_02	2. Intersencción Colegio Bruselas	10/6/2025	20/6/2025	16/6/2025	5/7/2025	100%	TERMINADO CON 15 DIAS DE ATRASO
GUAYABETAL	25335_CN_01	Vda San Antonio	25/6/2025	20/7/2025	23/6/2025	24/9/2025	100%	TERMINADO CON 66 DIAS DE ATRASO
GUAYABETAL	25335_CN_02	Instituto Clara Theresia	4/7/2025	30/7/2025	5/7/2025	25/9/2025	100%	TERMINADO CON 57 DIAS DE ATRASO
NEMOCON	25486_CN_01	ESCUELA LA PUERTA	25/6/2025	20/7/2025	23/6/2025	3/9/2025	100%	TERMINADO CON 45 DIAS DE ATRASO
CARMEN DE CARUPA	25154_CN_01	2. Sector La U	4/7/2025	19/7/2025	5/7/2025	12/8/2025	100%	TERMINADO CON 24 DIAS DE ATRASO
CARMEN DE CARUPA	25154_CN_02	3. Sector El Prado	4/7/2025	19/7/2025	5/7/2025	3/9/2025	100%	TERMINADO CON 46 DIAS DE ATRASO
CARMEN DE CARUPA	25154_CN_03	4.Sector Peligros	4/7/2025	19/7/2025	5/7/2025	15/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
FOSCA	25281_CN_01	1. Colegio IDER	7/7/2025	6/8/2025	23/7/2025	14/9/2025	100%	TERMINADO CON 39 DIAS DE ATRASO
FOSCA	25281_CN_02	2. Consolidado El Tablon	7/7/2025	6/8/2025	8/7/2025	14/9/2025	100%	TERMINADO CON 39 DIAS DE ATRASO
FOSCA	25281_CN_03	4. Cementerio Municipal	7/7/2025	6/8/2025	8/7/2025	14/9/2025	100%	TERMINADO CON 39 DIAS DE ATRASO
FOSCA	25281_CN_04	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	7/7/2025	11/8/2025	22/7/2025	24/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
SIMIJACA	25745_CN_01	COLEGIO AGUSTIN PARRA	26/7/2025	21/8/2025	13/7/2025	13/8/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
SIMIJACA	25745_CN_02	ESCUELA EL FICAL	26/7/2025	21/8/2025	13/7/2025	13/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO

MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		AVANCE	DÍAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
SIMIJACA	25745_CN_03	ESCUELA EL PANTANO	26/7/2025	21/8/2025	13/7/2025	3/9/2025	100%	TERMINADO CON 13 DIAS DE ATRASO
GUACHETA	25317_CN_01	ESCUELA LA ISLA	14/7/2025	13/8/2025	16/7/2025	27/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
GUACHETA	25317_CN_02	I.E. MIÑA Y TICHA	14/7/2025	13/8/2025	16/7/2025	28/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
GUACHETA	25317_CN_03	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	14/7/2025	13/8/2025	16/7/2025	28/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
CUCUNUBÁ	25224_CN_01	PUNTO CRITICO PR 4+100	1/8/2025	7/9/2025	16/7/2025	12/8/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
TOCANCIPA	25817_CN_01	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	31/7/2025	22/8/2025	31/7/2025	25/9/2025	100%	TERMINADO CON 34 DIAS DE ATRASO
UNE	25845_CN_01	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	28/8/2025	24/9/2025	1/9/2025	23/9/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
UNE	25845_CN_02	Entrada Estación De Servicio Texaco	11/8/2025	6/9/2025	14/8/2025	23/9/2025	100%	TERMINADO CON 17 DIAS DE ATRASO
UNE	25845_CN_03	Escuela Combura	7/8/2025	10/9/2025	27/8/2025	22/9/2025	100%	TERMINADO CON 12 DIAS DE ATRASO
UNE	25845_CN_04	Punto Critico Timasita	4/8/2025	6/9/2025	3/8/2025	22/9/2025	100%	TERMINADO CON 16 DIAS DE ATRASO
UNE	25845_CN_05	Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia	7/8/2025	10/9/2025	12/8/2025	22/9/2025	100%	TERMINADO CON 12 DIAS DE ATRASO
CÁQUEZA	25151_CN_01	1. Colegio Jhon Dalton	20/8/2025	20/9/2025	8/9/2025	30/9/2025	100%	TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO
CÁQUEZA	25151_CN_02	2. Escuela Ubatoque 2	20/8/2025	20/9/2025	8/9/2025	30/9/2025	100%	TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO
CÁQUEZA	25151_CN_03	3. Consolidado Sector El Campin	20/8/2025	20/9/2025	8/9/2025	30/9/2025	100%	TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO
CÁQUEZA	25151_CN_04	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	20/8/2025	20/9/2025	3/9/2025	30/9/2025	100%	TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO
QUETAME	25594_CN_01	1. Escuela Rural Granadillo	11/9/2025	22/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	100%	TERMINADO CON 5 DIAS DE ATRASO
QUETAME	25594_CN_02	2. Intersección Matemango	11/9/2025	22/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	100%	TERMINADO CON 5 DIAS DE ATRASO
SUTATAUSA	25781_CN_01	ESCUELA PALACIO	1/9/2025	11/9/2025	27/8/2025	28/8/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
SUTATAUSA	25781_CN_02	ESCUELA HATO VIEJO	1/9/2025	11/9/2025	27/8/2025	11/9/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
MACHETÁ	25426_CN_01	ESCUELA GUINA	20/9/2025	1/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	100%	TERMINADO CON 19 DIAS DE ATRASO
SUSA	25779_CN_01	ESCUELA EL TABLON	20/9/2025	1/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	100%	TERMINADO CON 22 DIAS DE ATRASO
TAUSA	25793_CN_01	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	22/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	100%	TERMINADO CON 16 DIAS DE ATRASO

MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		AVANCE	DÍAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
GUATAVITA	25326_CN_01	Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé	22/9/2025	25/10/2025	3/10/2025	6/10/2025	9,47%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
JUNIN	25372_CN_01	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	22/9/2025	16/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	100%	TERMINADO CON 1 DIAS DE ATRASO
JUNIN	25372_CN_02	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	22/9/2025	16/10/2025	7/10/2025	17/10/2025	100%	TERMINADO CON 1 DIAS DE ATRASO
JUNIN	25372_CN_03	Intersección Vía San Roque - Junín	20/10/2025	13/11/2025	25/10/2025	27/10/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
PARATEBUENO	25530_CN_01	Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso	1/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	EN EJECUCION	53,77%	48
SAN BERNARDO	25649_CN_02	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	10/10/2025	5/11/2025	21/10/2025	21/10/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
SAN BERNARDO	25649_CN_03	3. Institución Educativa Departametal San Bernardo	10/10/2025	5/11/2025	22/10/2025	25/11/2025	100%	TERMINADO CON 20 DIAS DE ATRASO
TENJO	25799_CN_03	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	7/11/2025	5/12/2025	7/11/2025	3/12/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
ARBELAEZ	25053_CN_02	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	10/11/2025	2/12/2025	10/11/2025	14/12/2025	100%	TERMINADO CON 12 DIAS DE ATRASO
ARBELAEZ	25053_CN_03	SECTOR: KIRPALAMAR	10/11/2025	2/12/2025	10/11/2025	14/12/2025	100%	TERMINADO CON 12 DIAS DE ATRASO
PASCA	25535_CN_01	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	18/11/2025	11/12/2025	13/12/2025	EN EJECUCION	33,98%	3
PASCA	25535_CN_02	VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	18/11/2025	11/12/2025	5/12/2025	EN EJECUCION	49,91%	3
UBALA	25839_CN_02	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	28/7/2025	8/8/2025	6/8/2025	17/9/2025	100%	TERMINADO CON 40 DIAS DE ATRASO

Municipio	Localizacion Punto	Visita preliminar	Entrega REAL informe visita	Estado del informe	Aprobación informe	Acta aprogiación diseños	Fecha inicio cronograma	Fecha Fin cronograma	Presupuesto diseño aprobado $	Diferencia presupuesto $	Radicación PMT	Aprobación PMT	Socialización inicial	Actas de vecindad	Actas entorno	Fecha inicio obra	Fecha fin obra	Avance de obra física (%)	Valor parcial ejecutado	Entrega planos récord CO a CI	Fecha Acta mayores y menores	Valor ejecutado Acta mayores y menores	Fecha acta visita con SMC	Fecha Acta entrega y recibo a satisfacción	Socialización fin	Actas cierre de vecindad	Actas cierre entorno	Cobrado SINO	Valor cobrado $	ESTADO ACTUAL
CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	16/9/2025	4/8/2025	APROBADO	8/8/2025	7/8/2025	20/8/2025	20/9/2025	$ 47.685.687,00	$ 3.564.126,66	24/9/2025	1/7/2025	16/6/2025	N/A	16/6/2025	8/9/2025	30/09/2025	100%	$ 42.948.945,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 42.948.945,00	8/10/2025	8/10/2025	15/11/2025	N/A	15/11/2025	SI	$ 42.948.945,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CÁQUEZA	2. Escuela Ubatoque 2	16/9/2025	4/8/2025	APROBADO	8/8/2025	7/8/2025	20/8/2025	20/9/2025	$ 37.189.415,00	$ 4.018.695,84	24/9/2025	1/7/2025	16/6/2025	N/A	16/6/2025	8/9/2025	30/09/2025	100%	$ 36.516.713,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 36.516.713,00	8/10/2025	8/10/2025	15/11/2025	N/A	15/11/2025	SI	$ 36.516.713,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CÁQUEZA	3. Consolidado Sector El Carmen	16/9/2025	4/8/2025	APROBADO	12/8/2025	8/8/2025	20/8/2025	20/9/2025	$ 111.048.527,00	$ 4.744.265,16	24/9/2025	1/7/2025	16/6/2025	N/A	16/6/2025	8/9/2025	30/09/2025	100%	$ 96.329.604,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 96.329.604,00	8/10/2025	8/10/2025	15/11/2025	N/A	15/11/2025	SI	$ 96.329.604,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CÁQUEZA	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	16/9/2025	4/8/2025	APROBADO	12/8/2025	8/8/2025	20/8/2025	20/9/2025	$ 43.335.493,00	$ 6.866.760,04	24/9/2025	1/7/2025	16/6/2025	N/A	16/6/2025	3/9/2025	30/09/2025	100%	$ 41.426.891,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 41.426.891,00	8/10/2025	8/10/2025	15/11/2025	N/A	15/11/2025	SI	$ 41.426.891,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CARMEN DE CARUPA	2. Sector La U	22/9/2025	24/6/2025	APROBADO	4/7/2025	27/7/2025	4/7/2025	19/7/2025	$ 58.036.759,00	-$ 345.193,38	30/9/2025	9/6/2025	22/5/2025	N/A	22/5/2025	5/7/2025	12/8/2025	100%	$ 50.958.139,00	15/8/2025	15/8/2025	$ 50.958.139,00	19/8/2025	19/8/2025	5/09/2025	N/A	5/09/2025	SI	$ 50.958.139,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CARMEN DE CARUPA	3. Sector El Prado	22/9/2025	24/6/2025	APROBADO	4/7/2025	27/7/2025	4/7/2025	19/7/2025	$ 77.764.628,00	-$ 5.873.463,86	30/9/2025	9/6/2025	22/5/2025	N/A	22/5/2025	5/7/2025	3/9/2025	100%	$ 75.709.222,00	4/9/2025	4/9/2025	$ 75.709.222,00	5/9/2025	5/9/2025	5/09/2025	N/A	5/09/2025	SI	$ 75.709.222,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CARMEN DE CARUPA	4.Sector Peligros	22/9/2025	24/6/2025	APROBADO	4/7/2025	27/7/2025	4/7/2025	19/7/2025	$ 43.884.752,00	$ 4.345.431,29	30/9/2025	9/6/2025	22/5/2025	N/A	22/5/2025	5/7/2025	15/7/2025	100%	$ 44.284.303,00	15/8/2025	15/8/2025	$ 44.284.303,00	19/8/2025	19/8/2025	5/09/2025	N/A	5/09/2025	SI	$ 44.284.303,00	TERMINADO Y RECIBIDO
CUCUNUBÁ	PUNTO CRITICO PR 4+100	22/9/2025	5/7/2025	APROBADO	15/7/2025	11/7/2025	1/8/2025	1/9/2025	$ 163.518.183,00	$ 4.690.975,09	30/9/2025	9/6/2025	22/5/2025	22/5/2025	22/5/2025	16/7/2025	12/8/2025	100%	$ 121.727.948,00	15/8/2025	15/8/2025	$ 121.727.948,00	19/8/2025	19/8/2025	5/09/2025	5/09/2025	5/09/2025	SI	$ 121.727.948,00	TERMINADO Y RECIBIDO
FOSCA	1. Colegio IDER	17/9/2025	2/7/2025	APROBADO	7/7/2025	4/7/2025	7/7/2025	6/8/2025	$ 25.167.041,00	$ 246.913,06	24/9/2025	1/7/2025	17/6/2025	N/A	N/A	17/6/2025	14/9/2025	100%	$ 22.846.901,00	18/9/2025	18/9/2025	$ 22.846.901,00	8/10/2025	8/10/2025	14/9/2025	N/A	14/9/2025	SI	$ 22.846.901,00	TERMINADO Y RECIBIDO
FOSCA	2. Consolidado El Tablon	17/9/2025	2/7/2025	APROBADO	7/7/2025	4/7/2025	7/7/2025	6/8/2025	$ 256.713.360,00	$ 25.641.163,17	24/9/2025	1/7/2025	17/6/2025	N/A	N/A	17/6/2025	14/9/2025	100%	$ 179.854.339,00	18/9/2025	18/9/2025	$ 179.854.339,00	8/10/2025	8/10/2025	14/9/2025	N/A	14/9/2025	SI	$ 179.854.339,00	TERMINADO Y RECIBIDO
FOSCA	4. Cementerio Municipal	17/9/2025	2/7/2025	APROBADO	7/7/2025	4/7/2025	7/7/2025	6/8/2025	$ 79.405.126,00	$ 4.491.466,94	24/9/2025	1/7/2025	17/6/2025	17/6/2025	17/6/2025	10/7/2025	14/9/2025	100%	$ 61.955.299,00	18/9/2025	18/9/2025	$ 61.955.299,00	8/10/2025	8/10/2025	14/9/2025	14/9/2025	14/9/2025	SI	$ 61.955.299,00	TERMINADO Y RECIBIDO
FOSCA	5. Sansime - Sector Finca Humberto Guevara	17/9/2025	2/7/2025	APROBADO	7/7/2025	4/7/2025	7/7/2025	11/8/2025	$ 17.517.093,00	-$ 26.464.679,24	24/9/2025	1/7/2025	17/6/2025	N/A	N/A	17/6/2025	22/7/2025	24/7/2025	100%	$ 11.506.821,00	18/9/2025	18/9/2025	$ 11.506.821,00	8/10/2025	8/10/2025	14/9/2025	N/A	14/9/2025	SI	$ 11.506.821,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUACHETA	ESCUELA LA ISLA	5/3/2025	13/3/2025	APROBADO	15/7/2025	11/7/2025	14/7/2025	13/8/2025	$ 31.648.186,00	$ 17.651.515,24	24/9/2025	1/7/2025	5/3/2025	N/A	N/A	5/3/2025	16/7/2025	27/7/2025	100%	$ 30.404.041,00	7/8/2025	7/8/2025	$ 30.404.041,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 30.404.041,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUACHETA	I.E. MIÑA Y TICHA	5/3/2025	13/3/2025	APROBADO	15/7/2025	11/7/2025	14/7/2025	13/8/2025	$ 13.511.162,00	$ 675.515,89	11/4/2025	24/4/2025	5/3/2025	N/A	N/A	5/3/2025	16/7/2025	28/7/2025	100%	$ 11.509.923,00	7/8/2025	7/8/2025	$ 11.509.923,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 11.509.923,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUACHETA	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	5/3/2025	13/3/2025	APROBADO	15/7/2025	11/7/2025	14/7/2025	13/8/2025	$ 7.832.441,00	$ 2.164.164,00	11/4/2025	24/4/2025	5/3/2025	N/A	N/A	5/3/2025	16/7/2025	28/7/2025	100%	$ 7.832.441,00	7/8/2025	7/8/2025	$ 7.832.441,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 7.832.441,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUAYABETAL	Vda San Antonio Reductores de velocidad / ocho (8)	20/3/2025	25/5/2025	APROBADO	7/6/2025	7/6/2025	25/6/2025	20/7/2025	$ 61.172.852,00	$ 325.640,63	12/5/2025	19/5/2025	20/3/2025	N/A	20/3/2025	23/6/2025	24/09/2025	100%	$ 56.450.044,00	1/10/2025	1/10/2025	$ 56.450.044,00	9/10/2025	9/10/2025	15/11/2025	N/A	15/11/2025	SI	$ 56.450.044,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUAYABETAL	Institute Clara Theresia Escuela Montemorobondo	17/9/2025	2/7/2025	APROBADO	4/7/2025	4/7/2025	4/7/2025	30/7/2025	$ 37.796.733,00	-$ 4.227.501,45	24/9/2025	1/7/2025	17/6/2025	17/6/2025	17/6/2025	5/7/2025	25/09/2025	100%	$ 40.442.050,00	1/10/2025	1/10/2025	$ 40.442.050,00	9/10/2025	9/10/2025	15/11/2025	15/11/2025	15/11/2025	SI	$ 40.442.050,00	TERMINADO Y RECIBIDO
MACHETÁ	ESCUELA GUINA	10/9/2025	4/8/2025	APROBADO	18/8/2025	14/8/2025	20/9/2025	1/10/2025	$ 7.780.676,00	$ 564.913,16	24/9/2025	1/7/2025	10/6/2025	N/A	10/6/2025	20/10/2025	22/10/2025	100%	$ 7.780.676,00	28/10/2025	28/10/2025	$ 7.780.676,00	20/11/2025	20/11/2025	29/10/2025	N/A	29/10/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
NEMOCÓN	ESCUELA LA PUERTA	21/3/2025	25/5/2025	APROBADO	7/6/2025	7/6/2025	25/6/2025	20/7/2025	$ 37.467.366,00	-$ 9.637.737,96	8/5/2025	19/5/2025	21/3/2025	N/A	21/3/2025	23/6/2025	3/9/2025	100%	$ 36.562.501,00	4/9/2025	4/9/2025	$ 36.562.501,00	5/9/2025	5/9/2025	5/09/2025	N/A	5/09/2025	SI	$ 36.562.501,00	TERMINADO Y RECIBIDO
PARATEBUENO	Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso	15/9/2025	17/9/2025	APROBADO	25/09/2025	23/09/2025	1/10/2025	27/10/2025	$ 67.634.570,00	$ 3.351.081,83	24/9/2025	1/7/2025	15/8/2025	15/8/2025	15/8/2025	27/10/2025		53,77%	$ 36.259.568,29										EN EJECUCIÓN
QUETAME	1. Escuela Rural Granadillo	20/3/2025	27/7/2025	APROBADO	8/8/2025	7/8/2025	11/9/2025	22/9/2025	$ 6.640.155,00	-$ 546.400,12	11/4/2025	24/4/2025	20/3/2025	N/A	20/3/2025	26/08/2025	27/09/2025	100%	$ 6.640.155,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 6.640.155,00	8/10/2025	8/10/2025	14/11/2025	N/A	14/11/2025	SI	$ 6.640.155,00	TERMINADO Y RECIBIDO
QUETAME	2. Intersección Matemango	20/3/2025	27/7/2025	APROBADO	8/8/2025	7/8/2025	11/9/2025	22/9/2025	$ 7.142.509,00	$ 2.275.697,36	24/9/2025	1/7/2025	20/3/2025	N/A	20/3/2025	26/08/2025	27/09/2025	100%	$ 7.142.510,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 7.142.510,00	8/10/2025	8/10/2025	14/11/2025	N/A	14/11/2025	SI	$ 7.142.510,00	TERMINADO Y RECIBIDO
SIMIJACA	COLEGIO AGUSTIN PARRA	5/3/2025	13/3/2025	APROBADO	8/7/2025	7/7/2025	26/7/2025	21/8/2025	$ 59.584.972,00	-$ 1.097.983,32	12/5/2025	19/5/2025	5/3/2025	N/A	5/3/2025	13/7/2025	13/8/2025	100%	$ 46.423.414,00	15/8/2025	15/8/2025	$ 46.423.414,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 46.423.414,00	TERMINADO Y RECIBIDO
SIMIJACA	ESCUELA EL FICAL	5/3/2025	13/3/2025	APROBADO	8/7/2025	4/7/2025	26/7/2025	21/8/2025	$ 10.920.006,00	-$ 9.137.115,60	11/4/2025	24/4/2025	5/3/2025	N/A	5/3/2025	13/7/2025	13/7/2025	100%	$ 11.407.589,00	15/08/2025 22/08/2025	15/08/2025 22/08/2025	$ 11.407.589,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 11.407.589,00	TERMINADO Y RECIBIDO
SIMIJACA	ESCUELA EL PANTANO	5/3/2025	13/3/2025	APROBADO	8/7/2025	4/7/2025	26/7/2025	21/8/2025	$ 21.115.706,00	$ 1.287.393,76	11/4/2025	24/4/2025	5/3/2025	N/A	5/3/2025	13/7/2025	3/9/2025	100%	$ 22.627.387,00	15/08/2025 22/08/2025	15/08/2025 22/08/2025	$ 22.627.387,00	26/8/2025	26/8/2025	2/8/2025	N/A	2/8/2025	SI	$ 22.627.387,00	TERMINADO Y RECIBIDO
SUSA	ESCUELA EL TABLON	21/3/2025	5/8/2025	APROBADO	21/8/2025	20/8/2025	20/9/2025	1/10/2025	$ 15.799.947,00	$ 7.114.495,89	11/4/2025	24/4/2025	21/3/2025	N/A	21/3/2025	22/10/2025	23/10/2025	100%	$ 13.576.914,00	28/10/2025	28/10/2025	$ 13.576.914,00	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	N/A	29/10/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
SUTATAUSA	ESCUELA PALACIO	21/3/2025	29/7/2025	APROBADO	8/8/2025	7/8/2025	1/9/2025	11/9/2025	$ 5.459.679,00	$ 0,28	11/4/2025	24/4/2025	21/3/2025	N/A	21/3/2025	27/8/2025	28/8/2025	100%	$ 5.459.679,00	15/9/2025	15/9/2025	$ 5.459.679,00	16/9/2025	16/9/2025	12/9/2025	N/A	12/9/2025	SI	$ 5.459.679,00	TERMINADO Y RECIBIDO
SUTATAUSA	ESCUELA HATO VIEJO	21/3/2025	29/7/2025	APROBADO	8/8/2025	7/8/2025	1/9/2025	11/9/2025	$ 15.714.275,00	-$ 0,02	11/4/2025	24/4/2025	21/3/2025	N/A	21/3/2025	27/8/2025	11/9/2025	100%	$ 14.394.984,00	15/9/2025	15/9/2025	$ 14.394.984,00	16/9/2025	16/9/2025	12/9/2025	N/A	12/9/2025	SI	$ 14.394.984,00	TERMINADO Y RECIBIDO
TABIO	1. Vía Tabio - Cajicá (Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia)	13/3/2025	21/03/2025 05/09/2025	APROBADO	13/5/2025	13/5/2025	16/5/2025	20/5/2025	$ 74.833.799,00	$ 2.506.198,56	12/5/2025	19/5/2025	13/3/2025	13/3/2025	13/3/2025	21/5/2025	10/6/2025	100%	$ 72.958.463,00	18/6/2025	18/6/2025	$ 72.958.463,00	20/6/2025	20/6/2025	6/6/2025	6/6/2025	6/6/2025	SI	$ 72.958.463,00	TERMINADO Y RECIBIDO
TABIO	2. Vía Tabio - Subachoque	28/3/2025	4/04/2025 05/09/2025	APROBADO	13/5/2025	13/5/2025	2/5/2025	16/5/2025	$ 258.580.216,00	$ 193.521.360,00	11/4/2025	24/4/2025	28/3/2025	N/A	28/3/2025	16/5/2025	7/6/2025	100%	$ 262.541.766,00	18/6/2025	18/6/2025	$ 262.541.766,00	20/6/2025	20/6/2025	6/6/2025	N/A	6/6/2025	SI	$ 262.541.766,00	TERMINADO Y RECIBIDO
TABIO	2. Vía Tabio - Subachoque	13/3/2025	21/03/2025 24/04/2025	APROBADO	28/4/2025	28/4/2025	2/5/2025	16/5/2025	$ 66.222.302,00	$ 620.246,39	11/4/2025	24/4/2025	13/3/2025	N/A	13/3/2025	2/5/2025	23/5/2025	100%	$ 66.388.347,00	18/6/2025	18/6/2025	$ 66.388.347,00	20/6/2025	20/6/2025	6/6/2025	N/A	6/6/2025	SI	$ 66.388.347,00	TERMINADO Y RECIBIDO
TAUSA	IED. SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	20/6/2025	5/8/2025	APROBADO	3/9/2025	2/9/2025	22/9/2025	7/10/2025	$ 22.183.503,00	$ 9.818.879,10	30/9/2025	9/6/2025	20/6/2025	20/6/2025	20/6/2025	21/10/2025	23/10/2025	100%	$ 21.762.674,00	28/10/2025	28/10/2025	$ 21.762.674,00	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
TOCANCIPÁ	BRICEÑO – ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	10/9/2025	14/7/2025	APROBADO	6/8/2025	5/8/2025	31/7/2025	22/8/2025	$ 307.479.873,62	$ 8.879.275,11	24/9/2025	1/7/2025	10/6/2025	N/A	10/6/2025	31/7/2025	15/9/2025	100%	$ 309.473.126,62	15/9/2025	15/9/2025	$ 309.473.126,62	16/9/2025	16/9/2025	12/9/2025	N/A	12/9/2025	SI	$ 309.473.126,62	TERMINADO Y RECIBIDO
UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ - I.E. EL TABOR	27/3/2025	9/7/2025	APROBADO	4/8/2025	4/8/2025	5/8/2025	20/8/2025	$ 68.176.692,00	$ 5.721.641,08	11/4/2025	24/4/2025	27/3/2025	N/A	27/3/2025	6/8/2025	17/9/2025	100%	$ 85.859.060,00	3/10/2025	3/10/2025	$ 85.859.060,00	6/10/2025	6/10/2025	1/10/2025	N/A	1/10/2025	SI	$ 85.859.060,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UBAQUE	1. Ubaque - Chipaque	14/3/2025	21/03/2025 29/05/2025	APROBADO	30/5/2025	15/5/2025	3/6/2025	20/6/2025	$ 110.492.345,00	$ 15.738.960,92	11/4/2025	24/4/2025	14/3/2025	N/A	14/3/2025	3/6/2025	7/7/2025	100%	$ 106.364.047,00	11/7/2025	11/7/2025	$ 106.364.047,00	21/7/2025	21/7/2025	12/7/2025	N/A	12/7/2025	SI	$ 106.364.047,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UBAQUE	3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico	14/3/2025	21/03/2025 29/05/2025	APROBADO	30/5/2025	21/5/2025	2/6/2025	20/6/2025	$ 55.738.410,00	$ 1.396.612,84	11/4/2025	24/4/2025	14/3/2025	N/A	14/3/2025	3/6/2025	8/7/2025	100%	$ 48.381.100,00	11/7/2025	11/7/2025	$ 48.381.100,00	21/7/2025	21/7/2025	12/7/2025	N/A	12/7/2025	SI	$ 48.381.100,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UBATÉ	1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas	22/9/2025	7/9/2025	APROBADO	7/9/2025	7/9/2025	10/9/2025	20/9/2025	$ 58.724.511,00	$ 2.125.782,95	30/9/2025	9/6/2025	22/5/2025	N/A	22/5/2025	11/6/2025	25/9/2025	100%	$ 78.504.970,00	7/7/2025	7/7/2025	$ 78.504.970,00	18/7/2025	18/7/2025	11/7/2025	N/A	11/7/2025	SI	$ 78.504.970,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UBATÉ	2. Interseccción Colegio Rincones	22/9/2025	7/9/2025	APROBADO	7/9/2025	7/9/2025	10/9/2025	20/9/2025	$ 148.029.600,00	-$ 79.630.768,53	30/9/2025	9/6/2025	22/5/2025	N/A	22/5/2025	16/6/2025	27/9/2025	100%	$ 148.553.469,00	7/7/2025	7/7/2025	$ 148.553.469,00	18/7/2025	18/7/2025	11/7/2025	N/A	11/7/2025	SI	$ 148.553.469,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UNE	Ingreso Une - Curva Alta Sintenidad	16/9/2025	13/7/2025	APROBADO	28/8/2025	27/8/2025	28/8/2025	24/9/2025	$ 57.483.723,00	$ 18.804.174,44	24/9/2025	1/7/2025	16/6/2025	N/A	16/6/2025	1/9/2025	23/09/2025	100%	$ 49.665.362,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 49.665.362,00	9/10/2025	9/10/2025	13/9/2025	N/A	13/9/2025	SI	$ 49.665.362,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UNE	Entrada Estación De Servicio Tequco	16/9/2025	13/7/2025	APROBADO	13/8/2025	8/8/2025	11/8/2025	6/9/2025	$ 93.018.609,00	$ 2.357.000,42	24/9/2025	1/7/2025	16/6/2025	N/A	16/6/2025	14/8/2025	23/09/2025	100%	$ 82.695.312,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 82.695.312,00	9/10/2025	9/10/2025	13/9/2025	N/A	13/9/2025	SI	$ 82.695.312,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UNE	Escuela Combura	16/9/2025	13/7/2025	APROBADO	25/8/2025	25/8/2025	7/8/2025	10/9/2025	$ 69.832.283,00	$ 18.539.003,60	24/9/2025	1/7/2025	16/6/2025	N/A	16/6/2025	27/8/2025	22/09/2025	100%	$ 64.560.095,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 64.560.095,00	9/10/2025	9/10/2025	13/9/2025	N/A	13/9/2025	SI	$ 64.560.095,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UNE	Punto Crítico Timasia	16/9/2025	13/7/2025	APROBADO	1/8/2025	1/8/2025	4/8/2025	6/9/2025	$ 51.974.068,00	$ 5.197.386,06	24/9/2025	1/7/2025	16/6/2025	N/A	16/6/2025	3/9/2025	22/09/2025	100%	$ 51.057.446,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 51.057.446,00	9/10/2025	9/10/2025	13/9/2025	N/A	13/9/2025	SI	$ 51.057.446,00	TERMINADO Y RECIBIDO
UNE	Sector Vda Salitre-costado Vda Yamila	16/9/2025	13/7/2025	APROBADO	8/8/2025	5/8/2025	7/8/2025	10/9/2025	$ 75.117.882,00	$ 8.203.598,97	24/9/2025	1/7/2025	16/6/2025	N/A	16/6/2025	12/8/2025	22/09/2025	100%	$ 71.006.743,00	7/10/2025	7/10/2025	$ 71.006.743,00	9/10/2025	9/10/2025	13/9/2025	N/A	13/9/2025	SI	$ 71.006.743,00	TERMINADO Y RECIBIDO
GUATAVITA	Interseccciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita – Sesquilé	12/8/2025	23/8/2025	APROBADO	22/08/2025	19/09/2025	22/09/2025	25/10/2025	$ 213.570.975,00	$ 4.100.666,00	6/08/2025	27/10/2025	14/8/2025	12/8/2025	N/A	12/8/2025	3/10/2025	6/10/2025	9,47%	$ 19.048.913,00										TERMINADO
SAN BERNARDO	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	19/8/2025	17/9/2025	APROBADO	25/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	5/11/2025	$ 17.345.215,00	$ 6.981.965,00	6/8/2025	14/8/2025	19/8/2025	N/A	19/8/2025	21/10/2025	21/10/2025	100%	$ 17.064.451,00	25/11/2025	25/11/2025	$ 17.064.451,00	1/12/2025	1/12/2025	25/11/2025	N/A	25/11/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
SAN BERNARDO	3. Institución Educativa Departamental San Bernardo	19/8/2025	17/9/2025	APROBADO	25/09/2025	23/09/2025	10/10/2025	5/11/2025	$ 47.218.098,00	-$ 16.789.715,00	6/8/2025	14/8/2025	19/8/2025	N/A	19/8/2025	22/10/2025	25/11/2025	100%	$ 48.088.890,00	25/11/2025	25/11/2025	$ 48.088.890,00	1/12/2025	1/12/2025	25/11/2025	N/A	25/11/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
JUNÍN	Vía Suesa-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	12/8/2025	3/9/2025	APROBADO	22/09/2025	19/09/2025	22/09/2025	16/10/2025	$ 74.599.696,00	$ 7.416.346,76	6/8/2025	14/8/2025	12/8/2025	12/8/2025	12/8/2025	10/10/2025	17/10/2025	100%	$ 83.766.171,00	19/11/2025	19/11/2025	$ 83.766.171,00	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
JUNÍN	Vía Suesa-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	12/8/2025	3/9/2025	APROBADO	22/09/2025	19/09/2025	22/09/2025	16/10/2025	$ 128.065.777,00	$ 4.436.844,39	6/8/2025	14/8/2025	12/8/2025	N/A	12/8/2025	7/10/2025	17/10/2025	100%	$ 135.529.683,00	19/11/2025	19/11/2025	$ 135.529.683,00	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	N/A	20/11/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
TOCANCIPÁ	Complemento C.R. ENTRELOMAS	10/9/2025	14/7/2025	APROBADO	6/8/2025	5/8/2025	31/7/2025	22/8/2025	$ 0,00	$ 23.593.154,38	24/9/2025	1/7/2025	10/6/2025	N/A	10/6/2025	31/7/2025	15/9/2025	100%	$ 23.593.154,38	15/9/2025	15/9/2025	$ 23.593.154,38	16/9/2025	16/9/2025	12/9/2025	N/A	12/9/2025	SI	$ 23.593.154,38	TERMINADO Y RECIBIDO
ARBELAEZ	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	15/10/2025	25/10/2025	APROBADO	7/11/2025	7/11/2025	10/11/2025	2/12/2025	$ 69.035.526,00	-$ 527.325,92	14/10/2025	21/10/2025	15/10/2025	N/A	15/10/2025	10/11/2025	14/12/2025	100%	$ 69.035.526,00											TERMINADO
ARBELAEZ	SECTOR KIRPALAMAR	15/10/2025	25/10/2025	APROBADO	7/11/2025	7/11/2025	10/11/2025	2/12/2025	$ 89.192.907,00	$ 753.735,30	14/10/2025	21/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	20/11/2025	14/12/2025	100%	$ 89.192.907,00											TERMINADO
PASCA	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	15/10/2025	25/10/2025	APROBADO	18/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	11/12/2025	$ 90.654.141,00	$ 3.270.872,54	14/10/2025	21/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	12/12/2025		33,98	$ 30.804.277,11											EN EJECUCIÓN
PASCA	VEREDA EL MOLINO - ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	15/10/2025	25/10/2025	APROBADO	18/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	11/12/2025	$ 100.402.971,00	-$ 905.875,72	14/10/2025	21/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	5/12/2025		49,91%	$ 50.111.122,83											EN EJECUCIÓN
JUNÍN	Interseccción Vía San Roque - Junín	9/10/2025	11/10/2025	APROBADO	17/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	$ 53.476.141,00	$ 809.730,64	14/10/2025	21/10/2025	9/10/2025	N/A	9/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	100%	$ 50.967.739,00	19/11/2025	19/11/2025	$ 50.967.739,00	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	N/A	20/11/2025			TERMINADO Y RECIBIDO
TENJO	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	21/10/2025	31/10/2025	APROBADO	5/11/2025	4/11/2025	7/11/2025	5/12/2025	$ 227.644.231,00	-$ 293.035,83	27/10/2025	6/11/2025	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	7/11/2025	3/12/2025	100%	$ 222.693.908,00	4/12/2025	4/12/2025	$ 222.693.908,00	5/12/2025	5/12/2025	4/12/2025	4/12/2025	4/12/2025			TERMINADO Y RECIBIDO

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
TABIO	Via Tabio - Cajica (Gimansio Campestre Santa Rita de Casia)	20/6/2025	$ 72.327.600,44	$ 74.833.799,00	$ 72.958.463,00	2,01%
TABIO	Via Tabio - El Mirador	20/6/2025	$ 65.602.005,61	$ 66.222.302,00	$ 66.388.347,00	1,83%
TABIO	Via Tabio - Subachoque	20/6/2025	$ 148.058.856,00	$ 258.580.216,00	$ 262.541.766,00	7,24%
UBATÉ	Ubate - Guacheta	18/7/2025	$ 56.598.728,05	$ 58.724.511,00	$ 78.504.970,00	2,17%
UBATÉ	2. Intersencción Colegio Bruselas	18/7/2025	$ 226.660.368,53	$ 148.029.600,00	$ 148.553.469,00	4,10%
UBAQUE	Ubaque - Chipaque	21/7/2025	$ 97.753.384,08	$ 113.492.345,00	$ 106.364.047,00	2,93%
UBAQUE	CURVA UBAQUE - LA UNIÓN	21/7/2025	$ 54.331.837,16	$ 55.728.450,00	$ 48.381.100,00	1,33%
CARMEN DE CARUPA	2. Sector La U	19/8/2025	$ 58.381.952,38	$ 58.036.759,00	$ 50.958.139,00	1,41%
CARMEN DE CARUPA	3. Sector El Prado	5/9/2025	$ 83.638.091,86	$ 77.764.628,00	$ 75.709.222,00	2,09%
CARMEN DE CARUPA	4.Sector Peligros	19/8/2025	$ 39.539.320,71	$ 43.884.752,00	$ 44.284.303,00	1,22%
GUACHETA	ESCUELA LA ISLA	26/8/2025	$ 13.792.670,76	$ 31.444.186,00	$ 30.404.041,00	0,84%
GUACHETA	I.E. MIÑA Y TICHA	26/8/2025	$ 13.035.646,11	$ 13.511.162,00	$ 11.509.923,00	0,32%
GUACHETA	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	26/8/2025	$ 5.668.278,00	$ 7.832.442,00	$ 7.832.441,00	0,22%
SIMIJACA	COLEGIO AGUSTIN PARRA	26/8/2025	$ 60.682.955,32	$ 59.584.972,00	$ 46.423.414,00	1,28%
SIMIJACA	ESCUELA EL FICAL	26/8/2025	$ 20.238.121,60	$ 10.901.006,00	$ 11.407.589,00	0,31%
SIMIJACA	ESCUELA EL PANTANO	26/8/2025	$ 19.828.402,24	$ 21.115.706,00	$ 22.627.387,00	0,62%
NEMOCON	Escuela La Puerta	5/9/2025	$ 46.105.043,95	$ 37.467.306,00	$ 36.562.501,00	1,01%
SUTATAUSA	ESCUELA PALACIO	16/9/2025	$ 5.459.679,72	$ 5.459.680,00	$ 5.459.679,00	0,15%
SUTATAUSA	ESCUELA HATO VIEJO	16/9/2025	$ 15.714.275,02	$ 15.714.275,00	$ 14.294.984,00	0,39%
TOCANCIPÁ	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	16/9/2025	$ 298.600.598,51	$ 307.479.873,62	$ 309.473.126,62	8,54%
TOCANCIPÁ	Complemento C.R. ENTRELOMAS	16/9/2025	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	0,65%
UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	6/10/2025	$ 82.454.368,92	$ 88.176.030,00	$ 85.859.060,00	2,37%
CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	8/10/2025	$ 44.421.570,34	$ 47.985.697,00	$ 42.948.940,00	1,18%
CÁQUEZA	2. Escuela Ubatoque 2	8/10/2025	$ 33.370.969,16	$ 37.389.635,00	$ 36.516.713,00	1,01%
CÁQUEZA	3. Consolidado Sector El Campin	8/10/2025	$ 106.304.301,84	$ 111.048.567,00	$ 96.329.604,00	2,66%
CÁQUEZA	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	8/10/2025	$ 36.468.732,96	$ 43.335.493,00	$ 41.426.891,00	1,14%
FOSCA	1. Colegio IDER	8/10/2025	$ 24.920.127,94	$ 25.167.041,00	$ 22.846.901,00	0,63%
FOSCA	2. Consolidado El Tablon	8/10/2025	$ 231.072.196,83	$ 256.713.360,00	$ 179.854.339,00	4,96%
FOSCA	4. Cementerio Municipal	8/10/2025	$ 74.910.059,06	$ 79.401.526,00	$ 61.955.299,00	1,71%
FOSCA	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	8/10/2025	$ 43.981.772,34	$ 17.517.093,00	$ 11.506.821,00	0,32%
QUETAME	1. Escuela Rural Granadillo	8/10/2025	$ 7.186.556,52	$ 6.640.156,00	$ 6.640.155,00	0,18%
QUETAME	2. Intersección Matemango	8/10/2025	$ 4.366.811,64	$ 7.142.509,00	$ 7.142.510,00	0,20%
UNE	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	9/10/2025	$ 38.679.548,56	$ 57.483.723,00	$ 49.665.362,00	1,37%
UNE	Entrada Estación De Servicio Texaco	9/10/2025	$ 90.661.608,58	$ 93.018.609,00	$ 82.695.312,00	2,28%
UNE	Escuela Combura	9/10/2025	$ 51.293.279,40	$ 69.832.283,00	$ 64.540.095,00	1,78%
UNE	Punto Critico Timasita	9/10/2025	$ 46.776.621,94	$ 51.974.008,00	$ 51.057.446,00	1,41%
UNE	Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia	9/10/2025	$ 67.313.483,03	$ 75.517.082,00	$ 71.006.743,00	1,96%
GUAYABETAL	Vda San Antonio	9/10/2025	$ 60.847.191,37	$ 61.172.852,00	$ 56.450.044,00	1,56%
GUAYABETAL	Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo	9/10/2025	$ 42.014.634,45	$ 37.786.733,00	$ 40.442.050,00	1,12%
SUSA	ESCUELA EL TABLON	29/10/2025	$ 8.677.541,11	$ 15.791.947,00	$ 13.576.914,00	0,37%
TAUSA	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	29/10/2025	$ 12.365.123,90	$ 22.183.503,00	$ 21.742.674,00	0,60%
JUNIN	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	20/11/2025	$ 67.183.349,24	$ 74.599.696,00	$ 83.766.171,00	2,31%
JUNIN	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	20/11/2025	$ 123.628.932,61	$ 128.065.777,00	$ 135.529.683,00	3,74%
JUNIN	Intersección Vía San Roque - Junín	20/11/2025	$ 52.666.410,36	$ 53.476.141,00	$ 50.967.739,00	1,41%
MACHETÁ	ESCUELA GUINA	20/11/2025	$ 7.215.762,84	$ 7.780.676,00	$ 7.780.676,00	0,21%
SAN BERNARDO	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	1/12/2025	$ 10.363.250,00	$ 17.345.215,00	$ 17.064.451,00	0,47%
SAN BERNARDO	3. Institución Educativa Departametal San Bernardo	1/12/2025	$ 63.987.813,00	$ 47.218.098,00	$ 48.088.890,00	1,33%
TENJO	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	5/12/2025	$ 227.937.266,83	$ 227.644.231,00	$ 222.693.908,00	6,14%
CUCUNUBÁ	PUNTO CRITICO PR 4+100	19/8/2025	$ 158.827.207,97	$ 163.518.183,00	$ 121.727.948,00	3,36%
TOTAL	49		$ 3.245.507.463,18	$ 3.414.326.989,00	$ 3.206.055.405,00	88,44%
