ACTA No:	121
FECHA:	30/10/ 2025
CONTRATO No:	C.I. No.STM-CM-010-2025
OBJETO:	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARTICIPANTES	
En Representación de	SMC
NOMBRE	Juan Heredia
Cargo	Supervisor
En Representación de	SMC
NOMBRE	Giovanna Naranjo
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	SMC
NOMBRE	Iván Hernández
Cargo	Abogado
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Ernesto Perdomo
Cargo	Director Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Dalila Otalora
Cargo	Especialista Transito
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Bibiana Rojas
Cargo	Residente Interventoría
En Representación de	Consorcio MS
NOMBRE	Juan Diego Román
Cargo	Representante legal suplente
En Representación de	Consorcio MS
NOMBRE	María Stella Agudelo
Cargo	Especialista en Transito

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR				
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**CUMPLIMIENTO**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
Informe preliminar Pasca y Arbeláez	CONSORCIO MS	X		25/10/2025 Cumplido
Envío informe de Guatavita y solicitud de permiso ante la ANI	CONSORCIO MS	X		28/10/2025 Cumplido
Terminación de obras de Machetá, Susa y Tausa	CONOSRCIO MS	X		23/10/2025 Cumplido
Visita de verificación de cantidades de Machetá, Susa, Tausa.	CONSOCIO MS	X		28/10/2025 Cumplido
Planos récord y cantidades de Machetá, Susa y Tausa	CONSOCIO MS	X		28/10/2025 Cumplido
Inicio Paratebueno	CONSOCIO MS	X		27/10/2025 Cumplido
Subsanación observaciones Cuenta de cobro 3 Contratista	CONSOCIO MS	X		24/10/2025 Cumplido
Instalación de radares Tocancipá	CONSOCIO MS			El contratista se mantiene en la fecha de cumplimiento 30/10/2025
Informe preliminar Tenjo	CONSOCIO MS		X	Sin Cumplir
PMT Tenjo	CONSORCIO MS	X		27/10/2025 Cumplido
Envío informes finales de Une	CONSORCIO MS		X	Sin Cumplir
Cronogramas informes finales	CONSORCIO MS	X		23/10/2025 Cumplido

TEMAS PRESENTE ACTA

Durante el comité de seguimiento, referente a los Informes de visita preliminar de Pasca y Arbeláez, se confirmó la entrega por parte del contratista. Estos documentos fueron avalados por la especialista de interventoría y se entregara el informe a la SMC para tramite de apropiación de diseños.

La interventoría menciona que el Informe de Guatavita, el contratista remitió el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) a la ANI, entidad que confirmó su recepción mediante número de radicado.

En los municipios de Susa, Tausa; se mencionó que fueron entregados el día anterior, la entrega de Machetá se programó para la próxima semana.

La interventoría menciona que las actas de cantidades y planos récord de Junín, están pendiente de entrega por el contratista, el contratista se compromete a entregar la próxima semana para revisión de interventoría.

La interventoría pregunta al contratista sobre la terminación de obras en Paratebueno, mencionando el contratista que se iniciaron los trabajos en el municipio; además indicó que se está a la espera del pago del acta para la terminación de los resaltos parabólicos en asfalto.

En cuanto a los Radares de Tocancipá el contratista menciona que se completaron los trabajos de obra civil correspondientes para la instalación de los radares y se programa para mañana, permitiendo así el trámite de la cuenta de cobro N.º 3.

Aspectos Contractuales

VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.625.158.645,00	$ 3.467.688.303,00	95,66%	$ 2.974.573.182,26	82,05%

A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 82,05% del valor total del contrato.

Aspectos Técnicos

Hito	Puntos	%Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$3.625.158.645,00	100%
Puntos entregados por la SMC	57	
Valor total estimado	$3.932.450.076,72	108,48%
Puntos descartados	2	
Valor puntos inicial puntos descartados	$ 66.704.675,40	1,84%
Valor ejecutable puntos entregados	$3.865.745.401,32	106,64%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	50	
Presupuesto diseños apropiados	$3.467.688.308,00	95,66%
Puntos en ejecución de obra	2	
Puntos terminados	48	
Puntos sin iniciar	0	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	40	
Valor ejecutado físico	$2.974.573.182,26	82,05%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$2.604.844.299,00	71,85%

NOTA: Los puntos entregados más recientemente fueron los ubicados en los municipios de Une y Guayabetal el día 09 de octubre de 2025.

Un 71,85% del valor total del contrato ha sido entregado a la entidad - SMC que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 2.604.844.299,00, correspondiente a los 40 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Simijaca (3), Guachetá (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubalá (1), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Quetame (2) y Cáqueza (4).

Seguimiento Metas Contractuales y Cronograma Proyecto

4.1 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Seguimiento metas contractuales: **Valor contrato L1** **$3.625.158.6445**

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Físico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20 mar 25	0%	$ 0					SI
2	20 abr 25	5%	$ 181.257.932					NO
3	20 may 25	10%	$ 362.515.864,50			$ 369.801.264,58	10,20%	NO
4	20 jun 25	20%	$ 725.031.729	$ 401.888.576,00	11,09%	$ 807.397.167,00	22,27%	NO
5	20 jul 25	35%	$ 1.268.805.526	$ 783.692.162,00	21,62%	$ 1.223.717.964,00	33,76%	NO
6	20 ago 25	50%	$ 1.812.579.323	$ 1.000.662.552,00	27,60%	$ 1.697.861.006,00	46,84%	NO
7	20 sep 25	70%	$ 2.537.611.052	$ 1.595.960.014,00	44,02%	$ 2.577.624.979,00	71,10%	NO
8	20 oct 25	90%	$ 3.262.642.781	$ 2.604.844.299,00	71,85%	$ 2.826.558.685,00	77,97%	NO
9	20 nov 25	100%	$ 3.625.158.645	$ 2.604.844.299,00	71,85%	$ 2.974.573.182,26	82,05%	NO

Aspectos Administrativos y de SST

De los 47 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 22 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Guachetá (3), Carmen de Carupa (3), Nemocón (1), Cucunuba (1), Simijaca (3), Sutatausa (2) y Tocancipá (2), los cuales ya fueron revisados por la interventoría, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoría se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes.

Aspectos sociales y/o ambientales

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
29 sep al 4 oct	6 oct al 11 oct	13 oct al 18 oct	20 oct al 25 oct	27 oct al 1 nov	3 nov al 8 nov	10 nov al 15 nov
Carmen de carupa (3)	Simijaca (3)	Fosca (4)	Une (5)	Cáqueza (4)	Guachetá (3)	Junín (3)
Cucunuba (1)	Sutatausa (2)	Tocancipá (1)		Ubalá (1)	Guayabetal (2)	Guatavita (1)
Nemocón (1)						

A la fecha se encuentra en trámite el PMT del punto ubicado en el municipio de Tenjo.

Aspectos Presupuestales

4.2 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRAT

Relación pagos: **Valor contrato L1** **$$3.625.158.6445**

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	3	Tabio (3)	$ 401.888.576,00	11,09 %	$ 401.888.576,00	11,09 %
2	7	Ubaté (2) Ubaque (2) Carmen de Carupa (2) Cucunuba (1)	$ 598.773.976,00	16,52 %	$ 1.000.662.552,00	27,61 %

ACCIONES Y COMPROMISOS FORMULADOS EN LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Planos récord y acta cantidades Junín	CONSORCIO MS			Compromiso para el 05/11/2025
Cronograma visitas de recibo (Junín, Machetá, Tocancipá)	CONSORCIO MS			Compromiso para el 30/10/2025
Instalación radares Tocancipá	CONSORCIO MS			Compromiso para el 31/10/2025
Informe visita Tenjo	CONSORCIO MS			Compromiso para el 31/10/2025
Informes finales Une	CONSORCIO MS			Compromiso para el 31/10/2025
Respuesta comunicado informes finales	CONSORCIO MS			Compromiso para el 31/10/2025
Terminación San Bernardo	CONSORCIO MS			Compromiso para el 03/11/2025
Ajuste paquete de cobro CO 3 (11 puntos).	CONSORCIO MS			Compromiso para el 07/11/2025
Informe mensual 8.	CONSORCIO MS			Compromiso para el 31/10/2025
Paquete de cobro CO 4 (18 puntos).	CONSORCIO MS			Compromiso para el 10/11/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: José Alexander Román
CONTRATISTA

Firma_____
Nombre: Ernesto Perdomo
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Firma_____
Nombre: Juan Heredia
SUPERVISOR SMC

Para uso exclusivo del supervisor de SMC: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR SMC

Copia: interventoría
Copia: contratista

- **REGISTRO DE ASISTENTES**

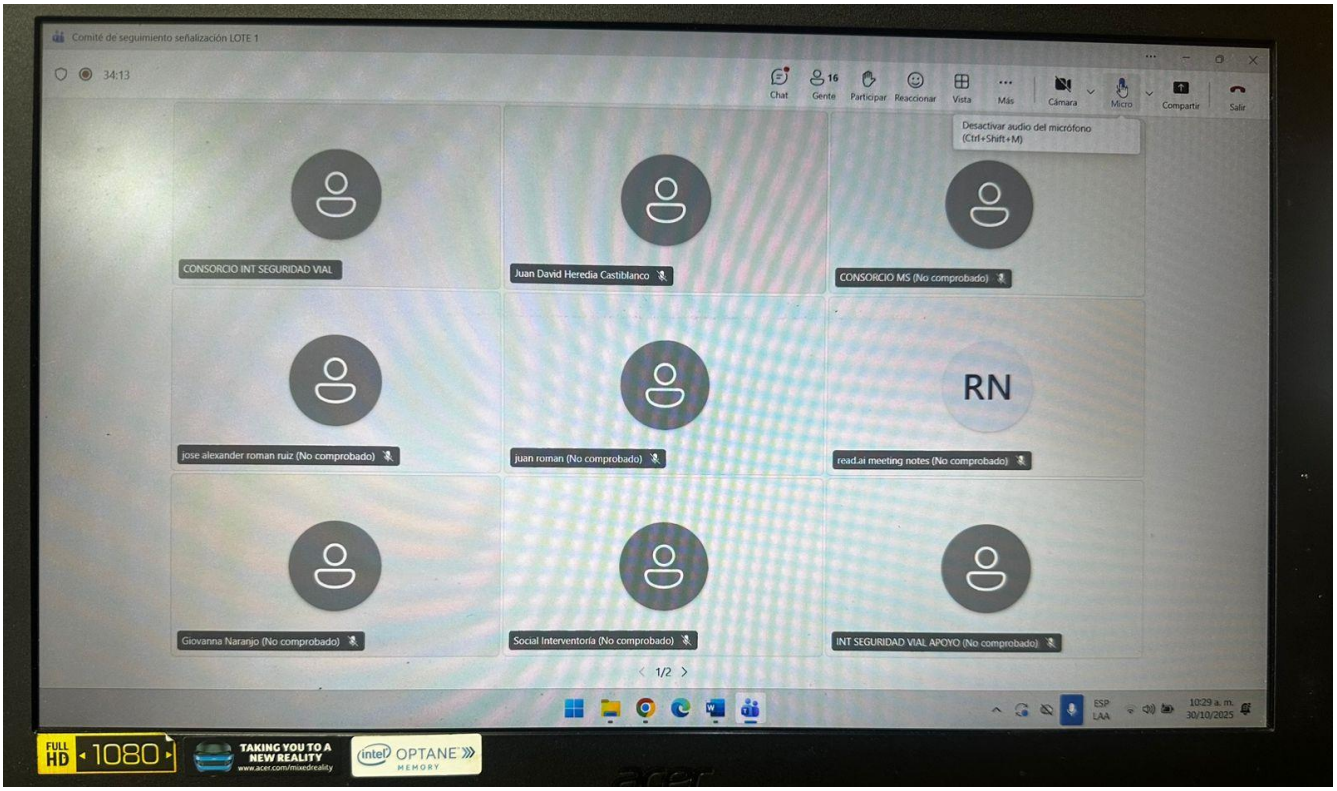

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria de Movilidad Contemporánea -SMC , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página contactenos@cundinamarca.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, SMC sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No 51-53 Bogotá D.C., al correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(601) 7490000, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Comité de seguimiento No. 34

Contrato de obra No. STM-LP-009-2025 (Lote 1)

Contrato de interventoría No. STM-CM-010-2025

Objeto: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Fecha 30-10-2025

CONTENIDO

1 RESUMEN CONTRACTUAL

2 SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

4 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

5 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

6 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Gobernación de Cundinamarca

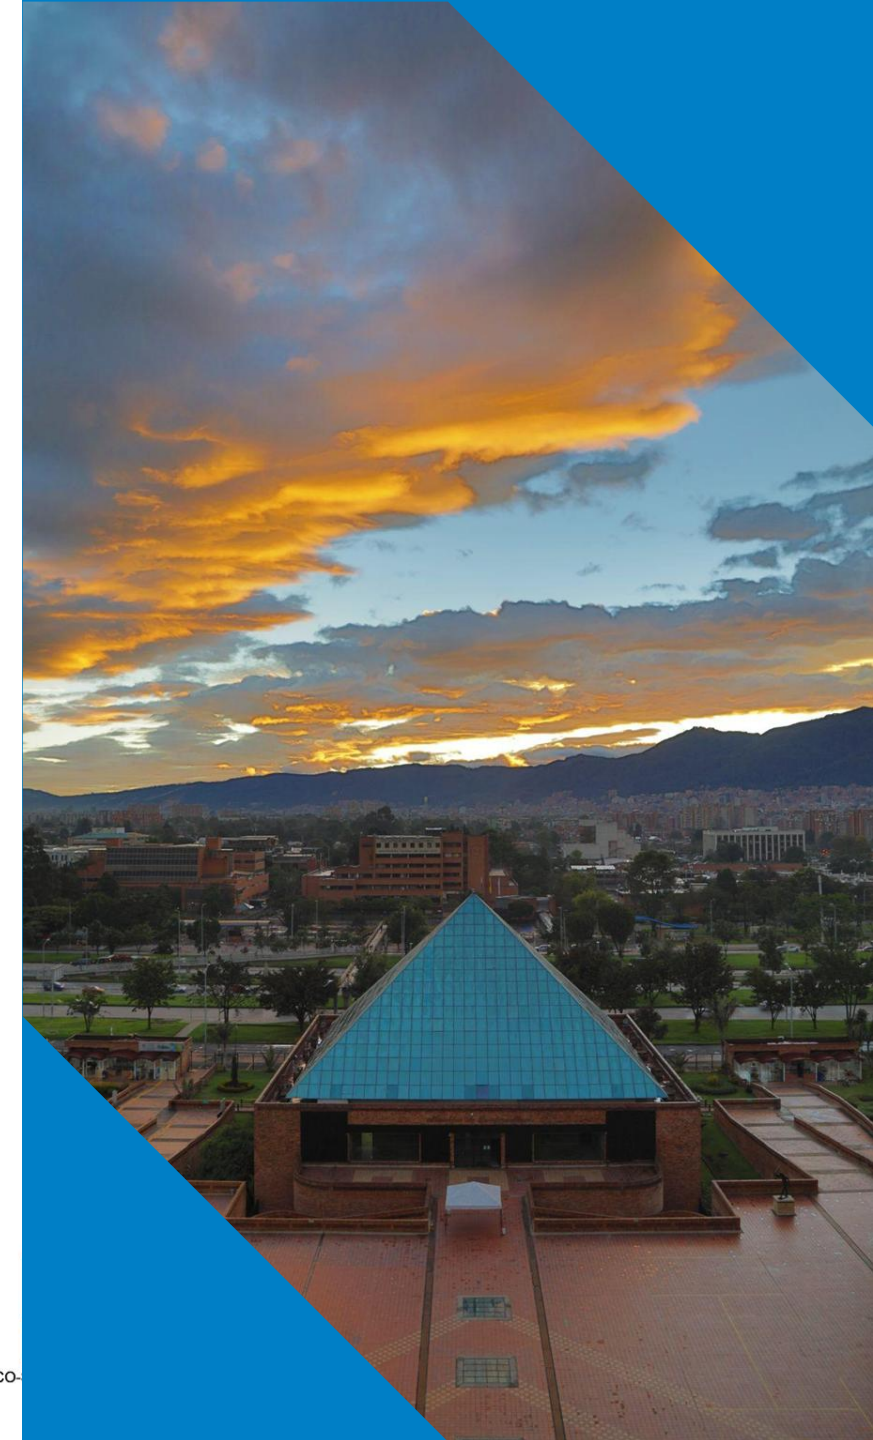

1. RESUMEN CONTRACTUAL

ALCANCE	OBRA	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	**CONSORCIO MS**	**CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**
OBJETO CONTRACTUAL	Implementar intervenciones en infraestructura vial para **mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos** priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca.	Realizar la gerencia integral para la **interventoría técnica, administrativa, financiera, operativa, jurídica, ambiental y social** al contrato cuyo objeto es: implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca.
VALOR DEL CONTRATO	$3.625.158.645,00	$1.651.573.119
ADICIONES	N/A	N/A
PLAZO DE EJECUCION	Diez (10) Meses	Once (11) Meses
FECHA INICIO	21 de febrero 2025	21 de febrero 2025
FECHA TERMINACIÓN	20 de diciembre 2025	20 de enero 2026

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


No.	Compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Fecha de cumplimiento	Observación
1	Informe visita preliminar Pasca y Arbeláez	Contratista	24/10/2025	25/10/2025	CUMPLIDO
2	Envío informe de Guatavita y solicitud de permiso ante la ANI	Contratista	24/10/2025	28/10/2025	CUMPLIDO
3	Terminación de obras de Machetá, Susa y Tausa	Contratista	23/10/2025	23/10/2025	CUMPLIDO
4	Visita de verificación de cantidades de Machetá, Susa y Tausa	Contratista	29/10/2025	28/10/2025	CUMPLIDO
5	Planos récord y cantidades de Machetá, Susa y Tausa	Contratista	27/10/2025	28/10/2025	CUMPLIDO
6	Inicio Paratebueno	Contratista		27/10/2025	CUMPLIDO
7	Subsanación observaciones Cuenta de cobro 3	Contratista	23/10/2025	24/10/2025	CUMPLIDO
8	Instalación de radares Tocancipá	Contratista	30/10/2025		
9	Informe visita preliminar Tenjo	Contratista	29/10/2025		
10	Radicación PMT Tenjo	Contratista	27/10/2025	27/10/2025	CUMPLIDO
11	Envío informes finales de Une	Contratista	25/10/2025		Sin cumplir
12	Cronograma informes finales	Contratista	23/10/2025	23/10/2025	CUMPLIDO

3.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Valor contrato L1 **$ 3.625.158.645,00**

Diseños entregados por la SMC:

LOTE 1	PUNTOS	PRESUPUESTO INICIAL
ARBELAEZ	2	$ 157.992.025,62
CÁQUEZA	4	$ 220.565.574,30
CARMEN DE CARUPA	3	$ 181.559.364,95
CUCUNUBÁ	1	$ 158.827.207,97
FOSCA	4	$ 374.884.156,17
GUACHETA	3	$ 32.496.594,87
GUATAVITA	1	$ 209.470.309,00
GUAYABETAL	2	$ 102.861.825,82
JUNIN	3	$ 243.478.692,21
MACHETÁ	1	$ 7.215.762,84
NEMOCON	1	$ 46.105.043,95
PARATEBUENO	1	$ 64.083.488,17
PASCA	2	$ 188.692.115,18
QUETAME	2	$ 11.553.368,16
SAN BERNARDO	2	$ 74.351.063,00
SIMIJACA	3	$ 100.749.479,16
SUSA	1	$ 8.677.541,11
SUTATAUSA	2	$ 21.173.954,74
TABIO	3	$ 285.988.462,05
TAUSA	1	$ 12.365.123,90
TOCANCIPÁ	2	$ 322.193.752,89
UBALA	2	$ 139.784.706,60
UBAQUE	3	$ 161.459.558,96
UBATÉ	2	$ 283.259.096,58
UNE	5	$ 294.724.541,51
TENJO	1	$ 227.937.267,00
Total general	**57**	**$ 3.932.450.076,72**

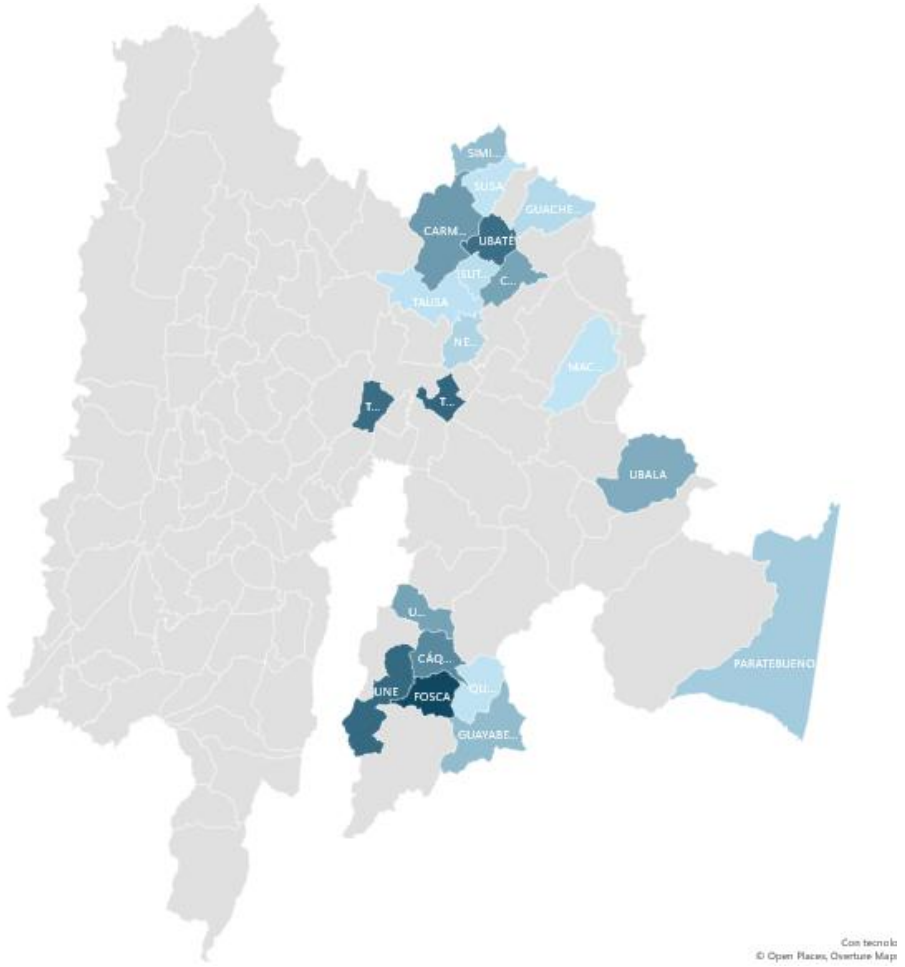

Gobernación de Cundinamarca

ENTIDAD CERTIFICADA

CO-SC-CER303297 ST-CER655785 CO-SI-CER1017570

3.2 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,72
Puntos con visita de reconocimiento	57
Puntos descartados	2
Entrega informe visita	54
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	50
Presupuesto diseños apropiados	$ 3.467.688.303,00

3.3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta Visita preliminar	Cuenta de Entrega REAL informe visita	Cuenta de Aprobación informe
GUACHETA	3	3	3	3
GUAYABETAL	2	2	2	2
NEMOCON	1	1	1	1
QUETAME	2	2	2	2
SIMIJACA	3	3	3	3
SUSA	1	1	1	1
SUTATAUSA	2	2	2	2
TABIO	3	3	3	3
UBALA	2	2	1	1
UBAQUE	3	3	2	2
TAUSA	1	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1	1
UBATÉ	2	2	2	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	3	3
MACHETÁ	1	1	1	1
CÁQUEZA	4	4	4	4
UNE	5	5	5	5
FOSCA	4	4	4	4
PARATEBUENO	1	1	1	1
TOCANCIPÁ	2	2	2	2
GUATAVITA	1	1	1	1
JUNIN	3	3	3	3
SAN BERNARDO	2	2	2	2
ARBELAEZ	2	2	2	
PASCA	2	2	2	
TENJO	1	1		
TOTAL	**57**	**57**	**54**	**50**

NOTA: Los puntos de Ubala y Ubaque que fueron descartados no requieren informe de visita preliminar.

3.5 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.625.158.645,00	100%
Puntos entregados por la SMC	57	
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,72	108,48%
Puntos descartados	2	
Valor puntos inicial puntos descartados	$ 66.704.675,40	1,84%
Valor ejecutable puntos entregados	$ 3.865.745.401,32	106,64%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	50	
Presupuesto diseños apropiados	$ 3.467.688.303,00	95,66%
Puntos en ejecución de obra	2	
Puntos terminados	48	
Puntos sin iniciar	0	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	40	
Valor ejecutado físico	$ 2.974.573.182,26	82,05%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 2.604.844.299,00	71,85%

NOTA: Los puntos entregados más recientemente fueron los ubicados en los municipios de Une y Guayabetal el día 09 de octubre de 2025.

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO
TABIO	Via Tabio - Cajica (Gimansio Campestre Santa Rita de Casia)	20/6/2025	$ 72.327.600,44	$ 74.833.799,00	$ 72.958.463,00	2,01%
TABIO	Via Tabio - El Mirador	20/6/2025	$ 65.602.005,61	$ 66.222.302,00	$ 66.388.347,00	1,83%
TABIO	Via Tabio - Subachoque	20/6/2025	$ 148.058.856,00	$ 258.580.216,00	$ 262.541.766,00	7,24%
UBATÉ	Ubate - Guacheta	18/7/2025	$ 56.598.728,05	$ 58.724.511,00	$ 78.504.970,00	2,17%
UBATÉ	2. Intersencción Colegio Bruselas	18/7/2025	$ 226.660.368,53	$ 148.029.600,00	$ 148.553.469,00	4,10%
UBAQUE	Ubaque - Chipaque	21/7/2025	$ 97.753.384,08	$ 113.492.344,00	$ 106.364.047,00	2,93%
UBAQUE	CURVA UBAQUE - LA UNIÓN	21/7/2025	$ 54.331.837,16	$ 55.728.450,00	$ 48.381.100,00	1,33%
CARMEN DE CARUPA	2. Sector La U	19/8/2025	$ 58.381.952,38	$ 58.036.759,00	$ 50.958.139,00	1,41%
CARMEN DE CARUPA	3. Sector El Prado	5/9/2025	$ 83.638.091,86	$ 77.764.628,00	$ 75.709.222,00	2,09%
CARMEN DE CARUPA	4.Sector Peligros	19/8/2025	$ 39.539.320,71	$ 43.884.752,00	$ 44.284.303,00	1,22%
GUACHETA	ESCUELA LA ISLA	26/8/2025	$ 13.792.670,76	$ 31.444.186,00	$ 30.404.041,00	0,84%
GUACHETA	I.E. MIÑA Y TICHA	26/8/2025	$ 13.035.646,11	$ 13.511.162,00	$ 11.509.923,00	0,32%
GUACHETA	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	26/8/2025	$ 5.668.278,00	$ 7.832.442,00	$ 7.832.441,00	0,22%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
SIMIJACA	COLEGIO AGUSTIN PARRA	26/8/2025	$ 60.682.955,32	$ 59.584.972,00	$ 46.423.414,00	1,28%
SIMIJACA	ESCUELA EL FICAL	26/8/2025	$ 20.238.121,60	$ 10.901.006,00	$ 11.407.589,00	0,31%
SIMIJACA	ESCUELA EL PANTANO	26/8/2025	$ 19.828.402,24	$ 21.115.706,00	$ 22.627.387,00	0,62%
NEMOCON	Escuela La Puerta	5/9/2025	$ 46.105.043,95	$ 37.467.306,00	$ 36.562.501,00	1,01%
SUTATAUSA	ESCUELA PALACIO	16/9/2025	$ 5.459.679,72	$ 5.459.680,00	$ 5.459.679,00	0,15%
SUTATAUSA	ESCUELA HATO VIEJO	16/9/2025	$ 15.714.275,02	$ 15.714.275,00	$ 14.294.984,00	0,39%
TOCANCIPÁ	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	16/9/2025	$ 298.600.598,51	$ 307.479.873,62	$ 309.473.126,62	8,54%
TOCANCIPÁ	Complemento C.R. ENTRELOMAS	16/9/2025	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	0,65%
UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	6/10/2025	$ 82.454.368,92	$ 88.176.030,00	$ 85.859.060,00	2,37%
CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	8/10/2025	$ 44.421.570,34	$ 47.985.697,00	$ 42.948.940,00	1,18%
CÁQUEZA	2. Escuela Ubatoque 2	8/10/2025	$ 33.370.969,16	$ 37.389.635,00	$ 36.516.713,00	1,01%
CÁQUEZA	3. Consolidado Sector El Campin	8/10/2025	$ 106.304.301,84	$ 111.048.567,00	$ 96.329.604,00	2,66%
CÁQUEZA	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	8/10/2025	$ 36.468.732,96	$ 43.335.493,00	$ 41.426.891,00	1,14%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO
FOSCA	1. Colegio IDER	8/10/2025	$ 24.920.127,94	$ 25.167.041,00	$ 22.846.901,00	0,63%
FOSCA	2. Consolidado El Tablon	8/10/2025	$ 231.072.196,83	$ 256.713.360,00	$ 179.854.339,00	4,96%
FOSCA	4. Cementerio Municipal	8/10/2025	$ 74.910.059,06	$ 79.401.526,00	$ 61.955.299,00	1,71%
FOSCA	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	8/10/2025	$ 43.981.772,34	$ 17.517.093,00	$ 11.506.821,00	0,32%
QUETAME	1. Escuela Rural Granadillo	8/10/2025	$ 7.186.556,52	$ 6.640.156,00	$ 6.640.155,00	0,18%
QUETAME	2. Intersección Matemango	8/10/2025	$ 4.366.811,64	$ 7.142.509,00	$ 7.142.510,00	0,20%
UNE	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	9/10/2025	$ 38.679.548,56	$ 57.483.723,00	$ 49.665.362,00	1,37%
UNE	Entrada Estación De Servicio Texaco	9/10/2025	$ 90.661.608,58	$ 93.018.609,00	$ 82.695.312,00	2,28%
UNE	Escuela Combura	9/10/2025	$ 51.293.279,40	$ 69.832.283,00	$ 64.540.095,00	1,78%
UNE	Punto Critico Timasita	9/10/2025	$ 46.776.621,94	$ 51.974.008,00	$ 51.057.446,00	1,41%
UNE	Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia	9/10/2025	$ 67.313.483,03	$ 75.517.082,00	$ 71.006.743,00	1,96%
GUAYABETAL	Vda San Antonio	9/10/2025	$ 60.847.191,37	$ 61.172.852,00	$ 56.450.044,00	1,56%
GUAYABETAL	Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo	9/10/2025	$ 42.014.634,45	$ 37.786.733,00	$ 40.442.050,00	1,12%
CUCUNUBÁ	PUNTO CRITICO PR 4+100	19/8/2025	$ 158.827.207,97	$ 163.518.183,00	$ 121.727.948,00	3,36%
TOTAL	40		$ 2.671.482.013,29	$ 2.820.221.705,00	$ 2.604.844.299,00	71,85%

3.7 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

CODIGO DEL PUNTO	MUNICIPIO	PUNTO	VALOR INICIAL	VALOR APROPIACION DISEÑO	DIFERENCIA	DIFERENCIA EN %	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE AVANCE DE IMPLEMENTACION DISEÑOS APROPIADOS
25785_CN_01	TABIO	Via Tabio - Cajica (Gimansio Campestre Santa Rita de Casia)	$ 72.327.600,44	$ 74.833.799,00	$ 2.506.198,56	3,47%	$ 72.958.463,00	100%
25785_CN_02	TABIO	Via Tabio - El Mirador	$ 65.602.005,61	$ 66.222.302,00	$ 620.296,39	0,95%	$ 66.388.347,00	100%
FR_56CN_20_1	TABIO	Via Tabio - Subachoque	$ 148.058.856,00	$ 258.580.216,00	$ 110.521.360,00	74,65%	$ 262.541.766,00	100%
25841_CN_01	UBAQUE	Ubaque - Chipaque	$ 97.753.384,08	$ 113.492.345,00	$ 15.738.960,92	16,10%	$ 106.364.047,00	100%
25841_CN_03	UBAQUE	CURVA UBAQUE - LA UNIÓN	$ 54.331.837,16	$ 55.728.450,00	$ 1.396.612,84	2,57%	$ 48.381.100,00	100%
25335_CN_01	GUAYABETAL	Vda San Antonio	$ 60.847.191,37	$ 61.172.852,00	$ 325.660,63	0,54%	$ 56.450.044,00	100%
25335_CN_02	GUAYABETAL	Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo	$ 42.014.634,45	$ 37.786.733,00	-$ 4.227.901,45	-10,06%	$ 40.442.050,00	100%
25486_CN_01	NEMOCON	Escuela La Puerta	$ 46.105.043,95	$ 37.467.306,00	-$ 8.637.737,95	-18,73%	$ 36.562.501,00	100%
25845_CN_01	UBATE	Ubate - Guacheta	$ 56.598.728,05	$ 58.724.511,00	$ 2.125.782,95	3,76%	$ 78.504.970,00	100%
25845_CN_02	UBATE	2. Intersencción Colegio Bruselas	$ 226.660.368,53	$ 148.029.600,00	-$ 78.630.768,53	-34,69%	$ 148.553.469,00	100%
25154_CN_01	CARMEN DE CARUPA	2. Sector La U	$ 58.381.952,38	$ 58.036.759,00	-$ 345.193,38	-0,59%	$ 50.958.139,00	100%
25154_CN_02	CARMEN DE CARUPA	3. Sector El Prado	$ 83.638.091,86	$ 77.764.628,00	-$ 5.873.463,86	-7,02%	$ 75.709.222,00	100%
25154_CN_03	CARMEN DE CARUPA	4.Sector Peligros	$ 39.539.320,71	$ 43.884.752,00	$ 4.345.431,29	10,99%	$ 44.284.303,00	100%

3.7 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

CODIGO DEL PUNTO	MUNICIPIO	PUNTO	VALOR INICIAL	VALOR APROPIACION DISEÑO	DIFERENCIA	DIFERENCIA EN %	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE AVANCE DE IMPLEMENTACION DISEÑOS APROPIADOS
25281_CN_01	FOSCA	1. Colegio IDER	$ 24.920.127,94	$ 25.167.041,00	$ 246.913,06	0,99%	$ 22.846.901,00	100%
25281_CN_02	FOSCA	2. Consolidado El Tablon	$ 231.072.196,83	$ 256.713.360,00	$ 25.641.163,17	11,10%	$ 179.854.339,00	100%
25281_CN_03	FOSCA	4. Cementerio Municipal	$ 74.910.059,06	$ 79.401.526,00	$ 4.491.466,94	6,00%	$ 61.955.299,00	100%
25281_CN_04	FOSCA	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	$ 43.981.772,34	$ 17.517.093,00	-$ 26.464.679,34	-60,17%	$ 11.506.821,00	100%
25745_CN_01	SIMIJACA	COLEGIO AGUSTIN PARRA	$ 60.682.955,32	$ 59.584.972,00	-$ 1.097.983,32	-1,81%	$ 46.423.414,00	100%
25745_CN_02	SIMIJACA	ESCUELA EL FICAL	$ 20.238.121,60	$ 10.901.006,00	-$ 9.337.115,60	-46,14%	$ 11.407.589,00	100%
25745_CN_03	SIMIJACA	ESCUELA EL PANTANO	$ 19.828.402,24	$ 21.115.706,00	$ 1.287.303,76	6,49%	$ 22.627.387,00	100%
25317_CN_01	GUACHETA	ESCUELA LA ISLA	$ 13.792.670,76	$ 31.444.186,00	$ 17.651.515,24	127,98%	$ 30.404.041,00	100%
25317_CN_02	GUACHETA	I.E. MIÑA Y TICHA	$ 13.035.646,11	$ 13.511.162,00	$ 475.515,89	3,65%	$ 11.509.923,00	100%
25317_CN_03	GUACHETA	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	$ 5.668.278,00	$ 7.832.442,00	$ 2.164.164,00	38,18%	$ 7.832.441,00	100%
25224_CN_01	CUCUNUBÁ	PUNTO CRITICO PR 4+100	$ 158.827.207,97	$ 163.518.183,00	$ 4.690.975,03	2,95%	$ 121.727.948,00	100%
25817_CN_01	TOCANCIPÁ	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	$ 298.600.598,51	$ 307.479.873,62	$ 8.879.275,11	2,97%	$ 309.473.126,62	100%
Complmento	TOCANCIPÁ	Complemento C.R. ENTRELOMAS	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	$ 0,00	0,00%	$ 23.593.154,38	100%

3.7 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

CODIGO DEL PUNTO	MUNICIPIO	PUNTO	VALOR INICIAL	VALOR APROPIACION DISEÑO	DIFERENCIA	DIFERENCIA EN %	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE AVANCE DE IMPLEMENTACION DISEÑOS APROPIADOS
25845_CN_01	UNE	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	$ 38.679.548,56	$ 57.483.723,00	$ 18.804.174,44	48,62%	$ 49.665.362,00	100%
25845_CN_02	UNE	Entrada Estación De Servicio Texaco	$ 90.661.608,58	$ 93.018.609,00	$ 2.357.000,42	2,60%	$ 82.695.312,00	100%
25845_CN_03	UNE	Escuela Combura	$ 51.293.279,40	$ 69.832.283,00	$ 18.539.003,60	36,14%	$ 64.540.095,00	100%
25845_CN_04	UNE	Punto Critico Timasita	$ 46.776.621,94	$ 51.974.008,00	$ 5.197.386,06	11,11%	$ 51.057.446,00	100%
25845_CN_05	UNE	Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia	$ 67.313.483,03	$ 75.517.082,00	$ 8.203.598,97	12,19%	$ 71.006.743,00	100%
25151_CN_01	CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	$ 44.421.570,34	$ 47.985.697,00	$ 3.564.126,66	8,02%	$ 42.948.940,00	100%
25151_CN_02	CÁQUEZA	2. Escuela Ubatoque 2	$ 33.370.969,16	$ 37.389.635,00	$ 4.018.665,84	12,04%	$ 36.516.713,00	100%
25151_CN_03	CÁQUEZA	3. Consolidado Sector El Campin	$ 106.304.301,84	$ 111.048.567,00	$ 4.744.265,16	4,46%	$ 96.329.604,00	100%
25151_CN_04	CÁQUEZA	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	$ 36.468.732,96	$ 43.335.493,00	$ 6.866.760,04	18,83%	$ 41.426.891,00	100%
25594_CN_01	QUETAME	1. Escuela Rural Granadillo	$ 7.186.556,52	$ 6.640.156,00	-$ 546.400,52	-7,60%	$ 6.640.155,00	100%
25594_CN_02	QUETAME	2. Intersección Matemango	$ 4.366.811,64	$ 7.142.509,00	$ 2.775.697,36	63,56%	$ 7.142.510,00	100%

3.7 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

CODIGO DEL PUNTO	MUNICIPIO	PUNTO	VALOR INICIAL	VALOR APROPIACION DISEÑO	DIFERENCIA	DIFERENCIA EN %	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE AVANCE DE IMPLEMENTACION DISEÑOS APROPIADOS
25781_CN_01	SUTATAUSA	ESCUELA PALACIO	$ 5.459.679,72	$ 5.459.680,00	$ 0,28	0,00%	$ 5.459.679,00	100%
25781_CN_02	SUTATAUSA	ESCUELA HATO VIEJO	$ 15.714.275,02	$ 15.714.275,00	-$ 0,02	0,00%	$ 14.294.984,00	100%
25426_CN_01	MACHETÁ	ESCUELA GUINA	$ 7.215.762,84	$ 7.780.676,00	$ 564.913,16	7,83%	$ 7.780.676,00	100%
25779_CN_01	SUSA	ESCUELA EL TABLON	$ 8.677.541,11	$ 15.791.947,00	$ 7.114.405,89	81,99%	$ 15.791.947,00	100%
25793_CN_01	TAUSA	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	$ 12.365.123,90	$ 22.183.503,00	$ 9.818.379,10	79,40%	$ 22.183.503,00	100%
25326_CN_01	GUATAVITA	Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé	$ 209.470.309,00	$ 213.570.975,00	$ 4.100.666,00	1,96%	$ 19.048.913,00	9,47%
25372_CN_01	JUNIN	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	$ 67.183.349,24	$ 74.599.696,00	$ 7.416.346,76	11,04%	$ 74.599.696,00	100%
25372_CN_02	JUNIN	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	$ 123.628.932,61	$ 128.065.777,00	$ 4.436.844,39	3,59%	$ 128.065.777,00	100%
25372_CN_03	JUNIN	Intersección Vía San Roque - Junín	$ 52.666.410,36	$ 53.476.141,00	$ 809.730,64	1,54%	$ 40.315.662,70	75,39%
25530_CN_01	PARATEBUENO	Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso	$ 64.083.488,17	$ 67.434.570,00	$ 3.351.081,83	5,23%		
25649_CN_02	SAN BERNARDO	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	$ 10.363.250,00	$ 17.345.215,00	$ 6.981.965,00	67,37%	$ 17.345.215,00	100%
25649_CN_03	SAN BERNARDO	3. Institución Educativa Departametal San Bernardo	$ 63.987.813,00	$ 47.218.098,00	-$ 16.769.715,00	-26,21%	$ 44.597.493,56	94,45%
25839_CN_02	UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	$ 82.454.368,92	$ 88.176.030,00	$ 5.721.661,08	6,94%	$ 85.859.060,00	100%
TOTAL			$ 3.291.123.993,52	$ 3.467.688.303,00	$ 176.564.309,48	5,36%	$ 2.974.573.182,26	95,59%

3.7 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.625.158.645,00	$ 3.467.688.303,00	95,66%	$ 2.974.573.182,26	82,05%

3.9 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		AVANCE	DÍAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
TABIO	25785_CN_01	1. Vía Tabio - Cajicá (Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia)	16/5/2025	20/5/2025	21/5/2025	10/6/2025	100%	TERMINADO CON 21 DIAS DE ATRASO
TABIO	FR_56CN20-1_374_2023	2. Vía Tabio - Subachoque	2/5/2025	16/5/2025	16/5/2025	7/6/2025	100%	TERMINADO CON 22 DIAS DE ATRASO
TABIO	25785_CN_02	2. Vía Tabio - Subachoque	2/5/2025	16/5/2025	2/5/2025	23/5/2025	100%	TERMINADO CON 7 DIAS DE ATRASO
UBAQUE	25841_CN_01	1. Ubaque - Chipaque	3/6/2025	20/6/2025	3/6/2025	7/7/2025	100%	TERMINADO CON 17 DIAS DE ATRASO
UBAQUE	25841_CN_03	3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico	3/6/2025	20/6/2025	3/6/2025	8/7/2025	100%	TERMINADO CON 18 DIAS DE ATRASO
UBATE	25845_CN_01	1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas	10/6/2025	20/6/2025	11/6/2025	25/6/2025	100%	TERMINADO CON 5 DIAS DE ATRASO
UBATE	25845_CN_02	2. Intersencción Colegio Bruselas	10/6/2025	20/6/2025	16/6/2025	5/7/2025	100%	TERMINADO CON 19 DIAS DE ATRASO
GUAYABETAL	25335_CN_01	Vda San Antonio	25/6/2025	20/7/2025	23/6/2025	24/9/2025	100%	TERMINADO CON 66 DIAS DE ATRASO
GUAYABETAL	25335_CN_02	Instituto Clara Theresia	4/7/2025	30/7/2025	5/7/2025	25/9/2025	100%	TERMINADO CON 57 DIAS DE ATRASO
NEMOCON	25486_CN_01	ESCUELA LA PUERTA	25/6/2025	20/7/2025	23/6/2025	3/9/2025	100%	TERMINADO CON 45 DIAS DE ATRASO
CARMEN DE CARUPA	25154_CN_01	2. Sector La U	4/7/2025	19/7/2025	5/7/2025	12/8/2025	100%	TERMINADO CON 24 DIAS DE ATRASO
CARMEN DE CARUPA	25154_CN_02	3. Sector El Prado	4/7/2025	19/7/2025	5/7/2025	3/9/2025	100%	TERMINADO CON 46 DIAS DE ATRASO
CARMEN DE CARUPA	25154_CN_03	4.Sector Peligros	4/7/2025	19/7/2025	5/7/2025	15/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO

3.9 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		AVANCE	DÍAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
FOSCA	25281_CN_01	1. Colegio IDER	7/7/2025	6/8/2025	23/7/2025	14/9/2025	100%	TERMINADO CON 39 DIAS DE ATRASO
FOSCA	25281_CN_02	2. Consolidado El Tablon	7/7/2025	6/8/2025	8/7/2025	14/9/2025	100%	TERMINADO CON 39 DIAS DE ATRASO
FOSCA	25281_CN_03	4. Cementerio Municipal	7/7/2025	6/8/2025	8/7/2025	14/9/2025	100%	TERMINADO CON 39 DIAS DE ATRASO
FOSCA	25281_CN_04	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	7/7/2025	11/8/2025	22/7/2025	24/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
SIMIJACA	25745_CN_01	COLEGIO AGUSTIN PARRA	26/7/2025	21/8/2025	13/7/2025	13/8/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
SIMIJACA	25745_CN_02	ESCUELA EL FICAL	26/7/2025	21/8/2025	13/7/2025	13/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
SIMIJACA	25745_CN_03	ESCUELA EL PANTANO	26/7/2025	21/8/2025	13/7/2025	3/9/2025	100%	TERMINADO CON 13 DIAS DE ATRASO
GUACHETA	25317_CN_01	ESCUELA LA ISLA	14/7/2025	13/8/2025	16/7/2025	27/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
GUACHETA	25317_CN_02	I.E. MIÑA Y TICHA	14/7/2025	13/8/2025	16/7/2025	28/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
GUACHETA	25317_CN_03	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	14/7/2025	13/8/2025	16/7/2025	28/7/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
CUCUNUBÁ	25224_CN_01	PUNTO CRITICO PR 4+100	1/8/2025	7/9/2025	16/7/2025	12/8/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
TOCANCIPA	25817_CN_01	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	31/7/2025	22/8/2025	31/7/2025	25/9/2025	100%	TERMINADO CON 24 DIAS DE ATRASO

3.9 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA


MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		AVANCE	DÍAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
UNE	25845_CN_01	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	28/8/2025	24/9/2025	1/9/2025	23/9/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
UNE	25845_CN_02	Entrada Estación De Servicio Texaco	11/8/2025	6/9/2025	14/8/2025	23/9/2025	100%	TERMINADO CON 17 DIAS DE ATRASO
UNE	25845_CN_03	Escuela Combura	7/8/2025	10/9/2025	27/8/2025	22/9/2025	100%	TERMINADO CON 12 DIAS DE ATRASO
UNE	25845_CN_04	Punto Critico Timasita	4/8/2025	6/9/2025	3/8/2025	22/9/2025	100%	TERMINADO CON 16 DIAS DE ATRASO
UNE	25845_CN_05	Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia	7/8/2025	10/9/2025	12/8/2025	22/9/2025	100%	TERMINADO CON 12 DIAS DE ATRASO
CÁQUEZA	25151_CN_01	1. Colegio Jhon Dalton	20/8/2025	20/9/2025	8/9/2025	30/9/2025	100%	TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO
CÁQUEZA	25151_CN_02	2. Escuela Ubatoque 2	20/8/2025	20/9/2025	8/9/2025	30/9/2025	100%	TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO
CÁQUEZA	25151_CN_03	3. Consolidado Sector El Campin	20/8/2025	20/9/2025	8/9/2025	30/9/2025	100%	TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO
CÁQUEZA	25151_CN_04	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	20/8/2025	20/9/2025	3/9/2025	30/9/2025	100%	TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO
QUETAME	25594_CN_01	1. Escuela Rural Granadillo	11/9/2025	22/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	100%	TERMINADO CON 5 DIAS DE ATRASO
QUETAME	25594_CN_02	2. Intersección Matemango	11/9/2025	22/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	100%	TERMINADO CON 5 DIAS DE ATRASO

3.9 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		AVANCE	DÍAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
SUTATAUSA	25781_CN_01	ESCUELA PALACIO	1/9/2025	11/9/2025	27/8/2025	28/8/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
SUTATAUSA	25781_CN_02	ESCUELA HATO VIEJO	1/9/2025	11/9/2025	27/8/2025	11/9/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
MACHETÁ	25426_CN_01	ESCUELA GUINA	20/9/2025	1/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
SUSA	25779_CN_01	ESCUELA EL TABLON	20/9/2025	1/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	100%	TERMINADO CON 22 DIAS DE ATRASO
TAUSA	25793_CN_01	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	22/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	100%	TERMINADO CON 16 DIAS DE ATRASO
GUATAVITA	25326_CN_01	Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé	22/9/2025	25/10/2025	3/10/2025	6/10/2025	9,47%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
JUNIN	25372_CN_01	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	22/9/2025	16/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	100%	TERMINADO CON 1 DIAS DE ATRASO
JUNIN	25372_CN_02	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	22/9/2025	16/10/2025	7/10/2025	17/10/2025	100%	TERMINADO CON 1 DIAS DE ATRASO
JUNIN	25372_CN_03	Intersección Vía San Roque - Junín	20/10/2025	13/11/2025	25/10/2025	EN EJECUCION	75,39%	0
PARATEBUENO	25530_CN_01	SEC. PLANEACION ING FELIPE PEDROZA ACOMPAÑA DANIELA SALGADO	1/10/2025	27/10/2025			0,00%	0
SAN BERNARDO	25649_CN_02	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	10/10/2025	5/11/2025	21/10/2025	21/10/2025	100%	TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO
SAN BERNARDO	25649_CN_03	3. Institución Educativa Departametal San Bernardo	10/10/2025	5/11/2025	22/10/2025	EN EJECUCION	94,45%	0
UBALA	25839_CN_02	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	28/7/2025	8/8/2025	6/8/2025	17/9/2025	100%	TERMINADO CON 40 DIAS DE ATRASO

3.9 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Fecha Comité	% Ejecutado Físico Sobre el Valor del Contrato	% Planeado en Base a la Meta Contractual	Avance Reportado Entre Comités
4/6/2025	10,20%	15,00%	-
11/6/2025	13,18%	17,50%	2,98%
25/6/2025	19,06%	20,00%	5,88%
2/7/2025	22,27%	24,00%	3,21%
10/7/2025	26,52%	28,00%	4,25%
16/7/2025	29,35%	32,00%	2,83%
22/7/2025	33,70%	35,00%	4,35%
31/7/2025	37,34%	38,00%	3,64%
8/8/2025	40,40%	41,00%	3,06%
14/8/2025	45,20%	44,00%	4,80%
21/8/2025	46,84%	50,00%	1,64%
28/8/2025	49,35%	52,50%	2,51%
4/9/2025	54,09%	55,00%	4,74%
11/9/2025	59,34%	60,00%	5,25%
18/9/2025	70,19%	65,00%	10,85%
25/9/2025	71,10%	70,00%	0,91%
2/10/2025	71,78%	75,00%	0,68%
9/10/2025	73,15%	80,00%	1,37%
20/10/2025	77,97%	90,00%	4,82%
23/10/2025	78,84%	91,25%	0,87%
30/10/2025	82,05%	92,00%	3,21%

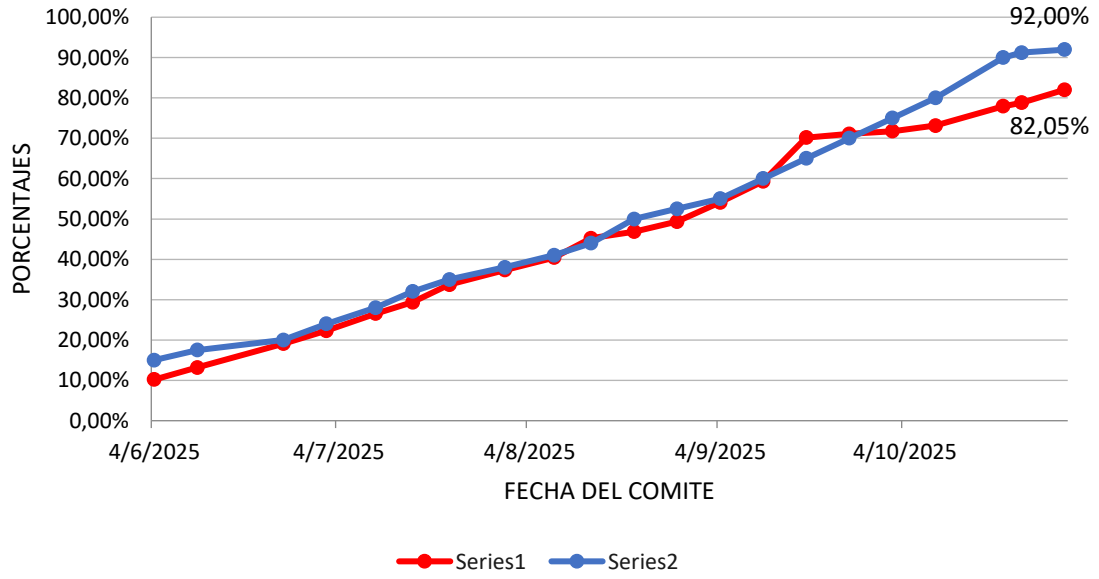

4.1 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO



Seguimiento metas contractuales:

Valor contrato L1 **$3.625.158.6445**

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Fisico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 181.257.932					NO
3	20-may-25	10%	$ 362.515.864,50			$ 369.801.264,58	10,20%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 725.031.729	$ 401.888.576,00	11,09%	$ 807.397.167,00	22,27%	NO
5	20-jul-25	35%	$1.268.805.526	$ 783.692.162,00	21,62%	$ 1.223.717.964,00	33,76%	NO
6	20-ago-25	50%	$1.812.579.323	$ 1.000.662.552,00	27,60%	$ 1.697.861.006,00	46,84%	NO
7	20-sep-25	70%	$2.537.611.052	$ 1.595.960.014,00	44,02%	$ 2.577.624.979,00	71,10%	NO
8	20-oct-25	90%	$3.262.642.781	$ 2.604.844.299,00	71,85%	$ 2.826.558.685,00	77,97%	NO
9	20-nov-25	100%	$3.625.158.645	$ 2.604.844.299,00	71,85%	$ 2.974.573.182,26	82,05%	NO
10	20-dic-25	100%	$3.625.158.645					

4.2 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO



Valor contrato L1 **$$3.625.158.6445**

Relación pagos:

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	3	Tabio (3)	$ 401.888.576,00	11,09 %	$ 401.888.576,00	11,09 %
2	7	Ubaté (2) Ubaque (2) Carmen de Carupa (2) Cucunuba (1)	$ 598.773.976,00	16,52 %	$ 1.000.662.552,00	27,61 %
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

5.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Actividades de implementación Susa 25779_CN_01 ESCUELA EL TABLON



Actividades de implementación Tausa 25793_CN_01 IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO



6. ESTADO DEL CLIMA

Ítem	Estado del Clima	lunes 20 octubre			martes 21 octubre			miércoles 22			jueves 23 octubre			viernes 24 octubre			sábado 25 octubre			domingo 26			TOTAL SEMANAL	TOTAL ACUMULADO
		Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche		
1	Lluvioso Junin																						0	6
2	Lluvioso Tausa																						0	3
3	Lluvioso San Bernardo																						0	0
4	Lluvioso Macheta																						0	0
5	Lluvioso Susa																						0	0

7.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
Puntos con socialización diseños	57
Puntos con actas de entorno	57
Puntos con socialización de cierre	32
Puntos con actas de entorno cierre	32
Actas de inicio de vecindad	24
Actas de cierre de vecindad	5
PQR recibidas	0
PQR atendidas y cerradas	0

7.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Socialización Inicial	Cuenta de Actas de vecindad Inicial	Cuenta de Actas entorno Inicial	Cuenta de Socialización fin	Cuenta de Actas de Cierre de Vecindad	Cuenta de Actas de cierre entorno
GUACHETA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
GUAYABETAL	2	2	1	2			
NEMOCON	1	1	N/A	1	1	N/A	1
QUETAME	2	2	N/A	2			
SIMIJACA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
SUSA	1	1	N/A	1			
SUTATAUSA	2	2	N/A	2	2	N/A	2
TABIO	3	3	2	3	3	2	3
UBALA	2	2	N/A	2	1	N/A	1
UBAQUE	3	3	N/A	3	2	N/A	2
TAUSA	1	1	1	1			
CUCUNUBÁ	1	1	1	1	1	1	1
UBATÉ	2	2	N/A	2	2	N/A	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
MACHETÁ	1	1	N/A	1			
CÁQUEZA	4	4	N/A	4			
UNE	5	5	N/A	5	5	N/A	5
FOSCA	4	4	2	4	4	2	4
PARATEBUENO	1	1	3	1			
TOCANCIPÁ	2	2	N/A	2	2	N/A	2
GUATAVITA	1	1	N/A	1			
JUNIN	3	3	2	3			
SAN BERNARDO	2	2	N/A	2			
ARBELAEZ	2	2	1	2			
PASCA	2	2	7	2			
TENJO	1	1	4	1			
TOTAL	**57**	**57**	**24**	**57**	**32**	**5**	**32**

8.1 SEGUIMIENTO PMT

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
PMT radicados	57
PMT aprobados	56
Puntos con otros permisos requeridos	0
Capacitaciones	0
Accidentes laborales	0

8.2 SEGUIMIENTO PMT

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Radicación PMT	Cuenta de Aprobación PMT
GUACHETA	3	3	3
GUAYABETAL	2	2	2
NEMOCON	1	1	1
QUETAME	2	2	2
SIMIJACA	3	3	3
SUSA	1	1	1
SUTATAUSA	2	2	2
TABIO	3	3	3
UBALA	2	2	2
UBAQUE	3	3	3
TAUSA	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1
UBATÉ	2	2	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	3
MACHETÁ	1	1	1
CÁQUEZA	4	4	4
UNE	5	5	5
FOSCA	4	4	4
PARATEBUENO	1	1	1
TOCANCIPÁ	2	2	2
GUATAVITA	1	1	1
JUNIN	3	3	3
SAN BERNARDO	2	2	2
ARBELAEZ	2	2	2
PASCA	2	2	2
TENJO	1	1	
TOTAL	**57**	**57**	**56**

9. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

Municipio	# de puntos	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA
Tabio	3	APROBADO	
Guayabetal	2	APROBADO	
Ubaque	3	APROBADO	
Nemocón	1	APROBADO	
Simijaca	3	APROBADO	
Guacheta	3	APROBADO	
Ubaté	2	APROBADO	
Ubalá	2	1 APROBADO	
Sutatausa	2	APROBADO	
Susa	1	APROBADO	
Quetame	2	APROBADO	
Carmen de Carupa	3	APROBADO	
Cucunubá	1	APROBADO	
Tausa	1	APROBADO	
Macheta	1	APROBADO	
Tocancipa	2	APROBADO	
Fosca	4	APROBADO	
Caqueza	4	APROBADO	
Une	5	APROBADO	
Guatavita	1	APROBADO	
Paratebueno	1	APROBADO	
Junín	3	APROBADO	
San Bernardo	2	APROBADO	
Arbelaez	2	EN REVISION	
Pasca	2	EN REVISION	
Tenjo	1	SIN ENTREGAR	

10. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES FINALES

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
29 sep al 4 oct	6 oct al 11 oct	13 oct al 18 oct	20 oct al 25 oct	27 oct al 1 nov	3 nov al 8 nov	10 nov al 15 nov
Carmen de carupa (3)	Simijaca (3)	Fosca (4)	Une (5)	Cáqueza (4)	Guachetá (3)	Junín (3)
Cucunuba (1)	Sutatausa (2)	Tocancipá (1)		Ubalá (1)	Guayabetal (2)	Guatavita (1)
Nemocón (1)						

10. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES FINALES

SEGUIMIENTO DE INFORMES FINALES Y COMUNICADOS DE SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SMC EN LA VISTA DE ENTREGA DE LOS PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC									
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA A LA SMC	CUENTA CON ACTA DE VISITA DE ENTREGA FIRMADA POR CONTRATISTA-SMC-INTERVENTORIA	OBSERVACIONES DE CAMPO DE LA SMC	COMUNICADO DE SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SMC EN LA VISITA DE ENTREGA	ESTADO DEL COMUNICADO DE SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SMC EN LA VISITA DE ENTREGA	INFORME FINAL	ESTADO DEL INFORME FINAL	INFORME FINAL ENVIADO A LA SMC
TABIO	Via Tabio - Cajica (Gimansio Campestre Santa Rita de Casia)	20/06/2025	SI	SUBSANADAS	11/07/2025	APROBADO	10/07/2025 05/08/2025 13/08/2025 09/09/2025 25/09/2025 01/10/2025 20/10/2025	EN REVISION	
TABIO	Via Tabio - El Mirador	20/06/2025	SI	SUBSANADAS	11/07/2025	APROBADO	10/07/2025 05/08/2025 13/08/2025 09/09/2025 25/09/2025 01/10/2025 20/10/2025	EN REVISION	
TABIO	Via Tabio - Subachoque	20/06/2025	SI	SUBSANADAS	11/07/2025	APROBADO	10/07/2025 05/08/2025 13/08/2025 09/09/2025 25/09/2025 01/10/2025 20/10/2025	EN REVISION	
UBATÉ	Ubate - Guacheta	18/07/2025	SI	SUBSANADAS	8/08/2025 20/08/2025 29/08/2025	APROBADO	20/08/2025 29/08/2025 08/09/2025 20/10/2025	EN REVISION	9/09/2025
UBATÉ	2. Intersección Colegio Bruselas	18/07/2025	SI	SUBSANADAS	8/08/2025 20/08/2025 29/08/2025	APROBADO	20/08/2025 29/08/2025 08/09/2025 20/10/2025	EN REVISION	9/09/2025
UBAQUE	Ubaque - Chipaque	21/07/2025	SI	SUBSANADAS	8/08/2025 20/08/2025	APROBADO	21/08/2025 27/08/2025 29/08/2025 11/09/2025 01/10/2025 20/10/2025	EN REVISION	
UBAQUE	CURVA UBAQUE - LA UNIÓN	21/07/2025	SI	SUBSANADAS	8/08/2025 20/08/2025	APROBADO	21/08/2025 27/08/2025 29/08/2025 11/09/2025 01/10/2025 20/10/2025	EN REVISION	
CARMEN DE CARUPA	2. Sector La U	19/08/2025	SI	SUBSANADAS	4/09/2025	APROBADO	29/09/2025 20/10/2025	EN REVISION	
CARMEN DE CARUPA	3. Sector El Prado	5/09/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	29/09/2025 20/10/2025	EN REVISION	
CARMEN DE CARUPA	4.Sector Peligros	19/08/2025	SI	SUBSANADAS	4/09/2025	APROBADO	29/09/2025 20/10/2025	EN REVISION	
GUACHETA	ESCUELA LA ISLA	26/08/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	11/09/2025 01/10/2025 20/10/2025	EN REVISION	
GUACHETA	I.E. MIÑA Y TICHA	26/08/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	11/09/2025 01/10/2025 20/10/2025	EN REVISION	
GUACHETA	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	26/08/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	11/09/2025 01/10/2025 20/10/2025	EN REVISION	
SIMIJACA	COLEGIO AGUSTIN PARRA	26/08/2025	SI	SUBSANADAS	16/09/2025	APROBADO	23/10/2025	EN REVISION	
SIMIJACA	ESCUELA EL FICAL	26/08/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	23/10/2025	EN REVISION	
SIMIJACA	ESCUELA EL PANTANO	26/08/2025	SI	SUBSANADAS	16/09/2025	APROBADO	23/10/2025	EN REVISION	
NEMOCON	Escuela La Puerta	5/09/2025	SI	SUBSANADAS	16/09/2025	APROBADO	6/10/2025	EN REVISION	
SUTATAUSA	ESCUELA PALACIO	19/09/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	20/10/2025	EN REVISION	
SUTATAUSA	ESCUELA HATO VIEJO	19/09/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	20/10/2025	EN REVISION	

10. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES FINALES

SEGUIMIENTO DE INFORMES FINALES Y COMUNICADOS DE SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SMC EN LA VISTA DE ENTREGA DE LOS PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC									
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA A LA SMC	CUENTA CON ACTA DE VISITA DE ENTREGA FIRMADA POR CONTRATISTA-SMC-INTERVENTORIA	OBSERVACIONES DE CAMPO DE LA SMC	COMUNICADO DE SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SMC EN LA VISITA DE ENTREGA	ESTADO DEL COMUNICADO DE SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SMC EN LA VISITA DE ENTREGA	INFORME FINAL	ESTADO DEL INFORME FINAL	INFORME FINAL ENVIADO A LA SMC
TOCANCIPÁ	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	19/09/2025	SI			SIN ENTREGAR	23/10/2025	EN REVISION	
UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	6/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	8/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
CÁQUEZA	2. Escuela Ubatoque 2	8/10/2025	SI			SIN ENTREGAR		SIN ENTREGAR	
CÁQUEZA	3. Consolidado Sector El Campin	8/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
CÁQUEZA	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	8/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
FOSCA	1. Colegio IDER	8/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	23/10/2025	EN REVISION	
FOSCA	2. Consolidado El Tablon	8/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	23/10/2025	EN REVISION	
FOSCA	4. Cementerio Municipal	8/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	23/10/2025	EN REVISION	
FOSCA	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	8/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A	23/10/2025	EN REVISION	
QUETAME	1. Escuela Rural Granadillo	8/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
QUETAME	2. Intersección Matemango	8/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
UNE	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	9/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
UNE	Entrada Estación De Servicio Texaco	9/10/2025	SI			SIN ENTREGAR		SIN ENTREGAR	
UNE	Escuela Combura	9/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
UNE	Punto Critico Timasita	9/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
UNE	Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia	9/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
GUAYABETAL	Vda San Antonio Reductores de velocidad / ocho (8)	9/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
GUAYABETAL	Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo	9/10/2025	SI	NO APLICA	N/A	N/A		SIN ENTREGAR	
CUCUNUBÁ	PUNTO CRITICO PR 4+100	19/08/2025	SI	SUBSANADAS	4/09/2025	APROBADO	6/10/2025 21/10/2025	DEVUELTO CON OBSERVACIONES	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se han realizado 57 visitas preliminares de los 57 puntos asignados.
2. A la fecha de este informe se han realizado 57 visitas preliminares de las cuales se han entregado 54 informes de visita preliminar y no se encuentra pendiente por visita preliminar ningún punto.
3. Los 54 informes de visita preliminar que se han entregado corresponden a los puntos presentes en los municipios de Carmen de Carupa (3), Cucunubá (1), Guachetá (3), Guayabetal (2), Fosca (4), Nemocón (1), Simijaca (3), Tabio (3), Ubaque (2) , Ubaté (2), Ubala (1), Une (5), Tocancipá (2), Quetame (2), Sutatausa (2), Cáqueza (4), Macheta (1), Susa (1), Tausa (1), Guatavita (1), Junín (3), Paratebueno (1), San Bernardo (2), Pasca (2) y Arbeláez (2).
4. Los informes de visita previa que ya fueron aprobados por la interventoría corresponden a los 50 puntos presentes en los municipios de Carmen de Carupa (3), Guayabetal (2), Fosca (4), Nemocón (1), Simijaca (3), Tabio (3), Ubaque (2), Ubaté (2), Cucunuba (1), Guachetá (3), Tocancipá (2), Une (5), Ubala (1), Quetame (2), Cáqueza (4), Sutatausa (2) Macheta (1), Susa (1), Tausa (1), Guatavita (1), Junín (3), Paratebueno (1) y San Bernardo (2), los cuales todos cuentan con acta de apropiación.
5. Los informes que fueron enviados por el contratista y se encuentran en revisión por parte de la interventoria son los correspondientes a los 4 puntos ubicados en el municipios de Arbeláez (2) y Pasca (2).
6. Se encuentra pendiente por entregar el informe de visita preliminar del punto ubicado en el municipio de Tenjo.
7. A la fecha 50 puntos cuentan con actas de apropiación suscritas, de los cuales; 47 han sido terminados y se han entregado a la entidad-SMC; 40 que son los que se encuentran ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Simijaca (3), Guachetá (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Quetame (2) y Cáqueza (4) y está pendiente por entregar 7 puntos ubicados en los municipios de Guatavita (1), Junín (2), Susa (1), Tausa (1) Macheta (1) y San Bernardo (1), 2 están en ejecución y 1 se encuentra pendiente por iniciar.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8. Se cuenta con la aprobación de PMT para 56 puntos, correspondientes a los municipios de Susa (1), Sutatausa (2), Simijaca (3), Guachetá (3), Ubaque (3), Quetame (1), Tabio (3), Ubalá (2), Guayabetal (2), Nemocón (1), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Tausa (1), Ubaté (2), Tocancipá (2), Macheta (1), Paratebueno (1), Une (5), Cáqueza (4), Fosca (4), Quetame (1), Guatavita (1), San Bernardo (2), Junín (3), Arbeláez (2) y Pasca (2).
9. A la fecha se encuentra en trámite el PMT del punto ubicado en el municipio de Tenjo.
10. De las observaciones realizadas por la entidad-SMC durante la visita de entrega de los 40 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Simijaca (3), Guachetá (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Quetame (2) y Cáqueza (4) , se encuentran pendientes de subsanación las correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Tocancipá, Cáqueza y Une.
11. Los informes de subsanaciones realizadas en los puntos entregados a la entidad-SMC que fueron entregados por el contratista corresponden a los puntos ubicados en los municipios de Tabio, Ubaté, Ubaque, Carmen de Carupa, Cucunuba Simijaca y Nemocón.
12. De los 47 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 22 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Guachetá (3), Carmen de Carupa (3), Nemocón (1), Cucunuba (1), Simijaca (3), Sutatausa (2) y Tocancipá (2), los cuales ya fueron revisados por la interventoria, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoria se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes.
13. Un 71,85% del valor total del contrato a sido entregado a la entidad - SMC que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 2.604.844.299,00, correspondiente a los 40 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Simijaca (3), Guachetá (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Quetame (2) y Cáqueza (4).
14. A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 82,05% del valor total del contrato.



Gobernación de
Cundinamarca
