Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	VIGENCIA:	**2025/01/22**

ACTA No:	135
FECHA:	27/11/ 2025
CONTRATO No:	C.I. No.STM-CM-010-2025
OBJETO:	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARTICIPANTES	
En Representación de	SMC
NOMBRE	Giovanna Naranjo
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	SMC
NOMBRE	María Virginia Rocha
Cargo	Especialista en transito
En Representación de	SMC
NOMBRE	Juan Heredia
Cargo	Supervisor
En Representación de	SMC
NOMBRE	Alejandro Leguizamo Flórez
Cargo	Profesional Universitario
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Ernesto Perdomo
Cargo	Director Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Dalila Otálora
Cargo	Especialista en Transito
En representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Bibiana Rojas
Cargo	Residente Interventoría

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR				
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**CUMPLIMIENTO**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
Subsanación informes mensuales interventoría No. 5 y 6	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido
Subsanación informe mensual interventoría No. 7	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		X	Sin cumplir
Informe mensual interventoría No. 8	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		X	Sin cumplir
Subsanaciones informes finales Tabio, Vergara, Nemocón, Cucunubá, Anapoima, Villeta EDS.	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		X	Sin cumplir
Entrega informes finales Ubaté, Ubaque, Nimaima	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		X	Sin cumplir
Actas reunión ICCU-Devisab, ANI, Guatavita, Tocancipá.	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido
Respuesta oficio meta mes 8	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		X	Sin cumplir
Solicitud formal borrado demarcación horizontal restaurante Guatavita	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido
Remitir video soporte de balizas y radares calibrados	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido
Revisión paquete de cobro 4 CO	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido parcialmente, pendiente las balizas.
Alcance comunicados inicio Pasca y Zipacón.	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido
Revisión informe La Mesa 2	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido

TEMAS PRESENTE ACTA

En el comité de seguimiento se revisó el estado de los informes mensuales de interventoría correspondientes al N°5 y N°6 mencionando que interventoría hizo la entrega de las subsanaciones y se encuentra en revisión por parte de la entidad.

Respecto a la subsanación de los informes N° 7 y N° 8, la interventoría se comprometió a remitir el informe N° 7 el día de hoy y el informe N° 8 para mañana viernes.

Se enfatizó la importancia de cumplir con los plazos para la radicación de las cuentas, estableciendo como objetivo mínimo presentar las cuentas de cobro N° 5 y N°6, para el día de hoy, y las cuentas N° 7 y N°8 antes del 10 de diciembre 2025.

Asimismo, se advirtió que persisten pendientes de subsanación los informes finales de los siguientes municipios (Tabio Vergara, Nemocón, Cucunuba, Anapoima, Villeta), pese a las comunicaciones previamente remitidas por la interventoría, indicando la fecha de terminación contractual (20 de diciembre).

Finalmente, se planteó que los atrasos en los informes finales podrían deberse a que el contratista estaría priorizando las actividades de cierre y terminación de obras, destinando menos recursos a la elaboración y entrega de la documentación requerida en los informes finales.

Aspectos Contractuales

- La entidad solicita la respuesta por parte de interventoría a la comunicación de la meta contractual 8, Interventoría indica que será entregada el día de mañana.
- Ante la falta de respuesta y el escaso avance por parte del contratista en las subsanaciones requeridas, se analizó la aplicación de las cláusulas contractuales sancionatorias, incluidas las multas, como mecanismo de presión para garantizar el cumplimiento en la entrega de los puntos que cuentan con acta de apropiación y que no están terminados o están sin iniciar.

Aspectos Técnicos

Se evidenció que permanecen sin subsanación varios informes finales (Tabio Vergara, Nemocón, Cucunuba, Anapoima, Villeta). La no entrega de correcciones afecta la estructuración del cierre técnico del contrato, la SMC recordó que el plazo contractual vence el 20 de diciembre 2025.

Seguimiento Metas Contractuales y Cronograma Proyecto

LOTE-1 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

Municipio	# de puntos	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA
TABIO	3	RADICADO A LA SMC	
GUAYABETAL	2	EN REVISION	
UBAQUE	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
NEMOCON	1	RADICADO A LA SMC	
SIMIJACA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
GUACHETA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
UBATE	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
UBALA	1	EN REVISION	
SUTATAUSA	2	EN REVISION	
SUSA	1	SIN ENTREGAR	26/11/2025
QUETAME	2	SIN ENTREGAR	26/11/2025
CARMEN DE CARUPA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
CUCUNUBA	1	RADICADO A LA SMC	
TAUSA	1	EN REVISION	
MACHETA	1	SIN ENTREGAR	
TOCANCIPA	2	EN REVISION	
FOSCA	4	EN REVISION	
CAQUEZA	4	EN REVISION	
UNE	5	EN REVISION	
JUNIN	3	SIN ENTREGAR	26/11/2025

LOTE-2 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES

Municipio	# de puntos	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA
VERGARA	5	RADICADO A LA SMC	
VILLETA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
ANOLAIMA	2	EN REVISION	
NIMAIMA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
PUERTO SALGAR	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
AGUA DE DIOS	2	EN REVISION	
PULI	1	EN REVISION	
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	EN REVISION	
LA VEGA	2	SIN ENTREGAR	
VIOTA	1	EN REVISION	
ALBAN	3	SIN ENTREGAR	
VIANI	3	EN REVISION	
APULO	2	EN REVISION	
YACOPI	1	SIN ENTREGAR	
CHAGUANI	4	SIN ENTREGAR	
NILO	3	EN REVISION	
CAPARRAPI	2	SIN ENTREGAR	
TOPAIPI	2	SIN ENTREGAR	
EL COLEGIO	3	EN REVISION	
ANAPOIMA	4	RADICADO A LA SMC	
CACHIPAY	4	EN REVISION	
EL ROSAL	2	EN REVISION	
FUNZA	2	SIN ENTREGAR	

Aspectos Administrativos y de SST

- Se menciona el cumplimiento por parte del contratista CONSORCIO MS entrega de las planillas correspondiente al informe N°8, haciendo referencia el incumplimiento por parte del CONSORCIO INGENIO VIAL.

Aspectos sociales y/o ambientales

Entre la entidad y la interventoría se da cumplimiento a mesa se trabajó para subsanar los informes mensuales ambientales por parte de interventoría.

Aspectos Presupuestales

Se radica la cuenta N°4 de interventoría en la SMC.

ACCIONES Y COMPROMISOS FORMULADOS EN LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Paquetes de cobro CI 5 y 6	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 27-11-2025
Subsanación Informe Mensual N°7	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 27-11-2025
Subsanación Informe Mensual N°8	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 28-11-2025
Cronograma entrega informes finales	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Respuesta meta contractual 8	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 28-11-2025
Subsanación observaciones visita recibo Une	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			
Revisión concepto resaltos San Bernardo.	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 28-11-2025
Envío proyección cobro 5 L1 y cobro 4 / 5 L2	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			
Subsanaciones informes finales Tabio, Nemocón Cucunubá	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 04-12-2025
Revisiones informes finales Guayabetal, Ubalá, Sutatausa, Tausa, Fosca, Cáqueza, Une	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 04-12-2025
Revisiones informes finales Anolaima, Agua de Dios, Pulí, Guayabal de Siquima, Vianí, Nilo, El Colegio, Cachipay, Rosal	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 04-12-2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Juan Heredia
SUPERVISOR SMC


Firma_____
Nombre: Ernesto Perdomo
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para uso exclusivo del supervisor de SMC: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR SMC

Copia: interventoría
Copia: contratista

- **REGISTRO DE ASISTENCIA**

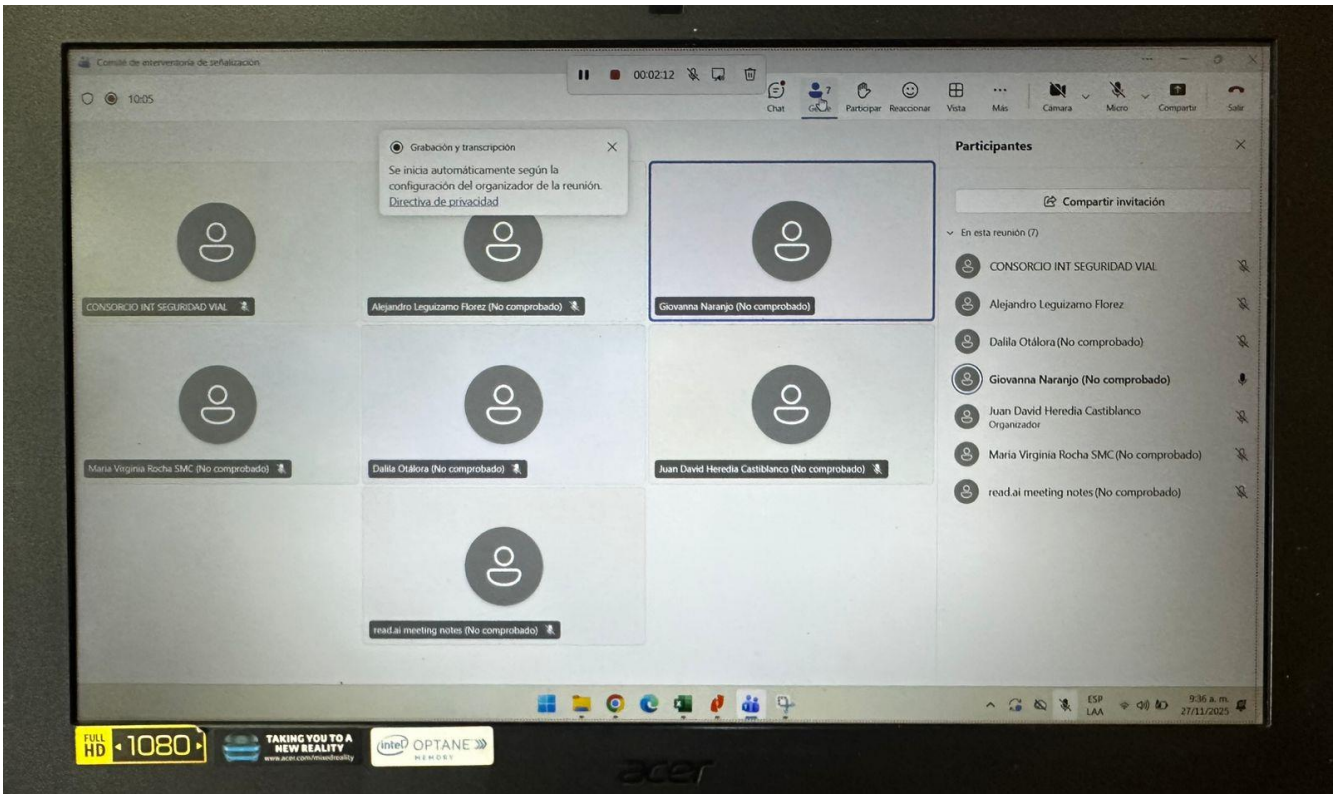

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria de Movilidad Contemporánea -SMC , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página contactenos@cundinamarca.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, SMC sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No 51-53 Bogotá D.C., al correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(601) 7490000, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.
