Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	VIGENCIA:	**2025/01/22**

ACTA No:	139
FECHA:	05/12/ 2025
CONTRATO No:	C.I. No.STM-CM-010-2025
OBJETO:	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARTICIPANTES	
En Representación de	SMC
NOMBRE	Juan Heredia
Cargo	Supervisor
En Representación de	SMC
NOMBRE	Giovanna Naranjo
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	SMC
NOMBRE	María Virginia Rocha
Cargo	Especialista transito
En Representación de	SMC
NOMBRE	Alejandro Leguizamo Flórez
Cargo	Profesional Universitario
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Ernesto Perdomo
Cargo	Director Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Dalila Otalora
Cargo	Especialista Transito
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Bibiana Rojas
Cargo	Residente Interventoría
En Representación de	Consorcio MS
NOMBRE	Juan Diego Román
Cargo	Representante legal suplente
En Representación de	Consorcio MS
NOMBRE	María Stella Agudelo
Cargo	Especialista en Transito

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Planos récord y acta cantidades Tenjo.	CONSORCIO MS	X		04/12/2025 Cumplido
Terminación Paratebueno y Arbeláez.	CONSORCIO MS		X	Sin cumplir
Terminación Tenjo.	CONOSRCIO MS	X		03/12/2025 Cumplido
Informe Mensual N°9	CONSOCIO MS	X		05/12/2025 Cumplido
Balance presupuestal	CONSOCIO MS		X	Sin cumplir
Cronograma visitas de recibo	CONSOCIO MS	X		02/12/2025 Cumplido
Cronograma entrega/subsanaciones informes finales	CONSOCIO MS		X	Sin cumplir
Presupuesto Guatavita	CONSOCIO MS			29/11/2025 Cumplido
Subsanación informes finales Ubaque, Simijaca, Guachetá, Ubaté, Carmen de Carupa.	CONSOCIO MS			
Entrega informes finales Susa, Quetame, Machetá, Junín	CONSOCIO MS	x		27/11/2025 Cumplido parcialmente, entrego Susa y Macheta

TEMAS PRESENTE ACTA

En el presente comité la interventoría menciona sobre el municipio de Tenjo dando a conocer que el contratista ya finalizó las actividades, entregó el acta de mayores y menores y los planos récord y el día de hoy está programada la entrega a la entidad, interventoría pregunta al contratista sobre el avance en la implementación en los municipios, dando a conocer el contratista lo siguiente:

- Actualmente se están ejecutando los resaltos parabólicos en Arbeláez y Pasca, de manera continua.
- Se estima que para final de la semana próxima estén terminadas y listas las obras para ser entregadas a la entidad en Pasca, Arbeláez y Paratebueno,
- También se proyecta iniciar en paralelo el borrado de señalización en Guatavita la próxima semana.

El contratista propone como fecha límite el 15 de diciembre**,** conforme al cronograma entregado, dejando los últimos cinco días para la entrega de subsanaciones llegado el caso.

Respecto al punto de Pasca, se aclara que solo se intervendrá el punto principal donde se ejecutarán los resaltos en asfalto. El otro punto no ha sido intervenido y no está previsto en la ejecución actual.

Se mencionan ajustes de fechas y compromisos de entrega, aunque el cronograma presentado por el contratista indica:

- Arbeláez: 15/12/2025
- Paratebueno: 17/12/2025

La entidad solicita que ambas obras estén completamente listas para el 15 de diciembre, incluyendo:

- Envío de planos récord
- Entrega de actas de cantidades

Esto debido a la necesidad de realizar visitas antes del día 20 de diciembre y a la limitación de personal para cubrir múltiples municipios el mismo día.

Se solicita a la interventoría iniciar con el conteo de cantidades desde ya para agilizar el proceso, interventoría indica que ese procedimiento se esta realizando en conjunto con el contratista.

la interventoría solicita al contratista dejar claro el compromiso; informar fecha exacta de entrega de actas de cantidades y planos récord, de manera que el cronograma de entregas a la entidad se pueda cumplir sin contratiempos.

El contratista menciona:

- Que mantiene proyectado finalizar los municipios en las fechas mencionadas.
- Que las lluvias recientes han generado retrasos significativos.
- Que el compromiso es entregar obras, actas de mayores y menores y planos récord a más tardar el 15 de diciembre.

Sin embargo, el contratista solicita a la entidad evaluar la posibilidad de ser flexibles en caso de que las condiciones climáticas impidan cumplir al 20 de diciembre con la entrega completa. Aun así, asegura estar haciendo lo posible para cumplir en los tiempos previstos, la entidad indica que no se puede ejecutar ni recibir obras fuera del plazo contractual.

La interventoría menciona que el informe mensual N°9 por parte del contratista fue recibido el día de hoy a las 8;32 am y se compromete a revisarlo y emitir concepto al contratista a más tardar el martes 9 de diciembre.

Aspectos Contractuales

VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.625.158.645,00	$ 4.044.608.081,00	111,57%	$ 3.320.420.143,90	91,59%

A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 91,59% del valor total del contrato.

El comité resaltó la urgencia de avanzar con las entregas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Su cumplimiento oportuno es esencial para consolidar los pagos pendientes y evitar la acumulación de saldos al cierre del año.

Aspectos Técnicos

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.625.158.645,00	100%
Puntos entregados por la SMC	57	
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,55	108,48%
Puntos descartados	2	
Valor puntos inicial puntos descartados	$ 66.704.675,40	1,84%
Valor ejecutable puntos entregados	$ 3.865.745.401,15	106,64%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	55	
Presupuesto diseños apropiados	$ 4.044.608.081,00	111,57%
Puntos en ejecución de obra	4	
Puntos terminados	49	
Puntos sin iniciar	2	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	48	
Valor ejecutado físico	$ 3.320.420.143,90	91,59%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 2.983.361.497,00	82,30%

NOTA: Los puntos entregados más recientemente fueron los ubicados en el municipio de San Bernardo el día 1 de diciembre de 2025

Un 82,30% del valor total del contrato ha sido entregado a la entidad - SMC que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 2.983.361.497,00, correspondiente a 48 puntos.

Seguimiento Metas Contractuales y Cronograma Proyecto

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Fisico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 181.257.932					NO
3	20-may-25	10%	$ 362.515.864,50			$ 369.801.264,58	10,20%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 725.031.729	$ 401.888.576,00	11,09%	$ 807.397.167,00	22,27%	NO
5	20-jul-25	35%	$1.268.805.526	$ 783.692.162,00	21,62%	$ 1.223.717.964,00	33,76%	NO
6	20-ago-25	50%	$1.812.579.323	$ 1.000.662.552,00	27,60%	$ 1.697.861.006,00	46,84%	NO
7	20-sep-25	70%	$2.537.611.052	$ 1.595.960.014,00	44,02%	$ 2.577.624.979,00	71,10%	NO
8	20-oct-25	90%	$3.262.642.781	$ 2.604.844.299,00	71,85%	$ 2.826.558.685,00	77,97%	NO
9	20-nov-25	100%	$3.625.158.645	$ 2.918.208.156,00	80,50%	$ 3.305.189.896,06	91,17%	NO
10	20-dic-25	100%	$3.625.158.645	$ 2.983.361.497,00	82,30%	$ 3.320.420.143,90	91,59%	NO

La interventoría aclara que, como es habitual, algunos frentes de trabajo pueden quedar pendientes, con garantías o actividades por subsanar. Estas situaciones serán consignadas en el acta de terminación correspondiente.

Aspectos Administrativos y de SST

De los 49 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 41 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Guachetá (3), Simijaca (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Cáqueza (4), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Susa (1), Tausa (1) y Macheta (1), los cuales ya fueron revisados por la interventoría, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoría se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Tabio, Nemocón y Cucunuba, los cuales ya fueron aprobados por la interventoría y remitidos a la entidad - SMC.

Aspectos sociales y/o ambientales

MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA
TABIO	3	RADICADO A LA SMC	
GUAYABETAL	2	EN REVISION	
UBAQUE	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
NEMOCON	1	RADICADO A LA SMC	
SIMIJACA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
GUACHETA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
UBATE	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
UBALA	1	EN REVISION	
SUTATAUSA	2	EN REVISION	
SUSA	1	EN REVISION	
QUETAME	2	SIN ENTREGAR	29/11/2025
CARMEN DE CARUPA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
CUCUNUBA	1	RADICADO A LA SMC	
TAUSA	1	EN REVISION	
MACHETA	1	EN REVISION	
TOCANCIPA	2	EN REVISION	
FOSCA	4	EN REVISION	
CAQUEZA	4	EN REVISION	
UNE	5	EN REVISION	
JUNIN	3	SIN ENTREGAR	29/11/2025
SAN BERNARDO	2	SIN ENTREGAR	

EN REVISION DE INTERVENTORIA	23
RADICADO A LA SMC	5
DEVUELTO AL CONTRATISTA	13
SIN ENTREGAR	7

A la fecha se encuentra en trámite el PMT del punto ubicado en el municipio Guatavita

La interventoría menciona los compromisos de otros entregables por parte el contratista

- Cronograma de visitas de recibo: fue entregado el 2 de diciembre.
- Cronograma de subsanación de informes finales: se está trabajando mediante mesas técnicas. Ya se han remitido avances de municipios como: Tabio, Nemocón, Cucunubá y Ubaté.

Aspectos Presupuestales

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	3	Tabio (3)	$ 401.888.576,00	11,09 %	$ 401.888.576,00	11,09 %
2	7	Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (2) y Cucunuba (1)	$ 598.773.976,00	16,52 %	$ 1.000.662.552,00	27,61 %
3	12	Carmen de Carupa (1), Guachetá (3), Nemocón (1), Simijaca (3), Sutatausa (2) y Tocancipá (2)	$ 595.297.462,00	16,42%	$ 1.595.960.014,00	44,02%
4	18	Cáqueza (4), Fosca (4), Guayabetal (2), Quetame (2), Ubala (1) y Une (5)	$ 1.008.884.285,00	27,83%	$ 2.604.844.299,00	71,85%

- La interventoría menciona que el balance económico del contratista tenía fecha límite del 29 de noviembre, pero no ha sido entregado, por ende, solicita envío urgente para verificar que no se supere el valor máximo contractual, dando respuesta el contratista lo siguiente:

- Se entregará un balance parcial, dado que aún no está definido el costo final de la implementación en *Guatavita*.
- El documento incluirá los dos puntos de Pasca, ya que aún no se ha ajustado el alcance.
- Es probable que uno de los puntos de Pasca no se implemente debido al presupuesto requerido para Guatavita.
- Se confirma que las señales verticales de ambos puntos ya están fabricadas desde noviembre y deben instalarse para no perder la inversión.
- Queda pendiente confirmar cuál punto de Pasca se ejecutará parcialmente (horizontal y vertical).

Interventoría queda a la espera del envío del balance.

ACCIONES Y COMPROMISOS FORMULADOS EN LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Terminación Paratebueno, Arbeláez, Pasca.	CONSORCIO MS			Compromiso para el 15/12/2025
Balance presupuestal.	CONSORCIO MS			Compromiso para el 05/12/2025
APU Slurry y paquete no previsto.	CONSORCIO MS			Compromiso para el 09/12/2025
Ajuste presupuesto Guatavita.	CONSORCIO MS			Compromiso para el 10/12/2025
Subsanación informes finales Ubaque, Simijaca, Guachetá, Ubaté y Carmen de Carupa.	CONSORCIO MS			Compromiso para el 06/12/2025
Paquete de cobro 5.	CONSORCIO MS			
Verificación parafiscales IM 9.	CONSORCIO MS			Compromiso para el 06/12/2025
Subsanación Tocancipá	CONSORCIO MS			Compromiso para el 11/12/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Juan Heredia
SUPERVISOR SMC

Firma_____
Nombre: Ernesto Perdomo
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Firma_____
Nombre: José Alexander Román
CONTRATISTA

Para uso exclusivo del supervisor de SMC: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR SMC

Copia: interventoría
Copia: contratista

- **REGISTRO DE ASISTENTES**

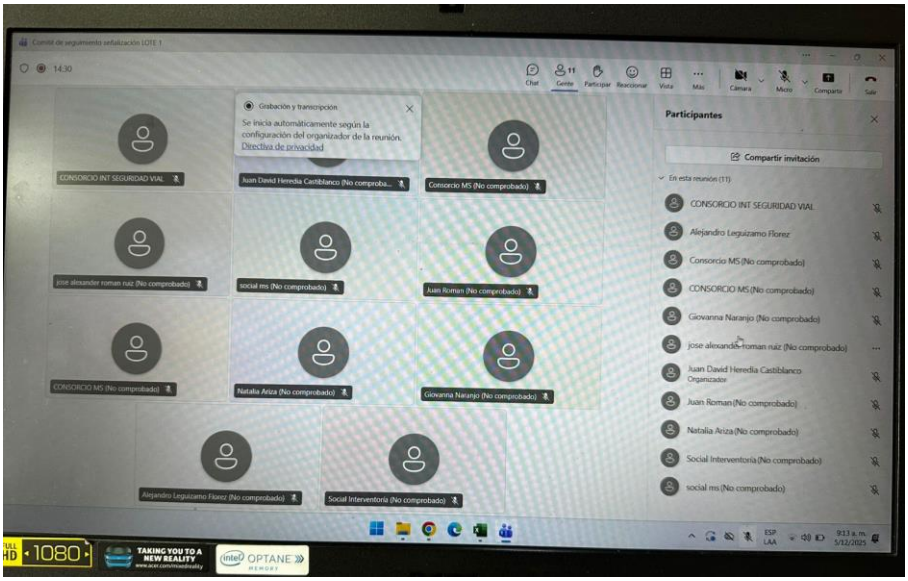

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria de Movilidad Contemporánea -SMC , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página contactenos@cundinamarca.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, SMC sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No 51-53 Bogotá D.C., al correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(601) 7490000, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Comité de seguimiento No. 39

Contrato de obra No. STM-LP-009-2025 (Lote 1)

Contrato de interventoría No. STM-CM-010-2025

Objeto: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Fecha 05-12-2025

CONTENIDO

1 RESUMEN CONTRACTUAL

2 SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

4 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

5 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

6 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Gobernación de Cundinamarca

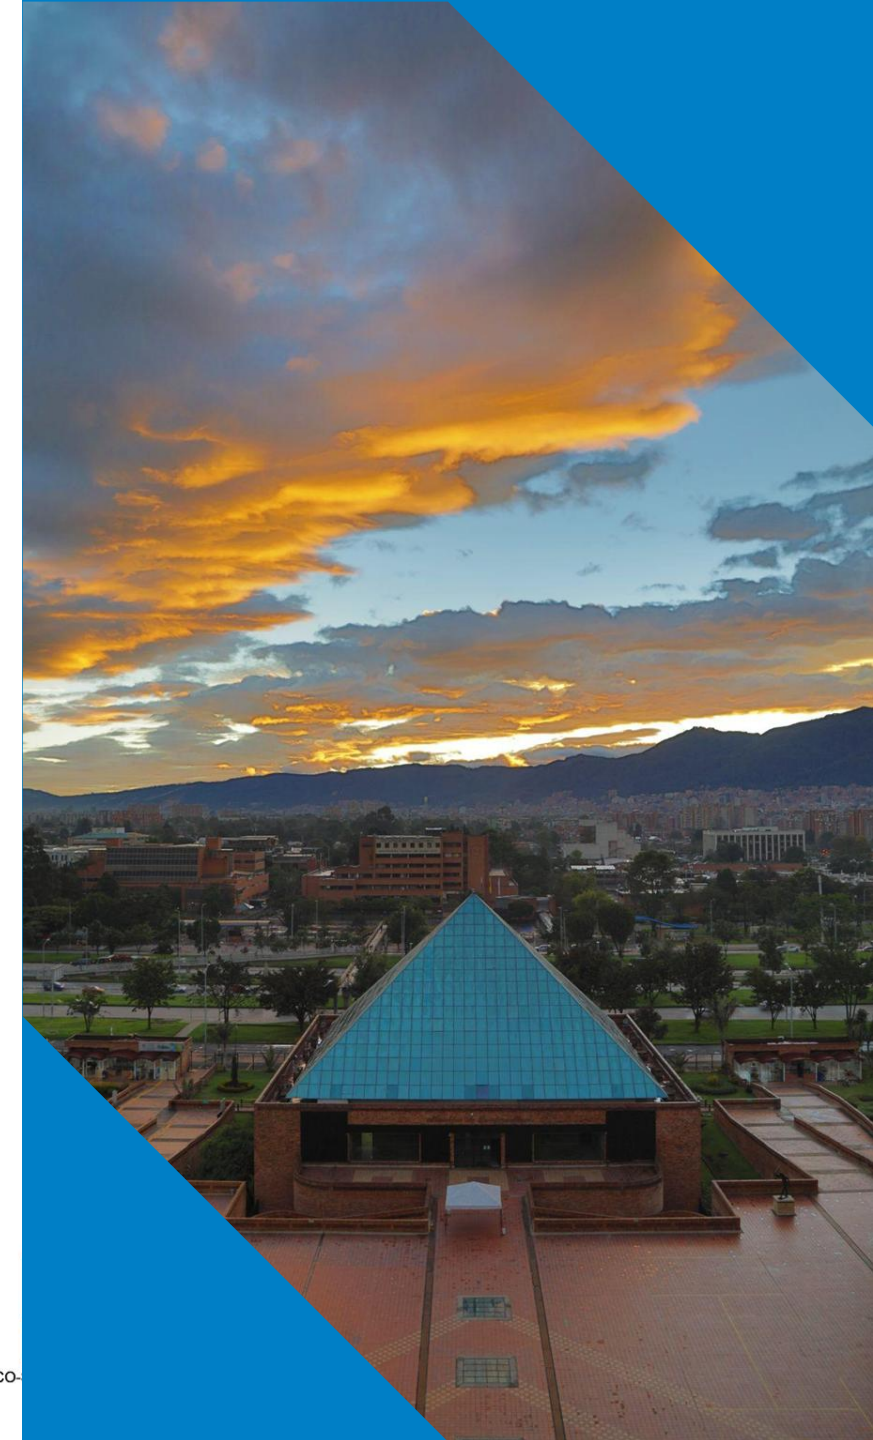

1. RESUMEN CONTRACTUAL

ALCANCE	OBRA	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	**CONSORCIO MS**	**CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**
OBJETO CONTRACTUAL	Implementar intervenciones en infraestructura vial para **mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos** priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca.	Realizar la gerencia integral para la **interventoría técnica, administrativa, financiera, operativa, jurídica, ambiental y social** al contrato cuyo objeto es: implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca.
VALOR DEL CONTRATO	$3.625.158.645,00	$1.651.573.119
ADICIONES	N/A	N/A
PLAZO DE EJECUCION	Diez (10) Meses	Once (11) Meses
FECHA INICIO	21 de febrero 2025	21 de febrero 2025
FECHA TERMINACIÓN	20 de diciembre 2025	20 de enero 2026

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


No.	Compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Fecha de cumplimiento	Observación
1	Terminación de obra en Tenjo	Contratista	30/11/2025	03/12/2025	CUMPLIDO
2	Planos récord y acta cantidades Tenjo	Contratista	02/12/2025	04/12/2025	CUMPLIDO
3	Terminación de obra en Paratebueno y Arbeláez	Contratista	05/12/2025		
4	Entrega informe mensual 9	Contratista	29/11/2025	05/12/2025	CUMPLIDO
5	Envío balance	Contratista	29/11/2025		Sin cumplir
6	Envío cronograma visitas de recibo	Contratista		02/12/2025	CUMPLIDO
7	Envío cronograma entrega/subsanación informes finales	Contratista	28/11/2025		Sin cumplir
8	Concepto presupuesto Guatavita	Contratista	02/12/2025	29/11/2025	CUMPLIDO
9	Subsanación informes finales Ubaque, Simijaca, Guachetá, Ubaté y Carmen de Carupa	Contratista	04/12/2025		
10	Entrega informes finales Susa, Quetame, Machetá, Junín	Contratista	29/11/2025	27/11/2025	CUMPLIDO parcialmente, entrego Susa y Macheta

3.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Valor contrato L1 **$ 3.625.158.645,00**

Diseños entregados por la SMC:

LOTE 1	PUNTOS	PRESUPUESTO INICIAL
ARBELAEZ	2	$ 157.992.025,62
CÁQUEZA	4	$ 220.565.574,30
CARMEN DE CARUPA	3	$ 181.559.364,95
CUCUNUBÁ	1	$ 158.827.207,97
FOSCA	4	$ 374.884.156,17
GUACHETA	3	$ 32.496.594,87
GUATAVITA	1	$ 209.470.309,00
GUAYABETAL	2	$ 102.861.825,82
JUNIN	3	$ 243.478.692,21
MACHETÁ	1	$ 7.215.762,84
NEMOCON	1	$ 46.105.043,95
PARATEBUENO	1	$ 64.083.488,17
PASCA	2	$ 188.692.115,18
QUETAME	2	$ 11.553.368,16
SAN BERNARDO	2	$ 74.351.063,00
SIMIJACA	3	$ 100.749.479,16
SUSA	1	$ 8.677.541,11
SUTATAUSA	2	$ 21.173.954,74
TABIO	3	$ 285.988.462,05
TAUSA	1	$ 12.365.123,90
TENJO	1	$ 227.937.266,83
TOCANCIPÁ	2	$ 322.193.752,89
UBALA	2	$ 139.784.706,60
UBAQUE	3	$ 161.459.558,96
UBATÉ	2	$ 283.259.096,58
UNE	5	$ 294.724.541,51
Total general	**57**	**$ 3.932.450.076,55**

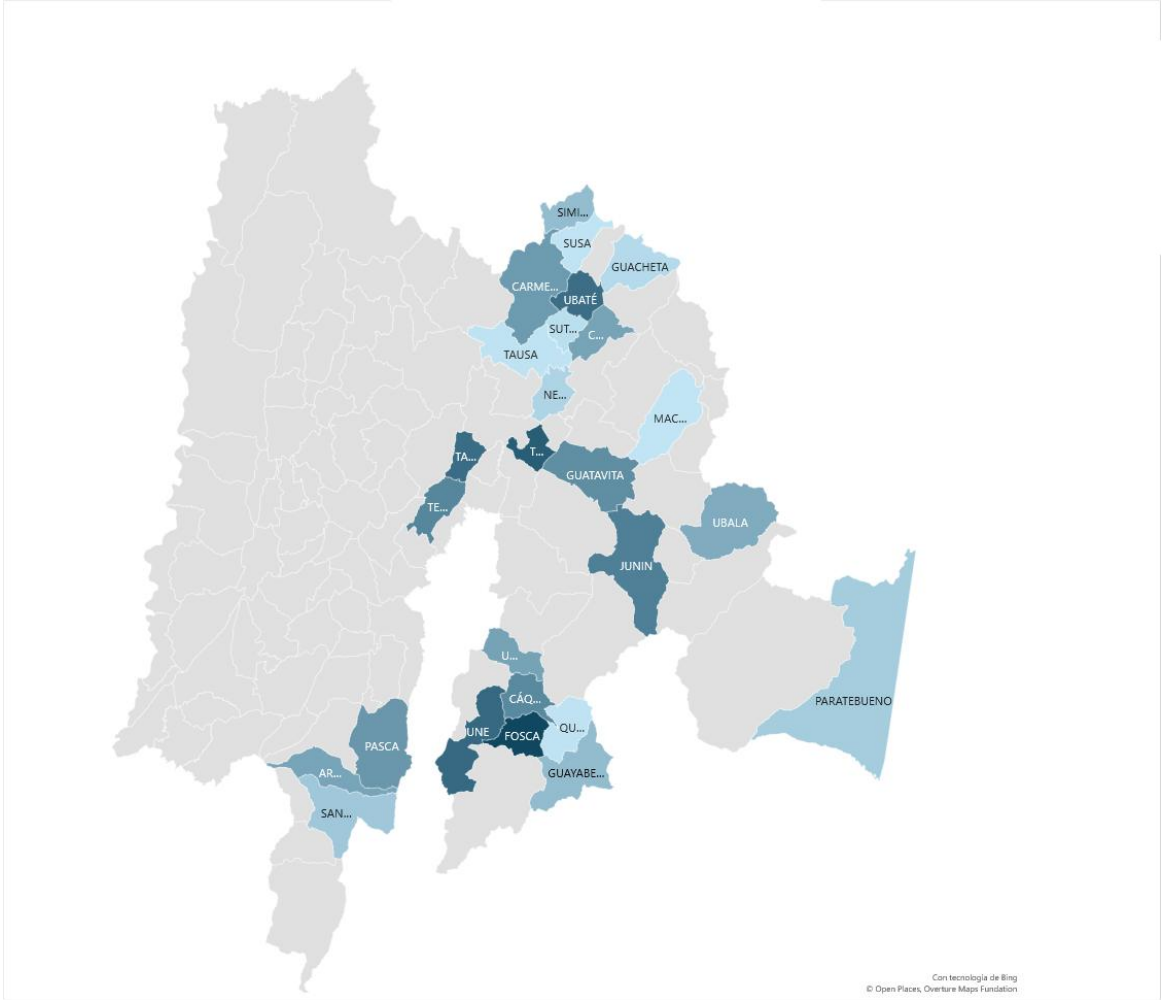

Gobernación de Cundinamarca

ENTIDAD CERTIFICADA

CO-SC-CER303297 ST-CER655785 CO-SI-CER1017570

3.2 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,55
Puntos con visita de reconocimiento	57
Puntos descartados	2
Entrega informe visita	55
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	55
Presupuesto diseños apropiados	$ 4.044.608.081,00

3.3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta Visita preliminar	Cuenta de Entrega REAL informe visita	Cuenta de Aprobación informe
GUACHETA	3	3	3	3
GUAYABETAL	2	2	2	2
NEMOCON	1	1	1	1
QUETAME	2	2	2	2
SIMIJACA	3	3	3	3
SUSA	1	1	1	1
SUTATAUSA	2	2	2	2
TABIO	3	3	3	3
UBALA	2	2	1	1
UBAQUE	3	3	2	2
TAUSA	1	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1	1
UBATÉ	2	2	2	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	3	3
MACHETÁ	1	1	1	1
CÁQUEZA	4	4	4	4
UNE	5	5	5	5
FOSCA	4	4	4	4
PARATEBUENO	1	1	1	1
TOCANCIPÁ	2	2	2	2
GUATAVITA	1	1	1	1
JUNIN	3	3	3	3
SAN BERNARDO	2	2	2	2
ARBELAEZ	2	2	2	2
PASCA	2	2	2	2
TENJO	1	1	1	1
TOTAL	**57**	**57**	**55**	**55**

NOTA: Los puntos de Ubala y Ubaque que fueron descartados no requieren informe de visita preliminar.

3.5 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.625.158.645,00	100%
Puntos entregados por la SMC	57	
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,55	108,48%
Puntos descartados	2	
Valor puntos inicial puntos descartados	$ 66.704.675,40	1,84%
Valor ejecutable puntos entregados	$ 3.865.745.401,15	106,64%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	55	
Presupuesto diseños apropiados	$ 4.044.608.081,00	111,57%
Puntos en ejecución de obra	4	
Puntos terminados	49	
Puntos sin iniciar	2	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	48	
Valor ejecutado físico	$ 3.320.420.143,90	91,59%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 2.983.361.497,00	82,30%

NOTA: Los puntos entregados más recientemente fueron los ubicados en el municipio de San Bernardo el día 1 de diciembre de 2025.

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO
TABIO	Via Tabio - Cajica (Gimansio Campestre Santa Rita de Casia)	20/6/2025	$ 72.327.600,44	$ 74.833.799,00	$ 72.958.463,00	2,01%
TABIO	Via Tabio - El Mirador	20/6/2025	$ 65.602.005,61	$ 66.222.302,00	$ 66.388.347,00	1,83%
TABIO	Via Tabio - Subachoque	20/6/2025	$ 148.058.856,00	$ 258.580.216,00	$ 262.541.766,00	7,24%
UBATÉ	Ubate - Guacheta	18/7/2025	$ 56.598.728,05	$ 58.724.511,00	$ 78.504.970,00	2,17%
UBATÉ	2. Intersencción Colegio Bruselas	18/7/2025	$ 226.660.368,53	$ 148.029.600,00	$ 148.553.469,00	4,10%
UBAQUE	Ubaque - Chipaque	21/7/2025	$ 97.753.384,08	$ 113.492.344,00	$ 106.364.047,00	2,93%
UBAQUE	CURVA UBAQUE - LA UNIÓN	21/7/2025	$ 54.331.837,16	$ 55.728.450,00	$ 48.381.100,00	1,33%
CARMEN DE CARUPA	2. Sector La U	19/8/2025	$ 58.381.952,38	$ 58.036.759,00	$ 50.958.139,00	1,41%
CARMEN DE CARUPA	3. Sector El Prado	5/9/2025	$ 83.638.091,86	$ 77.764.628,00	$ 75.709.222,00	2,09%
CARMEN DE CARUPA	4.Sector Peligros	19/8/2025	$ 39.539.320,71	$ 43.884.752,00	$ 44.284.303,00	1,22%
GUACHETA	ESCUELA LA ISLA	26/8/2025	$ 13.792.670,76	$ 31.444.186,00	$ 30.404.041,00	0,84%
GUACHETA	I.E. MIÑA Y TICHA	26/8/2025	$ 13.035.646,11	$ 13.511.162,00	$ 11.509.923,00	0,32%
GUACHETA	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	26/8/2025	$ 5.668.278,00	$ 7.832.442,00	$ 7.832.441,00	0,22%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
SIMIJACA	COLEGIO AGUSTIN PARRA	26/8/2025	$ 60.682.955,32	$ 59.584.972,00	$ 46.423.414,00	1,28%
SIMIJACA	ESCUELA EL FICAL	26/8/2025	$ 20.238.121,60	$ 10.901.006,00	$ 11.407.589,00	0,31%
SIMIJACA	ESCUELA EL PANTANO	26/8/2025	$ 19.828.402,24	$ 21.115.706,00	$ 22.627.387,00	0,62%
NEMOCON	Escuela La Puerta	5/9/2025	$ 46.105.043,95	$ 37.467.306,00	$ 36.562.501,00	1,01%
SUTATAUSA	ESCUELA PALACIO	16/9/2025	$ 5.459.679,72	$ 5.459.680,00	$ 5.459.679,00	0,15%
SUTATAUSA	ESCUELA HATO VIEJO	16/9/2025	$ 15.714.275,02	$ 15.714.275,00	$ 14.294.984,00	0,39%
TOCANCIPÁ	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	16/9/2025	$ 298.600.598,51	$ 307.479.873,62	$ 309.473.126,62	8,54%
TOCANCIPÁ	Complemento C.R. ENTRELOMAS	16/9/2025	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	0,65%
UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	6/10/2025	$ 82.454.368,92	$ 88.176.030,00	$ 85.859.060,00	2,37%
CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	8/10/2025	$ 44.421.570,34	$ 47.985.697,00	$ 42.948.940,00	1,18%
CÁQUEZA	2. Escuela Ubatoque 2	8/10/2025	$ 33.370.969,16	$ 37.389.635,00	$ 36.516.713,00	1,01%
CÁQUEZA	3. Consolidado Sector El Campin	8/10/2025	$ 106.304.301,84	$ 111.048.567,00	$ 96.329.604,00	2,66%
CÁQUEZA	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	8/10/2025	$ 36.468.732,96	$ 43.335.493,00	$ 41.426.891,00	1,14%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
FOSCA	1. Colegio IDER	8/10/2025	$ 24.920.127,94	$ 25.167.041,00	$ 22.846.901,00	0,63%
FOSCA	2. Consolidado El Tablon	8/10/2025	$ 231.072.196,83	$ 256.713.360,00	$ 179.854.339,00	4,96%
FOSCA	4. Cementerio Municipal	8/10/2025	$ 74.910.059,06	$ 79.401.526,00	$ 61.955.299,00	1,71%
FOSCA	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	8/10/2025	$ 43.981.772,34	$ 17.517.093,00	$ 11.506.821,00	0,32%
QUETAME	1. Escuela Rural Granadillo	8/10/2025	$ 7.186.556,52	$ 6.640.156,00	$ 6.640.155,00	0,18%
QUETAME	2. Intersección Matemango	8/10/2025	$ 4.366.811,64	$ 7.142.509,00	$ 7.142.510,00	0,20%
UNE	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	9/10/2025	$ 38.679.548,56	$ 57.483.723,00	$ 49.665.362,00	1,37%
UNE	Entrada Estación De Servicio Texaco	9/10/2025	$ 90.661.608,58	$ 93.018.609,00	$ 82.695.312,00	2,28%
UNE	Escuela Combura	9/10/2025	$ 51.293.279,40	$ 69.832.283,00	$ 64.540.095,00	1,78%
UNE	Punto Critico Timasita	9/10/2025	$ 46.776.621,94	$ 51.974.008,00	$ 51.057.446,00	1,41%
UNE	Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia	9/10/2025	$ 67.313.483,03	$ 75.517.082,00	$ 71.006.743,00	1,96%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
GUAYABETAL	Vda San Antonio	9/10/2025	$ 60.847.191,37	$ 61.172.852,00	$ 56.450.044,00	1,56%
GUAYABETAL	Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo	9/10/2025	$ 42.014.634,45	$ 37.786.733,00	$ 40.442.050,00	1,12%
SUSA	ESCUELA EL TABLON	29/10/2025	$ 8.677.541,11	$ 15.791.947,00	$ 13.576.914,00	0,37%
TAUSA	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	29/10/2025	$ 12.365.123,90	$ 22.183.503,00	$ 21.742.674,00	0,60%
JUNIN	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	20/11/2025	$ 67.183.349,24	$ 74.599.696,00	$ 83.766.171,00	2,31%
JUNIN	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	20/11/2025	$ 123.628.932,61	$ 128.065.777,00	$ 135.529.683,00	3,74%
JUNIN	Intersección Vía San Roque - Junín	20/11/2025	$ 52.666.410,36	$ 53.476.141,00	$ 50.967.739,00	1,41%
MACHETÁ	ESCUELA GUINA	20/11/2025	$ 7.215.762,84	$ 7.780.676,00	$ 7.780.676,00	0,21%
SAN BERNARDO	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	1/12/2025	$ 10.363.250,00	$ 17.345.215,00	$ 17.064.451,00	0,47%
SAN BERNARDO	3. Institución Educativa Departametal San Bernardo	1/12/2025	$ 63.987.813,00	$ 47.218.098,00	$ 48.088.890,00	1,33%
CUCUNUBÁ	PUNTO CRITICO PR 4+100	19/8/2025	$ 158.827.207,97	$ 163.518.183,00	$ 121.727.948,00	3,36%
TOTAL	48		$ 3.017.570.196,35	$ 3.186.682.758,00	$ 2.983.361.497,00	82,30%

3.7 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

CODIGO DEL PUNTO	MUNICIPIO	PUNTO	VALOR INICIAL	VALOR APROPIACION DISEÑO	DIFERENCIA	DIFERENCIA EN %	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE AVANCE DE IMPLEMENTACION DISEÑOS APROPIADOS
25530_CN_01	PARATEBUENO	Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso	$ 64.083.488,17	$ 67.434.570,00	$ 3.351.081,83	5,23%	$ 36.259.568,29	53,77%
25799_CN_03	TENJO	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	$ 227.937.266,83	$ 227.644.231,00	-$ 293.035,83	-0,13%	$ 185.894.279,03	81,66%
25053_CN_02	ARBELAEZ	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	$ 69.552.853,92	$ 69.025.528,00	-$ 527.325,92	-0,76%	$ 46.309.226,74	67,09%
25053_CN_03	ARBELAEZ	SECTOR: KIRPALAMAR	$ 88.439.171,70	$ 89.192.907,00	$ 753.735,30	0,85%	$ 49.546.659,84	55,55%
25535_CN_01	PASCA	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	$ 87.383.268,46	$ 90.654.141,00	$ 3.270.872,54	3,74%		
25535_CN_02	PASCA	VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	$ 101.308.846,72	$ 100.402.971,00	-$ 905.875,72	-0,89%		
TOTAL			$ 3.865.745.401,15	$ 4.044.608.081,00	$ 178.862.679,85	4,63%	$ 3.320.420.143,90	92,14%


VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.625.158.645,00	$ 4.044.608.081,00	111,57%	$ 3.320.420.143,90	91,59%

3.9 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		AVANCE	DÍAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
PARATEBUENO	25530_CN_01	SEC. PLANEACION ING FELIPE PEDROZA ACOMPAÑA DANIELA SALGADO	1/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	EN EJECUCION	53,77%	38
TENJO	25799_CN_03	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	7/11/2025	5/12/2025	7/11/2025	EN EJECUCION	81,66%	0
ARBELAEZ	25053_CN_02	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	10/11/2025	2/12/2025	10/11/2025	EN EJECUCION	67,09%	2
ARBELAEZ	25053_CN_03	SECTOR: KIRPALAMAR	10/11/2025	2/12/2025	10/11/2025	EN EJECUCION	55,55%	2
PASCA	25535_CN_01	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	18/11/2025	11/12/2025			0,00%	0
PASCA	25535_CN_02	VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	18/11/2025	11/12/2025			0,00%	0

3.9 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Fecha Comité	% Ejecutado Físico Sobre el Valor del Contrato	% Planeado en Base a la Meta Contractual	Avance Reportado Entre Comités
4/6/2025	10,20%	15,00%	-
11/6/2025	13,18%	17,50%	2,98%
25/6/2025	19,06%	20,00%	5,88%
2/7/2025	22,27%	24,00%	3,21%
10/7/2025	26,52%	28,00%	4,25%
16/7/2025	29,35%	32,00%	2,83%
22/7/2025	33,70%	35,00%	4,35%
31/7/2025	37,34%	38,00%	3,64%
8/8/2025	40,40%	41,00%	3,06%
14/8/2025	45,20%	44,00%	4,80%
21/8/2025	46,84%	50,00%	1,64%
28/8/2025	49,35%	52,50%	2,51%
4/9/2025	54,09%	55,00%	4,74%
11/9/2025	59,34%	60,00%	5,25%
18/9/2025	70,19%	65,00%	10,85%
25/9/2025	71,10%	70,00%	0,91%
2/10/2025	71,78%	75,00%	0,68%
9/10/2025	73,15%	80,00%	1,37%
20/10/2025	77,97%	90,00%	4,82%
23/10/2025	78,84%	91,25%	0,87%
30/10/2025	82,05%	92,00%	3,21%
6/11/2025	83,34%	94,00%	1,29%
13/11/2025	84,05%	96,00%	0,71%
20/11/2025	88,91%	100%	4,86%
27/11/2025	91,17%	100%	2,26%
4/12/2025	91,59%	100%	0,42%

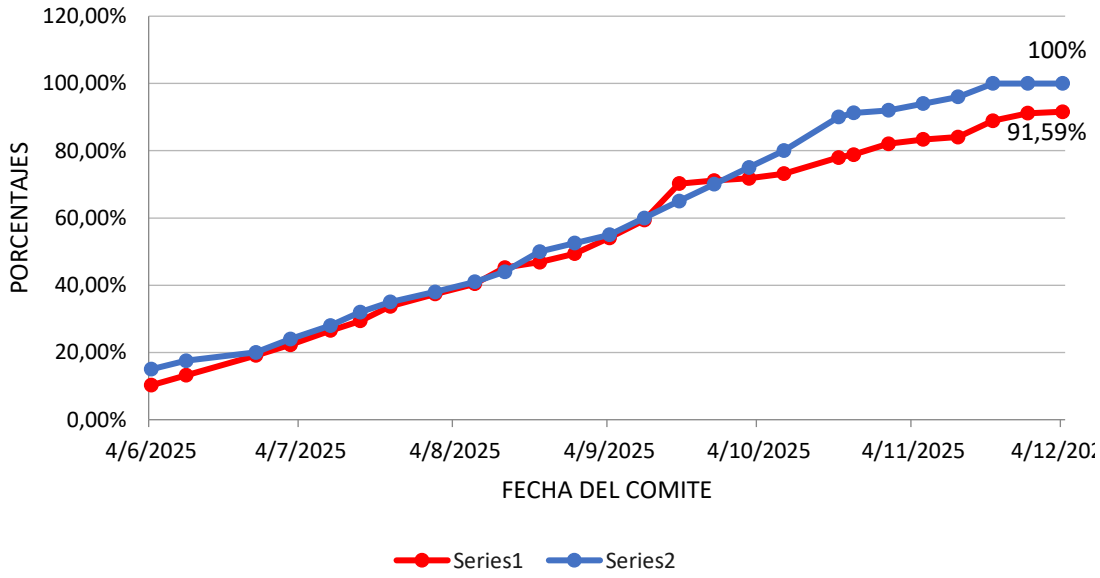

4.1 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO



Seguimiento metas contractuales:

Valor contrato L1 **$3.625.158.6445**

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Fisico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 181.257.932					NO
3	20-may-25	10%	$ 362.515.864,50			$ 369.801.264,58	10,20%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 725.031.729	$ 401.888.576,00	11,09%	$ 807.397.167,00	22,27%	NO
5	20-jul-25	35%	$1.268.805.526	$ 783.692.162,00	21,62%	$ 1.223.717.964,00	33,76%	NO
6	20-ago-25	50%	$1.812.579.323	$ 1.000.662.552,00	27,60%	$ 1.697.861.006,00	46,84%	NO
7	20-sep-25	70%	$2.537.611.052	$ 1.595.960.014,00	44,02%	$ 2.577.624.979,00	71,10%	NO
8	20-oct-25	90%	$3.262.642.781	$ 2.604.844.299,00	71,85%	$ 2.826.558.685,00	77,97%	NO
9	20-nov-25	100%	$3.625.158.645	$ 2.918.208.156,00	80,50%	$ 3.305.189.896,06	91,17%	NO
10	20-dic-25	100%	$3.625.158.645	$ 2.983.361.497,00	82,30%	$ 3.320.420.143,90	91,59%	NO

4.2 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor contrato L1 **$$3.625.158.6445**

Relación pagos:

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	3	Tabio (3)	$ 401.888.576,00	11,09 %	$ 401.888.576,00	11,09 %
2	7	Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (2) y Cucunuba (1)	$ 598.773.976,00	16,52 %	$ 1.000.662.552,00	27,61 %
3	12	Carmen de Carupa (1), Guachetá (3), Nemocón (1), Simijaca (3), Sutatausa (2) y Tocancipá (2)	$ 595.297.462,00	16,42%	$ 1.595.960.014,00	44,02%
4	18	Cáqueza (4), Fosca (4), Guayabetal (2), Quetame (2), Ubala (1) y Une (5)	$ 1.008.884.285,00	27,83%	$ 2.604.844.299,00	71,85%
5						
6						
7						
8						
9						
10						

5.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Actividades de implementación Tenjo 25799_CN_03 Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio



Actividades de implementación San Bernardo 25649_CN_03 3. Institución Educativa Departamental San Bernardo



6. ESTADO DEL CLIMA

Ítem	Estado del Clima	lunes 24			martes 25			miércoles 26			jueves 27			viernes 28			sábado 29			domingo 30			TOTAL SEMANAL	TOTAL ACUMULADO
		Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche		
1	Lluvioso Tenjo																						0	13
2	Lluvioso Arbelaez																						0	0
3	Lluvioso Paratebueno																						0	0
4	Lluvioso San Bernardo																						0	0

7.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
Puntos con socialización diseños	57
Puntos con actas de entorno	57
Puntos con socialización de cierre	48
Puntos con actas de entorno cierre	48
Actas de inicio de vecindad	24
Actas de cierre de vecindad	9
PQR recibidas	0
PQR atendidas y cerradas	0

7.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Socialización Inicial	Cuenta de Actas de vecindad Inicial	Cuenta de Actas entorno Inicial	Cuenta de Socialización fin	Cuenta de Actas de Cierre de Vecindad	Cuenta de Actas de cierre entorno
GUACHETA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
GUAYABETAL	2	2	1	2	2	1	2
NEMOCON	1	1	N/A	1	1	N/A	1
QUETAME	2	2	N/A	2	2	N/A	2
SIMIJACA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
SUSA	1	1	N/A	1	1	N/A	1
SUTATAUSA	2	2	N/A	2	2	N/A	2
TABIO	3	3	2	3	3	2	3
UBALA	2	2	N/A	2	1	N/A	1
UBAQUE	3	3	N/A	3	2	N/A	2
TAUSA	1	1	1	1	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1	1	1	1	1
UBATÉ	2	2	N/A	2	2	N/A	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
MACHETÁ	1	1	N/A	1	1	N/A	1
CÁQUEZA	4	4	N/A	4	4	N/A	4
UNE	5	5	N/A	5	5	N/A	5
FOSCA	4	4	2	4	4	2	4
PARATEBUENO	1	1	3	1			
TOCANCIPÁ	2	2	N/A	2	2	N/A	2
GUATAVITA	1	1	N/A	1			
JUNIN	3	3	2	3	3	2	3
SAN BERNARDO	2	2	N/A	2	2	N/A	2
ARBELAEZ	2	2	1	2			
PASCA	2	2	7	2			
TENJO	1	1	4	1			
TOTAL	**57**	**57**	**24**	**57**	**48**	**9**	**48**

8.1 SEGUIMIENTO PMT

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
PMT radicados	57
PMT aprobados	56
Puntos con otros permisos requeridos	0
Capacitaciones	0
Accidentes laborales	0

8.2 SEGUIMIENTO PMT

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Radicación PMT	Cuenta de Aprobación PMT
GUACHETA	3	3	3
GUAYABETAL	2	2	2
NEMOCON	1	1	1
QUETAME	2	2	2
SIMIJACA	3	3	3
SUSA	1	1	1
SUTATAUSA	2	2	2
TABIO	3	3	3
UBALA	2	2	2
UBAQUE	3	3	3
TAUSA	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1
UBATÉ	2	2	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	3
MACHETÁ	1	1	1
CÁQUEZA	4	4	4
UNE	5	5	5
FOSCA	4	4	4
PARATEBUENO	1	1	1
TOCANCIPÁ	2	2	2
GUATAVITA	1	1	
JUNIN	3	3	3
SAN BERNARDO	2	2	2
ARBELAEZ	2	2	2
PASCA	2	2	2
TENJO	1	1	1
TOTAL	**57**	**57**	**56**

9. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES DE VISITA PRELIMINAR

MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA
TABIO	3	APROBADO	
GUAYABETAL	2	APROBADO	
UBAQUE	2	APROBADO	
NEMOCON	1	APROBADO	
SIMIJACA	3	APROBADO	
GUACHETA	3	APROBADO	
UBATE	2	APROBADO	
UBALA	1	APROBADO	
SUTATAUSA	2	APROBADO	
SUSA	1	APROBADO	
QUETAME	2	APROBADO	
CARMEN DE CARUPA	3	APROBADO	
CUCUNUBA	1	APROBADO	
TAUSA	1	APROBADO	
MACHETA	1	APROBADO	
TOCANCIPA	2	APROBADO	
FOSCA	4	APROBADO	
CAQUEZA	4	APROBADO	
UNE	5	APROBADO	
GUATAVITA	1	APROBADO	
PARATEBUENO	1	APROBADO	
JUNIN	3	APROBADO	
SAN BERNARDO	2	APROBADO	
ARBELAEZ	2	APROBADO	
PASCA	2	APROBADO	
TENJO	1	APROBADO	

10. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES FINALES

MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA
TABIO	3	RADICADO A LA SMC	
GUAYABETAL	2	EN REVISION	
UBAQUE	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
NEMOCON	1	RADICADO A LA SMC	
SIMIJACA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
GUACHETA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
UBATE	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
UBALA	1	EN REVISION	
SUTATAUSA	2	EN REVISION	
SUSA	1	EN REVISION	
QUETAME	2	SIN ENTREGAR	29/11/2025
CARMEN DE CARUPA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	
CUCUNUBA	1	RADICADO A LA SMC	
TAUSA	1	EN REVISION	
MACHETA	1	EN REVISION	
TOCANCIPA	2	EN REVISION	
FOSCA	4	EN REVISION	
CAQUEZA	4	EN REVISION	
UNE	5	EN REVISION	
JUNIN	3	SIN ENTREGAR	29/11/2025
SAN BERNARDO	2	SIN ENTREGAR	

EN REVISION DE INTERVENTORIA	**23**
RADICADO A LA SMC	**5**
DEVUELTO AL CONTRATISTA	**13**
SIN ENTREGAR	**7**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se han realizado 57 visitas preliminares de las cuales se han entregado 55 informes de visita preliminar y no se encuentra pendiente por visita preliminar ningún punto.
2. 55 puntos cuentan con actas de apropiación suscritas, de los cuales; 49 han sido terminados y se han entregado a la entidad-SMC; 48 y está pendiente por entregar 1 punto, 4 están en ejecución y 2 se encuentra pendiente por iniciar.
3. A la fecha se encuentra en trámite el PMT del punto ubicado en el municipio Guatavita.
4. De los 49 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 41 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Guachetá (3), Simijaca (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Cáqueza (4), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Susa (1), Tausa (1) y Macheta (1), los cuales ya fueron revisados por la interventoria, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoria se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Tabio, Nemocón y Cucunuba, los cuales ya fueron aprobados por la interventoria y remitidos a la entidad - SMC.
5. Un 82,30% del valor total del contrato a sido entregado a la entidad - SMC que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 2.983.361.497,00, correspondiente a 48 puntos.
6. A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 91,59% del valor total del contrato.



Gobernación de
Cundinamarca
