ACTA No:	141
FECHA:	15/12/ 2025
CONTRATO No:	C.I. No.STM-CM-010-2025
OBJETO:	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARTICIPANTES	
En Representación de	SMC
NOMBRE	Giovanna Naranjo
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	SMC
NOMBRE	María Virginia Rocha
Cargo	Especialista en transito
En Representación de	SMC
NOMBRE	Juan Heredia
Cargo	Supervisor
En Representación de	SMC
NOMBRE	Alejandro Leguizamo Flórez
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Ernesto Perdomo
Cargo	Director Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Dalila Otálora
Cargo	Especialista en Transito
En representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Bibiana Rojas
Cargo	Residente Interventoría

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR				
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**CUMPLIMIENTO**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
Paquete de Cobro N°7	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido
Revisión informes mensuales 9 CO	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido parcialmente, Lote – 2 no ha enviado planillas.
Mesa de trabajo CO y CI para avanzar con informes finales y entregar reporte actualizado	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido
Envío de cronograma de entrega informes finales L1 y L2	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido
Envío reportes diarios	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	X		Cumplido
Informe mensual 9	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		X	Sin cumplir

TEMAS PRESENTE ACTA

En el presente comité la entidad menciono que las cuentas de cobro por parte de interventoría No.6, No.7 Y No.8 fueron radicadas a la SMC.

Referente a las cuentas de cobro No. 5 por parte de los contratistas se informa:

- Contratista MS: Radicó la cuenta de cobro No.5, se encuentra al día en parafiscales y está en proceso de revisión por parte la interventoría, se proyecta su trámite entre hoy y mañana.
- Contratista Ingenio Vial: presenta observaciones en el informe No.9 por falta de entrega de planillas parafiscales e informe ambiental, de igual manera presenta observaciones en los documentos de la cuenta, a la fecha se informa que el contratista no ha subsanado.

La entidad recuerda que los paquetes radicados hasta el 16 de diciembre podrán pagarse en la vigencia actual; los radicados posteriormente quedarán como cuentas por pagar del próximo año.

Interventoría procede a mencionar el estado actual de los informes mensuales de los contratistas y de interventoría, en cuanto al informe mensual No. 9 del contratista de obra LOTE-1 cumplió con su entrega, las planillas de seguridad social, pero se devuelve el informe porque presento observaciones del componente técnico, aclarando que si el contratista cumple

con la subsanación pueden proceder a la radicación. Para el LOTE -2 no ha cumplido con las entregas de las planillas de seguridad social.

El informe mensual No.9 de interventoría se radicará en el transcurso del día, con el fin de permitir su revisión antes del cierre de vigencia.

Respecto al estado actual de los informes finales se menciona:

- Interventoría entrego reporte del estado de los informes finales a la SMC. La entidad solicitó complementar el cuadro incluyendo una columna con el estado de revisión (aprobado / con observaciones).
- La interventoría se comprometió a remitir el cuadro actualizado en formato Excel, con el estado de aprobación, observaciones y fechas de radicación.
- La aprobación de los informes queda sujeta al aval técnico de la ingeniera María Virginia, particularmente en lo relacionado con resultados de ensayos.

Entre la entidad y la interventoría se da claridad del estado de las actas de comités

- Se revisó el estado de las actas pendientes.
- Se confirmó que las actas No. 138, 139 y 140 (comité del 5 de diciembre) y las actas No. 141, 142 y 143 (comité del día) serán enviadas a más tardar el día siguiente, con el fin de quedar al día.
- Se acordó verificar internamente cualquier inconsistencia en numeración o firmas y notificar oportunamente.

- Interventoría menciona el cronograma de visitas de entrega a la SMC a los puntos implementados de lote 1Y lote 2: Arbeláez, Pasca, Pacho, Guatavita, La Mesa, Ricaurte, Paratebueno, Tocaima.
- Se menciona que el contratista no remitió para las visitas de entrega de esta semana los planos récord ni actas de cantidades, sin embargo, estos fueron llevados impresos al sitio.
- Se establece el compromiso la entrega formal por correo de planos y actas de cantidades de todos los puntos visitados.
- Las actas de visita deberán detallar claramente observaciones, responsables y fechas de subsanación dentro de la presente vigencia.

Referente a las intervenciones en Guatavita:

- Se indica que el contratista inicio actividades de borrado mecánico y pintura sin aprobación formal del plan de trabajo ni especificaciones técnicas.
- La interventoría aclaró que no otorgó autorización previa.
- SMC indicó que cualquier actividad debe contar con plan de trabajo aprobado por escrito.
- Se acordó emitir comunicación formal de llamado de atención y exigir trazabilidad documental.

Aspectos Contractuales

La entidad menciona que para el Cierre contractual se tiene programada los siguientes comités

Los contratos de obra finalizan el 20 de diciembre.

- Se programó comité de cierre el viernes 19 de diciembre:
  - 2:30 p.m.: Interventoría
  - 3:00 p.m.: Contratista MS
  - 4:00 p.m.: Contratista Ingenio Vial
- Se solicitó llegar a dicho comité con un balance completo del contrato: informes, observaciones, actas de visitas y estado financiero.
- Se informó que el último comité del año será el lunes 29 de diciembre 2025.

Aspectos Técnicos

Para el caso de no previstos en Guatavita, se indicó que no podrán adelantarse actividades sin la validación técnica correspondiente y la trazabilidad documental exigida por la entidad.

Seguimiento Metas Contractuales y Cronograma Proyecto

APROBADO	2
EN REVISION DE INTERVENTORIA	21
EN REVISION LA SMC	12
DEVUELTO AL CONTRATISTA	9
SIN ENTREGAR	5

LOTE - 1

EN REVISION DE INTERVENTORIA	40
EN REVISION DE LA SMC	15
DEVUELTO AL CONTRATISTA	2
SIN ENTREGAR	12

LOTE - 2

La entidad recuerda que los paquetes radicados hasta el 16 de diciembre podrán pagarse en la vigencia actual; los radicados posteriormente quedarán como cuentas por pagar del próximo año.

Aspectos Administrativos y de SST

- Se menciona el cumplimiento por parte del contratista CONSORCIO MS entrega de las planillas correspondiente al informe N°9, haciendo referencia el incumplimiento por parte del CONSORCIO INGENIO VIAL.
- Se revisó el estado de los informes técnicos mensuales y finales, así como las observaciones pendientes de subsanación.

Aspectos sociales y/o ambientales

Entre la entidad y la interventoría se da cumplimiento a mesa se trabajó para subsanar los informes mensuales ambientales por parte de interventoría.

Aspectos Presupuestales

Se radican las cuentas de cobro No.6,No.7, y No.8 de interventoría en la SMC.

ACCIONES Y COMPROMISOS FORMULADOS EN LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Cuentas 5 CO	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para la semana del 15 dic
Informe mensual 9 CI	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 15/12/2025
Cuadro actualizado de informes finales	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 15/12/2025
Entrega planos récord y acta cantidades de los puntos a recibir en la semana del 15 dic (Arbeláez, Pasca, Paratebueno)	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para la semana del 15/12/2025
Actas de visita de recibo de puntos a visitar esta semana con observaciones específicos y fecha clara de compromiso de subsanación	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 16/12/2025
Actas de comité 138 a 143	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 16/12/2025
Paquete cobro 9 CI	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para la semana del 15/12/2025
Revisiones informes finales Simijaca, Guachetá, Susa, Tausa, Machetá, Tocancipá, Fosca, Cáqueza, Une, Junín	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para la semana del 15 al 18 /12/2025
Revisiones informes finales Guayabal de S, La Vega, Viotá, Alban, Vianí, Apulo, Yacopí, Chaguaní, Nilo, Caparrapí, Topaipí, El Colegio, El Rosal, Cachipay	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para la semana del 15 al 18 /12/2025
Actas de visita de recibo Funza 2, Subachoque	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Juan Heredia
SUPERVISOR SMC


Firma_____
Nombre: Ernesto Perdomo
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para uso exclusivo del supervisor de SMC: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR SMC

Copia: interventoría
Copia: contratista

- **REGISTRO DE ASISTENCIA**

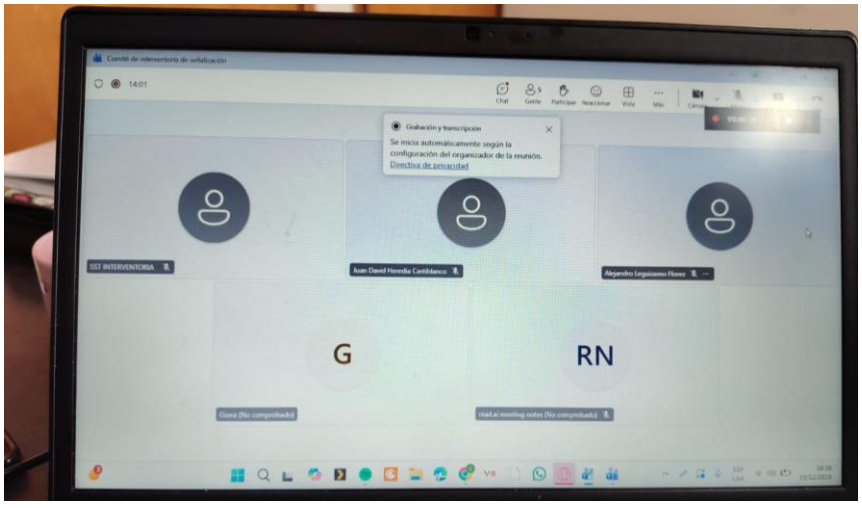

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria de Movilidad Contemporánea -SMC , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página contactenos@cundinamarca.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, SMC sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No 51-53 Bogotá D.C., al correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(601) 7490000, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.
