Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	VIGENCIA:	**2025/01/22**

ACTA No:	142
FECHA:	15/12/ 2025
CONTRATO No:	C.I. No.STM-CM-010-2025
OBJETO:	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARTICIPANTES	
En Representación de	SMC
NOMBRE	Juan Heredia
Cargo	Supervisor
En Representación de	SMC
NOMBRE	Giovanna Naranjo
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	SMC
NOMBRE	María Virginia Rocha
Cargo	Especialista transito
En Representación de	SMC
NOMBRE	Alejandro Leguizamo Flórez
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Ernesto Perdomo
Cargo	Director Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Dalila Otalora
Cargo	Especialista Transito
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Bibiana Rojas
Cargo	Residente Interventoría
En Representación de	Consorcio MS
NOMBRE	Juan Diego Román
Cargo	Representante legal suplente
En Representación de	Consorcio MS
NOMBRE	María Stella Agudelo
Cargo	Especialista en Transito

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Terminación Paratebueno, Arbeláez, Pasca.	CONSORCIO MS	x		El contratista se mantiene en la fecha de cumplimiento para el municipio de Arbeláez.
Balance presupuestal.	CONSORCIO MS	x		12/12/2025 Cumplido
APU Slurry y paquete no previsto.	CONOSRCIO MS	X		12/12/2025 Cumplido
Ajuste presupuesto Guatavita.	CONSOCIO MS	X		12/12/2025 Cumplido
Subsanación informes finales Ubaque, Simijaca, Guachetá, Ubaté y Carmen de Carupa.	CONSOCIO MS	X		12/10/2025 Cumplido parcialmente, radicado Ubaté y Ubaque.
Paquete de cobro 5.	CONSOCIO MS	X		06/12/2025 Cumplido, devuelto con observaciones
Verificación parafiscales IM 9.	CONSOCIO MS	X		10/12/2025 Cumplido
Subsanación Tocancipá	CONSOCIO MS		X	Sin cumplir

TEMAS PRESENTE ACTA

Se da inicio al Comité con la verificación de los compromisos pactados en el comité anterior, particularmente aquellos relacionados con la terminación y entrega de obras en los municipios de Arbeláez, Pasca y Paratebueno.

En este sentido, la Interventoría solicita al Contratista informar el estado actual de ejecución por cada uno de los municipios mencionados, a lo cual el Contratista responde de la siguiente manera:

Municipio de Arbeláez: Se informa que el día de hoy se está haciendo la visita de entrega a la entidad.

Municipio de Pasca: se ejecutó el metro lineal acordado en ambos puntos, se fundieron dos (2) resaltos en asfalto en el sector del Colegio El Molino, las cuadrillas se desplazan al municipio para ejecutar en su totalidad el Punto 2 y completar la señalización vertical correspondiente al Punto 1. La entrega definitiva del municipio de Pasca queda comprometida para el 18 de diciembre de 2025, en caso de presentarse pendientes, la verificación final podrá efectuarse mediante visita en sitio o mediante registro fotográfico según se acuerde.

Municipio de Paratebueno; El Contratista informa un avance aproximado del 80 %, como actividades pendientes se encuentran la fundida de dos (2) resaltos, su respectiva pintura y la instalación de resaltos portátiles.

Como resultado de lo anterior, se acuerda la finalización de las actividades durante la presente semana, como fecha máxima de entrega el 18 de diciembre de 2025.

La Interventoría solicita al Contratista el envío de un cronograma actualizado, con fechas reales de entrega, teniendo en cuenta los ajustes discutidos durante el comité.

El Contratista se compromete a remitir el cronograma actualizado el día de hoy antes de las 4:00 p.m.

La Interventoría deja constancia de que el balance presupuestal fue enviado y cumplido por parte del Contratista el día viernes 19 de diciembre.

En relación con el APU del no previsto para Guatavita, se informa que:

- El APU fue devuelto con observaciones el día sábado.
- El Contratista confirma que dichas observaciones serán subsanadas y radicadas el día de hoy.

Referente al plan de trabajo y actividades en Guatavita, la Interventoría manifiesta inconformidades respecto al procedimiento adoptado por el Contratista para la ejecución de actividades, evidenciándose ejecución de obras sin contar previamente con la aprobación del plan de trabajo solicitado por la concesión. El Contratista informa que las actividades se realizaron con acompañamiento de la ANI y de la Policía de Tránsito.

La Interventoría solicita formalizar el proceso documental con el fin de evitar suspensiones futuras, solicita al contratista radicar el plan de trabajo y la documentación requerida por la concesión el día de hoy.

La Interventoría informa a la Entidad el estado de los informes finales indicando que:

- Informes aprobados: Nemocón y Cucunubá.
- En revisión por la Interventoría: Simijaca y Guachetá (con cierre previsto antes del 19 de diciembre).
- Pendientes por el Contratista:
    - Ubaque: subsanación de observaciones – hoy.
    - Carmen de Carupa: entrega de subsanaciones – hoy.
    - Quetame: entrega programada para mañana.
    - San Bernardo y Tena: entrega programada para el miércoles.

La Interventoría informa que la cuenta de cobro No. 5 fue devuelto con observaciones el 11 de diciembre, se identificaron carpetas vacías, desorden documental y faltantes técnicos y ambientales, el Contratista se compromete a radicar la subsanación de la cuenta de cobro No. 5 completo y subsanado el día de hoy.

Interventoría menciona el estado del Informe Mensual No. 9 del contratista, mencionando que los Parafiscales Subsanados, y el Informe Mensual No. 9 está pendiente ajuste técnico menor, Comprometiéndose el contratista en la subsanación total del Informe Mensual No. 9 el día de hoy, con el fin de permitir su aprobación.

La Interventoría solicita al Contratista los certificados de calibración y luminiscencia de la implementación en Tocancipá.

El Contratista informa que el proveedor se encuentra en proceso de envío del certificado y se compromete a su entrega a más tardar el 19 de diciembre de 2025.

Aspectos Contractuales

VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.625.158.645,00	$ 4.044.608.081,00	111,57%	$ 3.410.801.491,51	94,09%

A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 94,09% del valor total del contrato.

La interventoría trasmite al contratista que para el Cierre contractual se tienen programados los siguientes comités

- Como el contrato de obra finaliza el 20 de diciembre, **s**e programa comité de cierre el viernes 19 de diciembre**:**
  - 2:30 p.m.: Interventoría
  - 3:00 p.m.: Contratista MS
  - 4:00 p.m.: Contratista Ingenio Vial
- La SMC solicita presentar en comité el balance completo del contrato: informes, observaciones, actas, visitas y estado financiero.
- Se informó que el último comité del año será el lunes 29 de diciembre.

Aspectos Técnicos

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.625.158.645,00	100%
Puntos entregados por la SMC	57	
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,55	108,48%
Puntos descartados	2	
Valor puntos inicial puntos descartados	$ 66.704.675,40	1,84%
Valor ejecutable puntos entregados	$ 3.865.745.401,15	106,64%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	55	
Presupuesto diseños apropiados	$ 4.044.608.081,00	111,57%
Puntos en ejecución de obra	4	
Puntos terminados	50	
Puntos sin iniciar	1	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	49	
Valor ejecutado físico	$ 3.410.801.491,51	94,09%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 3.206.055.405,00	88,44%

NOTA: El punto entregado más recientemente fue el ubicado en el municipio de Tenjo el día 5 de diciembre de 2025

Un 88,44% del valor total del contrato ha sido entregado a la entidad - SMC que corresponde a un total de valor ejecutado de$ 3.206.055.405,00, correspondiente a 49 puntos.

Seguimiento Metas Contractuales y Cronograma Proyecto

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Fisico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 181.257.932					NO
3	20-may-25	10%	$ 362.515.864,50			$ 369.801.264,58	10,20%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 725.031.729	$ 401.888.576,00	11,09%	$ 807.397.167,00	22,27%	NO
5	20-jul-25	35%	$1.268.805.526	$ 783.692.162,00	21,62%	$ 1.223.717.964,00	33,76%	NO
6	20-ago-25	50%	$1.812.579.323	$ 1.000.662.552,00	27,60%	$ 1.697.861.006,00	46,84%	NO
7	20-sep-25	70%	$2.537.611.052	$ 1.595.960.014,00	44,02%	$ 2.577.624.979,00	71,10%	NO
8	20-oct-25	90%	$3.262.642.781	$ 2.604.844.299,00	71,85%	$ 2.826.558.685,00	77,97%	NO
9	20-nov-25	100%	$3.625.158.645	$ 2.918.208.156,00	80,50%	$ 3.305.189.896,06	91,17%	NO
10	20-dic-25	100%	$3.625.158.645	$ 3.206.055.405,00	88,44%	$ 3.410.801.491,51	94,09%	NO

La interventoría aclara que, como es habitual, algunos frentes de trabajo pueden quedar pendientes, con garantías o actividades por subsanar. Estas situaciones serán consignadas en el acta de terminación correspondiente.

Aspectos Administrativos y de SST

De los 50 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 44 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Guachetá (3), Simijaca (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Cáqueza (4), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Susa (1), Tausa (1), Macheta (1) Y Junín (3), los cuales ya fueron revisados por la interventoría, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoría se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Tabio, Ubaté, Ubaque, Cucunuba, Nemocón, Sutatausa, Ubala y Guayabetal, los cuales ya fueron aprobados por la interventoría y remitidos a la entidad - SMC.

Aspectos sociales y/o ambientales

REPORTE INFORMES FINALES LOTE 1

MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA	ESTADO
TABIO	3	RADICADO A LA SMC		EN REVISIÓN
GUAYABETAL	2	RADICADO A LA SMC		EN REVISIÓN
UBAQUE	2	RADICADO A LA SMC		EN REVISIÓN
NEMOCON	1	RADICADO A LA SMC		APROBADO
SIMIJACA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	11/12/2025	
GUACHETA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	11/12/2025	
UBATE	2	RADICADO A LA SMC	10/12/2025	EN REVISIÓN
UBALA	1	RADICADO A LA SMC	10/12/2025	EN REVISIÓN
SUTATAUSA	2	RADICADO A LA SMC		EN REVISIÓN
SUSA	1	EN REVISION	15/12/2025	
QUETAME	2	SIN ENTREGAR	16/12/2025	
CARMEN DE	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	11/12/2025	
CUCUNUBA	1	RADICADO A LA SMC		APROBADO
TAUSA	1	EN REVISION	15/12/2025	
MACHETA	1	EN REVISION	16/12/2025	
TOCANCIPA	2	EN REVISION	15/12/2025	
FOSCA	4	EN REVISION	15/12/2025	
CAQUEZA	4	EN REVISION	16/12/2025	
UNE	5	EN REVISION	15/12/2025	
JUNIN	3	EN REVISION	16/12/2025	
SAN BERNARDO	2	SIN ENTREGAR	13/12/2025	
TENJO	1	SIN ENTREGAR	17/12/2025	

APROBADO	2
EN REVISION DE INTERVENTORIA	21
EN REVISION LA SMC	12
DEVUELTO AL CONTRATISTA	9
SIN ENTREGAR	5

A la fecha se encuentra en trámite el PMT del punto ubicado en el municipio Guatavita.

Aspectos Presupuestales

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	3	Tabio (3)	$ 401.888.576,00	11,09 %	$ 401.888.576,00	11,09 %
2	7	Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (2) y Cucunuba (1)	$ 598.773.976,00	16,52 %	$ 1.000.662.552,00	27,61 %
3	12	Carmen de Carupa (1), Guachetá (3), Nemocón (1), Simijaca (3), Sutatausa (2) y Tocancipá (2)	$ 595.297.462,00	16,42%	$ 1.595.960.014,00	44,02%
4	18	Cáqueza (4), Fosca (4), Guayabetal (2), Quetame (2), Ubala (1) y Une (5)	$ 1.008.884.285,00	27,83%	$ 2.604.844.299,00	71,85%

ACCIONES Y COMPROMISOS FORMULADOS EN LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Complemento paquete NP Slurry con especificación técnica	CONSORCIO MS			Compromiso para el 15/12/2025
Plan de trabajo dirigido a concesión Guatavita	CONSORCIO MS			Compromiso para el 15/12/2025
Verificación programación visitas de recibo de acuerdo con avances de obra.	CONSORCIO MS			Se pueden reprogramar máximo hasta el 19 /12/2025
Subsanación informes finales Ubaque y Carmen de Carupa	CONSORCIO MS			Compromiso para el 10/12/2025
Subsanación informe mensual 9	CONSORCIO MS			Compromiso para la semana del 15/12/2025
Subsanación cuenta de cobro 5	CONSORCIO MS			Compromiso para el 15/12/2025
Subsanación observaciones Tocancipá.	CONSORCIO MS			Compromiso para el 06/12/2025
Terminación actividades sociales de la totalidad de puntos ejecutados.	CONSORCIO MS			Compromiso para antes del 20 /12/2025
Entrega informes finales Quetame, San Bernardo, Tenjo.	CONSORCIO MS			Compromiso para la semana del 15/12/2025
Entrega planos récord y acta cantidades de los puntos a recibir en la semana del 15 dic (Arbeláez, Pasca, Paratebueno, Guatavita).	CONSORCIO MS			Compromiso para la semana del 15/12/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Juan Heredia
SUPERVISOR SMC

Firma_____
Nombre: Ernesto Perdomo
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: José Alexander Román
CONTRATISTA

Para uso exclusivo del supervisor de SMC: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR SMC

Copia: interventoría
Copia: contratista

- **REGISTRO DE ASISTENTES**



AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria de Movilidad Contemporánea -SMC , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página contactenos@cundinamarca.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, SMC sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No 51-53 Bogotá D.C., al correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(601) 7490000, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Comité de seguimiento No. 40

Contrato de obra No. STM-LP-009-2025 (Lote 1)

Contrato de interventoría No. STM-CM-010-2025

Objeto: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Fecha 15-12-2025

CONTENIDO

1 RESUMEN CONTRACTUAL

2 SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

4 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

5 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

6 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Gobernación de Cundinamarca

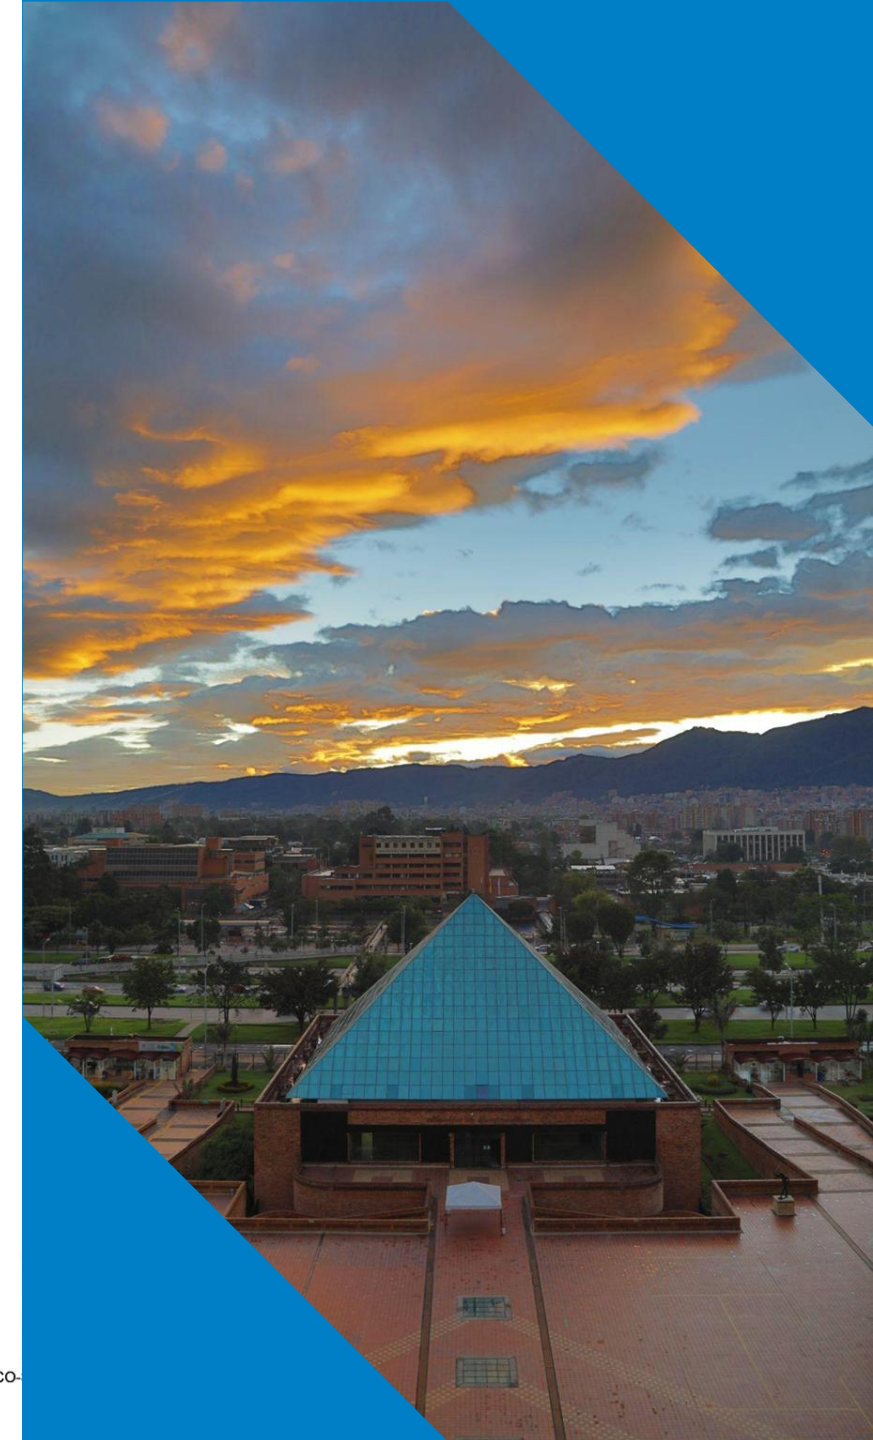

1. RESUMEN CONTRACTUAL

ALCANCE	OBRA	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	**CONSORCIO MS**	**CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**
OBJETO CONTRACTUAL	Implementar intervenciones en infraestructura vial para **mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos** priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca.	Realizar la gerencia integral para la **interventoría técnica, administrativa, financiera, operativa, jurídica, ambiental y social** al contrato cuyo objeto es: implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca.
VALOR DEL CONTRATO	$3.625.158.645,00	$1.651.573.119
ADICIONES	N/A	N/A
PLAZO DE EJECUCION	Diez (10) Meses	Once (11) Meses
FECHA INICIO	21 de febrero 2025	21 de febrero 2025
FECHA TERMINACIÓN	20 de diciembre 2025	20 de enero 2026

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


No.	Compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Fecha de cumplimiento	Observación
1	Terminación de obra en Paratebueno, Arbeláez y Pasca	Contratista	15/12/2025		
2	Envió balance presupuestal	Contratista	05/12/2025	12/12/2025	CUMPLIDO
3	Envió de APU Slurry y paquete no previsto	Contratista	09/12/2025	12/12/2025	CUMPLIDO
4	Comunicado ajuste presupuesto Guatavita	Contratista	10/12/2025	12/12/2025	CUMPLIDO
5	Subsanación informes finales Ubaque, Simijaca, Guachetá, Ubaté y Carmen de Carupa	Contratista	06/12/2025	10/12/2025	CUMPLIDO parcialmente, radicado Ubaté y Ubaque
6	Envió paquete de cobro 5	Contratista	06/12/2025	06/12/2025	CUMPLIDO, devuelto con observaciones
7	Verificación parafiscales informe mensual 9	Contratista	06/12/2025	10/12/2025	CUMPLIDO
8	Subsanación observaciones Tocancipá	Contratista	11/12/2025		Sin cumplir

3.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Valor contrato L1 **$ 3.625.158.645,00**

Diseños entregados por la SMC:

LOTE 1	PUNTOS	PRESUPUESTO INICIAL
ARBELAEZ	2	$ 157.992.025,62
CÁQUEZA	4	$ 220.565.574,30
CARMEN DE CARUPA	3	$ 181.559.364,95
CUCUNUBÁ	1	$ 158.827.207,97
FOSCA	4	$ 374.884.156,17
GUACHETA	3	$ 32.496.594,87
GUATAVITA	1	$ 209.470.309,00
GUAYABETAL	2	$ 102.861.825,82
JUNIN	3	$ 243.478.692,21
MACHETÁ	1	$ 7.215.762,84
NEMOCON	1	$ 46.105.043,95
PARATEBUENO	1	$ 64.083.488,17
PASCA	2	$ 188.692.115,18
QUETAME	2	$ 11.553.368,16
SAN BERNARDO	2	$ 74.351.063,00
SIMIJACA	3	$ 100.749.479,16
SUSA	1	$ 8.677.541,11
SUTATAUSA	2	$ 21.173.954,74
TABIO	3	$ 285.988.462,05
TAUSA	1	$ 12.365.123,90
TENJO	1	$ 227.937.266,83
TOCANCIPÁ	2	$ 322.193.752,89
UBALA	2	$ 139.784.706,60
UBAQUE	3	$ 161.459.558,96
UBATÉ	2	$ 283.259.096,58
UNE	5	$ 294.724.541,51
Total general	**57**	**$ 3.932.450.076,55**

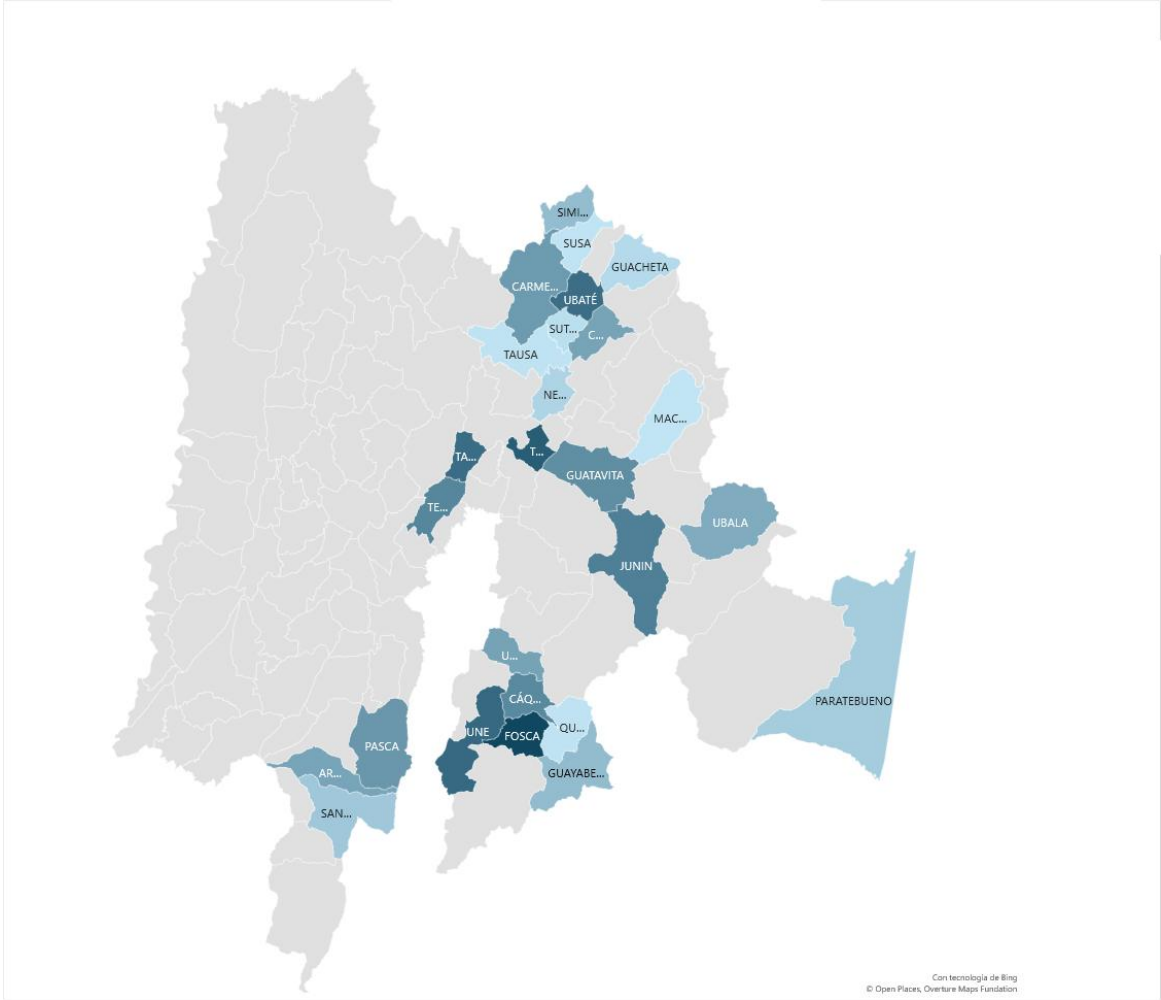

Gobernación de Cundinamarca

ENTIDAD CERTIFICADA

CO-SC-CER303297 ST-CER655785 CO-SI-CER1017570

3.2 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,55
Puntos con visita de reconocimiento	57
Puntos descartados	2
Entrega informe visita	55
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	55
Presupuesto diseños apropiados	$ 4.044.608.081,00

3.3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta Visita preliminar	Cuenta de Entrega REAL informe visita	Cuenta de Aprobación informe
GUACHETA	3	3	3	3
GUAYABETAL	2	2	2	2
NEMOCON	1	1	1	1
QUETAME	2	2	2	2
SIMIJACA	3	3	3	3
SUSA	1	1	1	1
SUTATAUSA	2	2	2	2
TABIO	3	3	3	3
UBALA	2	2	1	1
UBAQUE	3	3	2	2
TAUSA	1	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1	1
UBATÉ	2	2	2	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	3	3
MACHETÁ	1	1	1	1
CÁQUEZA	4	4	4	4
UNE	5	5	5	5
FOSCA	4	4	4	4
PARATEBUENO	1	1	1	1
TOCANCIPÁ	2	2	2	2
GUATAVITA	1	1	1	1
JUNIN	3	3	3	3
SAN BERNARDO	2	2	2	2
ARBELAEZ	2	2	2	2
PASCA	2	2	2	2
TENJO	1	1	1	1
TOTAL	**57**	**57**	**55**	**55**

NOTA: Los puntos de Ubala y Ubaque que fueron descartados no requieren informe de visita preliminar.

3.5 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.625.158.645,00	100%
Puntos entregados por la SMC	57	
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,55	108,48%
Puntos descartados	2	
Valor puntos inicial puntos descartados	$ 66.704.675,40	1,84%
Valor ejecutable puntos entregados	$ 3.865.745.401,15	106,64%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	55	
Presupuesto diseños apropiados	$ 4.044.608.081,00	111,57%
Puntos en ejecución de obra	4	
Puntos terminados	50	
Puntos sin iniciar	1	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	49	
Valor ejecutado físico	$ 3.410.801.491,51	94,09%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 3.206.055.405,00	88,44%

NOTA: El punto entregado más recientemente fue el ubicado en el municipio de Tenjo el día 5 de diciembre de 2025.

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO
TABIO	Via Tabio - Cajica (Gimansio Campestre Santa Rita de Casia)	20/6/2025	$ 72.327.600,44	$ 74.833.799,00	$ 72.958.463,00	2,01%
TABIO	Via Tabio - El Mirador	20/6/2025	$ 65.602.005,61	$ 66.222.302,00	$ 66.388.347,00	1,83%
TABIO	Via Tabio - Subachoque	20/6/2025	$ 148.058.856,00	$ 258.580.216,00	$ 262.541.766,00	7,24%
UBATÉ	Ubate - Guacheta	18/7/2025	$ 56.598.728,05	$ 58.724.511,00	$ 78.504.970,00	2,17%
UBATÉ	2. Intersencción Colegio Bruselas	18/7/2025	$ 226.660.368,53	$ 148.029.600,00	$ 148.553.469,00	4,10%
UBAQUE	Ubaque - Chipaque	21/7/2025	$ 97.753.384,08	$ 113.492.344,00	$ 106.364.047,00	2,93%
UBAQUE	CURVA UBAQUE - LA UNIÓN	21/7/2025	$ 54.331.837,16	$ 55.728.450,00	$ 48.381.100,00	1,33%
CARMEN DE CARUPA	2. Sector La U	19/8/2025	$ 58.381.952,38	$ 58.036.759,00	$ 50.958.139,00	1,41%
CARMEN DE CARUPA	3. Sector El Prado	5/9/2025	$ 83.638.091,86	$ 77.764.628,00	$ 75.709.222,00	2,09%
CARMEN DE CARUPA	4.Sector Peligros	19/8/2025	$ 39.539.320,71	$ 43.884.752,00	$ 44.284.303,00	1,22%
GUACHETA	ESCUELA LA ISLA	26/8/2025	$ 13.792.670,76	$ 31.444.186,00	$ 30.404.041,00	0,84%
GUACHETA	I.E. MIÑA Y TICHA	26/8/2025	$ 13.035.646,11	$ 13.511.162,00	$ 11.509.923,00	0,32%
GUACHETA	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	26/8/2025	$ 5.668.278,00	$ 7.832.442,00	$ 7.832.441,00	0,22%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
SIMIJACA	COLEGIO AGUSTIN PARRA	26/8/2025	$ 60.682.955,32	$ 59.584.972,00	$ 46.423.414,00	1,28%
SIMIJACA	ESCUELA EL FICAL	26/8/2025	$ 20.238.121,60	$ 10.901.006,00	$ 11.407.589,00	0,31%
SIMIJACA	ESCUELA EL PANTANO	26/8/2025	$ 19.828.402,24	$ 21.115.706,00	$ 22.627.387,00	0,62%
NEMOCON	Escuela La Puerta	5/9/2025	$ 46.105.043,95	$ 37.467.306,00	$ 36.562.501,00	1,01%
SUTATAUSA	ESCUELA PALACIO	16/9/2025	$ 5.459.679,72	$ 5.459.680,00	$ 5.459.679,00	0,15%
SUTATAUSA	ESCUELA HATO VIEJO	16/9/2025	$ 15.714.275,02	$ 15.714.275,00	$ 14.294.984,00	0,39%
TOCANCIPÁ	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	16/9/2025	$ 298.600.598,51	$ 307.479.873,62	$ 309.473.126,62	8,54%
TOCANCIPÁ	Complemento C.R. ENTRELOMAS	16/9/2025	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	0,65%
UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	6/10/2025	$ 82.454.368,92	$ 88.176.030,00	$ 85.859.060,00	2,37%
CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	8/10/2025	$ 44.421.570,34	$ 47.985.697,00	$ 42.948.940,00	1,18%
CÁQUEZA	2. Escuela Ubatoque 2	8/10/2025	$ 33.370.969,16	$ 37.389.635,00	$ 36.516.713,00	1,01%
CÁQUEZA	3. Consolidado Sector El Campin	8/10/2025	$ 106.304.301,84	$ 111.048.567,00	$ 96.329.604,00	2,66%
CÁQUEZA	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	8/10/2025	$ 36.468.732,96	$ 43.335.493,00	$ 41.426.891,00	1,14%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
FOSCA	1. Colegio IDER	8/10/2025	$ 24.920.127,94	$ 25.167.041,00	$ 22.846.901,00	0,63%
FOSCA	2. Consolidado El Tablon	8/10/2025	$ 231.072.196,83	$ 256.713.360,00	$ 179.854.339,00	4,96%
FOSCA	4. Cementerio Municipal	8/10/2025	$ 74.910.059,06	$ 79.401.526,00	$ 61.955.299,00	1,71%
FOSCA	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	8/10/2025	$ 43.981.772,34	$ 17.517.093,00	$ 11.506.821,00	0,32%
QUETAME	1. Escuela Rural Granadillo	8/10/2025	$ 7.186.556,52	$ 6.640.156,00	$ 6.640.155,00	0,18%
QUETAME	2. Intersección Matemango	8/10/2025	$ 4.366.811,64	$ 7.142.509,00	$ 7.142.510,00	0,20%
UNE	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	9/10/2025	$ 38.679.548,56	$ 57.483.723,00	$ 49.665.362,00	1,37%
UNE	Entrada Estación De Servicio Texaco	9/10/2025	$ 90.661.608,58	$ 93.018.609,00	$ 82.695.312,00	2,28%
UNE	Escuela Combura	9/10/2025	$ 51.293.279,40	$ 69.832.283,00	$ 64.540.095,00	1,78%
UNE	Punto Critico Timasita	9/10/2025	$ 46.776.621,94	$ 51.974.008,00	$ 51.057.446,00	1,41%
UNE	Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia	9/10/2025	$ 67.313.483,03	$ 75.517.082,00	$ 71.006.743,00	1,96%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO
GUAYABETAL	Vda San Antonio	9/10/2025	$ 60.847.191,37	$ 61.172.852,00	$ 56.450.044,00	1,56%
GUAYABETAL	Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo	9/10/2025	$ 42.014.634,45	$ 37.786.733,00	$ 40.442.050,00	1,12%
SUSA	ESCUELA EL TABLON	29/10/2025	$ 8.677.541,11	$ 15.791.947,00	$ 13.576.914,00	0,37%
TAUSA	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	29/10/2025	$ 12.365.123,90	$ 22.183.503,00	$ 21.742.674,00	0,60%
JUNIN	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	20/11/2025	$ 67.183.349,24	$ 74.599.696,00	$ 83.766.171,00	2,31%
JUNIN	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	20/11/2025	$ 123.628.932,61	$ 128.065.777,00	$ 135.529.683,00	3,74%
JUNIN	Intersección Vía San Roque - Junín	20/11/2025	$ 52.666.410,36	$ 53.476.141,00	$ 50.967.739,00	1,41%
MACHETÁ	ESCUELA GUINA	20/11/2025	$ 7.215.762,84	$ 7.780.676,00	$ 7.780.676,00	0,21%
SAN BERNARDO	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	1/12/2025	$ 10.363.250,00	$ 17.345.215,00	$ 17.064.451,00	0,47%
SAN BERNARDO	3. Institución Educativa Departametal San Bernardo	1/12/2025	$ 63.987.813,00	$ 47.218.098,00	$ 48.088.890,00	1,33%
TENJO	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	5/12/2025	$ 227.937.266,83	$ 227.644.231,00	$ 222.693.908,00	6,14%
CUCUNUBÁ	PUNTO CRITICO PR 4+100	19/8/2025	$ 158.827.207,97	$ 163.518.183,00	$ 121.727.948,00	3,36%
TOTAL	49		$ 3.245.507.463,18	$ 3.414.326.989,00	$ 3.206.055.405,00	88,44%

3.7 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

CODIGO DEL PUNTO	MUNICIPIO	PUNTO	VALOR INICIAL	VALOR APROPIACION DISEÑO	DIFERENCIA	DIFERENCIA EN %	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE AVANCE DE IMPLEMENTACION DISEÑOS APROPIADOS
25530_CN_01	PARATEBUENO	Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso	$ 64.083.488,17	$ 67.434.570,00	$ 3.351.081,83	5,23%	$ 36.259.568,29	53,77%
25053_CN_02	ARBELAEZ	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	$ 69.552.853,92	$ 69.025.528,00	-$ 527.325,92	-0,76%	$ 56.614.738,07	82,02%
25053_CN_03	ARBELAEZ	SECTOR: KIRPALAMAR	$ 88.439.171,70	$ 89.192.907,00	$ 753.735,30	0,85%	$ 78.445.161,71	87,95%
25535_CN_01	PASCA	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	$ 87.383.268,46	$ 90.654.141,00	$ 3.270.872,54	3,74%		
25535_CN_02	PASCA	VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	$ 101.308.846,72	$ 100.402.971,00	-$ 905.875,72	-0,89%	$ 14.377.705,45	14,32%
TOTAL			$ 3.865.745.401,15	$ 4.044.608.081,00	$ 178.862.679,85	4,63%	$ 3.410.801.491,51	93,59%


VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.625.158.645,00	$ 4.044.608.081,00	111,57%	$ 3.410.801.491,51	94,09%

3.9 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		AVANCE	DÍAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
PARATEBUENO	25530_CN_01	Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso	1/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	EN EJECUCION	53,77%	48
ARBELAEZ	25053_CN_02	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	10/11/2025	2/12/2025	10/11/2025	EN EJECUCION	82,02%	12
ARBELAEZ	25053_CN_03	SECTOR: KIRPALAMAR	10/11/2025	2/12/2025	10/11/2025	EN EJECUCION	87,95%	12
PASCA	25535_CN_01	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	18/11/2025	11/12/2025			0,00%	3
PASCA	25535_CN_02	VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	18/11/2025	11/12/2025	5/12/2025	EN EJECUCION	14,32%	3

3.9 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Fecha Comité	% Ejecutado Físico Sobre el Valor del Contrato	% Planeado en Base a la Meta Contractual	Avance Reportado Entre Comités
4/6/2025	10,20%	15,00%	-
11/6/2025	13,18%	17,50%	2,98%
25/6/2025	19,06%	20,00%	5,88%
2/7/2025	22,27%	24,00%	3,21%
10/7/2025	26,52%	28,00%	4,25%
16/7/2025	29,35%	32,00%	2,83%
22/7/2025	33,70%	35,00%	4,35%
31/7/2025	37,34%	38,00%	3,64%
8/8/2025	40,40%	41,00%	3,06%
14/8/2025	45,20%	44,00%	4,80%
21/8/2025	46,84%	50,00%	1,64%
28/8/2025	49,35%	52,50%	2,51%
4/9/2025	54,09%	55,00%	4,74%
11/9/2025	59,34%	60,00%	5,25%
18/9/2025	70,19%	65,00%	10,85%
25/9/2025	71,10%	70,00%	0,91%
2/10/2025	71,78%	75,00%	0,68%
9/10/2025	73,15%	80,00%	1,37%
20/10/2025	77,97%	90,00%	4,82%
23/10/2025	78,84%	91,25%	0,87%
30/10/2025	82,05%	92,00%	3,21%
6/11/2025	83,34%	94,00%	1,29%
13/11/2025	84,05%	96,00%	0,71%
20/11/2025	88,91%	100%	4,86%
27/11/2025	91,17%	100%	2,26%
4/12/2025	91,59%	100%	0,42%
15/12/2025	94,09%	100%	2,50%

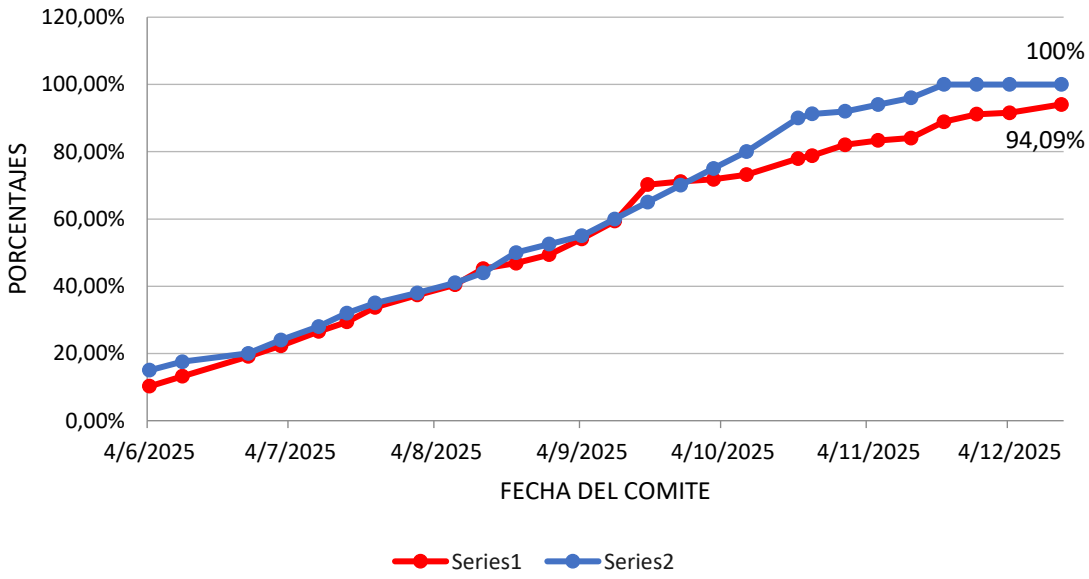

4.1 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO



Seguimiento metas contractuales:

Valor contrato L1 **$3.625.158.6445**

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Fisico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 181.257.932					NO
3	20-may-25	10%	$ 362.515.864,50			$ 369.801.264,58	10,20%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 725.031.729	$ 401.888.576,00	11,09%	$ 807.397.167,00	22,27%	NO
5	20-jul-25	35%	$1.268.805.526	$ 783.692.162,00	21,62%	$ 1.223.717.964,00	33,76%	NO
6	20-ago-25	50%	$1.812.579.323	$ 1.000.662.552,00	27,60%	$ 1.697.861.006,00	46,84%	NO
7	20-sep-25	70%	$2.537.611.052	$ 1.595.960.014,00	44,02%	$ 2.577.624.979,00	71,10%	NO
8	20-oct-25	90%	$3.262.642.781	$ 2.604.844.299,00	71,85%	$ 2.826.558.685,00	77,97%	NO
9	20-nov-25	100%	$3.625.158.645	$ 2.918.208.156,00	80,50%	$ 3.305.189.896,06	91,17%	NO
10	20-dic-25	100%	$3.625.158.645	$ 3.206.055.405,00	88,44%	$ 3.410.801.491,51	94,09%	NO

4.2 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor contrato L1 **$$3.625.158.6445**

Relación pagos:

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	3	Tabio (3)	$ 401.888.576,00	11,09 %	$ 401.888.576,00	11,09 %
2	7	Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (2) y Cucunuba (1)	$ 598.773.976,00	16,52 %	$ 1.000.662.552,00	27,61 %
3	12	Carmen de Carupa (1), Guachetá (3), Nemocón (1), Simijaca (3), Sutatausa (2) y Tocancipá (2)	$ 595.297.462,00	16,42%	$ 1.595.960.014,00	44,02%
4	18	Cáqueza (4), Fosca (4), Guayabetal (2), Quetame (2), Ubala (1) y Une (5)	$ 1.008.884.285,00	27,83%	$ 2.604.844.299,00	71,85%
5						
6						
7						
8						
9						
10						

5.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Actividades de implementación Arbeláez 25053_CN_03
SECTOR: KIRPALAMAR



Actividades de implementación Pasca 25535_CN_02 VEREDA
EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO



6. ESTADO DEL CLIMA

Ítem	Estado del Clima	lunes 1 diciembre			martes 2			miércoles 3			jueves 4			viernes 5			sábado 6			domingo 7			TOTAL SEMANAL	TOTAL ACUMULADO
		Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche		
1	Lluvioso Tenjo																						0	13
2	Lluvioso Arbelaez																						0	0
3	Lluvioso Paratebueno																						0	0
4	Lluvioso Pasca																						0	0

7.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
Puntos con socialización diseños	57
Puntos con actas de entorno	57
Puntos con socialización de cierre	49
Puntos con actas de entorno cierre	49
Actas de inicio de vecindad	24
Actas de cierre de vecindad	13
PQR recibidas	0
PQR atendidas y cerradas	0

7.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Socialización Inicial	Cuenta de Actas de vecindad Inicial	Cuenta de Actas entorno Inicial	Cuenta de Socialización fin	Cuenta de Actas de Cierre de Vecindad	Cuenta de Actas de cierre entorno
GUACHETA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
GUAYABETAL	2	2	1	2	2	1	2
NEMOCON	1	1	N/A	1	1	N/A	1
QUETAME	2	2	N/A	2	2	N/A	2
SIMIJACA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
SUSA	1	1	N/A	1	1	N/A	1
SUTATAUSA	2	2	N/A	2	2	N/A	2
TABIO	3	3	2	3	3	2	3
UBALA	2	2	N/A	2	1	N/A	1
UBAQUE	3	3	N/A	3	2	N/A	2
TAUSA	1	1	1	1	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1	1	1	1	1
UBATÉ	2	2	N/A	2	2	N/A	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
MACHETÁ	1	1	N/A	1	1	N/A	1
CÁQUEZA	4	4	N/A	4	4	N/A	4
UNE	5	5	N/A	5	5	N/A	5
FOSCA	4	4	2	4	4	2	4
PARATEBUENO	1	1	3	1			
TOCANCIPÁ	2	2	N/A	2	2	N/A	2
GUATAVITA	1	1	N/A	1			
JUNIN	3	3	2	3	3	2	3
SAN BERNARDO	2	2	N/A	2	2	N/A	2
ARBELAEZ	2	2	1	2			
PASCA	2	2	7	2			
TENJO	1	1	4	1	1	4	1
TOTAL	**57**	**57**	**24**	**57**	**49**	**13**	**49**

8.1 SEGUIMIENTO PMT

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
PMT radicados	57
PMT aprobados	56
Puntos con otros permisos requeridos	0
Capacitaciones	0
Accidentes laborales	0

8.2 SEGUIMIENTO PMT

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Radicación PMT	Cuenta de Aprobación PMT
GUACHETA	3	3	3
GUAYABETAL	2	2	2
NEMOCON	1	1	1
QUETAME	2	2	2
SIMIJACA	3	3	3
SUSA	1	1	1
SUTATAUSA	2	2	2
TABIO	3	3	3
UBALA	2	2	2
UBAQUE	3	3	3
TAUSA	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1
UBATÉ	2	2	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	3
MACHETÁ	1	1	1
CÁQUEZA	4	4	4
UNE	5	5	5
FOSCA	4	4	4
PARATEBUENO	1	1	1
TOCANCIPÁ	2	2	2
GUATAVITA	1	1	
JUNIN	3	3	3
SAN BERNARDO	2	2	2
ARBELAEZ	2	2	2
PASCA	2	2	2
TENJO	1	1	1
TOTAL	**57**	**57**	**56**

9. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES DE VISITA PRELIMINAR

MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA
TABIO	3	APROBADO	
GUAYABETAL	2	APROBADO	
UBAQUE	2	APROBADO	
NEMOCON	1	APROBADO	
SIMIJACA	3	APROBADO	
GUACHETA	3	APROBADO	
UBATE	2	APROBADO	
UBALA	1	APROBADO	
SUTATAUSA	2	APROBADO	
SUSA	1	APROBADO	
QUETAME	2	APROBADO	
CARMEN DE CARUPA	3	APROBADO	
CUCUNUBA	1	APROBADO	
TAUSA	1	APROBADO	
MACHETA	1	APROBADO	
TOCANCIPA	2	APROBADO	
FOSCA	4	APROBADO	
CAQUEZA	4	APROBADO	
UNE	5	APROBADO	
GUATAVITA	1	APROBADO	
PARATEBUENO	1	APROBADO	
JUNIN	3	APROBADO	
SAN BERNARDO	2	APROBADO	
ARBELAEZ	2	APROBADO	
PASCA	2	APROBADO	
TENJO	1	APROBADO	

10. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES FINALES

REPORTE INFORMES FINALES LOTE 1				
MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA	ESTADO
TABIO	3	RADICADO A LA SMC		EN REVISIÓN
GUAYABETAL	2	RADICADO A LA SMC		EN REVISIÓN
UBAQUE	2	RADICADO A LA SMC		EN REVISIÓN
NEMOCON	1	RADICADO A LA SMC		**APROBADO**
SIMIJACA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	11/12/2025	
GUACHETA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	11/12/2025	
UBATE	2	RADICADO A LA SMC	10/12/2025	EN REVISIÓN
UBALA	1	RADICADO A LA SMC	10/12/2025	EN REVISIÓN
SUTATAUSA	2	RADICADO A LA SMC		EN REVISIÓN
SUSA	1	EN REVISION	15/12/2025	
QUETAME	2	SIN ENTREGAR	16/12/2025	
CARMEN DE	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA	11/12/2025	
CUCUNUBA	1	RADICADO A LA SMC		**APROBADO**
TAUSA	1	EN REVISION	15/12/2025	
MACHETA	1	EN REVISION	16/12/2025	
TOCANCIPA	2	EN REVISION	15/12/2025	
FOSCA	4	EN REVISION	15/12/2025	
CAQUEZA	4	EN REVISION	16/12/2025	
UNE	5	EN REVISION	15/12/2025	
JUNIN	3	EN REVISION	18/12/2025	
SAN BERNARDO	2	SIN ENTREGAR	13/12/2025	
TENJO	1	SIN ENTREGAR	17/12/2025	

APROBADO	**2**
EN REVISION DE INTERVENTORIA	**21**
EN REVISION LA SMC	**12**
DEVUELTO AL CONTRATISTA	**9**
SIN ENTREGAR	**5**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se han realizado 57 visitas preliminares de las cuales se han entregado 55 informes de visita preliminar y no se encuentra pendiente por visita preliminar ningún punto.
2. 55 puntos cuentan con actas de apropiación suscritas, de los cuales; 50 han sido terminados y se han entregado a la entidad-SMC; 49 y está pendiente por entregar 1 punto, 4 están en ejecución y 1 se encuentra pendiente por iniciar.
3. A la fecha se encuentra en trámite el PMT del punto ubicado en el municipio Guatavita.
4. De los 50 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 44 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Guachetá (3), Simijaca (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Cáqueza (4), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Susa (1), Tausa (1), Macheta (1) Y Junín (3), los cuales ya fueron revisados por la interventoria, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoria se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Tabio, Ubaté, Ubaque, Cucunuba, Nemocón, Sutatausa, Ubala y Guayabetal, los cuales ya fueron aprobados por la interventoria y remitidos a la entidad - SMC.
5. Un 88,44% del valor total del contrato a sido entregado a la entidad - SMC que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 3.206.055.405,00, correspondiente a 49 puntos.
6. A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 94,09% del valor total del contrato.



Gobernación de
Cundinamarca
