Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	VIGENCIA:	**2025/01/22**

ACTA No:	143
FECHA:	15/12/ 2025
CONTRATO No:	C.I. No.STM-CM-010-2025
OBJETO:	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARTICIPANTES	
En Representación de	SMC
NOMBRE	Juan Heredia
Cargo	Supervisor
En Representación de	SMC
NOMBRE	Giovanna Naranjo
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	SMC
NOMBRE	María Virginia Rocha
Cargo	Especialista transito
En Representación de	SMC
NOMBRE	Alejandro Leguizamo Flórez
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Ernesto Perdomo
Cargo	Director Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Bibiana Rojas
Cargo	Residente Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Dalila Otalora
Cargo	Especialista en Tránsito
En Representación de	Consorcio INGENIO VIAL
NOMBRE	Héctor Gómez
Cargo	Director de obra.
En Representación de	Consorcio INGENIO VIAL
NOMBRE	Daniel Castilla
Cargo	Residente de Obra
En Representación de	Consorcio INGENIO VIAL
NOMBRE	Alexander Gómez
Cargo	Especialista de transito

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Envío planos récord y acta cantidades Subachoque y Funza punto 02	CONSORCIO INGENIO VIAL	X		08/12/2025 cumplido
Envío planos récord y acta cantidades Vergara punto 06 y Guaduas	CONSORCIO INGENIO VIAL	X		10/12/2025 cumplido
Cronograma visitas de recibo	CONSORCIO INGENIO VIAL	X		09/12/2025 cumplido
Envío planos récord y acta cantidades Ricaurte punto 01	CONSORCIO INGENIO VIAL		X	Sin cumplir
Subsanación Informe Mensual N° 8	CONSORCIO INGENIO VIAL	X		10/12/2025 cumplido
Paquete cobro 4	CONSORCIO INGENIO VIAL	X		09/12/2025 cumplido
Verificación parafiscales Informe Mensual N°9	CONSORCIO INGENIO VIAL		X	Sin cumplir
Subsanación informe finales Nimaima y Puerto Salgar	CONSORCIO INGENIO VIAL	X		11/12/2025 cumplido
Entrega informes finales Caparrapí, Topaipí y Funza	CONSORCIO INGENIO VIAL	X		CUMPLIDO parciamente, entregado Caparrapí y Topaipí

TEMAS PRESENTE ACTA

En el presente comité se realiza la revisión de los compromisos adquiridos en el comité anterior, evidenciándose el siguiente estado:

El contratista cumplió con la entrega de los planos récord y actas de cantidades correspondientes a los municipios de Subachoque, Funza (Punto 2) y Vergara (Punto 6), falta por entregar la documentación de Ricaurte (Punto 1).

Interventoría expone el estado actual de ejecución de los siguientes municipios:

- Ricaurte: Se ratifica como fecha de entrega el martes 16, una vez culminadas las actividades pendientes.
- La Mesa: Se confirma la visita de recibo para el día martes 16, correspondiente a los puntos programados.
- Pacho: El municipio se encuentra en ejecución desde el fin de semana, la fecha prevista de entrega es el día jueves.
- Tocaima: el contratista indica que la ejecución se realizará en un plazo de dos (2) días, y se compromete a aplicar los correctivos necesarios para lograr el recibo del punto a más tardar el viernes 19. Se deja como compromiso la reprogramación y el envío del cronograma actualizado durante la tarde del mismo día.

Así mismo, la interventoría solicita al contratista el reporte diario de avance del municipio de Tocaima, indicando porcentaje de ejecución y actividades desarrolladas, compromiso que es aceptado por el contratista.

Interventoría informa que se están revisando los informes finales y que se encuentran observaciones por lo que solicita al contratista priorizar la subsanación con el fin de lograr la suscripción de las actas de recibo de la totalidad de los puntos dentro de la vigencia del contrato por la SMC.

La interventoría aclara que, para el último pago, es requisito indispensable contar con todas las actas de recibo a satisfacción debidamente suscritas, e Informes finales aprobados por la interventoría.

El contratista informa que procederá primero con la radicación del informe No.9 y posteriormente, con la radicación de la cuenta de cobro No.5 La entidad recuerda que únicamente las cuentas radicadas hasta el día siguiente garantizan el pago dentro de la presente vigencia; las cuentas radicadas con posterioridad quedarán registradas como cuentas por pagar para la siguiente vigencia.

Aspectos Contractuales

VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.480.023.139,00	$ 3.559.371.980,65	102,28%	$ 2.944.219.840,29	84,60%

A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 84,60% del valor total del contrato.

Aspectos Técnicos

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.480.023.139,00	100%
Puntos entregados por la SMC	80	
Valor total estimado	$ 3.474.530.312,60	99,84%
Puntos descartados	4	
Valor inicial puntos descartados	$ 194.912.577,02	5,60%
Valor ejecutable puntos entregados por la SMC	$ 3.279.617.735,58	94,24%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	80	
Presupuesto diseños apropiados	$ 3.559.371.980,65	102,28%
Valor apropiado puntos descartados	$ 258.039.701,00	7,41%
Valor ejecutable puntos entregados por la SMC y apropiados	$ 3.301.332.279,65	94,87%
Puntos en ejecución de obra	2	
Puntos terminados	72	
Puntos sin iniciar	2	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	69	
Valor ejecutado físico	$ 2.944.219.840,29	84,60%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 2.726.349.083,00	78,34%

NOTA: Los puntos entregados más recientemente fueron los ubicados en los municipios de Guaduas y Vergara el día 11 de diciembre de 2025

Un 78,34% del valor total del contrato ha sido entregado a la entidad que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 2.726.349.083,00, correspondiente a 69 puntos.

Seguimiento Metas Contractuales y Cronograma Proyecto

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Físico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 174.001.157					NO
3	20-may-25	10%	$ 348.002.314			$ 354.286.974,40	10,18%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 696.004.628	$ 432.051.623,93	12,42%	$ 676.103.015,93	19,43%	NO
5	20-jul-25	35%	$ 1.218.008.099	$ 666.318.743,58	19,15%	$ 935.622.583,88	26,89%	NO
6	20-ago-25	50%	$ 1.740.011.570	$ 831.654.503,47	23,90%	$ 1.591.568.881,88	45,73%	NO
7	20-sep-25	70%	$ 2.436.016.197	$ 1.759.303.016,11	50,55%	$ 1.809.299.151,42	51,99%	NO
8	20-oct-25	90%	$ 3.132.020.825	$ 1.859.056.204,11	53,42%	$ 2.105.411.273,82	60,50%	NO
9	20-nov-25	100%	$ 3.480.023.139	$ 1.889.279.794,00	54,29%	$ 2.605.186.314,52	74,86%	NO
10	20-dic-25	100%	$ 3.480.023.139	$ 2.726.349.083,00	78,34%	$ 2.944.219.840,29	84,60%	NO

Aspectos Administrativos y de SST

De los 72 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 55 puntos ubicados en los municipios de Vergara (5), Nimaima (3), Anolaima (2), Vianí (3), Viotá (1), Agua de Dios (2), Puerto Salgar (2), La Vega (2), Pulí (1), Guayabal de Siquima (3), Alban (3), El Rosal (2), Cachipay (4), Villeta (3), Anapoima (4), El Colegio (3), Apulo (2), Nilo (3), Chaguaní (4), Topaipi (2) y Yacopí (1), los cuales ya fueron revisados por la interventoría, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoría se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Vergara, Anolaima, Pulí, Villeta y Anapoima, los cuales ya fueron aprobados por la interventoría y remitidos a la entidad - SMC.

La interventoría menciona el cumplimiento por parte del contratista de la entrega de las planillas de seguridad social para la aprobación del informe mensual N°8. Y se radica cuenta de cobro N°4.

Aspectos sociales y/o ambientales

REPORTE INFORMES FINALES LOTE 2

MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA	ESTADO
VERGARA	5	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
VILLETA EDS BRÍO	1	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
ANOLAIMA	2	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
NIMAIMA	3	EN REVISION	12/12/2025	
PUERTO SALGAR	2	EN REVISION	12/12/2025	
AGUA DE DIOS	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	11/12/2025	
PULI	1	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
GUAYABAL DE	3	EN REVISION	15/12/2025	
LA VEGA	2	EN REVISION	15/12/2025	
VIOTA	1	EN REVISION	15/12/2025	
ALBAN	3	EN REVISION	16/12/2025	
VIANI	3	EN REVISION	15/12/2025	
APULO	2	EN REVISION	16/12/2025	
YACOPI	1	EN REVISION	16/12/2025	
CHAGUANI	4	EN REVISION	16/12/2025	
NILO	3	EN REVISION	16/12/2025	
CAPARRAPI	2	EN REVISION		
TOPAIPI	2	EN REVISION	16/12/2025	
EL COLEGIO	3	EN REVISION	17/12/2025	
ANAPOIMA	4	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
CACHIPAY	4	EN REVISION	15/12/2025	
EL ROSAL	2	EN REVISION	17/12/2025	
FUNZA	2	SIN ENTREGAR	15/12/2025	
SAN JUAN DE RIO	4	SIN ENTREGAR	13/12/2025	
VILLETA	2	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
SUBIACHOQUE	3	SIN ENTREGAR	15/12/2025	
GUADUAS	2	SIN ENTREGAR	16/12/2025	
VERGARA SEÑALES INFORMATIVAS	1	SIN ENTREGAR	16/12/2025	

EN REVISION DE INTERVENTORIA	40
EN REVISION DE LA SMC	15
DEVUELTO AL CONTRATISTA	2
SIN ENTREGAR	12

A la fecha se encuentran en trámite los PMT para los 4 puntos ubicados en el municipio de Zipacón.

Aspectos Presupuestales

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	9	Vergara (5), Nimaima (3) y Villeta (1)	$ 298.655.383,00	8,58 %	$ 298.655.383,00	8,58 %
2	14	Anolaima (2), Vianí (3), Viotá (1), Anapoima (1), Agua de Dios (2), Puerto Salgar (2), La Vega (2) y Villeta (1)	$ 531.002.493,00	15,26 %	$ 829.657.876,00	23,84 %
3	22	Anapoima (3), Apulo (2), Cachipay (4), El Colegio (3), El Rosal (2), Guayabal de Siquima (3), Nilo (3), Pulí (1) y Villeta (1)	$ 875.336.493,00	25,15 %	$ 1.704.994.369,00	48,99 %

ACCIONES Y COMPROMISOS FORMULADOS EN LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Entrega planos récord y acta cantidades de los puntos a recibir en la semana del 15 dic (Ricaurte 1 punto, La Mesa, Tocaima, Pacho)	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para la semana del 15/12/2025
Planos récord Vergara e Inicio y terminación Tocaima	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para el 20/12/2025

Subsanación informe mensual N° 9	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para el 15/12/2025
Paquete de cobro N° 5 CO	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para la semana del 15/12/2025
Terminación actividades sociales de la totalidad de puntos ejecutados	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para antes del 20/12/2025
Entrega informes finales Agua de D, Funza, San juan de R, Subachoque, Guaduas, Vergara informativas	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para el 15 y 18 /12/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Juan Heredia
SUPERVISOR SMC

Firma_____
Nombre: Ernesto Perdomo
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Héctor Gómez
CONTRATISTA

Para uso exclusivo del supervisor de SMC: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR SMC

Copia: interventoría
Copia: contratista

REGISTRO DE ASISTENTES



AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria de Movilidad Contemporánea -SMC , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página contactenos@cundinamarca.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, SMC sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No 51-53 Bogotá D.C., al correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(601) 7490000, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Comité de seguimiento No. 40

Contrato de obra No. STM-LP-008-2025 (Lote 2)

Contrato de interventoría No. STM-CM-010-2025

Objeto: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Fecha 15-12-2025

CONTENIDO

1 RESUMEN CONTRACTUAL

2 SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

4 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

5 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

6 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Gobernación de Cundinamarca

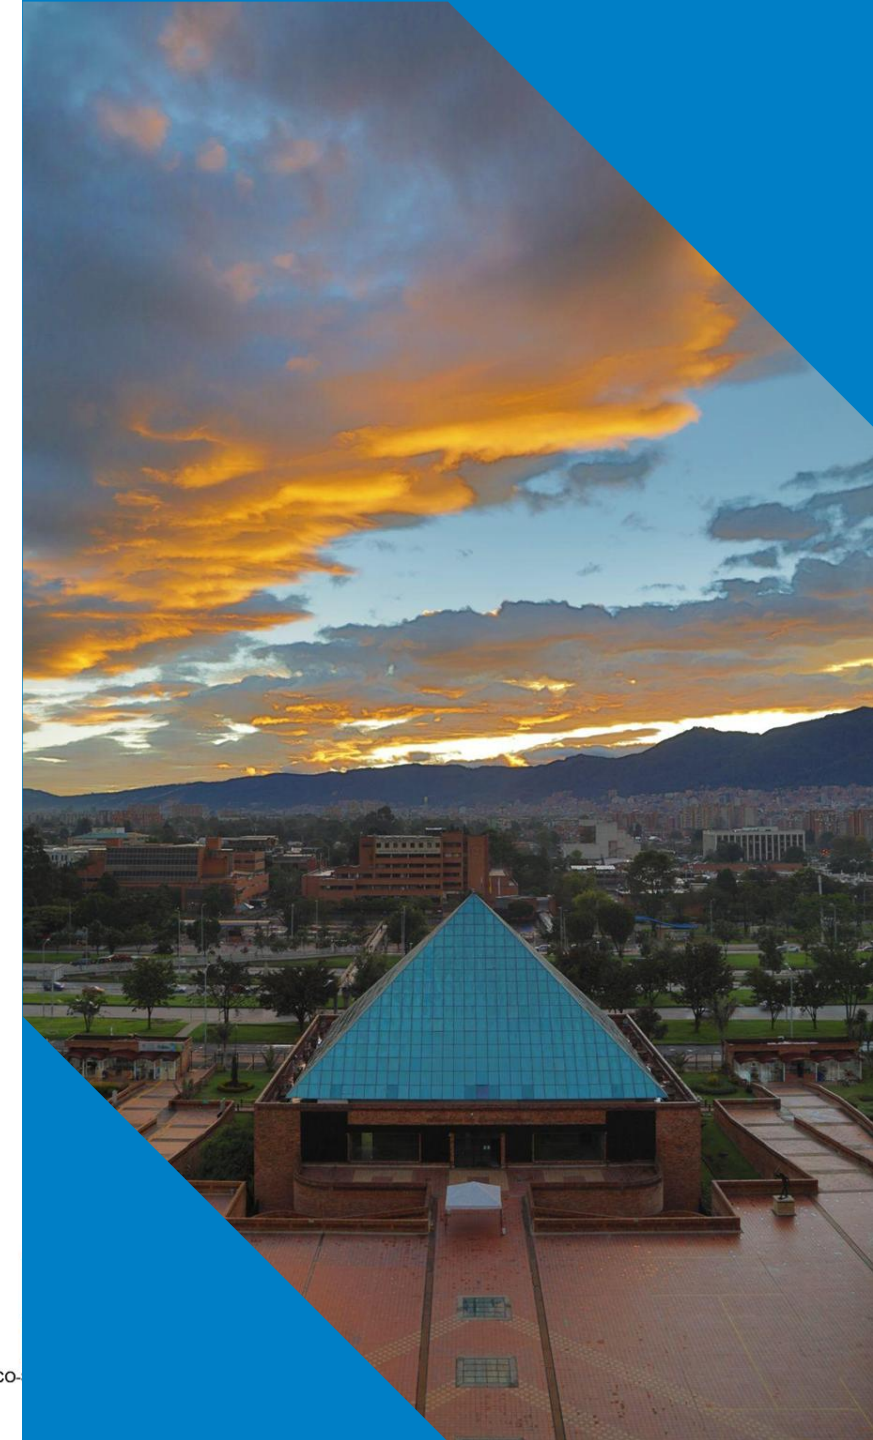

1. RESUMEN CONTRACTUAL

ALCANCE	OBRA	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	INGENIO VIAL	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL
OBJETO CONTRACTUAL	"Implementar intervenciones en infraestructura vial para **mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos** priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca".	Realizar la gerencia integral para la **interventoría técnica, administrativa, financiera, operativa, jurídica, ambiental y social** al contrato cuyo objeto es: implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca.
VALOR DEL CONTRATO	$3.480.023.139,00	$1.651.573.119
ADICIONES	N/A	N/A
PLAZO DE EJECUCION	Diez (10) Meses	Once (11) Meses
FECHA INICIO	21 de febrero 2025	21 de febrero 2025
FECHA TERMINACIÓN	20 de diciembre 2025	20 de enero 2026

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


No.	Compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Fecha de cumplimiento	Observación
1	Envío planos récord y acta cantidades Subachoque y Funza punto 02	Contratista	05/12/2025	08/12/2025	CUMPLIDO
2	Envío planos récord y acta cantidades Vergara punto 06 y Guaduas	Contratista	10/12/2025	10/12/2025	CUMPLIDO
3	Cronograma visitas de recibo	Contratista	09/12/2025	09/12/2025	CUMPLIDO
4	Envío planos récord y acta cantidades Ricaurte punto 01	Contratista	12/12/2025		Sin cumplir
5	Subsanación informe mensual 8	Contratista	05/12/2025	10/12/2025	CUMPLIDO
6	Envío paquete de cobro 4	Contratista	05/12/2025	09/12/2025	CUMPLIDO
7	Verificación parafiscales informe mensual 9	Contratista	06/12/2025		Sin cumplir
8	Subsanación informes finales Nimaima y Puerto Salgar	Contratista	09/12/2025	11/12/2025	CUMPLIDO
9	Entrega informes finales Caparrapí, Topaipí y Funza	Contratista			CUMPLIDO parciamente, entregado Caparrapí y Topaipí

3.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Valor contrato L2 **$ 3.480.023.139,00**

Diseños entregados por la SMC:

Municipio	Puntos Entregados	Presupuesto Inicial
AGUA DE DIOS	2	$ 83.512.726,82
ALBAN	3	$ 54.577.022,89
ANAPOIMA	4	$ 225.502.194,48
ANOLAIMA	2	$ 78.333.675,75
APULO	2	$ 17.794.439,63
CACHIPAY	4	$ 182.021.128,28
CAPARRAPI	2	$ 28.253.752,88
CHAGUANI	4	$ 25.441.332,63
EL COLEGIO	3	$ 140.158.506,76
EL ROSAL	2	$ 45.204.237,98
FUNZA	2	$ 415.595.664,86
GUADUAS	2	$ 145.063.271,76
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	$ 70.205.100,83
LA MESA	2	$ 226.880.407,91
LA VEGA	2	$ 44.831.834,68
NILO	3	$ 85.529.576,51
NIMAIMA	3	$ 109.558.823,89
PACHO	1	$ 129.847.837,89
PUERTO SALGAR	2	$ 87.258.759,11
PULI	1	$ 41.452.521,67
RICAURTE	3	$ 52.695.584,83
SAN JUAN DE RIO SECO	4	$ 77.036.569,08
SUBACHOQUE	3	$ 162.132.760,49
TOCAIMA	1	$ 50.534.419,90
TOPAIPI	2	$ 37.176.965,13
VERGARA	6	$ 191.169.152,61
VIANI	3	$ 50.769.370,13
VILLETA	3	$ 273.344.864,62
VIOTÁ	1	$ 51.477.264,72
YACOPI	1	$ 96.257.966,88
ZIPACÓN	4	$ 194.912.577,02
Total	80	$ 3.474.530.312,60

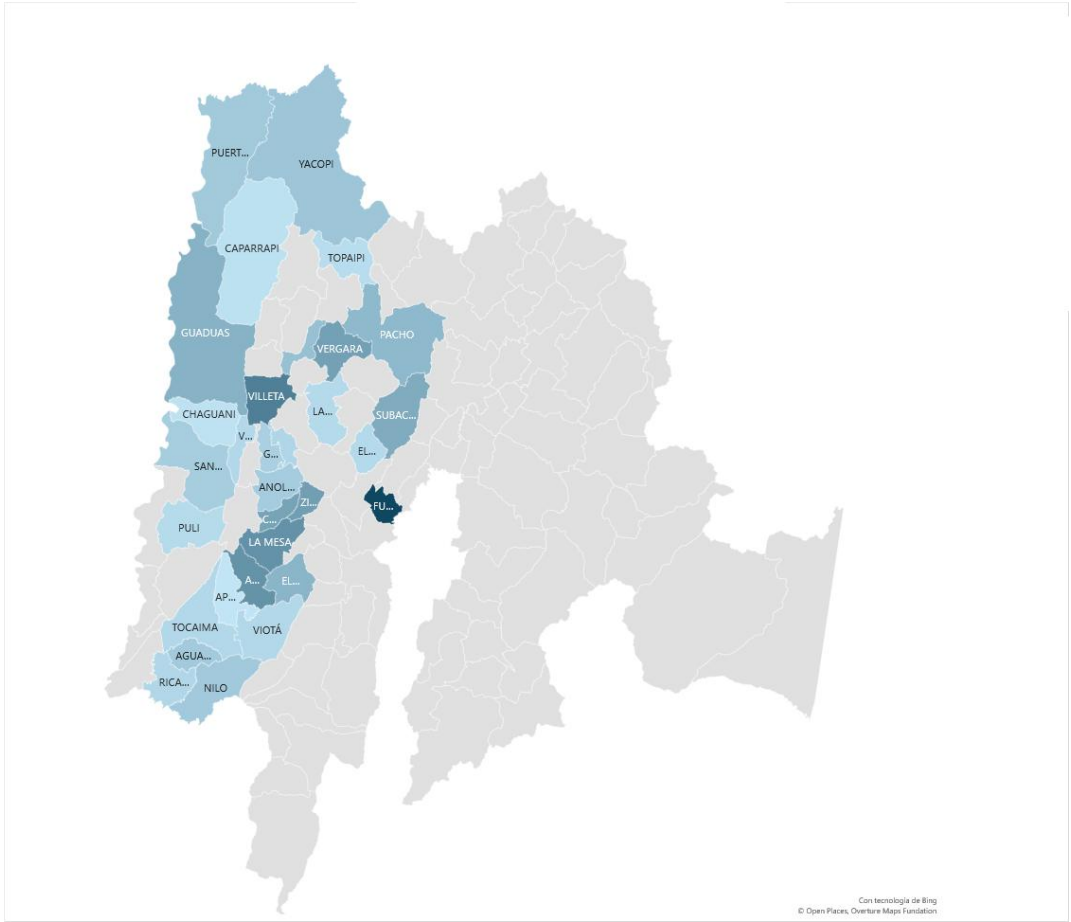

Gobernación de Cundinamarca

ENTIDAD CERTIFICADA

CO-SC-CER303297 ST-CER655785 CO-SI-CER1017570

3.2 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	80
Valor total estimado	$ 3.474.530.312,60
Puntos con visita de reconocimiento	80
Entrega informe visita	80
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	80
Presupuesto diseños apropiados	$ 3.559.371.980,65

3.3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Visita preliminar	Cuenta de Entrega REAL informe visita	Cuenta de Aprobación informe
AGUA DE DIOS	2	2	2	2
ALBAN	3	3	3	3
ANAPOIMA	3	3	3	3
ANAPOIMA (VIOTA)	1	1	1	1
ANOLAIMA	2	2	2	2
APULO	2	2	2	2
CACHIPAY	4	4	4	4
CAPARRAPI	2	2	2	2
CHAGUANI	4	4	4	4
EL COLEGIO	3	3	3	3
EL ROSAL	2	2	2	2
GUADUAS	2	2	2	2
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	3	3	3
LA VEGA	2	2	2	2
NILO	3	3	3	3
NIMAIMA	3	3	3	3
PUERTO SALGAR	2	2	2	2
PULI	1	1	1	1
TOPAIPI	2	2	2	2
VERGARA	6	6	6	6
VIANI	3	3	3	3
VILLETA - 1	1	1	1	1
VILLETA - 2	2	2	2	2
YACOPI	1	1	1	1
VIOTÁ	1	1	1	1
ZIPACÓN	4	4	4	4
RICAURTE	3	3	3	3
SAN JUAN DE RIO SECO	4	4	4	4
SUBACHOQUE	3	3	3	3
FUNZA	2	2	2	2
LA MESA	2	2	2	2
TOCAIMA	1	1	1	1
PACHO	1	1	1	1
TOTAL	**80**	**80**	**80**	**80**

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.480.023.139,00	100%
Puntos entregados por la SMC	80	
Valor total estimado	$ 3.474.530.312,60	99,84%
Puntos descartados	4	
Valor inicial puntos descartados	$ 194.912.577,02	5,60%
Valor ejecutable puntos entregados por la SMC	$ 3.279.617.735,58	94,24%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	80	
Presupuesto diseños apropiados	$ 3.559.371.980,65	102,28%
Valor apropiado puntos descartados	$ 258.039.701,00	7,41%
Valor ejecutable puntos entregados por la SMC y apropiados	$ 3.301.332.279,65	94,87%
Puntos en ejecución de obra	2	
Puntos terminados	72	
Puntos sin iniciar	2	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	69	
Valor ejecutado físico	$ 2.944.219.840,29	84,60%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 2.726.349.083,00	78,34%

NOTA: Los puntos entregados más recientemente fueron los ubicados en los municipios de Guaduas y Vergara el día 11 de diciembre de 2025.

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO**
VERGARA	INTERSECCION NOCAIMA - LA MAGOLA	16/6/2025	$ 38.158.940,33	$ 37.977.402,00	$ 39.492.082,00	1,13%
VERGARA	SECTOR TOBIAS	16/6/2025	$ 82.481.009,87	$ 72.427.271,40	$ 65.790.453,00	1,89%
VERGARA	IED FIDEL DE LEON TRIANA	16/6/2025	$ 26.647.883,06	$ 36.579.968,00	$ 38.837.056,00	1,12%
VERGARA	HOSPITAL SANTA BARBARA	16/6/2025	$ 20.308.321,92	$ 15.528.094,00	$ 17.245.140,00	0,50%
VERGARA	Escuela EL IMPAR	16/6/2025	$ 18.220.344,17	$ 24.617.897,00	$ 21.831.951,00	0,63%
NIMAIMA	Caserio Chaguani	16/6/2025	$ 32.615.429,14	$ 30.847.603,00	$ 26.890.101,00	0,77%
NIMAIMA	Sector Hungria - Ingreso Tobia-Escuela San Juan Bosco - Tobia	16/6/2025	$ 50.104.412,27	$ 49.000.305,00	$ 47.520.938,00	1,37%
NIMAIMA	Cruce La Maria - Via Nacional	16/6/2025	$ 26.838.982,49	$ 32.949.797,00	$ 35.713.586,00	1,03%
VILLETA	Restricción carga	16/6/2025	$ 6.514.652,43	$ 6.999.034,00	$ 5.334.076,00	0,15%
ANOLAIMA	1. Centro Poblado - La Florida	26/6/2025	$ 32.110.623,45	$ 35.706.357,00	$ 34.615.485,00	0,99%
ANOLAIMA	2. Vereda La Mesita - Salida Municipio	26/6/2025	$ 46.223.052,30	$ 46.171.172,00	$ 48.825.385,00	1,40%
VIANI	1. Vereda Hatillo	26/6/2025	$ 39.840.547,61	$ 38.433.097,00	$ 38.711.313,00	1,11%
VIANI	2. Escuela Rural Hatillo	26/6/2025	$ 5.885.786,28	$ 6.265.046,00	$ 6.265.046,00	0,18%
VIANI	3. Vereda RosarioEscuela Vda. Contador	26/6/2025	$ 5.043.036,24	$ 4.979.012,00	$ 4.979.012,00	0,14%

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO
VIOTA	Intersección Pueblo de Piedra	21/7/2025	$ 51.477.264,72	$ 58.184.017,00	$ 59.493.451,00	1,71%
ANAPOIMA	Intersección Puerto Lopez	21/7/2025	$ 99.277.128,10	$ 98.040.198,00	$ 102.500.667,00	2,95%
AGUA DE DIOS	VEREDA IBAÑEZ (Fundación San Miguel y Los Chorros)	21/7/2025	$ 60.729.823,02	$ 52.404.030,00	$ 51.921.354,00	1,49%
AGUA DE DIOS	Hospital Herrera Restrepo Barrio Boyaca	21/7/2025	$ 22.782.903,81	$ 19.975.480,00	$ 16.526.396,00	0,47%
PUERTO SALGAR	Hospital Puerto Salgar "Diógenes Troncoso"	25/7/2025	$ 50.405.455,99	$ 46.519.387,00	$ 48.348.010,00	1,39%
PUERTO SALGAR	Intersección Cruce Patevaca	25/7/2025	$ 36.853.303,12	$ 36.947.894,00	$ 32.635.657,00	0,94%
LA VEGA	Caserio Patio Bonito	5/8/2025	$ 24.056.687,85	$ 16.822.366,00	$ 14.028.270,00	0,40%
LA VEGA	Colegio IED Luis Alfonso Valvuena	5/8/2025	$ 20.775.146,83	$ 12.993.161,00	$ 10.580.772,00	0,30%
GUAYABAL DE SIQUIMA	1. Escuela El Rodeo	21/8/2025	$ 6.913.468,32	$ 8.562.685,00	$ 8.562.685,00	0,25%
GUAYABAL DE SIQUIMA	2. Instituto Departamental El Trigo	21/8/2025	$ 5.110.477,68	$ 7.138.954,00	$ 7.138.954,00	0,21%
GUAYABAL DE SIQUIMA	3. Centro Poblado El Trigo	21/8/2025	$ 58.181.154,83	$ 33.020.328,00	$ 30.482.460,00	0,88%
PULI	IEDI PULI Carrera 7 con calle 9.	21/8/2025	$ 41.452.521,67	$ 37.045.925,00	$ 34.668.288,00	1,00%
EL ROSAL	Intersección entre via Subachoque - El Rosal y vía El Secreto (Hacienda San Sebastián)	28/8/2025	$ 37.139.290,74	$ 39.617.052,00	$ 35.887.145,00	1,03%
EL ROSAL	Inicio vía Subachoque-el rosal	28/8/2025	$ 8.064.947,24	$ 8.877.603,00	$ 8.877.603,00	0,26%

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO
ALBAN	1. Interseccion Chimbe - Guayacundo Bajo	28/8/2025	$ 18.547.726,64	$ 16.970.921,00	$ 16.674.006,00	0,48%
ALBAN	2. Intersección Guayacundo - Bagazal - Villeta	28/8/2025	$ 17.218.175,94	$ 16.363.160,00	$ 17.036.359,00	0,49%
ALBAN	3. Intersección La Ceibita	28/8/2025	$ 18.811.120,31	$ 18.268.407,00	$ 16.147.589,00	0,46%
CACHIPAY	Instituto Agrícola - Peña Negra - Centro Poblado	4/9/2025	$ 28.167.647,38	$ 28.317.628,00	$ 27.592.514,00	0,79%
CACHIPAY	Vereda Peña Negra - Sector Recebera	4/9/2025	$ 84.073.752,65	$ 92.076.728,00	$ 88.592.891,00	2,55%
CACHIPAY	Sector los Cuartos	4/9/2025	$ 42.237.009,61	$ 46.127.977,00	$ 41.970.725,00	1,21%
CACHIPAY	Sector Curva los Acuña	4/9/2025	$ 27.542.718,64	$ 40.941.392,00	$ 44.054.492,00	1,27%
VILLETA	LORENA ALTA/ Intersección "Brío EDS La María J"/ EL BOLIVARIANO	15/9/2025	$ 214.672.363,09	$ 171.028.140,00	$ 171.145.712,00	4,92%
EL COLEGIO	Cra 4 Cl 6 y 7	17/9/2025	$ 40.345.013,79	$ 46.104.352,00	$ 41.342.586,00	1,19%
EL COLEGIO	CASCO URBANO Carrera 8 entre Cl 9 y Cl 5	17/9/2025	$ 59.051.534,16	$ 65.297.965,00	$ 58.439.784,00	1,68%
EL COLEGIO	CASCO URBANO Calle 8 entre Cl 9 y Via 40CN03	17/9/2025	$ 40.761.958,81	$ 42.440.828,00	$ 40.393.309,00	1,16%
ANAPOIMA	p2 centro poblado Patio Bonito	17/9/2025	$ 52.974.038,67	$ 61.700.374,00	$ 62.606.353,00	1,80%
ANAPOIMA	p3, Escuela Panama	17/9/2025	$ 30.429.311,21	$ 40.371.260,00	$ 43.048.348,00	1,24%
ANAPOIMA	P4 Sector La Paz	17/9/2025	$ 42.821.716,50	$ 45.026.582,00	$ 40.680.468,00	1,17%

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO**
APULO	I.E.D.I. ANTONIO NARIÑO Sede R. Salcedo	18/9/2025	$ 4.979.010,96	$ 6.131.342,00	$ 6.131.342,00	0,18%
APULO	IEDI ANTONIO NARIÑO Sede CHARCO LARGO	18/9/2025	$ 12.815.428,67	$ 6.096.059,00	$ 6.096.059,00	0,18%
NILO	p1 puente La Aguadediosita	18/9/2025	$ 27.606.374,40	$ 27.672.637,00	$ 27.672.637,00	0,80%
NILO	p2 curva puente Sector El Manantial	18/9/2025	$ 47.863.460,99	$ 50.853.915,00	$ 29.602.193,00	0,85%
NILO	P3Salida del Casco a urbano via Pueblo Nuevo	18/9/2025	$ 10.059.741,12	$ 20.022.370,00	$ 20.349.945,00	0,58%
CHAGUANI	1. Intersección Guadas - Chaguaní	2/10/2025	$ 7.180.025,11	$ 8.524.344,00	$ 8.524.344,00	0,24%
CHAGUANI	2. Escuela Rural Polonia	2/10/2025	$ 5.885.786,28	$ 5.821.761,00	$ 5.821.761,00	0,17%
CHAGUANI	3. Intersección La Estrella	2/10/2025	$ 5.979.832,16	$ 7.963.475,00	$ 7.963.475,00	0,23%
CHAGUANI	4, Escuela Rural Campo Alegre	2/10/2025	$ 6.395.689,08	$ 6.331.664,00	$ 6.331.664,00	0,18%
CAPARRAPI	1. Escuela Boca de Monte-Vía Utica-Caparrapí.	15/10/2025	$ 11.793.603,68	$ 13.019.058,00	$ 13.381.140,00	0,38%
CAPARRAPI	Intersección alto de brisas via Utica-Caparrapi	15/10/2025	$ 16.460.149,20	$ 20.405.056,00	$ 20.405.056,00	0,59%

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO
TOPAIPI	1. SAN ANTONIO DE AGUILERA	15/10/2025	$ 21.725.980,35	$ 20.599.464,00	$ 18.593.569,00	0,53%
TOPAIPI	2. TOPAIPÍ - YACOPÍ	15/10/2025	$ 15.450.984,78	$ 19.182.827,00	$ 18.732.179,00	0,54%
YACOPI	"Tramo vial que une la Escuela Vereda Yacopí Grande Intersección Vía Topaipí-Yacopi"	19/11/2025	$ 96.257.966,88	$ 39.170.676,00	$ 37.773.362,00	1,09%
FUNZA	Calle15 entre Carrera 9 y Glorieta Ingreso a Funza	21/11/2025	$ 132.438.669,11	$ 136.648.253,00	$ 134.851.327,00	3,88%
SAN JUAN DE RIO SECO	Sector la Balsa	27/11/2025	$ 15.780.966,43	$ 16.382.846,00	$ 16.382.846,00	0,47%
SAN JUAN DE RIO SECO	Vereda El Totumo - Sector Trituradora	27/11/2025	$ 1.765.763,21	$ 2.777.019,00	$ 3.096.711,00	0,09%
SAN JUAN DE RIO SECO	IEDR - Inspección de San Nicolas	27/11/2025	$ 12.418.929,60	$ 12.079.372,00	$ 12.079.372,00	0,35%
SAN JUAN DE RIO SECO	Vereda El Totumo - Sector la Agilita vía Lagunitas	27/11/2025	$ 47.070.909,84	$ 47.420.603,00	$ 45.440.519,00	1,31%
SUBACHOQUE	SECTOR LA CUESTA	9/12/2025	$ 40.267.426,54	$ 43.682.084,00	$ 51.091.006,00	1,47%
SUBACHOQUE	IE TOMAS IRIARTE	9/12/2025	$ 60.888.839,11	$ 60.329.712,00	$ 59.013.838,00	1,70%
SUBACHOQUE	INTERSECCIÓN LA VIRGEN	9/12/2025	$ 60.976.494,84	$ 83.354.148,00	$ 79.124.296,00	2,27%
FUNZA	Calle15 entre Carrera 9 y C.R. Quintas de San Isidro	9/12/2025	$ 283.156.995,75	$ 301.918.635,00	$ 293.383.613,00	8,43%
GUADUAS	Interseccion Plaza De Eventos	11/12/2025	$ 96.454.135,98	$ 101.902.474,00	$ 88.129.829,00	2,53%
GUADUAS	Colegio - Estación Bomberos	11/12/2025	$ 48.609.135,77	$ 43.319.105,00	$ 43.085.032,00	1,24%
VERGARA	SEÑALES INFORMATIVAS	11/12/2025	$ 5.352.653,25	$ 5.352.653,25	$ 8.291.821,00	0,24%
VILLETA	Nativa Park Apartamentos	5/8/2025	$ 52.157.849,10	$ 82.975.652,00	$ 61.571.675,00	1,77%
TOTAL	69		$ 2.819.659.485,05	$ 2.835.604.053,65	$ 2.726.349.083,00	78,34%

3.5 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

CODIGO DEL PUNTO	MUNICIPIO	PUNTO	VALOR INICIAL	VALOR APROPIACION DISEÑO	DIFERENCIA	DIFERENCIA EN %	VALOR REAL EJECUTADO	PORCENTAJE AVANCE DE IMPLEMENTACION DISEÑOS APROPIADOS
25386_CN_01	LA MESA	CALLE 8	$ 215.418.508,01	$ 206.913.205,00	-$ 8.505.303,01	-3,95%	$ 166.130.612,29	80,29%
25386_CN_02	LA MESA	COLEGIO AMERICANO MENNO	$ 11.461.899,90	$ 12.389.193,00	$ 927.293,10	8,09%		
25815_CN_01	TOCAIMA	Via Municipal - Calle 4 Sector: Curva intersección "CATARNICA"	$ 50.534.419,90	$ 55.261.833,00	$ 4.727.413,10	9,35%		
25513_CN_01	PACHO	1, Vía Zipaquirá-Pacho, Sector "La M", PR23+900	$ 129.847.837,89	$ 124.325.651,00	-$ 5.522.186,89	-4,25%		
TOTAL			$ 3.474.530.312,60	$ 3.559.371.980,65	$ 84.841.668,05	2,44%	$ 2.944.219.840,29	91,00%


VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.480.023.139,00	$ 3.559.371.980,65	102,28%	$ 2.944.219.840,29	84,60%

3.7 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		ADELANTO	DIAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
LA MESA	25386_CN_01	CALLE 8	3/11/2025	4/12/2025	7/11/2025	EN EJECUCION	80,29%	10
LA MESA	25386_CN_02	COLEGIO AMERICANO MENNO	25/11/2025	5/12/2025			0,00%	9
TOCAIMA	25815_CN_01	Via Municipal - Calle 4 Sector: Curva intersección "CATARNICA"	20/11/2025	10/12/2025			0,00%	4
PACHO	25513_CN_01	1, Vía Zipaquirá-Pacho, Sector "La M", PR23+900	1/12/2025	8/12/2025			0,00%	6

3.7 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

Fecha Comité	% Ejecutado Físico Sobre el Valor del Contrato	% Planeado en Base a la Meta Contractual	Avance Reportado Entre Comités
4/6/2025	9,58%	15,00%	-
11/6/2025	10,18%	17,50%	0,60%
25/6/2025	13,45%	20,00%	3,27%
2/7/2025	19,43%	24,00%	5,98%
10/7/2025	20,73%	28,00%	1,30%
16/7/2025	22,18%	32,00%	1,45%
22/7/2025	26,89%	35,00%	4,71%
31/7/2025	29,64%	38,00%	2,75%
8/8/2025	35,83%	41,00%	6,19%
14/8/2025	39,43%	44,00%	3,60%
21/8/2025	45,73%	50,00%	6,30%
28/8/2025	47,68%	52,50%	1,95%
4/9/2025	50,12%	55,00%	2,44%
11/9/2025	50,37%	60,00%	0,25%
18/9/2025	51,52%	65,00%	1,15%
25/9/2025	51,99%	70,00%	0,47%
2/10/2025	55,10%	75,00%	3,11%
9/10/2025	57,22%	80,00%	2,12%
20/10/2025	60,50%	90,00%	3,28%
23/10/2025	61,78%	91,25%	1,28%
30/10/2025	62,83%	92,00%	1,05%
6/11/2025	67,39%	94,00%	4,56%
13/11/2025	70,02%	96,00%	2,63%
20/11/2025	72,52%	100%	2,50%
27/11/2025	74,86%	100%	2,34%
4/12/2025	77,93%	100%	3,07%
15/12/2025	84,60%	100%	6,67%

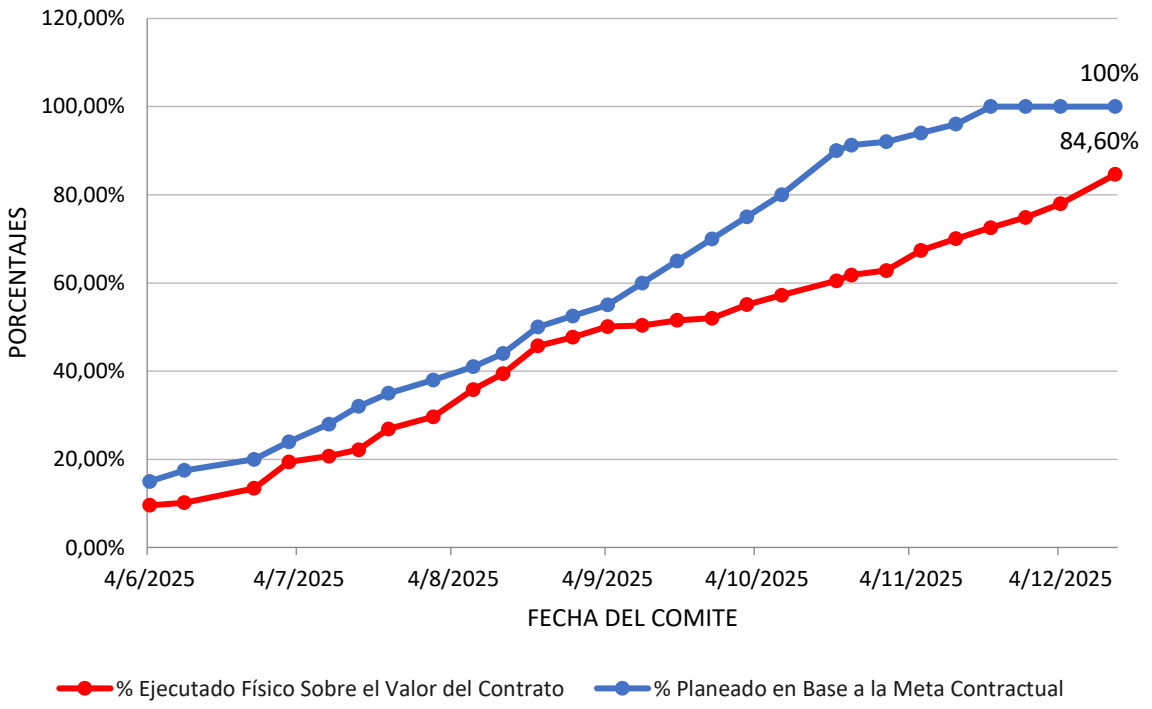

4.1 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO



Seguimiento metas contractuales:

Valor contrato L2 **$3.480.023.139,0**

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Físico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 174.001.157					NO
3	20-may-25	10%	$ 348.002.314			$ 354.286.974,40	10,18%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 696.004.628	$ 432.051.623,93	12,42%	$ 676.103.015,93	19,43%	NO
5	20-jul-25	35%	$ 1.218.008.099	$ 666.318.743,58	19,15%	$ 935.622.583,88	26,89%	NO
6	20-ago-25	50%	$ 1.740.011.570	$ 831.654.503,47	23,90%	$ 1.591.568.881,88	45,73%	NO
7	20-sep-25	70%	$ 2.436.016.197	$ 1.759.303.016,11	50,55%	$ 1.809.299.151,42	51,99%	NO
8	20-oct-25	90%	$ 3.132.020.825	$ 1.859.056.204,11	53,42%	$ 2.105.411.273,82	60,50%	NO
9	20-nov-25	100%	$ 3.480.023.139	$ 1.889.279.794,00	54,29%	$ 2.605.186.314,52	74,86%	NO
10	20-dic-25	100%	$ 3.480.023.139	$ 2.726.349.083,00	78,34%	$ 2.944.219.840,29	84,60%	NO

4.2 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO



Valor contrato L2 **$3.480.023.139,0**

Relación pagos:

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	9	Vergara (5), Nimaima (3) y Villeta (1)	$ 298.655.383,00	8,58 %	$ 298.655.383,00	8,58 %
2	14	Anolaima (2), Viani (3), Viotá (1), Anapoima (1), Agua de Dios (2), Puerto Salgar (2), La Vega (2) y Villeta (1)	$ 531.002.493,00	15,26 %	$ 829.657.876,00	23,84 %
3	22	Anapoima (3), Apulo (2), Cachipay (4), El Colegio (3), El Rosal (2), Guayabal de Siquima (3), Nilo (3), Pulí (1) y Villeta (1)	$ 875.336.493,00	25,15 %	$ 1.704.994.369,00	48,99 %
4	11	Alban (3), Topaipí (2), Caparrapí (2) y Chaguaní (4)	$ 149,611,142.00	4,30 %	$ 1.854.605.511,00	53,29 %
5						
6						
7						
8						
9						
10						

5.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Actividades de implementación La Mesa 25386_CN_01
CALLE 8



Actividades de implementación Guaduas
25320_CN_02 Colegio - Estación Bomberos



6. INFORME ESTADO DEL CLIMA

Estado del clima

Ítem	Estado del Clima	lunes 1 diciembre			martes 2			miércoles 3			jueves 4			viernes 5			sábado 6			domingo 7			TOTAL	TOTAL ACUMULADO
		Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche		
1	Lluvioso La Mesa																						0	4
2	Lluvioso Funza																						0	39
3	Lluvioso Guaduas																						0	0

7.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	80
Puntos con socialización inicial	78
Puntos con actas de entorno inicial	78
Puntos con socialización cierre	64
Puntos con actas de entorno de cierre	64
Actas de inicio de vecindad	86
Actas de cierre de vecindad	47
PQR recibidas	2
PQR atendidas y cerradas	2

7.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Socialización Inicial	Cuenta de Actas de vecindad	Cuenta de Actas entorno	Cuenta de Socialización fin	Cuenta de Actas de Cierre de Vecindad	Cuenta de Actas de cierre entorno
AGUA DE DIOS	2	2	4	2	2	4	2
ALBAN	3	3	3	3	3	3	3
ANAPOIMA	4	4	2	4	4	2	4
ANOLAIMA	2	2	4	2	2	4	2
APULO	2	2	N/A	2	2	N/A	2
CACHIPAY	4	4	2	4	4	2	4
CAPARRAPI	2	2	N/A	2	2	N/A	2
CHAGUANI	4	4	N/A	4	4	N/A	4
EL COLEGIO	3	3	15	3	3	15	3
EL ROSAL	2	2	3	2	2	3	2
GUADUAS	2	2	N/A	2			
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
LA VEGA	2	2	N/A	2	2	N/A	2
NILO	3	3	N/A	3	3	N/A	3
NIMAIMA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
PUERTO SALGAR	2	2	N/A	2	2	N/A	2
PULI	1	1	N/A	1	1	N/A	1
TOPAIPI	2	2	3	2	2	3	2
VERGARA	6	5	1	5	5	1	5
VIANI	3	3	N/A	3	3	N/A	3
VILLETA	3	2	5	2	2	5	2
YACOPI	1	1	N/A	1	1	N/A	1
VIOTÁ	1	1	1	1	1	1	1
ZIPACÓN	4	4	9	4			
RICAURTE	3	3	5	3			
SAN JUAN DE RIO SECO	4	4	2	4	4	2	4
SUBACHOQUE	3	3	2	3	3	2	3
FUNZA	2	2	4	2	1		1
LA MESA	2	2	17	2			
TOCAIMA	1	1	4	1			
PACHO	1	1	N/A	1			
TOTAL	**80**	**78**	**86**	**78**	**64**	**47**	**64**

NOTA: En los puntos Villeta-Restricción de Carga y Vergara- Señales Informativas no aplica levantar actas sociales.

8.1 SEGUIMIENTO PMT

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	80
PMT radicados	80
PMT aprobados	76
Puntos con otros permisos requeridos	0
Capacitaciones	0
Accidentes laborales	0

8.2 SEGUIMIENTO PMT

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Radicación PMT	Cuenta de Aprobación PMT
AGUA DE DIOS	2	2	2
ALBAN	3	3	3
ANAPOIMA	4	4	4
ANOLAIMA	2	2	2
APULO	2	2	2
CACHIPAY	4	4	4
CAPARRAPI	2	2	2
CHAGUANI	4	4	4
EL COLEGIO	3	3	3
EL ROSAL	2	2	2
GUADUAS	2	2	2
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	3	3
LA VEGA	2	2	2
NILO	3	3	3
NIMAIMA	3	3	3
PUERTO SALGAR	2	2	2
PULI	1	1	1
TOPAIPI	2	2	2
VERGARA	6	6	6
VIANI	3	3	3
VILLETA	3	3	3
YACOPI	1	1	1
VIOTÁ	1	1	1
ZIPACÓN	4	4	
RICAURTE	3	3	3
SAN JUAN DE RIO SECO	4	4	4
SUBACHOQUE	3	3	3
FUNZA	2	2	2
LA MESA	2	2	2
TOCAIMA	1	1	1
PACHO	1	1	1
TOTAL	**80**	**80**	**76**

9.1 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES DE VISITA PRELIMINAR

MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA
VERGARA	5	APROBADO	
VILLETA	2	APROBADO	
ANOLAIMA	2	APROBADO	
NIMAIMA	3	APROBADO	
ZIPACON	4	APROBADO	
GUADUAS	2	APROBADO	
PUERTO SALGAR	2	APROBADO	
AGUA DE DIOS	2	APROBADO	
PULI	1	APROBADO	
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	APROBADO	
LA VEGA	2	APROBADO	
VIOTA	1	APROBADO	
ALBAN	3	APROBADO	
VIANI	3	APROBADO	
APULO	2	APROBADO	
YACOPI	1	APROBADO	
CHAGUANI	4	APROBADO	
NILO	3	APROBADO	
CAPARRAPI	2	APROBADO	
TOPAIPI	2	APROBADO	
EL COLEGIO	3	APROBADO	
ANAPOIMA	4	APROBADO	
CACHIPAY	4	APROBADO	
EL ROSAL	2	APROBADO	
RICAURTE	3	APROBADO	
SUBACHOQUE	3	APROBADO	
FUNZA	2	APROBADO	
SAN JUAN DE RIO SECO	4	APROBADO	
LA MESA	2	APROBADO	
TOCAIMA	1	APROBADO	
PACHO	1	APROBADO	

10. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES FINALES

REPORTE INFORMES FINALES LOTE 2				
MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA	ESTADO
VERGARA	5	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
VILLETA EDS BRÍO	1	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
ANOLAIMA	2	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
NIMAIMA	3	EN REVISION	12/12/2025	
PUERTO SALGAR	2	EN REVISION	12/12/2025	
AGUA DE DIOS	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	11/12/2025	
PULI	1	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
GUAYABAL DE	3	EN REVISION	15/12/2025	
LA VEGA	2	EN REVISION	15/12/2025	
VIOTA	1	EN REVISION	15/12/2025	
ALBAN	3	EN REVISION	16/12/2025	
VIANI	3	EN REVISION	15/12/2025	
APULO	2	EN REVISION	16/12/2025	
YACOPI	1	EN REVISION	16/12/2025	
CHAGUANI	4	EN REVISION	18/12/2025	
NILO	3	EN REVISION	16/12/2025	
CAPARRAPI	2	EN REVISION		
TOPAIPI	2	EN REVISION	16/12/2025	
EL COLEGIO	3	EN REVISION	17/12/2025	
ANAPOIMA	4	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
CACHIPAY	4	EN REVISION	15/12/2025	
EL ROSAL	2	EN REVISION	17/12/2025	
FUNZA	2	SIN ENTREGAR	15/12/2025	
SAN JUAN DE RIO	4	SIN ENTREGAR	13/12/2025	
VILLETA	2	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
SUBACHOQUE	3	SIN ENTREGAR	15/12/2025	
GUADUAS	2	SIN ENTREGAR	16/12/2025	
VERGARA SEÑALES INFORMATIVAS	1	SIN ENTREGAR	16/12/2025	

EN REVISION DE INTERVENTORIA	**40**
EN REVISION DE LA SMC	**15**
DEVUELTO AL CONTRATISTA	**2**
SIN ENTREGAR	**12**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se han realizado 80 visitas preliminares de las cuales se han entregado 80 informes de visita preliminar y no se encuentran puntos pendientes por visita preliminar.
2. 80 puntos cuentan con actas de apropiación suscritas, de los cuales; 72 han sido terminados y de estos 66 y están pendientes por entregar 6 puntos, 1 están en ejecución y 7 se encuentran pendientes por iniciar.
3. A la fecha se encuentran en trámite los PMT para los 4 puntos ubicados en el municipio de Zipacón.
4. De los 72 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 55 puntos ubicados en los municipios de Vergara (5), Nimaima (3), Anolaima (2), Vianí (3), Viotá (1), Agua de Dios (2), Puerto Salgar (2), La Vega (2), Pulí (1), Guayabal de Siquima (3), Alban (3), El Rosal (2), Cachipay (4), Villeta (3), Anapoima (4), El Colegio (3), Apulo (2), Nilo (3), Chaguaní (4), Topaipi (2) y Yacopí (1), los cuales ya fueron revisados por la interventoria, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoria se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Vergara, Anolaima, Pulí, Villeta y Anapoima, los cuales ya fueron aprobados por la interventoria y remitidos a la entidad - SMC.
5. Un 78,34% del valor total del contrato a sido entregado a la entidad que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 2.726.349.083,00, correspondiente a 69 puntos.
6. A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 84,60% del valor total del contrato.



Gobernación de
Cundinamarca
