ACTA No:	144
FECHA:	19/12/ 2025
CONTRATO No:	C.I. No.STM-CM-010-2025
OBJETO:	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARTICIPANTES	
En Representación de	SMC
NOMBRE	Giovanna Naranjo
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	SMC
NOMBRE	María Virginia Rocha
Cargo	Especialista en transito
En Representación de	SMC
NOMBRE	Juan Heredia
Cargo	Supervisor
En Representación de	SMC
NOMBRE	Alejandro Leguizamo Flórez
Cargo	Profesional Universitario
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Ernesto Perdomo
Cargo	Director Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Dalila Otálora
Cargo	Especialista en Transito
En representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Bibiana Rojas
Cargo	Residente Interventoría

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR				
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**CUMPLIMIENTO**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
Cuentas 5 CO	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	x		Cumplido parcialmente, Lote-2 no cumplió.
Informe mensual 9 CI	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	x		Cumplido
Cuadro actualizado de informes finales	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL	x		Cumplido
Entrega planos récord y acta cantidades de los puntos a recibir en la semana del 15 dic (Arbeláez, Pasca, Paratebueno)	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		x	Sin cumplir
Actas de visita de recibo de puntos a visitar esta semana con observaciones específicos y fecha clara de compromiso de subsanación	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		x	Sin cumplir
Actas de comité 138 a 143	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		x	Sin cumplir
Paquete cobro 9 CI	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		x	Sin cumplir
Revisiones informes finales Simijaca, Guachetá, Susa, Tausa, Machetá, Tocancipá, Fosca, Cáqueza, Une, Junín	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		x	Sin cumplir
Revisiones informes finales Guayabal de S, La Vega, Viotá, Alban, Vianí, Apulo, Yacopí, Chaguaní, Nilo, Caparrapí, Topaipí, El Colegio, El Rosal, Cachipay	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		X	Sin cumplir
Actas de visita de recibo Funza 2, Subachoque	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL		x	Sin cumplir

TEMAS PRESENTE ACTA

En el presente comité se hace referencia del estado actual de la Cuenta No. 5 de los contratistas:

Lote 1: Se informa que la cuenta No. 5 fue recibida y avalada por interventoría y radicada en la SMC para tramite de pago.
Lote 2: El contratista no ha presentado la subsanación del informe mensual por lo tanto la cuenta No. 5 no será presentada.

Para el informe mensual de la interventoría N°9 Las observaciones fueron subsanadas y el informe ya se encuentra avalado, la entidad informa que emitirá el comunicado de aprobación requisito para la presentación de la cuenta de cobro No.9.

La SMC menciona que interventoría hizo entrega del cuadro de informes finales actualizado a la fecha, solicitando que sea nuevamente compartido el próximo lunes 29 de diciembre actualizado, con el fin de verificar avances durante la semana.

La entidad menciona el estado actual de entrega de planos récord y actas de cantidades, aclarando la interventoría que para Arbeláez y Pasca no se ha recibido información, a su vez la interventoría se compromete en fijar este compromiso con ambos contratistas, teniendo en cuenta que los puntos fueron visitados y entregados, se evidenció que no están culminados al 100%, los contratistas deberán finalizar las obras para poder contar con planos definitivos, consecutivos y demás documentación.

La entidad solicita a la interventoría que en las actas de visita y entrega debe quedar establecida la fecha de compromiso de subsanación, actividad que actualmente se viene realizando en campo.

La interventoría se compromete con la entrega de las actas de comité No. 138 a 146, para el día martes de la próxima semana.

La entidad solicita a la interventoría información sobre el estado actual de la revisión de informes finales

Lote 1: revisados y devueltos al contratista: Simijaca, Susa, Tocancipá, Fosca, Cáqueza. En revisión por parte de la interventoría: UNE, Junín, Guachetá, mencionando la interventoría que la revisión total de estos informes se enviara el día martes.

Lote-2**:** Los siguientes informes ya fueron observados, subsanados por el contratista y se encuentran nuevamente en revisión (versión 3): Guayabal de Siquima**,** Yacopí**,** Chaguaní**,** Caparrapí**,** Topaipí**,** El Colegio,**,** El Rosal.

La interventoría informa a la entidad que las actas de visita de recibo correspondientes a los municipios de Funza y Subachoque presentan observaciones, motivo por el cual se encuentran en proceso de ajuste por parte del contratista. Así mismo, se aclara que dichas actas están actualmente en revisión final por parte de la interventoría. En consecuencia, se acuerda que las actas serán entregadas el día martes, junto con el paquete completo de puntos pendientes.

Aspectos Contractuales

Se menciona el cumplimento del Lote -1 para cuenta de cobro N°5, haciendo referencia que para el Lote-2 el contratista no ha cumplido con la entrega del informe mensual N°9, y con la cuenta de cobro N°5 aclarando que es por falta de pagos de la seguridad social correspondiente al informe N°9.

La entidad menciona el cumplimento para el informe mensual de la interventoría N°9 mencionando que se encuentra avalado, la entidad emitirá el comunicado de aprobación de este, requisito para la presentación de la cuenta de cobro.

Se informa que el último comité del año será el lunes 29 de diciembre asistencia entre la entidad y interventoría

Aspectos Técnicos

Para el caso de no previstos en Guatavita, se indicó que no podrán adelantarse actividades sin la validación técnica correspondiente y la trazabilidad documental exigida por la entidad.

Seguimiento Metas Contractuales y Cronograma Proyecto

Se realizó seguimiento al avance en la entrega de informes finales y actividades técnicos, con base en el cuadro actualizado remitido por el contratista.

Se indica que los informes finales presentan atrasos en la subsanación de observaciones técnicas, especialmente en los puntos correspondientes a Arbeláez y Pasca.

Aspectos Administrativos y de SST

- Se menciona que el contratista CONSORCIO MS entrega de cuenta de cobro N°5 y se encuentra en revisión y tramite en la SMC,
- El CONSORCIO INGENIO VIAL, cuenta de cobro N°5 e informe mensual N°9, pendiente de subsanación.

Aspectos sociales y/o ambientales

Entre la SMC y la interventoría se da cumplimiento a mesa se trabajó para subsanar los informes mensuales ambientales por parte de interventoría.

Aspectos Presupuestales

La entidad menciona que el informe N°9 de la interventoría está avalado, la entidad emitirá el comunicado de aprobación del Informe Mensual No. 9, requisito para la presentación de la cuenta de cobro No.9, de igual manera se indica que está ya radica y revisada en espera de la aprobación del informe para radicación en físico.

ACCIONES Y COMPROMISOS FORMULADOS EN LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Emitir comunicado de aprobación del Informe Mensual No. 9	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para 20/12/2025
Compartir cuadro actualizado de informes finales	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 22/12/2025
Entregar de informe de cantidades pendientes	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 23/12/2025
Radicar actas de comité 138 a 143 y demás actas pendientes	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 23/12/2025
Finalizar revisión informe UNE, Junín y Guachetá	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 23/12/2025

Entregar actas de visita Funza y Subachoque ajustadas	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL			Compromiso para el 23/12/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Juan Heredia
SUPERVISOR SMC


Firma_____
Nombre: Ernesto Perdomo
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para uso exclusivo del supervisor de SMC: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR SMC

Copia: interventoría
Copia: contratista

- **REGISTRO DE ASISTENCIA**

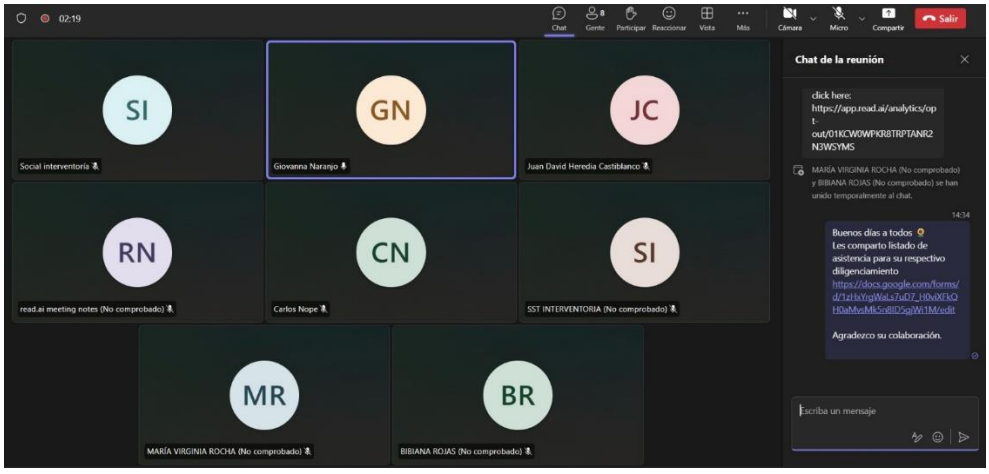

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria de Movilidad Contemporánea -SMC , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página contactenos@cundinamarca.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, SMC sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No 51-53 Bogotá D.C., al correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(601) 7490000, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.
